	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 4196-2023 **JAC:** Puerto Pervel
4817-2023 Tarido
4742-2023 Pie de Pato

Contrato de Interventoría No. 4699-2023 **Interventoría:** CISA SERVICIOS S.A.S

Objeto Contrato de Obra:
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO BAUDÓ Y EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No. **1** **MES O PERIODO:** ENERO-2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		10
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		12
2.1	Localización		12
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		12
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		13
2.4	Características técnicas del proyecto		14
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		15
3.1	Información general del contrato		15
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		20
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		21
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		21
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		22
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	22
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	46
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	50
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	55
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	60
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	64
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	68
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	77
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		84
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		84
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	84
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	88
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	88
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		93
5.1	Información general del contrato		93
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		93
5.3	Informes especialistas y profesionales		94
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		95
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	95
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	96
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	97
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	99
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	101
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		103
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		103
8	**Anexos**		104
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		105
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO BAUDÓ Y EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIOS SOLIDARIOS

4196 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL

4817 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNIDAD DE TARIDÓ

4742 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MUNICIPIO PIE DE PATÓ

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) - SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CISA SERVICIOS S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4699 DE 2023

ENERO 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
   - 2.1. Localización 7
   - 2.2. Estado inicial de la vía 8
   - 2.3. Características técnicas del proyecto 8
3. CONVENIOS SOLIDARIOS 10
   - 3.1. ANTECEDENTES 10
   - 3.2. INFORMACION GENERAL CONVENIOS SOLIDARIOS 11
   - 3.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONVENIOS SOLIDARIOS 13
   - 3.4. RESUMEN ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS EN EL MES 13
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 15
   - 4.1. Informe semanal 15
   - 4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra 16
   - 4.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 16
   - 4.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra 16
   - 4.5. Estado general del tiempo 16
   - 4.6. Resumen ensayos de Laboratorio 16
   - 4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 16
   - 4.8. Seguimiento Programa de Obra 16
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
   - 5.1. Descripción de las actividades y acciones realizadas por el Interventor 18
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21
   - 6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 21
   - 6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 21
   - 6.3. Información financiera y presupuestal Contrato de Interventoría 21
   - 6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría 21

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 23
9. ANEXOS 26

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización Municipios de Cantón del San Pablo y Alto Baudó 7
Ilustración 2. Localización Corregimientos de Puerto Pervel, Taridó y Alto Baudó 8
Ilustración 3. Avance ejecutado vs programado convenio 4196 de 2023 15

TABLAS

Tabla 1. Características Técnicas del Convenio Solidario N° 4196 DE 2023 9
Tabla 2. Características Técnicas del Convenio Solidario N° 4817 DE 2023 9
Tabla 3. Características Técnicas del Convenio Solidario N° 4742 DE 2023 9
Tabla 4. Convenios solidarios suscritos 10
Tabla 5. Información general Convenio 4196 de 2023 11
Tabla 6. Información general Convenio 4817 de 2023 12
Tabla 7. Información general Convenio 4742 de 2023 13
Tabla 8. Información Financiera Convenios Solidarios 13
Tabla 9. Actividades contratadas vs Actividades ejecutadas (Convenio 4196 de 2023) 14
Tabla 10. Información general del contrato de interventoría 17
Tabla 11. Acciones del interventor 18
Tabla 12. Actividades desarrolladas en el mes por la interventoría en convenio 4196-2023 20
Tabla 13. Actividades desarrolladas en el mes por la interventoría en convenio 4817-2023 20
Tabla 14.Actividades desarrolladas en el mes por la interventoría en convenio 4742-2023 20

1. INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva del Gobierno Nacional, el fortalecimiento y capacidad de la infraestructura física de transporte constituye un elemento fundamental para potenciar la competitividad a nivel nacional; es por esta razón, que el Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) ha estructurado el programa **"Caminos Comunitarios de la Paz Total"** a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios. Por regla general las Juntas de Acción Comunal solo pueden desarrollar actividades dentro del territorio de su zona de influencia (barrio, sector, etapa, vereda, corregimiento, etc.) dependiendo de la división establecida por el Distrito o Municipio respectivo.

El Instituto Nacional de Vías INVÍAS, es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, habiéndose modificado su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021, señalando como objeto del INVÍAS "La ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte".

En congruencia con lo anterior, se celebran los convenios solidarios No. **4196 de 2023**, No. **4817 de 2023** y No. **4742 de 2023** entre el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS** y las Juntas de acción comunal de la comunidad de Puerto Pervel, Taridó y el municipio de Pie de Pató para “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL, TARIDÓ Y EL MUNICIPIO DE PIE DE PATÓ EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO BAUDÓ Y EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. Para la interventoría, el INVÍAS contrató a través del proceso de selección de mínima cuantía a la empresa **CISA SERVICIOS S.A.S,** cuyo ID de contrato en el SECOP **CO1.PCCNTR.5600808** y de contrato No. **4699 de 2023**. Para control y vigilancia, el Instituto Nacional de Vías delegó como supervisor del contrato de interventoría al ingeniero **Jannier Salas**.

A lo largo de las siguientes páginas, se desglosarán minuciosamente los aspectos técnicos, administrativos, ambientales y financieros, relacionados con los presentes convenios solidarios, con el objetivo de brindar una visión integral de su desarrollo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización

Los convenios solidarios se encuentran localizados en el departamento del Chocó, en los municipios del Cantón del San Pablo y Alto Baudó. Las siguientes ilustraciones muestran los mapas que indican la ubicación de cada uno de los proyectos.

Ilustración 1. Localización Municipios de Cantón del San Pablo y Alto Baudó

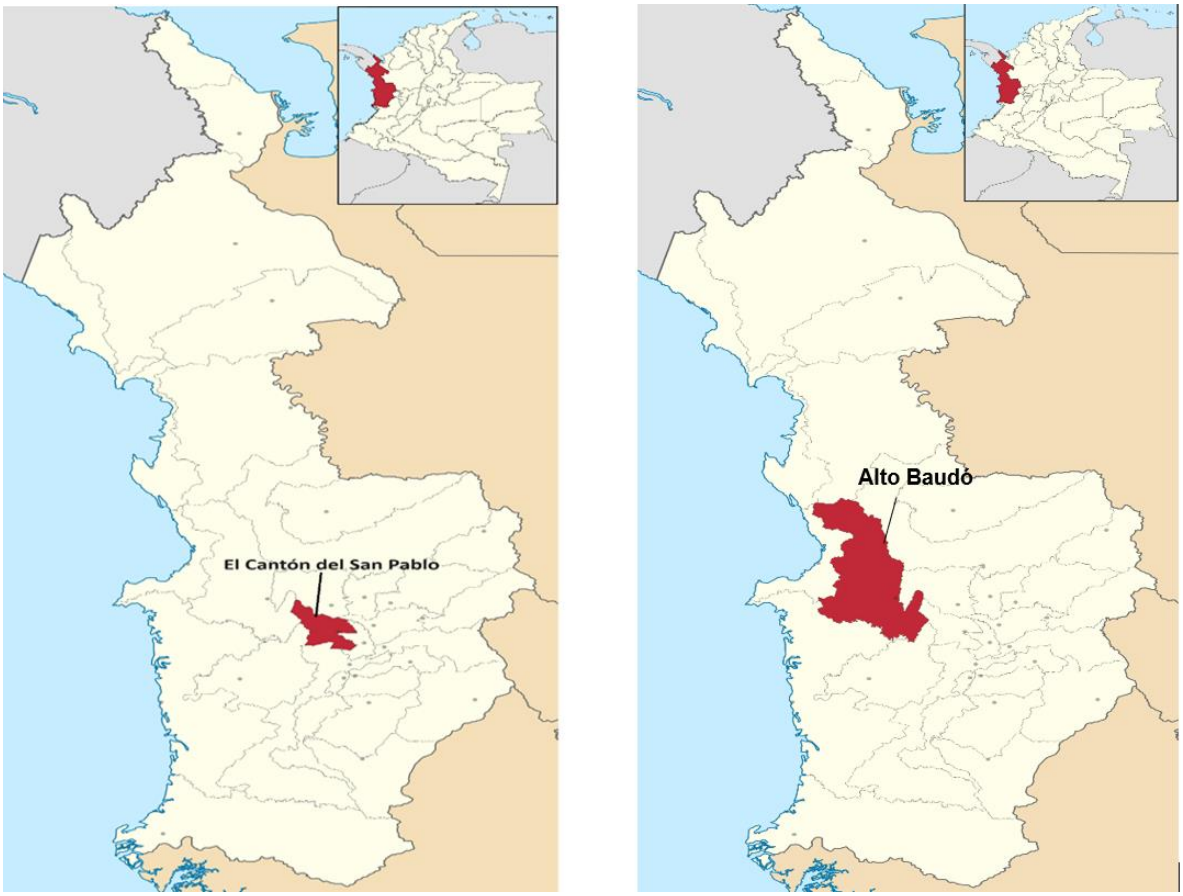


Ilustración 2. Localización Corregimientos de Puerto Pervel, Taridó y Alto Baudó



2.2. Estado inicial de la vía

Las vías urbanas son competencia de las Juntas de Acción Comunal referidas. Estas se encontraban en afirmado en malas condiciones; debido a, la presencia de deformaciones superficiales, tales como baches y ondulaciones, que comprometen la integridad estructural de la vía. La falta de mantenimiento adecuado ha propiciado la erosión de los materiales pétreos constituyentes del afirmado y generado condiciones de transitabilidad adversas. Además, se observa un incremento en la formación de charcos y en la acumulación de sedimentos, producto del escaso drenaje superficial y de la obstrucción de las cunetas. Estos factores, combinados con la acción del tránsito vehicular y las inclemencias climáticas, han derivado en un deterioro progresivo que compromete la seguridad y la fluidez del tráfico en dicha vía.

2.3. Características técnicas del proyecto

La definición del alcance final de las obras a ejecutarse determinada de manera conjunta por las partes que intervienen en los presentes convenios solidarios se presentas mediante aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS".

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

Partiendo de los diseños tipo, emitidos por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y las condiciones particulares del tramo a intervenir las características técnicas de cada convenio se relacionan a continuación.

Tabla 1. Características Técnicas del Convenio Solidario N° 4196 DE 2023

CONVENIO SOLIDARIO No. 4196 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL	
USO	Vía en operación, demanda intervenciones de conservación para su optimización
LONGITUD	110 ml
PLACA HUELLA	En Concreto Reforzado y Concreto Ciclópeo, espesor de 20 cm y de resistencias de 21 Mpa y 14 Mpa (G) respectivamente
ANCHO	6 m
ALCANTARILLA	Una (1) alcantarilla de 6 ml y 0.90m de diámetro interior

Tabla 2. Características Técnicas del Convenio Solidario N° 4817 DE 2023

CONVENIO SOLIDARIO No. 4817 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNIDAD DE TARIDÓ	
USO	Vía en operación, demanda intervenciones de conservación para su optimización
LONGITUD	90 ml
PLACA HUELLA	En Concreto Reforzado y Concreto Ciclópeo, espesor de 20 cm y de resistencias de 21 Mpa y 14 Mpa (G) respectivamente
ANCHO	6 m
ALCANTARILLA	Dos (2) alcantarillas de 6 ml y 0.90m de diámetro interior
	Limpieza de alcantarillas, cinco (5) und

Tabla 3. Características Técnicas del Convenio Solidario N° 4742 DE 2023

CONVENIO SOLIDARIO No. 4742 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MUNICIPIO PIE DE PATÓ	
USO	Vía en operación, demanda intervenciones de conservación para su optimización
LONGITUD	59 ml
PLACA HUELLA	En Concreto Reforzado y Concreto Ciclópeo, espesor de 20 cm y de resistencias de 21 Mpa y 14 Mpa (G) respectivamente
ANCHO	6 m
ALCANTARILLA	Dos (2) alcantarillas de 6 ml y 0.90m de diámetro interior

3. CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1. ANTECEDENTES

"Caminos Comunitarios de la Paz Total" es el programa a través del cual, el Gobierno del Cambio, lleva a cabo proyectos de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, en 33.102 kilómetros de caminos vecinales, ancestrales y vías regionales, con el propósito de alcanzar una mejor comunicación del campo colombiano. Caminos cuenta con recursos totales por $ 8 billones.

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías, trabajando de la mano con las comunidades en la inversión de recursos para el mejoramiento de las carreteras rurales, en el departamento de Chocó, el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, ha suscrito 19 convenios con igual número de Organismos de Acción Comunal.

Con una inversión de $ 4.339 millones, se tiene proyectado garantizar la transitabilidad de 48 kilómetros de vías veredales, proporcionando una movilidad segura, eficiente y permitiendo que los más de 5.700 beneficiarios puedan acceder a los servicios básicos de salud, educación, programas sociales, facilitando también el transporte de los productos agropecuarios de la región, además de la generación de más de 700 empleos locales.

Los convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y los organismos de acción comunal que son competencia de la presente interventoría se enlistan seguidamente.

Tabla 4. Convenios solidarios suscritos

CONVENIO SOLIDARIO No. 4196 DE 2023	JAC PUERTO PERVEL
	R.L. JOSE HERNAN PALACIO PALACIO
	ORDEN DE INICIO 01 DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO No. 4817 DE 2023	JAC TARIDÓ
	R.L. TARCILLO TELLO PALACIOS
	ORDEN DE INICIO 29 DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO No. 4742 DE 2023	JAC PIE DE PATÓ
	HENRY JAVIER PALACIOS MOSQUERA
	ORDEN DE INICIO 20 DICIEMBRE DE 2023

3.2. INFORMACION GENERAL CONVENIOS SOLIDARIOS

Se detalla en las siguientes tablas la información general respectiva a los convenios solidarios en cuestión.

Tabla 5. Información general Convenio 4196 de 2023

NÚMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.5511433
NÚMERO DEL CONTRATO	4196-2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL, DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL
	NIT 901.663.886-1.
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ
	NIT. 800.215.807-2
VALOR INICIAL	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS ($195.117.034) MONEDA CORRIENTE
ADICIONES	N/A
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS ($195.117.034) MONEDA CORRIENTE
MODIFICACIONES	PRORROGADO HASTA EL 30 ABRIL DE 2024
SUSPENSIONES	N/A
CESIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUAL	N/A
FECHA DE INICIO	05/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/04/2024
DIRECCIÓN	PUERTO PERVEL – CANTÓN DEL SAN PABLO

Tabla 6. Información general Convenio 4817 de 2023

NÚMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.5621974
NÚMERO DEL CONTRATO	4817-2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE TARIDO DEL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE TARIDO
	NIT 901.744.510-6
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ
	NIT. 800.215.807-2
VALOR INICIAL	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($195.120.846,00)
ADICIONES	N/A
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($195.120.846,00)
MODIFICACIONES	PRORROGADO HASTA EL 30 ABRIL DE 2024
SUSPENSIÓN N°1	DESDE 29/12/2023 HASTA 14/01/2024
AMPLIACIÓN N°1 SUSPENSIÓN N°1	DESDE 16/01/2024 HASTA 29/01/2024
FECHA REANUDACIÓN ACTUAL	30/01/2024
CESIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUAL	N/A
FECHA DE INICIO	29/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/04/2023
DIRECCIÓN	TARIDO – CANTÓN DEL SAN PABLO

Tabla 7. Información general Convenio 4742 de 2023

NÚMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.5608280
NÚMERO DEL CONTRATO	4742-2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PIE DE PATO DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL PIE DE PATO.
	NIT. 900.694.675-3
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ
	NIT. 800.215.807-2
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS UN MILLONES OCHENTA MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($201.080.073,00).
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	DOSCIENTOS UN MILLONES OCHENTA MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($201.080.073,00).
FECHA DE INICIO	20/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023
DIRECCIÓN	PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL - ALTO BAUDÓ -

3.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONVENIOS SOLIDARIOS

La información financiera hasta la fecha de corte del presente informe, de los convenios suscritos entre el INVIAS y las Juntas de Acción Comunal relacionadas, se describen en la siguiente tabla.

Tabla 8. Información Financiera Convenios Solidarios

CONVENIO	VALOR DESEMBOLSO #1
4196 DE 2023	$50.000.000,00
4817 DE 2023	N/A
4742 DE 2023	N/A

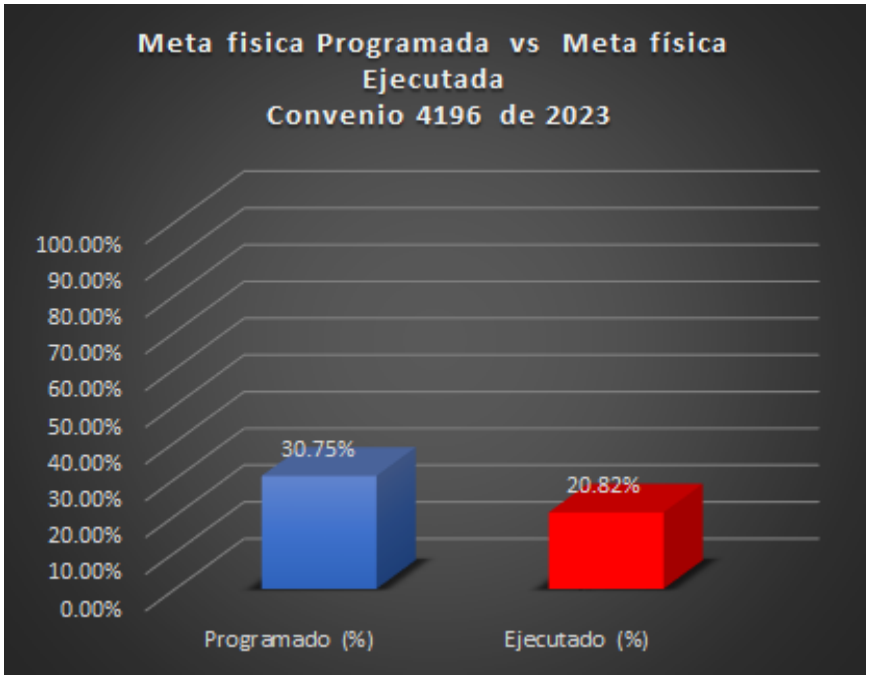
3.4. RESUMEN ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS EN EL MES.

En la presente fecha de corte solo se han iniciado las actividades en obra del convenio **4196 DE 2023 JAC PUERTO PERVEL**; por lo tanto, se muestra a continuación el resumen de obras programadas vs ejecutadas solo para este convenio.

Tabla 9. Actividades contratadas vs Actividades ejecutadas (Convenio 4196 de 2023)

CONDICIONES CONTRACTUALES CONVENIO 4196 DE 2023						CANTIDADES EJECUTADAS		
No	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**%**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	2.14	$ 33,502.00	$ 71,694.00	2.14	$ 71,694.28	0.05%
2	Subbase Granular Clase C	M3	109.39	$ 125,863.00	$ 13,768,154.00	109.39	$ 13,768,153.57	9.40%
3	Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	84.02	$ 746,558.00	$ 62,725,803.00		$ -	0.00%
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	58.26	$ 342,436.00	$ 19,950,321.00		$ -	0.00%
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3,106.64	$ 8,593.00	$ 26,695,358.00		$ -	0.00%
				SUB-TOTAL PLACA HUELLA	**$ 123,211,330.00**		**$ 13,839,847.85**	**9.45%**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA								
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.50	$ 33,502.00	$ 1,557,843.00	46.50	$ 1,557,843.00	1.06%
7	Excavaciones en roca en seco	M3	8.20	$ 76,979.00	$ 631,228.00	8.20	$ 631,227.80	0.43%
8	Demolición de Estructuras	M3	7.16	$ 232,220.00	$ 1,662,695.00	7.16	$ 1,662,695.20	1.14%
9	Concreto reforzada resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.50	$ 553,029.00	$ 276,515.00	0.50	$ 276,514.50	0.19%
10	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9.60	$ 746,558.00	$ 7,166,957.00	4.13	$ 3,083,284.54	2.11%
11	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.90	$ 8,593.00	$ 4,974,488.00	289.45	$ 2,487,243.85	1.70%
12	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.40	$ 55,910.00	$ 1,420,114.00	25.40	$ 1,420,114.00	0.97%
13	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6.00	$ 810,534.00	$ 4,863,204.00	6.00	$ 4,863,204.00	3.32%
14	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	30.00	$ 21,976.00	$ 659,280.00	30.00	$ 659,280.00	0.45%
				SUB-TOTAL ALCANTARILLA	**$ 23,212,324.00**		**$ 16,641,406.89**	**11.37%**
				SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 146,423,654.00**		**$ 30,481,254.74**	**20.82%**

Ilustración 3. Avance ejecutado vs programado convenio 4196 de 2023



ANÁLISIS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

- En la gráfica anterior se representa con color Azul el valor programado y en color Rojo el valor ejecutado.
- El porcentaje ejecutado acumulado está por debajo del programado con un valor porcentual del 9.93%.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Informe semanal

En aras de cumplir las condiciones contractuales, se adjunta Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-**3 diligenciado; donde, la interventoría deja constancia de los informes semanales correspondientes al presente mes, como medida de seguimiento periódico realizado por la empresa interventora (CISA SERVISIOS S.A.S), al cumplimiento de la ejecución del contrato de obra. Ver anexo 1

4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

El registro diario de maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras se evidencia en formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4** debidamente tramitado. Ver anexo 2

4.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

En cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones, se deja constancia en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-6**; en el cual se verifica el personal dispuesto en la obra. Ver anexo 3

4.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra

La Información financiera y presupuestal del contrato de obra se presenta en formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-8**. Ver anexo 4

4.5. Estado general del tiempo

En el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-10** adjunto, se detalla el registro diario del estado general del tiempo. Ver anexo 5

4.6. Resumen ensayos de Laboratorio

Se adjunta el resumen de ensayos de laboratorio en el formato respectivo. Ver anexo 6

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Se realiza el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra en Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-12.** Ver anexo 7

4.8. Seguimiento Programa de Obra

En el Anexo 8 se remite copia del seguimiento a los programas de obra

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales de los municipios de ALTO BAUDÓ Y EL CANTÓN DEL SAN PABLO, del Departamento del Chocó, cuyos objetos buscan el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del Programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total”; para lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Ante este imperativo legal, la entidad realizó el proceso de selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría mediante la plataforma Secop II, donde se evaluaron las diferentes ofertas de los proponentes para el proceso de selección de mínima cuantía No **N° P-DT-CHO-016-2023;** cuyo objeto, ***"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO BAUDÓ Y EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.***

Después de llevar a cabo el proceso de evaluación de los criterios de elegibilidad y de las propuestas económicas, el INVIAS otorgó el contrato al licitante que presentó la propuesta más favorable. Ahora, dicho licitante actúa como contratista INTERVENTOR para la ejecución de la obra pública – convenios solidarios, identificado con el número de seguimiento **4699 DE 2023**. Este contrato fue concedido a la persona jurídica **CISA SERVICIOS S.A.S** identificada con Número de Identificación Tributaria (NIT) 900792044-6.

El contrato **N° 4699 DE 2023** fue formalizado en la plataforma SECOP II mediante la aceptación de la propuesta el 28 de noviembre de 2023. Se detalla en la siguiente tabla la información respectiva al contrato de interventoría.

Tabla 10. Información general del contrato de interventoría

NÚMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.5600808
NÚMERO DEL CONTRATO	4699 DE 2023
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO BAUDÓ Y EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA	CISA SERVICIOS S.A.S.
NIT	900792044-6
VALOR INICIAL	NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M. CTE ($92.308.620,00)
ADICIONES	N/A
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M. CTE ($92.308.620,00)
MODIFICACIONES	N/A
ACLARACIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A
CESIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUAL	N/A
PLAZO INICIAL	3 meses
FECHA DE INICIO	05/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	15/03/2024
DIRECCIÓN	Carrera 27 No. 24 – 142 (QUIBDÓ CHOCO)

5.1. Descripción de las actividades y acciones realizadas por el Interventor

Se describe a continuación el desarrollo del plan de calidad del Interventor, el cual se ha adelantado con los procedimientos respectivos para las actividades en las que se trabajó durante este periodo y se aborda particularmente desde cada uno de los aspectos incluidos en el presente contrato de interventoría.

Tabla 11. Acciones del interventor

ASPECTOS TÉCNICOS	
Contrato No. 4699 de 2023	• Seguimiento de obra – bitácora de obra. • Verificación del personal disponible en obra. • Verificación de calidad de fuentes de materiales. • Verificación de maquinarias y equipos del contratista para la ejecución de la obra.

	• Revisión y aprobación de cronograma de obra establecido como ruta de trabajo para la ejecución de las actividades del contrato. • Seguimiento, registro y control del estado del tiempo.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	
Contrato No. 4699 de 2023	• Trazabilidad correspondencia con contratista, contratante y otros. • Definición del alcance del contrato a través de la ficha técnica. • Elaboración, revisión y entrega del informe mensual de avance No. 1 y de las semanas contenidas en el periodo. • Elaboración de las correspondientes actas. • Verificación de afiliación y pago de la seguridad social de los trabajadores del contratista. • Seguimiento a seguros y garantías, que se encuentren vigentes y acorde a las fechas del contrato. • Revisión del contrato y documentación legal. • Supervisar el cumplimiento de obligaciones contractuales • Proteger la confidencialidad de la información sensible y datos personales.
ASPECTOS AMBIENTALES	
Contrato No. 4699 de 2023	• Solicitar y hacer seguimiento al plan de gestión socio ambiental contemplado por el contratista de obra. • Seguimiento al uso y porte de los EPP. • Control y manejo de residuos sólidos y líquidos, orden y aseo. • Control y manejo del recurso hídrico y compensaciones.
ASPECTOS FINANCIEROS	
Contrato No. 4699 de 2023	• Revisar la ejecución presupuestal. • Seguimiento a la inversión del Anticipo • Seguimiento Programa de Inversiones

Tabla 12. Actividades desarrolladas en el mes por la interventoría en convenio 4196-2023

CONVENIO SOLIDARIO No. 4196 DE 2023		
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA (JAC PUERTO PERVEL)	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**
• Control topográfico • Excavaciones varias sin Clasificar • Subbase granular clase C • Concreto reforzado de 21mpa y 14mpa • Acero de refuerzo fy (6000si) • Excavaciones en roca en seco • Demolición de Estructuras • Relleno para Estructuras con Suelo • Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior • Relleno para Estructuras con material producto de la excavación • Alcantarilla	• Especificaciones de normas de la cartilla del invias para cada una de las actividades. • Pre-actas. • Registro Fotográfico.	Se lleva a cabo en colaboración con el contratista. Las cantidades de trabajos realizados se registran en la pre-acta y las actividades cotidianas en la bitácora. Se adecua a los requisitos de la especificación y todas las normativas legales en vigor.

Tabla 13. Actividades desarrolladas en el mes por la interventoría en convenio 4817-2023

CONVENIO SOLIDARIO No. 4817 DE 2023		
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA (JAC TARIDÓ)	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**
En el periodo no se realizaron actividades en obra porque el convenio 4817 de 2023 se encuentra suspendido.	ACTA DE SUSPENSIÓN	El convenio se encuentra suspendido debido a retrasos en el giro del desembolso por parte del INVIAS.

Tabla 14.Actividades desarrolladas en el mes por la interventoría en convenio 4742-2023

CONVENIO SOLIDARIO No. 4742 DE 2023		
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA (JAC PIE DE PATÓ)	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**
En el periodo no se realizaron actividades en obra porque el convenio 4742 de 2023 se encuentra suspendido.	ACTA DE SUSPENSIÓN	El convenio se encuentra suspendido debido a retrasos en el giro del desembolso por parte del INVIAS.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

El registro de los equipos y vehículos requeridos por la interventoría se evidencia en formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-5** en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el Manual de Interventoría vigente. Ver anexo 9

6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

Para efectos de seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato y cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica presentada por la interventoría, en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-7** se adjunta la relación del pago de los aportes legales y seguridad social efectuados por la interventoría. Ver anexo 10.

6.3. Información financiera y presupuestal Contrato de Interventoría

El control financiero, presupuestal y las acciones que conllevan de forma proactiva a la ejecución del contrato se incluyen en formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9.** Ver anexo 11.

6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría

El seguimiento a las garantías del contrato de interventoría de anexa en formato. **MEPI-MN1-IN-15-FR-13.** Ver anexo 12.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las labores de seguimiento y supervisión de los convenios suscritos durante este lapso posibilitan inferir lo siguiente:

- **Convenio 4196 de 2023**, el presente periodo que comprende (enero de 2024) se programó el 30.75% y las actividades ejecutadas por el contratista de obra acumulan un valor porcentual del 20.82%; siendo así, se en este mes se presenta un retraso de 9.93% al comparar la meta programada con la ejecutada. Con el objetivo de subsanar las deficiencias y retrasos presentados en periodo actual, la interventoría

recomienda a la JAC adoptar las medidas respectivas que garanticen el avance oportuno de las actividades. Con base a lo anterior, la interventoría se compromete a exigir el cumplimiento de todas las obligaciones de orden técnico, administrativo, ambiental, financieras y demás previstas en el pliego de condiciones; así como a inspeccionar y hacer labores de seguimiento integral al avance de los procesos constructivos

- **Convenio 4817 de 2023,** se espera que para el próximo periodo el INVIAS realice giro para tramitar el desembolso entre la interventoría en conjunto con la JAC de TARIDÓ y así poder iniciar oportunamente las actividades en obra.

- **Convenio 4742 de 2023,** se espera que para el próximo periodo el INVIAS realice giro para tramitar el desembolso entre la interventoría en conjunto con la JAC de PIE DE PATÓ y así poder iniciar oportunamente las actividades en obra.

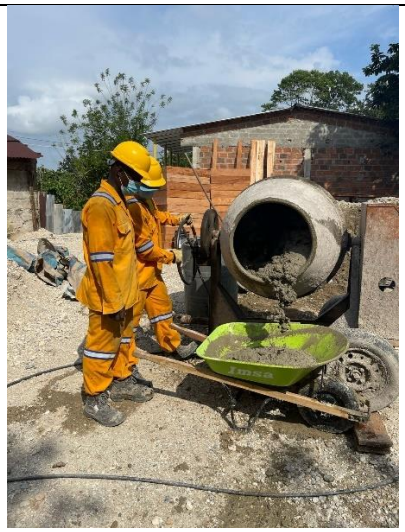
CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
REP. LEGAL DE CISA SERVICIOS SAS

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **CONVENIO SOLIDARIO No. 4196 DE 2023**

	
Actividades de campo	Actividades de campo
	
Actividades de campo	Actividades de campo

	
Actividades de campo	Actividades de campo
	
Actividades de campo	Actividades de campo

	
Actividades de campo	Actividades de campo
	
Actividades de campo	Actividades de campo

9. ANEXOS

ANEXO 1. INFORMES SEMANALES

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	22	1	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4196 de 2023		
SEMANA NUMERO	1	DEL 17 de enero de 2024	AL	20 de enero de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	50	dias			
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA				

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL, DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	10.25%	10.25%
Valor total de la Obra	$19,999,495.99	$ 19,999,495.99

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	12.24%	12.24%
Valor total de la	$ 23,882,325.0	$ 23,882,325.0

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL	**Interventor:**	CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
Convenio No.	4196 de 2023	Contrato No.	4699 de 2023
Valor Inicial:	$ 195,117,034.00	Valor Inicial:	92,308,620.00
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	1 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	30 de abril de 2024	Prorroga:	15 de marzo de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	30 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	15 de marzo de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SUBBASE GRABULAR CLASE C:

ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

maquinaria pesada y un conductor.

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1), Cortadora de**

Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):

Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)

CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)

ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)

RELLENO SUB-BASE GRANULAR CLASE C

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Un (1) Cortadora de hierro	Un (1) Conductor de volqueta
Una (1) Guia cortadora de madera	Siete (7) Ayudantes de obra
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	
Herramienta menor	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4196 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Puerto Pervel mejorar los rendimientos de la ejecucion de las obras para poder garantizar el avance integral del proyecto aumentando porcentajes de ejecucion programados.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria le notifica a la junta de accion comunal de Puerto Pervel convenio N° 4196 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	Cristiam Alborñoz Barrios **DIRECTOR INTERVENTORIA : CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS** **MP - 05202-124561 ANT**
Del orden técnico no se han presentado observaciones de gran magnitud, solo de carácter de control para que se conserve la calidad del proceso.	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Figura 1. Estado inicial de la vía y medición del sector a intervenir, (desde PR 00+000 hasta PR 00+110)



Figura 2. Labores ejecutadas por la comisión topográfica de Localización y replanteo en el tramo a intervenir, (desde PR 00+000 hasta PR 00+110)



Figura 3. Actividades de desmonte (corte) y terraplén (lleno) sección a media ladera, (desde PR 00+000 hasta PR 00+025)



Figura 4. Suministro e instalación Subbase Granular Clase C (desde PR 00+000 hasta PR 00+035)



Figura 5. Construcción obra de arte (Alcantarilla tipo II) de 6.00m de longitud localizada en el PR 00+050



Figura 6. Relleno para estructura (alcantarilla tipo II) con material granular (desde PR 00+030 hasta PR 00+045)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			FECHA	29	1	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO			CONVENIO No:	4196 de 2023		
SEMANA NUMERO	2	DEL	21 de enero de 2024	AL	27 de enero de 2024		
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	57	dias					
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA						

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL, DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	10.25%	20.50%	Obra Física	4.73%	16.96%
Valor total de la Obra	$19,999,495.99	$ 39,998,991.97	Valor total de la	$ 9,229,035.7	$ 33,091,849.0

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL	**Interventor:**	CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
Convenio No.	4196 de 2023	Contrato No.	4699 de 2023
Valor Inicial:	$ 195,117,034.00	Valor Inicial:	92,308,620.00
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	1 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	30 de abril de 2024	Prorroga:	15 de marzo de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	30 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	15 de marzo de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SUBBASE GRABULAR CLASE C:

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):

ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

maquinaria pesada y un conductor.

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1), Cortadora de**

Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):

Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)

CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)

ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)

RELLENO SUB-BASE GRANULAR CLASE C

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Un (1) Cortadora de hierro	Un (1) Conductor de volqueta
Una (1) Guia cortadora de madera	Siete (7) Ayudantes de obra
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	
Herramienta menor	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4196 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Puerto Pervel mejorar los rendimientos de la ejecucion de las obras para poder garantizar el avance integral del proyecto aumentando porcentajes de ejecucion programados.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria le notifica a la junta de accion comunal de Puerto Pervel convenio N° 4196 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	Cristiam Alborñoz Barrios **DIRECTOR INTERVENTORIA : CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS** **MP - 05202-124561 ANT**
Del orden técnico no se han presentado observaciones de gran magnitud, solo de carácter de control para que se conserve la calidad del proceso.	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Figura 1. Excavaciones tramo 2 (K00+050 – K00+110)



Figura 2. Excavaciones tramo 2 (K00+050 – K00+110)



Figura 3. Instalación Subbase Granular Clase C (desde PR 00+050 hasta PR 00+110)



Figura 4. Descargue de material granular (Agregados pétreos) para concreto hidráulico en zona de acopio



Figura 5. Descargue de material granular (Rajones) para concreto ciclópeo en zona de acopio



Figura 6. Elaboración formaletas de madera

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				FECHA	31	1	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO				CONVENIO No:	4196 de 2023		
SEMANA NUMERO	3		DEL	28 de enero de 2024	AL	3 de febrero de 2024		
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:		64	dias					
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA							

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL, DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	10.25%	30.75%	Obra Física	3.35%	20.82%
Valor total de la Obra	$19,999,495.99	$ 59,998,487.96	Valor total de la	$ 6,536,420.6	$ 40,623,366.5

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL	**Interventor:**	CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
Convenio No.	4196 de 2023	Contrato No.	4699 de 2023
Valor Inicial:	$ 195,117,034.00	Valor Inicial:	92,308,620.00
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	1 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	30 de abril de 2024	Prorroga:	15 de marzo de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	30 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	15 de marzo de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SUBBASE GRABULAR CLASE C:

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):

ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

maquinaria pesada y un conductor.

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1), Cortadora de**

Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):

Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)

CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)

ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)

RELLENO SUB-BASE GRANULAR CLASE C

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Un (1) Cortadora de hierro	Un (1) Conductor de volqueta
Una (1) Guia cortadora de madera	Siete (7) Ayudantes de obra
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	
Herramienta menor	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4196 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Puerto Pervel mejorar los rendimientos de la ejecucion de las obras para poder garantizar el avance integral del proyecto aumentando porcentajes de ejecucion programados.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria le notifica a la junta de accion comunal de Puerto Pervel convenio N° 4196 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	Cristiam Alborñoz Barrios **DIRECTOR INTERVENTORIA : CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS** **MP - 05202-124561 ANT**
Del orden técnico no se han presentado observaciones de gran magnitud, solo de carácter de control para que se conserve la calidad del proceso.	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Figura 1. Preparación concreto de 14 Mpa para solado sección descole alcantarilla PR 00+040



Figura 2. Concreto de limpieza (solado) sección descole alcantarilla PR 00+040



Figura 3. Instalación de acero alcantarilla sección descole PR 00+040



Figura 4. Fundición placa descole alcantarilla PR 00+040



Figura 5. Figurado de acero alcantarilla sección encole PR 00+040



Figura 6. Elaboración formaletas de madera para muro y aletas alcantarilla PR 00+040

ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: INVIAS - CHOCÓ

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-24

PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL, DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO No. 4196 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4699 DE 2023

INTERVENTORÍA: CISA SERVICIOS S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES - ENERO DE 2024																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
PULIDORA	Dewalt	1200 W	K0+035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	I	-	I	A	A
CORTADORA MANUAL DE ACERO	Dewalt	2300 w.	K0+035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	I	-	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	potencia 153 HP	K0+035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	I	-	I	I	I
RANA COMPACTADORA	MAQUISTORE	360 Kg	K0+035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	I	-	I	I	I
MEZCLADORA MANUAL	MASTER	2 bultos	K0+035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	I	A	I
VOLQUETA # 1	CHEVROLET	7 m3	K0+035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	I	I	I
VOLQUETA # 2	CATERPILLAR	5 m3	K0+035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	I	I	I
RETROEXCAVADORA	NEW HOLLAND	1 m3	K0+035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	-	8	8	8	8	8	8	-	8	8	8
TOTAL ACTIVO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	4	-	0	2	1
TOTAL EN REPARACIÓN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
TOTAL INACTIVO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	4	-	8	6	8

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3.3	41.35%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0.0	0.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	4.8	59.62%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: En el presente periodo se cuenta con el 100% de disponibilidad de las maquinas y equipos mínimos requeridos para adelantar las actividades en obra. Las maquinas y equipos inactivos, se encuentran en óptimas condiciones para ser utilizadas en el momento que las actividades programadas las requieran.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma: Neider Palacios Palacios
Neider Palacios Palacios
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 011037-0533930 ANT

Firma
Mario Andres Cujar Arriaga
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202134846 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 3. SEGURIDAD SOCIAL OBRA

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901663886	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PUERTO PERVEL	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE	juntacomunalpuertopervel@gmail.com	EL CANTON DEL SAN PABLO-CHOCO	3123653979

Clave: 9463023811

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/02/19	0	$0	$2,079,000
2024/02/20	0	$0	$2,079,000
2024/02/21	1	$2,300	$2,081,300
2024/02/22	2	$4,100	$2,083,100
2024/02/23	3	$6,100	$2,085,100
2024/02/26	6	$11,600	$2,090,600
2024/02/27	7	$13,500	$2,092,500
2024/02/28	8	$15,200	$2,094,200
2024/02/29	9	$17,300	$2,096,300

Periodo Pensión: 2024-01 **Periodo Salud: 2024-02**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	9	$873,900
COLPENSIONES		4	$388,400
PORVENIR		2	$194,200
PROTECCION		3	$291,300
ARL	1	9	$28,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		9	$28,800
CCF	1	9	$218,700
COMFACHOCÓ		9	$218,700
EPS	3	9	$683,100
COMFACHOCÓ		2	$151,800
NUEVA E.P.S.		6	$455,400
NUEVA EPS MOVILIDAD		1	$75,900
ICBF	1	9	$164,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		9	$164,700
SENA	1	9	$109,800
SENA		9	$109,800
SUBTOTAL			$2,079,000
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$2,079,000

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901663886	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PUERTO PERVEL	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE	puerto pervel	EL CANTON DEL SAN PABLO-CHOCO	1236548	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02		9463023811	E	2024/02/20			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEDE (9 Afiliados)																								**$5,460,003**	**$873,900**			**$5,460,003**	**$683,100**			**$5,460,003**	**$218,700**			**$5,460,003**		**$28,800**		**$5,460,003**	**$274,500**		**$2,079,000**
Centro de Trabajo: SEDE (9 Afiliados)																								**$5,460,003**	**$873,900**			**$5,460,003**	**$683,100**			**$5,460,003**	**$218,700**			**$5,460,003**		**$28,800**		**$5,460,003**	**$274,500**		**$2,079,000**
Ciudad: EL CANTON DEL SAN PABLO Depto: CHOCO (9 Afiliados)																								**$5,460,003**	**$873,900**			**$5,460,003**	**$683,100**			**$5,460,003**	**$218,700**			**$5,460,003**		**$28,800**		**$5,460,003**	**$274,500**		**$2,079,000**
1	CC	4846657	HURTADO WALTER	X																		25-14	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$75,900	CCF29	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	0.522%	$3,200	14	$606,667	$30,500	No	$231,000
2	CC	1022950819	MORENO MARISOL	X																		230201	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$75,900	CCF29	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	0.522%	$3,200	14	$606,667	$30,500	No	$231,000
3	CC	1148451605	MOSQUERA JOBER	X																		25-14	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$75,900	CCF29	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	0.522%	$3,200	14	$606,667	$30,500	No	$231,000
4	CC	1149434909	MOSQUERA JOSE	X																		230301	14	$606,667	$97,100	CCFC20	14	$606,667	$75,900	CCF29	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	0.522%	$3,200	14	$606,667	$30,500	No	$231,000
5	CC	11635009	OREJUELA REINALDO	X																		230201	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$75,900	CCF29	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	0.522%	$3,200	14	$606,667	$30,500	No	$231,000
6	CC	1129044574	PALACIOS ALEX	X																		230301	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$75,900	CCF29	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	0.522%	$3,200	14	$606,667	$30,500	No	$231,000
7	CC	1193239739	PALACIOS CRISTIAN	X																		25-14	14	$606,667	$97,100	CCFC20	14	$606,667	$75,900	CCF29	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	0.522%	$3,200	14	$606,667	$30,500	No	$231,000
8	CC	1078858047	PALACIOS NEIDER	X																		25-14	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$75,900	CCF29	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	0.522%	$3,200	14	$606,667	$30,500	No	$231,000
9	CC	70128463	PALACIOS REGULO	X																		230201	14	$606,667	$97,100	EPS041	14	$606,667	$75,900	CCF29	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	0.522%	$3,200	14	$606,667	$30,500	No	$231,000
Total			**Afiliados(9)**																					$5,460,003	$873,900			$5,460,003	$683,100			$5,460,003	$218,700			$5,460,003		$28,800		$5,460,003	$274,500		$2,079,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901663886	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PUERTO PERVEL	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE	puerto pervel	EL CANTON DEL SAN PABLO-CHOCO	1236548	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02		9463023811	E	2024/02/20			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$873,900	$0	$0	$873,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$388,400	$0	$0	$388,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$194,200	$0	$0	$194,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$291,300	$0	$0	$291,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$28,800	$0	$0	$28,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$28,800	$0	$0	$28,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$218,700	$0	$0	$218,700
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	9	$218,700	$0	$0	$218,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$683,100	$0	$0	$683,100
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	2	$151,800	$0	$0	$151,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$455,400	$0	$0	$455,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$75,900	$0	$0	$75,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$164,700	$0	$0	$164,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$164,700	$0	$0	$164,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$109,800	$0	$0	$109,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				**9**	**$2,079,000**	**$0**	**$0**	**$2,079,000**

ANEXO 4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: INVIAS - CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4196 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL

MES INFORME MENSUAL: ENERO

PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL, DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4699 DE 2023

INTERVENTOR: CISA SERVICIOS S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1235523	Caminos Comunitarios de la Paz Total	10	Presupuesto General de la Nación .- PGN	4691 DE 2023	$ 194,117,034.00	
				Otros Recursos	4691 DE 2023	$ 1,000,000	
TOTAL						$ 195,117,034	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 195,117,034.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA: Entendiendo que las condiciones de facturación y pago es bajo la modalidad abono en cuenta, la configuración financiera no contempla paago de anticipos; sin embargo, bajo previo plan de inversiones presentado a la interventoría por parte de la JAC, se suministran porcentualmente los recursos a través de la cuenta bancaria **No. 530111764 (cuenta corriente de naturaleza conjunta banco AV VILLAS)**

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
Nombre: **CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-124561 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** INVÍAS - CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4196 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-24 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL, DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4699 DE 2023 **INTERVENTOR:** CISA SERVICIOS S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES - ENERO 2024**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	16	10	13	20	18	24	24	24	12	14	24	24	24	24	295
Lluvias moderadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	8	6	4	6	0	0	0	4	6	0	0	0	0	37
Lluvias intensas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	6	5	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	0	28
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Neider Palacios Palacios
Neider Palacios Palacios
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 011037-0533930 ANT

Firma
Mario Andres Cujar Arriaga
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202134846 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** INVÍAS - CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No.: 4196 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-24 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL, DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4699 DE 2023 **INTERVENTOR:** CISA SERVICIOS S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	12/01/2024	Diseño de Mezclas 14 Mpa	NTC 673	LABORATORIO	4	100%	16.49 Mpa	SI	
2	12/01/2021	Diseño de Mezclas 21 Mpa	NTC 673	LABORATORIO	4	100%	21.85 Mpa	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Las pruebas de laboratorio han cumplido a cabalidad con los requerimientos mínimos.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-124561 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5	2	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** INVÍAS - CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No. 4196 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERVEL

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL, DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

FECHA DE INICIO: 1/12/2023

PLAZO INICIAL: 03 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 195,117,034.00

VALOR ACUMULADO: $ 195,117,034.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4699 de 2023 **INTERVENTOR:** CISA SERVICIOS S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20.00%	$ 39,023,407.00	2	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	50.00%	$ 9,755,852.00	2	11	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.00%	$ 58,535,111.00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291692

Certificado de modificación o anexo No.: 71784430
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00%	$ 232,000,000.00	2	11	2023	31	12	2023
PATRONAL	10.00%	$ 232,000,000.00	2	11	2023	31	12	2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00%	$ 232,000,000.00	2	11	2023	31	12	2023
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00%	$ 232,000,000.00	2	11	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071673 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 71784431
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5 (Día)	2 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS

Nombre: **CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-124561 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8. PROGRAMA DE OBRA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

OBJETO : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERVEL

INTERVENTOR : CISA SERVICIOS SAS

CAP	DESCRIPCIÓN	VALOR ACTIVIDAD	DURACIÓN ACTIVIDAD MES	VALOR ACTIVIDAD POR MES	MES 1				MES 2				MES 3				TOTAL
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	PRELIMINARES																
1	*Excavaciones varias sin Clasificar*	$ 71.694,00	1	$ 71.694,00													
2	*Subbase Granular Clase C*	$ 13.768.154,00	1	$ 13.768.154,00													
3	*Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ*	$ 62.725.803,00	3	$ 20.908.601,00													
4	*Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)*	$ 19.950.321,00	3	$ 6.650.107,00													
5	*Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)*	$ 26.695.358,00	3	$ 8.898.452,67													
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																
6	*Excavaciones Varias sin Clasificar*	$ 1.557.843,00	2	$ 778.921,50													
7	*Excavaciones en roca en seco*	$ 631.228,00	1	$ 631.228,00													
8	*Demolición de Estructuras*	$ 1.662.695,00	1	$ 1.662.695,00													
9	*Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ*	$ 276.515,00	3	$ 92.171,67													
10	*Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ*	$ 7.166.957,00	3	$ 2.388.985,67													
11	*Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa*	$ 4.974.488,00	3	$ 1.658.162,67													
12	*Relleno para Estructuras con Suelo*	$ 1.420.114,00	1	$ 1.420.114,00													
13	*Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior*	$ 4.863.204,00	1	$ 4.863.204,00													
14	*Relleno para Estructuras con material producto de la excavación*	$ 659.280,00	1	$ 659.280,00													
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.392.710,00	3	$ 1.464.236,67													
	APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERVEL	$ 1.000.000,00	3	$ 333.333,33													
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.300.670,00	3	$ 14.433.556,67													
	TOTAL	**$ 195.117.034,00**															
	TOTAL PROYECTO	**$ 195.117.034,00**															

Programado					**$**			**80.682.897,83**	**$**			**57.606.528,83**	**$**			**56.827.607,33**	**$ 195.117.034,00**
Acumulado					**$**			**80.682.897,83**	**$**			**138.289.426,67**	**$**			**195.117.034,00**	
% Programado							**41%**				**29,52%**				**29,12%**		
% Programado Acumulado							**41%**				**70,88%**				**100,00%**		

Atentamente,

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERVEL
JOSE HERNAN PALACIO PALACIO
Contratista de Obra

ANEXO 9. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA (05/02/2024)
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** INVIAS - CHOCÓ

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-24 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL, DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4699 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** CISA SERVICIOS S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 4196 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES - ENERO DE 2024																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Alquiler Vehículo (camioneta)	Modelo: 2018 Cilidraje: 2755 cc, Marca: Toyota, Placa:EIK847	I	I	I	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
Alquiler Motocicletas	Modelo: 2018 Cilidraje:155 cc, Marca: Yamaha, Placa:QTI41E	I	I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
Trabajo de topografia	Incluye personal, equipo y transporte	I	I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
Ensayos de laboratorios.	Equipo densidad en campo y formaletas para pruebas de resistencia a compresión del concreto	I	I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
Oficina/Campamento	incluye dotación y servicios públicos	I	I	I	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA (05/02/2024)
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma Cristiam Alborñoz Barrios
CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-124561 ANT

Firma
JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 5202181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 10. SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-20, 08:35:33 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1059864569

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

PAGADO 20/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CISA SERVICIOS SAS	**Nombre Sucursal**	OBRA	**Código Sucursal**	004
Documento	NI900792044	**Dirección**	CL 27 #2 - 21		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6723633		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	QUIBDO	**Departamento**	CHOCO		
Representante Legal	ALBORNOS BARRIOS CRISTIAN	**Identificación**	CC 11810046		
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11810046	CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF29) COMFACHOCO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 11937183	DAGNER ALETH MOSQUERA LOZANO	01	00		X															0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.671.667	$ 267.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.671.667	$ 66.900	6,960	$ 1.671.667	$ 116.400	(CCF29) COMFACHOCO	$ 1.671.667	$ 66.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.700
CC 35851835	INDIRA IVONNE HOYOS PALACIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF29) COMFACHOCO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 80022967	MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF29) COMFACHOCO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.171.667	$ 8.171.667	$ 8.171.667	$ 8.171.667	$ 1.307.500	$ 326.900	$ 568.800	$ 326.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.530.100	$ 0	$ 2.530.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 11. INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: INVIAS - CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4699 DE 2023

INTERVENTOR: CISA SERVICIOS S.A.S

MES INFORME MENSUAL: ene-24

PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL, DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO DE OBRA No: 4196 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1319723	Caminos comunitarios para la paz total	10	Presupuesto General de la Nación - PGN	Contrato Principal No. 4699 de 2023	$ 92,308,620.00	
TOTAL						$ 92,308,620.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 92,308,620.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	No. de Registro y fecha		Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones		
							Registro Presupuestal No.	Saldo						
							RP No. 1319723 de 2023-11-30	$ 90,308,620.00						
							RP No. 1319723 de 2023-11-30	$ 2,000,000.00		$ 92,308,620.00				
1	**dic-23**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ 92,308,620.00**	**$ -**	**$ 92,308,620.00**				
2	**ene-24**	$ 22,920,000	$ 4,354,800	**$ 27,274,800**				$ 65,033,820	$ 27,274,800	**$ 65,033,820.00**				
TOTALES		**$ 22,920,000**	**$ 4,354,800**	**$ 27,274,800**				**$ 65,033,820**	**$ 27,274,800**	**$ 65,033,820**				

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

4

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS: El medio de pago es en la modalidad de abono en cuenta bajo la presentación previa de reportes mensaules

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: **CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-124561 ANT

Firma

Nombre: **JANNIER SALAS QUEJADA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:05202181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 12. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: INVÍAS - CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4699 DE 2023 **INTERVENTOR:** CISA SERVICIOS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO BAUDÓ Y EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 5/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 92,308,620.00

VALOR ACUMULADO: $ 92,308,620.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10.00%	$ 9,230,862.00	21	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.00%	$ 18,461,724.00	30	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30.00%	$ 27,692,586.00	30	11	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 540-7-994000028198

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: **CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **05202-124561 ANT**

Firma

Nombre: **JANNIER SALAS QUEJADA**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **05202181087 ANT**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

RELACIÓN CORRESPONDENCIA CONVENIO 4196-2023

Quibdó, 19 de enero de 2024

Oficio – 04 - 2024

Señores:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN DEL SAN PABLO
NIT. 901.663.886-1.
JOSE HERNAN PALACIO PALACIO
Presidente
3224651459
E-mail: juntacomunalp.p@gmail.com

Asunto: Comunicación sobre presentación de informes y exigencias documentales del contratista de obra a la interventoría.

Cordial saludo,

A través del presente se le informa a la **OAC** de la comunidad de **PUERTO PERVEL,** en su calidad de contratista de obra, los documentos y la periodicidad en la que deben presentar estos a la interventoría durante la ejecución del Convenio Solidario No. 4196 de 2023 que tiene por objeto: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL, DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."** y son los siguientes:

- INFORME SEMANAL; se deberá presentar un informe semanal de avance de las actividades en el cual se contemplen todos los aspectos técnicos, económicos, financieros, ambientales y jurídicos.
- DIARIO DE OBRA (BITÁCORA); Se debe presentar en el informe semanal el registro de la bitácora diaria.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Quibdó a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2024.

Atentamente,

Cristiam Albornoz Barrios

CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
Rep. Legal **CISA SERVICIOS SAS**
INTERVENTOR

SERVICIO CON AMOR Y CALIDAD

Puerto Pervel- Canton del San Pablo, 22 de abril de 2024

Señores
CISA SERVICIOS SAS
CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS

Referencia: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Solicitud de cambio sección transversal de la vía.

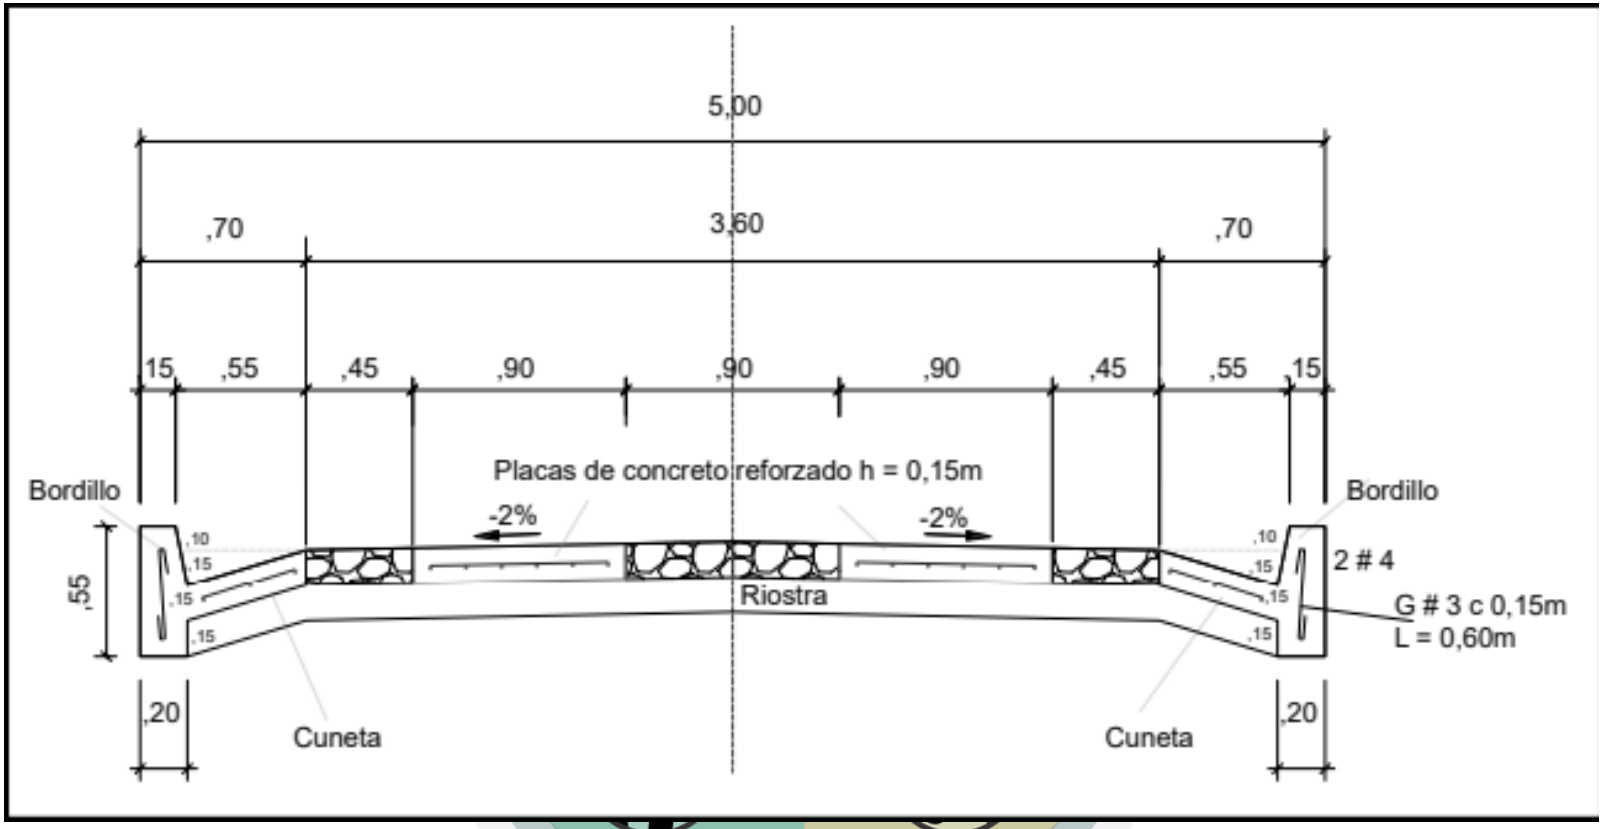
Reciban un cordial saludo.

Mediante la presente me dirijo ante usted con el objetivo de solicitar el cambio de la sección de la vía, Considerando no tener en cuenta el ancho variable. Es importante mencionar que esta es una vía de bajo tráfico. En el anexo adjuntaré imagen de la sección inicial y la sección que estamos solicitando aprobar.

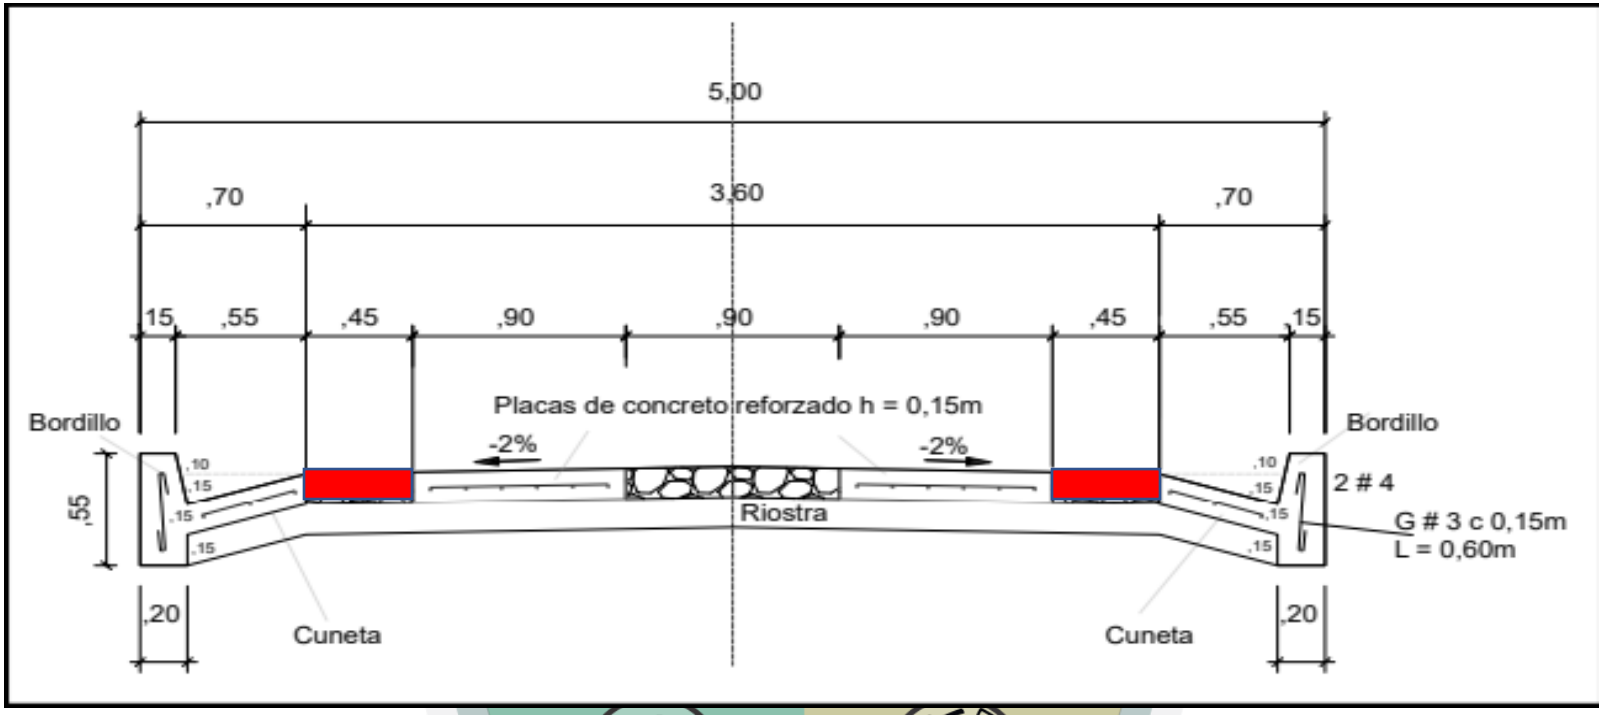
Muchas gracias por su atención

Joseher Hom Pal Lacio
JOSE HERNAN PALACIO PALACIO
R/L JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERVEL
Nit. 901663886-1

Sección transversal inicial



Sección transversal solicitada.



Nota: para el caso puntual de esta sección transversal que estamos solicitando no tener en cuenta el ancho variable, permitiendo tener un acho de vía de 4,10m de ancho.

En la siguiente figura adjunto otra imagen, con el objetivo de dar mayor claridad de como se pretende que quede la vía con la sección transversal solicitada.

Sección transversal sin considerar el ancho variable.



Quibdó, 23 de enero de 2024

Oficio – 05 - 2024

Señores:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN DEL SAN PABLO
NIT. 901.663.886-1.
JOSE HERNAN PALACIO PALACIO
Presidente
3224651459
E-mail: juntacomunalp.p@gmail.com

Referencia: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Aprobación sección transversal de la vía.

Cordial saludo. A través del presente, se responde el radicado de la **JAC** de **PUERTO PERVEL** dirigido a la interventoría el 22/01/2024, cuyo asunto es **"Solicitud de cambio sección transversal de la vía"** y se le informan las consideraciones siguientes:

- La justificación de la solicitud radicada por la **JAC** es válida; puesto que se trata de una vía con bajos volúmenes de tránsito vehicular.
- El criterio para la aprobación es la justificación antes mencionada y que el programa caminos comunitarios para la paz total permite modificar las dimensiones del sobre ancho según las características particulares de cada proyecto.
- En su calidad de contratista de obra del proyecto en referencia, la **JAC** de la comunidad de **PUERTO PERVEL** cuenta con el aval de la interventoría para la eliminación del sobre ancho variable en concreto ciclópeo de 1.90m de ancho (0.95m correspondientes a cada extremo de la placa huella) contemplado en los diseños emitidos por el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)** y reduciendo el ancho de vía que inicialmente era de 6.00m a 4.10m.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Quibdó a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2024.

Atentamente,

Cristiam Albornoz Barrios

CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
Rep. Legal **CISA SERVICIOS SAS**
INTERVENTOR

SERVICIO CON AMOR Y CALIDAD

Puerto Pervel- Canton del San Pablo, 25 de enero de 2024

Señores
CISA SERVICIOS SAS
CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
representante legal

Referencia: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto:

Cambio de sección de aletas alcantarilla K00+ 40

Reciban un cordial saludo.

Por medio del presente, me permito informar de manera oportuna y detallada, que, una vez realizado el replanteo en campo, identificamos que la obra de arte presupuestada no cumpliría con las condiciones que hoy esta exigiendo el terreno por las siguientes consideraciones:

1. Se realizo un terraplén desde la accisa K00+30 - K00+45 aproximadamente en aras de cumplir con las pendientes longitudinal de la vía.
2. altura encole placa Terminada = 2,25m aproximadamente
3. altura descole placa terminada= 3.50m aproximadamente

Estas consideraciones, nos obliga a subir las aletas de la alcantarilla, además de modificar la estructura que se tenia proyectada en el encole, por aletas, esto pues con el objetivo de lograr contener el lleno.

Por estas razones, nos dirigimos ante usted con el objetivo de viabilizar el cambio de sección, asi como también considera utilizar aletas en el encole de la obra de arte.

Adjuntaremos registro fotográfico para mejor comprensión de la problemática.

Nota: es impórtate precisar, Que el flujo de agua que se esta encausando es muy bajo en épocas de invierno y en verano prácticamente nulo.

Muchas gracias por su atención

JOSE HERNAN PALACIO PALACIO
R/L JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERVEL
Nit. 901663886-1

Situación inicial



Nota: en esta imagen podemos apreciar que, para las condiciones iniciales propuestas en el diseño, la estructura cumple.

Situación actual



Nota: en esta imagen podemos apreciar que, para las condiciones iniciales propuestas en el diseño, la estructura cumple.

Quibdó, 25 de enero de 2024

Oficio – 06 - 2024

Señores:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN DEL SAN PABLO
NIT. 901.663.886-1.
JOSE HERNAN PALACIO PALACIO
Presidente
3224651459
E-mail: juntacomunalp.p@gmail.com

Referencia: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Aprobación sección aletas alcantarilla localizada en K 00+040.

Cordial saludo. A través del presente, se responde el radicado de la **JAC** de **PUERTO PERVEL** dirigido a la interventoría el 25/01/2024, cuyo asunto es **"Cambio de sección de aletas K 00+040"** y se le informan las consideraciones siguientes:

- La interventoría aprueba la utilización de muro de cabecera y aletas en el encole de la alcantarilla localizada en el K 00+040 de la vía terciaria en ejecución, siempre y cuando se construya ceñido a las especificaciones para alcantarilla tipo II de los diseños técnicos del presente convenio.
- La justificación de la solicitud radicada por la **JAC** es válida; puesto que es necesario realizar una obra de arte que contenga el material del terraplén.
- Atendiendo a las condiciones topográficas particulares del tramo en intervención; se notifica que, el criterio para la aprobación es la justificación antes mencionada.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Quibdó a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2024.

Atentamente,

Cristiam Albornoz Barrios

CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
Rep. Legal **CISA SERVICIOS SAS**
INTERVENTOR

SERVICIO CON AMOR Y CALIDAD

Quibdó, 27 de enero de 2024

Oficio – 07 - 2024

Señores:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN DEL SAN PABLO
NIT. 901.663.886-1.
JOSE HERNAN PALACIO PALACIO
Presidente
3224651459
E-mail: juntacomunalp.p@gmail.com

Referencia: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Control calidad materiales.

Cordial saludo. A través del presente, se le solicita al contratista de obra (**JAC de PUERTO PERVEL**), por la interventoría las respectivas certificaciones de calidad y ensayos de laboratorio de los siguientes materiales:

- Certificado calidad del cemento.
- Certificado calidad del acero
- Caracterización del material empleado para SUBBASE GRANULAR TIPO C, según las especificaciones generales para construcción de carreteras INVIAS-22.
- Diseños de mezclas de concreto para las resistencias a compresión de 21MPa (210kg/cm²) y 14MPa (140kg/cm²)

Nota: Es importante destacar que los materiales deben cumplir con las especificaciones mínimas descritas en los anexos técnicos del presente convenio solidario No. 4196 de 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Quibdó a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2024.

Atentamente,

Cristiam Albornoz Barrios

CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
Rep. Legal **CISA SERVICIOS SAS**
INTERVENTOR

SERVICIO CON AMOR Y CALIDAD

Puerto Pervel- Canton del San Pablo, 27 de enero de 2024

Señores
CISA SERVICIOS SAS
CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
representante legal

Referencia: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto:

Definición PAGA o implementación de la Gestión social y ambiental

Reciban un cordial saludo.

Por medio del presente, me dirijo a ustedes con objetivo de tener claridad frente al ítem, que se describe de esta forma en el presupuesto "**PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)**", ya que causa confusión porque cuando hacemos referencia al PAGA (Plan de adaptación a la Guía Ambiental), hablamos de la implementación de diferentes programas que no se adaptarían a este proyecto, así como el presupuesto asignado. Teniendo en cuenta, Proponemos se adapte a la implementación de programas de Gestión social y ambiental.

Muchas gracias por su atención

Josehernan Palacio

JOSE HERNAN PALACIO PALACIO
R/L JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERVEL
Nit. 901663886-1

Quibdó, 29 de enero de 2024

Oficio – 08 - 2024

Señores:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN DEL SAN PABLO
NIT. 901.663.886-1.
JOSE HERNAN PALACIO PALACIO
Presidente
3224651459
E-mail: juntacomunalp.p@gmail.com

Referencia: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Aclaración del ítem "PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)"

Cordial saludo. A través del presente, se responde el radicado de la **JAC** de **PUERTO PERVEL** dirigido a la interventoría el 27/01/2024, cuyo asunto es **"Definición PAGA o implementación de la Gestión social y ambiental"** y se le informan las consideraciones siguientes:

- Se debe elaborar del documento PAGA según el nivel de complejidad socioambiental y con base al valor descrito en el presupuesto del presente convenio solidario **4196 de 2023**.

- Se deben atender y seguir los lineamientos estipulados en la **GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** emitida por el INVIAS en su última actualización.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Quibdó a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2024.

Atentamente,

CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS

CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
Rep. Legal **CISA SERVICIOS SAS**
INTERVENTOR

SERVICIO CON AMOR Y CALIDAD

BITACORA CONVENIO 4196-2023

BITÁCORA DE OBRA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERVEL	**FOLIO: 001**
	HOJA PORTADA

DATOS DE LA OBRA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	
LOCALIZACIÓN:	COMUNIDAD DE PUERTO PERVEL – CANTON DEL SAN PABLO- CHOCÓ	
No. DE CONVENIO:	**Convenio Solidario No. 4196 de 2023**	
No. DE OBRA:		
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA: 1-DICIEMBRE-2023	REAL:
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA: 29 – FEBRERO- 2024	REAL:
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERVEL**	
DOMICILIO:	PUERTO PERVE- CNATÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ	
TELÉFONOS:	312 3653979	

RESPONSABLES EN LA OBRA

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA
NEIDER PALACIOS PALACIOS **RESIDENTE DE OBRA** **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	**MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** RESIDENTE INTERVENTORIA **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

ANOTACIONES

No. DE CONVENIO:	Convenio Solidario No. 4196 de 2023
FOLIO:	001

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
			Durante esta jornada se realizado la actividad de descapote y limpieza, se utilizó maquinaria pesada. -se Descapotaron 330m2 - Duración actividad: 7 horas Equipo utilizado Retroexcavadoras Oruga-HITACHI- ZX 200
01	**15/01/2024**	**Producción**	

REVISIÓN DE ANOTACIONES


Neider Palacios Palacios **NEIDER PALACIOS PALACIOS** **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	**MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ANOTACIONES

No. DE CONVENIO:	Convenio Solidario No. 4196 de 2023
FOLIO:	002

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
			Durante esta jornada se realizado la actividad de descapote y limpieza, se utilizó maquinaria pesada. -se Descapotaron 330m2 - Duración actividad: 7 horas Equipo utilizado Retroexcavadoras Oruga-HITACHI- ZX 200
02	16/01/2024	Producción	

REVISIÓN DE ANOTACIONES

Neider Palacios Palacios **NEIDER PALACIOS PALACIOS** **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	 **MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ANOTACIONES

No. DE CONVENIO:	Convenio Solidario No. 4196 de 2023
FOLIO:	003

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
			se realizado la actividad de Corte y afirmado de via desde la abscisa K0+00 hasta la K0+50. **Cantidad:** - Se corto aproximadamente 75m3 de material arcilloso - Se lleno con material clasificado aproximadamente 70m3 **Equipo utilizado:** Volqueta #1= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Volqueta #2= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Retroexcavadora B110B = New Holland Capacidad del Cargador Colmado: 1 m3 **Herramientas Menores**
03	**17/01/2024**	**Producción**	 

REVISIÓN DE ANOTACIONES

Neider Palacios Palacios **NEIDER PALACIOS PALACIOS** **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	**MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ANOTACIONES

No. DE CONVENIO:	Convenio Solidario No. 4196 de 2023
FOLIO:	004

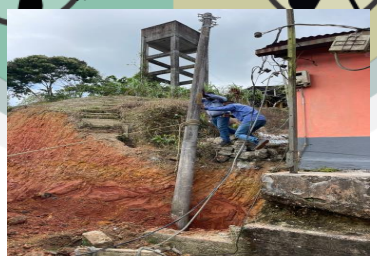
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
			En el desarrollo de esta jornada se realizaron actividades en el siguiente tramo de via desde la abscisa K0+00 hasta la K0+50, reubicación de poste de energia, lleno en material clasificado **Cantidad:** - reubicación de 2 postes de energia - Se lleno con material clasificado aproximadamente 70m3 **Equipo utilizado:** Volqueta #1= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Volqueta #2= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Retroexcavadora B110B = New Holland Capacidad del Cargador Colmado: 1 m3 **Herramientas Menores**
04	**18/01/2024**	**Producción**	 

REVISIÓN DE ANOTACIONES

NEIDER PALACIOS PALACIOS **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	**MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ANOTACIONES

No. DE CONVENIO:	Convenio Solidario No. 4196 de 2023
FOLIO:	005

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
			Durante esta jornada se desarrollaron las siguientes actividades: • Solado alcantarilla u obra de arte • Lleno en material clasificado • Localización y Replanteo **Cantidad:** - solado: 1.8m3 (14MPa) - Se lleno con material clasificado aproximadamente 140m3 **Equipo utilizado:** Volqueta #1= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Volqueta #2= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Retroexcavadora B110B = New Holland Capacidad del Cargador Cucharon: 1 m3 **Herramientas Menores**
05	**19/01/2024**	**Producción**	   

REVISIÓN DE ANOTACIONES

Neider Palacios Palacios **NEIDER PALACIOS PALACIOS** **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	**MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ANOTACIONES

No. DE CONVENIO:	Convenio Solidario No. 4196 de 2023
FOLIO:	006

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
			Durante esta jornada se ejecutaron las siguientes actividades: • Atraque alcantarilla u obra de arte • Instalación tubería • Lleno en material clasificado **Cantidad:** - Atraque alcantarilla: 2,124 m3 (21MPa) - Se lleno con material clasificado aproximadamente 196m3 **Equipo utilizado:** Volqueta #1= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Volqueta #2= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Retroexcavadora B110B = New Holland Capacidad del Cargador Cucharon: 1 m3 **Herramientas Menores**
06	**20/01/2024**	**Producción**	   

REVISIÓN DE ANOTACIONES

Neider Palacios Palacios **NEIDER PALACIOS PALACIOS** **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	 **MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ANOTACIONES

No. DE CONVENIO:	Convenio Solidario No. 4196 de 2023
FOLIO:	007

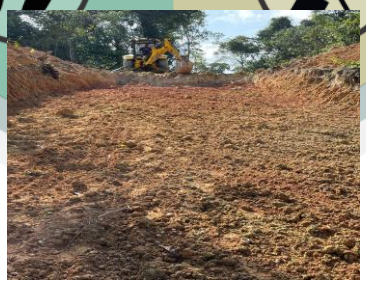
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
			Durante esta jornada se ejecutaron las siguientes actividades: Lleno en material clasificado **Cantidad:** - Se lleno con material clasificado aproximadamente 175m3 **Equipo utilizado:** Volqueta #1= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Volqueta #2= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Retroexcavadora B110B = New Holland Capacidad del Cargador Colmado: 1 m3
07	**22/01/2024**	**Producción**	   

REVISIÓN DE ANOTACIONES

Neider Palacios Palacios **NEIDER PALACIOS PALACIOS** **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	**MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ANOTACIONES

No. DE CONVENIO:	Convenio Solidario No. 4196 de 2023
FOLIO:	008

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
			Durante esta jornada se ejecutaron las siguientes actividades: • Corte **Cantidad:** - Se lleno con material clasificado aproximadamente 126m3 - Corte **Equipo utilizado:** Volqueta #1= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Volqueta #2= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Retroexcavadora B110B = New Holland Capacidad del Cargador Colmado: 1 m3
08	**23/01/2024**	**Producción**	   

REVISIÓN DE ANOTACIONES

Neider Palacios Palacios **NEIDER PALACIOS PALACIOS** **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	**MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ANOTACIONES

No. DE CONVENIO:	Convenio Solidario No. 4196 de 2023
FOLIO:	009

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
			Durante esta jornada se ejecutaron las siguientes actividades: • Corte Conformación en material clasificado **Cantidad:** - Se lleno con material clasificado aproximadamente 70m3 - Corte **Equipo utilizado:** Volqueta #1= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Volqueta #2= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Retroexcavadora B110B = New Holland Capacidad del Cargador Colmado: 1 m3 **Herramientas menores**
09	**24/01/2024**	**Producción**	   

REVISIÓN DE ANOTACIONES

Neider Palacios Palacios **NEIDER PALACIOS PALACIOS** **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	**MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ANOTACIONES

No. DE CONVENIO:	Convenio Solidario No. 4196 de 2023
FOLIO:	010

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
			Las actividades ejecutadas durante el día de hoy fueron las siguientes: Conformación en material clasificado **Cantidad:** - Se lleno con material clasificado aproximadamente 203m3 - Corte **Equipo utilizado:** Volqueta #1= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Volqueta #2= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Retroexcavadora B110B = New Holland Capacidad del Cargador Colmado: 1 m3 **Herramientas menores**
010	**25/01/2024**	**Producción**	   

REVISIÓN DE ANOTACIONES

NEIDER PALACIOS PALACIOS **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	**MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ANOTACIONES

No. DE CONVENIO:	Convenio Solidario No. 4196 de 2023
FOLIO:	011

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
			Las actividades ejecutadas durante el día de hoy fueron las siguientes: • Cargue material -Piedra para placa Huella • Formaleta en Madera – Para placa Huella **Cantidad:** - Se cargo material – Piedra- aproximadamente 42m3 **Equipo utilizado:** Volqueta #1= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Volqueta #2= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Retroexcavadora B110B = New Holland Capacidad del Cargador Colmado: 1 m3 **Herramientas menores**
011	26/01/2024	Producción	   

REVISIÓN DE ANOTACIONES

Neider Palacios Palacios **NEIDER PALACIOS PALACIOS** **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	**MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ANOTACIONES

No. DE CONVENIO:	Convenio Solidario No. 4196 de 2023
FOLIO:	012

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
			Las actividades ejecutadas durante el día de hoy fueron las siguientes: • Cargue material -Material para mezcla Huella • Formaleta en Madera – Para placa Huella **Cantidad:** - Se cargo material – Para mezcla- aproximadamente 120m3 **Equipo utilizado:** Volqueta #1= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Volqueta #2= Chevrolet volqueta capacidad 7m3 Retroexcavadora B110B = New Holland Capacidad del Cargador Colmado: 1 m3 **Herramientas menores**
012	27/01/2024	Producción	   

REVISIÓN DE ANOTACIONES


Neider Palacios Palacios **NEIDER PALACIOS PALACIOS** **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	 **MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ANOTACIONES

No. DE CONVENIO:	Convenio Solidario No. 4196 de 2023
FOLIO:	013

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
			Durante este periodo de ejecución del contrato se desarrollaron las siguientes actividades: Formaleta para placa Huella abscisa K00+40 Formaleta en Madera – Para placa Huella **Cantidad:** - **Equipo utilizado:** Cortadora manual **Herramientas menores**
013	**29/01/2024**	**Producción**	

REVISIÓN DE ANOTACIONES


Neider Palacios Palacios **NEIDER PALACIOS PALACIOS** **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	 **MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ANOTACIONES

No. DE CONVENIO:	Convenio Solidario No. 4196 de 2023
FOLIO:	014

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
			Durante este periodo de ejecución del contrato se desarrollaron las siguientes actividades: • Formaleta para placa Huella abscisa K00+30 • Construcción Obra de arte abscisa K0+040 **Cantidad:** - solado cantidad: 1m3 concreto de 14 Mpa **Equipo utilizado:** Cortadora manual **Herramientas menores**
014	**30/01/2024**	**Producción**	 

REVISIÓN DE ANOTACIONES

Neider Palacios Palacios **NEIDER PALACIOS PALACIOS** **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	 **MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ANOTACIONES

No. DE CONVENIO:	Convenio Solidario No. 4196 de 2023
FOLIO:	015

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
			En esta jornada laboral se realizaron la siguiente actividad: Figurado acero alcantarilla **Cantidad:** **Equipo utilizado:** Cortadora manual **Herramientas menores**
015	**31/01/2024**	**Producción**	 

REVISIÓN DE ANOTACIONES

NEIDER PALACIOS PALACIOS **Matrícula Profesional No.**: 011037-0533930 ANT	**MARIO ANDRES CUJAR ARRIAGA** **Matrícula Profesional No.**: 25202134846 CND
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA
