CONTRATO 4499 DEL 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL POGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 5
Periodo 1 al 30 de abril de 2024

ABRIL DEL 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

INFORME MENSUAL NO. _____ **MES O PERIODO:** _____

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**				
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**				
2.1	Localización				
2.2	Inventario y estado inicial de la vía				
2.3	Características técnicas del proyecto				
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				
3.1	Información general del contrato				
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				
3.3	Seguimiento Ítems no previstos				
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría				
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3			
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4			
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6			
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8			
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10			
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11			
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12			
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14			
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15			
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17			
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1 MINFRA-MN-IN-2-FR-2			
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1 MINFRA-MN-IN-6-FR-2			
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1			
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2			
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2			
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato				
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor				
5.3	Informes especialistas				
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				
5.5	Información otros programas y aplicativos				
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5			
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7			
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9			
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13			
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16			
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18			
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1 MINFRA-MN-IN-3-FR-2			
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**				
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo				
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras				
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales				

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

_____

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTROL DE APROBACIÓN

Nombre del documento:		Informe Mensual de interventoría No 5
Código del documento:		
Versión:	**1**	

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			
Actividad	**Fecha**	**Nombre del ejecutor**	**Firma**
Elaboración	01/04/2024		
Revisión			
Verificación			
Aprobación			

DISTRIBUCIÓN		
Persona a quien se envía	**Cargo**	**Organización**
JORGE MEDINA	Supervisor	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	**Fecha**	**Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior**
1		
2		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1 LOCALIZACIÓN 7
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 7
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 9
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 9
3.1.1 Información contractual 9
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 10
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 10
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 11
3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato 11
3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra. 11
3.4.3 Estado de pólizas 11
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 12
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 15
4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 15
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 15
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 15
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 15
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 16
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 17
5.1.1 Aspectos legales del contrato 17
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 18
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 19
6.1 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 19
6.2 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 19
6.3 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
6.4 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21
6.5 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 22
6.5.1 Seguimiento a la inversión del anticipo 22
8. ANEXOS 24

LISTA DE TABLAS

Imagen 1. Localización del proyecto 7
Tabla 1.Estado inicial de la vía 8
Tabla 2. Información general del contrato 9
Tabla 3 Póliza de cumplimiento 11
Tabla 4. Póliza de responsabilidad civil extracontractual 12
Tabla 5. Aspectos legales del contrato de interventoría 17
Tabla 6. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría 18
Tabla 7. Personal Activo de la Interventoría. 19

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto 7

LISTA DE ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 23
Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras 23

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 01-30 de abril de 2024, para el proyecto **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL POGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

Las actividades corresponden principalmente a labores de seguimiento, control y verificación a los trabajos correspondientes al convenio No. 4499 de 2023 en proceso de revisión y aprobación de documentos, cuyo objeto es: "**Anuar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda El Libano Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total."** El seguimiento a la ejecución del proyecto se ha realizado periódicamente a través de reuniones y recorridos en conjunto con la OAC de la vereda de El Libano, director territorial y supervisor de INVIAS, a diario con Ingenieros directores, Residentes e Interventoría para dar cumplimiento a lo estipulado en el pliego de condiciones y anexo técnico del Contrato 4927 de 2023 y en las Especificaciones Técnicas de INVIAS.

.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

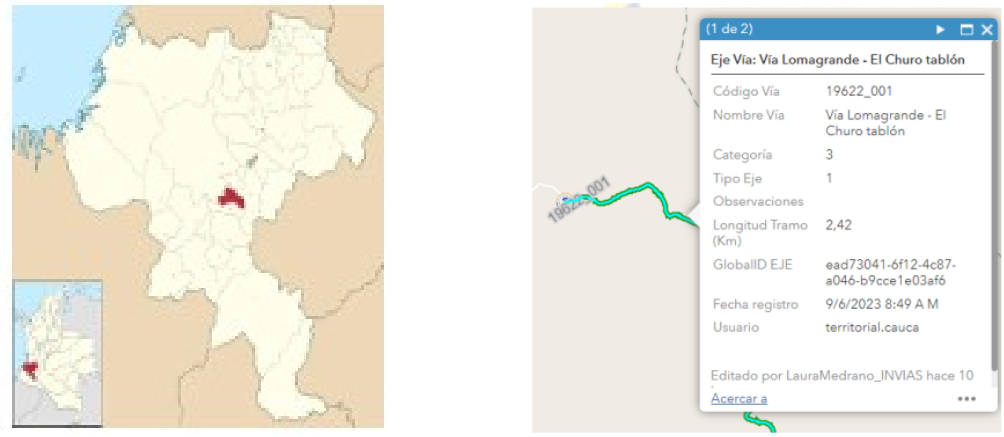


Imagen 1. Localización del proyecto

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Rosas del departamento de Cauca, en la vereda El Libano, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud: 2.2666, longitud: -76.7145 y punto de referencia final en el PR 2 + 420 con coordenadas latitud: 2.2539, longitud: -76.7065, de la vía Loma grande - El Churo tablón, la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Las vías de la vereda El Libano, se encuentran en mal estado debido a la falta de intervención y debido al tráfico constante de vehículos de carga pesada hacia los sectores de producción agrícola y minera que se encuentran en la zona, además de extender los tiempos de viaje y aumentar los costos de carga.

Tabla 1.Estado inicial de la vía

Fotografía N° 1	Descripción
	La vía se encuentra conformada con material, un ancho de carril de 4m.
Fotografía N° 2	**Descripción**
	La alcantarilla tiene una m longitud de 6m la cual requiere un mejoramiento

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

De igual manera se contempla la ejecución de actividades ambientales del programa de adaptación de la guía de manejo ambiental (PAGA), orientados a evitar, prevenir, corregir y mitigar o compensar los impactos generados en desarrollo del proceso de mejoramiento de la vía mencionada en el objeto del contrato 4927 de 2023.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1.1 Información contractual

Tabla 2. Información general del contrato

CONTRATO No. - FECHA	4499 de 2023
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Dirección territorial INVIAS
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL LIBANO, DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
C.C. o N.I.T.	901050100-0
REPRESENTANTE LEGAL	FABIOLA SANCHEZ MIRANDA
C.C. o N.I.T	34.568.505
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONTRATO	$200.652.620.00

PLAZO O DURACIÓN	Tres (3) meses.
PLAZO ADICIONAL DE DURACIÓN	De acuerdo con el Adicional No. 01: "Modificar el plazo de ejecución tres (03) meses más".
LUGAR DE EJECUCIÓN	VÍA LOMA GRANDE - EL CHURO TABLÓN
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	JORGE MEDINA - territorial INVIAS Cauca.
INTERVENTOR (Externo)	
FECHA ACTA DE INICIO	13 de diciembre de 2023

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo correspondiente del 01-30 de abril de 2024 de ejecución del contrato 4499 de 2023. El representante legal de la JAC El Libano, realizó las siguientes actividades.

- Se realiza socialización de inicio de obra
- Se realiza la cotización del estudio de suelos.
- Se realiza un comité operativo.
- Se realizó cotizaciones de compra
- Se presento un plan de compras

Se adelantarán las siguientes actividades técnicas:

- Se realiza visitas de los proveedores a la obra
- Se realizan los contratos del personal de obra
- Se realiza la vinculación de los trabajadores a seguridad social

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato

A la fecha no se han presentado modificaciones de cantidades.

3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra.

En el formato de Acta de recibo parcial y/o final de obra se relacionan los conceptos: información principal del contrato de obra, las condiciones originales, las condiciones actualizadas a traer de la última acta de modificación de cantidades de obra aprobada, la obra ejecutada en cada mes y el acumulado de ejecución de estos hasta el mes de la correspondiente acta.

A la fecha no se han presentado actas de recibo parcial.

3.4.3 Estado de pólizas

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presentó la póliza de cumplimiento No 100293911, con respecto a la fecha de inicio, expedida por la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS S.A. A continuación, se relacionan los amparos actualizados de esta póliza.

Tabla 3 Póliza de cumplimiento

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.130.524,00	22/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.032.631,00	22/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.195.786,00	31/11/2023	31/12/2028

De igual manera y de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presentó la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 100072490, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, y aprobada por la gobernación de Cauca. A continuación, se relaciona el amparo inicial de esta póliza.

Tabla 4. Póliza de responsabilidad civil extracontractual

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			22/11/2023	31/12/2023
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO


A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01-30 de abril de 2024, la información se relaciona en el Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA


El desarrollo semanal del contrato de obra se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los Informes Semanales están suscritos por el director de Interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III. Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. gestión predial, VI. Gestión social, VII. Actividades realizadas en la semana, VIII. Actividades que realizar en la siguiente semana, IX. Esquema gráfico alcance del contrato, X. registro fotográfico y XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto.


Informe N°14. (1 -7 abril)

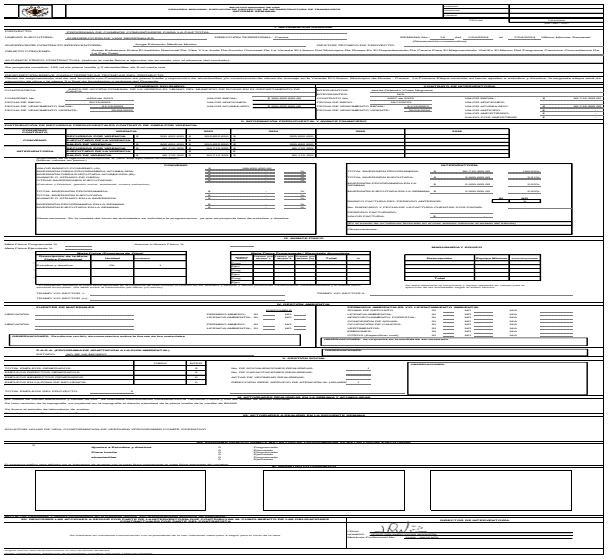


Informe N°15. (08 -14 abril)

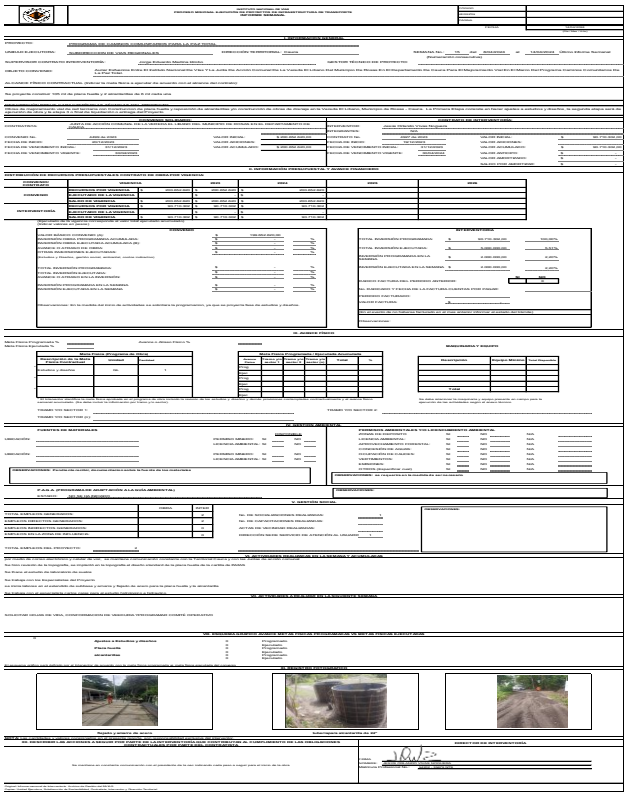

Informe N°16. (15 -21 abril)

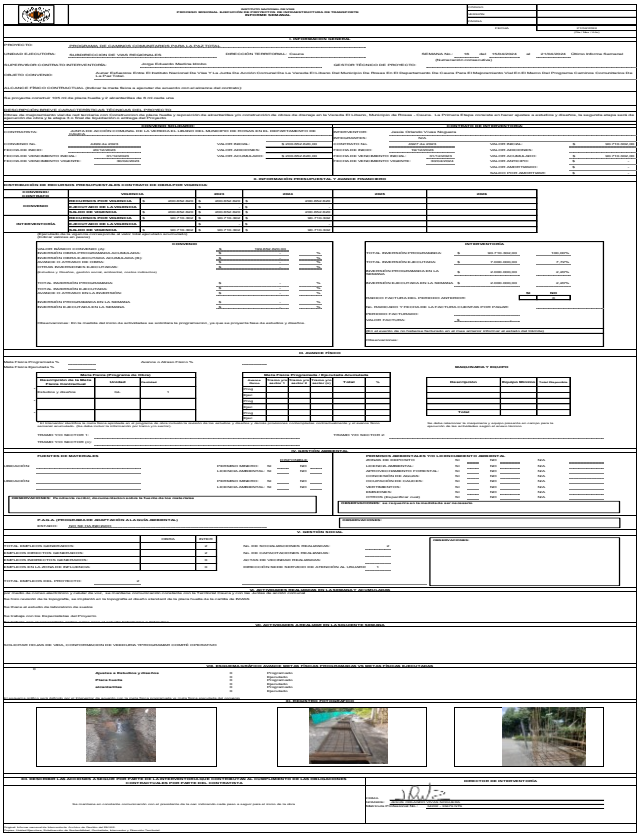

Informe N°17. (22 -30 abril)

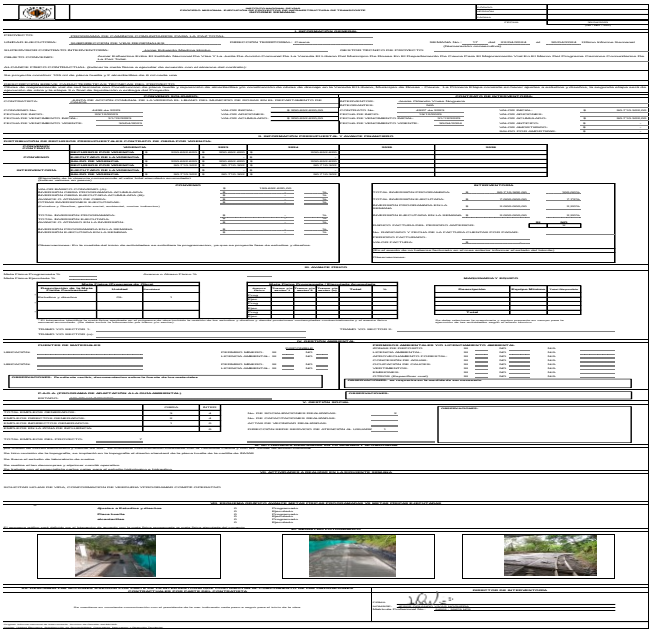

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Para La Obra se tienen los siguientes equipos y maquinarias

- Trompo revolvedor de concreto
- Vibrador de concreto
- Retroexcavadora de llantas
- Vibro compactador

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

El Personal contratado se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se describe el estado actual financiero del contrato de obra en el periodo comprendido entre el 01-30 de abril de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 denominado “Informe financiero y presupuestal del contrato de obra”. Adicionalmente se resalta que no se han generado actas ni ejecución de obra.

Hasta el momento no se han realizado movimiento presupuestal o financiero.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO


A continuación, se relaciona el estado general del tiempo en el periodo comprendido entre el 1-30 de abril de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 denominado “Estado general del tiempo”

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo aún no se han tomado muestras.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS del contrato de obra.

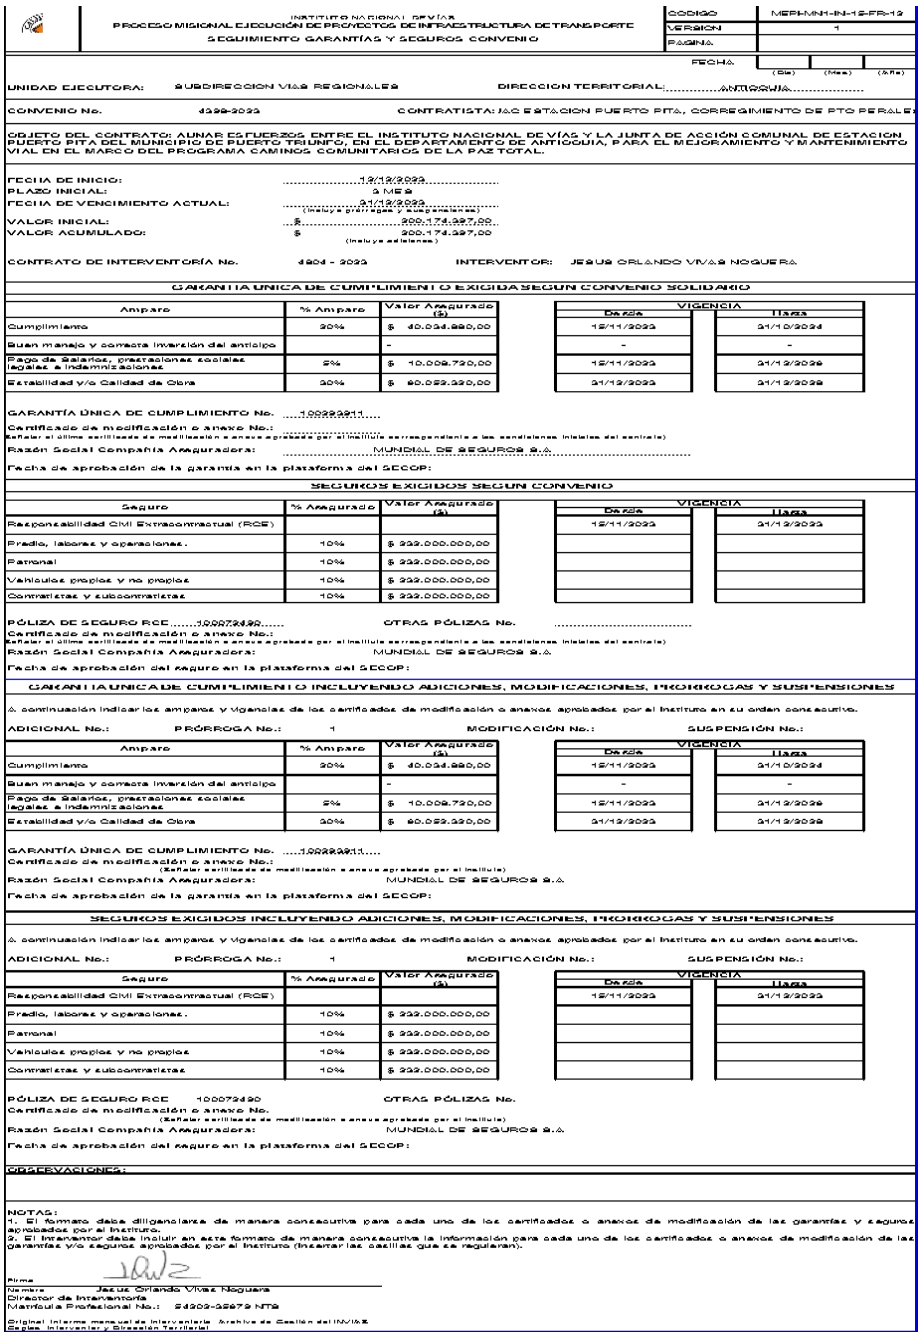

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4928-2023 — CONTRATISTA: JAC ESTACION PUERTO PITA, CORREGIMIENTO DE PTO PERALES

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2023
PLAZO INICIAL: 9 MES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.174.297,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.174.297,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4804 - 2023 — INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.034.860,00	19/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones	5%	$ 10.008.720,00	19/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.052.320,00	31/12/2023	31/12/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100039911
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las sandalenas iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGUN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			19/11/2023	31/12/2026
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 999.000.000,00		
Patronal	10%	$ 999.000.000,00		
Vehículos propios y no propios	10%	$ 999.000.000,00		
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 999.000.000,00		

PÓLIZA DE SEGURO RCE 1000726490 — OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las sandalenas iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.034.860,00	19/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones	5%	$ 10.008.720,00	19/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.052.320,00	31/12/2023	31/12/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100039911
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			19/11/2023	31/12/2026
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 999.000.000,00		
Patronal	10%	$ 999.000.000,00		
Vehículos propios y no propios	10%	$ 999.000.000,00		
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 999.000.000,00		

PÓLIZA DE SEGURO RCE 1000726490 — OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-25672 NTS

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS
Copias: Interventor y Dirección Territorial

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Seguimiento al plan de calidad contrato de obra FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-14

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Aspectos legales del contrato

Tabla 5. Aspectos legales del contrato de interventoría

CONTRATO:	4927-2023
CONTRATISTA:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ROSAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
PLAZO INICIAL:	Tres meses
FECHA INICIO:	13/12/2023
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	31/12/2023
FECHA DE PRORROGA	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 90.710.302

5.1.2 Pólizas y seguros

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías, gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual.

La aprobación de la póliza única de cumplimiento No 49-44-101032611 de SEGUROS DEL ESTADO S.A. fue indicada mediante en la plataforma SECOP II.

Tabla 6. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	$ 9.071.030,20	12/12/2023	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	30%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2028

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01-30 de abril de 2024, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del convenio de obra N° 4927 de 2023

Dentro de las actividades administrativas se encuentran:

- ✔ Elaboración de Informes Semanales y Mensuales de interventoría.
- ✔ Comités de seguimiento y control con la territorial de INVIAS.
- ✔ Seguimiento, control y aprobación de cuentas.
- ✔ Se actualizaron firmas para cambio del director territorial por director de Interventoría

Dentro de las actividades técnicas se realizaron:

- ✔ Se trabajó en levantamiento topográfico geo referenciado en campo.
- ✔ comité semanal de obra con la presidenta de JAC, Compromisos alcanzados, Procedimientos para pagos
- ✔ El ingeniero de residente realizo visitas durante los días 25 y 29 de febrero para priorizar los puntos críticos a intervenir con el fin de optimizar recursos

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el cuadro “Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría”, presentado en el anexo denominado “Formatos de seguimiento mensual” y logrado con el desarrollo de la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se presenta parcialmente, con detalle a nivel diario, la participación o utilización de los profesionales en desarrollo de las actividades objeto de la Interventoría, en el periodo objeto del informe.

En este periodo ha intervenido el personal que está desarrollando las actividades de seguimiento y control a la ejecución de obras, de acuerdo a los estudios y diseños y a los documentos técnicos entregados por la entidad contratante, que hacen parte del proyecto.

Tabla 7. Personal Activo de la Interventoría.

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
Jesús Orlando Vivas Noguera	Director de Interventoría	40%
JUAN CARLOS ANDRADE	Residente de Interventoría	100%
LEANA ROCIO ILES MUÑOZ	Profesional social	45%
LAURA PATRICIA MOYA	Inspector sst	100%
ALIRIO ARCS CAMPO	inspector	100%

6.2 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Cuadro “Información financiera del contrato de interventoría”, presentado en el anexo denominado “Formatos de seguimiento mensual” y logrado con el desarrollo de la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-9 se presentan los movimientos a nivel mensual

de costos de la interventoría, del saldo de contrato y del saldo del registro presupuestal.

6.3 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías del INTERVENOR (Garantía única), gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4927 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ROSAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 13/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 90.710.302,00
VALOR ACUMULADO: $ 90.710.302,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE MEDINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 9.071.030,20	12/12/2023	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	30%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 101032611
Certificado de modificación o anexo No.: 0
último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 9.071.030,20	12/12/2023	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	30%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 101032611
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Firma
Nombre:
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se elevará consulta ante el INVIAS para establecer las condiciones y la forma de presentación del plan de calidad para su aprobación.

6.5 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1 Seguimiento a la inversión del anticipo

El contrato de interventoría No 4927-2023 no pactó anticipo.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Se requiere por parte del contratista, acatar todas las recomendaciones dadas por la interventoría, así mismo la entrega oportuna de la documentación solicitada, con el fin de avanzar lo más pronto en la ejecución de actividades de obra.

8. ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre INVIAS, contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras

Hasta el momento no se han ejecutado actividades de obra.



Firma

Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS
