	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 4806-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL EL RAMAL
4331-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEÑA BLANCA
4493-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL LIBANO

Contrato de Interventoría No. 4927-2023 **Interventoría:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Objeto Contrato de Obra:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROSAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** MAYO/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCION**		9
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		11
2.1	Localización		11
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		11
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		14
2.4	Características técnicas del proyecto		14
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		17
3.1	Información general del contrato		17
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		22
3.3	Seguimiento Items no previstos		25
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		25
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		26
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	26
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	57
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	58
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	59
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	60
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	61
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	62
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	69
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		69
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	69
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	69
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		82
5.1	Información general del contrato		82
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		82
5.3	Informes especialistas y profesionales		82
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		83
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	83
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	84
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	85
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	87
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	90
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		91
8	**Anexos**		93
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		93
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** MARZO/2024

CONVENIO No.: 4806-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE EL ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RAMAL

PLAZO INICIAL: 0.27 MESES
FECHA DE INICIO: 12/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
PRORROGA No. 2 Hasta 30/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 6.47 MESES

VALOR INICIAL: $ 200,818,019.00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200,818,019.00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4927-2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	135
	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas	und	1
	Muro de Contención		
Mantenimiento	Alcantarillas		
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
Estructuras	Alcantarillas		0	
	Muro de Contención		0	
Mantenimiento	Alcantarillas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150,953,190.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4,528,596.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,336,233.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199,818,019.00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** MARZO/2024

CONVENIO No.: 4331-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN ROQUE CAÑAVERAL

PLAZO INICIAL: 0 3 MESES
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
PRORROGA No. 1 Hasta 30/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 3 5 MESES

VALOR INICIAL : $ 200,833,357.00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200,833,357.00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4927-2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	170
	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas	und	0
	Muro de Contención		
Mantenimiento	Alcantarillas		
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
Estructuras	Alcantarillas		0	
	Muro de Contención		0	
Mantenimiento	Alcantarillas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150,968,082.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4,529,042.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,336,233.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199,833,357.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ -	$ -

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSATALACION DE SUBBASE GRANULAR







CORTE Y FELJADO DE ACERO DE P.H

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** MARZO/2024

CONVENIO No.: 4499-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL RAMAL CGTO. DE URIBE

PLAZO INICIAL: 0.3 MESES
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/02/2024
PRORROGA No. 1 Hasta 30/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 3.5 MESES

VALOR INICIAL : $ 200,652,620.00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200,652,620.00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4953-2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	160
	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas	und	1
	Muro de Contención		
Mantenimiento	Alcantarillas		
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
Estructuras	Alcantarillas		0	
	Muro de Contención		0	
Mantenimiento	Alcantarillas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150,609.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4,523,778.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,336,233.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199,652,620.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ -	$ -

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

/A

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROSAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
INTERVENTORÍA DE CONVENIO SOLIDARIO

INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Jesus Orlando Vivas Noguera	Director de Interventoría	

JUAN CARLOS ANDRADE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 8
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10
2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 10
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS 13
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 13
2.3.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO 14
2.3.1.1 Placa Huella 14
2.3.1.2 Alcantarillas 15
3 INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS 16
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS 16
3.1.1 EL RAMAL 16
3.1.1.1 Presupuesto 17
3.1.2 El LIBANO 4499 18
3.1.2.1 Presupuesto 19
3.1.3 PEÑA BLANCA 44331 20
3.1.3.1 Presupuesto 21
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 22
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 24
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 24
4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 25
4.1 INFORME SEMANAL 25
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO 40
4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO 41
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO 44
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 47
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 50
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 51
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 54
4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 54
5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 56
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 56
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 56
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 57
6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 58
6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 59
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 60
6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 61
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 62
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 63

1 INTRODUCCIÓN

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial.

Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

Así el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales del municipio de ROSAS, del Departamento de Cauca, cuyos objetos buscan: **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”,” AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**”, por lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría.

Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de la interventoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de una Propuesta Técnica.

Así las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, requiere adelantar la contratación de la Interventoría que tiene por objeto: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ROSAS.**

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de TRES (3) convenios Solidarios que se suscribieron entre el INVIAS y las juntas de acción comunal del municipio de ROSAS:

CONTRATISTA	CONVENIO No.	VALOR CONVENIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RAMAL	4806-2023	$ 200,818,019
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL LIBANO	4499-2023	$ 200,652,620
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA PEÑA BLANCA	4802-2023	$ 200,833,357

Las principales actividades y obras para ejecutar son las siguientes:

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la interventoría, en el marco de la ejecución de tres (3) convenios solidarios que se suscribieron en el municipio de *ROSAS*, departamento de Cauca, como parte del programa “caminos Comunitarios de la Paz Total”

CONVENIO No.	VEREDA	LONG(m)	COORDENADA DE INICIO	COORDENADA FINAL	OBSERVACIONES
4806-2023	EL RAMAL	160	2.2129,-76.6932	2.2099,-76.6884	Construcción de 160 metros lineales de placa huella, y de 1 alcantarillas.

4499-2023	EL LIBANO	160	2.2666, -76.7145	2.2536, -76.7065	Construcción de 160 metros lineales de placa huella, y de 1 alcantarilla.
4499-2023	PEÑA BLANCA	170	2.5779,-76.8752	2.5808, -76.8766	Construcción de 170 metros lineales de placa huella.

Las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por la interventoría, en desarrollo del contrato.



Ilustración 1. Localización del proyecto, municipio de ROSAS.

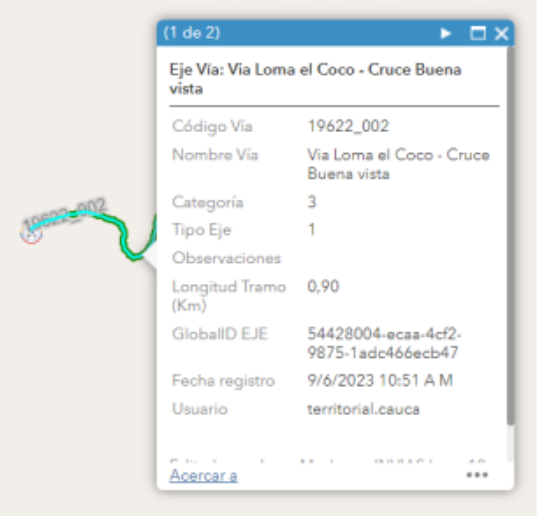


Ilustración 2. Localización del proyecto, Vereda El Ramal

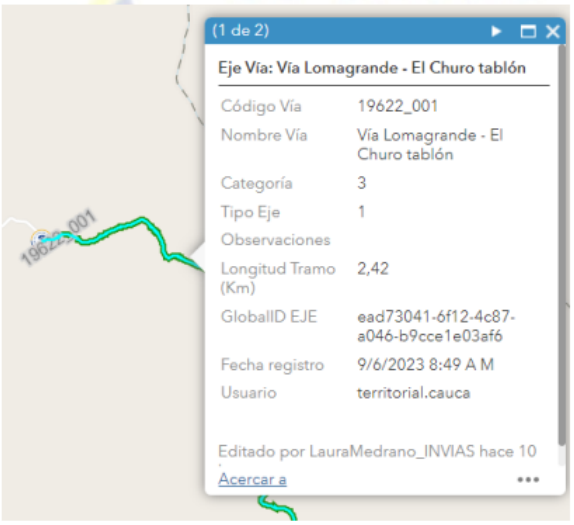


Ilustración 3. Localización del proyecto, Vereda El Libano.

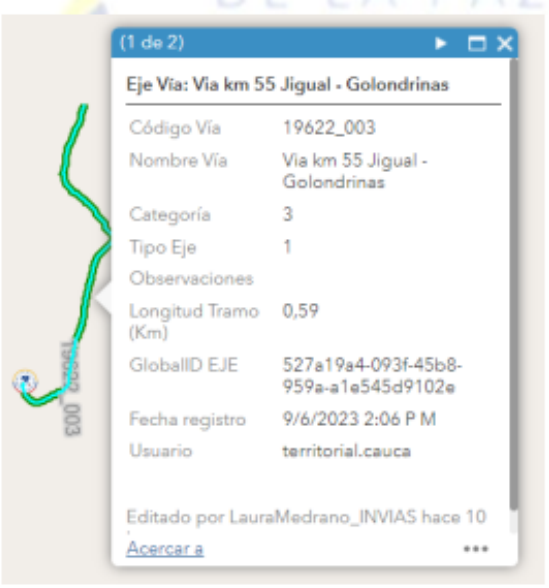


Ilustración 4. Localización del proyecto, Vereda Peña Blanca.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

Las vías para intervenir son vías rurales, prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con las juntas de acción comunal de las veredas El Ramal, El Libano y Peña Blanca; en el departamento del Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las obras proyectadas fueron producto del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento.

Las diferentes vías objeto de los contratos requieren las siguientes actividades:

2.3.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Las actividades de mejoramiento son el conjunto de obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades por ejecutar para el mejoramiento de las vías rurales son las siguientes:

Construcción de Placa Huella • Pavimentos convencionales • Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. • Construcción de Filtros y/o cunetas • Bases Estabilizadas • Tecnologías alternativas.

Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías, adoptado por Resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/. De igual manera, se tendrán en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construcción de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales. El alcance de las obras a ejecutar y el presupuesto respectivo se definirá una vez se suscriba el convenio, se confirme la cofinanciación por parte del ente territorial en los casos que se requiera y se actualicen los precios unitarios con el incremento del salario mínimo.

2.3.1.1 Placa Huella

Es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma-cunetas.

2.3.1.2 Alcantarillas

Como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36” (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos tipos de configuración. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros. La segunda configuración tipo aleta permite, además de recibir y evacuar la escorrentía aportante por las cunetas y filtros, dar continuidad a cauces con flujos intermitentes o efímeros.

3 INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 EL RAMAL

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4806-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE EL ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del convenio	$200.818.019,00
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RAMAL, DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
Nit	900176800-6
Representante legal	HERNEY ORDOÑEZ HOYOS
CC. R.L	76.296.896
Suscripción convenio	16/11/2023
Fecha de Orden de inicio	3 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 de unio de 2024

3.1.1.1 Presupuesto

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	88,72	$ 23.590,00	$ 2.092.905,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	111,57	$ 211.406,00	$ 23.586.567,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	60,82	$ 737.128,00	$ 44.832.125,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	32,31	$ 446.739,00	$ 14.434.137,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.844,18	$ 6.932,00	$ 19.715.856,00
							SUB-TOTAL	$ 104.661.590,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92,90	$ 23.590,00	$ 2.191.511,00
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	16,40	$ 51.385,00	$ 842.714,00
11	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,90	$ 562.519,00	$ 506.267,00
12	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19,10	$ 737.128,00	$ 14.079.145,00
13	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157,80	$ 6.932,00	$ 8.025.870,00
14	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con Recebo	M3	50,90	$ 184.017,00	$ 9.366.465,00
15	661.3	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12,00	$ 939.969,00	$ 11.279.628,00
							SUB-TOTAL	$ 46.291.600,00
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 150.953.190,00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.528.596,00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.336.233,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 199.818.019,00**

3.1.2 El LIBANO 4499

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4499-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del convenio	$ 200,656,620
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL LIBANO
Nit	901050100-0
R.L	FABIOLA SANCHEZ MIRANDA
CC. R.L	34.568.505
Suscripción convenio	20/11/2023
Fecha de Orden de inicio	22 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2024

3.1.2.1 Presupuesto

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	90,49	$ 23.590,00	$ 2.134.659,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	113,74	$ 190.721,00	$ 21.692.607,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	62,65	$ 715.425,00	$ 44.821.376,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	33,33	$ 426.691,00	$ 14.221.611,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.917,66	$ 6.922,00	$ 20.196.043,00
							SUB-TOTAL	**$ 103.066.296,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92,90	$ 23.590,00	$ 2.191.511,00
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	16,40	$ 51.385,00	$ 842.714,00
11	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,90	$ 539.129,00	$ 485.216,00
12	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	23,70	$ 715.425,00	$ 16.955.573,00
13	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157,80	$ 6.922,00	$ 8.014.292,00
14	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con Recebo	M3	50,90	$ 163.332,00	$ 8.313.599,00
15	661.3	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12,00	$ 910.284,00	$ 10.923.408,00
							SUB-TOTAL	**$ 47.726.313,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 150.792.609,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.523.778,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.336.233,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 199.652.620,00**

3.1.3 PEÑA BLANCA 44331

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4331-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del convenio	$ 200,833,357
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEÑA BLANCA
Nit	900699862-7
R.L	RUSBELIA ESTACIO RINCON
CC. R.L	34.640.149
Suscripción convenio	2/12/2023
Fecha de Orden de inicio	22 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 de junio de 2024

3.1.3.1 Presupuesto

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	83,55	$ 23.590,00	$ 1.970.945,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	105,07	$ 225.851,00	$ 23.730.165,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	57,05	$ 752.285,00	$ 42.917.859,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	30,29	$ 460.789,00	$ 13.957.299,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.673,00	$ 6.938,00	$ 18.545.274,00
							SUB-TOTAL	**$ 101.121.542,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92,90	$ 23.590,00	$ 2.191.511,00
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	16,40	$ 51.385,00	$ 842.714,00
11	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,90	$ 578.853,00	$ 520.968,00
12	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	22,10	$ 752.285,00	$ 16.625.499,00
13	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157,80	$ 6.938,00	$ 8.032.816,00
14	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con Recebo	M3	50,90	$ 198.462,00	$ 10.101.716,00
15	661.3	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12,00	$ 960.943,00	$ 11.531.316,00
							SUB-TOTAL	**$ 49.846.540,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 150.968.082,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.529.042,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.336.233,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 199.833.357,00**

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El alcance del proyecto objeto consiste en realizar la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS**. Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios, de los cuales se derivan las obras a realizar interventoría, incluida la cartilla de obras menores y estructuras viales. En particular, durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades:

3.2.1 EL RAMAL 4806

- El 1 de mayo se da el inicio del mejoramiento de la vía con la construcción de la placa huella en la vereda El Ramal, por consiguiente, los trabajadores inician labores tales como, cortado y flejado de acero, riego y compactación de subbase.
- El 2 de mayo se reciben más subbase granular con inconvenientes en el acceso ya que la vía está en circunstancias deplorables y las volquetas no pueden llegar al destino de construcción.
- El 9 de mayo se envía al banco la autorización de transferencia N.05.
- El 10 de mayo se opta por cambiar de proveedor de material de rio ya que con el que se contaba por el difícil acceso decidió subir los precios pactado.
- El 14 de mayo se envía al banco la autorización de transferencia N.06.
- El día 16 de mayo se le pide al ingeniero residente la actualización del presupuesto y el alcance del convenio, además enviar programación de obra.
- El 22 de mayo se envía al banco la autorización de transferencia N.07.
- El 24 de mayo se inicia con el primer tramo de placa huella fundida.
- El 28 de mayo se envía al banco la autorización de transferencia N.08.
- El 30 de mayo se envía al banco la autorización de transferencia N.09.

3.2.2 EL LIBANO 4499

- El 4 de Mayo Se realiza un visita técnica con la social para dar a entender o aclarar las obligaciones de la Junta de Acción Comunal (JAC), con el fin de resolver cualquier duda que surja al respecto.
- El 3 de Mayo se realiza la instalación de la tubería de la alcantarilla de 36”.
- El 8 de mayo se realiza la fundición de un tramo de placa huella.
- El 17 de mayo se envía al banco la autorización de transferencia N.08.
- El 22 de mayo se envía al banco la autorización de transferencia N.09.

3.2.3 PEÑA BLANCA 4331

- En mayo se realiza la fundición de todo el tramo de la placa huella a construir donde se entrega un total de 170 metros lineales con cunetas y bordillos.
- El 15 de mayo se envía al banco la autorización de transferencia N.08 y N.09.
- El 16 de mayo se envía al banco la autorización de transferencia N.10
- El 17 de mayo se envía al banco la autorización de transferencia N.11.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se ha dado la necesidad de suscribir ítem no previsto en ninguno de los convenios.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01-31 de mayo de 2024, la información se relaciona en el Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA


4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan los informes semanales del periodo 1 al 31 de mayo de 2024, referentes a los convenios solidarios (El Ramal, El Libano y Peña Blanca), los cuales están determinados en los siguientes plazos:

- Informe Semanal 18-01/05/2024-05/05/2024
- Informe semanal 19-06/05/2024-12/05/2024
- Informe semanal 20-13/05/2024-19/05/2024
- Informe semanal 21-20/05/2024-26/05/2024
- Informe semanal 22-27/05/2024-31/05/2024

4.1.1 EL RAMAL 4806

- Informe Semanal 18-01/05/2024-05/05/2024

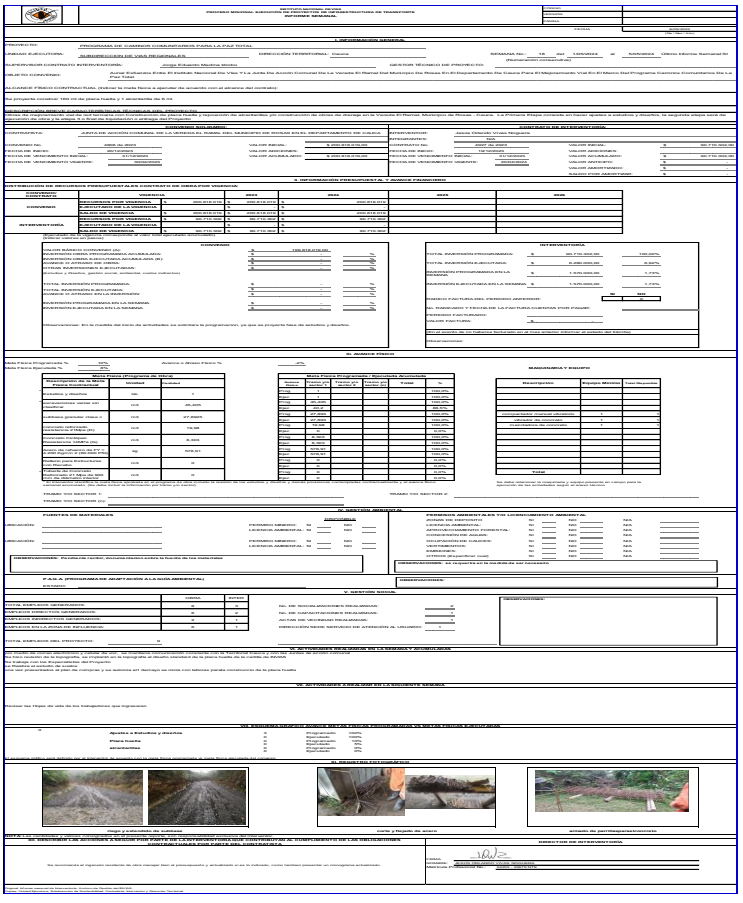

JESUS ORLANDO VIVAS NOGURA

Calle 2 Faroles N° 8 E 47
Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4927 DE 2023

No. Copias Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: junio 10 de 2024

- Informe semanal 19-06/05/2024-12/05/2024

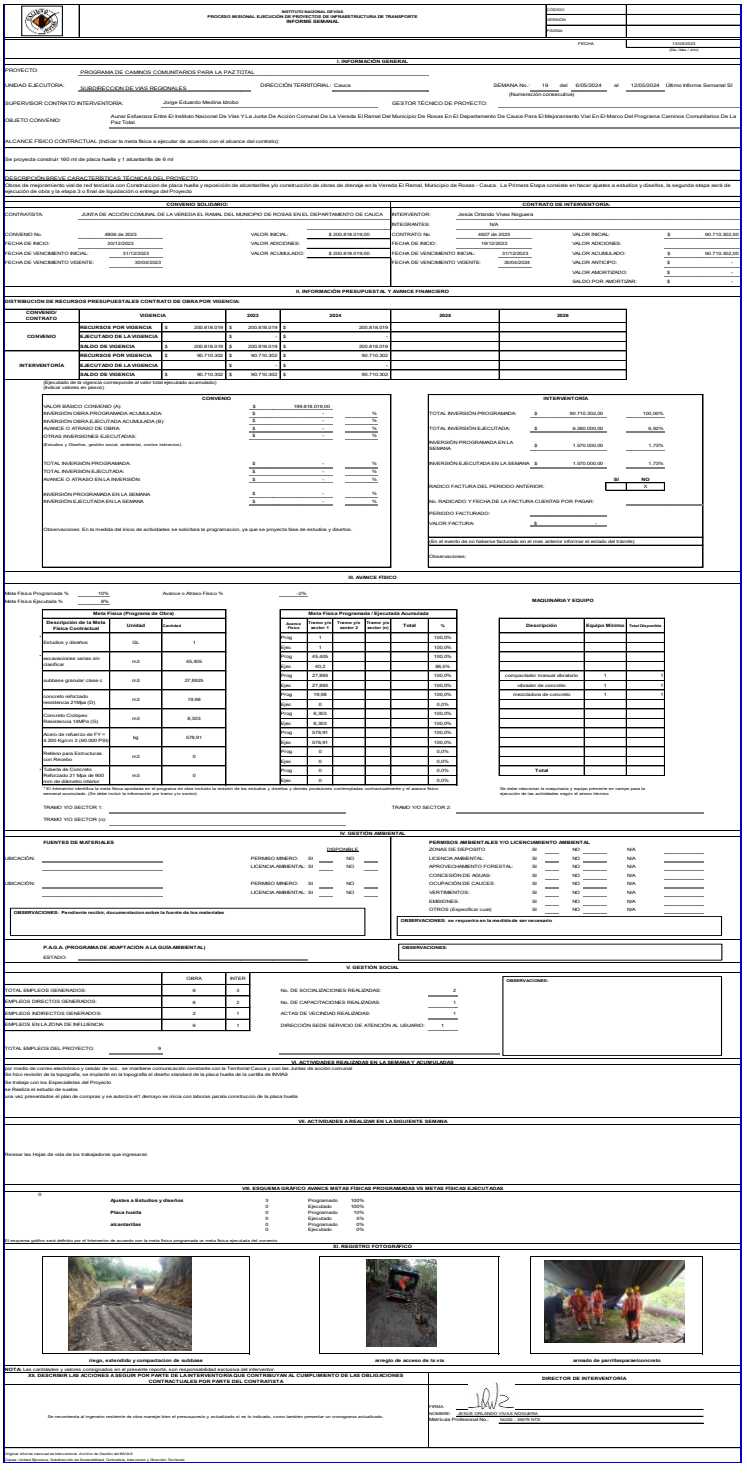

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO:
VERSIÓN:
PÁGINA:
FECHA: 13/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca — SEMANA No.: 19 del 6/05/2024 al 12/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Jorge Eduardo Medina Idrobo — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda El Ramal Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se proyecta construir 160 ml de placa huella y 1 alcantarilla de 6 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO:

Obras de mejoramiento vial de red terciaria con Construcción de placa huella y reposición de alcantarillas y/o construcción de obras de drenaje en la Vereda El Ramal, Municipio de Rosas - Cauca. La Primera Etapa consiste en hacer ajustes a estudios y diseños, la segunda etapa será de ejecución de obra y la etapa 3 o final de liquidación o entrega del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA	INTERVENTOR:	Jesus Orlando Vivas Noguera	
		INTEGRANTES:	N/A	
CONVENIO No.	4806 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.818.019,00	CONTRATO No. 4927 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 90.710.302,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.818.019,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 90.710.302,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
				VALOR AMORTIZADO: $ -
				SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.818.019	$ 200.818.019		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.818.019	$ 200.818.019		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.818.019,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 90.710.302,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.260.000,00	6,90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.570.000,00	1,73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.570.000,00	1,73%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10% — Avance o Atraso Físico %: -2%

Meta Física Ejecutada %: 8%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1
excavaciones varias sin clasificar	m3	45,405
subbase granular clase c	m3	27,8925
concreto reforzado resistencia 21Mpa (D)	m3	19,98
Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)	m3	8,303
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	578,91
Relleno para Estructuras con Recebo	m3	0
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m3	0

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	45,405				100,0%
Ejec	40,2				88,5%
Prog	27,893				100,0%
Ejec	27,893				100,0%
Prog	19,98				100,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	8,303				100,0%
Ejec	8,303				100,0%
Prog	578,91				100,0%
Ejec	578,91				100,0%
Prog	0				0,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	0				0,0%
Ejec	0				0,0%

* El Interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás previsiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal ejecutado. (De debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
compactador manual vibratorio	1	1
vibrador de concreto	1	1
mezcladora de concreto	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el avance técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Pendiente revisión, documentalmente sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.G.A.S. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

por medio de correo electrónico y celular de voz , se mantiene comunicación constante con la Territorial Cauca y con las Juntas de acción comunal
se hizo revisión de la topografía, se implanto en la topografía el diseño standard de la placa huella de la cartilla de INVIAS
se trabaja con los Especialistas del Proyecto
se Realiza el estudio de suelos
ese vez presentadas el plan de compras y se autoriza el1 derroyo se inicia con labores parata construccio de la placa huella

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisar las Hojas de vida de los trabajadores que ingresaran

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE MSITAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	3	Programado	100%
	0	Ejecutado	100%
Placa huella	0	Programado	10%
	0	Ejecutado	0%
alcantarillas	0	Programado	0%
	0	Ejecutado	0%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

riego, extensión y compactacion de subbase

arreglo de acceso de la via

armado de parrilla aparaconcreto

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe son de responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se recomienda al ingeniero residente de obra manejar bien el presupuesto y actualizarlo si es lo indicado, como tambien presentar un cronograma actualizado.


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54252 - 69676 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Consultoría, Interventor y Dirección Territorial.

JUAN CARLOS ANDRADE	JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ	APROBÓ

- Informe semanal 20-13/05/2024-19/05/2024

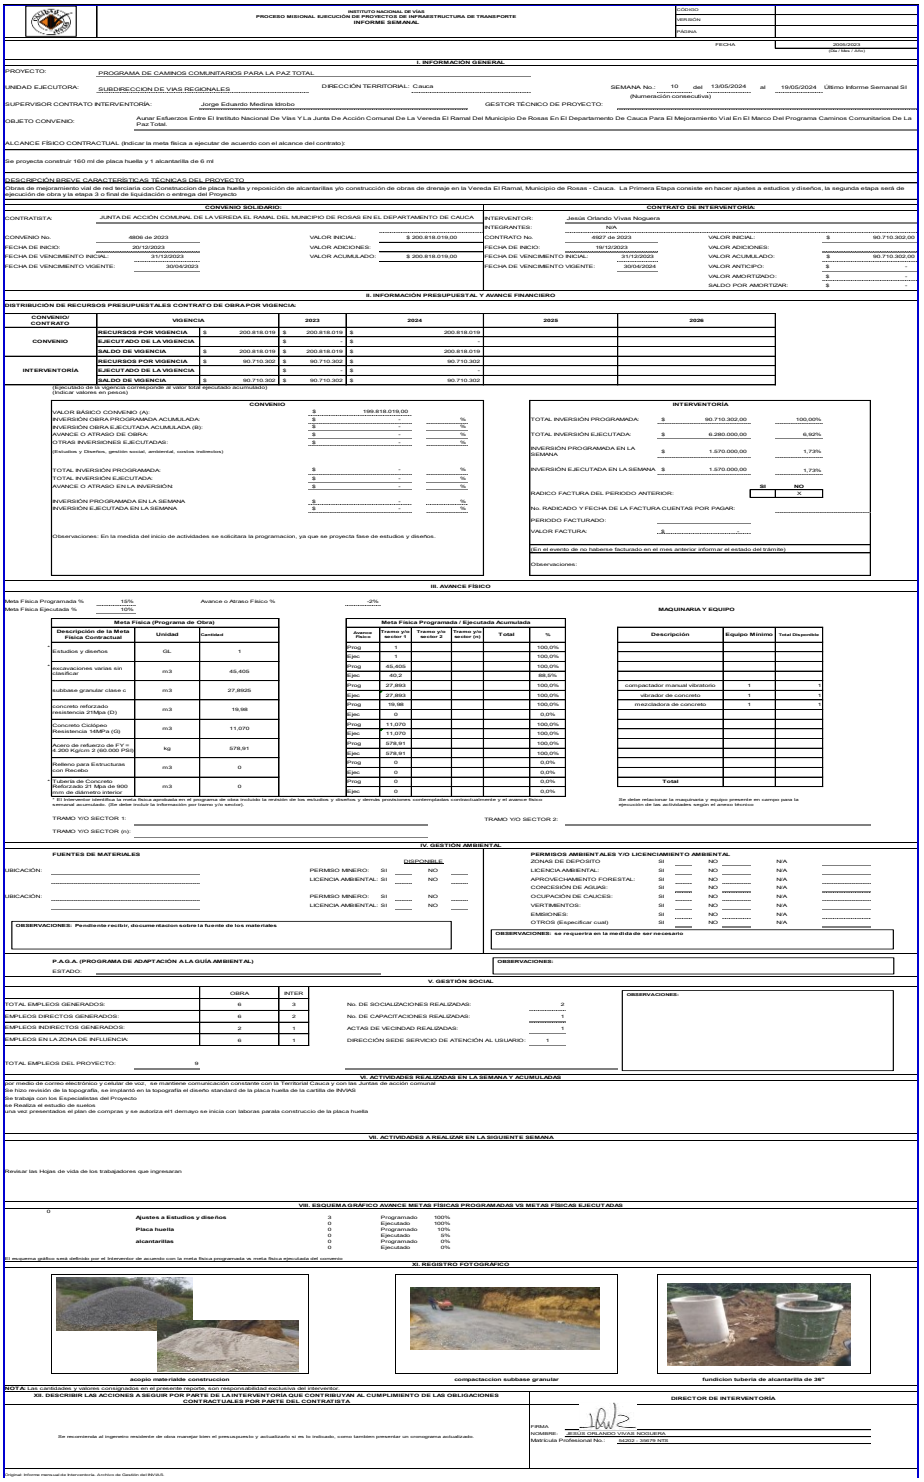

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA: 20/05/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca — SEMANA No.: 10 del 13/05/2024 al 19/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Jorge Eduardo Medina Idrobo — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda El Ramal Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se proyecta construir 160 ml de placa huella y 1 alcantarilla de 6 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Obras de mejoramiento vial de red terciaria con Construccion de placa huella y reposición de alcantarillas y/o construcción de obras de drenaje en la Vereda El Ramal, Municipio de Rosas - Cauca. La Primera Etapa consiste en hacer ajustes a estudios y diseños, la segunda etapa será de ejecución de obra y la etapa 3 o final de liquidación o entrega del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

CONVENIO No. 4806 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.818.019,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 — VALOR ADICIONES: -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.818.019,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: Jesús Orlando Vivas Noguera
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4927 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 90.710.302,00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 90.710.302,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.818.019	$ 200.818.019		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.818.019	$ 200.818.019		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302		

(Ejecutado de la vigencia correspondiente al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores sin pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.818.019,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 90.710.302,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.280.000,00	6,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.570.000,00	1,73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.570.000,00	1,73%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI / NO (X)
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 15% — Avance o Atraso Físico % -0%
Meta Física Ejecutada % 10%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1
excavaciones varias sin clasificar	m3	45,405
subbase granular clase c	m3	27,8925
concreto reforzado resistencia 21Mpa (D)	m3	19,98
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	11,070
Acero de refuerzo de FY= 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	578,91
Relleno para Estructuras con Recebo	m3	0
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m3	0

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	45,405				100,0%
Ejec	40,2				88,5%
Prog	27,893				100,0%
Ejec	27,893				100,0%
Prog	19,98				100,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	11,070				100,0%
Ejec	11,070				100,0%
Prog	578,91				100,0%
Ejec	578,91				100,0%
Prog	0				0,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	0				0,0%
Ejec	0				0,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
compactador manual vibratorio	1	1
vibrador de concreto	1	1
mezcladora de concreto	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

1. El Interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás procesos contemplados contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentación sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

por medio de correo electrónico y celular de voz , se mantiene comunicación constante con la Territorial Cauca y con las Juntas de acción comunal
Se hizo revisión de la topografía, se implantó en la topografía el diseño standard de la placa huella de la cartilla de INVÍAS
Se trabaja con los Especialistas del Proyecto
se Realiza el estudio de suelos
una vez presentados el plan de compras y se autoriza el desayo se inicia con labores para construccio de la placa huella

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisar las Hojas de vida de los trabajadores que ingresaran

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	3	Programado	100%
	0	Ejecutado	100%
Placa huella	0	Programado	10%
	0	Ejecutado	5%
alcantarillas	0	Programado	10%
	0	Ejecutado	0%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

acopio materialde construccion

compactaccion subbase granular

fundicion tuberia de alcantarilla de 36"

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA


Se recomienda al ingeniero residente de obra manejar bien el presupuesto y actualizarlo si es lo indicado, como tambien presentar un cronograma actualizado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202 - 54676 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

- Informe semanal 21-20/05/2024-26/05/2024

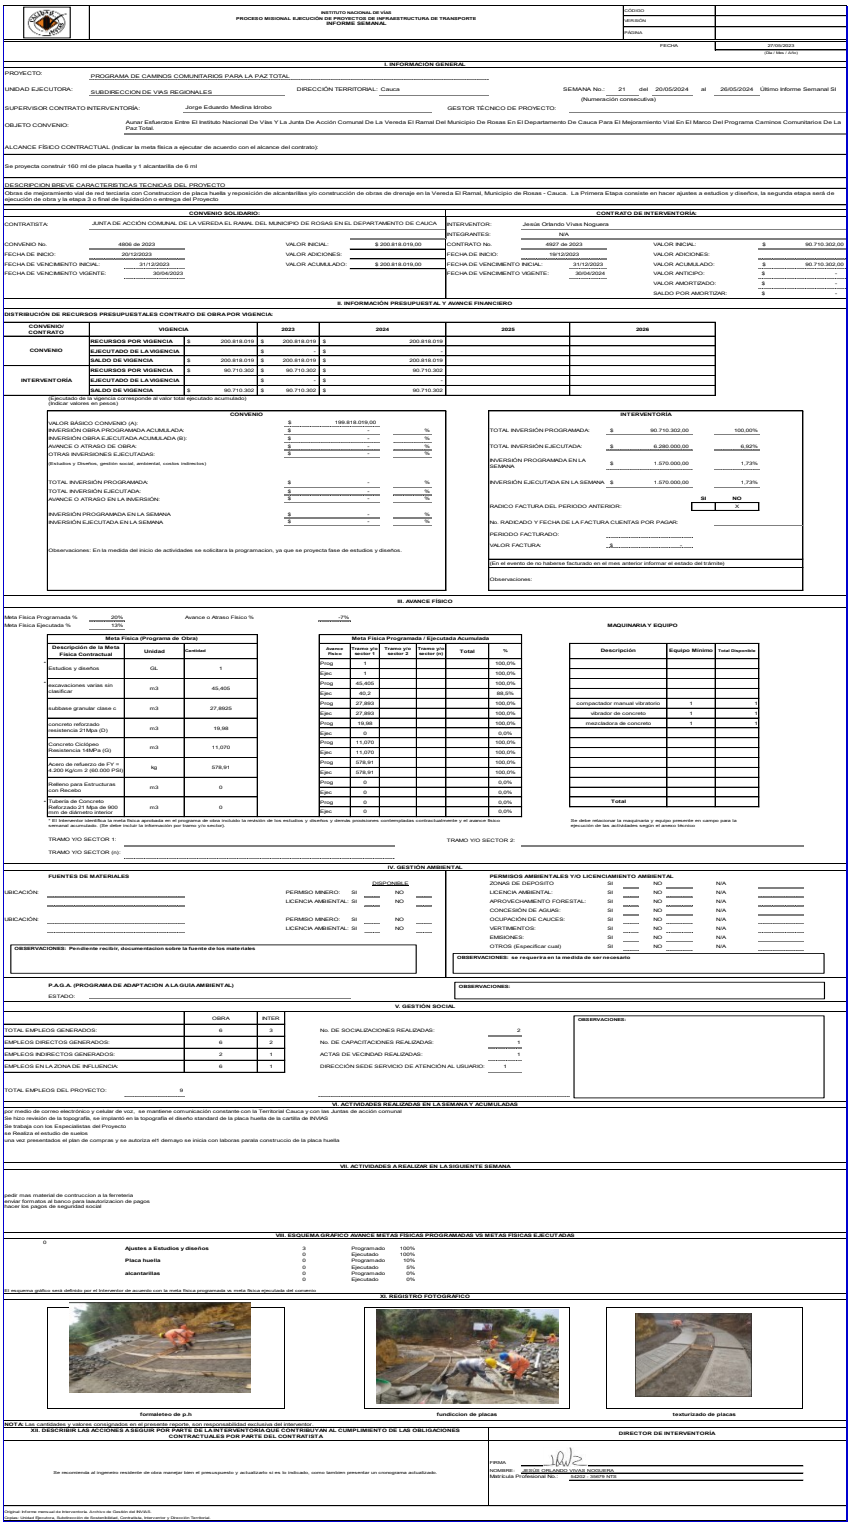

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | MISIÓN | PÁGINA | FECHA: 27/05/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca — SEMANA No.: 21 del 20/05/2024 al 26/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Jorge Eduardo Medina Idrobo — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda El Ramal Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se proyecta construir 160 ml de placa huella y 1 alcantarilla de 6 ml

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Obras de mejoramiento vial de red terciaria con Construccion de placa huella y reposición de alcantarillas y/o construcción de obras de drenaje en la Vereda El Ramal, Municipio de Rosas - Cauca. La Primera Etapa consiste en hacer ajustes a estudios y diseños, la segunda etapa será de ejecución de obra y la etapa 3 o final de liquidación o entrega del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
CONVENIO No. 4806 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.818.019,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 — VALOR ADICIONES: $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.818.019,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: Jesus Orlando Vivas Noguera
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4927 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 90.710.302,00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 90.710.302,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.818.019	$ 200.818.019		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.818.019	$ 200.818.019		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores sin pesos)

CONVENIO

VALOR BASICO CONVENIO (A):	$ 199.818.019,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 90.710.302,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.280.000,00	6,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.570.000,00	1,73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.570.000,00	1,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 20% — Avance o Atraso Físico % -7%
Meta Física Ejecutada % 13%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1
excavaciones varias sin clasificar	m3	45,405
subbase granular clase c	m3	27,8925
concreto reforzado resistencia 21Mpa (D)	m3	19,98
Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (D)	m3	11,070
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	578,91
Relleno para Estructuras con Recebo	m3	0
Tubería de Concreto Reforzado Clase C de 900 mm de diámetro interior	m3	0

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	45,405				100,0%
Ejec	40,2				88,5%
Prog	27,893				100,0%
Ejec	27,893				100,0%
Prog	19,98				100,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	11,070				100,0%
Ejec	11,070				100,0%
Prog	578,91				100,0%
Ejec	578,91				100,0%
Prog	0				0,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	0				0,0%
Ejec	0				0,0%

* El Interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás procesores contemplados contractualmente y el avance físico ejecutado acumulado. (De debe incluir la información por tramos y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
compactador manual vibratorio	1	1
vibrador de concreto	1	1
mezcladora de concreto	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segùn el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL SI NO — DISPONIBLE
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL SI NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

por medio de correo electrónico y celular de voz, se mantiene comunicación constante con la Territorial Cauca y con las Juntas de acción comunal
Se hizo revisión de la topografía, se implantó en la topografía el diseño standard de la placa huella de la cartilla de INVÍAS
Se trabaja con los Especialistas del Proyecto
se Realiza el estudio de suelos
una vez presentados el plan de compras y se autoriza el1 demayo se inicia con laboras parala construcio de la placa huella

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

pedir mas material de contruccion a la ferreteria
enviar formatos al banco para bautorizacion de pagos
hacer los pagos de seguridad social

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado	100%
	0	Ejecutado	100%
Placa huella	0	Programado	10%
	0	Ejecutado	5%
alcantarillas	0	Programado	0%
	0	Ejecutado	0%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

formaleteo de p.h

fundicion de placas

texturizado de placas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA


Se recomienda al ingeniero residente de obra manejar bien el presupuesto y actualizarlo si es lo indicado, como tambien presentar un cronograma actualizado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202 - 155679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe semanal 22-27/05/2024-31/05/2024

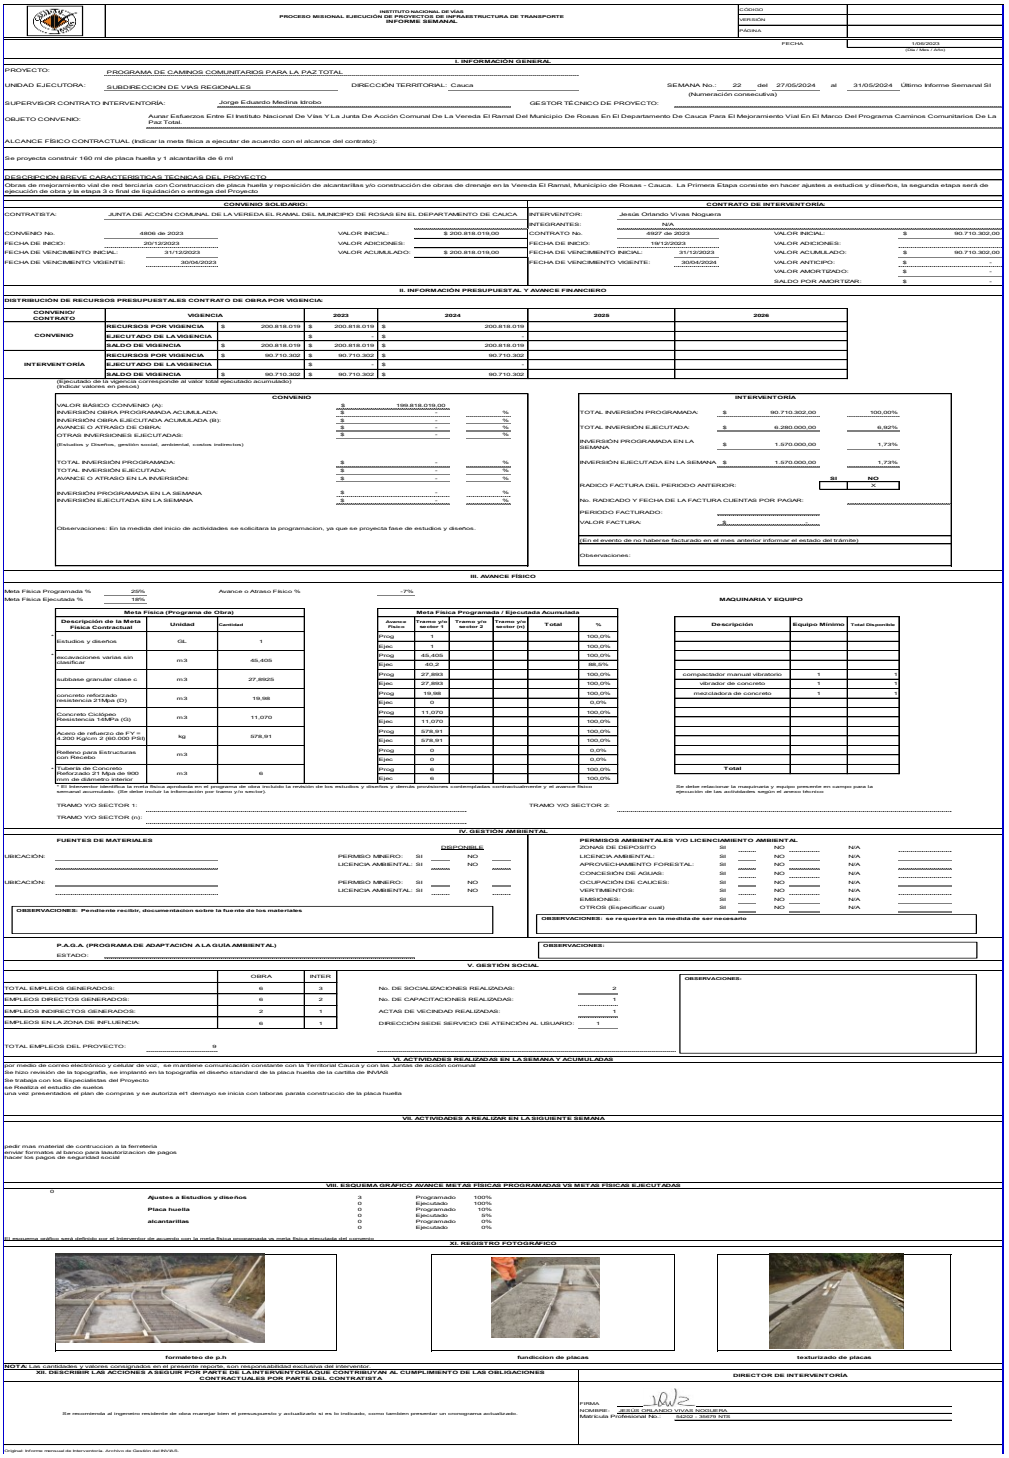

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO
VERSIÓN
PAGINA
FECHA: 14/06/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca — SEMANA No.: 22 del 27/05/2024 al 31/05/2024 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Jorge Eduardo Medina Idrobo — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda El Ramal Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se proyecta construir 160 ml de placa huella y 1 alcantarilla de 6 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Obras de mejoramiento vial de red terciaria con Construccion de placa huella y reposición de alcantarillas y/o construcción de obras de drenaje en la Vereda El Ramal, Municipio de Rosas - Cauca. La Primera Etapa consiste en hacer ajustes a estudios y diseños, la segunda etapa será de ejecución de obra y la etapa 3 o final de liquidación o entrega del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA	INTERVENTOR:	Jesús Orlando Vivas Noguera		
		INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	4806 de 2023	CONTRATO No.	4927 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 90.710.302,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 90.710.302,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR INICIAL:	$ 200.818.019,00			VALOR AMORTIZADO:	$ -
VALOR ADICIONES:	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200.818.019,00				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.818.019	$ 200.818.019	$ 200.818.019		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.818.019	$ 200.818.019	$ 200.818.019		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.818.019,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 90.710.302,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.280.000,00	6,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.570.000,00	1,73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.570.000,00	1,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 25% — Avance o Atraso Físico % -7%
Meta Física Ejecutada % 18%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1
excavaciones varias sin clasificar	m3	45,405
subbase granular clase c	m3	27,8925
concreto reforzado resistencia 21Mpa (f)	m3	19,98
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	11,070
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	579,91
Relleno para Estructuras con Recebo	m3	
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m3	6

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	45,405				100,0%
Ejec	40,2				88,5%
Prog	27,893				100,0%
Ejec	27,893				100,0%
Prog	19,98				100,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	11,070				100,0%
Ejec	11,070				100,0%
Prog	579,91				100,0%
Ejec	579,91				100,0%
Prog	0				0,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	6				100,0%
Ejec	6				100,0%

* El interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico correspondiente. (por favor incluir la información por tramo y/o sector)

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
compactador manual vibratorio	1	1
vibrador de concreto	1	1
mezcladora de concreto	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

por medio de correo electrónico y celular de voz , se mantiene comunicación constante con la Territorial Cauca y con las Juntas de acción comunal.
Se hizo revisión de la topografía, se implantó en la topografía el diseño standard de la placa huella de la cartilla de INVIAS
Se trabaja con los Especialistas del Proyecto
se Realiza el estudio de suelos
una vez presentados el plan de compras y se autoriza el1 demayo se inicia con labores parala construccio de la placa huella

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

pedir mas material de contruccion a la ferreteria
enviar formatos al banco para lasutorización de pagos
hacer los pagos de seguridad social

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	3	Programado	100%
	0	Ejecutado	100%
Placa huella	0	Programado	10%
	0	Ejecutado	5%
alcantarillas	0	Programado	0%
	0	Ejecutado	0%

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

formateteo de p.h

fundicion de placas

texturizado de placas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se recomienda al ingeniero residente de obra manejar bien el presupuesto y actualizarlo si es lo indicado, como tambien presentar un cronograma actualizado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202 - 36675 STS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS

JUAN CARLOS ANDRADE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

4.1.2 EL LIBANO 4499

- Informe Semanal 18-01/05/2024-05/05/2024

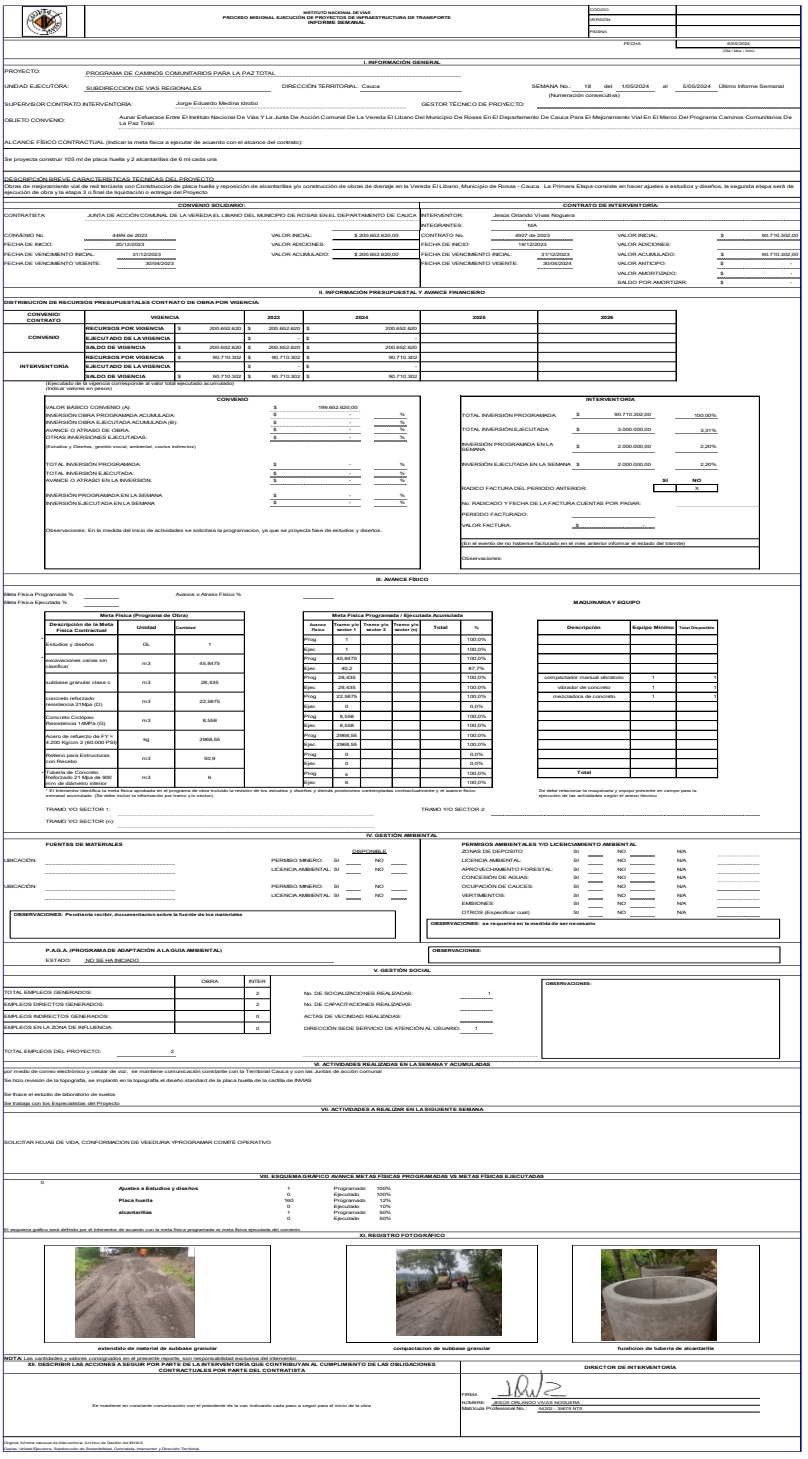

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA
FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca — SEMANA No.: 18 del 1/05/2024 al 5/05/2024 Ultimo Informe Semanal (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Jorge Eduardo Medina Idrobo — GESTOR TECNICO DE PROYECTO:
OBJETO CONVENIO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda El Líbano Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Se proyecta construir 105 ml de placa huella y 2 alcantarillas de 6 ml cada una
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL PROYECTO:
Obras de mejoramiento vial de red terciaria con Construccion de placa huella y reposición de alcantarillas y/o construcción de obras de drenaje en la Vereda El Líbano, Municipio de Rosas - Cauca. La Primera Etapa consiste en hacer ajustes a estudios y diseños, la segunda etapa será de ejecución de obra y la etapa 3 o final de liquidación o entrega del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA	INTERVENTOR:	Jesus Orlando Vivas Noguera	
		INTEGRANTES:	N/A	
CONVENIO No.	4499 de 2023	CONTRATO No.	4927 de 2023	VALOR INICIAL: $ 90.710.302,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 90.710.302,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR INICIAL:	$ 200.652.620,00			VALOR AMORTIZADO: $ -
VALOR ADICIONES:				SALDO POR AMORTIZAR: $ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200.652.620,00			

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.652.620	$ 200.652.620		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.652.620	$ 200.652.620		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.652.620,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 90.710.302,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.000.000,00	3,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 2.000.000,00	2,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 2.000.000,00	2,20%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ____ Avance o Atraso Físico %: ____
Meta Física Ejecutada %: ____

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1
excavaciones varias sin clasificar	m3	43,8475
subbase granular clase a	m3	28,435
concreto reforzado resistencia 21Mpa (D)	m3	22,5875
Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)	m3	8,558
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	2968,55
Relleno para Estructuras con Recebo	m3	50,9
Tuberia de Concreto Reforzado 21 Mpa de 360 mm de diámetro RDE	m3	6

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Física	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	43,8475				100,0%
Ejec	40,2				87,7%
Prog	28,435				100,0%
Ejec	28,435				100,0%
Prog	22,5875				100,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	8,558				100,0%
Ejec	8,558				100,0%
Prog	2968,55				100,0%
Ejec	2968,55				100,0%
Prog	0				0,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	6				100,0%
Ejec	6				100,0%

(En caso de no cumplir con la meta física ejecutada en el programa de obra incluida la revision de los estudios y diseños y demas posiciones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector)

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
compactador manual vibratorio	1	1
vibrador de concreto	1	1
mezcladora de concreto	1	1
Total		

En estas relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI ___ NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___ NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___ NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___ NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___ NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___ NO ___	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: NO SE HA INICIADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

por medio de correo electrónico y celular de voz, se mantiene comunicación constante con la Territorial Cauca y con las Juntas de acción comunal
Se hizo revisión de la topografía, se implantó en la topografía el diseño standard de la placa huella de la cartilla de INVIAS
Se trace el estudio de laboratorio de suelos
Se trabaja con los Especialistas del Proyecto

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SOLICITAR HOJAS DE VIDA, CONFORMACION DE VEEDURIA YPROGRAMAR COMITÉ OPERATIVO

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	1	Programado	100%
	0	Ejecutado	100%
Placa huella	160	Programado	12%
	0	Ejecutado	10%
alcantarillas	1	Programado	50%
	0	Ejecutado	50%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

estendido de material de subbase granular

compactacion de subbase granular

fundicion de tuberia de alcantarilla

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se mantiene en constante comunicación con el presidente de la asc indicando cada paso a seguir para el inicio de la obra


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGURA
Matrícula Profesional No.: 54202 - 35879 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Responsabilidad, Contraloría, Intervención y Dirección Territorial.

JESUS ORLANDO VIVAS NOGURA Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4927 DE 2023	No. Copias Impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: junio 10 de 2024

- Informe semanal 19-06/05/2024-12/05/2024

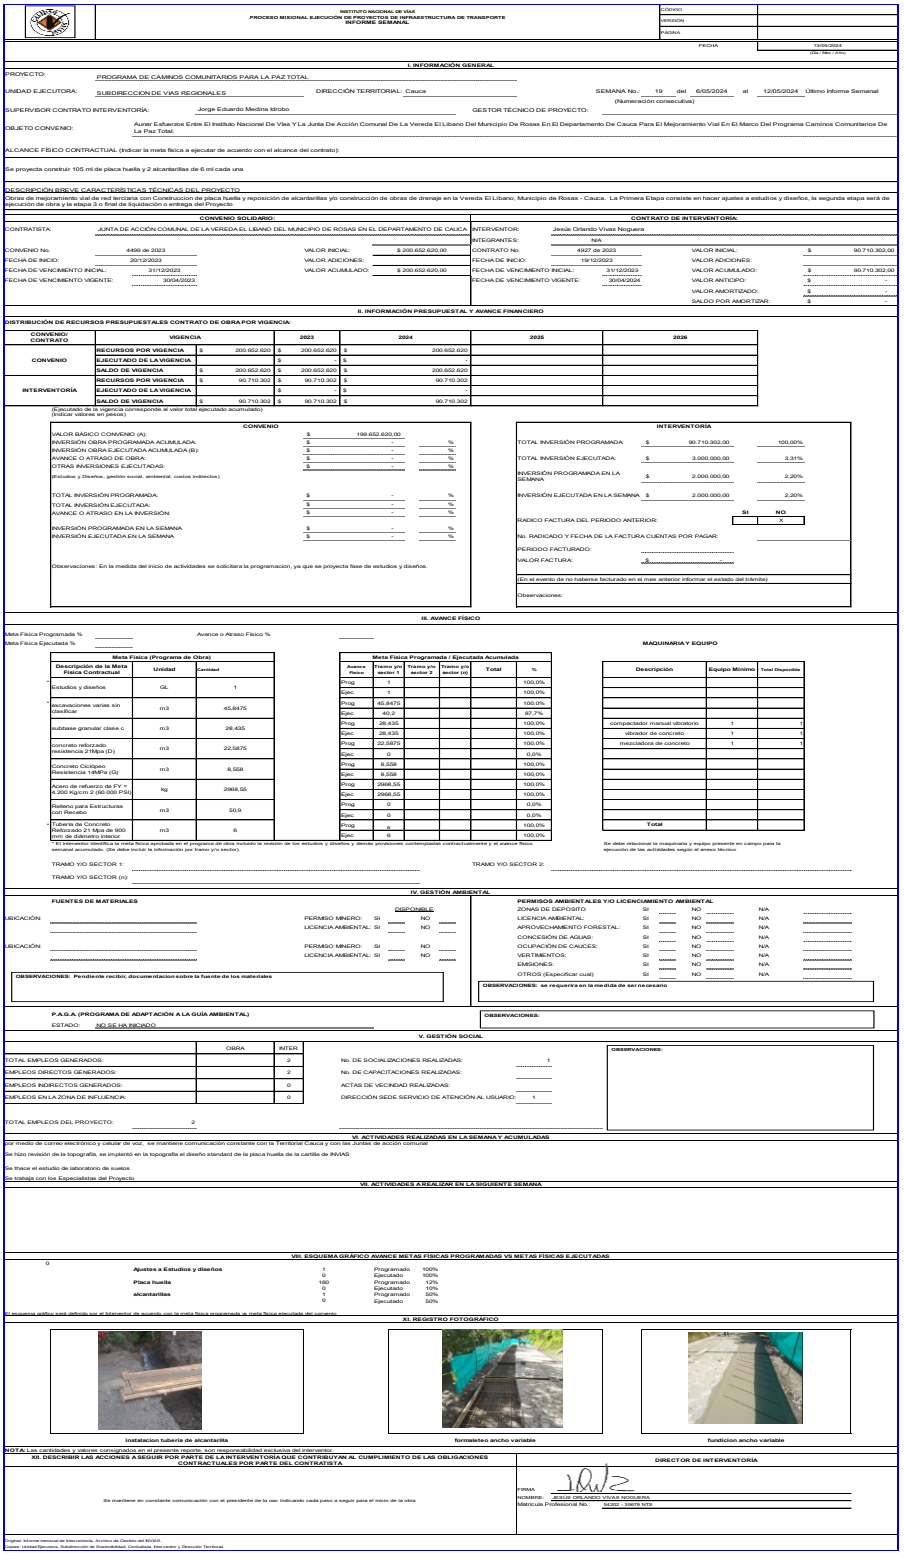

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO
VERSIÓN
PÁGINA
FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca — SEMANA No.: 19 del 6/05/2024 al 12/05/2024 Ultimo Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Jorge Eduardo Medina Idrobo — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda El Líbano Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se proyecta construir 105 ml de placa huella y 2 alcantarillas de 6 ml cada una

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Obras de mejoramiento vial de red terciaria con Construccion de placa huella y reposición de alcantarillas y/o construcción de obras de drenaje en la Vereda El Libano, Municipio de Rosas - Cauca. La Primera Etapa consiste en hacer ajustes a estudios y diseños, la segunda etapa será de ejecución de obra y la etapa 3 o final de liquidación o entrega del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA			INTERVENTOR:	Jesús Orlando Vivas Noguera		
				INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	4499 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.652.620,00	CONTRATO No.	4927 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 90.710.302,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	-	FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.652.620,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 90.710.302,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2023			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.652.620	$ 200.652.620	$ 200.652.620	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.652.620	$ 200.652.620	$ 200.652.620	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.652.620,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 90.710.302,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.000.000,00	3,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 2.000.000,00	2,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 2.000.000,00	2,20%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1
excavaciones varias sin clasificar	m3	45,8475
subbase granular clase c	m3	28,435
concreto reforzado resistencia 21Mpa (D)	m3	22,5875
Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)	m3	8,558
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	2968,55
Relleno para Estructuras con Recebo	m3	50,9
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m3	6

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	45,8475				100,0%
Ejec	40,2				87,7%
Prog	28,435				100,0%
Ejec	28,435				100,0%
Prog	22,5875				100,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	8,558				100,0%
Ejec	8,558				100,0%
Prog	2968,55				100,0%
Ejec	2968,55				100,0%
Prog	0				0,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	6				100,0%
Ejec	0				100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
compactador manual vibratorio	1	1
vibrador de concreto	1	1
mezcladora de concreto	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

(*) El Interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: NO SE HA INICIADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Por medio de correo electrónico y celular de vial, se mantiene comunicación constante con la Territorial Cauca y con las Juntas de acción comunal
Se hizo revisión de la topografía, se implantó en la topografía el diseño standard de la placa huella de la cartilla de INVIAS
Se hace el estudio de laboratorio de suelos
Se trabaja con los Especialistas del Proyecto

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	1	Programado	100%
	0	Ejecutado	100%
Placa huella	160	Programado	12%
	0	Ejecutado	10%
alcantarillas	1	Programado	50%
	0	Ejecutado	50%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del numeral

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

instalacion tubería de alcantarilla — formaleteo ancho variable — fundicion ancho variable

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se mantiene en constante comunicación con el presidente de la vac indicando cada paso a seguir para el inicio de la obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA:
NOMBRE: JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202 - 158476 NTS

Original: informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JUAN CARLOS ANDRADE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

JESUS ORLANDO VIVAS NOGURA Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4927 DE 2023	No. Copias Impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: junio 10 de 2024

- Informe semanal 20-13/05/2024-19/05/2024

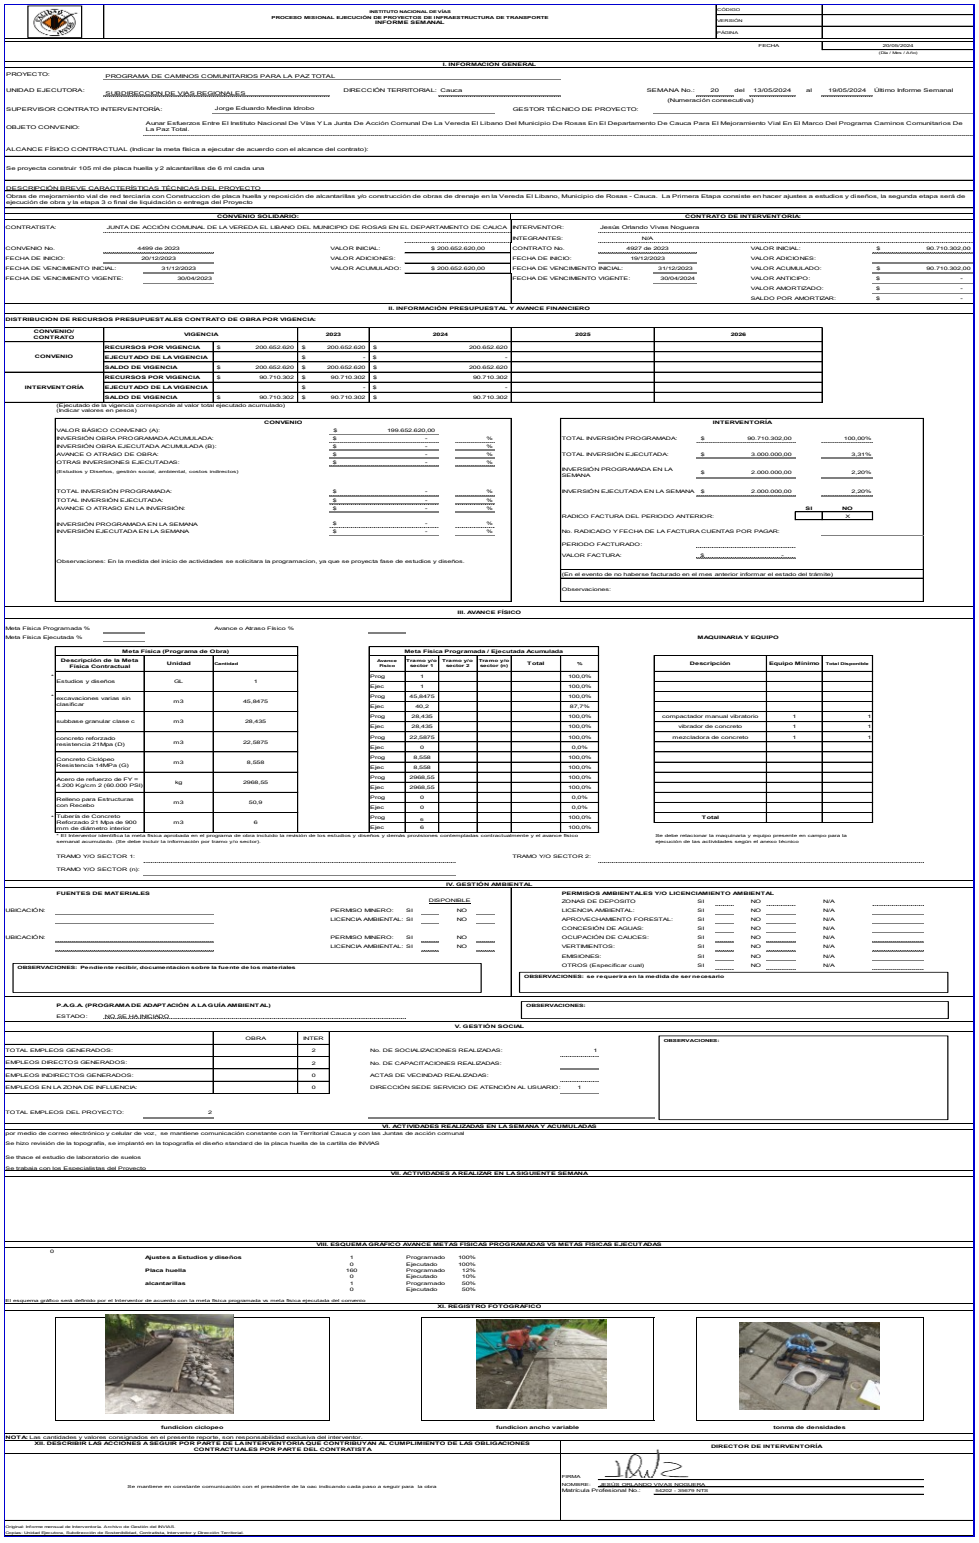

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA: 20/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca | SEMANA No.: 20 del 13/05/2024 al 19/05/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Jorge Eduardo Medina Idrobo | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda El Líbano Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se proyecta construir 105 ml de placa huella y 2 alcantarillas de 6 ml cada una

DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Obras de mejoramiento vial de red terciaria con Construccion de placa huella y reposición de alcantarillas y/o construcción de obras de drenaje en la Vereda El Libano, Municipio de Rosas - Cauca. La Primera Etapa consiste en hacer ajustes a estudios y diseños, la segunda etapa será de ejecución de obra y la etapa 3 o final de liquidación o entrega del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA	INTERVENTOR:	Jesús Orlando Vivas Noguera
		INTEGRANTES:	N/A
CONVENIO No.	4499 de 2023	CONTRATO No.	4927 de 2023
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024
VALOR INICIAL:	$ 200.652.620,00	VALOR INICIAL:	$ 90.710.302,00
VALOR ADICIONES:		VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 200.652.620,00	VALOR ACUMULADO:	$ 90.710.302,00
		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.652.620	$ 200.652.620	$ 200.652.620		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.652.620	$ 200.652.620	$ 200.652.620		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.652.620,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 90.710.302,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.000.000,00	3,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	2,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	2,20%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: | Meta Física Ejecutada %: | Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1
excavaciones varias sin clasificar	m3	45,8475
subbase granular clase c	m3	28,435
concreto reforzado resistencia 21Mpa (G)	m3	22,5875
Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)	m3	8,558
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	2968,55
Relleno para Estructuras con Recebo	m3	50,9
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m3	6

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	45,8475				100,0%
Ejec	40,2				87,7%
Prog	28,435				100,0%
Ejec	28,435				100,0%
Prog	22,5875				100,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	8,558				100,0%
Ejec	8,558				100,0%
Prog	2968,55				100,0%
Ejec	2968,55				100,0%
Prog	0				0,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	6				100,0%
Ejec	6				100,0%

* El Interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluido la relación de los estudios y diseños y demás prestaciones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (No debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
compactador manual vibratorio	1	1
vibrador de concreto	1	1
mezcladora de concreto	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO SE HA INICIADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

por medio de correo electrónico y celular de voz , se mantiene comunicación constante con la Territorial Cauca y con las Juntas de acción comunal
Se hizo revisión de la topografía, se implantó en la topografía el diseño standard de la placa huella de la cartilla de INVAS
Se thace el estudio de laboratorio de suelos
Se trabaja con los Especialistas del Proyecto

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

fundicion ciclopeo

fundicion ancho variable

tomma de densidades

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se mantiene en constante comunicación con el presidente de la oac indicando cada paso a seguir para la obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202 - 39679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JUAN CARLOS ANDRADE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

JESUS ORLANDO VIVAS NOGURA Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4927 DE 2023	No. Copias Impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: junio 10 de 2024

- Informe semanal 21-20/05/2024-26/05/2024

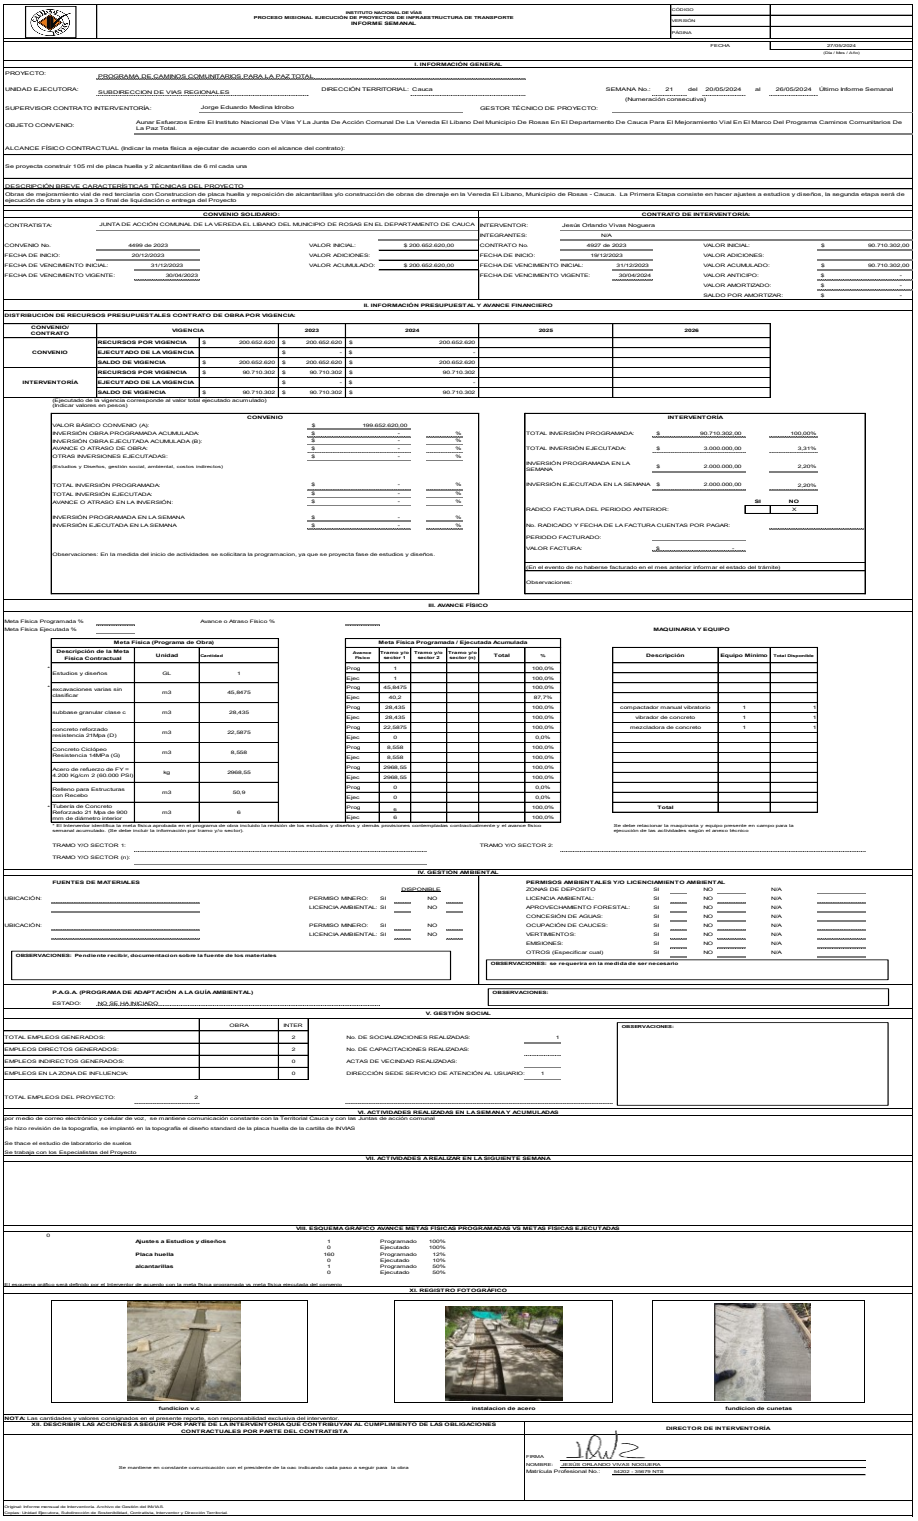

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA
FECHA: 27/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca — SEMANA No.: 21 del 20/05/2024 al 26/05/2024 Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Jorge Eduardo Medina Idrobo — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:
OBJETO CONVENIO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda El Líbano Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Se proyecta construir 105 ml de placa huella y 2 alcantarillas de 6 ml cada una

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
Obras de mejoramiento vial de red terciaria con Construccion de placa huella y reposición de alcantarillas y/o construcción de obras de drenaje en la Vereda El Líbano, Municipio de Rosas - Cauca. La Primera Etapa consiste en hacer ajustes a estudios y diseños, la segunda etapa será de ejecución de obra y la etapa 3 o final de liquidación o entrega del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA	INTERVENTOR:	Jesús Orlando Vivas Noguera		
		INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	4499 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.652.620,00	CONTRATO No.	4927 de 2023
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	-	FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.652.620,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2023			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024

VALOR INICIAL:	$ 90.710.302,00
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 90.710.302,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.652.620	$ 200.652.620	$ 200.652.620		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.652.620	$ 200.652.620	$ 200.652.620		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.652.620,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 90.710.302,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.000.000,00	3,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	2,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	2,20%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ..... Avance o Atraso Físico %: .....
Meta Física Ejecutada %: .....

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1
excavaciones varias sin clasificar	m3	45,8475
subbase granular clase c	m3	28,435
concreto reforzado resistencia 21Mpa (D)	m3	22,5875
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	8,559
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	2968,55
Relleno para Estructuras con Recebo	m3	50,9
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m3	6

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	45,8475				100,0%
Ejec	40,2				87,7%
Prog	28,435				100,0%
Ejec	28,435				100,0%
Prog	22,5875				100,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	8,559				100,0%
Ejec	8,559				100,0%
Prog	2968,55				100,0%
Ejec	2968,55				100,0%
Prog	0				0,0%
Ejec	0				0,0%
Prog	6				100,0%
Ejec	6				100,0%

El Interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás procedentes contemplados contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector)

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....
TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
compactador manual vibratorio	1	1
vibrador de concreto	1	1
mezcladora de concreto	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: NO SE HA INICIADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

por medio de correo electrónico y celular de voz, se mantiene comunicación constante con la Territorial Cauca y con las Juntas de acción comunal
Se hizo revisión de la topografía, se implantó en la topografía el diseño standard de la placa huella de la cartilla de INVAS
Se trace el estudio de laboratorio de suelos
Se trabaja con los Especialistas del Proyecto

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	1	Programado	100%
	0	Ejecutado	100%
Placa huella	160	Programado	12%
	0	Ejecutado	10%
alcantarillas	1	Programado	50%
	0	Ejecutado	50%

El esquema grafico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física presentada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

fundicion v.c

instalacion de acero

fundicion de cunetas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se mantiene en constante comunicación con el presidente de la oac indicando cada paso a seguir para la obra


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202 - 336176 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Gerencia, Interventor y Dirección Territorial.

JUAN CARLOS ANDRADE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

- Informe semanal 22-27/05/2024-31/05/2024

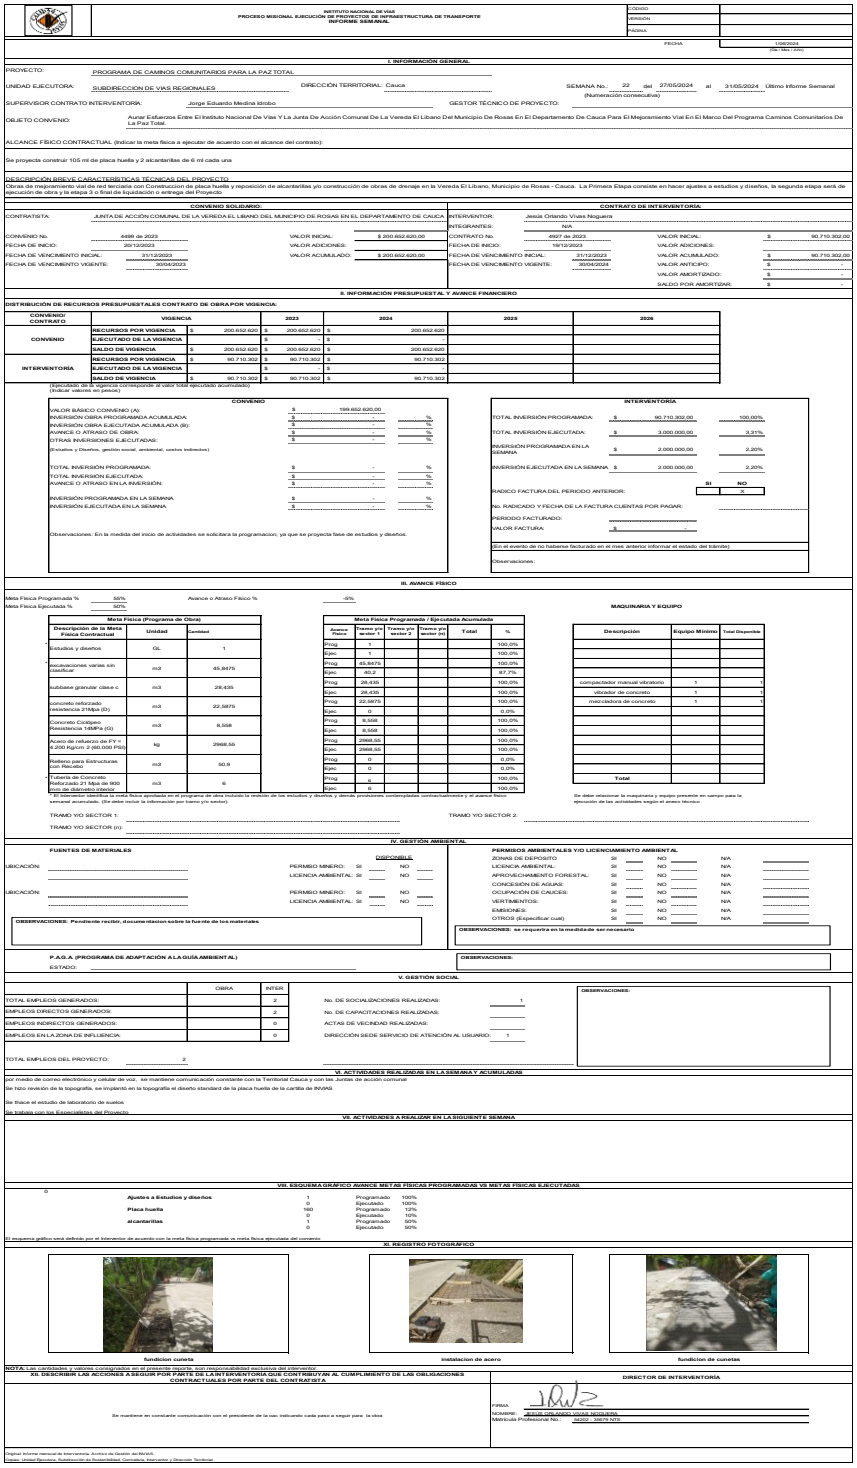

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA: 1/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca | SEMANA No.: 22 del 27/05/2024 al 31/05/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Jorge Eduardo Medina Idrobo | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda El Líbano Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se proyecta construir 105 ml de placa huella y 2 alcantarillas de 6 ml cada una

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Obras de mejoramiento vial de red terciaria con Construccion de placa huela y reposición de alcantarillas y/o construcción de obras de drenaje en la Vereda El Libano, Municipio de Rosas - Cauca. La Primera Etapa consiste en hacer ajustes a estudios y diseños, la segunda etapa será de ejecución de obra y la etapa 3 o final de liquidación o entrega del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA		INTERVENTOR:	Jesús Orlando Vivas Noguera	
			INTEGRANTES:	N/A	
CONVENIO No.	4499 de 2023	VALOR INICIAL: $ 200.652.620,00	CONTRATO No.	4927 de 2023	VALOR INICIAL: $ 90.710.302,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 200.652.620,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 90.710.302,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.652.620	$ 200.652.620		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.652.620	$ 200.652.620		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BASICO CONVENIO (A):	$ 199.652.620,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 90.710.302,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.000.000,00	3,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	2,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	2,20%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 55% | Avance o Atraso Físico % -5%

Meta Física Ejecutada % 50%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1
excavaciones varias sin clasificar	m3	45,8475
subbase granular clase a	m3	28,435
concreto reforzado resistencia 21Mpa (D)	m3	22,5875
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	8,558
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	2968,55
Relleno para Estructuras con Recebo	m3	50,9
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m3	6

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	1				100,0%
Ejec.	1				100,0%
Prog.	45,8475				100,0%
Ejec.	40,2				87,7%
Prog.	28,435				100,0%
Ejec.	28,435				100,0%
Prog.	22,5875				100,0%
Ejec.	0				0,0%
Prog.	8,558				100,0%
Ejec.	8,558				100,0%
Prog.	2968,55				100,0%
Ejec.	2968,55				100,0%
Prog.	0				0,0%
Ejec.	0				0,0%
Prog.	6				100,0%
Ejec.	6				100,0%

El Interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra indicada la ejecución de los estudios y diseños y demás procesos contemplados contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
compactador manual vibratorio	1	1
vibrador de concreto	1	1
mezcladora de concreto	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medidad de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

por medio de correo electrónico y celular de voz, se mantiene comunicación constante con te Territorial Cauca y con las juntas de acción comunal

se hizo revisión de la topografía, se implantó en la topografía el diseño standard de la placa huella de la cartilla de INVIAS

Se hace el estudio de laboratorio de suelos

Se trabaja con los Especialistas del Proyecto

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

fundicion cuneta

instalacion de acero

fundicion de cunetas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se mantiene en constante comunicación con el presidente de la oac indicando cada paso a seguir para la obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:


NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Matrícula Profesional No.: 54202 - 39679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.1.3 PEÑA BLANCA 4331

- Informe Semanal 18-01/05/2024-05/05/2024

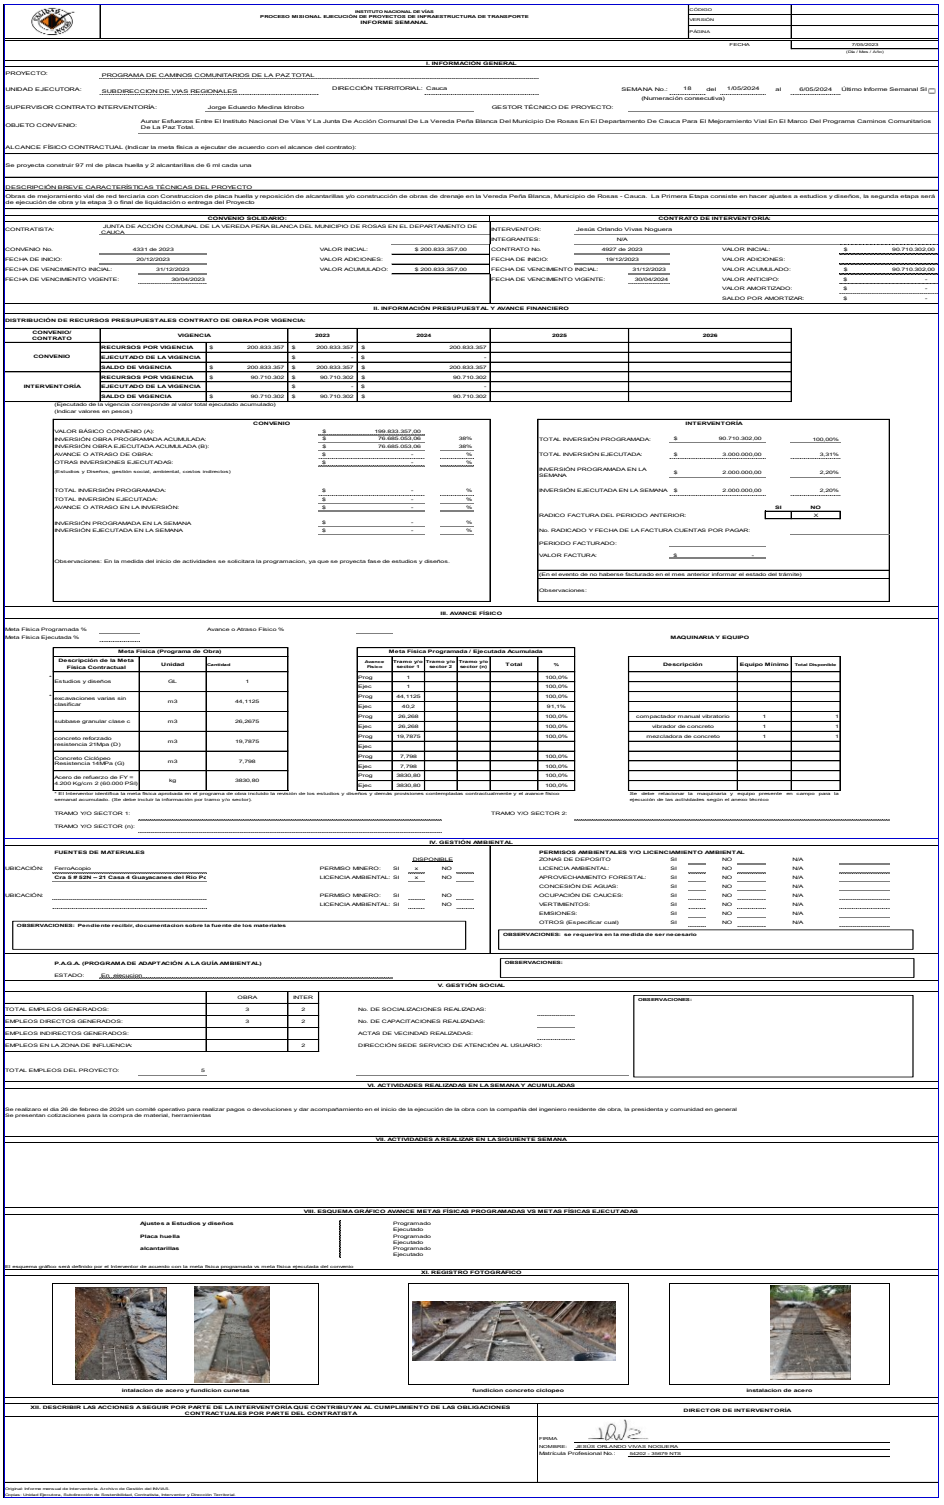

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA: 7/05/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca — SEMANA No.: 18 del 1/05/2024 al 6/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Jorge Eduardo Medina Idrobo — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda Peña Blanca Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se proyecta construir 97 ml de placa huella y 2 alcantarillas de 6 ml cada una

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Obras de mejoramiento vial de red terciaria con Construccion de placa huella y reposición de alcantarillas y/o construcción de obras de drenaje en la Vereda Peña Blanca, Municipio de Rosas - Cauca. La Primera Etapa consiste en hacer ajustes a estudios y diseños, la segunda etapa será de ejecución de obra y la etapa 3 o final de liquidación o entrega del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

CONVENIO No.: 4331 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.833.357,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 — VALOR ADICIONES: -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.833.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTOR: Jesús Orlando Vivas Noguera
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: 4927 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 90.710.302,00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 90.710.302,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.833.357	$ 200.833.357	$ 200.833.357		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.833.357	$ 200.833.357	$ 200.833.357		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.833.357,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 76.685.053,06	38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 76.685.053,06	38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 90.710.302,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.000.000,00	3,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 2.000.000,00	2,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	2,20%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1
excavaciones varias sin clasificar	m3	44,1125
subbase granular clase c	m3	26,2675
concreto reforzado resistencia 21Mpa (D)	m3	19,7875
Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)	m3	7,798
Acero de refuerzo de FY = 6.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	3930,80

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	44,1125				100,0%
Ejec	40,2				91,1%
Prog	26,268				100,0%
Ejec	26,268				100,0%
Prog	19,7875				100,0%
Ejec	-				
Prog	7,798				100,0%
Ejec	7,798				100,0%
Prog	3930,80				100,0%
Ejec	3930,80				100,0%

* El Interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra (incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector)

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
compactador manual vibratorio	1	1
vibrador de concreto	1	1
mezcladora de concreto	1	1

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	FerroAcopio Cra 5 # 52N – 21 Casa 4 Guayacanes del Rio Pc	PERMISO MINERO: SI	x NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	x NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES: se requeriria en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En ejecucion

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaro el dia 26 de febrero de 2024 un comité operativo para realizar pagos o devoluciones y dar acompañamiento en el inicio de la ejecución de la obra con la compañía del ingeniero residente de obra, la presidenta y comunidad en general
Se presentan cotizaciones para la compra de material, herramientas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	Programado	
	Ejecutado	
Placa huella	Programado	
	Ejecutado	
alcantarillas	Programado	
	Ejecutado	

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

instalacion de acero y fundicion cunetas

fundicion concreto ciclopeo

instalacion de acero

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202 - 33675 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JESUS ORLANDO VIVAS NOGURA Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4927 DE 2023	No. Copias Impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: junio 10 de 2024

- Informe semanal 19-06/05/2024-12/05/2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA: 13/05/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca — SEMANA No.: 19 del 6/05/2024 al 12/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Jorge Eduardo Medina Idrobo — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vias Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda Peña Blanca Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se proyecta construir 97 ml de placa huella y 2 alcantarillas de 6 ml cada una

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Obras de mejoramiento vial de red terciaria con Construccion de placa huella y reposición de alcantarillas y/o construcción de obras de drenaje en la Vereda Peña Blanca, Municipio de Rosas - Cauca. La Primera Etapa consiste en hacer ajustes a estudios y diseños, la segunda etapa será de ejecución de obra y la etapa 3 o final de liquidación o entrega del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

CONVENIO No.	4331 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.833.357,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.833.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2023		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	Jesús Orlando Vivas Noguera		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4927 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 90.710.302,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 90.710.302,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.833.357	$ 200.833.357	$ 200.833.357		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.833.357	$ 200.833.357	$ 200.833.357		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.833.357,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 76.685.053,06	38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 76.685.053,06	38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestion social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 90.710.302,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.000.000,00	3,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	2,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	2,20%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1
excavaciones varias sin clasificar	m3	44,1125
subbase granular clase c	m3	26,2675
concreto reforzado resistencia 21Mpa (D)	m3	19,7875
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	7,798
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	3830,80

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	44,1125				100,0%
Ejec	40,2				91,1%
Prog	26,268				100,0%
Ejec	26,268				100,0%
Prog	19,7875				100,0%
Ejec					
Prog	7,798				100,0%
Ejec	7,798				100,0%
Prog	3830,80				100,0%
Ejec	3830,80				100,0%

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la relación de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector)

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
compactador manual vibratorio	1	1
vibrador de concreto	1	1
mezcladora de concreto	1	1

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: FerroAcopio	PERMISO MINERO:	SI x	NO
Cra 5 # 52N – 21 Casa 4 Guayacanes del Rio Pc	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En ejecución

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaro el dia 26 de febreo de 2024 un comité operativo para realizar pagos o devoluciones y dar acompañamiento en el inicio de la ejecución de la obra con la compañia del ingeniero residente de obra, la presidenta y comunidad en general
Se presentan cotizaciones para la compra de material, herramientas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	Programado
	Ejecutado
Placa huella	Programado
	Ejecutado
alcantarillas	Programado
	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Intalacion de acero y fundicion cunetas



fundicion concreto ciclopeo



instalacion de acero

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202 - 33679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JUAN CARLOS ANDRADE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

- Informe semanal 20-13/05/2024-19/05/2024

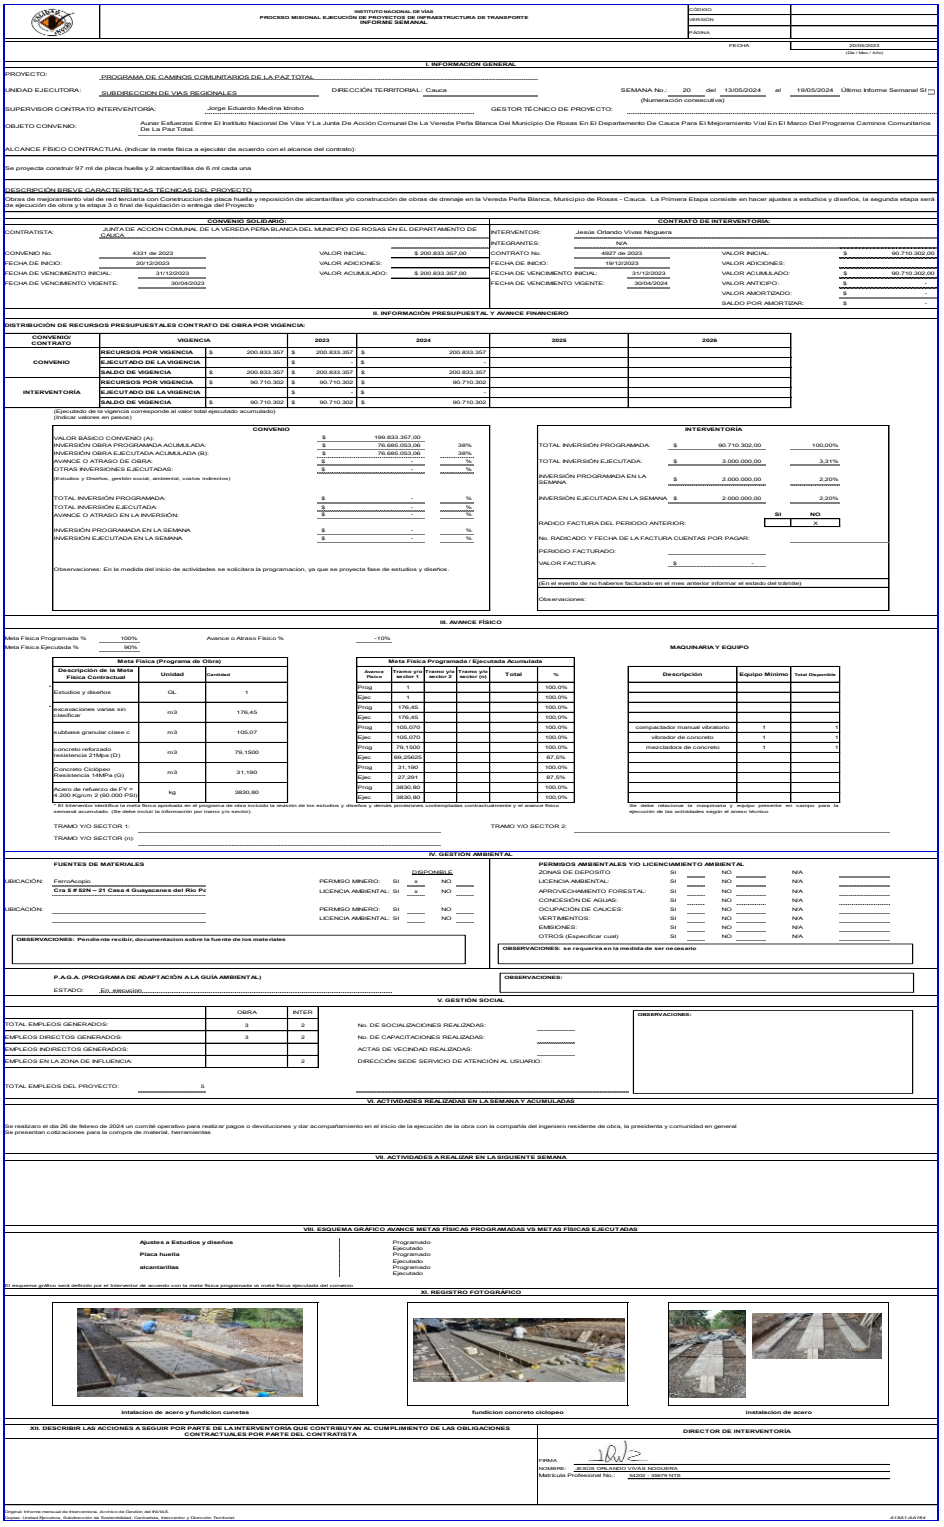

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA
FECHA: 20/05/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca — SEMANA No.: 20 del 13/05/2024 al 19/05/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI [ ]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Jorge Eduardo Medina Idrobo — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vias Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda Peña Blanca Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se proyecta construir 97 ml de placa huella y 2 alcantarillas de 6 ml cada una

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Obras de mejoramiento vial de red terciaria con Construccion de placa huella y reposición de alcantarillas y/o construcción de obras de drenaje en la Vereda Peña Blanca, Municipio de Rosas - Cauca. La Primera Etapa consiste en hacer ajustes a estudios y diseños, la segunda etapa será de ejecución de obra y la etapa 3 o final de liquidación o entrega del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

CONVENIO No.	4331 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.833.357,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.833.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2023		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: Jesús Orlando Vivas Noguera
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.	4927 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 90.710.302,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 90.710.302,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	-
		VALOR AMORTIZADO:	-
		SALDO POR AMORTIZAR:	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.833.357	$ 200.833.357	$ 200.833.357		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.833.357	$ 200.833.357	$ 200.833.357		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.833.357,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 76.685.053,06	38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 76.685.053,06	38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 90.710.302,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.000.000,00	3,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 2.000.000,00	2,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	2,20%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100% — Avance o Atraso Físico %: -10%
Meta Física Ejecutada %: 90%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1
excavaciones varias sin clasificar	m3	176,45
subbase granular clase c	m3	105,07
concreto reforzado resistencia 21Mpa (D)	m3	79,1500
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	31,190
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	3830,80

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1			-	100,0%
Ejec	1			-	100,0%
Prog	176,45			-	100,0%
Ejec	176,45			-	100,0%
Prog	105,070			-	100,0%
Ejec	105,070			-	100,0%
Prog	79,1500			-	100,0%
Ejec	69,25625			-	87,5%
Prog	31,190			-	100,0%
Ejec	27,291			-	87,5%
Prog	3830,80			-	100,0%
Ejec	3830,80			-	100,0%

El Interventor identifica la meta física apoderada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
compactador manual vibratorio	1	1
vibrador de concreto	1	1
mezcladora de concreto	1	1

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	FerroAcopio	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Cra 9 # 02N – 21 Casa 4 Guayacanes del Río Pamplonita	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requeriria en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En ejecución

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaro el dia 26 de febreo de 2024 un comité operativo para realizar pagos o devoluciones y dar acompañamiento en el inicio de la ejecución de la obra con la compañía del ingeniero residente de obra, la presidenta y comunidad en general
Se presentan cotizaciones para la compra de material, herramientas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños — Programado / Ejecutado
Placa huella — Programado / Ejecutado
alcantarillas — Programado / Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

instalacion de acero y fundicion cunetas

fundicion concreto ciclopeo

instalacion de acero

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202 - 168476 NTE


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

AIAM-AA164

JUAN CARLOS ANDRADE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

JESUS ORLANDO VIVAS NOGURA Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4927 DE 2023	No. Copias Impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: junio 10 de 2024

- Informe semanal 21-20/05/2024-26/05/2024

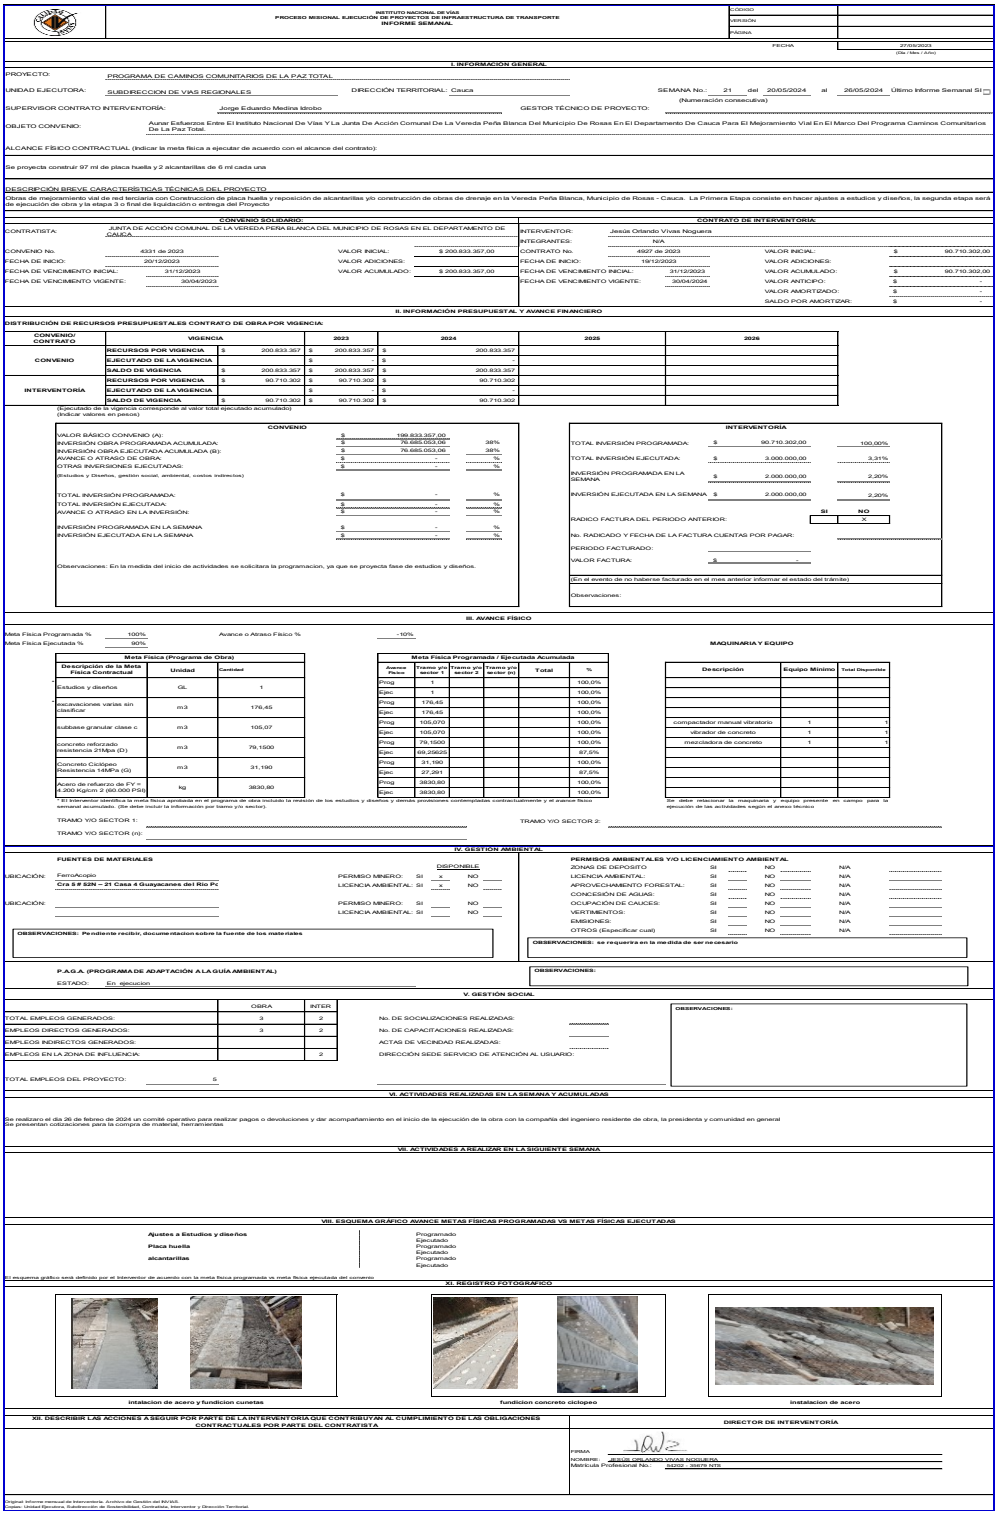

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

Código
Versión
Página
FECHA: 27/05/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca — SEMANA No.: 21 del 20/05/2024 al 26/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Jorge Eduardo Medina Idrobo — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda Peña Blanca Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se proyecta construir 97 ml de placa huella y 2 alcantarillas de 6 ml cada una

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Obras de mejoramiento vial de red terciaria con Construccion de placa huella y reposición de alcantarillas y/o construcción de obras de drenaje en la Vereda Peña Blanca, Municipio de Rosas - Cauca. La Primera Etapa consiste en hacer ajustes a estudios y diseños, la segunda etapa será de ejecución de obra y la etapa 3 o final de liquidación o entrega del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA			INTERVENTOR:	Jesús Orlando Vivas Noguera		
				INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	4331 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.833.357,00	CONTRATO No.	4927 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 90.710.302,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	-	FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.833.357,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 90.710.302,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2023			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.833.357	$ 200.833.357	$ 200.833.357	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	$		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.833.357	$ 200.833.357	$ 200.833.357	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	$		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.833.357,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 76.685.053,06	38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 76.685.053,06	38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMNNA	$	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 90.710.302,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.000.000,00	3,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	2,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	2,20%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100% — Avance o Atraso Físico % -10%
Meta Física Ejecutada % 90%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1
excavaciones varias sin clasificar	m3	176,45
subbase granular clase c	m3	105,07
concreto reforzado resistencia 21Mpa (D)	m3	79,1500
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	31,190
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	3830,80

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Acerca Física	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	176,45				100,0%
Ejec	176,45				100,0%
Prog	105,070				100,0%
Ejec	105,070				100,0%
Prog	79,1500				100,0%
Ejec	69,25625				87,5%
Prog	31,190				100,0%
Ejec	27,291				87,5%
Prog	3830,80				100,0%
Ejec	3830,80				100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (De darse cortar la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
compactador manual vibratorio	1	1
vibrador de concreto	1	1
mezcladora de concreto	1	1

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el avance fisico.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	FerroAcopio		
	Cra 5 # 82N – 21 Casa 4 Guayacanes del Rio Pc	PERMISO MINERO: SI x NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO	
UBICACIÓN:			
		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En ejecucion

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaro el dia 26 de febreo de 2024 un comité operativo para realizar pagos o devoluciones y dar acompañamiento en el inicio de la ejecución de la obra con la compañía del ingeniero residente de obra, la presidenta y comunidad en general
Se presentan cotizaciones para la compra de material, herramientas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	Programado
	Ejecutado
Placa huella	Programado
	Ejecutado
alcantarillas	Programado
	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

instalacion de acero y fundicion cunetas

fundicion concreto ciclopeo

instalacion de acero

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202 - 39478 NTB

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contables, Interventor y Dirección Territorial.

JUAN CARLOS ANDRADE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

- Informe semanal 22-27/05/2024-31/05/2024

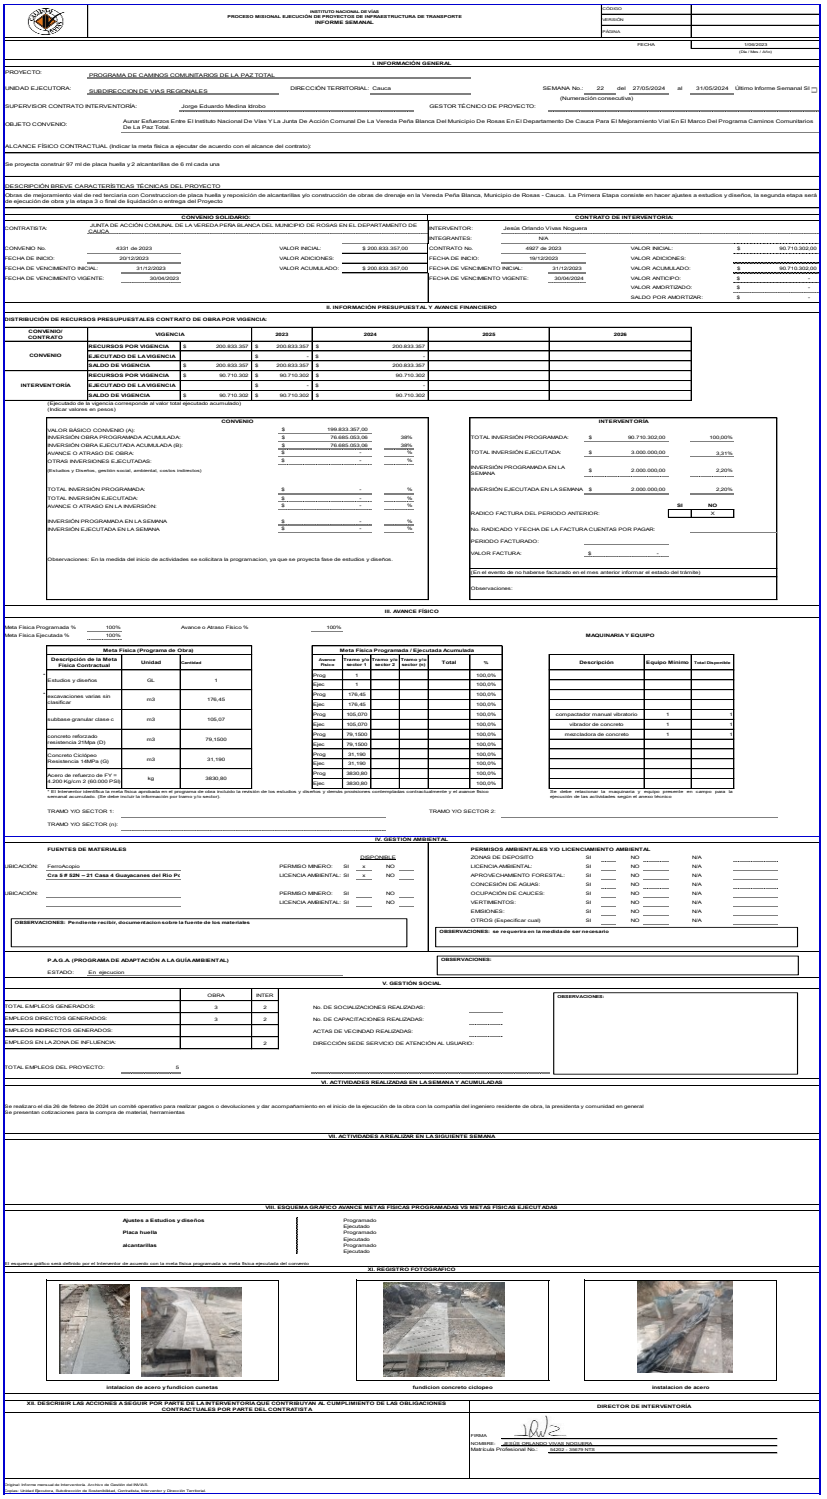

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

Código
Versión
Página
FECHA: 1/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca — SEMANA No.: 22 del 27/05/2024 al 31/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Jorge Eduardo Medina Idrobo — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda Peña Blanca Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se proyecta construir 97 ml de placa huella y 2 alcantarillas de 6 ml cada una

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Obras de mejoramiento vial de red terciaria con Construccion de placa huella y reposición de alcantarillas y/o construcción de obras de drenaje en la Vereda Peña Blanca, Municipio de Rosas - Cauca. La Primera Etapa consiste en hacer ajustes a estudios y diseños, la segunda etapa esta de ejecución de obra y la etapa 3 o final de liquidación o entrega del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

CONVENIO No.	4331 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.833.357,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.833.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	Jesús Orlando Vivas Noguera		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4927 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 90.710.302,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 90.710.302,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	-
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.833.357	$ 200.833.357	$ 200.833.357	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.833.357	$ 200.833.357	$ 200.833.357	
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos.)

CONVENIO

VALOR BASICO CONVENIO (A):	$ 199.833.357,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 76.685.053,06	38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 76.685.053,06	38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 90.710.302,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.000.000,00	3,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	2,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	2,20%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100% — Avance o Atraso Físico % 100%
Meta Física Ejecutada % 100%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1
excavaciones varias sin clasificar	m3	176,45
subbase granular clase c	m3	155,07
concreto reforzado resistencia 21Mpa (D)	m3	79,1500
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	31,190
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	3830,80

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Frente por sector 1	Frente por sector 2	Frente por sector (n)	Total	%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	176,45				100,0%
Ejec	176,45				100,0%
Prog	155,070				100,0%
Ejec	155,070				100,0%
Prog	79,1500				100,0%
Ejec	79,1500				100,0%
Prog	31,190				100,0%
Ejec	31,190				100,0%
Prog	3830,80				100,0%
Ejec	3830,80				100,0%

* El Interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (De debe incluir la información por tramo y/o sector)

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
compactador manuel vibratorio	1	1
vibrador de concreto	1	1
mezcladora de concreto	1	1

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			PERMISO MINERO:	LICENCIA AMBIENTAL:
UBICACIÓN:	FerroAcopio			
	Cra 5 # 52N – 21 Casa 4 Guayacanes del Rio Pc		SI x NO	SI x NO
UBICACIÓN:			SI NO	SI NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requeriria en la medidad se necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: En ejecucion

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaro el dia 26 de febreo de 2024 un comité operativo para realizar pagos o devoluciones y dar acompañamiento en el inicio de la ejecución de la obra con la compañía del ingeniero residente de obra, la presidenta y comunidad en general se presentan cotizaciones para la compra de material, herramientas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños — Programado / Ejecutado
Placa huella — Programado / Ejecutado
alcantarillas — Programado / Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs. meta física ejecutada del contrato

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

instalacion de acero y fundicion cunetas

fundicion concreto ciclopeo

instalacion de acero

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202 - 39676 NTE

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JUAN CARLOS ANDRADE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO

Los equipos que se encuentran en los convenios (vereda El Ramal, El Líbano Y Peña Blanca) se describen a continuación MEPI-MN1-IN-15-FR-4

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO

Durante este periodo, se cuenta con trabajadores en el convenio en ejecución.

- PEÑA BLANCA 4331

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 4331 — **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PEÑA BLANCA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO de 2024 — **PROYECTO:** Anuar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vias Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda Peña Blanca Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4927 — **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

NOMBRE ARL: PORVENIR — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indica si se dio de Cotización (SI/NO)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	HERSON MILLER CARVAJAL RUIZ	1002953779	OBRERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA PEÑA BLANCA			V	ASMET SALUD	9467054091	$ 162.500	PORVENIR	9468555437	$ 208.000	$ 90.500	$ 65.000	$ 65.000	
2	YUL FRANKI CARVAJAL RUIZ	1061600572	OFICIAL OBRA	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA PEÑA BLANCA			V	ASMET SALUD	9467054091	$ 212.500	PORVENIR	9468555437	$ 272.000	$ 118.400	$ 85.000	$ 85.000	
3	CRISTIAN ANDRES LEDEZMA MARTINEZ	1061601552	OBRERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA PEÑA BLANCA			V	NUEVA EPS	9467054091	$ 162.600	PORVENIR	9468555437	$ 208.100	$ 84.500	$ 60.800	$ 60.800	
4	ROYEIRO LLANTEN RUIZ	1061600360	OBRERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA PEÑA BLANCA			V	NUEVA EPS	9467054091	$ 162.500	PORVENIR	9468555437	$ 208.000	$ 90.500	$ 65.000	$ 65.000	
5	WILFRAN RUIZ CARVAJAL	94284907	MAESTRO OBRA	$ 2.320.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA PEÑA BLANCA			V	SOS SERVICIO OCIDENTAL DE SALUD	9467054091	$ 290.000	PORVENIR	9468555437	$ 371.200	$ 161.500	$ 116.000	$ 116.000	
6	PACHINCHANA FANY	1107037321	CSECRETARIA	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA PEÑA BLANCA			I	SOS SERVICIO OCIDENTAL DE SALUD	9467054091	$ 187.500	PORVENIR	9468555437	$ 240.000	$ 7.900	$ 75.000	$ 75.000	
7																			
8																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Rusbelis Estacio
Presidenta JAC
Matricula Profesional No.:N/A

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.: 54202-35679INTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JUAN CARLOS ANDRADE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

JESUS ORLANDO VIVAS NOGURA Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4927 DE 2023	No. Copias Impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: junio 10 de 2024

- EL RAMAL 4927

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-6 VERSIÓN: 1 PÁGINA: FECHA: 1/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 4927 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL RAMAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO de 2024 **PROYECTO:** Anuar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda El Ramal Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4927 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

NOMBRE ARL: PORVENIR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indica Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	AUSECHA CARLOS		OBRERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA EL RAMAL		$ 90.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9468347343	$ 162.500	PORVENIR	9468347343	$ 208.000	$ 52.000	$ 32.500	$ 32.500	
2	CHILITO MEYRO		OBRERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA EL RAMAL		$ 90.500	V	A.I.C.	9468347343	$ 162.500	PORVENIR	9468347343	$ 208.000	$ 52.000	$ 32.500	$ 32.500	
3	NOGUERA ALIRIO		OBRERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA EL RAMAL		$ 90.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9468347343	$ 162.500	PORVENIR	9468347343	$ 208.000	$ 52.000	$ 32.500	$ 32.500	
4	ORDOÑEZ HERNEY		OFICIAL	$ 2.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA EL RAMAL		$ 146.200	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9468347343	$ 262.500	COLPENSIONES	9468347343	$ 336.000	$ 84.000	$ 52.500	$ 52.500	
5	ORDOÑEZ MOISES		OBRERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA EL RAMAL		$ 90.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9468347343	$ 162.500	PORVENIR	9468347343	$ 208.000	$ 52.000	$ 32.500	$ 32.500	
6	PAZ ANDRES		MAESTRO	$ 2.320.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA EL RAMAL		$ 161.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9468347343	$ 290.000	COLFONDOS	9468347343	$ 371.200	$ 92.800	$ 58.000	$ 58.000	
7	PINZON YEISSON		OBRERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA EL RAMAL		$ 90.500	V	EMSSANAR	9468347343	$ 162.500	PORVENIR	9468347343	$ 208.000	$ 52.000	$ 32.500	$ 32.500	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma Herney Ordoñez A
Nombre: HERNEY ORDOÑEZ
Presidente JAC
Matrícula Profesional No.:N/A

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679INTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JUAN CARLOS ANDRADE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

JESUS ORLANDO VIVAS NOGURA Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4927 DE 2023	No. Copias Impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: junio 10 de 2024

- EL LIBANO 4499

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	1/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 4499 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL LIBANO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO de 2024 **PROYECTO:** Anuar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vias Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda EL LIBANO Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4927 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	AUSECHA FABRICIO	1061599900	OBRERO	$ 1.150.000	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	JAC VEREDA EL LIBANO		$ 80.100	V	ASMET SALUD	9466619354	$ 143.800	PORVENIR	9466619354	$ 184.000	$ 46.000	$ 57.500	$ 57.500	
2	CARVAJAL FERLEY	76150594	OBRERO	$ 1.150.000	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	JAC VEREDA EL LIBANO		$ 80.100	V	ASMET SALUD	9466619354	$ 143.800	PORVENIR	9466619354	$ 184.000	$ 46.000	$ 57.500	$ 57.500	
3	CORTES JESUS	4751773	MAESTRO DE OBRA	$ 1.778.667	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	JAC VEREDA EL LIBANO		$ 123.800	V	ASMET SALUD	9466619354	$ 222.400	PORVENIR	9466619354	$ 284.600	$ 71.200	$ 89.000	$ 89.000	
4	FRANCO NESTOR	1061600671	OBRERO	$ 1.150.000	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	JAC VEREDA EL LIBANO		$ 80.100	V	ASMET SALUD	9466619354	$ 143.800	PORVENIR	9466619354	$ 184.000	$ 46.000	$ 57.500	$ 57.500	
5	MOLINA LEONAIRO	1061599195	OBRERO	$ 1.150.000	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	JAC VEREDA EL LIBANO		$ 80.100	V	ASMET SALUD	9466619354	$ 143.800	PORVENIR	9466619354	$ 184.000	$ 46.000	$ 57.500	$ 57.500	
6	ORDOÑEZ YEDSON	1061598296	OBRERO	$ 783.334	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	JAC VEREDA EL LIBANO		$ 80.100	V	ASMET SALUD	9466619354	$ 98.000	PORVENIR	9466619354	$ 125.400	$ 14.000	$ 17.500	$ 17.500	
7	PIAMBA EDDERSON	4752862	OFICIAL	$ 1.190.000	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	JAC VEREDA EL LIBANO		$ 24.400	V	ASMET SALUD	9466619354	$ 148.800	PORVENIR	9466619354	$ 190.400	$ 47.600	$ 59.500	$ 59.500	
8	TROCHEZ ROBINSON	1061598384	OBRERO	$ 1.150.000	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	JAC VEREDA EL LIBANO		$ 82.900	V	ASMET SALUD	9466619354	$ 143.800	PORVENIR	9466619354	$ 184.000	$ 46.000	$ 57.500	$ 57.500	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FABIOLA SANCHEZ
Presidenta JAC
Matrícula Profesional No.:N/A

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JUAN CARLOS ANDRADE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO

- PEÑA BLANCA 4331

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-8
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 1/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 4331 - 2023 — CONTRATISTA: JAC VEREDA PEÑA BLANCA, DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

MES INFORME MENSUAL: abril — PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4927 - 2023 — INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	PROGRAMA CAMINOS	10	NACIÓN	4331/2023	$ 199.833.357	
		JAC VEREDA PEÑA BLANCA		PROPIOS	4331/2023	$ 1.000.000	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 200.833.357,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: Rusbelia Estavio R.
Nombre: Rusbelia Estavio R.
Presidente JAC
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679INTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

- EL LIBANO 4499

JESUS ORLANDO VIVAS NOGURA Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4927 DE 2023	No. Copias Impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: junio 10 de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 4499 - 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA EL EL LIBANO, DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

MES INFORME MENSUAL: MAYO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4927 - 2023

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	02-0600-14-0-24020	PROGRAMA CAMINOS JAC VEREDA EL LIBANO	10	NACIÓN PROPIOS	4499/2023 44992023	$ 199.652.620	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 200.652.620,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Fabiola Sanchez
Presidenta JAC
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

JUAN CARLOS ANDRADE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

- EL RAMAL 4499

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-8 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 4806 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

MES INFORME MENSUAL: febrero **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4927 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 200.818.019,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: Herney Ordoñez A.
Nombre: HERNEY ORDOÑEZ
Presidente JAC
Matricula Profesional No.:N/A

Firma:
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

- PEÑA BLANCA 4331

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No: 4331 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PEÑABLANCA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO **PROYECTO:** Anuar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda Peña Blanca Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4927 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	10	20	18	22	24	17	23	24	24	23	24	24	15	23	18	24	24	24	24	24	19	22	21	24	24	20	23	16	24	24	670
Lluvias moderadas	0	10	4	4	2	0	5	1	0	0	1	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	5	2	4	0	0	2	1	4	0	0	56
Lluvias intensas	0	4	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		4	0	0	19
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Yeison Quitumbo Guetio
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

- EL LIBANO 4499

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA: 1/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No: 4499 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL LIBANO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** Anuar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda EL LIBANO Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4927 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	10	20	18	22	24	17	23	24	24	23	24	24	15	23	18	24	24	24	24	24	19	22	21	24	24	20	23	16	24	24	670
Lluvias moderadas	0	10	4	4	2	0	5	1	0	0	1	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	5	2	4	0	0	2	1	4	0	0	56
Lluvias intensas	0	4	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	19
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Wilmer Gerardo Hoyos Urbano
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-328578 CAU

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

- EL RAMAL 4499

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No: 4806 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PEÑABLANCA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO **PROYECTO:** Anuar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda El Ramal Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4927 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	10	20	18	22	24	17	23	24	24	23	24	24	15	23	18	24	24	24	24	24	19	22	21	24	24	20	23	16	24	24	670
Lluvias moderadas	0	10	4	4	2	0	5	1	0	0	1	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	5	2	4	0	0	2	1	4	0	0	56
Lluvias intensas	0	4	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		4	0	0	19
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Wilmer Gerardo Hoyos Urbano
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-328578 CAU

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.


4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, no se cuento con ningún ensayo de laboratorio en los convenios.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

Se validaron las garantías de los convenios de obra suscritos dentro del tiempo transcurrido de esta interventoría.

4.7.1 PEÑA BLANCA 4927

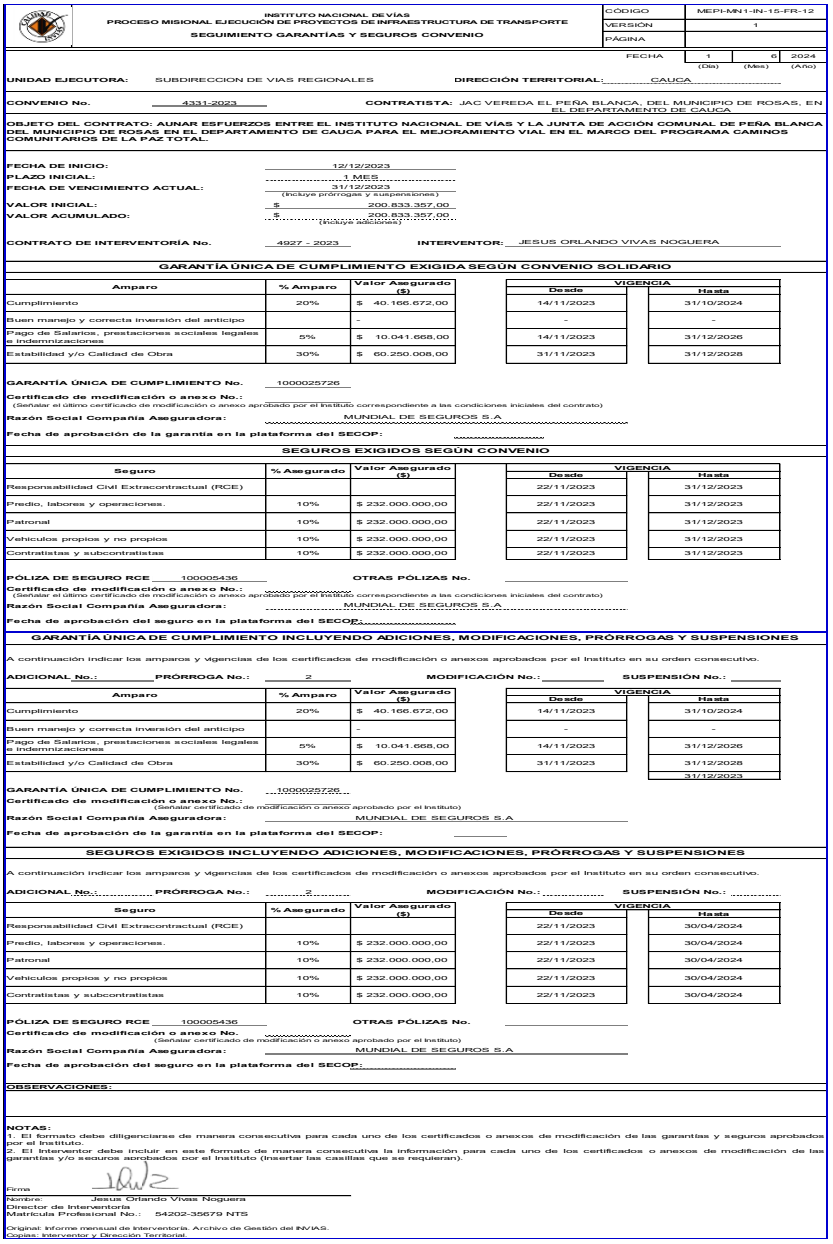

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4331-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL PEÑA BLANCA, DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 12/12/2023
PLAZO INICIAL: 1 MES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.833.357,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.833.357,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4927 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.166.672,00	14/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones	5%	$ 10.041.668,00	14/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.250.008,00	31/11/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 10000025726
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			22/11/2023	31/12/2023
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE 1000005436 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.166.672,00	14/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones	5%	$ 10.041.668,00	14/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.250.008,00	31/11/2023	31/12/2028
				31/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 10000025726
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			22/11/2023	30/04/2024
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024
Vehículos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE 1000005436 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.2 EL LIBANO 4499

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4499-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL EL LIBANO, DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 12/12/2023
PLAZO INICIAL: 1 MES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluya prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.652.620,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.652.620,00 (Incluya adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4927 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.130.524,00	22/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.032.631,00	22/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.195.786,00	31/11/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100284287
Certificado de modificación o anexo No.:
Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			22/11/2023	31/12/2023
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE 100026363 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.130.524,00	22/11/2023	31/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	31/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.032.631,00	22/11/2023	31/12/2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.195.786,00	31/11/2023	31/12/2023
				31/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100026363
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			22/11/2023	30/04/2024
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE 100005613 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros acrobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.3 EL RAMAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PAGINA	

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4806-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL EL RAMAL, DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 12/12/2023
PLAZO INICIAL: 1 MES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.818.019,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.818.019,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4927 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.163.604,00	2/12/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.040.901,00	2/12/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.245.406,00	31/11/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100026288
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			22/11/2023	31/12/2023
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE 100005593 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.163.604,00	2/12/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.040.901,00	2/12/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.245.406,00	31/11/2023	31/12/2028
				31/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100026288
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			22/11/2023	30/04/2024
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE 100005593 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha no se ha recibido el plan de calidad de ninguno de los convenios asociados a esta interventoría.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo, no se desarrollan reuniones de comité con las juntas de acción comunal asociados a los convenios.

4.9.2 ACTAS DE REUNIÓN

Durante este periodo, no se desarrollan reuniones del proyecto con las juntas de acción comunal asociados a los convenios.

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. del contrato de interventoría	4953-2023
Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ROSAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
Valor del contrato de interventoría	$ 90,710,302.00
Contratista	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Nit	13.451.988
R.L	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Fecha suscripción convenio	13/12/2023
Fecha orden de inicio	21/12/2023
Fecha de terminación inicial	31/12/2023
Fecha de terminación vigente	30/05/2024

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante este periodo, se ha realizado revisión y requerimientos a la entrega de los documentos requeridos, además:

- Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los Ítems contractuales.
- Revisión de la calidad de los materiales empleados.
- Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
- Revisión del cronograma programado para llevar trazabilidad de la ejecución.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo, se realizan el informe de dirección, informe de profesional ambiental y social como también informe de grupos de comité de participación comunitaria.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo, se hizo uso de vehículos para el desplazamiento de las actividades. Puesto que, se comenzó a efectuar visitas de reconocimiento y de socialización. De manera que, se diligencia formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION Y EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4927 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

CONTRATO DE OBRA No. **CONTRATISTA:**

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOCICLETA	MOTOCICLETA MARCA BAJAJ. LINEA PULSAR NS 160 FI ABS. COLOR GRIS PIEDRA. PLACA MWS76G. CILIDRAJE 160CC	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA. LINEA XTZ150-2 2021. COLOR GRIS PIEDRA. PLACA KOA74F. CILIDRAJE 150CC	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula Profesional: 19202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para este periodo se presenta el control de aportes legales y seguridad social mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	22-may-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4927 DE 2023 — **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 5 — **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 4806-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 4331-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 4499-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

NOMBRE ARL: POSITIVA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JESUS O. VIVAS	13.451.988	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	20,00%	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	$ 1.500.000	7.900,00	I	Nueva Eps	8699102191	187.500	COLPENSIONES	8699102191	N/A	N/A	N/A	N/A	Pensionado Resolucion No. 2023_616016 del 11 mayo 2023
3	JUAN CARLOS ANDRADE ASTAZA	1.061.796.304	RESIDENTE	$ 3.100.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100,00%	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	$ 3.100.000	215.800,00	V	SANITAS	8629926236	124.000	COLPENSIONES	8629926236					
4	LEANA ROCIO ILES MUÑOZ	1.061.761.688	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	$ 1.300.000		V	SANITAS	8629926236		PORVENIR	8629926236					
5	LAURA PATRICIA MOYA	1.061.780.375	INSPECTOR SST	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	$ 1.300.000		V	Nueva Eps	8629926236		PORVENIR	8629926236					
6	AURIO ARCS CAMPO	4.751.176	INSPECTOR	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	$ 1.300.000		V	Asmet Salud	8629926236		SINAFP-SINAFP	8629926236					
7	HOLMES QUIÑONES CARABALI	76.150.279	INSPECTOR	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	JESUS ORLANDO	$ 1.300.000												
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 9.460.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 29/3/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoria
ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Firma
JORGE EDUARDO MEDINA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional: 15202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

De acuerdo a lo ofertado durante el proceso licitatorio, la oferta económica adjudicada es:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 22-may-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4927 DE 2023 — **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

MES INFORME MENSUAL: 5 — **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO 4806-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO 4331-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO 4499-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1377023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	Contrato Principal	$ 90.710.302,00	$ -
			TOTAL			$ 90.710.302,00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 90.710.302

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	30 dic 2023	$ -	$ -	$ -				1377023 y 30/12/2023	$ 90.710.302,00	$ -		
2	31 ene 2024	$ -	$ -	$ -				1377023 y 31/01/2024	$ 90.710.302,00	$ -		
03	1 feb 2024	$ 9.883.170,00	$ -	$ 9.883.170,00				1377023 y 31/01/2024	$ 80.827.132,00	$ 80.827.132,00		
04	1-mar-24	$ 16.956.100,00	$ -	$ 26.839.270,00	-	-	-	1377023 y 01/04/2024	$ 63.871.032,00	$ 63.871.032,00		
05	1-abr-24	$ 28.004.900,00	$ -	$ 54.844.170,00				1377023 y 01/05/2024	$ 35.866.132,00	$ 35.866.132,00		
06												
07												
08												
09												
10												
TOTALES		$ 54.844.170,00	$ -	$ 54.844.170,00	$ -	$ -	$ -		$ 35.866.132,00	$ 35.866.132,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Valor total básico (C) = (A) + (B)	$ 90.710.302,00	$ -	$ 90.710.302,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ -	$ -	$ -
*			
VALOR TOTAL	$ 90.710.302,00	$ -	$ 90.710.302,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Matricula Profesional No.: 54202-35679NTS
Drector de Interventoria
ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Firma
JORGE EDUARDO MEDINA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional: 19202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CAUCA **DIRECCION TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4927 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ROSAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 13/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluya prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 90.710.302,00
VALOR ACUMULADO: $ 90.710.302,00 (Incluya adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE MEDINA

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	%Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 9.071.030,20	12/12/2023	30/08/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2028
Calidad del servicio	30%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2028

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 10103211
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	%Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 9.071.030,20	12/12/2023	30/08/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2028
Calidad del servicio	30%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2028

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 10103211
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTA:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Firma
Nombre:
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, este documento se encuentra en elaboración, se espera emitir y contar con la aprobación en el próximo periodo.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante este periodo, se llevaron a cabo reuniones de socialización con la participación de la Junta de Acción Comunal, la comunidad y la interventoría. Los temas más relevantes abordados en estas reuniones incluyeron:

- ✓ Alcance aproximado del convenio.
- ✓ Corredor vial estipulado inicialmente en el contrato.
- ✓ Comité Operativo de Compras.
- ✓ Estudios previos.
- ✓ Comité de Participación Ciudadana.

La participación de la comunidad y de la Junta de Acción Comunal es fundamental en el desarrollo del proyecto. La socialización inicial y la conformación del Comité de Participación Comunitaria demuestran un esfuerzo por involucrar a todas las partes interesadas desde el inicio del proyecto.
