ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre del (la) Contratista: CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT

Tipo de Contrato: CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato Nº: 1062-2023 DE: 24-jul-23

Documento de Identidad: NIT. Nº 901732581-7

Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a): KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS

Cargo Supervisor(a) o Interventor(a): SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE REHABILITACION DE ALGUNOS SEGMENTOS VIALES, Y LA RENOVACION ARQUITECTONICA, PAISAJISTICA Y CULTURAL DE LA ALMEDA FERREA LINEAL EL SOL, PARA UNA MOVILIDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Número cuenta del (a) Contratista: 637510256 Entidad: BANCOLOMBIA Tipo cuenta: CUENTA DE AHORROS

Fecha de inicio (Según Acta): 31-jul.-2023 Plazo de Ejecución: 17 meses, y días

Fecha de terminación (Incluye prórrogas): 30-sep.-2024

Valor inicial del contrato	$	**1.677.163.691,17**
Adición 1	$	465.406.096,00
Adición 2		
Adición 3		
Reducción		
Valor total del contrato	$	**2.142.569.787,17**

Prórrogas	Días
Prórroga 1	4 meses
Prórroga 2	4 meses
Prórroga 3	
Prórroga 4	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. Certificado Disponibilidad Presupuestal	No. Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Código Rubro Presupuestal	Valor a pagar por Rubro Presupuestal en el presente pago
2023000536	2023002086	24-jul.-23	2.3.24.2402.0600.2402116.003.2.3.2.02.02.008.381.1331107	$ 116.351.524,00
2023000534			2.3.40.4002.1400.4002019.001.2.3.2.02.02.008.157.1331107	
2024001253	2024001248	30-may-24	2.3.24.2402.0600.2402112.003.2.3.2.02.02.008.381.7002	

INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Salud 12,5%	208.000	EPS	Sanitas S:A, Nueva Eps, Salud total.	Numero de planilla	7939220075
Salud 12,5%		EPS		Número de planilla	
Pension 16%	624.000	Fondo Pensiones	PORVENIR, PROTECCION	Número de planilla	7939220075
Pension 16%		Fondo Pensiones		Número de planilla	
Riesgos Laborales	110.900	ARL	Seguros de vida colpatria S.A	Número de planilla	7939220075
Riesgos Laborales		ARL		Número de planilla	
FSP ***		Fondo pensiones		Número de planilla	

***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotizacion es mayor a 4 SMMLV.

INFORMACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PAGO

No. PAGO	PERÍODO DE PAGO DESDE	PERÍODO DE PAGO HASTA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL A PAGAR	SALDO POR PAGAR
10	1-jul.-24	30-jul.-24	89,14%	1.793.515.215,16	97.774.389,92	18.577.134,08	116.351.524,00	232.703.048,0

OBSERVACIONES:

CERTIFICACIÓN

El / la suscrito (a) supervisor (a) / interventor (a) certifica:

Que, CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT, identificado(a) con NIT. Nº 901732581-7 cumplió a satisfacción con el objeto del (la) CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 1062-2023 de 2023, de acuerdo con el informe presentado.

Que se verificaron los pagos efectuados por el (la) contratista al Sistema General de Seguridad Social y/o aportes parafiscales, correspondiente al presente periodo de pago, los cuales se efectuaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/2002, y demás Decretos Reglamentarios.

Que, con base en lo anterior se avala el pago por un valor de: $ 116.351.524,00 incluido IVA.

Fecha de expedición: 27 (Día) SEPTIEMBRE (Mes) 2024 (Año)

FIRMA SUPERVISOR(A) / INTERVENTOR(A)



CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT.
NIT 901.732.581-7
calle 134 # 13 - 64
Tel: (601) 4686916
Bogotá - Colombia
paula.quintero09@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FV 11

Señores	CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.732.581-7	**Teléfono**	(031) 0000000	**Generación**	04/09/2024, 18:10
Dirección		**Ciudad**	-	**Expedición**	04/09/2024, 18:10
				Vencimiento	04/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1062 DE 2023 JULIO	1.00	116,351,524.00

Factura generada por Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento dieciseis millones trescientos cincuenta y un mil quinientos veinticuatro pesos m/cte

Total Bruto	97,774,389.92
IVA 19%	18,577,134.08
Total a Pagar	116,351,524.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 116,351,524.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764057524228 aprobado en 20231005 prefijo FV desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 30c2357a683fdd934413091e75d65b1beb397496e5d1b05acdb066ff83a1f1f8b3b79cbba276e92a49829239c669f672

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900571397
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCION:	CR 22 65 15 BR PARNASO	TELEFONO:	6006133
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	09 - ADMON
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79392220075	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			868725735

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 416,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416,000	$ 0	$ 416,000
230201	230201-PROTECCION	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208,000	$ 0	$ 208,000
SUBTOTALES:										**$ 624,000**	**$ 0**	**$ 624,000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 52,000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104,000	$ 0	$ 0	$ 104,000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 52,000
SUBTOTALES:													**$ 208,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 208,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 110,900	$ 110,900	$ 0	$ 0	$ 110,900
SUBTOTALES:									**$ 110,900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 110,900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	4	$ 208,000	$ 0	$ 208,000
SUBTOTALES:			**$ 208,000**	**$ 0**	**$ 208,000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD							ARP											
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1005188440	AREA DUBIONEZ DANIELA MELISSA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 52,000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,300,000	$ 6,800	$ 6,800	30	$ 1,300,000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1099200607	HEREDIA MONTES RICHARD YASER	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 52,000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,300,000	$ 6,800	$ 6,800	30	$ 1,300,000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1096241082	MAYORGA CHACON JENNI CAROLINA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 52,000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,300,000	$ 6,800	$ 6,800	30	$ 1,300,000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 13865556	MENDOZA MEJIA GUILLERMO ELOY	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1,300,000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 52,000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,300,000	$ 90,500	$ 90,500	30	$ 1,300,000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1,150,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1109005805		JUSTINICO DIAZ MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 68 N 28 - 74	IBAGUE-TOLIMA	3212492164	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	785641533	9470034240	I	2024/08/02	2024/07/18	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$638,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1109005805	JUSTINICO DIAZ MARIA CAMILA																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	$11,500	0	$0	$0	No	$638,500
Total	**Afiliados(1)**																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0		$638,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1109005805		JUSTINICO DIAZ MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 68 N 28 - 74	IBAGUE-TOLIMA	3212492164	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	785641533	9470034240	I	2024/08/02	2024/07/18	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$638,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$0	$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$0	$0	$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				1	$638,500	$0	$0	$638,500

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DANIEL MAURICIO OLIER RESTREPO
IDENTIFICACIÓN:	CC-71664413
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-10
FECHA DE PAGO:	2024-10-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	31281417
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31281417
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 12.500	$ 13.200
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 12.500	$ 13.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 16.000	$ 16.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 16.000	$ 16.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 600	$ 700
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 600	$ 700
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
. AMIED	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 29.100	$ 30.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/09/2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026288416	OSCAR FABIAN GONZALEZ ARENAS	CL 41A # 8 -25 AP 1112	7968319	oscar_9428@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	25/09/2024	80357052	$421.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	175.000	0		0		0	50	6.500	0	181.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	224.000	0	0	0	0	50	8.300	0	232.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.400				7.400	50	300	7.700			74	7.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	50	0	0	0
ICBF				
0	50	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	181.500
Pensión	1	224.000	232.300
Riesgos Laborales	1	7.400	7.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	406.400	421.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026288416	OSCAR FABIAN GONZALEZ ARENAS		CL 41A # 8 -25 AP 1112	7968319	oscar_9428@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-07	I	25/09/2024	80357052	$421.500

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1026288416	GONZALEZ ARENAS OSCAR FABIAN	57	0			N																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS010	1.400.000	175.000	14-11	1.400.000	1	7.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39579746		OVIEDO NIETO PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ F CASA 18 CONJ GIRASOL	IBAGUE-TOLIMA	2763615	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	937797624	9473755426	I	2024/08/13	2024/09/26	BANCO DAVIVIENDA	44	$588,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	39579746	OVIEDO PAOLA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$10,400	$0	$330,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$10,400	$0	$330,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$8,200	$0	$258,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$8,200	$0	$258,200
TOTAL				1	$570,000	$18,600	$0	$588,600

2024/10/02 11:16 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93396284		CASTILLO GONZALEZ OMAR VIDAL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 10 # 28 - 41	IBAGUE-TOLIMA	2483113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	1000000562	9470806919	I	2024/08/22	2024/08/14	BANCO DE BOGOTA	0	$570,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	93396284	CASTILLO OMAR	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93396284		CASTILLO GONZALEZ OMAR VIDAL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 10 # 28 - 41	IBAGUE-TOLIMA	2483113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	1000000562	9470806919	I	2024/08/22	2024/08/14	BANCO DE BOGOTA	0	$570,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$570,000	$0	$0	$570,000

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1126001358	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS	CLL 41 A 8 25 AP 1112	2759450	JAGA_91_26@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	25/09/2024	79099591	$414.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	41	5.000	0	167.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	41	6.300	0	214.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	31.700				31.700	41	1.000	32.700			317	32.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	41	0	0	0
ICBF				
0	41	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	167.500
Pensión	1	208.000	214.300
Riesgos Laborales	1	31.700	32.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	414.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1126001358	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS		CLL 41 A 8 25 AP 1112	2759450	JAGA_91_26@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	25/09/2024	79099591	$414.500	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1126001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	57	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	3	31.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41956363		RAMIREZ VALENCIA CLAUDIA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 12 No 12 01	ARMENIA-QUINDIO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	841509766	9470569211	I	2024/08/15	2024/08/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$428,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC	41956363	RAMIREZ CLAUDIA	230201	30 $1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF43	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41956363		RAMIREZ VALENCIA CLAUDIA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 12 No 12 01	ARMENIA-QUINDIO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	841509766	9470569211	I	2024/08/15	2024/08/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$428,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$0	$0	$31,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$428,200	$0	$0	$428,200

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DANIEL MAURICIO OLIER RESTREPO
IDENTIFICACIÓN:	CC-71664413
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-05
FECHA DE PAGO:	2024-09-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30207188
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30207188
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 162.500	$ 166.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 208.000	$ 212.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 6.800	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 8.800	$ 377.300	$ 386.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/09/2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52010686	ISABEL CRISTINA VARGAS CRISTANCHO	CALLE 50 #22-22 apto 301	6692747	cristinavargasc@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	20/08/2024	79533360	$930.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.700				15.700	0	0	15.700			157	15.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	60.000	0	0	60.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	375.000
Pensión	1	480.000	480.000
Riesgos Laborales	1	15.700	15.700
CCF	1	60.000	60.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	930.700	930.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52010686	ISABEL CRISTINA VARGAS CRISTANCHO	CALLE 50 #22-22 apto 301	6692747	cristinavargasc@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-07	I	20/08/2024	79533360	$930.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	52010686	VARGAS CRISTANCHO ISABEL CRISTINA	57	0			N																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	375.000	14-23	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	60.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026560560	JIMMY ALEXANDER MENDOZA OSORIO	carrera 15A # 59-22	3012074942	miformato@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BARRANCABERMEJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	29/08/2024	79787654	$704.000	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1026560560	MENDOZA OSORIO JIMMY ALEXANDER	59	0			N																	230201	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS010	2.400.000	300.000	14-23	2.400.000	1	12.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026560560	JIMMY ALEXANDER MENDOZA OSORIO	carrera 15A # 59-22	3012074942	miformato@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BARRANCABERMEJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	29/08/2024	79787654	$704.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	300.000	0		0		0	14	3.200	0	303.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	384.000	0	0	0	0	14	4.000	0	388.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.600				12.600	14	200	12.800			126	12.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	303.200
Pensión	1	384.000	388.000
Riesgos Laborales	1	12.600	12.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	696.600	704.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ÓN:			
SOCIAL:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93355209
			ALVARO GODOY TRUJILLO
	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
	CRA 10 SUR # 11 - 79	TELÉFONO:	3333333
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
TACIÓN:	ÚNICO		
ERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7939578069	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			52				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			937778734

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.000	$ 0	$ 208.000	$ 8.000	$ 216.000
									$ 208.000	**$ 8.000**	**$ 216.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 6.300	$ 0	$ 162.500	$ 6.300	$ 0	$ 168.800
												$ 162.500	**$ 6.300**	**$ 0**	**$ 168.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 300	$ 0	$ 7.100
								$ 6.800	**$ 300**	**$ 0**	**$ 7.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
LO O	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	93355209	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 391.900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11221078		ESCOBAR RAMIREZ CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 19A #18-04 BARRIO LAS QUINTAS	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	2763615	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	895809301	9470730864	I	2024/08/21	2024/09/06	BANCOLOMBIA	16	$375,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	11221078	ESCOBAR CESAR	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,500	$0	$210,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$2,500	$0	$210,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,000	$0	$164,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$2,000	$0	$164,500
TOTAL				1	$370,500	$4,500	$0	$375,000

2024/10/07 07:51 AM

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8631773889
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8655157084
Fecha Pago Planilla: 2024-08-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ANTONIO GONZALEZ LEON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91234726	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 12 N 10 54	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	SAN VICENTE DE CHUCURI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	VENADODEORO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3112373744
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8631773889

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-91234726	03	No	No	No	68	689	0	Salario	GONZALEZ LEON ANTONIO	$1.300.000

NOVEDADES																																
ntificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 91234726																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
ntificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 91234726	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
tificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
91234726	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES														
ificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
91234726	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
NSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NISTRA ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EVA P.S. .A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

NISTRA ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
IARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.500
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$370.500

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8631827262
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8667683984
Fecha Pago Planilla: 2024-08-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CECILIA ARENAS VARGAS	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	37655036	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 12 N 10 56	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	SAN VICENTE DE CHUCURI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4731	CORREO ELECTRÓNICO	VENADODEORO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	6254933
FAX	6254933	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8631827262

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-37655036	03	No	No	No	68	689	0	Salario	ARENAS VARGAS CECILIA	$1.300.000

NOVEDADES																																
entificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 37655036																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
ntificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 37655036	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
tificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
37655036	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
ificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
37655036	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
NSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

IISTRA ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EVA P.S. .A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

IISTRA ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
IARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.500
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$370.500

CONTRATO No 734 DEL 2023

INFORME DE SUPERVISION

ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 734 DEL 2023
CELEBRADO ENTRE:

CONSORCIO GIRARDOT 2024
NIT 901703742-2
Y
"LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CND"

CON UNA VIGENCIA DE NUEVE (9) MESES

CONTRATO DE OBRA No. 734 DE 2023 CUYO OBJETO ES: ***"REHABILITACIÓN DE ALGUNOS SEGMENTOS VIALES, Y LA RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA, PAISAJISTICA Y CULTURAL DE LA ALAMEDA FÉRREA LINEAL EL SOL, PARA UNA MOVILIDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA".***

Que el día veinticinco 25 de abril del año dos mil veintitrés (2023), se firma el CONTRATO DE OBRA No.734 de 2023, por parte del Municipio de Girardot y el CONSORCIO GIRARDOT 2024.

JULIO DE 2024

CONTRATO No 734 DEL 2023

INTRODUCCION

Dentro del presente informe se describirá el estado actual del CONTRATO DE OBRA No.734/2023 a partir de la celebración del acta de inicio de fecha 31 de julio del 2023, el cual tiene un avance de ejecución del **57.86%** al 31 de julio del 2024. El cual tiene inmerso dos componentes así : Rehabilitación segmentos viales, con un avance real del **73.93% ,** el cual se desarrolla dentro de los plazos establecidos y vigentes contractualmente y la Renovación arquitectónica, paisajística y cultural de la alameda férrea del parque lineal el sol, continua sin actividad con un avance del **32.74%** , que en la actualidad no cuenta con el correspondiente permiso por parte del ministerio de cultura para continuar con las actividades de obra dentro de las áreas de inmediatez al corredor férreo, por lo cual se mantiene suspendido.

ESTADO CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	No 734 DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($21.496.000.972) .
OBJETO:	"CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE REHABILITACIÓN DE ALGUNOS SEGMENTOS VIALES, Y LA RENOVACIÓN ARQUITECTONICA, PAISAJISTICA Y CULTURAL DE LA ALAMEDA FERREA LINEAL EL SOL, PARA UNA MOVILIDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA"
LOCALIZACION	: MUNICIPIO DE GIRARDOT
PLAZO CONTRATO	: NUEVE (09) MESES
FECHA DE INCIO	: TREINTA Y UNO (31) JULIO DE 2023
PRORROGA No. 1	: VEINTIOCHO (28) DICIEMBRE .

CONTRATO No 734 DEL 2023

TIEMPO PRORROGA No1	: CUATRO (04) MESES
ACTA SUSPENSIÓN No.1	: VEINTINUEVE (29) ABRIL DE 2024.
TIEMPO SUSPENSIÓN No1	: QUINCE (15) DIAS DE CALENDARIO
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.1	: CATORCE (14) MAYO 2024
TIEMPO AMPLIACIÓN No.1	: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
ACTA REINICIO No.1	: VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE 2024
PRORROGA No.2	: VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE 2024
TIEMPO PRORROGA No.2	: CUATRO (4) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	: TREINTA (30) SEPTIEMBRE DEL 2024

Dentro del componente vial a intervenir en distintos sectores del municipio de Girardot se encuentran los siguientes tramos:

• Tramo N°1: Cr. 19 Entre Calle 24 y Semáforo la Maravilla o Barlovento.
• Tramo N°2: Vía Alicante Unicentro Diagonal8 entre 33 y 38 Incluye Empalme vía la Carbonera.
• Tramo N°3: Vía Rosa Blanca Calle 32 entre Cra 12 y Av Las Acacias y Cra 10 Entre 32 y 33.
• Tramo N°4: Vía San Jorge Calle 32 entre CRA 4 y 7ª, CRA 7 entre Calle 32 Esquina Reloj.
• Tramo N°5: Vía barrio Kennedy Calle 44 entre CRA 6ª Y 6C frente a la Cancha N°1.
• Tramo N°6: Vía Centro Cra. 11 entre 16 y 13 Calle 14 y 13 entre CRA 11 y 9
• Tramo N°7: Vía Cra 14 entre Calle 24 y entrada Calle 34 (La Playa).

CONTRATO No 734 DEL 2023

DESARROLLO EJECUCION COMPONENTE VIAS

El contrato de Obra N.º 734 de 2023, rehabilitación segmentos viales, se desarrolla un avance real del **73.93%** el cual se desarrolla dentro de los plazos establecidos y vigentes contractualmente y se ha venido interviniendo de acuerdo con la entrega de la empresa ACUAGYR S.A.S E.S.P, en los distintos tramos donde se ha realizado la renovación de redes de acueducto y alcantarillado.

En **el Tramo No 1** para este periodo se obtuvo un avance del **64,48%** , se realizó la instalación de la capa de rodadura previa aplicación de emulsión asfáltica desde el K0+000 al K0+220, colocación de la primera capa base granular previa instalación de geotextil y subbase desde K0+221 – K0+230 acceso universidad Cundinamarca y del k0+230 al K0+490, mejoramiento de subrasante, instalación de geotextil y colocación de primera y segunda capa subbase granular desde K0+570 AL K0+750 sector barlovento.

El Tramo No3 - Vía Rosa Blanca Cra 10 Entre 32 y 33, Calle 32 entre Av Las Acacias Cra 11 y Calle 32 entre Cra 11 y Cra12 tiene un avance del **80.83%** , en la actualidad solo se está ejecutando el sector comprendido entre la Calle 32 con Cra 11 y Cra12 , abscisa ko+230 y ko+330 , actividades correspondientes a mejoramiento de la subrasante en recebo abscisa K0+230 al K0+330 previa renovación de redes y entrega del tramo parte de la empresa de servicio publicos Acuagyr e.s.p s.a

El Tramo No5 Vía barrio Kennedy Calle 41 entre CRA 6ª Y 6C frente a la Cancha N°1, se encuentra ejecutado al **100%**, durante este mes queda faltando las líneas de demarcación con pintura en frio, verificación del funcionamiento de los pozos - sumideros, reparación de andenes y corrección de sardineles.

El Tramo No6, centro continuo en ejecución con un avance del **66.17%.** En la Calle 14 entre carreras 10 y 11 para este periodo se realizaron actividades como rellenos, seriado y compactación ultima capa base granular, así mismo la construcción de andenes afectados y posterior aplicación de emulsión e instalación de capa de rodadura MDC-19. En la Carrera11 entre calles 14 y 13 realizo la terminación rellenos granulares primera capa base granular y terminación instalación de bordillos.


El **tramo No.7** Carrera 14 entre Calles 24 y entrada calle 34 alcanza un avance del **91.87%** para este periodo. Se terminaron las actividades correspondientes a rellenos granulares, seriado y compactado instalación de bordillos prefabricados desde el K0+190 al K0+330 y diagonal que conduce a la calle 34 K0+000 al K0+060. E imprimación e instalación de mezcla asfáltica. en los puntos de referencia K0+190 al K0+330.En este periodo se aprueba por parte del ICCU la inclusión de items no previstos necesarios para construcción de Muro de confinamiento de estructura de

CONTRATO No 734 DEL 2023
pavimento en el punto de referencia K0+330 al K0+350, por lo cual en el próximo periodo se procederá a iniciar dicha obra.

A continuación, se describe el avance de ejecución de obra en los distintos tramos:

Tramo No1: Cr. 19 entre Calle 24 y Semáforo la Maravilla o Barlovento.

Estado - En Ejecución.

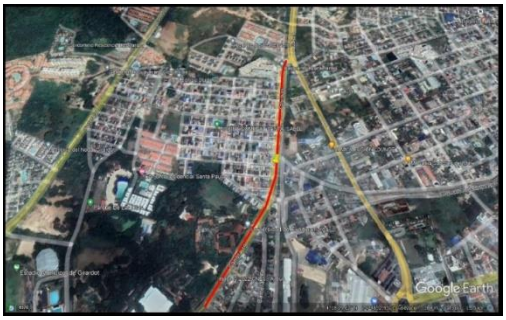



En **el Tramo No 1** para este periodo se obtuvo un avance del **64,48%** , se realizó la instalación de la capa de rodadura previa aplicación de emulsión asfáltica desde el K0+000 al K0+220, colocación de la primera capa base granular previa instalación de geotextil y subbase desde K0+221 – K0+230 acceso universidad Cundinamarca y del k0+230 al K0+490, mejoramiento de subrasante, instalación de geotextil y colocación de primera y segunda capa subbase granular desde K0+570 AL K0+750 sector barlovento.

Registro Fotográfico:





CONTRATO No 734 DEL 2023








<u>Descripción fotografías:</u> Se observa en las fotografías ilustradas la instalación de la mezcla asfáltica última capa previa aplicación de emulsión asfáltica desde el K0+000 al K0+220.

CONTRATO No 734 DEL 2023








<u>Descripción Fotografías:</u> Se evidencia la actividad de rellenos granulares primera capa base granular previa instalación de geotextil desde K0+221 – K0+230 acceso universidad Cundinamarca y del k0+230 al K0+490.

CONTRATO No 734 DEL 2023









<u>Descripción Fotografías:</u> Se evidencia la actividad de rellenos granulares primera capa base granular previa instalación de geotextil desde K0+221 – K0+230 acceso universidad Cundinamarca y del K0+230 al K0+490.

CONTRATO No 734 DEL 2023









<u>Descripción Fotografías:</u> Se observa en las fotografías ilustradas, la realización de rellenos segunda capa subbase granular desde K0+570 AL K0+750 sector barlovento.

CONTRATO No 734 DEL 2023

Tramo No3: Vía Rosa Blanca Calle 32 entre Cra 12 y Av Las Acacias y Cra 10 Entre 32 y 33.

Estado – En Ejecución.





El Tramo No3 - Vía Rosa Blanca Cra 10 Entre 32 y 33, Calle 32 entre Av Las Acacias Cra 11 y Calle 32 entre Cra 11 y Cra12 tiene un avance del **80.83%** , en la actualidad solo se está ejecutando el sector comprendido entre la Calle 32 con Cra 11 y Cra12 , abscisa ko+230 y ko+330 , actividades correspondientes a mejoramiento de la subrasante en recebo abscisa K0+230 al K0+330 previa renovación de redes y entrega del tramo parte de la empresa de servicio publicos Acuagyr e.s.p s.a

Registro Fotográfico:






CONTRATO No 734 DEL 2023




<u>Descripción Fotografías</u> Se observa en las fotografías ilustradas, mejoramiento de la subrasante en recebo abscisa K0+230 al K0+330 previa renovación de redes por parte de la empresa de servicio publicos Acuagyr e.s.p s.a

<u>Tramo No4: Vía San Jorge Calle 32 entre CRA 4 y 7ª, CRA 7 entre Calle 32 Esquina Reloj.</u>

Estado - Sin Iniciar Ejecución.

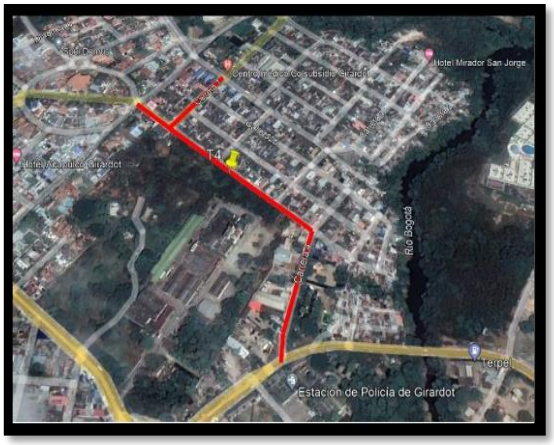



Este tramo aún no se ha iniciado a ejecutar, sin embargo, de acuerdo al cronograma de avance presentado por el Contratista, el tramo se iniciará una vez se cumpla el cierre de las vías aperturadas, a la fecha se encuentra en 0,00% de ejecución.

CONTRATO No 734 DEL 2023

Tramo No5: Vía barrio Kennedy Calle 44 entre CRA 6ª Y 6C frente a la Cancha N°1.

Estado – En Ejecución.





En la actualidad la construcción del tramo No5: Vía barrio Kennedy Calle 41 entre CRA 6ª Y 6C frente a la Cancha N°1, se encuentra ejecutado al 100%, quedo por intervenir líneas de demarcación con pintura en frio, verificación de pozos - sumideros, reparación de andenes y sardineles.

Tramo N°6: Vía Centro Cra. 11 entre 16 y 13 Calle 14 y 13 entre CRA 11 y 9.

Estado – En Ejecución.





El Tramo No6, centro continuo en ejecución con un avance del **66.17%.** En la Calle 14 entre carreras 10 y 11 para este periodo se realizaron actividades como rellenos, seriado ultima capa base granular, así mismo la construcción de andenes afectados y posterior aplicación de emulsión e instalación de capa de rodadura MDC-19. En la Carrera11 entre calles 14 y 13 realizo la terminación rellenos granulares primera capa base granular y terminación instalación de bordillos.

CONTRATO No 734 DEL 2023

Registro Fotográfico:








Descripción fotografías: Se observa en las fotografías ilustradas, el sector Calle 14 entre Cra. 10 y 11 actividades realizadas como rellenos granular primera capa base , instalación de bordillos.

CONTRATO No 734 DEL 2023








<u>Descripción fotografías:</u> Se observa en las fotografías ilustradas en Cra. 14 entre Calle 11 y 10 , actividades realizadas seriado ultima capa base granular así mismo construcción de andenes afectados.

CONTRATO No 734 DEL 2023








<u>Descripción fotografías:</u> Se observa en las fotografías ilustradas en la Cra. 14 entre Calle 11 y 10 , la terminación de seriado y compactación de ultima capa de base granular , posteriormente aplicación de la emulsión asfáltica.

CONTRATO No 734 DEL 2023









<u>Descripción fotografías:</u> Se observa en las fotografías ilustradas en la Cra. 14 entre Calle 11 y 10 , la instalación de la mezcla asfaltica tipo MDC- 19 .

CONTRATO No 734 DEL 2023










<u>Descripción fotografías:</u> Se observa en las fotografías ilustradas, en la Calle 11 entre Carreas 14 y 13 actividades realizadas rellenos granulares capa subbase granular.

CONTRATO No 734 DEL 2023










<u>Descripción fotografías:</u> Se observa en las fotografías ilustradas, en la Calle 11 entre Carreas 14 y 13 actividades realizadas rellenos granulares primera capa base granular e instalación de bordillos.

CONTRATO No 734 DEL 2023










<u>Descripción fotografías:</u> Se observa en las fotografías ilustradas, en la Calle 11 entre Carreas 14 y 13 actividades realizadas rellenos granulares ultima capa base granular y terminación instalación de bordillos.

CONTRATO No 734 DEL 2023

Tramo No7: Vía Cra 14 entre Calle 24 y entrada Calle 34 (La Playa).

Estado – En Ejecución.

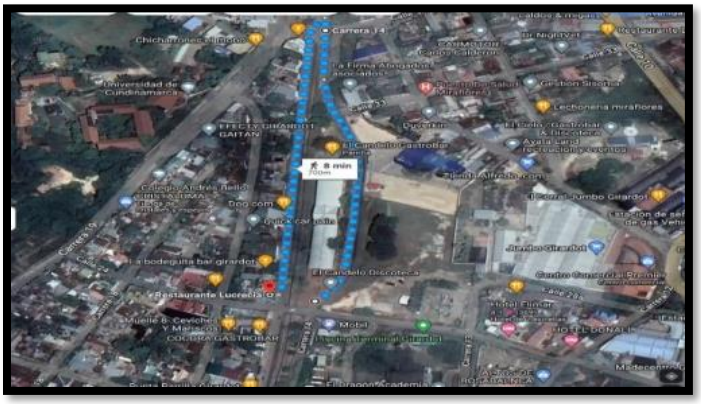



El **tramo No.7** Carrera 14 entre Calles 24 y entrada calle 34 alcanza un avance del **91.87%** para este periodo. Se terminaron las actividades correspondientes a rellenos granulares, seriado y compactado instalación de bordillos prefabricados desde el K0+190 al K0+330 y diagonal que conduce a la calle 34 K0+000 al K0+060. E imprimación e instalación de mezcla asfáltica. en los puntos de referencia K0+190 al K0+330.En este periodo se aprueba por parte del ICCU la inclusión de items no previstos necesarios para construcción de Muro de confinamiento de estructura de pavimento K0+330 al K0+350, por o cual en el próximo periodo se procederá a iniciar dicha obra.

Registro Fotografico

CONTRATO No 734 DEL 2023









<u>Descripción fotografías:</u> Se observa en las fotografías ilustradas la terminación de seriado y compactación de ultima capa de base granular, posteriormente aplicación de la emulsión asfáltica en instalación de capa de rodadura en los puntos de referencia K0+190 al K0+350 y diagonal que conduce a la calle 34 K0+000 al K0+060.

CONTRATO No 734 DEL 2023








<u>Descripción fotografías:</u> Se observa en las fotografías ilustradas la instalación de capa de rodadura en los puntos de referencia K0+190 al K0+350 , una vez se construya el muro de confinamiento en el K0+330 al K0+350 se instalara la mezcal asfáltica en la diagonal que conduce a la calle 34 K0+000 al K0+060.

CONTRATO No 734 DEL 2023

DESARROLLO EJECUCION COMPONENTE PARQUE LINEAL

La renovación arquitectónica, paisajística y cultural de la alameda férrea del parque lineal el sol, continua sin actividad con un avance del **32.74%** al presente mes.

Teniendo en cuenta que en la actualidad aún no se cuenta con el correspondiente permiso para continuar con las actividades de obra dentro de las áreas de inmediatez al corredor férreo, el Convenio 964/2022 se mantiene suspendido.

Sin embargo, la administración a realizado las acciones necesarias referente a la subsanación de observaciones realizar a la documentación entregada por parte de municipio ante el ministerio en el año 2023 y las cuales fueron atendidas por esta administración , procediendo a radicar ante el ministerio el pasado 17 de julio 2024 aportando las subsanaciones a las observaciones emitidas en la primera entrega. Sin que a la fecha se ha tenido respuesta alguna por parte del Ente gubernamental.

Mientras no se dé cumplimiento a lo anterior, las obras dentro del parque lineal deben continuar suspendidas. Por lo que en este componente se continuara realizando actividades en los andenes perimetrales, lo que genera una disminución considerable en el porcentaje de avance y ejecución de este componente.

A continuación, se describe el estado de ejecución de obra en los sectores intervenidos antes de la suspensión de actividades en este componente:

CONTRATO No 734 DEL 2023

Registro Fotográfico

Sector - La Locomotora:









CONTRATO No 734 DEL 2023






<u>Descripción fotografías:</u> Se observa en las fotografías ilustradas, en el sector de la locomotora, se puede evidenciar que en la vía realizada en adoquines está sufriendo un grave deterioro a causa de la suspensión de este componente.


CONTRATO No 734 DEL 2023


Construcción Andenes Perimetrales Cra 14 entre Calles 16 y 17







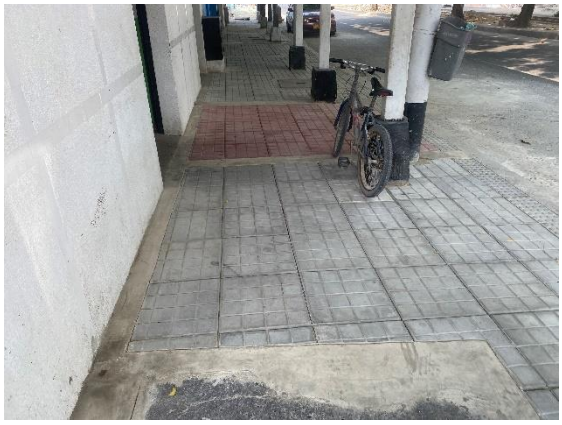

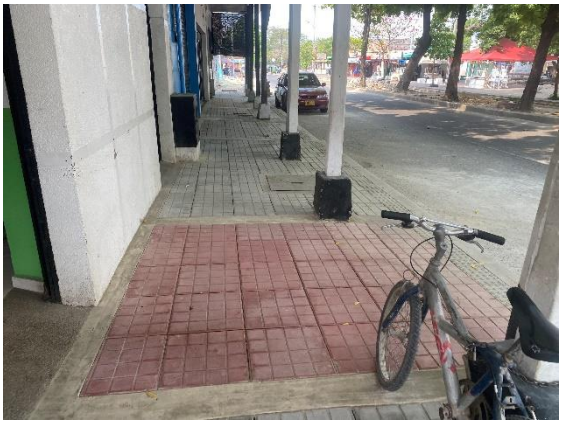



CONTRATO No 734 DEL 2023


Construcción Andenes Perimetrales Cra 14 entre Calles 17 y 18










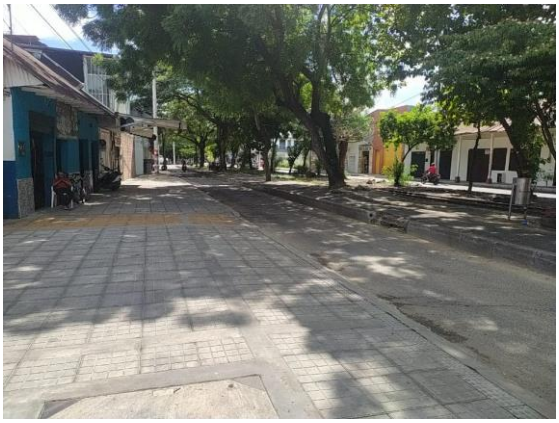

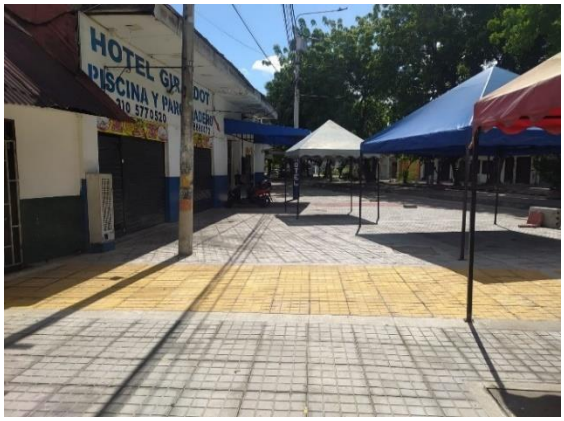

CONTRATO No 734 DEL 2023

ESTADO FINANCIERO VIAL

Descripción Contractual	Valor	Valor anticipo 30%	Amortización anticipo	Saldo por Amortizar
Valor Segmento Vial	$13.254.935.312	$3.976.480.593	-	-
Valor Pago No1	$5.029.850.315		$1.508.955.095	-
Saldo por Pagar	$8.225.084.997		-	-
Acumulado Pagado	$5.029.850.315		-	$2.467.525.498
Porcentaje ejecutado	**37.94 %**			
Porcentaje por ejecutar	**62.06%**			

ESTADO FINANCIERO PARQUE LINEAL

Descripción Contractual	Valor	Valor anticipo 30%	Amortización anticipo	Saldo por Amortizar
Valor Componente parque Lineal	$8.241.065.660	$2.472.319.698	-	-
Valor Pago No1	$1.249.788.862		$374.936.658,6	-
Saldo por Pagar	$6.991.276.798		-	-
Acumulado Pagado	$1.249.788.862		-	$2.097.383.039
Porcentaje ejecutado	**15,16 %**			
Porcentaje por ejecutar	**84.84%**			

CUADRO DE GARANTIAS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No SGPL-92817008-1				
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**	**No Anexo**
Cumplimiento del contrato	26/04/2023	30/01/2025	$2.149.600.097,20	2
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	26/04/2023	30/01/2025	$6.448.800.291,60	

CONTRATO No 734 DEL 2023

Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	26/04/2023	30/09/2027	$1.074.800.048,60	
Estabilidad y calidad de las obras	30/09/2024	30/09/2029	$4.299.200.194,40	

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No LBCO 92819078-1		
AMPARO **VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA** **SUMA ASEGURADA**	**No Anexo**
Predios, laborales y operacionales	$1.074.800.048,60	1
RC contratistas y subcontratista independientes	$537.400.024,00	
RC patronal	$161.220.007,00	
Vehículos propios y no propios	$268.700.012,00	

Atentamente.

ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS
Secretaria de Infraestructura

ELABORO: YEISSON T.
ING. YEISSON TRUJILLO GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION S.I.

CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT

901.732.581-7

MUNICIPIO DE GIRARADOT – CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1062-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN DE ALGUNOS SEGMENTOS VIALES, Y LA RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA, PAISAJÍSTICA Y CULTURAL DE LA ALAMEDA FÉRREA LINEAL EL SOL, PARA UNA MOVILIDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA".

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT
NIT: 901.732.581-7

INFORME EJECUTIVO

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA MESUAL PERIODO DEL 01-31 DE JULIO DEL 2024

Contenido

1. INTRODUCCIÓN. 8
2. ANTECEDENTES 8
2.1. ASPECTOS CONTRACTUALES INTERVENTORÍA. 8
3. ALCANCE DEL PROYECTO. 9
3.1 PROGRAMACION. 10
3.2 ACTIVIDADES EN EJECUCION DEL PROYECTO. 16
3.3 ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS DEL CONTRATO 18
3.3.1. GARANTIAS INTERVENTORIA. 18
3.3.2. ASPECTOS FINANCIEROS. 19
3.3.3. GARANTIAS CONTRATISTA DE OBRA. 19
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 21
4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 21
5. RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 21
6. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 22
3.4. ASPECTOS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA 23
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 24
3.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 24
3.4. ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROYECTO DESDE EL 1 AL 30 DE JULIO DEL 2024. 28
3.5. ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 29
4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS 29
4.3. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 29
4.4. AVANCES OBRA VIAL (COMPONENTE TRAMOS VIALES) 30
4.4.1. CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN LAS VIAS 31
4.4.2. TRAMO VIAL 1 33
4.4.3. TRAMO VIAL 2 40
4.4.4. TRAMO VIAL 3 43
4.4.5. TRAMO VIAL 4 48
4.4.6. TRAMO VIAL 5 49
4.4.7. TRAMO VIAL 6 52
4.4.8. TRAMO VIAL 7 60
4.5. AVANCE PARQUE LINEAL - LA RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA, PAISAJÍSTICA Y CULTURAL DE LA ALAMEDA FÉRREA LINEAL EL SOL, PARA UNA MOVILIDAD INTELIGENTE 67

4.5.1. CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN PARQUE LINEAL 69
5. CONSOLIDADO DEL CONTRATO DE OBRA No. 734 -2023 80
5.3. OBJETO "REHABILITACIÓN DE ALGUNOS SEGMENTOS VIALES, Y LA RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA, PAISAJÍSTICA Y CULTURAL DE LA ALAMEDA FÉRREA LINEAL EL SOL, PARA UNA MOVILIDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA". 80
6. CONTROL DE CALIDAD 95
6.3. VALLA 96
14.2 COMITÉ DE SEGUIMIENTO 98
14.3 BITACORA 98
15 SG-SST 98
1. ASPECTOS BASICOS LEGALES 98
3. ELEMENTOS DE EMERGENCIA 99
4. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 99
5. MAQUINARIA Y EQUIPO 100
6. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 100
11. OBSERVACIONES 104
12. RECOMENDACIONES 104
6.3. COMPONENTE SOCIAL 105
6.3.1. PROGRAMA ATENCION A LA COMUNIDAD 105
6.3.2. ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD 105
6.4. PROGRAMA DE INFORMACION Y DIVULGACION. 106
6.5. PROGRAMA DE PARTICIPACION COMUNITARIA. 107
6.6. PROGRAMA DE GESTION Y RESTITUCION PREDIAL 108
6.7. PROGRAMA DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA 109
6.8. CONCLUSIONES 110
16. INFORME AMBIENTAL 111
17. GESTIÓN PAGA 111
17.1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL 112
17.2. Programas de requerimientos 113
18. GESTIÓN PLAN DE CALIDAD 114
18.1. Información de entrada 114
18.2. Identificación y trazabilidad 114
18.3. Informe 114
18.4. Gestión de recursos de la Interventoría 114

18.5. Control de procesos y equipos.....115
18.6. Calificación del cumplimiento de los Sistemas de Gestión.....115
19. ACTIVIDADES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LA OBRA......115
20. CONCLUSIONES.....117

Lista de tablas

Tabla 1. ASPECTOS CONTRACTUALES DE INTERVENTORÍA. 8
Tabla 3. Personal de interventoría.....21
Tabla 4. Control de cantidades ejecutadas en las vías. 32
Tabla 5. Control de cantidades ejecutadas en parque lineal. 69
Tabla 6. Control de cantidades ejecutadas en términos FINANCIEROS Parque Lineal 79
Tabla 7. Actividades técnicas contempladas dentro del proyecto.....112
Tabla 8. Actividades solicitudes para aprovechamiento de especies arbóreas.....113
Tabla 9. Medidas compensatorias por tramos.....113
Tabla 10. Cumplimiento deberes del contratista de obra. 115

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Localización General del proyecto – Girardot 24
Ilustración 2. Tramo Rosa Blanca.....25
Ilustración 3. Tramo Vía U. Cundinamarca.....25
Ilustración 4. Tramo Vía Alicante.....25
Ilustración 5. Tramo Vía Alicante.....25
Ilustración 5. Tramo Vía Alicante.....25
Ilustración 5. Tramo Vía San Jorge 26
Ilustración 6. Tramo Vía Centro 26
Ilustración 7. Tramo Vía la Playa. 27

Lista de Gráficos

Gráfico 1. PORCENTAJES VIAS DE AVANCE REAL vs PROGRAMADO 30
Gráfico 2. PORCENTAJES PARQUE DE AVANCE FISICO Y EJECUCION PRESUPUESTAL.....69
Gráfico 3. Proyectado vs Ejecutado EN PORCENTAJES.....79
Gráfico 4. PORCENTAJES CONTRATO DE AVANCE REAL vs PROGRAMADO 94
Gráfico 5. Implementos de oficina utilizados por interventoría.....115

1. INTRODUCCIÓN.

De conformidad con el contenido del contrato de Interventoría **No. 1062-2023** pactado entre **CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT** y el municipio de Girardot, Cundinamarca que tiene por objeto **"OBRA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN DE ALGUNOS SEGMENTOS VIALES, Y LA RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA, PAISAJÍSTICA Y CULTURAL DE LA ALAMEDA FÉRREA LINEAL EL SOL, PARA UNA MOVILIDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA".**
El presente informe surge de la rendición de cuentas para la entidad contratante y consigna todas las actividades, con el fin de cumplir con los aspectos técnicos y contractuales

2. ANTECEDENTES

Las características particulares del Contrato de interventoría son:

2.1. ASPECTOS CONTRACTUALES INTERVENTORÍA.

Tabla 1. ASPECTOS CONTRACTUALES DE INTERVENTORÍA.

INTERVENTOR	CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	No. 1062-2023
NIT	901732581-7
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR FABIAN GONZALEZ ARENAS
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATODE OBRA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN DEALGUNOS SEGMENTOS VIALES, Y LA RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA, PAISAJÍSTICA Y CULTURAL DE LA ALAMEDA FÉRREA LINEAL ELSOL, PARA UNA MOVILIDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATO DE INTERENTORÍA	MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/L ($1.677.163.691,17).
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE NUEVE (9) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO DE INTERVENTORIA	31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 1 AMPLIACION PLAZO DE INTERVENTORIA	28 DE DICIEMBRE DEL 2023
TIEMPO DE PRORROGA N°01:	4 MESES
ACTA DE SUSPENSION N°1	29 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE SUSPENSION N°1	15 DIAS CALENDARIO
AMPLIACION N°1 SUSPENSION N°1	14 DE MAYO DEL 2024
TIEMPO AMPLIACION N°1	15 DIAS CALENDARIO
ACTA DE REINICIO N°1	29 DE MAYO DE 2024
ADICION 1 PRORROGA 2 AMPLIACION PLAZO DE INTERVENTORIA	30 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACION DE INTERVENTORIA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
SUPERVISOR MUNICIPIO	ING. KELLY DIAZ

3. ALCANCE DEL PROYECTO.

REHABILITACIÓN DE ALGUNOS SEGMENTOS VIALES:

Con la ejecución del proyecto se busca mejorar las condiciones de ciertos segmentos viales existente para el Municipio de Girardot ya que, por la deteriorada condición de las carreteras, la escasez de vías de acceso a la ciudad y los recurrentes atascos vehiculares debidos a una planificación insuficiente, afectan negativamente la organización, movilidad, presentación, desarrollo y competitividad del municipio. La mejora de la infraestructura vial existente no solo crea un entorno más seguro para los usuarios y alivia la carga de trabajo de los responsables de la gestión del tráfico y los servicios de emergencia, sino que también conlleva beneficios sociales, como la reducción de la contaminación ambiental, el incremento de la productividad en sectores como la industria, la empresa, la minería, el turismo y la agricultura, y garantiza la distribución de alimentos a diversos estratos de la sociedad. Los segmentos viales a intervenir son los siguientes, Tramo Kennedy, Tramo Vía la playa, Tramo U. Cundinamarca, Tramo San Jorge, Vía Alicante, Tramo Centro, Tramo Rosa Blanca

“RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA, PAISAJÍSTICA Y CULTURAL DE LA ALAMEDA FERREA DEL PARQUE LINEAL EL SOL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA”
Adecuación de aproximadamente 17.720 M2 de espacio público que se componen de tres espacios principales como son el parque de la locomotora, el parque Jorge Eliecer Gaitán

y el parque al camarógrafo así mismo como el sendero de circulación peatonal y ciclo ruta, en el cual se determina la adecuación y cambio de zonas duras, adecuación de zonas verdes, el mejoramiento de andenes, zonas de circulación y el trayecto correspondiente a la línea del ferrocarril que contará con el mejoramiento de la zonas duras y las especies arbóreas existentes, mejoramiento de iluminación halógena por iluminación LED, con sistemas de iluminación doble propósito en algunos puntos, instalación de mobiliario urbano que se compone de parques recreativos, bancas y basureros.

Es así que se busca la mejora de la infraestructura vial, y la renovación arquitectónica, paisajística y cultural de la alameda férrea lineal el sol, para una movilidad inteligente lo que facilita un desplazamiento más fluido y seguro para los residentes y visitantes del municipio. Esto reduce los riesgos de accidentes de tránsito y el desgaste de los vehículos, lo que a su vez disminuye los costos de mantenimiento.

Por su parte ayuda a generar un estímulo económico en donde renovación arquitectónica, paisajística y cultural puede atraer a más turistas y visitantes, lo que beneficia la economía local. Además, la inversión en infraestructura crea empleos temporales y puede revitalizar áreas comerciales y residenciales, generando un impacto positivo en el desarrollo económico del municipio. Así mismo se logra una sostenibilidad a largo plazo ya que sienta las bases para un desarrollo sostenible y social. Esto puede ayudar a que el municipio de Girardot crezca de manera planificada y sostenible.

Para el control y seguimiento de la rehabilitación de los segmentos viales del presente informe se tiene las siguientes programaciones que comprenden los Tramos viales siguientes (Vía la playa, Tramo U. Cundinamarca, Vía Alicante, Tramo Centro, Tramo Rosa Blanca y tramo Kennedy), así:

3.1 PROGRAMACION.

Se da inicio a la ejecución de las obras, el día 31 de julio del 2023, mediante acta de inicio, se solicita al contratista programación inicial de las obras con termino al 31 de diciembre del 2023.


Mediante otrosí en diciembre 28 se amplía el plazo de ejecución de las obras, por 04 meses, hasta el día abril 30 del 2024, tiempo adicional en donde se presenta y aprueba reprogramación de las actividades de obra.

En el mes de febrero del 2024, el rendimiento y avance en la ejecución de las obras NO tienen el rendimiento esperado, se solicita por parte de la interventoría un plan de contingencia que coadyube a terminar en los tiempos del contrato las obras, se solicita entonces programación del plan de contingencia que ayude a acelerar la ejecución de las obras y que logre adelantar los atrasos.

Se amplía el plazo de ejecución de las obras del contrato por 04 meses más, a partir de la fecha de adición del tiempo contractual mayo 29 del 2024 y se solicita por parte de la interventoría programación con termino 30 de septiembre del 2024, programación que se presenta a continuación.

Tabla 3. Reprogramación N°1 de PLAZO ADICIONAL Obra Segmentos Viales


Id	Modo de tarea	Notas	Nombre de tarea	Duración
1			**REHABILITACIONES VIALES GIRARDOT**	**101,25 días**
2			INICIO DE OBRA	0 días
3			**TRAMO 6 CENTRO (500ml)**	**101,25 días**
4			**CAPITULO 1 - EXPLANACIONES**	**93,25 días**
5		**Calle 14 cra 11 cra 10 - cra 11 entre calle 13 y calle 14**	**TRAMO 1**	**23,38 días**
6			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	6 días
7			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN,	8 días
8			INTERVENCIÓN POR PARTE DE ACUAGYR	10 días
9		**Continuación cll 13 entre cra 11 y cra 10 - Continuación entre cll 14 entre cra 10 y cra 9**	**TRAMO 2**	**58,63 días**
10			DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A	7 días
11			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNADISTANCIA DE 5KM)	7 días
12			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	21 días
13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y	7 días
14			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	5 días
15			INTERVENCIÓN DE ACUAGYR	28 días
16			**CAPITULO 2- PAVIMENTOS**	**84,88 días**
17		**Calle 14 cra 11 cra 10 - cra 11 entre calle 13 y calle 14**	**TRAMO 1**	**19,25 días**
18			SUBBASE GRANULAR	8 días
19			BASE GRANULAR	9 días
20			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	4 días
21			RIEGO DE IMPRIMACIÓN	4 días
22			SARDINEL PREFABRICADO A-10	5 días
23		**Continuación cll 13 entre cra 11 y cra 10 - Continuación entre cll 14 entre cra 10 y cra 9**	**TRAMO 2**	**19 días**
24			SUBBASE GRANULAR	10 días
25			BASE GRANULAR	5 días
26			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	3 días
27			RIEGO DE IMPRIMACIÓN	3 días
28			SARDINEL PREFABRICADO A-10	5 días
29			**CAPITULO 3 -ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**2 días**

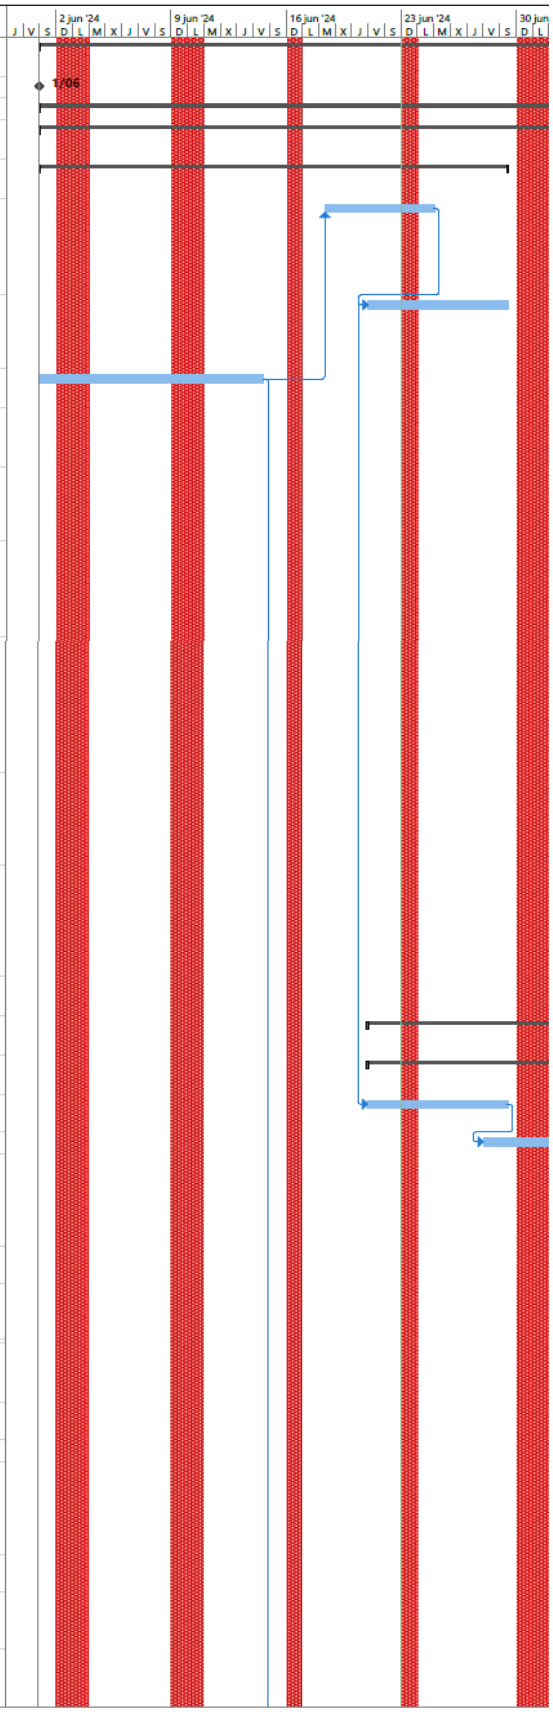

CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT

901.732.581-7


Id	Modo de tarea	Notas	Nombre de tarea	Duración
30			CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	2 días
31			SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	2 días
32			**CAPITULO 4 - TRANSPORTES**	**74,63 días**
33		**Calle 14 cra 11 cra 10 - cra 11 entre calle 13 y calle 14**	**TRAMO 1**	**6 días**
34			TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	6 días
35		**Continuación cll 13 entre cra 11 y cra 10 - Continuación entre cll 14 entre cra 10 y cra 9**	**TRAMO 2**	**50 días**
36			TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	21 días
37			**CAPITULO 5- SEÑALIZACION**	**2 días**
38			LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	2 días
39			**CUNDINAMARCA 1379ML**	**87,88 días**
40			**CAPITULO 1 - EXPLANACIONES**	**72,88 días**
41		**cra 19 entre calle 30 y calle 32**	**TRAMO 2B**	**17 días**
42			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	7 días
43			INTERVENCIÓN ACUAGYR	10 días
44		**Cra 19 entre calle 32 y calle 35**	**TRAMO 4**	**66 días**
45			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	17 días
46			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	17 días
47			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	9 días
48			INTERVENCIÓN ACUAGYR	40 días
49			**CAPITULO 2- PAVIMENTOS**	**82,88 días**
50		**cra 19 entre calle 24 y u. cundi**	**TRAMO 1**	**2 días**
51			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	2 días
52			RIEGO DE IMPRIMACIÓN	2 días
53		**cra 19 entre U cundi y calle 30**	**TRAMO 2A**	**12 días**
54			SUBBASE GRANULAR	7 días
55			BASE GRANULAR	5 días

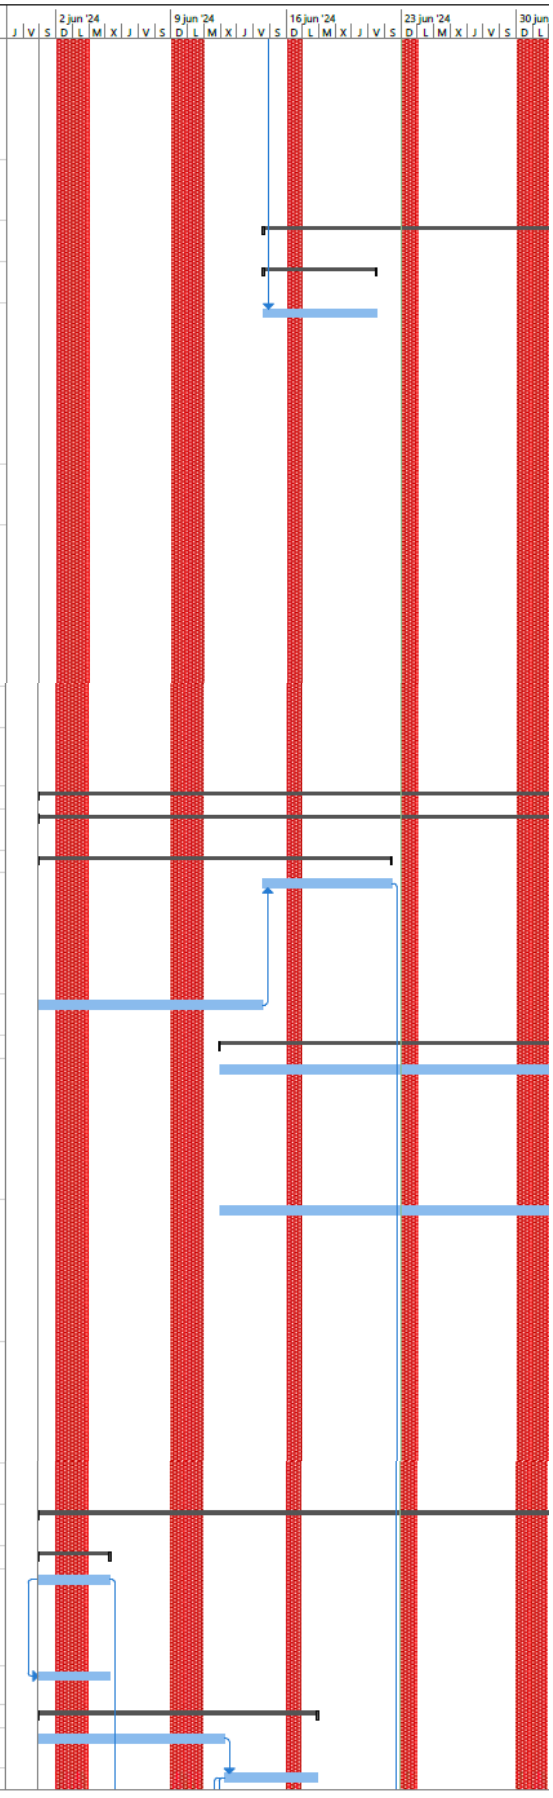

CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT

901.732.581-7


Id	Modo de tarea	Notas	Nombre de tarea	Duración
56			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	2 días
57			RIEGO DE IMPRIMACIÓN	2 días
58			SARDINEL PREFABRICADO A-10	4 días
59		cra 19 entre calle 30 y calle 32	**TRAMO 2B**	**28 días**
60			SUBBASE GRANULAR	7 días
61			BASE GRANULAR	8 días
62			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	2 días
63			RIEGO DE IMPRIMACIÓN	2 días
64		Cra 19 entre calle 35 y barlovento	**TRAMO 3**	**27 días**
65			SUBBASE GRANULAR	13 días
66			BASE GRANULAR	13 días
67			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	7 días
68			RIEGO DE IMPRIMACIÓN	7 días
69			SARDINEL PREFABRICADO A-10	12 días
70		Cra 19 entre calle 32 y calle 35	**TRAMO 4**	**19 días**
71			SUBBASE GRANULAR	1 día
72			BASE GRANULAR	9 días
73			SARDINEL PREFABRICADO A-10	10 días
74			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	3 días
75			RIEGO DE IMPRIMACIÓN	3 días
76			**CAPITULO 4 - TRANSPORTES**	**17 días**
77		Cra 19 entre calle 32 y calle 35	**TRAMO 4**	**17 días**
78			TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES)	17 días
79			**CAPITULO 5- SEÑALIZACION**	**5 días**
80			LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	5 días
81			**ROSA BLANCA 505 ML**	**92 días**
82			**CAPITULO 1 - EXPLANACIONES**	**4 días**
85			**CAPITULO 2- PAVIMENTOS**	**20 días**
86			**TRAMO 1**	**20 días**
87			RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	4 días
88			RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	4 días
89			SUBBASE GRANULAR	7 días
90			BASE GRANULAR	7 días
91			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	3 días
92			RIEGO DE IMPRIMACIÓN	3 días

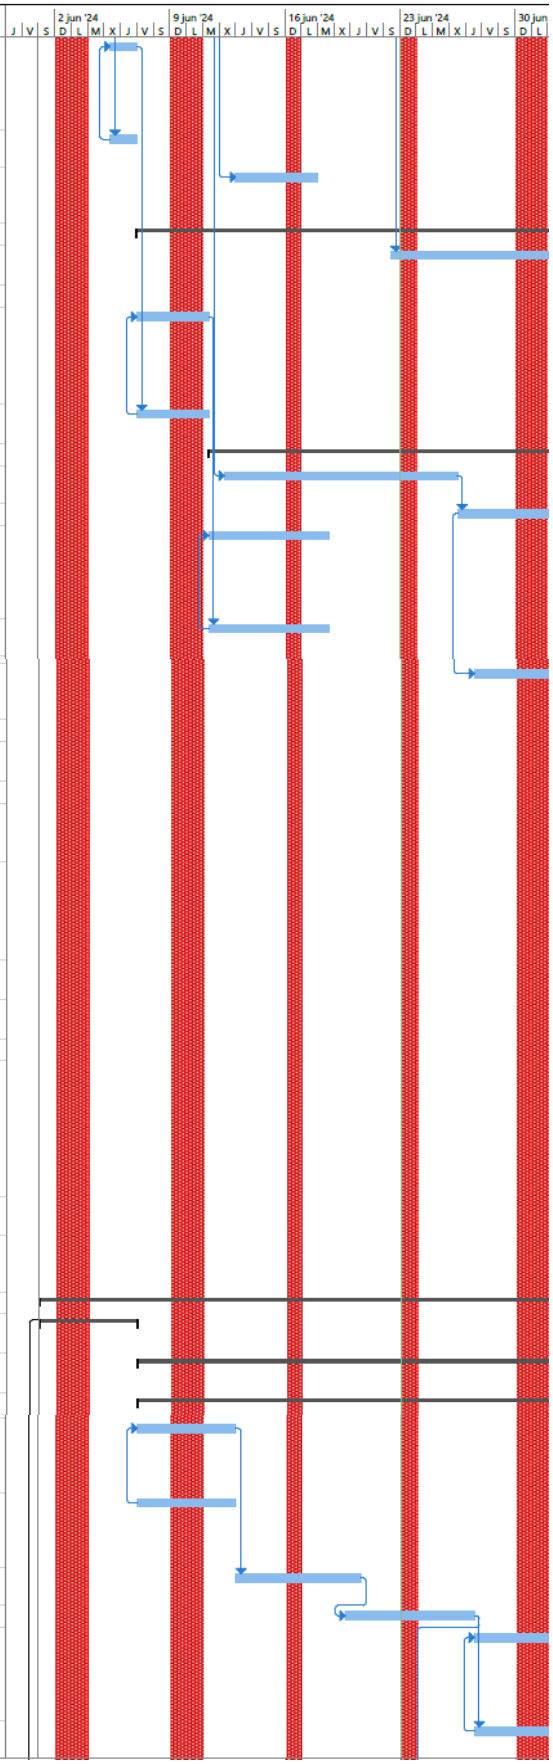

CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT

901.732.581-7


Id	Modo de tarea	Notas	Nombre de tarea	Duración
93			SARDINEL PREFABRICADO A-10	3 días
94			**CAPITULO 4 - TRANSPORTES**	**7 días**
95			**TRAMO 1**	**7 días**
96			TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES,	7 días
97			**CAPITULO 5- SEÑALIZACION**	**3 días**
98			**TRAMO 1**	**3 días**
99			LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	3 días
100			**LA PLAYA 756ML**	**59,75 días**
101			**CAPITULO 1 - EXPLANACIONES**	**13 días**
102		**Costado IAMSA conexión cundinamarca**	**TRAMO 2**	**13 días**
103			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNADISTANCIA DE 5KM)	4 días
104			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	9 días
105			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	7 días
106			**CAPITULO 2- PAVIMENTOS**	**56,75 días**
107		**Costado CDA**	**TRAMO 1**	**32,75 días**
108			BASE GRANULAR	11 días
109			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	3 días
110			RIEGO DE IMPRIMACIÓN	3 días
111			SARDINEL PREFABRICADO A-10	26 días
112		**Costado IAMSA conexión cundinamarca**	**TRAMO 2**	**18 días**
113			SUBBASE GRANULAR	7 días
114			BASE GRANULAR	8 días
115			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	2 días
116			RIEGO DE IMPRIMACIÓN	2 días
117			SARDINEL PREFABRICADO A-10	5 días
118			**CAPITULO 4 - TRANSPORTES**	**9 días**
119		**Costado IAMSA conexión cundinamarca**	**TRAMO 2**	**9 días**
120			TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES,	9 días
121			**CAPITULO 5- SEÑALIZACION**	**3 días**
122			LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	3 días
123			**SAN JORGE 695ML**	**98,88 días**
124			**CAPITULO 1 - EXPLANACIONES**	**89,88 días**
125			**TRAMO 1**	**89,88 días**

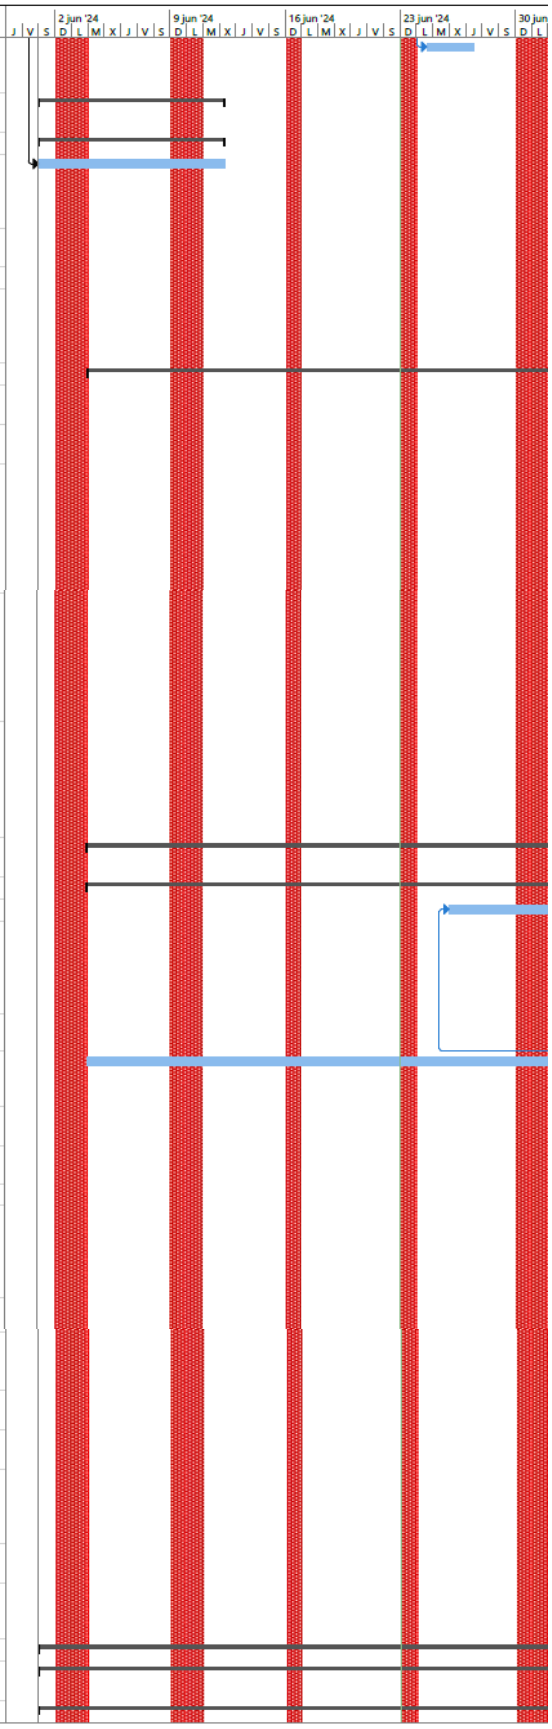

CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT

901.732.581-7

Id	Modo de tarea	Notas	Nombre de tarea	Duración
126			DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A	7 días
127			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A	13 días
128			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	27 días
129			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN,	10 días
130			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA	12 días
131			INTERVENCIÓN ACUAGYR	40 días
132			**CAPITULO 2- PAVIMENTOS**	**29 días**
133			**TRAMO 1**	**29 días**
134			SUBBASE GRANULAR	10 días
135			BASE GRANULAR	12 días
136			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	4 días
137			RIEGO DE IMPRIMACIÓN	4 días
138			SARDINEL PREFABRICADO A-10	13 días
139			**CAPITULO 3 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**2 días**
140			**TRAMO 1**	**2 días**
141			CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	2 días
142			SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	1 día
143			**CAPITULO 4 - TRANSPORTES**	**25 días**
144			**TRAMO 1**	**25 días**
145			TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	25 días
146			**CAPITULO 5- SEÑALIZACION**	**2 días**
147			LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	2 días
148			FIN OBRA	0 días

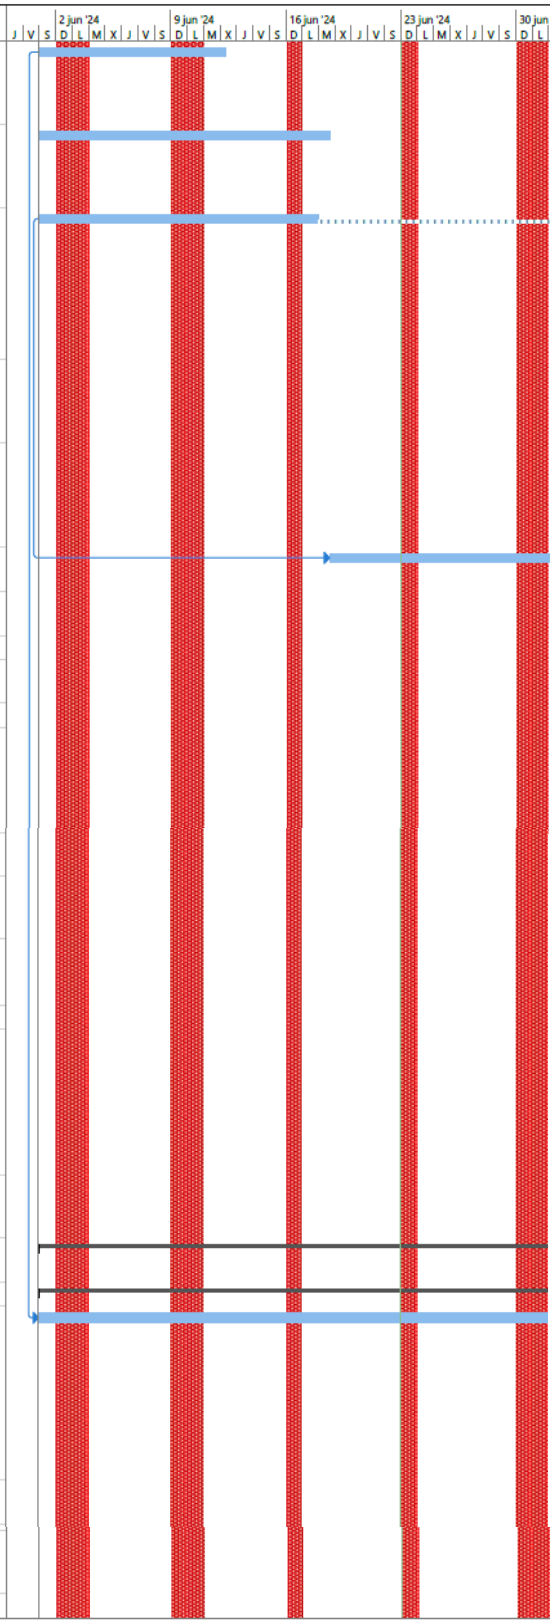

3.2 ACTIVIDADES EN EJECUCION DEL PROYECTO.

Para el desarrollo de la rehabilitación de los segmentos viales del presente informe se comprenden las actividades en los sectores intervenidos, Tramo Vía la playa, Tramo U. Cundinamarca, Tramo Centro, Tramo Rosa Blanca, se cuenta con la ejecución de las siguientes actividades en el presente periodo de tiempo programadas desde el inicio del plazo adicional de 04 meses así:

A. CERRAMIENTO:

Se realiza un cerramiento provisional de acuerdo con lo indicado en los planos, que aislé los tramos de vía que se van a intervenir. Se ponen los postes de madera a lo largo de los tramos, en los cuales estará amarrada y apuntillada la tela verde.

B. DEMOLICIONES:

Este ítem se refiere al conjunto de actividades de excavar, remover y retirar y cargar y disponer el lugar autorizado el terreno para formar la caja de la estructura del pavimento.

- **DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES, PISOS Y ANDENES DE CONCRETO Y BORDILLOS**

Los pavimentos rígidos y flexibles, andenes y bordillos de concreto, bases de concreto y otros elementos cuya demolición esté prevista en los documentos del proyecto, los cuales fueron demolidos con equipos apropiados y removidos en fracciones de tamaño adecuado, para que puedan ser utilizados en la construcción de rellenos o disponer de ellos como sea autorizado por el interventor y la normativa ambiental vigente. En caso de utilizar equipo pesado, el trabajo que se realice. cerca de la demolición se debe suspender a una distancia prudente, el constructor debe atender las disposiciones del artículo 102, Aspectos generales de seguridad

C. EXCAVACIONES PARA CONFORMACION DE LA SUBRASANTE:

Este ítem se refiere a excavaciones varias de material. El remover o quitar volúmenes de tierra u otros materiales con la finalidad de conformar espacios para la posterior construcción de estructuras y/o instalación de tuberías.

Se realizaron la excavación y nivelación de las zonas donde se van a construir los tramos de vía, se realizará de acuerdo con la sección transversal indicada en los planos constructivos.

Se tuvo cuidado con las redes de servicios públicos que puedan encontrarse en el lugar del proyecto, pues si durante la excavación hay que repararlas inmediatamente lo cual podrá causar retrasos en la obra. Luego de excavar y nivelar la subrasante hasta la cota determinada se procede a retirar y transportar el material de excavación

a los sitios de disposición o desecho previamente definidos.

D. GEOTEXTIL:

Se inició el suministro y la instalación de geotextiles para prevenir la mezcla entre los suelos de subrasante y los materiales que conforman las capas granulares del pavimento, de conformidad con los documentos del proyecto. El tipo y las propiedades requeridas del geotextil NT-1600.

E. SUBBASE:

Se continua con las actividades de suministro y la compactación de las capas granulares de la estructura, con la aplicación de la capa de sub?base en tramos; ROSA BLANCA, LA CUNDINAMARCA sector universidad, según las especificaciones y de conformidad con los documentos del proyecto. El tipo y las propiedades requeridas de las especificaciones.

F. BASE:

Se continua con las actividades de suministro y la compactación de las capas granulares de la estructura, con la aplicación de la capa de base en tramos; , LA CUNDINAMARCA sector universidad, según las especificaciones y de conformidad con los documentos del proyecto. El tipo y las propiedades requeridas de las especificaciones

G. SARDINEL PREFABRICADO A-10:

Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto A-10, se instala en tramos, CUNDINAMARCA sector universidad, PARQUE LINEAL SECTOR LA LOCOMOTORA y ANDENES SECTOR PARQUE JORGE ELIECER GAITAN HASTA LA MILFOR

H. RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE:

En algunos tramos de vías aparecen fallos que se mejoran con rajón y recebo como en ROSA BLANCA.

I. RIEGO DE IMPRIMACION:

Durante el periodo no se desarrolló en ningún tramo esta actividad.

J. MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19:

Durante el periodo no se desarrolló en ningún tramo esta actividad.

K. RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE:

Se suministra y dispone en tramos del parque de la locomotora y en fallos de vías para su mejoramiento

L. CARGUE DE SOBRANTES:

Se refiere al retiro y disposición de los **RCD,** en lugar aprobado por ente territorial, material proveniente de demoliciones y excavaciones que no cumplan con las especificaciones exigidas para ser utilizados como rellenos.

M. TRANSPORTE DE SOBRANTES:

Se refiere al transporte para la disposición final de los **RCD,** en lugar aprobado por ente territorial.

3.3 ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS DEL CONTRATO

3.3.1. GARANTIAS INTERVENTORIA.

El contrato de Interventoría se encuentra amparado por la aseguradora EQUIDAD SEGUROS. con las siguientes pólizas iniciales.

Tabla *5*. Garantías de cumplimiento de interventoría.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.000266				
Compañía de Seguros	**Póliza No.**	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor asegurado**
EQUIDAD SEGUROS	AB000266	CUMPLIMIENTO	30/04/2024 HASTA 30/01/2025	$214,256,978.70
EQUIDAD SEGUROS	AB000266	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	30/09/2024 HASTA 30/09/2027	$107,128,489.35
EQUIDAD SEGUROS	AB000266	CALIDAD DEL SERVICIO	30/09/2024 HASTA 30/09/2029	$214,256,978.70

3.3.2. ASPECTOS FINANCIEROS.

El contrato de interventoría cuenta con la siguiente información financiera:

Tabla *6*. Desembolsos realizados.

ESTADO FINANCIERO INTERVENTORIA		
COMPONENTE PARQUE LINEAL	**VALOR TOTAL**	**MESES/9**
VALOR COMPONENTE PARQUE LINEAL	$ 629.999.974,17	$ 69.999.997,13
VALOR DESEMBOLSADO HASTA LA FECHA COMPONENTE PARQUE LINEAL	8 MESES	$ 559.999.977,04
VALOR EJECUTADO COMPONENTE PARQUE A ABRIL	9 MESES	$ 629.999.974,17
PORCENTAJE DESEMBOLSADO COMPONENTE PARQUE LINEAL AL MES DE JULIO	**88,89%**	
PORCENTAJE POR DESEMBOLSAR COMPONENTE PARQUE LINEAL AL MES DE JULIO	**11,11%**	

COMPONENTE TRAMOS VIALES	**VALOR TOTAL**	**MESES/9**
VALOR INICIAL COMPONENTE SEGMENTOS DE VIAS	$ 1.047.163.717,00	$ 116.351.524,11
VALOR ADICION COMPONENTE VIAS (4 MESES)	$ 465.406.096,00	$ 116.351.524,00
TOTAL COMPONENTE VIAL	$ 1.512.569.813,00	
VALOR EJECUTADO COMPONENTE VIAL A JULIO	11 MESES	$ 1.279.866.765,22
VALOR POR PAGAR COMPONENTE VIAL A JULIO	3 MES(ABRIL, JUNIO, JULIO)	$ 349.054.572,00
PORCENTAJE EJECUTADO	**84,62%**	
PORCENTAJE POR EJECUTAR	**15,38%**	

COMPONENTE PARQUE + TRAMOS VIALES	**VALOR TOTAL**	**MESES/4**
VALOR TOTAL CONTRATO INCIAL (PARQUE + TRAMOS VIALES)	$ 1.677.163.691,17	$ 186.351.521,24
VALOR ADICION COMPONENTE TRAMOS VIALES (04 MESES)	$ 465.406.096,00	$ 116.351.524,00
V. TOTAL CONTRATO ADICIONADO (PARQUE + TRAMOS VIALES)	$ 2.142.569.787,17	
VALORES PAGADOS	8 MESES (2 COMPONENTES)	$ 1.490.812.169,93
VALORES POR PAGAR	1 MES (2 COMPONENTES)	$ 186.351.521,24
	2 MES (1 COMPONENTE VIAS)	$ 232.703.048,00
VALOR EJECUTADO	2 COMPONENTES	$ 1.909.866.739,17
VALOR POR EJECUTAR	2 MES (1 COMPONENTE VIAS)	$ 232.703.048,00
PORCENTAJE EJECUTADO	**89,14%**	
PORCENTAJE POR EJECUTAR	**10,86%**	

3.3.3. GARANTIAS CONTRATISTA DE OBRA.

El contrato de contratista se encuentra amparado por la aseguradora ZURICH COLOBIA SEGUROS S.A con las siguientes pólizas iniciales:

Tabla *7*. Garantías contractuales contrato de obra.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. SGPL-92817008-1				
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**	**No. ANEXO**
Cumplimientos del contrato	26/04/2023	31/01/2025	$2.149.600.097,20	7
Buen manejo y correcta inversión el anticipo	26/04/2023	30/01/2025	$6.448.800.291.60	
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	26/04/2023	30/09/2027	$1.074.800.048,60	
Estabilidad y calidad de las obras	30/09/2024	30/09/2029	$4.299.200.194,40	

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. LBCO-92819078-1		
AMPARO	**SUMA ASEGURADA**	**No. ANEXO**
1-Predios, laborales y operaciones	$1.074.800.048,60	6
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	$537.400.024,00	
5-RC Patronal	$161.220.007,00	
6-rc Vehículos propios y no propios	$268.700.012,00	

El contrato de obra cuenta con la siguiente información financiera:

Tabla *8*. Desembolsos realizados.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$21.496.000.972,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$21.496.000.972,00
VALOR ACTA PARCIAL1 RADICADA EN EL MUNICIPIO:28/12/23	$ 4.395.747.424,60
DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LA FIDUCIA	$ 6.448.800.290,990
TOTAL, DESEMBOLSOS	$ 10.844.547.716,20
SALDO POR PAGAR:	$15.216.361.794,00

3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

A la fecha se han invertido los recursos del proyecto de acuerdo con el programa de inversión, a continuación, se presenta el resumen del estado financiero del contrato de interventoría:

Tabla *14*. Situación financiera contrato de interventoría

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 1.677.163.691,17	100%
VALOR DESEMBOLSADO	$ 1.490.812.169.93	84.62%
SALDO POR CANCELAR	$ 186.351.521,24	15.38%
CONTRATO DE INTERVENTORIA ADICIONADO	$ 2.142.569.787,17	100%
VALOR EJECUTADO A JULIO	$ 1.909.866.739,17	89.14%

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla *5*. Situación financiera contrato de obra

DESCRIPCION	VALOR TOTAL	%
CONTRATO DE OBRA	$21.496.000.972,00	100%
VALOR ACTUAL PAGADO	$6.279.639.178,00%	0%
SALDO POR CANCELAR	**15.216.361.794,00**	70.79%
VALOR DEL FLUJO EJECUTADO ACTUAL	$9.215.519.984,44	42.87%
VALOR FLUJO PROGRAMADO	$ 16.171.441.526	75.23%
DIFERENCIA (+/-)	-$ 6.955.334.591	-32.36%

5. RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

Tabla 2. Personal de interventoría

PERSONAL PROFESIONAL	
1	Director de Interventoría
2	Ingeniero Residente de Interventoría
1	Especialista en Pavimentos y/o vias
1	Ingeniero Ambiental
1	Profesional en SST
1	Trabajador Social

1	Abogado
1	Contador publico
PERSONAL TÉCNICO	
3	Inspector
PERSONAL ADMINISTRATIVO	
1	Secretaria
1	conductor

6. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad, a través de la interventoría, reviso y aprobó los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que recibió a título de anticipo, el Contratista constituyo un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, el cual fue vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que pudo haber afectado el anticipo se autorizó, la interventoría velo así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor.

Tabla *9*. Desembolsos realizados anticipo-fiducia.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO GIRARDOT 2024

(Escriba el nombre o rzañon social del consultor contratado)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERALAMEDA VIAL GIRARDOT

(Escriba el nombre o rzañon social del Interventor)

RETENCIONES $ 1.031.808.038,99

B. DATOS ESPECIFICOS

No.	DESCRIPCION	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP6	PLAN Y FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO	SALDO RESTANTE POR FACTURAR
1	MATERIALES	$ 591.162.100,00	$ 781.129.300,00	$ 538.852.500,00	$ 169.485.900,00	$ 183.683.100,00	$ 1.282.527.200,00	$ 3.546.840.160,05	$ 60,05
2	EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA				$ 345.000.000,00		$ 1.073.736.000,00	$ 1.418.736.064,02	$ 64,02
3	TRANSPORTES DE MATERIALES	396.000.000,00	396.000.000,00	198.000.000,00	$ 100.000.000,00		6.296.000,00	$ 1.096.296.049,47	$ 49,47
4	SUBCONTRATOS MANO DE OBRA Y PERSONAL DE OBRA	$ 49.005.500,00	$ 49.005.500,00	$ 99.971.200,00	$ 100.000.000,00	$ 30.089.400,00	$ 58.856.400,00	$ 386.928.017,45	$ 17,45
	SUBTOTALES	**$ 1.036.167.600,00**	**$ 1.226.134.800,00**	**$ 836.823.700,00**	**$ 714.485.900,00**	**$ 213.772.500,00**	**$ 2.421.415.600,00**	**$ 6.448.800.290,99**	**$ 191,0**

A la fecha se han realizado 6 desembolsos por parte del encargo fiduciario, sobre el anticipo desembolsado de **$ 6.448.800.290,99** quedando un saldo pendiente por desembolsar de **$ 191,00.**

3.4. ASPECTOS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA

Tabla *9*. Aspectos contractuales contrato de obra.

CONVENIO	**CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT**
PROCESO SELECCIÓN:	**LP-002-2023.**
CONTRATO DE OBRA:	**No. 734-2023**
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:	**25 de abril de 2023.**
MUNICIPIO:	**GIRARADOT - CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO GIRARDOT 2024**
REPRESENTANTE LEGAL:	**IVAN YESID GALVIZ CHACON**
INTERVENTORIA DELEGADA	**CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT**
OBJETO:	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE REHABILITACION DE ALGUNOS SEGMENTOS VIALES, Y LA RENOVACION ARQUITECTONICA, PAISAJISTICA Y CULTURAL DE LA ALMEDA FERREA LINEAL EL SOL, PARA UNA MOVILIDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA**
VALOR INICIAL:	**VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS M/L ($21.496.000.972,00).**
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE NUEVE (9) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.**
ACTA INICIO:	**31 de julio de 2023.**
PRORROGA N°1	**28 DE DICIEMBRE DE 2023**
TIEMPO DE PRORROGA N°01:	**4 MESES**
ACTA DE SUSPENSION N°1	**29 DE ABRIL DE 2024**
TIEMPO DE SUSPENSION N°1	**15 DIAS CALENDARIO**
AMPLIACION N°1 SUSPENSION N°1	**14 DE MAYO DE 2024**
TIEMPO AMPLIACION N°1	**15 DIAS CALENDARIO**

ACTA DE REINICIO No1	**29 DE MAYO DE 2024**
PRORROGA Nº 2	**29 DE MAYO DE 2024 (4 MESES)**
FECHA TERMINACION FINAL:	**30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT**
SUPERVISOR MUNICIPIO:	**ING. KELLY DIAZ**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL

Girardot es un Municipio Colombiano del departamento de Cundinamarca, Girardot se sitúa en el centro del país, en la región conocida como el Valle de Magdalena Medio. Está aproximadamente a unos 130 kilómetros al suroeste de Bogotá, la capital de Colombia. El municipio de Girardot ocupa una superficie de alrededor de 68.65 kilómetros cuadrados.

Girardot se encuentra limitado geográficamente por el río Magdalena al oeste, lo que proporciona una barrera natural a esa parte del municipio. Al norte limita con el municipio de Ricaurte, al este con Nariño, y al sur con Tocaima. con temperaturas promedio que oscilan entre los 28°C y 32°C. Debido a su ubicación geográfica en una región baja y próxima al río Magdalena, la ciudad experimenta una temporada de lluvias entre los meses de abril y noviembre.

3.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ilustración 1. Localización General del proyecto – Girardot

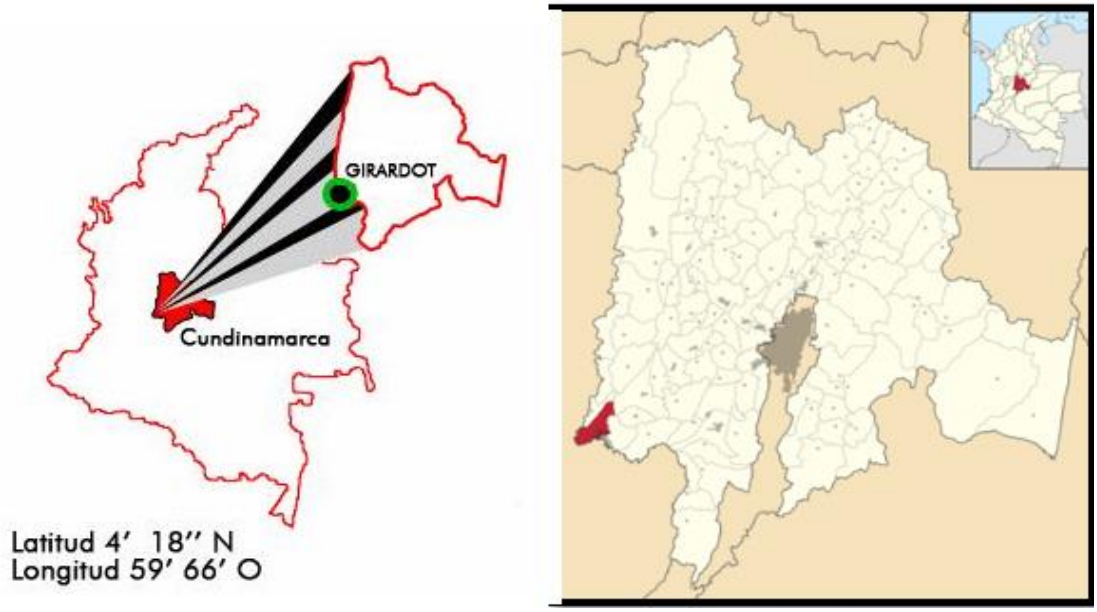


Ilustración 2. Tramo Rosa Blanca

Ilustración 3. Tramo Vía U. Cundinamarca

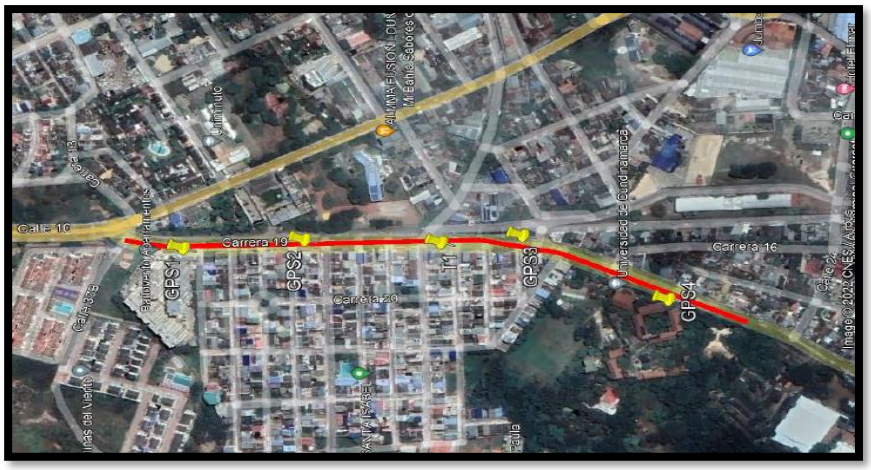


Ilustración 5. Tramo Vía Alicante



Ilustración 6. Tramo Vía Alicante



Ilustración 7. Tramo Vía San Jorge



Ilustración 8. Tramo Kennedy.



Ilustración 8. Tramo Vía Centro



Ilustración 9. Tramo Vía la Playa.



Ilustración 9. PARQUE LINEAL.



3.4. ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROYECTO DESDE EL 1 AL 30 DE JULIO DEL 2024.

De acuerdo con el tiempo de ejecución de las obras, se enmarca el periodo comprendido entre el 1 al 30 de julio de 2024, para la obra denominada "**OBRA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN DE ALGUNOS SEGMENTOS VIALES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA**" será regido por la normas y especificaciones técnicas de la NSR-10, así como las normas NTC. y contempla las siguientes actividades:

Tabla *10*. Actividades contractuales

CAPITULO 1 - EXPLANACIONES
DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNADISTANCIA DE 5KM)
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
CAPITULO 2- PAVIMENTOS
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE
RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
SUBBASE GRANULAR
BASE GRANULAR
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)
RIEGO DE IMPRIMACIÓN
SARDINEL PREFABRICADO A-10
CAPITULO 3 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)
SUMIDERO PREFABRICADO SL-100
CAPITULO 4 - TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES
CAPITULO 5- SEÑALIZACION
LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO

3.5. ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El **CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT,** debe velar por la calidad de cada uno de los componentes del Contrato de Obra No 734-2023" **OBRA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN DE ALGUNOS SEGMENTOS VIALES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA"**, los cuales son:

- Aseguramiento de la calidad de los materiales y equipos utilizados.
- Aseguramiento de la idoneidad profesional y técnica del personal vinculado.
- Seriedad en la entrega y presentación de la información requerida por la Administración Municipal.
- Fluidez en los canales y medios de comunicación internos y externos.
- Control de documentos y registros.
- Oportuna y adecuada atención a la comunidad
- Supervisión de la organización y señalización general de los frentes de obra

4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024, la firma CONSORCIO GIRARDOT 2024 bajo la supervisión y control de esta Interventoría, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato;

4.3. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla *11*. Actividades en ejecución del contratista.


ACTIVIDADES
DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNADISTANCIA DE 5KM)
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)
SUBBASE GRANULAR
BASE GRANULAR

ACTIVIDADES
SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE
RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
RIEGO DE IMPRIMACIÓN
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES

4.4. AVANCES OBRA VIAL (COMPONENTE TRAMOS VIALES)

De acuerdo con el avance de obra y flujo de caja se tienen los siguientes porcentajes de REHABILITACIÓN DE TODOS LOS SEGMENTOS VIALES intervenidos hasta la presentación de este informe que contiene el progreso del Contrato entre el 01 y el 31 de JULIO del 2024 es del **73,93%**

Gráfico 1. PORCENTAJES VIAS DE AVANCE REAL vs PROGRAMADO

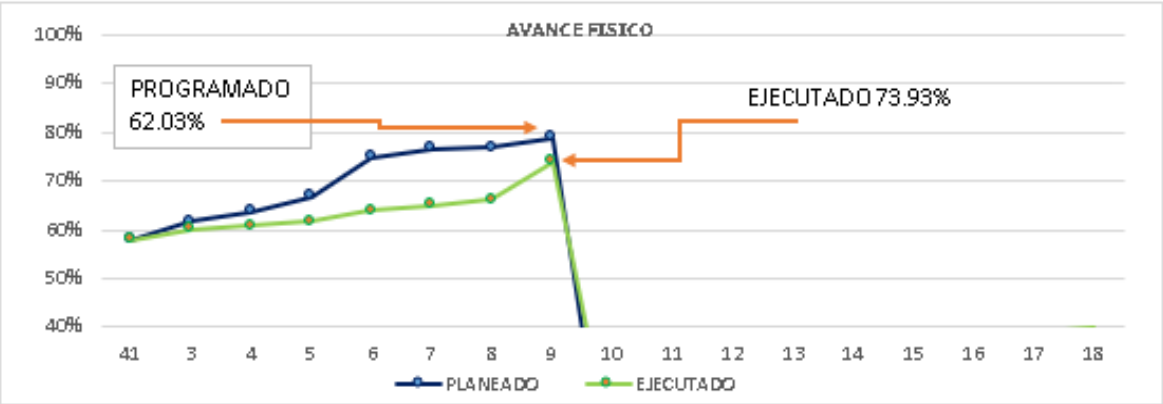

4.4.1. CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN LAS VIAS

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS/TODOS LOS TRAMOS/ JULIO DEL 2024							Semana
No. ID	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDADES TOTALES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDADES EJECUTADAS**	**SEMANA 09 DE REINICIO HASTA EL 31 DE JUIIO DE 2024**
	VIAS						
No. ID	**ACTIVIDADES**						
	CAPITULO 1 - EXPLANACIONES						
201-P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	m3	915,70	$ 57.716,54	$ 52.851.036,92	480,01	52,70
202	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNADISTANCIA DE 5KM)	m3	2.098,40	$ 96.230,83	$ 201.930.767,52	556,76	9,50
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	27.437,18	$ 22.115,04	$ 606.774.267,17	21.027,29	37,09
231-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	36.606,67	$ 7.933,83	$ 290.431.264,54	28.968,54	2.439,85
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	172,08	$ 51.427,07	$ 8.849.569,80	487,60	82,16
	CAPITULO 2- PAVIMENTOS						
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m2	1.052,28	$ 91.015,04	$ 95.773.303,76	1.024,64	
3.22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	m3	3.345,98	$ 118.874,44	$ 397.751.485,67	2.737,90	
320-1	SUBBASE GRANULAR	m3	11.650,38	$ 95.539,10	$ 1.113.066.793,58	8.550,45	719,35
330-1	BASE GRANULAR	m3	8.181,26	$ 106.048,87	$ 867.613.396,02	5.814,91	1.075,44

450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	5.414,82	$ 819.572,18	$ 4.437.835.834,15	3.247,95	794,68
420-1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	m2	38.684,27	$ 4.746,62	$ 183.619.395,87	24.868,63	1.998,63
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ml	9.282,00	$ 99.370,68	$ 922.358.621,05	5.738,30	808,10
	CAPITULO 3 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	77,00	$ 859.896,24	$ 66.212.010,53	0,00	
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	84,00	$ 1.982.560,90	$ 166.535.115,79	0,00	
	CAPITULO 4 - TRANSPORTES						
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	m3 - Km	346.436,66	$ 1.371,43	$ 475.113.134,39	970.715,64	18.704,19
	CAPITULO 5- SEÑALIZACION						
700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	18.579,00	$ 4.273,68	$ 79.400.778,95	0,00	
	NO PREVISTOS				$ 0,00	0,00	
	DEMOLICION ASFALTO	M2	196,03	$ 33.362,00	$ 6.539.952,86	716,99	715,99
	CONCRETO	M3	6,84	$ 607.272,00	$ 4.153.740,48	6,84	6,84
	ACERO	KG.	644,18	$ 8.361,00	$ 5.385.988,98	644,18	644,18
	IMPRIMACION	M2	33.997,78	$ 1.251,00	$ 42.531.222,78	0,00	
	Costo Directo				**$ 9.966.116.775,71**	**$ 7.368.380.506**	**$ 1.002.819.089**

Tabla 3. Control de cantidades ejecutadas en las vías.

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN TÉRMINOS FINANCIEROS					
Administración			27,00%	$ 2.690.851.529,44	$ 1.989.462.737
Imprevisto			1,00%	$ 99.661.167,76	$ 73.683.805
Utilidad			5,00%	$ 498.305.838,79	$ 368.419.025
TOTAL OBRA		**AIU**	**33,000%**	**$ 13.254.935.311,69**	**$ 9.799.946.073**
Cantidades Acumuladas					
Avance Ejecutado Acumulado %					**73,93%**

SEMANA	5	6	7	8	9
Progreso Planificado	66,85%	74,79%	76,56%	76,89%	78,85%
Progreso Real	61,61%	63,87%	65,01%	66,15%	73,93%
Desviación	3,70%	7,72%	8,17%	7,59%	3,48%
Ejecución Presupuestal Planificada	$ 953.423.675	$ 1.989.813.651	$ 695.529.395	$ 174.599.976	$ 42.578.746
Ejecución Presupuestal Real	$ 8.166.365.646	$ 8.466.196.685	$ 8.617.168.197	$ 8.768.139.709	$ 9.799.946.073
Valor Pagado					
Desviación Ejecución Presupuestal	$ 5.100.320.180	$ 4.579.494.361	$ 5.601.444.515	$ 6.076.550.220	$ 6.899.500.603
AVANCE SEMANAL	61,61%	63,87%	65,01%	66,15%	73,93%


El mes de julio es el segundo mes del reinicio de las obras de tiempo adicional de 04 meses concedido no se presentan atraso considerable respecto al cronograma presentado.

Se retoma la programación con el porcentaje de avance del día de la suspensión el progreso de ejecución en obra quedo para la fecha en 58,02%.

Para este mes de julio se programa para ejecutar hasta el 78,85% para este informe según el avance de ejecución real en obra se alcanza el 73,93% presentando un atraso respecto a lo programado del 4:92%

En general las obras se han venido interviniendo de acuerdo a los avances y entregas de ACUAGYR, responsable del cambio o profundización de redes hidrosanitarias, una vez esta entidad termina las intervenciones se hace entrega formal al contratista CONSORCIO GIRARDOT y este programa la finalización de obras.

4.4.2. TRAMO VIAL 1

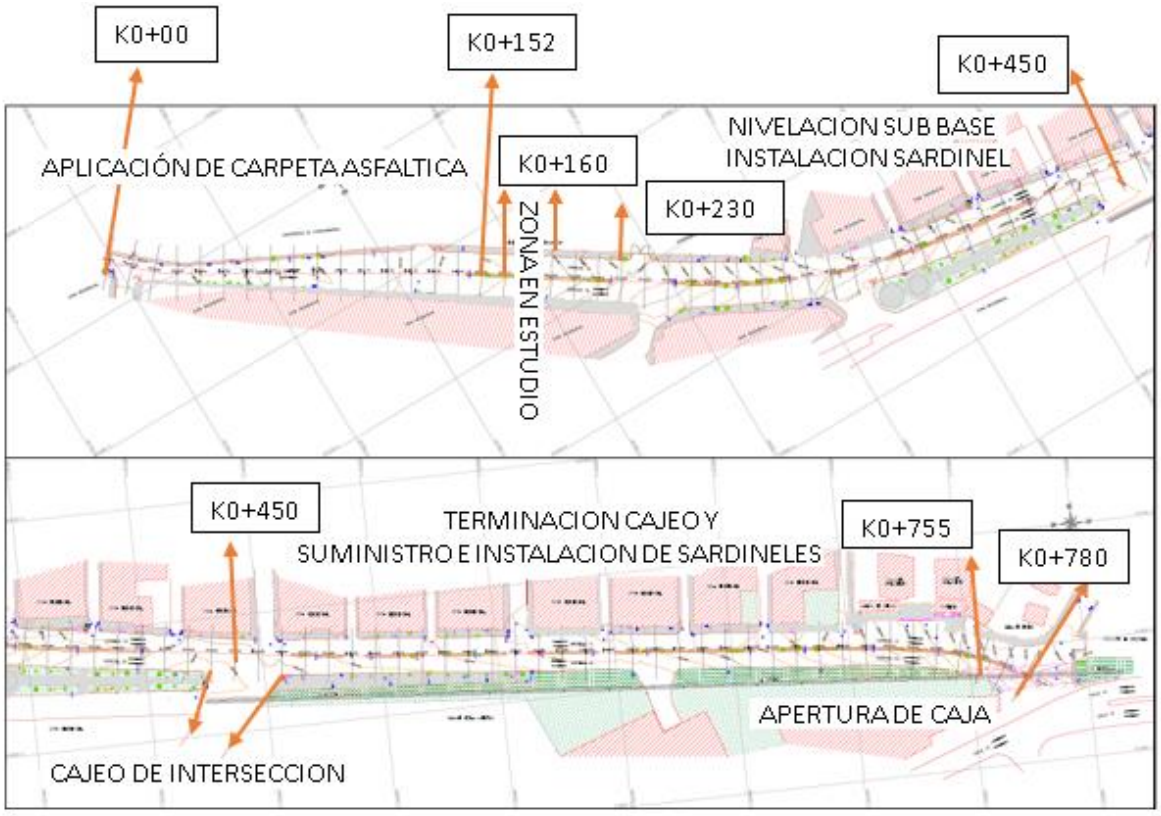

CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT

901.732.581-7

LOCALIZACION	DIRECCION	LONG ML APROX	ANCHO ML APROX
TRAMO 1	CR 19 ENTRE CLL 24 Y SEMAFORO MARAVILLA O BARLOVENTO.	1395	VARIABLES



CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS/CUNDINAMARCA/MES DE JULIO							Semana
No. ID	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDADES TOTALES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDADES EJECUTADAS**	**SEMANA 09 HASTA EL 31 DE JULIO**
	CAPITULO 1 - EXPLANACIONES						
201-P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	m3	279,00	$ 57.716,54	$ 16.102.915,04	191,20	49,300
201,7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNADISTANCIA DE 5KM)	m3	7,63	$ 96.230,83	$ 734.241,21	24,63	1,680
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE	m3	9.224,70	$ 22.115,04	$ 204.004.587,29	8.426,70	

	SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)						
231-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN , FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	11.492,33	$ 7.933,83	$ 91.178.245,23	11.803,87	2.053,404
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	44,98	$ 51.427,07	$ 2.313.189,50	177,92	57,440
						0,00	
	CAPITULO 2- PAVIMENTOS					0,00	
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m2	183,13	$ 91.015,04	$ 16.667.583,83	98,82	
3.22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	m3	437,73	$ 118.874,44	$ 52.034.906,91	376,33	
320-1	SUBBASE GRANULAR	m3	4.016,90	$ 95.539,10	$ 383.771.001,73	3.851,81	556,850
330-1	BASE GRANULAR	m3	2.869,34	106.048,87	$ 304.290.270,90	2.746,02	973,100
450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	1.807,06	$ 819.572,18	$ 1.481.016.104,41	1.277,09	379,450
420-1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	m2	12.962,33	$ 4.746,62	$ 61.527.209,99	8.558,91	392,690
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ml	2.790,00	$ 99.370,68	$ 277.244.187,97	2.154,00	718,000
						0,00	
	CAPITULO 3 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES					0,00	
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	27,00	$ 859.896,24	$ 23.217.198,50	0,00	
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	16,00	$ 1.982.560,90	$ 31.720.974,44	0,00	
						0,00	
	CAPITULO 4 - TRANSPORTES					0,00	
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS,	m3 - Km	97.819,75	$ 1.371,43	$ 134.152.800,00	355.667,21	2.977,140

	SOBREACARREOS Y DERRUMBES						
						0,00	
	CAPITULO 5- SEÑALIZACION					0,00	
700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	5.580,00	$ 4.273,68	$ 23.847.157,89	0,00	
	NO PREVISTOS					0,00	
	DEMOLICION ASFALTO		421,56	$ 33.362,00	$ 14.064.084,72	421,56	421,560
	Costo Directo				**$ 3.103.822.574,85**	**$ 2.818.677.094**	**$ 573.174.970**

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN TÉRMINOS FINANCIEROS						
Administración			27,00%	$ 838.032.095,21	$	761.042.815
Imprevisto			1,00%	$ 31.038.225,75	$	28.186.771
Utilidad			5,00%	$ 155.191.128,74	$	140.933.855
			0,00%	$ 0,00	$	-
			0,00%	$ 0,00	$	-
			0,00%	$ 0,00	$	-
TOTAL OBRA		AIU	33,00%	$ 4.128.084.024,55	$	3.748.840.535
Cantidades Acumuladas				$ 4.128.084.024,55		
Avance Ejecutado Acumulado %						90,81%

En el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM); EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), desde la abscisa ko+755 hasta la ko+780;Fallo para mejorar la subrasante de la abscisa ko+530 a la ko+550 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE; RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN); SUBBASE GRANULAR la abscisa ko+230 a la ko+450 , Fallo para mejorar la subrasante de la abscisa ko+530 a la ko+550; TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES,PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES. MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) desde la k0+000 hasta la k0+152; RIEGO DE IMPRIMACIÓN desde la k0+000 hasta la k0+152; SARDINEL PREFABRICADO A-10 desde la abscisa k0+230 hasta la k0+755.

Actualmente el proyecto se encuentra en la semana 09 de ejecución DESDE EL REINICIO el día 29 de mayo, a la fecha con la nueva programación el Contratista debería ir en un porcentaje de avance de alrededor del 82,10%, realmente a ejecutado un 64,48%, lo que equivale a un atraso significativo de lo programado en el mes que fue de 17,62% ejecutando en actividades de obra el 4,46%, presentando un atraso de lo programado del -13,16%.

La interventoría ha requerido constantemente al contratista CONSORCIO GIRARDOT 2024, para que incremente los equipos y el personal con el fin de que logre aumentar los rendimientos, también ha creado las alertas ante la entidad contratante para iniciar a considerar un posible incumplimiento.

TRAMO CUNDINAMARCA	
	
APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA CARRERA 19	APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA CARRERA 19

TRAMO CUNDINAMARCA	
	
APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA CARRERA 19	APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA CARRERA 19

TRAMO CUNDINAMARCA	
	
EXTENDIDA DE CAPAS GRANULARES CALLE 19	EXTENDIDA DE CAPAS GRANULARES CALLE 19

TRAMO CUNDINAMARCA	
	
EXTENSION DE CAPAS GRANULARES	TERMINACION CAJA BARLOVENTO FRENTE A ARA

TRAMO CUNDINAMARCA	
	 
INSTALACION DE SARDINELES EN TRAMO	IMPRIMACION Y INSTALACION DE MEZCLA INTERSECCION Cll 19-24.

TRAMO CUNDINAMRCA	
	
INICIO CONFORMACION SUB BASE	CONFORMACION DE SUB BASE

TRAMO CUNDINAMARCA	
	
INSTALACION DE GEOTEXTIL CALLE 19	INSTALACION DE GEOTEXTIL CALLE 19

4.4.3. TRAMO VIAL 2

LOCALIZACION	DIRECCION	LONG ML APROX	ANCHO ML APROX
TRAMO 2	8 ENTRE 33 Y 38 INCLUYE EMPALME VIA LA CARBONERA	585	VARIABLES



CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT

901.732.581-7

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS/MES DE FEBRERO						
No. ID	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDADES TOTALES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDADES EJECUTADAS**
	CAPITULO 1 - EXPLANACIONES					
201-P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	m3	104,50	$ 57.716,54	$ 6.031.378,57	103,18
201,7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNADISTANCIA DE 5KM)	m3	3,68	$ 96.230,83	$ 354.129,44	0,00
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	3.886,65	$ 22.115,04	$ 85.953.410,86	4.040,79
231-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	4.367,10	$ 7.933,83	$ 34.647.849,02	4.464,40
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	21,06	$ 51.427,07	$ 1.083.054,05	82,54
						0,00
	CAPITULO 2- PAVIMENTOS					0,00
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m2	181,96	$ 91.015,04	$ 16.561.096,24	477,46
3.22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	m3	1.317,26	$ 118.874,44	$ 156.588.539,68	1.142,85
320-1	SUBBASE GRANULAR	m3	1.097,68	$ 95.539,10	$ 104.871.356,81	1.053,88
330-1	BASE GRANULAR	m3	877,95	$ 106.048,87	$ 93.105.607,33	843,10
450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO	m3	591,31	$ 819.572,18	$ 484.621.226,02	548,02

	ASFÁLTICO)					
420-1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	m2	4.472,10	$ 4.746,62	$ 21.227.343,83	4.215,50
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ml	1.170,00	$ 99.370,68	$ 116.263.691,73	1.038,40
						0,00
	CAPITULO 3 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES					0,00
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	13,00	$ 859.896,24	$ 11.178.651,13	0,00
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	15,00	$ 1.982.560,90	$ 29.738.413,53	0,00
						0,00
	CAPITULO 4 - TRANSPORTES					0,00
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	m3 - Km	65.203,79	$ 1.371,43	$ 89.422.340,57	225.606,56
						0,00
	CAPITULO 5- SEÑALIZACION					0,00
700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	2.340,00	$ 4.273,68	$ 10.000.421,05	0,00
						0,00
						0,00
	Costo Directo				**$ 1.261.648.509,89**	**$ 1.386.131.356**

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN TÉRMINOS						
Administración			27,00%	$ 340.645.097,67	$	374.255.466
Imprevisto			1,00%	$ 12.616.485,10	$	13.861.314
Utilidad			5,00%	$ 63.082.425,49	$	69.306.568
PGIO			0,00%	$ 0,00	$	-
Acompañamiento Social			0,00%	$ 0,00	$	-
Transporte			0,00%	$ 0,00	$	-
TOTAL OBRA		**AIU**	**33,00%**	**$ 1.677.992.518,15**	$	1.843.554.703
Cantidades Acumuladas				$ 1.677.992.518,15		
Avance Ejecutado Acumulado %						109,87%

Actualmente el proyecto se encuentra en la semana 04 de ejecución, este tramo se encuentra en el 100.00%, este tramo ya se encuentra en funcionamiento, están pendientes las actividades de arreglos de andenes y mejoramiento de sardineles, señalización, se

espera la definición de el pago del sobre trasiego por parte del municipio y de la interventoría para determinar el alcance definitivo del tramo

TRAMO ALICANTE	
	
DETERIORO CAPA ASFALTICA EN REMATE CON ESTRUCTURA DE ACUAGYR	DETERIORO CAPA ASFALTICA EN REMATE CON ESTRUCTURA DE ACUAGYR


4.4.4. TRAMO VIAL 3



VIAS GIRARDOT TRAMO 3 – VIA ROSA BLANCA CLL 32 ENTRE 11 Y AV. LAS ACACIAS Y CRA 10 ENTRE 32 Y 33,

LOCALIZACION	DIRECCION	LONG ML APROX	ANCHO ML APROX
TRAMO 3	VIA ROSA BLANCA CLL 32 ENTRE CRA 12 Y AV. LAS ACACIAS Y CRA 10 ENTRE 32 Y 33	505	VARIABLES



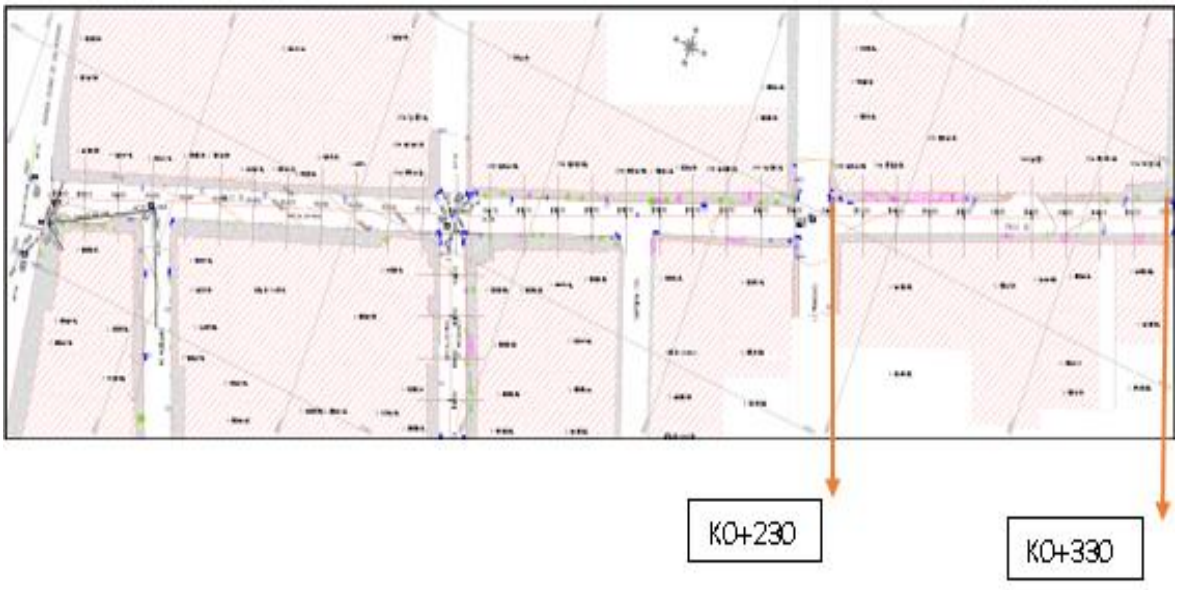

CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT

901.732.581-7

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS/ROSA BLANCA/MES DE JULIO							Semana
No. ID	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	SEMANA 09 HASTA EL 31 DE JULIO
	CAPITULO 1 - EXPLANACIONES						
201-P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	m3	101,00	$ 57.716,54	$ 5.829.370,68	71,88	
201,7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNADISTANCIA DE 5KM)	m3	1,98	$ 96.230,83	$ 190.537,04	3,11	
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	3.555,34	$ 22.115,04	$ 78.626.477,76	3.247,68	
231-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	4.144,21	$ 7.933,83	$ 32.879.476,63	3.957,81	
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	20,20	$ 51.427,07	$ 1.038.826,77	65,38	8,330
						0,00	
	CAPITULO 2- PAVIMENTOS					0,00	
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m2	687,19	$ 91.015,04	$ 62.544.623,68	325,31	
3.22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	m3	1.240,82	$ 118.874,44	$ 147.501.777,79	735,62	
320-1	SUBBASE GRANULAR	m3	1.034,50	$ 95.539,10	$ 98.835.196,62	933,33	
330-1	BASE GRANULAR	m3	620,61	$ 106.048,87	$ 65.814.990,56	455,00	


450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	575,41	$ 819.572,18	$ 471.590.028,35	394,33	
420-1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	m2	4.228,21	$ 4.746,62	$ 20.069.691,53	3.033,33	
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ml	1.010,00	$ 99.370,68	$ 100.364.383,46	722,20	
						0,00	
	CAPITULO 3 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES					0,00	
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	7,00	$ 859.896,24	$ 6.019.273,68	0,00	
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	22,00	$ 1.982.560,90	$ 43.616.339,85	0,00	
						0,00	
	CAPITULO 4 - TRANSPORTES					0,00	
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	m3 - Km	53.810,21	$ 1.371,43	$ 73.796.859,43	150.058,63	
						0,00	
	CAPITULO 5- SEÑALIZACION					0,00	
700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	2.020,00	$ 4.273,68	$ 8.632.842,11	0,00	
	NO PREVISTOS					0,00	
	DEMOLICION ASFALTO		98,40	$ 33.362,00	$ 3.282.820,80	98,40	98,400
	Costo Directo				**$ 1.217.350.695,93**	**$ 983.930.278**	**-$ 24.018.248**

En el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) en perfilamiento contra andenes y se incluye el ítem N.P. de DEMOLICION ASFALTO, el municipio y la interventoría determinaron que el material utilizado para el mejoramiento de la sub rasante NO cumple con las especificaciones estipuladas en los estudios, por lo tanto el contratista debe retirar este material a su costa y reemplazarlo por el adecuado.

Actualmente el proyecto se encuentra en la semana 09 de ejecución DESDE EL REINICIO el día 29 de mayo, a la fecha con la nueva programación el Contratista debería ir en un porcentaje de avance de alrededor del 99,00%, realmente a ejecutado un 80,83%, lo que

equivale a un atraso de lo programado en el mes que fue de 20,00% ejecutando en actividades de obra el 1,82%, presentando un atraso de lo programado del -17,58%.

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN TÉRMINOS FINANCIEROS						
Administración			27,00%	$ 328.684.687,90	$	265.661.175
Imprevisto			1,00%	$ 12.173.506,96	$	9.839.303
Utilidad			5,00%	$ 60.867.534,80	$	49.196.514
PGIO			0,00%	$ 0,00	$	-
Acompañamiento Social			0,00%	$ 0,00	$	-
Transporte			0,00%	$ 0,00	$	-
TOTAL OBRA		AIU	33,00%	$ 1.619.076.425,59	$	1.308.627.270
Cantidades Acumuladas				$ 1.619.076.425,59		
Avance Ejecutado Acumulado %						80,83%

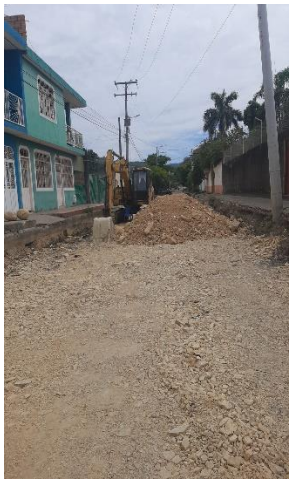TRAMO ROSA BLANCA	
 	
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y RECEBO	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON Y RECEBO

TRAMO ROSA BLANCA	
	
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y RECEBO	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON Y RECEBO

4.4.5. TRAMO VIAL 4

LOCALIZACION	DIRECCION	LONG ML APROX	ANCHO ML APROX
TRAMO 4	VÍA SAN JORGE CLL 32 ENTRE CRA 4 Y 7A, CRA 7 ENTRE CLL 32 Y 33, CRA 4 ENTRE CLL 32 Y ESQUINA RELOJ	695	VARIABLES



Costo Directo				**$ 1.637.980.593,35**	**$ -**
CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN					
Administración			27,00%	$ 442.254.760,21	$ -
Imprevisto			1,00%	$ 16.379.805,93	$ -
Utilidad			5,00%	$ 81.899.029,67	$ -
PGIO			0,00%	$ 0,00	$ -
Acompañamiento Social			0,00%	$ 0,00	$ -
Transporte			0,00%	$ 0,00	$ -
TOTAL OBRA		**AIU**	**33,00%**	**$ 2.178.514.189,16**	$ -
Cantidades Acumuladas				$ 2.178.514.189,16	
Avance Ejecutado Acumulado %					0,00%

Este tramo aún no se ha iniciado a ejecutar, de acuerdo al Contratista su inicio está programado para después del 15 de julio del 2024, sin embargo, de acuerdo al cronograma de avance presentado por el Contratista, el tramo se iniciará una vez se cumpla el cierre de los tramos viales aperturados, a la fecha se encuentra en 0,00% de ejecución.

4.4.6. TRAMO VIAL 5



VIAS GIRARDOT TRAMO 5 – VIA BARRIO KENNEDY CLL 41 ENTRE CRA 6A Y 6C FRENTE A CANCHA No. 1

LOCALIZACION	DIRECCION	LONG ML APROX	ANCHO ML APROX
TRAMO 5	VIA BARRIO KENNEDY CLL 41 ENTRE CRA 6A Y 6C FRENTE A CANCHA No. 1	195	VARIABLES



TRAMO CON CARPETA ASFALTICA

CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT


901.732.581-7

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS/KENNEDY/MES DE ABRIL						
No. ID	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDADES TOTALES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDADES EJECUTADAS**
	CAPITULO 1 - EXPLANACIONES					
201-P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	m3	39,00	$ 57.716,54	$ 2.250.945,11	38,45
201,7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNADISTANCIA DE 5KM)	m3	1,41	$ 96.230,83	$ 135.685,47	54,45
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	631,01	$ 22.115,04	$ 13.954.809,87	502,44
231-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	1.096,03	$ 7.933,83	$ 8.695.720,72	1.064,65
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	7,80	$ 51.427,07	$ 401.131,13	28,32
						0,00
	CAPITULO 2- PAVIMENTOS					0,00
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m2	17,10	$ 91.015,04	$ 1.556.357,14	17,10
3.22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	m3	68,40	$ 118.874,44	$ 8.131.011,43	68,40
320-1	SUBBASE GRANULAR	m3	282,21	$ 95.539,10	$ 26.962.088,77	222,33
330-1	BASE GRANULAR	m3	169,13	$ 106.048,87	$ 17.936.045,75	133,40
450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	166,09	$ 819.572,18	$ 136.122.743,45	106,80
420-1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	m2	1.115,63	$ 4.746,62	$ 5.295.467,81	1.726,90

5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ml	390,00	$ 99.370,68	$ 38.754.563,91	349,00
						0,00
	CAPITULO 3 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES					0,00
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	4,00	$ 859.896,24	$ 3.439.584,96	0,00
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	11,00	$ 1.982.560,90	$ 21.808.169,92	0,00
						0,00
	CAPITULO 4 - TRANSPORTES					0,00
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	m3 - Km	9.922,56	$ 1.371,43	$ 13.608.082,29	38.433,93
						0,00
	CAPITULO 5- SEÑALIZACION					0,00
700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	780,00	$ 4.273,68	$ 3.333.473,68	0,00
						0,00
						0,00
	Costo Directo				**$ 292.698.512,86**	**$ 256.666.113**

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN TÉRMINOS						
Administración			27,00%	$ 79.028.598,47	$	69.299.851
Imprevisto			1,00%	$ 2.926.985,13	$	2.566.661
Utilidad			5,00%	$ 14.634.925,64	$	12.833.306
PGIO			0,00%	$ 0,00	$	-
Acompañamiento Social			0,00%	$ 0,00	$	-
Transporte			0,00%	$ 0,00	$	-
TOTAL OBRA		AIU	33,00%	$ 389.289.022,10	$	341.365.931
Cantidades Acumuladas				$ 389.289.022,10		
Avance Ejecutado Acumulado %						87,69%

Actualmente el proyecto se encuentra en la semana 09 de ejecución del periodo adicional con fecha de reinicio el día 29 de mayo del 2024, a la fecha el Contratista cumplió con el 100% del tramo intervenido y queda faltando en este tramo la LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO, verificación del funcionamiento de los pozos y sumideros, reparación de los andenes y corrección de sardineles en este tramo realmente se ejecutó del presupuesto el 87,69%, queda pendiente el reconocimiento o no del mayor recorrido a el sitio de disposición de los RCD, para el cierre definitivo.

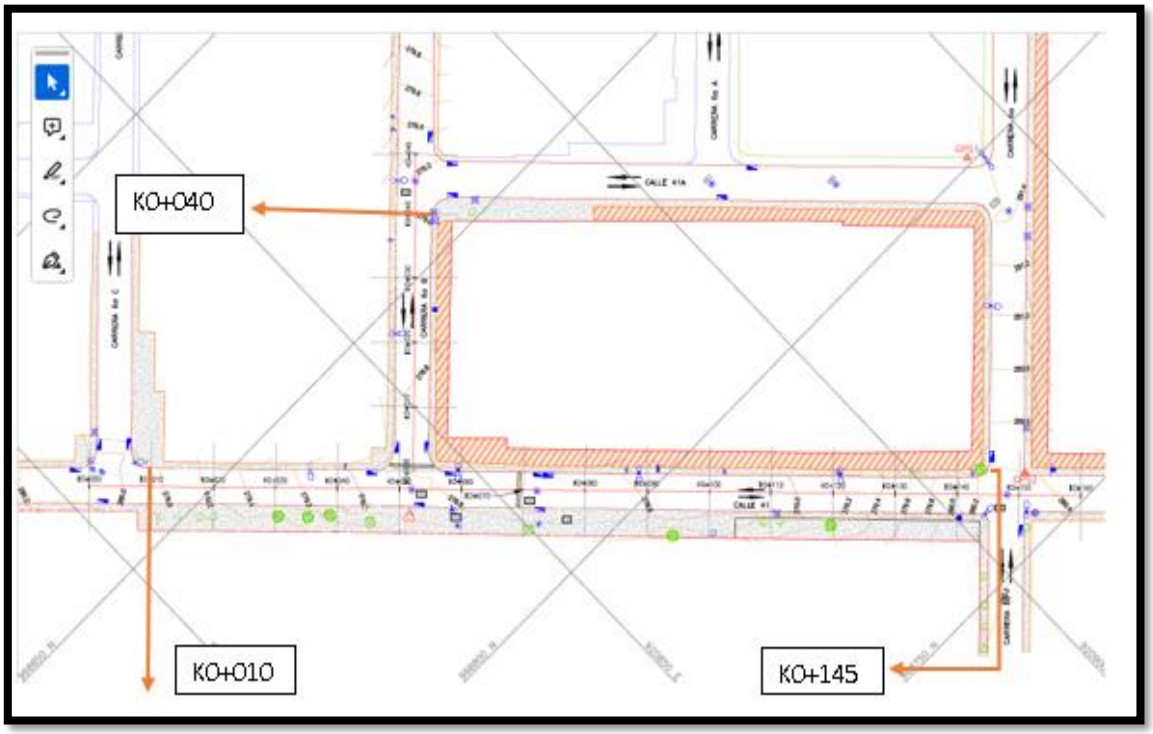

4.4.7. TRAMO VIAL 6



CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT

901.732.581-7

LOCALIZACION	DIRECCION	LONG ML APROX	ANCHO ML APROX
TRAMO 6	VIA CENTRO CRA 11 ENTRE 16 Y 13 Y CLL 14 Y 13 ENTRE CRA 11 Y 9	500	VARIABLES



CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS/MES DE JULIO							Semana
No. ID	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDADES TOTALES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDADES EJECUTADAS**	**SEMANA 09 HASTA EL 31 DE JULIO**
	CAPITULO 1 - EXPLANACIONES						
201-P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	m3	100,00	$ 60.755,00	$ 6.075.500,00	3,02	
201,7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNADISTANCIA DE 5KM)	m3	693,79	$ 101.296,00	$ 70.278.151,84	474,57	7,820
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	2.025,06	$ 23.279,00	$ 47.141.371,74	1.457,07	223,860


231-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	4.606,42	$ 8.352,00	$ 38.472.819,84	2.845,50	73,000
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	20,00	$ 54.134,00	$ 1.082.680,00	53,55	10,880
						0,00	
	CAPITULO 2- PAVIMENTOS					0,00	
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m2	0,00	$ 95.806,00	$ 0,00	33,78	22,400
3.22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	m3		$ 125.131,00	$ 0,00	298,21	218,580
320-1	SUBBASE GRANULAR	m3	1.152,91	$ 100.568,00	$ 115.945.852,88	708,65	38,250
330-1	BASE GRANULAR	m3	922,34	$ 111.631,00	$ 102.961.736,54	516,72	16,800
450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	715,93	$ 862.708,00	$ 617.638.538,44	380,20	211,600
420-1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	m2	4.900,42	$ 4.997,00	$ 24.487.398,74	3.658,80	1.410,840
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ml	1.000,00	$ 104.601,00	$ 104.601.000,00	581,90	133,400
						0,00	
	CAPITULO 3 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES					0,00	
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	10,00	$ 905.154,00	$ 9.051.540,00	0,00	
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	14,00	$ 2.086.907,00	$ 29.216.698,00	0,00	
						0,00	
	CAPITULO 4 - TRANSPORTES					0,00	
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	m3 - Km	18.180,55	$ 1.444,00	$ 26.252.714,20	76.263,46	25.527,620
						0,00	


	CAPITULO 5- SEÑALIZACION					0,00	
700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	2.055,00	$ 4.499,00	$ 9.245.445,00	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Costo Directo				**$ 1.202.451.447,22**	**$ 795.615.951**	**$ 282.835.998**

En este periodo se inician actividades sobre la carrera 11 entre carrera 14 y la carrera 13; DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNADISTANCIA DE 5KM) desde la abscisa ko+0.95 hasta la ko+000; EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN TÉRMINOS FINANCIEROS						
Administración			27,00%	$ 324.661.890,75	$	214.816.307
Imprevisto			1,00%	$ 12.024.514,47	$	7.956.160
Utilidad			5,00%	$ 60.122.572,36	$	39.780.798
PGIO			0,00%	$ 0,00	$	-
Acompañamiento Social			0,00%	$ 0,00	$	-
Transporte			0,00%	$ 0,00	$	-
TOTAL OBRA		**AIU**	**33,00%**	**$ 1.599.260.424,80**	$	1.058.169.214
Cantidades Acumuladas				$ 1.599.260.424,80		
Avance Ejecutado Acumulado %						66,17%

Actualmente el proyecto se encuentra en la semana 09 de ejecución en el plazo adicional, a la fecha el Contratista debería ir en un porcentaje de avance del 67,29%, realmente a ejecutado un 66.17%, lo que equivale a un atraso del 1.13%.

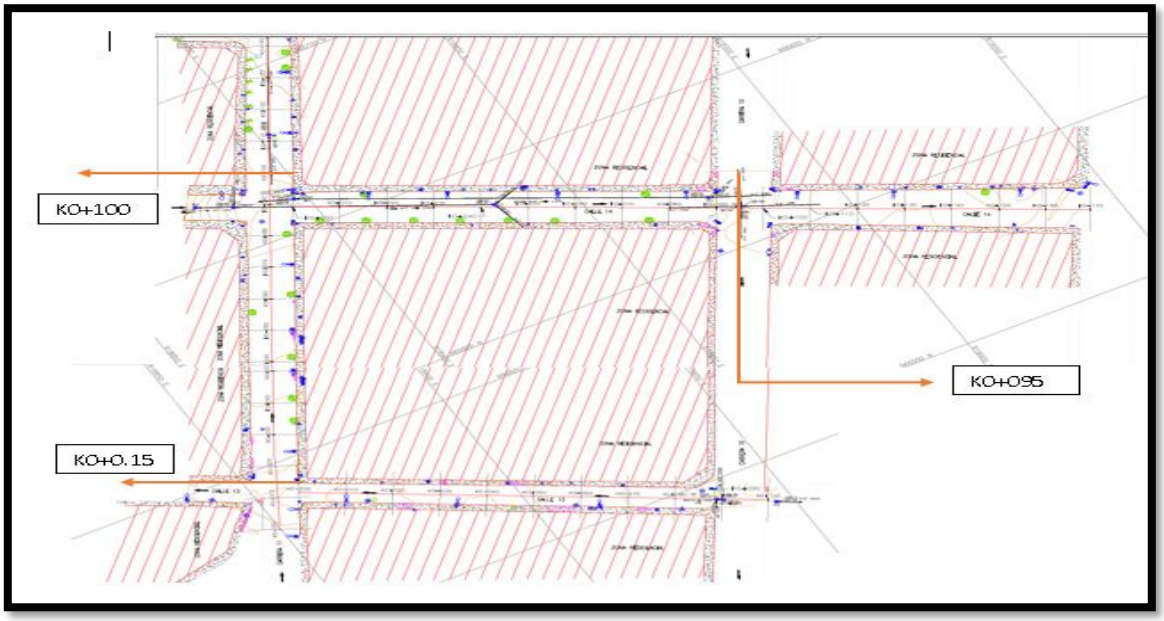

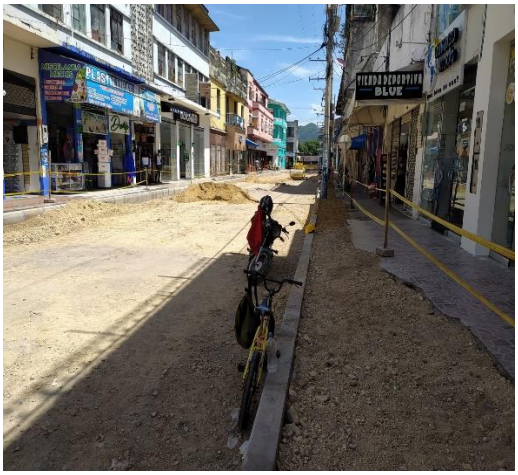TRAMO CENTRO	
	
CARRERA 14 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10	CARRERA 14 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10


TRAMO CENTRO	
	
CALLE 11 ENTRE CARRERA 14 Y CARRERA 13	CALLE 11 ENTRE CARRERA 14 Y CARRERA 13

TRAMO CENTRO	
	
CARRERA 14 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10	CARRERA 14 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10

TRAMO CENTRO	
	
CARRERA 14 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10	CARRERA 14 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10

TRAMO CENTRO	
	
CARRERA 14 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10	CARRERA 14 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10

TRAMO CENTRO	
	
CARRERA 14 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10	CARRERA 14 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10

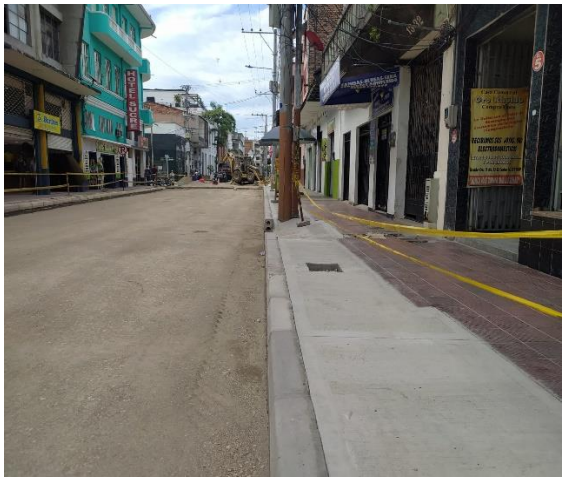TRAMO CENTRO	
	
CALLE 11 ENTRE CARRERA 14 Y CARRERA 13	CALLE 11 ENTRE CARRERA 14 Y CARRERA 13

TRAMO CENTRO	
	
CALLE 11 ENTRE CARRERA 14 Y CARRERA 13	CALLE 11 ENTRE CARRERA 14 Y CARRERA 13
TRAMO CENTRO	

	
CALLE 11 ENTRE CARRERA 14 Y CARRERA 13	CALLE 11 ENTRE CARRERA 14 Y CARRERA 13

4.4.8. TRAMO VIAL 7



VIAS GIRARDOT TRAMO 7

CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT

901.732.581-7

LOCALIZACION	DIRECCION	LONG ML APROX	ANCHO ML APROX
TRAMO 7	VIA CRA 14 ENTRE CLL 24 Y ENTREDA CLL 34	800	VARIABLES




CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS/LA PLAYA/MES DE JULIO							Semana
No. ID	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDADES TOTALES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDADES EJECUTADAS**	**09 DE REINICIO HASTA EL 31 de JULIO**
	CAPITULO 1 - EXPLANACIONES						
201-P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	m3	153,20	$ 57.716,54	$ 8.842.174,14	72,28	3,100
201,7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNADISTANCIA DE 5KM)	m3	2,83	$ 96.230,83	$ 272.333,24	0,00	
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	4.636,91	$ 22.115,04	$ 102.545.438,97	3.496,95	109,130
231-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	5.030,35	$ 7.933,83	$ 39.909.964,81	4.832,15	313,450

16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	30,64	$ 51.427,07	$ 1.575.725,35	79,89	5,520
						0,00	
	CAPITULO 2- PAVIMENTOS					0,00	
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m2	0,00	$ 91.015,04	$ 0,00	97,91	17,760
3.22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	m3	350,17	$ 118.874,44	$ 41.626.261,29	235,05	64,000
320-1	SUBBASE GRANULAR	m3	2.008,61	$ 95.539,10	$ 191.900.787,12	1.780,46	124,240
330-1	BASE GRANULAR	m3	1.255,64	$ 106.048,87	$ 133.159.205,86	1.089,74	54,600
450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	632,48	$ 819.572,18	$ 518.363.012,69	541,53	203,430
420-1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	m2	5.030,35	$ 4.746,62	$ 23.877.142,52	4.512,74	1.695,200
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ml	1.532,00	$ 99.370,68	$ 152.235.876,69	899,40	
						0,00	
	CAPITULO 3 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES					0,00	
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	4,00	$ 859.896,24	$ 3.439.584,96	0,00	
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	5,00	$ 1.982.560,90	$ 9.912.804,51	0,00	
						0,00	
	CAPITULO 4 - TRANSPORTES					0,00	
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	m3 - Km	50.711,29	$ 1.371,43	$ 69.546.912,00	136.105,22	1.800,670
						0,00	
	CAPITULO 5- SEÑALIZACION					0,00	
700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	3.064,00	$ 4.273,68	$ 13.094.568,42	0,00	

						0,00	
	NO PREVISTOS					0,00	
	DEMOLICION DE ASFALTO		196,03	$ 33.362,00		196,03	196,032
	CONCRETO		6,84	$ 607.272,00		6,84	6,840
	ACERO		644,18	$ 8.361,00		644,18	644,180
	Costo Directo				**$ 1.310.301.792,58**	**$ 1.203.834.297**	**$ 220.997.731**

En el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) desde la abscisa k0+180 hasta la k0+340 ; EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM); EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), desde la abscisa ko+240 hasta la ko+340;Fallo para mejorar la subrasante de la abscisa ko+200 a la ko+220 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE; RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE; SUBBASE GRANULAR sector barlovento y la abscisa ko+200 a la ko+220 , Fallo para mejorar la subrasante de la abscisa ko+200 a la ko+220; BASE GRANULAR
SARDINEL PREFABRICADO A-10; de la abscisa ko+150 hasta la ko+230; TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES.
Se realizaron actividades aprobadas por la interventoría y el municipio, en este periodo se inicia la construcción del MURO DE CONTENCION EN CONCRETO

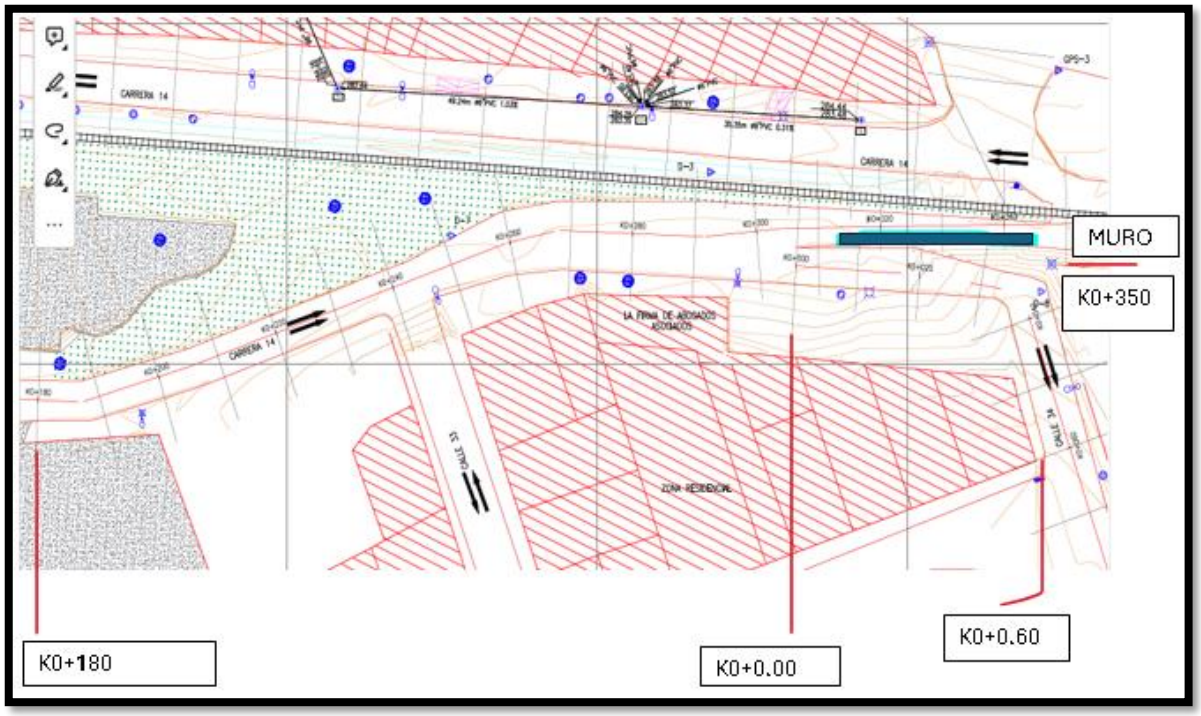

Actualmente el proyecto se encuentra en la semana 09 de ejecución DESDE EL REINICIO el día 29 de mayo, a la fecha con la nueva programación el Contratista debería ir en un porcentaje de avance de alrededor del 85,87%, a la fecha ha ejecutado un 91,87%, incluidas actividades N.P. como el muro en concreto, demolición de asfalto y mayor recorrido para la disposición final de los RCD, lo que equivale a un RENDIMIENTO viable de lo programado en el mes que fue de 6,00%

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN TÉRMINOS FINANCIEROS						
Administración			27,00%	$ 353.781.484,00	$	325.035.260
Imprevisto			1,00%	$ 13.103.017,93	$	12.038.343
Utilidad			5,00%	$ 65.515.089,63	$	60.191.715
PGIO			0,00%	$ 0,00	$	-
Acompañamiento Social			0,00%	$ 0,00	$	-
Transporte			0,00%	$ 0,00	$	-
TOTAL OBRA		AIU	33,00%	$ 1.742.701.384,13	$	1.601.099.616
Cantidades Acumuladas				$ 1.742.701.384,13		
Avance Ejecutado Acumulado %						91,87%

TRAMO LA PLAYA	
	
CONFORMACION DE BASE GRANULAR	CONFORMACION DE BASE GRANULAR

TRAMO LA PLAYA	
	
CORONA DE MURO EN CCTO.	MURO CCTO ELEVACION TERMINADO

TRAMO LA PLAYA	
	
APLICACIÓN DE IMPRIMACION	IMPRIMACION Y CARPETA ASFALTICA

TRAMO LA PLAYA	
	
APLICACIÓN DE IMPRIMACION	IMPRIMACION Y CARPETA ASFALTICA

TRAMO LA PLAYA	
	
APLICACIÓN DE IMPRIMACION	IMPRIMACION Y CARPETA ASFALTICA

4.5. AVANCE PARQUE LINEAL - LA RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA, PAISAJÍSTICA Y CULTURAL DE LA ALAMEDA FÉRREA LINEAL EL SOL, PARA UNA MOVILIDAD INTELIGENTE

PARQUE DE LA LOCOMOTORA	
	
LAS OBRAS SUSPENDIDAS DEL PARQUE, ESTAN PRESENTANDO DETERIORO PROGRESIVO	LAS OBRAS SUSPENDIDAS DEL PARQUE, ESTAN PRESENTANDO DETERIORO PROGRESIVO


ANDENES CALLE 15	
	
FLORECIMIENTO DE ARBUSTOS POR QUE NO HAY ACTIVIDAD	FLORECIMIENTO DE ARBUSTOS POR QUE NO HAY ACTIVIDAD

PARQUE DE LA LOCOMOTORA	
	
LAS OBRAS SUSPENDIDAS DEL PARQUE, ESTAN PRESENTANDO DETERIORO PROGRESIVO	LAS OBRAS SUSPENDIDAS DEL PARQUE, ESTAN PRESENTANDO DETERIORO PROGRESIVO

PARQUE DE LA LOCOMOTORA	
	
LAS OBRAS SUSPENDIDAS DEL PARQUE, ESTAN PRESENTANDO DETERIORO PROGRESIVO	LAS OBRAS SUSPENDIDAS DEL PARQUE, ESTAN PRESENTANDO DETERIORO PROGRESIVO

De acuerdo con el avance de obra y flujo de caja se tienen los siguientes porcentajes DE LA RENOVACION DE LA ALAMEDA FERREA desde el acta de inicio :**32.74% de avance físico ejecutado, a la fecha este componente se encuentra suspendido desde el día 24 de abril del 2024**

Gráfico 2. PORCENTAJES PARQUE DE AVANCE FISICO Y EJECUCION PRESUPUESTAL

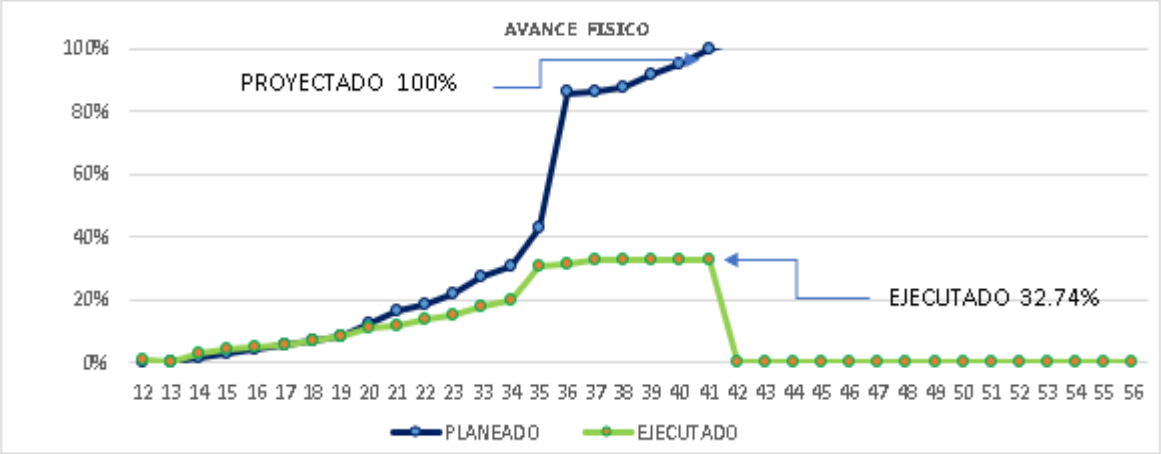

4.5.1. CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN PARQUE LINEAL

Tabla 4. Control de cantidades ejecutadas en parque lineal.

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS/ABRIL					
ACTIVIDADES	**UNIDAD**	**CANTIDADES TOTALES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDADES EJECUTADAS**
RENOVACION ARQUITECTONICA, PAISAJISTICA Y CULTURAL DE LA ALAMEDA FERREA LINEAL EL SOL, PARA UNA MOVILIDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE GIRADOT					
PARQUE LOCOMOTORA					
PRELIMINARES					
Campamento 18m²	UN	1,00	$ 2.173.885,71	$ 2.173.885,71	0,00
Cerca en teja de zinc H=1,80m	ML	390,58	$ 50.090,23	$ 19.564.240,30	36,00
Localizacion y replanteo con equipos topograficos	M2	5.932,54	$ 7.789,47	$ 46.211.364,21	5.932,54
Red Electrica Provicional L=50m	UN	18,00	$ 2.904.863,91	$ 52.287.550,38	0,00
Corte de pavimento rigido E=0,15m	ML	150,00	$ 9.276,69	$ 1.391.503,76	0,00

CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT

901.732.581-7

DESMONTES					
Desmonte de postes de concreto electrico	UN	5,00	$ 272.545,86	$ 1.362.729,32	6,00
Desmonte de Bancas	UN	15,00	$ 26.002,26	$ 390.033,83	15,00
Desmonte de Basureros	UN	6,00	$ 21.668,42	$ 130.010,53	7,00
DEMOLICIONES					
Demolicion de piso en adoquin e=0,10m (zona dura existente)	M2	1.483,14	$ 13.950,38	$ 20.690.360,57	2.744,86
Demolicion Placa piso 0.15m en concreto	M2	2.966,27	$ 26.640,60	$ 79.023.217,02	3.216,07
Demolicion de Sardinel en concreto Perimetral	ML	365,48	$ 8.254,14	$ 3.016.721,38	527,13
EXCAVACIONES					
Excavaciones varias a maquina sin clasificar (inlcuye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km)	M3	1.631,45	$ 18.413,53	$ 30.040.759,77	2.359,21
Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	593,26	$ 51.427,07	$ 30.509.622,17	441,96
Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	1.334,82	$ 91.015,04	$ 121.488.692,48	848,50
Relleno con material del sitio compactado mecanicamente	M3	889,88	$ 21.954,14	$ 19.536.545,95	56,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS					
Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	245,00	$ 51.427,07	$ 12.599.631,58	21,36
Acometida de acueducto 1" Incluye medidor	UN	1,00	$ 863.105,26	$ 863.105,26	0,00
Suministro e Instalacion de Tuberia pvc presion Ø 1" RDE 21	ML	110,00	$ 15.869,17	$ 1.745.609,02	207,00
Suministro e Instalacion de Tuberia pvc presion Ø 3/4" RDE 21	ML	85,10	$ 11.927,07	$ 1.014.993,46	60,00
Suministro e Instalacion de Tuberia pvc presion Ø 1/2" RDE 13,5	ML	61,20	$ 9.590,98	$ 586.967,82	0,00
Punto Hidraulico con llave Cromada de 1/2" (Zonas verdes)	UN	10,00	$ 55.080,45	$ 550.804,51	0,00
PLACA PISO ZONAS DE CIRCULACION					
Refuerzo malla electrosoldada	KG	9.299,27	$ 9.984,96	$ 92.852.861,35	3.514,43
Placa base concreto E= 0.10m 3000 PSI	M2	4.449,41	$ 59.596,24	$ 265.168.108,89	2.631,71
Concreto Estriado Rampas en concretos 3000PSI	M2	14,52	$ 62.784,21	$ 911.626,74	0,00
Bordillo Prefabricado A-80	ML	718,33	$ 72.457,89	$ 52.048.679,53	772,70

Sardinel Prefabricado A-10	ML	556,47	$ 99.370,68	$ 55.296.800,46	488,67
Loseta prefabricada Tipo olas 40x40cm - Color Variado	M2	1.154,48	$ 129.195,49	$ 149.153.607,82	0,00
Loseta prefabricada Tipo Cuadrato 30x30cm - Color Variado	M2	858,03	$ 129.195,49	$ 110.853.605,19	1.874,20
Loseta prefabricada Tipo (MEDIA LUNA) 30x30cm - Color Variado	M2	81,40	$ 129.195,49	$ 10.516.512,78	0,00
Loseta prefabricada Tipo Toperol 40x40cm - Color Gris	M2	723,46	$ 118.200,75	$ 85.513.515,95	59,30
Adoquin peatonal prefabricado E=6cm - Color Variado	M2	251,91	$ 73.297,74	$ 18.464.434,78	478,00
Media caña en Granito para terminado de pedestal 0,40 X 0,40m en concreto H=10cm	UN	55,00	$ 65.172,18	$ 3.584.469,92	0,00
BAHIA DE PARQUEO					
Adoquin peatonal prefabricado E=6cm - Color Variado	M2	417,67	$ 73.297,74	$ 30.614.268,89	184,20
Sub base Granular	M3	83,53	$ 95.539,10	$ 7.980.380,83	39,80
MOBILIARIO URBANO					
Banca en concreto gris/café Autoportante Simplemente puesta (1,80m x 0,45m x 0,45m) sin espaldar	UN	5,00	$ 1.351.953,38	$ 6.759.766,92	0,00
Banca en concreto gris/café Autoportante Simplemente puesta (1,80m x 0,45m x 0,57m) con espaldar	UN	5,00	$ 1.611.968,42	$ 8.059.842,11	0,00
Caneca M-121 TIPO IDU. Elaborado en Acero Inoxidable SAE-304, Con mecanismo de giro antivandalico, Diametro Cilindro de 40Cm. Acabado tipo satinado de alta presentacion.	UN	6,00	$ 879.856,39	$ 5.279.138,35	0,00
Parque infantil tipo IDRD para exterior, con capacidad promedio de 12 a 18 niños, entre los rango de edad de 3 a 14 años que cuenta con un area de ocupacion de 60 a 75 metros cuadrados con funciones ludicas para trepar, equilibrio, escalar, delizarse, incluye tubería galvanizada con pintura barrera epóxica ref,233710+esmalte alquídico tipo 3 de sika o similar y material en fibra de vidrio para zona de deslizaderos y/o metalica en area de obstaculos.	UN	1,00	$ 63.412.500,00	$ 63.412.500,00	0,00
SEÑALIZACION					

Linea de demarcacion con pintura en frio (Bahia de parqueadero)	ML	100,02	$ 4.273,68	$ 427.453,89	0,00
Marca Vial con pintura en frio - Rampas	M2	14,52	$ 46.667,67	$ 677.614,56	0,00
Señal vertical Grupo I 0,60 x 0,60m Poste 3,5m	UN	6,00	$ 252.377,44	$ 1.514.264,66	0,00
ZONAS VERDES					
Empradizacion (Incluye 15cm de tierra negra)	M2	728,05	$ 18.612,03	$ 13.550.488,50	0,00
Siembra de Duranta Limon - 5Un x ML	ML	283,16	$ 23.789,47	$ 6.736.227,37	0,00
Contenedor de Raiz en concreto 3000psi	ML	276,00	$ 128.819,55	$ 35.554.195,49	0,00
Baranda metalica para proteccion de zonas verdes	ML	283,16	$ 88.951,13	$ 25.187.401,35	0,00
PARQUE JORGE ELIECER GAITAN					
PRELIMINARES					
Campamento 18m²	UN	1,00	$ 2.173.885,71	$ 2.173.885,71	0,00
Cerca en teja de zinc H=1,80m	ML	160,96	$ 50.090,23	$ 8.062.522,71	0,00
Localizacion y replanteo	M2	1.216,76	$ 7.789,47	$ 9.477.920,00	1.216,76
Corte de pavimento rigido E=0,15m	ML	85,10	$ 9.180,45	$ 781.256,39	0,00
DESMONTES					
Desmonte de postes de concreto electrico	UN	7,00	$ 272.545,86	$ 1.907.821,05	0,00
Desmonte de Bancas	UN	5,00	$ 26.002,26	$ 130.011,28	0,00
Desmonte de Basureros	UN	3,00	$ 21.668,42	$ 65.005,26	0,00
DEMOLICIONES					
Demolicion de piso en adoquin e=0,10m (zona dura existente)	M2	547,54	$ 13.950,38	$ 7.638.388,84	0,00
Demolicion Placa piso 0.15m en concreto	M2	365,03	$ 26.640,60	$ 9.724.618,77	0,00
Demolicion de Sardinel en concreto Perimetral	ML	153,07	$ 8.254,14	$ 1.263.460,50	0,00
DEMOLICIONES A MAQUINA					
Excavaciones varias a maquina sin clasificar (inlcuye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km)	M3	328,52	$ 18.413,53	$ 6.049.214,14	0,00
Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	219,02	$ 51.427,07	$ 11.263.556,36	0,00
Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	355,90	$ 91.015,04	$ 32.392.251,88	0,00
Relleno con material del sitio compactado mecanicamente	M3	200,77	$ 21.954,14	$ 4.407.731,75	0,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS					

Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	154,00	$ 51.427,07	$ 7.919.768,42	0,00
Acometida de acueducto 1" Incluye medidor	UN	1,00	$ 863.105,26	$ 863.105,26	0,00
Suministro e Instalacion de Tuberia pvc presion Ø 1" RDE 21	ML	95,10	$ 9.028,57	$ 858.617,14	0,00
Suministro e Instalacion de Tuberia pvc presion Ø 3/4" RDE 21	ML	68,20	$ 7.355,64	$ 501.654,59	0,00
Suministro e Instalacion de Tuberia pvc presion Ø 1/2" RDE 13,5	ML	56,70	$ 5.952,63	$ 337.514,21	0,00
Punto Hidraulico con llave Cromada de 1/2" (Zonas verdes)	UN	4,00	$ 55.080,45	$ 220.321,80	0,00
PLACA PISO ZONAS DE CIRCULACION					
Refuerzo malla electrosoldada	KG	2.034,43	$ 9.984,96	$ 20.313.707,07	0,00
Placa base concreto E= 0.10m 3000 PSI	M2	973,41	$ 59.596,24	$ 58.011.576,56	0,00
Concreto Estriado Rampas en concretos 3000PSI	M2	9,68	$ 62.784,21	$ 607.751,16	0,00
Bordillo Prefabricado A-80	ML	272,57	$ 72.457,89	$ 19.749.848,37	0,00
Sardinel Prefabricado A-10	ML	160,96	$ 99.370,68	$ 15.994.704,12	0,00
Loseta prefabricada Tipo olas 40x40cm - Color Variado	M2	325,00	$ 129.195,49	$ 41.988.533,83	0,00
Loseta prefabricada Tipo Cuadrato 30x30cm - Color Variado	M2	266,71	$ 129.195,49	$ 34.457.728,80	0,00
Loseta prefabricada Tipo Toperol 40x40cm - Color Gris	M2	282,68	$ 118.200,75	$ 33.412.988,54	0,00
Media caña en Granito para terminado de pedestal 0,40 X 0,40m en concreto H=10cm	UN	23,00	$ 65.172,18	$ 1.498.960,15	0,00
ESTRUCTURA METALICA					
Pergola metalica en tuberia Estructural incluye tubo rectangular, tubo estructural cuadrado, soldadora, pintura wash Primer A, wash Primer B catalizador y esmalte sintetico debidamente instalado.	UN	1,00	$ 12.203.621,80	$ 12.203.621,80	0,00
MOBILIARIO URBANO					
Banca en concreto gris/café Autoportante Simplemente puesta (1,80m x 0,45m x 0,45m) sin espaldar	UN	8,00	$ 1.351.953,38	$ 10.815.627,07	0,00
Banca en concreto gris/café Autoportante Simplemente puesta (1,80m x 0,45m x 0,57m) con espaldar	UN	5,00	$ 1.611.968,42	$ 8.059.842,11	0,00

Caneca M-121 TIPO IDU. Elaborado en Acero Inoxidable SAE-304, Con mecanismo de giro antivandalico, Diametro Cilindro de 40Cm. Acabado tipo satinado de alta presentacion.	UN	3,00	$ 879.856,39	$ 2.639.569,17	0,00
SEÑALIZACION					
Marca Vial con pintura en frio - Rampas	M2	9,68	$ 46.667,67	$ 451.743,04	0,00
Señal vertical Grupo I 0,60 x 0,60m Poste 3,5m	UN	5,00	$ 252.377,44	$ 1.261.887,22	0,00
ZONAS VERDES					
Empradizacion (Incluye 15cm de tierra negra)	M2	167,38	$ 18.612,03	$ 3.115.281,59	0,00
Siembra de Duranta Limon - 5Un x ML	ML	89,79	$ 23.789,47	$ 2.136.056,84	0,00
Contenedor de Raiz en concreto 3000psi	ML	60,00	$ 128.819,55	$ 7.729.172,93	0,00
Baranda metalica para proteccion de zonas verdes	ML	89,79	$ 88.951,13	$ 7.986.921,77	0,00
ZONA MONUMENTO AL CAMAROGRAFO					
PRELIMINARES					
Cerca en teja de zinc H=1,80m	ML	82,99	$ 50.090,23	$ 4.156.987,82	0,00
Localizacion y replanteo	M2	233,41	$ 7.789,47	$ 1.818.141,05	233,41
Red Electrica Provicional L=50m	UN	5,00	$ 2.904.863,91	$ 14.524.319,55	0,00
Corte de pavimento rigido E=0,15m	ML	45,00	$ 9.276,69	$ 417.451,13	0,00
DEMOLICIONES					
Demolicion de piso en adoquin e=0,10m (zona dura existente)	M2	58,35	$ 12.721,80	$ 742.317,29	0,00
Demolicion Placa piso 0.15m en concreto	M2	116,71	$ 26.640,60	$ 3.109.224,60	0,00
Demolicion de Sardinel en concreto Perimetral	ML	77,53	$ 8.254,14	$ 639.943,11	0,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS					
Excavaciones varias a maquina sin clasificar (inlcuye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km)	M3	58,36	$ 18.413,53	$ 1.074.613,83	0,00
Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	35,01	$ 51.427,07	$ 1.800.461,64	0,00
Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	81,70	$ 91.015,04	$ 7.435.928,57	0,00
PLACA PISO ZONAS DE CIRCULACION					

Concreto Estriado Rampas en concretos 3000PSI	M2	4,84	$ 62.784,21	$ 303.875,58	0,00
Bordillo Prefabricado A-80	ML	36,48	$ 72.457,89	$ 2.643.264,00	0,00
Sardinel Prefabricado A-10	ML	82,99	$ 99.370,68	$ 8.246.772,46	0,00
Adoquin peatonal prefabricado E=6cm - Color Variado	M2	177,30	$ 73.297,74	$ 12.995.690,08	0,00
Media caña en Granito para terminado de pedestal 0,40 X 0,40m en concreto H=10cm	UN	4,00	$ 65.172,18	$ 260.688,72	0,00
MOBILIARIO URBANO					
Banca en concreto gris/café Autoportante Simplemente puesta (1,80m x 0,45m x 0,45m) sin espaldar	UN	3,00	$ 1.351.953,38	$ 4.055.860,15	0,00
Banca en concreto gris/café Autoportante Simplemente puesta (1,80m x 0,45m x 0,57m) con espaldar	UN	2,00	$ 1.611.968,42	$ 3.223.936,84	0,00
Caneca M-121 TIPO IDU. Elaborado en Acero Inoxidable SAE-304, Con mecanismo de giro antivandalico, Diametro Cilindro de 40Cm. Acabado tipo satinado de alta presentacion.	UN	1,00	$ 879.856,39	$ 879.856,39	0,00
PLACA PISO ZONAS DE CIRCULACION					
Marca Vial con pintura en frio - Rampas	M2	4,84	$ 46.667,67	$ 225.871,52	0,00
Señal vertical Grupo I 0,60 x 0,60m Poste 3,5m	UN	3,00	$ 252.377,44	$ 757.132,33	0,00
ALAMEDA FERREA SENDERO Y CICLORUTA (CARRERA 14 ENTRE CALLE16 Y CALLE 34)					
PRELIMINARES					
Campamento 18m²	UN	1,00	$ 2.173.885,71	$ 2.173.885,71	0,00
Cerca en teja de zinc H=1,80m	ML	1.733,84	$ 50.090,23	$ 86.848.436,69	0,00
Localizacion y replanteo	M2	7.993,32	$ 7.789,47	$ 62.263.755,79	7.993,32
Corte de pavimento rigido E=0,15m	ML	750,00	$ 9.276,69	$ 6.957.518,80	0,00
DEMOLICIONES					
Demolicion de piso en adoquin e=0,10m (zona dura existente)	M2	1.998,33	$ 13.950,38	$ 27.877.454,75	0,00
Demolicion Placa piso 0.15m en concreto	M2	5.994,99	$ 26.640,60	$ 159.710.139,61	0,00
Demolicion de Sardinel en concreto Perimetral	ML	1.558,84	$ 8.254,14	$ 12.866.876,33	0,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS					

Excavaciones varias a maquina sin clasificar (inlcuye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km)	M3	2.997,50	$ 18.413,53	$ 55.194.567,67	0,00
Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	2.398,00	$ 51.427,07	$ 123.322.108,27	0,00
Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	3.297,24	$ 91.015,04	$ 300.098.422,56	0,00
Relleno con material del sitio compactado mecanicamente	M3	2.098,25	$ 21.954,14	$ 46.065.264,47	0,00
PLACA PISO ZONAS DE CIRCULACION					
Refuerzo malla electrosoldada	KG	11.694,22	$ 9.984,96	$ 116.766.347,07	0,00
Placa base concreto E= 0.10m 3000 PSI	M2	5.595,32	$ 59.596,24	$ 333.460.036,96	0,00
Concreto Estriado Rampas en concretos 3000PSI	M2	48,40	$ 62.784,21	$ 3.038.755,79	0,00
Bordillo Prefabricado A-80	ML	145,46	$ 72.457,89	$ 10.539.725,37	0,00
Sardinel Prefabricado A-10	ML	3.965,46	$ 99.370,68	$ 394.050.443,59	0,00
Loseta prefabricada Tipo Toperol 40x40cm - Color Gris	M2	1.858,03	$ 118.200,75	$ 219.620.543,02	0,00
Media caña en Granito para terminado de pedestal 0,40 X 0,40m en concreto H=10cm	UN	70,00	$ 65.172,18	$ 4.562.052,63	0,00
CICLO RUTA					
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye cemento asfaltico)	M3	371,90	$ 934.460,15	$ 347.525.729,92	0,00
Sub base Granular	M3	557,85	$ 95.539,10	$ 53.296.485,68	0,00
Contenedor de Raiz en concreto 3000psi	ML	280,00	$ 128.819,55	$ 36.069.473,68	0,00
MOBILIARIO URBANO					
Caneca M-121 TIPO IDU. Elaborado en Acero Inoxidable SAE-304, Con mecanismo de giro antivandalico, Diametro Cilindro de 40Cm. Acabado tipo satinado de alta presentacion.	UN	15,00	$ 879.856,39	$ 13.197.845,86	0,00
SEÑALIZACION					
Linea de demarcacion con pintura en frio (Bahia de parqueadero)	ML	2.258,20	$ 4.273,68	$ 9.650.833,68	0,00
Marca Vial con pintura en frio - Rampas	M2	48,40	$ 46.667,67	$ 2.258.715,19	0,00
Señal vertical Grupo I 0,60 x 0,60m Poste 3,5m	UN	20,00	$ 252.377,44	$ 5.047.548,87	0,00

CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT

901.732.581-7

ANDENES DE CIRCULACION					
PLACA PISO ZONAS DE CIRCULACION					
Cerca en teja de zinc H=1,80m	ML	504,00	$ 50.090,23	$ 25.245.473,68	0,00
Localizacion y replanteo con equipos topograficos	M2	1.894,91	$ 7.789,47	$ 14.760.351,58	2.146,42
Demolicion Placa piso 0.15m en concreto	M2	1.894,91	$ 26.640,60	$ 50.481.542,20	2.822,51
Demolicion de Sardinel en concreto Perimetral	ML	504,00	$ 8.254,14	$ 4.160.084,21	656,19
Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	663,22	$ 51.427,07	$ 34.107.459,82	496,25
Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	568,47	$ 91.015,04	$ 51.739.318,42	466,77
Refuerzo malla electrosoldada	KG	3.960,36	$ 9.984,96	$ 39.544.045,71	2.681,18
Anden en concreto 3000psi en sitio E=0,10m	M2	1.894,91	$ 66.493,98	$ 126.000.117,05	2.146,42
Sardinel Prefabricado A-10	ML	504,00	$ 99.370,68	$ 50.082.821,05	548,08
Loseta prefabricada Tipo olas 40x40cm - Color Variado	M2	733,00	$ 129.195,49	$ 94.700.293,23	0,00
Loseta prefabricada Tipo Cuadrato 30x30cm - Color Variado	M2	733,00	$ 129.195,49	$ 94.700.293,23	1.860,20
Loseta prefabricada Tipo Toperol 40x40cm - Color Gris	M2	200,00	$ 118.200,75	$ 23.640.150,38	103,41
INSTALACIONES ELECTRICAS					
REDES ELECTRICAS					
Luminaria led mecano 37 W	UN	130,00	$ 2.507.912,03	$ 326.028.563,91	
Poste metalico troncoconico 6 mts de altura brazo sencillo Ø 4"	UN	130,00	$ 1.995.000,00	$ 259.350.000,00	0,00
Suminstro e instalacion de cajas SB 274	UN	4,00	$ 1.023.125,56	$ 4.092.502,26	0,00
Red de distribucion BT (2x12+12T) Cu Awg. Ducto de 3/4.	Mts	981,00	$ 30.477,44	$ 29.898.372,18	0,00
Tablero bifasico para control de luminación, incluye accesorios	UN	4,00	$ 1.567.412,03	$ 6.269.648,12	0,00
Malla polo a Tierra Principal	UN	4,00	$ 865.172,18	$ 3.460.688,72	0,00
Ducto PVC 2xØ2" con enterramiento SB 209	Mts	2.013,00	$ 161.174,44	$ 324.444.139,85	663,00
Caja AP280	UN	106,00	$ 415.300,00	$ 44.021.800,00	0,00
Acometida 2x4+4T AL serie 8000	Mts	1.360,00	$ 52.365,41	$ 71.216.962,41	0,00

Alimentador 2x12+12T Cu solo cable	Mts	978,00	$ 51.510,53	$ 50.377.294,74	0,00
Empalmes de resina	UN	70,00	$ 76.415,79	$ 5.349.105,26	0,00
Marquillado de cajas	UN	110,00	$ 35.268,42	$ 3.879.526,32	0,00
Armario para equipo de medida Directa Norma AE850 - incluye equipo de medida, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación a la intemperie. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa prestadora del servicio pernos metalicos de anclaje para sujecion. Incluye legalizacion ante empresa prestadora de servicio.	Und	4,00	$ 4.510.258,65	$ 18.041.034,59	0,00
Sistema de puesta a tierra para alumbrado	Und	16,00	$ 865.172,18	$ 13.842.754,89	0,00
CERCA EN TELA VERDE	ML.	365,00	$ 29.190,00	$ 10.654.350,00	365,00
Transporte de materiales prov. de explanación, canales, prestamos, sobre acarreos y derrumbes	M3	27.097,67	$ 1.371,43	$ 37.162.518,86	163.210,57
Alistado pisos 1:3 e=0,04	M2	1.305,80	$ 34.339,00	$ 44.839.866,20	1.337,80
LEGALIZACION Y CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	Und	0,00	$ 54.942.372,00	$ 0,00	0,00
	ML.			$ 0,00	0,00
	M3			$ 0,00	0,00
Costo Directo				**$ 6.154.979.911,99**	**$ 2.028.890.744**

TRAMOS INTERVENIDOS HASTA ABRIL 29 DEL 2024

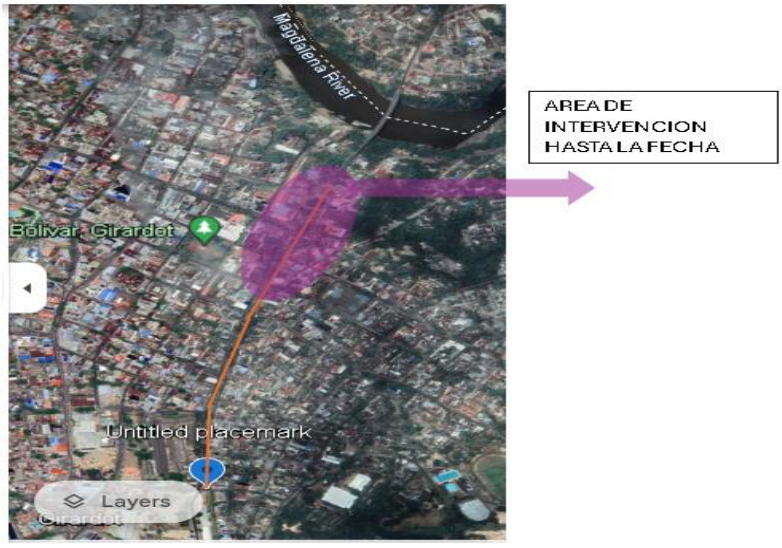




Tabla 5. Control de cantidades ejecutadas en términos FINANCIEROS Parque Lineal

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN TÉRMINOS FINANCIEROS						
Administración			27,00%	$ 1.661.844.576,24	$	547.800.501
Imprevisto			1,00%	$ 61.549.799,12	$	20.288.907
Utilidad			5,00%	$ 307.748.995,60	$	101.444.537
RETIE		RETIE	0,00%	$ 0,00	$	54.942.372
Acompañamiento Social			0,00%	$ 0,00	$	-
Transporte			0,00%	$ 0,00		
TOTAL OBRA		AIU	**33,000%**	**$ 8.241.065.654,95**	$	2.698.424.690
Cantidades Acumuladas				$ 8.241.065.654,95		
Avance Ejecutado Acumulado %				$ 21.496.000.972,00		32,74%

Gráfico 3. Proyectado vs Ejecutado EN PORCENTAJES

SEMANA	41
Progreso Planificado	100,00%
Progreso Real	32,74%
Desviación	47,56%
Ejecución Presupuestal Planificada	$ 415.500.180
Ejecución Presupuestal Real	$ 2.698.124.895
Valor Pagado	
Desviación Ejecución Presupuestal	$ 1.614.059.415
AVANCE SEMANAL	32,74%

Durante este mes del 01 al 30 de junio del 2024 el avance del parque es de **32.74% componente que continúa suspendido a la fecha**

VISITAS TÉCNICAS

En el mes de julio del 2024, NO se realizan visitas técnicas, pero se está a la espera de la aprobación de cantidades NO previstas y de aprobación de balance radicado en el municipio por parte de la interventoría en fecha mayo 11 del 2024, el cual a la fecha no se ha dado tramite.

5. CONSOLIDADO DEL CONTRATO DE OBRA No. 734 -2023

5.3. OBJETO "REHABILITACIÓN DE ALGUNOS SEGMENTOS VIALES, Y LA RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA, PAISAJÍSTICA Y CULTURAL DE LA ALAMEDA FÉRREA LINEAL EL SOL, PARA UNA MOVILIDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA".

El componente del parque se da inicio real el día 15 de septiembre del 2023, por instructivo de la supervisión del municipio, se inicia la implantación de los diseños contemplados en los estudios previos aprobados por el municipio y que hacen parte de los documentos contractuales en el sector del parque de la locomotora, una vez se realiza replanteo topográfico se encuentra que las áreas y los niveles contemplados NO corresponden a los niveles del terreno.

La interventoría y el contratista de obras CONSORCIO GIRARDOT 2024, inician el ajuste de los diseños acorde a las necesidades y las áreas reales generando paralelamente el balance de actividades y cantidades.

Una vez realizados ajustes en gran porcentaje de los diseños iniciales del PARQUE DE LA LOCOMOTORA, se continua con la implantación en terreno y se avanza en la construcción del proyecto, se presentan obras adicionales que se van resolviendo en diseños y costo para su posterior aprobación.

La nueva administración municipal por intermedio del supervisor designado para acompañar las obras evidencia que este componente NO cuenta con la viabilidad y el aval para ejecutarse del ministerio de cultura por lo tanto solicita a partir de la fecha de suspensión N° 1, 29 de abril del 2024 suspender de forma total todo tipo de actividades, esta suspensión será hasta que el ministerio de cultura expida las respectivas viabilidades para continuar con la implantación del proyecto, a la fecha este componente se encuentra SUSPENDIDO.

En las vías también se hacen ajustes en el presupuesto y se legalizan item NO PREVISTOS mediante acta modificatoria en donde se contemplan algunas actividades no previstas en los estudios previos, modificatoria de INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 AL CONVENIO 681 DE 2022 que se aprobó y viabilizo por parte del municipio y el iccu en el mes de julio, se espera esta aprobación para determinar el alcance real del objeto del contrato mientras tanto el contratista de obras CONSORCIO GIRARDOT 2024 avanza en buena forma, a continuación, se presentan las cantidades consolidadas.

Tabla 16. Control de cantidades ejecutadas total contrato.

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS/MES DE JULIO DEL 2024							Semana
No. ID	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDADES TOTALES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDADES EJECUTADAS**	**09 HASTA EL 31 DE JULIO**
VIAS							
No. ID	**ACTIVIDADES**						
	CAPITULO 1 - EXPLANACIONES						
201-P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	m3	915,70	$ 57.716,54	$ 52.851.036,92	480,01	52,70
202	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNADISTANCIA DE 5KM)	m3	2.098,40	$ 96.230,83	$ 201.930.767,52	556,76	9,50
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	27.437,18	$ 22.115,04	$ 606.774.267,17	21.027,29	37,09
231-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	36.606,67	$ 7.933,83	$ 290.431.264,54	28.968,54	2.439,85
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	172,08	$ 51.427,07	$ 8.849.569,80	487,60	82,16
	CAPITULO 2- PAVIMENTOS						
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m2	1.052,28	$ 91.015,04	$ 95.773.303,76	1.024,64	

3.22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	m3	3.345,98	$ 118.874,44	$ 397.751.485,67	2.737,90	
320-1	SUBBASE GRANULAR	m3	11.650,38	$ 95.539,10	$ 1.113.066.793,58	8.550,45	719,35
330-1	BASE GRANULAR	m3	8.181,26	$ 106.048,87	$ 867.613.396,02	5.814,91	1.075,44
450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	5.414,82	$ 819.572,18	$ 4.437.835.834,15	3.247,95	539,08
420-1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	m2	38.684,27	$ 4.746,62	$ 183.619.395,87	24.868,63	768,41
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ml	9.282,00	$ 99.370,68	$ 922.358.621,05	5.738,30	685,80
	CAPITULO 3 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	77,00	$ 859.896,24	$ 66.212.010,53	0,00	
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	84,00	$ 1.982.560,90	$ 166.535.115,79	0,00	
	CAPITULO 4 - TRANSPORTES						
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	m3 - Km	346.436,66	$ 1.371,43	$ 475.113.134,39	970.715,64	18.703,74
	CAPITULO 5- SEÑALIZACION						
700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	18.579,00	$ 4.273,68	$ 79.400.778,95	0,00	
	NO PREVISTOS				$ 0,00	0,00	
	DEMOLICION DE ASFALTO		715,99	$ 33.362,00	$ 23.886.858,38	715,99	715,99
	CONCRETO		6,84	$ 607.272,00	$ 4.153.740,48	6,84	6,84
	ACERO		644,18	$ 8.361,00	$ 5.385.988,98	644,18	644,18
		M3			$ 0,00	0,00	

PARQUE LINEAL							
PARQUE LOCOMOTORA							
1.1	PRELIMINARES						
1.1.1	Campamento 18m²	UN	1,00	$ 2.173.885,71	$ 2.173.885,71	0,00	
1.1.2	Cerca en teja de zinc H=1,80m	ML	390,58	$ 50.090,23	$ 19.564.240,30	36,00	
1.1.3	Localizacion y replanteo con equipos topograficos	M2	5.932,54	$ 7.789,47	$ 46.211.364,21	5.932,54	
1.1.4	Red Electrica Provicional L=50m	UN	18,00	$ 2.904.863,91	$ 52.287.550,38	0,00	
1.1.5	Corte de pavimento rigido E=0,15m	ML	150,00	$ 9.276,69	$ 1.391.503,76	0,00	
1,2	DESMONTES						
1.2.1	Desmonte de postes de concreto electrico	UN	5,00	$ 272.545,86	$ 1.362.729,32	5,00	
1.2.2	Desmonte de Bancas	UN	15,00	$ 26.002,26	$ 390.033,83	15,00	
1.2.3	Desmonte de Basureros	UN	6,00	$ 21.668,42	$ 130.010,53	7,00	
1,3	DEMOLICIONES						
1.3.1	Demolicion de piso en adoquin e=0,10m (zona dura existente)	M2	1.483,14	$ 13.950,38	$ 20.690.360,57	2.744,86	
1.3.2	Demolicion Placa piso 0.15m en concreto	M2	2.966,27	$ 26.640,60	$ 79.023.217,02	3.216,07	
1.3.3	Demolicion de Sardinel en concreto Perimetral	ML	365,48	$ 8.254,14	$ 3.016.721,38	527,13	
1,4	EXCAVACIONES						
1.4.1	Excavaciones varias a maquina sin clasificar (inlcuye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km)	M3	1.631,45	$ 18.413,53	$ 30.040.759,77	2.359,21	
1.4.2	Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	593,26	$ 51.427,07	$ 30.509.622,17	441,96	
1.4.3	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	1.334,82	$ 91.015,04	$ 121.488.692,48	848,50	
1.4.4	Relleno con material del sitio compactado mecanicamente	M3	889,88	$ 21.954,14	$ 19.536.545,95	56,00	
1,5	INSTALACIONES HIDRAULICAS						

1.5.1	Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	245,00	$ 51.427,07	$ 12.599.631,58	21,36	
1.5.2	Acometida de acueducto 1" Incluye medidor	UN	1,00	$ 863.105,26	$ 863.105,26	0,00	
1.5.3	Suministro e Instalacion de Tuberia pvc presion Ø 1" RDE 21	ML	110,00	$ 15.869,17	$ 1.745.609,02	207,00	
1.5.4	**Suministro e Instalacion de Tuberia pvc presion Ø 3/4" RDE 21**	ML	85,10	$ 11.927,07	$ 1.014.993,46	60,00	
1.5.5	Suministro e Instalacion de Tuberia pvc presion Ø 1/2" RDE 13,5	ML	61,20	$ 9.590,98	$ 586.967,82	0,00	
1.5.6	**Punto Hidraulico con llave Cromada de 1/2" (Zonas verdes)**	UN	10,00	$ 55.080,45	$ 550.804,51	0,00	
1,6	PLACA PISO ZONAS DE CIRCULACION						
1.6.1	Refuerzo malla electrosoldada	KG	9.299,27	$ 9.984,96	$ 92.852.861,35	3.514,43	
1.6.2	Placa base concreto E= 0.10m 3000 PSI	M2	4.449,41	$ 59.596,24	$ 265.168.108,89	2.631,71	
1.6.3	Concreto Estriado Rampas en concretos 3000PSI	M2	14,52	$ 62.784,21	$ 911.626,74	0,00	
1.6.4	Bordillo Prefabricado A-80	ML	718,33	$ 72.457,89	$ 52.048.679,53	772,70	
1.6.5	Sardinel Prefabricado A-10	ML	556,47	$ 99.370,68	$ 55.296.800,46	488,74	
1.6.6	Loseta prefabricada Tipo olas 40x40cm - Color Variado	M2	1.154,48	$ 129.195,49	$ 149.153.607,82	0,00	
1.6.7	Loseta prefabricada Tipo Cuadrato 30x30cm - Color Variado	M2	858,03	$ 129.195,49	$ 110.853.605,19	1.874,20	
1.6.8	Loseta prefabricada Tipo (MEDIA LUNA) 30x30cm - Color Variado	M2	81,40	$ 129.195,49	$ 10.516.512,78	0,00	
1.6.9	Loseta prefabricada Tipo Toperol 40x40cm - Color Gris	M2	723,46	$ 118.200,75	$ 85.513.515,95	59,30	
1.6.10	Adoquin peatonal prefabricado E=6cm - Color Variado	M2	251,91	$ 73.297,74	$ 18.464.434,78	478,00	
1.6.11	Media caña en Granito para terminado de pedestal 0,40 X	UN	55,00	$ 65.172,18	$ 3.584.469,92	0,00	

	0,40m en concreto H=10cm						
1,7	BAHIA DE PARQUEO						
1.7.1	Adoquin peatonal prefabricado E=6cm - Color Variado	M2	417,67	$ 73.297,74	$ 30.614.268,89	184,20	
1.7.2	Sub base Granular	M3	83,53	$ 95.539,10	$ 7.980.380,83	39,80	
1,8	MOBILIARIO URBANO						
1.8.1	Banca en concreto gris/café Autoportante Simplemente puesta (1,80m x 0,45m x 0,45m) sin espaldar	UN	5,00	$ 1.351.953,38	$ 6.759.766,92	0,00	
1.8.2	Banca en concreto gris/café Autoportante Simplemente puesta (1,80m x 0,45m x 0,57m) con espaldar	UN	5,00	$ 1.611.968,42	$ 8.059.842,11	0,00	
1.8.3	Caneca M-121 TIPO IDU. Elaborado en Acero Inoxidable SAE-304, Con mecanismo de giro antivandalico, Diametro Cilindro de 40Cm. Acabado tipo satinado de alta presentacion.	UN	6,00	$ 879.856,39	$ 5.279.138,35	0,00	
1,8,4	Parque infantil tipo IDRD para exterior, con capacidad promedio de 12 a 18 niños, entre los rango de edad de 3 a 14 años que cuenta con un area de ocupacion de 60 a 75 metros cuadrados con funciones ludicas para trepar, equilibrio, escalar, delizarse, incluye tubería galvanizada con pintura barrera epóxica ref,233710+esmalte alquídico tipo 3 de sika o similar y material en fibra de vidrio para zona de deslizaderos y/o metalica en area de obstaculos.	UN	1,00	$ 63.412.500,00	$ 63.412.500,00	0,00	
1,9	SEÑALIZACION						
1,9,1	Linea de demarcacion con pintura en frio (Bahia de parqueadero)	ML	100,02	$ 4.273,68	$ 427.453,89	0,00	

1,9,2	Marca Vial con pintura en frio - Rampas	M2	14,52	$ 46.667,67	$ 677.614,56	0,00	
1,9,3	Señal vertical Grupo I 0,60 x 0,60m Poste 3,5m	UN	6,00	$ 252.377,44	$ 1.514.264,66	0,00	
1,1	ZONAS VERDES						
1,10,1	Empradizacion (Incluye 15cm de tierra negra)	M2	728,05	$ 18.612,03	$ 13.550.488,50	0,00	
1,10,2	Siembra de Duranta Limon - 5Un x ML	ML	283,16	$ 23.789,47	$ 6.736.227,37	0,00	
1,10,3	Contenedor de Raiz en concreto 3000psi	ML	276,00	$ 128.819,55	$ 35.554.195,49	0,00	
1,10,4	Baranda metalica para proteccion de zonas verdes	ML	283,16	$ 88.951,13	$ 25.187.401,35	0,00	
PARQUE JORGE ELIECER GAITAN							
2,1	PRELIMINARES						
2.1.1	Campamento 18m²	UN	1,00	$ 2.173.885,71	$ 2.173.885,71	0,00	
2.1.2	Cerca en teja de zinc H=1,80m	ML	160,96	$ 50.090,23	$ 8.062.522,71	0,00	
2.1.3	Localizacion y replanteo	M2	1.216,76	$ 7.789,47	$ 9.477.920,00	1.216,76	
2.1.4	Corte de pavimento rigido E=0,15m	ML	85,10	$ 9.180,45	$ 781.256,39	0,00	
2,2	DESMONTES						
2.2.1	Desmonte de postes de concreto electrico	UN	7,00	$ 272.545,86	$ 1.907.821,05	0,00	
2.2.2	Desmonte de Bancas	UN	5,00	$ 26.002,26	$ 130.011,28	0,00	
2.2.3	Desmonte de Basureros	UN	3,00	$ 21.668,42	$ 65.005,26	0,00	
2,3	DEMOLICIONES						
2.3.1	Demolicion de piso en adoquin e=0,10m (zona dura existente)	M2	547,54	$ 13.950,38	$ 7.638.388,84	0,00	
2.3.2	Demolicion Placa piso 0.15m en concreto	M2	365,03	$ 26.640,60	$ 9.724.618,77	0,00	
2.3.3	Demolicion de Sardinel en concreto Perimetral	ML	153,07	$ 8.254,14	$ 1.263.460,50	0,00	
2,4	DEMOLICIONES A MAQUINA						
2.4.1	Excavaciones varias a maquina sin clasificar (inlcuye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km)	M3	328,52	$ 18.413,53	$ 6.049.214,14	0,00	

2.4.2	Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	219,02	$ 51.427,07	$ 11.263.556,36	0,00	
2.4.3	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	355,90	$ 91.015,04	$ 32.392.251,88	0,00	
2.4.4	Relleno con material del sitio compactado mecanicamente	M3	200,77	$ 21.954,14	$ 4.407.731,75	0,00	
2,5	INSTALACIONES HIDRAULICAS						
2.5.1	Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	154,00	$ 51.427,07	$ 7.919.768,42	0,00	
2.5.2	Acometida de acueducto 1" Incluye medidor	UN	1,00	$ 863.105,26	$ 863.105,26	0,00	
2.5.3	Suministro e Instalacion de Tuberia pvc presion Ø 1" RDE 21	ML	95,10	$ 9.028,57	$ 858.617,14	0,00	
2.5.4	Suministro e Instalacion de Tuberia pvc presion Ø 3/4" RDE 21	ML	68,20	$ 7.355,64	$ 501.654,59	0,00	
2.5.5	Suministro e Instalacion de Tuberia pvc presion Ø 1/2" RDE 13,5	ML	56,70	$ 5.952,63	$ 337.514,21	0,00	
2.5.6	Punto Hidraulico con llave Cromada de 1/2" (Zonas verdes)	UN	4,00	$ 55.080,45	$ 220.321,80	0,00	
2,6	PLACA PISO ZONAS DE CIRCULACION						
2.6.1	Refuerzo malla electrosoldada	KG	2.034,43	$ 9.984,96	$ 20.313.707,07	0,00	
2.6.2	Placa base concreto E= 0.10m 3000 PSI	M2	973,41	$ 59.596,24	$ 58.011.576,56	0,00	
2.6.3	Concreto Estriado Rampas en concretos 3000PSI	M2	9,68	$ 62.784,21	$ 607.751,16	0,00	
2.6.4	Bordillo Prefabricado A-80	ML	272,57	$ 72.457,89	$ 19.749.848,37	0,00	
2.6.5	Sardinel Prefabricado A-10	ML	160,96	$ 99.370,68	$ 15.994.704,12	0,00	
2.6.6	Loseta prefabricada Tipo olas 40x40cm - Color Variado	M2	325,00	$ 129.195,49	$ 41.988.533,83	0,00	
2.6.7	Loseta prefabricada Tipo Cuadrato 30x30cm - Color	M2	266,71	$ 129.195,49	$ 34.457.728,80	0,00	

	Variado						
2.6.8	Loseta prefabricada Tipo Toperol 40x40cm - Color Gris	M2	282,68	$ 118.200,75	$ 33.412.988,54	0,00	
2.6.9	Media caña en Granito para terminado de pedestal 0,40 X 0,40m en concreto H=10cm	UN	23,00	$ 65.172,18	$ 1.498.960,15	0,00	
2,7	ESTRUCTURA METALICA						
1.7.1	Pergola metalica en tuberia Estructural incluye tubo rectangular, tubo estructural cuadrado, soldadora, pintura wash Primer A, wash Primer B catalizador y esmalte sintetico debidamente instalado.	UN	1,00	$ 12.203.621,80	$ 12.203.621,80	0,00	
2,8	MOBILIARIO URBANO						
2.8.1	Banca en concreto gris/café Autoportante Simplemente puesta (1,80m x 0,45m x 0,45m) sin espaldar	UN	8,00	$ 1.351.953,38	$ 10.815.627,07	0,00	
2.8.2	Banca en concreto gris/café Autoportante Simplemente puesta (1,80m x 0,45m x 0,57m) con espaldar	UN	5,00	$ 1.611.968,42	$ 8.059.842,11	0,00	
2.8.3	Caneca M-121 TIPO IDU. Elaborado en Acero Inoxidable SAE-304, Con mecanismo de giro antivandalico, Diametro Cilindro de 40Cm. Acabado tipo satinado de alta presentacion.	UN	3,00	$ 879.856,39	$ 2.639.569,17	0,00	
1,9	SEÑALIZACION						
2.9.1	Marca Vial con pintura en frio - Rampas	M2	9,68	$ 46.667,67	$ 451.743,04	0,00	
2.9.2	Señal vertical Grupo I 0,60 x 0,60m Poste 3,5m	UN	5,00	$ 252.377,44	$ 1.261.887,22	0,00	
2,1	ZONAS VERDES						
2.10.1	Empradizacion (Incluye 15cm de tierra negra)	M2	167,38	$ 18.612,03	$ 3.115.281,59	0,00	
2.10.2	Siembra de Duranta Limon - 5Un x ML	ML	89,79	$ 23.789,47	$ 2.136.056,84	0,00	

2.10.3	Contenedor de Raiz en concreto 3000psi	ML	60,00	$ 128.819,55	$ 7.729.172,93	0,00	
2.10.4	Baranda metalica para proteccion de zonas verdes	ML	89,79	$ 88.951,13	$ 7.986.921,77	0,00	
ZONA MONUMENTO AL CAMAROGRAFO							
3,1	PRELIMINARES						
3.1.1	Cerca en teja de zinc H=1,80m	ML	82,99	$ 50.090,23	$ 4.156.987,82	0,00	
3.1.2	Localizacion y replanteo	M2	233,41	$ 7.789,47	$ 1.818.141,05	233,41	
3.1.3	Red Electrica Provicional L=50m	UN	5,00	$ 2.904.863,91	$ 14.524.319,55	0,00	
3.1.4	Corte de pavimento rigido E=0,15m	ML	45,00	$ 9.276,69	$ 417.451,13	0,00	
3,2	DEMOLICIONES						
3.2.1	Demolicion de piso en adoquin e=0,10m (zona dura existente)	M2	58,35	$ 12.721,80	$ 742.317,29	0,00	
3.2.2	Demolicion Placa piso 0.15m en concreto	M2	116,71	$ 26.640,60	$ 3.109.224,60	0,00	
3.2.3	Demolicion de Sardinel en concreto Perimetral	ML	77,53	$ 8.254,14	$ 639.943,11	0,00	
3,3	EXCAVACIONES Y RELLENOS						
3.3.1	Excavaciones varias a maquina sin clasificar (inlcuye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km)	M3	58,36	$ 18.413,53	$ 1.074.613,83	0,00	
3.3.2	Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	35,01	$ 51.427,07	$ 1.800.461,64	0,00	
3.3.3	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	81,70	$ 91.015,04	$ 7.435.928,57	0,00	
3,4	PLACA PISO ZONAS DE CIRCULACION						
3.4.1	Concreto Estriado Rampas en concretos 3000PSI	M2	4,84	$ 62.784,21	$ 303.875,58	0,00	
3.4.2	Bordillo Prefabricado A-80	ML	36,48	$ 72.457,89	$ 2.643.264,00	0,00	
3.4.3	Sardinel Prefabricado A-10	ML	82,99	$ 99.370,68	$ 8.246.772,46	0,00	
3.4.4	Adoquin peatonal prefabricado E=6cm - Color Variado	M2	177,30	$ 73.297,74	$ 12.995.690,08	0,00	

3.4.5	Media caña en Granito para terminado de pedestal 0,40 X 0,40m en concreto H=10cm	UN	4,00	$ 65.172,18	$ 260.688,72	0,00	
3,5	MOBILIARIO URBANO						
3.5.1	Banca en concreto gris/café Autoportante Simplemente puesta (1,80m x 0,45m x 0,45m) sin espaldar	UN	3,00	$ 1.351.953,38	$ 4.055.860,15	0,00	
3.5.2	Banca en concreto gris/café Autoportante Simplemente puesta (1,80m x 0,45m x 0,57m) con espaldar	UN	2,00	$ 1.611.968,42	$ 3.223.936,84	0,00	
3.5.3	Caneca M-121 TIPO IDU. Elaborado en Acero Inoxidable SAE-304, Con mecanismo de giro antivandalico, Diametro Cilindro de 40Cm. Acabado tipo satinado de alta presentacion.	UN	1,00	$ 879.856,39	$ 879.856,39	0,00	
3,6	PLACA PISO ZONAS DE CIRCULACION						
3.6.1	Marca Vial con pintura en frio - Rampas	M2	4,84	$ 46.667,67	$ 225.871,52	0,00	
3.6.2	Señal vertical Grupo I 0,60 x 0,60m Poste 3,5m	UN	3,00	$ 252.377,44	$ 757.132,33	0,00	
ALAMEDA FERREA SENDERO Y CICLORUTA (CARRERA 14 ENTRE CALLE16 Y CALLE 34)							
4,1	PRELIMINARES						
4.1.1	Campamento 18m²	UN	1,00	$ 2.173.885,71	$ 2.173.885,71	0,00	
4.1.2	Cerca en teja de zinc H=1,80m	ML	1.733,84	$ 50.090,23	$ 86.848.436,69	0,00	
4.1.3	Localizacion y replanteo	M2	7.993,32	$ 7.789,47	$ 62.263.755,79	7.993,32	
4.1.4	Corte de pavimento rigido E=0,15m	ML	750,00	$ 9.276,69	$ 6.957.518,80	0,00	
4,2	DEMOLICIONES						
4.2.1	Demolicion de piso en adoquin e=0,10m (zona dura existente)	M2	1.998,33	$ 13.950,38	$ 27.877.454,75	0,00	
4.2.2	Demolicion Placa piso 0.15m en concreto	M2	5.994,99	$ 26.640,60	$ 159.710.139,61	0,00	
4.2.3	Demolicion de Sardinel en concreto Perimetral	ML	1.558,84	$ 8.254,14	$ 12.866.876,33	0,00	


3,3	EXCAVACIONES Y RELLENOS						
4.3.1	Excavaciones varias a maquina sin clasificar (inlcuye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km)	M3	2.997,50	$ 18.413,53	$ 55.194.567,67	0,00	
4.3.2	Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	2.398,00	$ 51.427,07	$ 123.322.108,27	0,00	
4.3.3	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	3.297,24	$ 91.015,04	$ 300.098.422,56	0,00	
4.3.4	Relleno con material del sitio compactado mecanicamente	M3	2.098,25	$ 21.954,14	$ 46.065.264,47	0,00	
4,4	PLACA PISO ZONAS DE CIRCULACION						
4.4.1	Refuerzo malla electrosoldada	KG	11.694,22	$ 9.984,96	$ 116.766.347,07	0,00	
4.4.2	Placa base concreto E= 0.10m 3000 PSI	M2	5.595,32	$ 59.596,24	$ 333.460.036,96	0,00	
4.4.3	Concreto Estriado Rampas en concretos 3000PSI	M2	48,40	$ 62.784,21	$ 3.038.755,79	0,00	
4.4.4	Bordillo Prefabricado A-80	ML	145,46	$ 72.457,89	$ 10.539.725,37	0,00	
4.4.5	Sardinel Prefabricado A-10	ML	3.965,46	$ 99.370,68	$ 394.050.443,59	0,00	
4,4,6	Loseta prefabricada Tipo Toperol 40x40cm - Color Gris	M2	1.858,03	$ 118.200,75	$ 219.620.543,02	0,00	
4,4,7	Media caña en Granito para terminado de pedestal 0,40 X 0,40m en concreto H=10cm	UN	70,00	$ 65.172,18	$ 4.562.052,63	0,00	
4,5	CICLO RUTA						
4.5.1	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye cemento asfaltico)	M3	371,90	$ 934.460,15	$ 347.525.729,92	0,00	
4.5.2	Sub base Granular	M3	557,85	$ 95.539,10	$ 53.296.485,68	0,00	
4,5,3	Contenedor de Raiz en concreto 3000psi	ML	280,00	$ 128.819,55	$ 36.069.473,68	0,00	
4,6	MOBILIARIO URBANO						
4.6.1	Caneca M-121 TIPO IDU. Elaborado en Acero Inoxidable SAE-304, Con mecanismo de giro antivandalico, Diametro Cilindro de 40Cm.	UN	15,00	$ 879.856,39	$ 13.197.845,86	0,00	

	Acabado tipo satinado de alta presentacion.						
4,7	SEÑALIZACION						
4.7.1	Linea de demarcacion con pintura en frio (Bahia de parqueadero)	ML	2.258,20	$ 4.273,68	$ 9.650.833,68	0,00	
4.7.2	Marca Vial con pintura en frio - Rampas	M2	48,40	$ 46.667,67	$ 2.258.715,19	0,00	
4.7.3	Señal vertical Grupo I 0,60 x 0,60m Poste 3,5m	UN	20,00	$ 252.377,44	$ 5.047.548,87	0,00	
ANDENES DE CIRCULACION							
5,1	PLACA PISO ZONAS DE CIRCULACION						
5,1,1	Cerca en teja de zinc H=1,80m	ML	504,00	$ 50.090,23	$ 25.245.473,68	0,00	
5,1,2	Localizacion y replanteo con equipos topograficos	M2	1.894,91	$ 7.789,47	$ 14.760.351,58	2.146,42	
5,1,3	Demolicion Placa piso 0.15m en concreto	M2	1.894,91	$ 26.640,60	$ 50.481.542,20	2.822,51	
5,1,4	Demolicion de Sardinel en concreto Perimetral	ML	504,00	$ 8.254,14	$ 4.160.084,21	656,19	
5,1,5	Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	663,22	$ 51.427,07	$ 34.107.459,82	496,25	
5,1,6	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	568,47	$ 91.015,04	$ 51.739.318,42	466,77	
5,1,7	Refuerzo malla electrosoldada	KG	3.960,36	$ 9.984,96	$ 39.544.045,71	2.681,18	
5,1,8	Anden en concreto 3000psi en sitio E=0,10m	M2	1.894,91	$ 66.493,98	$ 126.000.117,05	2.146,42	
5,1,9	Sardinel Prefabricado A-10	ML	504,00	$ 99.370,68	$ 50.082.821,05	548,08	
5,1,10	Loseta prefabricada Tipo olas 40x40cm - Color Variado	M2	733,00	$ 129.195,49	$ 94.700.293,23	0,00	
5,1,11	Loseta prefabricada Tipo Cuadrato 30x30cm - Color Variado	M2	733,00	$ 129.195,49	$ 94.700.293,23	1.860,20	
5,1,12	Loseta prefabricada Tipo Toperol 40x40cm - Color Gris	M2	200,00	$ 118.200,75	$ 23.640.150,38	103,41	

INSTALACIONES ELECTRICAS							
6,1	REDES ELECTRICAS						
6,1,1	Luminaria led mecano 37 W	UN	130,00	$ 2.507.912,03	$ 326.028.563,91		
6,1,2	Poste metalico troncoconico 6 mts de altura brazo sencillo Ø 4"	UN	130,00	$ 1.995.000,00	$ 259.350.000,00	0,00	
6,1,3	Suminstro e instalacion de cajas SB 274	UN	4,00	$ 1.023.125,56	$ 4.092.502,26	0,00	
6,1,4	Red de distribucion BT (2x12+12T) Cu Awg. Ducto de 3/4.	Mts	981,00	$ 30.477,44	$ 29.898.372,18	0,00	
6,1,5	Tablero bifasico para control de luminación, incluye accesorios	UN	4,00	$ 1.567.412,03	$ 6.269.648,12	0,00	
6,1,6	Malla polo a Tierra Principal	UN	4,00	$ 865.172,18	$ 3.460.688,72	0,00	
6,1,7	Ducto PVC 2xØ2" con enterramiento SB 209	Mts	2.013,00	$ 161.174,44	$ 324.444.139,85	663,00	
6,1,8	Caja AP280	UN	106,00	$ 415.300,00	$ 44.021.800,00	0,00	
6,1,9	Acometida 2x4+4T AL serie 8000	Mts	1.360,00	$ 52.365,41	$ 71.216.962,41	0,00	
6,1,10	Alimentador 2x12+12T Cu solo cable	Mts	978,00	$ 51.510,53	$ 50.377.294,74	0,00	
6,1,11	Empalmes de resina	UN	70,00	$ 76.415,79	$ 5.349.105,26	0,00	
6,1,12	Marquillado de cajas	UN	110,00	$ 35.268,42	$ 3.879.526,32	0,00	
6,1,14	Armario para equipo de medida Directa Norma AE850 - incluye equipo de medida, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación a la intemperie. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa prestadora del servicio pernos metalicos de anclaje para sujecion. Incluye legalizacion ante empresa prestadora de servicio.	Und	4,00	$ 4.510.258,65	$ 18.041.034,59	0,00	
0	Sistema de puesta a tierra para alumbrado	Und	16,00	$ 865.172,18	$ 13.842.754,89	0,00	
0	LEGALIZACION Y CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	Und		$ 41.310.054,14	$ 0,00	0,00	
NO PREVISTOS							

N.P.1	CERCA EN TELA VERDE	M2		$ 29.190,00		365,00	
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	m3 /Km		$ 1.371,43	$ 0,00	163.210,57	
ICCU-13.4	Alistados pisos 1:3 e=0.04	M2		$ 34.339,00		1.337,80	
	Costo Directo				**$ 16.154.523.275,54**	**$ 9.351.068.664**	**$ 775.343.406**

Gráfico 4. PORCENTAJES CONTRATO DE AVANCE REAL vs PROGRAMADO

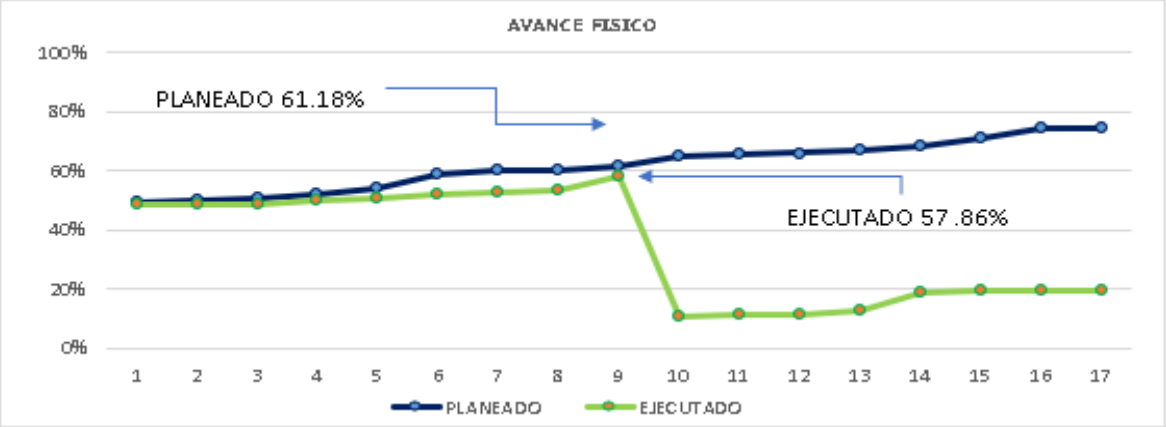

- **VIAS**

Se intervienen los tramos de: CENTRO en la calle 14 entre carreras 10 y 11, la carrera 11 entre calles 14 y13; LA PLAYA en el sector del cda, LA CUNDINAMARCA calle 19 entre Miraflores y calle 24 y ROSA BLANCA tramo de la calle 32 entre carrera 11 y carrera 12,

PARQUE

Este componente se encuentra suspendido se está a la espera de las viabilidades correspondientes de las entidades a cargo para reinicio

Gráfico 5. CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN TERMINOS FINANCIEROS

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN TÉRMINOS FINANCIEROS						
Administración			27,00%	$ 4.361.721.284,40	$	2.524.788.539
Imprevisto			1,00%	$ 161.545.232,76	$	93.510.687
Utilidad			5,00%	$ 807.726.163,78	$	467.553.433
RETIE			0,00%	$ 54.942.370,00	$	-
Acompañamiento Social			0,00%	$ 0,00	$	-
Transporte			0,00%	$ 0,00		
TOTAL OBRA		**AIU**	**33,000%**	**$ 21.496.000.972,00**	$	12.436.921.323
Cantidades Acumuladas				$ 21.496.000.972,00		
Avance Ejecutado Acumulado %				$ 21.496.000.972,00		**57,86%**


6. CONTROL DE CALIDAD

Los procesos realizados se encuentran dentro del alcance del plan de calidad tal como se tiene previsto en el documento.
Se ha hecho el seguimiento al plan de calidad verificando que se tengan los documentos o registros que este contiene, durante el desarrollo o avance del proyecto hasta la fecha, se ha hecho revisión de:

- **VIAS;** En las vías se hace verificación de la calidad a las capas granulares, a los asfaltos aplicados y a los sardineles prefabricados instalados solicitando certificados de calidad y pruebas de laboratorio necesarias para verificar la compactación. (ANEXO)

- En el tramo de la Cundinamarca localizado aledaño al acceso de la universidad, entre la abscisa K0+160 hasta la abscisa K0+200, la interventoría ha verificado que la estructura determinada en los estudios previos NO cumple con los espesores de las capas granulares, de esto se le ha notificado al contratista CONSORCIO GIRARDOT 2024, para que proceda con el retiro del material allí dispuesto cumpla con los niveles de la sub rasante estipulada en los estudios para luego instalar las capas granulares de diseño previo visto bueno de la interventoría.

- A la fecha se solicitó al contratista de obras CONSORCIO GIRARDOT 2024, elabore propuesta acorde a las condiciones del terreno y teniendo en cuenta los diseños de los documentos contractuales para ser evaluada por el consultor.

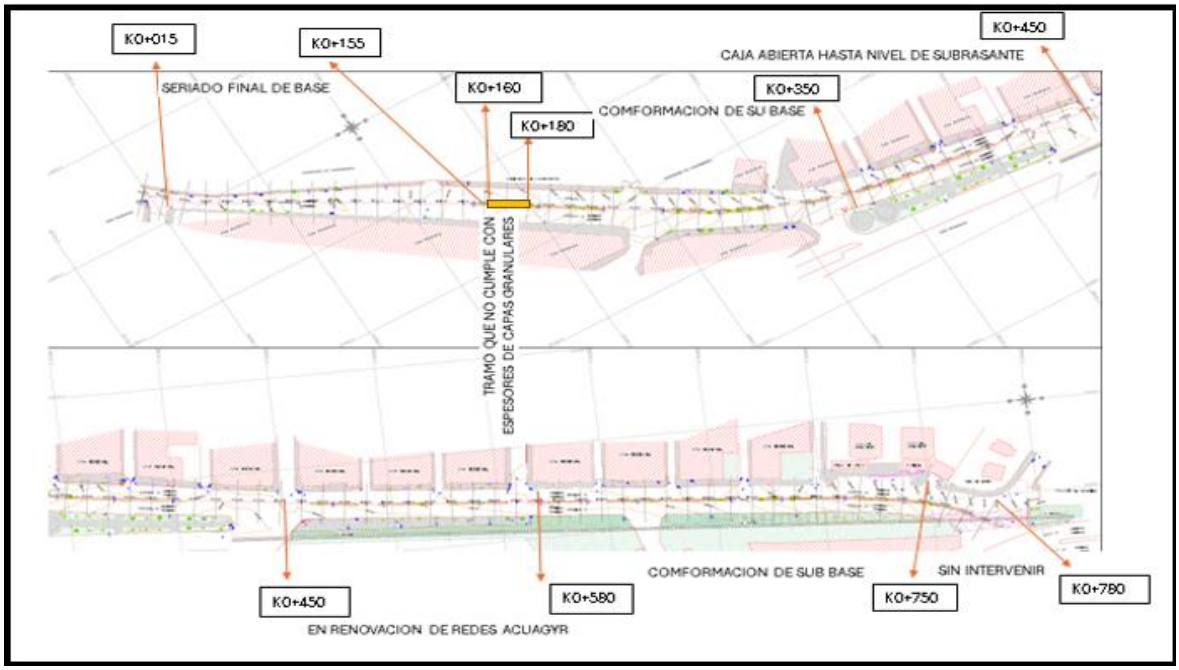


TOMA DE MUESTRAS	
	
VERIFICACION DE COMPACTACION EN BASES GRANULARES	VERIFICACION DE COMPACTACION EN BASES GRANULARES
TOMA DE MUESTRAS	
 	  
VERIFICACION DE RESISTENCIA DE CONCRETOS FABRICADO EN OBRA	VERIFICACION DE RESISTENCIA DE CONCRETOS FABRICADOS EN OBRA

PARQUE LINEAL; Se hace verificación de calidad a todos los materiales utilizados hasta la fecha de la suspensión.

6.3. VALLA

Se ha solicitado al contratista en diferentes ocasiones, se instalen las VALLAS informativas en las obras que se adelantan, a la fecha se ha instalado de manera provisional la del parque lineal, la valla que hace referencia a la intervención de las vías NO se instala aun a pesar que el sitio en donde se debe instalar ya se definió por parte de la interventoría y la supervisión del municipio.

VALLA DEL PARQUE	
	
VALLA INSTALADA PROVISIONALMENTE	A LA FECHA YA NO EXISTE LA VALLA

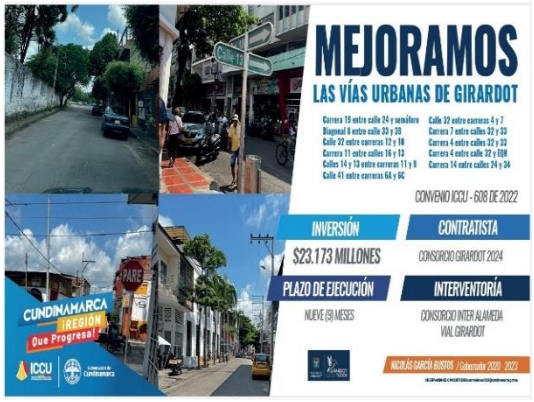VALLA DE LAS VIAS	
	
VALLA INSTALADA PROVISIONALMENTE	LUGAR EN DONDE SE DEBE INSTALAR LA VALLA

En comité de seguimiento se requiere al contratista para que instale en forma segura la valla del parque lineal realizando la estructura de soporte de manera técnica para evitar inconvenientes con el personal que circula cerca de ella.
Se determina el sitio en donde se ubicará la valla informativa del componente de las vías y se solicita al contratista instalarla en debida forma

14.2 COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Cumpliendo con las obligaciones de control Se realizan 00 comités de seguimiento, la razón por la que NO se realizaron, fue que se cito el representante legal del CONSORCIO GIRARDOT 2024, en reiteradas ocasiones y no asistió.

14.3 BITACORA

Se consigna y registra en los libros de obra las actividades relevantes y los sucesos diarios del desarrollo de las obras.

15 SG-SST

Teniendo en cuenta que la Seguridad y Salud en el trabajo es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores, CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL a través de su equipo SST, mantiene supervisión constante y diaria a el contratista de obras verificando que se cumpla en todas las actividades en ejecución los requerimientos normativos en Seguridad y Salud en el trabajo, tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones que a su vez deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

La Seguridad industrial es un tema de alta importancia en el área de la construcción ya que se enfoca en la protección integral del trabajador en los procesos de seguridad con los cuales se pretende motivar al trabajador sobre valorar su vida y protegerse a sí mismos, evitando de esta manera accidentes relacionados principalmente por descuidos o cuando el trabajador está ejecutando su labor.
Teniendo en cuenta la importancia de prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los cuales están expuestos los trabajadores, **el SG-SST** es una herramienta simple que permite desarrollar de manera organizada, las fases de **PLANEAR, HACER, VERIFICAR y ACTUAR** (ciclo **PHVA**), de la seguridad y salud en el trabajo.

Tabla7. Beneficios trabajadores, empleador

BENEFICIOS PARA EL TRABAJADOR	BENEFICIOS PARA EL EMPLEADOR
Refuerza el sentido de pertenencia a la empresa	Mejora las relaciones empresario trabajador.
Brinda satisfacción por el trabajo realizado.	Aumenta la productividad en la empresa.
Motiva a hacer una tarea con calidad.	Incrementa la calidad de los productos y servicios.
Mejora el ambienta de trabajo.	Disminuye gastos médicos y de seguros.
Favorece el compañerismo.	Disminuye el ausentismo.
Favorece la armonía de las relaciones familiares.	Proyecta una buena imagen ante la sociedad.
Mantiene una adecuada salud física y mental.	Participa en el desarrollo del país.
Favorece la prolongación de la vida productiva.	Cumple con legislación.

1. ASPECTOS BASICOS LEGALES

- Se solicito al CONSORCIO GIRARDOT 2024 la respectiva planilla de pago a seguridad social del mes de abril, evidenciando el respectivo pago por días

de salud, pensión y ARL (ANEXO)

- Accidentes de trabajo**,** en el presente mes NO se presentaron (**00**) accidentes.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El CONSORCIO GIRARDOT 2024 cuenta con una profesional SG-SST, que supervisa las actividades de obra, en este mes se laboró en los tramos de vías de ROSA BLANCA, CUNDINAMARCA, LA PLAYA Y CENTRO.
Las actividades desarrolladas tienen por objeto mejorar las condiciones de trabajo, protección de la salud de los trabajadores y evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales; mediante la planificación, aplicación y evaluación de dichas acciones de mejora destinadas a controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo las actividades desarrolladas (ANEXO).

3. ELEMENTOS DE EMERGENCIA

En el seguimiento realizado al CONSORCIO GIRARDOT 2024, se evidencio la instalación de los elementos de respuesta ante una emergencia en los tramos viales donde se encuentran realizando actividades, ni en el parque lineal.

<table>
<tr><th colspan="2">ELEMENTOS DE EMERGENCIAS</th></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>DISPOSICION DE ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS EN LA OBRA</td><td>DISPOSICION DE ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS EN LA OBRA</td></tr>
</table>

4. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El CONSORCIO GIRARDOT 2024, realizo entrega parcial de dotación y EPP al personal, acorde a la actividad de seguimiento que se ejecuta. En el monitoreo realizado, se corroboro mediante revisión en campo el uso parcial de las protecciones y cumplimiento de EPP.

5. MAQUINARIA Y EQUIPO

Mediante verificación documental, se revisó el mantenimiento de la maquinaria previa a su ingreso, lo que se evidencia en este aspecto es que el contratista realiza MANTENIMIENTO, preventivo deficiente, ocasionando fallos en la maquinaria amarilla dejándola poco operativa en campo y prácticamente haciendo este mantenimiento en campo, situación que ha llevado a un bajo rendimiento en obra.

6. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

En este caso realizaron el respectivo cerramiento con, cinta de peligro, soportado en parales de madera, con el fin de aislar los riesgos generados en las áreas de intervención. Se recuerda al contratista CONSORCIO GIRARDOT 2024, que estos cerramientos son de carácter permanente y se debe hacer la reparación y sostenimiento del buen estado las 24 horas, por parte del contratista que es el responsable UNICO, de la seguridad dentro del área de trabajo y las zonas externas de influencia

Cada uno de los tramos intervenidos por la **CONSORCIO DE GIRARDOT 2024** cuenta con cerramiento y señalización con cinta de peligro, señales preventivas e informativas que se mueven de forma dinámica según lo requiera la labor ejecutada día a día por los trabajadores. Se realizan inspecciones preoperacionales a la misma de forma semanal.

SEÑALIZACION Y DEMARCACION/ CENTRO	
	
CARRERA 14 CALLE 10	CARRERA 14 CALLE 10

SEÑALIZACION Y DEMARCACION	
	
CARRERA 19 CALLE	CARRERA 19 CALLE

SEÑALIZACION Y DEMARCACION	
	
CARRERA 19 CALLE	CARRERA 19 CALLE

CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT

901.732.581-7

SEÑALIZACION Y DEMARCACION	
	
CRUCE CALLE 24 CARRERA 19	CARRERA 19

SEÑALIZACION Y DEMARCACION	
	
CALLE 11 CARRERA 14	CALLE 19

SEÑALIZACION Y DEMARCACION	
	
DEMARCACION DE DOBLE VIA CALLE 19	DEMARCACION DE DOBLE VIA CALLE 19

7. **ORDEN Y ASEO:** Promover la generación de conductas que garanticen en los lugares de trabajo en condiciones óptimas de orden y aseo, mediante la implementación de la metodología de las 5S, con el fin de contribuir al bienestar de los trabajadores y contribuyendo una buena organización en los tramos intervenidos.
   Aunque es una política en los sistemas de gestión el contratista CONSORCIO GIRARDOT 2024, debe reforzar las medidas implementadas para la aplicación de las capas granulares, ya que en todos los tramos ha afectado el sistema sanitario municipal, llevando a reprocesos que retrasan la programación de las obras y por lo tanto la entrega dentro del plazo contractual

TRAMO DE VIAS	
 	 
NO SE HACE ACOPIO DE RCD A TIEMPO	Se SIGUE AFECTANDO LA RED SANITARIA

8. **Charlas inicio de jornada:** Son realizadas al trabajador al iniciar labores, y tiene una durabilidad aproximadamente entre 5 y 10 minutos a continuación, se relacionan los temas de las charlas.

9. **PAUSAS ACTIVAS:** Se realiza las pausas activas con la finalidad crear conciencia a los trabajadores de CONSORCIO GIRRADOT 2024, y tener conciencia sobre la importancia de adquirir y promover hábitos saludables dentro y fuera de la jornada laboral, buscando así la prevención de enfermedades profesionales y la promoción del bienestar, aumentando la satisfacción laboral de los trabajadores

10. **Riesgos naturales:** Sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos que se pueden presentar en el trabajo con y se puedan ver afectados por los episodios naturales, darles a conocer las normas básicas de evacuación ante una emergencia, cuáles son los elementos básicos que se requiere.

11. OBSERVACIONES

Se realizo recorrido en general a todos los tramos donde actualmente se vienen adelantando las actividades de ejecución del proyecto para verificar el cumplimiento de las normas establecidas en Seguridad y Salud en el Trabajo encaminadas a reducir el riesgo laboral, como también el de la señalización de los diferentes frentes de trabajo.

Durante este mes se recalca intensificar las medidas de SST las cuales se han informado y solicitado.

1. Implementar y ejecutar la divulgación de la Inducción al SGSTT y Políticas.
2. Verificar la implementación de los elementos y medidas en el plan de emergencia.
3. Garantizar el buen estado y la permanencia de los cerramientos y señalización a los diferentes tramos.
4. Continuar con las medidas de seguridad en los diferentes frentes de obra, asegurando la entrega y uso adecuado de EPI para el desarrollo de las actividades.
5. Se hace énfasis en cuanto al diligenciamiento y envió de la documentación e información que se solicite, con su respectiva evidencia y registro fotográfico.
6. Se debe continuar de manera permanente por parte del profesional de SST, con las actividades del sistema de gestión y el seguimiento a los planes de mejoramiento, con el fin de fortalecer la implementación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

12. RECOMENDACIONES

La Interventoría solicita a la supervisión por parte de la profesional de SST de obra, la verificación y el monitoreo permanente del plan anual de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de asegurar el cumplimiento a las actividades

de acuerdo con las fechas establecidas, y así mismo evitar la materialización de riesgos y no conformidades y/o observaciones por parte de los entes de control.

Seguir fortaleciendo los mecanismos de seguimiento, con el fin de valorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los controles del SG-SST, el nivel de ejecución de los planes, programas, y resultados de la gestión, con el propósito de detectar la identificación de riesgos y establecer acciones de mejora.

Ingresar más personal en el mantenimiento y manejo de los PMT, ya que se presenta deficiencia en la señalización y en los cerramientos de los tramos de vías aperturados, esta falta de sostenibilidad y mantenimiento en los elementos usados para los cerramientos y señalización pueden presentar riesgos en los transeúntes o en el tráfico vehicular aledaño a las zonas de los trabajos.

6.3. COMPONENTE SOCIAL

El Consorcio Girardot 2024, inicia la ejecución de las actividades constructivas en los espacios de Girardot Cundinamarca para el desarrollo del Proyecto y desde el área social se trabaja mancomunadamente con la interventoría y el municipio de manera progresiva en la práctica y realización de actividades como el acercamiento con la comunidad directamente beneficiaria del contrato de obra pública de rehabilitación de algunos segmentos viales, y la renovación arquitectónica, paisajística y cultural de la alameda férrea lineal el sol, para una movilidad inteligente en el municipio de Girardot Cundinamarca en ejecución, esto con el fin de mantener relaciones entre la población de la zona de influencia directa y contratistas, para garantizar el cumplimiento de las metas trazadas a la fecha.
La Interventoría, en procura porque el desarrollo del proyecto sea optimizado en todos sus componentes, hizo presencia y seguimiento en el componente social

6.3.1. PROGRAMA ATENCION A LA COMUNIDAD

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL PLAN DE GESTION SOCIAL.

Objetivo: Crear un sistema de información y recepción de solicitudes e inquietudes de la comunidad y autoridades, que garantice la atención oportuna y eficiente a los requerimientos de la población del área de influencia del proyecto.

6.3.2. ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD

Para el mes de JULIO del año 2024, comprendiendo el SEGUNDO mes del tiempo adicional de 04 meses generamos como interventoría informe mensual para este proyecto contrato de obra pública, desde el área social, la profesional ubico la oficina principal en la calle 16, en las instalaciones del municipio reconocido como el ITUC, con el propósito de hacer la recepción de las PQRS, presentadas por la comunidad de forma libre y acertada recepcionadas en la Oficina principal.

Tabla *12*. Seguimiento y monitoreo

SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
INDICADOR		**EVALUACION**	**REGISTRO**
# Manifestaciones resueltas _____ # Manifestaciones presentadas	0/0*100= 100%	Mensual	Driver código QR
Derechos de petición pendiente a la respuesta			

6.4. PROGRAMA DE INFORMACION Y DIVULGACION.

Objetivo: Desarrollar acciones de información dirigidas a las comunidades con las que se busca que estas conozcan de manera clara, veraz y oportuna el inicio y finalización de las obras, las condiciones técnicas, ambientales y sociales del desarrollo del proyecto, se emitieron comunicados sobre las socializaciones y volantes con la información de atención de PQRS con el código QR y línea de atención.

PROGRAMA DE INFORMACION Y DIVULGACION	
	
INFORMACION A COMUNIDADES PUNTO DE ATENCION EN EL ITUC	INFORMACION TECNICA A COMUNIDADES

Se realiza acercamiento con habitantes de diferentes tramos (Cundinamarca, rosa blanca, centro y sector la playa) donde se socializa y se explica técnicamente cual será la alineación de las vías demarcadas por los sardineles y/o bordillos los cuales estarán ubicados entre la vía y los andenes de circulación, también se recomienda el cuidado de la imprimación, se aclaran dudas y otras inquietudes.
Durante el periodo que comprende el mes de julio del 01 al 31, se realizó la circulación de información que va direccionada al cierre total que se presentan en el tramo de ejecución por rehabilitación vial Santa Isabel, esta información se suministró como primera medida al Comité de Participación Comunitaria (veeduría), por llamadas telefónicas y puerta a puerta, para que así mismo llegue la información a los demás tramos.

6.5. PROGRAMA DE PARTICIPACION COMUNITARIA.

Generar estrategias de apropiación de la obra a través de procesos de educación y concientización de la población aledaña al área de influencia directa, lograr actitudes que conduzcan a la sostenibilidad con acompañamiento del comité de participación comunitaria.

REUNIÓN CON VEEDURIA

se llevó a cabo dos (05) encuentros con la comunidad, tratando de mitigar los problemas que se presentan en obra por inconformidades y atrasos de obra, los temas fueron tratados junto a entidades públicas.

REUNIONES CON VEEDURIAS	
	
RECORRIDO CON EL ALCALDE	CON SRIO DESARROLLO Y AMBTE

REUNIÓN CON LAS COMUNIDADES

REUNIONES CON VEEDURIAS	
	
COMERCIANTES CENTRO	DESPACHO INFRAEST.

6.6. PROGRAMA DE GESTION Y RESTITUCION PREDIAL

Objetivo: Establecer la condición de la infraestructura de predios y servicios públicos que se encuentran en el área de influencia directa del proyecto con el propósito de evitar conflictos con las comunidades, se hace seguimiento de la condición final de los predios y andenes para así poder cerrar en buena forma y elaborar actas de vecindad de cierre.


No se hizo levantamiento nuevas actas de vecindad, sin embargo, se registra como pendiente verificar actas ejecutadas con anterioridad y realizar actas de cierres en tramos ya intervenidos.

INTERFERENCIAS PRESENTADAS

Se da solución a los requerimientos e inquietudes que se presentan en el momento de ejecución de cada tramo vial intervenido se atiende de modo oportuno y eficaz las interferencias ocasionadas en el desarrollo de las actividades propias de la ejecución de las obras, se explica a la comunidad como se gestiona la subsanación de las interferencias con cada uno de los entes involucrados y poder dar una respuesta inmediata.

La interventoría procede con sus profesionales junto con el equipo técnico del contratista y los profesionales TS del municipio, a verificar y dar trámite a las observaciones.

INTERFERENCIAS PRESENTADAS	
	
ROTURA DE TUBERIA QUE PRODUCE EMPOZAMIENTO	MEDIDAS DE MITIGACION DE LA FUGA DE AGUA

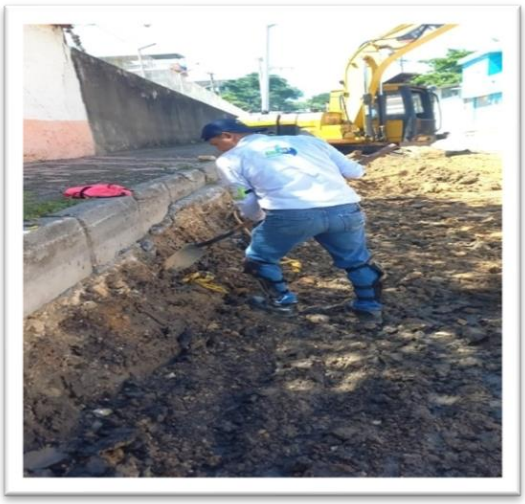
INTERFERENCIAS PRESENTADAS	
	
ROTURA TUBO DE AGUA POTABLE 3”	MEDIDAS DE MITIGACION DE LA FUGA DE AGUA

6.7. PROGRAMA DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA

Objetivo: Definir el procedimiento a seguir con el contratista, para la contratación de mano de obra no calificada, con el fin de hacer partícipe y beneficiar a las comunidades del área de influencia del proyecto.

Según información reportada por el área de seguridad y salud en el trabajo **(SST);** se realizó la contratación de veinte (17) personas que ingresaron como personal de obra no calificada, de la zona de influencia directa, Cinco (03) personas de mano de obra calificada (Verificación: informe de SST).

El personal de MONC, que se contrató para las labores constructivas por parte del CONSORCIO GIRARDOT 2024, a continuación, se presenta la gráfica mostrando el porcentaje del personal contratado.

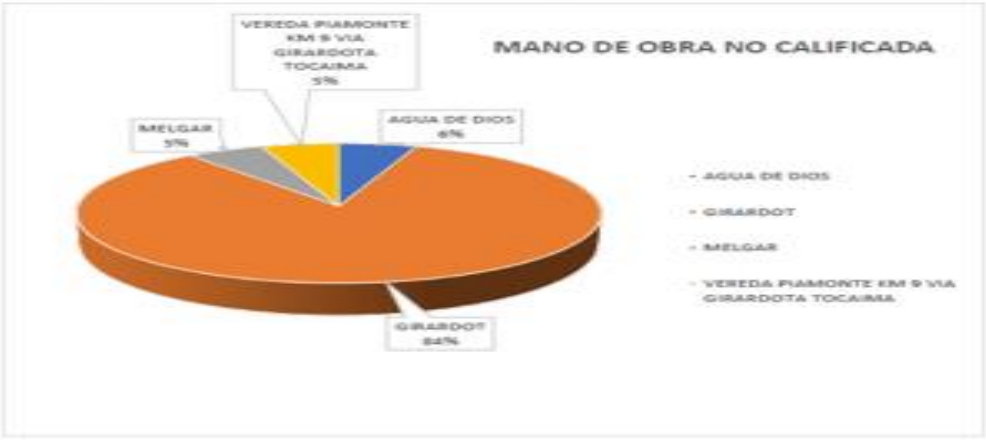

6.8. CONCLUSIONES

En el presente periodo, se logró realizar las reuniones con veedurías de cada tramo vial intervenido, se llevó a cabo la programación y levantamiento de actas de vecindad en el tramo vial de san Jorge. Asimismo, se logró dar solución oportuna a inquietudes de la comunidad de tipo verbal en el tramo de la Cundinamarca calle 19.

Los canales de comunicación con la comunidad (teléfono, correo electrónico y punto de atención al usuario) son herramientas fundamentales para la mantener informados a los miembros de la comunidad y así no generar situaciones que puedan frenar las actividades de obra.



DIVULGACION E INFORMACION	
	
COLOCACION DE LA INFORMACION DEL CONTRATO	COLOCACION DE LA INFORMACION DEL CONTRATO

16. INFORME AMBIENTAL

Durante la ejecución de las actividades constructivas que se desarrollan en el proyecto, se debe planificar y ejecutar estrategias para minimizar, prevenir, corregir y compensar los impactos ambientales generados. Para esto, es necesario realizar seguimiento y control continuo a cada uno de los Programas del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA; así mismo, y como es deber del consorcio Girardot 2024 se debe realizar el cumplimiento parcial o definitivo a las observaciones, recomendaciones y requerimientos impuestos por la interventoría o entes de control correspondiente.

OBJETIVOS

- **GENERAL**;

- dar cumplimiento a cada uno de los lineamientos ambientales del durante la ejecución del contrato No 734-2023. Rehabilitación de algunos segmentos viales, y la renovación arquitectónica, paisajística y cultural de la alameda férrea lineal el sol, para una movilidad inteligente en el municipio de Girardot - Cundinamarca. En cada uno de los programas y proyectos mencionados en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de JUNIO del año 2024.

- **ESPECIFICOS**;

- Diseñar y ejecutar el Plan de Manejo Ambiental PMA del proyecto.
- Realizar estrategias ambientales de seguimiento y monitoreo en cada uno de los tramos intervenidos del proyecto.
- subsanar las solicitudes emitidas por parte de la interventoría
- realizar el informe mensual ambiental y formatos ambientales requeridos en las fechas planteadas por los entes de control que lo solicite.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Para lograr el cumplimiento de los requerimientos ambientales dispuestos en el PAGA, y el PMA se debe establecer la normatividad base vigente y aplicable para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos generados por el desarrollo de la obra y actividades constructivas que se ejecuten,
Esta interventoría realiza el acompañamiento con nuestro profesional ambiental para supervisar las actividades ambientales que ejerce el contratista de las obras, así se verifica en terreno la aplicabilidad del P.A.G.A. y la sostenibilidad de los P.M.A.

17. GESTIÓN PAGA

Descripción de las actividades constructivas realizadas, en el marco del programa de adaptación de la guía ambiental.

Tabla 6. Actividades técnicas contempladas dentro del proyecto

ACTIVIDADES	ESPECIFICACIONES	SEGMENTOS VIALES Y PARQUE LIEAL ALAMEDA
demarcación vias a intervenir	Encerramientos con lona poliéster verde, en algunos tramos con cinta peligro por petición de la comunidad de influencia directa	Tramo AV Cundinamarca dos frentes, rosa blanca, Kennedy, la playa y 2 sector de La carbonera, Parque lineal alameda sector locomotora
Rotura del pavimento rigido y flexible	Se realiza la rotura por frente mediante retroexcavadora. Cada frente cuenta con u número mínimo de 2 volquetas doble troques con volumen de 14 ton para ser dispuesta en el relleno sanitario	Tramo AV Cundinamarca dos frentes, rosa blanca, Kennedy, la playa y 2 sector de La carbonera Parque lineal alameda sector locomotora
Excavación en conglomerado	La excavación tiene una profundidad de o,75 m por los frentes	Tramo AV Cundinamarca dos frentes, rosa blanca, Kennedy, la playa y 2 sector de La carbonera.
La obra se le entrega a ese punto a los señores de las empresas AAA para que instalen las redes sanitarias de alcantarillado y agua potable	Estas empresas a su vez son las encargadas de realizar las actividades constructivas para las instalaciones de la red de tuberías sanitarias.	No todos los segmentos viales se le instalaran redes sanitarias, los tramos que no se le van intervenir sanitariamente son la AV Cundinamarca y el sector del CDA
Se le recibe instalada las redes sanitarias por parte de la empresa AAA y se pasa a rellenar y compactar por material granular	El material granular a rellenar es SBG-1 con una altura de 0,35 m	Tramo rosa blanca Tramo alicante sector la carbonera
Relleno y compactado de sub base granular	El material granular a rellenar es de SBG-2 a una H de 0,25 m	Todos los segmentos viales
Aplicación de estructura asfáltica	Mezcla densa en caliente de 0,15 m	Todos los segmentos viales

Para cada uno de los componentes ambientales se realizaron estrategias para minimizar los impactos ambientales provenientes de las intervenciones en los frentes de obra promoviendo el seguimiento y monitoreo dando cumplimiento moderado a lo establecido en los programas PAGA y las fichas del PMA.

Tabla 25. Programas establecidos dentro del P.A.G.A.

2	Capacitación del personal en obra	- Establecer el programa de capacitación y entrenamiento enfocado en temas ambientales al personal de obra acorde a las necesidades del proyecto, con el fin de brindar las herramientas para reducir, mitigar, controlar los impactos que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
3	Cumplimientos de Requerimiento	- Establecer transmitir las autorización, licencias y concesiones para uso e intervención de los recursos naturales que lleguen a requerirse por el proyecto.
4	Manejo de residuos sólidos, líquidos	- Establecer el procedimiento para el manejo adecuado de los residuos sólidos generados en las diferentes etapas y frentes constructivas que permitan controlar y/o minimizar los impactos ambientales que surjan de la ejecución del objeto del contrato
5	Manejo integral de materiales de construcción	- Definir acciones para la obtención y manejo de los materiales dispuestos en obra. -
6	Señalización frentes de obras y sitios temporales	- Suministrar y ubicar la señalización necesaria en los frentes de trabajo para prevenir los impactos que se puedan derivar de su ausencia
7	Manejo y transporte de escombros y demolición RCD	- Establecer medidas de manejo para minimizar los impactos ocasionados por el manejo y transporte de escombros y demolición - Prevenir y minimizar la propagación de material particulado.
8	Programa de manejo de material de construcción maquinaria y equipos	- Establecer el procedimiento para el manejo adecuado de acopios de materiales de construcción, que permitan controlar y/o minimizar los impactos ambientales que se generen a causa de la emisión de material particulado, el aporte de sedimentos, la obstrucción de vías peatonales y vehiculares y la generación de enfermedades respiratorias en el personal de la obra, cumpliendo con la normatividad ambiental legal vigente - Evitar la incidencia de accidentes e incidentes laborales

Fuente: consorcio Girardot 2024

17.1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL

Conformación del grupo de gestión ambiental

Actualmente, el CONSORCIO GIRARDOT 2024 cuenta con un profesional de tiempo completo en el área ambiental realiza visitas periódicas con el fin que se garantice el cumplimiento de las obligaciones ambientales contempladas en los pliegos de condiciones del contrato, normas ambientales vigentes, requerimientos del PAGA y los permisos otorgados por la autoridad ambiental competente.

Programa de capacitación del personal en obra

El contratista NO realizó capacitaciones en el periodo

17.2. Programas de requerimientos

Permisos de aprovechamiento forestal

El CONSORCIO GIRARDOT 2024 en virtud de ejecutor del contrato N.º 734 emite oficios de solicitud por los otorgamientos legales que dispone el proyecto y con la finalidad de dar cumplimientos a los lineamientos y requisitos ambientales, ante el ente de control que otorga las debidas resoluciones de permisos de tala, la secretaria De Desarrollo Rural Y Ambiente (DATMA) la cual contempla y sugiere las correspondientes medidas de compensación y manejo forestal.
Para el presente periodo NO, se hacen solicitudes por que en los tramos intervenidos no hay individuos arbóreos que afecten su debida EJECUCION o ya se había realizado la tala en solicitudes anteriores.

Tabla 7. Actividades solicitudes para aprovechamiento de especies arbóreas

SOLICITUDES PRESENTADAS	FECHA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

Medidas compensatorias por tramo

Tabla 8. Medidas compensatorias por tramos

TRAMO	TALAS	COMPENSACION	PERMISO DATMA
parque lineal alameda tramo locomotora	25	209	aprobado
av. Universidad de cundinamarca	22	175	aprobado
cr 11 tramo centro	34	259	aprobado
parque el fografo - la playa	145	1274	sin repuesta
parque jorge eliecer gaitan (pizzas)	37	308	sin repuesta
Parque lineal sector andenes	9	75	sin repuesta
TOTAL	**272**	**2.300**	

Fuente: consorcio Girardot 2024

Aunque se dictaron algunas aprobaciones de permisos para aprovechamiento forestal y con ello la respectiva medida de compensación ambiental, no se ha definido ni el lugar en el cual se van a ubicar todas las especies a compensar.
El municipio como entidad encargada de estas aprobaciones determinó realizar la tala de los individuos arbóreos y la respectiva poda de los individuos arbóreos que sean necesarios para mejorar la movilidad del proyecto del parque lineal, quedando el contratista de obras CONSORCIO GIRARDOT 2024 encargado de realizar la extracción, retiro y disposición de la raíz.

Permisos Escombrera municipal

En el año 2023 se dispone los RCD del contrato N.º 734, en la escombrera SAN THOMAS, en el municipio de melgar a 41.9 kmts, generando mayores recorridos en el transporte para la disposición final de los RCD, para este año 2024 se ubica en el municipio de Girardot un lote de terreno con permisos de la CAR, para realizar rellenos con un PMA, en donde se pueden disponer para este fin RCD, ubicada en la vereda presidente predio los barrancos a un promedio de 10,5 kmts, una vez entregada la

documentación y revisada esta interventoría aprueba y avala la disposición final de los RCD en este sitio

Manejo de residuos sólidos y líquidos.

Para el manejo de los residuos líquidos de origen residual domestico es necesario un gestor certificado que realice la recolección, transporte y disposición final.
El consorcio Girardot 2024 con el fin de dar cumplimiento con los programas del PAGA efectúa acercamiento con la empresa gestora PLANETA S.A.S E.S.P

Salvamento de calidad por contenedor de raíces.

Salvamento de calidad por contenedor de raíces Se emitieron directrices en las cuales se estipula que se desiste de cualquier medida de contención para las raíces en las nuevas construcciones ejecutadas por el consorcio Girardot 2024. Frente a esta posición se diligencio un oficio el día 11 de dic, en el cual nos salvaguardamos de responsabilidades frente a daños futuros causados por extensión y crecimiento de raíces de las especies arbóreas que tengan incidencia en los tramos viales y de parques intervenidos durante el desarrollo de este proyecto

18. GESTIÓN PLAN DE CALIDAD

18.1. Información de entrada

Se encuentra actualizada la información referente, documentos contractuales, plan de emergencias ajustado al proyecto.

18.2. Identificación y trazabilidad

Se cuenta con una programación y controlada por los ingenieros directores y residentes; sus anotaciones y/o modificaciones se harán en la Bitácora de obra diariamente.
El corte de obra se realizará de acuerdo con lo contractual reflejará el avance del proyecto, y su aprobación se realizará en conjunto con los ingenieros directores y residentes, finalmente en el informe mensual se aprecian el estado del avance que lo evidenciaran.

18.3. Informe

Durante el desarrollo del proyecto se realiza el informe mensual que evidencian la gestión realizada en las áreas Técnica, se mantiene registro de estas actividades en medio magnético y físico en las oficinas de la interventoría.

18.4. Gestión de recursos de la Interventoría

Para el desarrollo del proyecto la interventoría dispone de 1 computador dispuesto con software que consta del paquete de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), AutoCAD versión 2014 y Project, así como 1 impresora y equipo menor de oficina y papelería. Para la parte operativa se cuenta con herramientas menores varias.

Gráfico 5. Implementos de oficina utilizados por interventoría

LISTADO DE EQUIPOS						
DESCRIPCION	**MARCA**	**MODELO**	**CAPACIDAD**	**UND**	**CANT**	**DEDICA.**
IMPRESORA	EPSON	L210	N/A	UND	1	100%
COMPUTADOR PORTATIL	DELL	2018	8 GB	UND	1	100%
COMPUTADOR ESCRITORIO	LENOVO	2014	12 GB	UND	1	100%

18.5. Control de procesos y equipos

La bitácora de obra se lleva a diario y se firma en conjunto con el residente de obra.

18.6. Calificación del cumplimiento de los Sistemas de Gestión

La Interventoría verificó el cumplimiento de la aplicación del (SG-SST) por parte del contratista de obra diariamente en campo, además realizó los respectivos requerimientos con el fin de que el contratista cumpliera con la aplicación del (SG-SST)
Para un mejor control del cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista con respecto a; cumplimiento y aplicabilidad de los programas de SG-SST, P.A.G.A, P.M.T, Y CONTROL DE CALIDAD esta interventoría realiza vigilancia a los compromisos contractuales del contratista de obras verificando los siguientes aspectos:

Seguimiento a obligaciones contractuales del contratista- Contrato de Obra No. 743-2023

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple medianamente y arrojara una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

Tabla 9. Cumplimiento deberes del contratista de obra.

Instructivo: Califique como "1" las características que cumplen , "0" las características que no cumplen y "N/A" las características que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple medianamente y arrojara una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

Página 1 de 5

	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		
	A) COMPONENTE CALIDAD	63%	
	B) COMPONENTE AMBIENTAL	48%	
	C) COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	14%	
TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST		42%	

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

EL CONTRATAISTA CONSORCIO GIRADOT 2024, DEBE IMPLEMENTAR EN SU PLANTA DE PERSONAL LOS PROFESIONALES IDONEOS, QUE COADYUBEN A GESTIONAR LOS SITEMAS DE GESTION EN DEBIDA FORMA, TIENE GRANDES FALENCIAS EN LA OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA AMARILLA POR OMISIONES EN EL DEBIDO MANTENIMIENTO REDUNDANDO EN ATRASOS CONSIDERABLES A LA PROGRAMACION DE LA OBRAS, GENERANDO MALESTAR EN LAS COMUNIDADES QUE SE VEN AFECTADAS POR EL ATRASO EN LA INTERVENCION Y TERMINACION DE ESTOS TRAMOS VIALES

Firmas:

- Atención a los requerimientos presentados por el contratista en aspectos técnicos y administrativos, calidad y suministro de materiales.

- Verificación de la vigencia de las pólizas contractuales (Adicional en Plazo), de tal manera que la entidad contratante permanezca protegida ante los eventos previstos en el contrato.

- Organización y planeación de las labores de la interventoría.

- Control de obra diario, por frente de obra y a nivel de actividades, insumos y maquinaria.

- Control de la calidad de la obra con base en las especificaciones de construcción.

- Supervisar, sugerir y solicitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista.
- Manejo y archivo de todos los documentos legales y técnicos del contrato. Instauración en conjunto con el constructor de la veeduría ciudadana.

- Elaboración de los Informes de interventoría donde se refleja el avance de los trabajos en obra.

- Vigilancia del cumplimiento por parte del contratista de obra, de las disposiciones legales de carácter laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de cumplimiento obligatorio.

- Elaboración y suscripción de las Actas de Inicio, Visitas, Parciales y de Reunión, actas de acuerdo entre otras.

- Control del avance de los trabajos de acuerdo con el programa y evaluación periódica.

- Crear las alertas necesarias y a tiempo cuando se presenten posibles incumplimientos o atrasos considerables que puedan afectar el logro físico de las metas contractuales objeto del contrato

- Ordenar las pruebas necesarias durante el transcurso de la obra con el fin de controlar la calidad de los insumos y materiales utilizados en la construcción de las actividades contractuales.

Para el seguimiento técnico se enmarcan las siguientes actuaciones:

- El seguimiento de la obra se hace a diario con la presencia del ingeniero residente de obra, Inspector de Obra controlando los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato y la optimización de los procedimientos constructivos a todos los ítems del contrato.

- Solicitud al contratista para que cumplan con lo establecido en pliegos y en el contrato en lo concerniente a Programa de trabajo.

- Registro diario en el libro de obra de todos los aspectos relevantes de la obra, tales como: actividades realizadas, equipo, personal, insumos (Bitácora).

- Revisión y control de los diseños y planos del proyecto, para ejecutar la obra de acuerdo a ellos.

- Verificación del equipo mínimo y su estado de funcionamiento. Los equipos suministrados por el contratista cuentan con los certificados de garantía de fábrica en la calidad, cantidad y oportunidad del uso de los mismos para instalación y puesta en marcha de los sistemas que le dan funcionalidad al proyecto de obra.

- Control actividades complementarias: En el reporte diario de obra, se registra la ejecución de cada una de las actividades constructivas que complementan los ítems contractuales, así como el suministro oportuno de los materiales que realiza el contratista para evitar que en época de invierno los trabajos sean interrumpidos.

- Medición de Ítems ejecutados.

- Verificación de la ejecución de los trabajos y actividades que se realizan conforme a los términos de referencia, a la propuesta técnico — económica, metodología y especificaciones pactadas en el contrato de obra.

- Control de calidad: La interventoría lleva a cabo con el personal técnico el registro de control de calidad de ejecución de actividades en obra mediante elaboración de ensayos de compresión de muestras de concreto teniendo en cuenta lo estipulado en la norma.

20. CONCLUSIONES

A. Las Obras se ejecutan dentro de los parámetros técnicos requeridos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del Contrato, se realiza suspensión de actividades en el componente del parque lineal y en los tramos viales por medio de acta con fecha abril 29 del 2024, quedando el componente del parque suspendido hasta la fecha en el **32.74%.**

Una vez subsanadas las causas de la suspensión, se adiciona el contrato en 04 meses de tiempo solo para el componente de los tramos viales, dejando el componente del parque lineal suspendido con fecha de abril 29 del 2024.

Se da reinicio solo para el componente de los tramos viales con acta de fecha de reinicio mayo 29 del 2024, se solicita y aprueba nueva programación para el componente de las vías con fecha de terminación septiembre 30 del 2024.

En el primer mes después del reinicio y la adición de tiempo de 04 meses en este periodo de **JUNIO** se tiene un avance real de ejecución del contrato del del **50.03%.** Para el segundo periodo después del reinicio mes de **JULIO** se llega a un avance de obra real de todo el contrato de **57.86%** equivalente a **$ 12.436.921.323.61,** con un avance real de ejecución en el mes del **7.83%**

B. El componente del parque lineal sigue suspendido para este mes igual se mantiene el porcentaje ejecutado hasta la fecha de suspensión, en el avance global, se suma el avance de obra de la REHABILITACIÓN DE TODOS LOS SEGMENTOS VIALES se llega a un avance de obra global real del **57.86%,** comparado con lo proyectado para este mes según programación presentada que fue del **61.18%** con un atraso de ejecución en el mes del **3.32%.**

C. Durante el segundo mes de ejecución de obra del tiempo adicionado se han intervenido 6 de los 7 tramos de vía de los cuales son; 1) Tramo vial alicante ya casi terminado falta reparación de andenes y demarcación 2) Tramo centro 3) Tramo rosa blanca 4) tramo la playa 5) Tramo Cundinamarca 6) Tramo Kennedy ya casi terminado falta limpieza de sumideros y cárcamos y demarcación.

D. Estos tramos de vías intervenidos han presentado atraso en la ejecución respecto a la programación, por diferentes causas como; 1) Intervención de acuagyr 2) Falta de maquinaria en cada uno de los frentes 3) Falta de más personal en cada frente.

Para este segundo mes de acuerdo con el avance de obra y flujo de caja presentados para el tiempo adicional de 04 meses se tienen los siguientes porcentajes en la REHABILITACIÓN DE TODOS LOS SEGMENTOS VIALES, para el periodo se proyecta una ejecución **del 78.85%**, se llega a un avance de obra real del **73.93%,** con un avance real de ejecución en el mes del **4.92%.**

ABRIL 29 DEL 2024	ABRIL 29 DEL 2024	HASTA JUNIO 30 DEL 2024	HASTA JULIO 31 DEL 2024
SUSPENSION	$ 7.693.164.455,08	$ 803.695.036,24	$ 2.759.005.763,09
	58,04%	6,06%	20,81%
	$ 13.254.935.312,00	$ 13.254.935.312,00	$ 13.254.935.312,00
	3,96%	3,34%	4,92%
	ATRASO	ATRASO	ATRASO
PROGRAMADO	62,00%	64,10%	78,85%
EJECUTADO	58,04%	60,76%	73,93%

E. Se ha solicitado al contratista de obra CONSORCIO GIRARDOT 2024, en reiteradas ocasiones cumpla con las obligaciones del contrato de incorporar para el avance de las obras 15 frentes de trabajo, que se proyectaron en los pliegos de condiciones para los 7 tramos viales como unidades, en el proceso de la intervención constructiva se han sub dividido estos tramos originando áreas de menor alcance o sub tramos, la interventoría ha requerido al contratista tener frentes operativos en cada uno de estos sub tramos lo cual a

la fecha no se ha cumplido, esta es una de las causas del poco rendimiento hasta la fecha

F. En el componente del parque lineal la administración municipal continua con la subsanación de las observaciones del ministerio de cultura para cumplir con la expedición de la viabilidad, por esta razón se deja las obras suspendidas con acta de fecha 29 de abril del 2024.

G. En las cantidades ejecutadas por el contratista de obra en este periodo se refleja atrasos, debido a la falta de personal y maquinaria en cada uno de los 04 tramos de vía, dejando una alarma en el respectivo avance y cumplimiento del cronograma de obra, se evidencia un **-4.92%** de atraso acumulado.
Para subsanar este atraso la interventoría, ha solicitado se incorpore maquinaria operativa y en buen funcionamiento debido a que en múltiples ocasiones los equipos que se encuentran en campo NO tienen la adecuada operatividad sobre todo la maquinaria amarilla, ingresar más operarios y disponer más personal en campo para que se logre impulsar y aumentar el rendimiento para lograr en el tiempo esperado.

H. Todas y cada una de las actividades consignadas en el presente informe se encuentran revisadas y avaladas por esta firma interventora y las cuales se verán reflejadas en los documentos anexos en la carpeta del contratista como lo son memorias de cálculo de cantidades, informe de ejecución semanas del periodo descrito y mensual.

I. El contratista de obras CONSORCIO GIRARDOT 2024, expone ante la interventoría los motivos que ha tenido para no cumplir con los tiempos programados para ejecutar las obras, en oficio sustentado solicita suspensión del plazo contractual para que se estudie por parte de la interventoría y del municipio la ampliación del tiempo contractual.
Una vez subsanadas las causas de la suspensión la interventoría junto con el municipio decide realizar el ACTA DE REINICIO N° 001 del 29 de mayo del 2024.

Sin otro particular,



ING. OSCAR FABIAN GONZALEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTER ALAMEDA VIAL GIRARDOT

ANEXOS

- ***ANEXO SOCIAL***
- ***ANEXO SG-SST***
- ***ANEXO CALIDAD***
- ***ANEXO AMBIENTAL***
- ***ANEXO ADMINISTRATIVO***
