	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. Convenio 3596 de 2023; Convenio 3991 de 2023; Convenio 488 de 2023; Convenio 4727 de 2023; Convenio 3413 de 2023

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN AGUSTIN; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUNIN; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CRISTALINA DE ESTRECHO OBANDO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION PUERTO QUINCHANA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA FATIMA

Contrato de Interventoría No. 2762 DE 2023

Interventoría: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

Objeto Contrato de Obra:
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME MENSUAL No. 5

MES O PERIODO: DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCION**		
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre:WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ **de fecha** _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Convenio 3596 de 2023 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**.

Convenio 3991 de 2023 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**.

Convenio 4818 cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Convenio 4727 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Convenio 3413 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

.

CONTRATISTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PROGRESO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ANDES
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CRISTALINA DEL LOZADA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

INFORME MES DE MAYO 2024

1 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
2.1 LOCALIZACIÓN 6
3. INFORMACIÓN CONVENIOS 7
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS 7
3.1.1 ASOJUNTAS 7
3.1.2 JUNIN 8
3.1.3 ESTRECHO OBANDO 8
3.1.4 PUERTO QUINCHANA 9
3.1.5 VILLA FATIMA 9
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 10
4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 17
4.1 AVANCE DE OBRA 17
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 17
5.2.1 INFORME DE DIRECTOR, RESIDENTE Y INSPECTOR DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 11) 18
5.2.2 INFORME AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO VER (ANEXO 12) 18
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18
6.2 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 18
6.2.1 ANEXO 11: REGISTRO FOTOGRÁFICO 18
6.2.2 ANEXO 12: APROBACION DE HOJAS DE VIDA, PROROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4576 DE 2023. 18
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18
8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INTERVENTORIA, CONTRATISTA DE OBRA Y INVIAS. 19

1. INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mediante oficio con radicado 2023S-VHUI-030866 entrega orden de inicio a partir del 22 de diciembre de 2023 al CONSORCIO R&C cuyo representante legal es CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO, para la ejecución de la OFERTA No.4762 DE 2023 el cual fue firmado el día 30 de noviembre de 2023, y cuenta con un plazo de ejecución inicial de tres (3) meses.

La vía objeto de las obras son muy necesarios para el Municipio de San Agustín - Isnos – del Departamento del Huila, ya que son corredores rurales productivos de vital importancia. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS – ha puesto su interés en las intervenciones necesarias con la finalidad de apoyar el desarrollo rural, garantizando la calidad y estabilidad de las obras diseñadas, aumentar la capacidad y nivel de servicio y brindarles comodidad y seguridad a los usuarios.

El objeto de dicho OFERTA No. 47626 DE 2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN E ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

El Consorcio R&C en calidad de Interventor, de los convenios: - Convenio 3596 de 2023 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"** - Convenio 3991 de 2023 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"** - Convenio 4818 cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" -** Convenio 4727 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL**

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - Convenio 3413 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, los cuales ejecutaran las juntas de acción comunal de las mencionadas veredas y que tiene como supervisor del proyecto al ingeniero WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR del Instituta Nacional de Vías – INVIAS, dando así a conocer el presente informe No 07 correspondiente al periodo del 1 de Julio de 2024 al 31 de Julio de 2024, en el cual relacionamos el desarrollo y avance de las actividades programadas, a efecto de constatar el cumplimiento por parte de la juntas de Acción Comunal.


2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrollará en los municipios de San Agustín e Isnos del Departamento del Huila, con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios en el programa "*Caminos Comunitarios de la Paz Total*"

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

San Agustín es un municipio colombiano ubicado en el sur del departamento de Huila. Hace parte de la región del Sur del Alto Magdalena, donde se encuentra el más alto valle del río Magdalena, resguardado por las primeras estribaciones de las cordilleras central y oriental. Yace sobre la parte oriental del macizo colombiano. Su extensión territorial es de 1.574 km², su altura es de 1.730 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 18 °C.

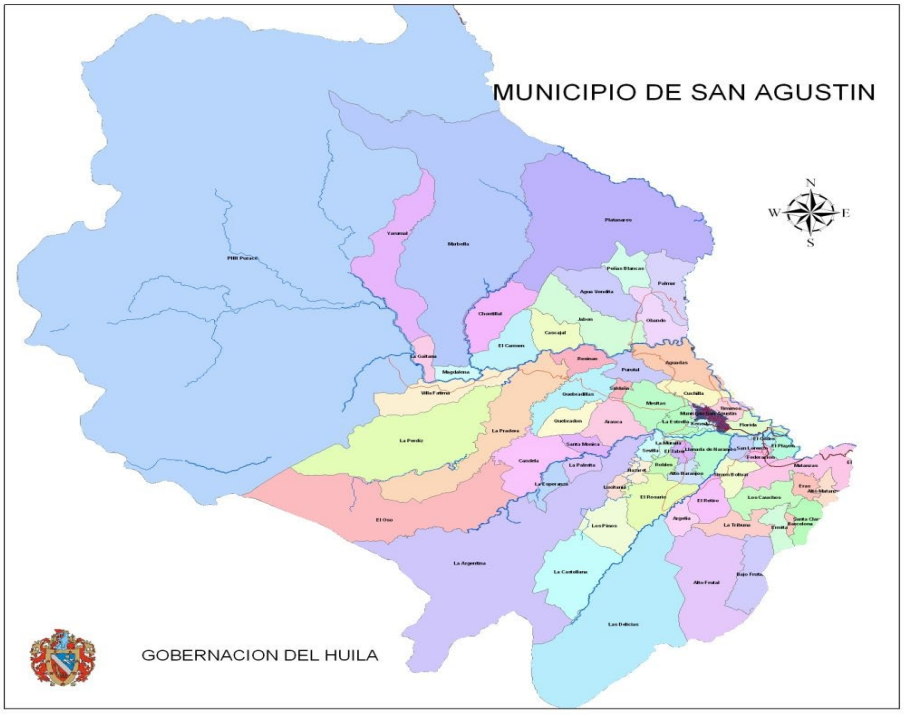

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ISNOS

Isnos es un municipio colombiano ubicado en el suroccidente del departamento de Huila. Yace sobre la faja intertropical del mundo, en la cadena montañosa de la cordillera central, en el Sur del Alto Magdalena y sobre el Macizo Colombiano, considerado como la estrella fluvial más importante de Colombia que alberga gran parte de las riquezas en diversidad biológica y ecológica. Su extensión territorial es de 697 km², su altura es de 1.700 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 18 °C.



3. INFORMACIÓN CONVENIOS
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 ASOJUNTAS

Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN AGUSTIN
Representante legal:	YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO
Nit.	900.773.779-1
Convenio No.	3596 de 2023

Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor convenio:	$ 188.564.775
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 188.564.775
Plazo:	Hasta el 30 de julio de 2024
Fecha de inicio:	05 de diciembre de 2023

3.1.2 JUNIN

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA JUNIN
Representante legal:	VICTOR LOPEZ ORTIZ
Nit.	800.247.404-5
Convenio No.	3991 de 2023
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor convenio:	**$**189.449.501
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	**$**189.449.501
Plazo:	Hasta el 30 de julio de 2024
Fecha de inicio:	27 de diciembre de 2023

3.1.3 ESTRECHO OBANDO

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE ESTRECHO OBANDO
Representante legal:	JOSE DEMETRIO ANACONA BOLAÑO
Nit.	813.003.979-8
Convenio No.	4818 de 2023

Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor convenio:	$ 189.544.876
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.544.876
Plazo:	Hasta el 30 de julio de 2024
Fecha de inicio:	28 de diciembre de 2023

3.1.4 PUERTO QUINCHANA

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL INSPECCION PUERTO QUINCHANA
Representante legal:	HENRY MARTINEZ MARTINEZ
Nit.	891.103.553-7
Convenio No.	4727 de 2023
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor convenio:	$ 189.085.518
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.085.518
Plazo:	Hasta el 30 de julio de 2024
Fecha de inicio:	27 de diciembre de 2023

3.1.5 VILLA FATIMA

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA FATIMA
Representante legal:	OLMAN ANCIZAR SANCHEZ
Nit.	813.003.285-5
Convenio No.	3413 de 2023

Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor convenio:	$ 200.803.236
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.269.182
Plazo:	Hasta el 30 de julio de 2024
Fecha de inicio:	5 de diciembre de 2023

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades realizadas durante el presente periodo por la interventoría consistieron en comités presencial y virtual, visita a las veredas de Villa Fátima, Puerto Quinchana, Asojuntas del municipio de san Agustín y Bajo Junín del Municipio de Isnos.

ASOJUNTAS:

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 18 desde el 6 al 12 de mayo del 2024:

- Aprobación de la compra de materiales pétreos y de ferretería según las cantidades calculadas por la residencia de obra, presentación contratos profesionales de Residente de Obra y contador con sus respectivas firmas y revisión de parámetros de ejecución del convenio solidario 3596 de 2023 de acuerdo a la normativa vigente para construcción de placa huella y concretos rígidos.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 19 desde el 13 al 19 de mayo del 2024:

- Solicitud de transferencia para Diseños, topografía, laboratorio de suelos y pólizas de seguros Y asociación de cuentas bancarias.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 20 desde el 20 al 26 de mayo del 2024:

- Junta de acción Comunal presento Balance de Obra a la fecha.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 21 desde el 27de mayo al 02 de junio del 2024:

- Entrega de estudios y Diseños de Placa-Huella

VEREDA BAJO JUNIN

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 18 desde el 6 al 12 de mayo del 2024:

- Aprobación de la compra de materiales pétreos y de ferretería según las cantidades calculadas por la residencia de obra y Revisión de parámetros de ejecución del convenio solidario 3991 de 2023 de acuerdo a la normativa vigente para construcción de placa huella y concretos rígidos.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 19 desde el 13 al 19 de mayo del 2024:

- Presentación contratos profesionales de Residente de Obra y contador con sus respectivas firmas, Solicitud de transferencia para topografía, laboratorio de suelos y pólizas de seguros; Asociación de cuentas de proveedores para compras, dotaciones y demás.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 20 desde el 20 al 26 de mayo del 2024:

- Junta de acción Comunal presento Balance de Obra a la fecha.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 21 desde el 27de mayo al 02 de junio del 2024:

- Solicitud de transferencia para dotación, exámenes médicos, materiales pétreos, ferretería y transporte.

VILLA FÁTIMA:

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 18 desde el 6 al 12 de mayo del 2024:

- Aprobación de la compra de materiales pétreos y de ferretería según las cantidades calculadas por la residencia de obra y revisión de parámetros de ejecución del

convenio solidario 3413 de 2023 de acuerdo a la normativa vigente para construcción de placa huella y concretos rígidos.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 19 desde el 13 al 19 de mayo del 2024:

- Presentación contratos profesionales de Residente de Obra y contador con sus respectivas firmas, Solicitud de transferencia para topografía, laboratorio de suelos y pólizas de seguros; Asociación de cuentas de proveedores para compras, dotaciones y demás.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 20 desde el 20 al 26 de mayo del 2024:

- Junta de acción Comunal presento Balance de Obra a la fecha.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 21 desde el 27de mayo al 02 de junio del 2024:

- Entrega de estudios y Diseños de Placa-Huella.

PUERTO QUINCHANA

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 18 desde el 6 al 12 de mayo del 2024:

- Aprobación de la compra de materiales pétreos y de ferretería según las cantidades calculadas por la residencia de obra y revisión de parámetros de ejecución del convenio solidario 4727 de 2023 de acuerdo a la normativa vigente para construcción de placa huella y concretos rígidos.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 19 desde el 13 al 19 de mayo del 2024:

- Presentación contratos profesionales de Residente de Obra y contador con sus respectivas firmas, Solicitud de transferencia para topografía, laboratorio de suelos y pólizas de seguros; Asociación de cuentas de proveedores para compras, dotaciones y demás.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 20 desde el 20 al 26 de mayo del 2024:


- Junta de acción Comunal presento Balance de Obra a la fecha.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 21 desde el 27de mayo al 02 de junio del 2024:

- Entrega de estudios y Diseños de placa Huella.

Registro fotográfico:

ASOJUNTA
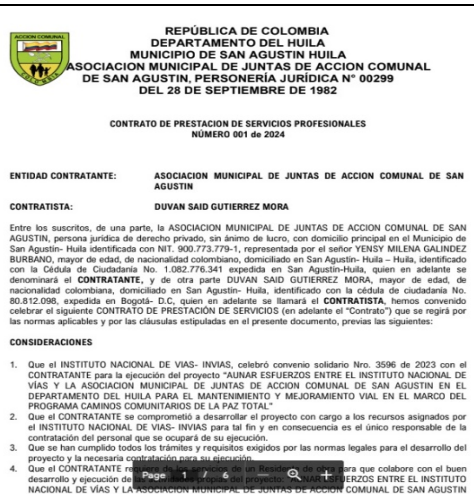
<table>
<tr>
<td>
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA
ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DE SAN AGUSTIN, PERSONERÍA JURÍDICA N° 00299
DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1982

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
NÚMERO 001 de 2024

ENTIDAD CONTRATANTE: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
CONTRATISTA: DUVAN SAID GUTIERREZ MORA

Entre los suscritos, de una parte, la ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de San Agustin- Huila identificada con NIT. 900.773.779-1, representada por el señor YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO, mayor de edad, de nacionalidad colombiano, domiciliado en San Agustin- Huila – Huila, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.082.776.341 expedida en San Agustin-Huila, quien en adelante se denominará el CONTRATANTE, y de otra parte DUVAN SAID GUTIERREZ MORA, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en San Agustin- Huila, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.812.098, expedida en Bogotá- D.C, quien en adelante se llamará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el siguiente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (en adelante el "Contrato") que se regirá por las normas aplicables y por las cláusulas estipuladas en el presente documento, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES



1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, celebró convenio solidario Nro. 3596 de 2023 con el CONTRATANTE para la ejecución del proyecto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
2. Que el CONTRATANTE se comprometió a desarrollar el proyecto con cargo a los recursos asignados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS para tal fin y en consecuencia es el único responsable de la contratación del personal que se ocupará de su ejecución.
3. Que se han cumplido todos los trámites y requisitos exigidos por las normas legales para el desarrollo del proyecto y la necesaria contratación para su ejecución.
4. Que el CONTRATANTE requiere [illegible] para que colabore con el buen desarrollo y ejecución de [illegible] ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN</td>
<td>
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN AGUSTÍN
MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN- HUILA
PERSONERÍA JURÍDICA N° 00299
DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1982

San Agustín- Huila; 16 de mayo de 2024


Señores:
BANCO AV VILLAS
Pitalito- Huila

Referencia: Solicitud de Transferencias (Pagos a proveedores y/o prestadores de servicios)

En el marco dell convenio solidario No. 3413 de 2023, celebrado entre la ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN, identificada con NIT. 900.773.779-1 y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, solicitamos repetuosamente realizar las transferencias que se mencionan a continuación, las cuales suman en total el valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MLC ($3.817.127)
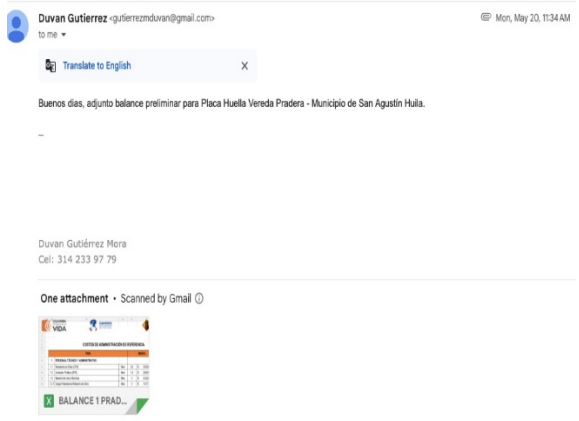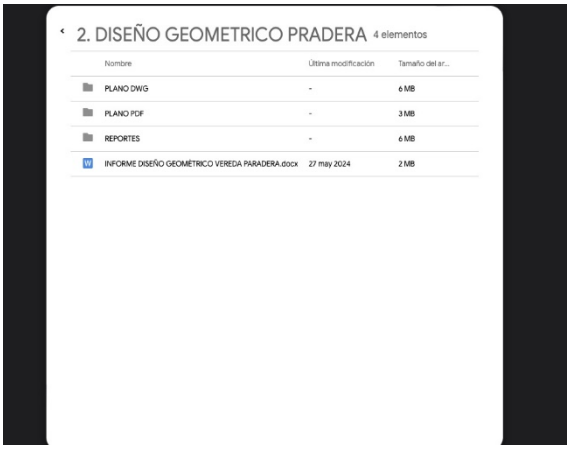
<table>
<tr><th>N° DE TRANS</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>NOMBRE TITUTLAR</th><th>NIT/ C.C</th><th>VALOR FACTURA</th><th>RETENCIÓN EN LA FUENTE</th><th>VALOR TRANS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Levantamiento Topográfico Georreferenciado, Diseño geométrico, Planos Diseño Estructural, Localización y Replanteo de la obra</td><td>D&D INGENIERÍA CIVIL Y TOPOGRÁFICA SAS</td><td>901.296.729</td><td>1,300,000</td><td>52,000</td><td>1,248,000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Laboratorios para placa huella en la vereda Predera del municipio de san Agustin Huila.</td><td>FERNANDO AUGUSTO ROJAS CHAUX</td><td>83.043.664</td><td>790,000</td><td>31,600</td><td>758,400</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reintegro dinero pagado por concepto de pólizas de inicio y reinicio.</td><td>ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN</td><td>900.773.779</td><td>1,810,727</td><td>-</td><td>1,810,727</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,817,127</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>Contratación</td>
<td>Transferencias</td>
</tr>
<tr>
<td>
Duvan Gutierrez <gutierrezmduvan@gmail.com> Mon, May 20, 11:34 AM
to me
Translate to English
Buenos dias, adjunto balance preliminar para Placa Huella Vereda Pradera - Municipio de San Agustin Huila.
Duvan Gutiérrez Mora
Cel: 314 233 97 79
One attachment • Scanned by Gmail
BALANCE 1 PRAD...</td>
<td>
2. DISEÑO GEOMETRICO PRADERA 4 elementos
Nombre | Última modificación | Tamaño del ar...
PLANO DWG - 6 MB
PLANO PDF - 3 MB
REPORTES - 6 MB
INFORME DISEÑO GEOMETRICO VEREDA PARADERA.docx 27 may 2024 2 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>Balance</td>
<td>Diseño Paca huella</td>
</tr>
</table>

BAJO JUNIN

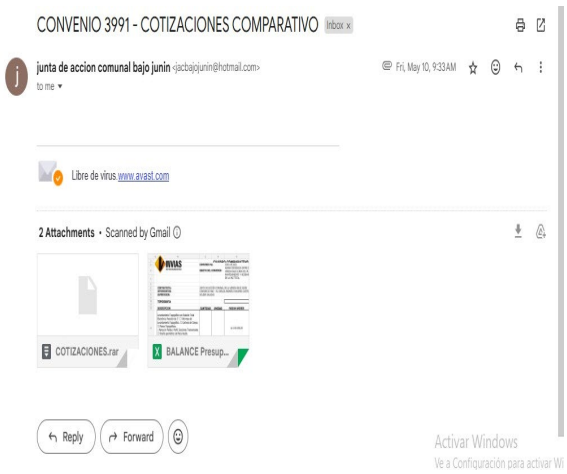


COTIZACIONES PRESENTADA




ENTREGA CUENTAS RADICADAS EN BANCO




ENTREGA CONTRATOS

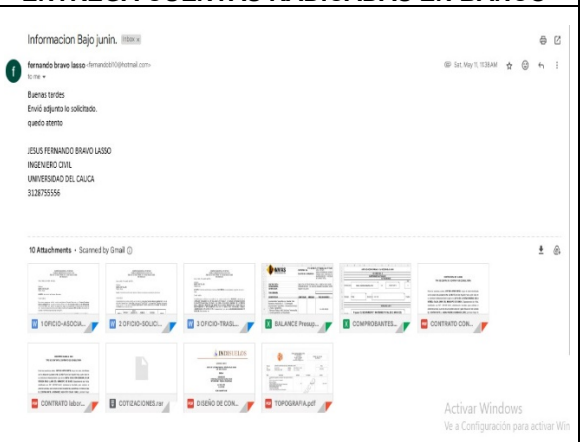

ENTREGA INFORMACION FINAL

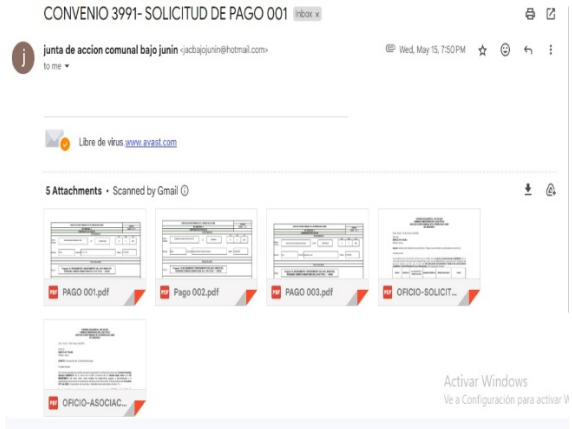


SOLICITUD PAGO

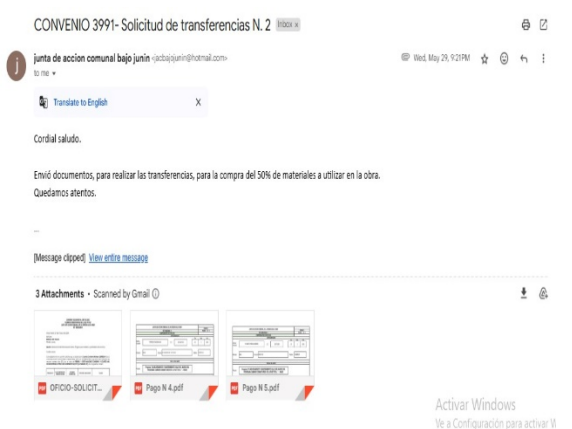

SOLICITUD TRANSFERENCIA

VILLA FATIMA

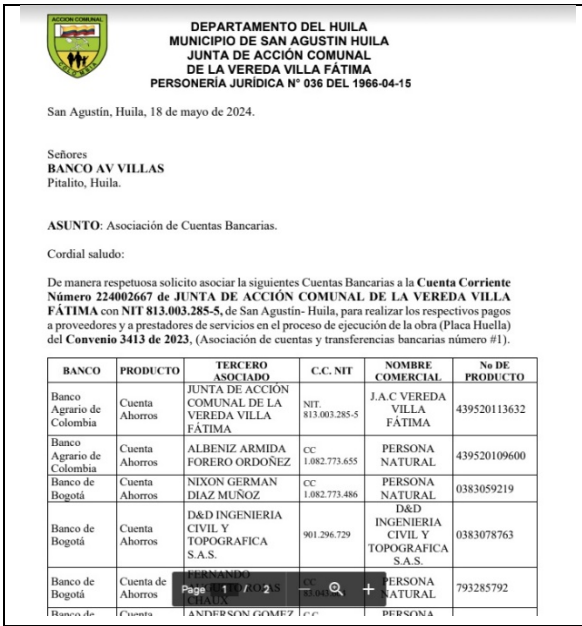

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA
PERSONERÍA JURÍDICA N° 036 DEL 1966-04-15

San Agustín, Huila, 18 de mayo de 2024.

Señores
BANCO AV VILLAS
Pitalito, Huila.

ASUNTO: Asociación de Cuentas Bancarias.


Cordial saludo:

De manera respetuosa solicito asociar la siguientes Cuentas Bancarias a la **Cuenta Corriente Número 224002667 de JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA** con **NIT 813.003.285-5,** de San Agustín- Huila, para realizar los respectivos pagos a proveedores y a prestadores de servicios en el proceso de ejecución de la obra (Placa Huella) del **Convenio 3413 de 2023**, (Asociación de cuentas y transferencias bancarias número #1).

BANCO	PRODUCTO	TERCERO ASOCIADO	C.C. NIT	NOMBRE COMERCIAL	No DE PRODUCTO
Banco Agrario de Colombia	Cuenta Ahorros	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA	NIT. 813.003.285-5	J.A.C VEREDA VILLA FÁTIMA	439520113632
Banco Agrario de Colombia	Cuenta Ahorros	ALBENIZ ARMIDA FORERO ORDOÑEZ	CC 1.082.773.655	PERSONA NATURAL	439520109600
Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	NIXON GERMAN DIAZ MUÑOZ	CC 1.082.773.486	PERSONA NATURAL	0383059219
Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	D&D INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFICA S.A.S.	901.296.729	D&D INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFICA S.A.S.	0383078763
Banco de Bogotá	Cuenta de Ahorros	FERNANDO [illegible]	CC [illegible]	PERSONA NATURAL	793285792
[illegible]	[illegible]	ANDERSON GOMEZ [illegible]	C.C. [illegible]	PERSONA [illegible]	[illegible]

Page 1 / 2

APROBACION COMPRA MATERIALES

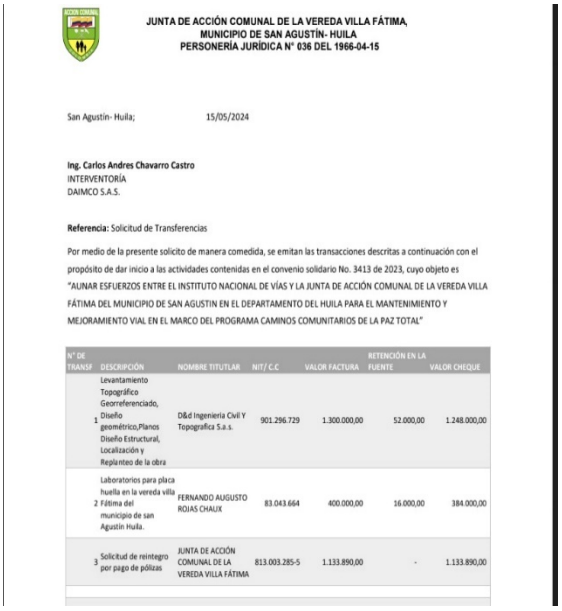

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA,
MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN- HUILA
PERSONERÍA JURÍDICA N° 036 DEL 1966-04-15

San Agustín- Huila; 15/05/2024


Ing. Carlos Andres Chavarro Castro
INTERVENTORÍA
DAIMCO S.A.S.

Referencia: Solicitud de Transferencias

Por medio de la presente solicito de manera comedida, se emitan las transacciones descritas a continuación con el propósito de dar inicio a las actividades contenidas en el convenio solidario No. 3413 de 2023, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

N° DE TRANSF	DESCRIPCIÓN	NOMBRE TITULAR	NIT/ C.C	VALOR FACTURA	RETENCIÓN EN LA FUENTE	VALOR CHEQUE
1	Levantamiento Topográfico Georreferenciado, Diseño geométrico,Planos Diseño Estructural, Localización y Replanteo de la obra	D&d Ingenieria Civil Y Topografica S.a.s.	901.296.729	1.300.000,00	52.000,00	1.248.000,00
2	Laboratorios para placa huella en la vereda villa Fátima del municipio de san Agustin Huila.	FERNANDO AUGUSTO ROJAS CHAUX	83.043.664	400.000,00	16.000,00	384.000,00
3	Solicitud de reintegro por pago de pólizas	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA	813.003.285-5	1.133.890,00	-	1.133.890,00

TRANSFERENCIAS

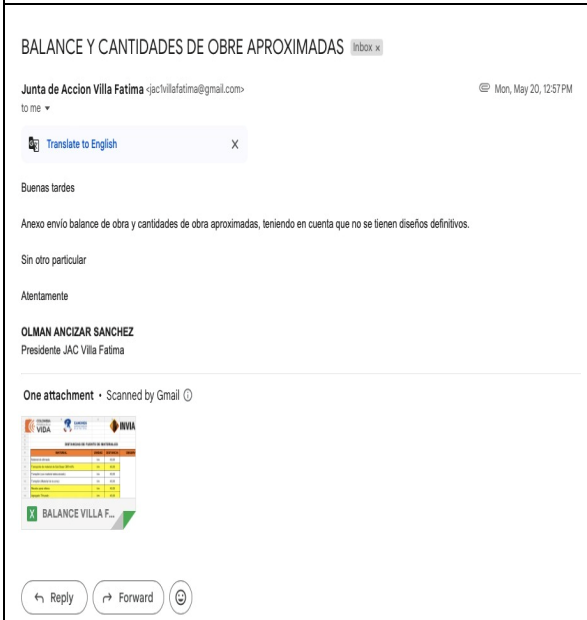

BALANCE Y CANTIDADES DE OBRE APROXIMADAS Inbox x

Junta de Accion Villa Fatima <jacvillafatima@gmail.com> Mon, May 20, 12:57 PM
to me

Translate to English X

Buenas tardes

Anexo envío balance de obra y cantidades de obra aproximadas, teniendo en cuenta que no se tienen diseños definitivos.

Sin otro particular

Atentamente


OLMAN ANCIZAR SANCHEZ
Presidente JAC Villa Fatima

One attachment • Scanned by Gmail

BALANCE VILLA F...

Reply Forward

BALANCE DE OBRA

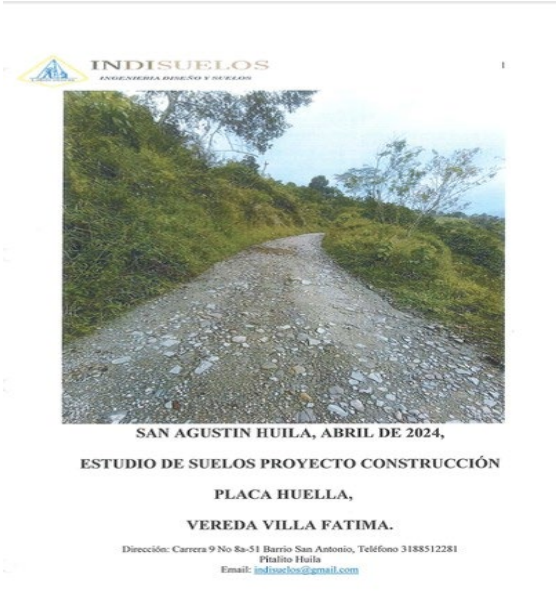

INDISUELOS
INGENIERIA DISEÑO Y SUELOS

SAN AGUSTIN HUILA, ABRIL DE 2024,

ESTUDIO DE SUELOS PROYECTO CONSTRUCCIÓN


PLACA HUELLA,

VEREDA VILLA FATIMA.

Dirección: Carrera 9 No 8a-51 Barrio San Antonio, Teléfono 3188512281
Pitalito Huila
Email: indisuelos@gmail.com

ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PUERTO QUINCHANA
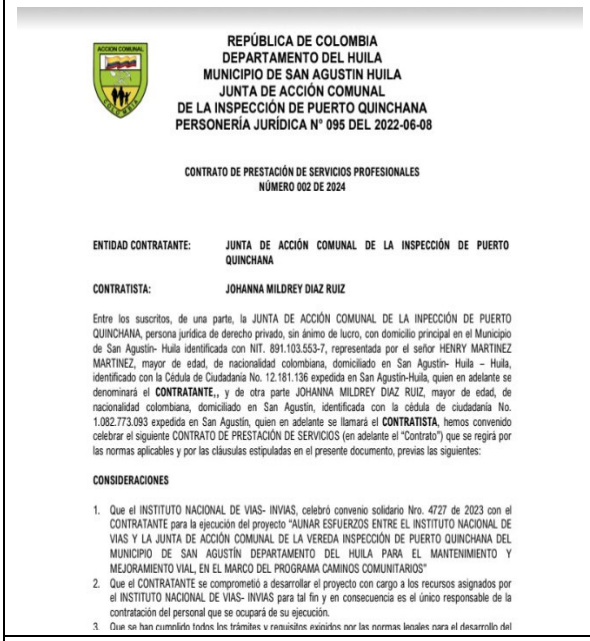
<table>
<tr>
<td>
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA
PERSONERÍA JURÍDICA N° 095 DEL 2022-06-08

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NÚMERO 002 DE 2024

ENTIDAD CONTRATANTE: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA
CONTRATISTA: JOHANNA MILDREY DIAZ RUIZ

Entre los suscritos, de una parte, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de San Agustín- Huila identificada con NIT. 891.103.553-7, representada por el señor HENRY MARTINEZ MARTINEZ, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en San Agustín- Huila – Huila, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 12.181.136 expedida en San Agustín-Huila, quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE.**, y de otra parte JOHANNA MILDREY DIAZ RUIZ, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en San Agustín, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.082.773.093 expedida en San Agustín, quien en adelante se llamará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el siguiente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (en adelante el "Contrato") que se regirá por las normas aplicables y por las cláusulas estipuladas en el presente documento, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, celebró convenio solidario Nro. 4727 de 2023 con el CONTRATANTE para la ejecución del proyecto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS"
2. Que el CONTRATANTE se comprometió a desarrollar el proyecto con cargo a los recursos asignados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS para tal fin y en consecuencia es el único responsable de la contratación del personal que se ocupará de su ejecución.
3. Que se han cumplido todos los trámites y requisitos exigidos por las normas legales para el desarrollo del

APROBACION DE COMPRAS</td>
<td>
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN- HUILA
PERSONERÍA JURÍDICA N° 865 DEL 1966-07-05


San Agustín- Huila; 17 de mayo de 2024


Señores:
BANCO AV VILLAS
Pitalito- Huila

Referencia: Solicitud de Transferencias (Pagos a proveedores y/o prestadores de servicios)

En el marco dell convenio solidario No. 4727de 2023, celebrado entre la LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN , identificada con NIT. 891.103.553-7 y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, solicitamos repetuosamente realizar las transferencias que se mencionan a continuación, las cuales suman en total el valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MLC ($3.856.052)

TRANSF	DESCRIPCIÓN	NOMBRE TITUTLAR	NIT/ C.C	VALOR FACTURA	RETENCIÓN EN LA FUENTE	VALOR TRANSFER
1	Levantamiento Topográfico Georreferenciado Diseño geométrico de la subrasante Localización y Replanteo de la obra.	DYD INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFICA SAS	901.296.729	1.300.000	52.000	1.248.000
2	Laboratorios para placa huella en la inspección de Puerto Quinchana del municipio de san Agustín Huila.	FERNANDO AUGUSTO ROJAS CHAUX	83.043.664	790.000	31.600	758.400
3	Reintegro dinero pagado por concepto de pólizas de inicio, Prorroga y suspensión.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO QUINCHANA	891.103.553	1.849.652		1.849.652
Total						3.856.052

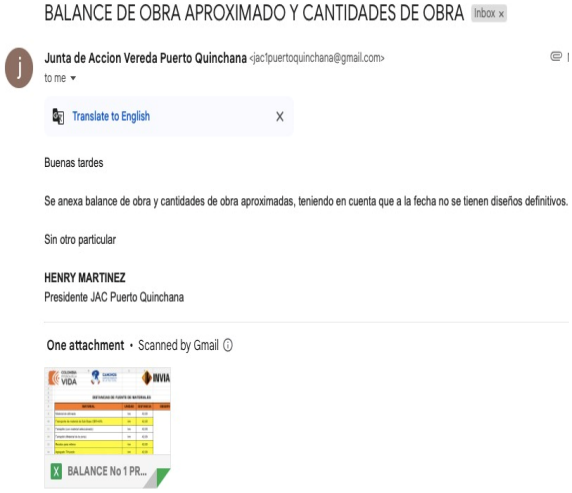TRANSFERENCIAS</td>
</tr>
<tr>
<td>
BALANCE DE OBRA APROXIMADO Y CANTIDADES DE OBRA Inbox ×
Junta de Accion Vereda Puerto Quinchana <jac1puertoquinchana@gmail.com>
to me
Translate to English ×
Buenas tardes
Se anexa balance de obra y cantidades de obra aproximadas, teniendo en cuenta que a la fecha no se tienen diseños definitivos.
Sin otro particular
HENRY MARTINEZ
Presidente JAC Puerto Quinchana
One attachment • Scanned by Gmail
BALANCE No 1 PR...

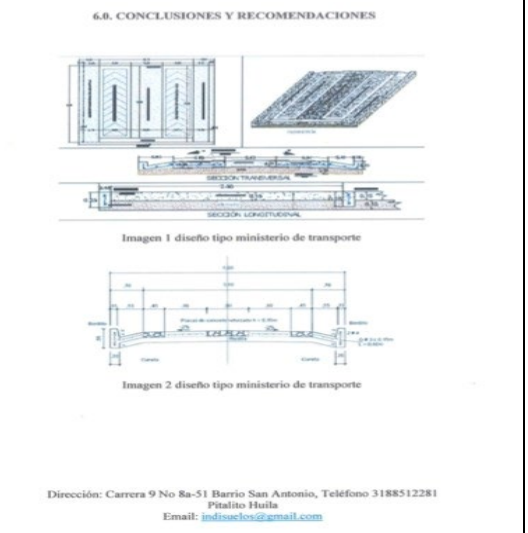BALANCE DE OBRA</td>
<td>
6.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Imagen 1 diseño tipo ministerio de transporte
Imagen 2 diseño tipo ministerio de transporte
Dirección: Carrera 9 No 8a-51 Barrio San Antonio, Teléfono 3188512281
Pitalito Huila
Email: indisuelos@gmail.com

ENTREGA DE DISEÑOS</td>
</tr>
</table>

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 AVANCE DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2024 al 31 de mayo del 2024 las Juntas de acción comunal no han presentado su cronograma de obra hasta que se adelante los procesos de cambio de firma, balance de obra, cotizaciones y demás procesos para iniciar la construcción de las obras.

4.1.1. ANEXO 01: CRONOGRAMA DE OBRA
4.1.2. ANEXO 02 : INFORME SEMANAL (MEPI-MN-IN-15-FR-3)
4.1.3. ANEXO 03: MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-4).
4.1.4. ANEXO 04: PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-6).
4.1.5. ANEXO 05: INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-8).
4.1.6. ANEXO 06: ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (MEPI-MN1-IN-15-FR-10).
4.1.7. ANEXO 07: RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO (MEPI-MN1-IN-15-FR-11).
4.1.8. ANEXO 08: SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-12).
4.1.9. ANEXO 09: OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL
4.1.10. ANEXO 10: ACTA DE REUNIÓN (MEPI-MN-IN-14-FR-2)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTOR	**CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**
Nit	7.703.837
Dirección	Cra. 8 B No. 27- 32
Teléfono	3168747742
Contrato de Interventoría N.º	4762 de 2023
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA

	PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN E ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Valor del contrato:	$ 75.007.262
Valor Adición	$0,00
Valor Acumulado del Contrato	$ 75.007.262
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Prorroga No.1:	Hasta el 30 Abril de 2024
Prorroga No.2:	Hasta el 30 Julio de 2024
Prorroga No.3:	Hasta el 30 Agosto de 2024

5.2. INFORMES ESPECIALISTA Y PROFESIONALES

5.2.1 INFORME DE DIRECTOR, RESIDENTE Y INSPECTOR DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 11)

5.2.2 INFORME AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO VER (ANEXO 12)

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.2 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.2.1 ANEXO 11: REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.2.2 ANEXO 12: APROBACION DE HOJAS DE VIDA, PROROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4576 DE 2023.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Realizar y entregar balance de obra a cada una de las actividades ejecutadas de los convenios.
- Continuar con las inscripciones de cuentas de proveedores frente a bancos para seguir con los procesos de compra de materiales a utilizar para la construcción de las obras a realizar.

- Continuar con la entrega de hojas de vida del personal que se dispondrá a ejecutar labores de ayudante y oficiales en los convenios.
- Coordinar con el contador o personal idóneo las afiliaciones de los trabajadores a (salud, pensión y arl).

8 OTROS ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INTERVENTORIA, CONTRATISTA DE OBRA Y INVIAS.

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORIA				
FECHA DEL OFICIO	**NOMBRE ENTIDAD REMITENTE**	**CONSECUTIVO**	**NOMBRE DEL DESTINATARIO**	**ASUNTO**
9/05/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 050	HENRY MARTINEZ MARTINEZ Presidente Junta de acción comunal de la inspección Puerto Quinchana	Solicitud de contratos de personal requeridos para la obra y ordenes de transferencia de pagos a actividades iniciales y aprobadas en comité operativo.
9/05/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 051	OLMAN ANCIZAR SANCHEZ BUESAQUILLO Presidente Junta de acción comunal vereda villa Fátima	Solicitud de contratos de personal requeridos para la obra y ordenes de transferencia de pagos a actividades iniciales y aprobadas en comité operativo
9/05/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 052	YENSY GALINDEZ BURBANO Presidente Junta Vereda Pradera	Solicitud de contratos de personal requeridos para la obra y ordenes de transferencia de pagos a actividades

				iniciales y aprobadas en comité operativo
9/05/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 053	VICTOR LOPEZ ORTIZ Presidente Junta vereda Bajo Junín	Solicitud de contratos de personal requeridos para la obra y ordenes de transferencia de pagos a actividades iniciales y aprobadas en comité operativo
24/05/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT – 061	VICTOR LOPEZ ORTIZ Presidente Junta vereda Bajo Junín	Llamado para agilizar y avanzar el proceso de órdenes de pago y contrataciones. Recomendación para planeación, realizar un cronograma de acciones y referentes temporales, sobre actividades de gestión.
24/05/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT – 062	HENRY MARTINEZ MARTINEZ Presidente Junta de acción comunal de la inspección Puerto Quinchana	Llamado para agilizar y avanzar el proceso de órdenes de pago y contrataciones. Recomendación para planeación, realizar un cronograma de acciones y referentes temporales, sobre actividades de gestión.
24/05/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT – 063	OLMAN ACIZAR SANCHEZ Presidente Junta Vereda Villa Fátima	Llamado para agilizar y avanzar el proceso de órdenes de pago y contrataciones. Recomendación para planeación, realizar un

				cronograma de acciones y referentes temporales, sobre actividades de gestión.
24/05/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 064	YENSY GALINDEZ BURBANO Presidente Junta Vereda Pradera	Llamado para agilizar y avanzar el proceso de órdenes de pago y contrataciones. Recomendación para planeación, realizar un cronograma de acciones y referentes temporales, sobre actividades de gestión.
27/05/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 066	YENSY GALINDEZ BURBANO Presidente Junta Vereda Pradera	Citación a comité operativo de manera presencial el día 28 de mayo de 2024.
27/05/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 067	OLMAN ANCIZAR SANCHEZ Presidente Junta Vereda Villa Fátima	Citación a comité operativo de manera presencial el día 28 de mayo de 2024.
27/05/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 068	VICTOR LOPEZ ORTIZ Presidente Junta Vereda Bajo Junín	Citación a comité operativo de manera presencial el día 28 de mayo de 2024.
27/05/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 069	HENRY MARTINEZ MARTINEZ Presidente Junta Vereda Puerto Quinchana	Citación a comité operativo de manera presencial el día 28 de mayo de 2024.
27/05/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 070	JOSE DEMETRIO PEREZ Presidente Junta Vereda Estrecho Obando	Citación a comité operativo de manera presencial el día 28 de mayo de 2024.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA				
NOMBRE ENTIDAD REMITENTE	**RADICADO**	**FECHA (dd-mm-aa)**	**NOMBRE DEL DESTINATARIO**	**ASUNTO (Tema principal del oficio)**

JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO JUNIN		2/05/2024	CONSORCIO R&C	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO JUNIN		4/05/2024	CONSORCIO R&C	CONVENIO 3391 – OAC BAJO JUNIN Contratos ajustados
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA		6/05/2024	CONSORCIO R&C	COTIZACIONES
JUNTA DE ACCION VILLA FATIMA		6/05/2024	CONSORCIO R&C	COTIZACIONES
JUNTA DE ACCION VILLA FATIMA		9/05/2024	CONSORCIO R&C	REMISION CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES CONVENIO 3414 DE 2024
VILLA DE ACCION COMUNAL BAJO JUNIN		10/05/2024	CONSORCIO R&C	CONVENIO 3991- COTIZACIONES COMPARATIVO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA		10/05/2024	CONSORCIO R&C	REMISION CUADRO COMPARATIVO CONVENIO 4727
DUVAN GUTIERREZ		10/05/2024	CONSORCIO R&C	COTIZACIONES PRADERA EN NUEVO FORMATO
DUVAN GUTIERREZ		11/05/2024	CONSORCIO R&C	COTIZACIONES PRADERA
FERNANDO BRAVO LASSO		11/05/2024	CONSORCIO R&C	INFORMACION BAJO JUNIN
JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO JUNIN		11/05/2024	CONSORCIO R&C	CONVENIO 3991 – COTIZACIONES COMPARATIVO Y CONTRATOS

JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO JUNIN		11/05/2024	CONSORCIO R&C	CONVENIO 3991 – COMPROBANTE DE EGRESO, SOLICITUD DE INSCRIPCION Y TRANSFERENCIA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA		13/05/2024	CONSORCIO R&C	REMISION CONTRATOS CONTADOR Y RESIDENTE
JUNTA DE ACCION VILLA FATIMA		13/05/2024	CONSORCIO R&C	REMISION CONTRATOS CONTADOR Y RESIDENTE
JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO JUNIN		14/05/2024	CONSORCIO R&C	CONVENIO 3391 – DOCUMENTOS PARA PAGO 01
JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO JUNIN		15/05/2024	CONSORCIO R&C	CONVENIO 3991 – SOLICITUD DE PAGO 001
JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO JUNIN		20/05/2024	CONSORCIO R&C	CONVENCIO 3991 – BALANCE Y CANTIDADES
JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO JUNIN		20/05/2024	CONSORCIO R&C	CONVENIO 3991 – ASOCIACION DE CUENTAS RADICADO EN EL BACO AV VILLAS
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA		20/05/2024	CONSORCIO R&C	BALANCE DE OBRA APROXIMADO Y CANTIDADES DE OBRA
JUNTA DE ACCION VILLA FATIMA		20/05/24	CONSORCIO R&C	BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS
JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO JUNIN		26/05/2024	CONSORCIO R&C	CONVENIO 3991 – COMPROBANTES DE EGRESO Y DOCUMENTOS PARA PAGO 002
JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO JUNIN		29/05/2024	CONSORCIO R&C	CONVENIO 3991 – SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS No. 2

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA		30/05/2024	CONSORCIO R&C	TOPOGRAFIA, ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS CONVENIO 4727 DE 2023
JUNTA DE ACCION VILLA FATIMA		30/05/2024	CONSORCIO R&C	TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE SUELO Y DISEÑOS CONVENIO 3991 DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO JUNIN		31/05/2024	CONSORCIO R&C	CONVENIO 3991 – SOLICITUDES DE PAGO 03

Cordialmente,

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 01:

CRONOGRAMA DE OBRA

LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL NO SE HAN PRESENTADO A LA INTERVENTORIA

ANEXO 02:

INFORME SEMANAL (MEPI-MN-IN-15-FR-3)

ASOJUNTAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 18 del 6/05/2024 al 12/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3596 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 155 m

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN	INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES:	YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO	INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No.	3596 DE 2023	CONTRATO No.	4762 DE 2023
FECHA DE INICIO:	5/12/2023	FECHA DE INICIO:	22/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024
VALOR INICIAL:	$ 188 564 775,00	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -	VALOR ACUMULADO:	$ -
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188 564 775			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 188 564 775,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 188 564 775,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 18 desde el 06 al 12 de Mayo del 2024:

- Aprobacion de la compra de materiales pétreos y de ferreteria segun las cantidades calculadas por la residencia de obra, presentacion contratos profesionales de Residente de Obra y contador con sus respectivas firmas y Revision de parametros de ejecucion del convenio solidario 3596 de 2023 de acuerdo a la normativa vigente para construccion de placa huella y concretos rigidos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - SEDE LA PLATA
ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DE SAN AGUSTIN, PERSONERIA JURIDICA N° 00299
DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1982

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NÚMERO 002 DE 2024

ENTIDAD CONTRATANTE: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN

CONTRATISTA: ULDARIZ AMAYA FERRER ORDOÑEZ

Entre los suscritos, de una parte, la ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de San Agustín- Sede identificada con NIT. 900.717.779-1, representada por el señor YENNY MILENA SALAMANCA RAMIREZ, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliada en San Agustín- Huila , identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.080.178.341, expedida en San Agustín-Huila, quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE**, y de otra parte ULDARIZ AMAYA FERRER ORDOÑEZ, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en San Agustín, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.080.773.690 expedida en San Agustín, quien en adelante se llamará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales, el cual se regirá por las normas aplicables y por las cláusulas estipuladas en el presente documento, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, celebró convenio solidario No. 3596 de 2023 con la CONTRATANTE para la ejecución del proyecto "HUMME ESPUESOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
2. Que el CONTRATISTA se compromete a desarrollar el presente con cargo a los recursos asignados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS para dar fe y el consecuencia es el único responsable de la contratación del personal que se requiera de su ejecución.
3. Que el CONTRATISTA se compromete a cumplir con las normas legales para el desarrollo del proyecto y la ejecución del presente contrato.
4. Que la CONTRATANTE [redacted] que celebrara con el buen desarrollo y ejecución del presente contrato, de conformidad con el convenio solidario No. 3596 de 2023 [redacted] ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - SEDE LA PLATA
ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DE SAN AGUSTIN, PERSONERIA JURIDICA N° 00299
DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1982

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NÚMERO 001 de 2024

ENTIDAD CONTRATANTE: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN

CONTRATISTA: EDWIN DIAZ ESTRADA MORA

Entre los suscritos, de una parte, la ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de San Agustín- Sede identificada con NIT. 900.717.779-1, representada por el señor YENNY MILENA SALAMANCA RAMIREZ, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliada en San Agustín- Huila , identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.080.178.341 expedida en San Agustín-Huila, quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE**, y de otra parte EDWIN DIAZ ESTRADA MORA, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en San Agustín, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.513.599, expedida en Bogotá, D.C. quien en adelante se llamará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales, el cual se regirá por las normas aplicables y por las cláusulas estipuladas en el presente documento, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, celebró convenio solidario No. 3596 de 2023 con el CONTRATANTE para la ejecución del proyecto "HUMME ESPUESOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
2. Que el CONTRATISTA se compromete a desarrollar el presente con cargo a los recursos asignados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS para dar fe y el consecuencia es el único responsable de la contratación del personal que se requiera de su ejecución.
3. Que el CONTRATISTA se compromete a cumplir con las normas legales para el desarrollo del proyecto y la ejecución del presente contrato.
4. Que la CONTRATANTE [redacted] que celebrara con el buen desarrollo y ejecución del presente contrato, de conformidad con el convenio solidario No. 3596 de 2023 [redacted] ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN

CONTRATACION

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 19 del 13/05/2024 al 19/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3596 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 155 m

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN	INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES:	YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO	INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No.	3596 DE 2023	CONTRATO No.	4762 DE 2023
FECHA DE INICIO:	5/12/2023	FECHA DE INICIO:	22/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024
VALOR INICIAL:	$ 188 564 775,00	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -	VALOR ACUMULADO:	$ -
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188 564 775			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 188 564 775,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 188 564 775,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 19 desde el 13 al 19 de Mayo del 2024:

- Solicitud de transferencia para Diseños, topografia , laboratorio de suelos y polizas de seguros Y asociacion de cuentas bancarias.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ASOCIACION



TRANSFERENCIAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 20 del 20/05/2024 al 26/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3596 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 155 m

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
INTEGRANTES: YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO
CONTRATO No. 3596 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 188 564 775,00
FECHA DE INICIO: 5/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES: 50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No. 4762 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188 564 775			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 188 564 775,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 188 564 775,00 — 100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - — %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - — %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 75 007 262,00 — 100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 20 desde el 20 al 26 de Mayo del 2024:

-Junta de accion Comunal presento Balance de Obra a la fecha.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



BALANCE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 21 del 27/05/2024 al 2/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3596 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 155 m

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN	INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES:	YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO	INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No.	3596 DE 2023	CONTRATO No.	4762 DE 2023
FECHA DE INICIO:	5/12/2023	FECHA DE INICIO:	22/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024
VALOR INICIAL:	$ 188 564 775,00	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -	VALOR ACUMULADO:	$ -
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188 564 775			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 188 564 775,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 188 564 775,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 21 desde el 27 de Mayo al 02 de Junio del 2024:

-Entrega de estudios y Diseños de Placa-Huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

BAJO JUNIN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 17 del 6/05/2024 al 12/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3991 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 161 m

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN		INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
INTEGRANTES:	VICTOR LOPEZ ORTIZ		INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
CONTRATO No.	3991 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 189 449 501,00	CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 449 501			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 449 501,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 449 501,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI X NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 18 desde el 06 al 12 de Mayo del 2024:

- Aprobacion de la compra de materiales pétreos y de ferreteria segun las cantidades calculadas por la residencia de obra y Revision de parametros de ejecucion del convenio solidario 3991 de 2023 de acuerdo a la normativa vigente para construccion de placa huella y concretos rigidos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 19 del 13/05/2024 al 19/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3991 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 161 m

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN	INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES:	VICTOR LOPEZ ORTIZ	INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No.	3991 DE 2023	CONTRATO No.	4762 DE 2023
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	FECHA DE INICIO:	22/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024
VALOR INICIAL:	$ 189 449 501,00	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -	VALOR ACUMULADO:	$ -
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 449 501			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 449 501,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 449 501,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 19 desde el 13 al 19 de Mayo del 2024:

-Presentacion contratos profesionales de Residente de Obra y contador con sus respectivas firmas , Solicitud de transferencia para topografia , laboratorio de suelos y polizas de seguros ; Asociacion de cuentas de proveedores para compras , dotaciones y demas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 20 del 20/05/2024 al 26/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3991 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 161 m

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN		INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
INTEGRANTES:	VICTOR LOPEZ ORTIZ		INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
CONTRATO No.	3991 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 189 449 501,00	CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 449 501			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 449 501,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 449 501,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 20 desde el 20 al 26 de Mayo del 2024:

-Junta de accion Comunal presento Balance de Obra a la fecha.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 21 del 27/05/2024 al 2/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3991 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 161 m

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN		
INTEGRANTES:	VICTOR LOPEZ ORTIZ		
CONTRATO No.	3991 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189 449 501,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 449 501			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 449 501,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 449 501,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 21 desde el 27 Mayo al 2 de Junio del 2024:

-Solicitud de transferencia para Dotacion,examenes medicos, Materiales petreos , ferreteria y transporte.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VILLA FATIMA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 18 del 6/05/2024 al 12/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3413 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 129 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
INTEGRANTES:	OLMAN ANCIZAR SANCHEZ BUESAQUILLO			INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	3413 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189 269 182,00	CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO:	5/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 269 182			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 269 182,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 269 182,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 18 desde el 06 al 12 de Mayo del 2024:

- Aprobacion de la compra de materiales pétreos y de ferreteria segun las cantidades calculadas por la residencia de obra y Revision de parametros de ejecucion del convenio solidario 3413 de 2023 de acuerdo a la normativa vigente para construccion de placa huella y concretos rigidos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA
JUNTA DE ACCION COMUNAL
DE LA VEREDA VILLA FATIMA
PERSONERIA JURIDICA N° 036 DEL 1960-04-19

San Agustin, Huila, 10 de mayo de 2024.

Señores
BANCO AV VILLAS
Pitalito, Huila.

ASUNTO: Asociación de Cuentas Bancarias

Cordial saludo:

De manera respetuosa solicito acorde lo aprobado Cuentas Bancarias a la Cuenta Corriente Número 224002667 de JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA identificada NIT 814.004.111-0 cuya representante legal es la señora [illegible] identificada con [illegible] en relación a el proceso de ejecución de la obra [illegible] del Convenio 3413 de 2023, (Asociación de usuarios y vereda)(nuevas Suscritas visitadas 11).

BANCO	TIPO DE CUENTA	NOMBRE COMPLETO	N.I.C. NIT	NOMBRE COMERCIAL	No DE PRODUCTO
Banco de Agrario de Colombia	Cuenta Ahorros	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA	814 004 111-0	JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA FATIMA	439030113433
Banco de Agrario de Colombia	Cuenta Ahorros	ALBEIRO ARMIDA TORRES OROZCO	1.082.173.419	PERSONA NATURAL	439028199681
Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	NELSON GUEVAS INGENIERIA	900 [illegible]	PERSONA NATURAL	830180924
Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	CIVIL TOPOGRAFICA S.A.S.	901.296.728	CIVIL TOPOGRAFICA S.A.S.	830307041
Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	[illegible]	[illegible]	PERSONA NATURAL	701201702



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 19 del 13/05/2024 al 19/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3413 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 129 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA		
INTEGRANTES:	OLMAN ANCIZAR SANCHEZ BUESAQUILLO		
CONTRATO No.	3413 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189 269 182,00
FECHA DE INICIO:	5/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 269 182			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 269 182,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 269 182,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 19 desde el 13 al 19 de Mayo del 2024:

-Presentacion contratos profesionales de Residente de Obra y contador con sus respectivas firmas , Solicitud de transferencia para topografia , laboratorio de suelos y polizas de seguros ; Asociacion de cuentas de proveedores para compras , dotaciones y demas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA
PERSONERÍA JURÍDICA N° 036 DEL 1966-04-15

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
NÚMERO 001 de 2024

ENTIDAD CONTRATANTE: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA

CONTRATISTA: WISON GERMAN DIAZ MUÑOZ

Entre los suscritos, de una parte, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de San Agustín- Huila identificada con NIT. 813.003.295-5, representada por el señor OLMAN ANDJAR SANCHEZ BUESAQUILLO, mayor de edad, de nacionalidad colombiano, domiciliado en San Agustín- Huila – Huila, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 12.180.323 expedida en San Agustín-Huila, quien en adelante se denominará el CONTRATANTE, y de otra parte WISON GERMAN DIAZ MUÑOZ, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en San Agustín- Huila, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.082.773.486, expedida en San Agustín- Huila, quien en adelante se llamará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el siguiente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (en adelante el "Contrato") que se regirá por las normas aplicables y por las cláusulas estipuladas en el presente documento, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, celebró convenio solidario Nro. 3413 de 2023 con el

CONTRATACION



TRANSFERENCIAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 20 del 20/05/2024 al 26/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3413 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 129 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA		
INTEGRANTES:	OLMAN ANCIZAR SANCHEZ BUESAQUILLO		
CONTRATO No.	3413 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189 269 182,00
FECHA DE INICIO:	5/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 269 182			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 269 182,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 269 182,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 20 desde el 20 al 26 de Mayo del 2024:

-Junta de accion Comunal presento Balance de Obra a la fecha.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



BALANCE DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 21 del 27/05/2024 al 2/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3413 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 129 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
INTEGRANTES:	OLMAN ANCIZAR SANCHEZ BUESAQUILLO			INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	3413 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189 269 182,00	CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO:	5/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 269 182			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 269 182,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 269 182,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 21 desde el 27 de Mayo al 02 de Junio del 2024:

-Entrega de estudios y Diseños de Placa-Huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTUDIOS



DISEÑOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PUERTO QUINCHANA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 18 del 6/05/2024 al 12/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4727 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 135 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO QUINCHANA
INTEGRANTES: HENRY MARTINEZ MARTINEZ
CONTRATO No. 4727 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 189 085 518,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES: 50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No. 4762 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 085 518			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 189 085 518,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 189 085 518,00 — 100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - — %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - — %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 75 007 262,00 — 100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 18 desde el 06 al 12 de Mayo del 2024:

- Aprobacion de la compra de materiales pétreos y de ferreteria segun las cantidades calculadas por la residencia de obra y Revision de parametros de ejecucion del convenio solidario 4727 de 2023 de acuerdo a la normativa vigente para construccion de placa huella y concretos rigidos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA
JUNTA DE ACCION COMUNAL
DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
PERSONERIA JURÍDICA N° 090 DEL 2022-08-08

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NÚMERO 002 DE 2024

ENTIDAD CONTRATANTE: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA

CONTRATISTA: JOHANNA MILENCY DIAZ RUIZ

Entre los suscritos, de una parte, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de San Agustín - Huila identificada con NIT. 901.531.821-7, representada por el señor HENRY MARTINEZ [illegible] identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 12.401.136 expedida en San Agustín-Huila, quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE**, y de otra parte JOHANNA MILENCY DIAZ RUIZ, mayor de edad, de nacionalidad [illegible] identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.082.773.909 expedida en San Agustín, quien en adelante se llamará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el siguiente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (en adelante el "Contrato"), que se regirá por las normas aplicables y por las cláusulas incluyendo en el presente documento, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, suscribió convenio solidario No. 4727 de 2023 con el CONTRATANTE para la ejecución del proyecto "SUMAN ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS CONFIANTADO".
2. Que el CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad para el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS para ser la No. y se comprometerá en el orden responsable de la contratación del personal que se ocuparán de su ejecución.
3. Que se han cumplido todos los requisitos y requisitos exigidos con las normas legales para el desarrollo del



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 19 del 13/05/2024 al 19/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4727 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 135 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO QUINCHANA		
INTEGRANTES:	HENRY MARTINEZ MARTINEZ		
CONTRATO No.	4727 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189 085 518,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 085 518			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 085 518,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 085 518,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 19 desde el 13 al 19 de Mayo del 2024:

-Presentacion contratos profesionales de Residente de Obra y contador con sus respectivas firmas , Solicitud de transferencia para topografia , laboratorio de suelos y polizas de seguros ; Asociacion de cuentas de proveedores para compras , dotaciones y demas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATACION



TRANSFERENCIAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 20 del 20/05/2024 al 26/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4727 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 135 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO QUINCHANA		
INTEGRANTES:	HENRY MARTINEZ MARTINEZ		
CONTRATO No.	4727 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189 085 518,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 085 518			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 085 518,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 085 518,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 20 desde el 20 al 26 de Mayo del 2024:

-Junta de accion Comunal presento Balance de Obra a la fecha.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



BALANCE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 21 del 27/05/2024 al 2/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4727 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 135 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO QUINCHANA
INTEGRANTES: HENRY MARTINEZ MARTINEZ
CONTRATO No. 4727 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 189 085 518,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES: 50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No. 4762 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 085 518			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 189 085 518,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 189 085 518,00 — 100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - — %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - — %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) $ - — %

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 75 007 262,00 — 100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 21 desde el 27 de Mayo al 02 de Junio del 2024:

-Entrega de estudios y Diseños de placa Huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTUDIOS



DISEÑOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 03:

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-4)

NO SE TIENE INFORME DE MAQUINARIA Y EQUIPO YA QUE LAS OBRAS NO HAN INICIADO

ANEXO 04:

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-6)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-7
VERSIÓ	1
PÁGINA	
FECHA	30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4762 DE 2023 **INTERVENTOR:** CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN E ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: **CONTRATISTA:** CONSORCIO R&C

NOMBRE ARL: POSTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFAMILIAR HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indica Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	7.703.837	DIRECTOR INTER.	$ 5.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,30	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	$ 1.740.000	$ 69.600	V	SANITAS	9469291961	$ 69.600	COLPENSIONES	9469291961	$ 69.600				
2	JUAN DIEGO HERRERA	1.075.317.959	ING. RESIDENTE INTER.	$ 2.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	$ 2.600.000	$ 104.000	V	SANITAS	9469291961	$ 104.000	COLPENSIONES	9469291961	$ 104.000				
3	PAULA SANDOVAL	1.075.274.422	PROF. AMBIENTAL	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,30	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	$ 840.000	$ 33.600	V	SANITAS	9469291961	$ 33.600	COLPENSIONES	9469291961	$ 33.600				
4	ELIANA CONSTANZA CALDERON	1.075.230.027	PROF. SOCIAL	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,50	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	$ 1.400.000	$ 56.000	V	SANITAS	9469291961	$ 56.000	PORVENIR	9469291961	$ 56.000				
5	CARMEN ELISA CARDOSO MORENO	26.430.875	ESPECIALISTA	$ 5.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,50	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	$ 2.500.000	$ 100.000	V	SANITAS	9469291961	$ 100.000	PROTECCION	9469291961	$ 100.000				
6	IVAN FABRICIO SANDOVAL CARDOZO	7.722.915	INSPECTOR	$ 1.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	$ 1.200.000	$ 48.000	V	SANITAS	9469291961	$ 48.000	COLPENSIONES	9469291961	$ 48.000				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 20.200.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 7/08/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Firma
Nombre: **WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR**
Supervisor de Contrato de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 51 No 17C - 05	NEIVA-HUILA	8716627	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	736234165	9469291961	E	2024/06/13	2024/06/28	BANCO CAJA SOCIAL	15	$4,915,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA (10 Afiliados)																							**$12,974,669**	**$2,130,600**			**$14,231,336**	**$569,600**			**$14,231,336**	**$569,600**			**$14,231,336**		**$990,900**		**$0**	**$0**		**$4,260,700**
Centro de Trabajo: OBRA (10 Afiliados)																							**$12,974,669**	**$2,130,600**			**$14,231,336**	**$569,600**			**$14,231,336**	**$569,600**			**$14,231,336**		**$990,900**		**$0**	**$0**		**$4,260,700**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (10 Afiliados)																							**$12,974,669**	**$2,130,600**			**$14,231,336**	**$569,600**			**$14,231,336**	**$569,600**			**$14,231,336**		**$990,900**		**$0**	**$0**		**$4,260,700**
1	CC	1075230027	CALDERON CASTRO ELIANA CONSTANZA	X	X																23030 1	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	6.960%	$18,100	6	$0	$0	Si	$80,500
2	CC	26430875	CARDOSO MORENO CARMEN ELISA	X	X																23020 1	30	$2,263,000	$362,100	EPS005	30	$2,263,000	$90,600	CCF32	30	$2,263,000	$90,600	14-23	30	$2,263,000	6.960%	$157,600	30	$0	$0	Si	$700,900
3	CC	12127735	CHAVARRO SANCHEZ ALVARO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1121959613	FLOREZ PARDO HAROLD ALEXANDER	X																	23030 1	16	$693,334	$111,000	EPS002	16	$693,334	$27,800	CCF32	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	6.960%	$48,300	16	$0	$0	Si	$214,900
5	CC	1075317959	HERRERA FIERRO JUAN DIEGO		X																23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
6	CC	1075237555	MOSQUERA DUSSAN KERLY YESENIA	X	X																23030 1	23	$996,667	$159,500	EPS005	23	$996,667	$39,900	CCF32	23	$996,667	$39,900	14-23	23	$996,667	6.960%	$69,400	23	$0	$0	Si	$308,700
7	CC	1075545375	RAMIREZ SANCHEZ JHON MARIO	X																	23030 1	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF32	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	6.960%	$48,300	16	$0	$0	Si	$214,900
8	CC	1121874315	SANDOVAL PACHON CRISTIAN DANILO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
9	CC	7722915	SANDOVAL CARDOZO IVAN FABRICIO																		25-14	30	$5,425,000	$922,400	EPS005	30	$5,425,000	$217,000	CCF32	30	$5,425,000	$217,000	14-23	30	$5,425,000	6.960%	$377,600	30	$0	$0	Si	$1,734,000
10	CC	4945986	TRUJILLO SALAZAR JAIME	X	X																	0	$0	$0	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF32	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	Si	$188,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (1 Afiliados)																							**$1,926,000**	**$308,200**			**$1,926,000**	**$77,100**			**$1,926,000**	**$77,100**			**$1,926,000**		**$134,100**		**$0**	**$0**		**$596,500**
Centro de Trabajo: BOGOTA (1 Afiliados)																							**$1,926,000**	**$308,200**			**$1,926,000**	**$77,100**			**$1,926,000**	**$77,100**			**$1,926,000**		**$134,100**		**$0**	**$0**		**$596,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							**$1,926,000**	**$308,200**			**$1,926,000**	**$77,100**			**$1,926,000**	**$77,100**			**$1,926,000**		**$134,100**		**$0**	**$0**		**$596,500**
11	CC	1075224392	PASTRANA LAGUNA MIGUEL ANDRES	X	X																25-14	30	$1,926,000	$308,200	EPS005	30	$1,926,000	$77,100	CCF24	30	$1,926,000	$77,100	14-23	30	$1,926,000	6.960%	$134,100	30	$0	$0	Si	$596,500
Total			**Afiliados(11)**																				$14,900,669	$2,438,800			$16,157,336	$646,700			$16,157,336	$646,700			$16,157,336		$1,125,000		$0	$0		$4,857,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 51 No 17C - 05	NEIVA-HUILA	8716627	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	736234165	9469291961	E	2024/06/13	2024/06/28	BANCO CAJA SOCIAL	15	$4,915,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,438,800	$29,100	$0	$2,467,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,438,600	$17,200	$0	$1,455,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$638,100	$7,600	$0	$645,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$362,100	$4,300	$0	$366,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,125,000	$13,300	$0	$1,138,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$1,125,000	$13,300	$0	$1,138,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$646,700	$7,800	$0	$654,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$569,600	$6,800	$0	$576,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$77,100	$1,000	$0	$78,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$646,700	$7,900	$0	$654,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$144,000	$1,800	$0	$145,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$27,800	$400	$0	$28,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$474,900	$5,700	$0	$480,600
TOTAL				11	$4,857,200	$58,100	$0	$4,915,300

ANEXO 05:

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-8)

ANEXO 06:

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (MEPI-MN-IN-15-FR-10)

ANEXO 07:

Resumen Ensayos de Laboratorio (MEPI-MN-IN-15-FR-11)

NO SE HAN REALIZADO ENSAYOS DE LA BORATORIOS YA QUE LAS OBRAS NO HAN INICIADO

ANEXO 08:

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-12).

SE SOLICITARON A LAS JAC PARA DILEGENCIAR EL PRESENTE FORMATO

ANEXO 09:

OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

ANEXO 10:

ACTA DE REUNION (MEPI-MN-IN-14-FR-2)

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 002	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 30/05/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Estrecho Obando –San Agustín - Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 4818 de 2023 – Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA
Ejecutor(es): JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ESTRECHO OBANDO

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JOSE DEMETERIO ANACONA BOLAÑOS	JAC ESTRECHO OBANDO	PRESIDENTE
TITO MUÑOZ ORDOÑEZ	JAC ESTRECHO OBANDO	TESORERO
LUIS FERNEY ANACONA BOLAÑOS	VEEDURIA	VEEDOR
RAMIRO ANDRES RINCÓN	JAC ESTRECHO OBANDO	ING RESIDENTE OBRA
CARLOS ANDRES CHAVARRO	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA
IVAN SANDOVAL CARDOZO	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Revisión y aprobación de hojas de vida
2. Revisión y aprobación de cotizaciones presentadas

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Evaluación del personal propuesto por la Junta de Acción Comunal Ingeniero Residente, Contador Público y Maestro de Obra.

2- Revisión, socialización y aprobación de cotizaciones presentadas por la Junta de Acción Comunal, las cotizaciones a revisar con las siguientes:

- Cotizaciones para Estudio de suelos
- Cotizaciones para Topografía y Diseño geométrico
- Cotizaciones para Materiales de ferretería
- Cotizaciones para Transporte de Materiales de ferretería
- Cotizaciones de Agregados pétreos y transporte de agregados pétreos
- Cotizaciones de Alquiler de maquinaria

- Cotizaciones de Dotaciones

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar).*

Tema	Resumen
1.	La junta de acción comunal realizo envió por medio de correo electrónico a la interventoría, su revisión y aprobación, la interventoría manifiesta que efectivamente ya se realizó la revisión del personal propuesto para Ing. Residente, Contador público y Maestro de obra, y anexo a esta acta de comité operativo se relaciona la evaluación respectiva de cada personal concluyendo lo siguiente: Ing. Residente: ING. RAMIRO ANDRES RINCON C.C 12.181.345 M.P. 10202-152709CAU Contador público: JOHANNA MILDREY DIAZ RUIZ C.C. 1.082.773.093 T.P. 235553-T Maestro de obra: TITO MUÑOZ ORDOÑEZ C.C 1.082.772.422
2.	La junta de acción comunal realizó envío de las cotizaciones presentadas por cada actividad, de las cuales la interventoría realiza un comparativo el cual se socializa en este comité operativo. • Las cotizaciones presentadas para Exámenes: 1. CALIDAD COLOMBIA 2. DISTRIALTURAS & SALUD LABORAL • Las cotizaciones presentadas para Valla: 1. TIMANCO LITOGRAFÍA 2. TIPOGRAFÍA SAN MARCOS • Las cotizaciones presentadas para dotaciones: 1. CONFE LIMARGLO 2. AGROTEXTILES 3. SERVIDOTACIONES • Las cotizaciones presentadas para los estudios de suelos: 1. INDISUELOS 2. YUVARSI

	3. MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS. • Las cotizaciones para Topografía y Diseño geométrico: 1. PLANEACIÓN Y PROYECTOS 2. D Y D 3. SOLUCIONES • Las cotizaciones de Agregados pétreos 1. INDUCON 2. PETREOS COLOMBIA 3. DISMETRIC 4. MINA FUEGO VERDE • Las cotizaciones para Materiales de ferretería Acero: 1. CONCRECAM 2. LA BARATA 3. IDEAL • Las cotizaciones para Materiales de ferretería Cemento: 1. BARATA 2. IDEAL • Cotizaciones para transporte de Acero: 1. LIDIER FERNANDEZ 2. CRISTIAN ARGOTE • Cotizaciones para transporte de Cemento: 1. SEGUNDO SALAMANCA 2. JHON RENZA 3. LIDIER FERNANDEZ • Las cotizaciones de Alquiler Maquinaria: 1. SEGUNDO SALAMANCA 2. JHON FREDDY RENZA • Las cotizaciones de Alquiler Mezcladora: 1. JESUS ANACONA 2. NELSON ORTIZ

	• Las cotizaciones de Madera: 1. MADER CENTRAL 2. EL ALTICO • Las cotizaciones de Transporte KM.M3: 1. SEGUNDO SALAMANCA 2. PETREOS COLOMBIA 2. ENRIQUE IBARRA

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	De acuerdo a la evaluación realizada al personal ofertado por la JAC, y teniendo en cuenta que postularon a una persona para Ing Residente de obra, una persona para Contador público y una persona para maestro de obra, todos cumple de acuerdo a las exigencias del anexo técnico dentro del convenio. Por lo tanto, el comité aprueba que para: Ing. Residente: ING. RAMIRO ANDRES RINCON C.C 12.181.345 M.P. 10202-152709CAU Contador público: JOHANNA MILDREY DIAZ RUIZ C.C. 1.082.773.093 T.P. 235553-T Maestro de obra: TITO MUÑOZ ORDOÑEZ C.C 1.082.772.422
2.	El comité operativo aprueba lo siguiente: • Tendiendo en cuenta las cotizaciones presentadas para cada uno de los diferentes ítems, se aprobaron con visto bueno por parte de los participantes los siguientes proveedores:

	- EXÁMENES: CALIDAD COLOMBIA - VALLA: LITOGRAFÍA TIMANCO - DOTACIONES: SERVIDOTACIONES - ESTUDIOS DE SUELOS: INDISUELOS - TOPOGRAFÍA Y DISEÑOS: D & D - TRANSPORTE KM.M3: SEGUNDO SALAMANCA - FERRETERIA – ACERO: IDEAL - FERRETERIA – CEMENTO: BARATA - AGREGADOS: DISMETRIC - TRANSPORTE ACERO: LIDIER ALBEIRO FERNANDEZ - TRANSPORTE CEMENTO: SEGUNDO SALAMANCA - ALQUILER MAQUINARIA: SEGUNDO SALAMANCA - ALQUILER MEZCLADORA: NELSON ORTIZ - MADERA: EL ALTICO

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Realizar los contratos pertinentes del personal aprobado: Ing. Residente de obra Contador publico Maestro de obra	JAC	Entre las semanas siguientes


PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación


FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: JOSE DEMETERIO ANACONA BOLAÑOS
Cargo: Presidente JAC




Nombre: CARLOS ANDRES CHAVARRO
Cargo: Director Interventoría



Nombre: LUIS FERNEY ANACONA BOLAÑOS
Cargo: Presidente veeduría ciudadana



Nombre: IVAN SANDOVAL CARDOZO
Cargo: Interventoría



Nombre: TITO MUÑOZ ORDOÑEZ
Cargo: Tesorero JAC



Nombre: RAMIRO ANDRES RINCÓN
Cargo: Ing. Residente JAC

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4818 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OBANDO
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

DOTACION DEL PERSONAL

			EMPRESAS					
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**CONFE LIMARGLO**		**AGRO TEXTIL´S**		**SERVIDOTACIONES**	
			Valor Unitario	**Valor total**	**Valor Unitario**	**Valor total**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Casco Industrial con certificación ansi con rache para obrero	7	$ 17,850.00	39,100	$ 273,700.00	$ 35,000.00	$ 245,000.00	$ 23,000.00	$ 161,000.00
Bota en caucho punta de acero para obrero	7	$ 63,070.00	136,000	$ 952,000.00	$ 65,000.00	$ 455,000.00	$ 85,000.00	$ 595,000.00
Gafa industrial unilente clara protectora	7	$ 6,545.00	7,650	$ 53,550.00	$ 9,000.00	$ 63,000.00	$ 4,500.00	$ 31,500.00
Guante de Carnaza corto reforzado	14	$ 7,735.00	15,300	$ 214,200.00	$ 12,000.00	$ 168,000.00	$ 9,500.00	$ 133,000.00
Guante vaqueta corto reforzado	14	$ 7,140.00	12,750	$ 178,500.00	$ 12,000.00	$ 168,000.00	$ 7,500.00	$ 105,000.00
Peto Carnaza	5	$ 26,180.00	38,250	$ 191,250.00	$ 25,000.00	$ 125,000.00	$ 25,000.00	$ 125,000.00
Careta para guadañar	2	$ 30,345.00	38,250	$ 76,500.00	$ 55,000.00	$ 110,000.00	$ 25,000.00	$ 50,000.00
Tapaoidos de inserción siliconado	14	$ 2,975.00	4,250	$ 59,500.00	$ 6,000.00	$ 84,000.00	$ 2,500.00	$ 35,000.00
Botiquín Tipo A	1	$ 70,000.00	200,600	$ 200,600.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00
Uniforme personalizado	7	$ 140,000.00	170,000	$ 1,190,000.00	$ 160,000.00	$ 1,120,000.00	$ 120,000.00	$ 840,000.00
Tela polipropileno para cerramiento H=2,00 M	30	$ 6,700.00		$ -		$ -		$ -
Plástico negro Cal. 6 ancho 4m para cubrimiento de agregados	40	$ 7,200.00		$ -		$ -		$ -
Cinta de demarcación L=500 M	2	$ 47,000.00		$ -		$ -	$ 27,000.00	$ 54,000.00
Cono de señalización en Plástico h=70 cm reforzado	2	$ 50,000.00		$ -		$ -	$ 55,000.00	$ 110,000.00
Paleta de señalización PARE-SIGA	2	$ 30,000.00		$ -		$ -	$ 25,000.00	$ 50,000.00
Caneca Plástica 55 gal para residuos	3	$ 70,000.00		$ -		$ -	$ 75,000.00	$ 225,000.00
TOTAL				**$ 3,389,800.00**		**$ 2,578,000.00**		**$ 2,639,500.00**
TRANSPORTE				SIN TRANSPORTE		SIN TRANSPORTE		
FORMA DE PAGO				CONTADO ANTICIPADO	100%	CONTADO ANTICIPADO	100%	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA				2 DIAS		2 DIAS		2 DIAS

Comité Operativo. **No:** **2**
Fecha Comité Operativo: 30/05/2024

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO
SERVIDOTACIONES

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE	$0.00
IVA	$0.00
RETENCION 2.5% O 3.5%	NO APLICA
TOTAL A TRANSFERIR	$0.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS **Presidente JAC** **Interventoria**

DOTACIONES INDUSTRIALES

AGRO TEXTILES Pitalito

SEÑOR;
JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA ESTRECHO
OBANDO SAN AGUSTIN
NIT: 8130039798

Cordial saludo.

Atendiendo la invitación realizada nos permitimos presentar cotización de la siguiente dotación

CANTIDAD	DETALLE	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	OVEROL DE DOS PIEZAS EN LINO FLEX CON ESTAMPADOS EN ESPALDA Y BOLSILLO CINTAS REFLECTIVAS EN PANTALON Y CAMISA RESPECTIVAMENTE	$160.000	$1.120.000
5	PETO EN CARNAZA	$25.000	$125.000
7	BOTA PLASTICA CON PUNTA DE ACERO	$65.000	$455.000
7	CASCO	$35.00	$245.000
7	LENTE TRANSPARENTE Y OSCURO	$9.000	$63.000
14	GUANTE EN CARNAZA	$12.000	$168.000
14	GUANTE EN VAQUETA CORTO REFORZADO	$12.000	$168.000
2	CARETA PARA GUADAÑAR	$55.000	$110.000
14	TAPA OIDO DE INSERCION SILICONADO	$6000	$84.000
1	BOTIQUIN TIPO A	$40.000	$40.000

VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS
FORMA DE PAGO; CONTADO

Atentamente,

MIREYA ZARATE
Gerente

DESCRIPCION	CANT	V UNIDAD	V. TOTAL
Casco tipo I ajuste rachet INSAFE	7	$ 23.000	$ 161.000
Bota PVC seguridad caña alta color negro Talla 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Talla 44, 45 tienen costo adicional	7	$ 85.000	$ 595.000
Gafa ref 818 transparente	7	$ 4.500	$ 31.500
Guante carnaza corto reforzado	14	$ 9.500	$ 133.000
Guante vaqueta corto reforzado	14	$ 7.500	$ 105.000
Peto carnaza	5	$ 25.000	$ 125.000
Careta guadañar ajuste rachet malla metalica	2	$ 25.000	$ 50.000
Tapaoido inserción silicona	14	$ 2.500	$ 35.000
Botiquin tipo morral dotado	1	$ 125.000	$ 125.000
Uniforme tipo INVIAS Camisa Talla S, M, L, XL Pantalón Talla 28, 30, 32, 34, 36 Tallas grandes tienen costo adicional	7	$ 120.000	$ 840.000
Cinta señalización peligro x 500 m	2	$ 27.000	$ 54.000
Cono PVC doble cinta reflectiva 70 cm	2	$ 55.000	$ 110.000
Paleta señalización Pare-Siga	2	$ 25.000	$ 50.000
Papelera plastica tapavaiven 55 litros	3	$ 75.000	$ 225.000
TOTAL			**$ 2.639.500**

CONFE LIMARGLO
EQUIPOS DE OFICINA
CELS: 321-787 5427 - 313-488 4701
CARRERA 10 No. 12-25 BARRIO SAN ANTONIO PITALITO H.

SUMINISTROS PARA
COLEGIOS Y HOSPITALES
FABRICA DE DOTACIONES PARA TODA
CLASE DE EMPRESAS
VENTA DE COMPUTADORES
Y REPUESTOS PARA LOS MISMOS
GLORIA MARLENY MUÑOZ GOMEZ NIT: 36.125.103-9
REGIMEN SIMPLIFICADO

PROPUESTA

CLIENTE: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN- HUILA
NIT: 813.003.979-8 **CIUDAD:** SAN AGUSTIN HUILA **FECHA:** 25-03-2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito extenderles mi más sincero saludo deseándoles muchos éxitos en sus labores, y a su vez poniendo en disposición los Servicios de CONFELIMARGLO, para ofrecerle suministros que puedan apoyar su trabajo:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CASCO TIPO I DIELCTRICO	7	$ 39.100	$ 273.700
2	BOTA PVC SEGURIDAD CAÑA ALTA TALLA 37, 38, 39, 49, 40, 41, 42, 43 TALLA 44, 45 TIENEN COSTO ADICIONAL	7	$ 136.000	$ 952.000
3	GAFA REF 818 CLARA	7	$ 7.650	$ 53.550
4	GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO EN VAQUETA		$ 15.300	$ 214.200
5	GUANTE VAQUETA CORTO REFORZADO EN VAQUETA		$ 12.750	$ 178.500
6	DELANTAL CARNAZA MEDIANO	5	$ 38.250	$ 191.250
7	CARETA PARA GUADAÑAR MALLA METALICA	2	$ 38.250	$ 76.500
8	TAPAOIDO INSERCIOON SILICONA		$ 4.250	$ 59.500
9	BOTIQUIN MORRAL DOTADO	1	$ 200.600	$ 200.600
10	UNIFORMA INVIAS LINOFLEX DOS PIEZAS, CINTA REFLECTIVA Y ESTAMPADOS TALLA S, M, L, XL TALLA 2XL, 3XL, 4XL, 5XL TIENEN COSTO ADICIONAL	7	$ 170.000	$ 1.190.000
TOTAL				**$ 3.389.800**

Atentamente:

Gloria Marleny Muñoz G.

GLORIA MARLENY MUÑOZ GOMEZ
CC. 36.125.103

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4818 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OBANDO
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

EXAMENES

			EMPRESAS		
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**CALIDAD COLOMBIA**	**DISTRIALTURAS**	
Paquete de exámenes médicos, valoración médica osteomuscular, audiometría, visiometria	1	UND	$ 64,000.00	$ 60,000.00	
TOTAL			**$ 64,000.00**	**$ 60,000.00**	

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	
FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA DE PROGRAMACION	1 DIA DE PROGRAMACION	

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: 30/05/2024

Aprobación	SI	NO
Tesoreso JAC	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

CALIDAD COLOMBIA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE	$0.00
IVA	$0.00
SERVICIOS 4 %	$0.00
TOTAL A TRANSFERIR	$0.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS **Presidente JAC** **Interventoria**

TARIFAS

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular, (ingreso, periódico o egreso)	$30.000
Visiometria	$17.000
Audiometria	$17.000
Colesterol	$10.000
Glicemia	$10.000
Triglicéridos	$10.000

313 280 8690 - 315 731 2154
www.examenesocupacionalespitalito.com
distrialturas.saludlaboral@gmail.com
Calle 3 #1B - 23 Barrio Quinche Pitalito

DISTRIALTURAS & SALUD LABORAL

PROPUESTA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR U	VALOR T
1	Valoración médica ocupacional (pre ingreso, periódico o retiro)	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00
2	Audiometría	1	$ 15.000,00	$ 15.000,00
3	Visiometría	1	$ 15.000,00	$ 15.000,00
			Total	**$ 60.000,00**

Quedamos atentos a cualquier otra información que requieran de nuestra parte para complementar nuestro amplio portafolio de servicios.

Gracias por su amable atención.

Atentamente;

GENNY ANDREA URBANO BETANCOURT
Gerente
Cel: 3124565316 - 3132808690
gerencia.distrialturas@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4818 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OBANDO
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

FERRETERIA CEMENTO

	EMPRESAS				
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**BARATA**	**IDEAL**		
CEMENTO SAN MARCOS 50.0 kg	1	$ 32,500.00			
CEMENTO CEMEX USO GENERAL 50.0 kg	1	$ 33,500.00	$ 34,000.00		
TOTAL		$ 66,000.00	$ 34,000.00	$ -	$ -

TRANSPORTE	SI INCLUYE	NO INCLUYE	NO INCLUYE	NO INCLUYE	NO INCLUYE
FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA	8 DIAS	8 DIAS	8 DIAS	8 DIAS	8 DIAS

Comité Operativo. **No:** **2**
Fecha Comité Operativo: 30/05/2024

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO
BARATA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE	$	-
IVA	$	-
RETENCION 2.5%	$	-
ANTICIPO 1	$	-

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS **Presidente JAC** **Interventoria**

Ferretería IDEAL

MANUEL JIMENEZ SAMBONY

Nit: 12142731-9

Dirección: CL 3 10 41

Telefono: 3118633275

Responsabilidad: Responsable de IVA (régimen común)

COTIZACÍON
1100

Resp: VENTAS

Fecha 2024-03-20
Fecha Final 2024-03-20
-

Cliente : JAC VEREDA ESTRECHO OBANDO
Nit / CC: 813003979
Telefono: 3103401668
Direccion:VRDA OBANDO

CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	P UNID	BASE	IMP	IVA	VAL DES	DES	V TOTAL
001786	VARILLA CORRX60 (3/8) 3.33	1,200.00	16,400.00	13,781.5	3,142,184.87	19%	0.00	0%	19,680,000.00
000001	CEMENTO CEMEX BTO X 50KL	800.00	34,000.00	28,571.4	4,342,857.14	19%	0.00	0%	27,200,000.00

ITEMS 2	SUBTOTAL 39,394,957.98	DESCUENTO 0.00	SUBTOTAL 39,394,957.98	IVA 7,485,042.02	TOTAL 46,880,000.00

COMENTARIO :

LA BARATA FERRETERIA
cr 11 2 56 Tel: 3176579745 SAN AGUSTIN
GRUPO LYDER S.A.S NIT: 900376214-8

COTIZACION Nº 1256

Cliente : JUNTA ACCION COMUNAL ESTRECHO OBANDO Nit/CC. : 813003979-8 Página : 1
Dirección : VEREDA OBANDO Teléfono : 3134400065 F. Pago : Efectivo
Ciudad : OBANDO Zona: SAN AGUSTIN Vend[ ] :

Fecha : 22/04/24
Vence : 22/04/24

CODIGO-B	DESCRIPCION	PRESENTACION	IMP	%Dcto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
001951-1	CEMENTO CEMEX GRIS BULTO * 50KLS	BULTO	0%	0.0%	1000.00	33,500.00	33,500,000.00

SON : TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS******

PESO: 50,000.00 KG

SUBTOTAL ======>	$ 33,500,000.00
IMP->IVA ======>	$ 0.00
T O T A L ======>	$ 33,500,000.00

Observaciones:

Elaboró

Aceptada y Recibida __/__/____

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4818 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OBANDO
INTERVENTOR: ING. JOSE LUIS VALDERRAMA
SUPERVISOR: ING. JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

VALLA

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TIMANCO LITOGRAFIA**	**TIPOGRAFIA SAN MARCOS**		
VALLA DE 1X2 EN MATERIAL BANNER CON ESTRUCTURA METALICA Y PARALES DE 3.60M	1	UND	$ 340,000.00	$ 485,000.00		
TOTAL			**$ 340,000.00**	**$ 485,000.00**		

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE		
FORMA DE PAGO	100%	100%		
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS	15 DIAS		

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: 30/05/2024

Aprobación	**SI**	**NO**
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

TIMANCO LITOGRAFIA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE	$ -
IVA	0
RETENCION 2.5% O 3.5%	NO APLICA
ANTICIPO	$ -
PAGO 2	$ -
TOTAL	$ -

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS **Presidente JAC** **Interventoria**

TIMANCO
LITOGRAFIA

NIT. 36.272.657 – 6
RESPONSABLE DE IVA

Pitalito, 19 de Abril de 2024

Señores:
JUNTA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DE SAN AGUSTIN
San Agustín - Huila

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	IMPRESIÓN DE UNA VALLA TAMAÑO: 2 M X 1 M EN BANNER IMPRESIÓN EN ALTA RESOLUCION	$ 150.000
1	LAMINADA VALLA TAMAÑO: 2 M X 1 M	$ 60.000
1	ESTRUCTURA TAMAÑO: 2 M X 1M	$ 130.000

NOTA: SI NECESITA FACTURA ELECTRONICA LOS PRECIOS SERAN MAS EL 19% IVA.

Atentamente,

Deissy Moreno Giraldo

Deissy Moreno Giraldo
C.C. 36.272.657



TIPOGRAFIA SAN MARCOS

Rosalba Navarro Lozano
Nit. 40.726.749-1
NO RESPONSABLE DE IVA

Señor(es):
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO
NIT. 8 1 3 0 0 3 9 7 9 8
correo: nayduyanith@yahoo.com

Muy cordialmente me permito cotizar los siguientes trabajos:

Cant.	Concepto	V/Unitario	Valor
1	***Valla Publicitaria:*** (2 MTS X 1) lona full color impresión digital con estructura metalica, tubos para suelo, sin instalar	485.000	485.000
1	***Lona Publicitaria:*** (2 MTS X 1) solo impresión lona full color. (sin instalar)	90.000	90.000

El valor de la cotización es por las cantidades mencionadas en ella, no por cantidades menores. Esta cotización tiene una vigencia de 30 dias. El presente trabajo se inicia con el 100% del valor mencionado y será entregado en un plazo maximo no superior a 15 dias habiles.

Rosalba Navarro Lozano
cc 40726749.

Fecha de Cotización : Mayo 9 / 2024

ROSALBA NAVARRO LOZANO
Cel: **312 3795637 - 8 360500** / e-mail. **sanmarcospitalito@hotmail.com**

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4818 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OBANDO
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

FERRETERIA ACERO

		EMPRESAS				
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**CONCRECAM**	**IDEAL**	**BARATA**		
VARILLA 1" LISA PDR-60, Fy: 4200 kg/cm3	1		$ 129,800.00	$ 155,000.00		
VARILLA 1/2" PDR-60, Fy: 4200 kg/cm3	1		$ 27,500.00	$ 27,900.00		
VARILLA 1/4" PDR-60, FY:4200 Kg/cm3	1		$ 8,100.00	$ 9,200.00		
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE	1					
CANASTILLAS COMPLETAS CON ACERO LISO DE 1"	19	$ 2,123,079.00				
ANTISLO SIKA 20KG	1		$ 245,000.00	$ 280,000.00		
	1					
	1					
	1					
TOTAL		$ 2,123,079.00	$ 410,400.00	$ 472,100.00		$ -

TRANSPORTE	SI INCLUYE	NO INCLUYE	NO INCLUYE	NO INCLUYE	NO INCLUYE
FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA	8 DIAS	8 DIAS	8 DIAS	8 DIAS	8 DIAS

Comité Operativo. **No:** **2**
Fecha Comité Operativo: 30/05/2024

Aprobación	**SI**	**NO**
Tesorero Jac		
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	2	

PROVEEDOR SELECCIONADO
IDEAL

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE	$	-
IVA	$	-
RETENCION 2.5%	$	-
ANTICIPO 1	$	-

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS **Presidente JAC** **Interventoria**

CONSTRUCCION DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL

Fabricación Pasajuntas -Corte y Sello de Juntas

Formaleta Metàlica - Estructura Metàlica

Hierro Recto, Figurado , Liso y Periferia

COTIZACION	LIPR01-F05
	VERSIÓN 2
	1/03/2006

CONCRECAM S.A.S.

Nit. 901,191.984-9

CLIENTE: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO

SOLICITA: DUVAN GUTIERREZ

NIT 8130039798

FORMA DE PAGO: ANTICIPADO 100%

OBRA/DIRECCIÓN: SAN AGUSTIN HUILA

FECHA PEDIDO: ABRIL 04 DE 2024

TELEFONO: 3142339779

FECHA ENTREGA: ENTREGA A 8 DIAS HABILES A PARTIR DE OC Y ANTICIPO

COTIZACION 3009 A

PRODUCTOS				
CANTIDAD	**UN**	**DESCRIPCIÓN**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
19	UND	CANASTILLA PASAJUNTA DE L=2,60mts H= 10cms CON PASADOR DE 1" A 40cms CADA 30cms C/U (9 PASADORES) W=18,10 KG Corte Industrial	$ 103.000	$ 1.957.000
			SUBTOTAL	$ 1.957.000
			IVA 19%	$ 371.830
			TOTAL	$ 2.328.830

PRODUCTOS				
CANTIDAD	**UN**	**DESCRIPCIÓN**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
19	UND	CANASTILLA PASAJUNTA DE L=2,60mts H= 10cms CON PASADOR DE 1" A 35cms CADA 30cms C/U (9 PASADORES) W=16,37 KG Corte Industrial	$ 93.900	$ 1.784.100
			SUBTOTAL	$ 1.784.100
			IVA 19%	$ 338.979
			TOTAL	$ 2.123.079

OBSERVACIONES
NOTA: FAVOR NO EFECTUAR RETENCION SOBRE ICA debido a que la empresa esta dedicada a una actividad industrial en el municipio de MOSQUERA (Cundinamarca). En concordancia con la ley 49 de Dic 1990 (CONGRESO DE COLOMBIA, CAPITULO XII FISCOS REGIONALES ART. 77)
***** NO INCLUYE FLETE - CLIENTE RECOGE EN PLANTA DE CONCRECAM TRASVERSAL 1 # 1 84 BARRIO EL LUCERO MOSQUERA CUNDINAMARCA**
***** ENTREGA A 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA Y ANTICIPO**
*****ESTE PRECIO ESTA SUJETO A VARIACIONES SEGÚN PRECIO SIN PREVIO AVISO Y SERA REVISADO AL MOMENTO DE LA COMPRA**
*****MATERIAL CON CERTIFICACION Y RESISTENCIA A-36 NORMA NTC 161 LISOS Y NTC 2289 CORRUGADOS Y SEGÚN PROCESO CONTRUCTIVO DE CONCRECAM SAS.**
*****OFERTA VALIDA POR 05 DIAS**
*****CONSIGNAR EN CTA CTE No 462011974 DEL BANCO AV VILLAS A NOMBRE DE CONCRECAM SAS**

Ferretería IDEAL

MANUEL JIMENEZ SAMBONI

Nit: 12142731-9

Dirección: CL 3 10 41

Telefono: 3118633275

Responsabilidad: Responsable de IVA (régimen común)

COTIZACÍON
1328

Resp: VENTAS

Fecha 2024-04-06
Fecha Final 2024-04-06
-

Cliente : JAC VEREDA ESTRECHO OBANDO
Telefono: 3103401668

Nit / CC: 813003979
Direccion:VRDA OBANDO

CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	P UNID	BASE	IMP	IVA	VAL DES	DES	V TOTAL
001789	VARILLA CORRX60 1/2" (5.95)#4	1.00	27,500.00	23,109.2	4,390.76	19%	0.00	0%	27,500.00
005100	ANTISOL SIKA 20KG	1.00	245,000.00	245,000.0	0.00	0%	0.00	0%	245,000.00
001783	VARILLA CORR 1/4	1.00	8,100.00	6,806.7	1,293.28	19%	0.00	0%	8,100.00
005101	VARILLA LISA 1"	10.00	129,800.00	109,075.6	207,243.70	19%	0.00	0%	1,298,000.00

ITEMS	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
4	1,365,672.27	0.00	1,365,672.27	212,927.73	1,578,600.00

COMENTARIO :

LA BARATA FERRETERIA

CR 11 2 56 Tel: 3185356988 SAN AGUSTIN
GRUPO LYDER S.A.S NIT: 900376214-8

COTIZACION Nº 1466

Cliente : CONSUMIDOR FINAL — Nit/CC. : 222222222222 — Página : 1
Dirección : CR 11 2 56 — Teléfono : 3185356988 — F. Pago : Efectivo
Ciudad : SAN AGUSTIN — Zona: SAN AGUSTIN — Vend[ ] :
Fecha : 05/05/24
Vence : 05/05/24

CODIGO-B	DESCRIPCION	PRESENTACION	IMP	%Dcto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
007218-1	VARILLA DE LISA 1 PULGADA	UNIDAD	0%	0.0%	1.00	155,000.00	155,000.00
006372-1	VARILLA 1/4 CORRUGADA	UNIDAD	0%	0.0%	1.00	9,200.00	9,200.00
007552-1	SIKA ANTISOL X20 KG	UNIDAD	0%	0.0%	1.00	280,000.00	280,000.00
003909-1	CARRETA COLIMA PLASTICA	UNIDAD	0%	0.0%	3.00	262,000.00	786,000.00
004613-1	BALDE CONTRUCION COYO	UNIDAD	0%	0.0%	20.00	6,500.00	130,000.00
000582-1	PALA HUILA C/ARO COLIMA	UNIDAD	0%	0.0%	5.00	22,800.00	114,000.00
000466-1	PUNTILLA CON CABEZA 2" X 400 GRMS VARIAS MARCA	LIBRA	0%	0.0%	1.00	4,000.00	4,000.00
002731-1	PUNTILLA CON CABEZA 2.1/2" 400 GRAMOS	UNIDAD	0%	0.0%	1.00	4,000.00	4,000.00
001939-1	PLASTICO NEGRO C-6*4MTS DE ANCHO	UNIDAD	0%	0.0%	1.00	7,500.00	7,500.00

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL******* SETECIENTOS PESOS**********

Observaciones:

SUBTOTAL ======>	$ 1,489,700.00
IMP->IVA ======>	$ 0.00
TOTAL ======>	$ 1,489,700.00

Elaboró

Aceptada y Recibida ___/___/____

LA BARATA FERRETERIA

CR 11 2 56 Tel: 3185356988 SAN AGUSTIN
GRUPO LYDER S.A.S NIT: 900376214-8

COTIZACION
N° 1467

Cliente : CONSUMIDOR FINAL — Nit/CC. : 222222222222 — Página : 1
Dirección : CR 11 2 56 — Teléfono : 3185356988 — F. Pago : Efectivo
Ciudad : SAN AGUSTIN — Zona: SAN AGUSTIN — Vend[ ] :
Fecha : 05/05/24
Vence : 05/05/24

CODIGO-B	DESCRIPCION	PRESENTACION	IMP	%Dcto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
007128-1	CUCHILLA GUADAÑA RECTA CUADRADA 352425	UNIDAD	0%	0.0%	1.00	155,000.00	155,000.00
006372-1	VARILLA 1/4 CORRUGADA	UNIDAD	0%	0.0%	1.00	9,200.00	9,200.00
007552-1	SIKA ANTISOL X20 KG	UNIDAD	0%	0.0%	1.00	280,000.00	280,000.00
003909-1	CARRETA COLIMA PLASTICA	UNIDAD	0%	0.0%	3.00	262,000.00	786,000.00
004613-1	BALDE CONTRUCION COYO	UNIDAD	0%	0.0%	20.00	6,500.00	130,000.00
000582-1	PALA HUILA C/ARO COLIMA	UNIDAD	0%	0.0%	5.00	22,800.00	114,000.00
000466-1	PUNTILLA CON CABEZA 2" X 400 GRMS VARIAS MARCA	LIBRA	0%	0.0%	1.00	4,000.00	4,000.00
002731-1	PUNTILLA CON CABEZA 2.1/2" 400 GRAMOS	UNIDAD	0%	0.0%	1.00	4,000.00	4,000.00
001939-1	PLASTICO NEGRO C-6*4MTS DE ANCHO	UNIDAD	0%	0.0%	1.00	7,500.00	7,500.00
000029-1	VARILLA CORRUGADA 1/2"	UNIDAD	0%	0.0%	1.00	27,900.00	27,900.00

SON : UN MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS***
PESOS**********

SUBTOTAL ======>	$ 1,517,600.00
IMP->IVA ======>	$ 0.00
TOTAL ======>	$ 1,517,600.00

Observaciones:

Elaboró

Aceptada y Recibida __/__/____

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4818 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OBANDO
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

SUELO

			EMPRESAS		
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**INDISUELOS**	**YUVARSI**	**MECANICA DE SUELOS**
		Unidad			
DENSIDAD	4	Unidad	$280,000.00	$400,000.00	$400,000.00
RESISTENCIA A LA COMPRESION	4	Unidad	$120,000.00	$320,000.00	$320,000.00
DISEÑO DE MEZCLA	1	Unidad	$500,000.00	$520,000.00	$520,000.00
APIQUE DE 1.50 MT DE PROFUNDIDAD	2	Unidad	$800,000.00	$900,000.00	$900,000.00
TOTAL			**$ 1,700,000.00**	**$ 2,140,000.00**	**$ 2,140,000.00**

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	
FORMA DE PAGO	50-50	50-50	50-50
TIEMPO DE ENTREGA	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS

Comité Operativo. No: 2
Fecha Comité Operativo: 30/05/2024

Aprobación	**SI**	**NO**
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	·	
Interventoria	·	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

INDISUELOS

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE	$1,700,000.00
IVA	$0.00
RETENCION 2.5% O 3.5%	NO APLICA
ANTICIPO	$0.00
PAGO 2	$1.700.000.00
TOTAL	$1,700,000.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS **Presidente JAC** **Interventoria**

Señores
ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN "ASOJUNTAS"
YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO. REPRESENTANTE LEGAL.
Solicitantes del servicio.

Ref.: **PROPUESTA ECONÒMICA PARA LA EJECUCIÒN DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA PLACA HUELLA EN LA VEREDA PRADERA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA.**

Reciban un cordial saludo.

A continuación, presentamos nuestra propuesta económica para la ejecución del proyecto en referencia.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Diseño de concreto, Concreto Hidráulico Art. 630-22 INVIAS, para resistencias de 2000 PSI -2500 PSI-3000PSI	1	$ 520.000	$ 520.000
Densidad seca máxima in situ (densidad de campo - cono y arena). Norma INV- E -161(la empresa contratista deberá programar mínimo 3 densidades por visita.)	4	$ 100.000	$ 400.000
Resistencia a la compresión de especímenes cilíndrico NORMA INVIAS - E- 630-22 (incluye toma en campo de 4 especímenes cilíndricos, alquiler de equipo, transporte de muestras al laboratorio central, curado e informe final)	4	$ 80.000	$ 320.000
Ejecución de apique a una profundidad máxima de 1.5 m	1	$ 450.000	$ 450.000

EMAIL: yuvarsithola@hotmail.com
DIRECCION: CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA LOS LAGOS TORRE 1 APTO 301.TELEFONO: 8362780

Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación) I.N.V.E 142	1	$ 150.000	$ 150.000
		TOTAL	**$ 1.840.000**

DATOS DEL CLIENTE

PROPUESTA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO No. 52-24

NOMBRE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO

NIT 813003979-8

DIRECCIÓN SAN AGUSTIN HUILA

TELEFONO 3103401668

EMAIL NO SUMINISTRADO

Ref.: **ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, PARA PAVIMENTO RIGIDO EN LA VEREDA ESTRECHO OBANDO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA.**

ITEM	DESCRIPCION	NORMA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Ensayos de control de calidad					
1	Diseño de concreto, Concreto Hidráulico, para resistencias de 2000 PSI -2500 PSI-3000PSI	INV - E - 630-22	1	$ 520.000	$ 520.000
2	Densidad seca máxima in situ (densidad de campo - cono y arena). (la empresa contratista deberá programar mínimo 3 densidades por visita.)	INV - E - 161	4	$ 100.000	$ 400.000
3	Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos (incluye toma en campo de 4 especímenes cilíndricos, alquiler de equipo, transporte de muestras al laboratorio central, curado e informe final)	INV - E - 630-22	4	$ 80.000	$ 320.000
4	Ejecución de apique a una profundidad máxima de 1.5 m		1	$ 450.000	$ 450.000
5	Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación) I.N.V.E 142	INV - E - 142	1	$ 150.000	$ 150.000
				SUBTOTAL	**$ 1.840.000**
				I.V.A (19%)	**$ 349.600**
				VALOR TOTAL	**$ 2.189.600**

SON: **DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS.M/cte.**

Pitalito 29 de Mayo de 2024

Señores:
junta de acción comunal de la vereda de estrecho Obando.

REF: Cotización control de calidad para pavimento rígido en la vereda de estrecho Obando del municipio de san Agustin departamento Huila.

Cordial saludo

NOTA: El valor cotizado para este trabajo no incluye IVA por el concepto de que no somos responsables de IVA.

En atención a su solicitud, nos permitimos cotizar los ensayos en referencia.

En espera de que nuestra cotización sea de total satisfacción y poder colaborarles.

A continuación, presentaremos los precios unitarios de cada de uno de los ensayos solicitados.

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	APIQUES A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD EL INFORME FINAL CONSTA DE: CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES CBR INALTERADO, CBR SATURADO. RELACION HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO.	Und	2	$ 400.000	$ 800.000
2	VIGAS EN CONCRETO ENSAYO A FLEXIÓN SIMPLE (TRAYÉNDOLAS AL LABORATORIO)	Und	1	$ 30.000	$ 30.000
3	DISEÑO CONCRETO MR-35	Und	1	$ 500.000	$ 500.000
4	DENSIDADES DE CAMPO MÉTODO CONO DE ARENA (SIN TRANSPORTE)	Und	1	$ 70.000	$ 70.000
VALOR TOTAL					
PLAZO OFERTA	20 DÍAS CALENDARIO				
PAGO	50% ANTES DE LOS INICIOS DE LOS TRABAJOS DE LABORATORIO, 50% CUANDO SE ENTREGUE EL INFORME.				

Dirección carrera 9 No 8a-51 Barrio San Antonio Pitalito Huila, teléfono 3188512281
Email: indisuelos@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4818 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OBANDO
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

TOPOGRAFIA

			EMPRESAS		
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PLANEACIÓN Y PROYECTOS**	**D&D**	**SOLUCIONES INGENIERIA**
Levantamiento Topografico	200	Unidad	$950,000.00	$900,000.00	$1,350,000.00
Diseño Geometrico	200	Unidad	$700,000.00	$450,000.00	$1,000,000.00
Materializacion eje del Proyecto	200	Unidad	$950,000.00	$850,000.00	
Control de Niveles	1	Unidad	$0.00	$0.00	
Plano Record final	0	Unidad	$950,000.00	$0.00	
Planos de diseño Estructural	1	Unidad	$0.00	$400,000.00	$900,000.00
TOTAL			**$ 3,550,000.00**	**$ 2,600,000.00**	**$ 3,250,000.00**
TRANSPORTE			CON TRANSPORTE	CON TRANSPORTE	CON TRANSPORTE
FORMA DE PAGO			50-50	50-50	50-50
TIEMPO DE ENTREGA			15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: 30/05/2024

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	·	
Interventoria	·	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

D&D

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE	$2,600,000.00
IVA	$0.00
RETENCION 10% O 11%	NO APLICA
ANTICIPO	$0.00
PARCIAL 2	$2,600,000.00
TOTAL	$2,600,000.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS **Presidente JAC** **Interventoria**

D&D
INGENIERIA

301 348 01 22
301 347 95 51

dydingenieriacivilytopografica@gmail.com

VALOR PROPUESTA.

PROPUESTA ECONOMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR GLOBAL	
1	Levantamiento Topográfico Georreferenciado	$	900,000.00
2	Diseño geométrico	$	450,000.00
3	Planos Diseño Estructural	$	400,000.00
4	Localización y Replanteo de la obra	$	850,000.00
TOTAL		$	2,600,000.00

El valor de la propuesta es de $ 2.600.000, Dos millones seiscientos mil pesos M(CTE).

FORMA DE PAGO.

Para iniciar trabajos y posterior a la firma del contrato, se solicita un anticipo del 50%. Una vez ejecutado el 100% de las actividades contratadas, se solicita el pago del 50% restante.

GARANTÌAS PARA EL CLIENTE.

Una vez revisado el producto por parte de la entidad correspondiente, en caso de ser necesario, se realizarán las subsanaciones a que haya lugar y que sean propias del alcance de la presente cotización.

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

La disponibilidad es inmediata, una vez se efectué el pago del anticipo. El tiempo de ejecución es de 8 días.

DIANA HINET JIMENEZ CHILITO
TEL. 301 3480122
INGENIERA TOPOGRÁFICA

San Agustín, marzo 11 de 20224 **COT. 12.2024**

Señores:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO
MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización Levantamiento Topográfico, Diseño Geométrico y Diseño Estructural Placa Huella Vereda Paradera.
Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos presentar nuestra propuesta económica para la realización del Trabajo de levantamiento topográfico, Diseño Geométrico y Diseño Estructural Placa Huella Vereda Paradera en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 200 metros

1. VALOR DE LA OFERTA

ITEM	UNIDAD	VR. UNITARIO	OBSERVACIONES
Levantamiento topográfico y georreferenciación del proyecto.	Glb	$ 1.350.000	Levantamiento topográfico de 250 metros.
Diseño Geométrico Tramo Placa Huella	Glb	$ 1.000.000	Diseño 250 metros
Planos de diseño Placa según Diseño Tipo Colombia Rural.	Glb	$ 900.000	
Subtotal		$ 3.250.000	

Retenciones 11%: $ 357.500

Son: $ 3.607.500 Tres millones seiscientos siete mil quinientos pesos

Nota: Anticipo del 50% para inicio de trabajos.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se realizará los levantamientos topográficos y georreferenciación al sistema de coordenadas Magna Sirgas y los diseños.

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El trabajo comprende las siguientes actividades:

Pitalito, febrero 19 de 2024

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO
NIT 813003979
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Asunto: Propuesta económica levantamiento topográfico, diseño geométrico, localización y levantamiento plano record para proyecto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Cordial saludo.

Es para nosotros muy importante ofrecer a usted nuestro servicio con profesionalismo, convencidos que podemos satisfacer sus necesidades de seguridad, comodidad y economía en la consultoría en referencia así:

ITEM	DESCRIPCION	UND	VLR TOTAL
1	Levantamiento topográfico para proyectos de pavimentación tipo Placa huella. Levantamiento realizado con estación total de topografía. Nota: El levantamiento topográfico ligado a partir de una georreferenciación con ayuda de herramientas como google earth la cual genera unas coordenadas iniciales aproximadas.	GL	950,000
2	Diseño geométrico de la rasante, acorde a la guía del instituto nacional de vías INVIAS. Se hace entrega de planos planta - perfil y secciones transversales del diseño de rasante, con la descripción de los tipos de curva. Se entrega cálculo de volúmenes de corte y/o terraplen e informe escrito describiendo la metodología empleada, carteras de coordenadas, certificado de calibración de equipos y registro fotográficos.	GL	700,000
3	Localización del diseño geométrico. Materialización del eje del proyecto cada 10 metros en recta y en curva cada 5 metros. En caso de haber sobre ancho localización de éste.	GL	950,000
4	Realización de levantamiento topográfico final. Entrega de plano record.	GL	950,000
			3,550,000
			3,550,000
SON:	TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS		

Calle 3 No 4-60 Pitalito (H)
320 812 6493 - 311 591 1528
carolinabolivarp@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4818 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OBANDO
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

AGREGADOS

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**FUEGO VERDE**	**PETREOS COLOMBIA**	**INDUCON**	**DISMETRIC**
Premezclado 1/2	1	m3		$ 77,350.00		$ 77,350.00
Premezclado 3/4	1	m3				$ 77,350.00
Gravilla 3/4	1	m3		$ 101,150.00	$ 101,150.00	
Gravilla 1/2	0	m3		$ 101,150.00	$ 101,150.00	$ 101,150.00
Sub base granular	1	m3		$ 67,830.00	$ 77,350.00	$ 101,150.00
Base	1	m3		$ 95,200.00	$ 89,250.00	
Material de Cantera	1	m3				
Piedra ciclopeo	1	m3				
Arena Triturada	1	m3		$ 47,600.00		$ 57,600.00
Arena Gruesa	1	m3	$ 27,766.00		$ 59,500.00	
Runcho	1	m3	$ 17,850.00			
Recebo	1	m3	$ 17,850.00			
Mixto de rio	1	m3		$ 53,550.00	$ 89,250.00	
TOTAL			**$ 63,466.00**	**$ 543,830.00**	**$ 517,650.00**	**$ 414,600.00**

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE
FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA	1 dia	1 dia	1 dia	1 dia

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: 30/05/2024

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

DISMETRIC

Firman en aprobación

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

Supervisor INVIAS

Presidente JAC

Interventoria

PETREOS
COLOMBIA S.A.S

Pitalito, Huila 13 de marzo 2024

Ingeniero:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CEREDA EL ESTRECHO OBANDO
NIT: 813003979-8

ASUNTO: COTIZACIÓN

Respetado señor, atendiendo su amable solicitud, PETREOS COLOMBIA. S.A.S. ponemos a su consideración la cotización sobre materiales de construcción.

Se adjunta la siguiente relación:

MATERIAL	VALOR MT3	IVA 19%	VALOR MT3 IVA INCLUIDO
GRAVILLA ¾ - ¾	$ 85.000	$ 16.150	**$ 101.150**
MIXTO DE RIO	$ 45.000	$ 8.550	**$ 53.550**
BASE	$ 80.000	$ 15.200	**$ 95.200**
SUB-BASE	$ 57.000	$ 10.830	**$ 67.830**
PREMEZCLADO	$ 65.000	$ 12.350	**$ 77.350**
ARENA TRITURADA	$ 40.000	$ 7.600	**$ 47.600**

El suministro de Pétreos contempla:

- Los valores indicados no incluyen transporte, este servicio será adicionado al valor de la cotización, ponemos a su disposición transporte Doble Troque, desde la Planta de Pëtreos ubicada en Vereda Matanzas kilómetro 21 vía San Agustín. Valor kilometro $1.000 pesos Mct

Consideraciones:

- El cliente deberá informar y enviar a la persona encargada de recibir el material en la Planta de Pétreos, quien a su vez será el (o la) responsable de comprobar la calidad del material, por lo que no se aceptaran reclamos ni devoluciones.

INDUCON
TRITURADOS

Pitalito 26 de febrero del 2024

Rut: 813003979-8
SEÑOR: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO
Correo: nayduyanith@yahoo.com
Dirección: VDA ESTRECHO OBANDO
Tel:3105727848

Cordial saludo.

Me dirijo a usted con el fin de presentarle la siguiente cotización, de agregados para la construcción. El desarrollo de nuestra actividad las realizamos amparados con los respectivos permisos y licencias otorgados por las entidades competentes "Titulo Minero N° KBN08251, Licencia Ambiental Res.N° 0228 Feb del 2013".

PLANTA INDUCON TRITURADOS

TIPO DE MATERIAL	PRECIO POR METRO CUBICO	PRECIO POR METRO CUBICO
Gravilla ½,3/4, 1 pulgada	SIN IVA $85.000	CON IVA $101.150
BASE	SIN IVA $75.000	CON IVA $89.250
ARENA G	SIN IVA $50.000	CON IVA $59.500
SUBBASE TIPO C	SIN IVA $65.000	CON IVA $77.350
PIEDRA FILTRO (RAJON)	SIN IVA $80.000	CON IVA $95.200
MIXTO	SIN IVA $75.000	CON IVA$89.250

el servicio de transporte es adicional;

Nota: El modo de pago se manejan por anticipos se realizar las consignaciones a la cuenta Corriente Bancolombia N°453229659-51 a nombre de José Hilario Vargas Trilleras. Las respectivas copias de las licencias se facilitan una vez se haya concretado la compra

Atentamente:



JOSE HILARIO VARGAS TRILLERAS
C.C. 12.237.793 De Pitalito Huila
Cel. 3108184433

DISMETRIC SAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION

NIT. 9 0 1 4 5 8 7 0 3 - 4 DECLARANTE DE IVA

FECHA 30/05/2024

PITALITO HUILA

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO

ASUNTO COTIZACION No.0071

Cordial saludo,

Le escribimos con el fin de darle respuesta a su solicitud de cotización de los siguientes materiales puestos en planta

PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL IVA INCLUIDO
PREMEZCLADO 1/2	1	$ 65.000	$ 77.350
PREMEZCLADO DE 3/4	1	$ 65.000	$ 77.350
GRAVILLA 1/2	1	$ 85.000	$ 101.150
GRAVILLA DE 3/4	1	$ 85.000	$ 101.150
ARENA TRITURADA	1	$ 40.000	$ 47.600
PIEDRA CICLOPEO	1	$ 85.000	$ 101.150

San Agustín (Huila) 13 de marzo año 2024

MINA FUEGO VERDE

Señores:
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO
Nit: 813003979-8

ASUNTO: COTIZACIÓN

Respetados señores, atendiendo su amable solicitud, MINA FUEGO VEDE, ponemos a su consideración la cotización sobre materiales de construcción. Se adjunta la siguiente relación:

VALOR MT³ MATERIAL			
MATERIAL	**VR MT³**	**IVA 19%**	**VR TOTAL**
ARENA GRUESA	$23.333	$4.433	$27.766
RUNCHO	$15.000	$2.850	$17.850
RECEBO	$15.000	$2.850	$17.850

Consideraciones:

- El cliente deberá informar y enviar a la persona encargada de recibir el material en la Planta de Mina Fuego Verde, quien a su vez será el (o la) responsable de comprobar la calidad del material, por lo que no se aceptaran reclamos ni devoluciones.
-

Forma de Pago.

- Anticipo por valor del 50%
- Pagos Quincenales según corte realizado amortizando anticipos.

A consideración del cliente los pagos se podrán consignar a la siguiente cuenta:

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4818 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OBANDO
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

TRANSPORTE ACERO

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**LIDIER ALBEIRO FERNANDEZ**	**CRISTIN DAVID ARGOTE LASO**		
Transporte de acero 3/8" de San Agustin a Vereda Pradera	1	Viaje	$ 250,000.00	$ 200,000.00		
TOTAL			**$ 250,000.00**	**$ 200,000.00**	**$ -**	**$ -**
TRANSPORTE			SIN TRANSPORTE	CON TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE
FORMA DE PAGO			CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA			5 dia	5 dia		

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: 30/05/2024

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac		
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	2	

PROVEEDOR SELECCIONADO

LIDIER ALBEIRO FERNANDEZ

Firman en aprobación

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA	1
BASE	
IVA	
RETENCION 2.5% O 3.5%	
ANTICIPO 100%	

Supervisor INVIAS **Presidente JAC** **Interventoria**

San Agustín, marzo 18 de 2024

COTIZACIÓN

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de Pavimento rigido de la Vereda Obando.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la construcción de Pavimento Rígido en la Vereda Obando en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 180 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE ACERO A OBRA
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8	$ 250,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

LIDIER ALBEIRO FERNANDEZ PEREZ
C.C 12.239.650

San Agustin, marzo 18 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de Pavimento rigido de la Vereda Obando.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la construcción de Pavimento Rigido en la Vereda Obando en el Municipio de San Agustin, para un tramo de 180 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE ACERO A OBRA
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8	$ 200,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

Cristian Argote L.

CRISTIAN DAVID ARGOTE LASO
C.C 1.082.780.915

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4818 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OBANDO
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

TRANSPORTE CEMENTO

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SEGUNDO SALAMANCA**	**YOLIMA MUÑÑOZ BOLAÑOS**		
Transporte de cemento (200 sacos) de San Agustin a Vereda Pradera	1	Viaje	$ 250,000.00	$ 250,000.00		
TOTAL			**$ 250,000.00**	**$ 250,000.00**	**$ -**	**$ -**
FORMA DE PAGO			CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPAD	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA			4 dias	5 dias		

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **30/05/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

SEGUNDO SALAMANCA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

Presidente JAC

Interventoria

San Agustín, mayo 29 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de Pavimento rígido de la Vereda Obando.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la construcción de Pavimento Rígido en la Vereda Obando en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 180 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE DE 200 SACOS DE CEMENTO A OBRA
VIAJE TRANSPORTE DE CEMENTO	$ 250,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

Segundo A. Salamanca

SEGUNDO SALAMANCA
C.C 12.142.866

San Agustin, marzo 19 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de Pavimento rígido de la Vereda Obando.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la construcción de Pavimento Rígido en la Vereda Obando en el Municipio de San Agustin, para un tramo de 180 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE DE 200 SACOS DE CEMENTO A OBRA
VIAJE TRANSPORTE DE CEMENTO	$ 250,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

Yolima E. Pinto B.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4818 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OBANDO
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

MAQUINARIA

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SEGUNDO SALAMANCA**	**JHON RENZA**		
MOTONIVELADORA	1	HORAS	$ 140,000.00			
RETROEXCAVADORA	1	HORAS	$ 120,000.00	$ 120,000.00		
VIBRO COMPACTADOR	1	HORAS				
TRANSPORTE VIBRO	1	GLOBAL				
TOTAL			**$ 260,000.00**	**$ 120,000.00**	**$ -**	**$ -**
TRANSPORTE			Transporte vibro 100%			
FORMA DE PAGO			100% transp vibro, 50% alquiler de maquinaria	100% transp vibro, 50% alquiler de maquinaria	50% anticipo	50% anticipo
TIEMPO DE ENTREGA						

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: 30/05/2024

Aprobación	**SI**	**NO**
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

SEGUNDO SALAMANCA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE
IVA
RETENCION 1%
TOTAL A TRANSFERIR

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS **Presidente JAC** **Interventoria**

San Agustín, marzo 13 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Pavimento rigido en la Vereda de Estrecho Obando.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales y alquiler de retroexcavadora de llanta tipo (pajarita) para la construcción de Pavimento rigido en la Vereda Estrecho Obando en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 84 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. KM/M3
TRANSPORTE	1600

DESCRIPCIÓN	VR/HR
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE LLANTA TIPO (PAJARITA)	$ 120,000

Los valores indicados no incluyen retenciones, ponemos a su disposición 4 volquetas sencillas.

Nota: Anticipo del 50% para inicio de trabajos.

Gracias.

Cordialmente.

Segundo A. Salamanca

SEGUNDO SALAMANCA
CC. 12.142.866

San Agustin, marzo 19 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO

REF: Cotización de alquiler de retroexcavadora de llanta tipo (pajarita) para la construcción de Pavimento Rigido en la Vereda de Estrecho Obando.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de alquiler de retroexcavadora de llanta tipo (pajarita) para la construcción de pavimento rigido en la vereda del Estrecho Obando en el Municipio de San Agustin.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR/HR
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE LLANTA TIPO (PAJARITA)	$ 120,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

Nota: Anticipo del 50% para inicio de trabajos.

Gracias.

Cordialmente.

JHON FREDDY RENZA
CC. 83.041.729

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4818 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OBANDO
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

MEZCLADORA

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**JESUS MANUEL**	**NELSON ORTIZ**		
MEZCLADORA 1 BULTO	1	DIA	$ 50,000.00	$ 50,000.00		
TOTAL			**$ 50,000.00**	**$ 50,000.00**	**$ -**	**$ -**
	TRANSPORTE		NO	NO		
	FORMA DE PAGO		50% anticipo	50% anticipo	50% anticipo	50% anticipo
	TIEMPO DE ENTREGA		2 dias	2 dias		

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: 30/05/2024

Aprobación	**SI**	**NO**
Tesorero Jac		
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	2	

PROVEEDOR SELECCIONADO

NELSON ORTIZ

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE
IVA
RETENCION 1%
TOTAL A TRANSFERIR

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS **Presidente JAC** **Interventoria**

San Agustín, Abril 15 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO

REF: Cotización de Alquiler de Mezcladora para la construcción de Pavimento rigido en la Vereda Obando.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de alquiler de mezcladora de concreto para pavimento rigido en la Vereda de Obando en el Municipio de San Agustín.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR/HR
ALQUILER DE MEZCLADORA DE 1 BULTO DIESEL	$ 50,000

Los valores indicados no incluyen retenciones

Nota: Anticipo del 50% para inicio de trabajos.

Gracias.

Cordialmente.

Jesus Manel Anacona

JESUS ANACONA

San Agustín, Abril 15 de 2024

COTIZACIÓN

Señores

JUNTA COMUNAL DE ESTRECHO OBANDO

REF: Cotización de Alquiler de Mezcladora para la construcción de Pavimento Rígido en la Vereda de Obando.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de alquiler de mezcladora de concreto para Pavimento rígido de la Vereda Estrecho Obando en el Municipio de San Agustín.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR/HR
ALQUILER DE MEZCLADORA DE 1 BULTO	$ 50,000

Los valores indicados no incluyen retenciones

Nota: Anticipo del 50% para inicio de trabajos.

Gracias.

Cordialmente.

Nelson Antonio Ortiz

NELSON ANTONIO ORTIZ

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4818 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OBANDO
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

MADERA

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**MADER CENTRAL**	**EL ALTICO**		
TABLA BURRA DE 20CM X 3CM X 3M	1	UNIDAD	$ 18,800.00	$ 18,000.00		
POLIN 5CM X 5CM X3M	1	UNIDAD		$ 7,000.00		
TOTAL			**$ 18,800.00**	**$ 25,000.00**	**$ -**	**$ -**

TRANSPORTE	NO	NO		
FORMA DE PAGO	50% anticipo	50% anticipo	50% anticipo	50% anticipo
TIEMPO DE ENTREGA	2 dias	2 dias		

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: 30/05/2024

Aprobación	**SI**	**NO**
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

EL ALTICO

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE
IVA
RETENCION 1%
TOTAL A TRANSFERIR

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS **Presidente JAC** **Interventoria**

Cotización

Empresa: Mader Central
NIT. 1075253766-2
Dirección: Calle 2 # 11 - 35
Municipio: San Agustín
Correo:
madercentralsanagustine@gmail.com
Teléfono: 3118400430 - 313253642

Cantidad	Concepto	Precio
1	Tabla burra de 20cm	$18,800.00
	Total	$18,800.00

Notas:
*El precio es valido por el mes de marzo de 2024
* El material se debe arreglar para placa huella

Dirigida a: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL OBANDO

REPRESENTANTE LEGAL
ERIKA JASBLEIDI MUÑOZ ZUÑIGA
C.C. 1075253766 de Neiva

EMPRESA FORESTAL RECONOCIDA POR LA CAM
MEDIANTE RESOLUCION N° 635 (23/02/2018)

Empresa: VENTA DE MADERA Y MACHIMBRES EL ALTICO
NIT: 1 082 774 855 – 0 NO RESPONSIBLE DE IVA
Dirección: CALLE 3 # 7 – 56 Barrio San Martin
Teléfono: 312 3918 596 – 313 8021 273 – 311 4789 242
Ciudad: SAN AGUSTIN – HUILA
Correo Electrónico: depositomaderaelaltico@gmail.com
Fecha: 19/03/2024

****VALIDEZ DE LA PROPUESTA = Marzo**

Producto	Cantidad	Vr Unitario
Tabla Burra 20cm x 3cm x 3 m	und	$ 18,000
Polin 5cm x 5cm x 3 m	und	$ 7,000

****NOTA**

- **En caso de Arreglo o Figuración a los productos en mención tienen un costo adicional de $ 1.000**
- **Realizamos todo tipo de formaleta para las diferentes necesidades de la construcción de edificaciones**
- **Todo nuestro material cuenta con los permisos necesarios y autorizados por las entidades de control ambiental a nivel regional y nacional.**

Dirigido a: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO**
NIT 813 003 979 – 8

Anderson Gómez Bolaños

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4818 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OBANDO
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

TRANSPORTE KM/M3

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SEGUNDO SALAMANCA (6M3)**	**PETREOS COLOMBIA (DOBLE TROQUE 14 M3)**	**ENRRIQUE IBARRA (6M3)**	
Transporte Km/m3	1	Km/m3	$ 1,600.00	$ 1,500.00	$ 1,600.00	
Transporte Km/m3 (cantera Petreos Colombia a Vereda Prdera)	26	Km/m3	$ 249,600.00	$ 546,000.00	$ 249,600.00	
TOTAL			**$ 249,600.00**	**$ 546,000.00**	**$ 249,600.00**	**$ -**

FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA	5 dias	5 dias	5 dias

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: 30/05/2024

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac		
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	2	

PROVEEDOR SELECCIONADO

SEGUNDO SALAMANCA

Firman en aprobación

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

Supervisor INVIAS **Presidente JAC** **Interventoria**

San Agustín, marzo 13 de 2024

COTIZACIÓN

Señores

ASOJUNTAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Pradera.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales y alquiler de retroexcavadora de llanta tipo (pajarita) para la Placa Huella Vereda Paradera en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 160 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. KM/M3
TRANSPORTE	1600

DESCRIPCIÓN	VR/HR
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE LLANTA TIPO (PAJARITA)	$ 120,000

Los valores indicados no incluyen retenciones, ponemos a su disposición 4 volquetas sencillas.

Nota: Anticipo del 50% para inicio de trabajos.

Gracias.

Cordialmente.

SEGUNDO SALAMANCA RIVERA
CC. 12.142.866

Pitalito, Huila 18 de marzo 2024

Señores:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA
Nit: 813003285-5

ASUNTO: COTIZACIÓN

Respetados señores, atendiendo su amable solicitud, PETREOS COLOMBIA. S.A.S. ponemos a su consideración la siguiente cotización.

Se adjunta la siguiente relación:

SERVICIO DE TRANSPORTE	KM	VALOR TOTAL
VEREDA QUINCHANA	38	$ 798.000
VEREDA VILLA FATIMA	31	$ 651.000
VEREDA PRADERA	26	$ 546.000
VEREDA OBANDO	24	$ 504.000

Forma de Pago.

- Anticipo por valor del 50%
- Pagos Quincenales según corte realizado amortizando anticipos.

A consideración del cliente los pagos se podrán consignar a las siguientes cuentas:

- **OPCIÓN 1:** cuenta corriente No. 45300001466 de Bancolombia a nombre de PETREOS COLOMBIA SAS.
-

Av. 3 No. 19-276 Sur Pitalito Huila Colombia
Teléfono: (57) (8) 836 91 28 - 3156272801
Email: petreoscolombia@gmail.com

San Agustín, marzo 13 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

ASOJUNTAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Pradera.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Paradera en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 160 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. KM/M3
TRANSPORTE	1600

Los valores indicados no incluyen relenciones.

Nota: Anticipo del 50% para inicio de trabajos.

Gracias.

Cordialmente.

Luis Enrique Ibarra D.

ENRRIQUE IBARRA

ANEXO 11:


INFORME DE PROFESIONALES, TOPOGRAFIA Y ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA MES DE MAYO

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS


INFORME DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

Las actividades que realizó el ingeniero CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Director de interventoría durante el periodo del 1 de Mayo al 30 de Mayo de 2024 fueron:

- Comité virtual inicial con juntas.
- Revisión de documentación

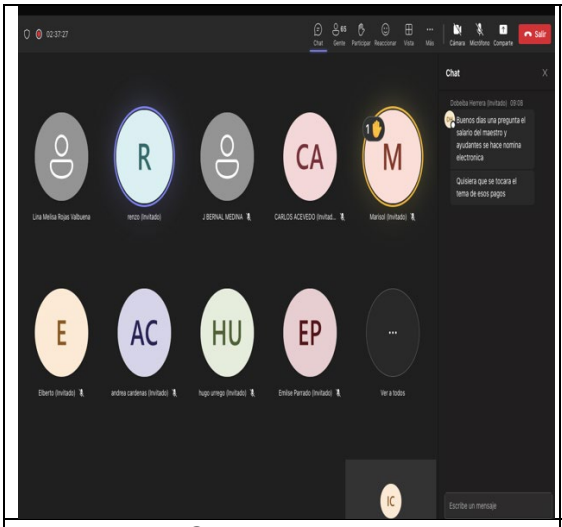

Comité virtual

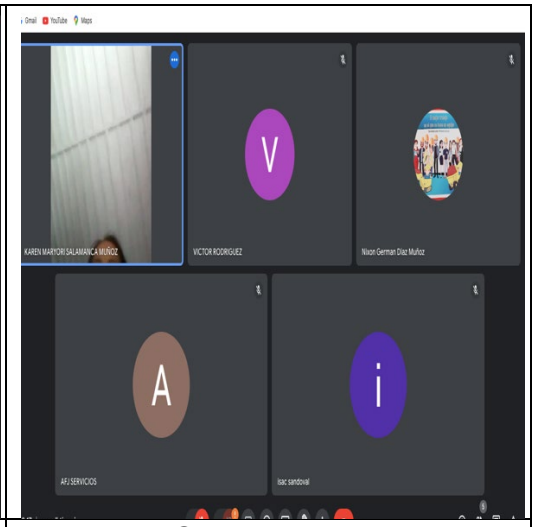

Comité virtual



Comité virtual


Carrera 7 N.º 16 A –31 oficina 1er. Piso – Quirinal, Celular: 3168747742
E-mail: ing.cach76@gmail.com, Neiva- Huila

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

INFORME DE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
JUAN DIEGO HERRERA

Las actividades que realizó ingeniero Ivan Fabricio Sandoval Cardozo residente de interventoría durante el periodo del 1 de Mayo de 2024 al 30 de Mayo de 2024 fueron:

- Comité virtual con juntas.
- Acompañamiento a las juntas de acción comunal
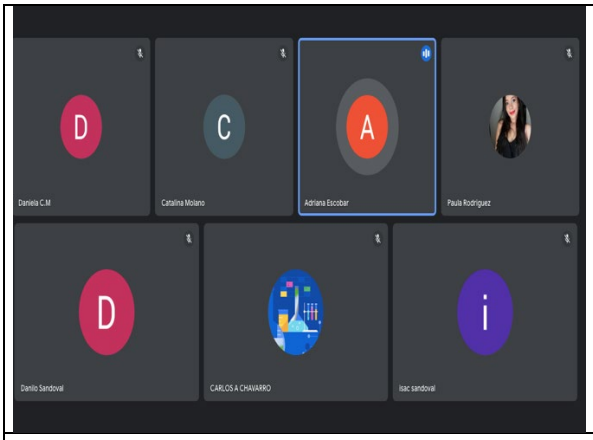
<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Comité virtual</td><td>Comité virtual</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Revisión documentación</td></tr>
</table>

Carrera 7 N.º 16 A –31 oficina 1er. Piso – Quirinal, Celular: 3168747742
E-mail: ing.cach76@gmail.com, Neiva- Huila

Neiva, 12 de junio de 2024. INVIAS.HUI.INT - 78

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN AGUSTIN
Presidente YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO
asociacionmunicipaldejuntas@gmail.com

C.C. Señor:
Ing. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor interventoría – INVIAS HUILA
Dirección: Cr 5 No. 18 – 19 Neiva.
Correo: wsalazar@invias.gov.co

REFERENCIA: Contrato de interventoría 4762 de 2023, cuyo Objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN E ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Asunto: aprobación de estudios y diseños

Respetuoso saludo.

Una vez revisado y analizado por parte de la interventoría los estudios y diseños presentados por la junta me permito avalar dichos diseños para dar inicio a la construcción de la placa huella, a continuación, se envía un breve resumen y análisis de los estudios.

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN – PRADERA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

El proyecto se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de San Agustín del departamento del Huila a una distancia de 10.5 km del casco urbano.



FUENTE DEL RECURSO	VALOR
VALOR CONVENIO	$ 186.893.320

El alcance del proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias – INVIAS, según el convenio No. 3596 DE 2023 contempla una la realización de una placa huella con longitud de 155ml con un ancho de vía de 4.5m.

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
800.1P	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	120
200.2	Desmonte y limpieza de zonas boscosas	Ha	1.40
600.1.1	excavaciones varias sin clasificar	m^3	5.0
320.3	Subbase granular clase C	m^3	130.43
630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) – mezcla in situ	m^3	90.12
630.1.7	Concreto ciclópeo resistencia 14Mpa (G)	m^3	39.66
640.1	Acero de refuerzo de FY = 4200 kg/cm^2 (60000PSI)	Kg	4188.15

Dentro de esta carpeta encontramos 4 carpetas denominadas así:


1. PLANO DWG: contiene 2 archivos denominados así:
   ACAD-PLACA HUELLA PRADERA - V2.bak
   ACAD-PLACA HUELLA PRADERA - V2.dwg
2. PLANO PDF: contiene 1 archivo denominado así:
   ACAD-PLACA HUELLA PRADERA - V2.pdf
3. REPORTES: contiene 7 archivos en Excel denominados así:
   ABSCISA Y CURVA HORIZONTAL.xls
   CARTERA DE CAMPO.XLS
   CARTERA VOLUMEN CORTE RELLENO Y RENIVELACION.XLS
   CURVA HORIZONTAL.xls
   DIF COTAS EJE RENIVELACION VS TERRENO.XLS
   PI.XLS
   PIV ABSCISA.XLS
4. INFORME DISEÑO GEOMÈTRICO VEREDA PRADERA.docx

Por medio de la presente me permito emitir la revisión del capítulo de Informe Diseño Geométrico realizado por la Ingeniera Topográfica DIANA HINET JIMENEZ CHILITO.

Dentro del informe se presentan

PARAMETROS DE DISEÑO	
Tipo de vía	Rural o de tercer orden
Ancho de banca	4.5m
Pendiente promedio	12% (ondulado)
Velocidad de diseño (Vd)	30 km/h
Peralte	2%
Vehículo de diseño	C3 – C2
Radio de curvatura mínimo	7

El diseño de la vía se compone de una calzada de 4.5 m de ancho de corona, comprende dos huellas de anchos de 0,90 metros cada uno y pasos de piedra pegada uno central con un ancho de 0,90 metros, de la misma manera se contempla la construcción de berma-cunetas para garantizar el manejo de las aguas.

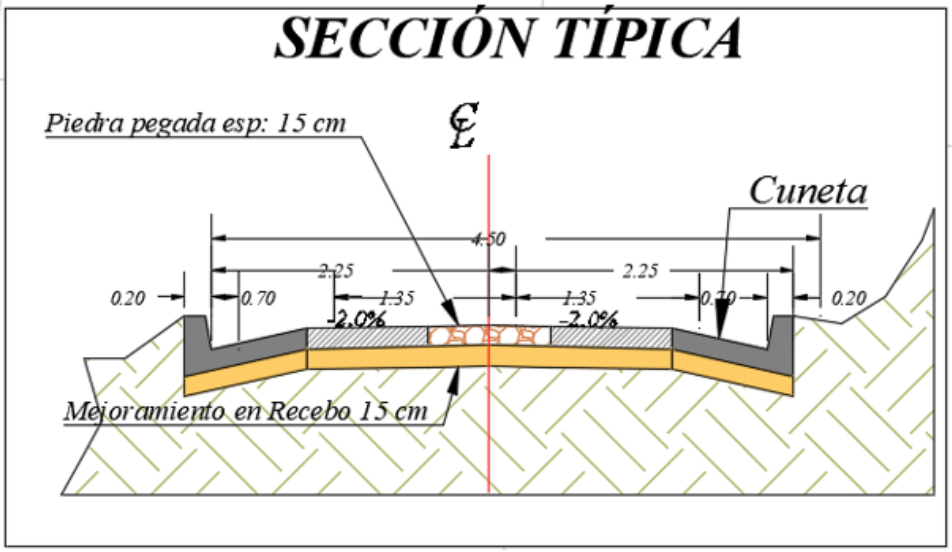

Del K 0+000 al K 0+160 en corte para K0+160 metros: 99.35 m^3 y relleno K0+160 metros: 18.61 m^3

- **GEOTECNIA**

Dentro de este capítulo encontramos un archivo denominado APIQUES VEREDA LA PRADERA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN.pdf

Por medio de la presente me permito emitir la revisión de los Estudios de exploración Geotécnica y ensayos de laboratorios realizados por la empresa INDISUELOS INGENIERIA DISEÑO Y SUELOS con fecha de 01 de abril de 2024.

Dentro del informe se evidencia que se realizaron 2 apiques a 1.50m de profundidad descritos así:

Apique No. 1:
Presenta una estratigrafía así: 0m – 0.15m una capa de mejoramiento; 0.15m – 1.50m una grava limosa con presencia de arenas color habano oscuro (GM), CBR inalterado 8.8 y CBR saturado 0.0, LL= NL, LP= NP, IP= NIP.

Apique No. 2:
Presenta una estratigrafía así: 0m – 0.15m una capa de mejoramiento; 0.15m – 1.50m una grava limosa con presencia de arenas color habano oscuro (GM), CBR inalterado 9.6 y CBR saturado 0.0, LL=NL, LP= NP, IP= NIP.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que durante el proceso constructivo se debe garantizar el cumplimiento de las condiciones mínimas de diseño contempladas en el presente informe, dentro de las cuales se destacan las siguientes:

- El espesor mínimo de subbase granular por colocar debe ser de 15 cm.
- La subrasante y la subbase granular deben ser debidamente compactadas hasta alcanzar la resistencia se diseño.
- Se debe garantizar el confinamiento de la subbase granular mediante la riostra y el bordillo.

- Las cuantías de acero de refuerzo propuestas corresponden a la cuantía de acero mínima requerida según el diseño, de tal manera que una variación en los espaciamientos, diámetro o longitud de las barras puede dar lugar a fallas estructurales.
- Las juntas de construcción de la placa-huella deben hacerse a un tercio de la longitud de la misma, medido desde la riostra y en ese punto se permite traslapo de máximo el 50% del refuerzo longitudinal
- La Junta de construcción de la riostra debe hacerse a 30 cm del punto donde termina la placa-huella, en este punto se permite traslapo de máximo el 50% del acero longitudinal.

Para más información se puede visitar el siguiente enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/6644-guia-de-disenoo-de-pavimentos-con-placa-huella/file

Atentamente,

CARMEN ELISA CARDOZO MORENO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS
INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
R.L. CONSORCIO R&C

Neiva, 12 de junio de 2024. INVIAS.HUI.INT - 79

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUNIN
Presidente VICTOR LOPEZ ORTIZ
yulylililopez@gmail.com

C.C. Señor:
Ing. Wilder Orley Salazar Cuellar
Supervisor interventoría – INVIAS HUILA
Dirección: Cr 5 No. 18 – 19 Neiva.
Correo: wsalazar@invias.gov.co

REFERENCIA: Contrato de interventoría 4762 de 2023, cuyo Objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN E ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Asunto: aprobación de estudios y diseños

Una vez revisado y analizado por parte de la interventoría los estudios y diseños presentados por la junta me permito avalar dichos diseños para dar inicio a la construcción de la placa huella, a continuación, se envía un breve resumen y análisis de los estudios.

Respetuoso saludo.

MUNICIPIO DE ISNOS – BAJO JUNIN

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

El proyecto se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Isnos del departamento del Huila a una distancia de 10.2 km del casco urbano.



FUENTE DEL RECURSO	VALOR
VALOR CONVENIO	$ 188.449.269

El alcance del proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, según el convenio No. 3991de 2023 contempla una la realización de una placa huella con longitud de 161ml con un ancho de vía de 5m.

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
800.1P	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	24
200.2	Desmonte y limpieza de zonas boscosas	Ha	1.60
600.1.1	excavaciones varias sin clasificar	m^3	5.20
320.3	Subbase granular clase C	m^3	135.48
630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) – mezcla in situ	m^3	93.84
630.1.7	Concreto ciclópeo resistencia 14Mpa (G)	m^3	41.31
640.1	Acero de refuerzo de FY = 4200 kg/cm^2 (60000PSI)	Kg	4356.32

Dentro de esta carpeta se encuentran 12 archivos denominados así:

- CARTERA DE DISEÑO-BAJO JUNIN (1).xlsx
- CERTIFICADO COPNIA (1).pdf
- DISEÑO EN PERFIL.pdf
- DISEÑO EN PLANTA.pdf
- DISEÑO PLACA HUELLA - BAJO JUNÍN-ESTRUCTURAL (1).pdf
- DISEÑO PLACA HUELLA - BAJO JUNÍN-PLANTA PERFIL (1).pdf
- DISEÑO PLACA HUELLA - BAJO JUNÍN-SECCIONES T. (1).pdf
- DOCUMENTOS ROBERTO (1).pdf
- INFORME DISEÑO PH-BAJO JUNIN-CAMINOS C (1).pdf
- PERALTADO 2.pdf
- PERALTADO.pdf
- PLACA HUELLA BAJO JUNIN.csv

- **GEOTECNIA**

Dentro de este capítulo encontramos un archivo denominado APIQUES ISNOS HUILA.pdf

Por medio de la presente me permito emitir la revisión de los Estudios de exploración Geotécnica y ensayos de laboratorios realizados por la empresa INDISUELOS INGENIERIA DISEÑO Y SUELOS con fecha de 01 de abril de 2024.

Dentro del informe se evidencia que se realizaron 2 apiques a 1.50m de profundidad descritos así:

Apique No. 1:
Presenta una estratigrafía así: 0.0m – 0.30m una capa de mejoramiento; 0.30m – 1.50m un limo inorgánico de baja plasticidad, color café y veta gris (ML), CBR inalterado 7.3 y CBR saturado 4.4, LL= 39, LP= 19.7, IP= 19.3.

Apique No. 2:
Presenta una estratigrafía así: 0m – 0.25m una capa de mejoramiento; 0.25m – 1.50m un limo inorgánico de plasticidad media, color café veta amarilla (MH), CBR inalterado 6.1 y CBR saturado 3.6, LL=54.8, LP= 35.9, IP= 18.9.


- **GEOMETRICO**

Por medio de la presente me permito emitir la revisión del Informe Diseño Geométrico y Estructural realizados por el Ingeniero ROBRTO ÑAÑEZ MUÑOZ con fecha de marzo de 2024.

Dentro del informe se presentan

PARAMETROS DE DISEÑO	
Periodo de diseño	20 años
Tipo de vía	Rural o de tercer orden
Ancho de banca	5m
Pendiente promedio	8% (ondulado)
Velocidad de diseño (Vd)	30 km/h
Peralte	2%
Vehículo de diseño	C3 – C2
Radio de curvatura mínimo	15

El diseño de la vía se compone de una calzada de 5.0 m de ancho de corona, comprende dos huellas de anchos de 0,90 metros cada uno y pasos de piedra pegada uno central con un ancho de 0,90 metros y dos huellas laterales de 0.45 m cada una; de la misma manera se contempla la construcción de berma-cunetas para garantizar el manejo de las aguas

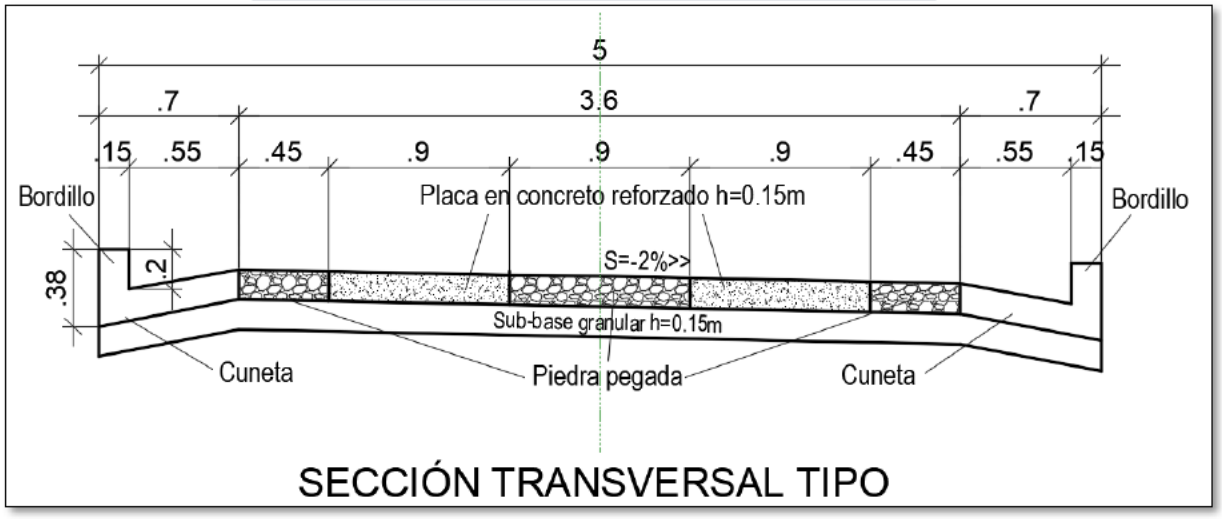

RECOMENDACIONES

Se recomienda que durante el proceso constructivo se debe garantizar el cumplimiento de las condiciones mínimas de diseño contempladas en el presente informe, dentro de las cuales se destacan las siguientes:

- El espesor mínimo de subbase granular por colocar debe ser de 15 cm.
- La subrasante y la subbase granular deben ser debidamente compactadas hasta alcanzar la resistencia se diseño.
- Se debe garantizar el confinamiento de la subbase granular mediante la riostra y el bordillo.
- Las cuantías de acero de refuerzo propuestas corresponden a la cuantía de acero mínima requerida según el diseño, de tal manera que una variación en los espaciamientos, diámetro o longitud de las barras puede dar lugar a fallas estructurales.
- Las juntas de construcción de la placa-huella deben hacerse a un tercio de la longitud de la misma, medido desde la riostra y en ese punto se permite traslapo de máximo el 50% del refuerzo longitudinal

- La Junta de construcción de la riostra debe hacerse a 30 cm del punto donde termina la placa-huella, en este punto se permite traslapo de máximo el 50% del acero longitudinal.

Para más información se puede visitar el siguiente enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/6644-guia-de-disenoo-de-pavimentos-con-placa-huella/file

Atentamente,

CARMEN ELISA CARDOZO MORENO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS
INTERVENTORIA


CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
R.L. CONSORCIO R&C

ANEXO 12:

INFORME AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO MES DE JULIO

ANEXO 13:
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASOJUNTA
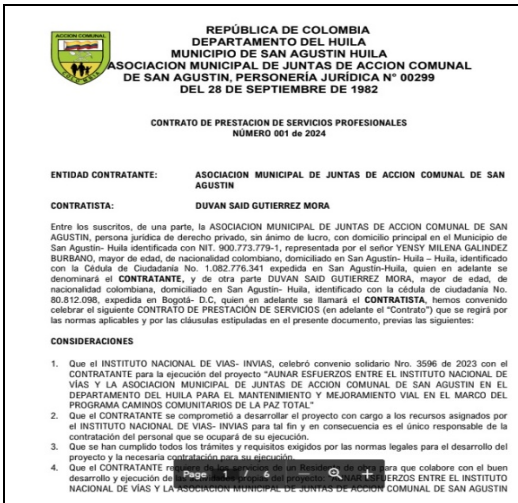
<table>
<tr>
<td>
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA
ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DE SAN AGUSTIN, PERSONERÍA JURÍDICA N° 00299
DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1982

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
NÚMERO 001 de 2024

ENTIDAD CONTRATANTE: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
CONTRATISTA: DUVAN SAID GUTIERREZ MORA

Entre los suscritos, de una parte, la ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de San Agustín- Huila identificada con NIT. 900.773.779-1, representada por el señor YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO, mayor de edad, de nacionalidad colombiano, domiciliado en San Agustín- Huila – Huila, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.082.776.341 expedida en San Agustín-Huila, quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE**, y de otra parte DUVAN SAID GUTIERREZ MORA, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en San Agustín- Huila, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.812.098, expedida en Bogotá- D.C, quien en adelante se llamará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el siguiente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (en adelante el "Contrato") que se regirá por las normas aplicables y por las cláusulas estipuladas en el presente documento, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES



1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, celebró convenio solidario Nro. 3596 de 2023 con el CONTRATANTE para la ejecución del proyecto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
2. Que el CONTRATANTE se comprometió a desarrollar el proyecto con cargo a los recursos asignados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS para tal fin y en consecuencia es el único responsable de la contratación del personal que se ocupará de su ejecución.
3. Que se han cumplido todos los trámites y requisitos exigidos por las normas legales para el desarrollo del proyecto y la necesaria contratación para su ejecución.
4. Que el CONTRATANTE requiere de los servicios de un Residente de obra para que colabore con el buen desarrollo y ejecución de los [illegible] del proyecto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN</td>
<td>
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN AGUSTÍN
MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN- HUILA
PERSONERÍA JURÍDICA N° 00299
DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1982

San Agustín- Huila; 16 de mayo de 2024


Señores:
BANCO AV VILLAS
Pitalito- Huila

Referencia: Solicitud de Transferencias (Pagos a proveedores y/o prestadores de servicios)


En el marco dell convenio solidario No. 3413 de 2023, celebrado entre la ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN, identificada con NIT. 900.773.779-1 y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, solicitamos repetuosamente realizar las transferencias que se mencionan a continuación, las cuales suman en total el valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MLC ($3.817.127)

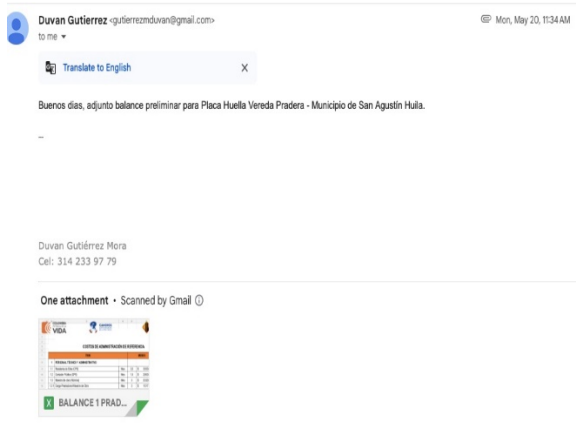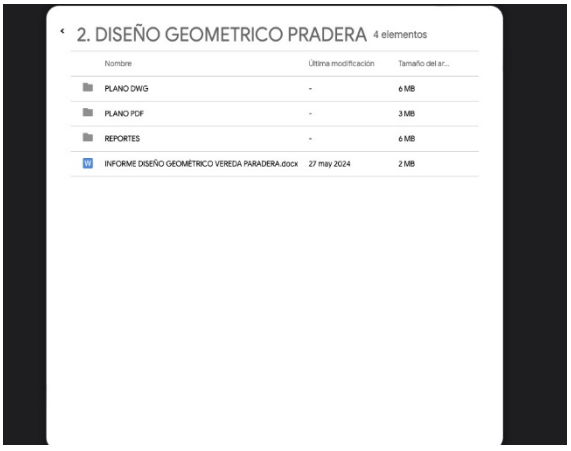N° DE TRANS	DESCRIPCIÓN	NOMBRE TITULAR	NIT/ C.C	VALOR FACTURA	RETENCIÓN EN LA FUENTE	VALOR TRANS
1	Levantamiento Topográfico Georreferenciado, Diseño geométrico, Planos Diseño Estructural, Localización y Replanteo de la obra	D&D INGENIERÍA CIVIL Y TOPOGRÁFICA SAS	901.296.729	1,300,000	52,000	1,248,000
2	Laboratorios para placa huella en la vereda Predera del municipio de san Agustín Huila.	FERNANDO AUGUSTO ROJAS CHAUX	83.043.664	790,000	31,600	758,400
3	Reintegro dinero pagado por concepto de pólizas de inicio y reinicio.	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN	900.773.779	1,810,727	-	1,810,727
Total						3,817,127
</td>
</tr>
<tr>
<td>Contratación</td>
<td>Transferencias</td>
</tr>
<tr>
<td>
Duvan Gutierrez <gutierrezmduvan@gmail.com> Mon, May 20, 11:34 AM
to me
Translate to English
Buenos dias, adjunto balance preliminar para Placa Huella Vereda Pradera - Municipio de San Agustín Huila.
--
Duvan Gutiérrez Mora
Cel: 314 233 97 79
One attachment • Scanned by Gmail
BALANCE 1 PRAD...</td>
<td>
2. DISEÑO GEOMETRICO PRADERA 4 elementos
Nombre	Última modificación	Tamaño del ar...
PLANO DWG	-	6 MB
PLANO PDF	-	3 MB
REPORTES	-	6 MB
INFORME DISEÑO GEOMÉTRICO VEREDA PARADERA.docx	27 may 2024	2 MB
</td>
</tr>
<tr>
<td>Balance</td>
<td>Diseño Paca huella</td>
</tr>
</table>

BAJO JUNIN

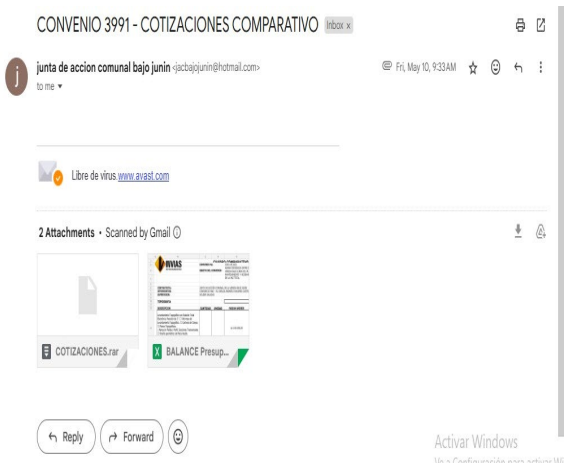


COTIZACIONES PRESENTADA

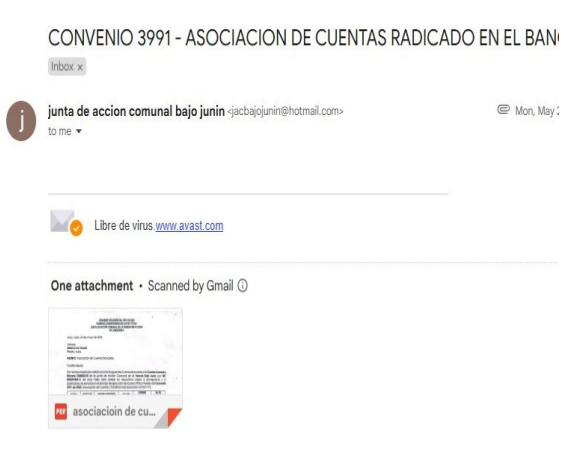


ENTREGA CUENTAS RADICADAS EN BANCO




ENTREGA CONTRATOS

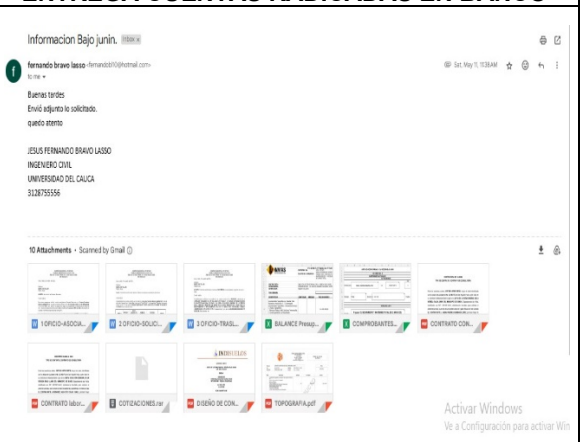

ENTREGA INFORMACION FINAL

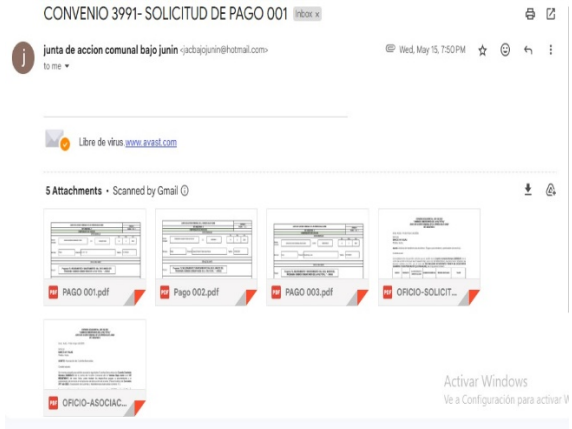


SOLICITUD PAGO

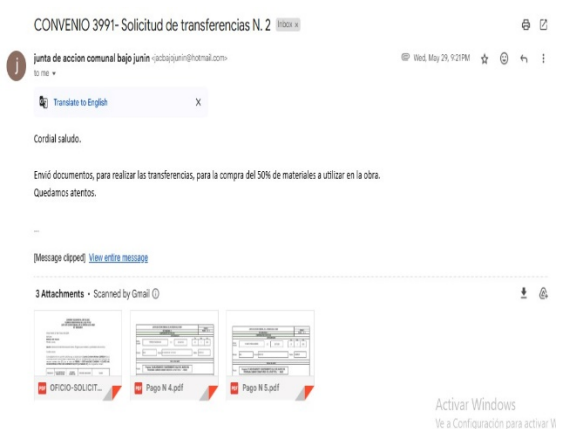

SOLICITUD TRANSFERENCIA

VILLA FATIMA

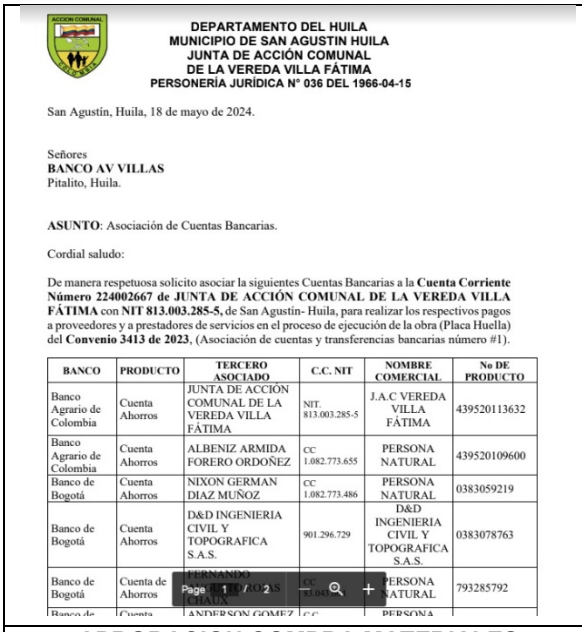

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA
PERSONERÍA JURÍDICA N° 036 DEL 1966-04-15

San Agustín, Huila, 18 de mayo de 2024.

Señores
BANCO AV VILLAS
Pitalito, Huila.

ASUNTO: Asociación de Cuentas Bancarias.


Cordial saludo:

De manera respetuosa solicito asociar la siguientes Cuentas Bancarias a la **Cuenta Corriente Número 224002667 de JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA** con **NIT 813.003.285-5,** de San Agustín- Huila, para realizar los respectivos pagos a proveedores y a prestadores de servicios en el proceso de ejecución de la obra (Placa Huella) del **Convenio 3413 de 2023**, (Asociación de cuentas y transferencias bancarias número #1).

BANCO	PRODUCTO	TERCERO ASOCIADO	C.C. NIT	NOMBRE COMERCIAL	No DE PRODUCTO
Banco Agrario de Colombia	Cuenta Ahorros	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA	NIT. 813.003.285-5	J.A.C VEREDA VILLA FÁTIMA	439520113632
Banco Agrario de Colombia	Cuenta Ahorros	ALBENIZ ARMIDA FORERO ORDOÑEZ	CC 1.082.773.655	PERSONA NATURAL	439520109600
Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	NIXON GERMAN DIAZ MUÑOZ	CC 1.082.773.486	PERSONA NATURAL	0383059219
Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	D&D INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFICA S.A.S.	901.296.729	D&D INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFICA S.A.S.	0383078763
Banco de Bogotá	Cuenta de Ahorros	FERNANDO [illegible]	CC [illegible]	PERSONA NATURAL	793285792
[illegible]	[illegible]	ANDERSON GOMEZ [illegible]	C.C. [illegible]	PERSONA [illegible]	[illegible]

Page 1 / 2

APROBACION COMPRA MATERIALES

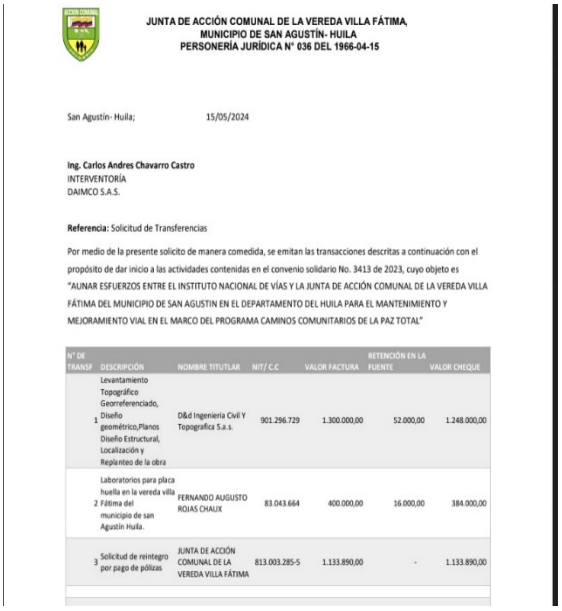

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA,
MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN- HUILA
PERSONERÍA JURÍDICA N° 036 DEL 1966-04-15

San Agustín- Huila; 15/05/2024


Ing. Carlos Andres Chavarro Castro
INTERVENTORÍA
DAIMCO S.A.S.

Referencia: Solicitud de Transferencias

Por medio de la presente solicito de manera comedida, se emitan las transacciones descritas a continuación con el propósito de dar inicio a las actividades contenidas en el convenio solidario No. 3413 de 2023, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

N° DE TRANSF	DESCRIPCIÓN	NOMBRE TITULAR	NIT/ C.C	VALOR FACTURA	RETENCIÓN EN LA FUENTE	VALOR CHEQUE
1	Levantamiento Topográfico Georreferenciado, Diseño geométrico,Planos Diseño Estructural, Localización y Replanteo de la obra	D&d Ingenieria Civil Y Topografica S.a.s.	901.296.729	1.300.000,00	52.000,00	1.248.000,00
2	Laboratorios para placa huella en la vereda villa Fátima del municipio de san Agustin Huila.	FERNANDO AUGUSTO ROJAS CHAUX	83.043.664	400.000,00	16.000,00	384.000,00
3	Solicitud de reintegro por pago de pólizas	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA	813.003.285-5	1.133.890,00	-	1.133.890,00

TRANSFERENCIAS

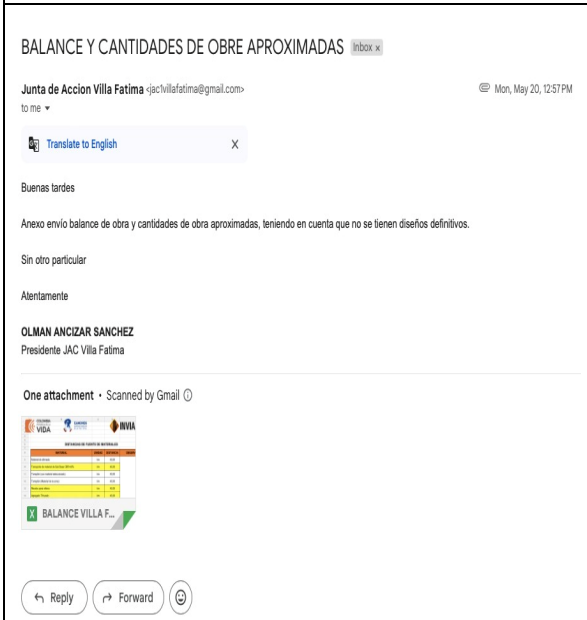

BALANCE Y CANTIDADES DE OBRE APROXIMADAS Inbox x

Junta de Accion Villa Fatima <jacvillafatima@gmail.com> Mon, May 20, 12:57 PM
to me

Translate to English X

Buenas tardes

Anexo envío balance de obra y cantidades de obra aproximadas, teniendo en cuenta que no se tienen diseños definitivos.

Sin otro particular

Atentamente


OLMAN ANCIZAR SANCHEZ
Presidente JAC Villa Fatima

One attachment • Scanned by Gmail

BALANCE VILLA F...

Reply Forward

BALANCE DE OBRA

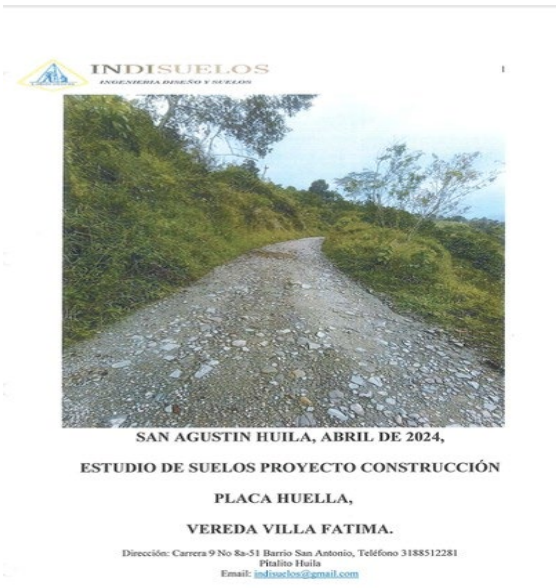

INDISUELOS
INGENIERIA DISEÑO Y SUELOS

SAN AGUSTIN HUILA, ABRIL DE 2024,

ESTUDIO DE SUELOS PROYECTO CONSTRUCCIÓN


PLACA HUELLA,

VEREDA VILLA FATIMA.

Dirección: Carrera 9 No 8a-51 Barrio San Antonio, Teléfono 3188512281
Pitalito Huila
Email: indisuelos@gmail.com

ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PUERTO QUINCHANA
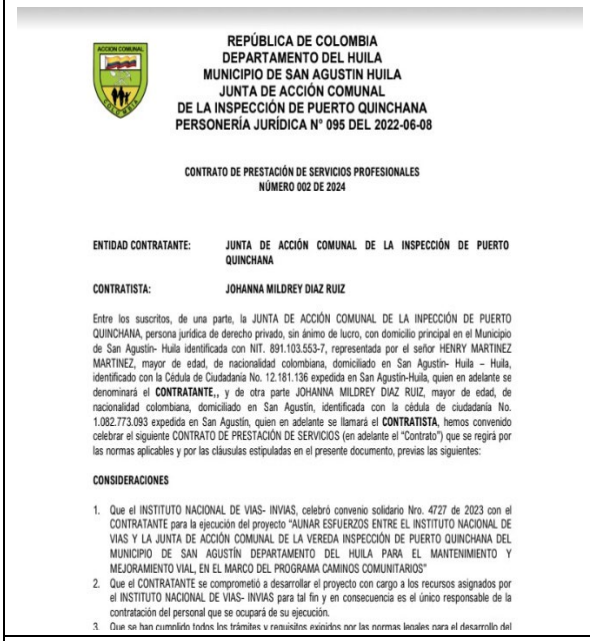
<table>
<tr>
<td>
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA
PERSONERÍA JURÍDICA N° 095 DEL 2022-06-08

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NÚMERO 002 DE 2024

ENTIDAD CONTRATANTE: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA
CONTRATISTA: JOHANNA MILDREY DIAZ RUIZ

Entre los suscritos, de una parte, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de San Agustín- Huila identificada con NIT. 891.103.553-7, representada por el señor HENRY MARTINEZ MARTINEZ, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en San Agustín- Huila – Huila, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 12.181.136 expedida en San Agustín-Huila, quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE.**, y de otra parte JOHANNA MILDREY DIAZ RUIZ, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en San Agustín, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.082.773.093 expedida en San Agustín, quien en adelante se llamará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el siguiente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (en adelante el "Contrato") que se regirá por las normas aplicables y por las cláusulas estipuladas en el presente documento, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, celebró convenio solidario Nro. 4727 de 2023 con el CONTRATANTE para la ejecución del proyecto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS"
2. Que el CONTRATANTE se comprometió a desarrollar el proyecto con cargo a los recursos asignados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS para tal fin y en consecuencia es el único responsable de la contratación del personal que se ocupará de su ejecución.
3. Que se han cumplido todos los trámites y requisitos exigidos por las normas legales para el desarrollo del

APROBACION DE COMPRAS</td>
<td>
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN- HUILA
PERSONERÍA JURÍDICA N° 865 DEL 1966-07-05


San Agustín- Huila; 17 de mayo de 2024


Señores:
BANCO AV VILLAS
Pitalito- Huila

Referencia: Solicitud de Transferencias (Pagos a proveedores y/o prestadores de servicios)

En el marco dell convenio solidario No. 4727de 2023, celebrado entre la LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN , identificada con NIT. 891.103.553-7 y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, solicitamos repetuosamente realizar las transferencias que se mencionan a continuación, las cuales suman en total el valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MLC ($3.856.052)

TRANSF	DESCRIPCIÓN	NOMBRE TITUTLAR	NIT/ C.C	VALOR FACTURA	RETENCIÓN EN LA FUENTE	VALOR TRANSFER
1	Levantamiento Topográfico Georreferenciado Diseño geométrico de la subrasante Localización y Replanteo de la obra.	DYD INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFICA SAS	901.296.729	1.300.000	52.000	1.248.000
2	Laboratorios para placa huella en la inspección de Puerto Quinchana del municipio de san Agustín Huila.	FERNANDO AUGUSTO ROJAS CHAUX	83.043.664	790.000	31.600	758.400
3	Reintegro dinero pagado por concepto de pólizas de inicio, Prorroga y suspensión.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO QUINCHANA	891.103.553	1.849.652		1.849.652
Total						3.856.052

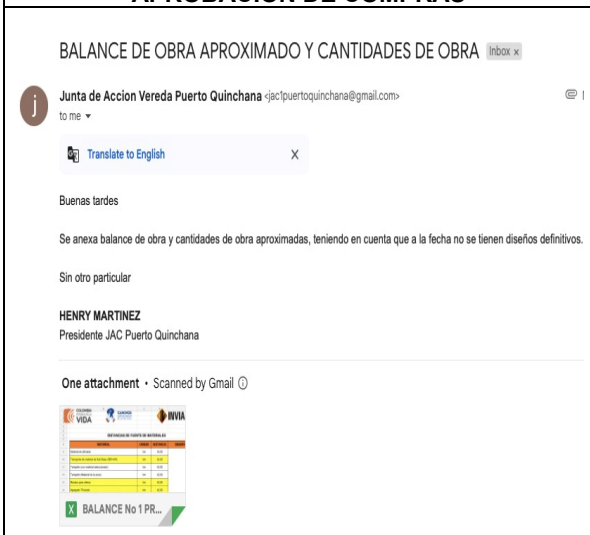TRANSFERENCIAS</td>
</tr>
<tr>
<td>
BALANCE DE OBRA APROXIMADO Y CANTIDADES DE OBRA Inbox ×
Junta de Accion Vereda Puerto Quinchana <jac1puertoquinchana@gmail.com>
to me
Translate to English ×
Buenas tardes
Se anexa balance de obra y cantidades de obra aproximadas, teniendo en cuenta que a la fecha no se tienen diseños definitivos.
Sin otro particular
HENRY MARTINEZ
Presidente JAC Puerto Quinchana
One attachment • Scanned by Gmail
BALANCE No 1 PR...

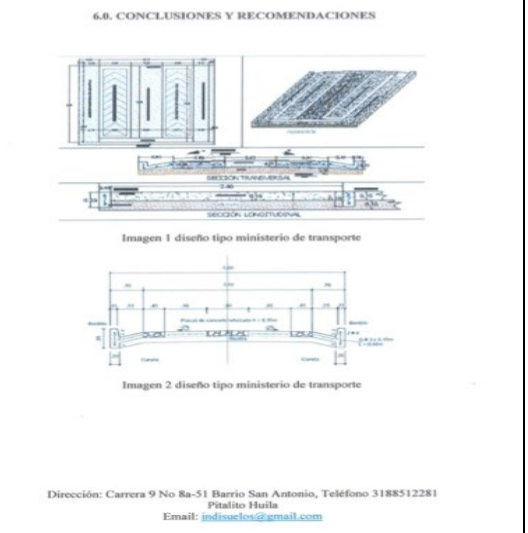BALANCE DE OBRA</td>
<td>
6.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Imagen 1 diseño tipo ministerio de transporte
Imagen 2 diseño tipo ministerio de transporte
Dirección: Carrera 9 No 8a-51 Barrio San Antonio, Teléfono 3188512281
Pitalito Huila
Email: indisuelos@gmail.com

ENTREGA DE DISEÑOS</td>
</tr>
</table>
