INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
01 al 30 abril de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4348 de 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TINCACHOQUE MUNICIO DE GUATEQUE

Contrato de Interventoría 2878 de 2023 **Interventoría:** HERBY LUNA CRUZ

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** ABRIL 1 al 30 DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		3
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2,2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecucion del proyecto		5
2,3	Inventario y estado inicial de la vía		5
2,4	Características técnicas del proyecto		6
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		7
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		7
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		8
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		9
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	,9-13
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	14
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	,14-15
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	16
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	17
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	18
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	.19-26
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	27
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		28
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	28
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	,29-30
	• Seguimiento Programa de Obra		,31-53
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	54
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	54
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	,55-57
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		58
5.1	Información general del contrato		58
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		59
5.3	Informes especialistas y profesionales		,60-77
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		No aplica
5.5	Informe matriz de riesgos.		No aplica
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		No aplica
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		No aplica
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		78
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	78
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	79
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	80
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	,81-84
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	85
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		86
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	86
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	86
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	86
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	86
7	**Conclusiones y recomendaciones**		87
8	**Anexos**		87
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		88
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		89
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		No aplica
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		,90-102

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MATRICULA PROFESIONAL: 041-037-0618068 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
01 al 30 abril de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
	VERSION	
	PÁGINA	

FECHA: 1/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA **PERIODO MES:** Abril 01 al 30 de 2024

CONVENIO No.: 4348 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TINCACHOQUE MUNICIPIO DE GUATEQUE

PLAZO INICIAL:	4 meses
FECHA DE INICIO:	05 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	30 de diciembre de 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	16 de enero de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2024
PLAZO ACUMULADO:	5 meses
PRÓRROGA	24/05/2024
FECHA VENCIMIENTO FINAL:	24/05/2024

VALOR INICIAL :	$ 249.705.462,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 249.705.462,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2878 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	placa huella	ml	200
Estructuras	Alcantarillas	UNIDAD	2
	Muro de Contención		
Mantenimiento	limpieza alcantarilla		
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	placahuella	ml	120	150
Estructuras	Alcantarillas	UNIDAD	0,2	2
	Muro de Contención			
Mantenimiento	limpieza alcantarilla			
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 191.215.679,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 5.736.470,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 52.753.313,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 249.705.462,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 32.608.864,00	$ 184.265.251,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 11.741.136,00	$ 37.234.149,00
VALOR EJECUTADO	$ 44.350.000,00	$ 221.499.400,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 160.975.460,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 184.265.251,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 114,47%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 16

REGISTRO FOTOGRÁFICO













PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520242574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
01 al 30 abril de 2024

1 INTRODUCCION

El convenio # 4348 de 2023 celebrado entre el Instituto Nacional de vías con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUEÁ identificado número de NIT 900.007.956**-2**, que tiene como objeto, **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**. Se impartió orden de inicio al convenio con fecha 05 de diciembre de 2023.

Por otra parte, mediante el proceso de selección de mínima cuantía No. **IP-DT-BOY-021- 2023**, El Instituto Nacional de Vías, celebró el contrato No **2878 de 2023**, entre el INVIAS y **HERBY LUNA CRUZ** la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE Y GUAYATÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**. Mediante invitación pública No. **IP-DT-BOY-021-2023** por el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**, asimismo, se impartió orden de inicio al contrato de Interventoría con fecha 01 de noviembre de 2023.

El presente informe de Interventoría N° 5 describe las actividades realizadas en el periodo de 01 al 30 de abril de 2024, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para los convenios solidarios suscritos entre el invias y las organizaciones de acción comunal de los municipios de Guateque y Guayata, en el departamento de Boyacá para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

2.1 Localización y alcance

Guateque es un municipio colombiano capital de la Provincia del Oriente en el suroeste del departamento de Boyacá, 125 kilómetros al sur de Tunja, capital departamental, y a 112 km al este de Bogotá. El municipio está ubicado en las estribaciones de la cordillera oriental, teniendo un relieve ondulado, quebrado y escarpado. Guateque tiene como cuenca principal el río Súnuba, formado por la unión de los ríos Aguacias y Machetá, y desemboca en la represa de Chivor.

El municipio de Guateque tiene una población de 10.921 personas, de las cuales 6.985 viven en el casco urbano y 2.937 habitan la zona rural. Es uno de los más densos del departamento.



Localización de Guateque en Colombia


Ubicación de Guateque en Boyacá



Ubicación vereda Tincachoque



Tramo a intervenir

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los municipios por beneficiarse se encuentran Guayata y Guateque, ya que la vía terciaria a intervenir es una via que acorta el camino entre Guayata y Guateque, acortando el tiempo de viaje ya que la vía principal no se encuentra en buen estado, también beneficia a la comunidad de la vereda chitavita y tincachoque ya que muchas de las personas viven de la agronomía y este mejoramiento vial ayuda a sacar sus productos para comercializarlos y que los niños tengan fácil acceso a sus escuelas.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

se hace necesario efectuar por parte del Organismo de Acción Comunal, con seguimiento y aprobación del interventor, la corroboración en el sitio de las condiciones del terreno donde se ejecutarán las obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construcción de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes, obras de contención de baja complejidad, etc.

El inventario depende de la "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE

VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir.



Ilustración 2. Estado inicial de la vía vereda tincachoque Guateque.

2.4 Características técnicas del proyecto

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

Por regla general las Juntas de Acción Comunal solo pueden desarrollar actividades dentro del territorio de su zona de influencia (barrio, sector, etapa, vereda, corregimiento, etc.) dependiendo de la división establecida por el Distrito o Municipio respectivo. El artículo 9° de la Ley 2166 de 2021 -en lo relacionado con las JAC.

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

En la siguiente tabla se muestra la información general del convenio.

CONVENIO No.	4348 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE
NIT	900.007.956-2
FECHA INICIACIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	CUATRO MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL CON PRORROGA	30 DE ABRIL DE 2024
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	30 DE DICIEMBRE DE 2023
TIEMPO DE SUSPENSION	No aplica
AMPLIACION SUSPENSION	No aplica
REANUDACION	16 DE ENERO DE 2024
FECHA TERMINACION FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION FINAL CON PRORROGA	24 DE MAYO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SECENTA Y DOS PESOS ($249.705.462) MONEDA CORRIENTE
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$249.705.462,oo

3.2 Descripción de actividades ejecutadas en el mes

En el convenio 4348 de la vereda de Tincachoque en el municipio de Guateque en el mes de abril se terminaron de construir las dos alcantarillas, se fundió placa huella en el tramo 2 124 metros de 130 metros, se fundieron 75 metros de bordillo; En el tramo 2 se fundieron 70 metros de centros y se iniciaron a instalar riostras para amarras el refuerzo de las huellas.

3.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

En este periodo no fue necesario adelantar nuevos precios.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

i. Gestión Ambiental

Se revisó de la disposición final de rcd en la obra y se revisaron licencias ambientales de las canteras de suministro de la obra.

ii. Gestión Social

En la vereda de Tincachoque en el municipio de Guateque se revisaron formatos para liquidar la parte social.

iii. SST

En la vereda Tincachoque del municipio de Guateque se realizó capacitación de uso de estos equipos de protección personal.

iv. Técnica

En la vereda Tincachoque del municipio de Guateque se construyó en su totalidad las dos alcantarillas, se fundió placa huella en el tramo 2 124 metros de 130 metros, se fundieron 75 metros de bordillo; En el tramo 2 se fundieron 70 metros de centros y se iniciaron a instalar riostras para amarras el refuerzo de las huellas.

INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
01 al 30 abril de 2024

4 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informes Semanales

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA	8/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL EN SECTOR VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA SEMANA No.: 15 del 1/04/2024 al 7/04/2024 Último Informe Semanal SI ( ) (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 200 ml Y 2 ALCANTARILLAS EN SECTOR DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

CONVENIO No.	4348	VALOR INICIAL:	$ 249.705.462,00
FECHA DE INICIO:	Dic 05 de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	Dic 31 de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 249.705.462,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	Mayo 24 de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	HERBY LUNA CRUZ		
INTEGRANTES:	HERBY LUNA CRUZ		
CONTRATO No.	2878 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 67.954.000,00
FECHA DE INICIO:	Nov 01 de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 13.962.722,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	Dic 31 de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 81.916.722,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	Mayo 24 de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 249.705.462	$ 249.705.462		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 178.849.400		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 249.705.462	$ 70.856.062		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 67.954.000,00	$ 81.916.722		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 72.172.322		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.954.000,00	$ 9.744.400		

(E)jecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 249.705.462,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 110.985.400,00	44,44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 153.356.387,00	61,41%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 42.390.987,00	16,98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 25.493.013,00	10,21%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 166.985.300,00	66,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 178.849.400,00	71,62%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 11.864.100,00	4,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.310.100,00	6,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.698.054,00	10,29%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.916.722,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.172.322,00	88,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-073540
PERIODO FACTURADO: MARZO
VALOR FACTURA: $ 12.028.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 44,44% Avance o Atraso Físico % 16,98%
Meta Física Ejecutada % 61,41%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	ALCANTARILLAS	Unidad	2
*	PLACA HUELLA	ML	200
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Física	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1	1		2	100,0%
Ejec	1	0,8		1,8	90,0%
Prog	130	70		200	100,0%
Ejec	45			45	22,5%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 4
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE LLEVAN 45 METROS FUNDIDOS DE CENTROS SOBRE ANCHOS Y HUELLAS DEL TRAMO 1 DE PLACA HUELLA Y 21 METROS DE CUNETA AL COSTADO DERECHO

FUNDIR 15 METROS MAS DE PLACA HUELLA Y 30 METROS DE CUNETA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

SE LLEVAN 45 METROS FUNDIDOS DE CENTROS SOBRE ANCHOS Y HUELLAS DEL TRAMO 1 DE PLACA HUELLA Y 21 METROS DE CUNETA AL COSTADO DERECHO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HERBY LUNA CRUZ
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
01 al 30 abril de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 14/04/2024 (DÍA / MES / AÑO)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL EN SECTOR VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA | SEMANA No.: 16 del 8/04/2024 al 14/04/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI [ ]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 200 ml Y 2 ALCANTARILLAS EN SECTOR DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

CONVENIO No.	4348	VALOR INICIAL:	$ 249.705.462,00
FECHA DE INICIO:	Dic 05 de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	Dic 31 de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 249.705.462,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	Mayo 24 de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	HERBY LUNA CRUZ		
INTEGRANTES:	HERBY LUNA CRUZ		
CONTRATO No.	2878 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 67.954.000,00
FECHA DE INICIO:	Nov 01 de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 13.962.722,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	Dic 31 de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 81.916.722,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	Mayo 24 de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 249.705.462	$ 249.705.462		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 197.849.400		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 249.705.462	$ 51.856.062		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 67.954.000,00	$ 81.916.722		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 73.777.922		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.954.000,00	$ 8.138.800		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 249.705.462,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 127.689.540,00	51,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 168.803.647,00	67,60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 41.114.107,00	16,47%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 29.045.753,00	11,63%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 181.698.740,00	72,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 197.849.400,00	79,23%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 16.150.660,00	6,47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.713.440,00	5,89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.000.000,00	7,61%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.916.722,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73.777.922,00	90,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-073540
PERIODO FACTURADO: MARZO
VALOR FACTURA: $ 12.028.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 51,14% | Avance o Atraso Físico %: 16,47%
Meta Física Ejecutada %: 67,60%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	ALCANTARILLAS	Unidad	2
*	PLACA HUELLA	ML	200
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1	1		2	100,0%
Ejec	1	0,8		1,8	90,0%
Prog	130	70		200	100,0%
Ejec	65			65	32,5%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 4
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE LLEVAN 65 METROS FUNDIDOS DE CENTROS SOBRE ANCHOS Y HUELLAS DEL TRAMO 1 DE PLACA HUELLA Y 60 METROS DE CUNETA EN AÑOS COSTADOS

FUNDIR 15 METROS MAS DE PLACA HUELLA Y 30 METROS DE CUNETA

VII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

SE LLEVAN 65 METROS FUNDIDOS DE CENTROS SOBRE ANCHOS Y HUELLAS DEL TRAMO 1 DE PLACA HUELLA Y 60 METROS DE CUNETA EN AÑOS COSTADOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HERBY LUNA CRUZ
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
01 al 30 abril de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	
	FECHA	22/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL EN SECTOR VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA SEMANA No.: 17 del 15/04/2024 al 21/04/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 200 ml Y 2 ALCANTARILLAS EN SECTOR DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

CONVENIO No. 4348 VALOR INICIAL: $ 249.705.462,00

FECHA DE INICIO: Dic 05 de 2023 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Dic 31 de 2023 VALOR ACUMULADO: $ 249.705.462,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Mayo 24 de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ

INTEGRANTES: HERBY LUNA CRUZ

CONTRATO No. 2878 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 67.954.000,00

FECHA DE INICIO: Nov 01 de 2023 VALOR ADICIONES: $ 13.962.722,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Dic 31 de 2023 VALOR ACUMULADO: $ 81.916.722,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Mayo 24 de 2024 VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 249.705.462	$ 249.705.462		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 200.699.400		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 249.705.462	$ 49.006.062		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 67.954.000,00	$ 81.916.722		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 75.383.522		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.954.000,00	$ 6.533.200		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 249.705.462,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 138.654.320,00	55,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 171.653.647,00	68,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 32.999.327,00	13,22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 29.045.753,00	11,63%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 193.654.200,00	77,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 200.699.400,00	80,37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 7.045.200,00	2,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.955.460,00	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.850.000,00	1,14%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.916.722,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 75.383.522,00	92,02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VJVRAZ-073540

PERIODO FACTURADO: MARZO

VALOR FACTURA: $ 12.028.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 55,53% Avance o Atraso Físico % 13,22%

Meta Física Ejecutada % 68,74%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	ALCANTARILLAS	Unidad	2
*	PLACA HUELLA	ML	200
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1	1		2	100,0%
Ejec	1	0,9		1,9	95,0%
Prog	130	70		200	100,0%
Ejec	90			90	45,0%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____		
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____		
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____		
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 5

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE LLEVAN 100 METROS FUNDIDOS DE CENTROS 90 METROS CON SOBRE ANCHOS Y HUELLAS DEL TRAMO 1 DE PLACA HUELLA Y 80 METROS DE CUNETA EN AMBOS COSTADOS, SE FUNDIO EL DESCOLE DE ALCANTARILLA 2

FUNDIR 15 METROS MAS DE PLACA HUELLA Y 30 METROS DE CUNETA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

SE LLEVAN 100 METROS FUNDIDOS DE CENTROS 90 METROS CON SOBRE ANCHOS Y HUELLAS DEL TRAMO 1 DE PLACA HUELLA Y 80 METROS DE CUNETA EN AMBOS COSTADOS, SE FUNDIO EL DESCOLE DE ALCANTARILLA 2

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HERBY LUNA CRUZ

Matrícula Profesional No.: 26202 42574 CND

Original: Informe mensual de interventoría, Archivo de Gestión del Proyecto
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
01 al 30 abril de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 29/04/2024 (DIA / MES / AÑO)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL EN SECTOR VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA SEMANA No.: 18 del 22/04/2024 al 28/04/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE EN GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 200 ml Y 2 ALCANTARILLAS EN SECTOR DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

CONVENIO No. 4348
FECHA DE INICIO: Dic 05 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Dic 31 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Mayo 24 de 2024

VALOR INICIAL: $ 249.705.462,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 249.705.462,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
INTEGRANTES: HERBY LUNA CRUZ
CONTRATO No. 2878 DE 2023
FECHA DE INICIO: Nov 01 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Dic 31 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Mayo 24 de 2024

VALOR INICIAL: $ 67.954.000,00
VALOR ADICIONES: $ 13.962.722,00
VALOR ACUMULADO: $ 81.916.722,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 249.705.462	$ 249.705.462		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 211.099.400		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 249.705.462	$ 38.606.062		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 67.954.000,00	$ 81.916.722		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 76.898.122		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.954.000,00	$ 5.018.600		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores sin pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 249.705.462,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149.700.650,00	59,95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 177.959.449,00	71,27%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 28.258.799,00	11,32%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 33.139.951,00	13,27%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201.875.600,00	80,85%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 211.099.400,00	84,54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 9.223.800,00	3,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.221.400,00	3,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.400.000,00	4,16%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.916.722,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.898.122,00	93,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-073540
PERIODO FACTURADO: MARZO
VALOR FACTURA: $ 12.028.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 59,95% Avance o Atraso Físico % 11,32%
Meta Física Ejecutada % 71,27%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	ALCANTARILLAS	Unidad	2
*	PLACA HUELLA	ML	200
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1	1		2	100,0%
Ejec	1	0,9		1,9	95,0%
Prog	130	70		200	100,0%
Ejec	110			110	55,0%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI ____	NO ____	N/A ____	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____	.....
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____	.....
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____	.....
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 5
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE LLEVAN 110 METROS FUNDIDOS DE CENTROS SOBRE ANCHOS Y HUELLAS DEL TRAMO 1 DE PLACA HUELLA Y 110 METROS DE CUNETA EN AMBOS COSTADOS, Y SE REALIZO TRAZO DEL TRAMO 2 DE PLACA HUELLA.

FUNDIR 15 METROS MAS DE PLACA HUELLA Y 30 METROS DE CUNETA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUY AN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

SE LLEVAN 110 METROS FUNDIDOS DE CENTROS SOBRE ANCHOS Y HUELLAS DEL TRAMO 1 DE PLACA HUELLA Y 110 METROS DE CUNETA EN AMBOS COSTADOS, Y SE REALIZO TRAZO DEL TRAMO 2 DE PLACA HUELLA.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HERBY LUNA CRUZ
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
01 al 30 abril de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | VERSIÓN | PAGINA

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL EN SECTOR VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA | SEMANA No.: 19 del 29/04/2024 al 5/05/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 200 ml Y 2 ALCANTARILLAS EN SECTOR DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

CONVENIO No.	4348	VALOR INICIAL:	$ 249.705.462,00
FECHA DE INICIO:	Dic 05 de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	Dic 31 de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 249.705.462,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	Mayo 24 de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
INTEGRANTES: HERBY LUNA CRUZ

CONTRATO No.	2878 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 67.954.000,00
FECHA DE INICIO:	Nov 01 de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 13.962.722,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	Dic 31 de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 81.916.722,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	Mayo 24 de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 249.705.462	$ 249.705.462		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 221.499.400		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 249.705.462	$ 28.206.062		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 67.954.000,00	$ 81.916.722		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 78.594.722		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.954.000,00	$ 3.322.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 249.705.462,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 160.975.460,00	64,47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 184.265.251,00	73,79%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 23.289.791,00	9,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 37.234.149,00	14,91%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 209.875.600,00	84,05%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 221.499.400,00	88,70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 11.623.800,00	4,66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.000.000,00	3,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.400.000,00	4,16%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.916.722,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.594.722,00	95,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-073540
PERIODO FACTURADO: MARZO
VALOR FACTURA: $ 12.028.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 64,47% | Avance o Atraso Físico % 9,33%
Meta Física Ejecutada % 73,79%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
ALCANTARILLAS	Unidad	2
PLACA HUELLA	ML	200

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1	1		2	100,0%
Ejec	1	1		2	100,0%
Prog	130	70		200	100,0%
Ejec	130	20		150	75,0%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____		
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____		
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____		
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 5
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE LLEVAN 124 METROS FUNDIDOS DE CENTROS SOBRE ANCHOS HUELLAS Y CUNETAS, Y 70 METROS DE BORDILLO POR AMBOS COSTADOS DEL TRAMO 1 DE PLACA HUELLA, SE FUNDIO EL ENCOLE DE LA ALCANTARILLA 2 Y SE FUNDIERON 70 METRSO DE CENTROS Y SE INSTALARON RIOSTRAS EN EL TRAMO 2 DE PLACA HUELLA.

FUNDIR LOS 6 METROS MAS DE PLACA HUELLA DEL TRAMO 1 Y ARMAR PARA FUNDIR HUELLAS EN EL TRAMO 2.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

SE LLEVAN 124 METROS FUNDIDOS DE CENTROS SOBRE ANCHOS HUELLAS Y CUNETAS, Y 70 METROS DE BORDILLO POR AMBOS COSTADOS DEL TRAMO 1 DE PLACA HUELLA, SE FUNDIO EL ENCOLE DE LA ALCANTARILLA 2 Y SE FUNDIERON 70 METRSO DE CENTROS Y SE INSTALARON RIOSTRAS EN EL TRAMO 2 DE PLACA HUELLA.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: HERBY LUNA CRUZ
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
01 al 30 abril de 2024

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4348 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TINCACHOQUE MUNICIPIO DE GUATEQUE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2878 de 2023 **INTERVENTORÍA:** HERBY LUNA CRUZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC	10 TON	TRAMO 2		X																												
MEZCLADORA DE CONCRETO	BAUKER	1 1/2 BULTO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VIBRADOR DE CONCRETO	TDK			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	3%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: En este periodo no se ejecutaron obras

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JOHAN SEBASTIAN PEREZ HEREDIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0538200 CND

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSION	1
		PAGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 4348 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TINCACHOQUE MUNICIPIO DE GUATEQUE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril de 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUTEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2878 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

NOMBRE ARL: COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOHAN SEBASTIAN PEREZ HEREDIA	1.010.219.297	Residente de obra.	$ 2.718.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.718.000,00	$ 189.200	V	FAMISANAR	9466513407	$ 339.800	PORVENIR	9466513407	$ 434.900	$ 108.800	$ -	$ -	
2	DIANA MARCELA RUIZ BOHORQUEZ	23.623.983	Contadora	$ 1.632.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.500.000,00	$ 8.600	I	FAMISANAR	9466513407	$ 204.000	PORVENIR	9466513407	$ 261.200	$ 65.300	$ -	$ -	
3	SALVADOR CARDENAS	74280317	ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9466513407	$ 162.500	PORVENIR	9466513407	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4	CRISTIAN GONCEL	1049234121	ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 78.500	V	NUEVA EPS	9466513407	$ 162.500	PORVENIR	9466513407	$ 208.000	$ 45.100	$ -	$ -	
5	ALVARO RODRIGUEZ	74280432	ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9466513407	$ 162.500	PORVENIR	9466513407	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
6	JOSE RODRIGUEZ	74281440	oficial	$ 1.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.600.000,00	$ 111.400	V	NUEVA EPS	9466513407	$ 200.000	PORVENIR	9466513407	$ 256.000	$ 64.000			
7	LUIS INSUASTI	98332565	ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9466513407	$ 162.500	PORVENIR	9466513407	$ 208.000	$ 52.000			
8	PABLO EMILIO BOHORQUEZ R.	1.051.336.831	maestro	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.700.000,00	$ 118.400	V	NUEVA EPS	9466513407	$ 212.500	PORVENIR	9466513407	$ 272.000	$ 68.000			
9	OMAR MARTIN VACA	7282057	ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9466513407	$ 162.500	PORVENIR	9466513407	$ 208.000	$ 52.000			
10	VICTOR GUAYACUNDO	1049234123	ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9466513407	$ 162.500	PORVENIR	9466513407	$ 208.000	$ 52.000			
11	JOSE PIÑEROS	1049798597	ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 68.400	V	NUEVA EPS	9466513407	$ 108.400	PORVENIR	9466513407	$ 138.700	$ 34.700			
12	MIGUEL CARDENAS	1002314437	ayudante	$ 1.300.000			$ 1.300.000,00	$ 63.400	V	NUEVA EPS	9466513407	$ 113.800	PORVENIR	9466513407	$ 145.600	$ 36.400			
13	CRISTIAN GUERRERO	1049794050	ayudante	$ 1.300.000			$ 1.300.000,00	$ 24.200	V	NUEVA EPS	9466513407	$ 43.400	PORVENIR	9466513407	$ 55.500	$ 13.900			
14	OMAR GUERRERO	9620264	ayudante	$ 1.300.000			$ 1.300.000,00	$ 45.300	V	NUEVA EPS	9466513407	$ 81.300	PORVENIR	9466513407	$ 104.000	$ 26.000			
15	JOOSE MOLINA	74280686	ayudante	$ 1.300.000			$ 1.300.000,00	$ 48.300	V	NUEVA EPS	9466513407	$ 86.700	PORVENIR	9466513407	$ 111.000	$ 27.800			
16	MAURICIO MORENO	7282337	ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9466513407	$ 162.500	PORVENIR	9466513407	$ 208.000	$ 52.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 01 de mayo de 2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOHAN SEBASTIAN PEREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0538200 CND

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900007956	2	JAC VDA TINCACHOQUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JAC TINCACHOQUE	CALLE 9 716	GUATEQUE-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	9466513407	9466513407	E	2024/05/15	2024/05/02	BANCO DE BOGOTA	0	$8,858,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: JAC TINCACHOQUE (15 Afiliados)						$18,584,669	$2,973,800			$18,584,669	$2,323,500			$18,411,335	$736,700			$18,584,669	$1,282,100		$18,411,335	$921,300
Centro de Trabajo: JAC TINCACHOQUE (15 Afiliados)						$18,584,669	$2,973,800			$18,584,669	$2,323,500			$18,411,335	$736,700			$18,584,669	$1,282,100		$18,411,335	$921,300
Ciudad: GUATEQUE Depto: BOYACA (15 Afiliados)						$18,584,669	$2,973,800			$18,584,669	$2,323,500			$18,411,335	$736,700			$18,584,669	$1,282,100		$18,411,335	$921,300
1	CC	1051336831	BOHORQUEZ PABLO	230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS041	30	$1,700,000	$212,500	CCF10	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	$118,400	30	$1,700,000	$85,000
2	CC	1002314437	CARDENAS MIGUEL	230301	21	$910,000	$145,600	EPS041	21	$910,000	$113,800	CCF10	21	$910,000	$36,400	14-4	21	$910,000	$63,400	21	$910,000	$45,500
3	CC	74280317	CARDENAS SALVADOR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
4	CC	1049234123	DONCEL CRISTIAN	25-14	26	$1,126,667	$180,300	EPS041	26	$1,126,667	$140,900	CCF10	26	$1,126,667	$45,100	14-4	26	$1,126,667	$78,500	26	$1,126,667	$56,500
5	CC	1049234123	DONCEL CRISTIAN	25-14	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$21,700	CCF10	0	$0	$0	14-4	4	$173,334	$0	0	$0	$0
6	CC	1049621970	GUAYACUNDO VICTOR	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
7	CC	1049794050	GUERRERO CRISTIAN	25-14	8	$346,667	$55,500	EPS041	8	$346,667	$43,400	CCF10	8	$346,667	$13,900	14-4	8	$346,667	$24,200	8	$346,667	$17,500
8	CC	9620264	GUERRERO OMAR	231001	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$81,300	CCF10	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	$45,300	15	$650,000	$32,500
9	CC	98332565	INGUASTI LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
10	CC	1051336498	MARTIN OMAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
11	CC	74280866	MOLINA JOSE	25-14	16	$693,334	$111,000	EPS041	16	$693,334	$86,700	CCF10	16	$693,334	$27,800	14-4	16	$693,334	$48,300	16	$693,334	$34,800
12	CC	74282337	MORENO MAURICIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
13	CC	1010219297	PEREZ JOHAN	230301	30	$2,718,000	$434,900	EPS017	30	$2,718,000	$339,800	CCF10	30	$2,718,000	$108,800	14-4	30	$2,718,000	$189,200	30	$2,718,000	$136,000
14	CC	1049798597	PIÑEROS JOSE	230301	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$108,400	CCF10	20	$866,667	$34,700	14-4	20	$866,667	$60,400	20	$866,667	$43,500
15	CC	74280432	RODRIGUEZ ALVARO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
16	CC	74281440	RODRIGUEZ JOSE	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS041	30	$1,600,000	$200,000	CCF10	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	$111,400	30	$1,600,000	$80,000
	EMPLEADO			**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: OFICINA (1 Afiliados)						$1,632,000	$261,200			$1,632,000	$204,000			$1,632,000	$65,300			$1,632,000	$8,600		$1,632,000	$81,700
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)						$1,632,000	$261,200			$1,632,000	$204,000			$1,632,000	$65,300			$1,632,000	$8,600		$1,632,000	$81,700
Ciudad: GUATEQUE Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,632,000	$261,200			$1,632,000	$204,000			$1,632,000	$65,300			$1,632,000	$8,600		$1,632,000	$81,700
17	CC	23623983	RUIZ DIANA	230301	30	$1,632,000	$261,200	EPS037	30	$1,632,000	$204,000	CCF10	30	$1,632,000	$65,300	14-4	30	$1,632,000	$8,600	30	$1,632,000	$81,700
Total	**Afiliados(16)**					$20,216,669	$3,235,000			$20,216,669	$2,527,500			$20,043,335	$802,000			$20,216,669	$1,290,700		$20,043,335	$1,003,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900007956	2	JAC VDA TINCACHOQUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JAC TINCACHOQUE	CALLE 9 716	GUATEQUE-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	9466513407	9466513407	E	2024/05/15	2024/05/02	BANCO DE BOGOTA	0	$8,858,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$3,235,000	$0	$0	$3,235,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$104,000	$0	$0	$104,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$790,600	$0	$0	$790,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,068,400	$0	$0	$2,068,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$272,000	$0	$0	$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,290,700	$0	$0	$1,290,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	16	$1,290,700	$0	$0	$1,290,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$802,000	$0	$0	$802,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	$802,000	$0	$0	$802,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$2,527,500	$0	$0	$2,527,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$339,800	$0	$0	$339,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$637,400	$0	$0	$637,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$1,387,800	$0	$0	$1,387,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$601,800	$0	$0	$601,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	16	$601,800	$0	$0	$601,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$401,200	$0	$0	$401,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	16	$401,200	$0	$0	$401,200
TOTAL				16	$8,858,200	$0	$0	$8,858,200

INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
01 al 30 abril de 2024

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 1/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 4348 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TONCACHOQUE MUNICIPIO DE GUATEQUE

MES INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2878 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	115523	2402-0600-14-0-2402041-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 249.705.462,00	$ 249.705.462,00
TOTAL						$ 249.705.462,00	$ 249.705.462,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 249.705.462,00 **VALOR BÁSICO DEL CONTRATO OBRA:** $ 249.705.462,00

ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA: $ 0,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		diciembre	$ 5.705.000,00	$ 0,00	$ 5.705.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 244.000.462,00	115523	$ 0,00					
2		enero	$ 86.162.900,00	$ 0,00	$ 86.162.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.837.562,00	115523	$ 0,00					
3		febrero	$ 37.818.500,00	$ 0,00	$ 37.818.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.019.062,00	115523	$ 0,00					
4		marzo	$ 47.463.000,00	$ 0,00	$ 47.463.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.556.062,00	115523	$ 0,00					
5		abril	$ 44.350.000,00	$ 0,00	$ 44.350.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.206.062,00	115523	$ 0,00					
TOTALES			$ 221.499.400,00	$ -	$ 221.499.400,00	$ -	$ -	$ 28.206.062,00		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 184.265.251,00		**$ 184.265.251,00**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 37.234.149,00	$ 0,00	**$ 37.234.149,00**
PAGA Y APORTE JAC			
AJUSTES			
VALOR TOTAL	$ 221.499.400,00	$ 0,00	**$ 221.499.400,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

NOTA 2: En este periodo no facturo el contratista de obra. Se adelantaron actividades de estudios y diseños

Firma

Nombre: JOHAN SEBASTIAN PEREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0538200 CND

Firma

Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 Estado general del tiempo.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 4348 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TINCACHOQUE MUNICIPIO DE GUATEQUE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1/04/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2878 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Seco	22	22	21	20	19	23	21	19	24	23	21	24	24	24	24	24	24	24	17	18	12	22	23	24	22	24	21	10	22	20		588
Lluvias moderadas	2	2	2	2	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	2	1	0	2	0	2	5	2	2		46
Lluvias intensas			1	2	3			3											4	3	6						1	9		2		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
El tiempo se presento seco

Firma
Nombre: JOHAN SEBASTIAN PEREZ HEREDIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:091037-0538200 CND

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstac	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departar	Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspensio	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calific	NivelAproba
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	1/04/2024 0:00	1	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	2/04/2024 0:00	0.5	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	3/04/2024 0:00	3.8	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	4/04/2024 0:00	5.2	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	5/04/2024 0:00	6	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	6/04/2024 0:00	0.5	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	7/04/2024 0:00	2	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	8/04/2024 0:00	6.7	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	9/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	10/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	11/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	12/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	13/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	14/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	15/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	16/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	17/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	18/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	19/04/2024 0:00	7.6	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	20/04/2024 0:00	6.5	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	21/04/2024 0:00	12.5	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	22/04/2024 0:00	2	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	23/04/2024 0:00	1	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	24/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	25/04/2024 0:00	1.2	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	26/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	27/04/2024 0:00	3.2	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	28/04/2024 0:00	32.5	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	29/04/2024 0:00	2.4	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	30/04/2024 0:00	4.5	50		900

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No.: 4348 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TINCACHOQUE MUNICIPIO DE GUATEQUE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2878 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									

OBSERVACIONES:

En este periodo no se realizaron ensayos de laboratorio.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma: Sebastian PH.
Nombre: JOHAN SEBASTIAN PEREZ HEREDIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:091037-0538200 CND

Firma:
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Directoe de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520242574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 5 (Día) | 5 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No. 4348 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TINCACHOQUE MUNICIPIO DE GUATEQUE

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 5/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 249.705.462,00
VALOR ACUMULADO: $ 249.705.462,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 0,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 0,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2878 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 50.141.092,40	11	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 12.535.273,10	11	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 75.211.638,60	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100038650
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	92,91%	$ 232.000.000,00	11	11	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100005092 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL SEGUROS
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 50.141.092,40	5	12	2023	22	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 12.535.273,10	5	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 75.211.638,60	30	3	2024	30	4	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100038650
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520242574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.21 08:45:32 -05:00

Código de Seguridad: PEOqbEkvflbkIgt8Ec96nQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPS2580000000027-0001

No. PÓLIZA	EY-100005092	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36161459	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNI	No. DOC. IDENTIDAD	900.807.956-2
DIRECCIÓN	VEREDA TINCACHOQUE	TELÉFONO	3112290982
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNI	No. DOC. IDENTIDAD	900.807.956-2
DIRECCIÓN	VEREDA TINCACHOQUE	TELÉFONO	3112290982
BENEFICIARIO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNI	No. DOC. IDENTIDAD	900.807.956-2
DIRECCIÓN	VEREDA TINCACHOQUE	TELÉFONO	3112290982

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4348 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4348 DE 2023 DEL 11/11/2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNI, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	63.561,64
PATRONAL	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	0,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASESORAMOS WOL L.T.D.A	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	63.561,64
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	63.561,64
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	13.026,71
TOTAL A PAGAR	$	81.588,35

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BY-100005092	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36161459	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	36161459

Fecha de Facturación	21/11/2023	**Fecha Límite de Pago**	21/12/2023
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		**Prima** (incluye gastos de expedición)	68.561,64
Póliza No.	BY-100005092	**IVA**	13.026,71
Periodo Facturado	11/11/2023 — 31/12/2023	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	81.588,35

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE
VEREDA TINCACHOQUE	900007956
Intermediario	ASESORAMOS WJL L.T.D.A

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **21/12/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIt 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	36161459

Fecha de Facturación	21/11/2023	**Fecha Límite de Pago**	21/12/2023
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		**Prima** (incluye gastos de expedición)	68.561,64
Póliza No.	BY-100005092	**IVA**	13.026,71
Periodo Facturado	11/11/2023 — 31/12/2023	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	81.588,35

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE
VEREDA TINCACHOQUE	900007956
Intermediario	ASESORAMOS WJL L.T.D.A

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000036161459(3900)000000081588(96)20231221

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299003616145 9(3900)000000081588(96)20231221

VIGILADO

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.21 09:39:55 -05:00

Código de Seguridad: #v2J62k179CHeBw58y1oxA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU52000000010-D001

No. PÓLIZA	BY-100038650	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36161466	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNI	No. DOC. IDENTIDAD	900.007.956-2
DIRECCIÓN	VEREDA TINCACHOQUE	TELÉFONO	3112290982
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25GNO 73B-60	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25GNO 73B-60	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.4348 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD Y DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4348 DE 2023 DEL 11/11/2023 CUYO : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	50.141.092,40	170.686,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	12.535.273,10	137.751,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 11/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	75.211.638,60	1.317.646,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 137.888.004,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASESORAMOS WOL L.T.D.A	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.626.083,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.626.083,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	309.905,77
TOTAL A PAGAR	$	1.940.988,77

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PINSA - AIP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100038650	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36161466	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR/GARANTIZADO: LA ASOCIACIÓN DE COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO GUATEQUE CON NIT 900.007.956-2

NOTA 1 : EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

NOTA 2 : LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LAS SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

NOTA 3 : QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 11/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4348 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA NOVELA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100038650** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNI** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** , expedida por la Compañía en **21/11/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los **21** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	36161466

Fecha de Facturación	21/11/2023		Fecha Límite de Pago	21/12/2023
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082			Prima (incluye gastos de expedición)	1.631.083,00
Póliza No.	BY-100038650		IVA	309.905,77
Periodo Facturado	11/11/2023	31/12/2028	VALOR TOTAL A PAGAR $	1.940.988,77

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DE
VEREDA TINCACHOQUE	900007956
Intermediario	ASESORAMOS W.J.L L.T.D.A

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **24/12/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIt 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	36161466

Fecha de Facturación	21/11/2023		Fecha Límite de Pago	21/12/2023
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082			Prima (incluye gastos de expedición)	1.631.083,00
Póliza No.	BY-100038650		IVA	309.905,77
Periodo Facturado	11/11/2023	31/12/2028	VALOR TOTAL A PAGAR $	1.940.988,77

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DE
VEREDA TINCACHOQUE	900007956
Intermediario	ASESORAMOS W.J.L L.T.D.A

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000361614 66(3900)000001940988(96)20231221

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299003616146 6(3900)000001940988(96)20231221

VIGILADO

INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
01 al 30 abril de 2024

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 5/05/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No. 4348 de 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TINCACHOQUE MUNICIPIO DE GUATEQUE

FECHA DE INICIO: 5/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2878 de 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ---------- APROBADO: SI ------- NO ------- VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ---------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ---------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- NO ---------- APROBADO: SI ------- N ------- FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto
El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto.

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma Sebastian PH.
Nombre: JOHAN SEBASTIAN PEREZ HEREDIA
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0538200 CND

Firma NO APLICA
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520242574 CND

Firma NO APLICA
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual:

Seguidamente se menciona la gestión de los siguientes documentos durante el desarrollo del proyecto:

- ✓ Seguimiento a la inversión del Anticipo:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PAGINA	

FECHA: 15/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4348 de 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TINCACHOQUE

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2878 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

JUSTIFICACIÓN:
INICIO Y EJECUCION DE OBRAS

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	CEMENTO ARGOS X 50 KG		$ 9.975.000,00	$ 16.045.500,00	$ 11.179.500,00	$ 37.200.000,00	100%
2	VARILLA 1/2 " Y 1/4"		$ 19.312.302,00	$ 26.352.302,00	$ 7.731.209,00	$ 53.395.813,00	100%
3	ALAMBRE NEGRO		$ 370.000,00	$ 370.000,00	$ 370.000,00	$ 1.110.000,00	100%
4	SUBBASE		$ 6.000.000,00	$ 6.180.000,00	$ -	$ 12.180.000,00	100%
5	TRANSPORTE SUBBASE		$ 3.450.000,00	$ 3.220.000,00		$ 6.670.000,00	100%
6	GRAVILLA 3/4		$ 2.898.840,00	$ 4.347.900,00	$ 1.449.420,00	$ 8.696.160,00	100%
7	TRANSORTE GRAVILLA 3/4		$ 800.000,00	$ 1.300.000,00	$ 400.000,00	$ 2.500.000,00	100%
8	ARENA TRITURADA		$ 2.898.840,00	$ 4.347.900,00	$ 1.449.420,00	$ 8.696.160,00	100%
9	TRANSPORTE ARENA		$ 800.000,00	$ 1.300.000,00	$ 400.000,00	$ 2.500.000,00	100%
10	UNIFORMES		$ 2.362.000,00			$ 2.362.000,00	100%
11	ESTUDIO TOPOGRAFICO	$ 2.000.000,00				$ 2.000.000,00	100%
12	ESTUDIO DE SUELOS	$ 3.000.000,00				$ 3.000.000,00	100%
13	COSTOS DE PERSONAL		$ 14.240.000,00	$ 19.200.000,00	$ 29.200.000,00	$ 62.640.000,00	100%
14	MAQUINARIA Y EQUIPOS		$ 11.749.770,00	$ 1.197.000,00		$ 12.946.770,00	100%
15	SEGURIDAD SOCIAL		$ 5.268.000,00	$ 5.808.000,00	$ 4.728.000,00	$ 15.804.000,00	100%
16	POLIZAS	$ 2.022.577,00				$ 2.022.577,00	100%
17	PAPELERIA		$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 150.000,00	$ 750.000,00	100%
18	BOTIQUIN TIPO A		$ 400.000,00			$ 400.000,00	100%
19	TELA PARA CERRAMIENTO		$ 300.000,00			$ 300.000,00	100%
20	VALLA		$ 350.000,00			$ 350.000,00	100%
21	PLASTICO NEGRO		$ 288.000,00			$ 288.000,00	100%
22	SEÑALIZACION		$ 254.000,00			$ 254.000,00	100%
23	COSTOS BANCARIOS	$ 80.000,00	$ 350.000,00	$ 344.000,00	$ 132.000,00	$ 906.000,00	100%
24	EXAMAMENS DE INGRESO		$ 480.000,00			$ 480.000,00	100%
25	ESTUDIO HIDRAULICO		$ 1.300.000,00			$ 1.300.000,00	100%
26	TUBOS ALCANTARILLA			$ 3.300.000,00		$ 3.300.000,00	100%
26	COMPRA DE TABLAS Y ALQUILER DE FORMALETA			$ 2.150.000,00		$ 2.150.000,00	100%
27	TRANSPORTE DIGNATARIO		$ 300.000,00	$ 600.000,00	$ -	$ 900.000,00	100%
	TOTAL	$ 7.102.577,00	$ 84.446.752,00	$ 96.362.602,00	$ 57.189.549,00	$ 245.101.480,00	100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:luz Mariela Aguilar
Representante Legal o su Apoderado

Firma:
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Firma:
Nombre: Johan Sebastian Perez Heredia
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:091037-0538200 CND

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
01 al 30 abril de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 01/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION REGIONALE DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 5 **MES:** ABRIL **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4348 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 249.705.462,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TINCACHOQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2878 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CHEQUE	9	10-abr-24	TITO ERNESTO MORENO	$ 1.700.000,00	CHEQUE 009	RETIRO N9
CHEQUE	10	15-abr-24	TITO ERNESTO MORENO	$ 19.000.000,00	CHEQUE 010	RETIRO N10
CHEQUE	11	24-abr-24	TITO ERNESTO MORENO	$ 2.850.000,00	CHEQUE 011	RETIRO N11
CHEQUE	12	30-abr-24	TITO ERNESTO MORENO	$ 20.800.000,00	CHEQUE 012	RETIRO N12
TOTAL				$ 44.350.000,00		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	ALAMBRE	$ 11.000,00	$ -	$ 11.000,00	$ 11.000,00	$ -
2	COMPRA DE RAJON	$ 1.260.000,00	$ -	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	
3	LIQUIDACION 2 AYUDANTES	$ 572.126,00	$ -	$ 572.126,00	$ 572.126,00	$ -
4	PAGO NOMINA	$ 7.646.641,00	$ -	$ 7.646.641,00	$ 7.646.641,00	$ -
5	SEGURIDAD SOCIAL	$ 7.045.100,00	$ -	$ 7.045.100,00	$ 7.045.100,00	$ -
6	MATERIAL	$ 49.000,00	$ -	$ 49.000,00	$ 49.000,00	$ -
7	ALQUILER VIBRADOR	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ -
8	COMPRA HERRAMIENTAS	$ 85.000,00	$ -	$ 85.000,00	$ 85.000,00	$ -
9	COMPRA DICOS Y PUNTILLAS	$ 13.600,00	$ -	$ 13.600,00	$ 13.600,00	$ -
10	COPRA DE ALAMBRE PUNTILLAS VALDES DISCOS	$ 350.500,00	$ -	$ 350.500,00	$ 350.500,00	$ -
11	COMPRA GRAVA 3/4 Y ARENA	$ 971.040,00	$ -	$ 971.040,00	$ 971.040,00	$ -
12	COMPRA LLANAS METALICAS	$ 48.005,00	$ -	$ 48.005,00	$ 48.005,00	$ -
13	COMPRA DE AGUA PARA MEZCLAR POR FALTA DE SUN	$ 120.000,00	$ -	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ -
14	ALAMBRE	$ 67.000,00	$ -	$ 67.000,00	$ 67.000,00	$ -
15	COMPRA DE TABLA	$ 1.100.000,00	$ -	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ -
16	TRANSPORTE DE TABLA	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -
17	PUNTILLAS	$ 7.200,00	$ -	$ 7.200,00	$ 7.200,00	$ -
18	GASOLINA PARA MEZCLADORA	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -
19	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 128.000,00	$ -	$ 128.000,00	$ 128.000,00	$ -
20	PUNTILLAS	$ 9.000,00	$ -	$ 9.000,00	$ 9.000,00	$ -
21	UNIFORMES	$ 270.000,00	$ -	$ 270.000,00	$ 270.000,00	$ -
22	COMPRA MATERIAL	$ 720.000,00	$ -	$ 720.000,00	$ 720.000,00	$ -
23	PAPELERIA	$ 15.500,00	$ -	$ 15.500,00	$ 15.500,00	$ -
24	GASOLINA	$ 223.000,00	$ -	$ 223.000,00	$ 223.000,00	$ -
25	NOMINA	$ 11.631.000,00	$ -	$ 11.631.000,00	$ 11.631.000,00	$ -
26	SEGURIDAD SOCIAL	$ 8.858.200,00	$ -	$ 8.858.200,00	$ 8.858.200,00	$ -
27	MATERIALES	$ 231.900,00	$ -	$ 231.900,00	$ 231.900,00	$ -
28	EXAMENES MEDICOS	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -
29	RENOVACION POLIZAS	$ 258.570,00	$ -	$ 258.570,00	$ 258.570,00	$ -
30	LONAS	$ 20.000,00	$ -	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ -
31	COMPRA ALAMBRE PUNTILLAS DISCOS	$ 52.500,00	$ -	$ 52.500,00	$ 52.500,00	$ -
32	MATERIALES	$ 34.000,00	$ -	$ 34.000,00	$ 34.000,00	$ -
33	COMPRA MATERIAL	$ 50.500,00	$ -	$ 50.500,00	$ 50.500,00	$ -
34	COMPRA ALAMBRE DISCOS	$ 86.500,00	$ -	$ 86.500,00	$ 86.500,00	$ -
35	ESTUDIO DE CONCRETO	$ 184.926,00	$ -	$ 184.926,00	$ 184.926,00	$ -
36	COMPRA MATERIAL	$ 1.455.600,00	$ -	$ 1.455.600,00	$ 1.455.600,00	$ -
37	COMPRA PUNTILLAS Y DISCOS	$ 14.592,00	$ -	$ 14.592,00	$ 14.592,00	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTALES	$ 44.350.000,00	$ -	$ 44.350.000,00	$ 44.350.000,00	

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (MARZO) : (Indicar el mes) $ 40.248,00 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 334.492,00 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Tito Ernesto M.
Nombre: TITO MORENO
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Firma: Sebastian P.M.
Nombre: SEBASTIAN PEREZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 091037-05382200 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
01 al 30 abril de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 02/05/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** 5

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONVENIO No. 4348 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

VÍA INTERVENIDA: VIA RURAL VEREDA TINCACHOQUE VIA ALTERNA A VIA GUATEQUE -GUAYATA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TINCACHOQUE MUNICIO DE GUATEQUE

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ **CONTRATO No.** 2878 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	5 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$	249.705.462,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR ADICIONES:**	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN:	16 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$	249.705.462,00
PLAZO (MESES):	4 MESES							
FECHA INICIAL DE VENCIMIEN	31 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)			
FECHA ACTUAL DE VENCIMIEN	24 (Día)	DE	5 (Mes)	DE	2024 (Año)			

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	FERRETERIA LIDER	74280515		30/03/2024	$ 492.000,00		$ 492.000,00
2	VICTOR PEÑA	74282289		4/04/2024	$ 40.000,00		$ 40.000,00
3	IVAN ALBERTO RUSSI RAMOS	4130251-4		8/04/2024	$ 11.000,00		$ 11.000,00
4	JAVIER ALEXANDER LOPEZ PERILLA	1057690138-5		12/04/2024	$ 1.260.000,00		$ 1.260.000,00
5	LIQUIDACION 4 OBREROS			15/04/2024	$ 1.245.707,00		$ 1.245.707,00
6	PAGO NOMINA			15/04/2024	$ 7.646.641,00		$ 7.646.641,00
7	PAGO SEGURIDAD SOCIAL			15/04/2024	$ 7.045.100,00		$ 7.045.100,00
8	JORGE ENRIQUE GAITAN BARRERA			15/04/2024	$ 49.000,00		$ 49.000,00
9	JUAN SALAMANCA			16/04/2024	$ 300.000,00		$ 300.000,00
10	FERRETERIA LIDER	74280515		18/04/2024	$ 156.000,00		$ 156.000,00
11	FERRETERIA LIDER	74280515		4/04/2024	$ 50.500,00		$ 50.500,00
13	IVAN ALBERTO RUSSI RAMOS	4130251-4		8/04/2024	$ 11.000,00		$ 11.000,00
15	IVAN ALBERTO RUSSI RAMOS	4130251-4		18/04/2024	$ 13.600,00		$ 13.600,00
16	FERRETERIA LIDER	74280515		18/04/2024	$ 350.500,00		$ 350.500,00
17	AGREGADOS HBA	901039222-6		18/04/2024	$ 971.040,00		$ 971.040,00
18	PREFABRICADOS VALLE DE TENZA	4129165-7		19/04/2024	$ 48.005,00		$ 48.005,00
19	BOMBEROS GUATEQUE			19/04/2024	$ 120.000,00		$ 120.000,00
20	FERRETERIA LIDER	74280515		19/04/2024	$ 67.000,00		$ 67.000,00
21	TALLER Y DEPOSITO DE MASERA SAN JUAN			19/04/2024	$ 1.100.000,00		$ 1.100.000,00
22	VICTOR PEÑA	74282289		19/04/2024	$ 50.000,00		$ 50.000,00
23	EDS LLANO GRANDE	901365432-3		21/04/2024	$ 50.000,00		$ 50.000,00
24	VICTOR PEÑA	74282289		22/04/2024	$ 128.000,00		$ 128.000,00
25	FERRETERIA LIDER	74280515		23/04/2024	$ 9.000,00		$ 9.000,00
26	SAUL ANTONIO CALDERON	4263077-1		25/04/2024	$ 720.000,00		$ 720.000,00
27	NOHORA ISABEL MORALES			25/04/2024	$ 15.500,00		$ 15.500,00
28	EDS LLANO GRANDE	901365432-3		27/04/2024	$ 223.000,00		$ 223.000,00
29	NOMINA			30/04/2024	$ 11.631.000,00		$ 11.631.000,00
30	SEGURIDAD SOCIAL			30/04/2024	$ 8.858.200,00		$ 8.858.200,00
31	FERRETERIA LIDER	74280515		3/05/2024	$ 231.900,00		$ 231.900,00
32	ADRIANA FERNANDA GRIJALBA FUERTES	52429374		4/05/2024	$ 360.000,00		$ 360.000,00
33	MUNDIAL SEGUROS	860037013-6		7/05/2024	$ 28.570,00		$ 28.570,00
34	LONAS			7/05/2024	$ 20.000,00		$ 20.000,00
35	FERRETERIA LIDER	74280515		7/05/2024	$ 52.500,00		$ 52.500,00
35	GAITAN BARRERA JORGE ELIECER	74281454-4		7/05/2024	$ 340.000,00		$ 340.000,00
35	FERRETERIA LIDER	74280515		8/05/2024	$ 86.500,00		$ 86.500,00
35	SISMO ESTRUCTURAS DE COLOMBIA	901446884-7		8/05/2024	$ 184.926,00		$ 184.926,00
35	PREFABRICADOS VALLE DE TENZA	4129165-7		10/05/2024	$ 383.911,00		$ 383.911,00

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 44.350.100	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 221.499.400
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ -
TOTAL PAGOS	$ 44.350.100	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 221.499.400

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.


Firma: Tito Ernesto M.
Nombre: Tito Ernesto Moreno
PRESIDENTE JAC
Junta de Accion Comunal Vereda Tincachoque

Firma:
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Firma: Sebastian P.H.
Nombre: SEBASTIAN PEREZ
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 091037-0538200 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

- ✓ Seguimiento Programa de Obra:

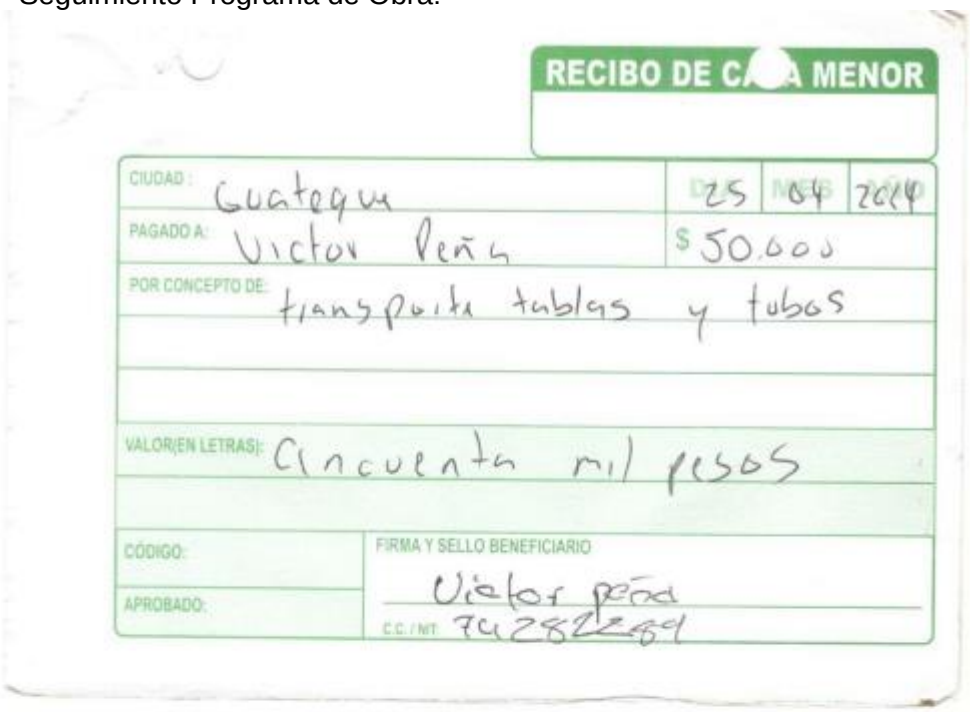

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: Guateque — DÍA 25 MES 04 AÑO 2024

PAGADO A: Victor Peña — $ 50.000

POR CONCEPTO DE: transporte tablas y tubos


VALOR(EN LETRAS): Cincuenta mil pesos

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO: Victor peña

C.C. / NIT: 74282289

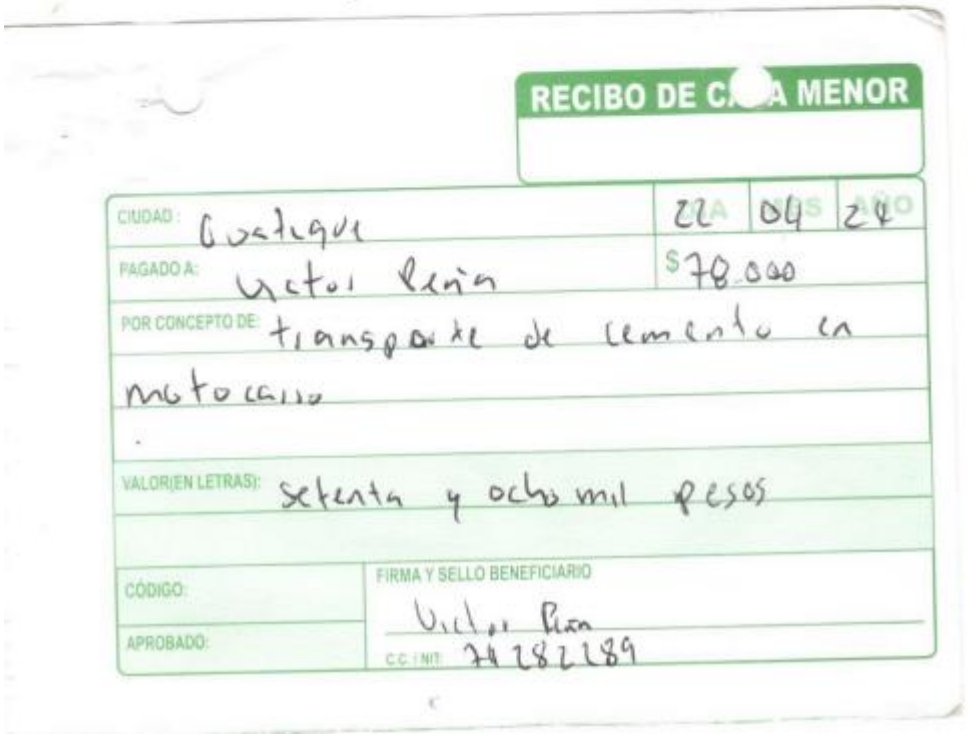

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: Guateque — DÍA 22 MES 04 AÑO 24

PAGADO A: Victor Peña — $ 78.000

POR CONCEPTO DE: transporte de cemento en moto carro

VALOR(EN LETRAS): setenta y ocho mil pesos

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO: Victor Peña

C.C. / NIT: 74282289

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FERRETERIA LIDER

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0d7a2c493b0212066f86e07eeabc0274b03a843f5c68d8243af8b0ae59f2bee29777efaee6dfe28c869bf73b54042d2e

Número de Factura: JESR-620
Fecha de Emisión: 01/04/2024
Fecha de Vencimiento: 01/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SORIANO ROMERO JORGE ENRIQUE
Nombre Comercial: SORIANO ROMERO JORGE ENRIQUE
Nit del Emisor: 74280515
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Guateque
Dirección: CL 6 6 A 21 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3227015524
Correo: ferreterialider1@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDADE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE,DEPARTAMENTO DE BOYACA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900007956
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: vtincachoque@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0111	PUNTILLA DE DOS PULGADAS	94	2,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.436,97	19.00			$ 7.563,02
2	1133	UNION DE POLIETILENO DE MEDIA	94	1,00	$ 840,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 159,66	19.00			$ 840,33
3	1112	MANGUERA RIEGO DE MEDIA	94	2,00	$ 48.739,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.521,01	19.00			$ 97.478,98
4	1117	TUBO SANITARIO DE 2 PULGADAS TL	94	1,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-01 14:17:05
Documento generado el: 2024-04-01 14:17:04
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	131.092,41
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	131.092,41
IVA	24.907,56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	24.907,56
Total neto factura (=)	155.999,97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 155.999,97

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764067934069 Rango desde: 618 Rango hasta: 650 Vigencia: 2024-09-26



CUENTA DE COBRO X
PEDIDO
COTIZACION
REMISION


DIA 04 MES 04 AÑO 2024

CLIENTE: TEL:
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Jgo llaves milimétricas		9000

Cancelado

Descuento
TOTAL 9000

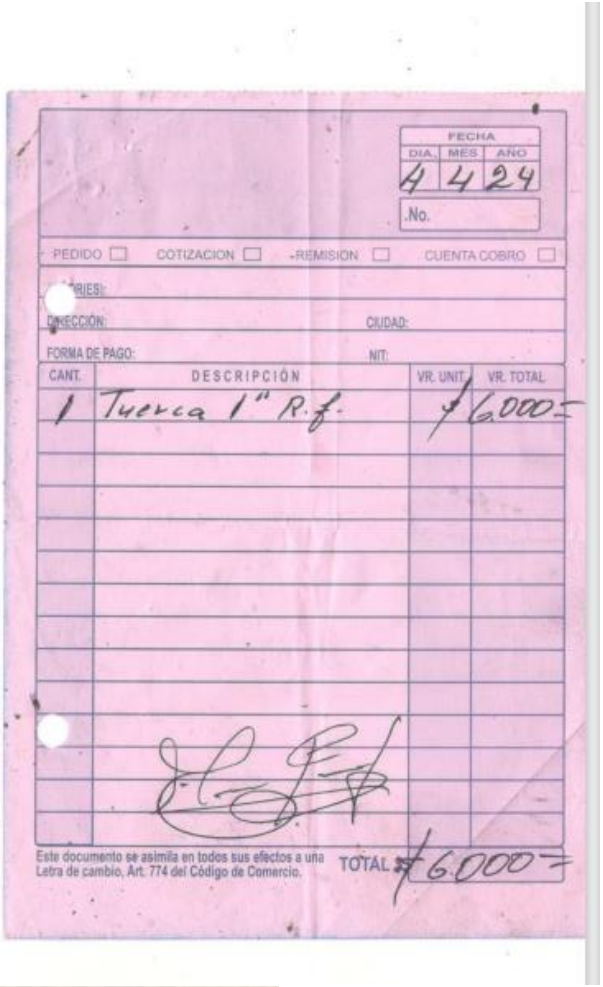

FECHA DIA 4 MES 4 AÑO 24
No.


PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐ CUENTA COBRO ☐

SEÑOR(ES):
DIRECCIÓN: CIUDAD:
FORMA DE PAGO: NIT:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Tuerca 1" R.f.	$	$6.000=

Este documento se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $6.000=

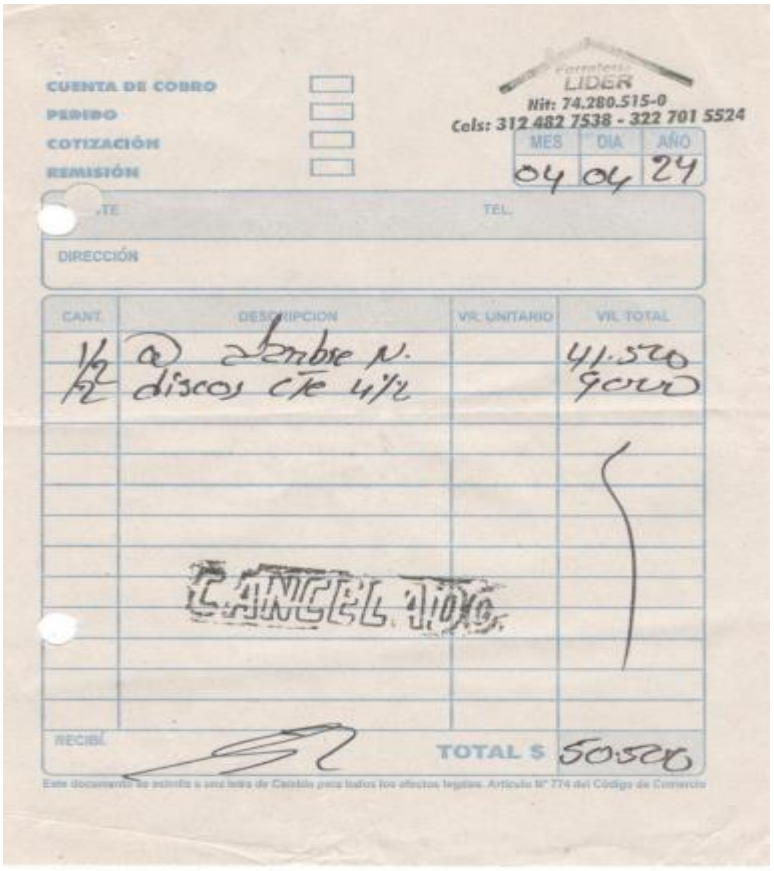

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISIÓN

LIDER
Nit: 74.280.515-0
Cels: 312 482 7538 - 322 701 5524

MES 04 DIA 04 AÑO 24

TE: TEL:
DIRECCIÓN

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1/2	a Lonbre N.		41.520
1/2	discos cte 4 1/2		Gour

CANCELADO

RECIBÍ TOTAL $ 50.520

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

ALMACEN EL TRAPICHE

IVAN ALBERTO RUSSI RAMOS

4130251-4

CARRERA 6 No.7 - 43

Tel: 7540073

REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.

POS19587

Fecha 08/04/2024 Hora 10:41:38

Cajero YAMILE BENITO

CLIENTE

CLIENTES VARIOS

11111

Ref	Detalle	Cant	Vr Total
24999130	ALAMBRE GALV	1	11.000

Total Articulos	1.00
Subtotal	9,243.70
Iva	1,756.30
Total a Pagar	11,000.00
Efectivo: 11,000.00	
Total Pagado	11,000
Cambio	

Base	% Iva	Vr Iva	Vr Total
9.244	19	1.756	11.000

OBSERVACIONES

PARA CUALQUIER RECLAMO DEBE PRESENTAR ESTA FACTURA. NO SE ACEPTAN CAMBIOS DESPUES DE 8 DÍAS FECHA TIRILLA.

Resolución Dian No.18764066899563 Del 07/03/2024, Autoriza del POS 19.026 al POS 30.000 - Vigencia 6 Meses.

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: Guatapé — FECHA: 16 04 2024

PAGADO A: Juan Salamanca — $ 300.000

POR CONCEPTO DE: Alquiler de Vibrador de Concreto

VALOR(EN LETRAS): trecientos mil pesos

CODIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

C.C. / NIT 7177126 Tunja

MUELLES Y REPUESTOS EL LORO

GAITAN BARRERA JORGE ELIECER
NIT: 74281454 - 4
DIRECCION: CARRERA 8 No 6 - 03 TELEFONO: 3208351462

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FERL2797

NOMBRE: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQU
NIT: 900007956-2
DIRECCION: VDA TINCACHOQUE
CIUDAD:
TELEFONO: 3112290982

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/04/2024
HORA DE EXPEDICIÓN: 12:55:00 p. m.
PLACA:

REF.	DETALLE	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
RL86	GRASAS LITIO BEG ROJA	1	15.000	15.000
LL226	MOBIL 20W-50 X 1/4	1	34.000	34.000


SON:	CUARENTA Y NUEVE MIL	Total Articulos	2
		Subtotal	46,605
		Iva	2,395
		Total a Pagar	49,000

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No 18764049098461 DEL 16 DE MAYO DE 2023, AUTORIZA DEL FERL 1964 AL FERL 5000, VIGENCIA 6 MESES.

CUFE: f826e55dbf5c953d4bcbc9c92a410cb152e212191b0174188d3f5c58a66a17d5ef3c05dfbb9dc6cce311a8e495a74d0e

Documento electrónico emitido por software Helisa Pos (Proasistemas SA 800.042.928) Proveedor tecnologico Ateb colombia.

GRACIAS POR SU COMPRA

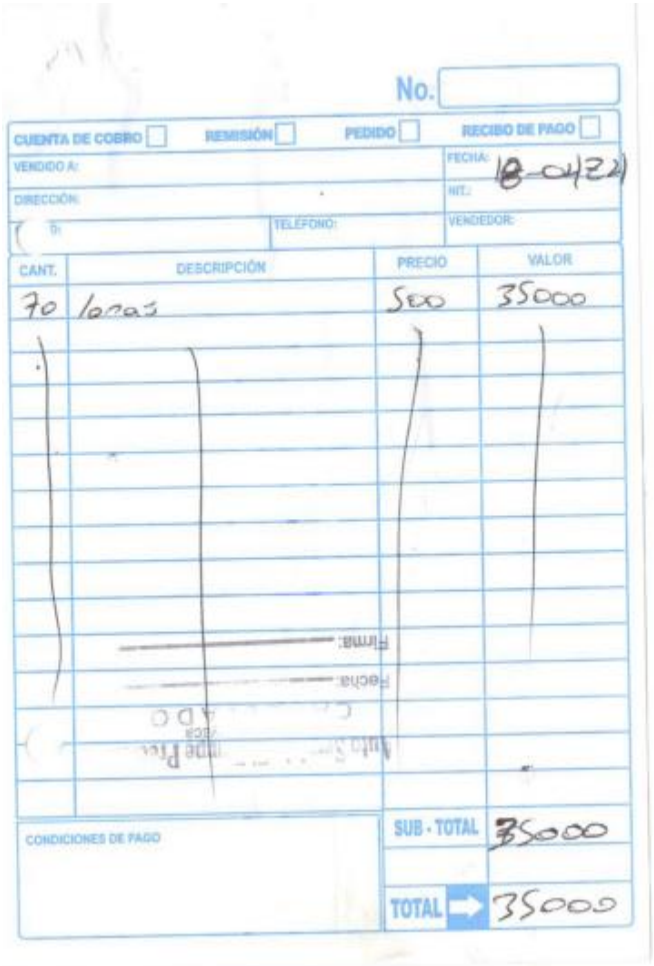

No.

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

VENDIDO A: FECHA: 18-04-24

DIRECCIÓN: NIT:


TELÉFONO: VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
70	bolsas	500	35000

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL 35000

TOTAL 35000

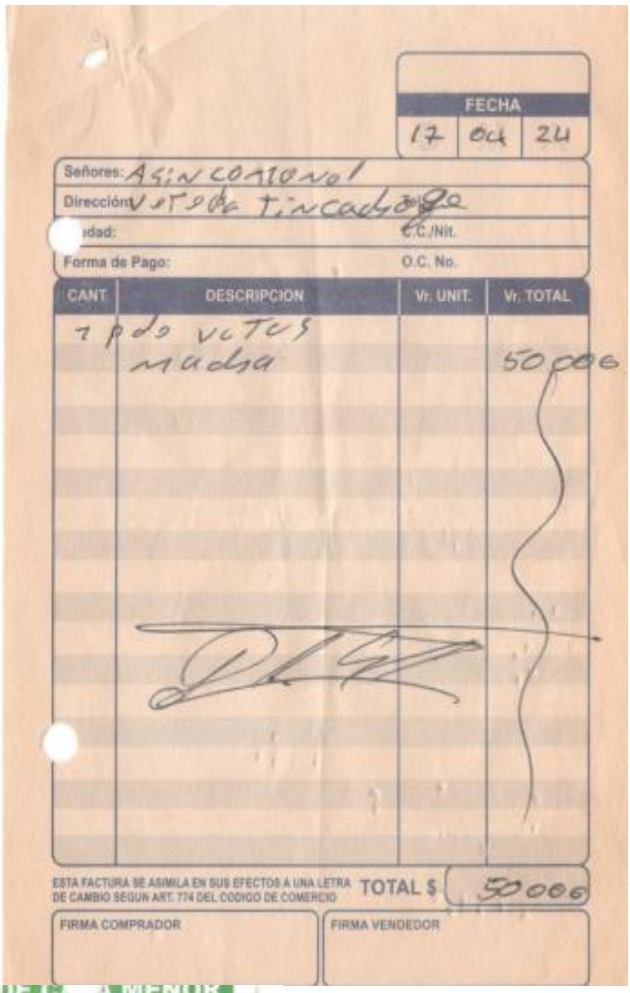

FECHA 17 04 24

Señores: Asincoatenol

Dirección: Vereda Tincachaga


C.C./Nit.

Forma de Pago: O.C. No.

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	pdo varias mudas		50000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO TOTAL $ 50000

FIRMA COMPRADOR FIRMA VENDEDOR

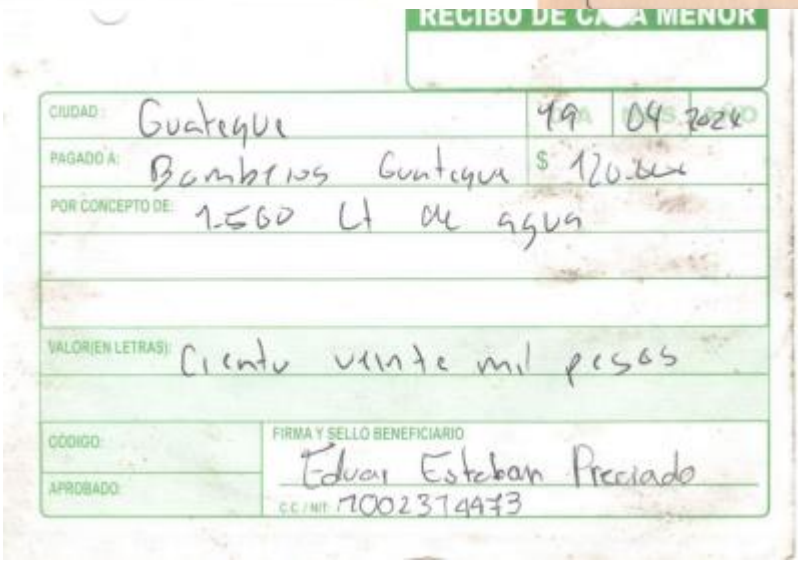

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: Guateque 19 04 2024

PAGADO A: Bambinos Guateque $ 120.000

POR CONCEPTO DE: 1.500 Lt de agua

VALOR(EN LETRAS): Ciento veinte mil pesos


CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

Edwar Esteban Preciado

C.C./NIT. 1002374973

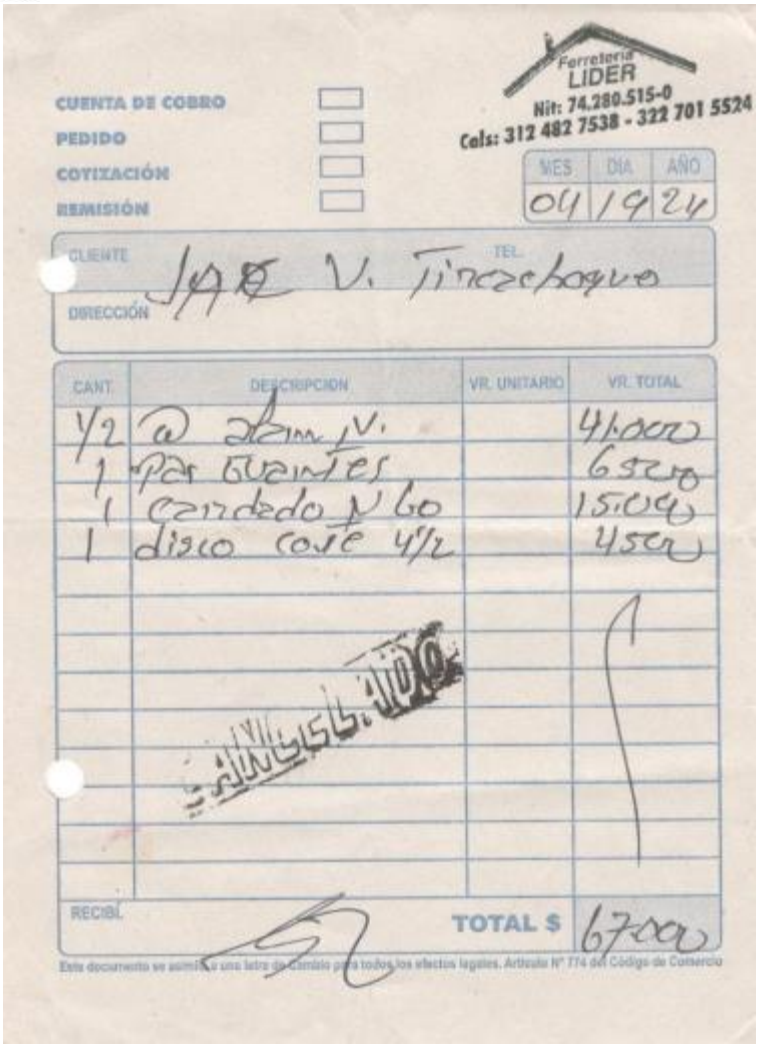

Ferretería LIDER
Nit: 74.280.515-0
Cels: 312 482 7538 - 322 701 5524

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACIÓN ☐
REMISIÓN ☐


MES	DÍA	AÑO
04	19	24

CLIENTE: JAC V. Tinzachagua — TEL.
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1/2	@ Thinner V.		4.000
1	par guantes		6500
1	cepillo N 60		15.000
1	disco corte 4 1/2		4500

RECIBÍ
TOTAL $ 67.000

Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

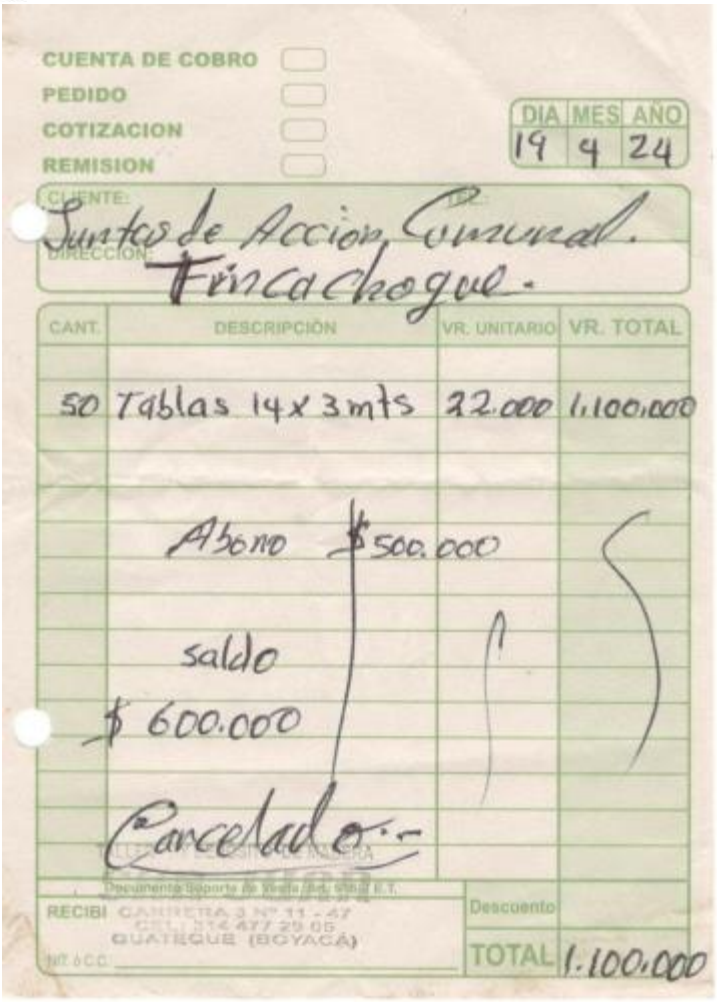

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION


DIA 19 MES 4 AÑO 24

CLIENTE: Juntas de Accion Comunal.
DIRECCION: Finca chogue.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
50	Tablas 14 x 3 mts	22.000	1.100.000
	Abono $500.000		
	saldo $ 600.000		
	Cancelado.-		

Descuento
TOTAL 1.100.000

RECIBI CARRERA 3 Nº 11 - 47
CEL 314 477 25 05
GUATEQUE (BOYACÁ)
Nº C.C.

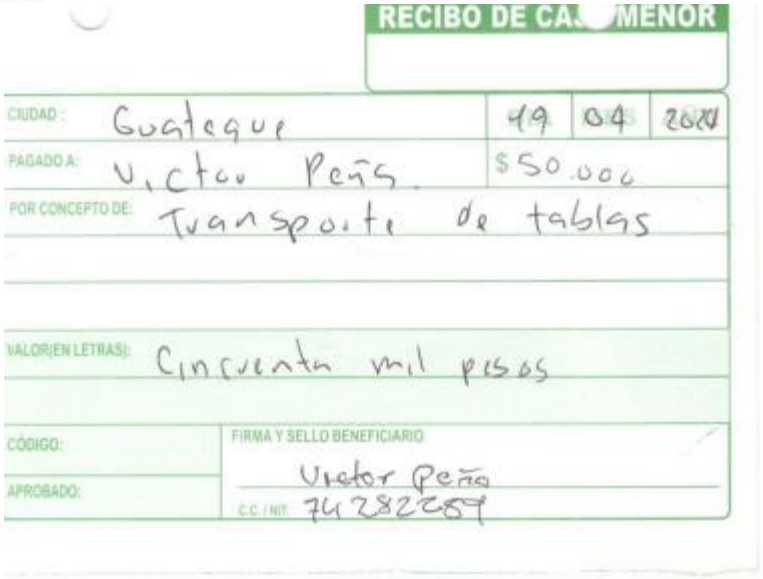

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: Guateque | 19 | 04 | 2024

PAGADO A: Victor Peña. | $50.000

POR CONCEPTO DE: Transporte de tablas

VALOR(EN LETRAS): Cincuenta mil pesos

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

Victor Peña

C.C. / NIT: 74282259

ALMACEN EL TRAPICHE

IVAN ALBERTO RUSSI RAMOS
4130251-4
CARRERA 6 No.7 - 43
Tel: 7540073

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA DIAN SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
TFE2760

CLIENTE

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TINCACHOQUE GUATEQU

Fecha y Hora de Generación
18/04/2024 10:37:53 a. m.

900007956-2

Forma y Medio de Pago
Contado: Efectivo

VEREDA TINCACHOQUE GUATEQUE

Cajero YAMILE BENITO
REGIMEN COMUN

Ite	Ref.	Detalle	Cant	Und	Vr. Unitario	Vlr IVA	Vr Total
1	10670180116	PUNTILLA CABALLO C/C 2.1/2"	2	LIBRA	4,800.00	1,533	9,600.00
2	FA130	FIBRA ATAFACIL X130G	1	UNIDAD	4,000.00	639	4,000.00

CUFE: 7893ec941e79c9997880b40349b4fd2712a0560ba4213c2f0be2d7aa77fd65951172f779866a26ea3bb

Base	% Iva	Vr Iva	Vr Total
11,429	19	2,171	13,600

Total Articulos	3.00
Subtotal	11,428.57
Iva	2,171.43
Total a Pagar	13,600.00

Fecha y Hora de Expedición (Validación DIAN)
2024-04-18 10:37:44

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (Art 5 ley 1231 de 2008) con este el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo.

Resolución Facturación Electrónica DIAN No.

18764059815038

Documento electrónico generado desde el sistema Helisa POS - PROAsistemas S.A. NIT 800042928 - 1
Proveedor Tecnológico ATEB Colombia S.A.S. - NIT 900965992 - 7

GRACIAS POR SU COMPRA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FERRETERIA LIDER

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b38089f5e09946ae4b815c3b29ed3843317ff075a81a5b8acbe150e0ed28384d81393cd6390369baaea4ede5f3ba08d6

Número de Factura: JESR-624
Fecha de Emisión: 18/04/2024
Fecha de Vencimiento: 18/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SORIANO ROMERO JORGE ENRIQUE
Nombre Comercial: SORIANO ROMERO JORGE ENRIQUE
Nit del Emisor: 74280515
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Guateque
Dirección: CL 6 6 A 21 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3227015524
Correo: ferreterialider1@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDADE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE,DEPARTAMENTO DE BOYACA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900007956
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: vtincachoque@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0023	DISCO DE CORTE DE CUATRO Y MEDIA	94	1,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 718,49	19.00			$ 3.781,51
2	9009	BALDES DE CAUCHO PARA CONSTRUCCION	94	4,00	$ 5.042,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,04
3	9025	CARRETILLA PLASTICA MARCA HERRAGRO	94	1,00	$ 201.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$ 201.680,67
4	1004	ALAMBRE NEGRO X MEDIA ARROBA	94	2,00	$ 34.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.092,44	19.00			$ 68.907,56

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-18 09:49:47
Documento generado el: 2024-04-18 09:49:47
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	294.537,78
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	294.537,78
IVA	55.962,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	55.962,19
Total neto factura (=)	350.499,97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 350.499,97

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764067934069 Rango desde: 618 Rango hasta: 650 Vigencia: 2024-09-26

AGREGADOS HBA S.A.S.

Nit:901039222 6
Dir: CRA 2 55 42
Teléfono: 2173463
agregadoshba@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

CUFE: c21ca2f022bc66f819b3bf8274a05ee1a5a5d131dc60bb0617 8b5ee7c78b4f090aa84d27681cca40a7d097689903c8b9

Resolución DIAN No. 18764054783289 del 29/08/2023, numeración autorizada del No. FA 415 al FA 1.000. Vigencia (12) Meses

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VREDA DE
Nit/ Cedula: 900007956 2
VDA TINCACHOQUE
Tel:
Ciudad: GUATEQUE
Email: vtincachoque@gmail.com
Condición Pago: CONSIGNACION BANCARIA

ORDEN DE COMPRA No.	ENTRADA DE ALMACÉN	SUCURSAL

FACTURA DE VENTA No	FECHA DE GENERACION	FECHA DE VENCIMIENTO	PEDIDO DE VENTAS	NUMERACION
FA 561	18/4/2024 11:37:05	18/05/2024		Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	% IVA	SUB-TOTAL
GRAVA 3/4 COMUN	12.00	68,000.00	19.00	816,000.00

Fecha y Firma de Aceptacion

Observaciones:

Subtotal	816,000
I.V.A.	155,040
Total	971,040
ReteFuente	0
ReteIva	0
ReteIca	0
Valor Neto	**971,040**

SON: **NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS**

Esta factura de venta se asemeja a una letra de cambio segun articulo 774 del codigo de comercio.

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No 360229538 BANCO DE BOGOTA AGREGADOS HBA SAS

JAIME PIRAMANRIQUE NIT 4129165
Actividad Económica Principal 4752
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEJP - 795

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065167787 de 07/02/2024 - 07/08/2024 autoriza FEJP-740 a FEJP-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/04/2024 13:31
Fecha de Vencimiento	19/04/2024 13:31
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JAIME PIRAMANRIQUE
Nombre Comercial	PREFABRICADOS VALLE DE TENZA
CC	4129165
Obligación	IVA
Email	piramanrriquejaime@gmail.com
Teléfono	3123838208
Dirección	CR 3 11 45
Ciudad, Depart.	GUATEQUE, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	JUNTA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO BOYAC
Nombre Comercial	
NIT	900007956
Obligación	NO APLICA
Email	vtincachoque@gmail.com
Teléfono	
Dirección	VDA TINCACHOQUE
Ciudad, Depart.	GUATEQUE, BOYACA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	85	MASETA OPTAGONAL 4 LIBRAS MANGO M	1	EA	$40,340.00	IVA 19%	$40,340.00	$48,005.00

1


PREFABRICADOS VALLE DE TENZA
NIT. 4.129.165-7
CANCELADO

idades de medida: EA = cada

Subtotal	$40,340.00
IVA 19%	$7,665.00
Total a Pagar	$48,005.00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

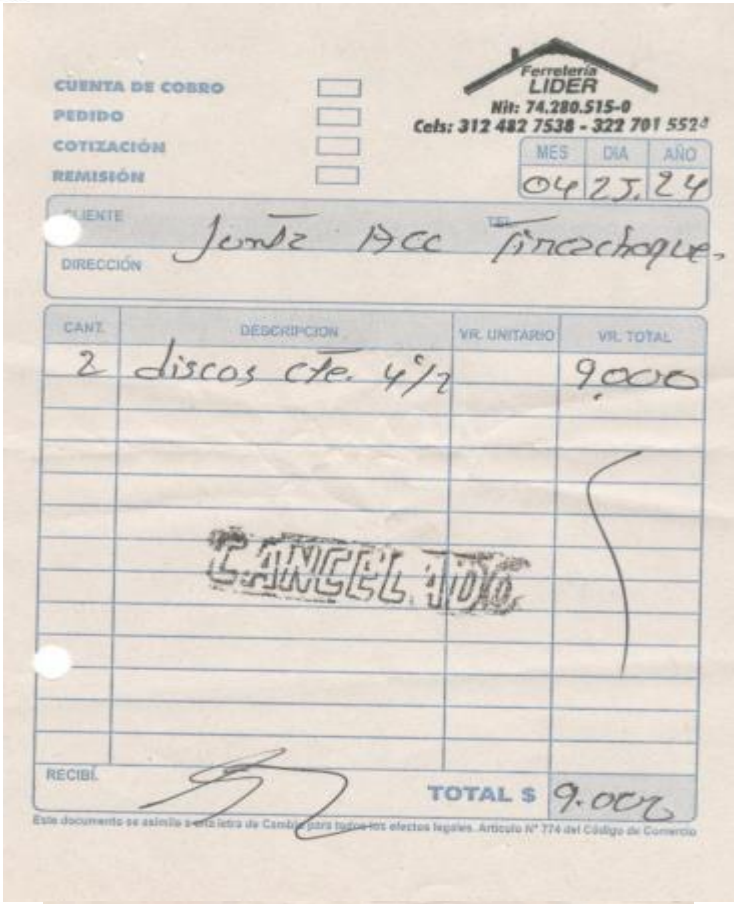

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACIÓN ☐
REMISIÓN ☐

Ferretería LIDER
Nit: 74.280.515-0
Cels: 312 482 7538 - 322 701 5528

MES	DIA	AÑO
04	25	24

CLIENTE: Jontz DCC Tinacheque
DIRECCIÓN:


CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	discos cte. 4½		9.000

CANCELADO

RECIBÍ:

TOTAL $ 9.000

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

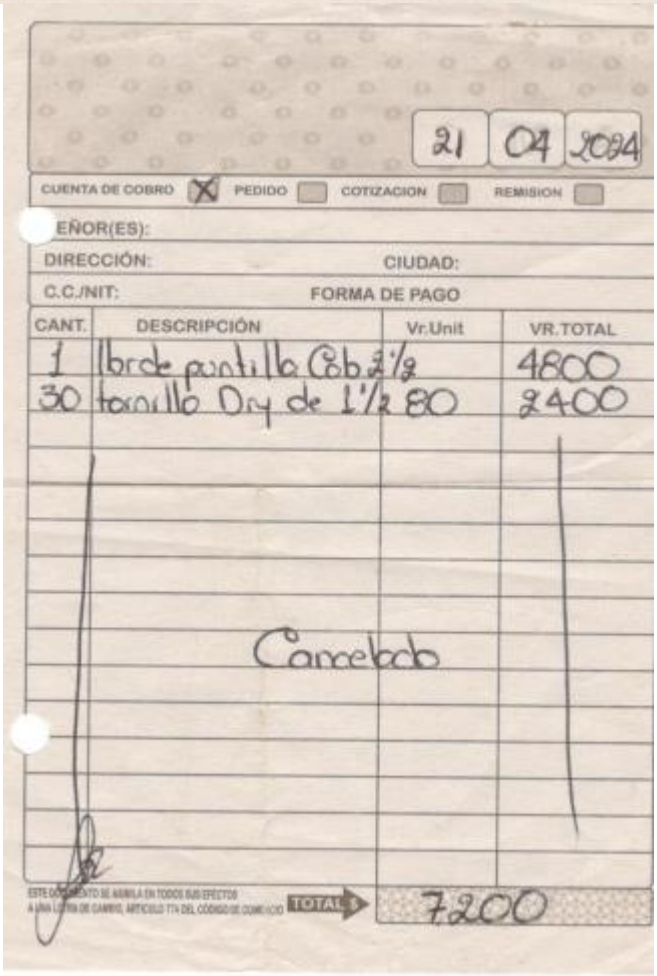

21 04 2024

CUENTA DE COBRO ☒ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

SEÑOR(ES):
DIRECCIÓN: CIUDAD:
C.C./NIT: FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr.Unit	VR.TOTAL
1	lbrde pantilla Cab 2½		4800
30	tornillo Dry de 1½ 80		2400

Cancelado

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL $ 7200


terpel
Valor
Impuesto
$0
IVA
$0

MADERAS EL LIBERTADOR



Saúl Antonio Calderón
NIT: 4263077-1
Régimen Simplificado
Carrera 4 No. 10 - 36, Cel.: 320 342 6182
Guateque - Boyacá

FECHA DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA	Nº 2416
25	04	2024		

SEÑOR (ES): Junta de Accion Comunal Tincachoque

DIRECCION:

TELEFONO: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
60	Listones 6cm x 3m	12.000	720.000
	CANCELADO		

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR QUE SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE 2008.

TOTAL $ 720.000

ABONO $ SALDO $

CLIENTE
Firma y C.C.

Firma Autorizada

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FERRETERIA LIDER

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e974a74da9930141b1320cf895a9d3c656fe1f27a833e48a09aa0c29dac96b95ac8d71a94b30bea15b7c60671b006415

Número de Factura: JESR-631
Fecha de Emisión: 03/05/2024
Fecha de Vencimiento: 03/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SORIANO ROMERO JORGE ENRIQUE
Nombre Comercial: SORIANO ROMERO JORGE ENRIQUE
Nit del Emisor: 74280515
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Guateque
Dirección: CL 6 6 A 21 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3227015524
Correo: ferreterialider1@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDADE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE,DEPARTAMENTO DE BOYACA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900007956
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: vtincachoque@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	9007	DISCO SIERRA DE CUATRO Y MEDIA	94	1,00	$ 6.722,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31	19.00			$ 6.722,68
2	2026	DISCO DE CORTE DE CUATRO Y MEDIA	94	1,00	$ 2.941,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,17
3	9014	PUNTILLA MARCA CABALLO POR LIBRAS	94	4,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.873,95	19.00			$ 15.126,04
4	6111	TUBO SANITARIO DE DOS TL	94	3,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,20
5	8000	UNION SANITARIA DE DOS	94	2,00	$ 1.848,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 702,52	19.00			$ 3.697,46
6	1004	ALAMBRE NEGRO X ARROBA	94	1,50	$ 68.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.638,65	19.00			$ 103.361,34

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-05-03 15:49:18
Documento generado el: 2024-05-03 15:49:16
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		194.873,89
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		194.873,89
IVA		37.026,04
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		37.026,04
Total neto factura (=)		231.899,93
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 231.899,93

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764067934069 Rango desde: 618 Rango hasta: 650 Vigencia: 2024-09-26



Papelería y Miscelánea Sumercé

Nohora Isabel Morales M. - Nit: 23.922.549-2 - Régimen Simplificado

Calle 12 No. 6-03 - Guateque Boyacá - Cel: 312 343 3699

Señores: Junta de acción com. Tinchaneque

C.C./Nit:

Dirección:

Cel:

FACTURA DE VENTA

Nº 1314

25 | 04 | 24

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	Libro de Actas 100 folios	14000	14000
1	Corrector	1500	1500

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR QUE SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE 2008.

TOTAL $ 15500

ABONO $

SALDO $

Observaciones:

Papelería y Miscelánea Sumercé

C.C. No. 23622049

Cliente:

C.C. No.

Guateque 4 MAYO 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE "TINCACHOQUE" DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DEBE A:
Adriana Fernanda Grijalba Fuertes
CC 52429374 Bta

LA SUMA DE:
(Tres cientos sesenta mil pesos MCT)

POR CONCEPTO DE:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Examen Médico Laboral de **INGRESO** con énfasis osteomuscular – Visiometria –	9	$40.000	$360.000

MEDIOS DE PAGO: DAVIPLATA CC 52429374 CEL 3105550687
BANCOLOMBIA A LA MANO 03105550687
BANCO DE BOGOTA CUENTA DE AHORROS No 360216469

Atentamente,

DRA. ADRIANA FERNANDA GRIJALBA FUERTES
MEDICA CIRUJANA
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RM 15300/2001
RESOLUCIÓN SST

Adriana Fernanda Grijalba Fuertes
Medica Cirujana Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
CC 52429374 Bta
RM 15/300 de 2001
Resolución SST 1044 -2020
Cel. 3105550687

tu compañía siempre

Mundial de Seguros S. A.
86 0.037.013 - 6

Datos del cliente

-Cliente-

Nombre / Razón social

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNI

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Referencia de pago No. 20249900475602

Fecha limite de pago 9/05/2024

Producto	Póliza	Certificado	Referencia	Nombre Asegurado	Fec.Límite Pago	Valor a Pagar
RESP. CIVIL	100005092	36169097	36169097	6906827-JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNI	INMEDIATO	27.229,81
RESP. CIVIL	100005092	36169356	36169356	6906827-JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNI	INMEDIATO	155.815,02
CUMPLIMIENTO	100038650	36169083	36169083	6906827-JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNI	INMEDIATO	2.574,71
CUMPLIMIENTO	100038650	36169342	36169342	6906827-JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNI	INMEDIATO	72.950,14

Valor total a pagar: 258.570,00


Banco de Bogota 360 Quatuque
Srv 2121 OR036001 Usu2016 T111
CC1x#####4651 09/05/24 10:35 H.MO
CREDICOOP CAPITAL COLOMB CEO 1782
Us:031594
Valor Efectivo:258,570.00

Fecha y hora: 2024/05/08 10:02

Número Comprobante: 24001908

Banco de Bogota 360 Quatuque
Srv 2121 OR036001 Usu2016 T111
CC1x#####4651 09/05/24 10:35 H.MO
CREDICOOP CAPITAL COLOMB CEO 1782
Us:031594
Valor Efectivo:258,570.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjetas: 0.00
Valor Rpto:0.00
Valor Total:258,570.00

VIGILADO

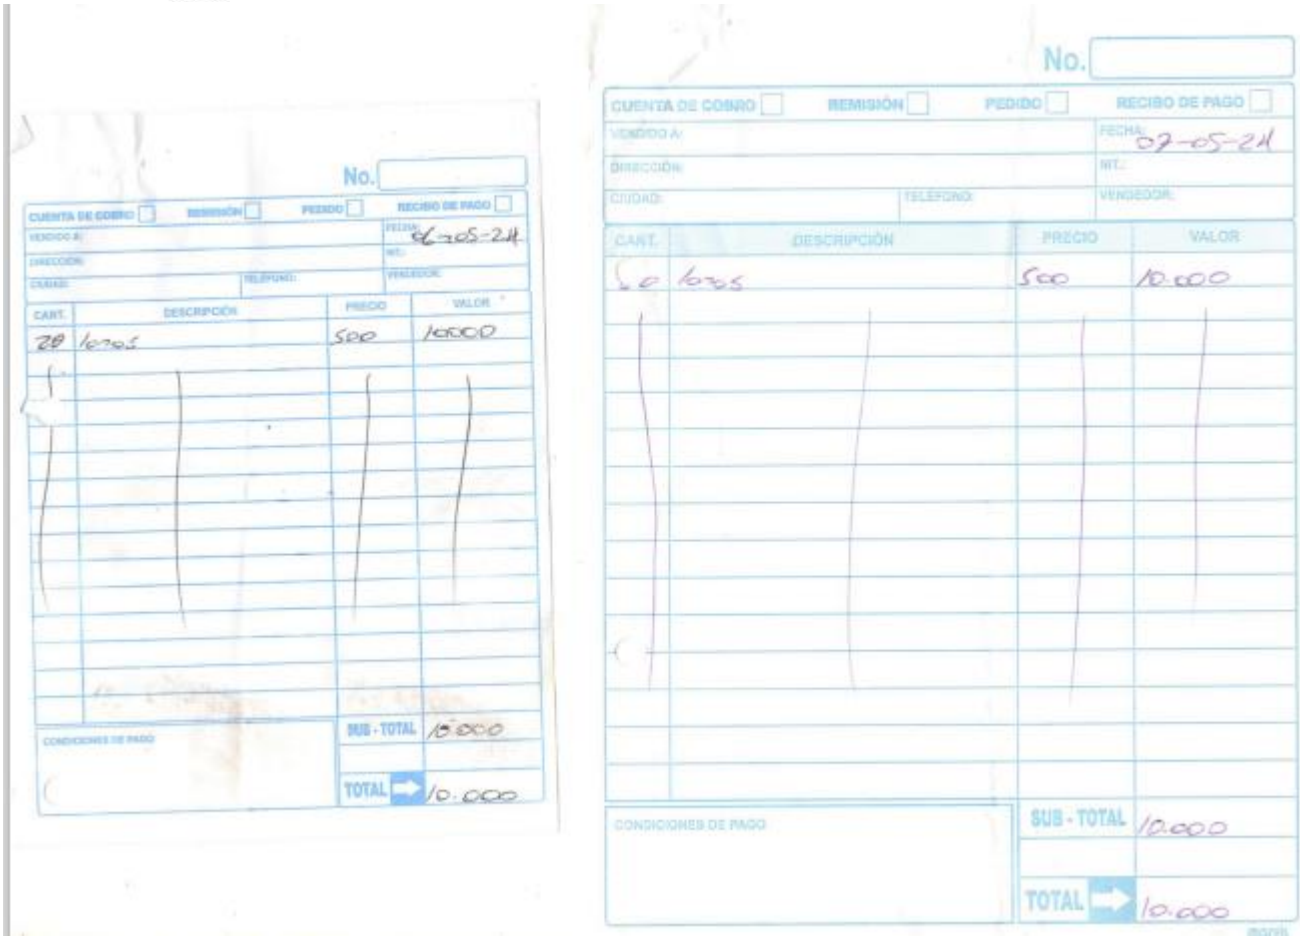

No.

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

VENDIDO A: FECHA: 02-05-24

DIRECCIÓN: NIT:

CIUDAD: TELEFONO: VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
20	lotes	500	10.000

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL 10.000

TOTAL 10.000

No.

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

VENDIDO A: FECHA: 02-05-24

DIRECCIÓN: NIT:

CIUDAD: TELEFONO: VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
20	lotes	500	10.000

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL 10.000

TOTAL 10.000

MUELLES Y REPUESTOS EL LORO
~~C.I.~~ JUAN BARRERA JORGE ELIECER
NIT: 74281454 - 4
DIRECCION: CARRERA 8 No 6 - 03 TELEFONO: 3208351462

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FERL2864

NOMBRE:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQU	**FECHA DE EXPEDICIÓN:**	08/05/2024
NIT:	900007956-2	**HORA DE EXPEDICIÓN:**	11:52:01 a. m.
DIRECCION:	VDA TINCACHOQUE	**PLACA:**	
CIUDAD:			
TELEFONO:	3112290982		

REF.	DETALLE	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
LL226	MOBIL 20W-50 K 1/4	1	34,000	34,000

SON:	TREINTA Y CUATRO MIL	**Total Articulos**	1
		Subtotal	34,000
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No 18764049098461 DEL 16 DE MAYO DE 2023, AUTORIZA DEL FERL 1964 AL FERL 5000, VIGENCIA 6 MESES.		**Iva**	
		Total a Pagar	34,000

CUFE: da1db2e81e57e612ed2c3057683a0de4d7f72cf420d43ddef80d020dde44af862591a44f6a84439f214d133be773cd84

Documento electrónico emitido por software Helisa Pos (Proasistemas SA 800.042.928) Proveedor tecnologico Ateb colombia.

GRACIAS POR SU COMPRA

SISMOESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Ingeniería Sísmica de Edificaciones

SISMOESTRUCTURAS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901446884-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 13 A 22 33, Tunja, Boyacá, Colombia
Tel. 3103824831

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	SMO76
Fecha Emisión	17/05/2024 20:49:30
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	17/05/2024 20:49:32

Autorización facturación electrónica No. 18764054247810 válida desde 2023-08-22 hasta 2024-08-22 rango desde SMO1 hasta SMO100.
Por favor abstenerse de practicar Retencion a Titulo de Renta somos regimen Simple de Tributacion. (Art 911 ET)
Favor cancelar en la cuenta de ahorros N° 108900085862 del banco Davivienda a nombre de Sismoestructuras de Colombia Sas identificada con Nit 901446884-7

DATOS DEL ADQUIRENTE	
NIT:	900007956
Cliente:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE "TINCACHOQUE" DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Dirección:	VDATINCACHOQUE, Guateque, Boyacá, Colombia
Teléfono:	
Email:	tltomorene0385@gmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria
Fecha de pago:	17/05/2024
Total de Lineas:	2

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto	Dcto.	Total
1	95	Ensayo de falla de probetas de cilindros de concreto OT 968	94	2,00	$12.000,00	IVA	19%	4560	0,00	$24.000,00
2	96	Alquiler de 3 camisas o moldes de concreto (Por dia)	94	73,00	$1.800,00	IVA	19%	24966	0,00	$131.400,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe		
01 IVA	$155.400,00	19,00%	$29.526,00		$155.400,00
					$0,00
					$0,00
					$29.526,00
					$184.926,00

Son:	(ciento ochenta y cuatro mil novecientos veintiseis pesos)
CUFE:	3c3556eda240c0e6266eb5bdeb897ea9fe6346eed8281bb78e66bb16e5be25befe900308760b593c59a0012fdff77452

Firma Digital: ULrGC2t2OvK55xYcbZLdkfYzs6upUUBo4pP1mbYOCZjrGL0FzEfQnDMMgv
e63sn1/9QDPU4jbFbcnF7V3mTXOAUC99PQapmZLbuUJ06RNZ
6YQBRxZJwGaGF Eq0nHTFSOWc5qVSMnrKnvAMgZQx02ZUY4oPUSQd6B/ec40463P9C0WvMYrnGZ3A NT2BkGOF/fyHpbQcdRWvGdXus3DKFlzzIV
DYr4ZbmbuPvs0yPv8Z4YCn5bzl 3HeOQcv1MRfmgrOlFvFI7BC4D26UOQjZU5ONfyGEYADHxx8mGgWGlVBXP5S vwM1cV78K0qRJaQK3j
iQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.930.334-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
01 al 30 abril de 2024

✓ Seguimiento Programa de Inversiones

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	15 (día) 12 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (marque con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Ver debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4340

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUANTA DE ACCION COMUNAL TINCACHIQUE MUNICIPIO DE GUATEQUE


LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TINCACHIQUE VIA ALTERNA MUNICIPIO DE GUATEQUE- GUAYATA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2878 DE 2023

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ

PLAZO INICIAL:	4 MES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	5/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION:	30/12/2024 (Indique la suspensión si se corresponde con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**	$ 249.705.462,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**	$ 249.705.462,00
PLAZO ACUMULADO	5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	24/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN:	16/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**	

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	$51.711.716	20,71%		% P	1,00%	11,81%	13,00%		
				$ P	$2.485.500	$29.485.000	$13.695.800		
	$51.711.716	20,71%		$ Ec	$0	$29.485.000	$13.695.800		
				% E	0,00%	11,81%	5,48%		
CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$139.503.963	55,87%		% P	1,00%	6,00%	13,00%	6,99%	14,70%
				$ P	$2.485.500	$26.485.000	$33.947.545	$25.458.700	$36.769.661
	$139.503.963	55,87%		$ E	$0	$55.377.900	$18.454.550	$34.643.127	$32.698.864
				% E	0,00%	15,48%	7,39%	13,87%	13,60%
COSTOS ADMINISTRATIVOS	$58.489.783	23,42%		% P	1,00%	11,16%	14,00%	0,63%	0,63%
				$ P	$2.485.500	$27.891.000	$35.595.300	$1.562.983	$1.562.983
	$58.489.783	23,42%		$ E	$5.705.000	$1.300.000	$5.668.150	$12.819.983	$11.741.136
				% E	2,00%	0,52%	2,27%	5,13%	4,70%
				% P					
				$ P					
				$ E					
				% E					
				% P					
				$ P					
				$ E					
				% E					
				% P					
				$ P					
				$ E					
				% E					
				% P					
				$ P					
				$ E					
				% E					
				% P					
				$ P					
				$ E					
				% E					
				% P					
				$ P					
				$ E					
				% E					
				% P					
				$ P					
				$ E					
				% E					
				% P					
				$ P					
				$ E					
				% E					
				% P					
				$ P					
				$ E					
				% E					
TOTAL OTROS ITEMS				% P					
				$ P					
				$ E					
				% E					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 249.705.462,00	100,00%							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 249.705.462,00	100,00%							

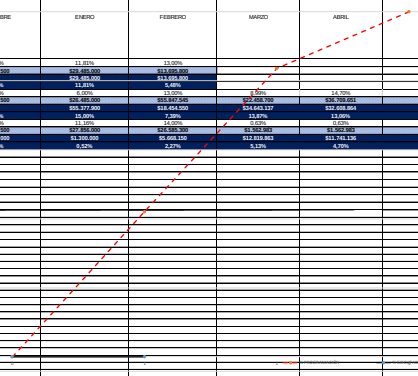

		DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,00%	29,96%	49,00%	9,62%	10,33%
	VALOR (Miles de Pesos)	$7.454.500	$83.836.000	$96.139.645	$24.021.683	$26.272.634
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	3,00%	31,96%	71,96%	81,58%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$7.454.500	$91.292.500	$187.411.145	$211.432.828	$249.705.462
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2,05%	27,33%	15,15%	19,01%	17,76%
	VALOR (Miles de Pesos)	$5.705.000	$68.162.900	$37.818.050	$47.463.850	$44.350.000
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2,05%	29,33%	44,47%	63,48%	81,24%
	VALOR (Miles de Pesos)	$5.705.000	$91.867.900	$129.686.450	$177.149.400	$221.499.450

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$5.000.000 / N/A
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$253.474 / N/A
AIU IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$6.337 / N/A
IVA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$1.204 / N/A
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A /
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	N/A / N/A
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	N/A / N/A
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$6.253.474
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$6.253.474**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Firma:	Aprueba Firma:	Aprueba Firma:	Revisó Firma:
Nombre: Johan Sebastian Perez Heredia	Nombre: HERBY LUNA CRUZ	NOMBRE: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA
Ingeniero Residente del Proyecto	INTERVENTOR	Matricula No.: 1522917469BYC	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad E	Matricula No.: 252024257ICND	Director Territorial	Matricula Profesional No. 041-027-0518008 BYC
Matrícula Profesional No. 091037-0538200 CND			

Revisó Firma:	Revisó Firma:	Revisó Firma: No Aplica
Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA	NOMBRE: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Nombre: N/A
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	Matricula No.: 1522917469BYC	Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No. 041-027-0518008 BYC	Director Territorial	Matricula No.: N/A

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

✓ Acta de comité de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 12-04-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA SOCIALIZACION No. (La numeración será consecutiva): #5

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: Boyaca

CONVENIO No. 4348 de 2023 (Indicar número de contrato y año)

REPRESENTANTE CONVENIO: JAC Vereda Tincachoque Guateque Boyacá

OBJETO DEL CONVENIO:
Aunar esfuerzos entre la junta de accion comunal vereda Tincachoque y INVIAS para el programa caminos comunitarios para la paz total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2876 de 2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Herby Luna Cruz

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

En el mes de marzo se revisó avance de obra el cual hay bastante retrazo se solicito reforzar con personal.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Avance de obra
- solucion donde se desbarranco la via
- Revisar solicitud de prorroga

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 3
		FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realizo comite de obra el cual se revisa que se llevan un avance de obra del 85%, se evidencia que no se alcanzara a finalizar el 30 de abril por ende se evalua solicitar prorroga hasta el 15 de mayo, uno de los motivos del retraso ha sido las lluvias y que se contrata personal poco otro se retira.

Junto con el Director de interventoria se revisa el desbalanceo del tramo 2 el cual es muy minimo, se evaluo realizar contención con lonas con tierra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
- Arreglar donde se desbarrancó	30-04-2024	Ing Residente
- Disposición de sacos de concreto	30-04-2024	JAC
- Adelantar puntos liquidación	30-04-2024	Residentes

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Tito Moreno	Presidente JAC	JAC	Tito E. Moreno
Hector Peñaloza	Veedor	JAC	
Sebastia Perez	Ing Res JAC	JAC	Sebastian P.H
Herby Luna Cruz	Director mtv	HLC	
Camilo Rodriguez	Ingenieros mtv	HLC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 Información general del Contrato

En la siguiente tabla se muestra la información general del contrato de interventoría.

Tabla 4. Información General del Contrato de interventoría

CONTRATO No.	2878 de 2023
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE Y GUAYATÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
INTERVENTOR	HERBY LUNA CRUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA
FECHA INICIACIÓN	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	4 MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	HASTA 31 DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	NO APLICA
TIEMPO DE SUSPENSION	NO APLICA
FECHA VENCIMIENTO FINAL	24 DE MAYO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS (67.954.000,00) M/CTE
VALOR DEL CONTRATO CON PRORROGA	OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEISMIL SETECIENTOS VEINTI DOS PESOS(81.916.722,00) M/CTE

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Con el objetivo de mantener una adecuada ejecución del proyecto se realizaron las siguientes actividades:

Técnica:

En la vereda Tincachoque del municipio de Guateque se terminaron de construir las dos alcantarillas, se fundieron 124 metros de 130 y se fundieron 75 metros de bordillo en el tramo 1; En el tramo 2 se fundieron 70 metros de centros y se iniciaron a instalar riostras para amarras el refuerzo de las huellas.

Ambiental: Se están realizando informes ambientales de cada convenio.

Informes semanales: Elaboración y seguimiento del Informes semanales correspondientes al periodo.

Informe Mensual (abril de 2024): Control y elaboración del segundo informe mensual de abril de 2024 de Interventoría correspondiente a este periodo.

Correspondencia: Elaboración y respuesta de correspondencia mediante comunicados como mensajes de correos electrónicos, dirigida y recibida del convenio y el Invías.

Información otros programas y aplicativos

Cifra: No aplica para este proyecto.

• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. No aplica para este proyecto.

Dificultades técnicas.

En este periodo no se presentaron dificultades técnicas.

5.3 Informe especialistas y profesionales

INFORME DIRECCION DE INTERVENTORIA

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN *COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE Y GUAYATÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*".

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORÍA No. 05
PERIODO: 01 al 30 de abril de 2024

ING. HERBY LUNA CRUZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Tabla Contenido

1 INTRODUCCION 69
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 6
2.1 Localización y alcance 7
2.2 Inventario y estado inicial de la vía 7
4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 8
a. Información general del Contrato 8
b. Descripción de actividades ejecutadas en el mes 9
c. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 10
4. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 1
4.1 Información general del Contrato 1
4.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 1
4.3 Información otros programas y aplicativos 2
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 3
6 REGISTRO FOTOGRAFICO 4

1 INTRODUCCION

El convenio # 4348 de 2023 celebrado entre el Instituto Nacional de vías con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUEÁ identificado número de NIT 900.007.956**-2**, que tiene como objeto, **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**. Se impartió orden de inicio al convenio con fecha 05 de diciembre de 2023.

Por otra parte, mediante el proceso de selección de mínima cuantía No. **IP-DT-BOY-021-2023**, El Instituto Nacional de Vías, celebró el contrato No **2878 de 2023**, entre el INVIAS y **HERBY LUNA CRUZ** la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE Y GUAYATÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**". Mediante invitación pública No. **IP-DT-BOY-021-2023** por el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**, asimismo, se impartió orden de inicio al contrato de Interventoría con fecha 01 de noviembre de 2023.

El presente informe del Director de Interventoría N° 6 describe las actividades realizadas en el periodo de 01 al 30 de abril de 2024, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

2.2 Localización y alcance

Guateque es un municipio colombiano capital de la Provincia del Oriente en el suroeste del departamento de Boyacá, 125 kilómetros al sur de Tunja, capital departamental, y a 112 km al este de Bogotá. El municipio está ubicado en las estribaciones de la cordillera oriental, teniendo un relieve ondulado, quebrado y escarpado. Guateque tiene como cuenca principal el río Súnuba, formado por la unión de los ríos Aguacias y Machetá, y desemboca en la represa de Chivor.


El municipio de Guateque tiene una población de 10.921 personas, de las cuales 6.985 viven en el casco urbano y 2.937 habitan la zona rural. Es uno de los más densos del departamento.



Localización de Guateque en Colombia



Ubicación de Guateque en Boyacá

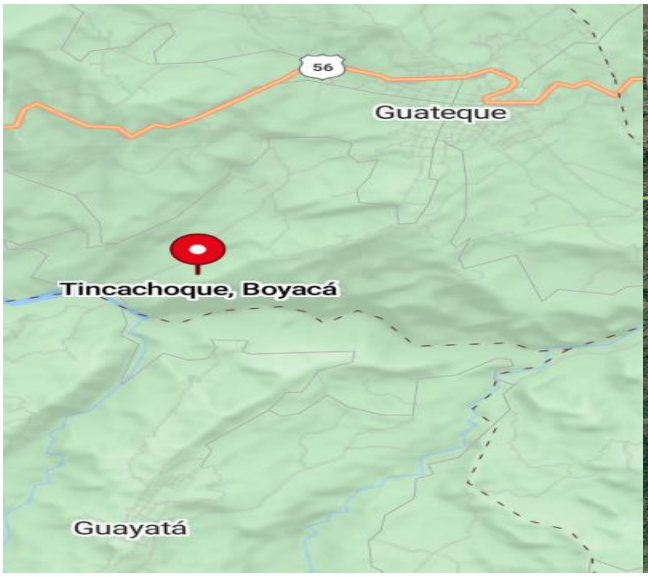

Ubicación vereda Tincachoque



Tramo a intervenir

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

se hace necesario efectuar por parte del Organismo de Acción Comunal, con seguimiento y aprobación del interventor, la corroboración en el sitio de las condiciones del terreno donde se ejecutarán las obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construcción de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes, obras de contención de baja complejidad, etc.

El inventario depende de la "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir.



Ilustración 2. Estado inicial de la vía vereda tincachoque Guateque.

3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

Por regla general las Juntas de Acción Comunal solo pueden desarrollar actividades dentro del territorio de su zona de influencia (barrio, sector, etapa, vereda, corregimiento, etc.) dependiendo de la división establecida por el Distrito o Municipio respectivo. El artículo 9° de la Ley 2166 de 2021 -en lo relacionado con las

4. INFORMACIÓN CONVENIO DE OBRA

a. Información general del Convenio

En la siguiente tabla se muestra la información general del convenio.

CONVENIO No.	4348 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE
NIT	900.007.956-2
FECHA INICIACIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	CUATRO MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL CON PRORROGA	30 DE ABRIL DE 2024
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	30 DE DICIEMBRE DE 2023
TIEMPO DE SUSPENSION	No aplica
AMPLIACION SUSPENSION	No aplica
REANUDACION	16 DE ENERO DE 2024
FECHA TERMINACION FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION FINAL CON PRORROGA	24 DE MAYO 2024
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SECENTA Y DOS PESOS ($249.705.462) MONEDA CORRIENTE
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$249.705.462,oo

b. Descripción de actividades ejecutadas en el mes

El director de interventoría hizo seguimiento a las siguientes actividades

En este periodo se terminaron de construir las dos alcantarillas en su totalidad, del tramo 1 de placa huella se fundieron 126 metros de 130 y 75 metros de bordillo, en el tramo 2 de placa huella se fundieron 70 metros de ciclópeo central y se iniciaron a instalar riostras

c. Estado de avance y acciones a seguir por parte de laInterventoría

i. Gestión Ambiental

Se revisó de la disposición final de rcd en la obra y se revisaron licencias ambientales de las canteras de suministro de la obra.

ii. Gestión Social

En la vereda de Tincachoque en el municipio de Guateque no se realizó socialización con la comunidad para llegar a acuerdo para conducir el agua recogida de la alcantarilla 2.

iii. SST

En la vereda Tincachoque del municipio de Guateque se realizó capacitación de uso de estos equipos de protección personal.

iv. Técnica

En la vereda Tincachoque del municipio de Guateque se construyó en su totalidad las dos alcantarillas, se fundió placa huella en el tramo 2 124 metros de 130 metros, se fundieron 75 metros de bordillo; En el tramo 2 se fundieron 70 metros de centros y se iniciaron a instalar riostras para amarras el refuerzo de las huellas.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En este periodo se adelantan varias gestiones y se avanzó en obra en la vereda Tincachoque del municipio de Guateque:

a). Construcción de las dos alcantarillas en su totalidad.
b). Construcción de 124 metros de 130 metros de centros sobre anchos y huella del primer tramo de placa huella.
d). Construcción de 75 metros de bordillo del tramo 1.
c). Fundida de 70 metros de ciclópeo central del tramo 2 de placa huella.
e). Armado e instalación de 25 riostras en el tramo 2.

5.4 Informe del programa anual de caja PAC.

No aplica para este proyecto.

5.4 Informe matriz de riesgos.

No aplica para este proyecto.

5.6 Información de otros programas y aplicativos según pliego de condiciones contratos de obra e interventoría.

No aplica para este proyecto.

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA Nº. 05
01 al 30 abril de 2024

INFORME DE RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONVENIO No. 4348 DE 2023

OBJETO: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL*

01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

1 INTRODUCCIÓN

En el Municipio de Guateque se ejecuta una obra de infraestructura la cual se da cumplimiento al convenio No 4348 de 2023 el cual tiene como objeto **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL**. Y se celebra entre la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, adelantó el proceso de contratación de la interventoría, el cual fue adjudicado al CONTRATISTA **HERBY LUNA CRUZ** por haber cumplido con los criterios de selección.

En el presente informe se describen los diferentes aspectos técnicos, financieros, administrativos, etc., relacionados con la ejecución del contrato para el periodo comprendido anteriormente, en aras de documentar todos los aspectos relevantes de la ejecución del contrato.

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

La junta de acción comunal en busca de contribuir a la construcción de obras que demanden el progreso y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad local, da inicio al proceso de mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del municipio, esto con el fin que la comunidad local cuente con vías de acceso optimas a las zonas rurales del Municipio y así brindar una mejor calidad de vida.

Para dar solución a la problemática que actualmente enfrenta el municipio, es pertinente llevar a cabo el “MANTENIEMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL – CORREDOR MUNICIPAL – VEREDA TINCACHOQUE MUNICIPIO DE GUATEQUE – BOYACA SEGÚN CONVENIO 4348 DE 2023”.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


El municipio está ubicado en las estribaciones de la cordillera oriental, teniendo un relieve ondulado, quebrado y escarpado. Guateque tiene como cuenca principal el río Súnuba, formado por la unión de los ríos Aguacias y Machetá, y desemboca en la represa de Chivor.

El municipio de Guateque tiene una población de 10.921 personas, de las cuales 6.985 viven en el casco urbano y 2.937 habitan la zona rural. Es uno de los más densos del departamento. La población en su mayoría es de raza blanca, el resto de la población es mestiza. Los habitantes del municipio se reconocen por su hospitalidad y buen trato hacia el turista.

Ilustración 1. Localización general del proyecto



Localización de Guateque en Colombia

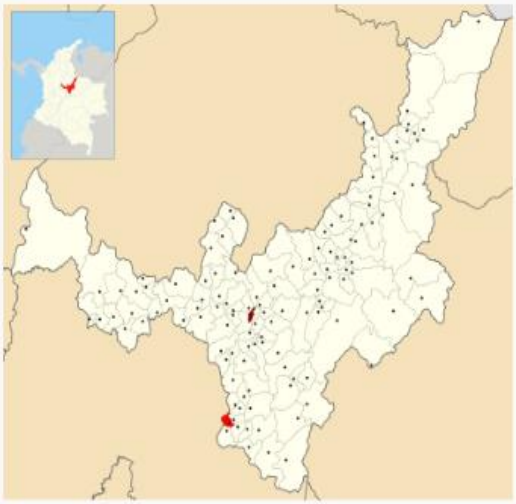
Ubicación de Guateque en Boyacá

Fuente: Wikipedia

2.2 ALCANCE DEL PROYECTO

De acuerdo con lo anterior, el proyecto se basa inicialmente en la construcción de dos tramos viales clasificados por el INVIAS como de tercer orden de acuerdo con lo establecido en la resolución 5556 de 2019, así como la construcción de obras de drenaje.

- El pavimento con Placa-huella constituye una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses y camiones al día siendo los automóviles, los camperos y las motocicletas el mayor componente del flujo vehicular.

- Por lo anterior, para el presente proyecto se ha seleccionado el pavimento de placa huella ya que se ajusta a las condiciones de corredor vial y cuenta con los siguientes atributos:

- Ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante un amplio período de servicio.

- No requiere acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales.

- No requiere mayores modificaciones a la geometría de la vía existente ya que por condiciones de rugosidad de la superficie de éste tipo de pavimento la velocidad de los vehículos tiende a ser muy baja. Es pertinente manifestar que la baja velocidad es un control implícito de la accidentalidad.

- Reducir los costos de construcción y mantenimiento respecto a los mismos costos de un pavimento convencional.

- Ofrecer la posibilidad de utilización de materiales y mano de obra locales.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.3 ASPECTOS CONTRACTUALES

Cuadro 1. Aspectos generales del contrato

RESUMEN ADMINISTRATIVO	
CONVENIO No.	4348 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
VALOR:	$ 249.705.462,oo
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE
NIT CONTRATISTA:	900007956-2
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No1	UN (1) MESES
FECHA FINAL DE TERMINACION:	24 DE MAYO DE 2024
SUPERVISIÓN:	HERBY LUNA CRUZ

2.4 EQUIPOS UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Cuadro 2. Equipos utilizados

EQUIPOS UTILIZADOS	CANTIDAD
Excavadora de llanta	0
Volqueta Sencilla	0
Vibro compactador	1
Motoniveladora	0
Vibrador de concreto	1
Mezcladora de un bulto y medio	1

2.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2.5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

1. Construcción de las dos alcantarillas
2. Inicio de construcción placa huella del tramo 2.
3. Ensayos de resistencia del concreto.
4. Acopio material de rio (arena y gravilla)
5. Acopio de cemento.
6. Trazos de la placa huella tramo 2.
7. Fundida de placa huella en el tramo 1 124m de 130m tramo 1.
8. Compactación de la via tramo 2.
9. Fundida de bordillo del primer tramo 75 m.
10. Acopio piedra rajos.
11. Armada de vigueteria.
12. Amarre de hierro para huellas y cunetas.

3 AVANCE DE OBRAS

A fecha del presente informe, se ha ejecutado el 85% de la obra donde se han fundido 194 metros lineales de ciclópeo central. 124 metros de ciclópeo externo por los dos costados, 124 metros lineales de huella en ambos costados, y 75 metro de bordillo en tramo 1.

3.1 CALIDAD DE LAS OBRAS

Por parte de la interventoría se realizó el seguimiento correspondiente para el cumplimiento del control de calidad de las labores que se desarrollaron, en este sentido se ha verificado la calidad de los materiales que se dispusieron en la obra y la verificación con sus respectivos protocolos de calidad de los materiales suministrados.

3.2 CONCEPTO TECNICO DE CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Se ejecutaron los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de nuestro compromiso contractual, para ello se entregan las evidencias de cumplimiento a la fecha, reglamentos y normas, así como las pruebas, análisis e investigaciones de campo previstas en el proyecto. (Ver Anexos).

3.3 CONTROL A LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

A pesar de todas las problemáticas presentadas en el plazo del contrato como lo fue dificultades en el suministro de materiales pétreos y granulares en la región, condiciones climáticas adversas, etc., con el esfuerzo y compromiso por parte del contratista y la Interventoría, se ejecutaron las actividades sin pendientes de obras.

4 REGISTRO FOTOGRÁFICO












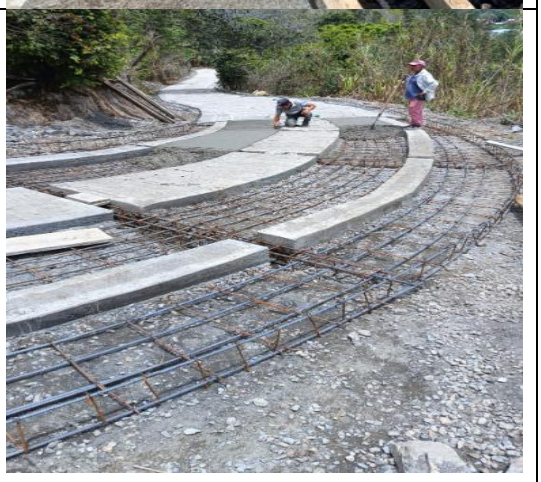

5 CONCLUSIONES

- A la fecha de entrega de este informe parcial No 5 se ha ejecutado el 85%, correspondientes a las actividades ejecutadas y descritas anteriormente.

- Se ha tenido una correcta seguridad en obra tanto industrialmente como biológicamente al momento de hacer todas las tareas contratadas, teniendo a la fecha cero casos de accidentes presentados en obra.

- **ADMINISTRATIVO**
  - Se realizó el presente Informe parcial de obra.
  - Revisión y control del personal del Contratista.
  - Revisión y control de equipo del Contratista.

- **TÉCNICO**
- Se realizó control en obra para verificación de cantidades ejecutadas y que se encuentren de acuerdo a las especificaciones técnicas de calidad.

- **FINANCIERO Y CONTABLE**
- A la fecha de corte se han presentado la documentación solicitada por parte de la interventoría donde son los soportes e informes contables.

- **JURÍDICO**
- Control de pólizas. A la fecha se revisaron y verificaron las garantías de cumplimiento las cuales se encuentran vigentes.

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA Nº. 05
01 al 30 abril de 2024

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2878 de 2023

INTERVENTORÍA: HERBY LUNA CRUZ

CONTRATO DE OBRA No. 4348 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TINCACHOQUE MUNICIPIO DE GUATEQUE

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE																													ENERO			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
MOTOCICLETA	TVS STRYKER 125 MOD 2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Control vehiculos interventoria

Alquiler de motocicleta TVS stryker 125 mod 2022 125 cc color negro para movilizacion de residente

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

Se terminan las obras objeto del contrato de obra

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No 2520242574 CND

Firma
Nombre: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA Nº. 05
01 al 30 abril de 2024

6.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CODIGO	MEPI-MINI-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2878 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONVENIO DE OBRA No.: 4348 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	YESID CAMILO RODRIGUEZ FONSECA	1049796832	RESIDENTE	$ 2.600.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	HERBY LUNA CRUZ	$ 2.600.000,00	$ 180.960	V	FAMISANAR	4524374602	$ 104.000	PORVENIR	4524374602	$ 416.000				
2	CESAR EDUARDO AVENDAÑO ZAMBRANO	1049795808	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.400.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50	HERBY LUNA CRUZ	$ 700.000,00	$ 48.720	V	FAMISANAR	4524374645	$ 87.500	PORVENIR	4524374645	$ 112.000				
N																				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 4.000.000,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha FEBRERO 01 DE 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Firma
Nombre: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA Nº. 05
01 al 30 abril de 2024

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2878 DE 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 4348 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1016923	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Contrato principal	$ 67.954.000,00	
		C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	adicion	$ 13.962.722	
			TOTAL			$ 81.916.722	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 81.916.722,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	NOVIEMBRE	$ 10.670.000,00	$ -	$ 10.670.000,00	$ 0	$ 10.670.000,00		1016923	$ 57.284.000,00	$ 57.284.000,00		
2	DICIEMBRE	$ 23.152.500,00	$ -	$ 23.152.500,00		$ 23.152.500,00		1016923 1016923	$ 34.131.500,00 $ 13.962.722,00	$ 48.094.222,00		
3	ENERO	$ 11.667.500,00	$ -	$ 11.667.500,00		$ 11.667.500,00		1016923 1016923	$ 22.464.000,00 $ 13.962.722,00	$ 36.426.722,00		
4	FEBRERO	$ 13.336.500,00		$ 13.336.500,00		$ 13.336.500,00		1016923 1016923	$ 9.127.500,00 $ 13.962.722,00	$ 23.090.222,00		
5	MARZO	$ 12.028.000,00		$ 12.028.000,00		$ 12.028.000,00		1016923 1016923	-$ 2.900.500,00 $ 13.962.722,00	$ 11.062.222,00		
6	ABRIL	$ 8.028.000,00		$ 8.028.000,00		$ 8.028.000,00		1016923	$ 3.034.222,00	$ 3.034.222,00		
	TOTALES	$ 78.882.500,00		$ 78.882.500,00	$ -	$ 70.854.500,00	$ 0		$ 3.034.222,00	$ 3.034.222,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Acta de costos No. 1	$ 10.670.000,00	$ -	$ 10.670.000,00
Acta de costos No. 2	$ 23.152.500,00	$ -	$ 23.152.500,00
Acta de costos No. 3	$ 11.667.500,00	$ -	$ 11.667.500,00
Acta de costos No. 4	$ 13.336.500,00	$ -	$ 13.336.500,00
Acta de costos No. 5	$ 12.028.000,00	$ -	$ 12.028.000,00
Acta de costos No. 6	$ 8.028.000,00	$ -	$ 8.028.000,00
VALOR TOTAL	$ 78.882.500,00	$ -	$ 78.882.500,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520242574 CND.

Firma
Nombre: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: . 041-037-0618068 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA Nº. 05
01 al 30 abril de 2024

6.4 Seguimiento a garantía contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2878 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 1/11/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 67.954.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 81.916.722,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.191.672,20	1	11	2023	21	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 16.383.344,40	1	11	2023	22	7	2027
Calidad del servicio	20%	$ 16.383.344,40	1	11	2023	22	7	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101154110

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/09/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad del servicio								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/09/223

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal - Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520242574 CND

Firma
Nombre: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101154110	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	03	2024	01	11	2023	00:00	22	07	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
LUNA CRUZ, HERBY	CC: 4.197.343	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3123282602

DIRECCIÓN: CL 19 B81 B 45

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0103, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 2878 DE 2023
OBJETO: El objeto del contrato INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE Y GUAYATA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2023	21/07/2024	$8,191,672.20	$6,795,400.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/11/2023	22/07/2027	$16,383,344.40	$13,590,800.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/11/2023	22/07/2025	$16,383,344.40	$13,590,800.00

ACLARACIONES

CONTRATO ADICIONAL NUMERO 1746-01-2023 DE 2023 ADICION VALOR $13.962.722

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******37,287.00	$ *******8,000.00	$ *******8,604.00	$ **********53,891.00	$ *******40,958,361.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS L	235494	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-44-101154110

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF235494A 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101154110	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	03	2024	01	11	2023	00:00	22	07	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
LUNA CRUZ, HERBY	CC: 4.197.343

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 B81 B 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3123282602

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

ADICIONAL:

PSE GUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******37,287.00	$ *******8,000.00	$ *******8,604.00	$ **********53,891.00	$ *******40,958,361.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS L	235494	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100860698001 1(3900)000000053891(96)20250304

REFERENCIA PAGO: 1100860698001-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101154110	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	03	2024	01	11	2023	00:00	22	07	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
LUNA CRUZ, HERBY			CC: 4.197.343
DIRECCIÓN: CL 19 B81 B 45	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3123282602

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-44-101154110

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF2356B4A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA Nº. 05
01 al 30 abril de 2024

6.5 Seguimiento al pan de calidad contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2878 de 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ

FECHA DE INICIO: 1/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 4348 de 2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TINCACHOQUE MUNICIPIO DE GUATEQUE

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ----------
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ----------

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:
Para este proyecto No aplica esta actividad.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND

Firma NA
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC


Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual.

• Seguimiento a la inversión del Anticipo:

Este contrato de interventoría no cuenta con anticipo

• Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado.

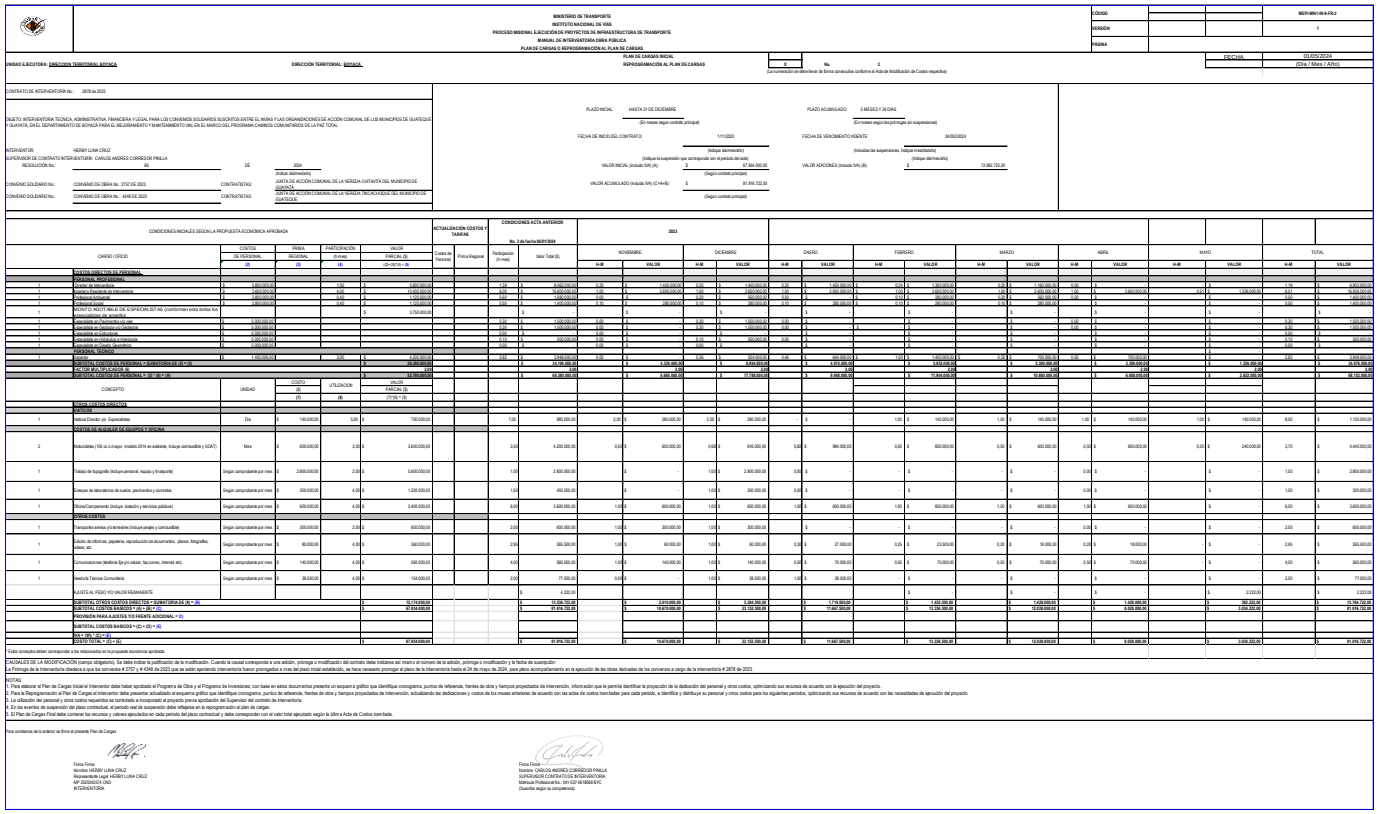

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO: MEP-MIN1-Ma-4-FR-2 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA | FECHA: 03/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BOYACA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA — PLAN DE CARGAS INICIAL / REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS — No. 3 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme el Acta de Modificación de Costos respectiva)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2678 de 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUATAQUÍ Y GUAYATÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 5 MESES Y 24 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2023 (Indique diamés/año) — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique mes/día/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 67.664.000,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13.962.722,00 (Indique diamés/año) (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 81.916.722,00 (Según contrato principal)

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA
RESOLUCIÓN No.: 88 DE 2024 (Indicar diamés/año)
CONVENIO SOLIDARIO No.: CONVENIO DE OBRA No.: 2707 DE 2023 CONTRATISTAS: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA
CONVENIO SOLIDARIO No.: CONVENIO DE OBRA No.: 4348 DE 2023 CONTRATISTAS: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TRICAHUSQUE DEL MUNICIPIO DE GUATAQUI

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA

CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL (A)	PRIMA REGIONAL (A)	PARTICIPACIÓN (t-mes) (A)	VALOR PARCIAL ($) (A)=(A)*(A)*(A)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
1 Director de Interventoria	$ 7.800.000,00	0,00	1,00	$ 7.800.000,00
1 Residente Residente de Obra civil	$ 7.800.000,00	0,00	4,00	$ 31.200.000,00
1 Profesional Ambiental	$ 7.800.000,00	0,00	1,00	$ 7.800.000,00
1 Profesional Social	$ 7.800.000,00	0,00	1,00	$ 7.800.000,00
1 MONTO AJUSTABLE DE ESPECIALISTAS (conformam esta bolsa los especialistas de suelos)				$ 3.750.000,00
1 Especialista en Geotecnia	$ 7.500.000,00		0,00	$ -
1 Especialista en Hidrologia y Drenaje	$ 7.500.000,00		0,00	$ -
1 Especialista en Estructuras	$ 7.500.000,00		0,00	$ -
1 Especialista en Hidraulica y Vertederos	$ 7.500.000,00		0,00	$ -
1 Especialista en Costos y Presupuestos	$ 7.500.000,00		0,00	$ -
PERSONAL TECNICO				
1 Topografo	$ 4.680.000,00	0,00	1,00	$ 4.680.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL + SUBSISTENCIA (D (1-A))				**$ 84.330.000,00**
FACTOR PRESTACIONAL (B)				**2,60**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (* (B) (*) (B))				**$ 219.258.000,00**

CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (C) (1)	UTILIZACION (C) (2)	VALOR PARCIAL ($) (C)=(1)*(2)
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIATICOS				
1 Viatico Director y/o Especialistas	Dia	140.000,00	5,00	$ 700.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
2 Vehiculares (1500 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	Mes	$ 600.000,00	3,00	$ 3.600.000,00
1 Teletipo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	Segun comprobante por mes	$ 2.800.000,00	2,00	$ 5.600.000,00
1 Analisis de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	Segun comprobante por mes	$ 300.000,00	4,00	$ 1.200.000,00
1 Otros(Cargamento (incluye dotación y servicios públicos)	Segun comprobante por mes	$ 600.000,00	4,00	$ 2.400.000,00
OTROS COSTOS				
1 Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Segun comprobante por mes	$ 300.000,00	2,00	$ 600.000,00
1 Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, biografías, videos, etc.	Segun comprobante por mes	$ 95.000,00	4,00	$ 380.000,00
1 Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Segun comprobante por mes	$ 140.000,00	4,00	$ 560.000,00
1 Asesoria Tecnica Comunitaria	Segun comprobante por mes	$ 38.500,00	4,00	$ 154.000,00
AJUSTE AL PISO Y/O VALOR REMANENTE				$ 4.333,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = $(UNIT.CRIA DE (B = (B)				**$ 15.176.000,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS * (A) + (B) = (C)				**$ 97.934.000,00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (C)				
SUBTOTAL COSTOS BASICOS + (C) + (D) = (E)				
IVA = (E) - (C) = (E)				
COSTO TOTAL = (C) + (E)				**$ 97.934.000,00**

	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (t-mes)	Valor Total ($)	2023 NOVIEMBRE H-M	NOVIEMBRE VALOR	DICIEMBRE H-M	DICIEMBRE VALOR	ENERO H-M	ENERO VALOR	FEBRERO H-M	FEBRERO VALOR	MARZO H-M	MARZO VALOR	ABRIL H-M	ABRIL VALOR	MAYO H-M	MAYO VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
1 Director de Interventoria			1,00	$ 8.400.000,00	0,40	$ 1.400.000,00	0,40	$ 1.400.000,00	0,40	$ 1.400.000,00	0,40	$ 1.400.000,00	0,40	$ 1.400.000,00	0,00	$ -		$ -	1,60	$ 5.600.000,00
1 Residente Residente de Obra civil			4,00	$ 33.600.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00		$ -	6,00	$ 16.800.000,00
1 Profesional Ambiental			1,00	$ 8.400.000,00	0,40	$ 1.400.000,00	0,40	$ 1.400.000,00	0,40	$ 1.400.000,00	0,40	$ 1.400.000,00	0,40	$ 1.400.000,00	0,00	$ -		$ -	1,60	$ 5.600.000,00
1 Profesional Social			1,00	$ 8.400.000,00	0,40	$ 1.400.000,00	0,40	$ 1.400.000,00	0,40	$ 1.400.000,00	0,40	$ 1.400.000,00	0,40	$ 1.400.000,00	0,00	$ -		$ -	1,60	$ 5.600.000,00
1 MONTO AJUST ABLE DE ESPECIALISTAS (conformam esta bolsa los especialistas de suelos)				$ 3.750.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1 Especialista en Geotecnia			0,25	$ 1.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,25	$ 1.500.000,00
1 Especialista en Hidrologia y Drenaje			0,25	$ 1.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,25	$ 1.500.000,00
1 Especialista en Estructuras			0,25	$ 1.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,25	$ 1.500.000,00
1 Especialista en Hidraulica y Vertederos			0,13	$ 750.000,00	0,00	$ -	0,13	$ 750.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,13	$ 750.000,00
1 Especialista en Costos y Presupuestos			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
PERSONAL TECNICO																				
1 Topografo			0,50	$ 2.340.000,00	0,00	$ -	0,50	$ 2.340.000,00	0,00	$ -	0,50	$ 2.340.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,50	$ 4.680.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL + SUBSISTENCIA (D (1-A))				**$ 84.330.000,00**		**$ 5.600.000,00**		**$ 8.290.000,00**		**$ 8.000.000,00**		**$ 8.000.000,00**		**$ 8.000.000,00**		**$ 5.600.000,00**		**$ - **		**$ 51.490.000,00**
FACTOR PRESTACIONAL (B)				**2,60**		**2,60**		**2,60**		**2,60**		**2,60**		**2,60**		**2,60**		**2,60**		**2,60**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL * (B) (*) (B))				**$ 219.258.000,00**		**$ 14.560.000,00**		**$ 21.554.000,00**		**$ 20.800.000,00**		**$ 20.800.000,00**		**$ 20.800.000,00**		**$ 14.560.000,00**		**$ - **		**$ 133.874.000,00**

CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (C) (1)	UTILIZACION (C) (2)	VALOR PARCIAL ($) (C)=(1)*(2)	NOVIEMBRE H-M	NOVIEMBRE VALOR	DICIEMBRE H-M	DICIEMBRE VALOR	ENERO H-M	ENERO VALOR	FEBRERO H-M	FEBRERO VALOR	MARZO H-M	MARZO VALOR	ABRIL H-M	ABRIL VALOR	MAYO H-M	MAYO VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS																				
VIATICOS																				
1 Viatico Director y/o Especialistas	Dia	140.000,00	5,00	$ 700.000,00	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00		$ -	5,00	$ 700.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																				
2 Vehiculares (1500 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	Mes	$ 600.000,00	3,00	$ 3.600.000,00	0,00	$ 600.000,00	0,00	$ 840.000,00	0,00	$ 984.000,00	0,00	$ 600.000,00	0,00	$ 600.000,00	0,00	$ 600.000,00	0,00	$ 240.000,00	2,70	$ 4.440.000,00
1 Teletipo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	Segun comprobante por mes	$ 2.800.000,00	2,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 2.800.000,00
1 Analisis de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	Segun comprobante por mes	$ 300.000,00	4,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 300.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 300.000,00
1 Otros(Cargamento (incluye dotación y servicios públicos)	Segun comprobante por mes	$ 600.000,00	4,00	$ 2.400.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00		$ -	6,00	$ 3.600.000,00
OTROS COSTOS																				
1 Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Segun comprobante por mes	$ 300.000,00	2,00	$ 600.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 600.000,00
1 Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, biografías, videos, etc.	Segun comprobante por mes	$ 95.000,00	4,00	$ 380.000,00	1,00	$ 95.000,00	1,00	$ 95.000,00	0,00	$ 27.000,00	0,00	$ 22.000,00	0,00	$ 19.000,00	0,00	$ 19.000,00		$ -	2,00	$ 380.000,00
1 Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Segun comprobante por mes	$ 140.000,00	4,00	$ 560.000,00	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	0,00	$ 70.000,00	0,00	$ 70.000,00	0,00	$ 70.000,00	0,00	$ 70.000,00		$ -	4,00	$ 560.000,00
1 Asesoria Tecnica Comunitaria	Segun comprobante por mes	$ 38.500,00	4,00	$ 154.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 38.500,00	1,00	$ 38.500,00		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 77.000,00
AJUSTE AL PISO Y/O VALOR REMANENTE				$ 4.333,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.222,00		$ 2.222,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = $(UNIT.CRIA DE (B = (B)				**$ 15.176.000,00**		**$ 3.910.000,00**		**$ 3.393.500,00**		**$ 1.719.500,00**		**$ 1.432.000,00**		**$ 1.429.000,00**		**$ 1.429.000,00**		**$ 242.222,00**		**$ 10.744.722,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS * (A) + (B) = (C)				**$ 97.934.000,00**		**$ 19.470.000,00**		**$ 25.192.500,00**		**$ 11.687.500,00**		**$ 10.356.500,00**		**$ 10.029.000,00**		**$ 6.029.000,00**		**$ 2.664.222,00**		**$ 81.916.722,00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (C)																				
SUBTOTAL COSTOS BASICOS + (C) + (D) = (E)																				
IVA = (E) - (C) = (E)																				
COSTO TOTAL = (C) + (E)				**$ 97.934.000,00**		**$ 19.470.000,00**		**$ 25.192.500,00**		**$ 11.687.500,00**		**$ 10.356.500,00**		**$ 10.029.000,00**		**$ 6.029.000,00**		**$ 2.664.222,00**		**$ 81.916.722,00**

Todos conceptos deben corresponder a las relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio): Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así: mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
La Prórroga de la Interventoria obedece a que los contratos # 2707 y # 4348 de 2023 que se están ejecutando Interventoria fueron prorrogados a mas del plazo inicial establecido, se hace necesario prorrogar el plazo de la Interventoria hasta el 24 de mayo de 2024, para poder acompañamiento en la ejecución de las obras derivadas de los convenios a cargo de la interventoria # 2678 de 2023.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos se controlará e incorporará el proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoria.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal: HERBY LUNA CRUZ
NIF 1052442078 CND
INTERVENTORIA

Firma Firma
Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matricula Profesional No.: 041-157-161868 BYC
(Suscribe según su competencia)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este periodo se adelantan varias gestiones y se continuo con ejecución de obra en la vereda Tincachoque del municipio de Guateque:

En la vereda Tincachoque del municipio de Guateque convenio 4348 se construyeron las dos alcantarillas en su totalidad, se fundieron 124 metros de ciclópeo central y ciclópeo de sobre ancho y huella de 130 metros del tramo 1, se fundieron 75 metros de bordillo del tramo y se fundieron 70 metros de ciclópeo central del tramo 2 se armó e instaló 24 riostras en el tramo 2. Se lleva una ejecución del 85% y un retraso por ende se solicitó prorroga hasta el 15 de mayo de 2024

8. ANEXOS

✓ Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. Ver Anexo 19


✓ Registro fotográfico sectores a intervenir.

8.1 RELACION CORRESPONDENCIA.

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA						
FECHA DE ENVÌO	NÙMERO CONSECUTIVO	NÙMERO RADICADO	FECHA DE RADICACIÒN	ASUNTO:	QUIÈN LO DIRIGE:	DIRIGIDO A:
03/04/2024	GUAY-BOY-033-2024	GUAY-BOY -033-2024	03/04/2024	INFORME MENSUAL # 4 DE INTERVENTORIA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
03/04/2024	GUAY-BOY -034-2024	GUAY-BOY -034-2024	03/04/2024	INFORMACION TERMINACION DE OBRAS	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
11/04/2024	GUAY-BOY -035-2024	GUAY-BOY -035-2024	11/04/2024	PRORROGA Y ADICION CONTRATO DE INTERVENTORIA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
11/04/2024	GUAY-BOY -036-2024	GUAY-BOY -036-2024	11/04/2024	ACTA DE COSTOS # 5DE INTERVENTORIA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
15/04/2024	GUAY-BOY -037-2024	GUAY-BOY -037-2024	15/04/2024	AVANCE DE OBRA CONVENIO 4348	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
19/04/2024	GUAY-BOY -038-2024	GUAY-BOY -038-2024	19/04/2024	PROGRAMACION PLAN DE CARGAS	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
24/04/2024	GUAY-BOY -039-2024	GUAY-BOY -039-2024	24/04/2024	ATENCION OBSERVACIONES INFORME FEBRERO	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
30/04/2024	GUAY-BOY -040-2024	GUAY-BOY -040-2024	30/04/2024	PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA					
FECHA RECIBIDO	NUMERO CONSECUTIVO	ASUNTO:	QUIEN REMITE	QUIEN FIRMA	DIRIGIDO A:
01/04/2024	GUAY-BOY-041-2024	DISEÑO DE VALLA CONVENIO 4348	INVIAS	CARLOS BETANCOUR	HERBY LUNA CRUZ.
03/04/2024	GUAY-BOY-042-2024	SOLICITUD AVANCE CONVENIOS CAMINOS COMUNITARIOS	INVIAS	ANGELICA RUBIO	HERBY LUNA CRUZ.
08/04/2024	GUAY-BOY-043-2024	INFORME CONVENIOS SOLIDARIOS	INVIAS	ANGELICA RUBIO	HERBY LUNA CRUZ.
09/04/2024	GUAY-BOY-044-2024	INFORME CONTABILIDAD TINCACHOQUE	JAC TINCACHOQUE	DIANA RUIZ	HERBY LUNA CRUZ.
16/04/2024	GUAY-BOY-045-2024	SOLICITUD INFORMACION GASTOS PAGA	INVIAS	ANGELICA RUBIO	HERBY LUNA CRUZ.
17/04/2024	GUAY-BOY-046-2024	INFORME ENERO FIRMADO	INVIAS	ANGELICA RUBIO	HERBY LUNA CRUZ.
23/04/2024	GUAY-BOY-047-2024	SOLICITUD INFORMACION CONVENIOS	INVIAS	ANGELICA RUBIO	HERBY LUNA CRUZ.
29/04/2024	GUAY-BOY-048-2024	REUNION AMBIENTAL	INVIAS	PAULA MORENO	HERBY LUNA CRUZ.

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO:

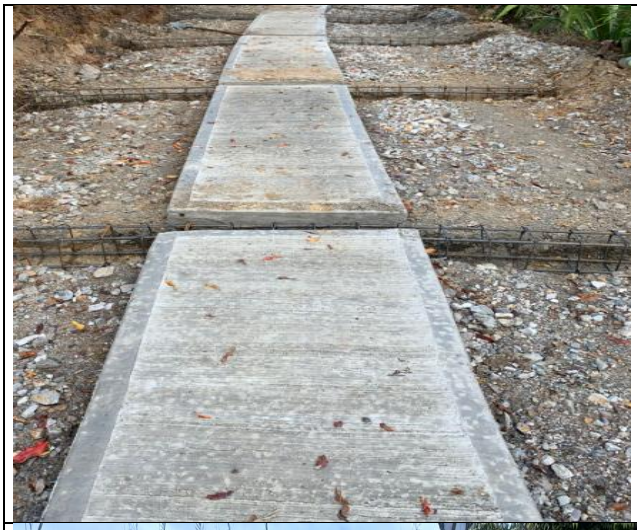







8.2 BITACORA

LUNES 01 DE ABRIL DE 2024.

Estado del Clima-> Dic

Personal en Obra-> Ingeniero-> Sebastian Perez

Maestro-> Emilio Ramirez

1 Oficial y 9 ayudantes.

Equipos-> Bicicleta, mitra, Pico, Pala, carretilla, alicates, Tabla mezcladora, vibrador de concreto, bagillera, Pelustre,

Actividades-> Se inicia Obra a las 7:00 am. donde se comienza excavando Para 4 vigas y luego empezar tierra Para 8 Secciones de huella y luego se ormen Para lo cual se usaron 28 bultos de cemento y luego se ormen 30 metros de ciclopeo central y de los sobrecanchos. del tramo # 2.

Sebastian PM. Ars. obra

Ped-Intv

MARTES 02 DE ABRIL DE 2024.

Estado del Clima-> Dic

Personal en Obra-> Ingeniero-> Sebastian Perez

Maestro-> Emilio Ramirez

1 Oficial y 9 Ayudantes

Equipos-> mezcladora, vibrador de concreto, Pala, baldes, carretilla bagillera, Pelustre, camion

Actividades-> Se inicia obra a las 7:00 am. donde Se Fundan 4 Secciones de ciclopeo central y de a 4 Secciones Por los costados Para lo cual se usaron 18 bultos de cemento y luego un camion con 100 bultos de cemento

Ped. Intv

Sebastian PM. Ars. obra

MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2024

Estado del Clima -> Dic

Personal en obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez

Maestro -> Emilio Ramirez

1 Oficial y 9 ayudantes

EQUIPOS -> mezcladora, vibrador de concreto, Pala, baldes

Cortafrio, bayoneta, Pulustre.

Actividades -> Se inicio obra a las 7:00 Am. donde

Se fundan 12 metros de ciclopeo por el

Centro y de c 17 metros de ciclopeo por

los costados en el tramo #2. Para lo cual

Se usaron 48 bultos de cemento.

Sebastian Perez / Ais. / PM. / obra.

Res. Inv

JUEVES 04 DE ABRIL DE 2024

Estado del Clima -> Dic

Personal en obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez

Maestro -> Emilio Ramirez

1 Oficial y 9 ayudantes

Esq. Pro -> Pala, Pico, barra, Pichirugla, mezcladora, baldes

Vibrador de concreto, cortafrio, bayoneta.

Actividades -> Se inicio obra a las 7:00 Am. donde

Se comienza a nivelar la base del concreto

ciclopeo y luego se comienza a fundir para meter

4 vigas y se cierra el hierro para 6 secciones

de muro donde se usan 24 varillas de 1/2" y

9 varillas de 1/4" luego se funden y se

usan 71 bultos de cemento.

Sebastian Perez / Ais. / PM. / obra

Res. Inv

VIERNES 05 DE ABRIL DE 2024

Estado del Clima -> Dic

Personal en obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez

Maestro -> Emilio Ramirez

1 Oficial y 9 ayudantes

Equipos -> boguillero, Alistar, mezcladora, vibrador de concreto

Pala, barra, pica, carretilla

Actividades -> Se inicia obra a las 7:00 Am. donde se ejecuta 3 vigas y se comienza armar el hierro donde se usan 12 varillas de 1/2 y 9 varillas de 1/4" para 6 secciones de huella luego se funden y se usan 15 bultos de cemento, Despues se arma el hierro para 36 metros de cuneta donde se usan 20 varillas de 1/2" y 9,5 varillas de 1/4"

Sebastian PII obra / Res. Int

SABADO 06 DE ABRIL DE 2024.

Estado del Clima ->

Personal en obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez

Maestro -> Emilio Ramirez

1 oficial y 9 ayudantes

Equipos -> mezcladora vibrador de concreto, carretilla, Pala baldes, boguillero, Tabla

Actividades -> Se inicia obra a las 7:00 a.m. donde se comienza instalando la tabla para luego fundir la cuneta, despues se funden los 36 metros de cuneta por el costado derecho, para lo cual se usaron 19 bultos de cemento

* Interventoria: Se solicita que el lunes se mueva el acceso a la vivienda donde se funde canaleta.

Sebastian PII obra / Res. Int

Lunes 08 de abril de 2024
Estado del clima → dia con lluvia
Personal en obra → ingeniero residente → Sebastian Perez
maestro → Emilio Bohorquez
1 oficial, 9 ayudantes
Equipos → Palas, pelin, vibro, carretilla, palustre, baguillera y vibrador de concreto.
Actividades → Se inicia obra alas 7 am donde se fundieron 60 metros de cunetas 48 metros lado izquierdo y 12 metros lado derecho viendo de arriba hacia abajo.

Sebastian P.H
Residente de obra

Res. Intv

Martes 09 de abril de 2024
Estado del clima → dia con lluvia
Personal en obra → ingeniero residente → Sebastia Perez
maestro → Emilio Bohorquez
1 oficial, 9 ayudantes
Equipos → varillas, palas, alambre, tablas, vibrorugue
Se realiza trazo central de placa huella y se alinean 7 secciones centrales y 5 secciones de bordes sobre anchos para dejar listo para fundir ciclopeo

Sebastian P.H
Res. obra

Res. Intv

Miercoles 10 abril de 2024
Estado del clima → Soleado
Personal en obra → Ingeniero residente → Sebastian Perez
maestro → Emilio Bohorquez
1 oficial, 9 ayudantes
Equipos → trompo, palas, baldes, carretillas, palustre, boquillera, metro, vibrador de concreto.
Actividades → Se funden 7 secciones de centro con ciclopeo y 5 secciones de sobre anchos. y se dejan armados 2 secciones centro y 4 de sobre ancho.

* Interventoria = Se hace revision de obra se sigue viendo retraso de obra se solicita agilizar, se recuerda arreglar entrada a vivienda.

Sebastian P.H
Res. obra

Res. Inter

Jueves 11 de abril de 2024
Estado del clima → Soleado
Personal en obra → Ingeniero residente → Sebastian Perez
1 maestro → Emilio Bohorquez
1 oficial, 9 ayudantes
Equipos → trompo, palas, baldes, tablas, varillas, carretillas, palustre, boquillera, vibrador de concreto.
Actividades → Se arman 2 secciones de centro y sobre anchos 2 secciones, se realiza fundida de 12 metros de centro y 15 metros de sobre anchos con ciclopeo, y se le realiza su respectivo acabado.

Sebastian P.H
Res. obra

Res. inter

Viernes 12 de abril de 2024
Estado del clima → Soleado
Personal en obra → Ingeniero residente → Sebastian Perez
Maestro → Emilio Bohorquez
1 oficial, 9 ayudantes
Equipos → Varillas, alambres, vichiraguer, palin, pica, palas, mezcladora, valdes, cuchilla, boquillera, palustre, martillo, camillas, puntillas
Actividades → Se realiza encofrado con camillas de aletas de descole de alcantarilla 1, tambien se arman 4 secciones de huella y se funden con su respectivo acabado, se da indiccacion a maestro de dejar bien ubicado y chaite agua ala que se funde para que fraguc bien.

*Interventoria: Se realiza revisión de obra ejecutada con visita de director de interventoria, el cual se le solicita al residente iniciar labores en el tramo 1 de placa huella, tambien agilizar labores ya que se evidencia retraso en la obra y se evidencia que no se termina el 30 de abril que es cuando se finaliza el convenio, tambien se solicita dejar nivelado el acceso a la vivienda cruce a la alcantarilla 1

Sebastian P.I.
Res. obra

Dir. Interv

Sabado 13 de abril de 2024
Estado del clima → Soleado
Personal en obra → Ingeniero residente → Sebastian Perez
Maestro → Emilio Bohorquez
1 oficial, 9 ayudantes
Equipos → Varillas, mezcladora, alambres, palas, picas, valdes, cuchillas

Vibrisoque, pulustre, boquillera, vibrador de concreto
Actividad → Se realiza el armado para 10 secciones de huella instalando las vigas, y se funden con concreto 15 metros de huella.

Sebastian P.H
Res. obra

Res. Intv

Lunes 15 de abril de 2024
Estado del clima → Soleado
Personal de obra → Ingeniero residente → Sebastian Perez
maestro → Emilio Bohorquez
Equipos → Varilla, mezcladora, carretillas, palas, valdes, boquillera, vibrisoques, pulustre, vibrador concreto.
Actividad → Se realiza armado e instalacion de vigas para 6 secciones de huella, se funden 9 metros de huella, se termina de encapiar desde alcantarilla 1, se deja listo para fundir, se reciben 400 bultos de cemento uno 600 de 1040

Sebastian P.H
Res. obra

Res. Intv

Martes 16 de abril de 2024
Estado del clima → Soleado
Personal de obra → Ing residente → Sebastian Perez
maestro = Emilio Bohorquez
1 oficial, 9 ayudantes
Equipos → Varillas, alambre, vibrisoque, mezcladora, palas, valdes, carretilla, martillo, pulustre, boquillera, vibrador de concreto.
Actividad → Se funde desde de alcantarilla 1, se saca muestra de concreto y se realiza armado de 8 metros de cunetas. Hubo que bajar el concreto desde la parte alta del tramo 2 al sitio de la alcantarilla.
e.Sebastian P.H

Res. Intv

30

Miercoles 17 de abril de 2024
Estado del tiempo → Soleado
Personal de obra → Ingeniero residente → Sebastian Perez
maestro → Emilio Bohorquez
1 oficial, 9 ayudantes
Equipos → Rueda, alambre, vibrocopor, mezcladora, palas, carretillas, valdes, boquillera, polvistre
Actividad → Se aiman 36 metros de cunetas y se funden 60 metros de ~~desarrollo~~ cunetas con su respectivo acabado, 60 metros izquierdo y 60 metros derecho.

* Interventoria = Se hace seguimiento a obra se solicita curar bien el concreto y ubicar bien las que se evidencia grietas minimas

Sebastian P.H
Res- obra

Res into

Jueves 18 de abril de 2024
Estado del tiempo = nublado
Personal de obra = ingeniero residente → Sebastian Perez
maestro → Emilio Bohorquez
1 oficial 9 ayudantes
Equipos → 3 tablas, puntilla, pentillas, alambre, mezcladora palas, picos, valdes carretilles, boquillera, vibrador de concreto
Actividad → Se dejan aimados 2 secciones de cunetas y sobre anchos, se instalan vigas y se realizo aimado y fundida de 4 secciones de huella, se descargan 100 bultos de cemento van 700 de 1040

Sebastian P.H
Res. obra

Res into

Viernes 19 de abril
Estado del tiempo = día con lluvia
Personal de obra → Ingeniero residente → Sebastian Perez
maestro → Emilio Bohorquez
1 especial, 9 ayudantes
Equipos → tablas, machetes, alambre, baldes, carretilla, mezcladora, vibrador de concreto,
Actividad → se toma 6 secciones de centro y sobre anchos del tramo 2, se funden 4 secciones de huella y se inicia trazado del tramo 4

Sebastian P.H
Res. obra

Res. intv

Sabado 20 de abril de 2024

Estado del clima → Soleado
Personal de obra → Ingeniero residente → Sebastian Perez
maestro → Emilio Bohorquez
1 especial, 9 ayudantes
Equipos = Mezcladora, carretilla, baldes, palas, barretillas, vibrador de concreto, pelustre
Actividad → Se realiza fundida de ciclopeo de 7 secciones de centro y 7 secciones de sobre anchos con su respectivo curado, se le indica a maestro donde hacer uso de pala fraguado.

Sebastian PH
Res. obra

Res. intv

32

Lunes 22 de abril de 2024
Estado del clima ⇒ Día con lluvias
Personal de obra ⇒ Ingeniero residente ⇒ Sebastian Perez
Maestro ⇒ Emilio Bohorquez
1 oficial, 9 ayudantes
Actividad ⇒ Se fundieron 4 secciones de ciclopeo con su respectivo acabado, se pictelan vigas y se deja armadas 12 secciones de huella del tramo 2 y se funden 3 secciones de ciclopeo del tramo 1.

Sebastian P.H
Res obra

Res. Intv

Martes 23 de abril de 2024
Estado del clima ⇒ Día nublado
Personal de obra ⇒ Ingeniero residente ⇒ Sebastian Perez
Maestro ⇒ Emilio Bohorquez
1 oficial, 9 ayudantes
Equipos ⇒ mezcladora, palas, carretilla, vibrador de concreto, hanas, valdes, boquillera
Actividad ⇒ Se alman y se funden con ciclopeo 5 secciones del tramo 1 y se realiza muro en longi en servidumbre de alcantarillo y segun lo acordado con comunidad.

Sebastian P.H
Res. obra

Res. Intv

Interventoria ⇒ Se le solicita al residente de obra curar el concreto ya que en el tramo 2 abi una seccion con una fisura se indica demoler y volver a realizar, tambien un pedazo del tramo donde se fundio se desbalanco, se esta buscando solución.

Miercoles 24 de abril de 2024
Estado del clima → lluvias
Personal de Obra → Ingeniero residente → Sebastian Perez
Maestro → Emilio Bohorquez
1 oficial 4 ayudantes
Equipos → Mezcladora, palas, carretillas, valdes, boguillera, vibrador de concreto, cilindros
Actividad → Se realizo armado de 24 metros de cuneta se fundieron 6 metros de huella 4 secciones se seccion maestro tramo 2 y se fundieron 3 secciones con ciclopeo del tramo 1

Sebastian P.H
Res - obra

Res - Intv

Jueves 25 de abril de 2024
Estado del clima → Soleado
Personal de obra → Ingeniero residente → Sebastian Perez
Maestro → Emilio Bohorquez
1 oficial, 4 ayudantes
Equipos → Mezcladora, palas, valdes, carretillas, boguillera, palestra vibrador de concreto
Actividad → Se iniciaron labores 7 am se inicio fundiendo 4 secciones de huella, sobre las 10:00 am hubo visita para revision de obras por parte de Invias dejaron observaciones, al final del dia se dejaron fundidos 14 Secciones de huella y 24 metros de cuneta por los dos lados

Sebastian P.H
Res - obra

Res. Intv

Viernes 26 de abril de 2024
Estado del clima → Nublado
Personal de obra: Ing residente → Sebastián Perez
Maestro → Emilio Bohorquez
1 oficial, 9 ayudantes
Equipos → Mezcladora, carretillas, palas, valdes, tablas, cuadrillas, alambre, pulustre, vibrador, bayoneta y vibrador de concreto
Actividad → Se realizo armado de 3 secciones de cuneta y sobre anchos y se realizo fundida de estas 3 secciones con ciclopeo, se armo 2 secciones de huella y se fundieron estas secciones del tramo 12.

P.H
Sebastian
Res. obra

Res. Interv

Sabado 27 de abril de 2024
Estado del clima = lluvioso
Personal de obra → Ingeniero residente → Sebastian Perez
→ Maestro → Emilio Bohorquez
1 oficial, 9 ayudantes
Equipos → Mezcladora, vibrador de concreto, carretillas, palas, valdes, cuadrillas, vibrocompactador, palin, pica, bayonetas, nivel y pulustre
Actividad → Se armaron 6 secciones de huella y 9 metros de cuneta por los dos lados y se fundieron estas 6 secciones de huella y 9 metros de cuneta en ambos lados.

P.H
Sebastian
Res. obra

Res. Interv

Lunes 29 de abril de 2024
Estado del clima = Lluviosos
Personal de obra → Ingeniero residente → Sebastian Perez
Maestro → Emilio Buhorquez
1 oficial, 9 ayudantes
Equipos → Tablas, martillo, Mezcladora, carretillas, palas, valdes, metro, boquillera, palustre, vibrador de concreto.
Actividad → Se armaron los ultimos 6 metros de cortina y sobre anchos del tramo 2, se fundieron estas secciones y se dejaron armados 36 metros de bordillo.

P.H
Sebastian
Res. obra

Res. Intv

Martes 30 de abril de 2024
Estado del clima → Nublado
Personal de obra → Ingeniero residente → Sebastian Perez
Maestro → Emilio Buhorquez
1 oficial, 9 ayudantes
Equipos → Tablas, mezcladora, Varillas, palas, carretillas, valdes vibrador de concreto, boquillera, palustre.
Actividad → Se arman y funden las dos ultimas secciones de huella del tramo 2 y se arman y funden 26 metros de cuneta para asi dejar armado y fundido todo hasta la via principal, se dejan armados 3 metros mas de bordillo y se dejan instaladas 9 vigas del tramo 1

P.H
Sebastian.
Res. obra

Res. Intv
