	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Convenios de Obra No. 2757 de 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIO DE GUAYATA

Contrato de Interventoría 2878 de 2023 **Interventoría:** HERBY LUNA CRUZ

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** abril 1 al 30 de 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		3
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		5
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		5
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	**INFORMACIÓN CONVENIOS DE OBRA**		6
3.1	Información general del contrato		6
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		7
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		7
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		7
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		8
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	8- 2
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	13
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	13 A 14
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	15
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	16
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	17
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	18- 26
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	27
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		28
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	28
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	28
	• Seguimiento Programa de Obra		31- 64
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	65
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	65
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	66- 68
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		69
5.1	Información general del contrato		69
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		70
5.3	Informes especialistas y profesionales		71- 88
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		No aplica
5.5	Informe matriz de riesgos.		No aplica
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		No aplica
	• Seguimiento estado del tramite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		No aplica
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		89
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	89
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	90
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	91
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	92- 95
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	96
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		97
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	97
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	97
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	97
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	97
7	**Conclusiones y recomendaciones**		98
8	**Anexos**		98
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		99
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		100
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		No aplica
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		101-115

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORIA Nº. 06
01 al 30 abril de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA **PERIODO MES:** Abril 1 al 30 de 2024

CONVENIO No.: 2757 de 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA

PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE INICIO: 01 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 4 meses

VALOR INICIAL : $ 207.042.782,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 207.042.782,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2878 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	placa huella	ml	200
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento	limpieza alcantarilla	ml	30
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	placahuella	ml	75	205
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento	limpieza alcantarilla	ml	30	30
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 158.198.040,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.523.500,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.321.242,00
APORTE JAC	$ 1.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 207.042.782,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 18.257.750,00	$ 158.750.590,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 11.105.800,00	$ 41.805.750,00
APORTE JAC		$ 1.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 29.363.550,00	$ 201.556.340,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 158.198.040,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 158.750.590,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,35%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO



tramo 1



tramo 1



tramo 1



tramo 1



tramo 2



tramo 2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520242574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORIA Nº. 06
01 al 30 abril de 2024

1 INTRODUCCION

El convenio # 2757 de 2023 celebrado entre el Instituto Nacional de vías con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ identificado número de NIT 820.003.917**-7**, que tiene como objeto, **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**. Se impartió orden de inicio al convenio con fecha 01 de noviembre de 2023.

Por otra parte, mediante el proceso de selección de mínima cuantía No. **IP-DT-BOY-021- 2023**, El Instituto Nacional de Vías, celebró el contrato No **2878 de 2023**, entre el INVIAS y **HERBY LUNA CRUZ** la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE Y GUAYATÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**". Mediante invitación pública No. **IP-DT-BOY-021-2023** por el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**, asimismo, se impartió orden de inicio al contrato de Interventoría con fecha 01 de noviembre de 2023.

El presente informe de Interventoría N° 6 describe las actividades realizadas en el periodo de 01 al 30 de abril de 2024, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para los convenios solidarios suscritos entre el invias y las organizaciones de acción comunal de los municipios de Guateque y Guayata, en el departamento de Boyacá para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.


El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.


Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

2.1 Localización y alcance

El municipio de Guayatá se encuentra localizado en la provincia de Oriente del Departamento de Boyacá, dista 131 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 112 Km cuadrados de los cuales solo 0,58 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Guayatá se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 4° 57’58’’
Longitud: 73° 29’21’’

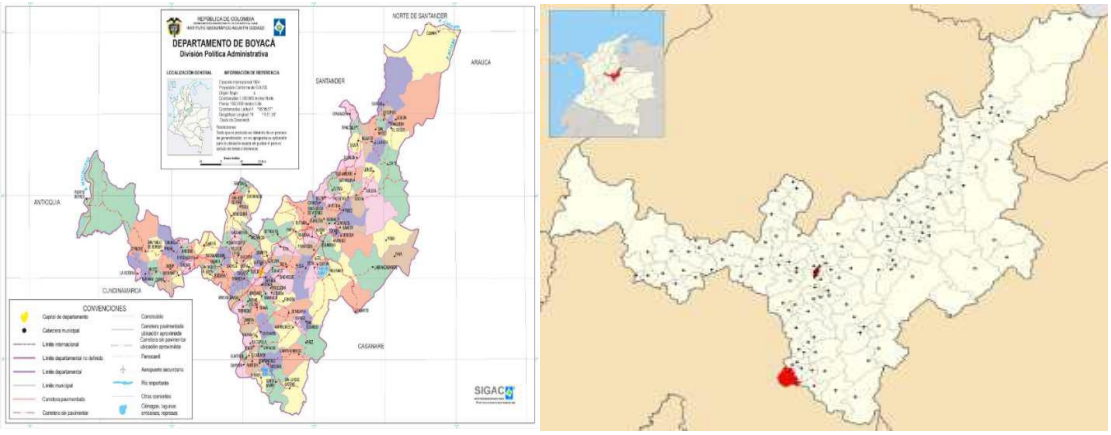

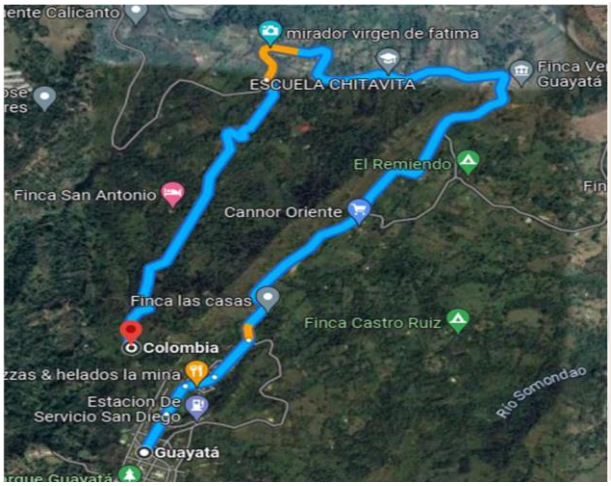

Recorrido de Municipio a PR 0+000



Tramo JAC Vereda Chitavitá

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los municipios por beneficiarse se encuentran Guayata y Guateque, ya que la vía terciaria a intervenir es una via que acorta el camino entre Guayata y Guateque, acortando el tiempo de viaje ya que la vía principal no se encuentra en buen estado, también beneficia a la comunidad de la vereda chitavita y tincachoque ya que muchas de las personas viven de la agronomía y este mejoramiento vial ayuda a sacar sus productos para comercializarlos y que los niños tengan fácil acceso a sus escuelas.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

se hace necesario efectuar por parte del Organismo de Acción Comunal, con seguimiento y aprobación del interventor, la corroboración en el sitio de las condiciones del terreno donde se ejecutarán las obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construcción de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes, obras de contención de baja complejidad, etc.

El inventario depende de la "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir.



Ilustración 2. Estado inicial de la vía vereda chitavita Guayata.

2.4 Características técnicas del proyecto

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

Por regla general las Juntas de Acción Comunal solo pueden desarrollar actividades dentro del territorio de su zona de influencia (barrio, sector, etapa, vereda, corregimiento, etc.) dependiendo de la división establecida por el Distrito o Municipio respectivo. El artículo 9° de la Ley 2166 de 2021 -en lo relacionado con las JAC.

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

En la siguiente tabla se muestra la información general del convenio.

CONVENIO No.	2757 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ
NIT	820.003.917-7
FECHA INICIACIÓN	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	CUATRO MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	No aplica
TIEMPO DE SUSPENSION	No aplica
AMPLIACION SUSPENSION	No aplica
REANUDACION	No aplica
FECHA TERMINACION FINAL	01 DE MARZO DE 2024
FECHA TERMINACION FINAL CON PRORROGA	30 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($207.042.782) MONEDA CORRIENTE
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 207.042.782,oo

3.2 Descripción de actividades ejecutadas en el mes

En el convenio 2757 de la vereda de Chitavita en el municipio de Guayata en el mes de abril se terminaron trabajos del tramo 1 de placa huella que tiene una longitud de 100 metros y del tramo 2 se fundieron 105 metros de placa huella al revisar el presupuesto se alcanzan a realizar 113 metros en el tramo 2.

3.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

En este periodo no fue necesario adelantar nuevos precios.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

i. Gestión Ambiental

Se realizó revisión de la disposición de residuos de la obra y se verifico permisos de canteras donde se trajo el material.

ii. Gestión Social

En la vereda de Chitavita en el municipio de Guayata se revisaron formatos de seguimiento no se recibieron pqr por parte de la comunidad.

iii. SST

En la vereda de Chitavita del municipio de Guayata se realizó entrega de dotación y equipos de protección personal a los empleados, también se realizó capacitación de uso de estos equipos de protección personal.

iv. Técnica

En la vereda de Chitavita en el municipio de Guayata en este periodo se construyó en su totalidad el tramo 1 de 100m y 105m del tramo 2.

INFORME DE INTERVENTORIA Nº. 06

01 al 30 abril de 2024

4 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informes Semanales

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA: 8/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL EN SECTOR VEREDA CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA | SEMANA No.: 23 del 1/04/2024 al 7/04/2024 (Numeración consecutiva) | Ultimo Informe Semanal SI [ ]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA Y LIMPIEZA DE 30 METROS LINEALES DE ALCANTARILLAS EN SECTOR DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ
CONVENIO No.: 2757 DE 2023
FECHA DE INICIO: Nov 01 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Mar 01 de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Abr 30 de 2024
VALOR INICIAL: $ 207.042.782,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 207.042.782,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
INTEGRANTES: HERBY LUNA CRUZ
CONTRATO No.: 2878 DE 2023
FECHA DE INICIO: Nov 01 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Dic 31 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Abril 30 de 2024
VALOR INICIAL: $ 67.954.000,00
VALOR ADICIONES: $ 13.962.722,00
VALOR ACUMULADO: $ 81.916.722,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207.042.782			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207.042.782			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 67.954.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.954.000,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207.042.782,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 112.468.750,00	54,32%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 144.003.790,00	69,55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 31.535.040,00	15,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 32.541.450,00	15,72%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 165.654.789,00	80,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 176.545.240,00	85,27%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 10.890.451,00	5,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.496.039,00	4,10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.352.450,00	2,10%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.916.722,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.172.322,00	88,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-073540
PERIODO FACTURADO: MARZO
VALOR FACTURA: $ 12.028.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 54,32% | Avance o Atraso Físico %: 15,23%
Meta Física Ejecutada %: 69,55%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	ML	30
PLACA HUELLA	ML	200

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	15	15		30	100,0%
Ejec	15	15		30	100,0%
Prog	100	100		200	100,0%
Ejec	100	45		145	72,5%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 4
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:


OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE LLEVAN 45 METROS FUNDIDOS DE PLACA HUELLA DEL TRAMO 2

FUNDIR LOS SIGUIENTES 15 METRSO DE CENTROS Y SOBRE ANCHOS DE CIPLOPEO

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

SE LLEVAN 45 METROS FUNDIDOS DE PLACA HUELLA DEL TRAMO 2

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: HERBY LUNA CRUZ
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA Nº. 06

01 al 30 abril de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	15/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL EN SECTOR VEREDA CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALE! DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA SEMANA No.: 24 del 8/04/2024 al 14/04/2024 Ultimo Informe Semanal SI [ ]
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA Y LIMPIEZA DE 30 METROS LINEALES DE ALCANTARILLAS EN SECTOR DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ

CONVENIO No.	2757 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 207.042.782,00
FECHA DE INICIO:	Nov 01 de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	Mar 01 de 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 207.042.782,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	Abr 30 de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
INTEGRANTES: HERBY LUNA CRUZ

CONTRATO No.	2878 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 67.954.000,00
FECHA DE INICIO:	Nov 01 de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 13.962.722,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	Dic 31 de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 81.916.722,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	Abril 30 de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207.042.782			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207.042.782			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 67.954.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.954.000,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207.042.782,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 118.369.845,00	57,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 148.764.310,00	71,85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 30.394.465,00	14,68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 33.541.450,00	16,20%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 176.985.450,00	85,48%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 182.305.760,00	88,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5.320.310,00	2,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.330.661,00	5,47%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.760.520,00	2,78%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.916.722,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73.777.922,00	90,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-073540
PERIODO FACTURADO: MARZO
VALOR FACTURA: $ 12.028.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 57,17% Avance o Atraso Físico % 14,68%
Meta Física Ejecutada % 71,85%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPEZA DE ALCANTARILLA	ML	30
*	PLACA HUELLA	ML	200
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	15	15		30	100,0%
Ejec	15	15		30	100,0%
Prog	100	100		200	100,0%
Ejec	100	60		160	80,0%
Prog					
Ejec					

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	___

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE LLEVAN 60 METROS FUNDIDOS DE PLACA HUELLA DEL TRAMO 2

FUNDIR LOS SIGUIENTES 15 METRSO DE CENTROS Y SOBRE ANCHOS DE CIPLOPEO

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

SE LLEVAN 60 METROS FUNDIDOS DE PLACA HUELLA DEL TRAMO 2

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: HERBY LUNA CRUZ
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA Nº. 06

01 al 30 abril de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	
	FECHA	22/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL EN SECTOR VEREDA CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA SEMANA No.: 25 del 15/04/2024 al 21/04/2024 Último Informe Semanal SI [ ]
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA Y LIMPIEZA DE 30 METROS LINEALES DE ALCANTARILLAS EN SECTOR DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ
CONVENIO No. 2757 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 207.042.782,00
FECHA DE INICIO: Nov 01 de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Mar 01 de 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 207.042.782,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Abr 30 de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
INTEGRANTES: HERBY LUNA CRUZ
CONTRATO No. 2878 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 67.954.000,00
FECHA DE INICIO: Nov 01 de 2023 — VALOR ADICIONES: $ 13.962.722,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Dic 31 de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 81.916.722,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Abril 30 de 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207.042.782			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207.042.782			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 67.954.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.954.000,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207.042.782,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 127.215.463,00	61,44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 152.394.310,00	73,61%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 25.178.847,00	12,16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 34.541.450,00	16,68%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 184.458.300,00	89,09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 186.935.760,00	90,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.477.460,00	1,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.472.850,00	3,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMNNA	$ 4.630.000,00	2,24%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.916.722,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 75.383.522,00	92,02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-073540
PERIODO FACTURADO: MARZO
VALOR FACTURA: $ 12.028.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 61,44% — Avance o Atraso Físico % 12,16%
Meta Física Ejecutada % 73,61%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
"	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	ML	30
"	PLACA HUELLA	ML	200
"			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	15	15		30	100,0%
Ejec	15	15		30	100,0%
Prog	100	100		200	100,0%
Ejec	100	75		175	87,5%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE LLEVAN 75 METROS FUNDIDOS DE PLACA HUELLA DEL TRAMO 2

FUNDIR LOS SIGUIENTES 15 METRSO DE CENTROS Y SOBRE ANCHOS DE CIPLOPEO

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

SE LLEVAN 75 METROS FUNDIDOS DE PLACA HUELLA DEL TRAMO 2

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: HERBY LUNA CRUZ
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA Nº. 06

01 al 30 abril de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	
	FECHA	29/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL EN SECTOR VEREDA CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA | SEMANA No.: 26 del 22/04/2024 al 28/04/2024 | Último Informe Semanal SI [ ] (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA Y LIMPIEZA DE 30 METROS LINEALES DE ALCANTARILLAS EN SECTOR DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ
CONVENIO No.: 2757 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 207.042.782,00
FECHA DE INICIO: Nov 01 de 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Mar 01 de 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 207.042.782,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Abr 30 de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
INTEGRANTES: HERBY LUNA CRUZ
CONTRATO No.: 2878 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 67.954.000,00
FECHA DE INICIO: Nov 01 de 2023 | VALOR ADICIONES: $ 13.962.722,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Dic 31 de 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 81.916.722,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Abril 30 de 2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207.042.782			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207.042.782			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 67.954.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.954.000,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207.042.782,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 139.148.967,00	67,21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 153.315.190,00	74,05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 14.166.223,00	6,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 40.753.450,00	19,68%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.024.782,00	96,13%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 194.068.640,00	93,73%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.956.142,00)	-2,39%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.566.482,00	7,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.132.880,00	3,45%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.916.722,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.989.122,00	93,98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-073540
PERIODO FACTURADO: MARZO
VALOR FACTURA: $ 12.028.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 67,21% | Avance o Atraso Físico %: 6,84%
Meta Física Ejecutada %: 74,05%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	ML	30
*	PLACA HUELLA	ML	200
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	15	15		30	100,0%
Ejec	15	15		30	100,0%
Prog	100	100		200	100,0%
Ejec	100	95		195	97,5%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 4
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:


OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE LLEVAN 95 METROS FUNDIDOS DE PLACA HUELLA DEL TRAMO 2

FUNDIR LOS SIGUIENTES 15 METROS DE PLACA HUELLA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

SE LLEVAN 95 METROS FUNDIDOS DE PLACA HUELLA DEL TRAMO 2

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: HERBY LUNA CRUZ
Matrícula Profesional No.: 26202 42574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA Nº. 06

01 al 30 abril de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	
	FECHA	29/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL EN SECTOR VEREDA CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA SEMANA No.: 27 del 28/04/2024 al 5/05/2024 Último Informe Semanal SI [ ] (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA Y LIMPIEZA DE 30 METROS LINEALES DE ALCANTARILLAS EN SECTOR DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ

CONVENIO No.: 2757 DE 2023
FECHA DE INICIO: Nov 01 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Mar 01 de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Abr 30 de 2024

VALOR INICIAL: $ 207.042.782,00
VALOR ADICIONES: $
VALOR ACUMULADO: $ 207.042.782,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
INTEGRANTES: HERBY LUNA CRUZ
CONTRATO No.: 2878 DE 2023
FECHA DE INICIO: Nov 01 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Dic 31 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Abril 30 de 2024

VALOR INICIAL: $ 67.954.000,00
VALOR ADICIONES: $ 13.962.722,00
VALOR ACUMULADO: $ 81.916.722,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207.042.782			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207.042.782			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 67.954.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.954.000,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207.042.782,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 158.198.040,00	76,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 158.750.590,00	76,68%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 552.550,00	0,27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 42.805.750,00	20,67%
(Estudios y Diseños; gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 207.042.782,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201.556.340,00	97,35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (5.486.442,00)	-2,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.018.000,00	3,87%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.487.700,00	3,62%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.916.722,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.594.722,00	95,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.605.600,00	1,96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VLVRAZ-073540
PERIODO FACTURADO: MARZO
VALOR FACTURA: $ 12.028.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 76,41% Avance o Atraso Físico % 0,27%
Meta Física Ejecutada % 76,68%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	ML	30
* PLACA HUELLA	ML	200
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	15	15		30	100,0%
Ejec	15	15		30	100,0%
Prog	100	100		200	100,0%
Ejec	100	105		205	102,5%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____ NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____ NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____ NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____ NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____ NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____ NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 4
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE LLEVAN 105 METROS DE PLACA HUELLA DEL TRAMO 2 SE PROYECTAN REALIZAR 113 METROS

TERMINAR LO PROYECTADO DEL TRAMO 2

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

SE LLEVAN 105 METROS DE PLACA HUELLA DEL TRAMO 2 SE PROYECTAN REALIZAR 113 METROS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HERBY LUNA CRUZ
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del PAAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA Nº. 06
01 al 30 abril de 2024

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 2757 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2878 de 2023 **INTERVENTORÍA:** HERBY LUNA CRUZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA DE CONCRETO	BAUKER	1 1/2 BULTO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VIBRADOR DE CONCRETO	TDK			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JOHAN SEBASTIAN PEREZ HEREDIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0538200 CND

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 2757 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril de 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYTA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2878 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOHAN SEBASTIAN PEREZ HEREDIA	1.010.219.297	Residente de obra	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.000.000,00	$ 139.200	V	FAMISANAR	76897408	$ 80.000	PORVENIR	76897408	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
2	HELMAN ARIEL VARGAS MONTAÑEZ	101-4195808	Contador	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.500.000,00	$ 104.400	V	NUEVA EPS	76897408	$ 60.000	COLPENSIONES	76897408	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	
3	JUAN SEBASTIAN ZAMORA	1015456285	ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 90.480	V	NUEVA EPS	76946370	$ 52.000	COLPENSIONES	76946370	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4	FABIAN CAMILO PEREZ MARTINEZ	1085990787	ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 90.480	V	NUEVA EPS	76946370	$ 52.000	COLPENSIONES	76946370	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
5	SEGUNDO DIAZ VARGAS	4132988	ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 90.480	V	NUEVA EPS	76946370	$ 52.000	COLPENSIONES	76946370	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
6	JOSELIN LOPEZ GUARIN	79062570	ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.480	V	NUEVA EPS	76946370	$ 52.000	COLPENSIONES	76946370	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
7	MIGUEL ANGEL SALAMANCA	79344054	ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.480	V	NUEVA EPS	76946370	$ 52.000	COLPENSIONES	76946370	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
8	PEDRO PABLO ZAMORA BARRERA	79360125	maestro	$ 1.875.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.875.000	$ 130.500	V	NUEVA EPS	76946370	$ 75.000	COLPENSIONES	76946370	$ 300.000	$ 75.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 02 de mayo de 2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOHAN SEBASTIAN PEREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0538200 CND

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	820003917-7	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA ...		VEREDA CHITAVITA	3138563826	juntachitavita@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	GUAYATÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	07/05/2024	76946370	$2.481.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en el Exter.	Extranj. en Colom.	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015458285	ZAMORA PEDREROS JUAN SEBASTIAN	1	0			S	X															230301	953.334	152.600	0	0	0	0	EPS037	953.334	38.200	14-11	953.334	5	66.400	CCF10	953.334	38.200	0	0	0	0	0
2	CC	1015458285	ZAMORA PEDREROS JUAN SEBASTIAN	1	0			S												X				230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS037	130.000	5.200	14-11	130.000	5	0	CCF10	130.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	1015458285	ZAMORA PEDREROS JUAN SEBASTIAN	1	0			S												X				230301	216.667	26.100	0	0	0	0	EPS037	216.667	0	14-11	216.667	5	0	CCF10	216.667	0	0	0	0	0	0
4	CC	1065900797	PEREZ MARTINEZ FABIAN CAMILO	1	0			S	X															25-14	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS041	1.126.667	45.100	14-11	1.126.667	5	78.500	CCF10	1.126.667	45.100	0	0	0	0	0
5	CC	1065900797	PEREZ MARTINEZ FABIAN CAMILO	1	0			S												X				25-14	86.667	10.500	0	0	0	0	EPS041	86.667	0	14-11	86.667	5	0	CCF10	86.667	0	0	0	0	0	0
6	CC	1065900797	PEREZ MARTINEZ FABIAN CAMILO	1	0			S												X				25-14	86.667	10.500	0	0	0	0	EPS041	86.667	0	14-11	86.667	5	0	CCF10	86.667	0	0	0	0	0	0
7	CC	4132998	DIAZ VARGAS SEGUNDO	1	0			S	X															25-14	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS037	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	5	87.500	CCF10	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
8	CC	4132998	DIAZ VARGAS SEGUNDO	1	0			S												X				25-14	43.334	5.300	0	0	0	0	EPS037	43.334	0	14-11	43.334	5	0	CCF10	43.334	0	0	0	0	0	0
9	CC	79062570	LOPEZ GUARIN JOSELIN	1	0			S	X															25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	79344054	SALAMANCA MIGUEL ANGEL	1	0			S	X															230201	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS037	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	5	84.500	CCF10	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
11	CC	79344054	SALAMANCA MIGUEL ANGEL	1	0			S												X				230201	86.667	10.500	0	0	0	0	EPS037	86.667	0	14-11	86.667	5	0	CCF10	86.667	0	0	0	0	0	0
12	CC	79360125	ZAMORA BARRERA PEDRO PABLO	1	0			S	X															25-14	1.875.000	300.000	0	0	0	0	EPS037	1.875.000	75.000	14-11	1.875.000	5	130.500	CCF10	1.875.000	75.000	0	0	0	0	0

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	820003917-7	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA ...		VEREDA CHITAVITA	3138563826	juntachitavita@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	GUAYATÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	Y	07/05/2024	76897408	$838.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en el Exter.	Extranj. en Colom.	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010219297	PEREZ HEREDIA JOHAN SEBASTIAN	59	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1014195608	VARGAS MONTAÑEZ HELMAN ARIEL	59	0			N																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 2757 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA

MES INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2878 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	964023	2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 207.042.782,00	207.042.782, oo
				TOTAL		$ 207.042.782,00	207.042.782, oo

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 207.042.782,00 **VALOR BÁSICO DEL CONTRATO OBRA:** $ 207.042.782,00

ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA: $ 0,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		noviembre	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	964023	$ 0,00					
2		diciembre	$ 20.914.000,00	$ 0,00	$ 20.914.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 186.128.782,00	964023	$ 0,00	$ -				
3		enero	$ 87.582.800,00	$ 0,00	$ 87.582.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.545.982,00	964023	$ 0,00					
4		febrero	$ 22.630.350,00	$ 0,00	$ 22.630.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.915.632,00	964023	$ 0,00					
5		marzo	$ 41.065.640,00	$ 0,00	$ 41.065.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.849.992,00	964023	$ 0,00					
6		abril	$ 29.363.550,00	$ 0,00	$ 29.363.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.486.442,00	964023	$ 0,00					
TOTALES			$ 201.556.340,00	$ 0,00	$ 201.556.340,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.486.442,00		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 158.750.590,00		**$ 158.750.590,00**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.805.750,00	$ -	**$ 41.805.750,00**
PAGA			
APORTE JAC	$ 1.000.000,00		
VALOR TOTAL	$ 201.556.340,00	$ -	**$ 201.556.340,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

NOTA 2: En este periodo no facturo el contratista de obra. Se adelantaron actividades de estudios y diseños

Firma
Nombre: JOHAN SEBASTIAN PEREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0538200 CND

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 Estado general del tiempo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-10 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 2757 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1/04/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2878 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Seco	22	22	21	20	19	23	21	19	24	23	21	24	24	24	24	24	24	24	17	18	12	22	23	24	22	24	21	10	22	20		588
Lluvias moderadas	2	2	2	2	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	2	1	0	2	0	2	5	2	2		46
Lluvias intensas			1	2	3			3											4	3	6						1	9		2		34
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
El tiempo se presento seco

Firma
Nombre: JOHAN SEBASTIAN PEREZ HEREDIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:091037-0538200 CND

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstac	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departar	Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspensio	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calific	NivelAproba
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	1/04/2024 0:00	1	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	2/04/2024 0:00	0.5	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	3/04/2024 0:00	3.8	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	4/04/2024 0:00	5.2	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	5/04/2024 0:00	6	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	6/04/2024 0:00	0.5	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	7/04/2024 0:00	2	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	8/04/2024 0:00	6.7	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	9/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	10/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	11/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	12/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	13/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	14/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	15/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	16/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	17/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	18/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	19/04/2024 0:00	7.6	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	20/04/2024 0:00	6.5	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	21/04/2024 0:00	12.5	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	22/04/2024 0:00	2	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	23/04/2024 0:00	1	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	24/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	25/04/2024 0:00	1.2	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	26/04/2024 0:00	0	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	27/04/2024 0:00	3.2	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	28/04/2024 0:00	32.5	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	29/04/2024 0:00	2.4	50		900
35075020	SUTATENZA [3507	50.222.777.780	-7.344.916.667	1930	ClimÃ¡tica	INSTITUTO DE HI	Area Operativa	BoyacÃ¡	Sutatenza	15/01/1969 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©	Diaria	30/04/2024 0:00	4.5	50		900

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No.: 2757 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYTA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2878 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									

OBSERVACIONES:

En este periodo no se realizaron ensayos de laboratorio.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: JOHAN SEBASTIAN PEREZ HEREDIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:091037-0538200 CND

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Directoe de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520242574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 5 (Día) | 5 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No. 2757 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYTA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 1/11/2023
PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 207.042.782,00
VALOR ACUMULADO: $ 207.042.782,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 0,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 0,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2878 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.408.556,40	8	8	2023	8	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.352.139,10	8	8	2023	8	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.112.834,60	8	12	2023	8	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100067973
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/09/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	112,05%	$ 232.000.000,00	7	9	2023	24	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101218806 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/09/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.408.556,40	1	11	2023	1	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.352.139,10	1	11	2023	1	3	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.112.834,60	1	3	2023	1	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100067973
Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/09/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520242574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.05 09:20:29 -05:00

Código de Seguridad: HFepo9135DGT/on+ab4LAg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100279843	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71921873	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/08/2023	24:00 Horas Del	01/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ	**No. DOC. IDENTIDAD**	820.003.917-7
DIRECCIÓN	VDA CHITAVITA	**TELÉFONO**	0
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	7056000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	7056000

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 01/11/2023 SE TRASLADA VIGENCIA DE LA POLIZA.LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 2757 DE 2023 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/11/2023	24:00 Horas Del 01/01/2025	41.408.556,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/11/2023	24:00 Horas Del 01/03/2027	10.352.139,10	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 01/03/2024	24:00 Horas Del 01/03/2029	62.112.834,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 113.873.530,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100279843	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71921873	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/08/2023	24:00 Horas Del	01/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ CON NIT 820.003.917-7

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.

NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 09 DE AGOSTO DEL 2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 2757 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100279843** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS ,** expedida por la Compañía en **05/04/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **05** días del mes **ABRIL** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71921873

Fecha de Facturación	05/04/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NB–100279843
Periodo Facturado	08/08/2023 — 01/03/2029

Fecha Límite de Pago	05/05/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ
VDA CHITAVITA	820003917
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **05/05/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71921873

Fecha de Facturación	05/04/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NB–100279843
Periodo Facturado	08/08/2023 — 01/03/2029

Fecha Límite de Pago	05/05/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ
VDA CHITAVITA	820003917
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000071921873(3900)000000000000(96)20240505

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990071921873(3900)000000000000(96)20240505

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.05 09:21:57 -05:00

Código de Seguridad: 94kjKlXRoI5zWPouiYyrQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU580000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100067973	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71921910	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/08/2023	24:00 Horas Del	01/03/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ	No. DOC. IDENTIDAD	820.003.917-7
DIRECCIÓN	VDA CHITAVITA	TELÉFONO	0
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA	No. DOC. IDENTIDAD	820.003.917-7
DIRECCIÓN	VDA CHITAVITA	TELÉFONO	0
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 01/11/2023 SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA POLLIZA.LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 2757 DE 2023 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNER - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA - AIP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100067973	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71921910	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/08/2023	24:00 Horas Del	01/03/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ CON NIT 820.003.917-7

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 09 DE AGOSTO DEL 2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 2757 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA DESDE 01/11/2023 HASTA 01/03/2024
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71921910

Fecha de Facturación	05/04/2024		Fecha Límite de Pago	05/05/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	NB-100067973		IVA	00,00
Periodo Facturado	08/08/2023	01/03/2024	VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA
VDA CHITAVITA	820003917
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudado efectivamente el [illegible] se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la cartilla de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIt 900531293-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71921910

Fecha de Facturación	05/04/2024		Fecha Límite de Pago	05/05/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	NB-100067973		IVA	00,00
Periodo Facturado	08/08/2023	01/03/2024	VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA
VDA CHITAVITA	820003917
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000719219 10(3900)000000000000(96)20240505

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990071921910(3900)000000000000(96)20240505

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE INTERVENTORIA Nº. 06
01 al 30 abril de 2024

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 1/05/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No. 2757 de 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYTA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA

FECHA DE INICIO: 1/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2878 de 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ---------- APROBADO: SI -------- NO -------- VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ---------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ---------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI -------- NO ---------- APROBADO: SI -------- N -------- FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI -------- NO --------

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto
El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto.

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma Sebastian PH.
Nombre: JOHAN SEBASTIAN PEREZ HEREDIA
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0538200 CND

Firma NO APLICA
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520242574 CND

Firma NO APLICA
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual:

Seguidamente se menciona la gestión de los siguientes documentos durante el desarrollo del proyecto:

- ✓ Seguimiento a la inversión del Anticipo:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 07/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 2757 de 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2878 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

JUSTIFICACIÓN:
INICIO Y EJECUCION DE OBRAS

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	CEMENTO ARGOS X 50 KG		$ 9.975.000,00	$ 16.045.500,00	$ 5.130.000,00	$ 31.150.500,00	100%
2	VARILLA 1/2 " Y 1/4"		$ 19.312.302,00	$ 26.352.302,00	$ 7.731.209,00	$ 53.395.813,00	100%
3	ALAMBRE NEGRO		$ 145.546,50	$ 299.258,00	$ 35.000,00	$ 479.804,50	100%
4	SUBBASE		$ 6.000.000,00	$ 6.180.000,00	$ -	$ 12.180.000,00	100%
5	TRANSPORTE SUBBASE		$ 3.450.000,00	$ 3.220.000,00		$ 6.670.000,00	100%
6	GRAVILLA 3/4		$ 2.898.840,00	$ 4.347.900,00	$ 1.449.420,00	$ 8.696.160,00	100%
7	TRANSORTE GRAVILLA 3/4		$ 780.000,00	$ 1.170.000,00	$ 390.000,00	$ 2.340.000,00	100%
8	ARENA TRITURADA		$ 2.898.840,00	$ 4.347.900,00	$ 1.449.420,00	$ 8.696.160,00	100%
9	TRANSPORTE ARENA		$ 780.000,00	$ 1.300.000,00	$ 390.000,00	$ 2.470.000,00	100%
10	UNIFORMES		$ 1.362.000,00			$ 1.362.000,00	100%
11	ESTUDIO TOPOGRAFICO		$ 2.400.000,00			$ 2.400.000,00	100%
12	ESTUDIO DE SUELOS		$ 1.420.000,00			$ 1.420.000,00	100%
13	COSTOS DE PERSONAL		$ 13.170.000,00	$ 14.520.000,00	$ 11.820.000,00	$ 39.510.000,00	100%
14	MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 887.000,00	$ 11.749.770,00	$ 1.197.000,00		$ 13.833.770,00	100%
15	SEGURIDAD SOCIAL	$ 354.800,00	$ 5.268.000,00	$ 5.808.000,00	$ 4.728.000,00	$ 16.158.800,00	100%
16	POLIZAS	$ 1.599.821,75				$ 1.599.821,75	100%
17	PAPELERIA	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00		$ 900.000,00	100%
18	BOTIQUIN TIPO A	$ 70.000,00				$ 70.000,00	100%
19	TELA PARA CERRAMIENTO	$ 231.000,00				$ 231.000,00	100%
20	VALLA		$ 350.000,00			$ 350.000,00	100%
21	PLASTICO NEGRO		$ 288.000,00			$ 288.000,00	100%
22	SEÑALIZACION		$ 254.000,00			$ 254.000,00	100%
23	COSTOS BANCARIOS	$ 80.000,00	$ 350.000,00	$ 344.000,00	$ 132.000,00	$ 906.000,00	100%
24	EXAMAMENS DE INGRESO		$ 480.000,00			$ 480.000,00	100%
25	TRANSPORTE DIGNATARIO	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 600.000,00	$ -	$ 1.200.000,00	100%
	TOTAL	$ 3.822.621,75	$ 83.932.298,50	$ 86.031.860,00	$ 33.255.049,00	$ 207.041.829,25	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Luz Mariela Aguilar
Nombre:luz Mariela Aguilar
Representante Legal o su Apoderado

Firma:
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Firma: Sebastian PM.
Nombre: Johan Sebastian Perez Heredia
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:091037-0538200 CND

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA Nº. 06
01 al 30 abril de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 05/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 5 **MES:** ABRIL **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 2757 de 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 207.042.782,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2878 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CHEQUE	15	5-abr-24	LUZ MARIELA AGUILAR	$ 4.352.450,00	CHEQUE N 15	RETIRO N 15
CHEQUE	16	15-abr-24	LUZ MARIELA AGUILAR	$ 5.760.520,00	CHEQUE N 16	RETIRO N 16
CHEQUE	17	26-abr-24	LUZ MARIELA AGUILAR	$ 4.630.000,00	CHEQUE N 17	RETIRO N 17
CHEQUE	18	3-may-24	LUZ MARIELA AGUILAR	$ 7.132.880,00	CHEQUE N 18	RETIRO N 18
CHEQUE	19	9-may-24	LUZ MARIELA AGUILAR	$ 7.487.700,00	CHEQUE N 19	RETIRO N 19
TOTAL				$ 29.363.550,00		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	PAGO APORTES EMPLEADOS	$ 2.602.200,00	$ -	$ 2.602.200,00	$ 2.602.200,00	$ -
2	PAGO APORTES INDEPENDIENTES	$ 841.500,00	$ -	$ 841.500,00	$ 841.500,00	$ -
3	GASOLINA MAQUINA	$ 100.720,00	$ -	$ 100.720,00	$ 100.720,00	$ -
4	ACEITE PARA LA MAQUINA	$ 30.000,00	$ -	$ 30.000,00	$ 30.000,00	$ -
5	ALAMBRE	$ 162.500,00	$ -	$ 162.500,00	$ 162.500,00	$ -
6	COMPRA MANGUERA	$ 160.000,00	$ -	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ -
7	ALMUERZO CONDUCTOR VOLQUETA	$ 40.000,00	$ -	$ 40.000,00	$ 40.000,00	$ -
8	REFRIGERIO OBREROS	$ 130.000,00	$ -	$ 130.000,00	$ 130.000,00	$ -
9	ALQUILER VIBRO COMPACTADOR	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00	$ 165.000,00	$ -
10	TRANSPORTE CEMENTO	$ 60.000,00	$ -	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ -
11	TRANSPORTE DILIGENCIA A GUATEQUE	$ 20.000,00	$ -	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ -
12	ALMUERZO CONDUCTORES VOLQUETA	$ 40.000,00	$ -	$ 40.000,00	$ 40.000,00	$ -
13	PAGO NOMINA OBREROS	$ 4.960.000,00	$ -	$ 4.960.000,00	$ 4.960.000,00	$ -
14	COMPRA VARILLA	$ 166.000,00	$ -	$ 166.000,00	$ 166.000,00	$ -
15	ARREGLO PALAS	$ 15.000,00	$ -	$ 15.000,00	$ 15.000,00	$ -
16	TRANSPORTE ARENA Y GRAVILLA	$ 284.130,00	$ -	$ 284.130,00	$ 284.130,00	$ -
17	GASOLINA MAQUINA	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -
18	COMPRA VARILLA Y ALAMBRE	$ 109.400,00	$ -	$ 109.400,00	$ 109.400,00	$ -
19	REFRIGERIO OBREROS	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -
20	COMPRA PUNTILLA	$ 10.000,00	$ -	$ 10.000,00	$ 10.000,00	$ -
21	GASOLINA MAQUINA	$ 100.000,00	$ -	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ -
22	PAGO NOMINA OBREROS	$ 4.245.000,00	$ -	$ 4.245.000,00	$ 4.245.000,00	$ -
23	SERVICIO ACARREO DE MATERIAL	$ 80.000,00	$ -	$ 80.000,00	$ 80.000,00	$ -
24	COMPRA ALAMBRE Y PUNTILLA	$ 171.900,00	$ -	$ 171.900,00	$ 171.900,00	$ -
25	TRANSPORTE ARENA Y GRAVILLA	$ 150.000,00	$ -	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ -
26	PAGO NOMINA PROFESIONALES	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ -
27	SERVICIO TOPOGRAFIA	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ -
28	PAGO RETENCION EN LA FUENTE	$ 1.712.000,00	$ -	$ 1.712.000,00	$ 1.712.000,00	$ -
29	SERVICIO DE TRANSPORTE	$ 1.197.000,00	$ -	$ 1.197.000,00	$ 1.197.000,00	$ -
30	NOMINA OBREROS	$ 3.326.500,00	$ -	$ 3.326.500,00	$ 3.326.500,00	$ -
31	SEGURIDAD SOCIAL	$ 3.319.700,00	$ -	$ 3.319.700,00	$ 3.319.700,00	$ -
32	SERVICIO TOPOGRAFIA	$ 565.000,00	$ -	$ 565.000,00	$ 565.000,00	$ -
	TOTALES	$ 29.363.550,00	$ -	$ 29.363.550,00	$ 29.363.550,00	

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (MARZO) : $ 15.353,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 237.482,00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Luz Mariela Aguilar
Nombre: LUZ MARIELA AGUILAR
Presidente JAC
Junta de accion comunal vereda Tincachoque

Firma:
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Firma: Sebastian P.M.
Nombre: SEBASTIAN PEREZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 091037-0538200 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA Nº. 06
01 al 30 abril de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 02/03/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** 3

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONVENIO No. 2757 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

VÍA INTERVENIDA: VIA RURAL VEREDA CHITAVITA, VIA ALTERNA A VIA GUAYATA -GUTEQUE

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIO DE GUAYATA

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ **CONTRATO No.** 2878 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	1 (Día)	DE	11 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 207.042.782,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 207.042.782,00
PLAZO (MESES):	4 MESES						
FECHA INICIAL DE VENCIMIEN	1 (Día)	DE	3 (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA ACTUAL DE VENCIMIEN	30 (Día)	DE	4 (Mes)	DE	2024 (Año)		

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	SISMOESTRUCTURAS DE COLOMBIA S.A.S	820003917	SMO22	1/02/2024	$ 475.000,00	$ 90.250,00	$ 565.250,00
2	PAGO NOMINA			1/02/2024	$ 8.010.000,00		$ 8.010.000,00
3	AGREGADOS HBA	901039222-6	FA 535	26/02/2024	$ 1.428.000,00	$ 271.320,00	$ 1.699.320,00
4	COMPENSAR OI	9998600669427	441293370	4/02/2024	$ 1.738.700,00		$ 1.738.700,00
5	SISMOESTRUCTURAS DE COLOMBIA S.A.S	820003917	SMO26	7/02/2024	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00
6	GRIJALBA FUERTES ADRIANA FERNANDA	52429374-1		1/02/2024	$ 240.000,00		$ 240.000,00
7	EDWARD ORLANDO MOJICA	1007402237-0		8/02/2024	$ 600.000,00		$ 600.000,00
8	EDGAR HERNANDO LOPEZ MARTIN	7277379		13/02/2024	$ 200.000,00		$ 200.000,00
9	LUIS ORLANDO CARRILLO AGUILAR	79414196		24/01/2024	$ 60.000,00		$ 60.000,00
10	JUAN MANUEL PIÑEROS	4132634		28/01/2024	$ 1.480.000,00		$ 1.480.000,00
11	ALVARO GUERRERO MORENO	4132894		31/01/2024	$ 100.000,00		$ 100.000,00
12	PAGO NOMINA			19/02/2024	$ 5.125.000,00		$ 5.125.000,00
13	ALCALDIA DE GUAYATA	891800896-8		1/03/2024	$ 354.000,00		$ 354.000,00
14	EDS LLA O GRANDE	901365432-3	14659	1/02/2024	$ 30.000,00		$ 30.000,00
16	IVAN ALBERTO RUSSI RAMOS	4130251-4	POS18468	1/02/2024	$ 7.563,00	$ 1.436,00	$ 8.999,00
17	ALVARO GUERRERO MORENO	4132894		1/02/2024	$ 70.000,00		$ 70.000,00
18	INTERRAPIDISIMO	800251569-7	POS 750009146478	5/02/2024	$ 18.000,00		$ 18.000,00
19	MEGACENTER JC	1051336510-4	14722	13/02/2024	$ 32.600,00		$ 32.600,00
20	DIMACOR	901109923-1	1178	28/02/2024	$ 12.101,00	$ 2.299,00	$ 14.400,00
21	JACKSON MANOSALVA	1090399561		3/02/2024	$ 60.000,00		$ 60.000,00
22	MAYCOL AURELIO VARGAS NUÑEZ	1049794954		6/02/2024	$ 20.000,00		$ 20.000,00
23	RAFAEL RICARDO MONTENEGRO MARTINEZ	1051330327		8/02/2024	$ 20.000,00		$ 20.000,00
24	DIAN		3505724076456	19/02/2024	$ 873.000,00		$ 873.000,00
25	AGREGADOS HBA	901039222-6	FA 532	16/02/2024	$ 952.000,00	$ 180.800,00	$ 1.132.800,00
26							
27							

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 22.055.964	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 131.158.369
VALOR IVA	$ 574.605	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ -
TOTAL PAGOS	$ 22.630.569	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 131.158.369

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: Luz Mariela Aguilar
Nombre: Luz Mariela Aguilar
PRESIDENTE JAC
Junta de Accion Comunal Vereda Chitavita

Firma:
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Firma: Sebastian PH.
Nombre: SEBASTIAN PEREZ
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 091037-0538200 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

✓ Seguimiento Programa de Obra:

6/4/24, 19:38 MiPlanilla.com

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x]Cerrar

Último ingreso exitoso: 2024-04-06 / 07:37:19 PM | Último ingreso fallido: 2024-02-04 / 03:38:59 PM

Abril 6 de 2024 / 7:37 PM

Inicio › Planillas › Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHÍTAVITA DEL MUNICI....	**Nit:**	820003917
Tipo planilla:	Y	**Periodo liquidación Pensiones**	Marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Marzo 2024
Número de radicación:	76106134	**Total a pagar:**	$841.500
Fecha de vencimiento:	04/04/2024	**Total de empleados:**	2
Fecha de pago:	06/04/2024	**Número de administradoras:**	5

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar CI	**Nit recaudo:**	899860068942?
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número de aprobación:**	556467278
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	2		$0.00	$97,700
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$208,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$208,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$163,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0.00	$163,100
						$841,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Le informamos que el pago de la planilla No. 76106134, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la ob[illegible]ación que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias [illegible]al. además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el pe[illegible]

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Último ingreso exitoso: 2024-04-06 / 07:37:19 PM | Último ingreso fallido: 2024-02-04 / 03:38:59 PM

Abril 6 de 2024 / 7:40 PM

Inicio › Planillas › Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA DEL MUNICI....	**Nit:**	820003917
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Abril 2024
Número de radicación:	76106319	**Total a pagar:**	$2,602,200
Fecha de vencimiento:	04/04/2024	**Total de empleados:**	6
Fecha de pago:	05/04/2024	**Número de administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar CI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número de aprobación:**	556478010
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	6		$0.00	$585,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$208,800
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$208,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		$0.00	$927,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$336,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		$0.00	$284,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0.00	$52,200
						$2,602,200

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

Le informamos que el pago de la planilla No. 76106319, fue posterior a la fecha limite estab[illegible]a e[illegible]. embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Ver abonillas navideñas

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

Tiquete POS #:POS 67623

E.D.S
SAN DIEGO

BLANCA SOFIA MARTIN ACO
NIT: 23.629.215-1
REGIMEN COMUN
CR 4 CL9 SEC SALIDA GUATE

COPIA

Equipo : 1
Venta #: 67623
Fecha: 2024-04-02
Hora: 6:52:48

Cliente: Consumidor Final
NIT/CC: 222222222222
Placa: JUNTA CHITAVITA
Producto: Corriente
Dinero: $ 102046
Volumen: 6.358 Galones
ppu: $16050

Subtotal: $ 102046
IVA : $ 0
Total: $ 102046

Impresion Software NEXUS
Desarrollado Por IMED OIL S.A.S
NIT 901.212.992-1

Res DIAN No 18764035245285
Vigencia 31/08/2022-28/02/2023
Del POS 1001 AL POS 20000

Gracias Por Su Compra
Vuelva pronto

Si requiere factura electronica
envie foto de esta factura y RUT
a blancasofiam@hotmail.com
WS 318 827 9057



No.

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

VENDIDO A: FECHA: 08-04-24

DIRECCIÓN: NIT:

CIUDAD: TELÉFONO: VENDEDOR: Taller el mero

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Aceite mobil 5w40 v	30000	30.000

CANCELADO

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL

TOTAL 30.000



DIMACOR GUAYATA
NIT:901109923-1 RÉGIMEN COMÚN
CR 5 5 21
FACTURACION ELECTRONICA1876400032530
FECHA: 2024-02-28
VIGENCIA: 2025-02-28
DEL 1231 AL 10.000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #
(GY 1355)
(, PEDIDO: 55)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
NIT: 520003917 7
CLIENTE: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA
TELÉFONO: 3108663056
DIRECCIÓN: VEREDA CHITAVITA

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS
25 ITEMS
CANT | ITEM | SUBTOTAL
25 X ALAMBRE NEGRO $136,555
X KL**

INFORMACIÓN DE PAGOS
02/04/24 8:40 AM EFECTIVO 200,000

SUBTOTAL: $ 136,555
DESCUENTOS: (-$ 0)
IMPTO (19%, $136,555): $25,945
TOTAL: 162,500
PAGOS: $ 200,000
BALANCE: $ 37,500

HORA REGISTRO: 02/04/2024 8:41:49 AM
CAJERO: CAJA PRINCIPAL CAJA

QUEREMOS HACER PARTE DE TU PROYECTO
GRACIAS POR TU COMPRA

SISTEMA POS EN LA NUBE
WWW.CUANTIS.COM

ALMACEN EL TRAPICHE

IVAN ALBERTO RUSSI RAMOS
4130251-4
CARRERA 6 No.7 - 43
Tel: 7540073

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA DIAN SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
TFE2762

CLIENTE

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA

820003917-7

VEREDA CHITAVITA GUAYATÁ

Fecha y Hora de Generación
18/04/2024 05:05:54 p. m.

Forma y Medio de Pago
Contado: Efectivo

Cajero YAMILE BENITO
REGIMEN COMUN

Ite	Ref.	Detalle	Cant	Und	Vr. Unitario	Vlr IVA	Vr Total
1	MJV	MANGUERA JARDIN VERDE	100	METROS	1,600.00	25,546	160,000.00

CUFE: 566151a1ae63b7d00299bd0b9272ecc805333d31fbbb96c65d82c6fdaaef1d40c86ec098a825015ad9f6

Base	% Iva	Vr Iva	Vr Total
134,454	19	25,546	160,000

Fecha y Hora de Expedición (Validación DIAN)
2024-04-18 17:05:39

Total Articulos	100.00
Subtotal	134,453.78
Iva	25,546.22
Total a Pagar	160,000.00

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (Art 5 ley 1231 de 2008) con este el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título.

Resolución Facturación Electrónica DIAN No.
18764059815038

Documento electrónico generado desde el sistema Helisa POS - PROAsistemas S.A. NIT 800042928 - 1
Proveedor Tecnológico ATEB Colombia S.A.S. - NIT 900965992 - 7

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 23/02/2024 No.

PAGADO A Fernando Zambrano $ 20000

POR CONCEPTO DE Almuerzo conductor Volquete.

VALOR (en letras) Veinte mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Fernando Zambrano P.
41132.060

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 27/02/2024 No.

PAGADO A Fernando Zambrano $ 20000

POR CONCEPTO DE Almuerzo conductor Volquete.

VALOR (en letras) Veinte mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Fernando Zambrano P.
41132060

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29/02/2024 — No.

PAGADO A Jackson Manosalba Garzón — $ 75.000

POR CONCEPTO DE Refrigerios Obreros Placa huella

VALOR (en letras) Setenta y cinco mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Jackson Manosalba Garzón.
1090399561.

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 24/02/2024 — No.

PAGADO A Segundo Diaz — $ 55000

POR CONCEPTO DE Refrigerios Obreros Placa huella.

VALOR (en letras) Cincuenta y cinco mil pesos.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Segundo Diaz Vargas
C.C. 4132998 Guayatá

Página 1 de 1 Formato ContC08



Recibos de Caja

Número 2024000075

Tercero JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA **NIT** 820003917
Dirección VEREDA CHITAVITA **Código Postal** 999999
Fecha 02/02/2024
Concepto VIBROCOMPCTADOR
Detalle SERVICIO DE VIBROCOMPACTADOR 1 HORA EN LA VEREDA CHITAVITA TRABAJOS REALIZADOS EL DIA 22 DE ENERO DE 2024

Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
	11050101	Caja General / JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA CHIT	165,000.00	00.00
1.1.02.05.002.09.05	13110111	Alquiler de Maquinaria / JUNTA ACCION COMUNAL VERE	00.00	165,000.00

Número Documento	Vencimiento	Débitos	Créditos	Valor Ingreso
2024000075	03/03/2024	165,000.00	165,000.00	165,000.00

ELABORO **FIRMA EN INGRESO**

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 08/03/2024 No.

PAGADO A Raul Alberto Pinto Costa $ 60.000

POR CONCEPTO DE transporte translado de 32 bultos de cemento en la via realizacion de placa huella

VALOR (en letras) Secenta mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Raul Pinto Costa
CC 1051336141

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 01/03/2024 No.

PAGADO A Fernando Zambrano $ 20000-

POR CONCEPTO DE transporte a Guateque consignacion a Banco Bogota


VALOR (en letras) Veinte mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Fernando A. Zambrano R.
4132080

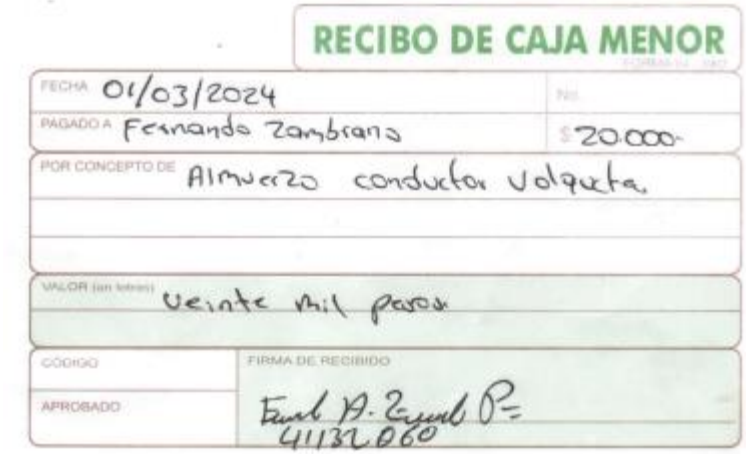

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 01/03/2024 — No.

PAGADO A Fernando Zambrano — $ 20.000.-

POR CONCEPTO DE Almuerzo conductor Volqueta.


VALOR (en letras) Veinte mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Fernando A. Zambrano P.
41132.060

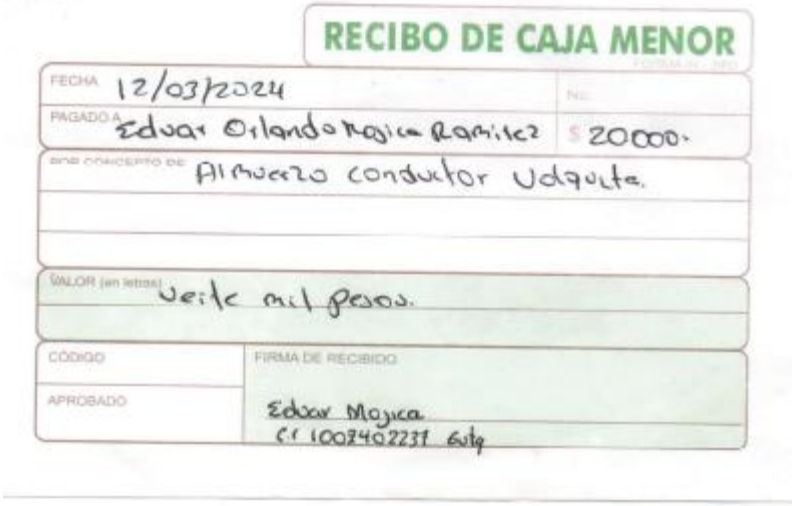

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 12/03/2024 — No.

PAGADO A Edwar Orlando Mojica Ramirez — $ 20000.-

POR CONCEPTO DE Almuerzo conductor Volqueta.

VALOR (en letras) Veinte mil pesos.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Edwar Mojica
C.C 1002402237 Cúcuta

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 15/04/2024. No.

PAGADO A Pedro Pablo Zamora Barrera $ 1'000.000-

POR CONCEPTO DE Maestro obra placahuella "caminos comunitarios Para la Paz total vereda chitavita Por los dias del 01 al 14 de abril

VALOR (en letras) Un millon de pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

PEDRO P. ZAMORA
79360125

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 15/04/2024 No.

PAGADO A Sebastian Zamora Pedreros $ 825.000-

POR CONCEPTO DE obrero mano de obra en la Placahuella "caminos comunitarios Para la Paz total vereda ch. tavito Por los dias del 01 al 14/2024

VALOR (en letras) Ochocientos Veinticinco mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Sebastian Zamora P.
1015456285

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 15/04/2024 — No.

PAGADO A Segundo Dia Vargo — $ 825.000.

POR CONCEPTO DE obrero mano de obra en la placahuella "caminos comunitarios Para la Paz total de la Vereda de chitavita por los días 01 al 14 dd 2024

VALOR (en letras) ochocientos Veinticinco mil

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Segundo Diaz Vargas

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 15/04/2024 — No.

PAGADO A Fabian Camilo Perez — $ 660.000.


POR CONCEPTO DE Obrero mano de obra en la placahuella "caminos comunitarios Para la Paz total Vereda chitavita por los dias 03/13 de abril 2024

VALOR (en letras) Seiscientos Sesenta mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Fabian Perez 1069900799

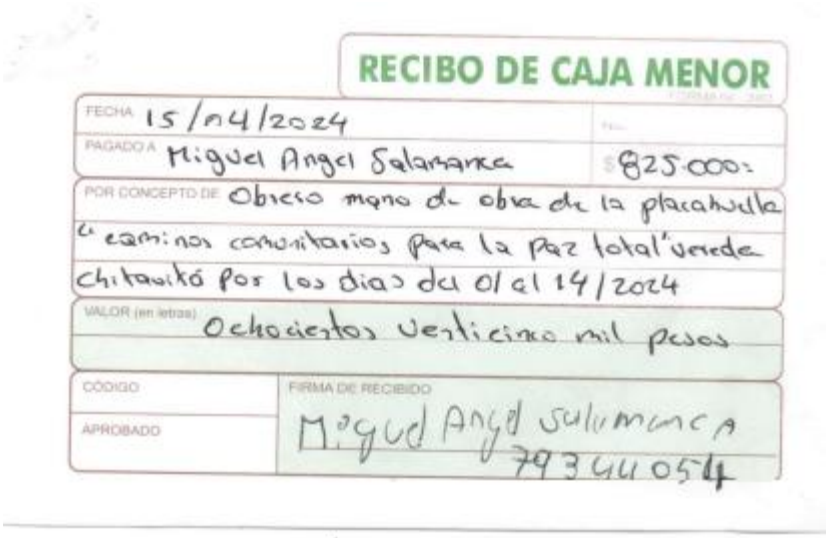

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 15/04/2024 — No.

PAGADO A Miguel Angel Salamanca — $825.000


POR CONCEPTO DE Obrero mano de obra de la placahuella "caminos comunitarios para la paz total" vereda chitaviká por los dias del 01 al 14/2024

VALOR (en letras) Ochocientos Veinticinco mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Miguel Angel Salamanca 79344054

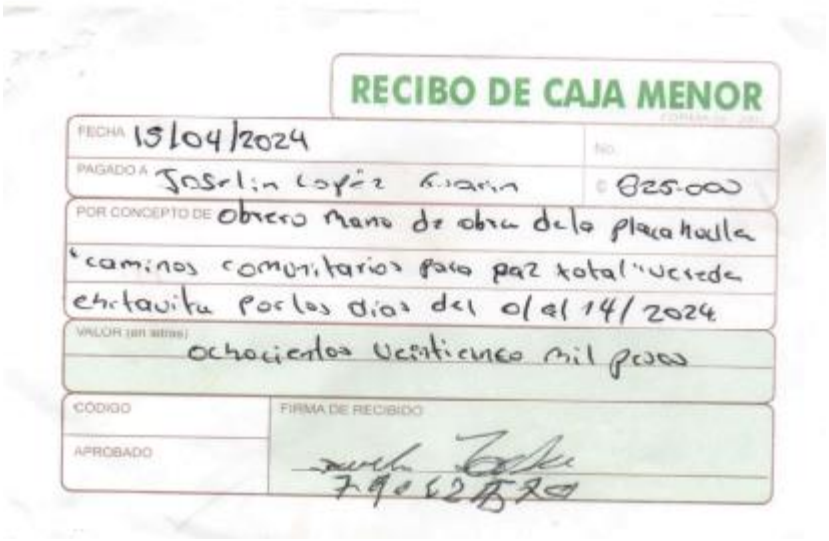

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 15/04/2024 — No.

PAGADO A Jaslin Lopez Rivera — $825.000

POR CONCEPTO DE Obrero Mano de obra de la placahuella "caminos comunitarios para paz total" vereda chitaviká por los dias del 01 al 14/2024

VALOR (en letras) ochocientos Veinticinco mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO 79662820

cheque N° 14

IMACOR

DIMACOR GUAYATA
NIT:901109923-1 RÉGIMEN COMÚN
CR 5 5 21
RES DIAN.FACT.ELECTRONICA18764006325391
FECHA: 2024-02-28
VIGENCIA: 2025-02-28
DEL 1231 AL 10.000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #
(GY 1420)
(, PEDIDO: 09)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
NIT: 820003917 7
CLIENTE: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA
TELÉFONO: 3108663056
DIRECCIÓN: VEREDA CHITAVITA

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS
22 ITEMS

CANT | ITEM	SUBTOTAL
10 X VARILLA CORRUGADA 1/4**	$73,950
12 X ALAMBRE NEGRO X KL**	$65,546

INFORMACIÓN DE PAGOS
18/04/24 9:12 AM EFECTIVO 200,000

SUBTOTAL: $ 139,496
DESCUENTOS: (-$ 0)
IMPTO (19%, $139.496) $26,504
TOTAL: 166,000
PAGOS: $ 200,000
BALANCE: $ 34,000

HORA REGISTRO: 18/04/2024 9:12:07 AM
CAJERO: CAJA PRINCIPAL CAJA

QUEREMOS HACER PARTE DE TU PROYECTO
GRACIAS POR TU COMPRA

SISTEMA POS EN LA NUBE
WWW.CUANTIS.COM

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 03/04/2024 — No.

PAGADO A Miguel Antonio Casas Garcia — $ 15.000

POR CONCEPTO DE Arreglo de dos palas.

VALOR (en letras) Quince mil pesos

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Miguel A Casas
4131692

RECIBO DE CAJA MENOR

LUGAR: Guayeta — 30 — 04 — 2024

PAGADO A: Elver Ricardo Espejo — $ 287.000

POR CONCEPTO DE: transporte bajada arena, grabillo desde la primera plataforma y al segundo tramo.

VALOR(EN LETRAS): Doscientos ochenta y siete mil pesos

CODIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

Elver Ricardo Espejo

C.C. / NIT 1051226455



DIMACOR GUAYATA
NIT:901109923-1 RÉGIMEN COMÚN
CR 5 5 21
RES.DIAN.FACT.ELECTRONICA18764066325391
FECHA: 2024-02-28
VIGENCIA: 2025-02-28
DEL 1231 AL 10.000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #
(GY 1486)
(PERIDO: 29)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
NIT: 820003917 7
CLIENTE: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA
TELÉFONO: 3108663056
DIRECCIÓN: VEREDA CHITAVITA

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS
12 ITEMS
CANT | ITEM | SUBTOTAL

8 X VARILLA CORRUGADA 1/4**	$59,160
4 X ALAMBRE NEGRO X KL**	$21,849

INFORMACIÓN DE PAGOS
02/05/24 9:19 AM EFECTIVO 100,000

SUBTOTAL: $ 81,008
DESCUENTOS: (-$ 0)
IMPTO (19%, $81.008): $15,392
TOTAL: 96,400
PAGOS: $ 100,000
BALANCE: $ 3,600

HORA REGISTRO: 02/05/2024 9:19:46 AM
CAJERO: CAJA PRINCIPAL CAJA

QUIEREMOS HACER PARTE DE TU PROYECTO
GRACIAS POR TU COMPRA

SISTEMA POS EN LA NUBE
WWW.CUANTIS.COM

Tiquete POS #:POS 70441

E.D.S
SAN DIEGO

BLANCA SOFIA MARTIN ACOSTA
NIT: 23.629.215-1
REGIMEN COMUN
CR 4 CL9 SEC SALIDA GUATEQUE

ORIGINAL

Equipo : 1
Venta #: 70441
Fecha: 2024-04-27
Hora: 7:42:25

Cliente: Consumidor Final
NIT/CC: 222222222222
Placa: VEREDA CHITAVITA
Producto: Corriente
Dinero: $ 50000
Volumen: 3.110 Galones
ppu: $16050

Subtotal: $ 50000
IVA : $ 0
Total: $ 50000

Impresion Software NEXUS
Desarrollado Por IMED OIL S.A.S
NIT 901.212.992-1

Res DIAN No 18764035245285
Vigencia 31/08/2022-28/02/2023
Del POS 1001 AL POS 20000

Gracias Por Su Compra
Vuelva pronto

Si requiere factura electronica envie foto de esta factura y RUT a blancasofiam@hotmail.com
WS 318 827 9057

IMACOR

DIMACOR GUAYATA
NIT:901109923-1 RÉGIMEN COMÚN
CR 5 5 21
RFS.DIAN.FACT.ELECTRONICA18764066375391
FECHA: 2024-02-28
VIGENCIA: 2025-02-28
DEL 1231 AL 10.000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #
(GY 1505)
(, PEDIDO: 65)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
NIT: 820003917-7
CLIENTE: JUNTA DE ACCION COMUNAL
DE LA VEREDA DE CHITAVITA DEL
MUNICIPIO DE GUAYATA
TELÉFONO: 3108663056
DIRECCIÓN: VEREDA CHITAVITA

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS
2 ITEMS
CANT | ITEM | SUBTOTAL
2 X ALAMBRE NEGRO X CL** $10,924

INFORMACIÓN DE PAGOS
07/05/24 9:19 AM EFECTIVO 13,000

SUBTOTAL: $ 10,924
DESCUENTOS: (-$ 0)
IMPTO (19%, $10,924): $2,076
TOTAL: 13,000
PAGOS: $ 13,000
BALANCE: $ 0

HORA REGISTRO: 07/05/2024 9:19:23 AM
CAJERO: CAJA PRINCIPAL CAJA

QUEREMOS HACER PARTE DE TU PROYECTO
GRACIAS POR TU COMPRA

SISTEMA POS EN LA NUBE
WWW.CUANTIS.COM

MEGACENTER J
CRA 5 N0 5-15
GUAYATA - CENTRO
NIT 1051336510-4
3133823030

21/12/2023 01:07 PM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA
FOLIO: 11575

CANT. DESCRIPCION IMPORTE
1 PUNTILLA LISA $4,200
CON CABEZA 3
1/2

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $4,200
PAGO CON: $4,200
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
TELEFONO0****3133823030

Maricla Aguilar
Chitavita

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 03/16/2024 NO.

PAGADO A Miguel Angel Salamanca $ 50.000.

POR CONCEPTO DE Refrigerio obreros obra

VALOR (en letras) Cincuenta mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Miguel Angel Salamanca
79744054

MEGACENTER JC
CRA 5 N0 5-15
GUAYATA - CENTRO
NIT 1051336510-4
3133823030

05/03/2024 09:06 AM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA
FOLIO: 15774

CANT. DESCRIPCION IMPORTE
==========
2 PUNTILLA 2 CAB $10,000
ALLO LIBRA

NO. DE ARTICULOS: 2
TOTAL: $10,000
PAGO CON: $10,000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
TELEFONO***3133823030

Tiquete POS #:POS 62791

E.D.S
SAN DIEGO

BLANCA SOFIA MARTIN ACOSTA
NIT 23.629.215-1
REGIMEN COMUN
CR 4 [illegible] SALIDA GUATEQUE

ORIGINAL

Equipo [illegible]
Venta #: [illegible]
Fecha: 20[illegible]
Hora: 7:49.[illegible]

Cliente: Consumidor [illegible]
NIT/CC: 2222222222
Placa: JUNTA CHITAVITA
Producto: Corriente
Dinero: $ 100000
Volumen: 6.200 Galones
ppu: $15960


Subtotal: $ 100000
IVA : $ 0
Total: $ 100000

Impresion Softwar
Desarrollado Por In[illegible]L S.A.S
NIT 901.212.992-1

Res DIAN No 1876403[illegible]45285
Vigencia 31/08/2022-28/02/2023
Del POS 1001 AL POS 20000

Gracias Por Su Comora
Vuelva pronto

Si requiere factura electronica
envie foto de esta factura y RUT
a blancasofiam@hotmail.com
WS 318 827 [illegible]

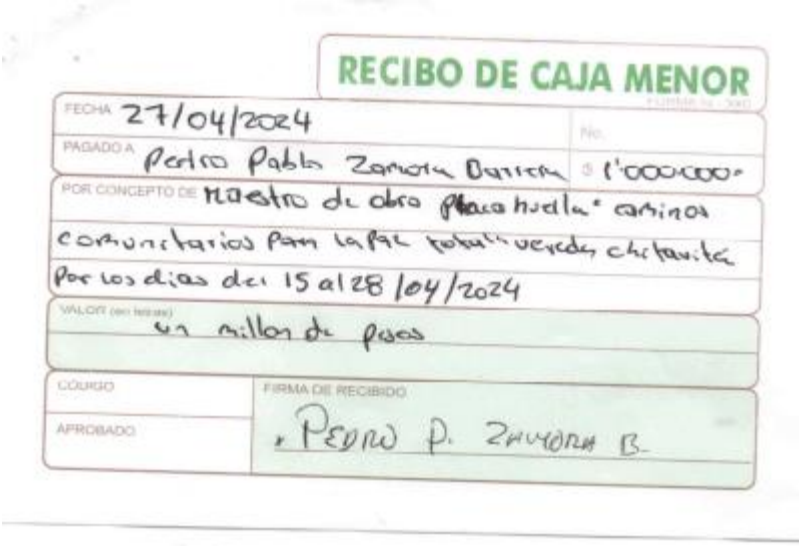

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 27/04/2024 — No.

PAGADO A Pedro Pablo Zamora Barrera — $ 1'000.000.-

POR CONCEPTO DE maestro de obra placa huella caminos comunitarios Para la Paz totali vereda chitavita


Por los dias del 15 al 28/04/2024

VALOR (en letras) un millon de pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: PEDRO P. ZAMORA B.

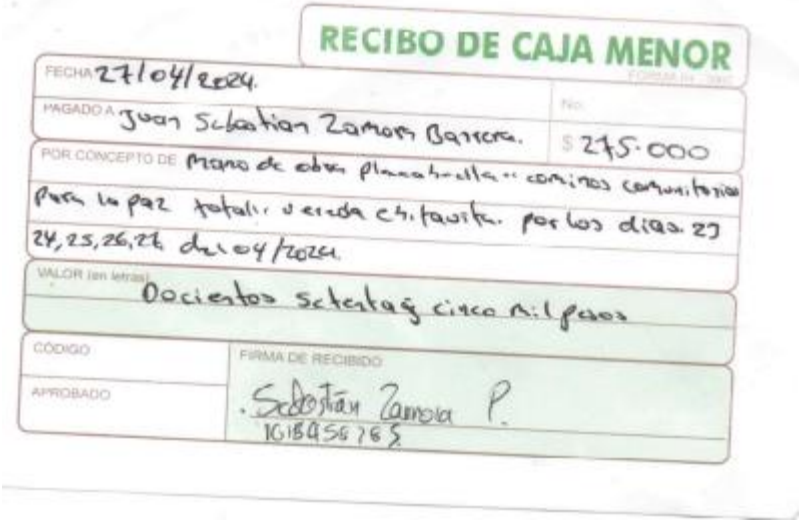

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 27/04/2024 — No.

PAGADO A Juan Sebastian Zamora Barrera. — $ 275.000


POR CONCEPTO DE Mano de obra placa huella caminos comunitarios Para la paz totali vereda chitavita. por los dias 23, 24, 25, 26, 27 del 04/2024.

VALOR (en letras) Doscientos setenta y cinco Mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: Sebastian Zamora P. 1018456765

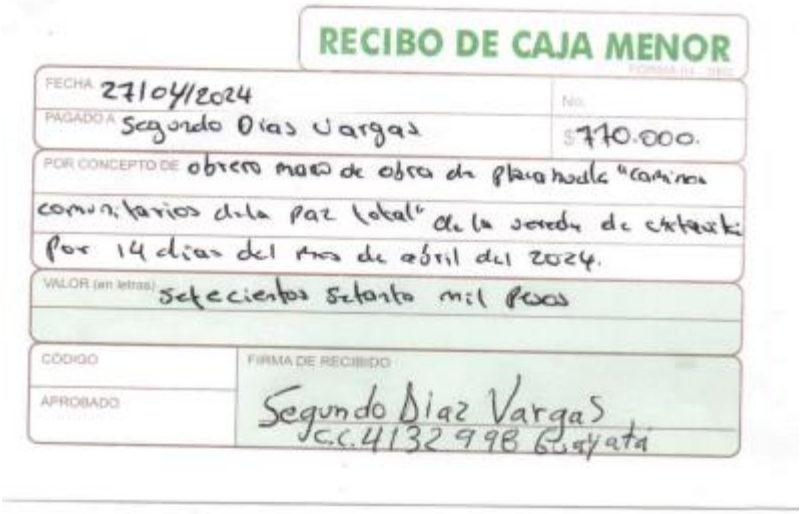

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 27/04/2024 — No.

PAGADO A Segundo Dias Vargas — $770.000.

POR CONCEPTO DE obrero mano de obra de placa huella "caminos comunitarios de la paz total" de la vereda de estanzuela por 14 dias del mes de abril del 2024.


VALOR (en letras) Setecientos Setenta mil Pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Segundo Diaz Vargas
C.C. 4132998 Bogotá

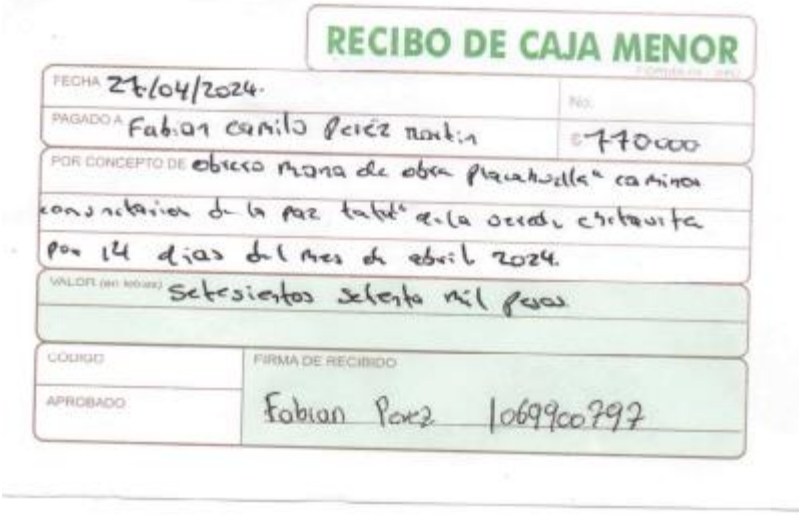

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 27/04/2024. — No.

PAGADO A Fabian Camilo Perez martin — $770000

POR CONCEPTO DE obrero mano de obra placahuella" caminos comunitarios de la paz total" de la vereda estanzuela por 14 dias del mes de abril 2024.

VALOR (en letras) Setesientos Setenta mil Pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Fabian Perez 1069900797

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 27/04/2024 — No.

PAGADO A Miguel Angel Salamanca. — $ 605.000

POR CONCEPTO DE obrero mano de obra de la placahuella "caminos comunitarios Para la paz total" vereda chitavita Por los dias 15,16,19,20,22,23,24,25,26,27 y 28 del mes 04/2024.

VALOR (en letras) Seiscientos cinco mil pesos.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: Miguel Angel salamanca
7933 44054

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 27/04/2024 — No.

PAGADO A Joselin Lopez Guarin — $ 875.000

POR CONCEPTO DE Obrero mano de obra de la placahuella "caminos comunitarios Para la paz total" vereda chitavita Por los dias 15 a/ 28 /2024.

VALOR (en letras) Ochocientos Veinticinco mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: Joselin Lopez
2906762 6

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 28/02/2024 — No.

PAGADO A Alvaro Guerrero Moreno — $ 80000.

POR CONCEPTO DE Transporte a llevar gasolina y otros acarreos ala via de placahuella

VALOR (en letras) ochenta mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: Alvaro Guerrero Moreno
4.132.894 Gta

IMACOR

DIMACOR GUAYATA
NIT:901109923-1 RÉGIMEN COMÚN
CR 5 5 21
DFS DIAN FACT.ELECTRONICA18764066375391
FECHA: 2024-02-28
VIGENCIA: 2025-02-28
DEL 1231 AL 10.000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #
(GY-1302)
(PEDIDO: 01)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NIT: 820003917 7
CLIENTE: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA
TELÉFONO: 3108663056
DIRECCIÓN: VEREDA CHITAVITA

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

27 ITEMS

CANT | ITEM | SUBTOTAL

25 X ALAMBRE NEGRO X KL** $136,555

2 X PUNTILLA CABALLO C/CABEZA X LB 2-1/2** $7,899

INFORMACIÓN DE PAGOS

14/03/24 8:09 AM EFECTIVO 171,900

SUBTOTAL: $ 144,454
DESCUENTOS: (-$ 0)
IMPTO (19%, $144.454): $27,446
TOTAL: 171,900
PAGOS: $ 171,900
BALANCE: $ 0

HORA REGISTRO: 14/03/2024 8:09:57 AM
CAJERO: CAJA PRINCIPAL CAJA

QUEREMOS HACER PARTE DE TU PROYECTO
GRACIAS POR TU COMPRA

SISTEMA POS EN LA NUBE
WWW.CUANTIS.COM

Guayatá, Boyacá.
14 de Febrero 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DE ACCION COMUNA LDE LA VEREDA DE CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA

NIT. 820003917-7

DEBE A:

JUAN NUMAEL PIÑEROS

C.C. 4.132.634 de Guayata, Boyaca.

LA SUMA DE:

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C ($ 150.000)

POR CONCEPTO DE: Transporte de un viajes de arena desde la triturador AGREGADOS HBA hasta vía de realización de placa huella vereda Chinavita.

Cordialmente.

JUAN NUMAEL PIÑEROS

C.C. 4.132.634 de Guayatá, Boyacá.

HELMAN ARIEL VARGAS
ASESORÍA EN ASUNTOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS, LEGALES.
ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL Y NORMAS DE ASEGURAMIENTO

CUENTA DE COBRO NO.: 327-2024

FECHA: GUAYATÁ – BOYACÁ 06 DE MAYO DE 2024

VENCIMIENTO: 06 DE MAYO DE 2024

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA

NIT. 820.003.917 - 7

DEBE A

HELMAN ARIEL VARGAS MONTAÑEZ

NIT.1.014.195.608

(NO RESPONSABLE DE IVA)

LA SUMA DE UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.500.000)

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTADOR PÚBLICO LABOR QUE SE LLEVÓ A CABO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, A LOS 06 DÍAS DE MES DE MAYO DE 2024.



HELMAN ARIEL VARGAS MONTAÑEZ

NIT.1.014.195.608

ACEPTADA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ.

06 MAYO 2024

GUAYATA BOYACA

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA
CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA
NIT 82000391-7

DEBE A
JOHAN SEBASTIAN PEREZ HEREDIA
C.C 1.010.219.297

POR CONCEPTO DE: Honorarios del mes de abril como ingeniero residente de la obra la cual es la construcción de placa huella en la vereda de Chitavita del municipio de Guayatá la suma de dos millones de pesos MCTE (2.000.000)

Cordialmente Sebastian PH.

Johan Sebastian Perez Herdia
C.c. 1.010.219.297

Guayata– Boyacá 09/05/024

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

VEREDA CHITAVITA – GUAYATA

NIT: 820003917

DEBE A:

RENE RUBIANO TOLOZA

TOPÓGRAFO PROFESIONAL

LIC. PROFESIONAL: 01-19824 CPNT

CC: 1.048.848.240 de Garagoa Boyacá

LA SUMA DE: Un millón quinientos mil pesos $1´500.000

POR CONCEPTO DE:

Levantamiento topográfico: planimétrico y altimétrico de placa huella construida (planos AS-BUILT) e informe del respectivo levantamiento en la vereda Chitavita del municipio de Guayata Boyacá

SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

Cordialmente:

Rene Rubiano Toloza

Lic. profesional: 01-19824 CPNT

C.C. 1.048.848.240 de Garagoa Boyacá

Celular: 3202205120

Correo electrónico: rerubiano100@gmail.com

Guayatá, Boyacá.
24 de mayo 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA

NIT. 820003917-7

DEBE A:

ALVARO GUERRERO MORENO

C.C. 4.132.894 de Guayatá – Boyacá.

LA SUMA DE:

MILLON CIENTO NOVETA Y CIETE MIL PESOS MONEDA COLOMBIANA ($1.197.000)

POR CONCEPTO DE: Servicios de transporte de representante de la junta de acción comunal de la vereda de Chitavita en los trayectos Guayatá Tunja, Guayatá Guateque, Guayatá recebera Somondoco, Guayatá recebera AGREGAOS, para procesos de firma de documentos, tramites bancarios, cotizaciones y compras de materiales,

demás vueltas administrativas.

Cordialmente.

Alvaro Guerrero Moreno

ALVARO GUERRERO MORENO

C.C. 4.132.894 de Guayatá – Boyacá.

Celular: 3103352677

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales | PRIVADA | **490**

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910806265289

(415)7707212489984(8020) 000491080626528 9

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 0 0 0 3 9 1 7	7				

11. Razón social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA

12. Cód. Dirección seccional: 2 0

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No.	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3505734708976

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título
			2 AAAA 0 4 MM 2 1 DD	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,712,000

(415)7707212489984(8020)528980000008230039176100(3900)00000001712000(96)20240521

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

969. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario


997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Banco Agrario de Colombia
OF. GUAYATA - BOYACA
CAJA 01
21 MAYO 2024
SBAN 1538
RECIBIDO CON PAGO

980. Pago total $: 1,712,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo


20243003159793

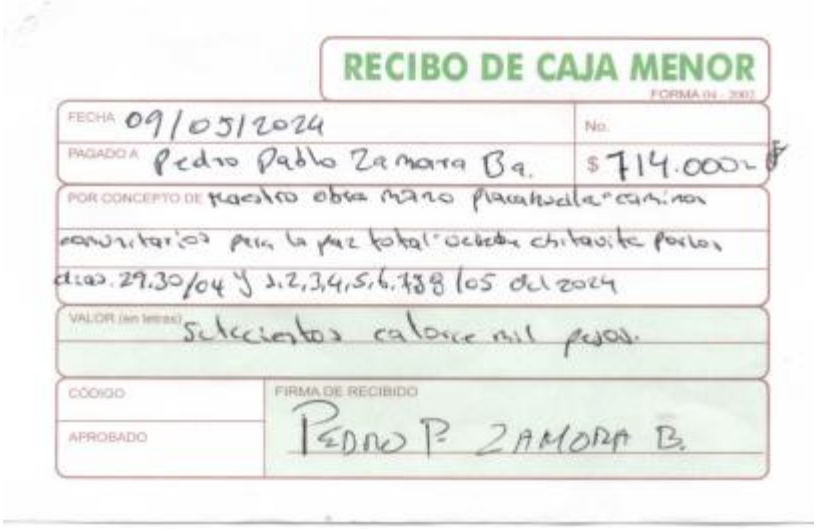

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002


FECHA 09/05/2024	No.
PAGADO A Pedro Pablo Zamora Bq.	$ 714.000
POR CONCEPTO DE Maestro obra mano Placahuella "caminos convitarios para la paz total" vereda chitavita Por los días 29.30/04 y 1.2.3.4.5.6.7.8 los 05 del 2024	
VALOR (en letras) Setecientos catorce mil pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	PEDRO P. ZAMORA B.

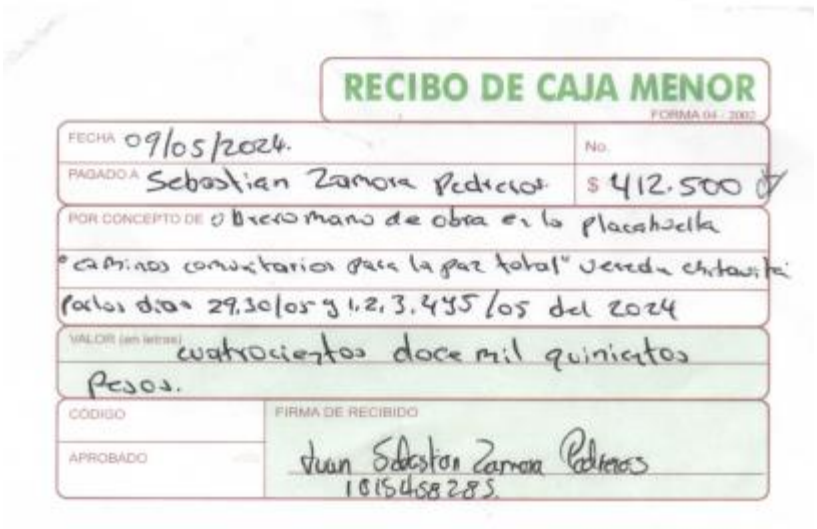

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 09/05/2024.	No.
PAGADO A Sebastian Zamora Pedraza	$ 412.500
POR CONCEPTO DE Obrero mano de obra en la placahuella "caminos convitarios para la paz total" vereda chitavita Por los días 29.30/05 y 1.2.3.4.5 los del 2024	
VALOR (en letras) cuatrocientos doce mil quinientos Pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Juan Sebastian Zamora Pedraza 1015458285.

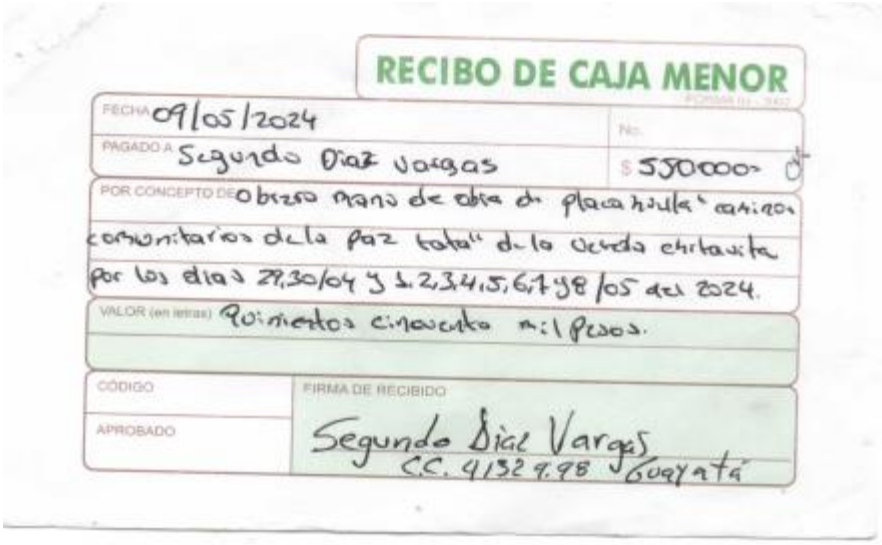

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 09/05/2024 — No.

PAGADO A Segundo Diaz Vargas — $ 550000

POR CONCEPTO DE Obrero mano de obra de placa huella caminos comunitarios de la paz total" de la vereda chitaviita por los dias 29,30/04 y 1,2,3,4,5,6,7 y 8/05 del 2024.


VALOR (en letras) Quinientos cincuenta mil Pesos.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Segundo Diaz Vargas
C.C. 4132998 Guayatá

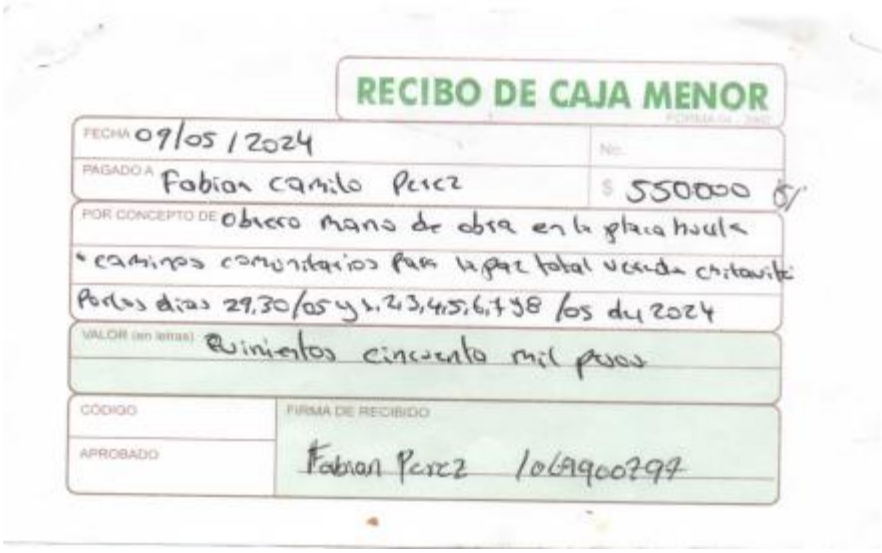

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 09/05/2024 — No.

PAGADO A Fabian camilo Perez — $ 550000

POR CONCEPTO DE Obrero mano de obra en la placa huella "caminos comunitarios para la paz total vereda chitaviita Por los dias 29,30/05 y 1,2,3,4,5,6,7 y 8/05 del 2024


VALOR (en letras) Quinientos cincuenta mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Fabian Perez 1069900797

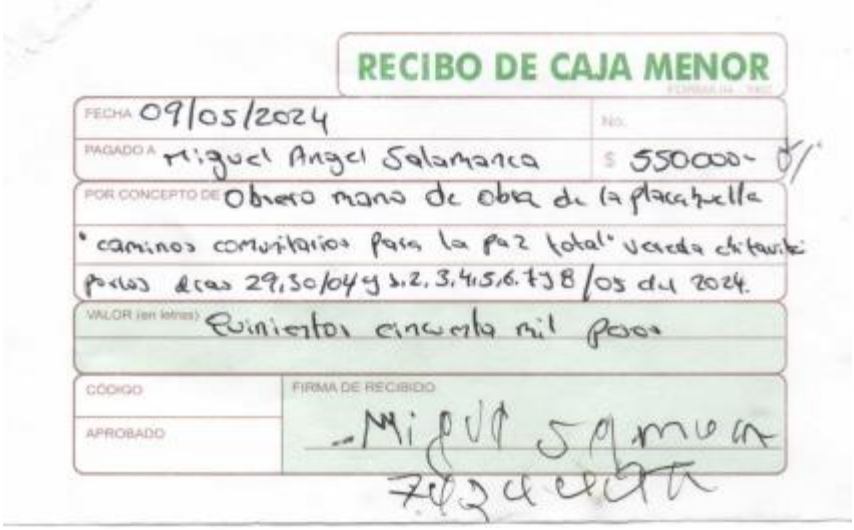

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 09/05/2024 — No.

PAGADO A Miguel Angel Salamanca — $ 550000-

POR CONCEPTO DE Obrero mano de obra de la placahuella "caminos comunitarios para la paz total" vereda chitavita por los dias 29,30/04 y 1,2,3,4,5,6,7,8/05 del 2024.


VALOR (en letras) Quinientos cincuenta mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Miguel Salamanca
7162 4187

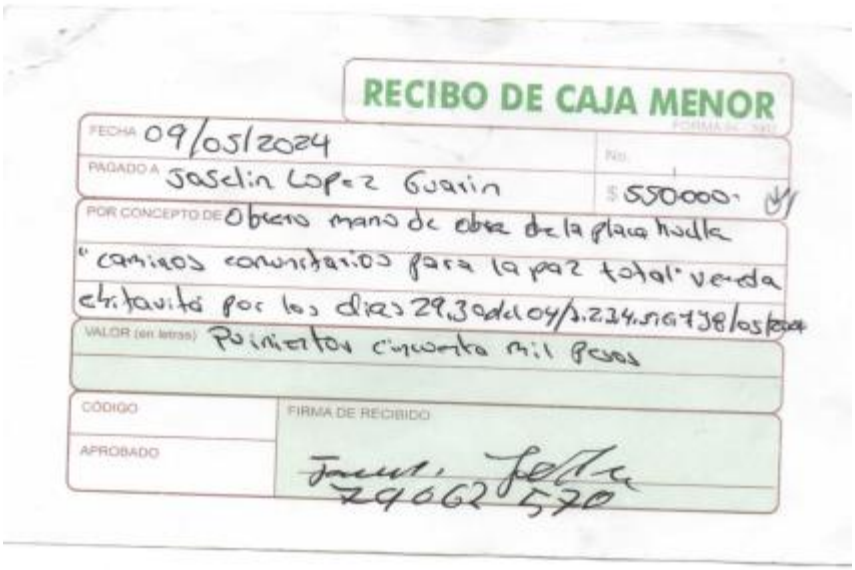

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 09/05/2024 — No.

PAGADO A Joselin Lopez Guarin — $ 550000-

POR CONCEPTO DE Obrero mano de obra de la placahuella "caminos comunitarios para la paz total" vereda chitavita por los dias 29,30 del 04/1,2,3,4,5,6,7,8/05/2024

VALOR (en letras) Quinientos cincuenta mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Joselin Lopez
2906257

Último ingreso exitoso: 2024-07-30 / 05:13:51 PM | Último ingreso fallido: 2024-02-04 / 03:38:59 PM

Datos | Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Cesantías | Pensiones Voluntarias | Salir

Julio 30 de 2024 / 5:14 PM

Inicio › Planillas › Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA DEL MUNICI....	**Nit:**	820003917
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Mayo 2024
Número de radicación:	76946370	**Total a pagar:**	$2,481,400
Fecha de vencimiento:	07/05/2024	**Total de empleados:**	6
Fecha de pago:	07/05/2024	**Número de administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar Of	**Nit recaudo:**	9998600869427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número de aprobación:**	625399477
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	6		$0.00	$537,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$204,700
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$199,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		$0.00	$915,700
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$309,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		$0.00	$269,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0.00	$45,100
						$2,481,400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bienvenidos

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transaccion

30/7/24, 17:14 MiPlanilla.com

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Último ingreso exitoso: 2024-07-30 / 05:13:51 PM | Último ingreso fallido: 2024-02-04 / 03:36:59 PM

Datos | Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Cesantías | Pensiones Voluntarias | Salir

Julio 30 de 2024 / 5:14 PM

Inicio - Planillas - Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA DEL MUNICI....	**Nit:**	820003917
Tipo planilla:	Y	**Periodo liquidación Pensiones**	Abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Abril 2024
Número de radicación:	76897408	**Total a pagar:**	$838.300
Fecha de vencimiento:	07/05/2024	**Total de empleados:**	2
Fecha de pago:	07/05/2024	**Número de administradoras:**	5

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600869427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número de aprobación:**	625410396
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	2		$0.00	$97.300
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$208.000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$208.000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$162.500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0.00	$162.500
						$838.300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Bienvenidos

Imprimir transacción

INFORME DE INTERVENTORIA Nº. 06
01 al 30 abril de 2024

✓ Seguimiento Programa de Inversiones

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1


FECHA: 20 (Día) 11 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA
PROGRAMA DE INVERSIONES: X (Indique con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.: 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 2757
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUANTA DE ACCION COMUNAL CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA
LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): CHITAVITA VIA ALTERNA MUNICIPIO DE GUAYATA Y GUATEQUE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2757
INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ

PLAZO INICIAL: 4 MES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: N/A (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión q/o corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 207.042.782,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 207.042.782,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado						
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	$2.575.040	1,24%		% P		1,24%				
	$2.575.040	1,24%		$ P acum		$2.575.000				
				$ E		$750.000				
				% E		0,36%				
CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$161.146.500	77,83%		% P		25,94%	25,94%	25,94%		
	$161.146.500	77,83%		$ P		$53.715.500	$53.715.500	$53.715.500		
				$ E		$13.756.200	$32.451.850	$18.377.400	$30.227.340	$18.257.750
				% E		5,20%	39,62%	7,88%	14,60%	8,82%
COSTOS ADMINISTRATIVOS	$43.321.242	20,92%		% P		6,97%	6,97%	6,97%		
	$43.321.242	20,92%		$ P		$14.440.414	$14.440.414	$14.440.414		
				$ E		$9.407.800	$5.513.900	$6.322.950	$10.818.300	$11.105.300
				% E		4,54%	2,48%	3,05%	5,23%	5,36%
				% P						
				$ P						
				$ E						
				% E						
				% P						
				$ P						
				$ E						
				% E						
				% P						
				$ P						
				$ E						
				% E						
				% P						
				$ P						
				$ E						
				% E						
				% P						
				$ P						
				$ E						
				% E						
				% P						
				$ P						
				$ E						
				% E						
				% P						
				$ P						
				$ E						
				% E						
				% P						
				$ P						
				$ E						
				% E						
TOTAL OTROS ITEMS				% P						
				$ P						
				$ E						
				% E						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 207.042.782,00	100,00%								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 207.042.782,00	100,00%								

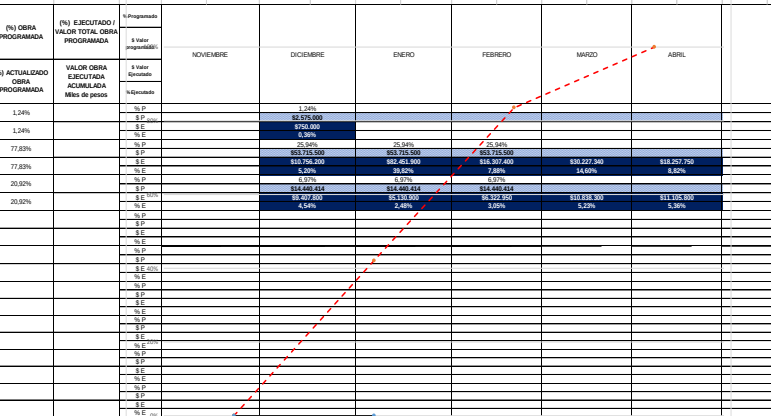

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	34,16%	32,92%	32,92%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$70.730.914	$68.155.914	$68.155.914	$0	$0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	34,16%	67,08%	100,00%	100,00%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$70.730.914	$138.886.828	$207.042.742	$207.042.742	$207.042.742
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		10,16%	42,38%	10,93%	19,83%	14,18%
	VALOR (Miles de Pesos)		$20.914.000	$87.582.800	$22.630.350	$41.065.640	$29.363.550
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		10,16%	52,45%	63,33%	83,17%	97,35%
	VALOR (Miles de Pesos)		$20.914.000	$108.496.800	$131.127.150	$172.192.790	$201.556.340

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$5.000.000 / N/A
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$253.474 / N/A
AIU IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$5.337 / N/A
IVA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$1.204 / N/A
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye N/A)	N/A
	N/A
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e N/A)	N/A
	N/A
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$5.253.474
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$5.253.474
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Firma:	Aprueba Firma:	Aprueba Firma	
Nombre: JOHAN SEBASTIAN PEREZ HEREDIA	Nombre: HERBY LUNA CRUZ	NOMBRE: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
Residente de Obra	INTERVENTOR	Matricula No.: 1521917469BYC	
Matricula Profesional No.: 091037-0538200 CND	Matricula No.: 2520242574CND	Director Territorial	
Revisó Firma:	Revisó Firma:	Revisó Firma: No Aplica	
Nombre: ANGELICA MARIA RUBIO	NOMBRE: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Nombre: N/A	
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	Matricula No.: 1521917469BYC	Gestor Técnico de Proyecto	
Matricula Profesional No.: 01123 11321 CP/TVC	Director Territorial	Matricula No.: N/A	

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- ✓ Acta de reunion de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 09-04-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Invias DIRECCIÓN TERRITORIAL: Boyacá

CONVENIO No. 2757 de 2023 (Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JAC Vereda Chitacata Guacata

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos entre la JAC y Invias para el Programa caminos comunitarios para la paz total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2678 de 2022 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Heiby Luna

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisar avance de obra y si se termina en la fecha de vencimiento del contrato 30 de abril

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Contabilidad
- Avance de obra
- Liquidacion de obra "documentos"
- Recorrido de obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizo reunion para revisar avance de obra se evidencia de que se finaliza el 30 de abril para el tramo 2 que era de 160 metros se entrega 113 metros y a que da el presupuesto,

Se solicita arreglar dilataciones en bordillos y lozas, recoger sacos de cemento y material sobrante, realizar eje de placa huella en ambos tramos.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Curar dilataciones	10-04-2024	Residente
Aseo de obra	5-05-2024	JAC
Adelantar formatos liquidacion	15-05-2024	Residentes

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Sebastian Perez	Ing residente	JAC	Sebastian P.
Herby Luna Cruz	Director Interv	HLC	
Camilo Rodriguez	Residente Interv	HLC	
Liz Manuela Aguilar	Presidente JA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 Información general del Contrato

En la siguiente tabla se muestra la información general del contrato de interventoría.

Tabla 4. Información General del Contrato de interventoría

CONTRATO No.	2878 de 2023
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE Y GUAYATÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
INTERVENTOR	HERBY LUNA CRUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA
FECHA INICIACIÓN	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	4 MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	HASTA 31 DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	NO APLICA
TIEMPO DE SUSPENSION	NO APLICA
FECHA VENCIMIENTO FINAL	24 DE MAYO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS (67.954.000,00) M/CTE
VALOR DEL CONTRATO CON PRORROGA	OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEISMIL SETECIENTOS VEINTI DOS PESOS(81.916.722,00) M/CTE

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Con el objetivo de mantener una adecuada ejecución del proyecto se realizaron las siguientes actividades:

Técnica:
En la vereda Chitavita se terminaron trabajo en el tramo 1 de 100 m de placa huella y se LLEVAN 105 metros del tramo 2 se alcanzan a realizar 113 metros en el tramo 2 de placa huella.

Ambiental: Se están realizando informes ambientales de cada convenio.

Informes semanales: Elaboración y seguimiento del Informes semanales correspondientes al periodo.

Informe Mensual (abril de 2024): Control y elaboración del segundo informe mensual de abril de 2024 de Interventoría correspondiente a este periodo.

Correspondencia: Elaboración y respuesta de correspondencia mediante comunicados como mensajes de correos electrónicos, dirigida y recibida del convenio y el Invías.

Información otros programas y aplicativos

Cifra: No aplica para este proyecto.

• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. No aplica para este proyecto.

Dificultades técnicas.

En este periodo no se presentaron dificultades técnicas.

5.3 Informe especialistas y profesionales

INFORME DIRECCION DE INTERVENTORIA

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN *COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE Y GUAYATÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*".

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORÍA No. 06
PERIODO: 01 al 30 de abril de 2024

ING. HERBY LUNA CRUZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Tabla Contenido

1 INTRODUCCION 69
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 6
2.1 Localización y alcance 7
2.2 Inventario y estado inicial de la vía 7
4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 8
a. Información general del Contrato 8
b. Descripción de actividades ejecutadas en el mes 9
c. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 10
4. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 1
4.1 Información general del Contrato 1
4.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 1
4.3 Información otros programas y aplicativos 2
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 3
6 REGISTRO FOTOGRAFICO 4

1 INTRODUCCION

El convenio # 2757 de 2023 celebrado entre el Instituto Nacional de vías con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ identificado número de NIT 820.003.917**-7**, que tiene como objeto, **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**. Se impartió orden de inicio al convenio con fecha 01 de noviembre de 2023.

Por otra parte, mediante el proceso de selección de mínima cuantía No. **IP-DT-BOY-021-2023**, El Instituto Nacional de Vías, celebró el contrato No **2878 de 2023**, entre el INVIAS y **HERBY LUNA CRUZ** la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE Y GUAYATÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**". Mediante invitación pública No. **IP-DT-BOY-021-2023** por el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**, asimismo, se impartió orden de inicio al contrato de Interventoría con fecha 01 de noviembre de 2023.

El presente informe del Director de Interventoría N° 6 describe las actividades realizadas en el periodo de 01 al 30 de abril de 2024, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayatá del departamento de Boyacá, en la vereda Chitavitá, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 (Latitud:4,9726; longitud: - 73,4904) en el cruce los morenos y punto de referencia final el PR 1+380 (Latitud:4,9825; longitud: -73,4860) en la capilla de la vereda, de la vía Guayatá – Vereda Chitavitá, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Boyacá del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.


El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.


Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.


2.2 Localización y alcance

El municipio de Guayatá se encuentra localizado en la provincia de Oriente del Departamento de Boyacá, dista 131 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 112 Km cuadrados de los cuales solo 0,58 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Guayatá se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 4° 57’58’’
Longitud: 73° 29’21’’

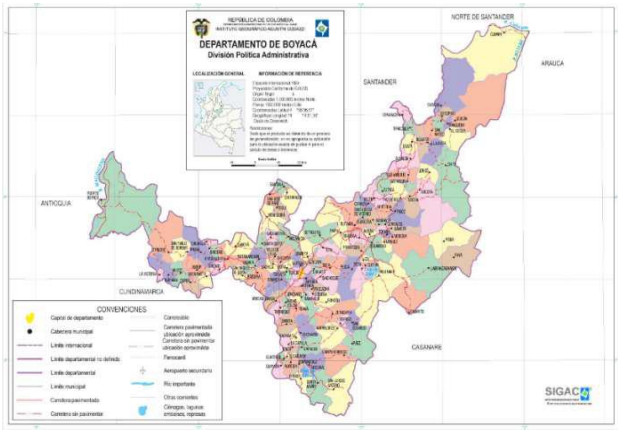

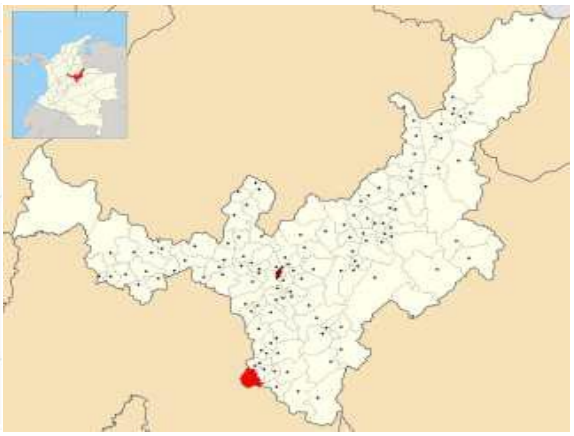

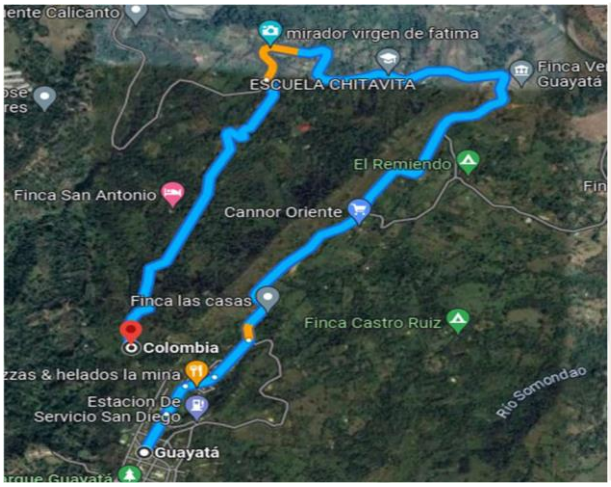

Recorrido de Municipio a PR 0+000



Tramo JAC Vereda Chitavitá

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

se hace necesario efectuar por parte del Organismo de Acción Comunal, con seguimiento y aprobación del interventor, la corroboración en el sitio de las condiciones del terreno donde se ejecutarán las obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construcción de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes, obras de contención de baja complejidad, etc.

El inventario depende de la "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir.



Ilustración 2. Estado inicial de la vía.

3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

Por regla general las Juntas de Acción Comunal solo pueden desarrollar actividades dentro del territorio de su zona de influencia (barrio, sector, etapa, vereda, corregimiento, etc.) dependiendo de la división establecida por el Distrito o Municipio respectivo.

4. INFORMACIÓN CONVENIO DE OBRA

a. Información general del Convenio

En la siguiente tabla se muestra la información general del convenio.

Tabla 1. Información general del contrato de obra vereda Chitavita Guayata.

CONVENIO No.	2757 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ
NIT	820.003.917-7
FECHA INICIACIÓN	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	CUATRO MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	No aplica
TIEMPO DE SUSPENSION	No aplica
AMPLIACION SUSPENSION	No aplica
REANUDACION	No aplica
FECHA TERMINACION FINAL	24 DE MAYO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($207.042.782) MONEDA CORRIENTE
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 207.042.782,oo

b. Descripción de actividades ejecutadas en el mes

El director de interventoría hizo seguimiento a las siguientes actividades

En este periodo se finalizo trabajó en el tramo 1 de placa huella, este tramo tiene una longitud de 100m y se llevan 105m en el tramo 2 de lo cual se van a realizar 113 metros para un total de 213 metros de placa huella.

c. Estado de avance y acciones a seguir por parte de laInterventoría

i. Gestión Ambiental

Pendiente ilustración del INVIAS a llevar a cabo en este proyecto, última información, se envió informe de actividades.

ii. Gestión Social

En la vereda de Chitavita en el municipio de Guayata se realizó seguimiento a los formatos diligenciados no se recibieron inconformidades por parte de la comunidad.

iii. SST

En la vereda de Chitavita del municipio de Guayata se realizó entrega de dotación y equipos de protección personal a los empleados, también se realizó capacitación de uso de estos equipos de protección personal.

iv. Técnica

En la vereda de Chitavita en el municipio de Guayata en este periodo se finalizo trabajó en el tramo 1 de placa huella, este tramo tiene una longitud de 100m y se llevan 105m en el tramo 2 de lo cual se van a realizar 113 metros para un total de 213 metros de placa huella.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En este periodo se adelantan varias gestiones y se dio inicio de obra en la vereda Chitavita del municipio de Guayata:

a). Construcción de 205 m de placa huella.
b). Armado de formaleta.
c). Fundida de bordillo del tramo 2.

5.4 Informe del programa anual de caja PAC.

No aplica para este proyecto.

5.4 Informe matriz de riesgos.

No aplica para este proyecto.

5.6 Información de otros programas y aplicativos según pliego de condiciones contratos de obra e interventoría.

No aplica para este proyecto.

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA Nº. 06
01 al 30 abril de 2024

INFORME REDIDENTE DE INTERVENTORIA

CONVENIO No. 2757 DE 2023

OBJETO: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL*

01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA Nº. 06
01 al 30 abril de 2024

1 INTRODUCCIÓN

En el Municipio de Guayatá se ejecuta una obra de infraestructura la cual se da cumplimiento al convenio No 2757 de 2023 el cual tiene como objeto **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL**. Y se celebra entre la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, adelantó el proceso de contratación de la interventoría, el cual fue adjudicado al CONTRATISTA **HERBY LUNA CRUZ** por haber cumplido con los criterios de selección.

En el presente informe se describen los diferentes aspectos técnicos, financieros, administrativos, etc., relacionados con la ejecución del contrato para el periodo comprendido anteriormente, en aras de documentar todos los aspectos relevantes de la ejecución del contrato.

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

La junta de acción comunal en busca de contribuir a la construcción de obras que demanden el progreso y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad local, da inicio al proceso de mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del municipio, esto con el fin que la comunidad local cuente con vías de acceso optimas a las zonas rurales del Municipio y así brindar una mejor calidad de vida.

Para dar solución a la problemática que actualmente enfrenta el municipio, es pertinente llevar a cabo el “MANTENIEMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL – CORREDOR MUNICIPAL – VEREDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA – BOYACA SEGÚN CONVENIO 2757 DE 2023”.

Desde la firma del Convenio de Obra No. 2757 se han realizados diversas actividades las cuales se ven plasmadas en el presente informe, donde se están cumpliendo cada una de las actividades contractuales.


A continuación, se resumen las actividades desarrolladas por el contratista JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA identificado tributariamente con el NIT. **82000391-7**, cuya presidenta es la señora y LUZ MARIELA AGUILAR la entidad contratante es el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, se demuestran los rendimientos obtenidos, el personal dispuesto para las actividades, materiales, maquinaria empleada y el registro fotográfico de cada una de las actividades desarrolladas desde el inicio del contrato hasta la fecha del presente INFORME PARCIAL DE OBRA No. 01 del Convenio No. 2757, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL”.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Guayatá es un municipio colombiano situado en el extremo sur occidente del Departamento de Boyacá y pertenece a la Provincia del Oriente, Para 2018 contaba con 3112 habitantes y tiene una temperatura promedio de 18 °C.

Limita por el Norte con Guateque (5,7 km), por el Oriente con Somondoco (12,7 km) y Chivor (2,6 km), por el Occidente con Manta, por el Sur con Gachetá y Ubalá (Cundinamarca 31,5 km). Según las Actas de Deslinde, los límites municipales no están bien determinados, lo que genera un conflicto Político Administrativo que debe ser objeto de revisión y ajuste por parte del municipio, sus municipios colindantes y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC.

Ilustración 1. Localización general del proyecto

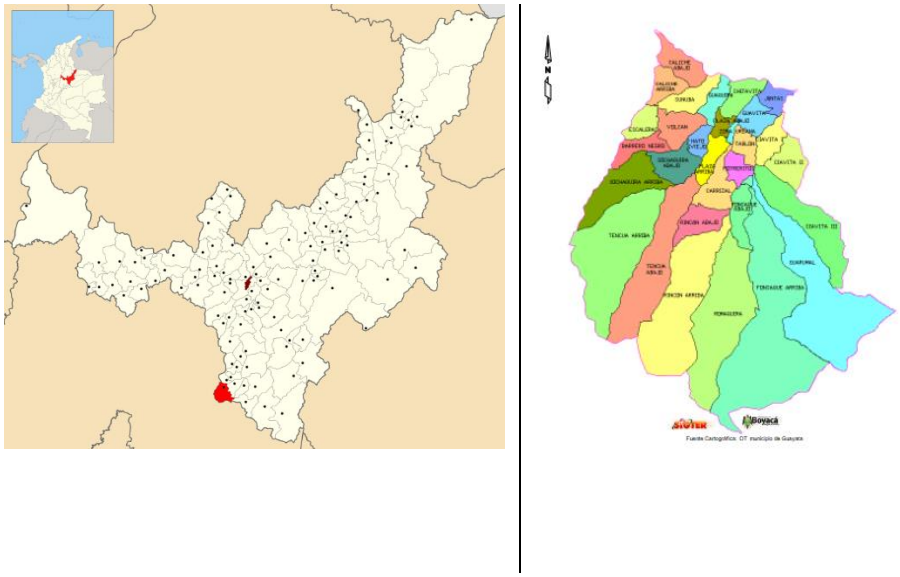

Fuente: Wikipedia

2.2 ALCANCE DEL PROYECTO

De acuerdo con lo anterior, el proyecto se basa inicialmente en la construcción de dos tramos viales clasificados por el INVIAS como de tercer orden de acuerdo con lo establecido en la resolución 5556 de 2019, así como la construcción de obras de drenaje.

- El pavimento con Placa-huella constituye una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses y camiones al día siendo los automóviles, los camperos y las motocicletas el mayor componente del flujo vehicular.

- Por lo anterior, para el presente proyecto se ha seleccionado el pavimento de placa huella ya que se ajusta a las condiciones de corredor vial y cuenta con los siguientes atributos:

- Ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante un amplio período de servicio.

- No requiere acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales.

- No requiere mayores modificaciones a la geometría de la vía existente ya que por condiciones de rugosidad de la superficie de éste tipo de pavimento la velocidad de los vehículos tiende a ser muy baja. Es pertinente manifestar que la baja velocidad es un control implícito de la accidentalidad.

- Reducir los costos de construcción y mantenimiento respecto a los mismos costos de un pavimento convencional.

- Ofrecer la posibilidad de utilización de materiales y mano de obra locales.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.3 ASPECTOS CONTRACTUALES

Cuadro 1. Aspectos generales del contrato

RESUMEN ADMINISTRATIVO	
CONVENIO No.	2757 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
VALOR:	$ 207.042.782,00
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA
NIT CONTRATISTA:	82000391-7
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE MARZO DE 2024
PRORROGA No1	UN (1) MESES
FECHA FINAL DE TERMINACION:	01 DE MARZO DE 2024
SUPERVISIÓN:	HERBY LUNA CRUZ

2.4 EQUIPOS UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Cuadro 2. Equipos utilizados

EQUIPOS UTILIZADOS	CANTIDAD
Vibro compactador	0
Motoniveladora	0
Vibrador de concreto	1
Mezcladora de un bulto y medio	1

2.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2.5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

1. construcción placa huella.
2. Trazos de la placa huella de los 13 metros que se hicieron de más.
3. Conformación de la via
4. Fundida de bordillo del segundo tramo.
5. Armada de vigueteria para el tramo adicional.
6. Amarre de hierro para huellas y cunetas para el tramo adicional.

3 AVANCE DE OBRAS

A fecha del presente informe, se ha ejecutado el 95% de la obra donde se han fundido 205 metros lineales de ciclópeo central 205 metros de ciclópeo externo por los dos costados, 208 metros lineales de huella en ambos costados, se han fundido 70 vigas cada una de 20cm de ancha y se han fundido 205 metros lineales de bordillo.

3.1 CALIDAD DE LAS OBRAS

Por parte de la interventoría se realizó el seguimiento correspondiente para el cumplimiento del control de calidad de las labores que se desarrollaron, en este sentido se ha verificado la calidad de los materiales que se dispusieron en la obra y la verificación con sus respectivos protocolos de calidad de los materiales suministrados.

3.2 CONCEPTO TECNICO DE CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Se ejecutaron los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de nuestro compromiso contractual, para ello se entregan las evidencias de cumplimiento a la fecha, reglamentos y normas, así como las pruebas, análisis e investigaciones de campo previstas en el proyecto. (Ver Anexos).

3.3 CONTROL A LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

A pesar de todas las problemáticas presentadas en el plazo del contrato como lo fue dificultades en el suministro de materiales pétreos y granulares en la región, condiciones climáticas adversas, etc., con el esfuerzo y compromiso por parte del contratista y la Interventoría, se ejecutaron las actividades sin pendientes de obras.

4 REGISTRO FOTOGRÁFICO










5 CONCUSIONES

- A la fecha de entrega de este informe parcial No 4 se ha ejecutado el 70%, correspondientes a las actividades ejecutadas y descritas anteriormente.

- Se ha tenido una correcta seguridad en obra tanto industrialmente como biológicamente al momento de hacer todas las tareas contratadas, teniendo a la fecha cero casos de accidentes presentados en obra.

- **ADMINISTRATIVO**
  - Revisión y control del personal del Contratista.
  - Revisión y control de equipo del Contratista.

- **TÉCNICO**
- Se realizó control en obra para verificación de cantidades ejecutadas y que se encuentren de acuerdo a las especificaciones técnicas de calidad.

- **FINANCIERO Y CONTABLE**
- A la fecha de corte se han presentado la documentación requerida por medio de la interventoría donde son los soportes e informes contables.

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2757 de 2023 **INTERVENTORÍA:** HERBY LUNA CRUZ

CONTRATO DE OBRA No. 2878 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | ABRIL | | |

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA Nº. 06
01 al 30 abril de 2024

6.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/05/2024 (DÍA/MES/AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2878 de 2023 — **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 — **PROYECTO:** PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONVENIO DE OBRA No.: 2757 de 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITÁ DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ

NOMBRE ARL: SURA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1–30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	YESID CAMILO RODRIGUEZ FONSECA	1049796832	RESIDENTE	$ 2.600.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	HERBY LUNA CRUZ	$ 2.600.000,00	$ 180.960	V	FAMISANAR	4538469928	$ 104.000	PORVENIR	4538469928	$ 416.000				
2	CESAR EDUARDO AVENDAÑO ZAMBRANO	1049795808	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.400.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50	HERBY LUNA CRUZ	$ 1.400.000,00	$ 97.440	V	FAMISANAR	4524375415	$ 175.000	PORVENIR	4524375415	$ 224.000				
N																				
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 15.400.000,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha MAYO 05 DE 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Firma
Nombre: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No. : 041-037-561808 SYC

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4197343
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			HERBY LUNA CRUZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 95	TELÉFONO:	7451263
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4538498928	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9997680733

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES VOLUNTARIOS COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
230301	230301-PORVENIR	2	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 0	$ 640.000
SUBTOTALES:										**$ 848.000**	**$ 0**	**$ 848.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:													**$ 212.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 212.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 229.300	$ 368.900	$ 0	$ 0	$ 368.900
SUBTOTALES:									**$ 368.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 368.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	2	$ 232.960	$ 0	$ 232.960
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 97.440	$ 0	$ 97.440
SUBTOTALES:			**$ 330.400**	**$ 0**	**$ 330.400**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANTE EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	COD	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	COD	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	COD	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: COD	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORT	SENA TOTAL APORT	ICBF TOTAL APORT	ESAP TOTAL APORT	MINED TOTAL APORT
1	CC 1016906617	LINA VANCANCIO ALEXANDR	30-Abr-24		$ 1.300.000	FIJO																		230201-PROTECCION	51	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS017-FAMISANAR	51	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	51	$ 1.300.000	$ 4197343	$ 90.000	1.300.000	COF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1049796832	RODRIGUEZ FONSECA YESID CAMILO	30-Abr-24		$ 2.600.000	FIJO			SI															230301-PORVENIR	51	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS037-NUEVA EPS	51	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$104.000	14-11 - ARL SURA	51	$ 2.600.000	$ 4197343	$180.960	2.600.000	COF24-COMPENSAR	$180.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4197343
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			HERBY LUNA CRUZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 95	TELÉFONO:	7451263
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4524375415	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996399999

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES VOLUNTARIOS COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-COLPENSIONES	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 224.000
SUBTOTALES:										$ 224.000	**$ 0**	$ 224.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 175.000
SUBTOTALES:													$ 175.000	**$ 0**	**$ 0**	$ 175.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 97.440	$ 97.440	$ 0	$ 0	$ 97.440
SUBTOTALES:									$ 97.440	**$ 0**	**$ 0**	$ 97.440

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANTE EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	COD	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	COD	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	COD	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: COD	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORT	SENA TOTAL APORT	ICBF TOTAL APORT	ESAP TOTAL APORT	MINED TOTAL APORT
1	CC 1049795808	CESAR EDUARDO AVENDAÑO ZAMBRANO	DEPENDIENTE		$ 1.400.000				NO															230301-COLPENSIONES	51	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS017-NUEVA EPS	51	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 0	$ 175.000	5-12 - ARL SURA	51	$ 1.400.000	$ 4197343	$ 97.440	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA Nº. 06
01 al 30 abril de 2024

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2878de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 2757 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATÁ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1016923	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Contrato principal	$ 67.954.000,00	$ 11.062.222,00
		C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	adicion	$ 13.962.722	
			TOTAL			$ 81.916.722	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 81.916.722,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	NOVIEMBRE	$ 10.670.000,00	$ -	$ 10.670.000,00	$ 0	$ 10.670.000,00		1016923	$ 71.246.722,00	$ 71.246.722,00		
2	DICIEMBRE	$ 23.152.500,00		$ 23.152.500,00		$ 23.152.500,00		1016923	$ 48.094.222,00	$ 48.094.222,00		
			$ -					1016923				
3	ENERO	$ 11.667.500,00	$ -	$ 11.667.500,00		$ 11.667.500,00		1016923 1016923	$ 36.426.722,00	$ 36.426.722,00		
4	FEBRERO	$ 13.336.500,00		$ 13.336.500,00		$ 13.336.500,00		1016923 1016923	$ 23.090.222,00	$ 23.090.222,00		
5	MARZO	$ 12.028.000,00		$ 12.028.000,00		$ 12.028.000		1016923 1016923	$ 11.062.222,00	$ 11.062.222,00		
6	ABRIL	$ 8.028.000,00		$ 8.028.000,00		$ 8.028.000,00		1016923 1016923	$ 3.034.222,00	$ 3.034.222,00		
	TOTALES	$ 78.882.500,00		$ 78.882.500,00	$ -	$ 70.854.500,00	$ 0		$ 3.034.222,00	$ 3.034.222,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Acta de costos No. 1	$ 10.670.000,00	$ -	$ 10.670.000,00
Acta de costos No. 2	$ 23.152.500,00	$ -	$ 23.152.500,00
Acta de costos No. 3	$ 11.667.500,00	$ -	$ 11.667.500,00
Acta de costos No. 4	$ 13.336.500,00	$ -	$ 13.336.500,00
Acta de costos No. 5	$ 12.028.000,00	$ -	$ 12.028.000,00
Acta de costos No. 6	$ 8.028.000,00		$ 8.028.000,00
VALOR TOTAL	$ 78.882.500,00	$ -	$ 78.882.500,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520242574 CND.

Firma
Nombre: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA Nº. 06

01 al 30 abril de 2024

6.4 Seguimiento a garantía contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2878 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 1/11/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 67.954.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 81.916.722,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.795.400,00	22	8	2023	10	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 13.590.800,00	22	8	2023	10	1	2027
Calidad del servicio	20%	$ 13.590.800,00	22	8	2023	10	1	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101154110

Certificado de modificación o anexo No.: 1
Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/09/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.191.672,20	1	11	2023	21	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 16.383.344,40	1	11	2023	22	7	2027
Calidad del servicio	20%	$ 16.383.344,40	1	11	2023	22	7	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101154110

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/09/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal - Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520242574 CND

Firma
Nombre: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101154110	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	03	2024	01	11	2023	00:00	22	07	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
LUNA CRUZ, HERBY		CC: 4.197.343	
DIRECCIÓN: CL 19 B81 B 45	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3123282602

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 2878 DE 2023
OBJETO: El objeto del contrato INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE Y GUAYATA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2023	21/07/2024	$8,191,672.20	$6,795,400.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/11/2023	22/07/2027	$16,383,344.40	$13,590,800.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/11/2023	22/07/2025	$16,383,344.40	$13,590,800.00

ACLARACIONES

CONTRATO ADICIONAL NUMERO 1746-01-2023 DE 2023 ADICION VALOR $13.962.722

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******37,287.00	$ *******8,000.00	$ *******8,604.00	$ **********53,891.00	$ *******40,958,361.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS L	235494	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-44-101154110

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101154110	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	03	2024	01	11	2023	00:00	22	07	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
LUNA CRUZ, HERBY	CC: 4.197.343

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 B81 B 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3123282602

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movi Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Efecty · Cobrodoro

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******37,287.00	$ *******8,000.00	$ *******8,604.00	$ **********53,891.00	$ *******40,958,361.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS L	235494	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100860698001 1(3900)000000053891(96)20250304

REFERENCIA PAGO: 1100860698001-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101154110	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	03	2024	01	11	2023	00:00	22	07	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
LUNA CRUZ, HERBY			CC: 4.197.343
DIRECCIÓN: CL 19 B81 B 45	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3123282602

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-44-101154110

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF235484A 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA Nº. 06
01 al 30 abril de 2024

6.5 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2878 de 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO :
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ

FECHA DE INICIO: 1/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 1/03/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 2757 de 2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ----------
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ----------
No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: .....
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: .....
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:
Para este proyecto No aplica esta actividad.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND

Firma NA
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.:041-037-0618068 BYC


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual.

• Seguimiento a la inversión del Anticipo:

Este contrato de interventoría no cuenta con anticipo

• Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado.

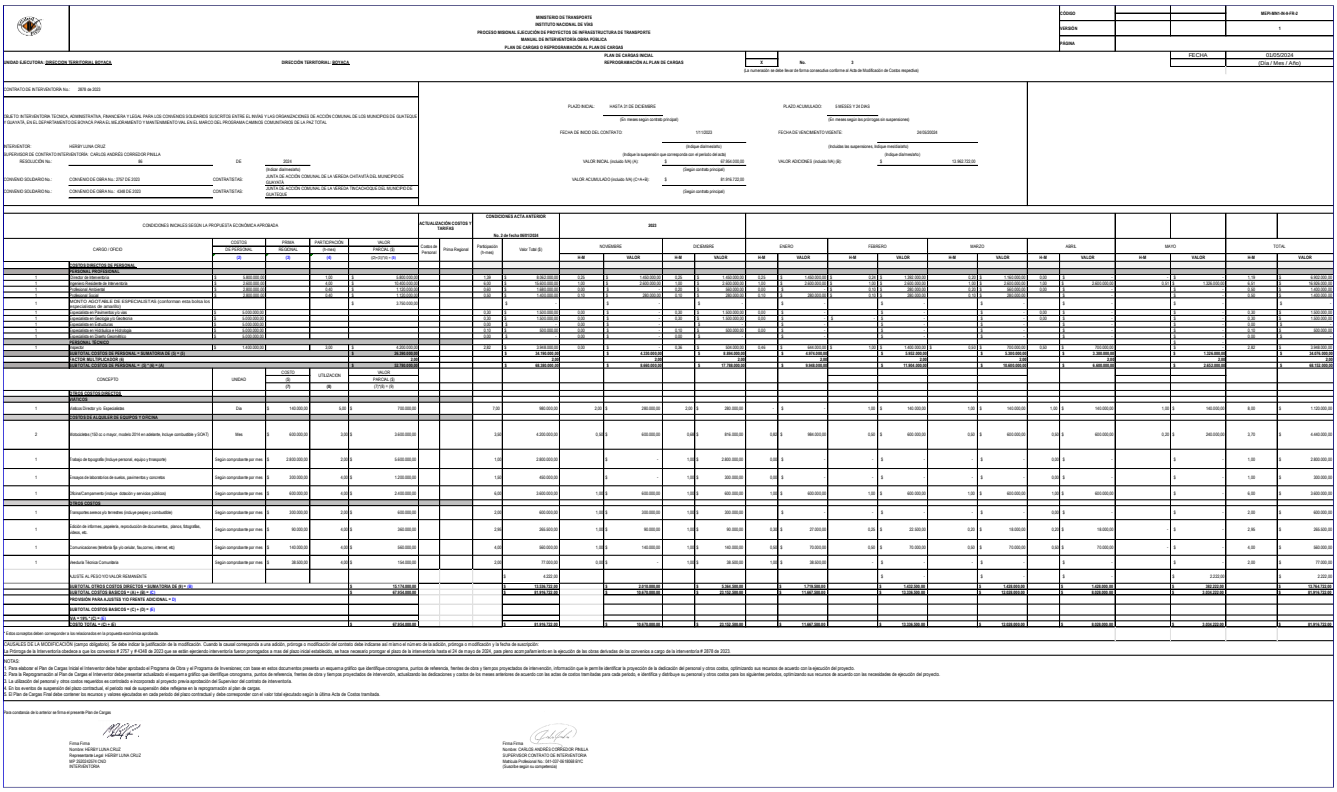

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO: M-DR-MAN-06-A-FR-2 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA | FECHA: 01/05/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL: X | REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS: No. 3 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2678 de 2022

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUATAQUI Y GUAYATA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
SUPERVISOR DE CONTRATO/INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA
RESOLUCIÓN No.: 86 DE: 2024 (Incluir dia/mes/año)
CONVENIO SOLIDARIO No.: CONVENIO DE OBRA No.: 2707 DE 2023 CONTRATISTA(S): JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUATAQUI
CONVENIO SOLIDARIO No.: CONVENIO DE OBRA No.: 4348 DE 2023 CONTRATISTA(S): JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TRICACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATAQUI

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 0 MESES Y 24 DIAS (En meses según las prórrogas con suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2023 (Incluye dia/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/05/2024 (Incluidas las suspensiones, incluye mes/dia/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 87.864.000,00 (Incluye la suspensión que corresponda con el periodo de ceb) (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13.962.722,00 (Incluye dia/mes/año) (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 87.816.722,00

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA

CARGO / CÓFICO	COSTOS (N) PROFESIONAL (J)	PRIMA REGIONAL (K)	PARTICIPACIÓN (H mes)	VALOR PARCIAL (M) (D+D*I/K + J)	Fecha de Parcial	Prima Regional	Participación (H mes)	Valor Total ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								
PERSONAL PROFESIONAL								
1 Director de Interventoría	$ 6.800.000,00		1,00	$ 6.800.000,00			1,28	$ 8.704.000,00
1 Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.600.000,00		4,00	$ 10.400.000,00			4,00	$ 10.400.000,00
1 Profesional Ambiental	$ 4.800.000,00		0,00	$ 1.600.000,00			0,00	$ 1.600.000,00
1 Profesional SST	$ 4.800.000,00		0,00	$ 1.600.000,00			0,00	$ 1.600.000,00
1 PERSONAL APOYO PARA LOS ESPECIALISTAS (cumplimiento este known los especialistas de ambiental)				$ 2.760.000,00				$ -
1 Topografo en Posthomitas (A) vias	$ 4.000.000,00			$ -			0,00	$ 1.600.000,00
1 Ayudante en Hidrologia y en Hidraulica	$ 4.000.000,00			$ -			0,00	$ 1.600.000,00
1 Topografo en Estructuras	$ 4.000.000,00			$ -			0,00	$ -
1 Ayudante de Hidrologia e Hidraulica	$ 4.000.000,00			$ 920.000,00			0,23	$ 920.000,00
1 Topografo en Cuerpo Geodesico	$ 4.000.000,00			$ -			0,00	$ -
PERSONAL TECNICO								
1 Inspector	$ 1.500.000,00		0,00	$ 4.000.000,00			2,00	$ 3.600.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (G+I+J)				$ 26.080.000,00				$ 34.704.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (4)				2,00				2,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (E) * (K) + (M)				$ 52.160.000,00				$ 69.408.000,00

CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (G)	UTILIZACIÓN (I)	VALOR PARCIAL (N) (I*(K + M))	Fecha de Parcial	Prima Regional	Participación (H mes)	Valor Total ($)
OTROS COSTOS DIRECTOS								
VIATICOS								
1 Asesor Director y/o Especialistas	Dia	$ 140.000,00	5,00	$ 700.000,00			7,00	$ 980.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								
2 Camionetas (1500 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y DOAT)	Mes	$ 600.000,00	2,00	$ 2.400.000,00			2,00	$ 4.200.000,00
1 Equipo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	Según corresponda por mes	$ 2.800.000,00	2,00	$ 5.600.000,00			1,00	$ 2.800.000,00
1 Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	Según corresponda por mes	$ 350.000,00	6,00	$ 1.200.000,00			1,00	$ 350.000,00
1 Alcoha/Cargamento (incluye distancia y servicios públicos)	Según corresponda por mes	$ 600.000,00	6,00	$ 2.400.000,00			6,00	$ 2.400.000,00
OTROS COSTOS								
1 Computos seleos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según corresponda por mes	$ 350.000,00	2,00	$ 600.000,00			2,00	$ 600.000,00
1 Alquiler de oficinas, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según corresponda por mes	$ 90.000,00	4,00	$ 360.000,00			2,96	$ 266.400,00
1 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según corresponda por mes	$ 140.000,00	4,00	$ 560.000,00			4,00	$ 560.000,00
1 Asesoría Técnica Consultoría	Según corresponda por mes	$ 38.500,00	4,00	$ 154.000,00			2,00	$ 77.000,00
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REDONDEO				$ 4.222,00				$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (E) + (N)				$ 13.356.722,00				$ 2.016.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)				$ 87.816.722,00				$ 93.676.722,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (O)								$ -
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (O) + (E)								$ 93.676.722,00
IVA = (19%) (O + E)								$ -
COSTO TOTAL = (S) + (E)				$ 87.816.722,00				$ 93.676.722,00

	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		TOTAL	
	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																			1,78	$ 3.562.722,00
																			0,51	$ 1.026.000,00
																			0,00	$ -
																			0,00	$ -
																			0,00	$ -
																			0,00	$ -
																			0,00	$ -
																			0,00	$ -
																			2,00	$ 3.600.000,00
																			34,00	$ 68.722.722,00

	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		TOTAL	
	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este periodo se adelantan varias gestiones y se dio inicio de obra en la vereda Chitavita del municipio de Guayata:

En la vereda Chitavita del municipio de Guayata convenio 2757 se han construido 100 metros del tramo 1 y 213 metros del tramo 2, al revisar el presupuesto se alcanzan a realizar 213 metros, se realizó el 100 %.

8. ANEXOS

✓ Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. Ver Anexo 19

✓ Registro fotográfico sectores a intervenir.

8.1 RELACION CORRESPONDENCIA.

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA						
FECHA DE ENVÌO	NÙMERO CONSECUTIVO	NÙMERO RADICADO	FECHA DE RADICACIÒN	ASUNTO:	QUIÈN LO DIRIGE:	DIRIGIDO A:
03/04/2024	GUAY-BOY-033-2024	GUAY-BOY-033-2024	03/04/2024	INFORME MENSUAL # 4 DE INTERVENTORIA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
03/04/2024	GUAY-BOY -034-2024	GUAY-BOY -034-2024	03/04/2024	INFORMACION TERMINACION DE OBRAS	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
11/04/2024	GUAY-BOY -035-2024	GUAY-BOY -035-2024	11/04/2024	PRORROGA Y ADICION CONTRATO DE INTERVENTORIA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
11/04/2024	GUAY-BOY -036-2024	GUAY-BOY -036-2024	11/04/2024	ACTA DE COSTOS # 5DE INTERVENTORIA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
15/04/2024	GUAY-BOY -037-2024	GUAY-BOY -037-2024	15/04/2024	AVANCE DE OBRA CONVENIO 4348	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
19/04/2024	GUAY-BOY -038-2024	GUAY-BOY -038-2024	19/04/2024	PROGRAMACION PLAN DE CARGAS	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
24/04/2024	GUAY-BOY -039-2024	GUAY-BOY -039-2024	24/04/2024	ATENCION OBSERVACIONES INFORME FEBRERO	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
30/04/2024	GUAY-BOY -040-2024	GUAY-BOY -040-2024	30/04/2024	PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS


CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA					
FECHA RECIBIDO	NUMERO CONSECUTIVO	ASUNTO:	QUIEN REMITE	QUIEN FIRMA	DIRIGIDO A:
01/04/2024	GUAY-BOY-041-2024	DISEÑO DE VALLA CONVENIO 4348	INVIAS	CARLOS BETANCOUR	HERBY LUNA CRUZ.
03/04/2024	GUAY-BOY-042-2024	SOLICITUD AVANCE CONVENIOS CAMINOS COMUNITARIOS	INVIAS	ANGELICA RUBIO	HERBY LUNA CRUZ.
08/04/2024	GUAY-BOY-043-2024	INFORME CONVENIOS SOLIDARIOS	INVIAS	ANGELICA RUBIO	HERBY LUNA CRUZ.
09/04/2024	GUAY-BOY-044-2024	INFORME CONTABILIDAD TINCACHOQUE	JAC TINCACHOQUE	DIANA RUIZ	HERBY LUNA CRUZ.
16/04/2024	GUAY-BOY-045-2024	SOLICITUD INFORMACION GASTOS PAGA	INVIAS	ANGELICA RUBIO	HERBY LUNA CRUZ.
17/04/2024	GUAY-BOY-046-2024	INFORME ENERO FIRMADO	INVIAS	ANGELICA RUBIO	HERBY LUNA CRUZ.
23/04/2024	GUAY-BOY-047-2024	SOLICITUD INFORMACION CONVENIOS	INVIAS	ANGELICA RUBIO	HERBY LUNA CRUZ.
29/04/2024	GUAY-BOY-048-2024	REUNION AMBIENTAL	INVIAS	PAULA MORENO	HERBY LUNA CRUZ.

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO








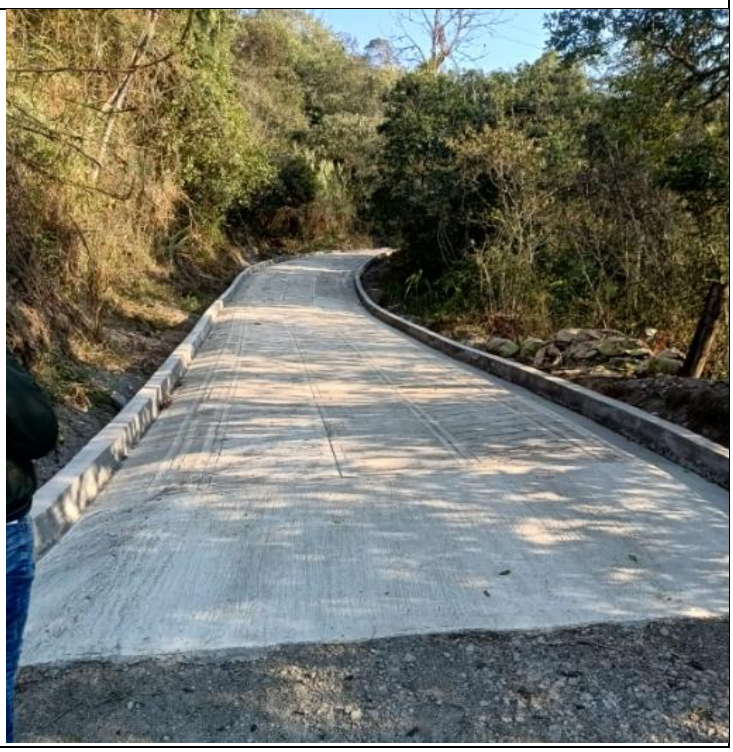

8.2 BITACORA

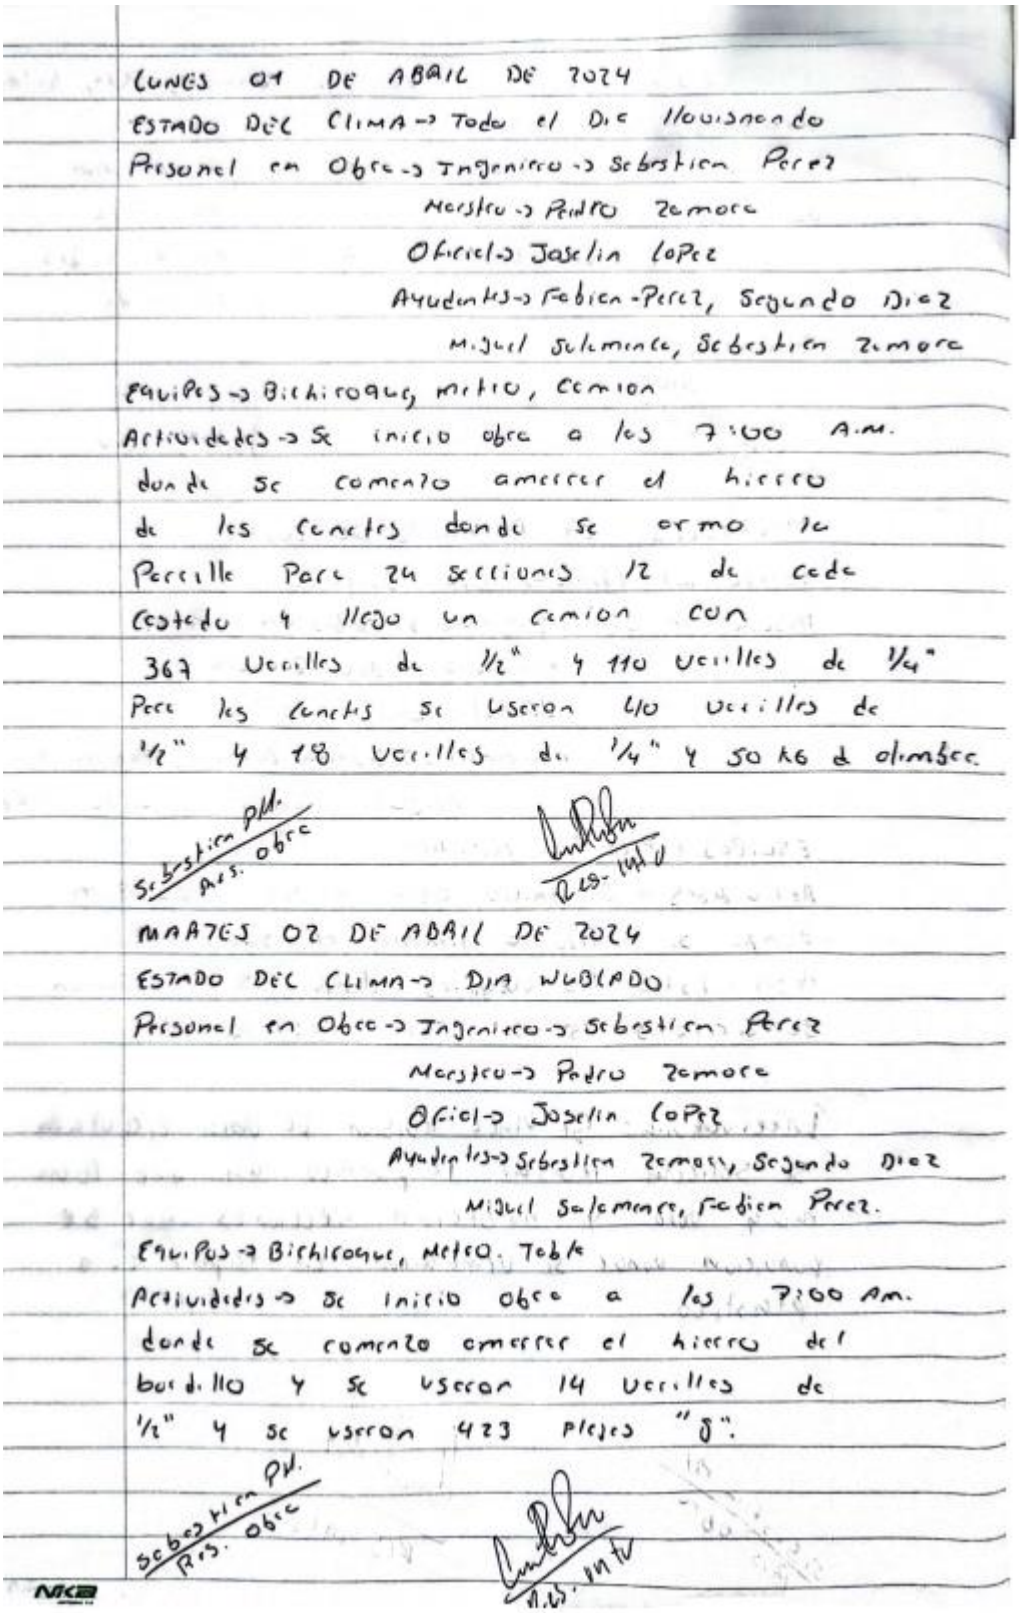

LUNES 01 DE ABRIL DE 2024
ESTADO DEL CLIMA -> Todo el Dia Nublado
Personal en Obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez
Maestro -> Pedro Zamora
Oficial -> Joselin Lopez
Ayudantes -> Fabian Perez, Segundo Diaz
Miguel Salamanca, Sebastian Zamora
Equipos -> Bichiroque, Mixto, Camion
Actividades -> Se inicio obra a las 7:00 A.M.
donde se comenzo amarrar el hierro
de los conectos donde se ormo la
Parrilla Para 24 secciones 12 de cada
costado y llego un camion con
367 Varillas de 1/2" y 110 Varillas de 1/4"
Para los conectos se usaron 110 Varillas de
1/2" y 18 Varillas de 1/4" y 50 kg de alambre.

Sebastian PM. Ans. Obra

DES. Int

MARTES 02 DE ABRIL DE 2024
ESTADO DEL CLIMA -> DIA NUBLADO
Personal en Obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez
Maestro -> Pedro Zamora
Oficial -> Joselin Lopez
Ayudantes -> Sebastian Zamora, Segundo Diaz
Miguel Salamanca, Fabian Perez.
Equipos -> Bichiroque, Mixto. Tabla
Actividades -> Se inicio obra a las 7:00 Am.
donde se comenzo amarrar el hierro del
bordillo y se usaron 14 Varillas de
1/2" y se usaron 423 Pliegos "J".

Sebastian PM. Ans. Obra

D.I. Int

MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2023
Estado del clima -> Dia Soleado
Personal en obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez
Maestro -> Pedro Zamora
Oficial -> Joselin Lopez
Ayudantes -> Sebastian Zamora, Fabian Perez
Miguel Salamanca, Segundo Diaz
Equipos -> Table, martillo, Mezcladora, vibrador de concreto, Pala, Palustre, boquillera
Actividades -> Se inicio obra a las 7:00 Am. donde llego un camion con 60 bultos de cemento y luego se inicio a instalar la tabla para Poder Fundir las cunetas dispues se comenzo a vaciar concreto y se fundieron 8 secciones de cuneta en Total y se usaron 70 bultos de cemento.

Interventoria: Se hace revision de obra ejecutada el cual se llevan 45 metros realizados sin bordillo y cuneta del tramo 2, se solicita revisar y tomar acciones para mejorar rendimiento

Sebastian PH. Pers. obra

Pers. Interv

JUEVES 04 DE ABRIL DE 2024
Estado del CLIMA -> DIA SOLEADO
Personal en obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez
Maestro -> Pedro Zamora
Oficial -> Joselin Lopez
Ayudantes -> Sebastian Zamora
Fabian Perez, Segundo Diaz
Miguel Salamanca

Equipos -> Mezcladora, vibrador de concreto, Pala
balde, Palustre, cepillo, Boquillera
Actividades -> Se inicio obra a las 7:00 A.M.
donde se comenzo a vaciar concreto en
los cuartos y se fundieron en total
16 secciones 12 por el costado derecho
y 4 por el costado izquierdo. en total
se usaron 71 bultos de cemento.

Sebastian PM. Obra

Ing. Inty

VIERNES 05 DE ABRIL DE 2024.
Estado del Clima -> Dia Nublado
Personal en obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez
Maestro -> Pedro Zamora
Oficial -> Joselin Cortez
Ayudantes -> Sebastian Zamora, Segundo Diez
Miguel Salamanca, Fabian Perez
Equipos -> Pichirogue, Malco, mezcladora, cepillo, Pala
vibrador de concreto, Boquillera, Palustre, Pisco
Actividades -> Se inicio obra a las 7:00 AM.
donde se comenzo amarrando el hierro de
la rampa del costado de arriba en
Varilla de 1/2" y luego se fundio despues
se amarraron 4 vigas los cuales se
usaron 16 varillas de 1/2" y 108
Flejes 15 x 20. Tambien se pego P.edra
Mason para el concreto ciclopeo, para la
Rampa se usaron 3 bultos de cemento

Sebastian PM. Obra

Ing. Inty

SABADO 06 DE ABRIL DE 2024

Estado del clima -> Todo el dia llovizando

Personal en Obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez

Maestro -> Pedro Zamora

Oficial -> Joselin Lopez

Ayudantes -> Sebastian Zamora, Segundo Diaz

Miguel Solemanes, Fabian Perez

Equipos -> Pica, Pala, Barra, Decametro, martillo.

Actividades -> Se inicio obra a las 7:00 a.m. donde se retiro la tabla de los cunetas fundidas y luego se trazo el eje central de la via donde se trazaron 30 metros.

Sebastian PH. Ing. Obra.

Res. Mtto

LUNES 08 DE ABRIL DE 2024

Estado del clima -> Dia Soleado

Personal en Obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez

Maestro -> Pedro Zamora

Oficial -> Joselin Lopez

Ayudantes -> Sebastian Zamora, Segundo Diaz


Miguel Solemanes, Fabian Perez

Equipos -> Tabla, Metro, Martillo

Actividades -> Se inicio obra a las 7:00 Am. donde se comienza a formaleteer el concreto ciclopeo central y de los orillos donde se forman 30 metros de cada uno Para dejar listo Para fundir el dia de mañana.

Sebastian PH. Res. Obra

Res. Mtto

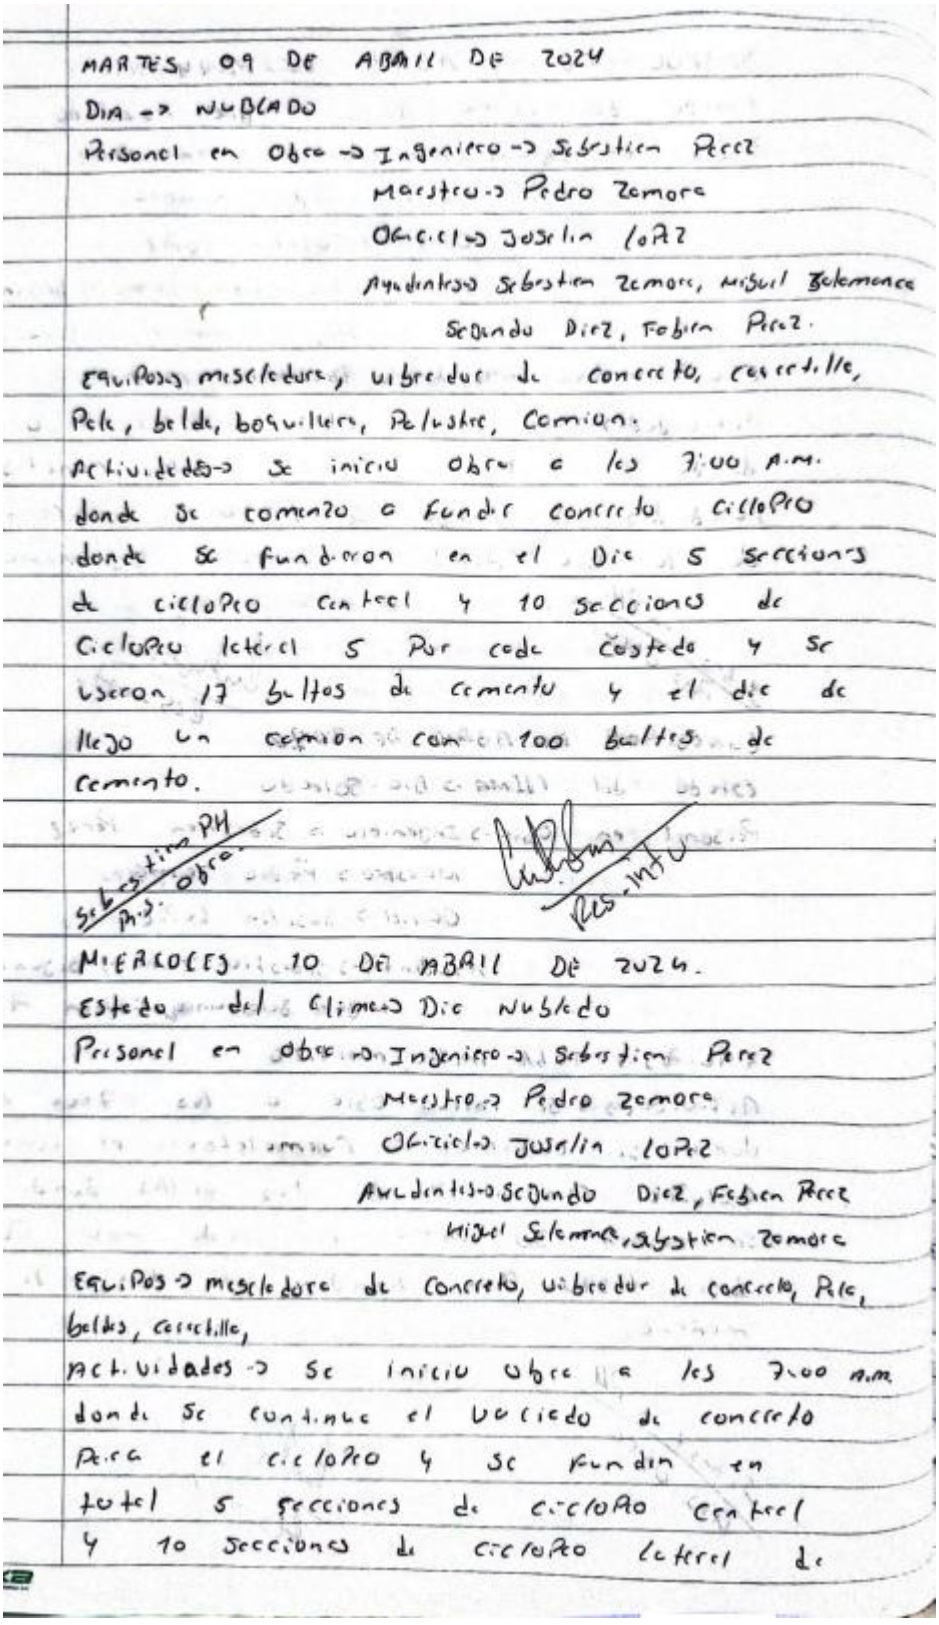

MARTES 09 DE ABRIL DE 2024
DIA -> NUBLADO
Personal en Obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez
Maestro -> Pedro Zamora
Oficiales -> Joselin Lopez
Ayudantes -> Sebastian Zamora, Miguel Salamanca
Segundo Diez, Fabian Perez.
Equipos -> mezcladora, vibradur de concreto, carretille,
Pala, balde, boquillera, Plastre, Camion.
Actividades -> Se inicio Obra a las 7:00 A.M.
donde se comenzo a fundir concreto ciclopeo
donde se fundieron en el Dia 5 secciones
de ciclopeo central y 10 secciones de
Ciclopeo lateral 5 Por cada costado y se
uscron 17 bultos de cemento y el dia de
llego un camion con 100 bultos de
cemento.

Sebastian PH
Ayud. Obra.

Ing. Inter

MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 2024.
Estado del Clima -> Dia Nublado
Personal en obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez
Maestro -> Pedro Zamora
Oficiales -> Joselin Lopez
Ayudantes -> Segundo Diez, Fabian Perez
Miguel Salamanca, Sebastian Zamora
Equipos -> mezcladora de concreto, vibradur de concreto, Pala,
baldes, carretille,
Actividades -> Se inicio obra a las 7:00 a.m.
donde se continue el vaciado de concreto
para el ciclopeo y se fundio en
total 5 secciones de ciclopeo central
y 10 secciones de ciclopeo lateral de

5 secciones por cada costado. Para este trabajo se usaron 17 bultos de cemento

Sebastian PH
Ais obra

Res. Inter

JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024
Estado del clima -> Dia soleado
Personal en obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez
Maestro -> Pedro Zamora
Oficial -> Joselin Lopez
Auxiliares -> Sebastian Zamora, Segundo Diaz
Miguel Salamanca, Fabian Perez.
Equipos -> Pica, Pala, barra, bichiroque, carretilla, balde
metro, Palco, mezcladora y ubicador de concreto.
Actividades -> Se inicio obra a las 7:00 Am.
donde se inicio quitando lodo de la viga y
limpiandola para luego se comenzo
amarrar hierro y haciendo excavacion de
vigas donde se excavaron para 4 vigas.
y se amarro el hierro para 8 secciones
de huellas las cuales se fundieron luego
y se usaron 27 bultos de cemento.

Sebastian PH
Ais. obra

Res Inter

VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024.
Estado del clima -> Dia soleado
Personal en obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez
Maestro -> Pedro Zamora
Oficial -> Joselin Lopez

Ayudantes -> Sebastian Zamora, Segundo Diaz
Fabian Perez, Miguel Solemnes.
Equipos -> Mezcladora, baldes, Pala, cucharilla, vibrador de concreto, boquillera, Polistes.
Actividades -> Se inicia obra a las 7:00 a.m. donde se comienza vaciando concreto para huellas y vigas para al final del dia fundir en total 10 secciones de huella y 5 vigas para usar un total de 34 bultos de cemento. en horas de la tarde llego el director de interventoria.

Interventoria: Se hace visita con director el cual se vuelve a solicitar rellenar el espacio entre el talud y bordillo del tramo 1, tambien en el tramo 2 se solicita rellenar el acceso a vivienda para que quede a nivel y recasar disposicion final de bolsas de cemento.

Res. Interv

Sebastian Zamora
Aux obra

SABADO 13 DE ABRIL DE 2024
Estado del clima -> Dia soleado
Presente en obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez
Maestro -> Pedro Zamora
Oficial -> Jaselin Lopez
Ayudantes -> Sebastian Zamora, Fabian Perez
Miguel Solemnes, Segundo Diaz
Equipos -> Pala, cucharilla, escoba.
Actividades -> Se inicia obra a las 7:00 A.M.

Donde se le hace la limpieza a la placa huella y se traslada Grevilla de la mitad de la placa huella por una via existente hacia la parte de abajo.

Sebastian PH. Res. obra

Res. Int

LUNES 15 DE ABRIL DE 2024.

Estado del clima → Dic soleado

Personal en obra → Ingeniero → Sebastian Perez

Maestro → Pedro Zamora,

Oficial → Joselin Lopez

Ayudantes → Miguel Salamanca. : : :

Equipos → Pica, Pala, carretilla, bichiqui, metro

Actividades → El dia de hoy se inicio obra a las 7:00 A.M. donde se excavaron para 4 vigas y luego se cimentaron las vigas para donde se acero se usaron 16 varillas de 1/2" y 84 Flejes 15*20. y se cimento hierro para 10 secciones donde se usaron 39 varillas de 1/2" y 141 varillas de 1/4"

Sebastian PH. Res. obra

Res. Int

MARTES 16 DE Abril de 2024.

Personal en obra → Ingeniero → Sebastian Perez

Maestro → Pedro Zamora

Oficial → Joselin Lopez

Ayudantes → Miguel Salamanca, segundo Diaz

Estado del clima → Dic soleado

Equipos → mezcladora, vibradora de concreto, Pala, balde, carretilla, boquillera, Polisotra,

Actividades → Se inicio obra a las 7:00 A.M donde

Se comienza a vaciar concreto y se fundio 8 secciones de muelles y 4 vigas para lo cual se usaron 77 bultos de cemento.

Sebastian PM. Res. Obra.

Residente

MIERCOLES 17 DE ABRIL DE 2024.

Estado del clima -> Dia Soleado

Personal en Obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez.

Maestro -> Pedro Zamora.

Of. civil -> Joselin Lopez

Ayudantes -> Miguel Salamanca, Segundo D.Z

Equipos. -> Pico, Pala, carretilla

Actividades -> el dia de hoy se inicio obra a las 7:00 A.M. donde se limpiaron 22 secciones de cuneta de a 11 secciones por cada costado.

Sebastian PM. Res. Obra.

Residente

JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024.

Estado del / Clima -> Dia con lluvias.

Personal en obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez

Maestro -> Pedro Zamora

Oficial -> Joselin Lopez

Ayudantes -> Fabian Perez, Segundo Diaz

Equipos -> Bichiroque, mixto, camion.

Actividades -> se inicio obra a las 7:00 AM. donde se comenzo emparejar el hierro de las 22 secciones que se limpiaron ayer para lo cual se usaron 36 varillas de 1/2" y 20 varillas de 1/4" en horas de la tarde llego un camion

Con 106 bultos de cemento. y se instalo la pta. Teble Pere los canales.

Sebastian Res. obra. Res. Int.

VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024.

Estado del Clima -> Dia Soleado

Personal en Obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez

Maestro -> Pedro Zamora

Oficial -> Joselin LOPEZ

Ayudantes -> Miguel Solamente, Segundo Diaz

Fabian Perez.

Equipos -> mezcladora de concreto, vibrador de concreto, Pala, baldes, carretilla, bogillera, Palustre.

Actividades -> Se inicio obra a las 7:00 A.m. donde se inicio vaciando concreto en los canales donde se fundieron 17 secciones de cuneta. Por el costado derecho se fundieron 13 y Por el izquierdo 4 secciones Para lo cual se usaron 76 bultos de cemento.

Sebastian pm Res. obra. Res. Int.

SABADO 20 DE ABRIL DE 2024

Estado del Clima -> Dia Soleado

Personal en Obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez

Maestro -> Pedro Zamora

Oficial -> Joselin LOPEZ

Ayudantes -> Fabian Perez, Miguel Solamente

Segundo Diaz

Equipos -> Mezcladora, vibrador de Concreto, Pala, baldes

Carretilla, bogillera, Palustre

Actividades -> Se inicio obra a las 7:00 A.m. donde se continua fundiendo cuneta Por el costado izquierdo donde se fundieron

9 secciones Por el costado izquierdo y se usaron 13 bultos de cemento y con esto se llegan a los 100 metros de placa. Pero se tiene Presupuesto Para mas metros.

Interventoria = Se hace recusion de obra ejecutada el cual se llevan los 100 metros del segundo tramo y aun queda material tramo 2 quedaria de 215 metros.

Res. intv

Sebastian PH. Res. obra

LUNES 22 DE ABRIL DE 2024.

ESTADO del clima -> Dia Soleado

Personal en obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez
Maestros Pedro Zamora
Of. civil -> Jasselin Lopez
Ayudantes -> Miguel Salamanca, Fabian Arce
Segundo Diaz.

Equipos -> Taslo, martillo, maseta, metro, birlastrace, alicates.

Actividades -> Se inicio obra a las 7:00 a.m. donde se comenzo a instalar la tabla Para la encofrada de bordillo donde se formaleteo 76 metros de ciclopeo Para los dos costados siendo de a 38 metros por el derecho y 36 metros Por el izquierdo

Sebastian PH Res. obra.

Res. intv

MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

Estado del clima -> Dia Soleado

Personal en Obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez
Maestro -> Pedro Zamora
Oficial -> Joselin Lopez
Ayudantes -> Miguel Salamanca, Segundo Diaz
Fabian Perez.

Equipos -> mezcladora, vibradores de concreto, Pala, baldes
Carretilla, Plastico.

Actividades -> se inicia obra a las 7:00 a.m. donde se comienza a hacer concreto para el bordillo donde ayer el dia se fundieron los 76 metros formaleteados el dia de ayer y se usaron 21 bultos de cemento.

Sebastian PH Res. Obra

Res. INTV

MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA -> Dia Soleado

Personal en Obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez
Maestro -> Pedro Zamora
Oficial -> Joselin Lopez
Ayudantes -> Sebastian Zamora, Segundo Diaz
Fabian Perez, Miguel Salamanca.

Equipos -> Pala, barra, Tabla, martillo, metro, Pichirrace, Alicates

Actividades -> Se inicio obra a las 7:00 a.m. donde se comienza a quitar la tabla del bordillo que se fundio ayer y se comienza a formaletear otro tramo de bordillo donde se formaletean 78 metros mas de bordillo de a 39 metros.

Sebastian PH Res. Obra

Res. INTV

JUEVES 25 DE ABRIL DE 2024.

Personal en obra-> Ingeniero-> Sebastian Perez

Maestro-> Pedro Zamora

Oficial-> Joselin Lopez

Ayudantes-> Segundo Diez, miguel Solemine

Sebastian Zamora, Fabian Perez

Estado del Clima-> Dic Soleado.

Equipos-> mezcladora, Pala, Barra, Pulidora, Palustre,

Carretilla, Vibrador de concreto, baldes

Actividades-> Se inicio Obra a las 7:00 A.m.

donde se comienza a vaciar concreto en el

Ciclopeo Pero a las 8:30 se nos daño el

Vibrador y toco llevarlo al Pueblo. el Final

del dia Se Pudo fundir y Se fundieron 78

mitros de a 39 Por Cada costado donde

Se usaron 23 bultos de Cemento. Sobre las

9:00 A.m. llega interventoria con Personal

del INVIAS.

VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

PERSONAL EN OBRA: Ingeniero: Sebastian Perez
Maestro: Pedro Zamora
Oficial: Joselin Lopez
Ayudantes: Sebastian Zamora, Miguel Colmenares
Fabian Perez, Segundo Diaz

EQUIPOS: Tobik, Martillo, Manguera, Mixer

Actividades: Se inicio Obra a las 7:00 a.m donde se retiro la tobik del bordillo fundido el dia de ayer y se comenzo a Formaleteal donde se formaleteo 24 metros mes por cada costado.

Sebastian Perez Ing. Obra

Roy Inter

SABADO 27 - DE ABRIL DE 2024.

Estado Del Clima: Dia con lluvias

Personal en Obra: Ingeniero: Sebastian Perez
Maestro: Pedro Zamora
Oficial: Joselin Lopez
Ayudantes: Sebastian Zamora, Segundo Diaz
Miguel Colmenares,

EQUIPOS: Cerrotible, Pala, Baldes, Boquillera, Pulmon
mezcladora

Actividades: Se inicio Obra a las 7:00 a.m donde se comenzo Vaciando Concreto Para los 48 metros lineales Bordillo que se dejaron Formaleteados el dia de ayer. Para lo cual se usaron 16 bultos de Cemento.

Sebastian Perez Ing. Obra

Roy Inter

LUNES 29 DE ABRIL DE 2024

Estado del Clima -> Todo el dia lloviznando

Personal en Obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez
maestro -> Pedro Zamora
Oficial -> Joselin Lopez
Ayudantes -> Sebastian Zamora, Segundo Diaz
Miguel Selemeque, Fabian Perez

Equipos -> Cedazillo, martillo, Tabla, machete, manguera.

Actividades -> Se inicio Obra a las 7:00 a.m.
donde se trasladó en cedazillo 3 metros de
Gravilla y 3 metros de Arena hasta la Pila
de obra y se formaleteando 3 Secciones
de ciclopeo central y 6 de los costados
y se corrigio una fuga de agua que
habia por debajo de la Pila hasta del
tramo

Sebastian PH Obra — Ing. Interv.

MARTES 30 DE ABRIL DE 2024

Estado del Clima -> Dia Soleado

Personal en Obra -> Ingeniero -> Sebastian Perez
Maestro -> Pedro Zamora
Oficial -> Joselin Lopez
Ayudantes -> Sebastian Zamora, Fabian Perez
Miguel Selemeque, Segundo Diaz

Equipos -> Machillo, martillo, Tabla, mezcladora de concreto,
cedazillo, Pala, Boquillera

Actividades -> De inicio Obra a las 7:00 A.M.
donde se comenzo resanando el bordillo, distanciado
Piedra y se fundieron 3 secciones de ciclopeo
central y 6 secciones de ciclopeo Lateral

Sebastian PH Aux. Obra — Ing. Interv.
