	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. Convenio 3836 de 2021; Convenio 3801 de 2021; Convenio 488 de 2023; Convenio 4727 de 2023; Convenio 3613 de 2023

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN AGUSTIN; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUNIN; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CRISTALINA DE BETANCOURT; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION PUERTO QUINCHANA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA FATIMA

Contrato de Interventoría No. 3783 DE 2023 **Interventor:** CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

Objeto Contrato de Obra:
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESPECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Registro de Horas de personal		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	- Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-BV2-FR-1 MEPI-MN-BV2-FR-2	
	- Seguimiento Programa de Obra		
	- Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-BV8-FR-1 MEPI-MN-BV8-FR-2	
	- Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-BV14-FR-1	
	- Actas de Reunión	MEPI-MN-BV14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos		
5.6	Información otros programas y aplicativos según obligaciones Contratos de Obra e Interventoría		
	- Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfica (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	- Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-BV3-FR-1 MEPI-MN-BV3-FR-2	
	- Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-BV3-FR-2	
	- Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-BV3-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Página 1

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Director Territorial

Convenio 3596 de 2023 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**.

Convenio 3991 de 2023 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**.

Convenio 4818 cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Convenio 4727 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Convenio 3413 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

.

CONTRATISTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PROGRESO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ANDES
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CRISTALINA DEL LOZADA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

INFORME MES DE ABRIL 2024

1 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

2.1 LOCALIZACIÓN 6

3. INFORMACIÓN CONVENIOS 7

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS 7

3.1.1 ASOJUNTAS 7

3.1.2 JUNIN 8

3.1.3 ESTRECHO OBANDO 8

3.1.4 PUERTO QUINCHANA 9

3.1.5 VILLA FATIMA 9

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 10

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 17

4.1 AVANCE DE OBRA 17

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 18

5.2.1 INFORME DE DIRECTOR, RESIDENTE Y INSPECTOR DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 11)19

5.2.2 INFORME AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO VER (ANEXO 12)19

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 19

6.2 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 19

6.2.1 ANEXO 11: REGISTRO FOTOGRÁFICO 19

6.2.2 ANEXO 12: APROBACION DE HOJAS DE VIDA, PROROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4576 DE 2023. 19

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 19

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INTERVENTORIA, CONTRATISTA DE OBRA Y INVIAS. 19

1. INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mediante oficio con radicado 2023S-VHUI-030866 entrega orden de inicio a partir del 22 de diciembre de 2023 al CONSORCIO R&C cuyo representante legal es CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO, para la ejecución de la OFERTA No.4762 DE 2023 el cual fue firmado el día 30 de noviembre de 2023, y cuenta con un plazo de ejecución inicial de tres (3) meses.

La vía objeto de las obras son muy necesarios para el Municipio de San Agustín - Isnos – del Departamento del Huila, ya que son corredores rurales productivos de vital importancia. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS – ha puesto su interés en las intervenciones necesarias con la finalidad de apoyar el desarrollo rural, garantizando la calidad y estabilidad de las obras diseñadas, aumentar la capacidad y nivel de servicio y brindarles comodidad y seguridad a los usuarios.

El objeto de dicho OFERTA No. 47626 DE 2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN E ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

El Consorcio R&C en calidad de Interventor, de los convenios: - Convenio 3596 de 2023 cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”** - Convenio 3991 de 2023 cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”** - Convenio 4818 cuyo objeto es “**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” -** Convenio 4727 cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL**

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - Convenio 3413 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, los cuales ejecutaran las juntas de acción comunal de las mencionadas veredas y que tiene como supervisor del proyecto al ingeniero WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR del Instituta Nacional de Vías – INVIAS, dando así a conocer el presente informe No 04 correspondiente al periodo del 1 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024, en el cual relacionamos el desarrollo y avance de las actividades programadas, a efecto de constatar el cumplimiento por parte de la juntas de Acción Comunal.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrollará en los municipios de San Agustín e Isnos del Departamento del Huila, con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios en el program "*Caminos Comunitarios de la Paz Total"*

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

San Agustín es un municipio colombiano ubicado en el sur del departamento de Huila. Hace parte de la región del Sur del Alto Magdalena, donde se encuentra el más alto valle del río Magdalena, resguardado por las primeras estribaciones de las cordilleras central y oriental. Yace sobre la parte oriental del macizo colombiano. Su extensión territorial es de 1.574 km², su altura es de 1.730 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 18 °C.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ISNOS

Isnos es un municipio colombiano ubicado en el suroccidente del departamento de Huila. Yace sobre la faja intertropical del mundo, en la cadena montañosa de la cordillera central, en el Sur del Alto Magdalena y sobre el Macizo Colombiano, considerado como la estrella fluvial más importante de Colombia que alberga gran parte de las riquezas en diversidad biológica y ecológica. Su extensión territorial es de 697 km², su altura es de 1.700 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 18 °C.



3. INFORMACIÓN CONVENIOS
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 ASOJUNTAS

Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN AGUSTIN
Representante legal:	YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO
Nit.	900.773.779-1
Convenio No.	3596 de 2023

Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor convenio:	$ 188.564.775
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 188.564.775
Plazo:	Hasta el 30 de julio de 2024
Fecha de inicio:	05 de diciembre de 2023

3.1.2 JUNIN

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA JUNIN
Representante legal:	VICTOR LOPEZ ORTIZ
Nit.	800.247.404-5
Convenio No.	3991 de 2023
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor convenio:	**$**189.449.501
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	**$**189.449.501
Plazo:	Hasta el 30 de julio de 2024
Fecha de inicio:	27 de diciembre de 2023

3.1.3 ESTRECHO OBANDO

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE ESTRECHO OBANDO
Representante legal:	JOSE DEMETRIO ANACONA BOLAÑO
Nit.	813.003.979-8
Convenio No.	4818 de 2023

Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor convenio:	$ 189.544.876
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.544.876
Plazo:	Hasta el 30 de julio de 2024
Fecha de inicio:	28 de diciembre de 2023

3.1.4 PUERTO QUINCHANA

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL INSPECCION PUERTO QUINCHANA
Representante legal:	HENRY MARTINEZ MARTINEZ
Nit.	891.103.553-7
Convenio No.	4727 de 2023
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor convenio:	$ 189.085.518
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.085.518
Plazo:	Hasta el 30 de julio de 2024
Fecha de inicio:	27 de diciembre de 2023

3.1.5 VILLA FATIMA

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA FATIMA
Representante legal:	OLMAN ANCIZAR SANCHEZ
Nit.	813.003.285-5
Convenio No.	3413 de 2023

Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor convenio:	$ 200.803.236
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.269.182
Plazo:	Hasta el 30 de julio de 2024
Fecha de inicio:	5 de diciembre de 2023

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades realizadas durante el presente periodo por la interventoría consistieron en comités presencial y virtual, visita a las veredas de Villa Fátima, Puerto Quinchana, Asojuntas del municipio de san Agustín y Bajo Junín del Municipio de Isnos.

ASOJUNTAS:

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 13 desde el 1 al 7 de abril del 2024:

- Se realiza comité operativo, cuyo objetivo principal es la verificación socialización y aprobación de las cotizaciones que se han presentado hasta el momento por parte de la junta de acción comunal.
- COMITE OPERATIVO 1 - 3596 - ASOJUNTAS - Donde se estipula los proveedores que se han aprobado para la ejecución del proyecto.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 14 desde el 8 al 14 de abril del 2024:

- Gestión con la JAC para cambio de firmas ante el banco de este modo poder iniciar con la compra de materiales, insumos y servicios ya aprobados.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 15 desde el 15 al 21 de abril del 2024:

- Se realizo comité virtual el día 18/04/2024 a las 11:00 AM con el objetivo de dar seguimiento a los contratos de prestación de servicios vigentes en el marco del convenio solidario.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 16 desde el 22 al 28 de abril del 2024:

- Se realizo prorroga de contrato N° 3596 de 2023.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 17 desde el 29 de abril al 5 de mayo del 2024:

- Supervisión y seguimiento a los contratos de prestación de servicios pertenecientes al convenio solidario.

VEREDA BAJO JUNIN:

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 13 desde el 1 al 7 de abril del 2024:

- Se realiza comité operativo, cuyo objetivo principal es la verificación socialización y aprobación de las cotizaciones que se han presentado hasta el momento por parte de la junta de acción comunal.
- COMITE OPERATIVO 1 - 3991 - BAJO JUNIN - Donde se estipula los proveedores que se han aprobado para la ejecución del proyecto.
- Socialización de personal presentado.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 15 desde el 15 al 21 de abril del 2024:

- Se realizo comité virtual el día 15/04/2024 a las 02:30 PM con el objetivo de dar seguimiento a los contratos de prestación de servicios vigentes en el marco del convenio solidario.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 16 desde el 22 al 28 de abril del 2024:

- Se realizo prorroga de contrato N° 3991 de 2023.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 17 desde el 29 de abril al 5 de mayo del 2024:

- Supervisión y seguimiento a los contratos de prestación de servicios y Revisión de Diseños pertenecientes al convenio solidario

VILLA FÁTIMA:

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 13 desde el 1 al 7 de abril del 2024:

- Se realiza comité operativo, cuyo objetivo principal es la verificación socialización y aprobación de las cotizaciones que se han presentado hasta el momento por parte de la junta de acción comunal.
- COMITE OPERATIVO 1 - 3413 - VILLA FATIMA - Donde se estipula los proveedores que se han aprobado para la ejecución del proyecto.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 14 desde el 8 al 14 de abril del 2024:

- Gestión con la JAC para cambio de firma ante el banco, con el fin de poder inscribir cuentas de proveedores.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 15 desde el 15 al 21 de abril del 2024:

- Se realizo comité virtual el día 17/04/2024 a las 9:30 AM con el objetivo de dar seguimiento a los contratos de prestación de servicios vigentes en el marco del convenio solidario.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 16 desde el 22 al 28 de abril del 2024:

- Se realizo prorroga de contrato N° 3413 de 2023.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 17 desde el 29 de abril al 5 de mayo del 2024:

- Supervisión y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario 3413 DE 2023.

PUERTO QUINCHANA:

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 13 desde el 1 al 7 de abril del 2024:

- Se realiza comité operativo, cuyo objetivo principal es la verificación socialización y aprobación de las cotizaciones que se han presentado hasta el momento por parte de la junta de acción comunal.
- Se emite oficio de verificación del personal presentado por la JAC.

- COMITE OPERATIVO 1 - 4727 - PUERTO QUINCHANA - Donde se estipula los proveedores que se han aprobado para la ejecución del proyecto.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 14 desde el 8 al 14 de abril del 2024:

- Gestión con el presidente y tesorero de la JAC para cambio de firmas ante el banco y poder iniciar con la compra de servicios y materiales ya aprobados.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 15 desde el 15 al 21 de abril del 2024:

- Se realizo comité virtual el día 16/04/2024 a las 8:00 AM con el objetivo de dar seguimiento a los contratos de prestación de servicios vigentes en el marco del convenio solidario.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 16 desde el 22 al 28 de abril del 2024:


- Se realizo prorroga de contrato N° 4727 de 2023.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 17 desde el 29 de abril al 5 de mayo del 2024:

- Supervisión y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario 4727 DE 2023.

Registro fotográfico:




ASOJUNTA

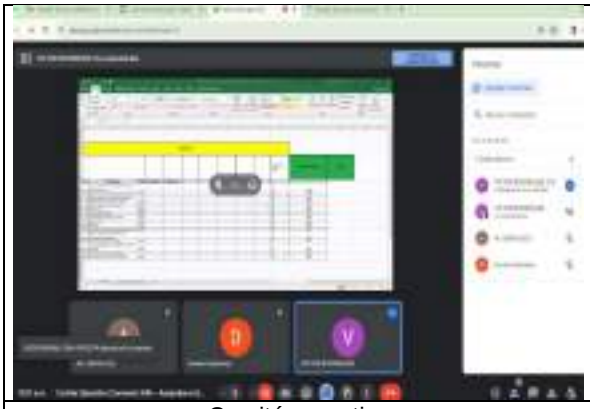	
Comité operativo	Comité virtual


	
Comité virtual	Prorroga
	
Supervisión	Seguimiento

BAJO JUNIN

	
Comité operativo	Comité virtual

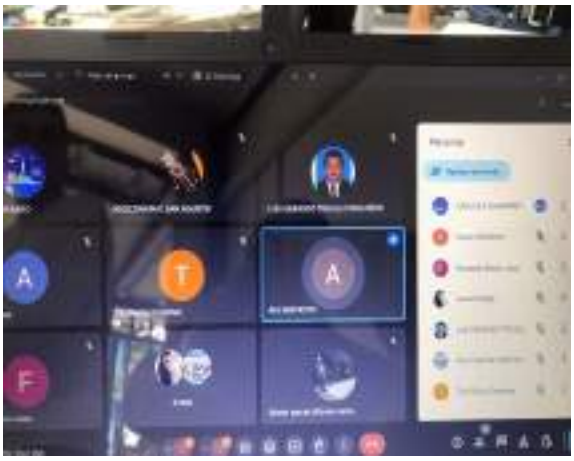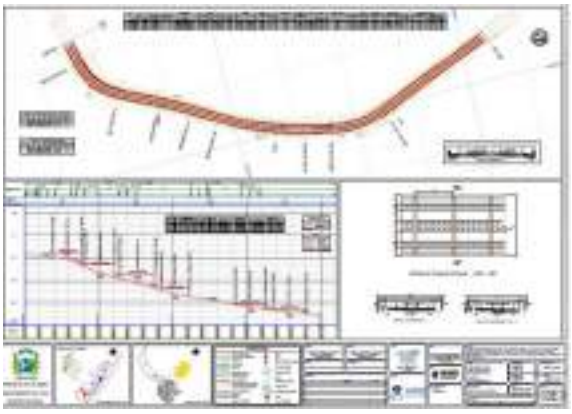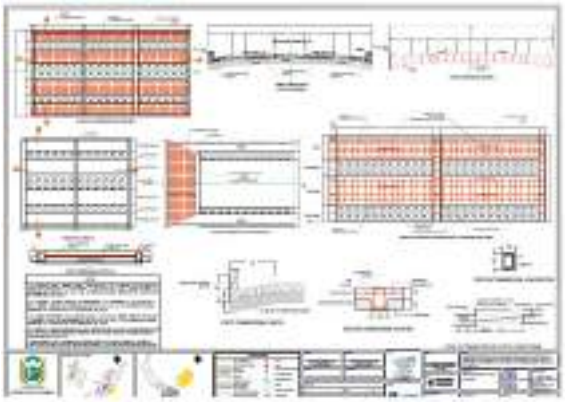
	
Comité virtual	Prorroga
	
Supervisión	Seguimiento

VILLA FATIMA

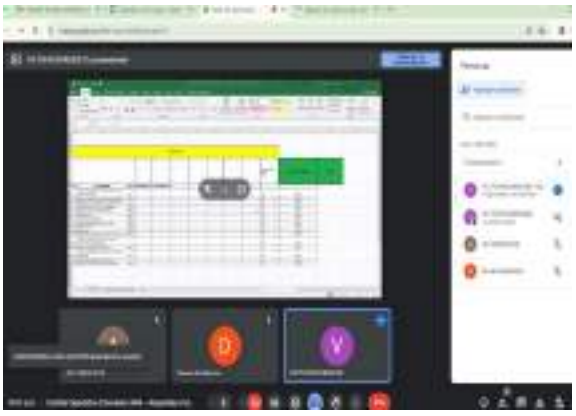	
Comité operativo	Comité operativo

	
Prorroga	**Supervisión**

PUERTO QUINCHANA

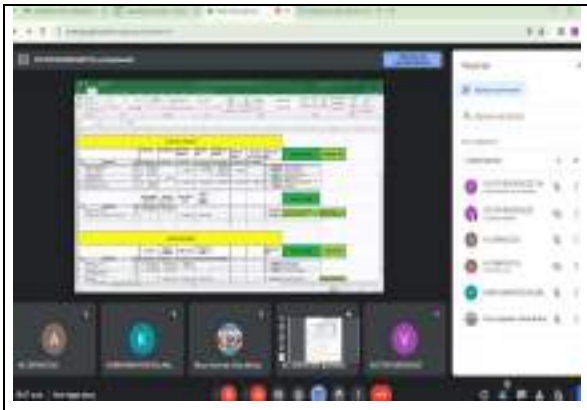	
Comité operativo	**Evaluación y verificación de personal**
	
Comité virtual	Comité virtual

	
Prorroga	Supervisión

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 AVANCE DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 1 de Abril del 2024 al 30 de Abril del 2024 las Juntas de acción comunal no han presentado su cronograma de obra hasta que se adelante los procesos de cambio de firma, balance de obra, cotizaciones y demás procesos para iniciar la construcción de las obras.

4.1.1. ANEXO 01: CRONOGRAMA DE OBRA
4.1.2. ANEXO 02 : INFORME SEMANAL (MEPI-MN-IN-15-FR-3)
4.1.3. ANEXO 03: MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-4).
4.1.4. ANEXO 04: PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-6).
4.1.5. ANEXO 05: INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-8).
4.1.6. ANEXO 06: ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (MEPI-MN1-IN-15-FR-10).
4.1.7. ANEXO 07: RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO (MEPI-MN1-IN-15-FR-11).
4.1.8. ANEXO 08: SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-12).
4.1.9. ANEXO 09: OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL
4.1.10. ANEXO 10: ACTA DE REUNIÓN (MEPI-MN-IN-14-FR-2)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTOR	**CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**
Nit	7.703.837
Dirección	Cra. 8 B No. 27- 32
Teléfono	3168747742
Contrato de Interventoría N.º	4762 de 2023
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN E ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Valor del contrato:	$ 75.007.262
Valor Adición	$0,00
Valor Acumulado del Contrato	$ 75.007.262
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Prorroga No.1:	Hasta el 30 Abril de 2024

Prorroga No.2:	Hasta el 30 Julio de 2024
Prorroga No.3:	Hasta el 30 Agosto de 2024

5.2. INFORMES ESPECIALISTA Y PROFESIONALES

5.2.1 INFORME DE DIRECTOR, RESIDENTE Y INSPECTOR DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 11)

5.2.2 INFORME AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO VER (ANEXO 12)

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.2 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.2.1 ANEXO 11: REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.2.2 ANEXO 12: APROBACION DE HOJAS DE VIDA, PROROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4576 DE 2023.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Realizar balance general de obra a cada una de las actividades a ejecutar dentro de los convenios.
- Inscripción de cuentas de los proveedores frente a bancos para agilizar los procesos de compra de materiales a utilizar para la construcción de las obras a realizar.
- Socialización y entrega de hojas de vida del personal que se dispondrá a ejecutar labores de profesionales, ayudantes y oficiales en los convenios
- Organizar y coordinar con el contador o personal idóneo las afiliaciones de los trabajadores a (salud, pensión y arl).

8 OTROS ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INTERVENTORIA, CONTRATISTA DE OBRA Y INVIAS.

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORIA				
FECHA DEL OFICIO	**NOMBRE ENTIDAD REMITENTE**	**CONSECUTIVO**	**NOMBRE DEL DESTINATARIO**	**ASUNTO**

3/04/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 019	OLMAN ANCIZAR SANCHEZ BUESAQUILLO Presidente Junta de acción comunal vereda villa Fátima	COMITÉ DE SOCIALIZACION, COTIZACIONES PRESENTADAS
3/04/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 020	YENSY GALINDEZ BURBANO Presidente	COMITÉ DE SOCIALIZACION, COTIZACIONES PRESENTADAS
3/04/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 021	VICTOR LOPEZ ORTIZ Presidente Junta vereda Bajo Junín	COMITÉ DE SOCIALIZACION, COTIZACIONES PRESENTADAS
3/04/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 022	HENRY MARTINEZ MARTINEZ Presidente Junta de acción comunal de la inspección Puerto Quinchana	COMITÉ DE SOCIALIZACION, COTIZACIONES PRESENTADAS
3/04/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 023	JOSE DEMETRIO PEREZ Presidente Junta Vereda Estrecho Obando	COMITÉ DE SOCIALIZACION, COTIZACIONES PRESENTADAS
22/04/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 031	WILDER SALAZAR CUELLAR Supervisor invias	ENTREGA DE INFORMES SEMANALES Y MENSUALES
28/04/2024	CONSORCIO R&C	INVIAS.HUI.INT - 037	WILDER SALAZAR CUELLAR Supervisor invias	SOLICITUD PRORROGA CONVENIOS

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA

NOMBRE ENTIDAD REMITENTE	RADICADO	FECHA (dd-mm-aa)	NOMBRE DEL DESTINATARIO	ASUNTO (Tema principal del oficio)
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA		5/04/2024	CONSORCIO R&C	ACTA DE VEEDURIA CONVENIO 4724 DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA		5/04/2024	CONSORCIO R&C	PRESENTACION ENSAYO PROCTOR CANTERA DE MULALES
JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA FATIMA		5/04/2024	CONSORCIO R&C	ENTREGA ENSAYO DEL PROCTOR CANTERA MULALES

DUVAN GUTIERREZ		16/04/2024	CONSORCIO R&C	COTIZACIONES DE LA VEREDA DE OBANDO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO JUNIN		25/04/2024	CONSORCIO R&C	COTIZACION VALLAS
JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO JUNIN	C-No 3991-2023 - OFI No 03	25/04/2024	CONSORCIO R&C	OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION
JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO JUNIN		26/04/2024	CONSORCIO R&C	SOLICITUD DE PRORROGA No. 02

Cordialmente,



CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 01:

CRONOGRAMA DE OBRA

LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL NO SE HAN PRESENTADO A LA INTERVENTORIA

ANEXO 02:

INFORME SEMANAL (MEPI-MN-IN-15-FR-3)

ASOJUNTAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/04/24

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 13 del 1/04/24 al 7/04/24 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3596 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 155 m

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
INTEGRANTES: YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO
CONTRATO No. 3596 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 188.564.775,00
FECHA DE INICIO: 5/12/23 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/23 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/24 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES: 50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No. 4762 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 75.007.262,00
FECHA DE INICIO: 22/12/23 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/23 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/24 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.564.775			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.007.262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 188.564.775,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 188.564.775,00 — 100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - — %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - — %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 75.007.262,00 — 100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 13 desde el 1 al 7 de abril del 2024:

- Se realiza comité operativo, cuyo objetivo principal es la verificación socializacion y aprobacion de las cotizaciones que se han presentado hasta el momento por parte de la junta de accion comunal.
* COMITE OPERATIVO 1 - 3596 - ASOJUNTAS - Donde se estipula los proveedores que se han aprobado para la ejecucion del proyceto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ OPERATIVO



COMITÉ OPERATIVO



COMPARATIVO COTIZACIONES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: informe mensual de interventoría. Anexo de Anexo de: [illegible]
Copias: Archivo Municipal, Archivo de Anexo [illegible], Archivador, interventoría y Usuario Anexo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/04/24

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 14 del 8/04/24 al 7/04/24 — Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3596 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 155 m

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN		
INTEGRANTES:	YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO		
CONTRATO No.	3596 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.564.775,00
FECHA DE INICIO:	5/12/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/23	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/24		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.007.262,00
FECHA DE INICIO:	22/12/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/23	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.564.775			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.007.262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 188.564.775,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 188.564.775,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.007.262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 13 desde el 1 al 7 de abril del 2024:

- Gestion con la JAC para cambio de firmas ante el banco de este modo poder iniciar con la compra de materiales, insumos y servicios ya aprobados.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ VIRTUAL



COMITÉ VIRTUAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: informe mensual de interventoría. Medios de medio de [illegible]
Magíster, Unidad Planeación, Dirección de Desarrollo Territorial, Interventoría y Vivienda Nacional

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 15 del 15/04/2024 al 21/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3596 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 155 m

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN	INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES:	YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO	INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No.	3596 DE 2023	CONTRATO No.	4762 DE 2023
FECHA DE INICIO:	5/12/2023	FECHA DE INICIO:	22/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024
VALOR INICIAL:	$ 188 564 775,00	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -	VALOR ACUMULADO:	$ -
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188 564 775			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 188 564 775,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 188 564 775,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 15 desde el 15 al 21 de abril del 2024:

- Se realizo comité virtual el dia 18/04/2024 a las 11:00 AM con el objetivo de dar seguimiento a los contratos de prestacion de servicios vigentes en el marco del convenio solidario.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ VIRTUAL



COMITÉ VIRTUAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 16 del 22/04/2024 al 28/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3596 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 155 m

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
INTEGRANTES: YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO
CONTRATO No. 3596 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 188 564 775,00
FECHA DE INICIO: 5/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES: 50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No. 4762 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188 564 775			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 188 564 775,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 188 564 775,00 — 100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - — %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - — %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 75 007 262,00 — 100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 16 desde el 22 al 28 de abril del 2024:

- Se realizo prorroga de contraro N° 3596 de 2023.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PRORROGA



SUPERVISION

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 17 del 29/04/2024 al 5/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3596 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 155 m

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN	INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES:	YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO	INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No.	3596 DE 2023	CONTRATO No.	4762 DE 2023
FECHA DE INICIO:	5/12/2023	FECHA DE INICIO:	22/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024
VALOR INICIAL:	$ 188 564 775,00	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -	VALOR ACUMULADO:	$ -
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188 564 775			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 188 564 775,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 188 564 775,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 17 desde el 29 de abril al 05 de Mayo del 2024:

- Supervision y seguimiento a los contratos de prestacion de servicios pertenecientes al convenio solidario.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SUPERVISION



SEGUIMIENTO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

BAJO JUNIN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/04/24

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 12 del 1/04/24 al 7/04/24. Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3991 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 161 m

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN
INTEGRANTES: VICTOR LOPEZ ORTIZ
CONTRATO No. 3991 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 189.449.501,00
FECHA DE INICIO: 27/12/23 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/23 VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/24 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES: 50% VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No. 4762 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 75.007.262,00
FECHA DE INICIO: 22/12/23 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/23 VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/24 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.449.501			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.007.262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 189.449.501,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 189.449.501,00 100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 75.007.262,00 100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 13 desde el 1 al 7 de abril del 2024:

- Se realiza comité operativo, cuyo objetivo principal es la verificación socializacion y aprobacion de las cotizaciones que se han presentado hasta el momento por parte de la junta de accion comunal.
* COMITE OPERATIVO 1 - 3991 - BAJO JUNIN - Donde se estipula los proveedores que se han aprobado para la ejecucion del proyceto.
* Socializacion de personal presentado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ OPERATIVO



COMITÉ OPERATIVO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: informe mensual de interventoría. Anexo de Anexo de: [illegible]
Copias: Archivo Ejecutor, Archivador de Anexo/Archivo, Interventoría y Supervisión Municipal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/04/24

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 14 del 8/04/24 al 14/04/24 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3991 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 161 m

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN
INTEGRANTES: VICTOR LOPEZ ORTIZ
CONTRATO No. 3991 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 189.449.501,00
FECHA DE INICIO: 27/12/23 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/23 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/24 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES: 50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No. 4762 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 75.007.262,00
FECHA DE INICIO: 22/12/23 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/23 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/24 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.449.501			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.007.262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 189.449.501,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 189.449.501,00 — 100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - — %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - — %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 75.007.262,00 — 100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI X NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ VIRTUAL



COMITÉ VIRTUAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: informe mensual de interventoría. Anexo de Anexo de: [illegible]
Copias: Anexo Técnico, Anexo de Anexo [illegible], Contratista, interventoría y Supervisor Municipal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 15 del 15/04/2024 al 21/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3991 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 161 m

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN	INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES:	VICTOR LOPEZ ORTIZ	INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No.	3991 DE 2023	CONTRATO No.	4762 DE 2023
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	FECHA DE INICIO:	22/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024
VALOR INICIAL:	$ 189 449 501,00	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -	VALOR ACUMULADO:	$ -
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 449 501			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 449 501,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 449 501,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 15 desde el 15 al 21 de abril del 2024:

- Se realizo comité virtual el dia 15/04/2024 a las 02:30 PM con el objetivo de dar seguimiento a los contratos de prestacion de servicios vigentes en el marco del convenio solidario.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ VIRTUAL



COMITÉ VIRTUAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 16 del 22/04/2024 al 28/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3991 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 161 m

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN		INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
INTEGRANTES:	VICTOR LOPEZ ORTIZ		INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
CONTRATO No.	3991 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 189 449 501,00	CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 449 501			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 449 501,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 449 501,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI X NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 16 desde el 22 al 28 de abril del 2024:

- Se realizo prorroga de contraro N° 3991 de 2023.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PRORROGA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 17 del 29/04/2024 al 5/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3991 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 161 m

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN	INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES:	VICTOR LOPEZ ORTIZ	INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No.	3991 DE 2023	CONTRATO No.	4762 DE 2023
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	FECHA DE INICIO:	22/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024
VALOR INICIAL:	$ 189 449 501,00	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -	VALOR ACUMULADO:	$ -
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 449 501			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 449 501,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 449 501,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 17 desde el 29 de abril al 05 de Mayo del 2024:

- Supervision y seguimiento a los contratos de prestacion de servicios y Revision de Diseños pertenecientes al convenio solidario .


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SUPERVISION



SEGUIMIENTO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VILLA FATIMA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/04/24

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 13 del 1/04/24 al 7/04/24 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3413 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 129 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA
INTEGRANTES: OLMAN ANCIZAR SANCHEZ BUESAQUILLO
CONTRATO No. 3413 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 189.269.182,00
FECHA DE INICIO: 5/12/23 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/23 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/24 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO R&C R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES: 50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No. 4762 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 75.007.262,00
FECHA DE INICIO: 22/12/23 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/23 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/24 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.269.182			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.007.262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 189.269.182,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 189.269.182,00 — 100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - — %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - — %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 75.007.262,00 — 100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI X NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 13 desde el 1 al 7 de abril del 2024:

- Se realiza comité operativo, cuyo objetivo principal es la verificación socializacion y aprobacion de las cotizaciones que se han presentado hasta el momento por parte de la junta de accion comunal.
* COMITE OPERATIVO 1 - 3413 - VILLA FATIMA - Donde se estipula los proveedores que se han aprobado para la ejecucion del proyceto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ OPERATIVO



COMITÉ OPERATIVO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: informe mensual de interventoría. Anexo de Anexo de: [illegible]
Copias: Anexo Técnico, Anexo de Anexo [illegible], Contratista, interventoría y Supervisor Contractual

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/24

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 14 del 8/04/24 al 14/04/24 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3413 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 129 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA		
INTEGRANTES:	OLMAN ANCIZAR SANCHEZ BUESAQUILLO		
CONTRATO No.	3413 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.269.182,00
FECHA DE INICIO:	5/12/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/23	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/24		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.007.262,00
FECHA DE INICIO:	22/12/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/23	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.269.182			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.007.262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.269.182,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189.269.182,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.007.262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 14 desde el 8 al 14 de abril del 2024:

- Gestion con la JAC para cambio de firma ante el banco, con el fin de poder inscribir cuentas de proveedores

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ VIRTUAL



COMITÉ VIRTUAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: informe mensual de interventoría. Anexo de Anexo de [illegible]
Magíster en Gestión Pública, Especialista en Revisoría Fiscal, Contaduría, Interventoría y Auditoría Financiera

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 15 del 15/04/2024 al 21/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3413 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 129 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA
INTEGRANTES:	OLMAN ANCIZAR SANCHEZ BUESAQUILLO
CONTRATO No.	3413 DE 2023
FECHA DE INICIO:	5/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024
VALOR INICIAL:	$ 189 269 182,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -
	$ -
	$ -
	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No.	4762 DE 2023
FECHA DE INICIO:	22/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024
VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 269 182			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 269 182,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 269 182,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A		
EMISIONES:	SI	NO X	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 15 desde el 15 al 21 de abril del 2024:

- Se realizo comité virtual el dia 17/04/2024 a las 9:30 AM con el objetivo de dar seguimiento a los contratos de prestacion de servicios vigentes en el marco del convenio solidario.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ VIRTUAL



COMITÉ VIRTUAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 16 del 22/04/2024 al 28/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3413 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 129 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA		
INTEGRANTES:	OLMAN ANCIZAR SANCHEZ BUESAQUILLO		
CONTRATO No.	3413 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189 269 182,00
FECHA DE INICIO:	5/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 269 182			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 269 182,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 269 182,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 16 desde el 22 al 28 de abril del 2024:

- Se realizo prorroga de contraro N° 3413 de 2023.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PRORROGA



SUPERVISION

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 17 del 29/04/2024 al 5/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 3413 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 129 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA
INTEGRANTES:	OLMAN ANCIZAR SANCHEZ BUESAQUILLO
CONTRATO No.	3413 DE 2023
FECHA DE INICIO:	5/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024
VALOR INICIAL:	$ 189 269 182,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -
	$ -
	$ -
	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C R.L. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No.	4762 DE 2023
FECHA DE INICIO:	22/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024
VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 269 182			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 269 182,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 269 182,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 17 desde el 29 de abril al 05 de Mayo del 2024:

- Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario 3413 DE 2023.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SUPERVISION



SEGUIMIENTO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PUERTO QUINCHANA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/04/24

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 13 del 1/04/24 al 7/04/24 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4727 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 135 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO QUINCHANA			INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
INTEGRANTES:	HENRY MARTINEZ MARTINEZ			INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4727 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.085.518,00	CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.007.262,00
FECHA DE INICIO:	27/12/23	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	22/12/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/23	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/23	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/24		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/24	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.085.518			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.007.262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.085.518,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189.085.518,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.007.262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños				
*				
*				
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 13 desde el 1 al 7 de abril del 2024:

- Se realiza comité operativo, cuyo objetivo principal es la verificación socializacion y aprobacion de las cotizaciones que se han presentado hasta el momento por parte de la junta de accion comunal.
- Se emite oficio de verificacion del personal presentado por la JAC.

* COMITE OPERATIVO 1 - 4727 - PUERTO QUINCHANA - Donde se estipula los proveedores que se han aprobado para la ejecucion del proyceto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ OPERATIVO



COMITÉ OPERATIVO



EVALUACION Y VERIFICACION PERSONAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/04/24

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 14 del 8/04/24 al 14/04/24 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4727 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 135 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO QUINCHANA	INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES:	HENRY MARTINEZ MARTINEZ	INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLEMRO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No.	4727 DE 2023	CONTRATO No.	4762 DE 2023
FECHA DE INICIO:	27/12/23	FECHA DE INICIO:	22/12/23
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/23	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/23
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/24	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/24
VALOR INICIAL:	$ 189.085.518,00	VALOR INICIAL:	$ 75.007.262,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -	VALOR ACUMULADO:	$ -
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.085.518			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.007.262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189.085.518,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189.085.518,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.007.262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI X NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 13 desde el 1 al 7 de abril del 2024:

- Gestion con presidente y tesorero de la JAC para cambio de firmas ante el banco y poder iniciar con la compra de servicios y materiales ya aprobados

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ VIRTUAL



COMITÉ VIRTUAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: informe mensual de interventoría. Anexo de Anexo de: [illegible]
Copias: Anexo Técnico, Documento de Anexo [illegible], Contratista, interventoría y Supervisor Anexo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 15 del 15/04/2024 al 21/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4727 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 135 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO QUINCHANA		
INTEGRANTES:	HENRY MARTINEZ MARTINEZ		
CONTRATO No.	4727 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189 085 518,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 085 518			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 085 518,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 085 518,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 15 desde el 15 al 21 de abril del 2024:

- Se realizo comité virtual el dia 16/04/2024 a las 8:00 AM con el objetivo de dar seguimiento a los contratos de prestacion de servicios vigentes en el marco del convenio solidario.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ VIRTUAL



COMITÉ VIRTUAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 16 del 22/04/2024 al 28/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4727 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 135 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO QUINCHANA
INTEGRANTES: HENRY MARTINEZ MARTINEZ
CONTRATO No. 4727 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 189 085 518,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTEGRANTES: 50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
CONTRATO No. 4762 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 085 518			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 189 085 518,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 189 085 518,00 — 100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - — %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - — %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) $ - — %

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 75 007 262,00 — 100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 16 desde el 22 al 28 de abril del 2024:

- Se realizo prorroga de contraro Nº 4727 de 2023.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PRORROGA



SUPERVISION

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 17 del 29/04/2024 al 5/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO No. 4727 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRAMO PLACA HUELA: Tramo 1 L= 135 m
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" TIPO I: 1 UND

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO QUINCHANA		
INTEGRANTES:	HENRY MARTINEZ MARTINEZ		
CONTRATO No.	4727 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189 085 518,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO R&C - CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
INTEGRANTES:	50% VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ Y 50% CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
CONTRATO No.	4762 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75 007 262,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189 085 518			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75 007 262			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 189 085 518,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189 085 518,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75 007 262,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 17 desde el 29 de abril al 05 de Mayo del 2024:

- Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario 4727 DE 2023.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervision y seguimiento a los trabajos de las actividades de mejoramiento del convenio solidario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SUPERVISION



SUPERVISION

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 03:

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-4)

NO SE TIENE INFORME DE MAQUINARIA Y EQUIPO YA QUE LAS OBRAS NO HAN INICIADO

ANEXO 04:

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-6)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓ	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4762 DE 2023

INTERVENTOR: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN E ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA: CONSORCIO R&C

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CONFAMILIAR HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	7.703.837	DIRECTOR INTER.	$ 5.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,30	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	$ 1.740.000	$ 69.600	V	SANITAS	9466123722	$ 69.600	COLPENSIONES	9466123722	$ 69.600				
2	JUAN DIEGO HERRERA	1.075.317.959	ING. RESIDENTE INTER.	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	$ 2.600.000	$ 104.000	V	SANITAS	9467688392	$ 104.000	COLPENSIONES	9467688392	$ 104.000				
3	IVAN FABRICIO SANDOVAL CAQRDOZO	7.722.915	INSPECTOR	$ 1.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	$ 1.200.000	$ 48.000	V	SANITAS	9467688392	$ 48.000	COLPENSIONES	9467688392	$ 48.000				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 9.600.000																																														

El Interventor adjunta la certificación de fecha 7/08/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Firma

Nombre: **WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR**
Supervisor de Contrato de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Car. 7 16 a 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8744488	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	668445338	9466123722	I	2024/05/10	2024/05/29	BANCO CAJA SOCIAL	19	$502,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA (1 Afiliados)																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$39,000		$0	$0		$495,000
Centro de Trabajo: NEIVA (1 Afiliados)																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$39,000		$0	$0		$495,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$39,000		$0	$0		$495,000
1	CC	7703837	CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES																	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	2.436%	$39,000	0	$0	$0	No	$495,000
Total	**Afiliados(1)**																					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$39,000		$0	$0		$495,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Car. 7 16 a 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8744488	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	668445338	9466123722	I	2024/05/10	2024/05/29	BANCO CAJA SOCIAL	19	$502,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$4,000	$0	$260,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$4,000	$0	$260,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$600	$0	$39,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$39,000	$600	$0	$39,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$3,100	$0	$203,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$3,100	$0	$203,100
TOTAL				**1**	**$495,000**	**$7,700**	**$0**	**$502,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 51 No 17C - 05	NEIVA-HUILA	8716627	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	661110528	9467688392	E	2024/05/10	2024/05/27	BANCO CAJA SOCIAL	17	$4,034,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA (10 Afiliados)																							**$12,173,335**	**$1,947,900**			**$13,573,335**	**$543,100**			**$13,573,335**	**$543,100**			**$13,573,335**		**$945,100**		**$0**	**$0**		**$3,979,200**
Centro de Trabajo: OBRA (10 Afiliados)																							**$12,173,335**	**$1,947,900**			**$13,573,335**	**$543,100**			**$13,573,335**	**$543,100**			**$13,573,335**		**$945,100**		**$0**	**$0**		**$3,979,200**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (10 Afiliados)																							**$12,173,335**	**$1,947,900**			**$13,573,335**	**$543,100**			**$13,573,335**	**$543,100**			**$13,573,335**		**$945,100**		**$0**	**$0**		**$3,979,200**
1	CC	1075230027	CALDERON CASTRO ELIANA CONSTANZA	X	X																230301	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF32	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	6.960%	$42,300	14	$0	$0	Si	$188,000
2	CC	26430875	CARDOSO MORENO CARMEN ELISA	X	X																230201	16	$800,000	$128,000	EPS005	16	$800,000	$32,000	CCF32	16	$800,000	$32,000	14-23	16	$800,000	6.960%	$55,700	16	$0	$0	Si	$247,700
3	CC	55166984	CASTRO VALENCIA MARTHA CECILIA	X	X																25-14	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF32	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
4	CC	12127735	CHAVARRO SANCHEZ ALVARO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	1075317959	HERRERA FIERRO JUAN DIEGO																		230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF32	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
6	CC	12099358	RAMIREZ VARGAS MANUEL ANTONIO	X	X																25-14	16	$800,000	$128,000	EPS005	16	$800,000	$32,000	CCF32	16	$800,000	$32,000	14-23	16	$800,000	6.960%	$55,700	16	$0	$0	Si	$247,700
7	CC	1121874315	SANDOVAL PACHON CRISTIAN DANILO																		230301	30	$3,900,000	$624,000	EPS037	30	$3,900,000	$156,000	CCF32	30	$3,900,000	$156,000	14-23	30	$3,900,000	6.960%	$271,500	30	$0	$0	Si	$1,207,500
8	CC	7722915	SANDOVAL CARDOZO IVAN FABRICIO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
9	CC	1075274422	SANDOVAL CARDOZO PAULA ANDREA	X	X																25-14	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF32	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
10	CC	4945986	TRUJILLO SALAZAR JAIME	X	X																	0	$0	$0	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF32	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$209,500
Total			**Afiliados(10)**																				$12,173,335	$1,947,900			$13,573,335	$543,100			$13,573,335	$543,100			$13,573,335		$945,100		$0	$0		$3,979,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 51 No 17C - 05	NEIVA-HUILA	8716627	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	661110528	9467688392	E	2024/05/10	2024/05/27	BANCO CAJA SOCIAL	17	$4,034,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,947,900	$26,800	$0	$1,974,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$682,800	$9,400	$0	$692,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,137,100	$15,600	$0	$1,152,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$128,000	$1,800	$0	$129,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$945,100	$13,000	$0	$958,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$945,100	$13,000	$0	$958,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$543,100	$7,500	$0	$550,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$543,100	$7,500	$0	$550,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$543,100	$7,600	$0	$550,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$336,300	$4,700	$0	$341,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$206,800	$2,900	$0	$209,700
TOTAL				10	$3,979,200	$54,900	$0	$4,034,100

ANEXO 05:

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-8)

ANEXO 06:

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (MEPI-MN-IN-15-FR-10)

ANEXO 07:

Resumen Ensayos de Laboratorio (MEPI-MN-IN-15-FR-11)

NO SE HAN REALIZADO ENSAYOS DE LA BORATORIOS YA QUE LAS OBRAS NO HAN INICIADO

ANEXO 08:

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-12).

SE SOLICITARON A LAS JAC PARA DILEGENCIAR EL PRESENTE FORMATO

ANEXO 09:

OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

ANEXO 10:

ACTA DE REUNION (MEPI-MN-IN-14-FR-2)

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 002	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 10/04/2024

Vereda – Municipio - Departamento: La Pradera – San Agustín - Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 3596 de 2023 – Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN AGUSTÍN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA
Ejecutor(es): JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
YENSY GALINDEZ	JAC ASOJUNTAS	PRESIDENTE
YOLANDA CHICANGANA	VEEDURIA	SECRETARIA
DUVAN GUTIERREZ	JAC ASOJUNTAS	ING RESIDENTE OBRA
ALBENIZ FORERO	JAC ASOJUNTAS	CONTADOR PUBLICO
CARLOS CHAVARRO	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA
IVAN SANDOVAL	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Revisión y aprobación de hojas de vida
2. Revisión y aprobación de cotizaciones presentadas

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Evaluación del personal propuesto por la Junta de Acción Comunal Ingeniero Residente, Contador Público y Maestro de Obra.

2- Revisión, socialización y aprobación de cotizaciones presentadas por la Junta de Acción Comunal, las cotizaciones a revisar con las siguientes:

- Cotizaciones para Estudio de suelos
- Cotizaciones para Topografía y Diseño geométrico
- Cotizaciones para Materiales de ferretería
- Cotizaciones para Transporte de Materiales de ferretería Cemento y Acero
- Cotizaciones de Agregados pétreos y transporte de agregados pétreos
- Cotizaciones de Alquiler de maquinaria

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar).*

Tema	Resumen
1.	La junta de acción comunal realizo envió por medio de correo electrónico a la interventoría, su revisión y aprobación, la interventoría manifiesta que efectivamente ya se realizó la revisión del personal propuesto para Ing. Residente, Contador público y Maestro de obra, y anexo a esta acta de comité operativo se relaciona la evaluación respectiva de cada personal concluyendo lo siguiente: Ing. Residente: ING. DUVAN SAID GUTIERREZ MORA C.C 80.812.098 Bogotá D.C. M.P. 25202-355117 CND 31/03/2017 Contador público: ALBENIZ ARMIDA FORERO ORDOÑEZ C.C 1.082.773.655 San Agustín Huila M.P. 189338-T Maestro de obra: JESUS MANUEL ANACONA JIMENEZ C.C 12.143.916 San Agustín Huila
2.	La junta de acción comunal realizó envío de las cotizaciones presentadas por cada actividad, de las cuales la interventoría realiza un comparativo el cual se socializa en este comité operativo. • Las cotizaciones presentadas para los estudios de suelos: Presentan dos cotizaciones: 1. INDISUELOS 2. YUVARSI THOLA M 3. MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS. La interventoría manifiesta que es necesario que con el laboratorio que se trabaje para los estudios de suelos también se trabaje para la realización de los ensayos de laboratorios que se requieren, por tal motivo es necesario que la JAC cotice los ensayos de laboratorio faltantes que se requieren. El Ing. Residente manifiesta que a nombre de la JAC va a solicitar cotización en especial al laboratorio que presentó la cotización más económica. • Las cotizaciones para Topografía y Diseño geométrico: Presenta tres cotizaciones: 1. PLANEACION Y PROYECTOS 2. D&D INGENIERIA

	3. SOLUCIONES INGENIERIA La interventoría manifiesta que de acuerdo a las cotizaciones presentadas todas están ofreciendo el mismo servicio, adicional de la topografía y el diseño geométrico realizan diseño estructural y materialización localización y replanteo, lo cual es importante pero no es muy necesario teniendo en cuenta que dentro de la cartilla guía de Colombia rural – invias se especifica las condiciones. • Las cotizaciones para Materiales de ferretería: Presenta ocho cotizaciones precios por unidad de medida unitaria: 1. PIMAR 2. TECHAR 3. LA BARATA FERRETERIA 4. FERRETERIA IDEAL Por parte de la JAC Ing. residente manifiesta que es necesario que los materiales que se adquieran sean de buena calidad de esta forma garantizar la obra, el presidente manifiesta que Teniendo en cuenta lo que sugiere el Ing. residente, ya que es conocido en la zona ya ha realizado obras en la zona lo cual se le da la confianza para du voz. De acuerdo con lo anterior la interventoría sugiere que se trabaje con los materiales más económicos teniendo en cuenta que en la ferretería donde se realice la compra ofrezcan todos los materiales que se necesitan. Dentro de las cotizaciones que se presentan dos empresas diferentes ofrecen el precio mas económico para cada material, se sugiere que los materiales que se compren sean en una sola empresa y que esta cumpla con las condiciones legales para realizar las compras. La interventoría manifiesta que de acuerdo al comparativo de las cotizaciones y teniendo en cuenta las condiciones de la zona la ferretería mas viable para la compra de los materiales es la ferretería ideal. • Las cotizaciones para Transporte de Materiales de ferretería Cemento y Acero: Para transporte de cemento presenta dos cotizaciones: 1. JOHN FREDDY RENZA JOAQUI 2. YOLIMA ERLINDA MUÑOZ BOLAÑOS Las cotizaciones especifican que el costo que ofrecen es por viaje de 200 bultos. Para transporte de acero presenta dos cotizaciones: 1. LIDIER ALBEIRO FERNANDEZ PEREZ 2. CRISTIAN DAVID ARGOTE Las cotizaciones especifican que es un solo viaje de acero de 3/8” • Las cotizaciones de Agregados pétreos y transporte de agregados pétreos: Presenta tres cotizaciones para la compra de materiales pétreos: 1. MINA FUEGO VERDE 2. PETREOS COLOMBIA 3. INDUCON

	4. DISMETRIC La interventoría manifiesta que donde se realice la compra de los materiales pétreos este debe tener licencia o certificación ambiental para la comercialización de este tipo de materiales. Por parte de la JAC Ing. Residente manifiesta que dentro de la zona esta situada una cantera la cual cuenta con un material tipo afirmado de muy buen comportamiento para que sea reemplazado por la Subbase granular tipo c que se exige dentro del presupuesto, pero que esta cantera no cuenta con ningún permiso para la explotación; la interventoría manifiesta que son directrices de que el material pétreo de playa que se compre este debe venir debidamente certificado ambientalmente para no tener problemas, de igual forma la JAC insiste en presentar una caracterización de ese material con el fin de ser evaluado. Presenta tres cotizaciones para el transporte de materiales pétreos: 1. PETREOS COLOMBIA 2. SEGUNDO SALAMANCA Por parte de la JAC Ing. Residente manifiesta que las cotizaciones de que se presentan, la cotización de Pétreos Colombia el precio que ofrece es un viaje de 14 m3. La interventoría manifiesta que en comparación con las tres cotizaciones pétreos Colombia es la mas viable ya que los viajes rinden muchos más y más económicos. • Cotizaciones para Alquiler de maquinaria: Presenta dos cotizaciones: 1. JOHN FREDDY RENZA JOAQUI 2. SEGUNDO SALAMANCA Las dos cotizaciones que se presentan ofrecen el mismo precio por hora trabajada.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	De acuerdo a la evaluación realizada al personal ofertado por la JAC, y teniendo en cuenta que postularon a una persona para Ing Residente de obra, una persona para Contador público y una persona para maestro de obra, todos cumple de acuerdo a las exigencias del anexo técnico dentro del convenio. Por lo tanto, el comité aprueba que para: Ing. Residente de obra: ING. DUVAN SAID GUTIERREZ MORA C.C 80.812.098 Bogotá D.C. M.P. 25202-355117 CND 31/03/2017

	Contador público: ALBENIZ ARMIDA FORERO ORDOÑEZ C.C 1.082.773.655 San Agustín Huila M.P. 189338-T Maestro de obra: JESUS MANUEL ANACONA JIMENEZ C.C 12.143.916 San Agustín Huila
2.	El comité operativo aprueba lo siguiente: • Se aprueba a el LABORATORIO INDISUELOS, obtiene voto positivo por parte del presidente y veedor, por mayoría de votos se concluye que se deja este laboratorio para realizar los estudios de suelos, de igual forma se deja la trazabilidad que hacen falta las cotizaciones para la realización de ensayos de laboratorio. Tanto el presidente como veeduría manifiestan que por ser la más económica y responsable, por lo tanto, la interventoría conociendo estas opiniones vota de manera positiva para que esta empresa realice los estudios de suelos. • Se aprueba a la empresa D&D INGENIERIA, obtiene voto positivo por parte del presidente y veedor, los cuales manifiestan que aparte de que es la cotización más económica, está ubicada en la misma zona y manifiestan que ya han realizado trabajos y son muy responsables, de acuerdo con esto la interventoría manifiesta que es la más viable debido a que ofrece un menos valor en comparación con las demás cotizaciones por tal motivo se vota positivamente por la empresa en mención. • Se aprueba y de acuerdo a lo socializado para la compra de material de ferretería la FERRETERIA IDEAL, ofrece los precios óptimos para que en esta se compre todos los materiales. Tanto el presidente como veeduría votan en positivo por esta ferretería, de igual forma la interventoría también vota en positivo debido a que esta ofrece todos los materiales para que la compra se haga en una sola ferretería. • Se aprueba al señor JOHN FREDDY RENZA JOAQUI para el transporte del Cemento, debido a que este ofrece la cotización más económica y además es de la zona, por lo tanto, el presidente, veedor e interventoría votan en positivo por el señor en mención. • Se aprueba al señor CRISTIAN DAVID ARGOTE para el transporte del Acero, ambas cotizaciones presentadas ofrecen el mismo precio y son personas de la zona, por

	lo tanto, el presidente, veedor votan en positivo por el señor en mención debido a que este fue el primero en presentar cotización, de igual forma la interventoría manifiesta que se tiene que tener en cuenta que las personas que se están presentando quedan aprobadas por mayoría de votos, pero se debe tener en cuenta que estas personas deben tener por lo menos RUT y Cuenta bancaria para poder ser contratadas por parte de la JAC. • Se concluye y de acuerdo a lo manifestado por la JAC se deja pendiente aun la empresa para la compra y el transporte de los materiales pétreos para otro comité operativo. • Se aprueba a el señor **JOHN FREDDY RENZA JOAQUI** para el alquiler de maquinaria pajarita, ambas cotizaciones presentadas ofrecen el mismo precio y son personas de la zona, por lo tanto, el presidente, veedor votan en positivo por el señor en mención debido a que este fue el primero en presentar cotización.
3.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Realizar los contratos pertinentes del personal aprobado: Ing. Residente de obra Contador publico Maestro de obra	JAC	Entre las semanas siguientes

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: **YENSY GALINDEZ**
Cargo: Presidente JAC

Nombre: **CARLOS ANDRES CHAVARRO**
Cargo: Interventoría

Nombre: **RUBER GIOVANI GUAMANGA QUINAYAS**
Cargo: Presidente veeduría ciudadana

Nombre: **IVAN SANDOVAL CARDOZO**
Cargo: Interventoría

Nombre: **DUVAN SAID GUTIERREZ**
Cargo: Ing. Residente JAC

Nombre: **ALBENIZ ARMIDA FORERO ORDOÑEZ**
Cargo: Contador público JAC

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3596 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

SUELO

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**INDISUELOS**	**YUVARSI**	**MECANICA DE SUELOS**	**DIFERENCIA**
		Unidad				
DENSIDAD	4	Unidad	$320,000.00	$400,000.00	$400,000.00	
RESISTENCIA A LA COMPRESION	4	Unidad	$320,000.00	$320,000.00	$320,000.00	
RELACION FR HUMEDAD	1	Unidad	$150,000.00	$150,000.00	$150,000.00	
APIQUE DE 1.50 MT DE PROFUNDIDAD	2	Unidad	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	
IVA					$ 336,300.00	
TOTAL			**$ 1,690,000.00**	**$ 1,770,000.00**	**$ 2,106,300.00**	-$ 80,000.00

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE		ANTICIPO
FORMA DE PAGO	50-50	50-50	50-50	435000
TIEMPO DE ENTREGA	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **10/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

INDISUELOS

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA	1
BASE	$1,690,000.00
IVA	$0.00
RETENCION 2.5% O 3.5%	NO APLICA
ANTICIPO	$435,000.00
PAGO 2	$1,255,000.00
TOTAL	$1,690,000.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

Yensy Galindez.
Presidente JAC

Interventoria

Pitalito 12 de Marzo de 2024

Señores:
Asociación municipal de juntas de acción comunal de san Agustín. "ASOJUNTAS"

REF: Cotización de apiques para placa huella en la vereda la pradera del municipio de san Agustín departamento Huila.

Cordial saludo

En atención a su solicitud, nos permitimos cotizar los ensayos en referencia.

En espera de que nuestra cotización sea de total satisfacción y poder colaborarles.

A continuación, presentaremos los precios unitarios de cada de uno de los ensayos solicitados.

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	APIQUES A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD EL INFORME FINAL CONSTA DE: CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES CBR INALTERADO, CBR SATURADO. RELACION HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO.	Und	2	$ 450.000	$ 900.000
2	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS.	Und	1	$ 20.000	$ 20.000

PLAZO OFERTA	20 DÍAS CALENDARIO
PAGO	50% ANTES DE LOS INICIOS DE LOS TRABAJOS DE LABORATORIO, 50% CUANDO SE ENTREGUE EL INFORME.

Dirección carrera 9 No 8a-51 Barrio San Antonio Pitalito Huila, teléfono 3188512281
Email: indisuelos@gmail.com

A continuación, presentamos nuestra propuesta económica para la ejecución del proyecto en referencia.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Diseño de concreto, Concreto Hidráulico Art. 630-22 INVIAS, para resistencias de 2000 PSI -2500 PSI-3000PSI	1	$ 520.000	$ 520.000
Densidad seca máxima in situ (densidad de campo - cono y arena). Norma INV- E -161(la empresa contratista deberá programar mínimo 3 densidades por visita.)	4	$ 100.000	$ 400.000
Resistencia a la compresión de especimenes cilindrico NORMA INVIAS - E- 630-22 (incluye toma en campo de 4 especimenes cilindricos, alquiler de equipo, transporte de muestras al laboratorio central, curado e informe final)	4	$ 80.000	$ 320.000
Ejecución de apique a una profundidad máxima de 1.5 m	1	$ 450.000	$ 450.000

EMAIL: yuvarsithola@hotmail.com
DIRECCION: CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA LOS LAGOS TORRE 1 APTO 301.TELEFONO: 8362780

YUVARSI THOLA M.

Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación) I.N.V.E 142	1	$ 150.000	$ 150.000
		TOTAL	**$ 1.840.000**

Son: **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.**

Ref.: **ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, PARA PLACA HUELLA EN LA VEREDA PRADERA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA.**

ITEM	DESCRIPCION	NORMA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Ensayos de control de calidad					
1	Diseño de concreto, Concreto Hidráulico, para resistencias de 2000 PSI -2500 PSI-3000PSI	INV - E - 630-22	1	$ 520.000	$ 520.000
2	Densidad seca máxima in situ (densidad de campo - cono y arena). (la empresa contratista deberá programar mínimo 3 densidades por visita.)	INV - E - 161	4	$ 100.000	$ 400.000
3	Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos (incluye toma en campo de 4 especímenes cilíndricos, alquiler de equipo, transporte de muestras al laboratorio central, curado e informe final)	INV - E - 630-22	4	$ 80.000	$ 320.000
4	Ejecución de apique a una profundidad máxima de 1.5 m		1	$ 450.000	$ 450.000
5	Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación) I.N.V.E 142	INV - E - 142	1	$ 150.000	$ 150.000
				SUBTOTAL	**$ 1.840.000**
				I.V.A (19%)	**$ 349.600**
				VALOR TOTAL	**$ 2.189.600**

SON: **DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS.M/cte.**

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3596 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

EXAMENES

			EMPRESAS	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**		**CALIDAD COLOMBIA**
Paquete de examenes medicos, valoracion médica osteomuscular, audiometría,	1	UND	$ 1.00	$ 64,000.00
TOTAL			**$ 1.00**	**$ 64,000.00**
TRANSPORTE			SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE
FORMA DE PAGO			CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA			1 DIA DE PROGRAMACION	1 DIA DE PROGRAMACION

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **10/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesoreso JAC	x	
Presidente JAC	x	
Interventoria	x	
Total Votos	3	

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE	$1.00
IVA	$0.00
SERVICIOS 4 %	$0.00
TOTAL A TRANSFERIR	$0.00

PROVEEDOR SELECCIONADO

CALIDAD COLOMBIA

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS | **Presidente JAC** | **Interventoria**

TARIFAS

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular, (ingreso, periódico o egreso)	$30.000
Visiometria	$17.000
Audiometría	$17.000
Colesterol	$10.000
Glicemia	$10.000
Triglicéridos	$10.000

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3596 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

TRANSPORTE POR VIAJES

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**LIDIER ALBEIRO FERNANDEZ**	**CRISTIN DAVID ARGOTE LASO**	**JHON FREDY RENZA**	**YOLIMA MUÑÑOZ BOLAÑOS**
Transporte de acero 3/8" de San Agustin a Vereda Pradera	1	Viaje	$ 250,000.00	$ 200,000.00		
Transporte de cemento (200 sacos) de San Agustin a Vereda Pradera					$ 200,000.00	$ 250,000.00
TOTAL			**$ 250,000.00**	**$ 200,000.00**	**$ 200,000.00**	**$ 250,000.00**

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	CON TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE
FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA				

	CANTIDAD	**UNIDAD**	**SEGUNDO SALAMANCA**	**PETREOS COLOMBIA**	**ENRRIQUE IBARRA**
DISTANCIA DE SAN AGUSTIN A PRADERA 14 KM - 12 KM PETREOS COLOMBIA A SAN AGUSTIN					
TRANSPORTE KM/M3	1	KM/M3	$ 1,600.00	$ 1,500.00	$ 1,600.00
TOTAL			**$ 1,600.00**	**$ 1,500.00**	**$ 1,600.00**
Precio a pradera	**26**	KM/M3	**$ 249,600.00**	**$ 546,000.00**	**$ 249,600.00**

FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA	1 dia	1 dia

Comité Operativo. **No:** **2**
Fecha Comité Operativo: **10/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

DISMETRIC PARA PREMEZCLADO Y PIEDRA CICLOPEO

BUENOS AIRES PARA SUB BASE

Firman en aprobación

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA PETREOS COLOMBIA

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA SEGUNDO SALAMANCA

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

Supervisor INVIAS

Presidente JAC

Interventoria

San Agustín, marzo 18 de 2024

COTIZACIÓN

Señores

ASOJUNTAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Pradera.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Pradera en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 160 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE ACERO A OBRA
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8	$ 250,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

LIDIER ALBEIRO FERNANDEZ PEREZ
C.C 12.239.650

San Agustín, marzo 18 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

ASOJUNTAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Pradera.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Pradera en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 160 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE ACERO A OBRA
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8	$ 200,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

Cristian Argote

CRISTIAN DAVID ARGOTE LASO
C.C 1.082.780.915

San Agustín, marzo 19 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

ASOJUNTAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Pradera.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Pradera en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 160 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE DE 200 SACOS DE CEMENTO A OBRA
VIAJE TRANSPORTE DE CEMENTO	$ 250,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

YOLIMA ERLINDA MUÑOZ BOLAÑOS
C.C 55.182.459
EMAIL: isabellarlams@hotmail.es

San Agustín, marzo 18 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

ASOJUNTAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Pradera.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Pradera en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 160 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE DE 200 SACOS DE CEMENTO A OBRA
VIAJE TRANSPORTE DE CEMENTO	$ 200,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

JHON FREDDY RENZA JOAQUI
C.C 83.041.729

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3596 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

DOTACION DEL PERSONAL

			EMPRESAS						
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**CONFE LIMARGLO**		**AGRO TEXTIL´S**		**DOTATEX**		**MAS ECONOMICO**
			Valor Unitario	**Valor total**	**Valor Unitario**	**Valor total**	**Valor**	**Valor total**	
Casco Industrial con certificación ansi con rache para obrero	7	$ 17,850.00	39,100	$ 273,700.00	$ 35,000.00	$ 245,000.00	$ 26,000.00	$ 182,000.00	
Bota en caucho punta de acero para obrero	7	$ 63,070.00	136,000	$ 952,000.00	$ 65,000.00	$ 455,000.00	$ 76,000.00	$ 532,000.00	
Gafa industrial unilente clara protectora	7	$ 6,545.00	7,650	$ 53,550.00	$ 9,000.00	$ 63,000.00	$ 6,000.00	$ 42,000.00	
Guante de Carnaza corto reforzado	14	$ 7,735.00	15,300	$ 214,200.00	$ 12,000.00	$ 168,000.00	$ 11,000.00	$ 154,000.00	
Guante vaqueta corto reforzado	14	$ 7,140.00	12,750	$ 178,500.00	$ 12,000.00	$ 168,000.00		$ -	
Peto Carnaza	5	$ 26,180.00	38,250	$ 191,250.00	$ 25,000.00	$ 125,000.00		$ -	
Careta para guadañar	2	$ 30,345.00	38,250	$ 76,500.00	$ 55,000.00	$ 110,000.00	$ 37,000.00	$ 74,000.00	
Tapaoidos de inserción siliconado	14	$ 2,975.00	4,250	$ 59,500.00	$ 6,000.00	$ 84,000.00	$ 4,000.00	$ 56,000.00	
Botiquin Tipo A	1	$ 70,000.00	200,600	$ 200,600.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00		$ -	
Uniforme personalizado	7	$ 140,000.00	170,000	$ 1,190,000.00	$ 160,000.00	$ 1,120,000.00	$ 135,000.00	$ 945,000.00	
Tela polipropileno para cerramiento H=2,00 M	30	$ 6,700.00		$ -		$ -		$ -	
Plástico negro Cal. 6 ancho 4m para cubrimiento de	40	$ 7,200.00		$ -		$ -		$ -	
Cinta de demarcación L=500 M	2	$ 47,000.00		$ -		$ -	$ 37,000.00	$ 74,000.00	
Cono de señalización en Plástico h=70 cm reforzado	2	$ 50,000.00		$ -		$ -	$ 47,000.00	$ 94,000.00	
Paleta de señalización PARE-SIGA	2	$ 30,000.00		$ -		$ -	$ 27,000.00	$ 54,000.00	
Caneca Plástica 55 gal para residuos	3	$ 70,000.00		$ -		$ -	$ 67,000.00	$ 201,000.00	
				$ 3,389,800.00		**$ 2,578,000.00**		**$ 2,408,000.00**	**$ 2,408,000.00**

TRANSPORTE		SIN TRANSPORTE		SIN TRANSPORTE		
FORMA DE PAGO	100%	CONTADO ANTICIPADO	100%	CONTADO ANTICIPADO	100%	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA		2 DIA DE PROGRAMACION		2 DIA DE PROGRAMACION		2 DIA DE

Comité Operativo. **No:** **2**
Fecha Comité Operativo: **10/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

CONFE LIMARGLO

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE	$2,408,000.00
IVA	$0.00
RETENCION 2.5% O 3.5%	NO APLICA
TOTAL A TRANSFERIR	$2,408,000.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS **Presidente JAC** **Interventoria**

CONFE LIMARGLO
EQUIPOS DE OFICINA
CELS: 321-787 5427 - 313-488 4701
CARRERA 10 No. 12-25 BARRIO SAN ANTONIO PITALITO H.

SUMINISTROS PARA
COLEGIOS Y HOSPITALES
FABRICA DE DOTACIONES PARA TODA
CLASE DE EMPRESAS
VENTA DE COMPUTADORES
Y REPUESTOS PARA LOS MISMOS

GLORIA MARLENY MUÑOZ GOMEZ NIT: 36.125.103-9
REGIMEN SIMPLIFICADO

PROPUESTA

CLIENTE: ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN AGUSTÍN
NIT: 900.773.779-1 **CIUDAD:** SAN AGUSTIN HUILA **FECHA:** 25-03-2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito extenderles mi más sincero saludo deseándoles muchos éxitos en sus labores, y a su vez poniendo en disposición los Servicios de CONFELIMARGLO, para ofrecerle suministros que puedan apoyar su trabajo:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CASCO TIPO I DIELCTRICO	7	$ 39.100	$ 273.700
2	BOTA PVC SEGURIDAD CAÑA ALTA TALLA 37, 38, 39, 49, 40, 41, 42, 43 TALLA 44, 45 TIENEN COSTO ADICIONAL	7	$ 136.000	$ 952.000
3	GAFA REF 818 CLARA	7	$ 7.650	$ 53.550
4	GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO EN VAQUETA		$ 15.300	$ 214.200
5	GUANTE VAQUETA CORTO REFORZADO EN VAQUETA		$ 12.750	$ 178.500
6	DELANTAL CARNAZA MEDIANO	5	$ 38.250	$ 191.250
7	CARETA PARA GUADAÑAR MALLA METALICA	2	$ 38.250	$ 76.500
8	TAPAOIDO INSERCIOON SILICONA		$ 4.250	$ 59.500
9	BOTIQUIN MORRAL DOTADO	1	$ 200.600	$ 200.600
10	UNIFORMA INVIAS LINOFLEX DOS PIEZAS, CINTA REFLECTIVA Y ESTAMPADOS TALLA S, M, L, XL TALLA 2XL, 3XL, 4XL, 5XL TIENEN COSTO ADICIONAL	7	$ 170.000	$ 1.190.000
TOTAL				**$ 3.389.800**

Atentamente:

Gloria Marleny Muñoz G.

GLORIA MARLENY MUÑOZ GOMEZ
CC. 36.125.103

DOTACIONES INDUSTRIALES

AGRO TEXTHIL'S Pitalito

SEÑOR;
ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION
COMUNAL SAN AGUSTIN
NIT: 9007737791

Cordial saludo.

Atendiendo la invitación realizada nos permitimos presentar cotización de la siguiente dotación

CANTIDAD	DETALLE	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	OVEROL DE DOS PIEZAS EN LINO FLEX CON ESTAMPADOS EN ESPALDA Y BOLSILLO CINTAS REFLECTIVAS EN PANTALON Y CAMISA RESPECTIVAMENTE	$160.000	$1.120.000
5	PETO EN CARNAZA	$25.000	$125.000
7	BOTA PLASTICA CON PUNTA DE ACERO	$65.000	$455.000
7	CASCO	$35.00	$245.000
7	LENTE TRANSPARENTE Y OSCURO	$9.000	$63.000
14	GUANTE EN CARNAZA	$12.000	$168.000
14	GUANTE EN VAQUETA CORTO REFORZADO	$12.000	$168.000
2	CARETA PARA GUADAÑAR	$55.000	$110.000
14	TAPA OIDO DE INSERCION SILICONADO	$6000	$84.000
1	BOTIQUIN TIPO A	$40.000	$40.000

VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS
FORMA DE PAGO; CONTADO

Atentamente,

MIREYA ZARATE
Gerente

PITALITO, 02-04-2024

SEÑOR
ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
NIT 900773779 - 1
SAN AGUSTIN

DOTATEX
protege sobre todo

COTIZACION

Atendiendo a su solicitud cotizo los siguientes productos:

ITEM	DESCRIPCION	UND MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caco de seguridad con ratche	UND	1	$ 26.000	$ 26.000
2	Bota en caucho en puntera de seguriad ROBUSTA	PAR	1	$ 76.000	$ 76.000
3	Gafa de proteccion lente claro y oscuro en policarbonato	UND	1	$ 6.000	$ 6.000
4	Guante tipo ingeniero reforzado corto	PAR	1	$ 11.000	$ 11.000
5	Careta para guadañar en malla	UND	1	$ 37.000	$ 37.000
6	Protector auditivo de insercion en silicona con cordon y estuche	UND	1	$ 4.000	$ 4.000
7	Traje en tela antifluido de lafayette	UND	1	$ 135.000	$ 135.000
8	Cinta señalizacion peligro rollo X 500 metros	UND	1	$ 37.000	$ 37.000
9	Paleta de señalizacion PARE/ SIGA	UND	1	$ 27.000	$ 27.000
10	Cono de selalizacion base negra con cinta reflectiva x 45 cm	UND	1	$ 47.000	$ 47.000
11	Papelera vaiven de 55 litros (negra y roja)	UND	1	$ 67.000	$ 67.000

Validez de la oferta: 30 dias calendario a apartir de la fecha de solicitud

Atentamente,

LUIS ALBERTO MEDINA PASCUAS
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 10 No 3 - 04 MÓVIL. 310 257 2285
www.dotatex.com / dotatex@gmail.com
PITALITO, HUILA

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3596 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

MAQUINARIA

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SEGUNDO SALAMANCA**	**JHON RENZA**	**AGROMAQ**	**JESUS ANACONA**
MOTONIVELADORA	1	HORAS	$ 140,000.00			
RETROEXCAVADORA	1	HORAS	$ 120,000.00	$ 120,000.00		
VIBRO COMPACTADOR	1	HORAS				
TRANSPORTE VIBRO	1	GLOBAL				
MEZCLADORA 1 BULTO	1	DIA			$ 50,000.00	$ 50,000.00
BASE			**$ 260,000.00**	**$ 120,000.00**	**$ 50,000.00**	**$ 50,000.00**
IVA			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL			**$ 260,000.00**	**$ 120,000.00**	**$ 50,000.00**	**$ 50,000.00**

TRANSPORTE	Transporte vibro 100%			
FORMA DE PAGO	100% transp vibro, 50% alqui	50% anticipo	50% anticipo	50% anticipo
TIEMPO DE ENTREGA				

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **10/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

SEGUNDO SALAMANCA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE
IVA
RETENCION 1%
TOTAL A TRANSFERIR

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

Yensy Galindez.

Presidente JAC

Interventoria

San Agustín, marzo 13 de 2024

COTIZACIÓN

Señores

ASOJUNTAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización d e Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Pradera.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales y alquiler de retroexcavadora de llanta tipo (pajarita) para la Placa Huella Vereda Paradera en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 160 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. KM/M3
TRANSPORTE	1600

DESCRIPCIÓN	VR/HR
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE LLANTA TIPO (PAJARITA)	$ 120,000

Los valores indicados no incluyen retenciones, ponemos a su disposición 4 volquetas sencillas.

Nota: Anticipo del 50% para inicio de trabajos.

Gracias.

Cordialmente.

SEGUNDO SALAMANCA RIVERA
CC. 12.142.866

San Agustín, marzo 19 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

ASOJUNTAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de alquiler de retroexcavadora de llanta tipo (pajarita) para la construcción de la Placa Huella Vereda Pradera.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de alquiler de retroexcavadora de llanta tipo (pajarita) para la Placa Huella Vereda Paradera en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 160 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR/HR
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE LLANTA TIPO (PAJARITA)	$ 120,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

Nota: Anticipo del 50% para inicio de trabajos.

Gracias.

Cordialmente.

JHON FREDDY RENZA
CC. 83.041.729

AGROMAQ
SAN AGUSTÍN
Máquinas y Repuestos Agrícolas

Angie Paola Santiago Varon
Nit. 1.083.911.134 - 0
No Responsable de IVA

FECHA EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
05	04	2024

COTIZACIÓN 0783

Calle 2 No 8 - 104 .Cel: 317 339 9020 .San Agustín - Huila

Señor: Asociacion municipal de juntas
Nit. 900773479 -1 Tel.
Dirección: Alcaldia San Agustin

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2	meses Arquiler	50.000	
	mes chaderra de bulto		3.000.000
	Dia		

Impreso por: Gironza Impresores. Tel: 836 9644 Pitalito - H.

GRAN TOTAL 3.000.000

San Agustín, Abril 02 de 2024

COTIZACIÓN

Señores

ASOJUNTAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Alquiler de Mezcladora para la construcción de Placa Huella Vereda Pradera.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de alquiler de mezcladora de concreto para la Placa Huella Vereda Pradera en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 160 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR/HR
ALQUILER DE MEZCLADORA DE 1 BULTO DIESEL	$ 50,000

Los valores indicados no incluyen retenciones

Nota: Anticipo del 50% para inicio de trabajos.

Gracias.

Cordialmente.

Jesus Manuel Anacona

JESUS ANACONA

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3596 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
INTERVENTOR: ING. JOSE LUIS VALDERRAMA
SUPERVISOR: ING. JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

VALLA

			EMPRESAS		
			TIMANCO LITOGRAFIA	TIPOGRAFIA SAN MARCOS	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COTIZACION 1**	**COTIZACION 2**	**MAS ECONOMICA**
VALLA DE 1X2 EN MATERIAL BANNER CON ESTRUCTURA METALICA Y PARALES DE 3.60M	1	UND	$ 340,000.00	$ 485,000.00	
TOTAL			**$ 340,000.00**	**$ 485,000.00**	$ 340,000.00

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE		
FORMA DE PAGO	60-40	60-40		
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS	15 DIAS		

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **10/04/2024**

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

BASE	$	340,000.00
IVA	0	
RETENCION 2.5% O 3.5%	NO APLICA	
ANTICIPO	$	204,000.00
PAGO 2	$	136,000.00
TOTAL	$	340,000.00

PROVEEDOR SELECCIONADO

TIPOGRAFÍA SAN MARCOS

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

Yensy Galindez.

Presidente JAC

Interventoria

Pitalito, 29 de Marzo de 2024

Señores:
ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
San Agustín - Huila

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	IMPRESIÓN DE UNA VALLA TAMAÑO: 2 M X 1 M EN BANNER IMPRESIÓN EN ALTA RESOLUCION	$ 150.000
1	LAMINADA VALLA TAMAÑO: 2 M X 1 M	$ 60.000
1	ESTRUCTURA TAMAÑO: 2 M X 1M	$ 130.000

NOTA: SI NECESITA FACTURA ELECTRONICA LOS PRECIOS SERAN MAS EL 19% IVA.

Atentamente,

Deissy Moreno Giraldo

Deissy Moreno Giraldo
C.C. 36.272.657



TIPOGRAFIA SAN MARCOS
Rosalba Navarro Lozano
Nit. 40.726.749-1
NO RESPONSABLE DE IVA

Señor(es):
ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
NIT. 9 0 0 7 7 3 7 7 9
correo: asociacionmuniciapldejuntas@gmail.com

Muy cordialmente me permito cotizar los siguientes trabajos:

Cant.	Concepto	V/Unitario	Valor
1	***Valla Publicitaria:*** (2 MTS X 1) lona full color impresión digital con estructura metalica, tubos para suelo, sin instalar	485.000	485.000
1	***Lona Publicitaria:*** (2 MTS X 1) solo impresión lona full color. (sin instalar)	90.000	90.000

El valor de la cotización es por las cantidades mencionadas en ella, no por cantidades menores. Esta cotización tiene una vigencia de 30 días. El presente trabajo se inicia con el 100% del valor mencionado y será entregado en un plazo maximo no superior a 15 días habiles.

Rosalba Navarro Lozano
CC 40726749

Fecha de Cotización : Marzo 19 / 2024

ROSALBA NAVARRO LOZANO
Cel: **312 3795637 - 8 360500** / e-mail. **sanmarcospitalito@hotmail.com**

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3596 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

TOPOGRAFIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	EMPRESAS: PLANEACIÓN Y PROYECTOS	EMPRESAS: D&D	EMPRESAS: SOLUCIONES INGENIERIA	DIFERENCIA
Levantamiento Topografico	200	Unidad	$950,000.00	$900,000.00	$1,350,000.00	
Diseño Geometrico	200	Unidad	$700,000.00	$450,000.00	$1,000,000.00	
Materializacion eje del Proyecto	200	Unidad	$950,000.00	$850,000.00		
Control de Niveles	1	Unidad	$0.00	$0.00		
Plano Record final	0	Unidad	$950,000.00	$0.00		
Planos de diseño Estructural	1	Unidad	$0.00	$400,000.00	$900,000.00	
BASE						
IVA			$ -	$ -		
TOTAL			**$ 3,550,000.00**	**$ 2,600,000.00**	**$ 3,250,000.00**	$ 950,000.00

TRANSPORTE	CON TRANSPORTE	CON TRANSPORTE	CON TRANSPORTE	anticipo
FORMA DE PAGO	50-50	50-50	50-50	$1,300,000.00
TIEMPO DE ENTREGA	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **10/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

D&D

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE	$2,600,000.00
IVA	$0.00
RETENCION 10% O 11%	NO APLICA
ANTICIPO	$1,300,000.00
PARCIAL 2	$1,300,000.00
TOTAL	$2,600,000.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS | **Presidente JAC** | **Interventoria**

Pitalito, marzo 18 de 2024

ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
NIT 900773779
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Asunto: Propuesta económica levantamiento topográfico, diseño geométrico, localización y levantamiento plano record para proyecto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Cordial saludo.

Es para nosotros muy importante ofrecer a usted nuestro servicio con profesionalismo, convencidos que podemos satisfacer sus necesidades de seguridad, comodidad y economía en la consultoría en referencia así:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	VALOR TOTAL
1	Levantamiento topográfico para proyectos de pavimentación tipo Placa huella. Levantamiento realizado con estación total de topografía. Nota: El levantamiento topográfico ligado a partir de una georeferenciación con ayuda de herramientas como google earth la cual genera unas coordenadas iniciales aproximadas.	GL	950,000
2	Diseño geométrico de la rasante, acorde a la guía del instituto nacional de vías INVIAS. Se hace entrega de planos planta - perfil y secciones transversales del diseño de rasante, con la descripción de los tipos de curva. Se entrega cálculo de volumenes de corte s/o terraplen e informe escrito describiendo la metodología empleada, carteras de coordenadas, certificado de calibración de equipos y registro fotográfico.	GL	700,000
3	Localización del diseño geométrico. Materialización del eje del proyecto cada 10 metros en recta y en curva cada 5 metros. En caso de haber sobre ancho localización de éste.	GL	950,000
4	Realización de levantamiento topográfico final. Entrega de plano record.	GL	950,000
			3,550,000
		COSTO DIRECTO	3,550,000
SON:	TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS		

Calle 3 No 4-60 Pitalito (H)
320 812 6493 - 311 591 1528
carolinabolivarp@gmail.com

D&D
INGENIERIA

301 348 01 22
301 347 95 51

dydingenieriacivilytopografica@gmail.com

VALOR PROPUESTA.

PROPUESTA ECONOMICA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR GLOBAL**	
1	Levantamiento Topográfico Georreferenciado	$	900,000.00
2	Diseño geométrico	$	450,000.00
3	Planos Diseño Estructural	$	400,000.00
4	Localización y Replanteo de la obra	$	850,000.00
TOTAL		**$**	**2,600,000.00**

El valor de la propuesta es de $ 2.600.000, Dos millones seiscientos mil pesos M(CTE).

FORMA DE PAGO.

Para iniciar trabajos y posterior a la firma del contrato, se solicita un anticipo del 50%. Una vez ejecutado el 100% de las actividades contratadas, se solicita el pago del 50% restante.

GARANTÌAS PARA EL CLIENTE.

Una vez revisado el producto por parte de la entidad correspondiente, en caso de ser necesario, se realizarán las subsanaciones a que haya lugar y que sean propias del alcance de la presente cotización.

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

La disponibilidad es inmediata, una vez se efectué el pago del anticipo. El tiempo de ejecución es de 8 días.

DIANA HINET JIMENEZ CHILITO
TEL. 301 3480122
INGENIERA TOPOGRÁFICA

San Agustín, marzo 11 de 20224 **COT. 12.2024**

Señores:

ASOJUNTAS
MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización Levantamiento Topográfico, Diseño Geométrico y Diseño Estructural Placa Huella Vereda Paradera.
Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos presentar nuestra propuesta económica para la realización del Trabajo de levantamiento topográfico, Diseño Geométrico y Diseño Estructural Placa Huella Vereda Paradera en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 200 metros

1. VALOR DE LA OFERTA

ITEM	UNIDAD	VR. UNITARIO	OBSERVACIONES
Levantamiento topográfico y georreferenciación del proyecto.	Glb	$ 1.350.000	Levantamiento topográfico de 250 metros.
Diseño Geométrico Tramo Placa Huella	Glb	$ 1.000.000	Diseño 250 metros
Planos de diseño Placa según Diseño Tipo Colombia Rural.	Glb	$ 900.000	
Subtotal		$ 3.250.000	

Retenciones 11%: $ 357.500

Son: $ 3.607.500 Tres millones seiscientos siete mil quinientos pesos

Nota: Anticipo del 50% para inicio de trabajos.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se realizará los levantamientos topográficos y georreferenciación al sistema de coordenadas Magna Sirgas y los diseños.

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El trabajo comprende las siguientes actividades:
Según requerimientos para Levantamientos Topográficos exigidos nuevas resoluciones 2021.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3596 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

FERRETERIA 155 metros

		EMPRESAS				
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**PIMAR**	**TECHAR**	**VARGAS BARRERA**	**BARATA**	**IDEAL**
CEMENTO CEMEX USO ESTRUCTURAL 42.5 kg	1			$ 34,000.00		
CEMENTO CEMEX USO GENERAL 50.0 kg	1		$ 33,000.00		$ 33,500.00	$ 34,000.00
CEMENTO ALION USO GENERAL 50.0 kg	1	$ 34,300.00				
VARILLA 1/2" PDR-60, Fy: 4200 kg/cm3	1					
VARILLA 3/8" PDR-60, Fy: 4200 kg/cm3	1	$ 18,249.99	$ 16,731.00			$ 16,400.00
VARILLA 1" PDR-60, Fy: 4200 kg/cm3	1					
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE	1					
puntilla de 2 1/2 pung	1					
puntilla 3 pulg	1					
sika antisol blanco * 20 kg	1					
Disco corte acero de 9"	1					
cemento de uso general 50 kg	1					
poliuretano 100% blanco	1					
	1					
BASE						
IVA		$ 52,549.99	$ 49,731.00	$ 34,000.00		$ 50,400.00
TOTAL						
TRANSPORTE		SI INCLUYE	NO INCLUYE	NO INCLUYE	NO INCLUYE	NO INCLUYE
FORMA DE PAGO		CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA		8 DIAS	8 DIAS	8 DIAS	8 DIAS	8 DIAS

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **10/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

PIMAR

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE	$	-
IVA	$	-
RETENCION 2.5%	$	-
ANTICIPO 1	$	-

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

Presidente JAC

Interventoria



COMERCIALIZADORA PIMAR SAS **COTIZACION No.** 1933

Nit 900414953

Direccion Avenida 1 NO 13-46 TEL:608 8352879 CEL: 3213363359

CLIENTE ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMU
NIT 900773779 1
DIRECCION ALCALDIA SAN AGUSTIN

CIUDAD San Agustín **TELEFONO** 3105727848

FECHA DOCUMENTO miércoles, 28 de febrero de 2024

FECHA VENCIMIENTO 28-feb.-24

POR CONCEPTO DE

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DENIS CAROLINA MORENO	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CEMENTO GRIS ALION 50 KL	2.400,00	Und.	$28.823,53	19%	69.176.470,59
VARILLA ROSCADA 3/8 16"X 1MTS	4.000,00	Und.	$15.336,13	19%	61.344.537,81
********** CERRADA **********					

Valor en Letras CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

Cotizacion valida hasta: 8 dias

SUBTOTAL	130.521.008
DESCUENTO	0
IVA	24.798.992
TOTAL DOCUMENTO	155.320.000

NUMERO DE CUENTA A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA PIMAR NT 900414953 EN BANCOLOMBIA 45380865401 AHORROS ---- DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No 108900091233

Firma Responsable_____ **Verificado Por**_____

TECHAR
·FERRETERÍA·

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TECHAR SAS

Nit: 900825836-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor
CLL 6 1B 36 PITALITO HUILA
Tel. 3187077862 - 3125821285
ferreteriatechar@gmail.com

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA, Según Resolución 4219 del 27 de Diciembre de 2023

COTIZACION No. **1858**

Adquiriente	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900773779-1 Tels: 3105727848	Feb-26-2024	CONTADO EFECTIVO
Dirección	ALCALDIA DE SAN AGUSTIN	Vencimiento	Vendedor
Ciudad	SAN AGUSTÍN - HUILA	Feb-26-2024	TRIANA TRIANA DIEGO FERNANDO
Entregar en:			

#	BODEGA	CANT.	REF/COD	DETALLE	VR/UNIT	%IVA	IVA INCL	VR IVA	VR/TOTAL
1	GARAJE	2,400.00	CMG CEMEX	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL 50 KG UNIDAD	27,731	19	33,000	12,645,378	79,200,000
2	FABRICA	1,190.00	VAR 3/8	VARILLA 3/8 CORRUGADA X6MT UNIDAD	14,059	19	16,731	3,178,890	19,909,890

OBSERVACIONES: RECOGIDO EN BODEGA / NO APLICA DOMICIL

Total items : 2

Consignar a la cuenta del Banco BANCOLOMBIA -Ahorros 45300002867 o DAVIVIENDA Ahorros 076700178676 a nombre de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TECHAR S.A.S . Por favor enviar los soportes a carteraferreteriatechar@gmail.com o al 3187077862.

Subtotal	83,285,621
Iva/Inc	15,824,268
TOTAL$	**99,109,890**

Son: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS mcte.

LA BARATA FERRETERIA

cr 11 2 56 Tel: 3176579745 SAN AGUSTIN

GRUPO LYDER S.A.S NIT: 900376214-8

COTIZACION N° 1258

Cliente : ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS ACCION DE Nit/CC. : 900773779-1 Página : 1

Dirección : ALCALDIA DE SAN AGUSTIN Teléfono : 3105727848 F. Pago : Efectivo Fecha : 04/04/24

Ciudad : SAN AGUSTIN Zona: SAN AGUSTIN Vend[ ] : Vence : 04/04/24

CODIGO-B	DESCRIPCION	PRESENTACION	IMP	%Dcto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
001951-1	CEMENTO CEMEX GRIS BULTO * 50KLS	BULTO	0%	0.0%	1.00	33,500.00	33,500.00

SON : TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS**********

PESO: 50.00 KG

Observaciones:

SUBTOTAL ======>	$	33,500.00
IMP->IVA ======>	$	0.00
T O T A L ======>	$	33,500.00

Elaboró

Aceptada y Recibida __/__/____

IVB CONSTRUCTORA

SOSTENIBILIDAD · PROGRESO · DESARROLLO

INVERSIONES VARGAS BARRERA SAS

Nit: 901139862-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CL 6 1A 104 PITALITO HUILA

Tel. 3202096296

COTIZACION No:

CT1 - 7

Aquiriente	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 900773779-1 Tel: 3105727848		Feb-26-2024	Feb-26-2024	EFECTIVO
Direccion	ALCALDIA DE SAN AGUSTIN San Agustin - Huila		Vendedor		Plazo
			BARRERA MOLINA MILDRED		0 Dias

REF.	BODEGA	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
10004381	PRINCIPAL	CEMENTO GRIS EXTRUCTURAL CEMEX X 42.5 KG UND	19	2,400.00	34,000.00	81,600,004.08

OBSERVACIONES: PRECIO DE CEMENTO VALIDO PARA 1 MES Y TIEMPO MAXIMO DE RETIRO 45 DIAS CALENDARIO, PRECIO FINAL NO INCLUYE DOMICILIO, CEMENTO ENTREGADO EN PITALITO

Son: OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL CUATRO PESOS mcte.

SubTotal	68,571,432.00
Iva	13,028,572.08
TOTAL	**81,600,004.00**

Ferretería IDEAL

MANUEL JIMENEZ SAMBONY

Nit: 12142731-9

Dirección: CL 3 10 41

Telefono: 3118633275

Responsabilidad: Responsable de IVA (régimen común)

COTIZACION
1101

Resp: VENTAS

Fecha 2024-03-20
Fecha Final 2024-03-20
-

Cliente : ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN

Nit / CC: 900773779

Telefono: 3105727848

Direccion:ALCALDIA DE SAN AGUSTIN

CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	P UNID	BASE	IMP	IVA	VAL DES	DES	V TOTAL
001786	VARILLA CORRX60 (3/8) 3.33	1,200.00	16,400.00	13,781.5	3,142,184.87	19%	0.00	0%	19,680,000.00
000001	CEMENTO CEMEX BTO X 50KL	800.00	34,000.00	28,571.4	4,342,857.14	19%	0.00	0%	27,200,000.00

ITEMS 2	SUBTOTAL 39,394,957.98	DESCUENTO 0.00	SUBTOTAL 39,394,957.98	IVA 7,485,042.02	TOTAL 46,880,000.00

COMENTARIO :

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3596 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

AGREGADOS

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**FUEGO VERDE**	**PETREOS COLOMBIA**	**INDUCON**	**DISMETRIC**
Premezclado 1/2	1	m3		$ 77,350.00		$ 77,350.00
Premezclado 3/4	1	m3				$ 77,350.00
Gravilla 3/4	1	m3		$ 101,150.00	$ 101,150.00	
Gravilla 1/2	0	m3		$ 101,150.00	$ 101,150.00	$ 101,150.00
Sub base granular	1	m3		$ 53,550.00	$ 77,350.00	$ 101,150.00
Base	1	m3		$ 77,350.00	$ 89,250.00	
Material de Cantera	1	m3				
Piedra ciclopeo	1	m3				
Arena Triturada	1	m3		$ 47,600.00		$ 57,600.00
Arena Gruesa	1	m3	$ 27,766.00		$ 59,500.00	
Runcho	1	m3	$ 17,850.00			
Recebo	1	m3	$ 17,850.00			
Mixto de rio	1	m3		$ 53,550.00	$ 89,250.00	
TRANSPORTE	1	Viaje		$ 546,000.00		
TOTAL			**$ -**	**$ 458,150.00**	**$ 368,900.00**	**$ 414,600.00**

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	CON TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE
FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA				

	CANTIDAD	**UNIDAD**	**SEGUNDO SALAMANCA**	**PETREOS COLOMBIA**	**ENRRIQUE IBARRA**
DISTANCIA DE SAN AGUSTIN A PRADERA 14 KM - 12 KM PETREOS COLOMBIA A SAN AGUSTIN					
TRANSPORTE KM/M3	1	KM/M3	$ 1,600.00	$ 1,500.00	$ 1,600.00
TOTAL			**$ 1,600.00**	**$ 1,500.00**	**$ 1,600.00**
Precio a pradera	**26**	KM/M3	**$ 249,600.00**	**$ 546,000.00**	**$ 249,600.00**

FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA	1 dia	1 dia

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **10/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	**3**	

PROVEEDOR SELECCIONADO

DISMETRIC PARA PREMEZCLADO Y PIEDRA CICLOPEO

BUENOS AIRES PARA SUB BASE

Firman en aprobación

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA PETREOS COLOMBIA

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA SEGUNDO SALAMANCA

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

Supervisor INVIAS

Yensy Galindez.
Presidente JAC

Interventoria

San Agustin (Huila) 13 de marzo año 2024

MINA FUEGO VERDE

Señores:
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
NIT: 900773779-1

ASUNTO: COTIZACIÓN

Respetados señores, atendiendo su amable solicitud, MINA FUEGO VEDE, ponemos a su consideración la cotización sobre materiales de construcción. Se adjunta la siguiente relación:

VALOR MT³ MATERIAL			
MATERIAL	**VR MT³**	**IVA 19%**	**VR TOTAL**
ARENA GRUESA	$23.333	$4.433	$27.766
RUNCHO	$15.000	$2.850	$17.850
RECEBO	$15.000	$2.850	$17.850

Consideraciones:

- El cliente deberá informar y enviar a la persona encargada de recibir el material en la Planta de Mina Fuego Verde, quien a su vez será el (o la) responsable de comprobar la calidad del material, por lo que no se aceptaran reclamos ni devoluciones.
-

Forma de Pago.

- Anticipo por valor del 50%
- Pagos Quincenales según corte realizado amortizando anticipos.

A consideración del cliente los pagos se podrán consignar a la siguiente cuenta:

PETREOS
COLOMBIA S.A.S

Pitalito, Huila 13 de marzo 2024

Señores:
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN.

ASUNTO: COTIZACIÓN

Respetados señores, atendiendo su amable solicitud, PETREOS COLOMBIA. S.A.S. ponemos a su consideración la cotización sobre materiales de construcción.

Se adjunta la siguiente relación:

MATERIAL	VALOR M3	IVA M3	VALOR M3 IVA INCLUIDO
GRAVILLA ¾ - ½	$ 85.000	$ 16.150	$ **101.150**
MIXTO DE RIO	$ 45.000	$ 8.550	$ **53.550**
BASE	$ 65.000	$ 12.350	$ **77.350**
SUB- BASE	$ 45.000	$ 8.550	$ **53.550**
PREMEZCLADO	$ 65.000	$ 12.350	$ **77.350**
ARENA TRITURADA	$ 40.000	$ 7.600	$ **47.600**

El suministro de Pétreos contempla:

- Los valores indicados no incluyen transporte, este servicio será adicionado al valor de la cotización, ponemos a su disposición transporte Doble Troque, desde la Planta de Pétreos ubicada en Vereda Matanzas kilómetro 21 vía San Agustín. Valor kilometro $1.000 pesos Mct

Consideraciones:

- El cliente deberá informar y enviar a la persona encargada de recibir el material en la Planta de Pétreos, quien a su vez será el (o la) responsable de comprobar la calidad del material, por lo que no se aceptaran reclamos ni devoluciones.
-

FECHA 21/03/24

PITALITO HUILA

SEÑORES
ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN

ASUNTO COTIZACION No.0054

Cordial saludo,

Le escribimos con el fin de darle respuesta a su solicitud de cotización de los siguientes materiales puestos en planta

PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD MT3	PRECIO UNITARIO	PRECIO IVA INCLUIDO
GRAVILLA 1/2	1	$ 85.000	$ 101.150
GRAVILLA 3/4	1	$ 85.000	$ 101.150
PREMEZCLADO 1/2	1	$ 65.000	$ 77.350
PREMEZCLADO ¾	1	$ 65.000	$ 77.350

INDUCON
TRITURADOS

Pitalito 26 de febrero del 2024

Rut: 900773779-1
SEÑOR: ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN.
Correo: asociacionmunicipaldejuntas@gmail.com
Dirección: VDA PRADERA
Tel:3105727848

Cordial saludo.

Me dirijo a usted con el fin de presentarle la siguiente cotización, de agregados para la construcción. El desarrollo de nuestra actividad las realizamos amparados con los respectivos permisos y licencias otorgados por las entidades competentes "Titulo Minero N° KBN08251, Licencia Ambiental Res N° 0228 Feb del 2013".

PLANTA INDUCON TRITURADOS

TIPO DE MATERIAL	**PRECIO POR METRO CUBICO**	**PRECIO POR METRO CUBICO**
Gravilla ¼,3/4, 1 pulgada	SIN IVA $85.000	CON IVA $101.150
BASE	SIN IVA $75.000	CON IVA $89.250
ARENA G	SIN IVA $50.000	CON IVA $59.500
SUBBASE TIPO C	SIN IVA $65.000	CON IVA $77.350
PIEDRA FILTRO (RAJON)	SIN IVA $80.000	CON IVA $95.200
MIXTO	SIN IVA $75.000	CON IVA$89.250

el servicio de transporte es adicional;

Nota: El modo de pago se manejan por anticipos se realizar las consignaciones a la cuenta Corriente Bancolombia N°453229659-51 a nombre de José Hilario Vargas Trilleras. Las respectivas copias de las licencias se facilitan una vez se haya concretado la compra

Atentamente:

JOSE HILARIO VARGAS TRILLERAS
C.C. 12.237.793 De Pitalito Huila
Cel. 3108184433

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3596 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR

MADERA

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**MADER CENTRAL**	**EL ALTICO**		
TABLA BURRA DE 20CM X 3CM X 3M	1	UNIDAD	$ 18,800.00	$ 18,000.00		
POLIN 5CM X 5CM X3M	1	UNIDAD		$ 7,000.00		
BASE			**$ 18,800.00**	**$ 25,000.00**	**$ -**	**$ -**
IVA			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL			**$ 18,800.00**	**$ 25,000.00**	**$ -**	**$ -**

TRANSPORTE	Transporte vibro 100%			
FORMA DE PAGO	100% transp vibro, 50% alqui	50% anticipo	50% anticipo	50% anticipo
TIEMPO DE ENTREGA				

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **10/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

MADER CENTRAL

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE
IVA
RETENCION 1%
TOTAL A TRANSFERIR

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

Yensy Galindez.
Presidente JAC

Interventoria

Cotización

Empresa: Mader Central
NIT. 1075253766-2
Dirección: Calle 2 # 11 - 35
Municipio: San Agustín
Correo:
madercentralsanagustinegmail.c
Teléfono: 3118400430 - 3132536

Cantidad	Concepto	Precio
1	Tabla burra de 20cm	$18,800.00
Total		$18,800.00

Notas:
*El precio es valido por el mes de marzo de 2024
* El material se debe arreglar para placa huella

Dirigida a: ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

REPRESENTANTE LEGAL
ERIKA JASBLEIDI MUÑOZ ZUÑIGA
C.C. 1075253766 de Neiva

EMPRESA FORESTAL RECONOCIDA POR LA CAM
MEDIANTE RESOLUCION N° 635 (23/02/2018)

EL ALTICO
VENTA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

Empresa: VENTA DE MADERA Y MACHIMBRES EL ALTICO
NIT: 1 082 774 855 – 0 NO RESPONSIBLE DE IVA
Dirección: CALLE 3 # 7 – 56 Barrio San Martin
Teléfono: 312 3918 596 – 313 8021 273 – 311 4789 242
Ciudad: SAN AGUSTIN – HUILA
Correo Electrónico: depositomaderaelaltico@gmail.com
Fecha: 19/03/2024

****VALIDEZ DE LA PROPUESTA** = Marzo

Producto	Cantidad	Vr Unitario
Tabla Burra 20cm x 3cm x 3 m	und	$ 18,000
Polin 5cm x 5cm x 3 m	und	$ 7,000

****NOTA**

- **En caso de Arreglo o Figuración a los productos en mención tienen un costo adicional de $ 1.000**
- **Realizamos todo tipo de formaleta para las diferentes necesidades de la construcción de edificaciones**
- **Todo nuestro material cuenta con los permisos necesarios y autorizados por las entidades de control ambiental a nivel regional y nacional.**

Dirigido a: **ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN**
NIT 900 773 779 – 1

Anderson Gómez Bolaños
Firma
Representante legal de la empresa forestal

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 002	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 05/04/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Bajo Junín – Isnos - Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 3991 de 2023 – Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNÍN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA
Ejecutor(es): JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BAJO JUNIN

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
VICTOR LOPEZ	JAC BAJO JUNIN	PRESIDENTE
MARTHA BURBANO	JAC BAJO JUNIN	SECRETARIA
YAMID AHUMADA	JAC BAJO JUNIN	TESORERO
JOAN ANDRES VARGAS	VEEDURIA	VEEDOR
FERNANDO BRAVO	JAC BAJO JUNIN	ING RESIDENTE OBRA
LAURA ORTEGA	JAC BAJO JUNIN	CONTADOR PUBLICO
CARLOS CHAVARRO	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA
IVAN SANDOVAL	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Revisión y aprobación de hojas de vida
2. Revisión y aprobación de cotizaciones presentadas

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Evaluación del personal propuesto por la Junta de Acción Comunal Ingeniero Residente, Contador Público y Maestro de Obra.

2- Revisión, socialización y aprobación de cotizaciones presentadas por la Junta de Acción Comunal, las cotizaciones a revisar con las siguientes:
   - Cotizaciones para Estudio de suelos
   - Cotizaciones para Topografía y Diseño geométrico
   - Cotizaciones para Materiales de ferretería

- Cotizaciones para Transporte de Materiales de ferretería
- Cotizaciones de Agregados pétreos y transporte de agregados pétreos
- Cotizaciones de Alquiler de maquinaria
- Cotizaciones de Dotaciones

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar).*

Tema	Resumen
1.	La junta de acción comunal realizo envió por medio de correo electrónico a la interventoría, su revisión y aprobación, la interventoría manifiesta que efectivamente ya se realizó la revisión del personal propuesto para Ing. Residente, Contador público y Maestro de obra, y anexo a esta acta de comité operativo se relaciona la evaluación respectiva de cada personal concluyendo lo siguiente: Ing. Residente: ING. JESUS FERNANDO BRAVO LASSO C.C 1.088.971.799 La Cruz Nariño M.P. 19202229601CAU 21/06/2012 Contador público: LAURA SOFIA ORTEGA CUERVO C.C. 1.084.261.186 Isnos Huila M.P. 275015-T 09/01/2020 Maestro de obra: BLADIMIRO ORDOÑEZ ORTEGA C.C 12.170.603 Isnos Huila
2.	La junta de acción comunal realizó envío de las cotizaciones presentadas por cada actividad, de las cuales la interventoría realiza un comparativo el cual se socializa en este comité operativo. • Las cotizaciones presentadas para los estudios de suelos: Presentan dos cotizaciones: 1. INDISUELOS 2. MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS. La interventoría manifiesta según la revisión y evaluación comparativa de las cotizaciones presentadas en la cual se ofrece tantos los estudios de suelos como ensayos de laboratorios necesarios para el proyecto, el laboratorio Indisuelos quien oferta el menor valor también ofrece todos los ensayos necesarios. El Ing. Residente manifiesta que en vista de que este laboratorio es el más económico adicional es un laboratorio muy responsable que ya ha realizado varios trabajos con ellos y son muy cumplidos con las entregas.

	Por otro lado, el presidente y la veeduría que manifiestan que de acuerdo a lo que dice el ing residente en el cual depositan toda la confianza debido a que ya conocen el trabajo de el, están de acuerdo con lo que el Ing. residente opina. • Las cotizaciones para Topografía y Diseño geométrico: Presenta tres cotizaciones: 1. ING. JOHNATHAN JAVIER MONTERO TORRES 2. ING. JULIÁN ANDRÉS ESPAÑA 3. TOPOGRAFO-FABIAN ANDRES BURBANO LOPEZ La interventoría manifiesta que de acuerdo a las cotizaciones presentadas todas están ofreciendo el mismo servicio, buscar la más viable económicamente. • Las cotizaciones para Materiales de ferretería: • Las cotizaciones para Transporte de Materiales de ferretería: • Las cotizaciones de Agregados pétreos y transporte de agregados pétreos: • Cotizaciones para Alquiler de maquinaria: Presenta tres cotizaciones precios por unidad de medida unitaria: 1. FERRETERIA SURTIHERRAMIENTAS ISNOS 2. FERRETEERIA ANDINA 3. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CONSTRUCENTER La interventoría manifiesta que de acuerdo a la revisión y comparación de las cotizaciones presentadas la ferretería andina es la que ofrece los valores más económicos de igual manera que está ofreciendo también transporte de materiales alquiler de maquinaria y materiales pétreos. Por parte de la JAC Ing. residente manifiesta que esta ferretería que se encuentra ubicada en la misma zona cuanta con todos los materiales y servicios requeridos. La interventoría manifiesta que donde se realice la compra de los materiales pétreos este debe tener licencia o certificación ambiental para la comercialización de este tipo de materiales. Por parte de la JAC Ing. Residente manifiesta que dentro de la zona está situada una cantera la cual cuenta con un material tipo afirmado de muy buen comportamiento para que sea reemplazado por la Subbase granular tipo c que se exige dentro del presupuesto, pero que esta cantera no cuenta con ningún permiso para la explotación; la interventoría manifiesta que son directrices de que el material pétreo de playa que se compre este debe venir debidamente certificado ambientalmente para no tener problemas. • Las cotizaciones de Dotaciones: Presenta tres cotizaciones: 1. DOTATEX 2. SERVIDOTACIONES 3. H&M DOTACIONES La interventoría manifiesta que de acuerdo con la evaluación y comparación de las cotizaciones presentadas la empresa de servidotaciones presenta los precios más económicos.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	De acuerdo a la evaluación realizada al personal ofertado por la JAC, y teniendo en cuenta que postularon a una persona para Ing Residente de obra, una persona para Contador público y una persona para maestro de obra, todos cumple de acuerdo a las exigencias del anexo técnico dentro del convenio. Por lo tanto, el comité aprueba que para: Ing. Residente: ING. JESUS FERNANDO BRAVO LASSO C.C 1.088.971.799 La Cruz Nariño M.P. 19202229601CAU 21/06/2012 Contador público: LAURA SOFIA ORTEGA CUERVO C.C. 1.084.261.186 Isnos Huila M.P. 275015-T 09/01/2020 Maestro de obra: BLADIMIRO ORDOÑEZ ORTEGA C.C 12.170.603 Isnos Huila
2.	El comité operativo aprueba lo siguiente: • Reintegro de polizas • Se aprueba a el LABORATORIO INDISUELOS, obtiene voto positivo por parte del presidente y veedor, por mayoría de votos se concluye que se deja este laboratorio para realizar los estudios de suelos, debido a que presenta la cotización más económica. La interventoría conociendo estas opiniones vota de manera positiva para que esta empresa realice los estudios de suelos. • Se aprueba al TOPOGRAFO-FABIAN ANDRES BURBANO LOPEZ obtiene voto positivo por parte del presidente, veedor e interventoría. De acuerdo a lo que manifiesta el Ing. Residente, el topógrafo Fabian es un buen profesional responsable, comprometido con el trabajo, por esta razón tanto

	presidente como la veeduría votan en positivo por el topógrafo, aparte de que presenta la cotización mas baja es buen profesional, de igual manera la interventoría esta de acuerdo con lo que se están diciendo por parte de la JAC. • Se aprueba la empresa SERVIDOTACIONES teniendo en cuenta que fue la cotización más económica tanto presidente y veedor, optan por esta empresa de igual manera, la interventoría vota de manera positiva debido a que presenta la menor cotización y es más viable.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____


COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Realizar los contratos pertinentes del personal aprobado: Ing. Residente de obra Contador publico Maestro de obra	JAC	Entre las semanas siguientes
Presentar cotizaciones pendientes: Alquiler de maquinaria Valla Exámenes médicos	JAC	Entre las semanas siguientes


PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación


FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: **VICTOR LOPEZ ORTIZ**
Cargo: Presidente JAC




Nombre: **CARLOS ANDRÉS CHAVARRO**
Cargo: Interventoría




Nombre: **JOHAN ANDRES VARGAS**
Cargo: Presidente veeduría ciudadana



Nombre: **IVAN SANDOVAL CARDOZO**
Cargo: Interventoría




Nombre: **YAMID ALBERTO AHUMADA B.**
Cargo: Ing. Tesorero JAC



Nombre: **MARTHA BURBANO**
Cargo: Secretaria JAC



Nombre: **FERNANDO BRAVO LASSO**
Cargo: Ing. Residente JAC



Nombre: **LAURA SOFIA ORTEGA CUERVO**
Cargo: Contador público JAC

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3391 DE 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN
INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - RL CARLOS ANDRÉS CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: WILDER SALAZAR

TOPOGRAFIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	EMPRESAS: FABIAN ANDRES	JULIAN ANDRES ESPAÑA		DIFERENCIA
Levantamiento Topográfico con Estación Total Electrónica Precisión de 2". · Informes del Levantamiento Topográfico. · Carteras de Campo. · Planos Topográficos. - Planos en Planta y Perfil, Secciones Transversales. · Diseño geométrico de Placa Huella. - Planos en Planta y Perfil, - Secciones Transversales. - Corte y relleno de las Secciones Transversales. ·	1	Unidad	$1,200,000.00	$1,500,000.00	$1,600,000.00	
Replanteo y demarcación de puntos: - Eje de vía, - Abscisado costado derecho, izquierdo, o Punto de inicio y terminación del tramo	1	Unidad	$500,000.00	$800,000.00	$800,000.00	
BASE						
IVA			$ -	$ -		
TOTAL			**$ 1,700,000.00**	**$ 2,300,000.00**	**$ 2,400,000.00**	$ 700,000.00

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	anticipo
FORMA DE PAGO	100-100	CONTADO ANTICIPADO	$1,200,000.00
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIAS	15 DIAS	

Comité Operativo. **No:** **1**

Fecha Comité Operativo: **5/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

FABIAN ANDRES BURBANO LOPEZ

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE	$1,700,000.00
IVA	$0.00
RETENCION 10% O 11%	NO APLICA
ANTICIPO	$1,200,000.00
PARCIAL 2	$500,000.00
TOTAL	$1,700,000.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

Presidente JAC

Interventoria

11/03/2024

COTIZACIÓN

Señores:
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA BAJO JUNIN
Nit: 800247404-5
Isnos - Huila

Se me ha solicitado la cotización para realizar el Levantamiento Tipográfico y Diseño geométrico para 1 tramos de Placa Huella de 200 metros aproximadamente en la Vereda Bajo Junín del Municipios Isnos, Departamento del Huila.

Entregables

- Levantamiento Topográfico con Estación Total Electrónica Precisión de 2".
- Informes del Levantamiento Topográfico.
- Carteras de Campo.
- Planos Topográficos.
  - Planos en Planta y Perfil, Secciones Transversales.
- Diseño geométrico de Placa Huella.
  - Planos en Planta y Perfil,
  - Secciones Transversales.
  - Corte y relleno de las Secciones Transversales.
- Replanteo y demarcación de puntos:
  - Eje de vía,
  - Abscisado costado derecho, izquierdo,
  - Punto de inicio y terminación del tramo.

Valor del tramo a intervenir Un millón Setecientos mil pesos M/CT ($1.700.000.)

Atentamente

Topógrafo - Fabián Andrés Burbano López
CC: 1.083.887.038 de Pitalito Huila
Tel: 317-3766330

FECHA: 11/03/2024

Julian Andrés España
Ingeniero Civil

INGENIERO JULIÁN ANDRÉS ESPAÑA

COTIZACION:

SEÑORES: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN
NIT: 800247404-5
ISNOS – HUILA

OBJETO:
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TIPOGRÁFICO Y DISEÑO GEOMÉTRICO PARA 1 TRAMOS DE PLACA HUELLA DE 200 METROS APROXIMADAMENTE Y ANCHO DE 5 METROS, DE ACUERDO A LA CARTILLA DE DISEÑO DE OBRAS MENORES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN LA VEREDA BAJO JUNÍN DEL MUNICIPIOS ISNOS HUILA.

VALOR: DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CT ($2.300.000.)

DESCRIPCION	
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL ELECTRÓNICA.	$ 900.000
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLA – CARTILLA COLOMBIA RURAL	$ 600.000
REPLANTEO Y DEMARCACIÓN DE PUNTOS (LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EN CAMPO)	$ 800.000
VALOR TOTAL	$2.300.000

LA PRESENTE SE EXPIDE A LOS ONCE DÍAS (11) DÍAS DEL MES FEBRERO DE 2024.

ATENTAMENTE;

JULIAN ANDRES ESPAÑA

ING. JULIÁN ANDRÉS ESPAÑA
INGENIERO CIVIL – UNIVERCIDAD DEL CAUCA
CELULAR: 3213073253

ISNOS HUILA – 11 DE FEBRERO DE 2024

COTIZACION:

SEÑORES: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN
NIT: 800247404-5
ISNOS – HUILA

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TIPOGRÁFICO Y DISEÑO GEOMÉTRICO PARA 1 TRAMOS DE PLACA HUELLA DE 161 METROS Y ANCHO DE 5 METROS, DE ACUERDO A LA CARTILLA DE DISEÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN LA VEREDA BAJO JUNÍN DEL MUNICIPIOS ISNOS HUILA.

Se entregará:
Levantamiento Topográfico con Estación Total

- Informes del Levantamiento Topográfico.
- Carteras de Campo.
- Planos Topográficos. o Planos en Planta y Perfil, Secciones Transversales.
- Diseño geométrico de Placa Huella según cartilla Colombia rural, con Planos en Planta y Perfil, Secciones Transversales y Corte y relleno de las Secciones Transversales.


VALOR: UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS M/CT ($1.600.000.)

Replanteo y demarcación de puntos

- Eje de la vía
- Abscisado costado derecho e Izquierdo
- Punto de Inicio y terminación de tramo.

VALOR: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CT ($800.000.)

ATENTAMENTE;



ING. JOHNATHAN JAVIER MONTERO TORRES
C:C 1.018.433.450
INGENIERO CIVIL
CELULAR: 3132215805

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3391 DE 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN
INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - RL CARLOS ANDRÉS CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: WILDER SALAZAR

FERRETERIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	EMPRESAS: FERRETERIA ANDINA	DOTATEX	HYM DOTACIONES	DIFERENCIA
Varilla corrugada 3/8" X 6 metros	1	Unidad	$17,500.00	$17,500.00	$17,500.00	
Alambre negro de amarre	1	kg	$6,500.00	$6,500.00	$7,000.00	
Cemento gris uso general X 50 kg	1	Unidad	$33,500.00	$33,500.00	$34,000.00	
Libra de puntilla de 2"	1	Unidad	$4,000.00	$4,500.00	$4,500.00	
Libra de puntilla de 2" de acero	1	Unidad	$9,000.00	$9,000.00	$9,500.00	
Discos de corte De 4 pulgadas para acero	1	Unidad	$4,500.00	$4,500.00	$4,500.00	
Discos de corte De 4 pulgadas Diamantado	1	Unidad	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	
Discos de corte De 7 pulgadas para acero	1	Unidad	$8,000.00	$8,000.00	$8,000.00	
Discos de corte De 7 pulgadas Diamantado	1	Unidad	$24,000.00	$24,000.00	$24,000.00	
BASE						
IVA			$ -			
TOTAL			**$ 117,000.00**	**$ 117,500.00**	**$ 119,000.00**	$ 2,000.00

Materiales puestos en obra.

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	anticipo
FORMA DE PAGO	100-100	CONTADO ANTICIPADO	$117,000.00
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIAS	15 DIAS	

Comité Operativo. **No:** **1**

Fecha Comité Operativo: **5/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

FERRETERIA ANDINA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE	$117,000.00
IVA	$0.00
RETENCION 10% O 11%	NO APLICA
ANTICIPO	$117,000.00
PARCIAL 2	$0.00
TOTAL	$117,000.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS | **Presidente JAC** | **Interventoria**



FERRETERIA ANDINA ISNOS

Nit: 36113838-1

Dirección: CR4 6 25

Telefono: 3142380576

Responsabilidad: Responsable de IVA (régimen común)

Correo: facturasandinaisnos@gmail.com

Responsable: ELIZABETH ZUÑIGA SAMBONI

N° Cotización: 633 - Generada 2024-02-23 11:06:45 - Fecha vencimiento 2024-02-23 11:06:00 AM

Cliente: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN	**Nit/ CC:** 800247404
Telefono: 3128755556	**Direccion:**VEREDA BAJO JUNIN
Correo: burbanomarta03@gmail.com	**Municipio:** Isnos

ITEMS	CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	P. UNID	V UNID	IMP	IVA	VAL DES	DES	V TOTAL
1	100320	KILO DE CHIPA FLEJE X 1/4	1.00	5,400.00	4,537.8	862.18	19%	0.00	0 %	5,400.00
2	Editable	ALQUILER DE MEZCLADORA X DIA	1.00	70,000.00	58,823.5	11,176.47	19%	0.00	0 %	70,000.00
3	Editable	ALQUILER DE VOLTA POR HORA	1.00	67,000.00	63,809.5	3,190.48	5%	0.00	0 %	67,000.00
4	Editable	ALQUILER PAJARITA POR HORA	1.00	110,000.00	92,437.0	17,563.03	19%	0.00	0 %	110,000.00
5	68044	TRANSPORTE DE RECEBO X M3	1.00	120,000.00	120,000.0	0.00	0%	0.00	0 %	120,000.00
6	68050	TRANSPORTE PIEDRA ZONGA X M³	1.00	80,000.00	80,000.0	0.00	0%	0.00	0 %	80,000.00
7	873182	TRANSPORTE DE MIXTO DE RIO	1.00	83,400.00	83,400.0	0.00	0%	0.00	0 %	83,400.00
8	68051	TRANSPORTE DE ARENA GRUESA X M3	1.00	50,000.00	50,000.0	0.00	0%	0.00	0 %	50,000.00
9	68052	TRANSPORTE DE GRAVILLA X M3	1.00	121,700.00	121,700.0	0.00	0%	0.00	0 %	121,700.00
10	852947	LIBRA PUNTILLA 2 " C CABEZA	1.00	4,000.00	3,361.3	638.66	19%	0.00	0 %	4,000.00
11	300457	ALAMBRE NEGRO X KG	1.00	6,500.00	5,462.2	1,037.82	19%	0.00	0 %	6,500.00
12	68321	VARILLA 3/8 X 6 MTRS	1.00	17,500.00	14,705.9	2,794.12	19%	0.00	0 %	17,500.00
13	68324	VARILLA 1/2 CORRUGADA X 6 MTRS	1.00	29,000.00	24,369.7	4,630.25	19%	0.00	0 %	29,000.00
14	781145	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X 50 KG	1.00	33,500.00	28,151.3	5,348.74	19%	0.00	0 %	33,500.00
15	781146	CEMENTO GRIS ARGOS X 50 KILOS	1.00	33,500.00	28,151.3	5,348.74	19%	0.00	0 %	33,500.00

COMENTARIOS DEL DOCUMENTO

Terminos y Condiciones:

1. Los precios de venta de esta cotización están sujetos a cambios por concepto de compras nuevas que alteren su valor o será válida durante el tiempo pactado con la empresa.

X

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN

ITEMS	15
SUBTOTAL	778,909.52
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	778,909.52
IVA	52,590.48
TOTAL	831,500.00

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

Generada por *FERRETERIA ANDINA ISNOS* Nit: 36113838-1 Tel: 3142380576

Gracias por hacer negocios con nosotros!

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CONSTRUCENTER

CL 5 3 22 Tel: 3212604343 ISNOS

GELMAR YESID ROSERO MANCHOLA NIT: 1084250316-0

COTIZACION Nº 859

Cliente : JAC BAJO JUNIN — Nit/CC. : 800247404-5 — Página : 1 — Fecha : 27/02/24

Dirección : VDA BAJO JUNIN — Teléfono : 3134987263 — F. Pago : Efectivo — Vence : 27/02/24

Ciudad : ISNOS — Zona: ISNOS — Vend[06] : GELMAR

CODIGO-B	DESCRIPCION	PRESENTACION	IMP	%Dcto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
000591-1	VARILLA 1/2" CORRUGADA	UNIDAD	0%	0.0%	1.00	29,500.00	29,500.00
002422-1	VARILLA 3/8" CORRUGADA	E	0%	0.0%	1.00	17,500.00	17,500.00
001406-1	ALAMBRE AMARRE NEGRO	KILO	0%	0.0%	1.00	6,500.00	6,500.00
000121-1	FLEJE 1/4 X KILO	KILO	0%	0.0%	1.00	5,500.00	5,500.00
000395-1	CEMENTO GRIS CEMEX BULTO X 50 KILOS	BULTO	0%	0.0%	1.00	33,500.00	33,500.00
002217-1	VIAJE GRAVILLA / 6 m³	UND	0%	0.0%	1.00	750,000.00	750,000.00
002218-1	VIAJE DE ARENA GRUESA	UND	0%	0.0%	1.00	350,000.00	350,000.00
004726-1	VIAJE PIEDRA	UNIDAD	0%	0.0%	1.00	600,000.00	600,000.00
002752-1	TRANSPORTE DE MATERIALES (RECEBO/DIAMANTE),	FLETE	0%	0.0%	1.00	130,000.00	130,000.00

SON : UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS* PESOS********** PESO: 61.31 KG

Observaciones: 0

SUBTOTAL ======>	$ 1,922,500.00
IMP->IVA ======>	$ 0.00
TOTAL ======>	$ 1,922,500.00

Elaboró

Aceptada y Recibida __/__/____

MATERIAL PUESTO EN OBRA V/BAJO JUNIN

Ferretería SurtiHerramientas Isnos

Alambres - Plásticos para Secaderos - Mallas - Polisombras - Materiales Eléctricos - Zinc
Cemento - Varilla - Herramientas en General - Pinturas y Todo lo Relacionado para Carpintería

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	03	24

COTIZACIÓN 0546

SEÑOR (ES): J. A-C. vereda Bayo Junin — NIT. 800247404
DIRECCION: Vereda Bayo Junin — TEL. 3128755556

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Kilo fleje 1/4	5.800	5.800
1	Da alquiler mezcladora	80.000	80.000
1	Hora alquiler de volta	77.000	77.000
1	Hora alquiler pajarita	120.000	120.000
1	transporte recebo x M^3	130.000	130.000
1	transporte piedra x M^3	90.000	90.000
1	transporte de mixto	94.000	94.000
1	transporte arena gruesa x M^3	60.000	60.000
1	transporte gravilla x M^3	132.000	132.000
1	Libra puntilla 2"	4.500	4.500
1	Kilo alambre negro	7.000	7.000
1	Varilla 3/8 x 6 mts.	17.500	17.500
1	Varilla 1/2 x 6 mts.	29.500	29.500
1	Bulto cemento cemex	34.000	34.000
1	Bulto cemento argos.	34.000	34.000

Pasados 15 dias, los precios de esta cotización pueden estar sujetos a cambios o ajustes

GRAN TOTAL 915.300

Recibido por: C.C. de

Entregado por: C.C. de

311 479 5815 Calle 4 N° 5-35 Isnos - Huila

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3391 DE 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN
INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - RL CARLOS ANDRÉS CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: WILDER SALAZAR

LABORATORIO

			EMPRESAS		
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**INDISUELOS**	**MECANICA DE SUELOS**	**DIFERENCIA**
APIQUES A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD - EL INFORME FINAL CONSTA DE: CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES, CBR INALTERADO, CBR SATURADO, RELACION HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO	2	Unidad	$900,000.00	$1,000,000.00	
DISEÑO DE CONCRETO 3000 PSI.	1	Unidad	$1,000,000.00	$600,000.00	
DENSIDAD DE CAMPO MÉTODO CONO DE ARENA	5	Unidad	$350,000.00	$500,000.00	
TRANSPORTE	1	Unidad	$250,000.00	$250,000.00	
ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR	1	Unidad	$170,000.00	$150,000.00	
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS.	20	Unidad	$400,000.00	$280,000.00	
BASE					
IVA			$ -	$ 528,200.00	
TOTAL			**$ 3,070,000.00**	**$ 3,308,200.00**	**$ - $ 238,200.00**

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE		anticipo
FORMA DE PAGO	50-50	CONTADO ANTICIPADO		$1,535,000.00
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIAS	15 DIAS		

Comité Operativo. **No:** **1**

Fecha Comité Operativo: **5/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

INDISUELOS

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE	$3,070,000.00
IVA	$0.00
RETENCION 10% O 11%	NO APLICA
ANTICIPO	$1,535,000.00
PARCIAL 2	$1,535,000.00
TOTAL	$3,070,000.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS	**Presidente JAC**	**Interventoria**

INDISUELOS

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	DISEÑO DE CONCRETO 3000 PSI.	Und	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
2	DENSIDAD DE CAMPO MÉTODO CONO DE ARENA	Und	1	$ 70.000	$ 70.000,00
3	TRANSPORTE	Und	1	$ 250.000	$ 250.000,00
4	ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR	Und	1	$ 180.000	$ 180.000,00
5	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS.	Und	1	$ 20.000	$ 20.000,00
7	ENSAYOS DE CARACTERIZACION PARA SUBBASE GRANULAR	Und	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000,00

PLAZO OFERTA	20 DÍAS CALENDARIO
PAGO	50% ANTES DE LOS INICIOS DE LOS TRABAJOS DE LABORATORIO, 50% CUANDO SE ENTREGUE EL INFORME.

INDISUELOS
INGENIERÍA - DISEÑO - SUELOS
NIT: 83.043.664 - 7

Atentamente:
Fernando Augusto Rojas Chaux
Gerente

INDISUELOS

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	APIQUES A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD EL INFORME FINAL CONSTA DE: CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES CBR INALTERADO, CBR SATURADO. RELACION HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO.	Und	2	$ 450.000	$ 900.000

VALOR EN LETRAS	NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE
PLAZO OFERTA	20 DÍAS CALENDARIO
PAGO	50% ANTES DE LOS INICIOS DE LOS TRABAJOS DE LABORATORIO, 50% CUANDO SE ENTREGUE EL INFORME.

INDISUELOS
INGENIERÍA - DISEÑO - SUELOS
NIT: 83.043.994 - 7

Atentamente:
Fernando Augusto Rojas Chaux
Gerente

DATOS DEL CLIENTE

PROPUESTA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO No. 54-24

NOMBRE	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN**
NIT	800247404-5
DIRECCIÓN	VDA BAJO JUNIN ISNOS HUILA
TELEFONO	3134293662
EMAIL	Burbanomarta03@gmail.com

Ref.: **ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, PARA PROYECTO DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA BAJO JUNÍN APROXIMADAMENTE A 12 Km DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA.**

ITEM	DESCRIPCION	NORMA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD					
1	Densidad seca máxima in situ (densidad de campo - cono y arena). (la empresa contratista deberá programar mínimo 3 densidades por visita.)	INV - E - 161	4	$ 100.000	$ 400.000
2	Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos. Norma INVIAS - E- 410 (incluye rotura del cilindro) (NOTA: el contratista deberá suministrar Las muestras cilíndricas en las instalaciones de nuestra oficina calle 2 no. 2-59 Valvanera) valor unitario	INV - E- 410	1	$ 14.000	$ 14.000
3	Ejecución de apique a una profundidad máxima de 1.5m		2	$ 500.000	$ 1.000.000
4	Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación) I.N.V.E 142	INV - E - 142	1	$ 150.000	$ 150.000
				SUBTOTAL	**$ 1.564.000**
				I.V.A (19%)	**$ 297.160**
				VALOR TOTAL	**$ 1.861.160**

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3391 DE 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN
INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - RL CARLOS ANDRÉS CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: WILDER SALAZAR

EXAMENES			**EMPRESAS**		
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**CALIDAD COLOMBIA**	**ARSOH**	**DIFERENCIA**
Valoracion medica ocupacional de ingreso	1	Unidad	$30,000.00	$30,000.00	
Visiometria	1	Unidad	$15,000.00	$20,000.00	
Audiometria	1	Unidad	$15,000.00	$20,000.00	
BASE					
IVA			$ -		
TOTAL			**$ 60,000.00**	**$ 70,000.00**	**$ -** $ 10,000.00

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE		anticipo
FORMA DE PAGO	100-100	CONTADO ANTICIPADO		$60,000.00
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIAS	2 DIAS		

Comité Operativo. **No:** **1**

Fecha Comité Operativo: **5/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

CALIDAD COLOMBIA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE	$60,000.00
IVA	$0.00
RETENCION 10% O 11%	NO APLICA
ANTICIPO	$60,000.00
PARCIAL 2	$0.00
TOTAL	$60,000.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

vidor lopez

Presidente JAC

Interventoria

CALIDAD COLOMBIA® SERVICES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Res. Habilitación 1932/2020 expedida por SecSalud Deptal Huila
Licencia 2401/2015 SecSalud Deptal Huila

COTIZACIÓN SOLICITADA

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VALORACION MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO	1	$30,000
VISIOMETRIA	1	$15,000
AUDIOMETRÍA	1	$15,000
	Total	$60,000

AQUÍ LO TIENES ¡TODO!

Pitalito Huila, 02 de febrero del 2024.

Sres.
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN

Asunto: Propuesta exámenes médicos ocupacionales y valoraciones complementarias.

Respetuoso saludo.

Por medio de la presente me permito presentar la propuesta para realizar las evaluaciones médicas ocupacionales y valoraciones complementarias para dar cumplimiento a la resolución 2346 de 2007 y resolución 1918 de 2009 en materia de seguridad y salud en el trabajo.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	Paquete de exámenes médicos. Valoración médica osteomuscular, audiometría, Visiometria, laboratorios (Colesterol, glicemia, Triglicéridos).	$ 70.000	N/A	$ 70.000
1	Valoración medica osteomuscular	$ 30.000	N/A	$ 30.000

OLGA MERIET PÉREZ
Representante legal APSOH
"Por su seguridad al mejor nivel"
Lic. En Seguridad y Salud en el Trabajo N° 0346/2018

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3391 DE 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN
INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - RL CARLOS ANDRÉS CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: WILDER SALAZAR

DOTACION

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	EMPRESAS: SERVIDOTACIONES DEL	DOTATEX	HYM DOTACIONES	DIFERENCIA
Casco Industrial con certificación ansi con rache para obrero	7	Unidad	$161,000.00	$182,000.00	$210,000.00	
Bota en caucho punta de acero para obrero	7	Unidad	$595,000.00	$532,000.00	$560,000.00	
Gafa industrial unilente clara protectora	7	Unidad	$31,500.00	$42,000.00	$49,000.00	
Guante de Carnaza corto reforzado	14	Unidad	$105,000.00	$154,000.00	$133,000.00	
Guante baqueta corto reforzado	14	Unidad	$140,000.00	$154,000.00	$133,000.00	
Tapa oídos de inserción siliconado	14	Unidad	$35,000.00	$56,000.00	$56,000.00	
Botiquín Tipo A	1	Unidad	$120,000.00	$130,000.00	$160,000.00	
Uniforme (Camisa jeans caballero).	7	Unidad	$210,000.00	$220,500.00	$210,000.00	
Uniforme (Jeans rigido caballero).	7	Unidad	$210,000.00	$220,500.00	$210,000.00	
Uniforme (Bota dielectrica negra).	7	Unidad	$455,000.00	$560,000.00	$560,000.00	
Cinta de demarcación L=500 M	2	Unidad	$56,000.00	$74,000.00	$70,000.00	
Cono de señalización en Plástico h=70 cm reforzado	2	Unidad	$110,000.00	$130,000.00	$110,000.00	
Paleta de señalización PARE-SIGA	2	Unidad	$48,000.00	$54,000.00	$50,000.00	
Caneca Plástica 55 gal para residuos	3	Unidad	$225,000.00	$201,000.00	$225,000.00	
BASE						
IVA			$ -			
TOTAL			**$ 2,501,500.00**	**$ 2,710,000.00**	**$ 2,736,000.00**	$ 234,500.00

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	anticipo
FORMA DE PAGO	100-100	CONTADO ANTICIPADO	$2,501,500.00
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIAS	15 DIAS	

Comité Operativo. **No:** **1**

Fecha Comité Operativo: **5/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

SERVIDOTACIONES DEL HUILA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE	$2,501,500.00
IVA	$0.00
RETENCION 10% O 11%	NO APLICA
ANTICIPO	$2,501,500.00
PARCIAL 2	$0.00
TOTAL	$2,501,500.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

Presidente JAC

Interventoria

Respetados señores,

Nos complace dirigirnos a usted para saludarle cordialmente y a la vez le presentamos a SERVIDOTACIONES DEL HUILA. Nuestra permanencia en el mercado nos proporciona una amplia experiencia, promoviendo un modelo empresarial que busca anticipar y gestionar de forma responsable tanto los riegos laborales y desafios derivados del desarrollo sostenible, como en las oportunidades que surgen del mismo. Contamos con el mejor talento humano para acompañarlo y asesorarlo ante todos sus requerimientos, seremos su aliado industrial.

Esperamos que después de analizar nuestra presentación poder llegar a ser su proveedor habitual y de confianza

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	TOTAL
CASCO TIPO I AJUSTE DE RACHET	7	$ 23.000	$ 161.000
BOTA PVC CAÑA ALTA NEGRA SEGURIDAD	7	$ 85.000	$ 595.000
BOTA PU RH SEG DIELECTRICA NEGRA	7	$ 65.000	$ 455.000
GAFA 818 TRANSPARENTES	7	$ 4.500	$ 31.500
GUANTE VAQUETA CORTO REFORZADO	14	$ 7.500	$ 105.000
GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO	14	$ 10.000	$ 140.000
DELANTAL CARNAZA	5	$ 25.000	$ 125.000
CARETA PARA GUADAÑAR	5	$ 25.000	$ 125.000
TAPAOIDO INSERCION SILICONA	14	$ 2.500	$ 35.000
BOTIQUIN TIPO MORRAL DOTADO	1	$ 120.000	$ 120.000
CAMISA JEAN CABALLERO 8ONZ TALLA S, M, L, XL TALLA 2XL, 3XL TIENEN COSTO ADICIONAL	7	$ 30.000	$ 210.000
CINTA REFLECTIVA BASE EN REATA DE 5CM COLOR NARANJA CON GRIS - 2 LOGOS EN PECHO	7	$ 35.000	$ 245.000
JEAN RIGIDO CABALLERO 14ONZ TALLA 28, 30, 32, 34, 36 TALLA 38, 40, 42 TIENEN COSTO ADICIONAL	7	$ 30.000	$ 210.000
CINTA REFLECTIVA BASE EN REATA DE 5CM COLOR NARANJA	7	$ 15.000	$ 105.000
CINTA PELIGRO X 500 METROS	2	$ 28.000	$ 56.000
CONO SEÑALIZACIÓN PVC DOBLE CINTA REFLECTIVA	2	$ 55.000	$ 110.000
PALETA SEÑALIZACIÓN PARE - SIGA	2	$ 24.000	$ 48.000
PAPELERAS TAPA VAIVEN 55 LITROS	3	$ 75.000	$ 225.000
TOTAL			**$ 3.101.500**

PITALITO, 14 DE MARZO 2024

SEÑOR
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN
NIT 800247404
ISNOS

DOTATEX
protege sobre todo

COTIZACION

Atendiendo a su solicitud cotizo los siguientes productos:

ITEM	DESCRIPCION	UND MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caco de seguridad con ratche	UND	7	$ 26.000	$ 182.000
2	Bota en caucho en puntera de seguriad ROBUSTA	PAR	7	$ 76.000	$ 532.000
3	Gafa de proteccion lente claro y oscuro en policarbonato	UND	7	$ 6.000	$ 42.000
4	Guante tipo ingeniero reforzado corto	PAR	14	$ 11.000	$ 154.000
5	Careta para guadañar en malla	UND	2	$ 37.000	$ 74.000
6	Protector auditivo de insercion en silicona con cordon y estuche	UND	14	$ 4.000	$ 56.000
7	Botiquin tipo morral para establecimiento	UND	1	$ 130.000	$ 130.000
8	Traje en tela antifluido de lafayette	UND	7	$ 135.000	$ 945.000
9	Cinta señalixacion peligro rollo X 100 metros	UND	2	$ 16.000	$ 32.000
10	Cinta señalixacion peligro rollo X 350 metros	UND	2	$ 29.000	$ 58.000
11	Cinta señalixacion peligro rollo X 500 metros	UND	2	$ 37.000	$ 74.000
12	Paleta de señalizacion PARE/ SIGA	UND	2	$ 27.000	$ 54.000
13	Cono de selalizacion base negra con cinta reflectiva x 45 cm	UND	2	$ 47.000	$ 94.000
14	Cono de selalizacion base negra con cinta reflectiva x 70 cm	UND	2	$ 65.000	$ 130.000
15	Bota en cuero REF 1520 ALPACA con puntera de seguridad	PAR	2	$ 80.000	$ 160.000
16	Conjunto impermeable calibre 16 X 2 piezas color amarillo con cinta reflectiva	UND	2	$ 63.000	$ 126.000
17	Papelera vaiven de 55 litros (verde, negra, blanca y roja)	UND	3	$ 67.000	$ 201.000
				TOTAL	**$ 3.044.000**

Validez de la oferta: 30 dias calendario a apartir de la fecha de solicitud

Ciudad y Fecha: Pitalito 12 de marzo de 2024

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN

Teléfonos: 3134293662
Dirección VDA BAJO JUNIN
Pitalito – Huila

Referencia: Cotización

H&M DOTACIONES donde brindamos protección individual y grupal para tus trabajadores, contando con productos de la mejor calidad y garantía para tu tranquilidad. No olvides la importancia de utilizar los elementos de protección adecuados en tu labor diaria todas las marcas certificadas.

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VR UNIDAD	VR TOTAL
1	CASCO INSAFE CERTIFICADO RACHET	7	30.000	210.000
2	BOTA CERRO SEGURIDAD	7	80.000	560.000
3	GAFA INDUSTRIAL CLARA	7	7.000	490.000
4	GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO	14	9.500	133.000
5	GUANTE VAQUETA CORTO REFORZADO	14	9.500	133.000
6	PETO CARNAZA	5	30.000	150.000
7	CARETA GUADAÑAR	2	37.000	74.000
8	TAPAOIDO INSERCION SILICONADO	14	4.000	56.000
9	BOTIQUIN TIPO A	1	160.000	160.000
10	CAMISA JEAN HOMBRE	7	30.000	210.000
11	JEAN HOMBRE	7	30.000	210.000
12	CINTA PELIGRO 500M	2	35.000	70.000
13	CONO REFLECTIVO 70 CM	2	55.000	110.000
14	PALETA PARE Y SIGA	2	25.000	50.000
15	CANECA PLASTICA 55 LT FULLER	3	75.000	225.000
16	BOTA HEROS HM SEGURIDAD	1	80.000	80.000
SUBTOTAL				**2.454.621**
IVA 19%				**466.379**
TOTAL				**2.921.000**

Esta cotización tiene una vigencia de 8 Dias

Nit: 1083890262-3
CALLE 10 # 2 – 47 PITALITO HUILA
3115842259 – 3162346575
hymdotaciones@gmail.com
Responsables De IVA

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3391 DE 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN
INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - RL CARLOS ANDRÉS CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: WILDER SALAZAR

AGREGADOS PETREOS Y TRANSPORTE

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PETREOS - MINA FUEGO**	**FERRETERIA ANDINA**	**DISMETRIC SAS**	**INDUCON**
ARENA GRUESA	1	M3	$27,766.00	$27,766.00		$59,500.00
GRAVILLA 1/2 - 3/4	1	M3	$101,150.00	$101,150.00	$101,150.00	$101,150.00
SUD BASE GRANULAR	1	M3	$67,830.00	$67,830.00	$65,450.00	$77,350.00
PIEDRA PARA CONCRETO CICLOPEO	1	M3		$95,200.00	$95,200.00	$101,150.00
RECEBO	1	M3		$13,090.00		$13,090.00
MIXTO PREMEZCLADO	1	M3	$77,350.00	$77,350.00	$77,350.00	
ARENA TRITURADA	1	M3	$47,600.00	$47,600.00	$47,600.00	$47,600.00
BASE						
IVA			$ -			
TOTAL			**$ 321,696.00**	**$ 429,986.00**	**$ 386,750.00**	**$ 399,840.00**

Materiales puestos en obra.

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	CON TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE
FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA				

	CANTIDAD	**UNIDAD**	**FERRETERIA ANDINA**	**PETREOS COLOMBIA**
TRANSPORTE DESDE PLANTA PETREOS COLOMBIA-FUEGO VERDE, DISMETRIC	1	M3	$ 31,000.00	$ 32,000.00
TRANSPORTE DESDE PLANTA INDUCON	1	M3	$ 38,000.00	$ 50,000.00
TOTAL			**$ 69,000.00**	**$ 82,000.00**
Precio por m3		VIAJE/7 M3	**$ 217,000.00**	**$ 224,000.00**
		VIAJE/7 M3	**$ 266,000.00**	**$ 350,000.00**
FORMA DE PAGO			CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO ANTICIPO
TIEMPO DE ENTREGA			1 dia	1 dia

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **2/06/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

DISMETRIC PARA PIEDRA CICLOPEO
- GRAVILLA 3/4 PETREOS - SUB BASE GRANULAR
ARENA GRUESA FUEGO VERDE
TRANSPORTE FERRETERIA ANDINA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA PETREOS COLOMBIA - FUEGO VERDE - DISMETRIC- TRANSPORTE DE FERETERIA ANDINA
BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%
PARCIAL 1

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

Presidente JAC

Interventoria

San Agustín Huila, 3 de marzo año

2024

Señores

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN
NIT: 800247404-5

ASUNTO: COTIZACIÓN.

Respetados señores, atendiendo su amable solicitud, FUEGO VERDE. S.A.S. ponemos a su consideración la cotización sobre materiales de construcción.

Se adjunta la siguiente relación:

	VALOR MT^3 MATERIAL		
MATERIAL	**VR MT^3**	**IVA 19%**	**VR TOTAL**
ARENA GRUESA	$23.333	$4.433	$27.766

Consideraciones:

- El cliente deberá informar y enviar a la persona encargada de recibir el material en la Planta de Pétreos, quien a su vez será el (o la) responsable de comprobar la calidad del material, por lo que no se aceptaran reclamos ni devoluciones.

Forma de Pago.

- Anticipo por valor del 50%
- Pagos Quincenales según corte realizado amortizando anticipos.

A consideración del cliente los pagos se podrán consignar a la siguiente cuenta:

Vda Matanzas, San Agustín Huila Colombia
Celular: 3233229402- 3108004409
Email: emperatriz0473@hotmail.com

cuenta de Ahorros No. 45349755134 de Bancolombia a nombre de EMPERATRIZ MUÑOZ BOLAÑOS.

- Una vez realizado el pago, enviar soporte por medio de WhatsApp 311 5200224 o WhatsApp 313 2744816

EMPERATRIZ MUÑOZ
Representante legal

Vda Matanzas, San Agustín Huila Colombia
Celular: 3233229402- 3108004409
Email: emperatriz0473@hotmail.com

Pitalito, Huila 6 de marzo año 2024

Señores:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN
NIT: 800247404-5

ASUNTO: COTIZACIÓN

Respetados señores, atendiendo su amable solicitud, PETREOS COLOMBIA. S.A.S. ponemos a su consideración la cotización sobre materiales de construcción.

Se adjunta la siguiente relación:

MATERIAL	VALOR M3	IVA M3	VALOR M3 IVA INCLUIDO
GRAVILLA ¾ - ½	$ 85.000	$ 16.150	$ **101.150**
MIXTO DE RIO	$ 45.000	$ 8.550	$ **53.550**
BASE	$ 80.000	$ 15.200	$ **95.200**
SUB- BASE	$ 57.000	$ 10.830	$ **67.830**
PREMEZCLADO	$ 65.000	$ 12.350	$ **77.350**
ARENA TRITURADA	$ 40.000	$ 7.600	$ **47.600**

El suministro de Pétreos contempla:

- Los valores indicados no incluyen transporte, este servicio será adicionado al valor de la cotización, ponemos a su disposición transporte Doble Troque, desde la Planta de Pétreos ubicada en Vereda Matanzas kilómetro 21 vía San Agustín. Valor kilometro $1.000 pesos Mct

Consideraciones:

- El cliente deberá informar y enviar a la persona encargada de recibir el material en la Planta de Pétreos, quien a su vez será el (o la) responsable de comprobar la calidad del material, por lo que no se aceptaran reclamos ni devoluciones.
-

Av. 3 No. 19-276 Sur Pitalito Huila Colombia
Teléfono: (57) (8) 836 91 28 - 3156272801
Email: petreoscolombia@gmail.com

FECHA 06/03/2024

PITALITO HUILA

SEÑORES
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN
NIT: 800247404-5

ASUNTO COTIZACION No.0064

Cordial saludo,

Le escribimos con el fin de darle respuesta a su solicitud de cotización de los siguientes materiales puestos en planta.

PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SUBBASE GRANULAR	1	$ 55.000	$ 55.000
PIEDRA CICLOPIO	1	$ 80.000	$ 80.000
PREMEZCLADO DE 3/4	1	$ 65.000	$ 65.000
PREMEZCLADO ½	1	$ 65.000	$ 65.000
GRAVILLA DE 3/4	1	$ 85.000	$ 85.000
GRAVILLA DE ½	1	$ 90.000	$ 90.000
ARENA TRITURADA	1	$ 40.000	$ 40.000

Los valores no incluyen Iva



FERRETERIA ANDINA ISNOS

Nit: 36113838-1

Dirección: CR4 6 25

Telefono: 3142380576

Responsabilidad: Responsable de IVA (régimen común)

COTIZACÍON
691

Resp: ELIZABETH ZUÑIGA SAMBONI

Fecha 2024-03-08
Fecha Final 2024-03-08
-

Cliente : JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN **Nit** / CC: 800247404

Telefono: 3128755556 **Direccion:**VEREDA BAJO JUNIN

CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	BASE	VAL DES	DES	V TOTAL
Editable	TRANSPORTE MATERIALES INDUCON X MTR3	7.00	38,000.0	0.00	0%	266,000.00
Editable	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS X MTR3	7.00	31,000.0	0.00	0%	217,000.00

ITEMS	2	SUBTOTAL	483,000.00	DESCUENTO	0.00	SUBTOTAL	483,000.00	IVA	0.00	TOTAL	483,000.00

COMENTARIO : ANTICIPO 50% Y PAGOS PARCIALES SEMANALMENTE DE ACUERDO A LAS ENTREGAS.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3391 DE 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN
INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - RL CARLOS ANDRÉS CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: WILDER SALAZAR

MAQUINNARIA

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**FERRETERIA ANDINA**	**RODRIGO LARA**	**ANDRES PALACIOS**	**FERRETERIA SURTI**
MOTONIVELADORA	1	HORAS	$ 150,000.00	$ 150,000.00		
RETROEXCAVADORA	1	HORAS	$ 110,000.00	$ 120,000.00	$ 130,000.00	$ 120,000.00
VIBRO COMPACTADOR	1	HORAS	$ 150,000.00			
TRANSPORTE VIBRO	1	GLOBAL	$ 700,000.00			
MEZCLADORA 1 BULTO	1	DIA	$ 70,000.00		$ 100,000.00	$ 80,000.00
VIBRO ELECTRICO PARA CONCRETO	1	DIA	$ 50,000.00			$ 50,000.00
VOLQUETA SENCILLA 7 M3	1	HORAS	$ 67,000.00		$ 70,000.00	$ 77,000.00
BASE			**$ 1,297,000.00**	**$ 270,000.00**	**$ 300,000.00**	**$ 327,000.00**
IVA			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL			**$ 1,297,000.00**	**$ 270,000.00**	**$ 300,000.00**	**$ 327,000.00**

TRANSPORTE	Transporte vibro 100%			
FORMA DE PAGO	100% transp vibro, 50% alquiler			
TIEMPO DE ENTREGA				

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo:

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

FERRETERIA ANDINA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE
IVA
RETENCION 1%
TOTAL A TRANSFERIR

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

Presidente JAC

Interventoria

Pitalito Huila, 2 abril 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITO
Vereda Brazuelito

Asunto: Cotización maquinaria y equipo

Cordial Saludo

De acuerdo a lo solicitado relacionamos el alquiler de la maquinaria para la zona

Descripción	Unidad	Valor
Alquiler de Vibrocompactador	Hr	$ 130.000
Transporte de vibrocompactador	Viaje	$ 700.000
Alquiler de Mezcladora 1 Bulto	Dia	$ 85.000

Nota: El servicio se presta usando vibrocompatador mínimo 5 horas por día y mínimo 5 días

Forma de pago:
El transporte se debe consignar en un 100%
Anticipo del 50% del total del servicio de alquiler.
Pagos quincenales según corte realizado amortizando el anticipo.

Cordialmente,



MAURICIO SIERRA
C.C. 12.241167 Pitalito-Huila

Suaza, 02 abril 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITO
Vereda Brazuelito

Asunto: Cotización mezcladora

Cordial Saludo

Descripción	Unidad	Valor
Alquiler de Mezcladora 1 Bulto	Dia	$ 70.000

Nota: El transporte del sitio donde se encuentra el vibro se encarga el contratante.

Forma de pago:
Anticipo del 50% del total del servicio de alquiler.
Pagos quincenales según corte realizado amortizando el anticipo.

Cordialmente,



ALEXANDER RAMOS
C.C. 1.110.570.334 Ibagué - Tolima

4 abril 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITO
NIT: 813.002.300
Vereda Brazuelitos

Asunto: Cotización de materiales pétreos

Cordial Saludo

Atendiendo su requerimiento de cotización para el transporte de materiales pétreos con una distancia aproximada desde la planta hasta el sitio de la obra de 30 km, los precios que le ofrezco son los siguientes:

Descripción	Unidad	Valor
Transporte en volqueta de 7m3 Distancia aprox. 95 km	Viaje	$ 798.000
Alquiler de retroexcavadora de llantas	Hora	$ 130.000

Nota: El valor ofertado no incluye retenciones

Forma de pago:
Anticipo del 50% del total de los viajes acordados.
Pagos quincenales según corte realizado amortizando el anticipo.

Cordialmente,

Orlando Cano R.

ORLANDO CANO RODRIGUEZ
C.C. 4.88.628 Altamira-Huila

CONSTRUEQUIPOS YEY

ALQUILER DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION

ANA YEY SIERRA

NIT. 36.287.440-0

COTIZACIÓN N° 001

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITOS

NIT. 813.002.300-3

POR CONCEPTO: ALQUILER DE EQUIPO OBRA MUNICIPIO DE SUAZA
FECHA: 02/04/2023

CANT	DESCRIPCIÓN	V. DÍA	V. MENSUAL
1	Mezcladora Bulto	$ 70.000	$ 1.500.000
1	Vibro electrico, Diesel o a Gasolina	$ 50.000	$ 700.000
	IVA 19%		

NOTA: DEPÓSITO INICIAL 100% DEL VALOR TOTAL
Una vez realizado el pago, se entregan las herramientas
LA FACTURA SE EXPIDE AL FINAL DE TODO EL PAGO
SI NECESITA FACTURA ELECTRÓNICA VA MÁS IVA 19%
El cliente se compromete a entregar los equipos en el estado en que se le entregan.

Ana Yey Sierra V.

ANA YEY SIERRA
CC.36.287.440-0
CEL.314 304 6000 - 314 264 4882

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3391 DE 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN
INTERVENTOR: CONSORCIO R&C - RL CARLOS ANDRÉS CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: WILDER SALAZAR

VALLA INFORMATIVA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	EMPRESAS: TALLER DE CARPINTERIA Y	EMPRESAS: METALICAS VIZVAYA	DIFERENCIA
Vaya publicitaria de 2x1 metros, con soporte en ángulo de pulgada y media, instalada	1	Unidad	$400,000.00	$450,000.00	
BASE					
IVA			$ -		
TOTAL			**$ 400,000.00**	**$ 450,000.00**	**$ -** $ 50,000.00

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE		anticipo
FORMA DE PAGO	70-30	CONTADO ANTICIPADO		$400,000.00
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIAS	2 DIAS		

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo:

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

TALLER DE CARPINTERIA Y HIERRO MUÑOZ

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA	1
BASE	$280,000.00
IVA	$0.00
RETENCION 10% O 11%	NO APLICA
ANTICIPO	$400,000.00
PARCIAL 2	-$120,000.00
TOTAL	$280,000.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS	Presidente JAC	Interventoria
	victor lopez	

TALLER DE CARPINTERÍA EN HIERRO Y ALUMINIO MUÑOZ

VIDRIERÍA Y MARQUETERÍA PICASSO

Isnos Huila, 02 de Abril de 2024

Señores:
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA BAJO JUNIN ISNOS HUILA
NIT:800247404-5

Ref: Cotización

Cordila saludo,

Somos una empresa la cual ofrecemos los servicios de ornamentación, estructuras, puertas ventanas, rejas en hierro y aluminio, y todo los relacionado con vidrios.

COSTOS DETALLADOS DE LA COTIZACION

Producto o servicio	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Vaya publicitaria de 2x1 metros, con soporte en ángulo de pulgada y media, instalada	1	$400.000	**$400.000**
		Subtotal	**$400.000**
		TOTAL	**$400.000**

Cotización válida hasta la fecha: 02 / 05 / 2024

Para constancia firma:

CARLOS HERLEY MUÑOZ ÑAÑEZ
GERENTE

LA PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DENOMINADO "METALICAS VIZVAYA " UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA.

REF: COTIZACION

Isnos Huila, 01 de Abril de 2024

Señores:
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO JUNIN ISNOS HUILA
NIT:800247404-5

COSTOS DE COTIZACION

Producto o servicio	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Vaya publicitaria con soporte en ángulo de 1 – ½ ", instalada	1	$450.000	**$450.000**
		TOTAL	**$450.000**

Cotización válida hasta la fecha: 01 / 05 / 2024

Para constancia firma:

EDWIN VIZCAYA
C.C. 79.765.228 Exp. Bogotá D.C.
Cel: 313 244 74 25
GERENTE

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 002	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 24/04/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Puerto Quinchana – San Agustín - Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 4727 de 2023 – Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Ejecutor(es): JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
HENRY MARTINEZ	JAC PUERTO QUINCHANA	PRESIDENTE
DIANA CAROLINA ANACONA	JAC PUERTO QUINCHANA	ING RESIDENTE DE OBRA
KAREN MARYORI SALAMANCA	VEEDURIA	VICEPRESIDENTE
CARLOS CHAVARRO	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA
IVAN SANDOVAL	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Revisión y aprobación de hojas de vida
2. Revisión y aprobación de cotizaciones presentadas

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Evaluación del personal propuesto por la Junta de Acción Comunal Ingeniero Residente, Contador Público y Maestro de Obra.

2- Revisión, socialización y aprobación de cotizaciones presentadas por la Junta de Acción Comunal, las cotizaciones a revisar con las siguientes:

- Cotizaciones para Estudio de suelos
- Cotizaciones para Topografía y Diseño geométrico
- Cotizaciones para Materiales de ferretería
- Cotizaciones para Transporte de Materiales de ferretería Cemento y Acero
- Cotizaciones de Agregados pétreos y transporte de agregados pétreos
- Cotizaciones de Alquiler de maquinaria

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar).*

Tema	Resumen
1.	La junta de acción comunal realizo envió por medio de correo electrónico a la interventoría, su revisión y aprobación, la interventoría manifiesta que efectivamente ya se realizó la revisión del personal propuesto para Ing. Residente, Contador público y Maestro de obra, y anexo a esta acta de comité operativo se relaciona la evaluación respectiva de cada personal concluyendo lo siguiente: Ing. Residente: ING. DIANA CAROLINA ANACONA LASSO C.C 1.061.727.444 Popayán Cauca M.P. 19202-286285 CAU 01/10/2014 Contador público: Maestro de obra: DUBIER ARBEY MALES ROMERO C.C 1.082.774.042 San Agustín Huila
2.	La junta de acción comunal realizó envío de las cotizaciones presentadas por cada actividad, de las cuales la interventoría realiza un comparativo el cual se socializa en este comité operativo. • Las cotizaciones presentadas para los estudios de suelos: Presentan dos cotizaciones: 1. MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS. 2. INDISUELOS La interventoría manifiesta que es necesario que con el laboratorio que se trabaje para los estudios de suelos también se trabaje para la realización de los ensayos de laboratorios que se requieren, por tal motivo es necesario que la JAC cotice los ensayos de laboratorio tanto para la subbase y concretos que se requieren. • Las cotizaciones para Topografía y Diseño geométrico: Presenta tres cotizaciones: 1. D&D INGENIERIA 2. PLANEACION Y PROYECTOS 3. YULIAN ALBERTO LOSADA RAMOS La interventoría manifiesta que de acuerdo a las cotizaciones presentadas todas están ofreciendo el mismo servicio, adicional de la topografía y el diseño geométrico realizan diseño estructural y materialización localización y replanteo.

	• Las cotizaciones para Materiales de ferretería: Presenta ocho cotizaciones precios por unidad de medida unitaria: 1. FERROPLAS 2. CONSTRUCASA 3. FERRETARIA AGRARIA 4. FERRETERIA IDEAL 5. HIERROS SAN AGUSTIN 6. FERRETERIA ANDINA 7. CONSTRUIMOS DEL HUILA 8. FRANCISCO JAVIER SOTELO CERON La interventoría manifiesta que de acuerdo a todas las cotizaciones que se presentaron para la compra de cemento y acero es viable utilizar el precio más económico. Por parte de la JAC Ing. residente manifiesta que es evidente que el cemento que se cotizó más económico es el de marca San Marcos, de igual forma las condiciones de la zona, se requiere que se pueda trabajar con un cemento el cual tenga buenos componentes; el presidente opina que quisiera que los materiales que se vayan a comprar sean de buena calidad con el fin de garantizar una buena construcción de la obra; de igual forma la veeduría manifiesta que la experiencia que tiene Ing. residente en la zona que ya ha construido obras se tenga en cuenta. De acuerdo con lo anterior la interventoría sugiere que se trabaje con los materiales más económicos independientemente de la marca porque todos los materiales tienen su propia composición para tal fin, en el caso del cemento cualquier marca que se use se realiza un diseño de mezcla para conocer las dosificaciones exactas para el concreto, de igual modo con el acero. Dentro de las cotizaciones que se presentan dos empresas diferentes ofrecen el precio mas económico para cada material, se sugiere que los materiales que se compren sean en una sola empresa y que esta cumpla con las condiciones legales para realizar las compras. • Las cotizaciones para Transporte de Materiales de ferretería Cemento y Acero: Para transporte de cemento presenta dos cotizaciones: 1. JOHN FREDDY RENZA JOAQUI 2. YOLIMA ERLINDA MUÑOZ BOLAÑOS Las cotizaciones especifican que el costo que ofrecen es por viaje de 200 bultos. Para transporte de acero presenta dos cotizaciones: 1. LIDIER ALBEIRO FERNANDEZ PEREZ 2. CRISTIAN DAVID ARGOTE LASSO Las cotizaciones especifican que es un solo viaje de acero de 3/8” • Las cotizaciones de Agregados pétreos y transporte de agregados pétreos: Presenta tres cotizaciones para la compra de materiales pétreos: 1. INDUCON 2. PETREOS COLOMBIA 3. FERRETERIA ANDINA

	La interventoría manifiesta que donde se realice la compra de los materiales pétreos este debe tener licencia o certificación ambiental para la comercialización de este tipo de materiales. Por parte de la JAC Ing. Residente manifiesta que dentro de la zona esta situada una cantera la cual cuenta con un material tipo afirmado de muy buen comportamiento para que sea reemplazado por la Subbase granular tipo c que se exige dentro del presupuesto, pero que esta cantera no cuenta con ningún permiso para la explotación; la interventoría manifiesta que son directrices de que el material pétreo de playa que se compre este debe venir debidamente certificado ambientalmente para no tener problemas, de igual forma la JAC insiste en presentar una caracterización de ese material con el fin de ser evaluado. Presenta tres cotizaciones para el transporte de materiales pétreos: 1. PETREOS COLOMBIA 2. JOHN FREDDY RENZA JOAQUI 3. FERREANDINA Por parte de la JAC Ing. Residente manifiesta que las cotizaciones de que se presentan, la cotización de Pétreos Colombia el precio que ofrece es un viaje de 14 m3. La interventoría manifiesta que en comparación con las tres cotizaciones pétreos Colombia es la mas viable ya que los viajes rinden muchos más y más económicos. • Cotizaciones para Alquiler de maquinaria: Presenta dos cotizaciones: 1. JOHN FREDDY RENZA JOAQUI 2. JEFFER ALEJANDRO SALAMANCA ACOSTA Las dos cotizaciones que se presentan ofrecen el mismo precio por hora trabajada.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	De acuerdo a la evaluación realizada al personal ofertado por la JAC, y teniendo en cuenta que postularon a una persona para Ing Residente de obra, una persona para Contador público y una persona para maestro de obra, todos cumple de acuerdo a las exigencias del anexo técnico dentro del convenio. Por lo tanto, el comité aprueba que para: Ingeniero residente de obra sea: ING. DIANA CAROLINA ANACONA LASSO C.C 1.061.727.444 Popayán Cauca M.P. 19202-286285 CAU 01/10/2014

	Contador público sea: Maestro de obra sea: DUBIER ARBEY MALES ROMERO C.C 1.082.774.042 San Agustín Huila
2.	El comité operativo aprueba lo siguiente: • Se aprueba a el LABORATORIO INDISUELOS, obtiene voto positivo por parte del presidente y veedor, por mayoría de votos se concluye que se deja este laboratorio para realizar los estudios de suelos, de igual forma se deja la trazabilidad que hacen falta las cotizaciones para la realización de ensayos de laboratorio. Tanto el presidente como veeduría manifiestan que por ser la más económica y responsable, por lo tanto, la interventoría conociendo estas opiniones vota de manera positiva para que esta empresa realice los estudios de suelos. • Se aprueba a la empresa D&D INGENIERIA, obtiene voto positivo por parte del presidente y veedor, los cuales manifiestan que aparte de que es la cotización más económica, está ubicada en la misma zona y manifiestan que ya han realizado trabajos y son muy responsables, de acuerdo con esto la interventoría manifiesta que es la más viable debido a que ofrece un menos valor en comparación con las demás cotizaciones por tal motivo se vota positivamente por la empresa en mención. • Se aprueba y de acuerdo a lo socializado para la compra de ferretería la FERRETERIA HIERROS SAN AGUSTIN, ofrece los precios óptimos para que en esta se compre todos los materiales. Tanto el presidente como veeduría votan en positivo por esta ferretería, de igual forma la interventoría también vota en positivo debido a que esta ofrece todos los materiales para que la compra se haga en una sola ferretería. • Se aprueba al señor JOHN FREDDY RENZA JOAQUI para el transporte del Cemento, debido a que este ofrece la cotización más económica y además es de la zona, por lo tanto, el presidente, veedor e interventoría votan en positivo por el señor en mención. • Se aprueba al señor LIDIER ALBEIRO FERNANDEZ PEREZ para el transporte del Acero, ambas cotizaciones presentadas ofrecen el mismo precio y son personas de la zona, por lo tanto, el presidente, veedor votan en positivo por el señor en mención debido a que este fue el primero en presentar cotización, de igual forma

	la interventoría manifiesta que se tiene que tener en cuenta que las personas que se están presentando quedan aprobadas por mayoría de votos, pero se debe tener en cuenta que estas personas deben tener por lo menos RUT y Cuenta bancaria para poder ser contratadas por parte de la JAC. • Se concluye y de acuerdo a lo manifestado por la JAC se deja pendiente aun la empresa para la compra y el transporte de los materiales pétreos para otro comité operativo. • Se aprueba a el señor JOHN FREDDY RENZA JOAQUI para el alquiler de maquinaria pajarita, ambas cotizaciones presentadas ofrecen el mismo precio y son personas de la zona, por lo tanto, el presidente, veedor votan en positivo por el señor en mención debido a que este fue el primero en presentar cotización.
3.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Realizar los contratos pertinentes del personal aprobado: Ing. Residente de obra Contador publico Maestro de obra	JAC	Entre las semanas siguientes
Presentar cotizaciones pendientes: Ensayos de laboratorio Alquiler de maquinaria Valla	JAC	Entre las semanas siguientes

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Dotaciones Exámenes médicos		

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

HENRY MARTINEZ MARTINEZ

Nombre: **HENRY MARTINEZ MARTINEZ**
Cargo: Presidente JAC

Nombre: **CARLOS ANDRES CHAVARRO**
Cargo: Director Interventoría

Nombre: **DIANA CAROLINA ANACONA LASSO**
Cargo: Ing. Residente obra JAC

Nombre: **IVAN SANDOVAL CARDOZO**
Cargo: Interventoría

Nombre: **JESUS HUMBERTO NOGUERO**
Cargo: Presidente Veeduría ciudadana

Nombre: **JOHANNA MILDREY DIAZ RUIZ**
Cargo: Contador JAC

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4727 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

EXAMENES

			EMPRESAS		
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**AGREMIACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD**	**CALIDAD COLOMBIA**	
Paquete de exámenes médicos, valoración médica osteomuscular, audiometría,	1	UND	$ 100,000.00	$ 94,000.00	
TOTAL			**$ 100,000.00**	**$ 94,000.00**	

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	
FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA DE PROGRAMACION	1 DIA DE PROGRAMACION	

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **24/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesoreso JAC	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE	$94,000.00
IVA	$0.00
SERVICIOS 4 %	$0.00
TOTAL A TRANSFERIR	$0.00

PROVEEDOR SELECCIONADO

CALIDAD COLOMBIA

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

HENRY MARTINEZ MARTINEZ

Presidente JAC

Interventoria

Pitalito Huila, 02 de febrero del 2024.

Sres.
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA

Asunto: Propuesta exámenes médicos ocupacionales y valoraciones complementarias.

Respetuoso saludo.

Por medio de la presente me permito presentar la propuesta para realizar las evaluaciones médicas ocupacionales y valoraciones complementarias para dar cumplimiento a la resolución 2346 de 2007 y resolución 1918 de 2009 en materia de seguridad y salud en el trabajo.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	Paquete de exámenes médicos. Valoración médica osteomuscular, audiometría, Visiometria, laboratorios (Colesterol, glicemia, Triglicéridos).	$ 70.000	N/A	$ 70.000
1	Valoración medica osteomuscular	$ 30.000	N/A	$ 30.000

OLGA MERIET PÉREZ
Representante legal APSOH
"Por su seguridad al mejor nivel"
Lic. En Seguridad y Salud en el Trabajo N° 0346/2018

Celular: 3232921853
E-mail:
apsoh1014@gmail.com

Pitalito, 4 de abril del 2024

Señores:
JUNTA DE ACCION COMUNAL INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
SAN AGUSTIN

Asunto: Propuesta de servicios 2024

Cordial saludo:

Con el objeto de generar espacios de reflexión acerca de la seguridad y la salud en el trabajo, a la luz con lo enmarcado en el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y Resolución 0312 de 2019, queremos poner a su disposición nuestros servicios de Medicina Ocupacional.

Es de aclarar que la presente propuesta se hará con base al profesiograma manejado en el cual está sujeto a cambios o ajustes según sugerencia de la alta dirección, Medico Ocupacional o profesional en seguridad y salud en el trabajo, con base a identificación de nuevos peligros, riesgos, ausentismos y/o incapacidades.

De igual forma ofrecemos la certificación de personas en trabajo seguro en alturas en nuestro centro de entrenamiento autorizado por el Ministerio de Trabajo y certificado por **ICONTEC**. Reiteramos nuestro agradecimiento por confiar en **CALIDAD COLOMBIA SERVICES SAS**, empresa laboyana con Licencia en SST y Resolución de habilitación; prestamos servicios de Seguridad - Salud en el trabajo y seguridad vial, en nuestra propia sede ubicada en Pitalito, contando con buena referencia de nuestros clientes Cenconsud, Grupo Éxito, Aliadas para el progreso, Nexarte, Intra Pitalito, Terminal de Transporte de Pitalito, Alcaldia de Pitalito, Hospital de Pitalito, ESE Manuel Castro Tovar, Alcaldía de Saladoblanco, Grupo Dsierra, ESE Camilo Trujillo Silva, Supermercado Rubio, Cofco Colombia, Caravela, Milt Cofee Company, Connective, Sinergy, Alcaldia de Teruel, Alcaldia de Altamira, Bomberos Pitalito, Cootraslaboyana, Aerotrans, Hotel Internacional, Estación de Servicio Sideral, CEA Buen Conductor, Contratistas Guatipan, Baru Constructores, Ferreteria la Cordillera, Almacenes Olimpica, CEA El Portal, Banexport CEA El Portal, Camara de Comercio de Neiva, Colegio de la Presentacion, Colegio San Juan de Laboyos, SACS, Clip salud, Cendiatra, Labor Vida, Corhuila, Universidad Surcolombiana, Biorganicos del huila, Supermercado AZ, Lineas Timanco, Cootranslaboyana entre otros

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4727 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

FERRETERIA 156 metros

		EMPRESAS										EMPRESAS		
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**FERRETERIA FERROPLAST**	**FERRETERIA AGRARIA**	**HIERROS SAN AGUSTIN**	**FERRETERIA IDEAL**	**FERRETERIA ANDINA**	**JAVIER SOTELO**	**CASA CORONA SAN**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**FERRETERIA VALE**	**FERREHIERROS CABRERA**	**INPRODES**
CEMENTO													
CEMENTO CEMEX USO ESTRUCTURAL 42.5 kg	1		$ 34,500.00	$ 34,100.00	$ 34,000.00	$ 34,000.00				bultos	$0.00	$0.00	$0.00
CEMENTO ARGOS USO ESTRUCTURAL 42.5 kg	1		$ 34,199.00	$ 33,900.00						und	$0.00	$0.00	$0.00
CEMENTO SAN MARCOS USO GENERAL 50 kg	1		$ 31,500.00		$ 30,500.00					und	$0.00	$0.00	$0.00
CEMENTO ALION CORONA USO ESTRUCTURAL 42.5 KG	1							$ 33,400.00		und	$0.00	$0.00	$0.00
ACERO, ALAMBRE Y PUNTILLA													
VARILLA 1/2" PDR-60, Fy: 4200 kg/cm3	1	$ 30,000.00	$ 30,500.00	$ 28,300.00	$ 29,610.00					kg	$0.00	$0.00	$0.00
VARILLA 3/8" PDR-60, Fy: 4200 kg/cm3	1	$ 17,800.00	$ 17,000.00	$ 16,800.00	$ 16,400.00	$ 17,500.00	$ 16,000.00			lb	$0.00	$0.00	$0.00
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE	1	$ 6,000.00	$ 6,500.00	$ 6,100.00	$ 5,540.00	$ 7,000.00				lb	$0.00	$0.00	$0.00
puntilla de 2 1/2 pung	1									und	$0.00	$0.00	$0.00
puntilla 3 pulg	1									und	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE DE ACERO										bultos	$0.00	$0.00	$0.00
		LIDIER ALBEIRO FERNANDEZ TORO	**CRISTIAN DAVID ARGOTE LASSO**										
TRANSPORTE VIAJE DE ACERO	1	$ 300,000.00	$ 300,000.00										
BASE													
IVA											$ -	$ -	$ -
TOTAL													

TRANSPORTE	Si incluye	No incluye	Si incluye
FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA	2 DIAS	2 DIAS	4 DIAS

Comité Operativo. **No:** **2**
Fecha Comité Operativo: **24/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac		
Presidente JAC		
Interventoria		
Total Votos		

PROVEEDOR SELECCIONADO

FERRETERIA IDEAL
CRISTIAN DAVID ARGOTE LASSO

Firman en aprobación

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE	$	-
IVA	$	-
RETENCION	$	-
ANTICIPO 1	$	-

Supervisor INVIAS

HENRY MARTINEZ MARTINEZ
Presidente JAC

Interventoria

LUZ MARINA BRAVO GARCÉS
NIT : 26564302- 4
CL 3 11 30 34
- 3112282737
SAN AGUSTÍN - COLOMBIA

San Agustín, 29 de febrero de 2024

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO
Atn:
VRDA PUERTO QUINCHANA
3213797192
San Agustin-Huila . Colombia

Ref : Cotización V - 001 - 104

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0080011000001	ALAMBRE AMARRE NEGRO	KGM	1.00	5,042.00	5,042.00
0010002000003	VARILLA 3/8	UN	1.00	14,958.00	14,958.00

Total Bruto	20,000.00
IVA	3,800.00
IMPOCONSUMO	0.00
Total a Pagar	$23,800.00

Entrega: 15 días despues de recibir su orden de compra o pedido
Forma de Pago : Contado
Validez de la oferta: 15 días a partir de la fecha, febrero 29 2024

Cordialmente,

Luz Marina Bravo Garces

LUZ MARINA BRAVO GARCÉS

Elaborado e Impreso por Sligo

PAZ CHICANGANA MIRABAL
NIT : 4935958- 8
CARRERA 11 1A 65
3184089357 -
SAN AGUSTIN - COLOMBIA

San Agustin, 29 de febrero de 2024

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO
Atn:
VDA PUERTO QUINCHANA
3213797192
San Agustin-Huila . Colombia

Ref : Cotización V - 001 - 142

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Descripción	Unidad	Cantidad	ValorMovimientoMasImpVenta	ValorMovi
VARILLA CORRUGADA 3/8"*6M	UN	1.00	17.000,00	17.000,00

Total Bruto	14,286.00
IVA	2,714.00
Total a Pagar	$17,000.00

Entrega: días despues de recibir su orden de compra o pedido
Forma de Pago :
Validez de la oferta: 8 días a partir de la fecha, febrero 29 2024

Cordialmente,

Vendedor Principal

PAZ CHICANGANA MIRABAL

Elaborado e Impreso por Siigo

COTIZACIÓN

CONSTRUIMOS DEL HUILA SA

Ladrillo a ladrillo, somos Construimos, servicio y calidad, un camino de experiencia y trayectoria.

Almacén Carrera 3 #1 57, Pitalito Huila.
Bodega Calle 25 sur #2c-13 Barrio Madelena, Pitalito Huila.
Tel: 3173760682
ventaspitalito@construimos.com.co

COTIZACIÓN VENTAS N° 000703
FECHA 29 de febrero de 2024
ASESOR COMERCIAL FERNANDO FAJARDO
TELÉFONO 3159265175

DATOS CLIENTE

Empresa	**JUNTA ACCION COMUNAL DE LA VDA PUERTO QUINCHANA**
Cliente	
Dirección	**VDA PUERTO QUINCHANA**
Ciudad	**SAN AGUSTIN HUILA**
Teléfono	**3213797192**
Correo electrónico	

Estimados señores:

Atendiendo su amable solicitud, enviamos cotización de los productos requeridos, siendo para nosotros un placer poner nuestra empresa a su servicio.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO IVA	VR. TOTAL
311302	CEMENTO GRIS X 42,5 KG MARCA ARGOS USO ESTRUCTURAL	BULTO	1	$ 33.000	$ 33.000
321104	VARILLA CORRUGADA DE 3/8" X 6MT	BARRA	1	$ 16.456	$ 16.456
321501	ALAMBRE NEGRO X KG	KG	1	$ 5.500	$ 5.500
NOTA: ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO.				SUBTOTAL	$ 46.182
				IVA	$ 8.774
				TOTAL	**$ 54.956**

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA	**2 DIAS HABILES.**
VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA	2 DIAS.
TRANSPORTE	**RECOGER EN BODEGA.**
DESCARGUE	**NO APLICA.**

SOMOS RESPONSABLES DEL RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES DE ICA

GRACIAS POR SU CONFIANZA

AURA TERESA VARGAS CASTRO
NIT: 55180756-0
CALLE 5 #12-32
CELULAR: 3223270200
SAN AGUSTÍN – COLOMBIA

San Agustín, 29 de febrero de 2024

Señores:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO
Atn:
VEREDA PUERTO QUINCHANA
3213797192
San Agustín-Huila. Colombia

Ref: Cotización

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor bruto	Valor con Iva	Valor total
CEMENTO SAN MARCOS 50 KL	BULTO	800	26.386	31.400	25.120.000
CEMENTO ARGOS U.G. 50KL	BULTO	800	28.487	33.900	27.120.000
CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 40 KL	BULTO	800	28.067	33.400	26.720.000
CEMENTO CEMEX U.G 50KL	BULTO	800	28.655	34.100	27.280.000
VARILLA CORRGUDA 3/8 x 6mts DIACO		1	14.117	16.800	16.800

Total Bruto	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	0
Total a Pagar	0

ENTREGA: 15 días después de recibir su orden de compra o pedido

FORMA DE PAGO: Contado

TRASNPORTE: Entrega en bodega

VALIDEZ DE LA OFERTA: En la fecha solicitada debido a la variación de precio

Cordialmente,

AURA TERESA VARGAS CASTRO

Elaborado e Impreso por Siigo

San Agustín Huila, 19 de marzo de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
NIT: 8 9 1 1 0 3 5 5 3-7
Celular de Contacto: 3 2 1 3 7 9 7 1 9 2
Vereda Puerto Quinchana

REF: COTIZACION

Por medio del presente me permito presentar la presente COTIZACION referente en:

DESCRIPCION	MARCA	CALIBRE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
BARRA CORRUGADA DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO	Nacional	3/8”	1	$16.000,00

El producto será entregado en Obra, Forma de Pago de contado

Se anexa ficha técnica del Producto:

En espera de Poder servirle con responsabilidad quedo altamente agradecido

FRANCISCO JAVIER SOTELO CERON
Asesor de Ventas
Celular 312-3908891
Lugar de Residencia Calle 7 No. 18-21 Barrio El Samán
San Agustín Huila



FERRETERIA ANDINA ISNOS

Nit: 36113838-1

Dirección: CR4 6 25

Telefono: 3142380576

Responsabilidad: Responsable de IVA (régimen común)

COTIZACÍON
645

Resp: ELIZABETH ZUÑIGA SAMBONI

Fecha 2024-03-14
Fecha Final 2024-03-14
-

Cliente : JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA

Nit / CC: 891103553

Telefono: 3213797192

Direccion:VEREDA PUERTO QUINCHANA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	P UNID	BASE	IMP	IVA	VAL DES	DES	V TOTAL
781145	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X 50 KG	1.00	34,000.00	28,571.4	5,428.57	19%	0.00	0%	34,000.00
852738	PREMEZCLADO X M³	1.00	65,000.00	65,000.0	0.00	0%	0.00	0%	65,000.00
852735	ARENA GRUESA X M³	1.00	25,000.00	25,000.0	0.00	0%	0.00	0%	25,000.00
852734	GRAVILLA X M³	1.00	90,000.00	90,000.0	0.00	0%	0.00	0%	90,000.00
300457	ALAMBRE NEGRO X KG	1.00	7,000.00	5,882.4	1,117.65	19%	0.00	0%	7,000.00
68321	VARILLA 3/8 X 6 MTRS	1.00	17,500.00	14,705.9	2,794.12	19%	0.00	0%	17,500.00
521255	TRANSPORTE AGREGADOS M3XKM	1.00	2,000.00	2,000.0	0.00	0%	0.00	0%	2,000.00

ITEMS	7	SUBTOTAL	231,159.66	DESCUENTO	0.00	SUBTOTAL	231,159.66	IVA	9,340.34	TOTAL	240,500.00

COMENTARIO : VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DÍAS EL VALOR DEL TRANSPORTE AGREGADOS APLICA PARA VIAJES DE 6 A 7 METROS CÚBICOS MÍNIMO

LUZ MARINA BRAVO GARCÉS
NIT : 26564302- 4
CL 3 11 30 34
- 3112282737
SAN AGUSTÍN - COLOMBIA

San Agustín, 27 de febrero de 2024

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO
Atn:
VRDA PUERTO QUINCHANA
3213797192
San Agustin-Huila . Colombia

Ref : Cotización V - 001 - 100

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0010001000001	CEMENTO SAN MARCOS U.G. 50KL	BULTO	800.00	26,471.00	21,176,471.00
0010001000008	CEMENTO GRIS CEMEX U.G 50KL	BULTO	800.00	28,824.00	23,058,824.00
0010001000003	CEMENTO ARGOS U.G. 50 KL	BULTO	800.00	28,739.00	22,991,597.00

Total Bruto	67,226,892.00
IVA	12,773,108.00
IMPOCONSUMO	0.00
Total a Pagar	$80,000,000.00

Entrega: 20 días despues de recibir su orden de compra o pedido
Forma de Pago : Contado
Validez de la oferta: 15 días a partir de la fecha, febrero 27 2024

Cordialmente,

Luz Marina Bravo Garces

LUZ MARINA BRAVO GARCÉS

Elaborado e Impreso por Sligo

CONSTRUCASA

COTIZACION

FECHA SAN AGUSTIN: 27/02/2024

	JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA INSPECCION DE PUERTO QUINACHAN
Nit	891103553
Atn.	
Obra	
Municipio	SAN AGUSTIN
Departament	Huila
Código	
Ciudad Principal	
Cel	3146008590

No.	DESCRIPCION	UND	Q	VR. UNIT IVA INCL	VR. TOTAL IVA INCLUIDO
1	CEMENTO ALION CORONA X 50KG UG	M2	800	$ 33.400	$ 26.720.000
2		M2			$ -
3		M2			$ -
4		M2			$ -
5		UND			$ -
6		UND			$ -
7		UND			$ -
8		UND			$ -
9		UND			$ -
10		BOLSA			$ -
11		BOLSA			$ -
12		BOLSA			$ -

TOTAL $ 26.720.000

ACUERDOS COMERCIALES

VALIDEZ MÍNIMA DE LA OFERTA: OCHO (08) DIAS

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: BODEGA ALMACENES (PITALITO - SAN AGUSTÍN HUILA)

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA O EFECTIVO

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nro: 45300002720 CONVENIO 13859 A NOMBRE DE CONSTRUCASA CORONA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS

DISPONIBILIDAD EN FABRICA: Inmediata

PLAZO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES: 3 días posterior al compromiso de Fábrica

PESO APROXIMADO: 0 Kgs

GARANTIA: TODOS SON MATERIALES CON CERTIFICACIÓN DE 1RA CALIDAD

EDNA LILIANA GONZALEZ LASSO
EJECUTIVA COMERCIAL
CEL 311 454 94 56

Powered by CamScanner



FERRETERIA ANDINA ISNOS

Nit: 36113838-1

Dirección: CR4 6 25

Telefono: 3142380576

Responsabilidad: Responsable de IVA (régimen común)

COTIZACÍON
645

Resp: ELIZABETH ZUÑIGA SAMBONI

Fecha 2024-03-14
Fecha Final 2024-03-14
-

Cliente : JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA

Nit / CC: 891103553

Telefono: 3213797192

Direccion:VEREDA PUERTO QUINCHANA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	P UNID	BASE	IMP	IVA	VAL DES	DES	V TOTAL
781145	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X 50 KG	1.00	34,000.00	28,571.4	5,428.57	19%	0.00	0%	34,000.00
852738	PREMEZCLADO X M³	1.00	65,000.00	65,000.0	0.00	0%	0.00	0%	65,000.00
852735	ARENA GRUESA X M³	1.00	25,000.00	25,000.0	0.00	0%	0.00	0%	25,000.00
852734	GRAVILLA X M³	1.00	90,000.00	90,000.0	0.00	0%	0.00	0%	90,000.00
300457	ALAMBRE NEGRO X KG	1.00	7,000.00	5,882.4	1,117.65	19%	0.00	0%	7,000.00
68321	VARILLA 3/8 X 6 MTRS	1.00	17,500.00	14,705.9	2,794.12	19%	0.00	0%	17,500.00
521255	TRANSPORTE AGREGADOS M3XKM	1.00	2,000.00	2,000.0	0.00	0%	0.00	0%	2,000.00

ITEMS	7	SUBTOTAL	231,159.66	DESCUENTO	0.00	SUBTOTAL	231,159.66	IVA	9,340.34	TOTAL	240,500.00

COMENTARIO : VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DÍAS EL VALOR DEL TRANSPORTE AGREGADOS APLICA PARA VIAJES DE 6 A 7 METROS CÚBICOS MÍNIMO

PAZ CHICANGANA MIRABAL
NIT : 4935958- 8
CARRERA 11 1A 65
3184089357 -
SAN AGUSTIN - COLOMBIA

San Agustin, 29 de febrero de 2024

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO
Atn:
VDA PUERTO QUINCHANA
3213797192
San Agustin-Huila . Colombia

Ref : Cotización V - 001 - 140

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Descripción	Unidad	Cantidad	ValorMovimientoMasImpVenta	ValorMovi
CEME CEMEX*50K	BULTO	800.00	34.500,00	27.600.000,(

Total Bruto	23,193,277.00
IVA	4,406,723.00
Total a Pagar	$27,600,000.00

Entrega: días despues de recibir su orden de compra o pedido
Forma de Pago :
Validez de la oferta: 8 días a partir de la fecha, febrero 29 2024

Cordialmente,

Vendedor Principal

PAZ CHICANGANA MIRABAL

Elaborado e Impreso por Siigo

AURA TERESA VARGAS CASTRO
NIT: 55180756-0
CALLE 5 #12-32
CELULAR: 3223270200
SAN AGUSTÍN – COLOMBIA

San Agustín, 29 de febrero de 2024

Señores:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO
Atn:
VEREDA PUERTO QUINCHANA
3213797192
San Agustín-Huila. Colombia

Ref: Cotización

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor bruto	Valor con Iva	Valor total
CEMENTO SAN MARCOS 50 KL	BULTO	800	26.386	31.400	25.120.000
CEMENTO ARGOS U.G. 50KL	BULTO	800	28.487	33.900	27.120.000
CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 40 KL	BULTO	800	28.067	33.400	26.720.000
CEMENTO CEMEX U.G 50KL	BULTO	800	28.655	34.100	27.280.000
VARILLA CORRGUDA 3/8 x 6mts DIACO		1	14.117	16.800	16.800

Total Bruto	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	0
Total a Pagar	0

ENTREGA: 15 días después de recibir su orden de compra o pedido

FORMA DE PAGO: Contado

TRASNPORTE: Entrega en bodega

VALIDEZ DE LA OFERTA: En la fecha solicitada debido a la variación de precio

Cordialmente,

AURA TERESA VARGAS CASTRO

Elaborado e Impreso por Siigo

San Agustín, marzo 18 de 2024

COTIZACIÓN

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 135 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE ACERO A OBRA
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8	$ 350,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

LIDIER ALBEIRO FERNANDEZ PEREZ
C.C 12.239.650

San Agustín, marzo 18 de 2024

COTIZACIÓN

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 135 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE ACERO A OBRA
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8	$ 350,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

Cristian Argote

CRISTIAN DAVID ARGOTE LASSO
C.C 1082780915 de San Agustín

San Agustín, marzo 18 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 135 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE CEMENTO A OBRA
TRANSPORTE DE 200 SACOS DE CEMENTO	$ 350,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

JOHN FREDDY RENZA JOAQUI
C.C. 83.041.729 de San Agustin Huila
Teléfono: 313 249 1180
Vereda Los Cauchos
Email: johnfreddyrenza@gmail.com

San Agustín, marzo 18 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 135 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE CEMENTO A OBRA
TRANSPORTE DE 200 SACOS DE CEMENTO	$ 400,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

YOLIMA ERLINDA MUÑOZ BOLAÑOS
C.C. 55.182.459 de San Agustín Huila
Telefono: 314 785 9580
CLL 11 No 1ª-59
E-mail: isabelladams@hotmail.es

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4727 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

MAQUINARIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	EMPRESAS: JOHN FREDY RENZA	JEFER SALAMANCA	BEIMAR CHAZOY ANACONA	BRUNO ANDRES GONZALEZ	ANGIE PAOLA SANTIAGO	JULIAN PARDO	JAVIER VILLAMARIN	
MOTONIVELADORA	1	HORA								
RETROEXCAVADORA	1	HORA	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00					
VIBRO COMPACTADOR 10 TON	1	HORA						$ 160,000.00	$ 160,000	
TRANSPORTE VIBRO	1	GLOBAL						$ 2,000,000	$ 2,200,000	
MEZCLADORA 1 BULTO	1	DIA				$ 80,000.00	$ 75,000.00			
VIBRO ELECTRICO PARA CONCRETO	1	DIA				$ 80,000.00	$ 75,000.00			
BASE										
IVA			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
TOTAL			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				

TRANSPORTE	Transporte vibro 100%			
FORMA DE PAGO	100% transp vibro, 50% alqui	50% anticipo	50% anticipo	50% anticipo
TIEMPO DE ENTREGA				

Comité Operativo. **No:** **2**
Fecha Comité Operativo: **24/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

JOHN FREDY RENZA
ANGIE PAOLA SANTIAGO VARON
JULIAN PARDO ARTUNDUAGA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE
IVA
RETENCION 1%
TOTAL A TRANSFERIR

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

HENRY MARTINEZ MARTINEZ
Presidente JAC

Interventoria

San Agustín, marzo 20 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización hora de retroexcavadora para labores de perfilación, excavación y seriado en la construcción de la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del trabajo de perfilación, excavación y seriado con retroexcavadora (PAJARITA) en la construcción de Placa Huella en la Vereda Puerto Quinchana en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 135 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE CEMENTO A OBRA
HORA DE RETROEXCAVADORA PAJARITA	$ 120,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

   Las horas de trabajo se contabilizan desde que la maquina sale desde el casco urbano hasta el sitio de la obra.

Quedo atento a sus observaciones e inquietudes

Cordialmente.

JOHN FREDDY RENZA JOAQUI
C.C. 83.041.729 de San Agustín Huila
Teléfono: 313 249 1180
Vereda Los Cauchos
Email: johnfreddyrenza@gmail.com

San Agustín, marzo 20 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización hora de retroexcavadora para labores de perfilación, excavación y seriado en la construcción de la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del trabajo de perfilación, excavación y seriado con retroexcavadora (PAJARITA) en la construcción de Placa Huella en la Vereda Puerto Quinchana en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 135 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE CEMENTO A OBRA
HORA DE RETROEXCAVADORA PAJARITA	$ 120,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

   Las horas de trabajo se contabilizan desde que la maquina sale desde el casco urbano hasta el sitio de la obra.

Quedo atento a sus observaciones e inquietudes

Cordialmente.

Jeffer Salamanca

JEFFER ALEJANDRO SALAMANCA ACOSTA
C.C. 1.083.899.653 de San Agustín Huila
Telefono: 310 233 0948
Carrera 2 No 1-04
E-mail: jalejandro9343@gmail.com

San Agustín, marzo 21 de 2024

COTIZACIÓN

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización hora de retroexcavadora para labores de perfilación, excavación y seriado en la construcción de la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del trabajo de perfilación, excavación y seriado con retroexcavadora (PAJARITA) en la construcción de Placa Huella en la Vereda Puerto Quinchana en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 135 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE CEMENTO A OBRA
HORA DE RETROEXCAVADORA PAJARITA	$ 120,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

   Las horas de trabajo se contabilizan desde que la maquina sale desde el casco urbano hasta el sitio de la obra.

Quedo atento a sus observaciones e inquietudes

Cordialmente.

Beimar Chasoy Anacona.

BEIMAR CHASOY ANACONA
C.C 12.181.051 de San Agustín
Teléfono: 3143921163
Dirección: Cra 1 no. 2-39
Email: beimarjj1411@hotmail.com

Powered by CamScanner

San Agustín, abril 10 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización día de mezcladora y vibrador de concreto para la construcción de la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para el alquiler de mezcladora de 1 bulto y vibrador de aguja para preparación de mezcla de concreto para la construcción de Placa Huella en la Vereda Puerto Quinchana en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 135 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR DIA
Dia mezcladora de 1 bulto	$ 80,000
Dia vibrador de aguja	$ 80.000

Los valores indicados no incluyen combustible ni transporte, los cuales deberán ser asumidos por el contratante.

Quedo atento a sus observaciones e inquietudes

Cordialmente.



NOMBRE: BRUNO ANDRES GONZALEZ ALVAREZ
C.C: 1.067.094.027 de Buenavista Córdoba
Telefono: 320 436 3104
Dirección: Calle 4 No 3-45

San Agustín, abril 10 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización día de mezcladora y vibrador de concreto para la construcción de la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para el alquiler de mezcladora de 1 bulto y vibrador de aguja para preparación de mezcla de concreto para la construcción de Placa Huella en la Vereda Puerto Quinchana en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 135 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR DIA
Dia mezcladora de 1 bulto	$ 75,000
Dia vibrador de aguja	$ 75.000

Los valores indicados no incluyen combustible ni transporte, los cuales deberán ser asumidos por el contratante.

Quedo atento a sus observaciones e inquietudes

Cordialmente.



_____

NOMBRE: ANGIE PAOLA SANTIAGO VARON
C.C: 1.083.911.134 de Pitalito Huila
Telefono: 317 339 9020
Dirección: Calle 2 No 8-45



CALLE 8 N No 13-15
jpmon2020@yahoo.es
312 456 7890

COTIZACIÓN

Fecha de emisión:	26/02/2024
Cotización N°:	**5**
Validez:	10 dias

Cliente:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO QUINCHANA		
C.I.F/ DNI:			
Dirección:	VEREDA PUERTO QUINCHANA		
Teléfonos:	311 4623619	**Correo elect.:**	jac1puertoquinchana@gmail.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Hora de Vibrocompactador de 10 toneladas	Unidad	1	160.000	160.000
2	Transporte ida y regreso de vibrocompactador	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Cantidad de registros **2**



Realizado por:
JULIAN PARDO ARTUNDUAGA

Subtotal		2.160.000
Descuentos	0%	-
Recargos	0%	-
Impuesto	0%	-
TOTAL		**2.160.000**

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4727 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

AGREGADOS

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**INDUCON**	**PETREOS COLOMBIA**	**ANDINA**	
AGREGADOS PETREOS						
Premezclado 1/2	0	m3				
Premezclado 3/4	0	m3	$ 89,250.00			
Gravilla 3/4	1	m3	$ 101,150.00	$ 101,150.00	$ 101,150.00	
Gravilla 1/2	0	m3	$ 101,150.00			
Sub base granular	1	m3	$ 77,350.00	$ 53,550.00	$ 65,450.00	
Material de Cantera	0	m3				
Piedra ciclopeo	0	m3				
Arena Triturada	1	m3	$ 59,500.00	$ 47,600.00	$ 47,600.00	
TRANSPORTE						
			PETREOS COLOMBIA	**JOHN FREDY RENZA**	**FERRETERIA ANDINA**	**YOLIMA MUÑOZ**
TRANSPORTE AGREGADOS DESDE PETREOS	1	Viaje 6 m3	$ 325,500.00	$ 320,000.00	$ 372,000.00	
TRANSPORTE DE CEMENTO DESDE AREA URBANA	1	Viaje 200 Sacos		$ 300,000.00		$ 300,000.00
TOTAL			**$ 428,400.00**	**$ 202,300.00**	**$ 214,200.00**	**$ -**

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	CON TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE
FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA				

FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA	1 dia	1 dia

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **24/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac		
Presidente JAC		
Interventoria		
Total Votos		

PROVEEDOR SELECCIONADO

PETREOS COLOMBIA

JOHN FREDY RENZA

Firman en aprobación

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA BIOGESTION

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA PETREOS COLOMBIA

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

Supervisor INVIAS

HENRY MARTINEZ MARTINEZ
Presidente JAC

Interventoria

Pitalito 26 de febrero del 2024

Rut:891103553-7
SEÑOR: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA
Correo: tareas.contabilidad@hotmail.com
Dirección: VDA PUERTO QUINCHANA
Tel:3213797192

Cordial saludo.

Me dirijo a usted con el fin de presentarle la siguiente cotización, de agregados para la construcción. El desarrollo de nuestra actividad las realizamos amparados con los respectivos permisos y licencias otorgados por las entidades competentes “Titulo Minero N° KBN08251, Licencia Ambiental Res.N° 0228 Feb del 2013”.

PLANTA INDUCON TRITURADOS

TIPO DE MATERIAL	**PRECIO POR METRO CUBICO**	**PRECIO POR METRO CUBICO**
Gravilla ½,3/4, 1 pulgada	SIN IVA $85.000	CON IVA $101.150
BASE	SIN IVA $75.000	CON IVA $89.250
ARENA G	SIN IVA $50.000	CON IVA $59.500
SUBBASE TIPO C	SIN IVA $65.000	CON IVA $77.350
PIEDRA FILTRO (RAJON)	SIN IVA $80.000	CON IVA $95.200
MIXTO	SIN IVA $75.000	CON IVA$89.250

el servicio de transporte es adicional;

Nota: El modo de pago se manejan por anticipos se realizar las consignaciones a la cuenta Corriente Bancolombia N°453229659-51 a nombre de José Hilario Vargas Trilleras. Las respectivas copias de las licencias se facilitan una vez se haya concretado la compra

Atentamente:

JOSE HILARIO VARGAS TRILLERAS
C.C. 12.237.793 De Pitalito Huila
Cel. 3108184433

Pitalito, Huila 26 de febrero año 2024

Señores:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA

ASUNTO: COTIZACIÓN

Respetados señores, atendiendo su amable solicitud, PETREOS COLOMBIA. S.A.S. ponemos a su consideración la cotización sobre materiales de construcción.

Se adjunta la siguiente relación:

MATERIAL	VALOR M3	IVA M3	VALOR M3 IVA INCLUIDO
GRAVILLA ¾ - ½	$ 85.000	$ 16.150	$ **101.150**
MIXTO DE RIO	$ 45.000	$ 8.550	$ **53.550**
BASE	$ 65.000	$ 12.350	$ **77.350**
SUB- BASE	$ 45.000	$ 8.550	$ **53.550**
PREMEZCLADO	$ 65.000	$ 12.350	$ **77.350**
ARENA TRITURADA	$ 40.000	$ 7.600	$ **47.600**

El suministro de Pétreos contempla:

- Los valores indicados no incluyen transporte, este servicio será adicionado al valor de la cotización, ponemos a su disposición transporte Doble Troque, desde la Planta de Pétreos ubicada en Vereda Matanzas kilómetro 21 vía San Agustín. Valor kilometro $1.000 pesos Mct

Consideraciones:

- El cliente deberá informar y enviar a la persona encargada de recibir el material en la Planta de Pétreos, quien a su vez será el (o la) responsable de comprobar la calidad del material, por lo que no se aceptaran reclamos ni devoluciones.
-

Av. 3 No. 19-276 Sur Pitalito Huila Colombia
Teléfono: (57) (8) 836 91 28 - 3156272801
Email: petreoscolombia@gmail.com

Forma de Pago.

- Anticipo por valor del 50%
- Pagos Quincenales según corte realizado amortizando anticipos.

A consideración del cliente los pagos se podrán consignar a las siguientes cuentas:

- **OPCIÓN 1:** cuenta corriente No. 45300001466 de Bancolombia a nombre de PETREOS COLOMBIA SAS.
- **OPCIÓN 2:** cuenta corriente No. 076769996083 de Davivienda a nombre de PETREOS COLOMBIA SAS.
- Una vez realizado el pago, enviar soporte al correo electrónico petreoscolombia@gmail.com. O por medio de WhatsApp 311 5200224

Cordialmente,



YULY ANDREA LOPEZ GARCÍA
Representante Legal

Av. 3 No. 19-276 Sur Pitalito Huila Colombia
Teléfono: (57) (8) 836 91 28 - 3156272801
Email: petreoscolombia@gmail.com



FERRETERIA ANDINA ISNOS

Nit: 36113838-1

Dirección: CR4 6 25

Telefono: 3142380576

Responsabilidad: Responsable de IVA (régimen común)

COTIZACÍON
645

Resp: ELIZABETH ZUÑIGA SAMBONI

Fecha 2024-03-14
Fecha Final 2024-03-14
-

Cliente : JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA

Nit / CC: 891103553

Telefono: 3213797192

Direccion:VEREDA PUERTO QUINCHANA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	P UNID	BASE	IMP	IVA	VAL DES	DES	V TOTAL
781145	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X 50 KG	1.00	34,000.00	28,571.4	5,428.57	19%	0.00	0%	34,000.00
852738	PREMEZCLADO X M³	1.00	65,000.00	65,000.0	0.00	0%	0.00	0%	65,000.00
852735	ARENA GRUESA X M³	1.00	25,000.00	25,000.0	0.00	0%	0.00	0%	25,000.00
852734	GRAVILLA X M³	1.00	90,000.00	90,000.0	0.00	0%	0.00	0%	90,000.00
300457	ALAMBRE NEGRO X KG	1.00	7,000.00	5,882.4	1,117.65	19%	0.00	0%	7,000.00
68321	VARILLA 3/8 X 6 MTRS	1.00	17,500.00	14,705.9	2,794.12	19%	0.00	0%	17,500.00
521255	TRANSPORTE AGREGADOS M3XKM	1.00	2,000.00	2,000.0	0.00	0%	0.00	0%	2,000.00

ITEMS	7	SUBTOTAL	231,159.66	DESCUENTO	0.00	SUBTOTAL	231,159.66	IVA	9,340.34	TOTAL	240,500.00

COMENTARIO : VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DÍAS EL VALOR DEL TRANSPORTE AGREGADOS APLICA PARA VIAJES DE 6 A 7 METROS CÚBICOS MÍNIMO

Pitalito, Huila 18 de marzo 2024

Señores:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA

ASUNTO: COTIZACIÓN

Respetados señores, atendiendo su amable solicitud, PETREOS COLOMBIA. S.A.S. ponemos a su consideración la siguiente cotización.

Se adjunta la siguiente relación:

SERVICIO DE TRANSPORTE	KM	VALOR TOTAL
VEREDA QUINCHANA	38	$ 798.000
VEREDA VILLA FATIMA	31	$ 651.000
VEREDA PRADERA	26	$ 546.000
VEREDA OBANDO	24	$ 504.000

Forma de Pago.

- Anticipo por valor del 50%
- Pagos Quincenales según corte realizado amortizando anticipos.

A consideración del cliente los pagos se podrán consignar a las siguientes cuentas:

- **OPCIÓN 1:** cuenta corriente No. 45300001466 de Bancolombia a nombre de PETREOS COLOMBIA SAS.
-

Av. 3 No. 19-276 Sur Pitalito Huila Colombia
Teléfono: (57) (8) 836 91 28 - 3156272801
Email: petreoscolombia@gmail.com

- **OPCIÓN 2:** cuenta corriente No. 076769996083 de Davivienda a nombre de PETREOS COLOMBIA SAS.
- Una vez realizado el pago, enviar soporte al correo electrónico petreoscolombia@gmail.com. O por medio de WhatsApp 311 5200224

Cordialmente,



YULY ANDREA LOPEZ GARCÍA
Representante Legal

Av. 3 No. 19-276 Sur Pitalito Huila Colombia
Teléfono: (57) (8) 836 91 28 - 3156272801
Email: petreoscolombia@gmail.com

San Agustín, marzo 18 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 135 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE CEMENTO A OBRA
TRANSPORTE DE AGREGADOS A PUERTO QUINCHANA VIAJE DE 6 M3, TOTAL 38 KILOMETROS	$ 450,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

   El anterior precio no incluye: Cargue.

Gracias.

Cordialmente.

JOHN FREDDY RENZA JOAQUI
C.C. 83.041.729 de San Agustin Huila
Teléfono: 313 249 1180
Vereda Los Cauchos
Email: johnfreddyrenza@gmail.com



FERRETERIA ANDINA ISNOS

Nit: 36113838-1

Dirección: CR4 6 25

Telefono: 3142380576

Responsabilidad: Responsable de IVA (régimen común)

COTIZACÍON
645

Resp: ELIZABETH ZUÑIGA SAMBONI

Fecha 2024-03-14
Fecha Final 2024-03-14
-

Cliente : JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA

Nit / CC: 891103553

Telefono: 3213797192

Direccion:VEREDA PUERTO QUINCHANA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	P UNID	BASE	IMP	IVA	VAL DES	DES	V TOTAL
781145	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X 50 KG	1.00	34,000.00	28,571.4	5,428.57	19%	0.00	0%	34,000.00
852738	PREMEZCLADO X M³	1.00	65,000.00	65,000.0	0.00	0%	0.00	0%	65,000.00
852735	ARENA GRUESA X M³	1.00	25,000.00	25,000.0	0.00	0%	0.00	0%	25,000.00
852734	GRAVILLA X M³	1.00	90,000.00	90,000.0	0.00	0%	0.00	0%	90,000.00
300457	ALAMBRE NEGRO X KG	1.00	7,000.00	5,882.4	1,117.65	19%	0.00	0%	7,000.00
68321	VARILLA 3/8 X 6 MTRS	1.00	17,500.00	14,705.9	2,794.12	19%	0.00	0%	17,500.00
521255	TRANSPORTE AGREGADOS M3XKM	1.00	2,000.00	2,000.0	0.00	0%	0.00	0%	2,000.00

ITEMS	7	SUBTOTAL	231,159.66	DESCUENTO	0.00	SUBTOTAL	231,159.66	IVA	9,340.34	TOTAL	240,500.00

COMENTARIO : VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DÍAS EL VALOR DEL TRANSPORTE AGREGADOS APLICA PARA VIAJES DE 6 A 7 METROS CÚBICOS MÍNIMO

San Agustín, marzo 21 de 2024

COTIZACIÓN

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Puerto Quinchana en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 135 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE CEMENTO A OBRA
TRANSPORTE DE AGREGADOS A PUERTO QUINCHANA VIAJE DE 6 M3, TOTAL 38 KILOMETROS	$ 500,000
TRANSPORTE MATERIAL DE ESCAVACIÓN , VIAJE DE 6 M3	$ 70.000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio incluye: Cargue.

Cordialment.

Beimar Chasoy Anacona.

BEIMAR CHASOY ANACONA
C.C 12.181.051 de San Agustín
Teléfono: 3143921163
Dirección: Cra 1 no. 2-39
Email: beimarjj1411@hotmail.com

Powered by CamScanner

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4727 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

AGREGADOS

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**EL ALTICO**	**MADER CENTRAL**		
TABLA BURRA 20cm x 3cm x 3 mts	1	UND	$ 19,000.00	$ 18,800.00		
TOTAL			**$ 19,000.00**	**$ 18,800.00**	**$ -**	**$ -**

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	CON TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE
FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA				

FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA	1 dia	1 dia

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **24/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac		
Presidente JAC		
Interventoria		
Total Votos		

PROVEEDOR SELECCIONADO

MADER CENTRAL
$ -

Firman en aprobación

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA BIOGESTION

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA PETREOS COLOMBIA

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

Supervisor INVIAS

HENRY MARTINEZ MARTINEZ
Presidente JAC

Interventoria

EMPRESA FORESTAL RECONOCIDA POR LA CAM MEDIANTE RESOLUCION N° 635 (23/02/2018)

Empresa: **VENTA DE MADERA Y MACHIMBRES EL ALTICO**
NIT: **1 082 774 855 – 0** **NO RESPONSIBLE DE IVA**
Dirección: CALLE 3 # 7 – 56 Barrio San Martin
Teléfono: 312 3918 596 – 313 8021 273 – 311 4789 242
Ciudad: SAN AGUSTIN – HUILA
Correo Electrónico: depositomaderaelaltico@gmail.com
Fecha: **11/03/2024**

****VALIDEZ DE LA OFERTA** = **MARZO**

Producto	Cantidad	Vr Unitario	%Descuento	IVA	Vr Total
TABLA BURRA 20cm x 3cm x 3 mts	1	$ 19,000	0%	0%	$ 19.000
				Subtotal	**0**
				Descuento	**0**
				IVA	**0**
				TOTAL	**$ 19.000**

****NOTA: Este material se debe arreglar para realizar placa huella.**

Cotización dirigida a: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA**
NIT 891 103553 - 7

NOTA: *Estos materiales cuentan con el amparo de los permisos legales y certificados por las autoridades ambientales.*

Anderson Gómez Bolaños
Firma
Representante legal de la empresa forestal

Cotización

Empresa: Mader Central
NIT. 1075253766-2
Dirección: Calle 2 # 11 - 35
Municipio: San Agustín
Correo:
madercentralsanagustin@gmail.com
Teléfono: 3118400430 - 3132536421

Cantidad	Concepto	Precio
1	Tabla burra de 20cm	$18,800.00
Total		$18,800.00

Notas:
*El precio es valido por el mes de marzo
* El material se debe arreglar para placa huella

Dirigida a: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUINCHANA



REPRESENTANTE LEGAL
ERIKA JASBLEIDI MUÑOZ ZUÑIGA
C.C. 1075253766 de Neiva

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4727 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

DOTACION DEL PERSONAL

			EMPRESAS							
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**AGROTEXTILIS**		**CONFELIMARGLO**		**ISO SEGURIDAD INGENIERIA**		**LUISA FERNANDA CARVAJAL**	
			Valor Unitario	**Valor total**	**Valor Unitario**	**Valor total**	**Valor**	**Valor total**		
Casco Industrial con certificación ansi con rache para	7	$ 17,850.00	35,000	$ 245,000.00	$ 39,100.00	$ 273,700.00	$ 26,505.00	$ 185,535.00	$ 15,900.00	$ 111,300.00
Bota en caucho punta de acero para obrero	7	$ 63,070.00	65,000	$ 455,000.00	$ 136,000.00	$ 952,000.00	$ 87,305.00	$ 611,135.00	$ 70,000.00	$ 490,000.00
Gafa industrial unilente clara protectora	7	$ 6,545.00	9,000	$ 63,000.00	$ 7,650.00	$ 53,550.00	$ 4,900.00	$ 34,300.00	$ 3,500.00	$ 24,500.00
Guante de Carnaza corto reforzado	14	$ 7,735.00	12,000	$ 168,000.00	$ 15,300.00	$ 214,200.00	$ 10,925.00	$ 152,950.00	$ 8,500.00	$ 119,000.00
Guante vaqueta corto reforzado	14	$ 7,140.00	12,000	$ 168,000.00	$ 12,750.00	$ 178,500.00	$ 11,305.00	$ 158,270.00		$ -
Peto Carnaza	5	$ 26,180.00	25,000	$ 125,000.00	$ 38,250.00	$ 191,250.00	$ 25,555.00	$ 127,775.00	$ 28,000.00	$ 140,000.00
Careta para guadañar	2	$ 30,345.00	55,000	$ 110,000.00	$ 38,250.00	$ 76,500.00	$ 27,455.00	$ 54,910.00	$ 20,000.00	$ 40,000.00
Tapaoidos de inserción siliconado	14	$ 2,975.00	6,000	$ 84,000.00	$ 4,250.00	$ 59,500.00	$ 1,330.00	$ 18,620.00	$ 2,000.00	$ 28,000.00
Botiquín Tipo A	1	$ 70,000.00	40,000	$ 40,000.00	$ 200,600.00	$ 200,600.00	$ 219,350.00	$ 219,350.00	$ 59,500.00	$ 59,500.00
Uniforme personalizado	7	$ 140,000.00	160,000	$ 1,120,000.00	$ 170,000.00	$ 1,190,000.00	$ 99,155.00	$ 694,085.00		$ -
Tela polipropileno para cerramiento H=2,00 M	30	$ 6,700.00		$ -		$ -	$ 4,250.00	$ 127,500.00		$ -
Plástico negro Cal. 6 ancho 4m para cubrimiento de	40	$ 7,200.00		$ -		$ -	$ 12,000.00	$ 480,000.00		$ -
Cinta de demarcación L=500 M	2	$ 47,000.00		$ -		$ -	$ 33,155.00	$ 66,310.00	$ 33,000.00	$ 66,000.00
Cono de señalización en Plástico h=70 cm reforzado	2	$ 50,000.00		$ -		$ -	$ 59,755.00	$ 119,510.00		$ -
Paleta de señalización PARE-SIGA	2	$ 30,000.00		$ -		$ -	$ 33,320.00	$ 66,640.00	$ 21,000.00	$ 42,000.00
Caneca Plástica 55 gal para residuos	3	$ 70,000.00		$ -		$ -	$ 74,004.00	$ 222,012.00		$ -
				$ 2,578,000.00		**$ 3,389,800.00**		**$ 3,338,902.00**		**$ 1,120,300**

TRANSPORTE		SIN TRANSPORTE		SIN TRANSPORTE		
FORMA DE PAGO	100%	CONTADO ANTICIPA	100%	CONTADO ANTICIPADO	100%	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA		2 DIA DE		2 DIA DE		2 DIA DE

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **24/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

ISO SEGURIDAD INGENIERIA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE	$0.00
IVA	$0.00
RETENCION 2.5% O 3.5%	NO APLICA
TOTAL A TRANSFERIR	$0.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

HENRY MARTINEZ MARTINEZ
Presidente JAC

Interventoria



Luisa Fernanda Carvajal
NIT: 1083912400
Tel: 57+3152495694

COTIZACION No.237

Fecha: 2024-04-09 - abril-2024 09:58

Cliente: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
Dirección: VDA PUERTO QUINCHANA

Ciudad: PITALITO
Email: tareas.contabilidad@hotmail.com

Identificación: 891103553
Movil: 3213797192

Nro.	Producto	Cant	PrecioxUnidad	Total
1	BOTA PLASTICA WORKMAN NEGRA CON PUNTERA/40	7 und	$ 70,000	$ 490,000
2	BOTIQUÍN LONA 19 PRODUCTOS	1 und	$ ∞	$ 59,500
3	CARETA MALLA RACHET / GUADAÑAR/ AMARILLA ECO	2 und	$ 20,000	$ 40,000
4	CASCO DIELÉCTRICO OBRERO	7 und	$ 15,900	$ 111,300
5	CINTA PELIGRO/500	2 und	$ ∞	$ 66,000
6	DELANTAL CUERO CARNAZA	5 und	$ 28,000	$ 140,000
7	GAFA GENÉRICA /NO ANP/ECO/Transparente	7 und	$ 3,500	$ 24,500
8	GUANTE INGENIERO CORTO/ REFORZADO /AMARILLO	14 und	$ 8,500	$ 119,000
9	PALETA PARE-SIGA	2 und	$ 21,000	$ 42,000

Nro.	Producto	Cant	PrecioxUnidad	Precio	Total
10	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN	14 und	$ 2,000	$ 1,681	$ 28,000

Total Neto:	**$ 1,120,300**

Cotización
No. C-1-1593

Cristian Mauricio Molano España
NIT 1.075.253.466-8
Cra. 3 No. 4-31 Local 102
Tel: (57) 3213432573
Pitalito - Colombia

Para	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
Nit	891.103.553-7
Contacto	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO
Dirección	VDA PUERTO QUINCHANA
Ciudad/Tel.	San Agustín / (608) 3213797192 - Ext. 000 - (000) 0000000
Fecha	2024-04-08

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

OFRECEMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD LABORAL, VENTA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA, EXTINTORES, BOTIQUINES, CAMILLAS, SEÑALIZACION, DETECTORES DE HUMO, LAMPARAS DE EMERGENCIA, ENTRE OTROS.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CASCO TIPO 1 DIELECTRICO INSAFE COLOR BLANCO	7.00	23,445.38	164,117.65	8,205.88	19 %	185,535.01
2	WORKMAN SAFETY NEGRA TALLA 39	1.00	77,226.89	77,226.89	3,861.34	19 %	87,305.00
3	LENTE CLARO SPY S/ANTIFO CLARA	7.00	4,117.65	28,823.53	0.00	19 %	34,300.00
4	GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO	14.00	9,663.87	135,294.12	6,764.71	19 %	152,950.00
5	GUANTE VAQUETA REFUERZO EXTERNO	14.00	10,000.00	140,000.00	7,000.00	19 %	158,270.00
6	PETO DE CARNAZA	5.00	22,605.04	113,025.21	5,651.26	19 %	127,775.00
7	CARETA ESMERILAR LINKTECH	2.00	24,285.71	48,571.43	2,428.57	19 %	54,910.00
8	PROTECTOR AUDITIVO HUMANPACK INSERCION ECONOMICO APOLO REF. JY-172 APOLO ECO	14.00	1,176.47	16,470.59	823.53	19 %	18,620.00
9	BOTIQUIN TIPO A	1.00	230,900.00	230,900.00	11,545.00	0 %	219,355.00
10	CINTA PELIGRO 500 MT	2.00	29,327.73	58,655.46	2,932.77	19 %	66,310.00
11	CONO PVC 70 CM CON REFLECTIVO	2.00	52,857.14	105,714.29	5,285.71	19 %	119,510.01
12	STIKER 28X28 PARA PALETAS.	2.00	8,403.36	16,806.72	840.34	19 %	18,999.99
13	CANECA 55 LT COLPLAST para PUNTO ECOLOGICO - TAPA VAIVEN-VERDE.	1.00	65,462.18	65,462.18	3,273.11	19 %	74,004.99
14	CANECA 55 LT COLPLAST para PUNTO ECOLOGICO - TAPA VAIVEN NEGRA	1.00	65,462.18	65,462.18	3,273.11	19 %	74,004.99
15	CANECA 55 LT COLPLAST para PUNTO ECOLOGICO - TAPA VAIVEN BLANCA	1.00	65,462.18	65,462.18	3,273.11	19 %	74,004.99
16	CAMISA JEAN AZUL REFLECTIVA CON BORDADO	7.00	44,453.78	311,176.47	15,558.82	19 %	351,785.00
17	PANTALON JEAN AZUL REFLECTIVO TALLA 34	7.00	41,092.44	287,647.06	0.00	19 %	342,300.00

Total Bruto	1,930,815.96
Descuentos	80,717.26
Subtotal	1,850,098.70
IVA 19%	309,841.28
Total a Pagar	2,159,939.98

1. Esta cotización no incluye valores respecto a bordados o estampados de logos,
2. Esta factura no incluye valores respecto a **instalación** de equipos, los cuales tendrán un costo dependiente del lugar .
3. Esta cotización tiene una **vigencia** de **02 días hábiles**, a partir de los cuales puede estar sujeto a cambios o variación en los precios.

CRISTIAN MAURICIO MOLANO
fact.isoseguridad@gmail.com
(3213432573)

DOTACIONES INDUSTRIALES

AGRO TEXTIL'S Pitalito

SEÑOR;
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION
DE PTO QUINCHANA
NIT: 891103553

Cordial saludo.

Atendiendo la invitación realizada nos permitimos presentar cotización de la siguiente dotación

CANTIDAD	DETALLE	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	OVEROL DE DOS PIEZAS EN LINO FLEX CON ESTAMPADOS EN ESPALDA Y BOLSILLO CINTAS REFLECTIVAS EN PANTALON Y CAMISA RESPECTIVAMENTE	$160.000	$1.120.000
5	PETO EN CARNAZA	$25.000	$125.000
7	BOTA PLASTICA CON PUNTA DE ACERO	$65.000	$455.000
7	CASCO	$35.00	$245.000
7	LENTE TRANSPARENTE Y OSCURO	$9.000	$63.000
14	GUANTE EN CARNAZA	$12.000	$168.000
14	GUANTE EN VAQUETA CORTO REFORZADO	$12.000	$168.000
2	CARETA PARA GUADAÑAR	$55.000	$110.000
14	TAPA OIDO DE INSERCION SILICONADO	$6000	$84.000
1	BOTIQUIN TIPO A	$40.000	$40.000

VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS
FORMA DE PAGO; CONTADO

Atentamente,

MIREYA ZARATE
Gerente

CONFE LIMARGLO
EQUIPOS DE OFICINA
CELS: 321-787 5427 - 313-488 4701
SUMINISTROS PARA
COLEGIOS Y HOSPITALES
FABRICA DE DOTACIONES PARA TODA
CLASE DE EMPRESAS
VENTA DE COMPUTADORES
Y REPUESTOS PARA LOS MISMOS
GLORIA MARLENY MUÑOZ GOMEZ NIT: 36.125.103-9
REGIMEN SIMPLIFICADO
CARRERA 10 No. 12-25 BARRIO SAN ANTONIO PITALITO H.

PROPUESTA

CLIENTE: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE A INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA
NIT: 891.103.553-7 **CIUDAD:** SAN AGUSTIN HUILA **FECHA:** 25-03-2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito extenderles mi más sincero saludo deseándoles muchos éxitos en sus labores, y a su vez poniendo en disposición los Servicios de CONFELIMARGLO, para ofrecerle suministros que puedan apoyar su trabajo:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CASCO TIPO I DIELCTRICO	7	$ 39.100	$ 273.700
2	BOTA PVC SEGURIDAD CAÑA ALTA TALLA 37, 38, 39, 49, 40, 41, 42, 43 TALLA 44, 45 TIENEN COSTO ADICIONAL	7	$ 136.000	$ 952.000
3	GAFA REF 818 CLARA	7	$ 7.650	$ 53.550
4	GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO EN VAQUETA		$ 15.300	$ 214.200
5	GUANTE VAQUETA CORTO REFORZADO EN VAQUETA		$ 12.750	$ 178.500
6	DELANTAL CARNAZA MEDIANO	5	$ 38.250	$ 191.250
7	CARETA PARA GUADAÑAR MALLA METALICA	2	$ 38.250	$ 76.500
8	TAPAOIDO INSERCIOON SILICONA		$ 4.250	$ 59.500
9	BOTIQUIN MORRAL DOTADO	1	$ 200.600	$ 200.600
10	UNIFORMA INVIAS LINOFLEX DOS PIEZAS, CINTA REFLECTIVA Y ESTAMPADOS TALLA S, M, L, XL TALLA 2XL, 3XL, 4XL, 5XL TIENEN COSTO ADICIONAL	7	$ 170.000	$ 1.190.000
TOTAL				**$ 3.389.800**

Atentamente:

GLORIA MARLENY MUÑOZ GOMEZ
CC. 36.125.103

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4727 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

TOPOGRAFIA

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**D&D INGENIERIA**	**PLANEACION & DISEÑO**	**JULIAN LOSADA**	**DIFERENCIA**
Levantamiento Topografico	1	Unidad	$900,000.00	$950,000.00	$1,000,000.00	
Diseño Geometrico	1	Unidad	$850,000.00	$750,000.00	$700,000.00	
Materializacion eje del Proyecto	1	Unidad	$850,000.00	$950,000.00	$1,100,000.00	
Control de Niveles	0	Unidad	$0.00	$0.00		
Plano Record final	0	Unidad	$0.00	$0.00		
BASE						
IVA			$ -	$ -		
TOTAL			**$ 2,600,000.00**	**$ 2,650,000.00**	**$ 2,800,000.00**	-$ 50,000.00

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE		anticipo
FORMA DE PAGO	50-50	CONTADO ANTICIPADO		$1,325,000.00
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIAS	15 DIAS		

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **24/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

D&D INGENIERIA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE	$2,650,000.00
IVA	$0.00
RETENCION 10% O 11%	NO APLICA
ANTICIPO	$1,325,000.00
PARCIAL 2	$1,325,000.00
TOTAL	$2,650,000.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

HENRY MARTINEZ MARTINEZ

Presidente JAC

Interventoria

D&D
INGENIERIA
301 348 01 22
301 347 95 51
dydingenieriacivilytopografica@gmail.com

San Agustín Huila, 08 de marzo de 2024

SEÑORES:
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA

ASUNTO: Propuesta Económica Revisión y/o Ajustes Estudios y Diseños Placa Huella Vereda Puerto Quinchana.

Cordial saludo,

Gracias por comunicarse con nosotros, por medio de la presente hacemos llegar a usted la propuesta técnico-económica de acuerdo con su solicitud.

ALCANCE DE LA PROPUESTA

- ✓ Se realizará levantamiento Topográfico del tramo de la Placa Huella en la vereda Puerto Quinchana.

- ✓ Se realizará el Diseño Geométrico del tramo de la Placa Huella en la vereda Puerto Quinchana.

- ✓ Se realizará los Planos Estructurales de la Placa Huella en la vereda Puerto Quinchana, de acuerdo con los parámetros de la Guía de Construcción de Vías Terciarias de Colombia Rural.

D&D INGENIERIA
301 348 01 22
301 347 95 51
dydingenieriacivilytopografica@gmail.com

VALOR PROPUESTA.

PROPUESTA ECONOMICA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR GLOBAL**	
1	Levantamiento Topográfico Georreferenciado	$	900,000.00
2	Diseño geométrico de la subrasante	$	950,000.00
3	Localización y Replanteo de la obra	$	850,000.00
TOTAL		**$**	**2,600,000.00**

El valor de la propuesta es de $ 2.600.000, Dos millones seiscientos mil pesos M(CTE).

FORMA DE PAGO.

Para iniciar trabajos y posterior a la firma del contrato, se solicita un anticipo del 50%. Una vez ejecutado el 100% de las actividades contratadas, se solicita el pago del 50% restante.

GARANTÌAS PARA EL CLIENTE.

Una vez revisado el producto por parte de la entidad correspondiente, en caso de ser necesario, se realizarán las subsanaciones a que haya lugar y que sean propias del alcance de la presente cotización.

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

La disponibilidad es inmediata, una vez se efectué el pago del anticipo. El tiempo de ejecución es de 8 días.

DIANA HINET JIMENEZ CHILITO
TEL. 301 3480122
INGENIERA TOPOGRÁFICA

Pitalito, febrero 19 de 2024

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Asunto: Propuesta económica levantamiento topográfico, diseño geométrico, localización y levantamiento plano record para proyecto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Cordial saludo.

Es para nosotros muy importante ofrecer a usted nuestro servicio con profesionalismo, convencidos que podemos satisfacer sus necesidades de seguridad, comodidad y economía en la consultoría en referencia así:

CUADRO DE PRESUPUESTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	SUB TOTAL
1	Levantamiento topográfico para proyectos de pavimentación tipo Placa huella. Levantamiento realizado con estación total de topografía. Nota: El levantamiento topográfico ligado a partir de una georreferenciación con ayuda de herramientas como google earth la cual genera unas coordenadas iniciales aproximadas.	GL	950,000
2	Diseño geométrico de la rasante, acorde a la guía del instituto nacional de vías INVIAS. Se hace entrega de planos planta - perfil y secciones transversales del diseño de rasante, con la descripción de los tipos de curva. Se entrega cálculo de volumenes de corte y/o terraplen e informe escrito describiendo la metodología empleada, carteras de coordenadas, certificado de calibración de equipos y registro fotográfico.	GL	700,000
3	Localización del diseño geométrico. Materialización del eje del proyecto cada 10 metros en recta y en curva cada 5 metros. En caso de haber sobre ancho localización de éste.	GL	950,000
4	Realización de levantamiento topográfico final. Entrega de plano record.	GL	950,000
			3,550,000
		COSTOS DIRECTOS:	**3,550,000**
SON:	**TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS**		

Calle 3 No 4-60 Pitalito (H)
320 812 6493 - 311 591 1528
carolinabolivarp@gmail.com

Pitalito, febrero 15 de 2024

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ISNPECCION DE PUERTO QUINCHANA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Asunto: Cotización levantamiento topográfico inicial, diseño geométrico, materialización del proyecto y levantamiento plano final, para proyecto cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Cordial saludo.

De manera atenta me permito allegar la siguiente cotización de acuerdo a lo requerido.

PRESUPUESTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	SUB TOTAL
1	Levantamiento topográfico para proyectos de pavimentación tipo Placa huella. Levantamiento realizado con estación total de topografía.	GL	1,000,000
2	Diseño geométrico de la rasante, acorde a la guía del instituto nacional de vías INVIAS.	Mts	700,000
3	Materialización del eje del proyecto	Mts	1,100,000
4	Levantamiento topográfico final. Entrega de plano en planta	Mts	1,100,000
			3,900,000
		VALOLOR TOTAL	**3,900,000**
SON:	**TRES MILLLONES NOVECIENTOS MIL PESOS**		

Valor total: **TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS**
Forma de pago 50% de anticipo y 50% al final
No incluye seguridad social.

Yulian Losada.
YULIAN ALBERTO LOSADA RAMOS
Tecnólogo en topografía.
M.P. 01-15207 CNPT

Carrera 4 No 7-54 Isnos (H) Cel: 313 266 1906
7yulian@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4727 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

SUELO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	EMPRESAS: INDISUELOS	EMPRESAS: MECANICA DE SUELOS	EMPRESAS: COTIZACION 3	DIFERENCIA
		Unidad				
Ejecución de dos (2) apiques a cielo abierto a una profundidad de 1,5 metros.	2	Unidad	$800,000.00	$800,000.00		
		19%		**$ 152,000.00**		
IVA			$ 800,000.00	$ 952,000.00		
TOTAL			**$ 800,000.00**	**$ 952,000.00**	**$ -**	-$ 152,000.00

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE		ANTICIPO
FORMA DE PAGO	50-50	CONTADO ANTICIPADO		435000
TIEMPO DE ENTREGA	8 DIAS	15 DIAS		

Comité Operativo. **No:** **2**
Fecha Comité Operativo: **24/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO
INDISUELOS

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA	1
BASE	$800,000.00
IVA	$0.00
RETENCION 2.5% O 3.5%	NO APLICA
ANTICIPO	$435,000.00
PAGO 2	$365,000.00
TOTAL	$800,000.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

HENRY MARTINEZ MARTINEZ
Presidente JAC

Interventoria

NIT 901745638-4

Pitalito, 14 de febrero del 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
Solicitante del servicio.
San Agustín Huila.

Somos una empresa de servicio denominada “MECANICA DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.”. Nuestra organización está constituida por un grupo de personas con capacidades profesionales, técnicas y humanas idóneas para desarrollar y acompañar en sus diferentes proyectos.

Los equipos de nuestro laboratorio se encuentran debidamente calibrados por un Laboratorio, el cual cuenta con acreditación del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC, teniendo en cuenta la Norma ISO/IEC 17025:2017.

De igual manera, contamos con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST avalado por la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. y el Ministerio de trabajo, desarrollando un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, Además, nos encontramos en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad según los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.

Atendiendo a su amable solicitud, a continuación, relacionamos, la propuesta de prestación del servicio No. 25-24, correspondiente al servicio solicitado.

DATOS DEL CLIENTE

PROPUESTA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO No. 25-24

NOMBRE	**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA**
NIT	891103553-7
DIRECCIÓN	VEREDA PUERTO QUINCHANA
TEL.	3213797192
EMAIL	Tareas.contabilidad@hotmail.com

Ref.: **ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA.**

- **Ejecución de apiques:**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ejecución de dos (2) apiques a cielo abierto a una profundidad de 1,5 metros.	2	$ 400.000	$ 800.000
			SUBTOTAL	$ 800.000
			IVA (19%)	$ 152.000
			VALOR TOTAL	$ 952.000

Son: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

INDISUELOS

Pitalito 28 de Febrero de 2024

Señores:
Junta de acción comunal de la inspección de puerto Quinchana.

REF: Cotización de apiques para placa huella en la inspección de puerto quinchana del municipio de san Agustín Huila.

Cordial saludo

En atención a su solicitud, nos permitimos cotizar los ensayos en referencia.

En espera de que nuestra cotización sea de total satisfacción y poder colaborarles.

A continuación, presentaremos los precios unitarios de cada de uno de los ensayos solicitados.

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	APIQUES A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD EL INFORME FINAL CONSTA DE: CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES CBR INALTERADO, CBR SATURADO. RELACION HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO.	Und	2	$ 400.000	$ 800.000
VALOR TOTAL					**$ 800.000,00**

VALOR EN LETRAS	OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE
PLAZO OFERTA	20 DÍAS CALENDARIO
PAGO	50% ANTES DE LOS INICIOS DE LOS TRABAJOS DE LABORATORIO, 50% CUANDO SE ENTREGUE EL INFORME.

Dirección carrera 9 No 8a-51 Barrio San Antonio Pitalito Huila, teléfono 3188512281
Email: indisuelos@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4727 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

SUELO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	EMPRESAS CON DISEÑO DE MEZCLA: INDISUELOS	MECANICA DE SUELOS	COTIZACION 3	DIFERENCIA
		Unidad				
DENSIDAD	5	Unidad	$400,000.00	$500,000.00		
RESISTENCIA A LA COMPRESION	4	Unidad	$80,000.00	$320,000.00		
RELACION FR HUMEDAD	1	Unidad	$300,000.00	$150,000.00		
DISEÑO DE MEZCLAS	1	Unidad	$600,000.00	$520,000.00		
IVA		19.00%	$ 262,200.00	$ 283,100.00		
TOTAL			**$ 1,642,200.00**	**$ 1,773,100.00**	**$ -**	-$ 130,900.00

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE		ANTICIPO
FORMA DE PAGO	50-50	CONTADO ANTICIPADO		435000
TIEMPO DE ENTREGA	8 DIAS	15 DIAS		

Comité Operativo. **No:** **2**
Fecha Comité Operativo: **24/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO
INDISUELOS

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA	1
BASE	$1,642,200.00
IVA	$0.00
RETENCION 2.5% O 3.5%	NO APLICA
ANTICIPO	$435,000.00
PAGO 2	$1,207,200.00
TOTAL	$1,642,200.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS	HENRY MARTINEZ MARTINEZ **Presidente JAC**	**Interventoria**

INDISUELOS

Pitalito 05 de abril de 2024

Señores:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA

REF: COTIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA PLACA HUELLA EN LA INSPECCIÓN DE PUERTO QUINCHANA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Cordial saludo

En atención a su solicitud, nos permitimos cotizar los ensayos en referencia.

En espera de que nuestra cotización sea de total satisfacción y poder colaborarles.

A continuación, presentaremos los precios unitarios de cada de uno de los ensayos solicitados.

Nota: El valor cotizado para este trabajo no incluye IVA por el concepto de que no somos responsables de IVA

Dirección carrera 9 No 8a-51 Barrio San Antonio Pitalito Huila, teléfono 3188512281
Email: indisuelos@gmail.com

INDISUELOS

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	ENSAYO A COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (EL CLIENTE DEBE SUMINISTRAR LOS CILINDROS AL LABORATORIO)	Und	1	$ 20.000	$ 20.000
2	DENSIDADES MÉTODO CONO DE ARENA	Und	1	$ 80.000	$ 80.000
3	DISEÑO DE CONCRETO	Und	1	$ 600.000	$ 600.000
4	SUMINISTRO DE VEHICULO A LA OBRA PARA LA TOMA DE DENSIDADES	Und	1	$ 300.000	$ 300.000

PLAZO OFERTA	20 DÍAS CALENDARIO
PAGO	50% ANTES DE LOS INICIOS DE LOS TRABAJOS DE LABORATORIO, 50% CUANDO SE ENTREGUE EL INFORME.

INDISUELOS
INGENIERÍA - DISEÑO - SUELOS
NIT: 83.043.894 - 7

Atentamente:
Fernando Augusto Rojas Chaux
Gerente

Dirección carrera 9 No 8a-51 Barrio San Antonio Pitalito Huila, teléfono 3188512281
Email: indisuelos@gmail.com

NIT 901745638-4

Pitalito, 10 de abril de 2024.

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA.

San Agustín- Huila

Solicitante del servicio

Somos una empresa de servicio denominada “MECANICA DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.”. Nuestra organización está constituida por un grupo de personas con capacidades profesionales, técnicas y humanas idóneas para desarrollar y acompañar en sus diferentes proyectos.

Los equipos de nuestro laboratorio se encuentran debidamente calibrados por un Laboratorio, el cual cuenta con acreditación del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC, teniendo en cuenta la Norma ISO/IEC 17025:2017.

De igual manera, contamos con el sistema de gestión de la calidad- SGC desarrollando un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua.

Atendiendo a su amable solicitud, a continuación, relacionamos, la propuesta de prestación del servicio No. 75-24, correspondiente al servicio solicitado. Adjuntamos a la presente nuestro portafolio de servicios.

DATOS DEL CLIENTE

PROPUESTA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO No. 75-24

NOMBRE	**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA**
NIT	891103553-7
DIRECCIÓN	VDA PUERTO QUINCHANA – SAN AGUSTIN HUILA
TELEFONO	3213797192
EMAIL	Tareas.contabilidad@hotmail.com

Ref.: **ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, PARA PLACA HUELLA EN LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA.**

ITEM	DESCRIPCION	NORMA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD					
1	Diseño de concreto, Concreto Hidráulico, para resistencias de 2000 PSI -2500 PSI-3000PSI	INV - E - 630-22	1	$ 520.000	$ 520.000
2	Densidad seca máxima in situ (densidad de campo - cono y arena). (la empresa contratista deberá programar mínimo 3 densidades por visita.)	INV - E - 161	5	$ 100.000	$ 500.000
3	Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos (incluye toma en campo de 4 especímenes cilíndricos, alquiler de equipo, transporte de muestras al laboratorio central, curado e informe final)	INV - E - 630-22	4	$ 80.000	$ 320.000
4	Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación) I.N.V.E 142	INV - E - 142	1	$ 150.000	$ 150.000
				SUBTOTAL	**$ 1.490.000**
				I.V.A (19%)	**$ 283.100**
				VALOR TOTAL	**$ 1.773.100**

SON: **UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN PESOS.M/cte.**

NOTAS Y ACLARACIONES

Nota 1: La empresa CONTRATANTE, deberá suministrar y entregar en las instalaciones del laboratorio (Calle 2 No. 2-59 Pitalito- Huila) Tres (3), medias (½) Tulas por cada agregado (arena y grava) y un bulto de cemento.

CONDICIONES DE PAGO: El 50% antes del inicio de los trabajos de campo, el 50% restante contra entrega de informe.

CONDICIONES DE ENTREGA DE INFORMES: Los informes de los ensayos se entregarán dos (2) días después de la entrega de las muestras en el laboratorio.
El plazo de dos días comenzará a contar a partir del momento en que se reciben las muestras en el laboratorio. En caso de que surjan circunstancias excepcionales que puedan retrasar la entrega de los informes, se informará a los clientes de manera oportuna sobre cualquier cambio en el cronograma de entrega. Se garantiza la confidencialidad de los resultados de los ensayos y se tomarán medidas para proteger la privacidad de los clientes y la información de las muestras.

VIGENCIA DE LA OFERTA: Valida durante el año 2024.

Quedo a la espera de gratas noticias.

Atentamente

OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
NIT. 7690.239.8
Mecánica de suelos, pavimentos y concretos

OSCAR FERNANDO AREVALO
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró: Laura Valentina Pinilla - área contable.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 4727 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

VALLA

			EMPRESAS		
			VALLARTE	TIMANCO LITOGRAFIA	TIPOGRAFIA SAN MARCOS
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COTIZACION 1**	**COTIZACION 2**	**COTIZACION 3**
VALLA DE 1X2 EN MATERIAL BANNER CON ESTRUCTURA METALICA Y PARALES DE 3.60M	1	UND	$ 410,000.00	$ 404,600.00	$ 575,000.00
TOTAL			**$ 410,000.00**	**$ 404,600.00**	**$ 575,000.00**

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE		
FORMA DE PAGO	60-40	60-40		
TIEMPO DE ENTREGA	4 DIAS	4 DIAS		

MAS ECONOMICA $ 404,600.00

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **24/04/2024**

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

BASE	$ 404,600.00
IVA	0
RETENCION 2.5% O 3.5%	NO APLICA
ANTICIPO	$ 242,760.00
PAGO 2	$ 161,840.00
TOTAL	$ 404,600.00

PROVEEDOR SELECCIONADO

COTIZACION 2

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

HENRY MARTINEZ MARTINEZ
Presidente JAC

Interventoria

Pitalito, 19 de Abril de 2024

Señores:
JUNTA ACCION COMUNAL DE LA
INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA
San Agustín - Huila

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	IMPRESIÓN DE UNA VALLA TAMAÑO: 2 M X 1 M EN BANNER IMPRESIÓN EN ALTA RESOLUCION	$ 150.000
1	LAMINADA VALLA TAMAÑO: 2 M X 1 M	$ 60.000
1	ESTRUCTURA TAMAÑO: 2 M X 1M	$ 130.000

NOTA: SI NECESITA FACTURA ELECTRONICA LOS PRECIOS SERAN MAS EL 19% IVA.

Atentamente,

Deissy Moreno Giraldo

Deissy Moreno Giraldo
C.C. 36.272.657



TIPOGRAFIA SAN MARCOS
Rosalba Navarro Lozano
Nit. 40.726.749-1
NO RESPONSABLE DE IVA

Señor(es):
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA

Muy cordialmente me permito cotizar los siguientes trabajos:

Cant.	Concepto	V/Unitario	Valor
1	***Valla Publicitaria:*** (2 MTS X 1) lona full color impresión digital con estructura metalica, tubos para suelo, sin instalar	485.000	485.000
1	***Lona Publicitaria:*** (2 MTS X 1) solo impresión lona full color. (sin instalar)	90.000	90.000

El valor de la cotización es por las cantidades mencionadas en ella, no por cantidades menores. Esta cotización tiene una vigencia de 30 días. El presente trabajo se inicia con el 100% del valor mencionado y será entregado en un plazo maximo no superior a 15 días habiles.

Rosalba Navarro Lozano
CC 40726749

Fecha de Cotización : Abril 9 / 2024

ROSALBA NAVARRO LOZANO
Cel: **312 3795637 - 8 360500** / e-mail. **sanmarcospitalito@hotmail.com**

Pitalito, 06 de mayo de 2024

Señora:
JUNTA ACCION COMUNAL INSPECCION PUERTO QUINCHANA
PITALITO HUILA
L. C.

Cordial Saludo

De acuerdo a su amable solicitud, presentamos para su consideración y estudio la siguiente cotización.

REFERENCIA: VALLA TEMPLADA CON SOPORTES
MATERIAL: MARCO EN TUBO DE PULGADA, BANNER IMPRESO, SOPORTES METALICOS DE 3M, EN TUBO REDONDO DE 2 PULGADAS

CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**410.000**	**410.000**

SON: CUATROCIENTOS DIEZ MIL ($410.000) PESOS M/CTE

METODO DE PAGO: 60% ANTICIPO DE LA VALLA Y 40% A LA ENTREGADE LA MISMA

TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES APARTIR DEL ANTICIPO Y APROBACION DEL DISEÑO.

NOTA: LA VALLA NO INCLUYE INSTALACION.

En espera de una pronta y positiva respuesta

Dora Ines Correa C

DORA INES CORREA C.
C.C.36.284.344

Ideas que venden !

Cra. 8 No. 10 -20 Tel. 8 36 9080 - Cel. 320 273 4234 - 321 234 0907 Pitalito Huila
Email- vallartepublicidad@yahoo.com

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 002	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 04/04/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Villa Fátima – San Agustín - Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 3413 de 2023 – Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA
Ejecutor(es): JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VILLA FATIMA

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
ANCIZAR SANCHEZ	JAC VILLA FATIMA	PRESIDENTE
DIEGO JOAQUI PEREZ	JAC VILLA FATIMA	TESORERO
YURANI GARCES	VEEDURIA	PRESIDENTE
JULIAN MARTINEZ	VEEDURIA	SECRETARIO
NIXON DIAZ	JAC VILLA FATIMA	ING RESIDENTE OBRA
ALBENIZ FORERO	JAC VILLA FATIMA	CONTADOR PUBLICO
CARLOS CHAVARRO	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA
IVAN SANDOVAL	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Revisión y aprobación de hojas de vida
2. Revisión y aprobación de cotizaciones presentadas

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Evaluación del personal propuesto por la Junta de Acción Comunal Ingeniero Residente, Contador Público y Maestro de Obra.

2- Revisión, socialización y aprobación de cotizaciones presentadas por la Junta de Acción Comunal, las cotizaciones a revisar con las siguientes:
   - Cotizaciones para Estudio de suelos
   - Cotizaciones para Topografía y Diseño geométrico
   - Cotizaciones para Materiales de ferretería

- Cotizaciones para Transporte de Materiales de ferretería Cemento y Acero
- Cotizaciones de Agregados pétreos y transporte de agregados pétreos
- Cotizaciones de Alquiler de maquinaria

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar).*

Tema	Resumen
1.	La junta de acción comunal realizo envió por medio de correo electrónico a la interventoría, su revisión y aprobación, la interventoría manifiesta que efectivamente ya se realizó la revisión del personal propuesto para Ing. Residente, Contador público y Maestro de obra, y anexo a esta acta de comité operativo se relaciona la evaluación respectiva de cada personal concluyendo lo siguiente: Ing. Residente: ING. NIXON GERMAN DIAZ MUÑOZ C.C 1.082.773.486 San Agustín Huila M.P. 19202-281022 CAU 22/07/2014 Contador público: ALBENIZ ARMIDA FORERO ORDOÑEZ C.C 1.082.773.655 San Agustín Huila M.P. 189338-T Maestro de obra: ELEUTERIO SALAMANCA GARCES C.C 4.936.188 San Agustín Huila
2.	La junta de acción comunal realizó envío de las cotizaciones presentadas por cada actividad, de las cuales la interventoría realiza un comparativo el cual se socializa en este comité operativo. • Las cotizaciones presentadas para los estudios de suelos: Presentan dos cotizaciones: 1. MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS. 2. INDISUELOS La interventoría manifiesta que es necesario que con el laboratorio que se trabaje para los estudios de suelos también se trabaje para la realización de los ensayos de laboratorios que se requieren, por tal motivo es necesario que la JAC cotice los ensayos de laboratorio tanto para la subbase y concretos que se requieren. El Ing. Residente manifiesta que a nombre de la JAC va a solicitar cotización en especial al laboratorio que presentó la cotización más económica. • Las cotizaciones para Topografía y Diseño geométrico: Presenta tres cotizaciones: 1. D&D INGENIERIA

	2. PLANEACION Y PROYECTOS 3. YULIAN ALBERTO LOSADA RAMOS La interventoría manifiesta que de acuerdo a las cotizaciones presentadas todas están ofreciendo el mismo servicio, adicional de la topografía y el diseño geométrico realizan diseño estructural y materialización localización y replanteo, lo cual es importante pero no es muy necesario teniendo en cuenta que dentro de la cartilla guía de Colombia rural – invias se especifica las condiciones. • Las cotizaciones para Materiales de ferretería: Presenta ocho cotizaciones precios por unidad de medida unitaria: 1. FERROPLAS 2. CONSTRUCASA 3. FERRETARIA AGRARIA 4. FERRETERIA IDEAL 5. HIERROS SAN AGUSTIN 6. FERRETERIA ANDINA 7. CONSTRUIMOS DEL HUILA 8. FRANCISCO JAVIER SOTELO CERON La interventoría manifiesta que de acuerdo a todas las cotizaciones que se presentaron para la compra de cemento y acero es viable utilizar el precio más económico. Por parte de la JAC Ing. residente manifiesta que es necesario que los materiales que se adquieran sean de buena calidad de esta forma garantizar la obra, el presidente manifiesta que Teniendo en cuenta lo que sugiere el Ing. residente, ya que es conocido en la zona ya ha realizado obras en la zona lo cual se le da la confianza para du voz. De acuerdo con lo anterior la interventoría sugiere que se trabaje con los materiales más económicos teniendo en cuenta que en la ferretería donde se realice la compra ofrezcan todos los materiales que se necesitan. Dentro de las cotizaciones que se presentan dos empresas diferentes ofrecen el precio mas económico para cada material, se sugiere que los materiales que se compren sean en una sola empresa y que esta cumpla con las condiciones legales para realizar las compras. • Las cotizaciones para Transporte de Materiales de ferretería Cemento y Acero: Para transporte de cemento presenta dos cotizaciones: 1. JOHN FREDDY RENZA JOAQUI 2. YOLIMA ERLINDA MUÑOZ BOLAÑOS Las cotizaciones especifican que el costo que ofrecen es por viaje de 200 bultos. Para transporte de acero presenta dos cotizaciones: 1. LIDIER ALBEIRO FERNANDEZ PEREZ 2. CRISTIAN DAVID ARGOTE LASSO Las cotizaciones especifican que es un solo viaje de acero de 3/8” • Las cotizaciones de Agregados pétreos y transporte de agregados pétreos:

	Presenta tres cotizaciones para la compra de materiales pétreos: 1. INDUCON 2. PETREOS COLOMBIA 3. FERRETERIA ANDINA La interventoría manifiesta que donde se realice la compra de los materiales pétreos este debe tener licencia o certificación ambiental para la comercialización de este tipo de materiales. Por parte de la JAC Ing. Residente manifiesta que dentro de la zona esta situada una cantera la cual cuenta con un material tipo afirmado de muy buen comportamiento para que sea reemplazado por la Subbase granular tipo c que se exige dentro del presupuesto, pero que esta cantera no cuenta con ningún permiso para la explotación; la interventoría manifiesta que son directrices de que el material pétreo de playa que se compre este debe venir debidamente certificado ambientalmente para no tener problemas, de igual forma la JAC insiste en presentar una caracterización de ese material con el fin de ser evaluado. Presenta tres cotizaciones para el transporte de materiales pétreos: 1. PETREOS COLOMBIA 2. JOHN FREDDY RENZA JOAQUI 3. FERREANDINA Por parte de la JAC Ing. Residente manifiesta que las cotizaciones de que se presentan, la cotización de Pétreos Colombia el precio que ofrece es un viaje de 14 m3. La interventoría manifiesta que en comparación con las tres cotizaciones pétreos Colombia es la mas viable ya que los viajes rinden muchos más y más económicos. • Cotizaciones para Alquiler de maquinaria: Presenta dos cotizaciones: 1. JOHN FREDDY RENZA JOAQUI 2. JEFFER ALEJANDRO SALAMANCA ACOSTA Las dos cotizaciones que se presentan ofrecen el mismo precio por hora trabajada.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	De acuerdo a la evaluación realizada al personal ofertado por la JAC, y teniendo en cuenta que postularon a una persona para Ing Residente de obra, una persona para Contador público y una persona para maestro de obra, todos cumple de acuerdo a las exigencias del anexo técnico dentro del convenio. Por lo tanto, el comité aprueba que para: Ing. Residente de obra:

	ING. NIXON GERMAN DIAZ MUÑOZ C.C 1.082.773.486 San Agustín Huila M.P. 19202-281022 CAU 22/07/2014 Contador público: ALBENIZ ARMIDA FORERO ORDOÑEZ C.C 1.082.773.655 San Agustín Huila M.P. 189338-T Maestro de obra: ELEUTERIO SALAMANCA GARCES C.C 4.936.188 San Agustín Huila
2.	El comité operativo aprueba lo siguiente: • Se aprueba a el LABORATORIO INDISUELOS, obtiene voto positivo por parte del presidente y veedor, por mayoría de votos se concluye que se deja este laboratorio para realizar los estudios de suelos, de igual forma se deja la trazabilidad que hacen falta las cotizaciones para la realización de ensayos de laboratorio. Tanto el presidente como veeduría manifiestan que por ser la más económica y responsable, por lo tanto, la interventoría conociendo estas opiniones vota de manera positiva para que esta empresa realice los estudios de suelos. • Se aprueba a la empresa D&D INGENIERIA, obtiene voto positivo por parte del presidente y veedor, los cuales manifiestan que aparte de que es la cotización más económica, está ubicada en la misma zona y manifiestan que ya han realizado trabajos y son muy responsables, de acuerdo con esto la interventoría manifiesta que es la más viable debido a que ofrece un menos valor en comparación con las demás cotizaciones por tal motivo se vota positivamente por la empresa en mención. • Se aprueba y de acuerdo a lo socializado para la compra de ferretería la FERRETERIA HIERROS SAN AGUSTIN, ofrece los precios óptimos para que en esta se compre todos los materiales. Tanto el presidente como veeduría votan en positivo por esta ferretería, de igual forma la interventoría también vota en positivo debido a que esta ofrece todos los materiales para que la compra se haga en una sola ferretería. • Se aprueba al señor JOHN FREDDY RENZA JOAQUI para el transporte del Cemento, debido a que este ofrece la cotización más económica y además es de la zona, por lo tanto, el presidente, veedor e interventoría votan en positivo por el señor en mención.

	• Se aprueba al señor **LIDIER ALBEIRO FERNANDEZ PEREZ** para el transporte del Acero, ambas cotizaciones presentadas ofrecen el mismo precio y son personas de la zona, por lo tanto, el presidente, veedor votan en positivo por el señor en mención debido a que este fue el primero en presentar cotización, de igual forma la interventoría manifiesta que se tiene que tener en cuenta que las personas que se están presentando quedan aprobadas por mayoría de votos, pero se debe tener en cuenta que estas personas deben tener por lo menos RUT y Cuenta bancaria para poder ser contratadas por parte de la JAC. • Se concluye y de acuerdo a lo manifestado por la JAC se deja pendiente aun la empresa para la compra y el transporte de los materiales pétreos para otro comité operativo. • Se aprueba a el señor **JOHN FREDDY RENZA JOAQUI** para el alquiler de maquinaria pajarita, ambas cotizaciones presentadas ofrecen el mismo precio y son personas de la zona, por lo tanto, el presidente, veedor votan en positivo por el señor en mención debido a que este fue el primero en presentar cotización.
3.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*


Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Realizar los contratos pertinentes del personal aprobado: Ing. Residente de obra Contador publico Maestro de obra	JAC	Entre las semanas siguientes

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Presentar cotizaciones pendientes: Ensayos de laboratorio Alquiler de maquinaria Valla Dotaciones Exámenes médicos	JAC	Entre las semanas siguientes


PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación


FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: **OLMAN ANCIZAR SANCHEZ**
Cargo: Presidente JAC




Nombre: **CARLOS ANDRÉS CHAVARRO**
Cargo: Director Interventoría



Nombre: **DIEGO JOSÉ JOAQUIN PEREZ**
Cargo: Tesorero JAC




Nombre: **IVAN SANDOVAL CARDOZO**
Cargo: Interventoría




Nombre: **YURANI MARLEIDY GARCES**
Cargo: Presidente de veeduría ciudadana



Nombre: **JULIAN ANDRES MARTINEZ QUISAMBONI**
Cargo: Secretario de veeduría ciudadana



Nombre: **NIXON GERMAN DÍAZ MUÑOZ**
Cargo: Ing. Residente de obra JAC



Nombre: **ALBENIZ ARMIDA ORDOÑEZ**
Cargo: Contador público JAC

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3413 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLAFATIMA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

SUELO

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**INDISUELOS**	**MECANICA DE SUELOS**	**COTIZACION 3**	**DIFERENCIA**
		Unidad				
Ejecución de dos (2) apiques a cielo abierto a una profundidad de 1,5 metros.	2	Unidad	$800,000.00	$800,000.00		
		19%		**$ 152,000.00**		
IVA			$ 800,000.00	$ 952,000.00		
TOTAL			**$ 800,000.00**	**$ 952,000.00**	**$ -**	-$ 152,000.00

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE		ANTICIPO
FORMA DE PAGO	50-50	CONTADO ANTICIPADO		435000
TIEMPO DE ENTREGA	8 DIAS	15 DIAS		

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **04/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

INDISUELOS

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA	1
BASE	$800,000.00
IVA	$0.00
RETENCION 2.5% O 3.5%	NO APLICA
ANTICIPO	$435,000.00
PAGO 2	$365,000.00
TOTAL	$800,000.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

Presidente JAC

Interventoria

NIT 901745638-4

Pitalito, 14 de febrero del 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE VILLA FATIMA
Solicitante del servicio.
San Agustín Huila.

Somos una empresa de servicio denominada “MECANICA DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.”. Nuestra organización está constituida por un grupo de personas con capacidades profesionales, técnicas y humanas idóneas para desarrollar y acompañar en sus diferentes proyectos.

Los equipos de nuestro laboratorio se encuentran debidamente calibrados por un Laboratorio, el cual cuenta con acreditación del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC, teniendo en cuenta la Norma ISO/IEC 17025:2017.

De igual manera, contamos con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST avalado por la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. y el Ministerio de trabajo, desarrollando un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, Además, nos encontramos en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad según los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.

Atendiendo a su amable solicitud, a continuación, relacionamos, la propuesta de prestación del servicio No. 24-24, correspondiente al servicio solicitado.

DATOS DEL CLIENTE

PROPUESTA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO No. 24-24

NOMBRE	**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE VILLA FATIMA**
NIT	813003285-5
DIRECCIÓN	VEREDA VILLA FATIMA
TEL.	3209669889
EMAIL	Jav1villafatima@gmail.com

Ref.: **ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA.**

- **Ejecución de apiques:**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ejecución de dos (2) apiques a cielo abierto a una profundidad de 1,5 metros.	2	$ 400.000	$ 800.000
			SUBTOTAL	$ 800.000
			IVA (19%)	$ 152.000
			VALOR TOTAL	$ 952.000

Son: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

DETALLE DEL SERVICIO

❖ Ítem 1. Apiques a cielo abierto.

Dicho Estudio Geotécnico cumple con los parámetros establecidos por la Norma Técnica para Construcción de Vías INVIAS-13 y NTC, el cual estipula Exploración del Área de Construcción con la siguiente metodología:

- Exploración del Sub suelo, ejecución de dos (2) apiques a cielo abierto.

Análisis granulométrico de suelos por tamizado: Granulometría por tamizado con lavado sobre tamiz No. 200	INV E-123-13	UN	2
Determinación del límite líquido de suelos	INV E 128-13	UN	2
Determinación del límite plástico de suelos	INV E 125-13	UN	2
Límite plástico e índice de plasticidad de suelos	INV E 125-13	UN	2
Límite de contracción	INV E 127-13	UN	2
Determinación en el Laboratorio del contenido de agua (Humedad del suelo, roca y mezclas de suelo-agregado) - contenido de humedad	INV E 122-13	UN	2
Relación de soporte del suelo sobre muestras inalteradas y sumergidas a cuatro (4) días CBR	INV E 148-07	UN	2
CBR Método I sobre suelos granulares	INV E 148-07	UN	2
Densidad de Campo Método del Cono de Arena	INV E 161-07	UN	2
PDC Subrasante	INV E 157-13	ML	2

1. Verificación del NIVEL FREATICO por Apique.
2. Cuadros complementarios tales como Estratigrafía, Resumen de Ensayos y Registro Fotográfico.
3. Planos topográficos suministrados por el cliente.
4. Informe final.

INDISUELOS

Pitalito 28 de Febrero de 2024

Señores:
Junta de acción comunal de la vereda de villa Fátima.

REF: Cotización de apiques para placa huella en la vereda villa Fátima del municipio de san Agustín Huila.

Cordial saludo

En atención a su solicitud, nos permitimos cotizar los ensayos en referencia.

En espera de que nuestra cotización sea de total satisfacción y poder colaborarles.

A continuación, presentaremos los precios unitarios de cada de uno de los ensayos solicitados.

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	APIQUES A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD EL INFORME FINAL CONSTA DE: CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES CBR INALTERADO, CBR SATURADO. RELACION HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO.	Und	2	$ 400.000	$ 800.000
VALOR TOTAL					**$ 800.000,00**

VALOR EN LETRAS	OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE
PLAZO OFERTA	20 DÍAS CALENDARIO
PAGO	50% ANTES DE LOS INICIOS DE LOS TRABAJOS DE LABORATORIO, 50% CUANDO SE ENTREGUE EL INFORME.

Dirección carrera 9 No 8a-51 Barrio San Antonio Pitalito Huila, teléfono 3188512281
Email: indisuelos@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3413 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLAFATIMA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

SUELO

			EMPRESAS CON DISEÑO DE MEZCLA			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**INDISUELOS**	**MECANICA DE SUELOS**	**COTIZACION 3**	**DIFERENCIA**
		Unidad				
DENSIDAD	5	Unidad	$400,000.00	$500,000.00		
RESISTENCIA A LA COMPRESION	4	Unidad	$80,000.00	$320,000.00		
RELACION FR HUMEDAD	1	Unidad	$300,000.00	$150,000.00		
DISEÑO DE MEZCLAS	1	Unidad	$600,000.00	$520,000.00		
IVA		19.00%	$ 262,200.00	$ 283,100.00		
TOTAL			**$ 1,642,200.00**	**$ 1,773,100.00**	**$ -**	-$ 130,900.00

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE		ANTICIPO
FORMA DE PAGO	50-50	CONTADO ANTICIPADO		435000
TIEMPO DE ENTREGA	8 DIAS	15 DIAS		

Comité Operativo. **No:** **2**
Fecha Comité Operativo: **04/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO
INDISUELOS

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA	1
BASE	$1,642,200.00
IVA	$0.00
RETENCION 2.5% O 3.5%	NO APLICA
ANTICIPO	$435,000.00
PAGO 2	$1,207,200.00
TOTAL	$1,642,200.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS | **Presidente JAC** | **Interventoria**

INDISUELOS

Pitalito 03 de abril de 2024

Señores:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA

REF: COTIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA PLACA HUELLA EN LA VEREDA VILLA FÁTIMA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Cordial saludo

En atención a su solicitud, nos permitimos cotizar los ensayos en referencia.

En espera de que nuestra cotización sea de total satisfacción y poder colaborarles.

A continuación, presentaremos los precios unitarios de cada de uno de los ensayos solicitados.

Nota: El valor cotizado para este trabajo no incluye IVA por el concepto de que no somos responsables de IVA

Dirección carrera 9 No 8a-51 Barrio San Antonio Pitalito Huila, teléfono 3188512281
Email: indisuelos@gmail.com

INDISUELOS

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	ENSAYO A COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (EL CLIENTE DEBE SUMINISTRAR LOS CILINDROS AL LABORATORIO)	Und	1	$ 20.000	$ 20.000
2	DENSIDADES MÉTODO CONO DE ARENA	Und	1	$ 80.000	$ 80.000
3	DISEÑO DE CONCRETO	Und	1	$ 600.000	$ 600.000
4	SUMINISTRO DE VEHICULO A LA OBRA PARA LA TOMA DE DENSIDADES	Und	1	$ 300.000	$ 300.000

PLAZO OFERTA	20 DÍAS CALENDARIO
PAGO	50% ANTES DE LOS INICIOS DE LOS TRABAJOS DE LABORATORIO, 50% CUANDO SE ENTREGUE EL INFORME.

INDISUELOS
INGENIERÍA - DISEÑO - SUELOS
NIT: 83.043.884 - 7

Atentamente:
Fernando Augusto Rojas Chaux
Gerente

Dirección carrera 9 No 8a-51 Barrio San Antonio Pitalito Huila, teléfono 3188512281
Email: indisuelos@gmail.com

NIT 901745638-4

Pitalito, 01 de abril de 2024.

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE VILLA FATIMA.

San Agustín- Huila

Solicitante del servicio

Somos una empresa de servicio denominada “MECANICA DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.”. Nuestra organización está constituida por un grupo de personas con capacidades profesionales, técnicas y humanas idóneas para desarrollar y acompañar en sus diferentes proyectos.

Los equipos de nuestro laboratorio se encuentran debidamente calibrados por un Laboratorio, el cual cuenta con acreditación del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC, teniendo en cuenta la Norma ISO/IEC 17025:2017.

De igual manera, contamos con el sistema de gestión de la calidad- SGC desarrollando un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua.

Atendiendo a su amable solicitud, a continuación, relacionamos, la propuesta de prestación del servicio No. 76-24, correspondiente al servicio solicitado. Adjuntamos a la presente nuestro portafolio de servicios.

DATOS DEL CLIENTE

PROPUESTA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO No. 76-24

NOMBRE	**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE VILLA FATIMA**
NIT	813003285-5
DIRECCIÓN	VDAVILLA FATIMA– SAN AGUSTIN HUILA
TELEFONO	3209669889
EMAIL	Jav1villafatima@gmail.com

Ref.: **ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, PARA PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE VILLA FATIMA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA.**

ITEM	DESCRIPCION	NORMA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD					
1	Diseño de concreto, Concreto Hidráulico, para resistencias de 2000 PSI -2500 PSI-3000PSI	INV - E - 630-22	1	$ 520.000	$ 520.000
2	Densidad seca máxima in situ (densidad de campo - cono y arena). (la empresa contratista deberá programar mínimo 3 densidades por visita.)	INV - E - 161	5	$ 100.000	$ 500.000
3	Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos (incluye toma en campo de 4 especímenes cilíndricos, alquiler de equipo, transporte de muestras al laboratorio central, curado e informe final)	INV - E - 630-22	4	$ 80.000	$ 320.000
4	Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación) I.N.V.E 142	INV - E - 142	1	$ 150.000	$ 150.000
				SUBTOTAL	**$ 1.490.000**
				I.V.A (19%)	**$ 283.100**
				VALOR TOTAL	**$ 1.773.100**

SON: **UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN PESOS.M/cte.**

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3413 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLAFATIMA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

VALLA

			EMPRESAS			
			VALLARTE	TIMANCO LITOGRAFIA	TIPOGRAFIA SAN MARCOS	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COTIZACION 1**	**COTIZACION 2**	**COTIZACION 3**	**MAS ECONOMICA**
VALLA DE 1X2 EN MATERIAL BANNER CON ESTRUCTURA METALICA Y PARALES DE 3.60M	1	UND	$ 410,000.00	$ 404,600.00	$ 575,000.00	
TOTAL			**$ 410,000.00**	**$ 404,600.00**	**$ 575,000.00**	$ 404,600.00

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE		
FORMA DE PAGO	60-40	60-40		
TIEMPO DE ENTREGA	4 DIAS	4 DIAS		

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **04/04/2024**

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC		
Tesorero JAC		
Interventoria		
Total Votos		

BASE	$ 404,600.00
IVA	0
RETENCION 2.5% O 3.5%	NO APLICA
ANTICIPO	$ 242,760.00
PAGO 2	$ 161,840.00
TOTAL	$ 404,600.00

PROVEEDOR SELECCIONADO

COTIZACION 2

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

Olman Anerzar Sanchez

Presidente JAC

Interventoria

Pitalito, 27 de Marzo de 2024

Señores:
JUNTA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA DE SAN AGUSTIN
San Agustín - Huila

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	IMPRESIÓN DE UNA VALLA TAMAÑO: 2 M X 1 M EN BANNER IMPRESIÓN EN ALTA RESOLUCION	$ 150.000
1	LAMINADA VALLA TAMAÑO: 2 M X 1 M	$ 60.000
1	ESTRUCTURA TAMAÑO: 2 M X 1M	$ 130.000

NOTA: SI NECESITA FACTURA ELECTRONICA LOS PRECIOS SERAN MAS EL 19% IVA.

Atentamente,

Deissy Moreno Giraldo

Deissy Moreno Giraldo
C.C. 36.272.657



TIPOGRAFIA SAN MARCOS
Rosalba Navarro Lozano
Nit. 40.726.749-1
NO RESPONSABLE DE IVA

Señor(es):
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE VILLA FÁTIMA
NIT. 8 1 3 0 0 3 9 7 9 8
correo: nayduyanith@yahoo.com

Muy cordialmente me permito cotizar los siguientes trabajos:

Cant.	Concepto	V/Unitario	Valor
1	***Valla Publicitaria:*** (2 MTS X 1) lona full color impresión digital con estructura metalica, tubos para suelo, sin instalar	485.000	485.000
1	***Lona Publicitaria:*** (2 MTS X 1) solo impresión lona full color. (sin instalar)	90.000	90.000

El valor de la cotización es por las cantidades mencionadas en ella, no por cantidades menores. Esta cotización tiene una vigencia de 30 días. El presente trabajo se inicia con el 100% del valor mencionado y será entregado en un plazo maximo no superior a 15 días habiles.

Rosalba Navarro Lozano
CC 40726749

Fecha de Cotización : Abril 01 / 2024

ROSALBA NAVARRO LOZANO
Cel: **312 3795637 - 8 360500** / e-mail. **sanmarcospitalito@hotmail.com**

Pitalito, 03 de abril de 2024

Señora:
JUNTA ACCION COMUNAL VILLA FATIMA
PITALITO HUILA
L. C.

Cordial Saludo

De acuerdo a su amable solicitud, presentamos para su consideración y estudio la siguiente cotización.

REFERENCIA: VALLA TEMPLADA CON SOPORTES
MATERIAL: MARCO EN TUBO DE PULGADA, BANNER IMPRESO, SOPORTES METALICOS DE 3M, EN TUBO REDONDO DE 2 PULGADAS

CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**410.000**	**410.000**

SON: CUATROCIENTOS DIEZ MIL ($410.000) PESOS M/CTE

METODO DE PAGO: 60% ANTICIPO DE LA VALLA Y 40% A LA ENTREGADE LA MISMA

TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES APARTIR DEL ANTICIPO Y APROBACION DEL DISEÑO.

NOTA: LA VALLA NO INCLUYE INSTALACION.

En espera de una pronta y positiva respuesta

DORA INES CORREA C.
C.C.36.284.344

Ideas que venden !

Cra. 8 No. 10 -20 Tel. 8 36 9080 - Cel. 320 273 4234 - 321 234 0907 Pitalito Huila
Email- vallartepublicidad@yahoo.com

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3413 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLAFATIMA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

EXAMENES

			EMPRESAS		
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**AGREMIACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD**	**CALIDAD COLOMBIA**	
Paquete de exámenes médicos, valoración médica osteomuscular, audiometría,	1	UND	$ 100,000.00	$ 94,000.00	
TOTAL			**$ 100,000.00**	**$ 94,000.00**	

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	
FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA DE PROGRAMACION	1 DIA DE PROGRAMACION	

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **04/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesoreso JAC	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE	$94,000.00
IVA	$0.00
SERVICIOS 4 %	$0.00
TOTAL A TRANSFERIR	$0.00

PROVEEDOR SELECCIONADO

CALIDAD COLOMBIA

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

Olman. Anezar Sanchez
Presidente JAC

Interventoria

Pitalito Huila, 02 de febrero del 2024.

Sres.
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLAFATIMA

Asunto: Propuesta exámenes médicos ocupacionales y valoraciones complementarias.

Respetuoso saludo.

Por medio de la presente me permito presentar la propuesta para realizar las evaluaciones médicas ocupacionales y valoraciones complementarias para dar cumplimiento a la resolución 2346 de 2007 y resolución 1918 de 2009 en materia de seguridad y salud en el trabajo.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	Paquete de exámenes médicos. Valoración médica osteomuscular, audiometría, Visiometria, laboratorios (Colesterol, glicemia, Triglicéridos).	$ 70.000	N/A	$ 70.000
1	Valoración medica osteomuscular	$ 30.000	N/A	$ 30.000

OLGA MERIET PÉREZ
Representante legal APSOH
"Por su seguridad al mejor nivel"
Lic. En Seguridad y Salud en el Trabajo N° 0346/2018

Pitalito, 3 de abril del 2024

Señores:
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA FATIMA
SAN AGUSTIN

Asunto: Propuesta de servicios 2024

Cordial saludo:

Con el objeto de generar espacios de reflexión acerca de la seguridad y la salud en el trabajo, a la luz con lo enmarcado en el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y Resolución 0312 de 2019, queremos poner a su disposición nuestros servicios de Medicina Ocupacional.

Es de aclarar que la presente propuesta se hará con base al profesiograma manejado en el cual está sujeto a cambios o ajustes según sugerencia de la alta dirección, Medico Ocupacional o profesional en seguridad y salud en el trabajo, con base a identificación de nuevos peligros, riesgos, ausentismos y/o incapacidades.

De igual forma ofrecemos la certificación de personas en trabajo seguro en alturas en nuestro centro de entrenamiento autorizado por el Ministerio de Trabajo y certificado por **ICONTEC**. Reiteramos nuestro agradecimiento por confiar en **CALIDAD COLOMBIA SERVICES SAS**, empresa laboyana con Licencia en SST y Resolución de habilitación; prestamos servicios de Seguridad - Salud en el trabajo y seguridad vial, en nuestra propia sede ubicada en Pitalito, contando con buena referencia de nuestros clientes Cenconsud, Grupo Éxito, Aliadas para el progreso, Nexarte, Intra Pitalito, Terminal de Transporte de Pitalito, Alcaldia de Pitalito, Hospital de Pitalito, ESE Manuel Castro Tovar, Alcaldía de Saladoblanco, Grupo Dsierra, ESE Camilo Trujillo Silva, Supermercado Rubio, Cofco Colombia, Caravela, Milt Cofee Company, Connective, Sinergy, Alcaldia de Teruel, Alcaldia de Altamira, Bomberos Pitalito, Cootraslaboyana, Aerotrans, Hotel Internacional, Estación de Servicio Sideral, CEA Buen Conductor, Contratistas Guatipan, Baru Constructores, Ferreteria la Cordillera, Almacenes Olimpica, CEA El Portal, Banexport CEA El Portal, Camara de Comercio de Neiva, Colegio de la Presentacion, Colegio San Juan de Laboyos, SACS, Clip salud, Cendiatra, Labor Vida, Corhuila, Universidad Surcolombiana, Biorganicos del huila, Supermercado AZ, Lineas Timanco, Cootranslaboyana entre otros

TARIFAS

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular, (ingreso, periódico o egreso)	$30.000
Visiometria	$17.000
Audiometría	$17.000
Colesterol	$10.000
Glicemia	$10.000
Triglicéridos	$10.000

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3413 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLAFATIMA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

MAQUINARIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	EMPRESAS: JOHN FREDY RENZA	JEFER SALAMANCA	BEIMAR CHAZOY ANACONA	BRUNO ANDRES GONZALEZ	ANGIE PAOLA SANTIAGO	JULIAN PARDO	JAVIER VILLAMARIN	
MOTONIVELADORA	1	HORA								
RETROEXCAVADORA	1	HORA	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00					
VIBRO COMPACTADOR 10 TON	1	HORA						$ 160,000.00	$ 160,000	
TRANSPORTE VIBRO	1	GLOBAL						$ 2,000,000	$ 2,200,000	
MEZCLADORA 1 BULTO	1	DIA				$ 80,000.00	$ 75,000.00			
VIBRO ELECTRICO PARA CONCRETO	1	DIA				$ 80,000.00	$ 75,000.00			
BASE										
IVA			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
TOTAL			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				

TRANSPORTE	Transporte vibro 100%			
FORMA DE PAGO	100% transp vibro, 50% alqui	50% anticipo	50% anticipo	50% anticipo
TIEMPO DE ENTREGA				

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **04/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

JOHN FREDY RENZA

ANGIE PAOLA SANTIAGO VARON

JULIAN PARDO ARTUNDUAGA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE
IVA
RETENCION 1%
TOTAL A TRANSFERIR

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

Presidente JAC

Interventoria

San Agustín, marzo 20 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA FATIMA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización hora de retroexcavadora para labores de perfilación, excavación y seriado en la construcción de la Placa Huella Vereda Villa Fátima.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del trabajo de perfilación, excavación y seriado con retroexcavadora (PAJARITA) en la construcción de Placa Huella en la Vereda Villa Fátima en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 129 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE CEMENTO A OBRA
HORA DE RETROEXCAVADORA PAJARITA	$ 120,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

   Las horas de trabajo se contabilizan desde que la maquina sale desde el casco urbano hasta el sitio de la obra.

Quedo atento a sus observaciones e inquietudes

Cordialmente.

JOHN FREDDY RENZA JOAQUI
C.C. 83.041.729 de San Agustín Huila
Teléfono: 313 249 1180
Vereda Los Cauchos
Email: johnfreddyrenza@gmail.com

COTIZACIÓN

ALQUILER DE MAQUINARIA SAN LUIS

NUM. DE COTIZACIÓN: # 34567

FECHA DE COTIZACIÓN: 21/03/2024

FECHA DE VENCIMIENTO:21/04/2024

CLIENTE: JAC VEREDA VILLAFATIMA

Contacto: Olman Ancizar Sanchez

Correo electrónico: jac1villafatima@gmail.com

Dirección: Vereda Villa Fatima

Teléfono: 320 966 9889

NÚMERO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTID	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	5-MA	Vibrocompactador de 10 toneladas	1	Hora	$160.000	$160.000
2	6-M3	Transporte de vibrocompactador en cama baja ida y regreso	1	Gbl	$2.200.000	$2,200.000
					TOTAL	**$2,350.000**

Observaciones: El stand by de la maquina sera de 4 horas.

FIRMA:

NOMBRE. JAVIER VILLAMARIN PRAGA

CC: 12 240 345

CELULAR: 3235667889

San Agustín, marzo 20 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA FATIMA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización hora de retroexcavadora para labores de perfilación, excavación y seriado en la construcción de la Placa Huella Vereda Villa Fátima.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del trabajo de perfilación, excavación y seriado con retroexcavadora (PAJARITA) en la construcción de Placa Huella en la Vereda Villa Fátima en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 129 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE CEMENTO A OBRA
HORA DE RETROEXCAVADORA PAJARITA	$ 120,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

   Las horas de trabajo se contabilizan desde que la maquina sale desde el casco urbano hasta el sitio de la obra.

Quedo atento a sus observaciones e inquietudes

Cordialmente.

JEFFER ALEJANDRO SALAMANCA ACOSTA
C.C. 1.083.899.653 de San Agustin Huila
Telefono: 310 233 0948
Carrera 2 No 1-04
E-mail: jalejandro9343@gmail.com

San Agustín, abril 03 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLAFATIMA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización día de mezcladora y vibrador de concreto para la construcción de la Placa Huella Vereda Villa Fatima.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para el alquiler de mezcladora de 1 bulto y vibrador de aguja para preparación de mezcla de concreto para la construcción de Placa Huella en la Vereda Villa Fátima en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 129 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR DIA
Dia mezcladora de 1 bulto	$ 80,000
Dia vibrador de aguja	$ 80.000

Los valores indicados no incluyen combustible ni transporte, los cuales deberán ser asumidos por el contratante.

Quedo atento a sus observaciones e inquietudes

Cordialmente.



NOMBRE: BRUNO ANDRES GONZALEZ ALVAREZ
C.C: 1.067.094.027 de Buenavista Córdoba
Telefono: 320 436 3104
Dirección: Calle 4 No 3-45

San Agustín, marzo 21 de 2024

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA FATIMA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización hora de retroexcavadora para labores de perfilación, excavación y seriado en la construcción de la Placa Huella Vereda Villa Fátima.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del trabajo de perfilación, excavación y seriado con retroexcavadora (PAJARITA) en la construcción de Placa Huella en la Vereda Villa Fátima en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 129 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE CEMENTO A OBRA
HORA DE RETROEXCAVADORA PAJARITA	$ 120,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

   Las horas de trabajo se contabilizan desde que la maquina sale desde el casco urbano hasta el sitio de la obra.

Quedo atento a sus observaciones e inquietudes

Cordialmente.

Beimar Chasoy Anacona.

BEIMAR CHASOY ANACONA
C.C 12.181.051 de San Agustín
Teléfono: 3143921163
Dirección: Cra 1 no. 2-39
Email: beimarjj1411@hotmail.com

Powered by CamScanner

San Agustín, abril 03 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLAFATIMA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización día de mezcladora y vibrador de concreto para la construcción de la Placa Huella Vereda Villa Fatima.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para el alquiler de mezcladora de 1 bulto y vibrador de aguja para preparación de mezcla de concreto para la construcción de Placa Huella en la Vereda Villa Fátima en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 129 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR DIA
Dia mezcladora de 1 bulto	$ 75,000
Dia vibrador de aguja	$ 75.000

Los valores indicados no incluyen combustible ni transporte, los cuales deberán ser asumidos por el contratante.

Quedo atento a sus observaciones e inquietudes

Cordialmente.



NOMBRE: ANGIE PAOLA SANTIAGO VARON
C.C: 1.083.911.134 de Pitalito Huila
Telefono: 317 339 9020
Dirección: Calle 2 No 8-45



CALLE 8 N No 13-15
jpmon2020@yahoo.es
312 456 7890

COTIZACIÓN

Fecha de emisión:	26/02/2024
Cotización N°:	**5**
Validez:	10 dias

Cliente:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLAFATIMA		
C.I.F/ DNI:			
Dirección:	VEREDA VILLAFATIMA		
Teléfonos:	320 9669889	**Correo elect.:**	jac1veredavillafatima@gmail.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Hora de Vibrocompactador de 10 toneladas	Unidad	1	160.000	160.000
2	Transporte ida y regreso de vibrocompactador	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Cantidad de registros **2**



Realizado por:
JULIAN PARDO ARTUNDUAGA

Subtotal		2.160.000
Descuentos	0%	-
Recargos	0%	-
Impuesto	0%	-
TOTAL		**2.160.000**

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3413 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLAFATIMA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

FERRETERIA 156 metros

		EMPRESAS									EMPRESAS		
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**FERRETERIA FERROPLAST**	**FERRETERIA AGRARIA**	**HIERROS SAN AGUSTIN**	**FERRETERIA IDEAL**	**FERRETERIA ANDINA**	**JAVIER SOTELO**	**CASA CORONA SAN**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**FERRETERIA VALE**	**FERREHIERROS CABRERA**	**INPRODES**
CEMENTO													
CEMENTO CEMEX USO ESTRUCTURAL 42.5 kg	1		$ 34,500.00	$ 34,100.00	$ 34,000.00	$ 34,000.00				bultos	$0.00	$0.00	$0.00
CEMENTO ARGOS USO ESTRUCTURAL 42.5 kg	1		$ 34,199.00	$ 33,900.00						und	$0.00	$0.00	$0.00
CEMENTO SAN MARCOS USO GENERAL 50 kg	1		$ 31,500.00		$ 30,500.00					und	$0.00	$0.00	$0.00
CEMENTO ALION CORONA USO ESTRUCTURAL 42.5 KG	1							$ 33,400.00		und	$0.00	$0.00	$0.00
ACERO, ALAMBRE Y PUNTILLA													
VARILLA 1/2" PDR-60, Fy: 4200 kg/cm3	1	$ 30,000.00	$ 30,500.00	$ 28,300.00	$ 29,610.00					kg	$0.00	$0.00	$0.00
VARILLA 3/8" PDR-60, Fy: 4200 kg/cm3	1	$ 17,800.00	$ 17,000.00	$ 16,800.00	$ 16,400.00	$ 17,500.00	$ 16,000.00			lb	$0.00	$0.00	$0.00
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE	1	$ 6,000.00	$ 6,500.00	$ 6,100.00	$ 5,540.00	$ 7,000.00				lb	$0.00	$0.00	$0.00
puntilla de 2 1/2 pung	1									und	$0.00	$0.00	$0.00
puntilla 3 pulg	1									und	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE DE ACERO										bultos	$0.00	$0.00	$0.00
		LIDIER ALBEIRO FERNANDEZ TORO	**CRISTIAN DAVID ARGOTE LASSO**										
TRANSPORTE VIAJE DE ACERO	1	$ 300,000.00	$ 300,000.00										
BASE													
IVA											$ -	$ -	$ -
TOTAL													

TRANSPORTE	Si incluye	No incluye	Si incluye
FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA	2 DIAS	2 DIAS	4 DIAS

Comité Operativo. **No:** **2**
Fecha Comité Operativo: **04/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac		
Presidente JAC		
Interventoria		
Total Votos		

PROVEEDOR SELECCIONADO

FERRETERIA IDEAL
CRISTIAN DAVID ARGOTE LASSO

Firman en aprobación

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE	$	-
IVA	$	-
RETENCION	$	-
ANTICIPO 1	$	-

Supervisor INVIAS **Presidente JAC** **Interventoria**

LUZ MARINA BRAVO GARCÉS
NIT : 26564302- 4
CL 3 11 30 34
- 3112282737
SAN AGUSTÍN - COLOMBIA

San Agustín, 29 de febrero de 2024

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLLA FATIMA
Atn:
X

San Agustin-Huila . Colombia

Ref : Cotización V - 001 - 105

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0080011000001	ALAMBRE AMARRE NEGRO	KGM	1.00	5,042.00	5,042.00
0010002000003	VARILLA 3/8	UN	1.00	14,958.00	14,958.00

Total Bruto	20,000.00
IVA	3,800.00
IMPOCONSUMO	0.00
Total a Pagar	$23,800.00

Entrega: 15 días despues de recibir su orden de compra o pedido
Forma de Pago : Contado
Validez de la oferta: 15 días a partir de la fecha, febrero 29 2024

Cordialmente,

Luz Marina Bravo Garces

LUZ MARINA BRAVO GARCÉS

Elaborado e Impreso por Sligo

PAZ CHICANGANA MIRABAL
NIT : 4935958- 8
CARRERA 11 1A 65
3184089357 -
SAN AGUSTIN - COLOMBIA

San Agustin, 29 de febrero de 2024

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE VILLAFATIMA
Atn:
VDA VILLAFATIMA
3209669889
San Agustin-Huila . Colombia

Ref : Cotización V - 001 - 141

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Descripción	Unidad	Cantidad	ValorMovimientoMasImpVenta	ValorMovi
VARILLA CORRUGADA 3/8"*6M	UN	1.00	17.000,00	17.000,00

Total Bruto	14,286.00
IVA	2,714.00
Total a Pagar	$17,000.00

Entrega: días despues de recibir su orden de compra o pedido
Forma de Pago :
Validez de la oferta: 8 días a partir de la fecha, febrero 29 2024

Cordialmente,

Vendedor Principal

PAZ CHICANGANA MIRABAL

Elaborado e Impreso por Siigo

COTIZACIÓN

CONSTRUIMOS DEL HUILA SA

Ladrillo a ladrillo, somos Construimos, servicio y calidad, un camino de experiencia y trayectoria.

Almacén Carrera 3 #1 57, Pitalito Huila.
Bodega Calle 25 sur #2c-13 Barrio Madelena, Pitalito Huila.
Tel: 3173760682
ventaspitalito@construimos.com.co

COTIZACIÓN VENTAS N° 000702
FECHA 29 de febrero de 2024
ASESOR COMERCIAL FERNANDO FAJARDO
TELÉFONO 3159265175

DATOS CLIENTE

Empresa	**JUNTA ACCION COMUNAL DE LA VDA VILLA FATIMA**
Cliente	
Dirección	**VDA VILLA FATIMA**
Ciudad	**SAN AGUSTIN HUILA**
Teléfono	**3209669889**
Correo electrónico	

Estimados señores:

Atendiendo su amable solicitud, enviamos cotización de los productos requeridos, siendo para nosotros un placer poner nuestra empresa a su servicio.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO IVA	VR. TOTAL
311302	CEMENTO GRIS X 42,5 KG MARCA ARGOS USO ESTRUCTURAL	BULTO	1	$ 33.000	$ 33.000
321104	VARILLA CORRUGADA DE 3/8" X 6MT	BARRA	1	$ 16.456	$ 16.456
321501	ALAMBRE NEGRO X KG	KG	1	$ 5.500	$ 5.500
NOTA: ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO.				SUBTOTAL	$ 46.182
				IVA	$ 8.774
				TOTAL	**$ 54.956**

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA	**2 DIAS HABILES.**
VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA	2 DIAS.
TRANSPORTE	**RECOGER EN BODEGA.**
DESCARGUE	**NO APLICA.**

SOMOS RESPONSABLES DEL RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES DE ICA

GRACIAS POR SU CONFIANZA

AURA TERESA VARGAS CASTRO
NIT: 55180756-0
CALLE 5 #12-32
CELULAR: 3223270200
SAN AGUSTÍN – COLOMBIA

San Agustín, 11 de marzo de 2024

Señores:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE INSPECCION DEL PUERTO
VEREDA VILLA FATIMA
CEL:3213797192
San Agustín-Huila. Colombia

Ref: Cotización

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor bruto	Valor con Iva	Valor total
CEMENTO ARGOS U.G. 50KL	BULTO	1	28.487	33.900	33.900
CEMENTO CEMEX U.G 50KL	BULTO	1	28.655	34.100	34.100
VARILLA CORRGUDA 3/8 x 6mts		1	14.117	16.800	16.800
VARILLA CORRGUDA 1/2 x 6mts		1	23.781	28.300	28.300

Total Bruto	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	0
Total a Pagar	0

Elaborado e Impreso por Siigo

ENTREGA: 15 días después de recibir su orden de compra o pedido

FORMA DE PAGO: Contado

TRASNPORTE: Entrega en bodega

VALIDEZ DE LA OFERTA: En la fecha solicitada debido a la variación de precio

Cordialmente,

AURA TERESA VARGAS CASTRO



FERRETERIA ANDINA ISNOS

Nit: 36113838-1

Dirección: CR4 6 25

Telefono: 3142380576

Responsabilidad: Responsable de IVA (régimen común)

COTIZACÍON
652

Resp: ELIZABETH ZUÑIGA SAMBONI

Fecha 2024-03-19
Fecha Final 2024-03-19
-

Cliente : JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA **Nit** / CC: 813003285

Telefono: 3209669889 **Direccion:**VEREDA VILLA FATIMA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	P UNID	BASE	IMP	IVA	VAL DES	DES	V TOTAL
300457	ALAMBRE NEGRO X KG	1.00	7,000.00	5,882.4	1,117.65	19%	0.00	0%	7,000.00
521255	TRANSPORTE AGREGADOS M3XKM	1.00	2,000.00	2,000.0	0.00	0%	0.00	0%	2,000.00
852735	ARENA GRUESA X M³	1.00	25,000.00	25,000.0	0.00	0%	0.00	0%	25,000.00
852734	GRAVILLA X M³	1.00	90,000.00	90,000.0	0.00	0%	0.00	0%	90,000.00
852738	PREMEZCLADO X M³	1.00	65,000.00	65,000.0	0.00	0%	0.00	0%	65,000.00
68321	VARILLA 3/8 X 6 MTRS	1.00	17,500.00	14,705.9	2,794.12	19%	0.00	0%	17,500.00
781145	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X 50 KG	1.00	34,000.00	28,571.4	5,428.57	19%	0.00	0%	34,000.00

ITEMS	7	SUBTOTAL	231,159.66	DESCUENTO	0.00	SUBTOTAL	231,159.66	IVA	9,340.34	TOTAL	240,500.00

COMENTARIO :

San Agustín Huila, 19 de marzo de 2024

Señores
JUNTA DE ACCCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLAFATIMA
NIT: 8 13003285-5
Celular de Contacto: 3209669889
Vereda Villa Fátima

REF: COTIZACION

Por medio del presente me permito presentar la presente COTIZACION referente en:

DESCRIPCION	MARCA	CALIBRE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
BARRA CORRUGADA DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO	Nacional	3/8”	1	$16.000,00

El producto será entregado en Obra , Forma de Pago de Contado

Se anexa ficha técnica del Producto:

En espera de Poder servirle con responsabilidad quedo altamente agradecido

FRANCISCO JAVIER SOTELO CERON
Asesor de Ventas
Celular 312-3908891
Lugar de Residencia Calle 7 No. 18-21 Barrio El Samán
San Agustín Huila

San Agustin, marzo 18 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLAFATIMA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Villa Fátima.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Villa Fátima en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 129 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE ACERO A OBRA
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8	$ 300,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

LIDIER ALBEIRO FERNANDEZ PEREZ
C.C 12.239.650

San Agustín, marzo 18 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLAFATIMA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Villa Fátima.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Villa Fátima en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 129 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE ACERO A OBRA
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8	$ 300,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

   El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

Cristian Argote

CRISTIAN DAVID ARGOTE LASSO
C.C 1082780915 de San Agustín

LUZ MARINA BRAVO GARCÉS
NIT : 26564302- 4
CL 3 11 30 34
- 3112282737
SAN AGUSTÍN - COLOMBIA

San Agustín, 27 de febrero de 2024

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLLA FATIMA
Atn:
X

San Agustin-Huila . Colombia

Ref : Cotización V - 001 - 99

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0010001000001	CEMENTO SAN MARCOS U.G. 50KL	BULTO	800.00	26,471.00	21,176,471.00
0010001000008	CEMENTO GRIS CEMEX U.G 50KL	BULTO	800.00	28,824.00	23,058,824.00
0010001000003	CEMENTO ARGOS U.G. 50 KL	BULTO	800.00	28,739.00	22,991,597.00

Total Bruto	67,226,892.00
IVA	12,773,108.00
IMPOCONSUMO	0.00
Total a Pagar	$80,000,000.00

Entrega: 20 días despues de recibir su orden de compra o pedido
Forma de Pago : Contado
Validez de la oferta: 15 días a partir de la fecha, febrero 27 2024

Cordialmente,

Luz Marina Bravo Garces

LUZ MARINA BRAVO GARCÉS

Elaborado e Impreso por Sligo

CONSTRUCASA

COTIZACION

FECHA 27/02/2024
SAN AGUSTIN

	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA	Código	
Nit	813003285	Ciudad Principal	
Atn.			
Obra		Cel	3146008590
Municipio	SAN AGUSTIN		
Departamen	Huila		

No.	DESCRIPCION	UND	Q	Vr. UNIT IVA INCL	Vr. TOTAL IVA INCLUIDO
1	CEMENTO ALIDN CORONA X 50KG UG	M2	800	$ 33.400	$ 26.720.000
2		M2			$ -
3		M2			$ -
4		M2			$ -
5		UND			$ -
6		UND			$ -
7		UND			$ -
8		UND			$ -
9		UND			$ -
10		BOLSA			$ -
11		BOLSA			$ -
12		BOLSA			$ -

ACUERDOS COMERCIALES

TOTAL $ 26.720.000

VALIDEZ MÍNIMA DE LA OFERTA — OCHO (08) DIAS
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES — BODEGA ALMACENES (PITALITO - SAN AGUSTÍN HUILA)
FORMA DE PAGO — TRANSFERENCIA O EFECTIVO
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nro: 45300002720 CONVENIO 13859 A NOMBRE DE CONSTRUCASA CORONA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS
DISPONIBILIDAD EN FABRICA — Inmediata
PLAZO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES — 3 días posterior al compromiso de Fábrica
PESO APROXIMADO — 0 Kgs
GARANTIA — TODOS SON MATERIALES CON CERTIFICACIÓN DE 1RA CALIDAD

EDNA LILIANA GONZALEZ LASSO
EJECUTIVA COMERCIAL
CEL 311 454 94 56

Powered by CamScanner

PAZ CHICANGANA MIRABAL
NIT : 4935958- 8
CARRERA 11 1A 65
3184089357 -
SAN AGUSTIN - COLOMBIA

San Agustin, 29 de febrero de 2024

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE VILLAFATIMA
Atn:
VDA VILLAFATIMA
3209669889
San Agustin-Huila . Colombia

Ref : Cotización V - 001 - 139

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Descripción	Unidad	Cantidad	ValorMovimientoMasImpVenta	ValorMovi
CEME CEMEX*50K	BULTO	800.00	34.500,00	27.600.000,(

Total Bruto	23,193,277.00
IVA	4,406,723.00
Total a Pagar	$27,600,000.00

Entrega: días despues de recibir su orden de compra o pedido
Forma de Pago :
Validez de la oferta: 8 días a partir de la fecha, febrero 29 2024

Cordialmente,

Vendedor Principal

PAZ CHICANGANA MIRABAL

Elaborado e Impreso por Siigo

AURA TERESA VARGAS CASTRO
NIT: 55180756-0
CALLE 5 #12-32
CELULAR: 3223270200
SAN AGUSTÍN – COLOMBIA

San Agustín, 11 de marzo de 2024

Señores:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE INSPECCION DEL PUERTO
VEREDA VILLA FATIMA
CEL:3213797192
San Agustín-Huila. Colombia

Ref: Cotización

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor bruto	Valor con Iva	Valor total
CEMENTO ARGOS U.G. 50KL	BULTO	1	28.487	33.900	33.900
CEMENTO CEMEX U.G 50KL	BULTO	1	28.655	34.100	34.100
VARILLA CORRGUDA 3/8 x 6mts		1	14.117	16.800	16.800
VARILLA CORRGUDA 1/2 x 6mts		1	23.781	28.300	28.300

Total Bruto	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	0
Total a Pagar	0

Elaborado e Impreso por Siigo

ENTREGA: 15 días después de recibir su orden de compra o pedido

FORMA DE PAGO: Contado

TRASNPORTE: Entrega en bodega

VALIDEZ DE LA OFERTA: En la fecha solicitada debido a la variación de precio

Cordialmente,

AURA TERESA VARGAS CASTRO



FERRETERIA ANDINA ISNOS

Nit: 36113838-1

Dirección: CR4 6 25

Telefono: 3142380576

Responsabilidad: Responsable de IVA (régimen común)

COTIZACÍON
652

Resp: ELIZABETH ZUÑIGA SAMBONI

Fecha 2024-03-19
Fecha Final 2024-03-19
-

Cliente : JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA **Nit** / CC: 813003285

Telefono: 3209669889 **Direccion:**VEREDA VILLA FATIMA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	P UNID	BASE	IMP	IVA	VAL DES	DES	V TOTAL
300457	ALAMBRE NEGRO X KG	1.00	7,000.00	5,882.4	1,117.65	19%	0.00	0%	7,000.00
521255	TRANSPORTE AGREGADOS M3XKM	1.00	2,000.00	2,000.0	0.00	0%	0.00	0%	2,000.00
852735	ARENA GRUESA X M³	1.00	25,000.00	25,000.0	0.00	0%	0.00	0%	25,000.00
852734	GRAVILLA X M³	1.00	90,000.00	90,000.0	0.00	0%	0.00	0%	90,000.00
852738	PREMEZCLADO X M³	1.00	65,000.00	65,000.0	0.00	0%	0.00	0%	65,000.00
68321	VARILLA 3/8 X 6 MTRS	1.00	17,500.00	14,705.9	2,794.12	19%	0.00	0%	17,500.00
781145	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X 50 KG	1.00	34,000.00	28,571.4	5,428.57	19%	0.00	0%	34,000.00

ITEMS	7	SUBTOTAL	231,159.66	DESCUENTO	0.00	SUBTOTAL	231,159.66	IVA	9,340.34	TOTAL	240,500.00

COMENTARIO :

San Agustín, marzo 18 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLAFATIMA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Villa Fátima.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Villa Fátima en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 129 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE CEMENTO A OBRA
TRANSPORTE DE 200 SACOS DE CEMENTO	$ 300,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

JOHN FREDDY RENZA JOAQUI
C.C. 83.041.729 de San Agustín Huila
Teléfono: 313 249 1180
Vereda Los Cauchos
Email. johnfreddyrenza@gmail.com

San Agustín, marzo 18 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLAFATIMA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Villa Fátima.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Villa Fátima en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 129 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE DE 200 SACOS DE CEMENTO A OBRA
TRANSPORTE DE 200 SACOS DE CEMENTO	$ 300,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue ni descargue.

Gracias.

Cordialmente.

YOLIMA ERLINDA MUÑOZ BOLAÑOS
C.C. 55.182.459 de San Agustin Huila
Telefono: 314 785 9580
CLL 11 No 1ª-59
E-mail: isabelladams@hotmail.es

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3413 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLAFATIMA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

DOTACION DEL PERSONAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	EMPRESAS							
			AGROTEXTILIS		CONFELIMARGLO		ISO SEGURIDAD INGENIERIA		LUISA FERNANDA CARVAJAL	
			Valor Unitario	Valor total	Valor Unitario	Valor total	Valor	Valor total		
Casco Industrial con certificación ansi con rache para	7	$ 17,850.00	35,000	$ 245,000.00	$ 39,100.00	$ 273,700.00	$ 26,505.00	$ 185,535.00	$ 15,900.00	$ 111,300.00
Bota en caucho punta de acero para obrero	7	$ 63,070.00	65,000	$ 455,000.00	$ 136,000.00	$ 952,000.00	$ 87,305.00	$ 611,135.00	$ 70,000.00	$ 490,000.00
Gafa industrial unilente clara protectora	7	$ 6,545.00	9,000	$ 63,000.00	$ 7,650.00	$ 53,550.00	$ 4,900.00	$ 34,300.00	$ 3,500.00	$ 24,500.00
Guante de Carnaza corto reforzado	14	$ 7,735.00	12,000	$ 168,000.00	$ 15,300.00	$ 214,200.00	$ 10,925.00	$ 152,950.00	$ 8,500.00	$ 119,000.00
Guante vaqueta corto reforzado	14	$ 7,140.00	12,000	$ 168,000.00	$ 12,750.00	$ 178,500.00	$ 11,305.00	$ 158,270.00		$ -
Peto Carnaza	5	$ 26,180.00	25,000	$ 125,000.00	$ 38,250.00	$ 191,250.00	$ 25,555.00	$ 127,775.00	$ 28,000.00	$ 140,000.00
Careta para guadañar	2	$ 30,345.00	55,000	$ 110,000.00	$ 38,250.00	$ 76,500.00	$ 27,455.00	$ 54,910.00	$ 20,000.00	$ 40,000.00
Tapaoidos de inserción siliconado	14	$ 2,975.00	6,000	$ 84,000.00	$ 4,250.00	$ 59,500.00	$ 1,330.00	$ 18,620.00	$ 2,000.00	$ 28,000.00
Botiquín Tipo A	1	$ 70,000.00	40,000	$ 40,000.00	$ 200,600.00	$ 200,600.00	$ 219,350.00	$ 219,350.00	$ 59,500.00	$ 59,500.00
Uniforme personalizado	7	$ 140,000.00	160,000	$ 1,120,000.00	$ 170,000.00	$ 1,190,000.00	$ 99,155.00	$ 694,085.00		$ -
Tela polipropileno para cerramiento H=2,00 M	30	$ 6,700.00		$ -		$ -	$ 4,250.00	$ 127,500.00		$ -
Plástico negro Cal. 6 ancho 4m para cubrimiento de	40	$ 7,200.00		$ -		$ -	$ 12,000.00	$ 480,000.00		$ -
Cinta de demarcación L=500 M	2	$ 47,000.00		$ -		$ -	$ 33,155.00	$ 66,310.00	$ 33,000.00	$ 66,000.00
Cono de señalización en Plástico h=70 cm reforzado	2	$ 50,000.00		$ -		$ -	$ 59,755.00	$ 119,510.00		$ -
Paleta de señalización PARE-SIGA	2	$ 30,000.00		$ -		$ -	$ 33,320.00	$ 66,640.00	$ 21,000.00	$ 42,000.00
Caneca Plástica 55 gal para residuos	3	$ 70,000.00		$ -		$ -	$ 74,004.00	$ 222,012.00		$ -
				$ 2,578,000.00		**$ 3,389,800.00**		**$ 3,338,902.00**		**$ 1,120,300**

TRANSPORTE		SIN TRANSPORTE		SIN TRANSPORTE		
FORMA DE PAGO	100%	CONTADO ANTICIPAD	100%	CONTADO ANTICIPADO	100%	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA		2 DIA DE		2 DIA DE		2 DIA DE

Comité Operativo. **No:** **2**
Fecha Comité Operativo: **04/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac		
Presidente JAC		
Interventoria		
Total Votos		

PROVEEDOR SELECCIONADO
ISO SEGURIDAD INGENIERIA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

BASE	$0.00
IVA	$0.00
RETENCION 2.5% O 3.5%	NO APLICA
TOTAL A TRANSFERIR	$0.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS

Presidente JAC

Interventoria



Cristian Mauricio Molano España
NIT 1.075.253.466-8
Cra. 3 No. 4-31 Local 102
Tel: (57) 3213432573
Pitalito - Colombia

Cotización
No. C-1-1594

Para	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA QUINCHANA **VEREDA VILLAFATIMA**
Nit	891.103.553-7
Contacto	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA
Dirección	VDA PUERTO QUINCHANA
Ciudad/Tel.	San Agustín / (608) 3213797192 - Ext. 000 - (000) 0000000
Fecha	2024-03-27

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

OFRECEMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD LABORAL, VENTA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA, EXTINTORES, BOTIQUINES, CAMILLAS, SEÑALIZACION, DETECTORES DE HUMO, LAMPARAS DE EMERGENCIA, ENTRE OTROS.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CASCO TIPO 1 DIELECTRICO INSAFE COLOR BLANCO	7.00	23,445.38	164,117.65	8,205.88	19 %	185,535.01
2	WORKMAN SAFETY NEGRA TALLA 39	1.00	77,226.89	77,226.89	3,861.34	19 %	87,305.00
3	LENTE CLARO SPY S/ANTIFO CLARA	7.00	4,117.65	28,823.53	0.00	19 %	34,300.00
4	GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO	14.00	9,663.87	135,294.12	6,764.71	19 %	152,950.00
5	GUANTE VAQUETA REFUERZO EXTERNO	14.00	10,000.00	140,000.00	7,000.00	19 %	158,270.00
6	PETO DE CARNAZA	5.00	22,605.04	113,025.21	5,651.26	19 %	127,775.00
7	CARETA ESMERILAR LINKTECH	2.00	24,285.71	48,571.43	2,428.57	19 %	54,910.00
8	PROTECTOR AUDITIVO HUMANPACK INSERCION ECONOMICO APOLO REF. JY-172 APOLO ECO	14.00	1,176.47	16,470.59	823.53	19 %	18,620.00
9	BOTIQUIN TIPO A	1.00	230,900.00	230,900.00	11,545.00	0 %	219,355.00
10	CINTA PELIGRO 500 MT	2.00	29,327.73	58,655.46	2,932.77	19 %	66,310.00
11	CONO PVC 70 CM CON REFLECTIVO	2.00	52,857.14	105,714.29	5,285.71	19 %	119,510.01
12	STIKER 28X28 PARA PALETAS.	2.00	8,403.36	16,806.72	840.34	19 %	18,999.99
13	CANECA 55 LT COLPLAST para PUNTO ECOLOGICO - TAPA VAIVEN-VERDE.	1.00	65,462.18	65,462.18	3,273.11	19 %	74,004.99
14	CANECA 55 LT COLPLAST para PUNTO ECOLOGICO - TAPA VAIVEN NEGRA	1.00	65,462.18	65,462.18	3,273.11	19 %	74,004.99
15	CANECA 55 LT COLPLAST para PUNTO ECOLOGICO - TAPA VAIVEN BLANCA	1.00	65,462.18	65,462.18	3,273.11	19 %	74,004.99
16	CAMISA JEAN AZUL REFLECTIVA CON BORDADO	7.00	44,453.78	311,176.47	15,558.82	19 %	351,785.00
17	PANTALON JEAN AZUL REFLECTIVO TALLA 34	7.00	41,092.44	287,647.06	0.00	19 %	342,300.00

Total Bruto	1,930,815.96
Descuentos	80,717.26
Subtotal	1,850,098.70
IVA 19%	309,841.28
Total a Pagar	2,159,939.98

1. Esta cotización no incluye valores respecto a bordados o estampados de logos,
2. Esta factura no incluye valores respecto a **instalación** de equipos, los cuales tendrán un costo dependiente del lugar .
3. Esta cotización tiene una **vigencia** de **02 días hábiles**, a partir de los cuales puede estar sujeto a cambios o variación en los precios.

DOTACIONES INDUSTRIALES

AGRO TEXTIL'S Pitalito

SEÑOR;
JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA VILLA FATIMA
NIT: 813003285

Cordial saludo.

Atendiendo la invitación realizada nos permitimos presentar cotización de la siguiente dotación

CANTIDAD	DETALLE	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	OVEROL DE DOS PIEZAS EN LINO FLEX CON ESTAMPADOS EN ESPALDA Y BOLSILLO CINTAS REFLECTIVAS EN PANTALON Y CAMISA RESPECTIVAMENTE	$160.000	$1.120.000
5	PETO EN CARNAZA	$25.000	$125.000
7	BOTA PLASTICA CON PUNTA DE ACERO	$65.000	$455.000
7	CASCO	$35.00	$245.000
7	LENTE TRANSPARENTE Y OSCURO	$9.000	$63.000
14	GUANTE EN CARNAZA	$12.000	$168.000
14	GUANTE EN VAQUETA CORTO REFORZADO	$12.000	$168.000
2	CARETA PARA GUADAÑAR	$55.000	$110.000
14	TAPA OIDO DE INSERCION SILICONADO	$6000	$84.000
1	BOTIQUIN TIPO A	$40.000	$40.000

VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS
FORMA DE PAGO; CONTADO

Atentamente,

MIREYA ZARATE
Gerente

Calle 5 No 14-03 VILLA MATILDE PITALITO HUILA TELÉFONO 3103124358



Luisa Fernanda Carvajal
NIT: 1083912400
Tel: 57+3152495694

COTIZACION No.237

Fecha: 2024-03-29 - marzo-2024 09:58

Cliente: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLAFATIMA

Ciudad: PITALITO
Email: tareas.contabilidad@hotmail.com

Identificación: 891103553
Movil: 3213797192

Nro.	Producto	Cant	PrecioxUnidad	Total
1	BOTA PLASTICA WORKMAN NEGRA CON PUNTERA/40	7 und	$ 70,000	$ 490,000
2	BOTIQUÍN LONA 19 PRODUCTOS	1 und	$ ∞	$ 59,500
3	CARETA MALLA RACHET / GUADAÑAR/ AMARILLA ECO	2 und	$ 20,000	$ 40,000
4	CASCO DIELÉCTRICO OBRERO	7 und	$ 15,900	$ 111,300
5	CINTA PELIGRO/500	2 und	$ ∞	$ 66,000
6	DELANTAL CUERO CARNAZA	5 und	$ 28,000	$ 140,000
7	GAFA GENÉRICA /NO ANP/ECO/Transparente	7 und	$ 3,500	$ 24,500
8	GUANTE INGENIERO CORTO/ REFORZADO /AMARILLO	14 und	$ 8,500	$ 119,000
9	PALETA PARE-SIGA	2 und	$ 21,000	$ 42,000

Nro.	Producto	Cant	PrecioxUnidad	Precio	Total
10	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN	14 und	$ 2,000	$ 1,681	$ 28,000

Total Neto:	**$ 1,120,300**

CONFE LIMARGLO
EQUIPOS DE OFICINA
CELS: 321-787 5427 - 313-488 4701
SUMINISTROS PARA
COLEGIOS Y HOSPITALES
FABRICA DE DOTACIONES PARA TODA
CLASE DE EMPRESAS
VENTA DE COMPUTADORES
Y REPUESTOS PARA LOS MISMOS
GLORIA MARLENY MUÑOZ GOMEZ NIT: 36.125.103-9
REGIMEN SIMPLIFICADO
CARRERA 10 No. 12-25 BARRIO SAN ANTONIO PITALITO H.

PROPUESTA


CLIENTE: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FÁTIMA
NIT: 813.003.285-5 **CIUDAD:** SAN AGUSTIN HUILA **FECHA:** 25-03-2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito extenderles mi más sincero saludo deseándoles muchos éxitos en sus labores, y a su vez poniendo en disposición los Servicios de CONFELIMARGLO, para ofrecerle suministros que puedan apoyar su trabajo:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CASCO TIPO I DIELCTRICO	7	$ 39.100	$ 273.700
2	BOTA PVC SEGURIDAD CAÑA ALTA TALLA 37, 38, 39, 49, 40, 41, 42, 43 TALLA 44, 45 TIENEN COSTO ADICIONAL	7	$ 136.000	$ 952.000
3	GAFA REF 818 CLARA	7	$ 7.650	$ 53.550
4	GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO EN VAQUETA		$ 15.300	$ 214.200
5	GUANTE VAQUETA CORTO REFORZADO EN VAQUETA		$ 12.750	$ 178.500
6	DELANTAL CARNAZA MEDIANO	5	$ 38.250	$ 191.250
7	CARETA PARA GUADAÑAR MALLA METALICA	2	$ 38.250	$ 76.500
8	TAPAOIDO INSERCIOON SILICONA		$ 4.250	$ 59.500
9	BOTIQUIN MORRAL DOTADO	1	$ 200.600	$ 200.600
10	UNIFORMA INVIAS LINOFLEX DOS PIEZAS, CINTA REFLECTIVA Y ESTAMPADOS TALLA S, M, L, XL TALLA 2XL, 3XL, 4XL, 5XL TIENEN COSTO ADICIONAL	7	$ 170.000	$ 1.190.000
TOTAL				**$ 3.389.800**

Atentamente:



GLORIA MARLENY MUÑOZ GOMEZ
CC. 36.125.103

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3413 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLAFATIMA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

AGREGADOS

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**EL ALTICO**	**MADER CENTRAL**		
TABLA BURRA 20cm x 3cm x 3 mts	1	UND	$ 19,000.00	$ 18,800.00		
TOTAL			**$ 19,000.00**	**$ 18,800.00**	**$ -**	**$ -**

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	CON TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE
FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA				

FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA	1 dia	1 dia

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **04/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

MADER CENTRAL
$ -

Firman en aprobación

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA BIOGESTION

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA PETREOS COLOMBIA

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

Supervisor INVIAS

Presidente JAC

Interventoria

EMPRESA FORESTAL RECONOCIDA POR LA CAM
MEDIANTE RESOLUCION N° 635 (23/02/2018)

Empresa: **VENTA DE MADERA Y MACHIMBRES EL ALTICO**
NIT: **1 082 774 855 – 0** **NO RESPONSIBLE DE IVA**
Dirección: CALLE 3 # 7 – 56 Barrio San Martin
Teléfono: 312 3918 596 – 313 8021 273 – 311 4789 242
Ciudad: SAN AGUSTIN – HUILA
Correo Electrónico: depositomaderaelaltico@gmail.com
Fecha: **11/03/2024**

****VALIDEZ DE LA OFERTA** = **MARZO**

Producto	Cantidad	Vr Unitario	%Descuento	IVA	Vr Total
TABLA BURRA 20cm x 3cm x 3 mts	1	$ 19,000	0%	0%	$ 19.000
				Subtotal	**0**
				Descuento	**0**
				IVA	**0**
				TOTAL	**$ 19.000**

****NOTA: Este material se debe arreglar para realizar placa huella.**

Cotización dirigida a: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA**
NIT 813 003 285-5

NOTA: *Estos materiales cuentan con el amparo de los permisos legales y certificados por las autoridades ambientales.*

Anderson Gómez Bolaños
Firma
Representante legal de la empresa forestal

Cotización

Empresa: Mader Central
NIT. 1075253766-2
Dirección: Calle 2 # 11 - 35
Municipio: San Agustín
Correo:
madercentralsanagustin@gmail.com
Teléfono: 3118400430 - 3132536421

	Concepto	Precio
1	Tabla burra de 20cm	$18,800.00
Total		$18,800.00

Dirigida a: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA FÁTIMA

REPRESENTANTE LEGAL
ERIKA JASBLEIDI MUÑOZ ZUÑIGA
C.C. 1075253766 de Neiva

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3413 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLAFATIMA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

TOPOGRAFIA

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**D&D INGENIERIA**	**PLANEACION & DISEÑO**	**JULIAN LOSADA**	**DIFERENCIA**
Levantamiento Topografico	1	Unidad	$900,000.00	$950,000.00	$1,000,000.00	
Diseño Geometrico	1	Unidad	$850,000.00	$750,000.00	$700,000.00	
Materializacion eje del Proyecto	1	Unidad	$850,000.00	$950,000.00	$1,100,000.00	
Control de Niveles	0	Unidad	$0.00	$0.00		
Plano Record final	0	Unidad	$0.00	$0.00		
BASE						
IVA			$ -	$ -		
TOTAL			**$ 2,600,000.00**	**$ 2,650,000.00**	**$ 2,800,000.00**	-$ 50,000.00

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE		anticipo
FORMA DE PAGO	50-50	CONTADO ANTICIPADO		$1,325,000.00
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIAS	15 DIAS		

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **04/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Presidente JAC	X	
Tesorero JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

D&D INGENIERIA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA 1

BASE	$2,650,000.00
IVA	$0.00
RETENCION 10% O 11%	NO APLICA
ANTICIPO	$1,325,000.00
PARCIAL 2	$1,325,000.00
TOTAL	$2,650,000.00

Firman en aprobación

Supervisor INVIAS | **Presidente JAC** | **Interventoria**

D&D
INGENIERIA
301 348 01 22
301 347 95 51
dydingenieriacivilytopografica@gmail.com

San Agustín Huila, 08 de marzo de 2024

SEÑORES:
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE VILLA FATIMA

ASUNTO: Propuesta Económica Revisión y/o Ajustes Estudios y Diseños Placa Huella Vereda Villa Fátima.

Cordial saludo,

Gracias por comunicarse con nosotros, por medio de la presente hacemos llegar a usted la propuesta técnico-económica de acuerdo con su solicitud.

ALCANCE DE LA PROPUESTA

- ✓ Se realizará levantamiento Topográfico del tramo de la Placa Huella en la vereda Villa Fátima.

- ✓ Se realizará el Diseño Geométrico del tramo de la Placa Huella en la vereda Villa Fátima.

- ✓ Se realizará los Planos Estructurales de la Placa Huella en la vereda Villa Fátima, de acuerdo con los parámetros de la Guía de Construcción de Vías Terciarias de Colombia Rural.

D&D INGENIERIA
301 348 01 22
301 347 95 51
dydingenieriacivilytopografica@gmail.com

VALOR PROPUESTA.

PROPUESTA ECONOMICA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR GLOBAL**	
1	Levantamiento Topográfico Georreferenciado	$	900,000.00
2	Diseño geométrico	$	450,000.00
3	Planos Diseño Estructural	$	400,000.00
4	Localización y Replanteo de la obra	$	850,000.00
TOTAL		**$**	**2,600,000.00**

El valor de la propuesta es de $ 2.600.000, Dos millones seiscientos mil pesos M(CTE).

FORMA DE PAGO.

Para iniciar trabajos y posterior a la firma del contrato, se solicita un anticipo del 50%. Una vez ejecutado el 100% de las actividades contratadas, se solicita el pago del 50% restante.

GARANTÌAS PARA EL CLIENTE.

Una vez revisado el producto por parte de la entidad correspondiente, en caso de ser necesario, se realizarán las subsanaciones a que haya lugar y que sean propias del alcance de la presente cotización.

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

La disponibilidad es inmediata, una vez se efectué el pago del anticipo. El tiempo de ejecución es de 8 días.

DIANA HINET JIMENEZ CHILITO
TEL. 301 3480122
INGENIERA TOPOGRÁFICA

Pitalito, febrero 19 de 2024

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA FATIMA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Asunto: Propuesta económica levantamiento topográfico, diseño geométrico, localización y levantamiento plano record para proyecto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Cordial saludo.

Es para nosotros muy importante ofrecer a usted nuestro servicio con profesionalismo, convencidos que podemos satisfacer sus necesidades de seguridad, comodidad y economía en la consultoría en referencia así:

CUADRO DE PRESUPUESTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	SUB TOTAL
1	Levantamiento topográfico para proyectos de pavimentación tipo Placa huella. Levantamiento realizado con estación total de topografía. Nota: El levantamiento topográfico ligado a partir de una georreferenciación con ayuda de herramientas como google earth la cual genera unas coordenadas iniciales aproximadas.	GL	950,000
2	Diseño geométrico de la rasante, acorde a la guía del instituto nacional de vías INVIAS. Se hace entrega de planos planta - perfil y secciones transversales del diseño de rasante, con la descripción de los tipos de curva. Se entrega cálculo de volumenes de corte y/o terraplen e informe escrito describiendo la metodología empleada, carteras de coordenadas, certificado de calibración de equipos y registro fotográfico.	GL	700,000
3	Localización del diseño geométrico. Materialización del eje del proyecto cada 10 metros en recta y en curva cada 5 metros. En caso de haber sobre ancho localización de éste.	GL	950,000
4	Realización de levantamiento topográfico final. Entrega de plano record.	GL	950,000
			3,550,000
		COSTOS DIRECTOS:	**3,550,000**
SON:	**TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS**		

Calle 3 No 4-60 Pitalito (H)
320 812 6493 - 311 591 1528
carolinabolivarp@gmail.com

Pitalito, febrero 15 de 2024

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Asunto: Cotización levantamiento topográfico inicial, diseño geométrico, materialización del proyecto y levantamiento plano final, para proyecto cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Cordial saludo.

De manera atenta me permito allegar la siguiente cotización de acuerdo a lo requerido.

PRESUPUESTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	SUB TOTAL
1	Levantamiento topográfico para proyectos de pavimentación tipo Placa huella. Levantamiento realizado con estación total de topografía.	GL	1,000,000
2.	Diseño geométrico de la rasante, acorde a la guía del instituto nacional de vías INVIAS.	Mts	700,000
3	Materialización del eje del proyecto	Mts	1,100,000
4	Levantamiento topográfico final. Entrega de plano en planta	Mts	1,100,000
			3,900,000
		VALOLOR TOTAL	**3,900,000**

SON: TRES MILLLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

Valor total: **TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS**
Forma de pago 50% de anticipo y 50% al final
No incluye seguridad social.

Yulian Losada.
YULIAN ALBERTO LOSADA RAMOS
Tecnólogo en topografía.
M.P. 01-15207 CNPT

Carrera 4 No 7-54 Isnos (H) Cel: 313 266 1906
7yulian@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CONVENIO No. 3413 de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLAFATIMA
INTERVENTOR: ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
SUPERVISOR: ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

AGREGADOS

			EMPRESAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**INDUCON**	**PETREOS COLOMBIA**	**ANDINA**	
AGREGADOS PETREOS						
Premezclado 1/2	0	m3				
Premezclado 3/4	0	m3	$ 89,250.00			
Gravilla 3/4	1	m3	$ 101,150.00	$ 101,150.00	$ 101,150.00	
Gravilla 1/2	0	m3	$ 101,150.00			
Sub base granular	1	m3	$ 77,350.00	$ 53,550.00	$ 65,450.00	
Material de Cantera	0	m3				
Piedra ciclopeo	0	m3				
Arena Triturada	1	m3	$ 59,500.00	$ 47,600.00	$ 47,600.00	
TRANSPORTE						
			PETREOS COLOMBIA	**JOHN FREDY RENZA**	**FERRETERIA ANDINA**	**YOLIMA MUÑOZ**
TRANSPORTE AGREGADOS DESDE PETREOS	1	Viaje 6 m3	$ 325,500.00	$ 320,000.00	$ 372,000.00	
TRANSPORTE DE CEMENTO DESDE AREA URBANA	1	Viaje 200 Sacos		$ 300,000.00		$ 300,000.00
TOTAL			**$ 428,400.00**	**$ 202,300.00**	**$ 214,200.00**	**$ -**

TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	CON TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE	SIN TRANSPORTE
FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA				

FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA	1 dia	1 dia

Comité Operativo. **No:** **2**

Fecha Comité Operativo: **04/04/2024**

Aprobación	SI	NO
Tesorero Jac	X	
Presidente JAC	X	
Interventoria	X	
Total Votos	3	

PROVEEDOR SELECCIONADO

PETREOS COLOMBIA

JOHN FREDY RENZA

Firman en aprobación

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA BIOGESTION

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA PETREOS COLOMBIA

BASE
IVA
RETENCION 2.5% O 3.5%
ANTICIPO 100%

Supervisor INVIAS

Presidente JAC

Interventoria

Pitalito 26de febrero del 2024

Rut:891103553-7
SEÑOR: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE VILLAFATIMA
Correo: tareas.contabilidad@hotmail.com
Dirección: VDA PUERTO QUINCHANA
Tel:3213797192

Cordial saludo.

Me dirijo a usted con el fin de presentarle la siguiente cotización, de agregados para la construcción. El desarrollo de nuestra actividad las realizamos amparados con los respectivos permisos y licencias otorgados por las entidades competentes “Titulo Minero N° KBN08251, Licencia Ambiental Res.N° 0228 Feb del 2013”.

PLANTA INDUCON TRITURADOS

TIPO DE MATERIAL	**PRECIO POR METRO CUBICO**	**PRECIO POR METRO CUBICO**
Gravilla ½,3/4, 1 pulgada	SIN IVA $85.000	CON IVA $101.150
BASE	SIN IVA $75.000	CON IVA $89.250
ARENA G	SIN IVA $50.000	CON IVA $59.500
SUBBASE TIPO C	SIN IVA $65.000	CON IVA $77.350
PIEDRA FILTRO (RAJON)	SIN IVA $80.000	CON IVA $95.200
MIXTO	SIN IVA $75.000	CON IVA$89.250

el servicio de transporte es adicional;

Nota: El modo de pago se manejan por anticipos se realizar las consignaciones a la cuenta Corriente Bancolombia N°453229659-51 a nombre de José Hilario Vargas Trilleras. Las respectivas copias de las licencias se facilitan una vez se haya concretado la compra

Atentamente:

JOSE HILARIO VARGAS TRILLERAS
C.C. 12.237.793 De Pitalito Huila
Cel. 3108184433

Pitalito, Huila 26 de Febrero año 2024

Señores:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA

ASUNTO: COTIZACIÓN

Respetados señores, atendiendo su amable solicitud, PETREOS COLOMBIA. S.A.S. ponemos a su consideración la cotización sobre materiales de construcción.

Se adjunta la siguiente relación:

MATERIAL	VALOR M3	IVA M3	VALOR M3 IVA INCLUIDO
GRAVILLA ¾ - ½	$ 85.000	$ 16.150	$ **101.150**
MIXTO DE RIO	$ 45.000	$ 8.550	$ **53.550**
BASE	$ 65.000	$ 12.350	$ **77.350**
SUB- BASE	$ 45.000	$ 8.550	$ **53.550**
PREMEZCLADO	$ 65.000	$ 12.350	$ **77.350**
ARENA TRITURADA	$ 40.000	$ 7.600	$ **47.600**

El suministro de Pétreos contempla:

- Los valores indicados no incluyen transporte, este servicio será adicionado al valor de la cotización, ponemos a su disposición transporte Doble Troque, desde la Planta de Pétreos ubicada en Vereda Matanzas kilómetro 21 vía San Agustín. Valor kilometro $1.000 pesos Mct

Consideraciones:

- El cliente deberá informar y enviar a la persona encargada de recibir el material en la Planta de Pétreos, quien a su vez será el (o la) responsable de comprobar la calidad del material, por lo que no se aceptaran reclamos ni devoluciones.
-

Av. 3 No. 19-276 Sur Pitalito Huila Colombia
Teléfono: (57) (8) 836 91 28 - 3156272801
Email: petreoscolombia@gmail.com



FERRETERIA ANDINA ISNOS

Nit: 36113838-1

Dirección: CR4 6 25

Telefono: 3142380576

Responsabilidad: Responsable de IVA (régimen común)

COTIZACÍON
652

Resp: ELIZABETH ZUÑIGA SAMBONI

Fecha 2024-03-19
Fecha Final 2024-03-19
-

Cliente : JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA **Nit** / CC: 813003285

Telefono: 3209669889 **Direccion:**VEREDA VILLA FATIMA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	P UNID	BASE	IMP	IVA	VAL DES	DES	V TOTAL
300457	ALAMBRE NEGRO X KG	1.00	7,000.00	5,882.4	1,117.65	19%	0.00	0%	7,000.00
521255	TRANSPORTE AGREGADOS M3XKM	1.00	2,000.00	2,000.0	0.00	0%	0.00	0%	2,000.00
852735	ARENA GRUESA X M³	1.00	25,000.00	25,000.0	0.00	0%	0.00	0%	25,000.00
852734	GRAVILLA X M³	1.00	90,000.00	90,000.0	0.00	0%	0.00	0%	90,000.00
852738	PREMEZCLADO X M³	1.00	65,000.00	65,000.0	0.00	0%	0.00	0%	65,000.00
68321	VARILLA 3/8 X 6 MTRS	1.00	17,500.00	14,705.9	2,794.12	19%	0.00	0%	17,500.00
781145	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X 50 KG	1.00	34,000.00	28,571.4	5,428.57	19%	0.00	0%	34,000.00

ITEMS	7	SUBTOTAL	231,159.66	DESCUENTO	0.00	SUBTOTAL	231,159.66	IVA	9,340.34	TOTAL	240,500.00

COMENTARIO :

Pitalito, Huila 18 de marzo 2024

Señores:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA
Nit: 813003285-5

ASUNTO: COTIZACIÓN

Respetados señores, atendiendo su amable solicitud, PETREOS COLOMBIA. S.A.S. ponemos a su consideración la siguiente cotización.

Se adjunta la siguiente relación:

SERVICIO DE TRANSPORTE	KM	VALOR TOTAL
VEREDA QUINCHANA	38	$ 798.000
VEREDA VILLA FATIMA	31	$ 651.000
VEREDA PRADERA	26	$ 546.000
VEREDA OBANDO	24	$ 504.000

Forma de Pago.

- Anticipo por valor del 50%
- Pagos Quincenales según corte realizado amortizando anticipos.

A consideración del cliente los pagos se podrán consignar a las siguientes cuentas:

- **OPCIÓN 1:** cuenta corriente No. 45300001466 de Bancolombia a nombre de PETREOS COLOMBIA SAS.
-

San Agustín, marzo 18 de 2024 **COTIZACIÓN**

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Villa Fatima.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Villa Fátima en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 129 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE CEMENTO A OBRA
TRANSPORTE DE AGREGADOS A VILLA FATIMA VIAJE DE 6 M3, TOTAL 30 KILOMETROS	$ 320,000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio no incluye: Cargue.

Gracias.

Cordialmente.

JOHN FREDDY RENZA JOAQUI
C.C. 83.041.729 de San Agustín Huila
Teléfono: 313 249 1180
Vereda Los Cauchos
Email: johnfreddyrenza@gmail.com



FERRETERIA ANDINA ISNOS

Nit: 36113838-1

Dirección: CR4 6 25

Telefono: 3142380576

Responsabilidad: Responsable de IVA (régimen común)

COTIZACÍON
652

Resp: ELIZABETH ZUÑIGA SAMBONI

Fecha 2024-03-19
Fecha Final 2024-03-19
-

Cliente : JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA **Nit** / CC: 813003285

Telefono: 3209669889 **Direccion:**VEREDA VILLA FATIMA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	P UNID	BASE	IMP	IVA	VAL DES	DES	V TOTAL
300457	ALAMBRE NEGRO X KG	1.00	7,000.00	5,882.4	1,117.65	19%	0.00	0%	7,000.00
521255	TRANSPORTE AGREGADOS M3XKM	1.00	2,000.00	2,000.0	0.00	0%	0.00	0%	2,000.00
852735	ARENA GRUESA X M³	1.00	25,000.00	25,000.0	0.00	0%	0.00	0%	25,000.00
852734	GRAVILLA X M³	1.00	90,000.00	90,000.0	0.00	0%	0.00	0%	90,000.00
852738	PREMEZCLADO X M³	1.00	65,000.00	65,000.0	0.00	0%	0.00	0%	65,000.00
68321	VARILLA 3/8 X 6 MTRS	1.00	17,500.00	14,705.9	2,794.12	19%	0.00	0%	17,500.00
781145	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X 50 KG	1.00	34,000.00	28,571.4	5,428.57	19%	0.00	0%	34,000.00

ITEMS	7	SUBTOTAL	231,159.66	DESCUENTO	0.00	SUBTOTAL	231,159.66	IVA	9,340.34	TOTAL	240,500.00

COMENTARIO :

San Agustín, marzo 21 de 2024

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

REF: Cotización de Transporte de materiales para la construcción de la Placa Huella Vereda Villa Fatima.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar mi propuesta económica para la realización del Trabajo de transporte de materiales para la Placa Huella Vereda Villa Fátima en el Municipio de San Agustín, para un tramo de 129 metros.

1. **VALOR DE LA OFERTA**

DESCRIPCIÓN	VR. POR TRANSPORTE GLOBAL DE CEMENTO A OBRA
TRANSPORTE DE AGREGADOS A VILLA FATIMA VIAJE DE 6 M3, TOTAL 30 KILOMETROS	$ 400,000
TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVAIÓN , VIAJE 6M3	$ 70.000

Los valores indicados no incluyen retenciones.

1. **OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA**

El anterior precio incluye: Cargue.

Cordialmente.

Beimar Chasoy Anacona

BEIMAR CHASOY ANACONA
C.C 12.181.051 de San Agustín
Teléfono: 3143921163
Dirección: Cra 1 no. 2-39
Email: beimarjj1411@hotmail.com

Powered by CamScanner

ANEXO 11:


INFORME DE PROFESIONALES, TOPOGRAFIA Y ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA MES DE ABRIL

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

INFORME DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

Las actividades que realizó el ingeniero CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Director de interventoría durante el periodo del 1 de Abril al 30 de Abril de 2024 fueron:

- Comité virtual inicial con juntas.
- Revisión de documentación
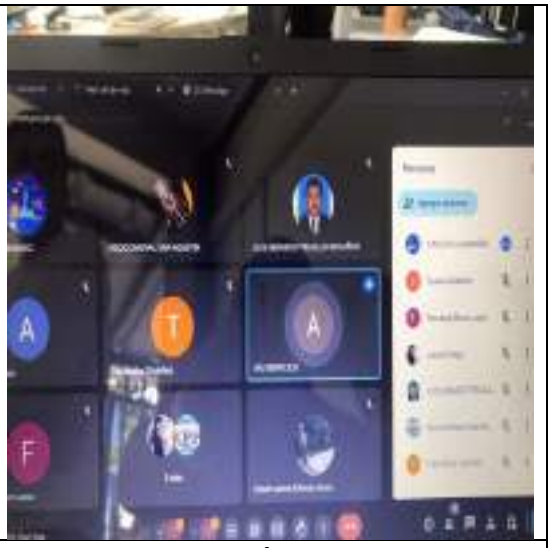
<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Comité del proyecto</td><td>Comité virtual</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Comité técnico</td></tr>
</table>


Carrera 7 N.º 16 A –31 oficina 1er. Piso – Quirinal, Celular: 3168747742
E-mail: ing.cach76@gmail.com, Neiva- Huila

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

INFORME DE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
JUAN DIEGO HERRERA

Las actividades que realizó ingeniero Ivan Fabricio Sandoval Cardozo residente de interventoría durante el periodo del 1 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024 fueron:

- Comité virtual con juntas.
- Acompañamiento a las juntas de acción comunal para la ubicación de cada una de las obras a realizar.

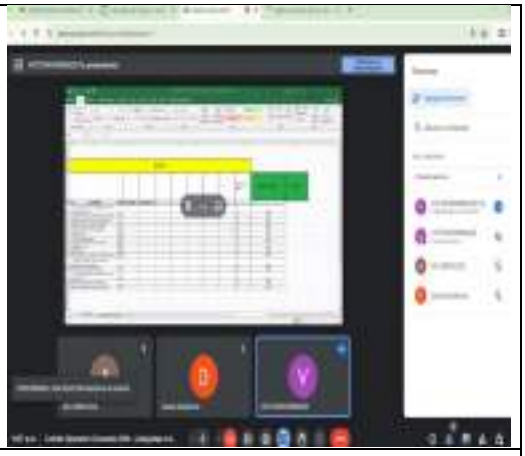	
Comité virtual	Visita preliminar sito de obra
	
Visita sitio de obra	Visita preliminar sito de obra


Carrera 7 N.º 16 A –31 oficina 1er. Piso – Quirinal, Celular: 3168747742
E-mail: ing.cach76@gmail.com, Neiva- Huila

ANEXO 12:




INFORME AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO MES DE ABRIL

ANEXO 13:
REGISTRO FOTOGRÁFICO



ASOJUNTA
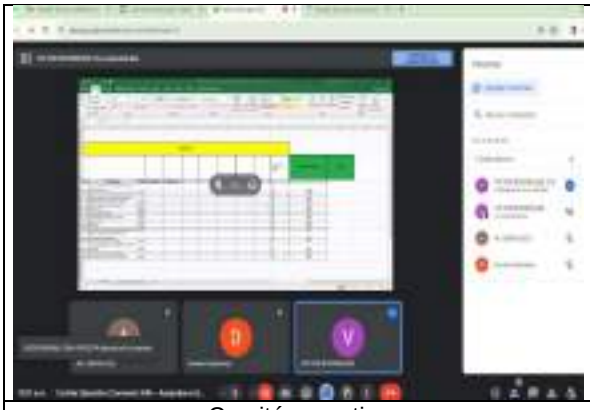
<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Comité operativo</td><td>Comité virtual</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Comité virtual</td><td>Prorroga</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Supervisión</td><td>Seguimiento</td></tr>
</table>


BAJO JUNIN

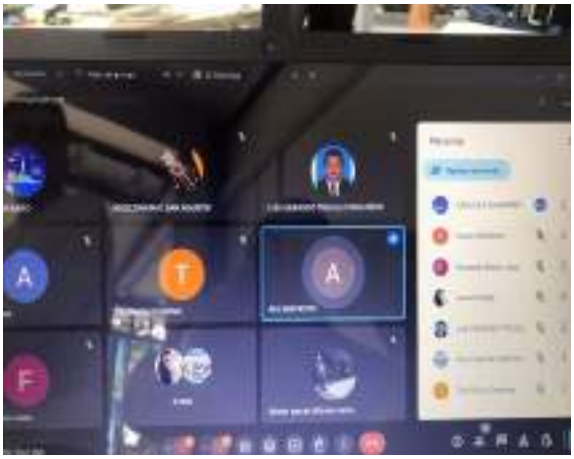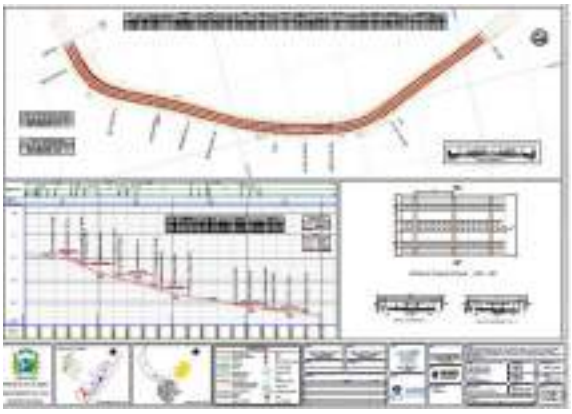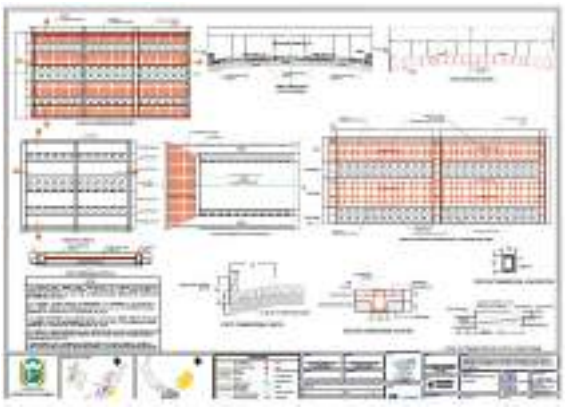	
Comité operativo	Comité virtual
	
Comité virtual	Prorroga
	
Supervisión	Seguimiento

VILLA FATIMA

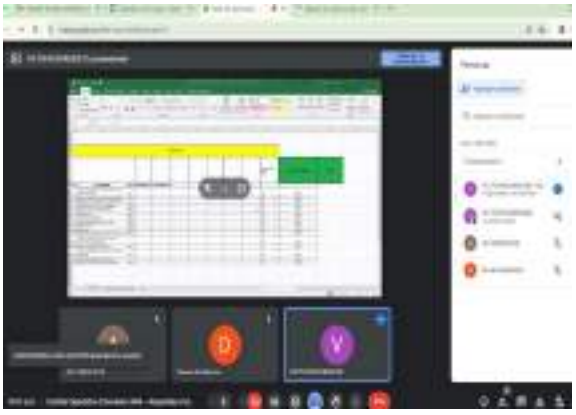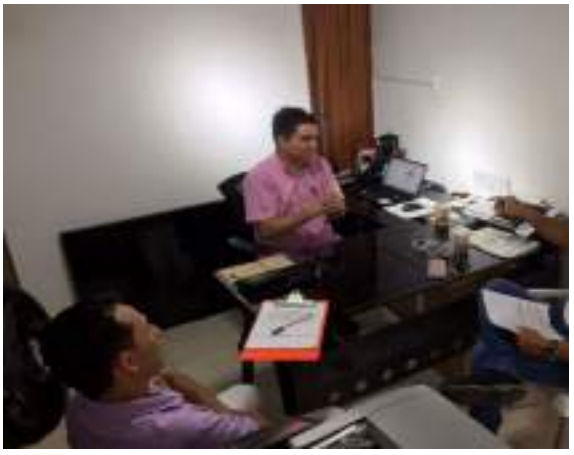	
Comité operativo	Comité operativo
	
Prorroga	**Supervisión**

PUERTO QUINCHANA

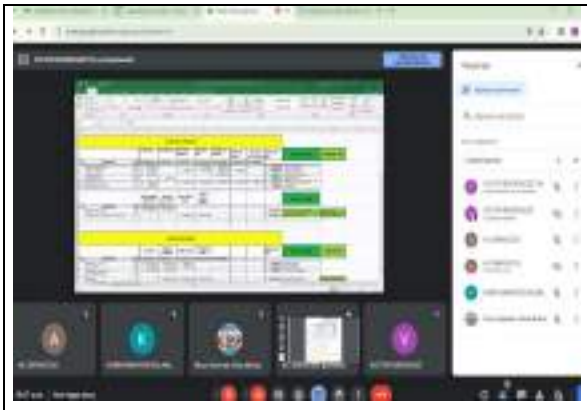	
Comité operativo	**Evaluación y verificación de personal**

	
Comité virtual	Comité virtual
	
Prorroga	Supervisión
