CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 - 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 05
PERIODO: DEL 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SUPERVISOR:

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS SOLIDARIOS:


3379 DE 2023 – OAC LA ESMERALDA
3441 DE 2023 – OAC BAJO PLATANILLO
3760 DE 2023 – OAC BUENOS AIRES BAJOS

PERIODO:

DEL 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024

FLORENCIA – CAQUETÁ

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN INFORME TÉCNICO

Tipo de Documento: INFORME TÉCNICO	Contrato: ACEPTACIÓN DE OFERTA 4136 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
Titulo: INFORME MENSUAL No 5. JULIO/2024		
Emitido para: Aprobación		
ELABORÓ: Ing. Residente	Firma:	
	Nombre:	Ing. Cesar Augusto Galindez Garcia C. C. No. 1.110.521.985 de IBAGUÉ M P No. 70202 393111 TLM
REVISÓ: Ing. Director	Firma:	
	Nombre:	Ing. Elkin David Ramos Mosquera C. C. No. 7.692.245 de NEIVA M P No. 19202 61820 CAU
APROBÓ: Supervisor	Firma:	
	Nombre:	José Ricardo Burbano Barcenas

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

(**VER A CONTINUACIÓN FORMATO:** *MEPI-MN1-IN-15-FR-1*)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenios Solidarios No.: 3379 DE 2023
3441 DE 2023
3760 DE 2023

Contratista 1: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA
Contratista 2: JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO
Contratista 3: JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

Contrato de Interventoría No. 4136 DE 2023

Interventor: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Objeto Contrato de Interventoría:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILÁN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 5

MES O PERIODO: JULIO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	4
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	7
	CONTENIDO		14
1	**INTRODUCCIÓN**		20
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		23
2.1	Localización		23
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		30
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		30
2.4	Características técnicas del proyecto		32
3	**INFORMACIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS**		37
3.1	Información general de convenios solidarios		37
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		49
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		57
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		57
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS**		59
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	59
4.2	Maquinaria y Equipo de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	60
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	60
4.4	Informe Financiero y Presupuestal de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	61
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	61
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	61
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros de los convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	62
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad de convenios solidarios	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	62
4.9	Otros documentos de seguimientos mensual		63
	• Seguimiento a la inversión del desembolso		63
	• Seguimiento programa de obra		63
4.10	• Actas de comité de obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	66
4.11	• Actas de reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	66
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		67
5.1	Información general del contrato		67
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		72
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		72
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	72
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	72
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	72
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	72
6.5	Otros documentos seguimiento mensual		72
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	72
7	**Conclusiones y recomendaciones**		73
8	**Anexos**		74
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		74
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		74
8.3	Copia de la bitácora de obra del mes correspondiente del convenio solidario		74
8.4	Informes semanales		74
8.5	Maquinaria y Equipo de convenios solidarios		74
8.6	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social de convenios solidarios		75
8.7	Informe Financiero y presupuestal de convenios solidarios		75
8.8	Estado general del tiempo		75

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenios Solidarios No.: 3379 DE 2023
3441 DE 2023
3760 DE 2023

Contratista 1: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA
Contratista 2: JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO
Contratista 3: JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

Contrato de Interventoría No. 4136 DE 2023

Interventor: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Objeto Contrato de Interventoría:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILÁN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 5

MES O PERIODO: JULIO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
8.9	Resumen ensayos de laboratorio		75
8.10	Seguimiento garantías y seguros de los convenios solidarios		75
8.11	Plan de inversión de desembolso de los convenios solidarios		76
8.12	Informe de inversión y buen manejo de desembolso de los convenios solidarios		76
8.13	Seguimiento programa de obra		76
8.14	Actas de comité de obra		76
8.15	Equipo y vehículos contrato de interventoría		76
8.16	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social contrato de interventoría		76
8.17	Informe Financiero y presupuestal de contrato de interventoría		76
8.18	Seguimiento garantías y seguros de los contrato de interventoría		76
8.19	Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado		77

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma:

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 3230 de fecha 15/09/2023.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

(**VER A CONTINUACIÓN FORMATO:** *MEPI-MN1-IN-15-FR-2*)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PERIODO MES: 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3379 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.001.571,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.001.571,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	98
Estructuras (Obras de drenaje)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	-	-
Estructuras (Obras de drenaje)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149.372.854,00	-	$ 149.372.854,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	-	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531,00	-	$ 44.147.531,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.481.186,00	-	$ 4.481.186,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198.001.571,00	-	$ 198.001.571,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	-	-	-	-
AJUSTES	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	-	-	-	-
VALOR EJECUTADO	-	-	-	-

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 67.940.279,06
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 41.093.346,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	60,485%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**3**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PERIODO MES: 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3379 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.001.571,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.001.571,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Compactación de material granular sub-base



Compactación de material granular sub-base

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3441 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.001.571,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.001.571,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	109
Estructuras (Obras de drenaje)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	-	-
Estructuras (Obras de drenaje)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149.372.854,00	-	$ 149.372.854,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	-	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531,00	-	$ 44.147.531,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.481.186,00	-	$ 4.481.186,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198.001.571,00	-	$ 198.001.571,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	-	-	-	-
AJUSTES	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	-	-	-	-
VALOR EJECUTADO	-	-	-	-

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 66.025.603,87
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 37.573.770,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	56,908%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**3**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PERIODO MES: 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3441 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.001.571,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.001.571,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista de personal con su respectiva dotación



Extendido de material granular sub-base

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3760 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.663.426,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.663.426,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	98
Estructuras (Obras de drenaje)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	-	-
Estructuras (Obras de drenaje)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.980.064,00	-	$ 150.980.064,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	-	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.153.960,00	-	$ 44.153.960,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.529.402,00	-	$ 4.529.402,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.663.426,00	-	$ 199.663.426,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	-	-	-	-
AJUSTES	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	-	-	-	-
VALOR EJECUTADO	-	-	-	-

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 68.386.720,04
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 15.769.271,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	23,059%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**3**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3760 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.663.426,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.663.426,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Restauración y reforzamiento de puente en madera, para paso de vehiculos con carga



Descargue de material sub-base granular para tramo de placa huella.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 20
ANTECEDENTES 22
FINALIDAD DEL PROYECTO 22
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 23
2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 23
2.1.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS 23
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 30
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 30
A) CONVENIO SOLIDARIO No. 3379-2023 – LA ESMERALDA 30
B) CONVENIO SOLIDARIO No. 3441-2023 – BAJO PLATANILLO 31
C) CONVENIO SOLIDARIO No. 3760-2023 – BUENOS AIRES BAJO 32
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS 32
3. INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS 37
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS 37
- **CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023 ..... 37**
- **CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023 ..... 41**
- **CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023 ..... 45**

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES .49
3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS 57
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 57
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS 59
4.1. INFORME SEMANAL 59
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS 60

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDAROS **60**

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS **61**

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO **61**

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO **61**

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **62**

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIOS SOLIDARIOS ... **62**

4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL **63**

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** **63**
- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA** **63**

4.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA **66**

4.11. ACTAS DE REUNIÓN **66**

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA **67**

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO **67**

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR **71**

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **72**

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA **72**

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **72**

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA **72**

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA **72**

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL **72**

- **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO** **72**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **73**

8. ANEXOS 74

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 74

8.1.1. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda La Esmeralda – CS#3379 74

8.1.2. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 74

8.1.3. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 74

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS ..74

8.2.1. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 74

8.2.2. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 74

8.2.3. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 74

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO 74

8.3.1. Copia de la bitácora de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 74

8.3.2. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 74

8.3.3. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 74

8.4. INFORMES SEMANALES 74

8.4.1. Informe semanal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 74

8.4.2. Informe semanal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 74

8.4.3. Informe semanal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 74

8.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS 74

8.5.1. Maquinaria y equipo de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ...74

8.5.2. Maquinaria y equipo de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441.74

8.5.3. Maquinaria y equipo de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 74

8.6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS.....75

8.6.1. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 75

8.6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 75

8.6.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 75

8.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS 75

8.7.1. Informe financiero y presupuestal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 75

8.7.2. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441.....75

8.7.3. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379.....75

8.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.....75

8.8.1. Estado general del tiempo climático de la Vereda La Esmeralda – CS#3379.....75

8.8.2. Estado general del tiempo climático de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441.....75

8.8.3. Estado general del tiempo climático de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379.....75

8.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 75

8.9.1. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 75

8.9.2. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **75**

8.9.3. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **75**

8.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **75**

8.10.1. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **75**

8.10.2. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **75**

8.10.3. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **75**

8.11. PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **76**

8.11.1. Plan de inversión de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **76**

8.11.2. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **76**

8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **76**

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **76**

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **76**

8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **76**

8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **76**

8.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA **76**

8.13.1. Seguimiento programa de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **76**

8.13.2. Seguimiento programa de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **76**

8.13.3. Seguimiento programa de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **76**

8.14. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA **76**

8.14.1. Actas de comité de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **76**

8.14.2. Actas de comité de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **76**

8.14.3. Actas de comité de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **76**

8.15. EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA **76**

8.16. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **76**

8.17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **76**

8.18. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA **76**

8.19. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO **77**

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

En este informe se presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 04** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024** el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL""**, hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los siguientes convenios:

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor HERNÁN SANCHEZ HUERTAS de la JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS de la JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE

CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor GEAN CARLOS TAPIERO MONGE de la JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

ANTECEDENTES

La economía de los municipios de La Montañita y de Milán en el departamento del Caquetá, está basada principalmente por la agricultura y la ganadería de doble propósito (leche y carne), complementada con la piscicultura, la apicultura, la coca y aprovechamientos forestales.

Debido al aumento del número de fincas y de la densidad poblacional de las veredas de los municipios, las trochas son intervenidas con maquinaria pesada (motoniveladora) para mejorarlas y, así facilitar el transporte de los lugareños. Las vías adecuadas también son utilizadas para movilizar ganado, productos lácteos (leche y queso) y de agricultura (caña de azúcar, plátanos, etc.).

A los municipios de La Montañita y de Milán, se acede por la ruta troncal del llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por la empresa Coomotor por vía terrestre, además de su vecina, se accede por Villavicencio en el vecino departamento del Meta en el norte, Mitú (Vaupés) al este y Leticia (Amazonas) en el sur.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente, proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

El Departamento del Caquetá se localiza en el Sur-Oriente de Colombia, haciendo parte de la región Amazónica. Cuenta con una superficie 88.965 km2, lo que representa el 7.79% del territorio nacional y su capital es la ciudad de Florencia. El departamento está dividido políticamente en 16 municipios, dos de ellos son los municipios de La Montañita y Milán en donde se ejecutarán las obras viales tipo terciarias.

Para el caso del municipio de La Montañita se encuentra localizada al sur – oriente de Colombia, situado al Occidente del departamento de Caquetá, a una distancia de 32 km de Florencia, capital departamental. entre las coordenadas: Latitud: 1º 28’ 53” N y Longitud: 75° 26’ 23” W con respecto al meridiano de Greenwich. Altitud de la cabecera municipal: 237 metros sobre el nivel del mar. El territorio municipal comprende una extensión en superficie de 184.042.22 Hectáreas (1.840,42 Km2), perteneciendo casi todo al sector rural. De acuerdo con las proyecciones DANE 2019, la población para el Municipio de La Montañita presenta un total de 24.323, de los cuales 11.797 son mujeres, representando un 48,5% y 12.526 son hombres con un 51,4%.

Y en cuanto al municipio de Milán se encuentra ubicado en la región de la amazonia colombiana, con predominio de terrenos semi- ondulados y llanuras de inundación. La principal fuente hídrica es el rio Orteguaza con sus afluentes el rio Bodoquero y Pescado, las quebradas de Platanillo y Getuchá. El Municipio de Milán se localiza en las coordenadas 1°17’25” de latitud norte y 75°30’25” de longitud Oeste del meridiano de Greenwich en el parque principal. Se encuentra a una distancia de 80 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Florencia Capital del Departamento del Caquetá por vía terrestre y a 47 kilómetros por vía fluvial a través de río Orteguaza.

Por lo que en el municipio de Milán se ejecutará una obra en la Vereda de Bajo Platanillo y en el municipio de La Montañita se ejecutarán dos proyectos ubicados en las Veredas de La Esmeralda y en Buenos Aires Bajo.

2.1.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS

- *VEREDA LA ESMERALDA (CS # 3379 - 2023)*

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La montañita del departamento del Caquetá, en la Vereda La Esmeralda, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda La Esmeralda de la

inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La esmeralda – La montañita código: 181050, con coordenadas iniciales 1,21556 N; -75,12500 W, y punto final de coordenadas 1,21528 N; -75,12611 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Google Earth".

https://earth.google.com/web/data=MkEKPwo9CiExTjZhMmNXeUhocDVROEZma295cFJhekxsRGxxRW5nemsSFgoUMEYzRUFFODU2RTMxQjk0NTZBOEIgAQ

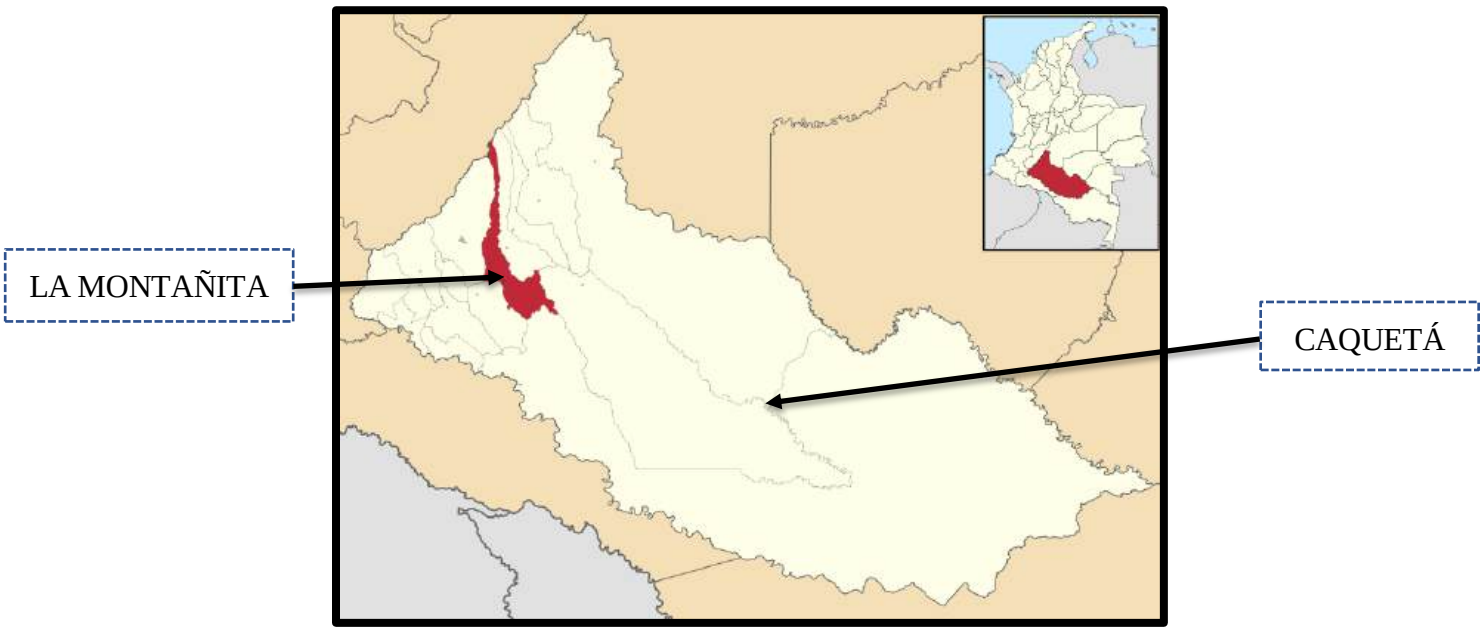


Ilustración 1. *Localización municipio de La Montañita en el departamento del Caquetá.*

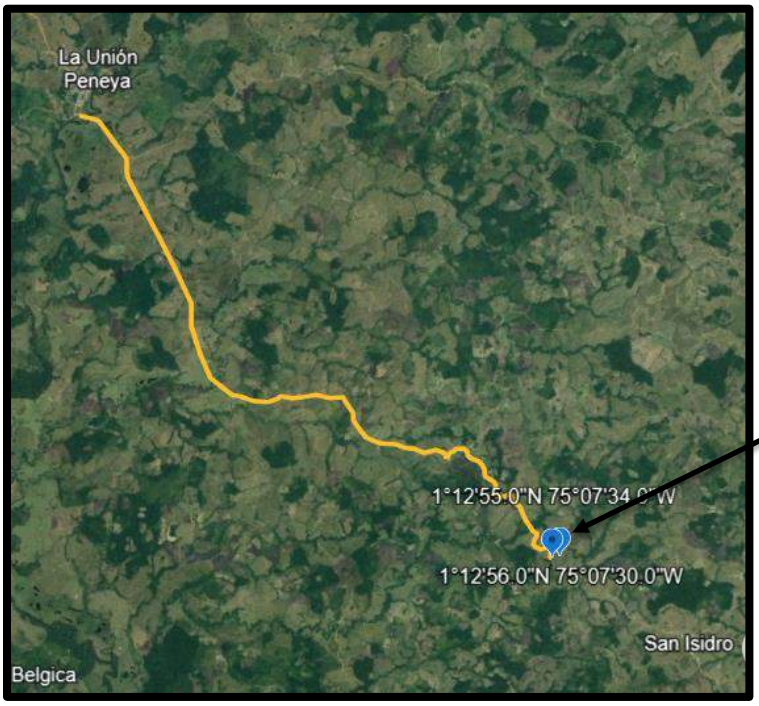


Ilustración 2. *Ubicación del proyecto en la Vereda La Esmeralda.*

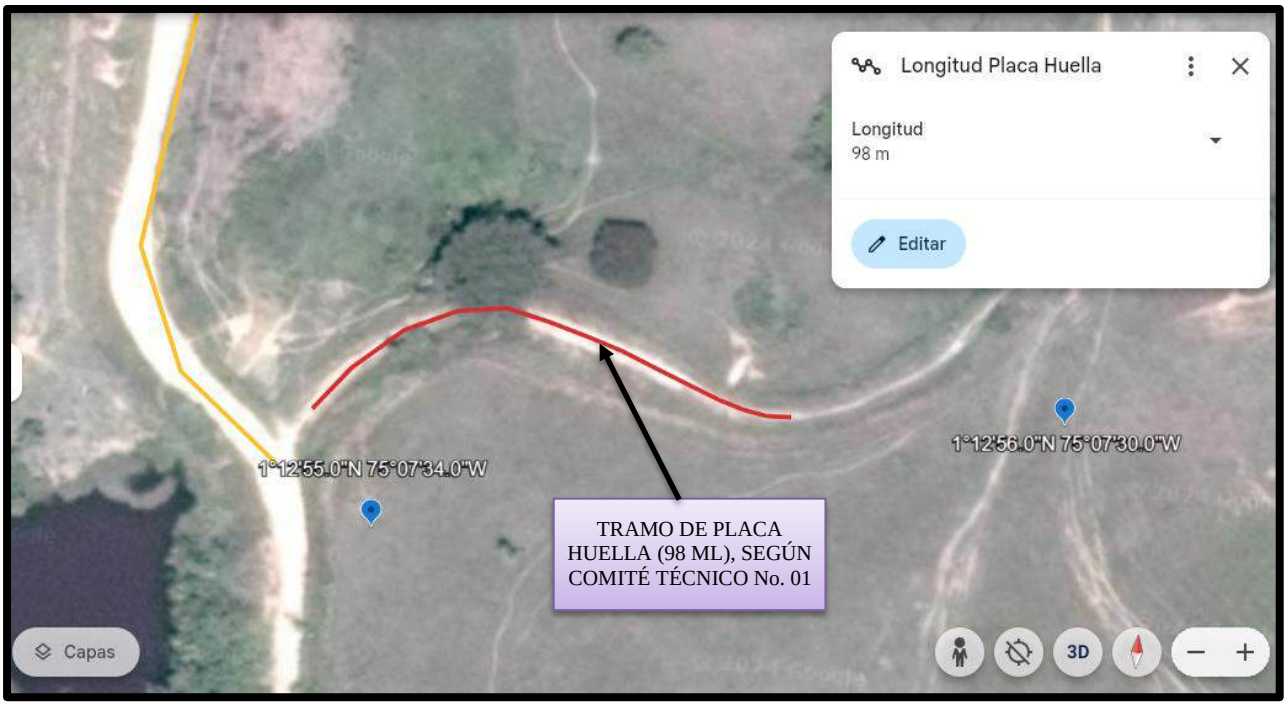


Ilustración 3. *Tramo de placa huella de intervención en la Vereda La Esmeralda.*

- *VEREDA BAJO PLATANILLO (CS # 3441 - 2023)*

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Milán del departamento del Caquetá, en la Vereda Bajo Platanillo, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Bajo Platanillo en Km 45+000 de la vía – Cruce la Sevilla hacia La Anguilla –Milán código: 185030, con coordenadas iniciales 1,28639 N; -75,46528 W, y punto final de coordenadas 1,28500 N; - 75,46472 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Google Earth" y "Bing Mapas".

https://earth.google.com/web/data=MkEKPwo9CiExRlNNMUo2QjgzS19nejgzY3MzbEhzV3FGMEdoNzQxUTESFgoUMDYyOTQ3REIyMTMxQjlEMzQ1QzEgAQ

https://www.bing.com/maps?osid=58d481cd-a819-470e-9c37-5b30c43051c3&cp=1.286942~-75.492878&lvl=14.531498&style=h&pi=0&v=2&sV=2&form=S00027

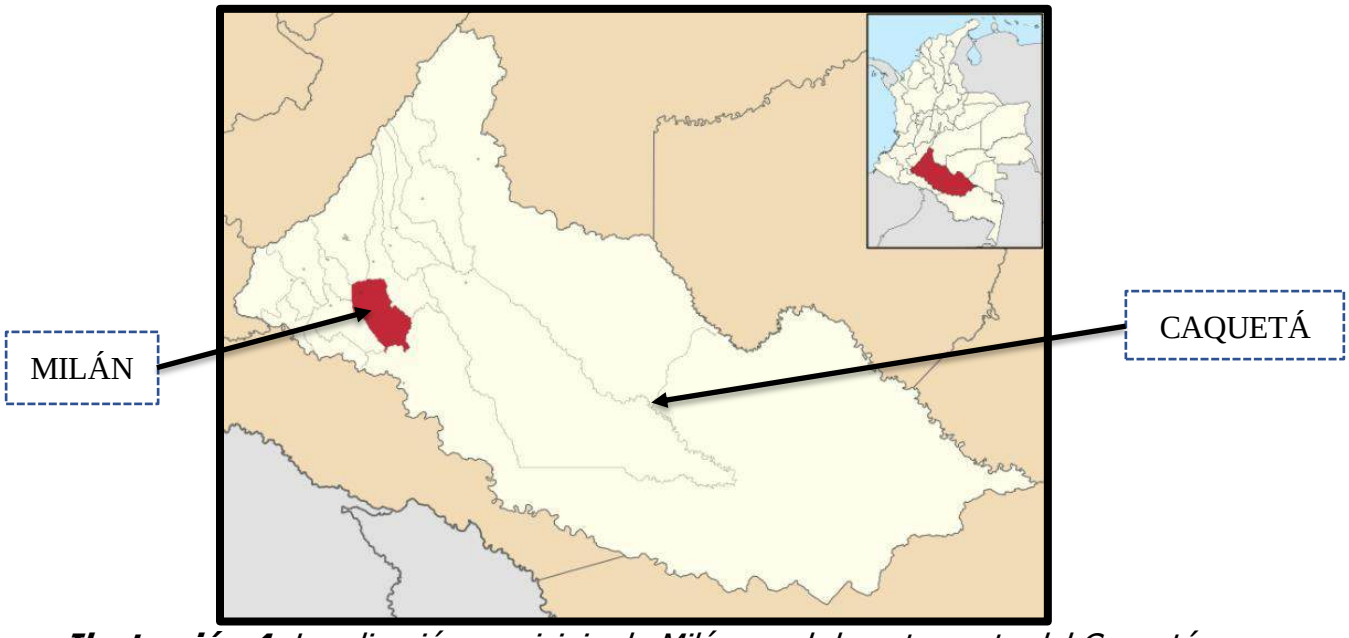


Ilustración 4. *Localización municipio de Milán en el departamento del Caquetá.*



Ilustración 5. *Ubicación del proyecto en la Vereda Bajo Platanillo.*

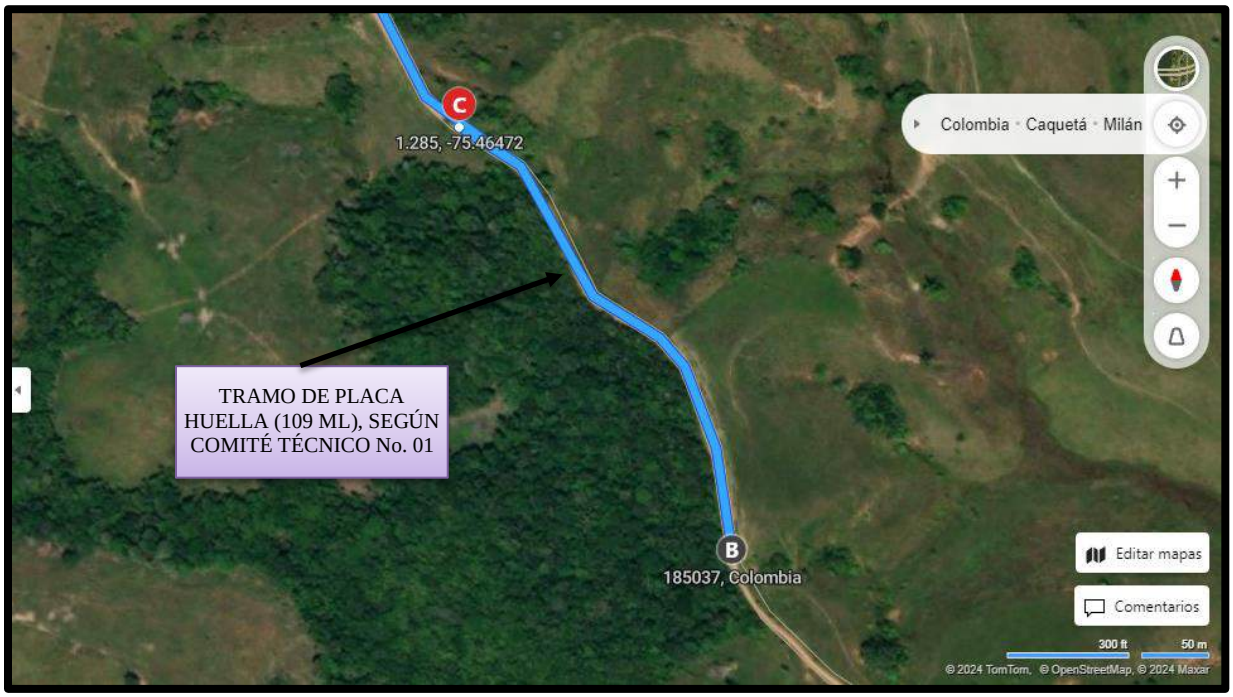


Ilustración 6. *Tramo de placa huella de intervención en la Vereda Bajo Platanillo.*

- *VEREDA BUENOS AIRES BAJO (CS # 3760 - 2023)*

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La montañita del departamento del Caquetá, en la Vereda Buenos aires bajos, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050, con coordenadas iniciales 1,32056 N; -75,13139 W, y punto final de coordenadas 1,32528 N; -75,12667 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Google Earth".

https://earth.google.com/web/data=MkEKPwo9CiExZ1hwR3ptTXh2VkxNZVFaaHdPUkNvX1FFbnJoenY5amkSFgoUMDE5MkNFQzkwRTMxQkE5QjYwRkYgAQ

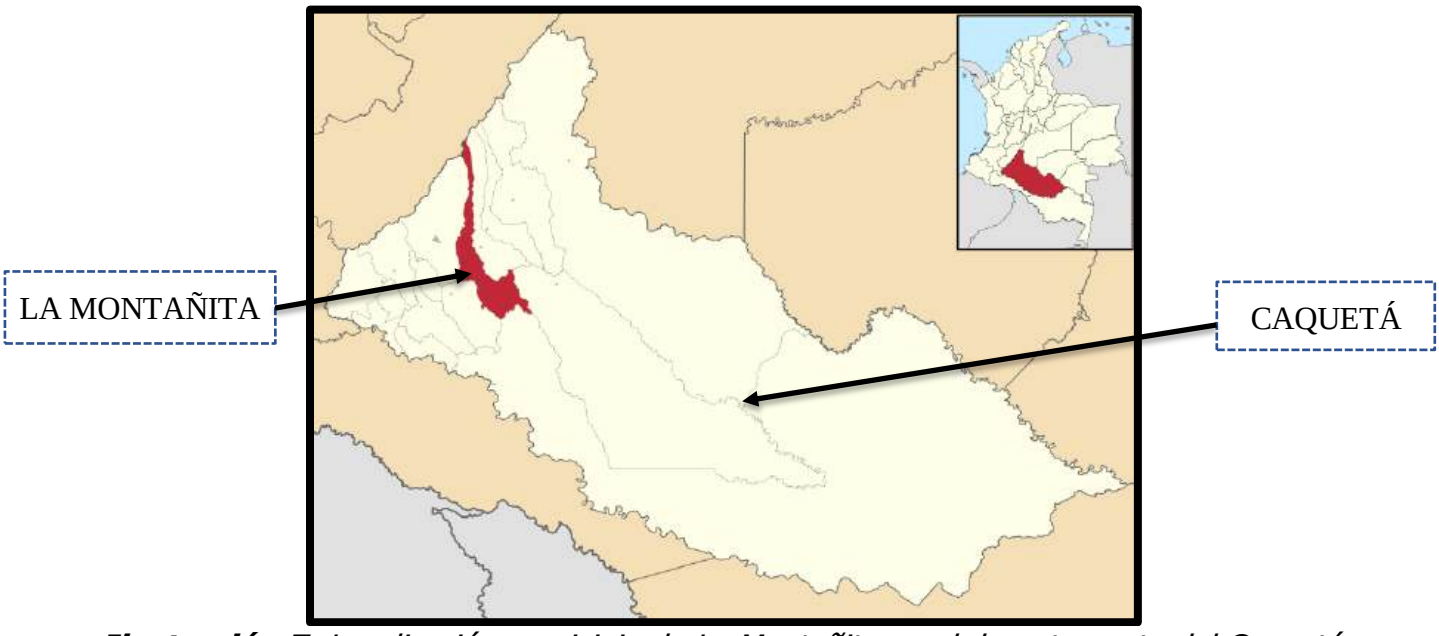


Ilustración 7. *Localización municipio de La Montañita en el departamento del Caquetá.*



Ilustración 8. *Ubicación del proyecto en la Vereda Buenos Aires Bajo*

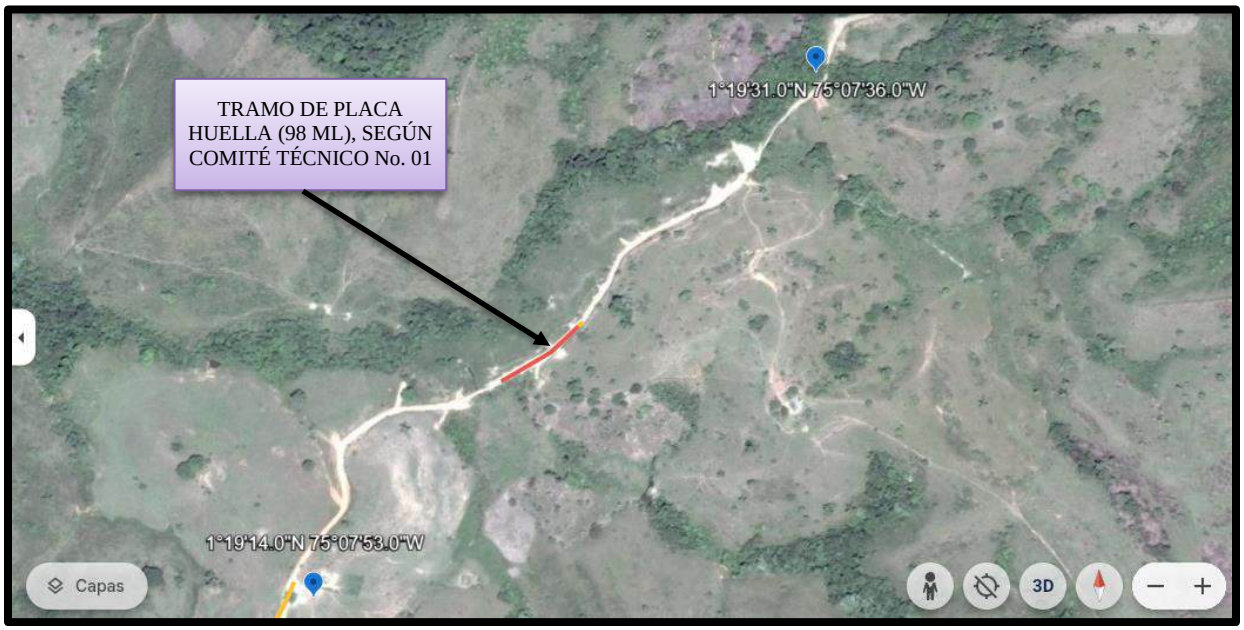


Ilustración 9. *Tramo de placa huella de intervención en la Vereda Buenos Aires Bajo.*

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a La Esmeralda y Buenos Aires Bajo del municipio de LA MONTAÑITA y Bajo Platanillo del municipio de MILÁN, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos. Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

A) CONVENIO SOLIDARIO No. 3379-2023 – LA ESMERALDA

- INVENTARIO

En el tramo de intervención, solo se evidenció en sitio de obra, una obra de arte tipo alcantarilla en concreto reforzado con tubería en concreto reforzado de 36”, encole de caja poceta y descole en aletas.

Tabla 1. *Inventario en tramo de intervención - Vereda La Esmeralda*

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
Alcantarilla en concreto reforzado	Bueno	1

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizada la inspección visual por parte de esta firma de interventoría en el tramo de intervención de la vereda La Esmeralda, teniendo en cuenta las coordenadas 1.21556 N; -75.12500 W y 1.21528 N; -75.12611 W, levantadas en campo por INVIAS, a continuación, se describe el estado inicial antes de su inicio de obra:

- La superficie o rodadura del terreno presenta hundimientos puntuales a lo largo del tramo establecido, a causa del tránsito de caballos, medio que se utiliza como transporte hacia la escuela, dado que en el momento que se presentan lluvias es imposible transitarse en vehículos (moto o carro).
- Se evidencia surcos que se ha generado por de épocas de lluvias mediante proceso de arrastre o por erosión de material limoso, llegando con el tiempo más hundimiento del terreno natural.
- No se cuenta con cunetas en material de concreto reforzado
- No se evidencia material granular (mixto) sobre la capa de rodadura o terreno natural.

B) CONVENIO SOLIDARIO No. 3441-2023 – BAJO PLATANILLO

- INVENTARIO

Para esta vereda, en el tramo de intervención solo se evidenció en sitio de obra, una obra de arte tipo alcantarilla (cajón-aletas) en concreto reforzado con tubería en concreto reforzado de diámetro < 36", don la caja o poceta está totalmente deteriorado la calidad de concreto con el pasar de los años de uso.

Tabla 2. *Inventario en tramo de intervención - Vereda Bajo Platanillo*

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
Alcantarilla en concreto reforzado	Deteriorado	1

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizada la inspección visual por parte de esta firma de interventoría en el tramo de intervención de la vereda Bajo Platanillo, teniendo en cuenta las coordenadas 1.28639 N; -75.46528 W y 1.28500 N; -75.46472 W, levantadas en campo por INVIAS, a continuación, se describe el estado inicial antes de su inicio de obra:

- La superficie o rodadura del terreno cuenta con material de afirmado (material de rio) con existencias de surcos transversales a la vía a causa de épocas de lluvias.
- Se evidencia erosión en zona de descole de alcantarilla existente, donde la comunidad ha solicitado suspenderse para que no se continue generando daños al predio.
- No se cuenta con cunetas en material de concreto de 3.000 psi.
- Se evidencia sobre los taludes vegetación y no cuenta con árboles de diámetro mayor a 5cm en el tramo de intervención de este proyecto

C) CONVENIO SOLIDARIO No. 3760-2023 – BUENOS AIRES BAJO

- INVENTARIO

No se cuenta con obras de arte de drenajes, ni placa huellas u otras obras viales en vías terciarias.

Tabla 3. *Inventario en tramo de intervención - Vereda Buenos Aires Bajo*

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizada la inspección visual por parte de esta firma de interventoría en el tramo de intervención de la vereda Buenos Aires Bajo, teniendo en cuenta las coordenadas 1.32056 N; -75.13139 W y 1.32528 N; -75.12667 W, levantadas en campo por INVIAS, a continuación, se describe el estado inicial antes de su inicio de obra:

- La superficie del terreno o rodadura del terreno presenta pocos hundimientos puntuales a lo largo del tramo establecido, el tránsito sobre la vía es muy baja.
- No se cuenta con cunetas en material de concreto reforzado sobre el tramo a intervenir.
- No se cuentan con obras de arte de drenajes (alcantarillas).
- No se evidencia material granular (mixto) sobre la capa de rodadura o terreno natural.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS

Los proyectos consisten en realizar la revisión e implementación del contenido de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje o placa huella en los sectores priorizados. Los materiales, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución de las obras deberán ser los que se exigen en las especificaciones técnicas del INVIAS, Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.


Las obras que se van a ejecutar, deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen.

A continuación, se describe el alcance y las actividades técnicas a ejecutar de cada uno de los proyectos ubicados en las veredas de Buenos Aires Bajo, La Esmeralda y Bajo Platanillo, de los cuales fueron avalados por esta interventoría como se evidencia en el comité técnico de obra No. 01 desarrollados en cada una de las juntas de acción comunal:

- **JAC LA ESMERALDA** (CS#3379 DE 2023)

La junta de acción comunal de la vereda de La Esmeralda tiene como alcance la construcción de 98 metros lineales de placa huella, no se cuenta con construcción de obras de drenajes como alcantarillas u otras.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	98 ML DE PLACA HUELLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópeo resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi

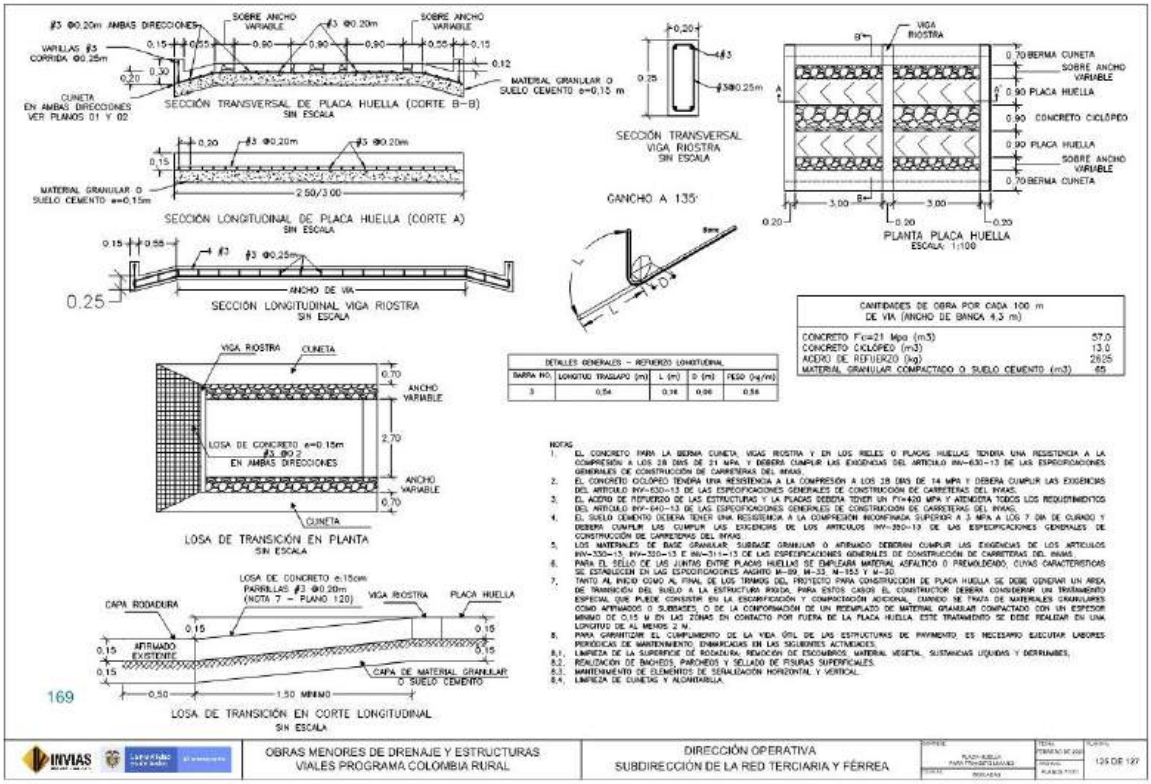ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA


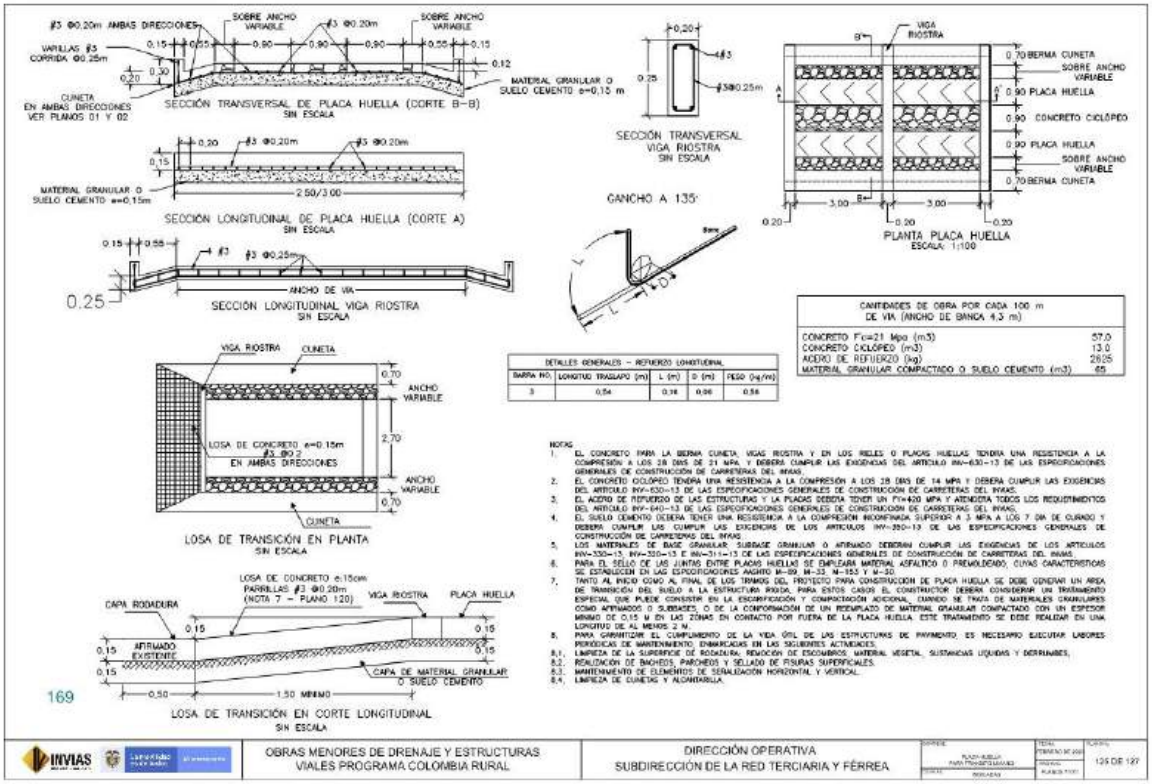
- **JAC BAJO PLATANILLO** (CS#3441 DE 2023)

La junta de acción comunal de la vereda de Bajo Platanillo tiene como alcance la construcción de 109 metros lineales de placa huella, no se cuenta con construcción de obras de drenajes como alcantarillas u otras.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	109 ML DE PLACA HUELLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C

	- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópeo resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi

ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA




- **JAC BUENOS AIRES BAJO** (CS#3760 DE 2023)

La junta de acción comunal de la vereda de Buenos Aires Bajo tiene como alcance la construcción de 98 metros lineales de placa huella, no se cuenta con construcción de obras de drenajes como alcantarillas u otras.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	98 ML DE PLACA HUELLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópeo resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi

ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA

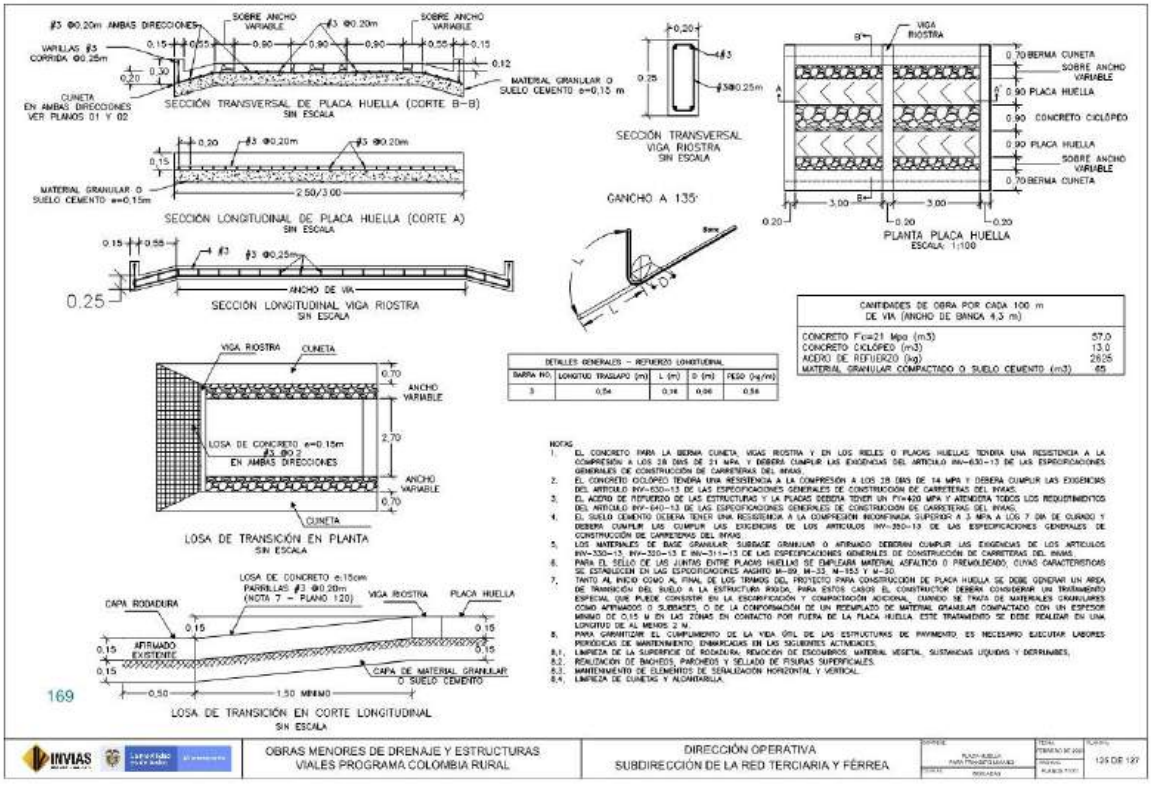

3. INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

- **CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023**

El presente convenio solidario No. 3379 – 2023 se suscribió el día 29 de septiembre de 2023 entre la señora *PAOLA ANDREA ROA MORA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *HERNÁN SANCHEZ HUERTAS* en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA**, por un valor del convenio de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (**$199.001.571,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (**$198.001.571,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	3379-2023	
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	
NIT:	800.215.807-2	
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA	
NIT:	901.705.545-7	
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNÁN SANCHEZ HUERTAS	
IDENTIFICACIÓN:	17.644.725 DE FLORENCIA	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 199.001.571,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**

		$ 198.001.571,00 M/CTE
		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	27 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 19 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 23 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 3379-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA*

DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio", fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 20 de junio de 2024 un alcance físico de 98 mL de placa huella. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	MONTAÑITA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA	98,00	CAQUETÁ	20/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0,000	$ 63.146,00	$ -
							SUB-TOTAL	**$ -**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,000	$ 179.200,00	$ 179.200,00
							SUB-TOTAL	**$ 179.200,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,2600	$ 29.170,00	$ 95.094,00
4	320.3.1	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	82,4700	$ 303.772,00	$ 25.052.077,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	60,1700	$ 1.324.340,00	$ 79.685.538,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,6200	$ 774.303,00	$ 19.837.643,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.873,6000	$ 8.534,00	$ 24.523.302,00
							SUB-TOTAL	**$ 149.193.654,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 149.372.854,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.481.186,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.147.531,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 198.001.571,00**

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023

El presente convenio solidario No. 3441 – 2023 se suscribió el día 19 de septiembre de 2023 entre la señora *PAOLA ANDREA ROA MORA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS* en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO**, por un valor del convenio de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (**$199.001.571,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (**$198.001.571,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	3441-2023	
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	
NIT:	800.215.807-2	
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO	
NIT:	900.124.679-8	
REPRESENTANTE LEGAL:	DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS	
IDENTIFICACIÓN:	1.117.511.741 DE FLORENCIA	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 199.001.571,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**
		$ 198.001.571,00 M/CTE

		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 19 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 24 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 25 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 3441-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio"*, fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 18

de junio de 2024 un alcance físico de 109 mL de placa huella. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	MILAN	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	109,00	CAQUETÁ	18/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0,00	$ 63.146,00	$ -
							SUB-TOTAL	**$ -**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 278.204,00	$ 278.204,00
							SUB-TOTAL	**$ 278.204,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,5700	$ 29.815,000	$ 106.440,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	95,0600	$ 225.354,000	$ 21.422.151,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	65,8500	$ 1.241.285,000	$ 81.738.617,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	28,0900	$ 737.443,000	$ 20.714.774,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.164,0000	$ 7.937,000	$ 25.112.668,00
							SUB-TOTAL	**$ 149.094.650,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 149.372.854,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.481.186,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.147.531,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 198.001.571,00**

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023

El presente convenio solidario No. 3760 – 2023 se suscribió el día 5 de octubre de 2023 entre la señora *PAOLA ANDREA ROA MORA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *GEAN CARLOS TAPIERO MONGE* en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO**, por un valor del convenio de DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS (**$200.663.426,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS (**$199.663.426,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	3760-2023	
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	
NIT:	800.215.807-2	
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO	
NIT:	900.787.710-3	
REPRESENTANTE LEGAL:	GEAN CARLOS TAPIERO MONGE	
IDENTIFICACIÓN:	1.006.529.457 DE EL PAUJIL	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.663.426,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**

		$ 199.663.426,00 M/CTE
		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	5 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 19 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 23 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 3760-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA*

DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio", fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 20 de junio de 2024 un alcance físico de 98 mL de placa huella. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	MONTAÑITA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO	98,00	CAQUETÁ	20/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0,00	$ 63.146,00	$ -
							SUB-TOTAL	**$ -**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 202.690,00	$ 202.690,00
							SUB-TOTAL	**$ 202.690,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,2600	$ 27.566,00	$ 89.865,00
4	320.3.1	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	82,4700	$ 303.612,00	$ 25.038.882,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	60,1700	$ 1.334.950,00	$ 80.323.942,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,6200	$ 795.544,00	$ 20.381.837,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.873,6000	$ 8.680,00	$ 24.942.848,00
							SUB-TOTAL	**$ 150.777.374,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 150.980.064,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.529.402,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.153.960,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 199.663.426,00**

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3379-2023 (LA ESMERALDA)

En el presente mes de julio de 2024, se llevaron actividades preliminares como desmonte y limpieza de zona no boscosas, excavaciones, conformación y nivelación del terreno dentro del tramo de los 98 metros lineales de placa huella; suministro, extendido e instalación de sub-base granular con equipo vibro-compactador benitin y suministro de materiales de ferretería y materiales pétreos (arena y grava) por parte de la junta de acción comunal de la vereda La Esmeralda. Por otra parte, actividades administrativas que condujo a las compras de materiales de obra, pagos de transportes de materiales, afiliación de personal calificado y no calificado, entre otras. A continuación, se describe con mayor brevedad cada una de las actividades ejecutadas en el presente periodo:

- **Desmonte y limpieza de zonas no boscosas**

Esta actividad comprende el desraíce y la limpieza de zonas cubiertas de pasto, rastrojo, maleza, escombro, cultivos y arbustos sobre la margen izquierda y derecha del tramo de intervención donde se construirá la placa huella, en un ancho promedio de 5 metros. Esta interventoría verifico la zona, y se evidenció que estas actividades fueron ejecutadas con herramientas menores como machete, azadón, palín, guadañas, etc. Se contó con un oficial y tres ayudantes para realizar esas labores.

	
Imagen No. 1: Desmonte y limpieza sobre margen izquierda y derecha.	**Imagen No. 2**: Desmonte y limpieza sobre margen izquierda y derecha.

- **Excavaciones varias sin clasificar**

Esta actividad comprende a los trabajos de excavaciones varias de cualquier material, sin importar su naturaleza ni la presencia de la tabla de agua o nivel freático. Para este periodo del presente informe, JAC de la vereda La Esmeralda realizó cortes sobre taludes sobre la margen izquierda (MI) bajando y conformación del terreno natural con maquinaria tipo pajarita, permitiendo la ampliación de la banca a lo largo del tramo de intervención, en cumplimiento al ancho del diseño transversal de la placa huella como se establece en la página 169 de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES". Se contó con personal de obra, 2 ayudantes para actividades varias durante el proceso de operación de la maquinaria.

	
Imagen No. 3: Corte de taludes con maquinaria tipo pajarita.	**Imagen No. 4**: Vista general de corte sobre taludes MI bajando y ampliación de banca.

- **Sub-base granular clase C**

Esta actividad consiste en el suministro, el transporte, la colocación, el humedecimiento o aireación, la extensión y la conformación, la compactación y el terminado de material sub-base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas hasta lograrse un espesor de e=15cm, de conformidad con los lineamientos, las pendientes y las dimensiones indicados en los planos estructurales de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES". Se contó en campo con maquinarias y equipos para llevarse a cabo esta actividad junto con tres (3) ayudantes para labores varias durante la operación de estas maquinarias o equipos.

	
Imagen No. 5: Compactación de material sub-base granular Clase C.	**Imagen No. 6**: Vista general de terminado de material sub-base granular Clase C.

- **Otras actividades realizadas por la JAC**

Es de entero conocimiento por parte de esta firma interventora, que se han realizado otras actividades por la JAC de la vereda La Esmeralda junto con su residente de obra y que no representa un avance cuantificativo en el cronograma de obra, de las cuales se mencionan a continuación:

a) Determinación de punto inicial y final del tramo de intervención dentro de la zona de influencia para construcción de placa huella para un alcance de 98 metros lineales.

	
Imagen No. 7: Demarcación de punto inicial de construcción de placa huella.	**Imagen No. 8**: Medición de 98 metros lineales, para demarcar punto final de placa huella a construirse.

b) Se realiza por parte de la comunidad de la vereda La Esmeralda, el suministro e instalación de la valla informativa, y la colocación de cono de señalización a la entrada del inicio de la obra de la placa huella para el control de ingreso y salida de vehículos motorizados, bestias, entre otros al momento que se esté ejecutando durante las horas de jornada laboral.

	
Imagen No. 9: Vista general de valla informativa, ubicada en la zona de inicio del proyecto de obra.	**Imagen No. 10**: Valla informativa.

c) Se cuenta en sitio de obra los materiales de ferretería descargas por la comunidad, como bultos de cemento, madera para formaleta, acero de refuerzo de 60.000 psi, alambre negro de amarre para acero de refuerzo de 60.000 psi, entre otros que son necesarios para llevarse a cabo la construcción de la placa huella.

	
Imagen No. 11: Acopio de bultos de cemento, salvaguardado con plástico y colocado sobre soportes de madera.	**Imagen No. 12**: Acopio de formaleta para placa huella.

	
Imagen No. 13: Acopio de acero de refuerzo de 60.000 psi.	**Imagen No. 14**: Acopio de alambre negro para amarre de acero de refuerzo de 60.000 psi.

d) Se cuenta además en el sitio de obra kit de Botiquín y elementos de primeros auxilios instalados por la comunidad, ante una posible emergencia laboral, para ello se tiene en un lugar de trabajo un extintor, camilla rígida plástica y bolso de primeros auxilios.

	
Imagen No. 15: Vista de ubicación de extintor aledaño a la obra.	**Imagen No. 16**: Vista de ubicación de camilla rígida plástica aledaño a la obra.

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3441-2023 (BAJO PLATANILLO)

Durante la ejecución de la obra del presente informe, la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Bajo Platanillo ha realizado actividades de suministro, extendido y compactación de material sub-base granular a lo largo del tramo de los 109mL y otras actividades como, la construcción del campamento provisional para el almacenamiento de los materiales de ferretería. A continuación, se describe con mayor detalle cada una de las actividades ejecutadas en el presente periodo:

- **Sub-base granular clase C**

Esta actividad consiste en el suministro, el transporte, la colocación, el humedecimiento o aireación, la extensión y la conformación, la compactación y el terminado de material sub-base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas hasta lograrse un espesor de e=15cm, de conformidad con los lineamientos, las pendientes y las dimensiones indicados en los planos estructurales de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES". Se contó en campo con maquinarias y equipos para llevarse a cabo esta actividad junto con tres (3) ayudantes para labores varias durante la operación de estas maquinarias o equipos.

	
Imagen No. 17: Compactación de material sub-base granular Clase C.	**Imagen No. 18**: Vista general de terminado de material sub-base granular Clase C.

- **Otras actividades realizadas por la JAC**

Es de entero conocimiento por parte de esta firma interventora, que se continúan realizando otras actividades por la JAC de la vereda Bajo Platanillo junto con su residente de obra y que no representa un avance cuantificativo en el cronograma de obra, de las cuales se mencionan a continuación:

a) Construcción de campamento provisional para el almacenamiento de los materiales de ferretería que deben de estar bajo techo. La comunidad de Bajo Platanillo, han aportado la mano de obra y los materiales necesarios para la construcción del mismo.

	
Imagen No. 19: Avance de construcción de campamento provisional, aledaño a la obra.	**Imagen No. 20**: Vista general en proceso de construcción de campamento provisional.

❖ CONVENIO SOLIDARIO No. 3760-2023 (BUENOS AIRES BAJO)

En este convenio solidario en el mes de julio del presente año, la junta de acción comunal de la vereda de Buenos Aires Bajo aún no cuenta con registro de avance de obra físico. Es de entero conocimiento para esta interventoría, que el presidente de la organización comunal y el ingeniero residente han manifestado que la vía que conduce de la Inspección de la Unión Peneya a la Vereda Buenos Aires del municipio de La Montañita, existe un puente construido en madera y que actualmente no se encuentra en condiciones adecuadas para que una volqueta cargada de materiales de obra pase por allí, y que se requiere reforzarse para que este entre en funcionamiento. En virtud de esto, la comunidad de la vereda del presente informe, se encuentran en la gestión de restauración

y reforzamiento de las estructuras del puente de madera de tal manera que este entre al servicio para el paso vehicular de cargas (volquetas de 6 m3).

- **Actividades realizadas por la JAC para restauración y reforzamiento de puente de madera**

A continuación, se evidencian las actividades que viene realizando la junta de acción comunal de la vereda de Buenos Aires Bajo en la restauración y reforzamiento del puente en madera existente, que permite el ingreso vehicular de cargas, y así poderse ejecutar las obras de construcción de los 98 metros lineales de placa huella.

	
Imagen No. 21: Desmonte de estructuras del puente en mal estado con maquinaria.	**Imagen No. 22**: Vista general reforzamiento de muros del puente existente.

	
Imagen No. 23: Traslado de vigas en madera para el puente con ayuda de maquinaria pajarita.	**Imagen No. 24**: Instalación de vigas en madera sobre los muros reforzados de la zona del puente con ayuda de maquinaria pajarita.

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha del presente informe no se han evidenciado ni presentado ítems no previstos en cada uno de los proyectos que se tienen en las veredas de La Esmeralda, Bajo Platanillo y en Buenos Aires Bajo.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Conforme a lo estipulado en el contrato de interventoría No. 4136 de 2023, la firma interventora realizó el seguimiento, control y supervisión a las obligaciones de los convenios solidarios número 3379–3441–3760 de 2023, de acuerdo a lo consignado en la guía para el ejercicio de la supervisión e interventoría emitida por *Colombia Compra Eficiente* y el *manual de interventoría de obra pública (2022)*, y demás lineamientos señalados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

En ese sentido, es importante señalar algunas de las actividades que, a la luz de la normativa vigente en el ordenamiento jurídico, así como en la guía de Colombia Compra Eficiente y en la reiterada Jurisprudencia del Consejo de Estado, debe realizar los interventores:

1. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos de este.
2. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en el contrato y documentos que lo integran.
3. Hacer seguimiento estricto al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, verificando que se cumpla el plazo y los cronogramas previstos en el contrato.
4. Requerir oportunamente al contratista con el fin de que presente planes de contingencia que conjuren las situaciones que generen retrasos o impactos en el cronograma de obra.
5. Informar oportunamente a la entidad estatal de posibles incumplimientos del contratista, y elaborar y presentar los soportes correspondientes, de conformidad con la normatividad vigente, el contrato y documentos que lo integran, el Manual de Interventoría de Obra y demás documentos.
6. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para atender las situaciones que afectan la ejecución contractual.
7. Informar oportunamente a la Entidad, las afectaciones al cronograma causadas por las gestiones de terceros y/o Entidades Públicas, con el fin de que sea desarrollada la gestión interinstitucional debida.

8. Informar, analizar, avalar y solicitar a la Entidad oportunamente, las modificaciones contractuales necesarias para la debida ejecución del proyecto.

En virtud de lo anterior, para este periodo del mes de julio – 2024, la interventoría ha realizado el acompañamiento a cada uno de los proyectos que se ejecutan en el departamento del Caquetá que corresponden a las veredas de La Esmeralda y Buenos Aires Bajo en el municipio de La Montañita y en la vereda Bajo Platanillo en el municipio de Milán, dentro de las actividades más puntuales que se han llevado por parte de esta interventoría se describen a continuación:

- Se ha realizado control y registro de cada uno de los pagos solicitados por parte de las juntas de acción comunal, destinadas para compras de materiales de obra, equipos, alquiler de maquinarias y nóminas.

- Verificación en cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de afiliación y pagos de la seguridad social de cada uno de los trabajadores calificados y no calificados de la obra.

- Visitas técnicas a los proyectos de obra con el fin de llevar control y seguimiento de cada una de las actividades ejecutadas en el presente periodo, de igual forma cada uno de los procesos constructivos de la placa huella.

- Verificación de dimensiones estipuladas en los diseños de acuerdo a la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INVIAS".

- Chequeo visual de los materiales pétreos utilizados en cada una de las obras de placa huellas que se llevan en las veredas.

- Acompañamiento por parte del equipo de interventoría en el área de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y social frente a cada una de las comunidades donde se ejecutan los proyectos de placa huella.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

4.1. INFORME SEMANAL

En el periodo comprendido del presente informe se presenta por parte de esta firma interventora cinco (5) informes semanales para cada uno de los proyectos de obra que se adelantan en las veredas La Esmeralda y Buenos Aires Bajo en el municipio de La Montañita y en la vereda Bajo Platanillo en el municipio de Milán, de los cuales se describen a continuación:

- Convenio Solidario No. 3379-2023 (**La Esmeralda**)

- Informe semanal No. 14: del 01 de julio al 07 de julio de 2024
- Informe semanal No. 15: del 08 de julio al 14 de julio de 2024
- Informe semanal No. 16: del 15 de julio al 21 de julio de 2024
- Informe semanal No. 17: del 22 de julio al 28 de julio de 2024
- Informe semanal No. 18: del 29 de julio al 04 de agosto de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.1**).

- Convenio Solidario No. 3441-2023 (**Bajo Platanillo**)

- Informe semanal No. 14: del 01 de julio al 07 de julio de 2024
- Informe semanal No. 15: del 08 de julio al 14 de julio de 2024
- Informe semanal No. 16: del 15 de julio al 21 de julio de 2024
- Informe semanal No. 17: del 22 de julio al 28 de julio de 2024
- Informe semanal No. 18: del 29 de julio al 04 de agosto de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.2**).

- Convenio Solidario No. 3760-2023 (**Buenos Aires Bajo**)

- Informe semanal No. 14: del 01 de julio al 07 de julio de 2024
- Informe semanal No. 15: del 08 de julio al 14 de julio de 2024
- Informe semanal No. 16: del 15 de julio al 21 de julio de 2024
- Informe semanal No. 17: del 22 de julio al 28 de julio de 2024
- Informe semanal No. 18: del 29 de julio al 04 de agosto de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.3)**

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

Durante el mes de julio de 2024, esta firma de interventoría llevó registro de maquinaria y equipos utilizados por cada una de las juntas de acción comunal en la obra. Dicha información se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.5.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.5.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.5.3**).

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDAROS

Durante el mes de julio de 2024, esta firma de interventoría llevó registro del personal de obra, control de aportes legales y seguridad social de cada una de las juntas de acción comunal. Se adjunta la información diligenciada en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.6.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.6.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.6.3**).

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

Se presenta por parte de esta firma interventora para el mes julio de 2024 los informes financieros y presupuestales de cada uno de los convenios solidarios, el cual se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.7.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.7.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.7.3**).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el mes de julio de 2024 se registró el tiempo climático diario de cada una de las veredas donde se ejecutan las obras de placa huellas, dicha información se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.8.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.8.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.8.3**).

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En el periodo correspondiente al mes de julio – 2024, no se cuenta con obras que se relacione con concretos, ya que en algunas veredas aún no se han iniciado formalmente la preparación, transporte, vaciado e instalado de concretos de 3.000 psi para el tema de huellas, vigas de cimentación, cunetas o bordillos. De igual forma, esta interventoría presenta la relación de información correspondiente a los resultados de ensayos de laboratorio en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.9.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.9.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.9.3**).

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Comprende la relación de las garantías y seguros de cada uno de los convenios solidarios cuando estos surten modificaciones, por lo que esta firma de interventoría hace seguimiento mensual a través del formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 3379, correspondiente a la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.10.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 3441, correspondiente a la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.10.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 3760, correspondiente a la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.10.3**).

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIOS SOLIDARIOS

Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, por lo que no es aplicable a ninguno de los convenios solidarios.

Nota: El formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-14* que se establece en la "LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA", No Aplica (N/A).

4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL

A continuación, se relacionan otros documentos de seguimientos mensuales que se lleva a cada uno de los convenios solidarios por esta interventoría, que corresponde al seguimiento de los desembolsos realizados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y su respectivo seguimiento de programa de inversiones de ello, que a continuación se relacionan:

- SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

Para este presente periodo del mes de julio – 2024, esta firma interventora solicitó a las JAC el informe de seguimiento de la inversión del desembolso mensual de su respectivo convenio basado en el plan de inversión de desembolso presentado por cada una de las Juntas y aprobados por esta firma (**Ver Anexo 8.11.1, Anexo 8.11.2 y Anexo 8.11.3**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 3379, JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.12.1**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 3441, JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.12.2**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 3760, JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.12.3**).

- SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Se realiza por esta firma de interventoría el seguimiento mensual del programa de obra para cada JAC de acuerdo a la programación elaborada por el ingeniero residente y lo aprobado por esta interventoría (**Ver Anexo 8.13.1, Anexo 8.13.2 y Anexo 8.13.3**), programación que es vigente a partir del día 24 de junio de 2024 para todas las juntas (La Esmeralda, Bajo Platanillo y Buenos Aires Bajo). De acuerdo a lo anterior, se refleja mediante de tablas el porcentaje programado y ejecutado acumulado del presente periodo, donde se deja constancia el atraso o avance física de cada una de las juntas para el presente periodo.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda La Esmeralda.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "**JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA**" **CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 - 2023**			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada Mensual	Ejecutado Acumulado Mensual	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,030%	0,000%	-0,030%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	34,283%	20,754%	-13,529
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	36,214%	-	-
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	29,473%	-	-
TOTAL	**100,000%**	**20,754%**	**-13,559%**

Tabla 4. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC - La Esmeralda.*

Según Tabla No. 4, se tiene un avance ejecutado acumulado del 20,754% correspondiente a $ 41.093.346,00 de pesos, contra un programado acumulado de 34,313% equivalente a $ 67.940.279,06 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda La Esmeralda, se encuentra en atraso, es decir, por debajo del programado en un 13,559% que representa en valor de $ 26.846.933,06 de pesos.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda Bajo Platanillo.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "**JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO**" **CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 - 2023**			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada Mensual	Ejecutado Acumulado Mensual	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,047%	0,141%	0,094%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	33,299%	18,836%	-14,463%

Agosto – 2024 Días del 01 al 31	36,627%	-	-
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	30,027%	-	-
TOTAL	**100,000%**	**18,977%**	**-14,369%**

Tabla 5. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC - Bajo Platanillo.*

Según Tabla No. 5, se tiene un avance ejecutado acumulado del 18,977% correspondiente a $ 37.573.770,00 de pesos, contra un programado acumulado de 33,346% equivalente a $ 66.025.603,87 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda Bajo Platanillo, se encuentra en atraso, es decir, por debajo del programado en un 14.369% que representa en valor de $ 28.451.833,87 de pesos.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "**JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO**" **CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 - 2023**			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada Mensual	Ejecutado Acumulado Mensual	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,034%	0,000%	-0,034%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	34,217%	7,898%	-26,319%
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	36,260%	-	-
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	29,489%	-	-
TOTAL	**100,000%**	**7,898%**	**-26,353%**

Tabla 6. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC - Buenos Aires Bajo*

Según Tabla No. 6, se tiene un avance ejecutado acumulado del 7,898% correspondiente a $ 15.769.271,00 de pesos, contra un programado acumulado de 34,251% equivalente a $ 68.386.720,04 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo, se encuentra en atraso, es decir, por debajo del programado en un 26.353% que representa en valor de $ 52.617.449,04 de pesos.

4.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Para este presente periodo del mes de julio -2024, no se realizaron actas de comité de obra.

4.11. ACTAS DE REUNIÓN

Para este periodo del mes de julio – 2024, se realizaron Actas de reuniones en las juntas de acción comunal de las veredas La Esmeralda y de Bajo Platanillo. A continuación, se describen:

- Acta de reunión No. 01 – JAC, La Esmeralda (**Ver Anexo 8.14.1**)
- Acta de reunión No. 01 – JAC, Bajo Platanillo (**Ver Anexo 8.14.2**)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

El presente contrato de interventoría No. 4136 – 2023 se suscribió el día 26 de octubre de 2023 entre la señor *JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS* en calidad de **DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CAQUETÁ** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA* en calidad de **CONTRATISTA**, por un valor del contrato de CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (**$107.999.997,00**) M/CTE, equivalente a 93,10 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2023, a continuación, se relaciona los datos generales del contrato de interventoría:

CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4136-2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILÁN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
NIT:	7.692.245-1
VALOR DEL CONTRATO:	$ 107.999.997,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	26 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 19 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 24 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA CUARTA.** VALOR: El valor del contrato de interventoría es por la suma de CIENTO SIETO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M-CTE ($107.999.997), equivalentes a 93,10 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2023, suma que se discrimina de la siguiente manera o presupuesto de interventoría inicial:

PRESUPUESTO INICIAL DE INTERVENTORÍA

	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
		(1)	**(2)**	**(3)**	((1)+(2))*(3) = **(4)**
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
	Director de Interventoría	$ 5.000.000,00		0,50	$ 2.500.000,00
	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,00		4,00	$ 16.000.000,00
	Profesional ambiental	$ 2.800.000,00		0,40	$ 1.120.000,00
	Profesional social	$ 2.800.000,00		0,40	$ 1.120.000,00
	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 3.000.000,00
	Especialista en Estructuras	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Vía y/o Pavimentos	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.500.000,00			
	Especialista en diseño Geometrico	$ 5.500.000,00			
	Inspector	$ 1.300.000,00		6,00	$ 7.800.000,00
	Inspector SST	$ 1.300.000,00		0,50	$ 650.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)				$ 32.190.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR (6)				2,36
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				$ 75.968.400,00

	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
			(7)	(8)	(7)*(8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	VIÁTICOS				
	Viaticos Director y/o Especialistas	Dia	$ 140.000,00	4,00	$ 560.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	Mes	$ 550.000,00	12,00	$ 6.600.000,00
	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	$ 2.800.000,00	2,00	$ 5.600.000,00
	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	3,00	$ 900.000,00
	OTROS COSTOS				
	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$ 176.200,00	2,00	$ 352.400,00
	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	$ 80.000,00	3,00	$ 240.000,00
	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 140.000,00	3,00	$ 420.000,00
	Veeduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	$ 38.500,00	3,00	$ 115.500,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 14.787.900,00
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 90.756.300,00
	IVA = 19% * (C) = (D)				$ 17.243.697,00
	COSTO TOTAL = (C) + (D)				$ 107.999.997,00

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Como interventoría, se continúa realizando actividades de seguimiento, acompañamiento y supervisión a cada una de las obras suscritas entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS y las juntas de acción comunal, dentro de las actividades de las cuales realizó esta firma durante el periodo del presente informe se describen a continuación:

- Acompañamiento y socialización del nuevo alcance de los proyectos de cada una de las juntas, que fueron ajustado por parte de los residentes de obra, posteriormente revisado, aprobado y avalado por esta interventoría. Esto debido a las alzas de los precios unitarios de los materiales de obra del año 2023 al presente año y ajuste de cantidades en algunos ítems o rubros del presupuesto, llegando de esta manera a disminuir la meta física.

- Revisión y aprobación de los materiales pétreos suministrados por los proveedores acordados por cada una de las juntas, donde se detalló los permisos o licencias ambientales y/o explotación minera, como también, que dichos materiales estén acordes a los materiales estipulados en los diseños de mezcla de 3.000 psi.

- Durante este periodo la interventoría realizó visitas a campo junto con los residentes de obra, en cumplimiento al seguimiento y control de cada una de las actividades que se llevan en las obras. Además, por parte del residente y director de interventoría realizaron recomendaciones muy puntuales en cuanto al tema de los bombeos y peraltes para cada una de las placas huellas al momento de extenderse y compactarse el material sub-base granular.

- Se realizó chequeo visual de los materiales de ferretería acopiados en sitio de obra, donde se evidenció la calidad y las especificaciones técnicas de cada uno de ellos necesarios para la construcción de las placas huelas en las juntas de Buenos Aires Bajo, La Esmeralda y Bajo Platanillo.

- Se verificó en sitio de obra que el personal de mano de obra calificada y no calificada estuviesen debidamente afiliados al sistema de seguridad social, para las juntas que iniciaron a realizar actividades físicas en obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-5* donde hace referencia el vehículo utilizado por el residente de interventoría para cada una de las veredas donde se supervisa, control y seguimiento técnico de las obras de placa huella.
(**Ver Anexo 8.15**)

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-7* donde se relaciona el personal mínimo requerido de acuerdo a la propuesta económica presentada por esta firma de interventoría, necesarios para llevar a cabo la supervisión técnica de cada uno de los convenios suscritos con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.16**)

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-9* donde se relaciona el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría para el presente periodo.
(**Ver Anexo 8.17**)

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-13* donde se relacionan las pólizas de **a)** cumplimiento general, **b)** pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y **c)** Calidad del servicio; correspondiente al contrato de interventoría No. 4136 – 2023 a la fecha del presente periodo.
(**Ver Anexo 8.18**)

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Otros de los documentos que se llevan periódicamente en el presente informe hace énfasis al formato de plan de cargas o reprogramación al plan de cargas del INVIAS.

- PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Se anexa formato *MEPI-MN-IN-9-FR-2* donde se evidencia el plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado para esta firma de interventoría por parte de la supervisión del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.19**)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Que esta interventoría junto con los residentes de obra de la Vereda La Esmeralda y de Bajo Platanillo se socializó en lugar de sitio de obra ante la comunidad el nuevo alcance de obra y los motivos o causas que se llevó a reducir la meta física inicial del proyecto para la construcción de placa huella.

- Se verificó por parte de esta firma interventora a las JAC los materiales pétreos adquiridos, y son acordes tal como se establecen en los diseños de concreto de 3.000 psi, siendo estos pétreos de buena calidad y que cumplen con las especificaciones técnicas del INVIAS.

- Que la Junta de Acción Comunal de la Vereda BAJO PLATANILLO presenta para este periodo un programado acumulado del 33,346% correspondiente a $66.025.603,87 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 18,977% correspondiente a $37.573.770,00 pesos M/CTE, lo que indica un atraso por debajo de lo programado en un 14,369% correspondiente a $28.451.833,87 pesos M/CTE.

- Que la Junta de Acción Comunal de la Vereda BUENOS AIRES BAJO presenta para este periodo un programado acumulado del 34,251% correspondiente a $68.386.720,04 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 7,898% correspondiente a $15.769.271,00 pesos M/CTE, lo que indica un atraso por debajo de lo programado en un 26,353% correspondiente a $52.617.449,04 pesos M/CTE.

- Que la Junta de Acción Comunal de la Vereda LA ESMERALDA presenta para este periodo un programado acumulado del 34,313% correspondiente a $67.940.279,06 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 20,754% correspondiente a $41.093.346,00 pesos M/CTE, lo que indica un atraso por debajo de lo programado en un 13,559% correspondiente a $26.846.933,06 pesos M/CTE.

- Para este presente informe del mes de julio, las juntas de la Vereda de La Esmeralda y Bajo Platanillo, tienen finalizado el suministro, extendido, humedecimiento y compactación del material sub-base granular a lo largo del tramo de intervención de 98mL y 109 mL respectivamente, cumpliendo con las especificaciones técnicas del INVIAS y de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES", como también respetando los bombeos y peraltes como se estipulan en los diseños geométricos de cada proyecto de la junta.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.1.2. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.1.3. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

8.2.1. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.2.2. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.2.3. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO

8.3.1. Copia de la bitácora de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.3.2. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.3.3. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.4. INFORMES SEMANALES

8.4.1. Informe semanal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.4.2. Informe semanal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.4.3. Informe semanal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.5.1. Maquinaria y equipo de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.5.2. Maquinaria y equipo de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.5.3. Maquinaria y equipo de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.6.1. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.6.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.7.1. Informe financiero y presupuestal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.7.2. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.7.3. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

8.8.1. Estado general del tiempo climático de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.8.2. Estado general del tiempo climático de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.8.3. Estado general del tiempo climático de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

8.9.1. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.9.2. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.9.3. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.10.1. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.10.2. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.10.3. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.11. PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.11.1. Plan de inversión de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.11.2. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

8.13.1. Seguimiento programa de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.13.2. Seguimiento programa de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.13.3. Seguimiento programa de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.14. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

8.14.1. Actas de comité de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.14.2. Actas de comité de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.14.3. Actas de comité de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.15. EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.16. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.18. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.19. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Atentamente,



ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
MP No. 19202-61820 CAU

ANEXOS

ANEXO 8.1.

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

ANEXO 8.1.1.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda La Esmeralda – CS#3379

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2024 - VEREDA DE LA ESMERALDA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE

Para este presente periodo no se efectuaron oficios remisorios por parte de esta firma interventora ante la junta de acción comunal de la vereda La Esmeralda.

ANEXO 8.1.2.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2024 - VEREDA BAJO PLATANILLO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE

Para este presente periodo no se efectuaron oficios remisorios por parte de esta firma interventora ante la junta de acción comunal de la vereda Bajo Platanillo.

ANEXO 8.1.3.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2024 - VEREDA BUENOS AIRES BAJO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE

Para este presente periodo no se efectuaron oficios remisorios por parte de esta firma interventora ante la junta de acción comunal de la vereda Buenos Aires Bajo.

ANEXO 8.1.4.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2024 – INTERVENTORÍA A INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE

Para este presente periodo no se efectuaron oficios remisorios por parte de esta firma interventora ante la entidad del Instituto Nacional de Invias - INVIAS.

ANEXO 8.2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

ANEXO 8.2.1.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA **FECHA:**31/07/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 1 (Valla informativa)	FOTOGRAFÍA 2 (Extendido de material granular sub-base)
	
FOTOGRAFÍA 3 (Armado de acero ref. 60.000 PSI para viga riostra)	FOTOGRAFÍA 4 (Extendido de material granular sub-base)
	
FOTOGRAFÍA 5 (Benitin en sitio de obra)	FOTOGRAFÍA 6 (Alambre negro para amarre en acopio)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA **FECHA:**31/07/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 7 (Corte y figurado de acero de ref. para viga riostra)	FOTOGRAFÍA 8 (Corte de acero transversal para huellas)
	
FOTOGRAFÍA 9 (Medición de ancho de banca, mayor a 5 metros.)	FOTOGRAFÍA 10 (Armado de viga riostra para placa huella)
	
FOTOGRAFÍA 11 (Acopio de acero de ref. de 60.000 psi)	FOTOGRAFÍA 12 (Vista general del tramo de placa huella a intervenir)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA **FECHA:**31/07/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 13 (Señalización de tránsito)	FOTOGRAFÍA 14 (Acopio de madera para armado de formaleta)
	
FOTOGRAFÍA 15 (Camilla rígida en ubicado en sitio de obra)	FOTOGRAFÍA 16 (Extintor ubicado en sitio de obra)
	
FOTOGRAFÍA 17 (Mezcladora de concreto en sitio de obra)	FOTOGRAFÍA 18 (Cemento para obra, sitio de acopio)

ANEXO 8.2.2.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO **FECHA:**31/07/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 1 (Valla informativa)	FOTOGRAFÍA 2 (Acopio de material de obra en bodega)
	
FOTOGRAFÍA 3 (Armado de formaleta para huella y cuneta)	FOTOGRAFÍA 4 (Socialización nuevo alcance del proyecto – 109 mL)
	
FOTOGRAFÍA 5 (Extendido de material granular sub-base)	FOTOGRAFÍA 6 (Extendido de material granular sub-base)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA **FECHA:**31/07/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 7 (Vista general instalación material sub-base granular)	FOTOGRAFÍA 8 (Vista general de campamento)
	
FOTOGRAFÍA 9 (Visita interventoría, INVIAS y miembros de junta)	FOTOGRAFÍA 10 (Campamento construido en obra)
	
FOTOGRAFÍA 11 (Señalización tránsito – Obra en la vía)	FOTOGRAFÍA 12 (Dotación de personal de obra)

ANEXO 8.2.3.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO **FECHA:**31/07/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 1 (Restauración y reforzamiento de puente en madera)	FOTOGRAFÍA 2 (Viga en madera para puente en madera)
	
FOTOGRAFÍA 3 (Ingreso de materiales pétreos – Sub-base granular)	FOTOGRAFÍA 4 (Drenado de agua acumulado y mejoramiento vía)
	
FOTOGRAFÍA 5 (Vista general de restauración de puente en madera)	FOTOGRAFÍA 6 (Descargue de material pétreos en sitio de obra)


ANEXO 8.3.

COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO


ANEXO 8.3.1.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

30/06/2024 Dia Dominical.




01/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Nublada
NOTA: Se continua trámite de activación de torrens por parte del contador contratado por la junta. La Esmeralda.



02/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Nublada.
NOTA: Se adelataron trámites de gestión del proveedor de material pétreo solicitando cotizaciones.
Se continua realizando la invitación a los miembros de la junta de accion


Powered by CamScanner

comunal para que participen como ayudantes en el proyecto.



03/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Nublado
Tarde: Soleado.


NOTA: Se continua por parte de la junta de acción comunal la recolección de hojas de vida para cargos de ayudantes de obra. Se coordinan con el Ingeniero residente y los directivos de la junta el transporte de materiales petreos




04/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Nublado
Tarde: Soleada

NOTA: Se continua por parte de la junta de la vereda la recolección de hojas de


vida para ejercer cargos de ayudantes de obra.






05/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Nublado
Tarde: Soleada


NOTA: Se continua por parte de la junta recolectando hojas de vida para cargos de ayudantes de obra.






06/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia Intensa
Tarde: Nublado


NOTA: Se continua por parte de la junta recolectando hojas de vida para afiliación de trabajadores a obra.






Powered by CamScanner

07/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Nublado
NOTA: Dra Dominical.




07
08/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia moderada.
Tarde: nublada.
NOTA: Se coordina actividades de transportes de materiales entre la junta directiva y el ingeniero residente de obra se continuan recolectando hojas de vida.



09/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: nublada.
NOTA: Se continua realizando la invitación a los miembros de la junta de acción comunal para que parte-


Powered by CamScanner

cipen como ayudantes en el proyecto.



10/07/2024 Registro Lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: dra soleado.

NOTA: Se continuan realizando la invitacion a los miembros de la junta de accion comunal para que participen como ayudantes en el proyecto.




11/07/2024 Registro lluvias: Mañana: soleada
Tarde: Nublada

Actividades: Se realizo localizacion y replanteo con equipo de topografia para el tramo de placa huella de 98mL, revision de bombeos y peraltes teniendo en cuenta el diseño


Powered by CamScanner

geométrico. Se continua recolectando hojas de vida por parte de la junta para ejercer cargos de ayudantes de obra



12/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Nublada

NOTA: se continua por parte de la junta recolectando hojas de vida para laborar como ayudantes de obra



13/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Lluvia intensa.

Nota: se continua por parte de la comunidad recolectando informaciòn

Powered by CamScanner

de las hojas de vida. Se continua coordinando actividades de transportes de los materiales de obra.

Cristian Cano

14/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Nublado.

NOTA: Dia dominical.

Cristian Cano

15/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado

NOTA: Se continua recibiendo hojas de vida por parte de los miembros de la JAC para el proyecto.

Cristian Cano

Powered by CamScanner

16/07/2024 Registro Lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Nublado
NOTA: Se continua recibiendo hojas de vida para laborar en la obra del proyecto de placa huella.

17/07/2024 Registro Lluvias: Mañana: Nublado
Tarde: Nublada.
NOTA: Se continua recibiendo hojas de vida para laborar en la obra del proyecto de placa huella.

18/07/2024 Registro Lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Nublada
NOTA: Se continua recibiendo hojas de vida para laborar en la obra

Powered by CamScanner

del proyecto de placa huella.

19/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleada.

ACTIVIDADES: Se acopia primer viaje de material granular sub-base en sitio de obra.

MAQ. y EQUIPOS: 1 Volqueta.


NOTA: Se continua recibiendo hojas de vida para laborar en la obra del proyecto de placa huella.

20/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Nublada.


NOTA: Se continua recibiendo hojas de vida para el proyecto de la placa huella por parte de

Powered by CamScanner

miembros de junta directiva.



21/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia suave
Tarde: Nublada.
Actividades: Se continua acoprando material granular sub-base.
MAQ. Y EQU.: * 1 volqueta
NOTA: se continua recibiendo hojas de vida para laborar como ayudantes.



22/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Nublado
Tarde: Nublada.
ACTIVIDADES: Se acopia material granular sub-base
MAQ Y EQU.: 1 volqueta
NOTA: Se continua recibiendo hojas de

Powered by CamScanner

vido por parte de la JAC para laborar como ayudantes de obra.

23/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Nublada.

ACTIVIDADES:- Acopio de material granular de sub-base.

NOTA: Se continua recibiendo hojas de vida para laborar en el proyecto de placa huella.


24/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleada.

ACTIVIDADES:- Acopio de material granular de sub-base.

NOTA: Se realiza descarge de materiales de obra por parte de la

Powered by CamScanner

junta de acción comunal. Se realizan afiliaciones de personal de obra.




25/07/2024 Registro lluvia: Mañana: soleada.
Tarde: nublada.

ACTIVIDADES: - Acopio de material granular sub-base.

MAQ Y EQUIPOS: - 1 retroexcavadora pajarita
- 1 vibro-compactador benetin.

NOTA: - Instalación de valla informativa.
- Afiliación de personal de obra.



26/07/2024 Registro lluvias: Mañana Soleada
Tarde: soleada.

Personal de obra: * 1 Ingeniero residente de obra.

Powered by CamScanner

* 1 Residente Interventoria
* 1 maestro
* 7 ayudantes.

MAQ Y EQU: * 1 retroexcavadora pajarita
* 1 beretin.

ACTIVIDADES: * Se realizan corte, figurado de acero de ref. de 60.000 psi para vigas riostras * Se extiende material granular sub-base * Se perfila la rasante y corte a talude para ampliación de banca. del tramo de los 98 ml.


27/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Soleado.

PERSONA OBRA: * Ing. residente de obra
* Ing. residente Interventoria
* 1 maestro
* 7 ayudantes.

MAQ Y EQU: * 1 Retroexcadora pajarita
* 1 vibro compactador beretin.


Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: * Se continua corte, figurado de acero de refuerso de 60.000 psi para viga riostras. * Se realizan actividades de compactación y humedecimiento de sub-base granular.



28/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia suave
Tarde: nublada

ACTIVIDADES: Día dominical, no se laboró.



29/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: soleada

PERSONAL DE OBRA: * Residente de obra
* Residente Interventoría

Powered by CamScanner

* 1 maestro
* 7 ayudantes.

MAQ Y EQUIPO: * pulidora
* Mezcladora 1.5 bultos

ACTIVIDADES: * Se continuan corte y figurado de acero de refuerzo de 60.000 psi para vigas riostra. * Se da inicio armado de formaleta para fundicion de concreto 3.000 psi para huella.

30/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada.
Tarde: Nublado.

PERSONAL OBRA: * Residente obra.
* Residente Interventoria
* 1 maestro.
* 7 ayudantes.

MAQ Y EQUI: * Pulidora
* Mezcladora 1.5 bultos.

ACTIVIDADES: * Se inician actividades de

Powered by CamScanner

preparación, transporte, vaciado y terminado de concreto de 3000 psi para huella y cunetas desde abscisa K0+000 a K0+010. * Se continuan trabajos de armados de formaleta e instalacion de la misma. para huellas.

31/07/2024 Registro lluvias: Mañana: nublado
Tarde: nublado.

PERSONAL OBRA: * Residente de obra
* Residente Interventoria
* 1 maestro
* 7 ayudantes

MAQ Y EQUI: * Mezcladora 1-5 bultos.
* Polidora.

ACTIVIDADES: * Se funde concreto de 3000 psi para huella entre abscisa K0+00 a K0+010 MD bajando. * Fundicion de concreto ciclopeo: C60% concreto y

40% piedra) * Se continua desencofre y instalacion de formaleta para placa huella.

Anexo Cero


ANEXO 8.3.2.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

Maquinaria y Equipos: - Retroexcavadora tipo pajarita.

Actividades: - Se realizo excavacion a maquina sobre taludes para ampliacion de calzada.
- Se chequea con topografia los cortes de taludes con maquina






01/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Lluvias moderadas

Nota: Se continua proceso de afiliacion del personal de obra.
No se reportan actividades de obra, ya que no se ha podida afiliarse al seguro social, y se han gestionado por parte de la contadora agilizando estos

Powered by CamScanner

actividades para afiliar correctamente.
No se cuentan con maquinarias en obra, el dia de hoy.






02/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Dia soleado entorde

Actividades: No se reportan actividades en obra.

Nota: La junta de acción comunal continua en el proceso de afiliación del personal de obra a ingresar. Se continua, junto con el residente de obra coordinando en transporte los materiales pétreos para conformación de calzada. con material sub-base.






INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

03/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Dra soleado
Tarde: soleado.

Actividades: No se reportan actividade en sitio de obra.


Nota: Se continua por parte de la junta de acción comunal y contador la afiliacion de las personas a laborar.



04/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderado
Tarde: Lluvias Fuertes.

Actividades: No se reportan actividades en sitio de obra.


NOTA: Se continua afiliaciones de trabajadores.




Powered by CamScanner


05/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado.
Tarde: Lluvia suave
Actividades: No se reportan actividades de obra.
Nota: Se continuo por parte del contador de la Junta Bajo platanillo, la afiliación de las personas que laborarán en obra.





06/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Actividades: No se reportan actividades de obra
Notas se continuan en el proceso de afiliación de personal de obra






07/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Nubado.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Actividades: Dia dominical.






08/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvias moderadas

Tarde: Lluias moderadas

Actividades: se continua sin registro de lluvias, y de actividades de obra.

Nota: Se continua proceso de afiliación del personal de obra.





09/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.


Tarde: Lluvias Intensas


Actividades: No se cuenta con registro de actividades de obra

Nota: Se continua en proceso de afilia-


Powered by CamScanner


ción del personal de obra.





10/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluvia intensas.
Actividades: No se registran actividades de obra.
Nota: Se continua proceso de afiliación del personal que laborará en obra.







11/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluvia moderada.
Actividades: No se reporta actividades de obras ~~Fisicas~~ en sitio de obra
Nota: Se continua proceso de afiliacion de personal de obra por parte del contador, por otra parte se vienen

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner


adelantando actividades de compra de materiales de obra necesario para el proyecto.





12/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderada
Tarde: Lluvia suave
Actividades: No se registran actividades de obra.
Nota: Se continua por parte de la junta de acción comunal consultas con INVIAS los problemas para afiliación del personal de obra







13/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Lluvias moderadas
Actividades: No se registran actividad en sitio de obra.


Powered by CamScanner


Nota: Se continua proceso de afiliación del personal de obra.





14/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvias moderada
tarde: Nubado.
Actividades: No se registran actividades de obra.
Nota: Se continua proceso de afiliación con el personal de obra necesario para la obra.






15/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluvia moderada
Actividades: No se reportan actividades de obra en sitio de construcción de Placa huella.
NOTA: Se continua proceso de afiliación del personal de obra

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner


que laborará en el proyecto.





16/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias fuertes
Tarde: Lluvias fuertes
Actividades: No se registran actividades en obra
Nota: Se continua por parte de la junta de acción comunal la afiliación del personal en obra. Se adelatan trámites de compras de materiales de obra.







17/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias suave
Tarde: Nublado.
Actividades: Se continua sin actividades realizadas en obra
Nota: Se continua con el proceso de afiliación del personal de obra ne-

Powered by CamScanner

corano para construcion de placa huella







18/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Actividades: Se continua sin avance de obra, se mantienen aun actividades de corte de taludes margen izquierda (Bajando) y conformacion, nivelacion del terreno con maquinaria en su momento.

Nota: Se continua con actividades de compra de materiales y de afiliacion del personal de trabajo a laborar.





19/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Lluvias suaves


Actividades: No se registran actividades de obra.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner


20/07/2024 Registro lluvias: mañana: Soleado
Tarde: Lluvia moderada.
Actividades: la junta continua sin ejecutar obra, después de la intervención con maquinaria pesada
Nota: Se continua proceso de afiliación de personal de obra.





21/07/2024 Registro lluvia: Mañana: Lluvias fuertes
Tarde: Lluvias fuertes
Actividades: No se reportan actividades ejecutadas en obra.
Nota: Se continua proceso de afiliacion.






22/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia suave
Tarde: Lluvia suave

Powered by CamScanner


Actividades: No se registran actividades ejecutadas en obra.
Nota: Se realizan compras de material granular sub-base, y de ferretería.





23/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Lluvias moderadas.
Actividades: No se registra actividade ejecutadas en obra.
Nota: Quedan afiliados el personal de obra. Se continuan trámites de compra de materiales de obra.





24/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de obra: - 1 maestro
- 6 Ayudantes

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Maquinaria y equipos: - Mezcladora 1.5 bultos
- Pulidora.

Actividades: - Corte, figurado de acero de refuerzo para vigas nosotras
- Armado de formaleta para Placa Huellas

25/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvias suaves
Tarde: Lluvias suaves.

Personal de obra: * 1 maestro de obra
* 6 Ayudantes de obra


Maq y equipos: * Mezcladora 1.5 bultos
* Pulidora
* Planta eléctrica.

Actividades: Se realizaron actividades de corte, flejado de acero de refuerzo de 60.000 psi, armado de formaleta para placa huella. Se continua acopio de materiales granulares pétreos como

Powered by CamScanner

sub-base granular.







26/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: soleado.

Personal de obra: * 1 maestro
* 6 Ayudantes

Maq. y equipos: * Mezcladora de 7.5 bultos
* pulidora.
* planta eléctrica.

Actividades: Se continua acopio de material granular sub-base, corte y figurado de acero de refuerzo de 60.000 psi para placa huella.





27/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia moderado
Tarde: Soleado.

INDUCONTABLES


Powered by CamScanner

Personal de obra: * 1 maestro
* 6 ayudantes

Maq. y equipos: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 polidera
* 1 planta eléctrica

Actividades: Se continua acopio de material granular sub-base, figurado y corte de acero de refuerzo de 60.000 ps.






28/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvias fuertes
Tarde: Lluvias fuertes

Actividades: DTA dominical





29/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: soleado.

Personal de obra: * 1 maestro

Powered by CamScanner

* 6 ayudantes.

Maq. y equipos: * 1 motoniveladora
* 1 mezclador 1-5 bultos
* 1 pulidora
* 1 planta eléctrica.

Actividades: * Extendido, humedecimiento, nivelación, compactación de material granular sub-base con motoniveladora. y vibro compactador.

30/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal de obra: * 1 maestro
* 6 Ayudantes

Maq. y equipos: * 1 mezcladora
* 1 pulidora.

Actividades: * Chequeo y revisión de bombeos y cenit entre Ingenieros de obra y de Interventoría. * corte y figu-

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

rado de acero de refuerzo de 60.000 psi para huellas, viga riostra y cunetas.

31/07/2024 Registro lluvia: Mañana: Lluvias Intensas
Tarde: Lluvias suave.

Personal de obra:
* 1 maestro
* 6 Ayudantes

Maq. y equipos:
* 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 pulidora
* 1 planta eléctrica.

Actividades: Se construye campamento necesario para almacenamiento de materiales de obra. Se continua con armado de Formaleta para huellas y Zona de Concreto ciclópeo, corte de estacas para sujecion de Formaletas.


Powered by CamScanner

ANEXO 8.3.3.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760


30/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Lluvias moderadas.

Día Dominical



01/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Nublada.

NOTA: Se adelantaron gestiones de proveedor de material pétreo solicitando cotizaciones para posterior compra.
Se continua realizando la invitación a los miembros de la Junta de Acción comunal para que participen como ayudantes en el proyecto.




INDUCONTABLES

Powered by CamScanner


02/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Nublada.

NOTA: Se continua la invitación en la junta de acción comunal para que participen en el proyecto de construcción de placa huella.



03/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Nublada
Tarde: Soleada

NOTA: Se continua realizando la invitación a los miembro de la junta de acción comunal para que participen como ayudantes en el proyecto de placa Huella.
Se inicia cuantificación de materiales de Ferretería por parte del Ing. Residente de obra.



Powered by CamScanner

04/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Nublada
Tarde: Soleada

NOTA: Se continua realizando la invitación a los miembro de la JAC de la vereda Buenos Aires bajo para que participen como ayudantes de obra.

05/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Nublada
Tarde: Soleada.


NOTA: Se continua realizando la invitacion a la comunidad aledaña al proyecto a que participen como ayudantes de obra. Se manifiesta por la vereda que intervendrán el puente en madera para restaurarse y que permita el flujo vehicular, ya que actualmente está en muy malas condiciones.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner


06/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Nubado.

NOTA: Se solicita a los miembros de la junta directiva a que participen la comunidad en general a cargos como ayudantes de obra.



07/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia Intensa
Tarde: Nublado

NOTA: Se continua solicitando a los miembros de la junta directiva q que participen la comunidad en general a cargos como ayudantes de obra.



08/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia Intensa
Tarde: Nublado

Powered by CamScanner

NOTA: Se continua por parte del residente de obra, la solicitud de participacion de la comunidad a cargos como ayodantes de obra.

09/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia Intensa
Tarde: Lluvia Intensa.

NOTA: Se solicita a la comunidad hojas de vida para laborar en el proyecto y posteriormente afiliarse al proyecto.


10/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Soleada

NOTA: Se continua solicitando a los miembros de la comunidad de la junta directiva a que participen la

INDUCONTABLES


Powered by CamScanner

comunidad en general a cargos como ayudantes de obra.



11/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
tarde: nublada.

NOTA: Se continua solicitando a la junta directiva de la vereda las hojas de vida para cargos como ayudantes de obra. Se realiza revisión y análisis para el puente en madera existe, si es o no viable que pase un vehiculo cargado de materiales.



12/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Nublado.

NOTA: Se continua solicitando a la junta directiva de la vereda las

Powered by CamScanner

hojas de vidas para el cargo de ayudantes de obra.

13/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Lluvia moderada.

NOTA: Se continua a la espera de las Hojas de vida y que sean entregadas por directivos de la junta al contador para que estos se afilien al momento de iniciar obras y se tengan viabilizado el paso por el puente en madera

14/07/2024 Registro Lluvias: Mañana: Lluvia intensa
Tarde: Nublada.

NOTA: Dia Dominical.

INDECONTABLES

Powered by CamScanner

15/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado

NOTA: Se continua a la espera de hojas de vida de posibles para cargos de ayudantes de obra, para remitir a contador y se afilien correctamente

16/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Nublada

Nota: Se continua por parte de los miembros directivos de la junta a que participen la comunida a cargos como ayudantes de obra y se entreguen las hojas de vida al contador para posteriormente afiliarse a seguridad social

17/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Nublada
Tarde: Nublada

NOTA: Se continua proceso de afiliacion del personal de obra.

18/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Nublada

ACTIVIDADES: Se realizan actividades de topografia de bcalizacion y replanteo del ramo de la placa Huella a Intervenirse.

NOTA: Se continua en el proceso de afiliacion del personal de obra, una vez se de viabilizacion de paso de vehiculos de carga sobe el puente en madera.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

19/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde. Soleada

NOTA: Se continua a la espera de afiliacion del personal de obra, una vez Se (vialice) viabilice el pasa de vehiculos de carga sobre puente en madera que esta en proceso de restauracion y reforzamiento de columnas en madera.


20/09/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Nublada

NOTA: Se continua a la espera de afiliacion del personal de obra, una vez se de visto bueno el servicio de la estructura del puente en madera.

Powered by CamScanner


21/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Llovia moderado
Tarde: Noblada.

NOTA: Dia dominical.



22/07/2024 Registro lluvias: Mañano: Noblada
Taide: Noblado.

NOTA: Se continoa a la espera de afiliacion del personal de obra, una vez se restaure y se refuerce el puente en madera que se encuentra en malas condiciones, para el pase de vehiculos de carga de materiales de obra para placa huella




23/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Noblada.

NOTA: Se continua a la espera que la

INCUCONTABLES


Powered by CamScanner

comunidad de Buenos Aires Bajo restaure y refuerce el puente en madera, que permita el transito de vehiculos de carga.



24/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Soleada.

NOTA: Se continua por parte de la comunidad de la vereda Buenos Aires Bajo, se restore y se refuerze estructura de puente en madera que permita el Ingreso de los materiales de obra en vehiculos de carga.




25/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Nublada

NOTA: Se continua por parte de la co-


Powered by CamScanner

munidad de la vereda la restauración y reforzamiento del puente de madera que permita el Ingreso de los materiales de obra.



26/07/2024 Registro llovias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

NOTA: Se continua por parte de la comonidad se restaure y se refuerza las estrutura del puente en madera, que permita el Ingreso delos materiales de obra de placa huella.




27/07/2024 Registro llovias: Mañana: Soleada
Tarde: Soleada.

NOTA: La comunidad de la vereda junto con el residente de obra realizan solicitud de apoyo ante a la alcaldia de

INDUCONTABLES


Powered by CamScanner

La Montañita con una maquinaria retro-excavadora para restaurar puente en madera.




28/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Noblada.

NOTA: Dia : dominical.




29/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Soleada.

Actividades: Se realizan actividades de restauración y reforzamiento del puente en madera, con maquinaria de apoyo por parte de la alcaldía y por otra parte por la comunidad de la vereda.




30/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Nublada.

NOTA: Se continuan la restauración y reforzamiento del puente en madera existente por parte de la comunidad de la vereda Buenos Aires Bajo.



31/07/2024 Registro lluvias: Mañana: Nublado.
Tarde: Nublado.

NOTA: Se realiza reunión con el maestro de obra, junto con el residente de obra y la junta directiva, las recomendaciones a tener en cuenta como el plástico, estacas, madera, etc. Se termina la restauración y reforzamiento de puente en madera que permite el transito de vehiculos pesados.



INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

ANEXO 8.4.

INFORMES SEMANALES

ANEXO 8.4.1.

Informe semanal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	7/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 14 del 1/07/2024 al 7/07/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3379 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 1,653% Avance o Atraso Físico % -0,060%
Meta Física Ejecutada % 1,593%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	13,07				13,3%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo topografía RTK	1	-
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	2	-
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda La Esmeralda de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La esmeralda – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI	X NO
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) EL PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA JUNTO CON EL RESIDENTE DE OBRA SE ADELANTARON COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y SELECCIONANDO PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA PRÓXIMA SEMANA.

2) SE ADELANTARON ACTIVIDADES DE GESTIÓN CON EL PROPIETARIO DE FINCA ALEDAÑA A LA OBRA, PARA SOLICITUD DE PERMISO POR PARTE DE LA JAC.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) AFILIACIÓN DE PERSONAL DE OBRA NO CALIFICADA POR PARTE DE LA JAC DE LA VEREDA DE LA ESMERALDA.

2) DETERMINAR LUGAR DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE OBRA (CEMENTO, ACERO DE REFUERZO, ETC).

3) COORDINAR TRÁMITE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERÍA, UNA VEZ SE HAGAN EFECTIVAS LAS COMPRAS.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	14/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 15 del 8/07/2024 al 14/07/2024 Último Informe Semanal SI☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3379 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7,045% Avance o Atraso Físico % -3,860%
Meta Física Ejecutada % 3,185%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	19,60				20,0%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo topografía RTK	1	1
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	1	-
Pulidora	1	-
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda La Esmeralda de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La esmeralda – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE CONTINUA POR PARTE DE JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA JUNTO CON EL RESIDENTE DE OBRA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y SELECCIONANDO PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA PRÓXIMA SEMANA.

2) SE REALIZARON COLOCACIÓN DE ESTACAS DELIMITANDO EN SITIO DE OBRA EL PUNTO DE INICIO Y FINAL DEL TRAMO DE PLACA HUELLA A CONSTRUIRSE, PARA ESTA ACTIVIDAD SE LOCALIZÓ CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) AFILIACIÓN DE PERSONAL DE OBRA NO CALIFICADA POR PARTE DE LA JAC DE LA VEREDA DE LA ESMERALDA.

2) DETERMINAR LUGAR DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE OBRA (CEMENTO, ACERO DE REFUERZO, ETC).

3) COORDINAR TRÁMITE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERÍA, UNA VEZ SE HAGAN EFECTIVAS LAS COMPRAS.

4) ACOPIAR SUB-BASE PARA QUE SE CUENTE EN SITIO DE OBRA, QUEDANDO LISTO PARA EXTENDERSE SOBRE EL TRAMO DE PLACA HUELLA A REALIZARSE, UNA VEZ ESTÉN LAS MAQUINARIAS EN OBRA.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Localización de punto final con topografía



Localización de punto inicial y marcación de delta con topografía



Equipo de topografía en sitio de obra para colocación de estacas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	21/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 16 del 15/07/2024 al 21/07/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3379 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 12,411% Avance o Atraso Físico % -7,633%
Meta Física Ejecutada % 4,778%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	26,13				26,7%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo topografía RTK	1	1
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	1	-
Pulidora	1	-
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda La Esmeralda de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La esmeralda – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE CONTINUA POR PARTE DE JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA JUNTO CON EL RESIDENTE DE OBRA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y SELECCIONANDO PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA PRÓXIMA SEMANA.

2) SE ESTÁ COORDINANDO POR PARTE DE LA COMUNIDAD LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO CEMENTO, ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI, ETC.

3) SE REALZIARON COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERÍA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) DETERMINAR LUGAR DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE OBRA (CEMENTO, ACERO DE REFUERZO, ETC).

3) COORDINAR TRÁMITE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERÍA, UNA VEZ SE HAGAN EFECTIVAS LAS COMPRAS.

4) ACOPIAR SUB-BASE PARA QUE SE CUENTE EN SITIO DE OBRA, QUEDANDO LISTO PARA EXTENDERSE SOBRE EL TRAMO DE PLACA HUELLA A REALIZARSE, UNA VEZ ESTÉN LAS MAQUINARIAS EN OBRA.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	29/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 17 del 22/07/2024 al 28/07/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3379 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 46.257.127,02	23,362%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 12.613.580,00	6,370%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (33.643.547,02)	-16,992%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.683.152,04	10,951%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.395,00	1,593%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 23,362% Avance o Atraso Físico % -16,992%
Meta Física Ejecutada % 6,370%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	32,67				33,3%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo topografía RTK	1	1
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	1	-
Pulidora	1	-
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda La Esmeralda de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La esmeralda – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE ACOPIA MATERIALES DE FERRETERÍA EN SITIO DE OBRA

2) SE REALIZA EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR SUB-BASE, QUEDANDO PENDIENTE COMPACTACIÓN DEL MISMO CON VIBRO-COMPACTADOR.

3) SE DA INICIO DE CORTE, FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA ARMAR VIGA CIMENTACIÓN DE PLACA HUELLA.

4) SE ACOPIA FORMALETA NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE CUADROS DE HUELLAS, CICLÓPEO Y CUNETAS, MEDIDAS QUE CUMPLEN CON LOS 15 CM DE ALTO DE ACUERDO A LA "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES"

5) INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) FINALIZAR ACTIVIDADES DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SUB-BASE GRANULAR CON MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO.

2) CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA VIGAS, CUNETAS Y HUELLAS.

3) DAR INICIO DE FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI Y/O CONCRETO CICLÓPEO (60% CONCRETO 3.000 PSI Y 40% PIEDRA).

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Extendido material sub-base granular con maquinaria



Instalación de valla informativa, señalización de tránsito



Corte y figurado de acero de ref. de 60.000 psi para vigas

NOTA: - Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.
- Se continua a la espera por parte del proveedor la entrega de los uniformes (camibuso, bota, casco,etc).

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	4/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 18 del 29/07/2024 al 4/08/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3379 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 67.940.279,06	34,313%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 41.093.346,00	20,754%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (26.846.933,06)	-13,559%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.683.152,04	10,951%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 28.479.766,00	14,384%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 34,313% Avance o Atraso Físico % -13,559%
Meta Física Ejecutada % 20,754%

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	39,20				40,0%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Benitin	1	1
Motoniveladora	1	1
Volqueta	2	2
Pulidora	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda La Esmeralda de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La esmeralda – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE FINALIZA EXTENDIO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL GRANULAR SUB-BASE A LO LARGO DEL TRAMO DE PLACA HUELLA, 98 METROS LINEALES.

2) SE CONTINUA CORTE, FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA ARMAR VIGA CIMENTACIÓN, HUELLAS Y CUNETAS DE LA PLACA HUELLA.

3) SE REALIZA ARMADO DE CAJONES PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO, DONDE SE CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE LARGO Y ANCHO DE ACUERDO A LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE PLACA HUELLA DEFINIDOS EN LA "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES"

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) DAR INICIO DE FUNDICIONES DE CONCRETO CICLÓPEO (60% CONCRETO 3.000 PSI Y 40% PIEDRA) Y DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLAS Y VIGA CIMENTACIÓN.

2) CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA VIGAS, CUNETAS Y HUELLAS.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Equipo benitin en sitio de obra



Vista general de sub-base granular extendida y compactada



Corte, figurado y armado de viga cimentación para placa huella

NOTA: - Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.
- Se continua a la espera por parte del proveedor la entrega de los uniformes (camibuso, bota, casco,etc).

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.4.2.

Informe semanal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	7/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 14 del 1/07/2024 al 7/07/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 164 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO
INTEGRANTES: N/A
CONVENIO No. 3441 de 2023 VALOR INICIAL: $ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4136 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO: 10/11/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): $ 199.001.571,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 107.999.997,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 1,686% Avance o Atraso Físico % 0,047%
Meta Física Ejecutada % 1,733%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	109,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	14,53				13,3%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora Pajarita	1	1
Volqueta	2	1
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Bajo Platanillo en Km 45+000 de la vía – Cruce la Sevilla hacia La Anguilla –Milán código: 185030

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI	X NO
	MTERIALES PÉTREOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) EN PROCESO DE AFILIACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA, SE HA TENIDO INQUIETUDES POR PARTE DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, DE NO SER POSIBLE A AFILIARSE Y SE ENCUENTRA EN TRÁMITE SE SUBSANACIÓN.

2) SOLICITUD DE PERMISO MEDIANTE ACTA DE VECINDAD O POR ESCRITO AL PROPIETARIO DE FINCA ALEDAÑA A LA OBRA, PARA PERMISO DE INTERVENCIÓN DE UN ÁREA DEL TERRENO Y PODERSE ALLÍ REALIZAR CAMPAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE OBRA.

3) EN PROCESO DE COMPRAS DE MATERIALES DE OBRA Y COORDINACIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERÍA POR PARTE DE LA JAC E ING. RESIDENTE DE OBRA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) DAR INICIOS DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERÍA DESDE FLORENCIA - SITIO DE OBRA UBICADO EN LA VEREDA DE BAJO PLATANILLO.

2) DAR INICIOS DE CARGUE, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE MATERIAL SUB-BASE CLASE C A LO LARGO DEL TRAMO DE INTERVENCIÓN DE PLACA HUELLA.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	14/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 15 del 8/07/2024 al 14/07/2024 Último Informe Semanal SI☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3441 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 6,758% Avance o Atraso Físico % -3,432%
Meta Física Ejecutada % 3,326%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	109,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	21,80				20,0%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	2	-
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	-
Pulidora	1	-
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Bajo Platanillo en Km 45+000 de la vía – Cruce la Sevilla hacia La Anguilla –Milán código: 185030

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ	PERMISO MINERO: SI	X NO
	MTERIALES PÉTREOS	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE CONTINUA PROCESO DE AFILIACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA, SE HA MANIFESTADO POR PARTE DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, DE NO SER POSIBLE A AFILIARSE Y SE ENCUENTRA EN TRÁMITE SE SUBSANACIÓN.

2) SOLICITUD DE PERMISO MEDIANTE ACTA DE VECINDAD O POR ESCRITO AL PROPIETARIO DE FINCA ALEDAÑA A LA OBRA, PARA PERMISO DE INTERVENCIÓN DE UN ÁREA DEL TERRENO Y PODERSE ALLÍ REALIZAR CAMPAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE OBRA.

3) EN PROCESO DE COMPRAS DE MATERIALES DE OBRA Y COORDINACIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERÍA POR PARTE DE LA JAC E ING. RESIDENTE DE OBRA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) DAR INICIOS DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERÍA DESDE FLORENCIA - SITIO DE OBRA UBICADO EN LA VEREDA DE BAJO PLATANILLO.

2) DAR INICIOS DE CARGUE, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE MATERIAL SUB-BASE CLASE C A LO LARGO DEL TRAMO DE INTERVENCIÓN DE PLACA HUELLA.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	21/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 16 del 15/07/2024 al 21/07/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3441 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 11,788%
Meta Física Ejecutada % 4,918%

Avance o Atraso Físico % -6,870%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	109,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	29,07				26,7%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	2	-
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	-
Pulidora	1	-
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Bajo Platanillo en Km 45+000 de la vía – Cruce la Sevilla hacia La Anguilla –Milán código: 185030

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MTERIALES PÉTREOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE CONTINUA PROCESO DE AFILIACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA, SE HA MANIFESTADO POR PARTE DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, DE NO SER POSIBLE A AFILIARSE Y SE ENCUENTRA EN TRÁMITE SE SUBSANACIÓN.

2) EL DÍA 17 DE JULIO DE 2024, SE REALIZÓ REUNIÓN EN LA ESCUELA DE BAJO PLATANILLO (MILÁN), PARA SOCIALIZAR EL NUEVO ALCANCE DEL PROYECTO, QUIEN ESTUBO PRESENTE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORÍA Y DIRECTOR DE INTERVENTORÍA. DONDE SE INFORMÓ A LA COMUNIDAD QUE EL ALCANCE FÍSICO DE LA OBRA ES DE 109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA.

3) SE CONTINUA EN PROCESO DE COMPRAS DE MATERIALES DE OBRA Y COORDINACIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERÍA POR PARTE DE LA JAC Y EL ING. RESIDENTE DE OBRA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) DAR INICIOS DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERÍA DESDE FLORENCIA - SITIO DE OBRA UBICADO EN LA VEREDA DE BAJO PLATANILLO.

2) DAR INICIOS DE CARGUE, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE MATERIAL SUB-BASE CLASE C A LO LARGO DEL TRAMO DE INTERVENCIÓN DE PLACA HUELLA.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	29/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 17 del 22/07/2024 al 28/07/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3441 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 44.683.014,53	22,567%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 12.891.784,00	6,511%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (31.791.230,53)	-16,056%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.342.589,34	10,779%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.395,00	1,593%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 22,567% Avance o Atraso Físico % -16,056%
Meta Física Ejecutada % 6,511%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	109,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	36,33				33,3%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	2	-
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	-
Pulidora	1	-
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Bajo Platanillo en Km 45+000 de la vía – Cruce la Sevilla hacia La Anguilla –Milán código: 185030

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MTERIALES PÉTREOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL SUB-BASE GRANULAR EN SITIO DE OBRA PARA ÁREA DE PLACA HUELLA.

2) SE REALIZA PAGOS A MATERIALES DE FERRETERÍA.

3) LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL REALIZA EL TRASLADO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPAMENTO PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE FERRETERÍA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) INSTALAR MATERIAL SUB-BASE GRANULAR EN LA ZONA DE LA PLACA HUELLA, E=15CM.

2) CONSTRUIR CAMPAMENTO PARA FUNCIÓN DE BODEGA DE MATERIALES DE OBRA.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita técnica por parte de Interventoría



Vista general del tramo de placa huella, L=109 metros

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	4/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 18 del 29/07/2024 al 4/08/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3441 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66.025.603,87	33,346%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 37.573.770,00	18,977%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (28.451.833,87)	-14,369%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.342.589,34	10,779%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.681.986,00	12,466%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 33,346% Avance o Atraso Físico % -14,369%
Meta Física Ejecutada % 18,977%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	109,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	43,60				40,0%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Volqueta	2	2
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	-
Pulidora	1	-
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Bajo Platanillo en Km 45+000 de la vía – Cruce la Sevilla hacia La Anguilla –Milán código: 185030

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MTERIALES PÉTREOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR PARA TRAMO DE PLACA HUELLA, E=15CM.

2) CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE FERRETERIA (CEMENTO, HERRAMEINTAS, ETC.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA.

2) TRANSPORTE, CORTE Y FIGURADO DE ACERRO DE REFUERZO PARA HUELLAS, TANTO LONGITUDINAL COMO TRANSVERSAL.

3) EXCAVACIONES MANUALES PARA VIGA DE CIMENTACIÓN, DE ACUERDO A LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA "CARTILLA DE OBRA MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES".

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general de extendido de sub-base granular



Extendido de material sub-base granular con motoniveladora



Campamento provisional, almacenamiento materiales ferretería

NOTA: - Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.
- Se continua a la espera por parte del proveedor la entrega de los uniformes (camibuso, bota, casco,etc).

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.4.3.

Informe semanal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	7/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 14 del 1/07/2024 al 7/07/2024 Último Informe Semanal SI☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3760 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.663.426,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.663.426,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.663.426,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.663.426,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 1,647% Avance o Atraso Físico % -0,067%
Meta Física Ejecutada % 1,580%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	13,07				13,3%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo topografía RTK	1	-
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	2	-
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) EL PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO JUNTO CON EL RESIDENTE DE OBRA SE ADELANTARON COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y SELECCIONANDO PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA PRÓXIMA SEMANA.

2) SE ADELANTARON ACTIVIDADES DE GESTIÓN CON EL PROPIETARIO DE FINCA ALEDAÑA A LA OBRA, PARA SOLICITUD DE PERMISO POR PARTE DE LA JAC.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) AFILIACIÓN DE PERSONAL DE OBRA NO CALIFICADA POR PARTE DE LA JAC DE LA VEREDA DE BUENOS AIRES BAJO.

2) DETERMINAR LUGAR DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE OBRA (CEMENTO, ACERO DE REFUERZO, ETC).

3) COORDINAR TRÁMITE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERÍA, UNA VEZ SE HAGAN EFECTIVAS LAS COMPRAS.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	14/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 15 del 8/07/2024 al 14/07/2024 Último Informe Semanal SI☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3760 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.663.426,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.663.426,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.663.426,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.663.426,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7,018% Avance o Atraso Físico % -3,859%
Meta Física Ejecutada % 3,159%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	19,60				20,0%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo topografía RTK	1	-
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	1	-
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	-
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE CONTINUA POR PARTE DE LA JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO JUNTO CON EL RESIDENTE DE OBRA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y SELECCIONANDO PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA PRÓXIMA SEMANA.

2) SE ADELANTARON TRÁMITES DE CONTRATACIÓN DE COMISIÓN TOPOGRÁFICA PARA INICIAR LINEAMIENTOS JUNTO CON LOS OPERARIOS DE MAQUINARIA, TENIENDO EN CUENTA LOS DISEÑOS GEOMETRICOS APROBADOS POR ESTA INTERVENTORÍA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) AFILIACIÓN DE PERSONAL DE OBRA NO CALIFICADA POR PARTE DE LA JAC DE LA VEREDA DE BUENOS AIRES BAJO.

2) DETERMINAR LUGAR DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE OBRA (CEMENTO, ACERO DE REFUERZO, ETC).

3) COORDINAR TRÁMITE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERÍA, UNA VEZ SE HAGAN EFECTIVAS LAS COMPRAS.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	21/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 16 del 15/07/2024 al 21/07/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO
INTEGRANTES: N/A
CONVENIO No. 3760 de 2023 VALOR INICIAL: $ 200.663.426,00
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 200.663.426,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4136 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO: 10/11/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.663.426,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): $ 200.663.426,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 107.999.997,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 12,359% Avance o Atraso Físico % -7,620%
Meta Física Ejecutada % 4,739%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	26,13				26,7%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo topografía RTK	1	-
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	1	-
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	-
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE REALIZA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, DICHA LOCALIZACIÓN SE HACE A TRAVÉS CON EL AYUDANTE DEL TOPOGRÁFO COLOCANDO ESTACAS DE 5X5 A CADA 5 METROS A LO LARGO DEL TRAMO, TANTO DE MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA.

2) SE CONTINUA POR PARTE DE LA JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO JUNTO CON EL RESIDENTE DE OBRA, LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y SELECCIONANDO PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA PRÓXIMA SEMANA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) DETERMINAR LUGAR DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE OBRA (CEMENTO, ACERO DE REFUERZO, ETC).

2) COORDINAR TRÁMITE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERÍA, UNA VEZ SE HAGAN EFECTIVAS LAS COMPRAS.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Localización y replanteo



Localización y replanteo



Localización y replanteo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	29/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 17 del 22/07/2024 al 28/07/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3760 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.663.426,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.663.426,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.663.426,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.663.426,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 46.531.561,43	23,305%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 12.615.417,00	6,318%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (33.916.144,43)	-16,987%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.855.158,61	10,946%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.854,00	1,580%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 23,305% Avance o Atraso Físico % -16,987%
Meta Física Ejecutada % 6,318%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	32,67				33,3%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo topografía RTK	1	-
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	1	-
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	-
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI	X NO
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE DEFINIO POR PARTE DE LA COMUNIDAD REFORZAR O ARREGLAR EL PUENTE EN MADERA, QUE PERMITA EL INGRESO DE CAMIONES O VOLQUETA, DONDE SE TRANSPORTA AMTERIALES NECESARIOS PARA LA PLACA HUELLA.

2) SE CONTINUA POR PARTE DE LA JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO JUNTO CON EL RESIDENTE DE OBRA, LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y SELECCIONANDO PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA PRÓXIMA SEMANA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) REFORZAR PUENTE ELABORADO ANTERIORMENTE POR LA COMUNIDAD, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y QUE NO ES VIABLE EL INGRESO DE VOLQUETAS.

2) COORDINAR TRÁMITE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERÍA, UNA VEZ SE HAGAN EFECTIVAS LAS COMPRAS.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Localización y replanteo	Localización y replanteo	Localización y replanteo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	4/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 18 del 29/07/2024 al 4/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO
INTEGRANTES: N/A
CONVENIO No. 3760 de 2023 VALOR INICIAL: $ 200.663.426,00
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 200.663.426,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4136 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO: 10/11/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.663.426,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.663.426,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 68.386.720,04	34,251%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 15.769.271,00	7,898%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (52.617.449,04)	-26,353%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.855.158,61	10,946%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.854,00	1,580%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 34,251% Avance o Atraso Físico % -26,353%
Meta Física Ejecutada % 7,898%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	39,20				40,0%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo topografía RTK	1	-
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	1	-
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	-
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE INCIA LABORES DE RESTAURACIÓN O REFORZAMIENTO DEL PUENTE EN MADERA, QUE CONDUCE A LA VEREDA DE BUENOS AIRES BAJO DONDE SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA.

2) SE CONTINUA POR PARTE DE LA JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO JUNTO CON EL RESIDENTE DE OBRA, LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y SELECCIONANDO PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA PRÓXIMA SEMANA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) DAR VIABILIDAD DE PASO DE MATERIALES DE OBRA PARA PLACA HUELLA SOBRE EL PUENTE REFORZADO POR LA COMUNIDAD DE LA VEREDA DE BUENOS AIRES BAJO.

2) COORDINAR TRÁMITE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERÍA.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Localización y replanteo	Localización y replanteo	Localización y replanteo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.5.1.

Maquinaria y equipo de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETÁ** **PERIODO MES:** **5**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3379 DE 2023 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JULIO																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETRO EXCAVADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE RODILLO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I
MEZCLADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RANA COMPACTADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4	5	5	6	6	6	6

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	2,69
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	5	2,69
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	-
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	181	97,31

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): NO SE CONTABA CON ACTIVIDADES QUE REALIZARA LAS MAQUINARIAS O EQUIPOS.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL PORCENTAJE DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS QUE SE REPORTA ACTIVAMENTE EN EL PERIODO, SE DEBE A QUE HASTA EL DÍA 23 DE JULIO YA SE CONTABA CON LOS MATERIALES PÉTREOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma 1110521765 de Ibague

Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.2.

Maquinaria y equipo de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETÁ** **PERIODO MES:** **5**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3441 DE 2023 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JULIO																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETRO EXCAVADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I
MOTONIVELADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE RODILLO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA	MERCURY-1959	6 M3	MILAN	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	A	A	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	5	5	6	5	6	6

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	2,15
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	2,15
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	-
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	182	97,85

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): NO SE CONTABA CON ACTIVIDADES QUE REALIZARA LAS MAQUINARIAS O EQUIPOS.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL PORCENTAJE DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS QUE SE REPORTA ACTIVAMENTE EN EL PERIODO, SE DEBE A QUE HASTA EL DÍA 23 DE JULIO YA SE CONTABA CON LOS MATERIALES PÉTREOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.3.

Maquinaria y equipo de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETÁ** **PERIODO MES:** **5**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3760 DE 2023

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JULIO																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETRO EXCAVADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I
MOTONIVELADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE RODILLO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RANA COMPACTADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	6

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	1,08
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	1,08
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	-
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	184	98,92

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): NO SE CUENTA CON ACTIVIDADES NECESARIAS EN OBRA PARA OCUPAR EQUIPOS Y MAQUIANRIAS.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: SE EVIDENCIA PRESENCIA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA EL REFORZAMIENTO Y RESTRAURACIÓN DE PUENTE EN MADERA, QUE PERMITA EL PASO DE VOLQUETAS O CAMIONES DE CARGA DE MATERIAL DE OBRA.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma 1110521785 de Ibague

Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.6.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.6.1.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

ANEXO 8.6.2.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4136 DE 2024 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

NOMBRE ARL: N/A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N/A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	YOVANI MUÑOZ SILVA	17605250	MAESTRO	$ 2.158.000	X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	$ 575.467	$ 40.100	V	NUEVA EPS		$ 72.000	PROTECCION		$ 92.100	$ 23.100	$ 11.600	$ 17.300	
2	YESID GONZALEZ ARIZA	1117233677	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	$ 346.667	$ 15.100	IV	NUEVA EPS		$ 43.400	PORVENIR		$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
3	ARNULFO HUL SANJUAN	17656633	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	$ 346.667	$ 15.100	IV	NUEVA EPS		$ 43.400	PORVENIR		$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
4	BRAYAN MENDEZ PERDOMO	1006484377	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	$ 346.667	$ 15.100	IV	NUEVA EPS		$ 43.400	PORVENIR		$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
5	DAIMER NOGUERA FAJARDO	1006483957	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	$ 346.667	$ 15.100	IV	NUEVA EPS		$ 43.400	PORVENIR		$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
6	CARLOS ORTIZ PALOMARES	1117235947	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	$ 346.667	$ 15.100	IV	NUEVA EPS		$ 43.400	PORVENIR		$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
7	WILMER ÑAÑEZ MENDEZ	1117234029,00	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	$ 346.667	$ 15.100	IV	NUEVA EPS		$ 43.400	PORVENIR		$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
8																			
9																			
10																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

EL INGRESO DEL PERSONAL AL SITIO DE LA OBRA SE REGISTRA A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2024

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS
Rep. Legal: Presidente de la Junta de Acción Comunal

Firma
Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.6.3.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4136 DE 2024 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

NOMBRE ARL: N/A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N/A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NO SE RELACIONA PERSONAL EN EL FORMATO, DEBIDO A QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO NO CUENTA CON MATERIALES DE FERRETERÍA EN SITIO DE OBRA.

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: GEAN CARLOS TAPIERO MONGE
Rep. Legal: Presidente de la Junta de Acción Comunal

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.7.1.

Informe financiero y presupuestal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1113323		10	NACIÓN	3379-0	$ 197.824.563,00	$ 197.824.563,00
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.001.571,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	N/A		

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.2.

Informe financiero y presupuestal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 3441 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1114423		10	NACIÓN	3441-0	$ 197.824.563,00	$ 197.824.563,00
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.001.571,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	N/A		

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.3.

Informe financiero y presupuestal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1137923		10	NACION	3760-0	$ 199.486.418,00	$ 199.486.418,00
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200.663.426,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	N/A		

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

ANEXO 8.8.1.

Estado general del tiempo climático de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	14	16	18	18	24	24	24	24	18	24	24	24	24	24	24	18	24	24	24	24	24	24	18	24	24	24	696
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	10	8	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	48
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma 1110521785 de Ibague
Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.2.

Estado general del tiempo climático de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	13	19	24	16	21	24	18	16	15	19	12	15	0	19	16	4	13	24	21	17	0	16	14	24	15	24	18	14	20	24	17	512
Lluvias moderadas	11	5	0	2	3	0	6	8	5	1	12	6	24	3	8	20	5	0	3	1	24	3	6	0	3	0	4	3	4	0	1	171
Lluvias intensas	0	0	0	6	0	0	0	0	4	4	0	3	0	2	0	0	6	0	0	6	0	5	4	0	6	0	2	7	0	0	6	61
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Firma 1110521985 de Ibague
Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.3.

Estado general del tiempo climático de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	14	16	18	18	24	24	24	24	18	24	24	24	24	24	24	18	24	24	24	24	24	24	18	24	24	24	696
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	10	8	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	48
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma 7710521785 de Ibague
Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

ANEXO 8.9.1.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

PARA ESTE MES NO SE REPORTA RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.2.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

PARA ESTE MES NO SE REPORTA RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.3.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

PARA ESTE MES NO SE REPORTA RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.10.1.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 27/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.001.571,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.001.571,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 39.800.314,00	29/09/2023	3/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.950.079,00	29/09/2023	3/01/2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.700.471,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3749854-1

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurad	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	117%	$ 232.000.000,00	29/09/2023	31/12/2023
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0931402-2 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurad	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.2.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 28/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.001.571,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.001.571,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 39.800.314,20	19/09/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.950.078,55	19/09/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.700.471,30	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3746473-3

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	117%	$ 232.000.000,00	19/09/2023	31/12/2023
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0930728-3 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.3.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 29/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.663.426,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.663.426,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.132.685,00	5/10/2023	6/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.033.171,00	5/10/2023	6/01/2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.199.028,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3752670-2

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 10/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	$ 232.000.000,00	5/10/2023	31/12/2023
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0932022-1 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 10/10/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.

PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.11.1.

Plan de inversión de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	18/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3379 de 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 59.749.142,00	$ 44.811.856,00	$ 44.811.856,00		$ 149.372.854,00	75,4%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.481.186,00		$ 4.481.186,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.659.013,00	$ 13.244.259,00	$ 13.244.259,00		$ 44.147.531,00	22,3%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 77.408.155,00	$ 58.056.115,00	$ 62.537.301,00		$ 198.001.571,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: HERNÁN SÁNCHEZ HUERTAS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: ALVARO GASCA TORRES
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 96892-T

Contratista

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.2.

8.11.2. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	18/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3441 DE 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMACAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 59.749.142,00	$ 44.811.856,00	$ 44.811.856,00		$ 149.372.854,00	75,4%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.481.186,00		$ 4.481.186,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.659.013,00	$ 13.244.259,00	$ 13.244.259,00		$ 44.147.531,00	22,3%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 77.408.155,00	$ 58.056.115,00	$ 62.537.301,00		$ 198.001.571,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: ROBINSON ALMARIO PENAGOS
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 93901-T

Contratista

Firma:
Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.3.

8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	18/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3760 de 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 60.392.026,00	$ 45.294.019,00	$ 45.294.019,00		$ 150.980.064,00	75,6%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.529.402,00		$ 4.529.402,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.661.584,00	$ 13.246.188,00	$ 13.246.188,00		$ 44.153.960,00	22,1%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 78.053.610,00	$ 58.540.207,00	$ 63.069.609,00		$ 199.663.426,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Gean Carlos Tapiero.
Nombre: GEAN CARLOS TAPIERO MONGE
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: ALVARO GASCA TORRES
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 96892-T

Contratista

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.12.

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.12.1.

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 05/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

1 de 2

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3 **MES:** JULIO del 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3379 del 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 198.001.571,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

"UNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 del 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
Nota de Contabilidad 003	31/07/2024	Banco de Occidente	Gastos bancarios e Impuestos	$ 695.192,62	$ -	$ -	$ -	$ 695.192,62	3	Gastos Administrativos
003	8/07/2024	JAC Vereda La Esmeralda	Reintegro valor de Pólizas Convenio No. 3379-2023 IN	1.502.077,00	-	-	-	1.502.077,00	3	Gastos Administrativos
004	8/07/2024	Porvenir Ltda Asesores de Seguros	Renovación de pólizas Convenio No. 3379-2023 INVIA	365.443,00	-	-	-	365.443,00	3	Gastos Administrativos
005	8/07/2024	Hernán Sánchez Huertas	Subsidio de transporte Presidente Mayo y Junio - 2024	800.000,00	-	-	-	800.000,00	3	Gastos Administrativos
006	9/07/2024	Liana Maria Molina Jaramillo	Pago valla publicitaria	80.000,00	-	-	-	80.000,00	3	Gastos Administrativos
007	18/07/2024	Eveimar Leonel Laguna	Pago levantamiento topográfico	1.500.000,00	-	90.000,00	-	1.410.000,00	3	Gastos Administrativos
008	18/07/2024	Benavides Duran Polania	Pago transporte de 10 viajes de arena	8.500.000,00	-	85.000,00	-	8.415.000,00	1	Costo directo de obra
009	18/07/2024	Luis Antonio Avilez	Pago Estudios y Diseños	1.509.003,00	-	50.722,00	-	1.458.281,00	3	Gastos Administrativos
010	18/07/2024	Apolo & Agregados S.A.S	Pago material granular	16.020.900,00	-	336.574,00	-	15.684.326,00	1	Costo directo de obra
011	19/07/2024	Constructora - Obras Kris Zoomac S.A.S	Pago materiales de ferretería	39.951.397,00	-	864.672,00	-	39.086.725,00	1	Costo directo de obra
012	19/07/2024	Laboremos SSA S.A.S	Exámenes de Ingreso Laboral	200.000,00	-	-	-	200.000,00	3	Gastos Administrativos
013	19/07/2024	RPM Suministros y Dotaciones S.A.S	Elementos de protección personal	2.264.500,00	-	54.143,00	-	2.210.357,00	3	Gastos Administrativos
014	25/07/2024	Alvaro Gasca Torres	Pago Contador Jun.17 a Jul.16-2024	2.100.000,00	-	-	-	2.100.000,00	3	Gastos Administrativos
015	25/07/2024	Benavides Duran Polania	Pago transporte de 15 viajes de material granular	12.750.000,00	-	127.500,00	-	12.622.500,00	1	Costo directo de obra
016	25/07/2024	Tecnicercas S.A.S	Pago servicio de transporte materiales de construcción	6.700.000,00	-	67.000,00	-	6.633.000,00	1	Costo directo de obra
017	29/07/2024	Constructora - Obras Kris Zoomac S.A.S	Pago servicio de transporte materiales de ferretería	2.260.000,00	-	28.104,00	-	2.231.896,00	1	Costo directo de obra
018	31/07/2024	Carlos Alberto Zambrano Gonzalez	Pago No. 1 Ingeniero Residente	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	3	Gastos Administrativos
019	31/07/2024	Nelson Enrique Gutierrez Santos	Sueldo Administración del 22 al 31 de julio del 2024	688.920,00	-	-	-	688.920,00	3	Gastos Administrativos
020	31/07/2024	Nómina costo directo de la obra	Nómina costo directo de la obra	2.851.800,00	-	-	-	2.851.800,00	1	Costo directo de obra

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 149.372.854,00	$ -	$ 89.034.097,00	$ 89.034.097,00	$ 60.338.757,00
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	4.481.186,00	-	-	-	4.481.186,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.147.531,00	2.486.624,23	16.143.135,62	18.629.759,85	25.517.771,15
	TOTALES	**$ 198.001.571,00**	**$ 2.486.624,23**	**$ 105.177.232,62**	**$ 107.663.856,85**	**$ 90.337.714,15**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **(Julio del 2024):** (Indicar el mes) **$ 33.367,69** (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: **$ 435.032,68** (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
1	$ 361.147,99	$ -	Mayo del 2024	26/06/2024	$ 361.147,99

OBSERVACIONES:

El valor de los rendimientos financieros consignados es el valor acumulado a 31 de mayo del 2024.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Hernan Sanchez H
Nombre: **HERNAN SANCHEZ HUERTAS**
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: **ALVARO GASCA TORRES**
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: **96892-T**

Firma:
Nombre: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
Interventor
Matrícula Profesional No.: **19202-61820 CAU**

Firma:
Nombre: **CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **25202-72334 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONVENIO No. 3379 del 2023 (Indicar número y año) **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	SALDO INICIAL		**1/07/2024**																	**$ 195.555.463,77**	
3	Gastos Administrativos		8/07/2024	C.E	003	N/A	Reintegro valor de Pólizas Convenio No. 3379-2023 INVIAS	OAC Vereda La Esmeralda	901.705.545	Vereda La Esmeralda		jacveredlaesmeraldaup@gmail.com	$ 1.262.249,58	$ 239.827,42	$ 1.502.077,00				$ 1.502.077,00	194.053.386,77	
3	Gastos Administrativos		8/07/2024	C.E	004		Renovación de pólizas Convenio No. 3379-2023 INVIAS	Porvenir Ltda Asesores de Seguros	828.001.755	Calle 17 Carrera 7	4380053		307.094,96	58.348,04	365.443,00				365.443,00	193.687.943,77	
3	Gastos Administrativos		8/07/2024	C.E	005		Subsidio de transporte Presidente Mayo y Junio 2024	Hernán Sánchez Huertas	17.644.725	Vereda La Esmeralda	312 4077972	jacveredlaesmeraldaup@gmail.com	800.000,00		800.000,00				800.000,00	192.887.943,77	
3	Gastos Administrativos		9/07/2024	C.E	006		Pago valla publicitaria	Liana Maria Molina Jaramillo	40.730.932	Calle 16 Carrera 5	4348952	planosypublicidad@yahoo.es	80.000,00		80.000,00				80.000,00	192.807.943,77	
3	Gastos Administrativos		18/07/2024	C.E	007		Pago levantamiento topográfico	Eveimar Leonel Laguna	1.006.004.919	Calle 69 No. 28.87	324 5653005	eveimarleonel223@gmail.com	1.500.000,00		1.500.000,00		90.000,00		1.410.000,00	191.307.943,77	
1	Costo directo de obra		18/07/2024	C.E	008		Pago transporte de 10 viajes de arena	Benavides Duran Polania	1.012.402.533	Calle 33 No. 40-60	313 3819962	benavidesduranpolania@gmail.com	8.500.000,00		8.500.000,00		85.000,00		8.415.000,00	182.807.943,77	
3	Gastos Administrativos		18/07/2024	C.E	009		Pago Estudios y Diseños	Luis Antonio Avilez	6.886.705	Calle 6 Sur No. 18-18	3125233649	geoconingenieria@hotmail.com	1.268.070,00	240.933,30	1.509.003,30		50.722,00		1.458.281,00	181.298.940,47	
1	Costo directo de obra		18/07/2024	C.E	010		Pago material granular	Apolo & Agregados S.A.S	901.379.145	Calle 10 No. 1A - 23	3124775092	apoloyagregados@gmail.com	13.462.941,18	2.557.958,82	16.020.900,00		336.574,00		15.684.326,00	165.278.040,47	
1	Costo directo de obra		19/07/2024	C.E	011		Pago materiales de ferretería	Constructora - Obras Kris Zoomac S.A.S	901.436.971	Calle 1A No. 1A-105	608-4343684	macrismupa1402@gmail.com	34.586.889,00	6.514.508,00	41.101.397,00		864.672,00		40.236.725,00	124.176.643,47	
3	Gastos Administrativos		19/07/2024	C.E	012		Exámenes de Ingreso Laboral	Laboremos SSA S.A.S	900.749.357	Calle 16A No. 6-55	3118891942	laboremos1431@yahoo.com	200.000,00		200.000,00				200.000,00	123.976.643,47	
3	Gastos Administrativos		19/07/2024	C.E	013		Elementos de protección personal	RPM Suministros y Dotaciones S.A.S	901.426.432	Carrera 14 No. 20-14	3202627622	rpmsuministrosydotaciones@gmail.com	2.165.714,00	386.786,00	2.552.500,00		54.143,00		2.498.357,00	121.424.143,47	
3	Gastos Administrativos		25/07/2024	C.E	014		Pago Contador Jun.17 a Jul.16-2024	Alvaro Gasca Torres	17.652.275	Calle 1G No.17A-29	3133477239	alvarogasca@hotmail.com	2.100.000,00		2.100.000,00				2.100.000,00	119.324.143,47	
1	Costo directo de obra		25/07/2024	C.E	015		Pago transporte de 15 viajes de material granular	Benavides Duran Polania	1.012.402.533	Calle 33 No. 40-60	313 3819962	benavidesduranpolania@gmail.com	12.750.000,00		12.750.000,00		127.500,00		12.622.500,00	106.574.143,47	
1	Costo directo de obra		25/07/2024	C.E	016		Pago servicio de transporte materiales de construcción	Tecnicercas S.A.S	900.304.790	Carrera 4 No. 4-15	3122548879	tecnicerca@hotmail.com	6.700.000,00		6.700.000,00		67.000,00		6.633.000,00	99.874.143,47	
1	Costo directo de obra		29/07/2024	C.E	017		Pago servicio de transporte materiales de ferretería	Constructora - Obras Kris Zoomac S.A.S	901.436.971	Calle 1A No. 1A-105	608-4343684	macrismupa1402@gmail.com	2.180.168,00	79.832,00	2.260.000,00		28.104,00		2.231.896,00	97.614.143,47	
3	Gastos Administrativos		31/07/2024	C.E	018		Pago No. 1 Ingeniero Residente	Carlos Alberto Zambrano Gonzalez	79.695.240	CL 26 19 26 BRR ACOLSURE	3142187509	carlosydiana20@gmail.com	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00	94.614.143,47	
3	Gastos Administrativos		31/07/2024	C.E	019		Sueldo Administración del 22 al 31 de julio del 2024	Nelson Enrique Gutierrez Santos	80.117.524	Vereda La Esmeralda	3209852389		688.920,00		688.920,00				688.920,00	93.925.223,47	
1	Costo directo de obra		31/07/2024	C.E	020		Nómina costo directo de la obra	Nómina costo directo de la obra					2.851.800,00		2.851.800,00				2.851.800,00	91.073.423,47	
	Interéses Generados	40.517,00	30/06/2024				Rendimientos Financieros	O.A.C	901.705.545	Vereda La Esmeralda	312 4077972	jacveredlaesmeraldaup@gmail.com	33.367,69		33.367,69				33.367,69	91.106.791,16	
3	Gastos Administrativos		30/06/2024	N.C	003	N/A	Gastos Financieros	Banco de Occidente	890.300.279				695.192,62		695.192,62				695.192,62	90.411.598,54	

Firma: Hernan Sanchez H
Nombre: HERNÁN SÁNCHEZ HUERTAS
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Firma:
Nombre: ALVARO GASCA TORRES
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 96892-T

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

ANEXO 8.12.2.

8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3441 DE 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 198.001.571,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMACAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CE 001 DEL 05-jul-2024	FEV 576	2-jul-24	LUIS ANTONIO AVILEZ	$ 416.500	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 002 DEL 05-jul-2024	CTA COBRO	3-jul-24	ANGIE VIVIANA HERNANDEZ ALVARADO	$ 1.200.000	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 003 DEL 18-jul-2024	FE 2926	17-jul-24	LIANA MARIA MOLINA JARAMILLO	$ 160.000	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 004 DEL 24-jul-2024	FE 1085	22-jul-24	FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC SAS	$ 38.848.108	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 004 DEL 24-jul-2024	FE 1086	22-jul-24	FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC SAS	$ 37.604	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 005 DEL 30-07-2024	FE 1527	27-jul-24	PETREOS DE COLOMBIA SAS	$ 8.490.000	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 006 DEL 30-07-2024	FE 143	24-jul-24	CONSTRUCTORA NACIONAL Y PROYECTOS VIA	$ 3.240.000	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
	EXTRACTO	31-jul-24	BANCO DE OCCIDENTE	$ 258.296	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operacion de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 149.372.854	$ -	50.578.108	50.578.108	98.794.746
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ 4.481.186	$ -	-	-	4.481.186
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531	306.300	2.072.400	2.378.700	41.768.831
		$ -	$ -	-	-	-
		$ -	$ -	-	-	-
	TOTALES	$ 198.001.571	$ 306.300	52.650.508	52.956.808	145.044.763

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (JULIO DE 2024): $ 39.388,15
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 441.125
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2 de 2 .

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: **DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS**
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: **ROBINSON ALMARIO PENAGOS**
Contador del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 193901-T

Firma:
Nombre: **JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONVENIO No. 3441 DE 2023 **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
		198.001.571	20/12/023		A838212		UNICO DESEMBOLSO CONVENIO No. 3441 de 2023													$ 198.001.571,00	
		32.550	28/12/2023				RENDIMIENTOS FINANCIEROS												$ -	$ 198.034.121,48	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	28/12/2023	EXTRACTO			GASTOS BANCARIOS (GMF Y RETENCION)	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CL 15 44 11			$ 2.289,12	$ -	$ 2.289,12	$ -	$ -		$ 2.289,12	$ 198.031.832,36	
		83.843	28/01/2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								$ -				$ -	$ 198.115.675,10	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	28/01/2024	EXTRACTO			GASTOS BANCARIOS (GMF, CUOTA DE MANEJO, IVA, RETENCION)	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CL 15 44 11			$ 86.263,36	$ 15.200,00	$ 101.463,36				$ 101.463,36	$ 198.014.211,74	
		78.424	28/02/2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								$ -				$ -	$ 198.092.636,08	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	28/02/2024	EXTRACTO			GASTOS BANCARIOS (GMF, CUOTA DE MANEJO, IVA, RETENCION)	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CL 15 44 11			$ 85.883,84	$ 15.200,00	$ 101.083,84				$ 101.083,84	$ 197.991.552,24	
		83.824	28/03/2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								$ -				$ -	$ 198.075.376,62	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	28/03/2024	EXTRACTO			GASTOS BANCARIOS (GMF, CUOTA DE MANEJO, IVA, RETENCION)	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CL 15 44 11			$ 86.263,36	$ 15.200,00	$ 101.463,36				$ 101.463,36	$ 197.973.913,26	
		40.572	28/04/2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS												$ -	$ 198.014.485,70	
		41.934	28/05/2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS												$ -	$ 198.056.419,31	
		40.589	30/06/2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS												$ -	$ 198.097.008,65	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	5/07/2024	C.E. 001	A182741	FEV 576	DISEÑO DE MEZCLA	LUIS ANTONIO AVILEZ	6886705	CL 6 SUR 18 18 VILLAMONICA	3125233649	geoconingenieria@ho	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00		$ 14.000,00		$ 402.500,00	$ 197.694.508,65	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	5/07/2024	C.E. 002	A182840	CTA COBRO	SERVICIO DE TOPOGRAFIA PLACA HUELLA	ANGIE VIVIANA HERNANDEZ ALVARADO	1006487317	CL 12 B 13 33 BRR JESUS ANGEL	3118973228	angieher059922@gm	$ 1.200.000,00		$ 1.200.000,00				$ 1.200.000,00	$ 196.494.508,65	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	18/07/2024	C.E. 003	A344962	FE2926	VALLA Y BANNER	LIANA MARIA MOLINA JARAMILLO	40730932	CL 16 CR 5 ESQ BRR SIETE DE AGOSTO	4348952	planosypublicidad@y	$ 160.000,00		$ 160.000,00				$ 160.000,00	$ 196.334.508,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	-	24/07/2024	C.E. 004	A735093	FE1085	VARILLA CEMENTO Y OTROS PARA OBRA	FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC SAS	901429462	CR 16 15 48 BRR CENTRO	3114609940		$ 32.751.956,68	$ 6.096.152,00	$ 38.848.108,68		$ 818.799,00		$ 38.029.309,68	$ 158.305.198,97	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	24/07/2024	C.E. 004	A735093	FE1086	CINTA PELIGRO	FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC SAS	901429462	CR 16 15 48 BRR CENTRO	3114609940		$ 31.600,00	$ 6.004,00	$ 37.604,00		$ 791,00		$ 36.813,00	$ 158.268.385,97	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	-	30/07/2024	C.E. 005	A297191	FE 1527	AGREGADOS Y ARENA	PETREOS DE COLOMBIA SAS	900459141	CL 14 12 18 ED BANCOLOMBIA	3134436828	petreosdelcaqueta@h	$ 7.134.454,00	$ 1.355.546,00	$ 8.490.000,00		$ 178.361,00		$ 8.311.639,00	$ 149.956.746,97	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	-	30/07/2024	C.E. 006	A298373	FE 143	SUMINISTRO MATERIAL DE CRUDO	CONSTRUCTORA NACIONAL Y PROYECTOS VIALES	900702526	CR 6 7 47 BRR CENTRO	3209637432	constructoranacional2	$ 2.722.689,00	$ 517.311,00	$ 3.240.000,00		$ 68.067,00		$ 3.171.933,00	$ 146.784.813,97	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	31/07/2024	EXTRACTO			GASTOS BANCARIOS (GMF, IVA Y COMISION)	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CL 15 44 11			$ 249.860,10	$ 8.436,00	$ 258.296,10				$ 258.296,10	$ 146.526.517,87	
		39.388	31/07/2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS												$ -	$ 146.565.906,02	

Firma:
Nombre: **DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS**
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma:
Nombre: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: **ROBINSON ALMARIO PENAGOS**
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 193901-T

Firma:
Nombre: **JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ**
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.12.3.

8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#33760

ANEXO 8.13.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

ANEXO 8.13.1.

Seguimiento programa de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379-2023

HERNÁN SANCHEZ HUERTAS
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 15 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	$ 0,00																**$ 0,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 179.200,00	$ 59.733,33	$ 59.733,33	$ 59.733,33													**$ 179.200,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 95.094,00				$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40			**$ 95.094,00**
320.3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 25.052.077,00			$ 5.010.415,40	$ 5.010.415,40	$ 5.010.415,40	$ 5.010.415,40	$ 5.010.415,40									**$ 25.052.077,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 79.685.538,00					$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67			**$ 79.685.538,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 19.837.643,00					$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56			**$ 19.837.643,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 24.523.302,00			$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20				**$ 24.523.302,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.481.186,00													$ 1.792.474,40	$ 1.792.474,40	$ 896.237,20	**$ 4.481.186,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531,00		$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	**$ 44.147.531,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 198.001.571,00	**$ 59.733,33**	**$ 3.213.128,40**	**$ 10.675.874,00**	**$ 10.625.650,07**	**$ 21.683.781,29**	**$ 21.683.781,29**	**$ 21.683.781,29**	**$ 16.673.365,89**	**$ 16.673.365,89**	**$ 16.673.365,89**	**$ 16.673.365,89**	**$ 16.673.365,89**	**$ 16.013.510,09**	**$ 4.945.869,47**	**$ 4.049.632,27**	**$ 198.001.571,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,030%	1,623%	5,392%	5,366%	10,951%	10,951%	10,951%	8,421%	8,421%	8,421%	8,421%	8,421%	8,088%	2,498%	2,045%	100,000%
	ACUMULADO	0,030%	1,653%	7,045%	12,411%	23,362%	34,313%	45,264%	53,685%	62,106%	70,527%	78,948%	87,369%	95,457%	97,955%	100,00%	

EJECUTADO	**SEMANAL**	0,000%	1,593%	1,593%	1,593%	1,593%	14,384%											
	ACUMULADO	0,000%	1,593%	3,185%	4,778%	6,370%	20,754%											

ANEXO 8.13.2.

Seguimiento programa de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441-2023

DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 15 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	$ 0,00																**$ 0,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 278.204,00	$ 92.734,67	$ 92.734,67	$ 92.734,67													**$ 278.204,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 106.440,00				$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00			**$ 106.440,00**
320.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 21.422.151,00			$ 4.284.430,20	$ 4.284.430,20	$ 4.284.430,20	$ 4.284.430,20	$ 4.284.430,20									**$ 21.422.151,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 81.738.617,00					$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56			**$ 81.738.617,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 20.714.774,00					$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56			**$ 20.714.774,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 25.112.668,00			$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80				**$ 25.112.668,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.481.186,00													$ 1.792.474,40	$ 1.792.474,40	$ 896.237,20	**$ 4.481.186,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531,00		$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	**$ 44.147.531,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 198.001.571,00	**$ 92.734,67**	**$ 3.246.129,74**	**$ 10.041.826,74**	**$ 9.959.736,07**	**$ 21.343.446,18**	**$ 21.343.446,18**	**$ 21.343.446,18**	**$ 17.059.015,98**	**$ 17.059.015,98**	**$ 17.059.015,98**	**$ 17.059.015,98**	**$ 17.059.015,98**	**$ 16.340.223,58**	**$ 4.945.869,47**	**$ 4.049.632,27**	**$ 198.001.571,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,047%	1,639%	5,072%	5,030%	10,779%	10,779%	10,779%	8,616%	8,616%	8,616%	8,616%	8,616%	8,253%	2,498%	2,045%	100,000%
	ACUMULADO	0,047%	1,686%	6,758%	11,788%	22,567%	33,346%	44,125%	52,741%	61,357%	69,973%	78,589%	87,205%	95,458%	97,956%	100,00%	

EJECUTADO	**SEMANAL**	0,141%	1,593%	1,593%	1,593%	1,593%	12,466%											
	ACUMULADO	0,141%	1,733%	3,326%	4,918%	6,511%	18,977%											

ANEXO 8.13.3.

Seguimiento programa de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760-2023

GEAN CARLOS TAPIERO MONGE
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 15 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	$ 0,00																**$ 0,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 202.690,00	$ 67.563,33	$ 67.563,33	$ 67.563,33													**$ 202.690,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 89.865,00				$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50			**$ 89.865,00**
320.3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 25.038.882,00			$ 5.007.776,40	$ 5.007.776,40	$ 5.007.776,40	$ 5.007.776,40	$ 5.007.776,40									**$ 25.038.882,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 80.323.942,00					$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44			**$ 80.323.942,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 20.381.837,00					$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56			**$ 20.381.837,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 24.942.848,00			$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80				**$ 24.942.848,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.529.402,00													$ 1.811.760,80	$ 1.811.760,80	$ 905.880,40	**$ 4.529.402,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.153.960,00		$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	**$ 44.153.960,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 199.663.426,00	**$ 67.563,33**	**$ 3.221.417,62**	**$ 10.723.478,82**	**$ 10.664.901,99**	**$ 21.854.432,99**	**$ 21.854.432,99**	**$ 21.854.432,99**	**$ 16.846.656,59**	**$ 16.846.656,59**	**$ 16.846.656,59**	**$ 16.846.656,59**	**$ 16.846.656,59**	**$ 16.164.132,59**	**$ 4.965.615,09**	**$ 4.059.734,69**	**$ 199.663.426,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**		0,034%	1,613%	5,371%	5,341%	10,946%	10,946%	10,946%	8,438%	8,438%	8,438%	8,438%	8,438%	8,096%	2,487%	2,033%	100,000%
	ACUMULADO		0,034%	1,647%	7,018%	12,359%	23,305%	34,251%	45,197%	53,635%	62,073%	70,511%	78,949%	87,387%	95,483%	97,970%	100,00%	

EJECUTADO	**SEMANAL**		0,000%	1,580%	1,580%	1,580%	1,580%	1,580%										
	ACUMULADO		0,000%	1,580%	3,159%	4,739%	6,318%	7,898%										

ANEXO 8.14.

8.14. ACTAS DE REUNIÓN DE OBRA

ANEXO 8.14.1.

Actas de reunión de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 29 (Día) / 7 (Mes) / 2024 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE CONVENIO SOLIDARIO No.: 3379 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
HERNÁN SANCHEZ HUERTAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA	VEREDA LA ESMERALDA
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	RESIDENTE DE OBRA	VEREDA LA ESMERALDA
ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
CESAR AUGUSTO GALINDEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
MAYRA KATHERINE BERMÚDEZ PEÑA	PROFESIONAL SOCIAL	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGRID YULIETH MEJÍA PEÑA	PROFESIONAL PSICÓLOGA	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
ADRIANA MONTOYA GONZALEZ	PROFESIONAL BIÓLOGA	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
ANGY JULIETH LARA	SUPERVISORA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITAR, RECORRER Y OBSERVAR POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA EL AVANCE DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA QUE TIENE COMO ALCANCE FÍSICO DE 98 METROS LINEALES.

VERIFICAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE ACTUALMENTE ESTÁN EN ACOPIO.

REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS TRABAJADORES.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

SE HARÁ RECORRIDO EN LA OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, INTERVENTORÍA, RESIDENTE DE OBRA, DIRECTIVOS Y MIEMBROS DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, DONDE SE DETALLARÁ TÉCNICAMENTE Y EL AVANCE GENERAL DE LA OBRA, VERIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA, COMO TAMBIEN EL CHEQUEO GENERAL DE LA UTILIZACION ADECUADA DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo la 1:05 pm del dia 29 de julio de 2024, el Ing. EIKIN RAMOS MOSQUERA en calidad de Director de Interventoria informa a la supervisora Ing. Angy LARA, comunidad y miembros directivos que ya se dieron inicios de trabajos de concreto de 3.000 psi para placa huella, se vienen adelantando el corte y figurado para huellas, cunetas, bordillos y vigas riostras. Manifestó tambien, que el personal de obra se encuentran con su respectiva dotacion y sus elementos de proteccion personal adecuado para cada trabajador. Por parte de la Ing. Angy realizo observaciones muy generales acerca de los materiales de obra que deben de estar encima de algo y no sobre el suelo que se puedan mojar en epocas de lluvias. Manifestó ademas que se cuenta con un personal de obra muy organizando para que permita entregarsen las obras antes de la fecha de terminacion. Se realizaron charlas o capacitaciones por parte de los profesionales siso, social y ambiental, donde básicamente fueron temas del cuidado, aplicacion y responsabilidad de cada uno de ellos, se mencionaron temas de las afiliaciones de cada uno los de los trabajadores, que una vez afiliado ante la junta, se daba

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inido en la obra. al siguiente dia.
El Ing. ELKIN, manifiesto ademas que la Obra continua en un proceso normal, que se cuentan con los materiales necesarios en la obra como cemento, acero de refuerzo de 60000 PSI, sub-base para reposicion, Arena Grava, Gomaleta, etc. Pero que las lluvias han venido afectando el normal proceso de construccion de las placas huellas, debido a que las lluvias generan arrastre del material y se debe de restaurar manualmente y posteriormente compactarse. con rana.

Por otro lado y para finalizar, se recomendó al Ing. residente de obra que se dieran unos terminados al concreto muy eficiente, para que esta informacion fuese transmitida al maestro de obra.

El Ing. ELKIN RAMOS, siendo las 3:17 pm da por Finalizada la reunion con las partes.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Hernan Sanchez Huertas	Hernan S H
Angy Milet Lara M.	Angy Lara.
Carlos Zamorano	
Ingrid Wiliteth Mesa Peña	
Adriana Montoya Gonzalez	
Mayra Katherine Bermudez Parra	
Elkin D. Rojas	
Cesar Augusto Galindez Garcia	Cesar Galindez

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

ANEXO 8.14.2.

Actas de reunión de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 29 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE CONVENIO SOLIDARIO No.: 3441 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS	PRESIDENTE DE LA JUNTA	VEREDA BAJO PLATANILLO
JESÚS ALBERTO DUSSÁN	RESIDENTE DE OBRA	VEREDA BAJO PLATANILLO
ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
CESAR AUGUSTO GALINDEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
MAYRA KATHERINE BERMÚDEZ PEÑA	PROFESIONAL SOCIAL	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGRID YULIETH MEJÍA PEÑA	PROFESIONAL PSICÓLOGA	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
ADRIANA MONTOYA GONZALEZ	PROFESIONAL BIÓLOGA	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
ANGY JULIETH LARA	SUPERVISORA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITAR, RECORRER Y OBSERVAR POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA EL AVANCE DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA QUE TIENE COMO ALCANCE FÍSICO DE 109 METROS LINEALES.

VERIFICAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE ACTUALMENTE ESTÁN EN ACOPIO.

REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS TRABAJADORES.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

SE HARÁ RECORRIDO EN LA OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, INTERVENTORÍA, RESIDENTE DE OBRA, DIRECTIVOS Y MIEMBROS DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, DONDE SE DETALLARÁ TÉCNICAMENTE Y EL AVANCE GENERAL DE LA OBRA, VERIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA, COMO TAMBIEN EL CHEQUEO GENERAL DE LA UTILIZACIÓN ADECUADA DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:58 am del dia 29 de Julio de 2024, el Ing. Elkin David Ramos en calidad de Director de Interventoria da inicio a esta reunion en en el sitio de obra de la vereda de Bajo platanillo, donde presenta a cada unos de los Integrantes presente como lo es la Ing. Angy Julieth Lara en calidad de supervisora, los profesionales en el área ambiental, social y SISO, Ing. residente de obra e Interventoria y directivos de la vereda la junta Bajo platanillo y demás miembros que la conforman. unos de los miembros de la junta manifiesta el inconformismo del diámetro del acero que se esta utilizando para la placa huella. El Ing. Elkin toma la palabra una vez, donde explica que diámetro de la barra de acero de refuerzo es acorde a lo estipulado en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" definido por la entidad del Instituto Nacional de VIAS - INVIAS, y que de acuerdo a la cartilla se están respetando los diámetros, espaciados y cortes de los aceros de refuerzo para la placa huella.
Por parte, de la profesional SISO, dirige unas re-

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

comendaciones a la comunidad, miembros y trabajadores acerca del buen uso de los elementos de proteceion personal, entre otras aentividades.

La Ing. Angy Lara manifiesta que las obras que ya tienen orden de inicio por nada se debe de parar la obra al menos que lo indique el Interventor de obra. Ningun miembro de la junta de aceion comunal puede parar la obra ante el Ing. Residente de obra o algunos de los trabajadores. Solicitó ademas, a la interventoria que explicara brevemente los planos estructurales de la CARTILLA DE OBRAS MENORES del INVIAS al miembro o en general cuales son los diámetros establecidos para esta placa huella que está en proceso de construccion.

Toma la palabra el Ing. Cesar Golindez en calidad de residente de Interventoria donde explica a la comunida beneficiaria del proyecto que los planos estructurales estan acorde a lo estipulado en INVIAS y se explica cuales son los diámetros de aceros a utilizar, corte de flejes, cantidad de barras longitudinales de la huella, cuneta y bordillo.

No siendo más, El Ing. ElKW al ver que no hay mas dudas y que son superadas, da por terminado (el ac) la reunión siendo las 9:40 am.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Dubelly Toledo collazos	
ARMANDO ERAZO	ARMANDO
Jesus A. Dussan - Residente Obra.	
Miller Martinez	
Albert Narvaez	Albert.
Carlos Andres Ortiz P	
Yacyra Katherine Bermudez Parra	
Ingrid Yuleth Mejia Pena	
Angy Lora	Angy Lora.
Cesar Augusto Galindez Garcia	Cesar Galindez
Elkin D. Ramos M.	
Adriana J. Montoya Gonzalez	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

ANEXO 8.14.3.

Actas de reunión de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

ANEXO 8.15.

EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO:** 5

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	**DESCRIPCIÓN**	**DÍAS DEL MES**																														
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
CAMIIONETA	MITSUBISHI DOBLE CABINA CON PLACA DE MATRICULA (**HQX980**)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
MOTOCICLETA	HONDA CON CILINDRAJE 150 Cc CON PLACA DE MATRICULA (**RGK09F**)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO:** 5

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).


(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.



Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU



Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NARIÑO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.16.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO SOLIDARIO No: 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

CONVENIO SOLIDARIO No: 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

CONVENIO SOLIDARIO No: 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

NOMBRE ARL: POSITIVA ARL **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	7.692.245	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 4.060.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOQUERA	$4.060.000,00	$ 282.600,00	V	SANITAS	30533418	$ 507.500,00	COLPENSIONES	30533418	$ 649.600,00	$ -	$ -	$ -	
2	CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA	1.110.521.985	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOQUERA	$1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SANITAS	30566714	$ 52.000,00	PORVENIR	30566714	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
3	INGRID YULIETH MEJIA PEÑA	1.117.505.206	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOQUERA	$1.213.334,00	$ 84.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30566714	$ 48.600,00	PORVENIR	30566714	$ 194.200,00	$ 48.600,00	$ -	$ -	
4	ADRIANA JULIETH MONTOYA GONZALEZ	1.118.027.920	BIÓLOGA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOQUERA	$1.213.334,00	$ 84.500,00	V	ESSC ASMET SALUD	30566714	$ 48.600,00	COLPENSIONES	30566714	$ 194.200,00	$ 48.600,00	$ -	$ -	
5	MAYRA KATHERINE BERMUDEZ PARRA	1.117.492.838	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOQUERA	$1.213.334,00	$ 84.500,00	V	SANITAS	30566714	$ 48.600,00	PORVENIR	30566714	$ 194.200,00	$ 48.600,00	$ -	$ -	
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 9.260.000,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 3 DE AGOSTO 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma

Nombre: José Ricardo Burbano Barcenas

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NARIÑO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30533418
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-07-31

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7692245	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	FLORENCIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	ELKINRAMOS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3114755282
FAX	0	SUCURSAL	03	NOMBRE SUCURSAL	03
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		30533418

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7692245	57	No	No	No	18	1	0	Salario	RAMOS MOSQUERA ELKIN DAVID	$4.060.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7692245																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7692245	COLPENSIONES	30	$4.060.000	0.1600000	$649.600	$0	$0	$649.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7692245	SANITAS	30	$4.060.000	0.1250000	$507.500	$0	0	$0	0	$0	30	$4.060.000	7692245	0.0696000	$282.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7692245	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$649.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$649.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$507.500	$0	0	$0	0	$0	$507.500	0	$0	$0	$507.500	$0	0	$0	$0	$507.500	$0	$0	$507.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$282.600	0	$0	$0	$282.600	0	$0	$282.600	0	$0	$0	$282.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$507.500
PENSIONES	1	$649.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$282.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.439.700

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30566714
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-07-31

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7692245	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 3 B BIS NO 12 18	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	FLORENCIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	ELKINRAMOS@GMAIL.COM	TELÉFONO	0984359385
FAX	984359385	SUCURSAL	014	NOMBRE SUCURSAL	admon
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7692245	PRIMER APELLIDO	RAMOS	SEGUNDO APELLIDO	MOSQUERA
PRIMER NOMBRE	ELKIN	SEGUNDO NOMBRE	DAVID		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$7.540.002		30566714

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1117492838	01	No	No	No	18	1	5711001	Fijo	BERMUDEZ PARRA MAYRA KATHERINE	$1.300.000
CC-1110521985	01	No	No	No	18	1	5439001	Fijo	GALINDEZ GARCIA CESAR AUGUSTO	$1.300.000
CC-1006524418	01	No	No	No	18	1	1711001	Fijo	GALLEGO CALDERON DIEGO FERNANDO	$1.300.000
CC-1117505206	01	No	No	No	18	1	5711001	Fijo	MEJIA PEÑA INGRID YULIETH	$1.300.000
CC-1118027920	01	No	No	No	18	1	5711001	Fijo	MONTOYA GONZALEZ ADRIANA JULIETH	$1.300.000
CC-1106713403	01	No	No	No	18	1	1711001	Fijo	MORALES CORTES DIEGO ALEJANDRO	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1117492838	X	2024-07-03																											0		
CC - 1110521985																													0		
CC - 1006524418																													0		
CC - 1117505206	X	2024-07-03																											0		
CC - 1118027920	X	2024-07-03																											0		
CC - 1106713403																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1117492838	PORVENIR	28	$1.213.334	0.1600000	$194.200	$0	$0	$194.200	$0	$0	$0
CC - 1110521985	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1006524418	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1117505206	PORVENIR	28	$1.213.334	0.1600000	$194.200	$0	$0	$194.200	$0	$0	$0
CC - 1118027920	COLPENSIONES	28	$1.213.334	0.1600000	$194.200	$0	$0	$194.200	$0	$0	$0
CC - 1106713403	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1117492838	SANITAS	28	$1.213.334	0.0400000	$48.600	$0	0	$0	0	$0	28	$1.213.334	14	0.0696000	$84.500
CC - 1110521985	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	14	0.0696000	$90.500
CC - 1006524418	ESSC ASMET SALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	14	0.0696000	$90.500
CC - 1117505206	NUEVA E.P.S. S.A.	28	$1.213.334	0.0400000	$48.600	$0	0	$0	0	$0	28	$1.213.334	14	0.0696000	$84.500
CC - 1118027920	ESSC ASMET SALUD	28	$1.213.334	0.0400000	$48.600	$0	0	$0	0	$0	28	$1.213.334	14	0.0696000	$84.500
CC - 1106713403	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	14	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1117492838	COMFACA	28	$1.213.334	0.0400000	$48.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110521985	COMFACA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006524418	COMFACA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117505206	COMFACA	28	$1.213.334	0.0400000	$48.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1118027920	COMFACA	28	$1.213.334	0.0400000	$48.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1106713403	COMFACA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000
PORVENIR	4	$804.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$804.400

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$194.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$194.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	2	$100.600	$0	0	$0	0	$0	$100.600	0	$0	$0	$100.600	$0	0	$0	$0	$100.600	$0	$0	$100.600
SANITAS	2	$100.600	$0	0	$0	0	$0	$100.600	0	$0	$0	$100.600	$0	0	$0	$0	$100.600	$0	$0	$100.600
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$100.600	$0	0	$0	0	$0	$100.600	0	$0	$0	$100.600	$0	0	$0	$0	$100.600	$0	$0	$100.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	6	$525.000	0	$0	$0	$525.000	0	$0	$525.000	0	$0	$0	$525.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACA	6	$301.800	0	$0	$301.800
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$301.800
PENSIONES	3	$1.206.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$525.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$301.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.335.200

ANEXO 8.17.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MES INFORME MENSUAL: 5 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO # 3441 DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO # 3379 DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO # 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO – MUNICIPIO DE MILAN, CAQUETA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA ESMERALDA – MUNICIPIO DE MONTAÑITA, CAQUETA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO - MUNICIPIO DE MONTAÑITA, CAQUETA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1235223	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 107.999.997	$ 107.999.997
TOTAL						$ 107.999.997	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 107.999.997**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
TOTALES												

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)	$ 90.756.300		$ 90.756.300
IVA = 19% * (C) = (D)		$ 17.243.697	$ 17.243.697
VALOR TOTAL	$ 90.756.300	$ 17.243.697	$ 107.999.997

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.18.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 10-nov-23

PLAZO INICIAL: HASTA 31/DIC/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30-sep-24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 107.999.997,00

VALOR ACUMULADO: $ 107.999.997,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.800.000	26/10/2023	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.600.000	26/10/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	30%	$ 32.400.000	26/10/2023	31/12/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100009288

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10-nov-23

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.800.000	26/10/2023	30/09/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.600.000	26/10/2023	31/03/2027
Calidad del servicio	30%	$ 32.400.000	26/10/2023	31/03/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100009288

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/08/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.800.000	26/10/2023	30/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.600.000	26/10/2023	30/04/2027
Calidad del servicio	30%	$ 32.400.000	26/10/2023	30/04/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100009288

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.800.000	26/10/2023	31/12/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.600.000	26/10/2023	30/06/2027
Calidad del servicio	30%	$ 32.400.000	26/10/2023	30/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100009288

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 4-may-24

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.19.

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☐ **No.** 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 3230 DE 15/09/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO # 3441 DE 2023, CONVENIO SOLIDARIO # 3379 DE 2023, CONVENIO SOLIDARIO # 3760 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO – MUNICIPIO DE MILAN, CAQUETA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA ESMERALDA – MUNICIPIO DE MONTAÑITA, CAQUETA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO - MUNICIPIO DE MONTAÑITA, CAQUETA

PLAZO INICIAL: HASTA 31/DIC/2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/11/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 31/03/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 107.999.997,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 107.999.997,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha		AÑO 2024				AÑO 2024														TOTAL	
											MES		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT		MES		MES		MES			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		Director de Interventoría	5.000.000,00		0,50	2.500.000,00			1,32	$ 6.600.000			0,11	$ 550.000	0,11	$ 550.000	0,11	$ 550.000	0,33	$ 1.650.000	0,33	$ 1.650.000	0,33	$ 1.650.000							1,32	$ 6.600.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	4.000.000,00		4,00	16.000.000,00			4,00	$ 16.000.000			0,33	$ 1.333.333	0,33	$ 1.333.333	0,33	$ 1.333.333	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000							4,00	$ 16.000.000,00
		Profesional ambiental	2.800.000,00		0,40	1.120.000,00			1,32	$ 3.696.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000							1,32	$ 3.696.000,00
		Profesional social	2.800.000,00		0,40	1.120.000,00			1,32	$ 3.696.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000							1,32	$ 3.696.000,00
		Profesional SST	2.800.000,00		-	-			1,32	$ 3.696.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000							1,32	$ 3.696.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	3.000.000,00			3.000.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		Especialista en Estructuras	5.500.000,00																													
		Especialista en Vía y/o Pavimentos	5.500.000,00																													
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	5.500.000,00																													
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	5.500.000,00																													
		Especialista en diseño Geométrico	5.500.000,00																													
		Inspector	1.300.000,00		6,00	7.800.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		Inspector SST	1.300.000,00		0,50	650.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -								$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						32.190.000,00				$ 33.688.000				$ 1.883.333		$ 1.883.333		$ 1.883.333		$ 9.346.000		$ 9.346.000		$ 9.346.000								$ 33.688.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36				2,36				2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36								2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						75.968.400,00				$ 79.503.680				$ 4.444.667		$ 4.444.667		$ 4.444.667		$ 22.056.560		$ 22.056.560		$ 22.056.560								$ 79.503.680,00

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2024				AÑO														TOTAL	
											MES		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT		MES		MES		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIÁTICOS																												
		Viáticos Director y/o Especialistas	140.000,00	Día	4,00	560.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	550.000,00	Mes	12,00	6.600.000,00			12,00	$ 6.600.000			0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.650.000	3,00	$ 1.650.000	3,00	$ 1.650.000	3,00	$ 1.650.000							12,00	$ 6.600.000,00
		Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	2.800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	5.600.000,00			1,10	$ 3.067.820			0,00	$ -	0,00	$ -	0,27	$ 766.955	0,27	$ 766.955	0,27	$ 766.955	0,27	$ 766.955							1,10	$ 3.067.819,83
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	300.000,00	Según comprobante por mes	3,00	900.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		OTROS COSTOS								$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	176.200,00	Según comprobante por mes	2,00	352.400,00			4,00	$ 704.800			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 176.200	1,00	$ 176.200	1,00	$ 176.200	1,00	$ 176.200							4,00	$ 704.800,00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	80.000,00	Según comprobante por mes	3,00	240.000,00			4,00	$ 320.000			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 80.000	1,00	$ 80.000	1,00	$ 80.000	1,00	$ 80.000							4,00	$ 320.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	140.000,00	Según comprobante por mes	3,00	420.000,00			4,00	$ 560.000			0,33	$ 46.667	0,33	$ 46.667	0,33	$ 46.667	1,00	$ 140.000	1,00	$ 140.000	1,00	$ 140.000							4,00	$ 560.000,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	38.500,00	Según comprobante	3,00	115.500,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																												
*		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				14.787.900,00				$ 11.252.620				$ 46.667		$ 46.667		$ 2.719.822		$ 2.813.155		$ 2.813.155		$ 2.813.155								$ 11.252.619,83
*		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)				90.756.300,00				90.756.299,83				$ 4.491.334		$ 4.491.334		$ 7.164.489		$ 24.869.715		$ 24.869.715		$ 24.869.715								$ 90.756.299,83
*		IVA = 19% * (C) = (D)				17.243.697,00				$ 17.243.697				$ 853.353		$ 853.353		$ 1.361.253		$ 4.725.246		$ 4.725.246		$ 4.725.246								$ 17.243.697,00
*		COSTO TOTAL = (C) + (D)				107.999.997,00				$ 107.999.997				$ 5.344.687		$ 5.344.687		$ 8.525.742		$ 29.594.961		$ 29.594.961		$ 29.594.961								$ 107.999.996,83

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

- El profesional ambiental de la Interventoría deberá realizar seguimiento y control al Plan de Gestión Ambiental (complejidad baja) elaborado y presentar informes durante la ejecución del proyecto.
- El profesional social de la Interventoría deberá acompañar y/o asesorar a las OAC en la elaboración del Plan de Gestión Social, que es responsabilidad de la OAC, ya que en los presupuestos de los convenios suscritos con las OAC no existe rubro que cubra esos gastos.
- El profesional social de la Interventoría deberá realizar seguimiento al Plan de Gestión Social y presentar informes durante la ejecución del proyecto.
- La Interventoría debe vincular un profesional en SST, que deberá acompañar y/o asesorar a las OAC en la elaboración del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, que es responsabilidad de la OAC, ya que en los presupuestos de los convenios suscritos con las OAC no existe rubro que cubra esos gastos.

En la oferta económica de la Interventoría existe un Inspector SST el cual no posee la idoneidad para responsabilizarse del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

- El profesional en SST que vincule de la Interventoría deberá realizar seguimiento al Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y presentar informes durante la ejecución del proyecto.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada período, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes períodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
