CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 - 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 06
PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO 2024 AL 31 DE AGOSTO 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SUPERVISOR:

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS SOLIDARIOS:



3379 DE 2023 – OAC LA ESMERALDA
3441 DE 2023 – OAC BAJO PLATANILLO
3760 DE 2023 – OAC BUENOS AIRES BAJOS

PERIODO:

DEL 01 DE AGOSTO 2024 AL 31 DE AGOSTO 2024

FLORENCIA – CAQUETÁ

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN INFORME TÉCNICO

Tipo de Documento: INFORME TÉCNICO	Contrato: ACEPTACIÓN DE OFERTA 4136 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
Titulo: INFORME MENSUAL No 6. AGOSTO/2024		
Emitido para: Aprobación		
ELABORÓ: Ing. Residente	Firma:	
	Nombre:	Ing. Cesar Augusto Galindez García C. C. No. 1.110.521.985 de IBAGUÉ M P No. 70202 393111 TLM
REVISÓ: Ing. Director	Firma:	
	Nombre:	Ing. Elkin David Ramos Mosquera C. C. No. 7.692.245 de NEIVA M P No. 19202 61820 CAU
APROBÓ: Supervisor	Firma:	
	Nombre:	José Ricardo Burbano Barcenas

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

(**VER A CONTINUACIÓN FORMATO:** *MEPI-MN1-IN-15-FR-1*)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenios Solidarios No.: 3379 DE 2023
3441 DE 2023
3760 DE 2023

Contratista 1: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA
Contratista 2: JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO
Contratista 3: JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

Contrato de Interventoría No. 4136 DE 2023

Interventor: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Objeto Contrato de Interventoría:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILÁN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 6

MES O PERIODO: AGOSTO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	4
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	7
	CONTENIDO		14
1	**INTRODUCCIÓN**		20
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		23
2.1	Localización		23
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		30
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		30
2.4	Características técnicas del proyecto		32
3	**INFORMACIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS**		37
3.1	Información general de convenios solidarios		37
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		49
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		61
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		61
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS**		64
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	64
4.2	Maquinaria y Equipo de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	65
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	65
4.4	Informe Financiero y Presupuestal de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	66
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	66
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	66
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros de los convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	67
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad de convenios solidarios	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	67
4.9	Otros documentos de seguimientos mensual		68
	• Seguimiento a la inversión del desembolso		68
	• Seguimiento programa de obra		68
4.10	• Actas de comité de obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	71
4.11	• Actas de reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	71
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		72
5.1	Información general del contrato		72
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		76
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		77
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	77
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	77
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	77
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	77
6.5	Otros documentos seguimiento mensual		77
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	77
7	**Conclusiones y recomendaciones**		78
8	**Anexos**		79
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		79
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		79
8.3	Copia de la bitácora de obra del mes correspondiente del convenio solidario		79
8.4	Informes semanales		79
8.5	Maquinaria y Equipo de convenios solidarios		79
8.6	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social de convenios solidarios		80
8.7	Informe Financiero y presupuestal de convenios solidarios		80
8.8	Estado general del tiempo		80

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenios Solidarios No.: 3379 DE 2023
3441 DE 2023
3760 DE 2023

Contratista 1: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA
Contratista 2: JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO
Contratista 3: JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

Contrato de Interventoría No. 4136 DE 2023

Interventor: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Objeto Contrato de Interventoría:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILÁN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 6

MES O PERIODO: AGOSTO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
8.9	Resumen ensayos de laboratorio		80
8.10	Seguimiento garantías y seguros de los convenios solidarios		80
8.11	Plan de inversión de desembolso de los convenios solidarios		81
8.12	Informe de inversión y buen manejo de desembolso de los convenios solidarios		81
8.13	Seguimiento programa de obra		81
8.14	Actas de comité de obra		81
8.15	Equipo y vehículos contrato de interventoría		81
8.16	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social contrato de interventoría		81
8.17	Informe Financiero y presupuestal de contrato de interventoría		81
8.18	Seguimiento garantías y seguros de los contrato de interventoría		81
8.19	Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado		82

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 3230 de fecha 15/09/2023.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

(**VER A CONTINUACIÓN FORMATO:** *MEPI-MN1-IN-15-FR-2*)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PERIODO MES: 6

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3379 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.001.571,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.001.571,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	98
Estructuras (Obras de drenaje)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	105	105
Estructuras (Obras de drenaje)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149.372.854,00	-	$ 149.372.854,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	-	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531,00	-	$ 44.147.531,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.481.186,00	-	$ 4.481.186,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198.001.571,00	-	$ 198.001.571,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	-	-	-	-
AJUSTES	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	-	-	-	-
VALOR EJECUTADO	-	-	-	-

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 139.644.567,98
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 198.001.571,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	141,790%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 6

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3379 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.001.571,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.001.571,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general de placa huella terminada, abscisa k0+060



Vista general de placa huella terminada, abscisa k0+080

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 6

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3441 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.001.571,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.001.571,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	109
Estructuras (Obras de drenaje)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	76	76
Estructuras (Obras de drenaje)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149.372.854,00	-	$ 149.372.854,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	-	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531,00	-	$ 44.147.531,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.481.186,00	-	$ 4.481.186,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198.001.571,00	-	$ 198.001.571,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	-	-	-	-
AJUSTES	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	-	-	-	-
VALOR EJECUTADO	-	-	-	-

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 138.007.094,99
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 150.758.396,16
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	109,240%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PERIODO MES: 6

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3441 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.001.571,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.001.571,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general de avance de obra, abscisa k0+112



Vista general de avance de obra, abscisa k0+060

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 6

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3760 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.663.426,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.663.426,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	98
Estructuras (Obras de drenaje)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	0	0
Estructuras (Obras de drenaje)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.980.064,00	-	$ 150.980.064,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	-	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.153.960,00	-	$ 44.153.960,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.529.402,00	-	$ 4.529.402,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.663.426,00	-	$ 199.663.426,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	-	-	-	-
AJUSTES	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	-	-	-	-
VALOR EJECUTADO	-	-	-	-

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 140.782.681,67
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 73.052.854,30
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	51,891%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**3**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 6

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3760 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.663.426,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.663.426,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sub-base granular instalada sobre el tramo de intervención de 98 mL



Sub-base granular instalada sobre el tramo de intervención de 98 mL

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN **20**
ANTECEDENTES **22**
FINALIDAD DEL PROYECTO **22**
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO **23**
2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL **23**
2.1.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS **23**
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO **30**
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA **30**
A) CONVENIO SOLIDARIO No. 3379-2023 – LA ESMERALDA **30**
B) CONVENIO SOLIDARIO No. 3441-2023 – BAJO PLATANILLO **31**
C) CONVENIO SOLIDARIO No. 3760-2023 – BUENOS AIRES BAJO 32
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS **32**
3. INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS **37**
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS **37**
- **CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023** **37**
- **CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023** **41**
- **CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023** **45**

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES **49**
3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS **61**
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA **61**
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS **64**
4.1. INFORME SEMANAL **64**
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS **65**

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDAROS **65**

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS **66**

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO **66**

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO **66**

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **67**

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIOS SOLIDARIOS **67**

4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL **68**

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** **68**
- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA** **68**

4.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA **71**

4.11. ACTAS DE REUNIÓN **71**

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA **72**

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO **72**

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR **76**

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **77**

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA **77**

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **77**

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA **77**

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA **77**

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL **77**

- **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO** **77**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **78**

8. ANEXOS **79**

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO **79**

8.1.1. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **79**

8.1.2. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **79**

8.1.3. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **79**

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS ..**79**

8.2.1. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **79**

8.2.2. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **79**

8.2.3. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **79**

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO **79**

8.3.1. Copia de la bitácora de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **79**

8.3.2. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **79**

8.3.3. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **79**

8.4. INFORMES SEMANALES **79**

8.4.1. Informe semanal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **79**

8.4.2. Informe semanal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **79**

8.4.3. Informe semanal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 **79**

8.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS **79**

8.5.1. Maquinaria y equipo de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ...79

8.5.2. Maquinaria y equipo de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 .79

8.5.3. Maquinaria y equipo de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 79

8.6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS.....80

8.6.1. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 80

8.6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 80

8.6.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 80

8.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS 80

8.7.1. Informe financiero y presupuestal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 80

8.7.2. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441.....80

8.7.3. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379.....80

8.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.....80

8.8.1. Estado general del tiempo climático de la Vereda La Esmeralda – CS#3379.....80

8.8.2. Estado general del tiempo climático de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441.....80

8.8.3. Estado general del tiempo climático de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379.....80

8.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 80

8.9.1. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 80

8.9.2. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **80**

8.9.3. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **80**

8.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **80**

8.10.1. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **80**

8.10.2. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **80**

8.10.3. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **80**

8.11. PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **81**

8.11.1. Plan de inversión de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **81**

8.11.2. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **81**

8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **81**

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **81**

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **81**

8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **81**

8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **81**

8.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA **81**

8.13.1. Seguimiento programa de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **81**

8.13.2. Seguimiento programa de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **81**

8.13.3. Seguimiento programa de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **81**

8.14. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA **81**

8.14.1. Actas de comité de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **81**

8.14.2. Actas de comité de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **81**

8.14.3. Actas de comité de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **81**

8.15. EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA **81**

8.16. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **81**

8.17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **81**

8.18. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA **81**

8.19. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO **82**

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

En este informe se presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 06** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024** el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL""**, hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los siguientes convenios:

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor HERNÁN SANCHEZ HUERTAS de la JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS de la JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA

VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor GEAN CARLOS TAPIERO MONGE de la JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

ANTECEDENTES

La economía de los municipios de La Montañita y de Milán en el departamento del Caquetá, está basada principalmente por la agricultura y la ganadería de doble propósito (leche y carne), complementada con la piscicultura, la apicultura, la coca y aprovechamientos forestales.

Debido al aumento del número de fincas y de la densidad poblacional de las veredas de los municipios, las trochas son intervenidas con maquinaria pesada (motoniveladora) para mejorarlas y, así facilitar el transporte de los lugareños. Las vías adecuadas también son utilizadas para movilizar ganado, productos lácteos (leche y queso) y de agricultura (caña de azúcar, plátanos, etc.).

A los municipios de La Montañita y de Milán, se acede por la ruta troncal del llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por la empresa Coomotor por vía terrestre, además de su vecina, se accede por Villavicencio en el vecino departamento del Meta en el norte, Mitú (Vaupés) al este y Leticia (Amazonas) en el sur.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente, proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

El Departamento del Caquetá se localiza en el Sur-Oriente de Colombia, haciendo parte de la región Amazónica. Cuenta con una superficie 88.965 km2, lo que representa el 7.79% del territorio nacional y su capital es la ciudad de Florencia. El departamento está dividido políticamente en 16 municipios, dos de ellos son los municipios de La Montañita y Milán en donde se ejecutarán las obras viales tipo terciarias.

Para el caso del municipio de La Montañita se encuentra localizada al sur – oriente de Colombia, situado al Occidente del departamento de Caquetá, a una distancia de 32 km de Florencia, capital departamental. entre las coordenadas: Latitud: 1º 28’ 53” N y Longitud: 75° 26’ 23” W con respecto al meridiano de Greenwich. Altitud de la cabecera municipal: 237 metros sobre el nivel del mar. El territorio municipal comprende una extensión en superficie de 184.042.22 Hectáreas (1.840,42 Km2), perteneciendo casi todo al sector rural. De acuerdo con las proyecciones DANE 2019, la población para el Municipio de La Montañita presenta un total de 24.323, de los cuales 11.797 son mujeres, representando un 48,5% y 12.526 son hombres con un 51,4%.

Y en cuanto al municipio de Milán se encuentra ubicado en la región de la amazonia colombiana, con predominio de terrenos semi- ondulados y llanuras de inundación. La principal fuente hídrica es el rio Orteguaza con sus afluentes el rio Bodoquero y Pescado, las quebradas de Platanillo y Getuchá. El Municipio de Milán se localiza en las coordenadas 1°17’25” de latitud norte y 75°30’25” de longitud Oeste del meridiano de Greenwich en el parque principal. Se encuentra a una distancia de 80 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Florencia Capital del Departamento del Caquetá por vía terrestre y a 47 kilómetros por vía fluvial a través de río Orteguaza.

Por lo que en el municipio de Milán se ejecutará una obra en la Vereda de Bajo Platanillo y en el municipio de La Montañita se ejecutarán dos proyectos ubicados en las Veredas de La Esmeralda y en Buenos Aires Bajo.

2.1.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS

- *VEREDA LA ESMERALDA (CS # 3379 - 2023)*

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La montañita del departamento del Caquetá, en la Vereda La Esmeralda, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda La Esmeralda de la

inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La esmeralda – La montañita código: 181050, con coordenadas iniciales 1,21556 N; -75,12500 W, y punto final de coordenadas 1,21528 N; -75,12611 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Google Earth".

https://earth.google.com/web/data=MkEKPwo9CiExTjZhMmNXeUhocDVROEZma295cFJhekxsRGxxRW5nemsSFgoUMEYzRUFFODU2RTMxQjk0NTZBOEIgAQ

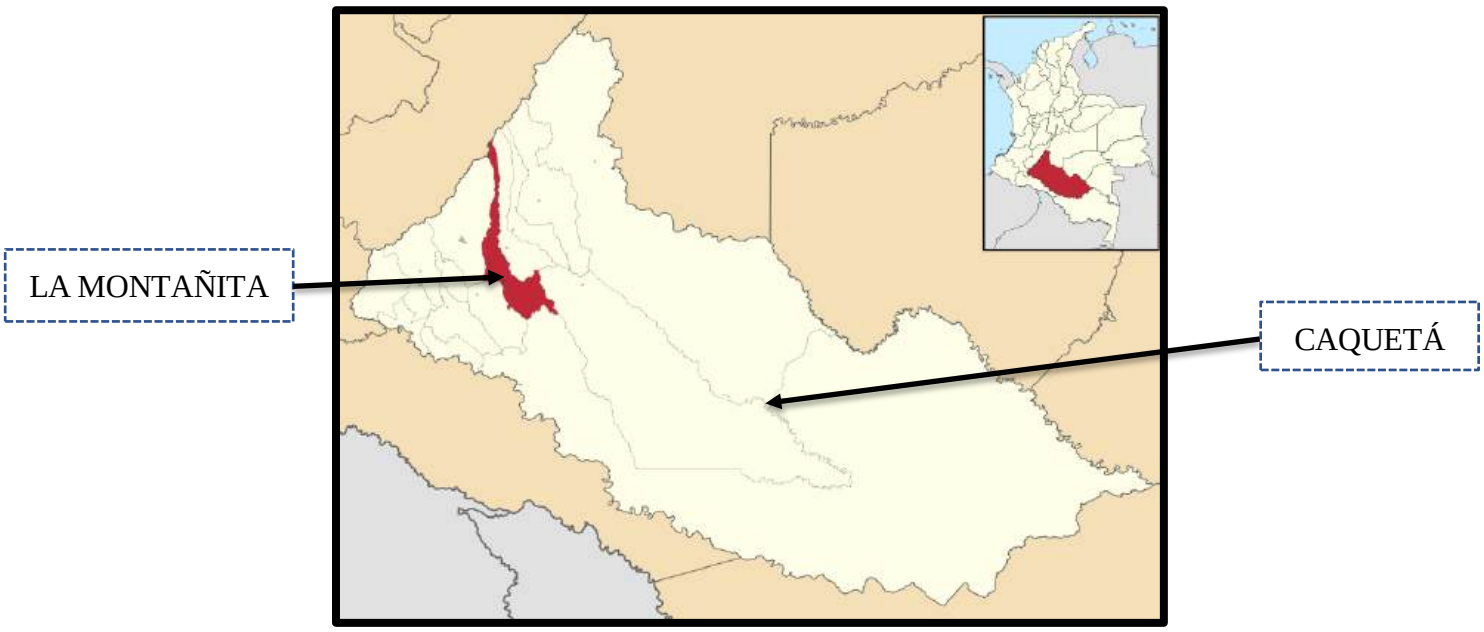


Ilustración 1. *Localización municipio de La Montañita en el departamento del Caquetá.*

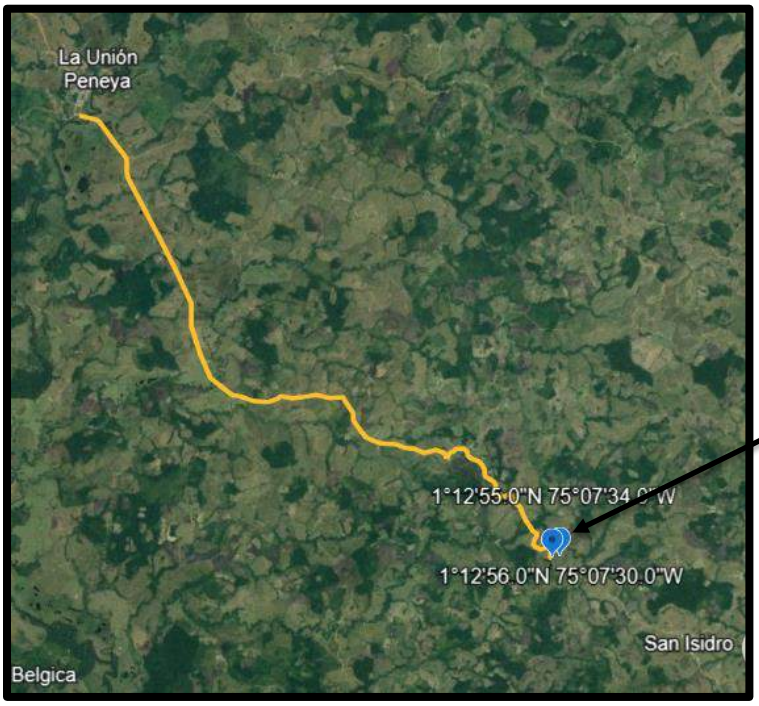


Ilustración 2. *Ubicación del proyecto en la Vereda La Esmeralda.*

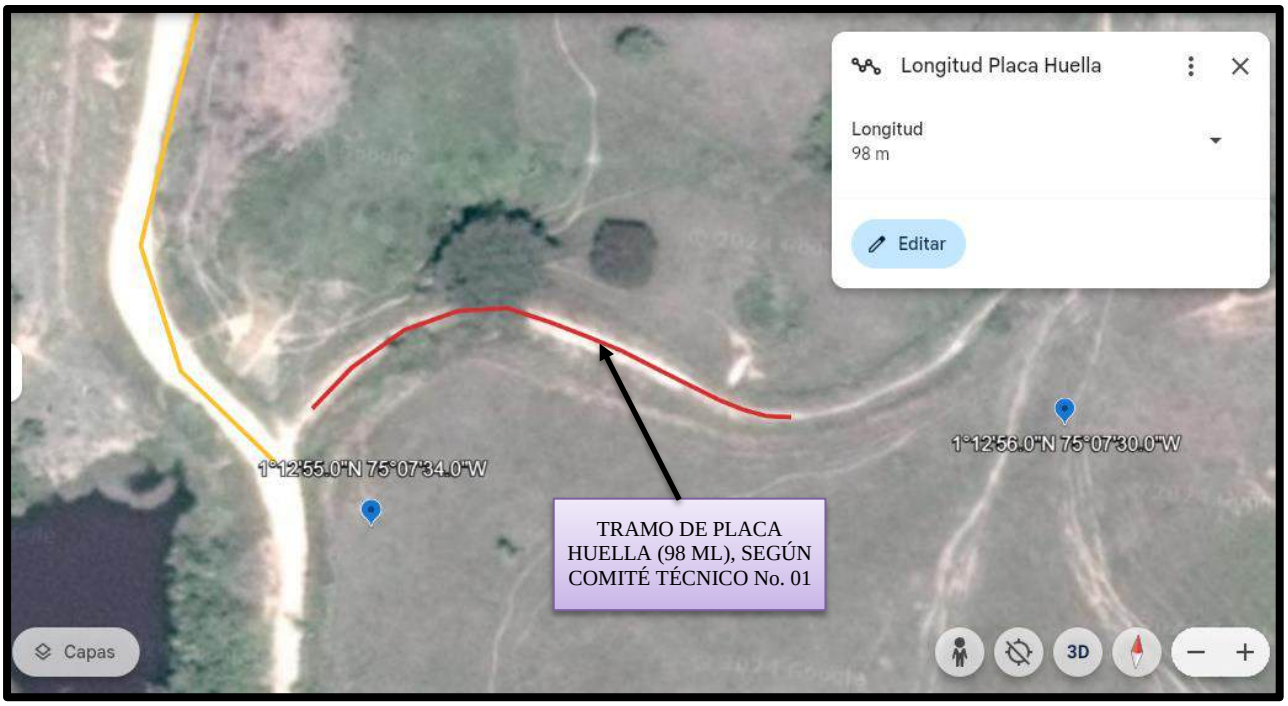


Ilustración 3. *Tramo de placa huella de intervención en la Vereda La Esmeralda.*

- *VEREDA BAJO PLATANILLO (CS # 3441 - 2023)*

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Milán del departamento del Caquetá, en la Vereda Bajo Platanillo, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Bajo Platanillo en Km 45+000 de la vía – Cruce la Sevilla hacia La Anguilla –Milán código: 185030, con coordenadas iniciales 1,28639 N; -75,46528 W, y punto final de coordenadas 1,28500 N; - 75,46472 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Google Earth" y "Bing Mapas".

https://earth.google.com/web/data=MkEKPwo9CiExRlNNMUo2QjgzS19nejgzY3MzbEhzV3FGMEdoNzQxUTESFgoUMDYyOTQ3REIyMTMxQjlEMzQ1QzEgAQ

https://www.bing.com/maps?osid=58d481cd-a819-470e-9c37-5b30c43051c3&cp=1.286942~-75.492878&lvl=14.531498&style=h&pi=0&v=2&sV=2&form=S00027

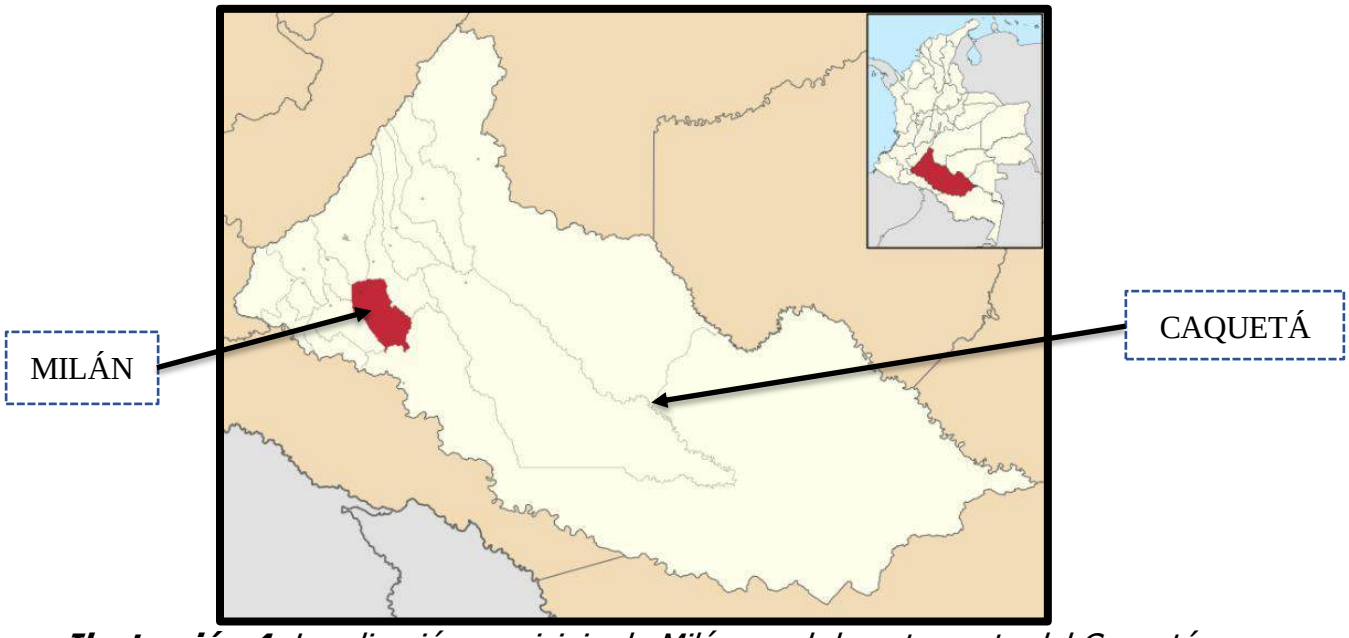


Ilustración 4. *Localización municipio de Milán en el departamento del Caquetá.*



Ilustración 5. *Ubicación del proyecto en la Vereda Bajo Platanillo.*

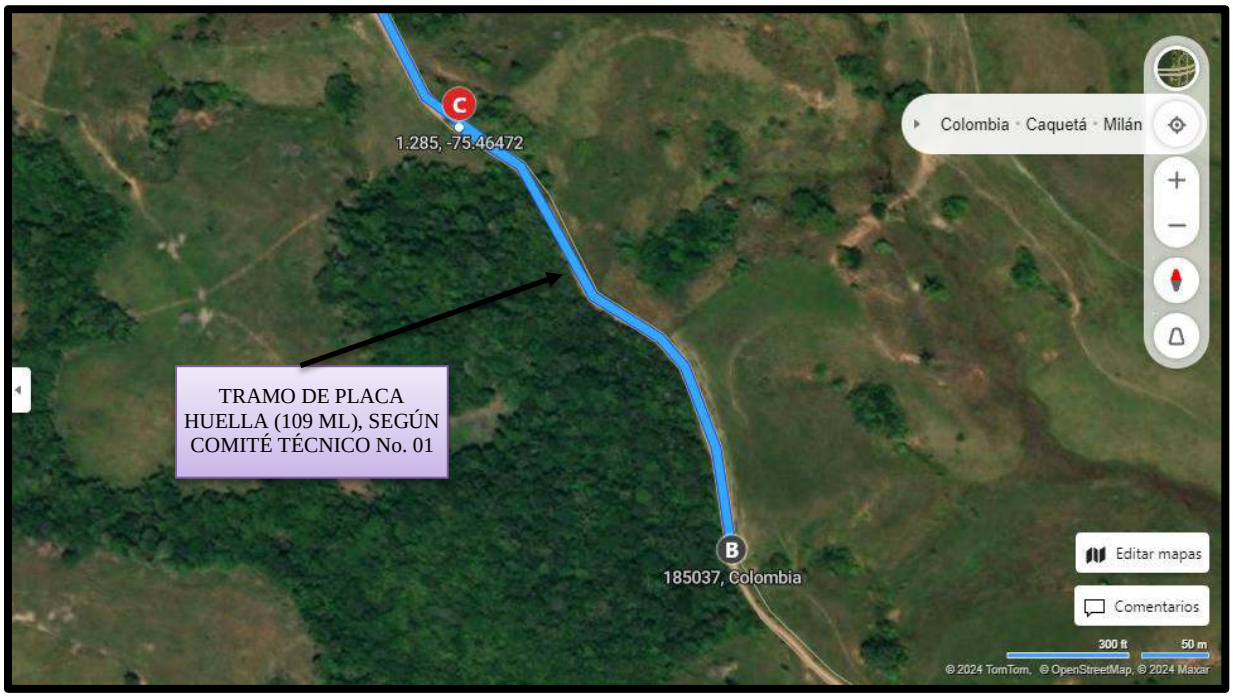


Ilustración 6. *Tramo de placa huella de intervención en la Vereda Bajo Platanillo.*

- *VEREDA BUENOS AIRES BAJO (CS # 3760 - 2023)*

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La montañita del departamento del Caquetá, en la Vereda Buenos aires bajos, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050, con coordenadas iniciales 1,32056 N; -75,13139 W, y punto final de coordenadas 1,32528 N; -75,12667 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Google Earth".

https://earth.google.com/web/data=MkEKPwo9CiExZ1hwR3ptTXh2VkxNZVFaaHdPUkNvX1FFbnJoenY5amkSFgoUMDE5MkNFQzkwRTMxQkE5QjYwRkYgAQ

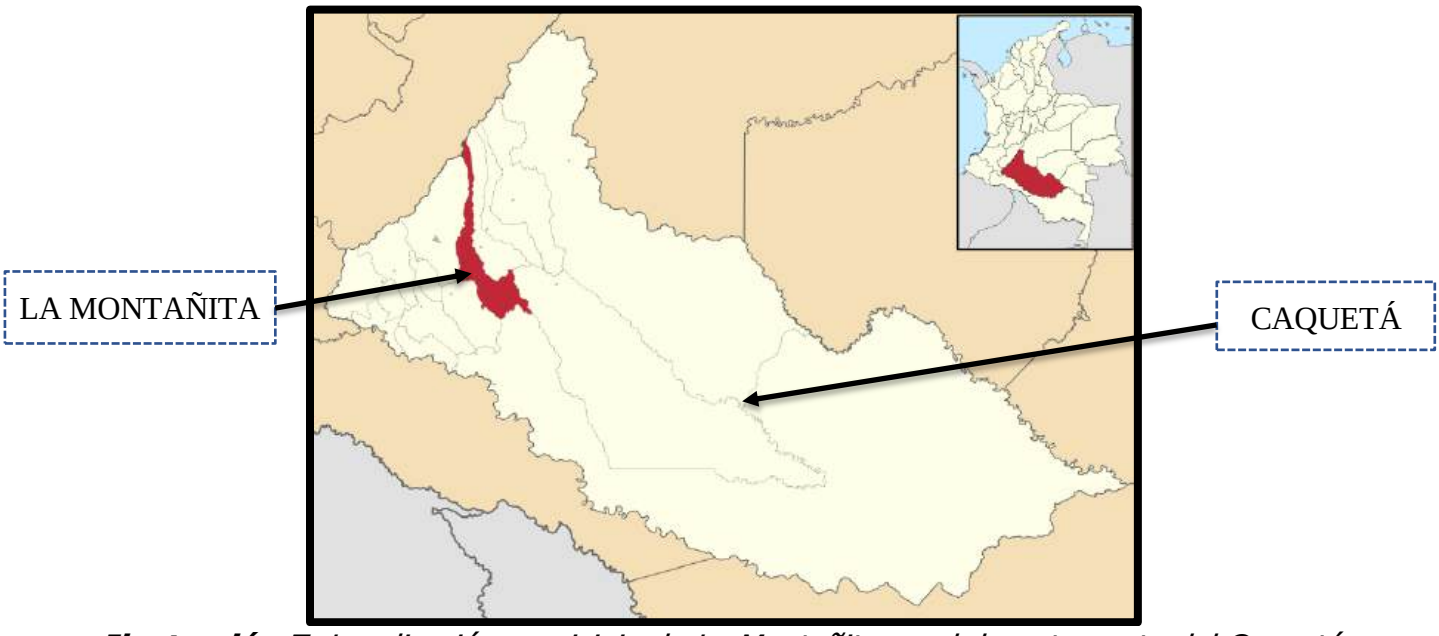


Ilustración 7. *Localización municipio de La Montañita en el departamento del Caquetá.*



Ilustración 8. *Ubicación del proyecto en la Vereda Buenos Aires Bajo*

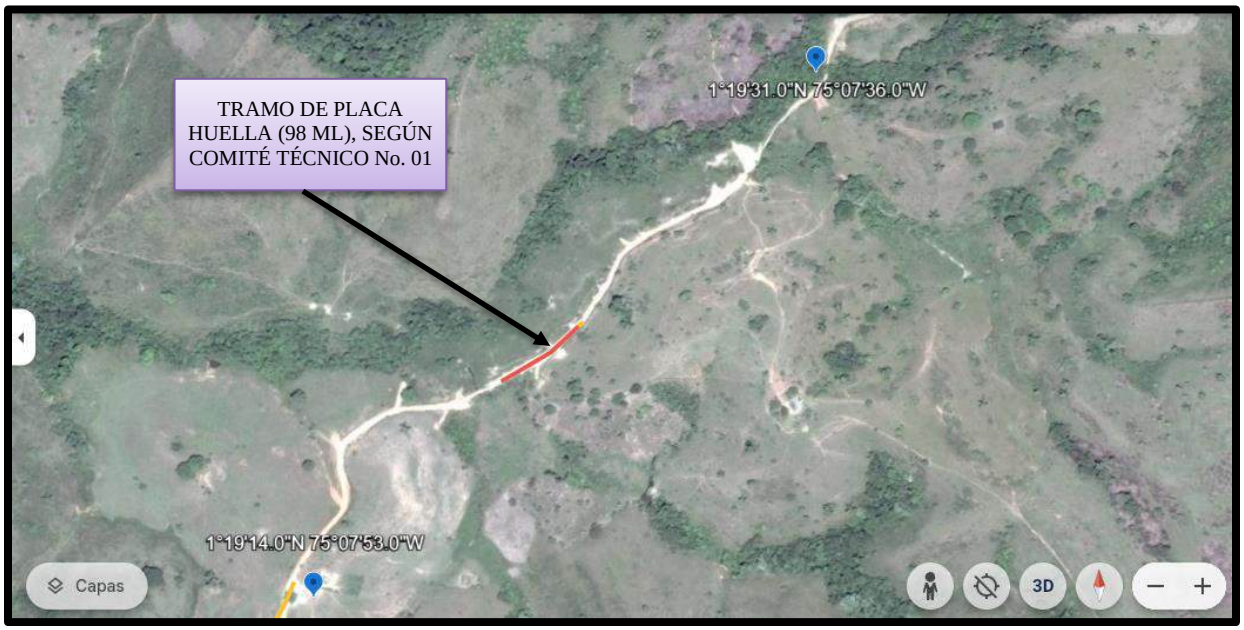


Ilustración 9. *Tramo de placa huella de intervención en la Vereda Buenos Aires Bajo.*

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a La Esmeralda y Buenos Aires Bajo del municipio de LA MONTAÑITA y Bajo Platanillo del municipio de MILÁN, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos. Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

A) CONVENIO SOLIDARIO No. 3379-2023 – LA ESMERALDA

- INVENTARIO

En el tramo de intervención, solo se evidenció en sitio de obra, una obra de arte tipo alcantarilla en concreto reforzado con tubería en concreto reforzado de 36”, encole de caja poceta y descole en aletas.

Tabla 1. *Inventario en tramo de intervención - Vereda La Esmeralda*

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
Alcantarilla en concreto reforzado	Bueno	1

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizada la inspección visual por parte de esta firma de interventoría en el tramo de intervención de la vereda La Esmeralda, teniendo en cuenta las coordenadas 1.21556 N; -75.12500 W y 1.21528 N; -75.12611 W, levantadas en campo por INVIAS, a continuación, se describe el estado inicial antes de su inicio de obra:

- La superficie o rodadura del terreno presenta hundimientos puntuales a lo largo del tramo establecido, a causa del tránsito de caballos, medio que se utiliza como transporte hacia la escuela, dado que en el momento que se presentan lluvias es imposible transitarse en vehículos (moto o carro).
- Se evidencia surcos que se ha generado por de épocas de lluvias mediante proceso de arrastre o por erosión de material limoso, llegando con el tiempo más hundimiento del terreno natural.
- No se cuenta con cunetas en material de concreto reforzado
- No se evidencia material granular (mixto) sobre la capa de rodadura o terreno natural.

B) CONVENIO SOLIDARIO No. 3441-2023 – BAJO PLATANILLO

- INVENTARIO

Para esta vereda, en el tramo de intervención solo se evidenció en sitio de obra, una obra de arte tipo alcantarilla (cajón-aletas) en concreto reforzado con tubería en concreto reforzado de diámetro < 36", don la caja o poceta está totalmente deteriorado la calidad de concreto con el pasar de los años de uso.

Tabla 2. *Inventario en tramo de intervención - Vereda Bajo Platanillo*

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
Alcantarilla en concreto reforzado	Deteriorado	1

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizada la inspección visual por parte de esta firma de interventoría en el tramo de intervención de la vereda Bajo Platanillo, teniendo en cuenta las coordenadas 1.28639 N; -75.46528 W y 1.28500 N; -75.46472 W, levantadas en campo por INVIAS, a continuación, se describe el estado inicial antes de su inicio de obra:

- La superficie o rodadura del terreno cuenta con material de afirmado (material de rio) con existencias de surcos transversales a la vía a causa de épocas de lluvias.
- Se evidencia erosión en zona de descole de alcantarilla existente, donde la comunidad ha solicitado suspenderse para que no se continue generando daños al predio.
- No se cuenta con cunetas en material de concreto de 3.000 psi.
- Se evidencia sobre los taludes vegetación y no cuenta con árboles de diámetro mayor a 5cm en el tramo de intervención de este proyecto

C) CONVENIO SOLIDARIO No. 3760-2023 – BUENOS AIRES BAJO

- INVENTARIO

No se cuenta con obras de arte de drenajes, ni placa huellas u otras obras viales en vías terciarias.

Tabla 3. *Inventario en tramo de intervención - Vereda Buenos Aires Bajo*

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizada la inspección visual por parte de esta firma de interventoría en el tramo de intervención de la vereda Buenos Aires Bajo, teniendo en cuenta las coordenadas 1.32056 N; -75.13139 W y 1.32528 N; -75.12667 W, levantadas en campo por INVIAS, a continuación, se describe el estado inicial antes de su inicio de obra:

- La superficie del terreno o rodadura del terreno presenta pocos hundimientos puntuales a lo largo del tramo establecido, el tránsito sobre la vía es muy baja.
- No se cuenta con cunetas en material de concreto reforzado sobre el tramo a intervenir.
- No se cuentan con obras de arte de drenajes (alcantarillas).
- No se evidencia material granular (mixto) sobre la capa de rodadura o terreno natural.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS

Los proyectos consisten en realizar la revisión e implementación del contenido de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje o placa huella en los sectores priorizados. Los materiales, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución de las obras deberán ser los que se exigen en las especificaciones técnicas del INVIAS, Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.


Las obras que se van a ejecutar, deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen.

A continuación, se describe el alcance y las actividades técnicas a ejecutar de cada uno de los proyectos ubicados en las veredas de Buenos Aires Bajo, La Esmeralda y Bajo Platanillo, de los cuales fueron avalados por esta interventoría como se evidencia en el comité técnico de obra No. 01 desarrollados en cada una de las juntas de acción comunal:

- **JAC LA ESMERALDA** (CS#3379 DE 2023)

La junta de acción comunal de la vereda de La Esmeralda tiene como alcance la construcción de 98 metros lineales de placa huella, no se cuenta con construcción de obras de drenajes como alcantarillas u otras.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	98 ML DE PLACA HUELLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópeo resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi

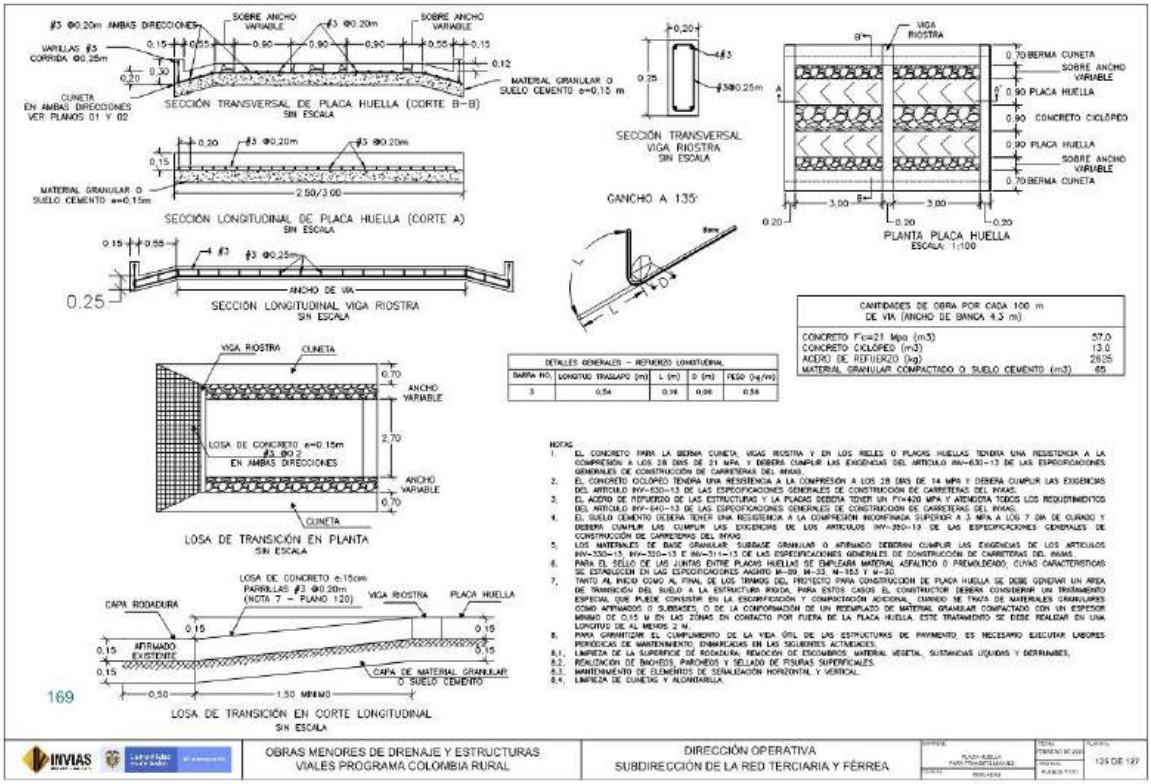ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA


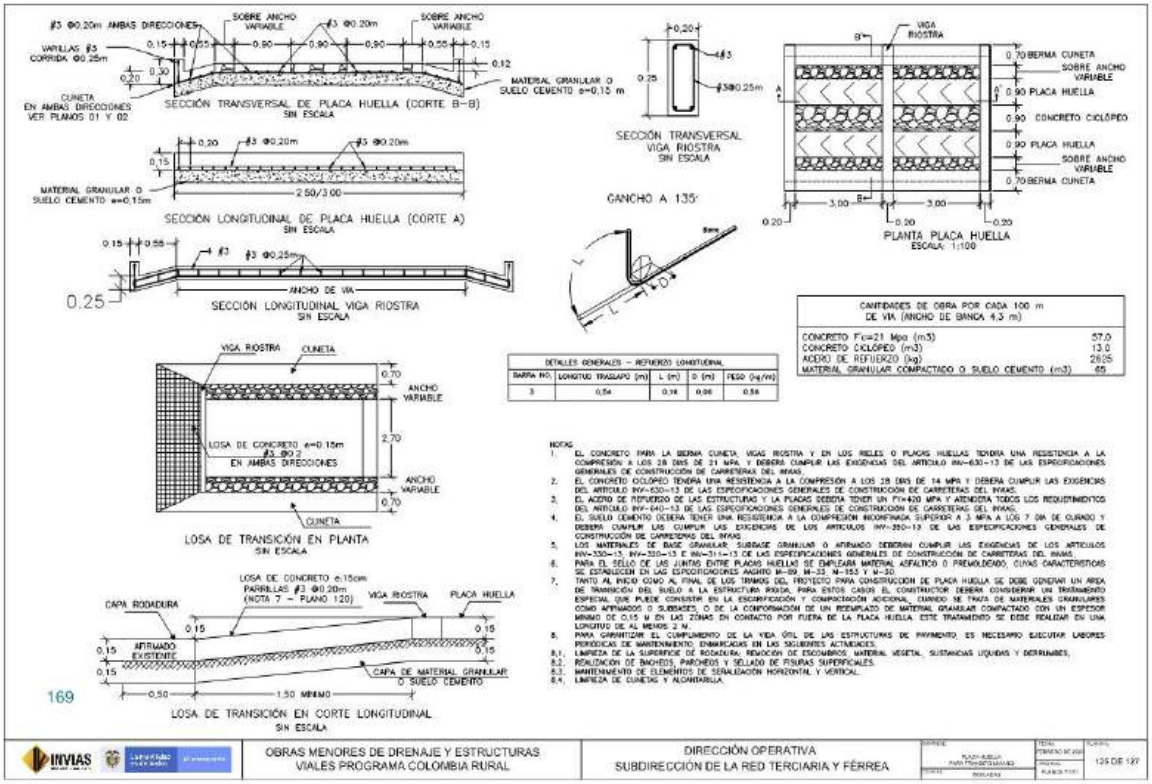
- **JAC BAJO PLATANILLO** (CS#3441 DE 2023)

La junta de acción comunal de la vereda de Bajo Platanillo tiene como alcance la construcción de 109 metros lineales de placa huella, no se cuenta con construcción de obras de drenajes como alcantarillas u otras.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	109 ML DE PLACA HUELLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C

	- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópeo resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi

ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA




- **JAC BUENOS AIRES BAJO** (CS#3760 DE 2023)

La junta de acción comunal de la vereda de Buenos Aires Bajo tiene como alcance la construcción de 98 metros lineales de placa huella, no se cuenta con construcción de obras de drenajes como alcantarillas u otras.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	98 ML DE PLACA HUELLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópeo resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi

ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA

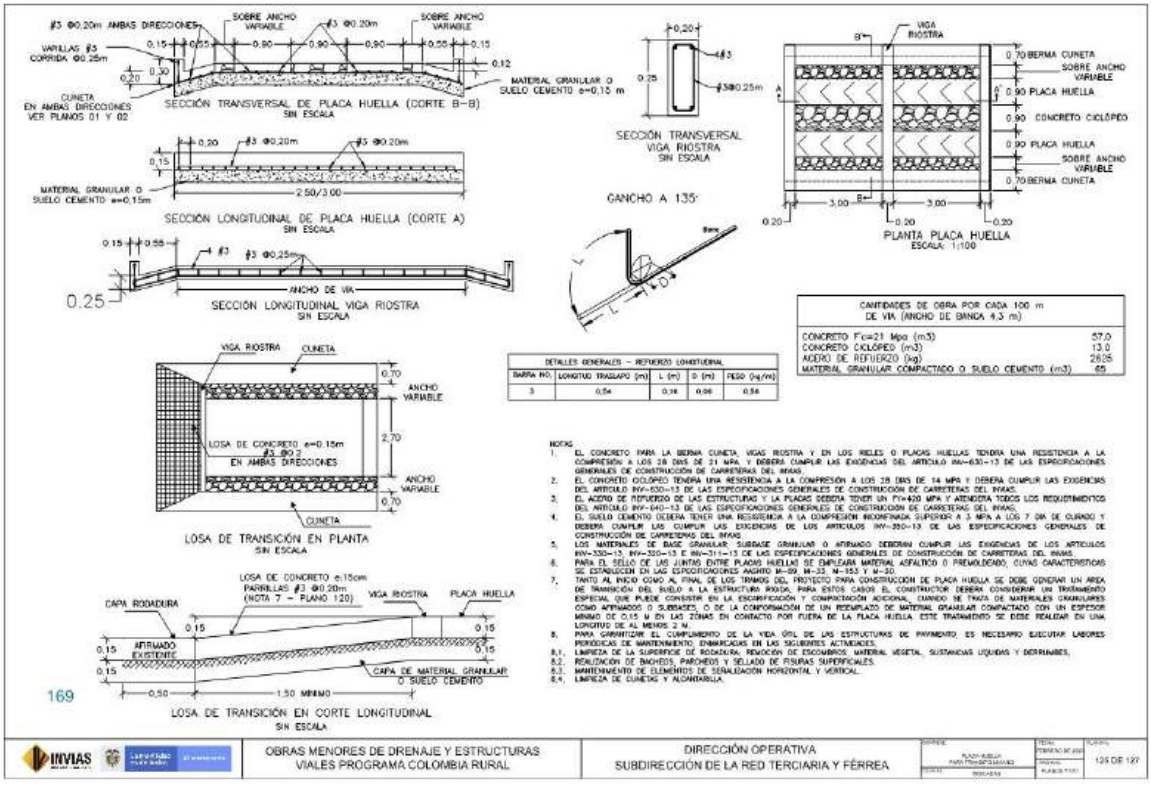

3. INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

- **CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023**

El presente convenio solidario No. 3379 – 2023 se suscribió el día 29 de septiembre de 2023 entre la señora *PAOLA ANDREA ROA MORA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *HERNÁN SANCHEZ HUERTAS* en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA**, por un valor del convenio de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (**$199.001.571,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (**$198.001.571,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	3379-2023	
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	
NIT:	800.215.807-2	
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA	
NIT:	901.705.545-7	
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNÁN SANCHEZ HUERTAS	
IDENTIFICACIÓN:	17.644.725 DE FLORENCIA	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 199.001.571,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**

		$ 198.001.571,00 M/CTE
		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	27 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 19 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 23 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 3379-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA*

DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio", fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 20 de junio de 2024 un alcance físico de 98 mL de placa huella. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	MONTAÑITA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA	98,00	CAQUETÁ	20/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0,000	$ 63.146,00	$ -
							SUB-TOTAL	**$ -**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,000	$ 179.200,00	$ 179.200,00
							SUB-TOTAL	**$ 179.200,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,2600	$ 29.170,00	$ 95.094,00
4	320.3.1	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	82,4700	$ 303.772,00	$ 25.052.077,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	60,1700	$ 1.324.340,00	$ 79.685.538,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,6200	$ 774.303,00	$ 19.837.643,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.873,6000	$ 8.534,00	$ 24.523.302,00
							SUB-TOTAL	**$ 149.193.654,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 149.372.854,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.481.186,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.147.531,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 198.001.571,00**

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023

El presente convenio solidario No. 3441 – 2023 se suscribió el día 19 de septiembre de 2023 entre la señora *PAOLA ANDREA ROA MORA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS* en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO**, por un valor del convenio de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (**$199.001.571,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (**$198.001.571,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	3441-2023	
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	
NIT:	800.215.807-2	
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO	
NIT:	900.124.679-8	
REPRESENTANTE LEGAL:	DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS	
IDENTIFICACIÓN:	1.117.511.741 DE FLORENCIA	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 199.001.571,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**
		$ 198.001.571,00 M/CTE

		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 19 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 24 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 25 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 3441-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio"*, fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 18

de junio de 2024 un alcance físico de 109 mL de placa huella. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	MILAN	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	109,00	CAQUETÁ	18/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0,00	$ 63.146,00	$ -
							SUB-TOTAL	**$ -**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 278.204,00	$ 278.204,00
							SUB-TOTAL	**$ 278.204,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,5700	$ 29.815,000	$ 106.440,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	95,0600	$ 225.354,000	$ 21.422.151,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	65,8500	$ 1.241.285,000	$ 81.738.617,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	28,0900	$ 737.443,000	$ 20.714.774,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.164,0000	$ 7.937,000	$ 25.112.668,00
							SUB-TOTAL	**$ 149.094.650,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 149.372.854,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.481.186,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.147.531,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 198.001.571,00**

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023

El presente convenio solidario No. 3760 – 2023 se suscribió el día 5 de octubre de 2023 entre la señora *PAOLA ANDREA ROA MORA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *GEAN CARLOS TAPIERO MONGE* en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO**, por un valor del convenio de DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS (**$200.663.426,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS (**$199.663.426,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	3760-2023	
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	
NIT:	800.215.807-2	
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO	
NIT:	900.787.710-3	
REPRESENTANTE LEGAL:	GEAN CARLOS TAPIERO MONGE	
IDENTIFICACIÓN:	1.006.529.457 DE EL PAUJIL	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.663.426,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**

		$ 199.663.426,00 M/CTE
		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	5 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 19 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 23 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 3760-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA*

DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio", fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 20 de junio de 2024 un alcance físico de 98 mL de placa huella. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	MONTAÑITA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO	98,00	CAQUETÁ	20/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0,00	$ 63.146,00	$ -
							SUB-TOTAL	**$ -**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 202.690,00	$ 202.690,00
							SUB-TOTAL	**$ 202.690,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,2600	$ 27.566,00	$ 89.865,00
4	320.3.1	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	82,4700	$ 303.612,00	$ 25.038.882,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	60,1700	$ 1.334.950,00	$ 80.323.942,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,6200	$ 795.544,00	$ 20.381.837,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.873,6000	$ 8.680,00	$ 24.942.848,00
							SUB-TOTAL	**$ 150.777.374,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 150.980.064,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.529.402,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.153.960,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 199.663.426,00**

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3379-2023 (LA ESMERALDA)

En el presente mes de agosto de 2024, se llevaron actividades de elaboración de concretos ciclópeo (concreto de 2.000 psi 60% y piedra 40%) y concretos de 3.000 psi para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, como también el suministro e instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi para el tramo de los 98 mL por parte de la junta de acción comunal de la vereda La Esmeralda, es de aclarar, que la JAC tuvo ahorros económicos y se ejecutó hasta 105 mL. A continuación, se describe con mayor brevedad cada una de las actividades ejecutadas en el presente periodo:

- **Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ**

Actividad que comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 3.000 psi (21 Mpa), utilizados para la construcción vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos para placa huellas de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, bades, etc. Se contó además con un maestro y 5 ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 1: Concreto de 3.000 psi para cunetas MI, abscisa k0+040.	**Imagen No. 2**: Concreto de 3.000 psi para placa de acceso de entrada y salida de placa huella, abscisa k0+000.

	
Imagen No. 3: Concreto de 3.000 psi para huella, abscisa k0+028.	**Imagen No. 4**: Concreto de 3.000 psi para bordillo de cuneta MD, abscisa k0+045.
	
Imagen No. 5: Concreto de 3.000 psi para huella, abscisa k0+028. Detalle de acabado.	**Imagen No. 6**: Concreto de 3.000 psi para huellas sobre MD y MI, abscisa k0+070.
	
Imagen No. 7: Vista general de placa huella, concreto de 3.000 psi para vigas riostras, huellas y cunetas.	**Imagen No. 8**: Vista general de placa huella, concreto de 3.000 psi para vigas riostras, huellas y cunetas.

- **Concreto ciclópeo resistencia 14 MPA (G)**

Comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 2.000 psi (14Mpa) – (60%) y por otra parte piedra (40%), utilizados para la construcción de tres franjas de concreto ciclópeo, dos de 45cm y una de 90cm para placa huellas de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla y su respectiva instalación de piedra, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, bades, etc. Se contó además con un oficial y 5 ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 9: Concreto de 2.000 psi (14Mpa) - (60%) y piedra (40%) para concreto ciclópeo para franja lateral de 45cm, MI, abscisa k0+030.	**Imagen No. 10**: Concreto de 2.000 psi (14Mpa) - (60%) y piedra (40%) para concreto ciclópeo para franja lateral de 45cm, MI, abscisa k0+030. Ingeniero residente de interventoría verificando actividades técnicas y cumplimiento de planos de placa huellas.

	
Imagen No. 11: Concreto de 2.000 psi (14Mpa) - (60%) y piedra (40%) para concreto ciclópeo para franjas laterales de 45cm y central de 90cm, abscisa k0+080.	**Imagen No. 12**: Concreto de 2.000 psi (14Mpa) - (60%) y piedra (40%) para concreto ciclópeo para franjas laterales de 45cm y central de 90cm, abscisa k0+070.
	
Imagen No. 13: Concreto de 2.000 psi (14Mpa) - (60%) y piedra (40%) para concreto ciclópeo para franjas laterales de 45cm y central de 90cm, abscisa k0+088.	**Imagen No. 14**: Concreto de 2.000 psi (14Mpa) - (60%) y piedra (40%) para concreto ciclópeo para franjas laterales de 45cm y central de 90cm, abscisa k0+082.

- **Acero de refuerzo de FY=4.200 kg/cm2 (60.000 psi)**

Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto como placa de acceso y salida, vigas riostras, huellas y cunetas con su respectivo bordillo en concordancia con los planos estructurales para placa huellas definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Se verificó en campo de obra que los aceros de refuerzo correspondieran al número de la barra, espaciado, medidas de cortes acordes y flejes con su respectiva longitud de desarrollo, actividad que se ejecutó con equipos manuales y herramientas menores como pulidora, bichiroque, etc. Se contó además con un oficial y 2 ayudantes prácticos para realizar las labores de corte, figurado e instalación del acero de refuerzo.

	
Imagen No. 15: Corte de acero de refuerzo de 60.000 psi.	**Imagen No. 16**: Figurado y corte de acero de refuerzo de 60.000 psi.

	
Imagen No. 17: Armado de acero de refuerzo de 60.000 psi para vigas riostra.	**Imagen No. 18**: Armado de acero de refuerzo de 60.000 psi para vigas riostra.

	
Imagen No. 19: Flejes para vigas riostra en acero de refuerzo de 60.000 psi.	**Imagen No. 20**: Acero de refuerzo de 60.000 psi para huellas, longitudinal y transversal.

	
Imagen No. 21: Acero de refuerzo de 60.000 psi para huellas, longitudinal y transversal.	**Imagen No. 22**: Acero de refuerzo de 60.000 psi para placa de acceso y salida, longitudinal y transversal.

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3441-2023 (BAJO PLATANILLO)

Para el presente informe, la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Bajo Platanillo adelantó actividades de concreto de 3.000 psi y acero de refuerzo de 60.000 psi para huellas y cunetas con bordillo, como también concreto ciclópeo (60% concreto de 2.000 psi y 40% de piedra) para las franjas de 90cm y dos laterales de 45cm. Estas actividades se ejecutaron dentro del tramo de los 109 mL de placa huella, a continuación, se describe con mayor detalle cada una de las actividades ejecutadas en el presente periodo:

- **Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ**

Actividad que comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 3.000 psi (21 Mpa), utilizados para la construcción vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos para placa huellas de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, bades, etc. Se contó además con un maestro y 5 ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 23: Concreto de 3.000 psi para huellas y cunetas MD, abscisa k0+000.	**Imagen No. 24**: Concreto de 3.000 psi para huellas y cunetas MD, abscisa k0+000.
	
Imagen No. 25: Concreto de 3.000 psi para huellas y cunetas MD, abscisa k0+030.	**Imagen No. 26**: Concreto de 3.000 psi para huellas y cunetas MD, abscisa k0+000. Chequeo de medidas de sección de huellas.

	
Imagen No. 27: Concreto de 3.000 psi para huella y cunetas, abscisa k0+000.	**Imagen No. 28**: Toma de muestras de concreto de 3.000 psi por residente de interventoría.

	
Imagen No. 29: Concreto de 3.000 psi para huella y cunetas, abscisa k0+112.	**Imagen No. 30**: Concreto de 3.000 psi para huella y cunetas, abscisa k0+112.

- **Concreto ciclópeo resistencia 14 MPA (G)**

Comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 2.000 psi (14Mpa) – (60%) y por otra parte piedra (40%), utilizados para la construcción de tres franjas de concreto ciclópeo, dos de 45cm y una de 90cm para placa huellas de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla y su respectiva instalación de piedra, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como

mezcladora, palas, bades, etc. Se contó además con un oficial y 5 ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 31: Concreto de 2.000 psi (14Mpa) - (60%) y piedra (40%) para concreto ciclópeo para franja lateral de 45cm, MD, abscisa k0+030.	**Imagen No. 32**: Concreto de 2.000 psi (14Mpa) - (60%) y piedra (40%) para concreto ciclópeo para franja lateral y central de 45cm y 90cm, MI y MD, abscisa k0+000.

	
Imagen No. 33: Concreto de 2.000 psi (14Mpa) - (60%) y piedra (40%) para concreto ciclópeo para franja lateral y central de 45cm y 90cm, MI y MD, abscisa k0+030.	**Imagen No. 34**: Concreto de 2.000 psi (14Mpa) - (60%) y piedra (40%) para concreto ciclópeo para franja lateral y central de 45cm y 90cm, MI y MD, abscisa k0+040.

	
Imagen No. 35: Concreto de 2.000 psi (14Mpa) - (60%) y piedra (40%) para concreto ciclópeo para franja lateral y central de 45cm y 90cm, MI y MD, abscisa k0+035.	**Imagen No. 36**: Concreto de 2.000 psi (14Mpa) - (60%) y piedra (40%) para concreto ciclópeo para franja lateral y central de 45cm y 90cm, MI y MD, abscisa k0+035.

- **Acero de refuerzo de FY=4.200 kg/cm2 (60.000 psi)**

Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto como placa de acceso y salida, vigas riostras, huellas y cunetas con su respectivo bordillo en concordancia con los planos estructurales para placa huellas definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Se verificó en campo de obra que los aceros de refuerzo correspondieran al número de la barra, espaciado, medidas de cortes acordes y flejes con su respectiva longitud de desarrollo, actividad que se ejecutó con equipos manuales y herramientas menores como pulidora, bichiroque, etc. Se contó además con un oficial y 2 ayudantes prácticos para realizar las labores de corte, figurado e instalación del acero de refuerzo.

	
Imagen No. 37: Acero de refuerzo de 60.000 psi para huellas y cunetas.	**Imagen No. 38**: Acero de refuerzo de 60.000 psi para huellas y cunetas.

	
Imagen No. 39: Acero de refuerzo de 60.000 psi para cunetas, abscisa k0+090.	**Imagen No. 40**: Acero de refuerzo de 60.000 psi para cunetas, abscisa k0+080.

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3760-2023 (BUENOS AIRES BAJO)

En este convenio solidario en el mes de agosto del presente año, la junta de acción comunal de la vereda de Buenos Aires Bajo, se llevaron actividades preliminares como desmonte y limpieza de zona no boscosas, excavaciones, conformación y nivelación del terreno dentro del tramo de los 98 metros lineales de placa huella; suministro, extendido e instalación de sub-base granular con equipo vibro-compactador benitin y suministro de materiales de ferretería y materiales pétreos (arena y grava) por parte de la junta de acción comunal de la vereda Buenos Aires Bajo. Por otra parte, actividades administrativas que condujo a las compras de materiales de obra, pagos de transportes de materiales, afiliación de personal calificado y no calificado, entre otras. A continuación, se describe con mayor brevedad cada una de las actividades ejecutadas en el presente periodo:

- **Desmonte y limpieza de zonas no boscosas**

Esta actividad comprende el desraíce y la limpieza de zonas cubiertas de pasto, rastrojo, maleza, escombro, cultivos y arbustos sobre la margen izquierda y derecha del tramo de intervención donde se construirá la placa huella, en un ancho promedio de 5 metros. Esta interventoría verifico la zona, y se evidenció que estas actividades fueron ejecutadas con herramientas menores como machete, azadón, palín, guadañas, etc. Se contó con un oficial y tres ayudantes para realizar esas labores.

	
Imagen No. 41: Desmonte y limpieza sobre margen izquierda y derecha.	**Imagen No. 42**: Desmonte y limpieza sobre margen izquierda y derecha.

- **Excavaciones varias sin clasificar**

Esta actividad comprende a los trabajos de excavaciones varias de cualquier material, sin importar su naturaleza ni la presencia de la tabla de agua o nivel freático. Para este periodo del presente informe, JAC de la vereda Buenos Aires Bajo realizó cortes sobre taludes sobre la margen izquierda (MI) bajando y conformación del terreno natural con maquinaria tipo pajarita, permitiendo la ampliación de la banca a lo largo del tramo de intervención, en cumplimiento al ancho del diseño transversal de la placa huella como se establece en la página 169 de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES". Se contó con personal de obra, 2 ayudantes para actividades varias durante el proceso de operación de la maquinaria.

	
Imagen No. 43: Corte de taludes con maquinaria tipo pajarita.	**Imagen No. 44**: Vista general de corte sobre taludes MI y MD, para ampliación de banca.

- **Sub-base granular clase C**

Esta actividad consiste en el suministro, el transporte, la colocación, el humedecimiento o aireación, la extensión y la conformación, la compactación y el terminado de material sub-base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas hasta lograrse un espesor de e=15cm, de conformidad con los lineamientos, las pendientes y las dimensiones indicados en los planos estructurales de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES". Se contó en campo con maquinarias y equipos para llevarse a cabo esta actividad junto con tres (3) ayudantes para labores varias durante la operación de estas maquinarias o equipos.

	
Imagen No. 45: Extendido de material sub-base granular Clase C con maquinaria tipo pajarita.	**Imagen No. 46**: Compactación de material sub-base granular Clase C con equipo benitin.

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha del presente informe no se han evidenciado ni presentado ítems no previstos en cada uno de los proyectos que se tienen en las veredas de La Esmeralda, Bajo Platanillo y en Buenos Aires Bajo.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Conforme a lo estipulado en el contrato de interventoría No. 4136 de 2023, la firma interventora realizó el seguimiento, control y supervisión a las obligaciones de los convenios solidarios número 3379–3441–3760 de 2023, de acuerdo a lo consignado en la guía para el ejercicio de la supervisión e interventoría emitida por *Colombia Compra Eficiente* y el *manual de interventoría de obra pública (2022)*, y demás lineamientos señalados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

En ese sentido, es importante señalar algunas de las actividades que, a la luz de la normativa vigente en el ordenamiento jurídico, así como en la guía de Colombia Compra Eficiente y en la reiterada Jurisprudencia del Consejo de Estado, debe realizar los interventores:

1. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos de este.
2. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en el contrato y documentos que lo integran.
3. Hacer seguimiento estricto al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, verificando que se cumpla el plazo y los cronogramas previstos en el contrato.
4. Requerir oportunamente al contratista con el fin de que presente planes de contingencia que conjuren las situaciones que generen retrasos o impactos en el cronograma de obra.
5. Informar oportunamente a la entidad estatal de posibles incumplimientos del contratista, y elaborar y presentar los soportes correspondientes, de conformidad con la normatividad vigente, el contrato y documentos que lo integran, el Manual de Interventoría de Obra y demás documentos.
6. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para atender las situaciones que afectan la ejecución contractual.
7. Informar oportunamente a la Entidad, las afectaciones al cronograma causadas por las gestiones de terceros y/o Entidades Públicas, con el fin de que sea desarrollada la gestión interinstitucional debida.
8. Informar, analizar, avalar y solicitar a la Entidad oportunamente, las modificaciones contractuales necesarias para la debida ejecución del proyecto.

En virtud de lo anterior, para este periodo del mes de agosto – 2024, la interventoría ha realizado el acompañamiento a cada uno de los proyectos que se ejecutan en el departamento del Caquetá que corresponden a las veredas de La Esmeralda y Buenos Aires Bajo en el municipio de La Montañita y en la vereda Bajo Platanillo en el municipio de Milán, dentro de las actividades más puntuales que se han llevado por parte de esta interventoría se describen a continuación:

- Se ha realizado control y registro de cada uno de los pagos solicitados por parte de las juntas de acción comunal, destinadas para compras de materiales de obra, equipos, alquiler de maquinarias y nóminas.

- Verificación en cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de afiliación y pagos de la seguridad social de cada uno de los trabajadores calificados y no calificados de la obra.

- Visitas técnicas a los proyectos de obra con el fin de llevar control y seguimiento de cada una de las actividades ejecutadas en el presente periodo, de igual forma cada uno de los procesos constructivos de la placa huella.

- Verificación de dimensiones estipuladas en los diseños de acuerdo a la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INVIAS" de la entidad del Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

- Chequeo visual de los materiales pétreos utilizados en cada una de las obras de placa huellas que se llevan en las veredas.

- Acompañamiento por parte del equipo de interventoría en el área de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y social frente a cada una de las comunidades donde se ejecutan los proyectos de placa huella.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

4.1. INFORME SEMANAL

En el periodo comprendido del presente informe se presenta por parte de esta firma interventora cuatro (4) informes semanales para cada uno de los proyectos de obra que se adelantan en las veredas La Esmeralda y Buenos Aires Bajo en el municipio de La Montañita y en la vereda Bajo Platanillo en el municipio de Milán, de los cuales se describen a continuación:

- Convenio Solidario No. 3379-2023 (**La Esmeralda**)

- Informe semanal No. 19: del 05 de agosto al 11 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 20: del 12 de agosto al 18 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 21: del 19 de agosto al 25 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 22: del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.1**).

- Convenio Solidario No. 3441-2023 (**Bajo Platanillo**)

- Informe semanal No. 19: del 05 de agosto al 11 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 20: del 12 de agosto al 18 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 21: del 19 de agosto al 25 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 22: del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.2**).

- Convenio Solidario No. 3760-2023 (**Buenos Aires Bajo**)

- Informe semanal No. 19: del 05 de agosto al 11 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 20: del 12 de agosto al 18 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 21: del 19 de agosto al 25 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 22: del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

(**Ver Anexo 8.4.3)**

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

Durante el mes de agosto de 2024, esta firma de interventoría llevó registro de maquinaria y equipos utilizados por cada una de las juntas de acción comunal en la obra. Dicha información se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.5.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.5.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.5.3**).

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDAROS

Durante el mes de agosto de 2024, esta firma de interventoría llevó registro del personal de obra, control de aportes legales y seguridad social de cada una de las juntas de acción comunal. Se adjunta la información diligenciada en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.6.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.6.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.6.3**).

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

Se presenta por parte de esta firma interventora para el mes agosto de 2024 los informes financieros y presupuestales de cada uno de los convenios solidarios, el cual se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.7.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.7.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.7.3**).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el mes de agosto de 2024 se registró el tiempo climático diario de cada una de las veredas donde se ejecutan las obras de placa huellas, dicha información se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.8.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.8.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.8.3**).

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En el periodo correspondiente al mes de agosto – 2024, se cuenta con resultados de ensayos de laboratorios de la vereda La Esmeralda del Municipio de La Montañita y de Bajo Platanillo del Municipio de Milán en el departamento del Caquetá, resultados que comprende a los concretos de resistencia de 3.000 psi para vigas riostras, cunetas con bordillos, franjas de huellas y placa de acceso y salida a la placa huella. De igual forma, esta interventoría presenta la relación de información correspondiente a los resultados de ensayos de laboratorio en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.9.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.9.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.9.3**).

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Comprende la relación de las garantías y seguros de cada uno de los convenios solidarios cuando estos surten modificaciones, por lo que esta firma de interventoría hace seguimiento mensual a través del formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 3379, correspondiente a la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.10.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 3441, correspondiente a la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.10.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 3760, correspondiente a la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.10.3**).

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIOS SOLIDARIOS

Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, por lo que no es aplicable a ninguno de los convenios solidarios.

Nota: El formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-14* que se establece en la "LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA", No Aplica (N/A).

4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL

A continuación, se relacionan otros documentos de seguimientos mensuales que se lleva a cada uno de los convenios solidarios por esta interventoría, que corresponde al seguimiento de los desembolsos realizados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y su respectivo seguimiento de programa de inversiones de ello, que a continuación se relacionan:

- SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

Para este presente periodo del mes de agosto – 2024, esta firma interventora solicitó a las JAC el informe de seguimiento de la inversión del desembolso mensual de su respectivo convenio basado en el plan de inversión de desembolso presentado por cada una de las Juntas y aprobados por esta firma (**Ver Anexo 8.11.1, Anexo 8.11.2 y Anexo 8.11.3**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 3379, JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.12.1**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 3441, JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.12.2**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 3760, JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.12.3**).

- SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Se realiza por esta firma de interventoría el seguimiento mensual del programa de obra para cada JAC de acuerdo a la programación elaborada por el ingeniero residente y lo aprobado por esta interventoría (**Ver Anexo 8.13.1, Anexo 8.13.2 y Anexo 8.13.3**), programación que es vigente a partir del día 24 de junio de 2024 para todas las juntas (La Esmeralda, Bajo Platanillo y Buenos Aires Bajo). De acuerdo a lo anterior, se refleja mediante de tablas el porcentaje programado y ejecutado acumulado del presente periodo, donde se deja constancia el atraso o avance física de cada una de las juntas para el presente periodo.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda La Esmeralda.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "**JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA**" **CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 - 2023**			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada Mensual	Ejecutado Acumulado Mensual	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,030%	0,000%	-0,030%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	34,283%	20,754%	-13,529%
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	36,214%	79,246%	43,032%
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	29,473%	-	-
TOTAL	**100,000%**	**100,00%**	**29,473%**

Tabla 4. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC - La Esmeralda.*

Según Tabla No. 4, se tiene un avance ejecutado acumulado del 100,00% correspondiente a $ 198.001.571,00 de pesos, contra un programado acumulado de 70,527% equivalente a $ 139.644.567,98 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda La Esmeralda, se encuentra en adelanto y finalizada la obra, es decir, por encima del programado en un 29,473% que representa en valor de $ 58.357.003,02 de pesos.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda Bajo Platanillo.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "**JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO**" **CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 - 2023**			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada Mensual	Ejecutado Acumulado Mensual	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,047%	0,141%	0,094%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	33,299%	18,836%	-14,463%

Agosto – 2024 Días del 01 al 31	36,627%	57,164%	20,537%
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	30,027%	-	-
TOTAL	**100,000%**	**76,141%**	**6,168%**

Tabla 5. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC - Bajo Platanillo.*

Según Tabla No. 5, se tiene un avance ejecutado acumulado del 76,141% correspondiente a $ 150.759.239,00 de pesos, contra un programado acumulado de 69,973% equivalente a $ 138.547.639,28 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda Bajo Platanillo, se encuentra en adelanto, es decir, por encima del programado en un 6.168% que representa en valor de $ 12.211.599,72 de pesos.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "**JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO**" **CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 - 2023**			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada Mensual	Ejecutado Acumulado Mensual	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,034%	0,000%	-0,034%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	34,217%	7,898%	-26,319%
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	36,260%	28,690%	-7,570%
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	29,489%	-	-
TOTAL	**100,000%**	**36,588%**	**-33,923%**

Tabla 6. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC - Buenos Aires Bajo*

Según Tabla No. 6, se tiene un avance ejecutado acumulado del 36,588% correspondiente a $ 73.051.973,00 de pesos, contra un programado acumulado de 70,511% equivalente a $ 140.784.678,31 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo, se encuentra en atraso, es decir, por debajo del programado en un -33.923% que representa en valor de $ 67.732.705,31 de pesos.

4.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Para este presente periodo del mes de agosto -2024, no se realizaron actas de comité de obra.

4.11. ACTAS DE REUNIÓN

Para este periodo del mes de agosto – 2024, se realizaron Actas de reuniones en las juntas de acción comunal de las veredas La Esmeralda y de Bajo Platanillo. A continuación, se describen:

- Acta de reunión No. 02 – JAC, La Esmeralda (**Ver Anexo 8.14.1**)
- Acta de reunión No. 02 – JAC, Bajo Platanillo (**Ver Anexo 8.14.2**)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

El presente contrato de interventoría No. 4136 – 2023 se suscribió el día 26 de octubre de 2023 entre la señor *JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS* en calidad de **DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CAQUETÁ** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA* en calidad de **CONTRATISTA**, por un valor del contrato de CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (**$107.999.997,00**) M/CTE, equivalente a 93,10 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2023, a continuación, se relaciona los datos generales del contrato de interventoría:

CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4136-2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILÁN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
NIT:	7.692.245-1
VALOR DEL CONTRATO:	$ 107.999.997,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	26 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 19 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 24 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA CUARTA.** VALOR: El valor del contrato de interventoría es por la suma de CIENTO SIETO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M-CTE ($107.999.997), equivalentes a 93,10 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2023, suma que se discrimina de la siguiente manera o presupuesto de interventoría inicial:

PRESUPUESTO INICIAL DE INTERVENTORÍA

	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
		(1)	**(2)**	**(3)**	((1)+(2))*(3) = **(4)**
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
	Director de Interventoría	$ 5.000.000,00		0,50	$ 2.500.000,00
	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,00		4,00	$ 16.000.000,00
	Profesional ambiental	$ 2.800.000,00		0,40	$ 1.120.000,00
	Profesional social	$ 2.800.000,00		0,40	$ 1.120.000,00
	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 3.000.000,00
	Especialista en Estructuras	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Vía y/o Pavimentos	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.500.000,00			
	Especialista en diseño Geometrico	$ 5.500.000,00			
	Inspector	$ 1.300.000,00		6,00	$ 7.800.000,00
	Inspector SST	$ 1.300.000,00		0,50	$ 650.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)				$ 32.190.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR (6)				2,36
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				$ 75.968.400,00

	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
			(7)	(8)	(7)*(8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	VIÁTICOS				
	Viaticos Director y/o Especialistas	Dia	$ 140.000,00	4,00	$ 560.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	Mes	$ 550.000,00	12,00	$ 6.600.000,00
	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	$ 2.800.000,00	2,00	$ 5.600.000,00
	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	3,00	$ 900.000,00
	OTROS COSTOS				
	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$ 176.200,00	2,00	$ 352.400,00
	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	$ 80.000,00	3,00	$ 240.000,00
	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 140.000,00	3,00	$ 420.000,00
	Veeduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	$ 38.500,00	3,00	$ 115.500,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 14.787.900,00
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 90.756.300,00
	IVA = 19% * (C) = (D)				$ 17.243.697,00
	COSTO TOTAL = (C) + (D)				$ 107.999.997,00

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Como interventoría, se continúa realizando actividades de seguimiento, acompañamiento y supervisión a cada una de las obras suscritas entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS y las juntas de acción comunal, dentro de las actividades de las cuales realizó esta firma durante el periodo del presente informe se describen a continuación:

- Revisión y aprobación de los materiales pétreos que se continúan suministrándose a cada una de las veredas por los proveedores acordados, como también se detalló los permisos o licencias ambientales y/o explotación minera, como también, que dichos materiales estén acordes a los materiales estipulados en los diseños de mezcla de 3.000 psi.

- Se continua durante este periodo por parte de la interventoría realizando visitas técnicas junto con los residentes de obra, en cumplimiento al seguimiento y control de cada una de las actividades que se llevan en las obras. Además, por parte del residente y director de esta firma de interventoría se transmitió a los ingenieros residentes de obra recomendaciones muy puntuales en cuanto al tema de los bombeos y peraltes para cada una de las placas huellas al momento de fundirse concretos de 3.000 psi (huellas, cunetas con bordillos y vigas riostras) y de ciclópeo (franjas de 45cm y de 90cm).

- Se realizaron tomas de muestras de concreto de 3.000 psi en conjunto entre los ingenieros residentes de obra e interventoría a lo largo del tramo de intervención de construcción de placa huellas, para las juntas de acción comunal de La Esmeralda y de Bajo Platanillo.

- Se continua el chequeo visual de los materiales de ferretería acopiados en sitio de obra, donde se evidenció la calidad y las especificaciones técnicas de cada uno de ellos necesarios para la construcción de las placas huellas en las juntas de Buenos Aires Bajo, La Esmeralda y Bajo Platanillo.

- Se verificó en sitio de obra que el personal de mano de obra calificada y no calificada estuviesen debidamente afiliados al sistema de seguridad social, para las juntas que iniciaron a realizar actividades físicas en obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa para el mes de agosto el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-5* donde hace referencia el vehículo utilizado por el residente de interventoría para cada una de las veredas donde se supervisa, control y seguimiento técnico de las obras de placa huella.
(**Ver Anexo 8.15**)

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa para el mes de agosto el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-7* donde se relaciona el personal mínimo requerido de acuerdo a la propuesta económica presentada por esta firma de interventoría, necesarios para llevar a cabo la supervisión técnica de cada uno de los convenios suscritos con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.16**)

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA

Se anexa para el mes de agosto el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-9* donde se relaciona el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría.
(**Ver Anexo 8.17**)

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa para el mes de agosto el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-13* donde se relacionan las pólizas de **a)** cumplimiento general, **b)** pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y **c)** Calidad del servicio; correspondiente al contrato de interventoría No. 4136 – 2023 a la fecha.
(**Ver Anexo 8.18**)

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Otros de los documentos que se llevan periódicamente en el presente informe hace énfasis al formato de plan de cargas o reprogramación al plan de cargas del INVIAS.

- **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO**

Se anexa para el mes de agosto el formato *MEPI-MN-IN-9-FR-2* donde se evidencia el plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado para esta firma de interventoría por parte de la supervisión del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.19**)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se verificó por parte de esta firma interventora a las JAC los materiales pétreos adquiridos, y son acordes tal como se establecen en los diseños de concreto de 3.000 psi, siendo estos pétreos de buena calidad y que cumplen con las especificaciones técnicas del INVIAS.

- Que la Junta de Acción Comunal de la Vereda BAJO PLATANILLO presenta para este periodo un programado acumulado del 69,973% correspondiente a $138.547.639,28 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 76,141% correspondiente a $150.759.239,00 pesos M/CTE, lo que indica un adelanto por encima de lo programado en un 6,168% correspondiente a $12.211.599,72 pesos M/CTE.

- Que la Junta de Acción Comunal de la Vereda BUENOS AIRES BAJO presenta para este periodo un programado acumulado del 70,511% correspondiente a $140.784.678,31 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 36,588% correspondiente a $73.051.973,00 pesos M/CTE, lo que indica un atraso por debajo de lo programado en un 33,923% correspondiente a $67.732.705,31 pesos M/CTE.

- Que la Junta de Acción Comunal de la Vereda LA ESMERALDA presenta para este periodo un programado acumulado del 70,527% correspondiente a $139.644.567,98 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 100,00% correspondiente a $198.001.571,00 pesos M/CTE, lo que indica un adelanto por encima de lo programado en un 29,473% correspondiente a $58.357.003,02 pesos M/CTE, es de aclarar que se da por finalizada todas las actividades de construcción de placa huella.

- Que la Junta de Acción Comunal de la Vereda LA ESMERALDA cumplió a satisfacción con el objeto del convenio solidario, donde su alcance final del proyecto se ajustó a los 105 metros lineales de placa huella.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.1.2. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.1.3. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

8.2.1. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.2.2. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.2.3. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO

8.3.1. Copia de la bitácora de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.3.2. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.3.3. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.4. INFORMES SEMANALES

8.4.1. Informe semanal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.4.2. Informe semanal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.4.3. Informe semanal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.5.1. Maquinaria y equipo de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.5.2. Maquinaria y equipo de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.5.3. Maquinaria y equipo de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.6.1. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.6.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.7.1. Informe financiero y presupuestal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.7.2. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.7.3. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

8.8.1. Estado general del tiempo climático de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.8.2. Estado general del tiempo climático de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.8.3. Estado general del tiempo climático de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

8.9.1. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.9.2. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.9.3. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.10.1. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.10.2. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.10.3. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.11. PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.11.1. Plan de inversión de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.11.2. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

8.13.1. Seguimiento programa de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.13.2. Seguimiento programa de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.13.3. Seguimiento programa de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.14. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

8.14.1. Actas de comité de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.14.2. Actas de comité de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.14.3. Actas de comité de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.15. EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.16. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.18. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.19. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Atentamente,



ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
MP No. 19202-61820 CAU

ANEXOS

ANEXO 8.1.

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

ANEXO 8.1.1.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda La Esmeralda – CS#3379

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 - VEREDA DE LA ESMERALDA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
08/08/2024	Aceptación de oferta No. 4136 de 2023	Informe financiero CS No. 3379 de 2023 – JAC VEREDA LA ESMERALDA	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

Gmail **Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>**

IP 018 cto 4136 - Informe financiero CS No. 3379 de 2023 - JAC VEREDA LA ESMERALDA

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 8 de agosto de 2024, 5:29 p.m.
Para: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>, atencionciudadano@invias.gov.co

050-4136

Florencia, 08 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4136 de 2023
Asunto: Informe financiero CS No. 3379 de 2023 - JAC VEREDA LA ESMERALDA

Cordial saludo;

En cumplimiento de obligación de realizar vigilancia y control financiero a los recursos entregados por INVIAS a las Juntas u organismos de acción comunal – OAC, establecida en el numeral 12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR, del anexo técnico de la Invitación pública que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Formato informe de inversión y buen manejo del desembolso de mayo de 2024
- Formato informe de inversión y buen manejo del desembolso de junio de 2024
- Formato informe de inversión y buen manejo del desembolso de julio de 2024
- Formato auxiliar detallado movimientos buen manejo del desembolso de mayo de 2024
- Formato auxiliar detallado movimientos buen manejo del desembolso de junio de 2024
- Formato auxiliar detallado movimientos buen manejo del desembolso de julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4136 de 2023

7 archivos adjuntos

050-4136 informes finacieros.pdf
76K

3379 Formato Auxiliar Detallado Jul.2024.pdf
335K

3379 Formato Auxiliar Detallado May.2024.pdf
301K

3379 Formato Auxiliar Detallado Jun.2024.pdf
301K

3379 202405 Formato Informe inversión buen manejo desembolso.pdf
411K

3379 202406 Formato Informe inversión buen manejo desembolso.pdf
412K

3379 202407 Formato Informe inversión buen manejo desembolso.pdf
441K

ANEXO 8.1.2.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 - VEREDA BAJO PLATANILLO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
08/08/2024	Aceptación de oferta No. 4136 de 2023	Informe financiero CS No. 3441 de 2023 - JAC VEREDA BAJO PLATANILLO	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

Gmail **Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>**

IP 018 cto 4136 - Informe financiero CS No. 3441 de 2023 - JAC VEREDA BAJO PLATANILLO

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 8 de agosto de 2024, 5:49 p.m.
Para: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>, atencionciudadano@invias.gov.co
CC: jesal_1090@hotmail.com, duberleytoledocollazos@hotmail.com

051-4136

Florencia, 08 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4136 de 2023
Asunto: Informe financiero CS No. 3441 de 2023 - JAC VEREDA BAJO PLATANILLO

Cordial saludo;

En cumplimiento de obligación de realizar vigilancia y control financiero a los recursos entregados por INVIAS a las Juntas u organismos de acción comunal – OAC, establecida en el numeral 12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR, del anexo técnico de la Invitación pública que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Formato informe de inversión y buen manejo del desembolso de julio de 2024
- Formato auxiliar detallado movimientos buen manejo del desembolso de julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4136 de 2023

3 archivos adjuntos

051-4136 informes finacieros CS 3441.pdf
75K

3441 julio 2024 Formato Auxiliar Detallado julio.pdf
79K

3441 julio 2024 Informe inversioìn buen manejo desembolso.pdf
117K

ANEXO 8.1.3.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 - VEREDA BUENOS AIRES BAJO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
15/08/2024	Aceptación de oferta No. 4136 de 2023	Informe financiero CS No. 3760 de 2023 - JAC VEREDA LA BUENOS AIRES BAJO	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

Gmail **Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>**

IP 018 cto 4136 - Informe financiero CS No. 3760 de 2023 - JAC VEREDA LA BUENOS AIRES BAJO

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 15 de agosto de 2024, 5:26 p.m.
Para: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>, atencionciudadano@invias.gov.co

054-4136

Florencia, 15 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4136 de 2023
Asunto: Informe financiero CS No. 3760 de 2023 - JAC VEREDA LA BUENOS AIRES BAJO

Cordial saludo;

En cumplimiento de obligación de realizar vigilancia y control financiero a los recursos entregados por INVIAS a las Juntas u organismos de acción comunal – OAC, establecida en el numeral 12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR, del anexo técnico de la Invitación publica que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Formato informe de inversión y buen manejo del desembolso de julio de 2024
- Formato auxiliar detallado movimientos buen manejo del desembolso de julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4136 de 2023

3 archivos adjuntos

054-4136 informes finacieros CS3760.pdf
75K

3760 Formato Auxiliar Detallado Jul.2024.pdf
325K

3379 07. Formato Informe inversión buen manejo desembolso.pdf
431K

ANEXO 8.1.4.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 – INTERVENTORÍA A INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
14/08/2024	Aceptación de oferta No. 4136 de 2023	Informe mensual Julio de 2024	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)
14/08/2024	Aceptación de oferta No. 4136 de 2023	Acta de costos #01	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)
30/08/2024	Convenio Solidario No. 3441 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4136 de 2023	Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión ambiental inicial	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD - INVIAS)
30/08/2024	Convenio Solidario No. 3379 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4136 de 2023	Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión ambiental inicial	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD - INVIAS)

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

Gmail **Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>**

IP 018 cto 4136 - Informe mensual julio de 2024

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 14 de agosto de 2024, 8:34 a.m.
Para: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>, atencionciudadano@invias.gov.co

052-4136

Florencia, 14 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4136 de 2023
Asunto: Informe mensual Julio de 2024

Cordial saludo;

En cumplimiento del numeral 2.1 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE y del numeral 2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Invitación pública que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe mensual de Julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4136 de 2023

cto 4136 Infor mensual julio - COMPILADO.pdf

052-4136 infor mensual julio.pdf
74K

Gmail **Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>**

IP 018 cto 4136 - acta de costos #01

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 14 de agosto de 2024, 8:47 a.m.
Para: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>

053-4136

Florencia, 14 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4136 de 2023
Asunto: acta de costos #01

Cordial saludo;

En cumplimiento de la cláusula QUINTA – FORMA DE PAGO del contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

1. Hoja de ruta
2. Acta de costos #01
    - Acta de costos
    - Factura
    - RUT
3. Afectación presupuestal de obligaciones
4. Identificación de ejecución contractual
5. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría
6. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría
7. Soporte de nómina electrónica
8. Certificación Pago de obligaciones provenientes del sistema de seguridad social
    - Certificación
    - Planilla de autoliquidación de aportes
9. Informe mensual de julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4136 de 2023

2 archivos adjuntos

DTCAQ - ACTA 1 CTO 4136-2023 JULIO24.xlsx
596K

DTCAQ - ACTA 1 CTO 4136-2023 JULIO24;RP1235223.pdf
2999K

Gmail **Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>**

IP 018 cto 4136 - Gestión ambiental inicial CS No. 3441 de 2023 - JAC VEREDA BAJO PLATANILLO

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 30 de agosto de 2024, 4:04 p.m.
Para: atencionciudadano@invias.gov.co, nacevedo@invias.gov.co, jalgonzalez@invias.gov.co
CC: Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>, Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, bioadrimontoya@gmail.com

056-4136

Florencia - Caquetá , 30 de agosto de 2024

Señores
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de sostenibilidad
antecionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Convenio Solidario No. 3441 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4136 de 2023
Asunto: Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión ambiental inicial.

Cordial saludo;

Por medio de la presente, la interventoría *(ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, NIT: 7.692.245-1)* notifica que la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO con **Convenio Solidario No. 3441 de 2023,** presentó el Plan de Gestión Ambiental -PGA según la *"VERSIÓN 3 – 06/2024"* del programa Caminos Comunitarios para la Paz Total, así como los formatos: MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION AMBIENTAL y MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL y los respectivos anexos.

Siendo así, se informa que se aprueba el documento PGA y se solicita al organismo de acción comunal presentar el seguimiento y el balance de gestión ambiental para finalizar el proyecto

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4136 de 2023

2 archivos adjuntos

GESTIÓN AMBIENTAL INICIAL_ CS No. 3441 de 2023 _ Vda. BAJO PLATANILLO.zip
4510K

056-4136 OFICIO REMISIÓN GESTIÓN AMBIENTAL INICIAL _ CS No. 3441 de 2023.pdf
67K

Gmail **Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>**

IP 018 cto 4136 - Gestión ambiental inicial CS No. 3379 de 2023 - JAC VEREDA LA ESMERALDA

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 30 de agosto de 2024, 4:12 p.m.
Para: atencionciudadano@invias.gov.co, nacevedo@invias.gov.co, jalgonzalez@invias.gov.co
CC: Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>, Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, bioadrimontoya@gmail.com

057-4136

Florencia – Caquetá, 30 de agosto de 2024

Señores
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de sostenibilidad
antecionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Convenio Solidario No. 3379 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4136 de 2023
Asunto: Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión ambiental inicial.

Cordial saludo;

Por medio de la presente, la interventoría *(ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, NIT: 7.692.245-1)* notifica que la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA con **Convenio Solidario No. 3379 de 2023,** presentó el Plan de Gestión Ambiental -PGA según la *"VERSIÓN 3 – 06/2024"* del programa Caminos Comunitarios para la Paz Total, así como los formatos: MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION AMBIENTAL y MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL y los respectivos anexos.

Siendo así, se informa que se aprueba el documento PGA y se solicita al organismo de acción comunal presentar el seguimiento y el balance de gestión ambiental para finalizar el proyecto.

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4136 de 2023

GESTIÓN AMBIENTAL INICIAL_ CS No. 3379 de 2023_ Vda LA ESMERALDA.zip

057-4136 OFICIO REMISIÓN GESTIÓN AMBIENTAL INICIAL _ CS No. 3379 de 2023.pdf
67K

ANEXO 8.2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

ANEXO 8.2.1.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA **FECHA:**31/08/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 1 (Corte de acero de refuerzo de 60.000 psi)	FOTOGRAFÍA 2 (Flejes para viga riostra, acero de 420 Mpa)
	
FOTOGRAFÍA 3 (Flejes para viga riostra, acero de 420 Mpa)	FOTOGRAFÍA 4 (Capacitación ambiental con personal de obra)
	
FOTOGRAFÍA 5 (Suministro de alambre negro para placa huella)	FOTOGRAFÍA 6 (Armado de viga riostra para placa huella)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA **FECHA:**31/08/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 7 (Armado de viga riostra para placa huella)	FOTOGRAFÍA 8 (Visita técnica por Invias junto con interventoría)
	
FOTOGRAFÍA 9 (Visita técnica por Invias junto con interventoría)	FOTOGRAFÍA 10 (Visita técnica por Invias junto con interventoría)
	
FOTOGRAFÍA 11 (Conc. ciclópeo–60% conc. 3.000 psi y 40% piedra)	FOTOGRAFÍA 12 (Visita técnica por Invias junto con interventoría)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA **FECHA:**31/08/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 13 (Conc. ciclópeo–60% conc. 3.000 psi y 40% piedra)	FOTOGRAFÍA 14 (Concreto de 3.000 psi para huella, abscisa k0+030)
	
FOTOGRAFÍA 15 (Conc. ciclópeo–60% conc. 3.000 psi y 40% piedra)	FOTOGRAFÍA 16 (Acero de refuerzo de 60.000 psi para placa huella)
	
FOTOGRAFÍA 17 (Vista general de placa huella, abscisa k0+000)	FOTOGRAFÍA 18 (Vista general de placa huella, abscisa k0+040)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA **FECHA:**31/08/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 19 (Concreto de 3.000 psi para bordillo de cuneta)	FOTOGRAFÍA 20 (Conc. ciclópeo–60% conc. 3.000 psi y 40% piedra)
	
FOTOGRAFÍA 21 (Acero de refuerzo 60.000 psi para viga riostra)	FOTOGRAFÍA 22 (Conc. ciclópeo–60% conc. 3.000 psi y 40% piedra)
	
FOTOGRAFÍA 23 (Concreto de 3.000 psi para huella, abscisa k0+075)	FOTOGRAFÍA 24 (Toma de muestras de concreto de 3.000 psi)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA **FECHA:**31/08/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 25 (Vista general de placa huella, abscisa k0+000)	FOTOGRAFÍA 26 (Vista general de placa huella, abscisa k0+060)
	
FOTOGRAFÍA 27 (Vista general de placa huella, abscisa k0+040)	FOTOGRAFÍA 28 (Vista general de placa huella, abscisa k0+080)

ANEXO 8.2.2.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO **FECHA:**31/08/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 1 (Visita técnica por Invias junto con interventoría)	FOTOGRAFÍA 2 (Visita técnica por Invias junto con interventoría)
	
FOTOGRAFÍA 3 (Visita técnica por Invias junto con interventoría)	FOTOGRAFÍA 4 (Concreto de 3.000 psi para huella, abscisa k0+000)
	
FOTOGRAFÍA 5 (Concreto de 3.000 psi para huella, abscisa k0+000)	FOTOGRAFÍA 6 (Concreto de 3.000 psi para huella, abscisa k0+000)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO **FECHA:**31/08/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 7 (Revisión de ancho de huella y espesor de placa)	FOTOGRAFÍA 8 (Chequeo visual muestra de concreto de 3.000 psi)
	
FOTOGRAFÍA 9 (Acero de refuerzo de 60.000 psi para huella)	FOTOGRAFÍA 10 (Acero 420 Mpa y concreto 21 Mpa)
	
FOTOGRAFÍA 11 (Conc. ciclópeo–60% conc. 3.000 psi y 40% piedra)	FOTOGRAFÍA 12 (Vista general de avance de obra de placa huella)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO **FECHA:**31/08/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 13 (Conc. ciclópeo–60% conc. 3.000 psi y 40% piedra)	FOTOGRAFÍA 14 (Concreto de 3.000 psi para cuneta, abscisa k0+070)
	
FOTOGRAFÍA 15 (Toma de muestras de concreto para laboratorio)	FOTOGRAFÍA 16 (Acero de refuerzo de 60.000 psi para placa huella)
	
FOTOGRAFÍA 17 (Vista general de placa huella, abscisa k0+080)	FOTOGRAFÍA 18 (Vista general de placa huella, abscisa k0+112)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO **FECHA:**31/08/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 19 (Vista general de placa huella, abscisa k0+112)	FOTOGRAFÍA 20 (Vista general de placa huella, abscisa k0+112)
	
FOTOGRAFÍA 21 (Chequeo de espesor de placa huella, e=15cm)	FOTOGRAFÍA 22 (Concreto de 3.000 psi para huella, abscisa k0+072)
	
FOTOGRAFÍA 23 (Vista general de placa huella, abscisa k0+060)	FOTOGRAFÍA 24 (Vista general de placa huella, abscisa k0+030)

ANEXO 8.2.3.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO **FECHA:**31/08/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 1 (Punto crítico existente, vía que conduce a la vereda)	FOTOGRAFÍA 2 (Acopio de materiales pétreos en sitio de obra)
	
FOTOGRAFÍA 3 (Acopio de materiales pétreos en sitio de obra)	FOTOGRAFÍA 4 (Vista general tramo de intervención, placa huella)
	
FOTOGRAFÍA 5 (Acopio de materiales pétreos en sitio de obra)	FOTOGRAFÍA 6 (Sub-base granular extendida y compactada)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO **FECHA:**31/08/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 7 (Sub-base granular extendida y compactada)	FOTOGRAFÍA 8 (Sub-base granular extendida y compactada)
	
FOTOGRAFÍA 9 (Subbase granular extendida y compactada, e=15cm)	FOTOGRAFÍA 10 (Acopio de material de ferretería, cemento)
	
FOTOGRAFÍA 11 (Acero de refuerzo de 60.000 psi en stock)	FOTOGRAFÍA 12 (Acero de refuerzo de 60.000 psi en stock)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO **FECHA:**31/08/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 13 (Acero de refuerzo de 60.000 psi y cemento en stock)	FOTOGRAFÍA 14 (Alambre negro para amarre de acero de 420 Mpa)
	
FOTOGRAFÍA 15 (Punto crítico existente, vía que conduce a la vereda)	FOTOGRAFÍA 16 (Punto crítico existente, vía que conduce a la vereda)


ANEXO 8.3.

COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO

ANEXO 8.3.1.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

40% piedra) * Se continua desencofe y instalacion de formaleta para placa huella.



01/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal de Obra: *1 maestro
*7 Ayudantes
*1 Residente de obra
*1 Residente de Interventoria

Mqq. y Equipos: *1 mezcladora 1.5 bultos
*1 pulidora.

ACTIVIDADES: *Se continua fundicion en concreto ciclopeo en el sector K0+030:
*Se continuan la colocacion de formaletas de los tramos de huella y contrahuella.




02/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
PERSONAL OBRA: *1 maestro
*7 ayudantes
MAQ. y EQUIPOS: *1 mezcladora 1.5 bultos
*1 pulidora.
ACTIVIDADES: * Concreto de 3000 psi para coretas en la abscisas K0+32
* Armado de formaletas para tramos de huellas y contrahuellas
* Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo de 60000 psi para huellas y vigas riostra.

03/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: soleada
PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes
MAQ y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos

Scanned with CamScanner


* 1 polidora.

ACTIVIDADES: * Se realiza fundición de concreto de 3000 psi para bordillos Abscisas K0+020.



04/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Soleada

Día Dominical.



05/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Soleada.

PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes.

MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 7S bultos
* 1 polidora.

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES: * Se realiza fundicion de concreto de 3.000 psi para huellas y cadópeo en el tramo de Km0+085 al Km0+070.
* Armado de formaleta para huella y cunetas. * Corte, figurado e instalacion de acero de refuerzo de 60.000 psi.

06/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvioso
Tarde: Nublado.

PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes

MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 pulidora.

ACTIVIDADES: * Se realiza fundicion de concreto de 3.000 psi para placa huella en las descansos Km0+070 al Km0+060. * Se continuan con el armado de for-

maletas para huellas y cunetas.
* Se continuan los trabajos de corte, figurado e instalacion de acero de refuerzo de 60.000 psi.

07/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluviosa
Tarde: Nublada.

PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 1 ayudantes.

MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 pulidora

ACTIVIDADES: * Se realizo la fundicion de concreto ciclopeo entre las abscisas Km 0+085 al Km 0+090. * Se continuan trabajos de colocacion de formaletas para bordillos, cunetas y placa huellas.

08/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvioso
Tarde: Nublada
PERSONAL OBRA: *1 maestro
*7 ayudantes.
MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 pulidora.
ACTIVIPADES: * fundición de concreto ciclópeo en el sector Koto70 al Koto60. * Formaleta para huellas y cunetas con bordillos. * Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi.

09/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado.
PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes.
MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos.
* (7 ayudantes) 1 pulidora.

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES: * Se realiza la fundición de placas en concreto de 3.000 psi entre las abscisas K0+085 al K0+060.
* Se continuan trabajos de formaletas para placas huellas * Armado de vigas nivelación de acero de refuerzo de 60.000 psi.

10/08/2024 Registro de Novias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleada.

PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes.

MAQ Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 pulidora.

ACTIVIDADES: * Se realiza fundición de bordillos en concreto de 3000 psi en el sector de las abscisas K0+085 al K0+060.
* Armado de formaletas para

huellas, tuneles y bordillos * Corte, figurado e instalacion de acero de refuerzo de 60.000 psi.

11/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleada.

PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes.

MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 pulidora

ACTIVIDADES: * Riego de agua, * Armado de acero de refuerzo de 60.000 psi, colocacion de Formaletas clase placa huella

12/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleada
PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes
MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 polidora
ACTIVIDADES: * Se realiza fundición de concreto de 3.000 psi para placa huella entre las abscisas K0+060 a K0+045. * Armado de Formaleta para huellas y contrahuella.

13/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvioso
Tarde: Nublado
PERSONAL DE OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes.
MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 pulidora
ACTIVIDADES: * Se realiza la fundición

Scanned with CamScanner

de concretos de 3000 psi entre las abscisas K0+045 al K0+035.
*Armado de Formaleta para huellas cunetas y bordillos.

14/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleada.
PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes.
MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 pulidora
ACTIVIDADES: * Se realiza la fundición de concreto ciclopeo entre las abscisas R0+060 al K0+045.
* Descimbre de formaletas y armado de formaletas.

Scanned with CamScanner

15/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluviosa
Tarde: Nubada
PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 1 ayudantes.
MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.0 bultos
* 1 pulidora.
ACTIVIDADES: * Se realiza fundicion de concretos de ciclopeo entre las abscisas ko+045 al ko+035.
* Armado de formaleta para huellas, cunetas, bordillos y ciclopeo.

16/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Nublado.
PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 1 ayudantes
MAQ. Y. EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 pulidora.
ACTIVIDADES: * Se realiza fundicion

Scanned with CamScanner

de concreto de 3.000 psi para cunetas entre las abscisas Km0+060 al Km0+035.* Armado de formaleta y corte, figurado e instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi.

17/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Soleada.

PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 1 ayudantes

MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 polidora

ACTIVIDADES: * Se realiza fundición de concretos de 3.000 psi entre las abscisas Km0+060 al Km0+035.

18/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleada
tarde: soleada

Día Dominical.

19/08/2024 Registro de lluvias. Mañana: Soleada
Tarde: Lluviosa.

PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes.

MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 polidora


ACTIVIDADES: * Realiza la fundicion de concreto de 3.000 psi para huellas y cunetas entre las abscisas K0+035 al K0+020. * Colocacion de formaletas de huellas y cunetas.

20/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluviosa
tarde: Nublado.
PERSONAL OBRA: * 1 maestro.
* 7 ayudantes.
MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 polidora
ACTIVIDADES: * Se realiza fundición de concreto de 3000 psi para huella y cuneta con bordillos entre las abscisas K0+020 a K0+010.
* Armado de formaleta para huellas cunetas

21/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleada.
PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes
MAQ. Y. EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 polidora

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES: * Se realiza fundición de concreto de ciclópeo entre las abscisas K0+035 al K0+020.




22/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluviosa
Tarde: Nublada

PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes

MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 polidera

ACTIVIDADES: * Se realiza fundición de concreto ciclópeo entre las abscisas K0+020 al K0+010.
* Se continuah armado de formaleta y armado de acero de refuerzo de 60.000 psi para huellas.



Scanned with CamScanner

23/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Nublada.
Personal obra: * 1 maestro
* 7 ayudantes
MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos.
* 1 polidora.
ACTIVIDADES: * Se realiza fundición de concretos de 3.000 psi para cunetas entre las abscisas K0+035 al K0+010. * Se realizan trabajos de armar de hierro de refuerzo para cunetas, vigas riostras y placas de huella.

24/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Nublado.
Personal obra: * 1 maestro
* 7 ayudantes.
MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos

Scanned with CamScanner

* 1 polidora.

ACTIVIDADES: * Se realiza fundicion de concretos de 3000 psi para bordillos entre las abscisas K0+035 al K0+010. * Formaletas de armados para cunetas y huellas.

25/08/2028 Registro de lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Soleada.

PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes

MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 polidora

ACTIVIDADES: * No se realizaran actividades, Dia Dominical

26/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Nublada

PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes

MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 pulidora.

ACTIVIDADES: * Por parte de Interventoría se han revisado abarros en la junta se proyecta de 98 m2 a 705 ml de placa huella: Por lo que se continua formaleteando para más vigas nostras, cunetas, huellas y bordillos. * Se realiza fundición de concreto de 3.000 psi para huella y cunetas entre abscisas K1+010 al K1+000.

27/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleada.
PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes
MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 polidera
ACTIVIDADES: * Se realiza fundición de concreto de 3.000 psi para cunetas y bordillos. entre las abscisas K0+000 al +150-005..
* Se continuán armado de formaletas para placas huellas

28/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleada.
PERSONA OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes.
MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 polidora.

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES: * fundicion de Concreto de ciclópeo entre las abscisas K0+010 a K0+000.
* Formaleta para placa huella y armada de acero de refuerzo de 60.000 psi.

29/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluviosa
Tarde: Nublada

PERSONAL DE OBRA: * 1 maestro
* 1 ayudantes

MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 polidora.

ACTIVIDADES: * Se realiza fundicion de concreto ciclópeo entre abscisas K0+000 al K0-005.
* se adelantaron actividades de corte, figurado y armado de

acero de refuerzo de 60.000 psi.

30/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleada.

PERSONAL OBRA: * 1 maestro
* 7 ayudantes

MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 1.5 bultos
* 1 pulidora.

ACTIVIDADES: * Se realiza fundicion de concreto de 3.000 psi para cunetas y bordillos entre las abscisas K0+010 al K0-005.

31/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: soleado

PERSONAL OBRA: *1 maestro

Scanned with CamScanner

* 7 ayudantes

MAQ. Y EQUIPOS: * 1 mezcladora 7.5 bultos
* 1 polidora

ACTIVIDADES: * Se realiza fundicion de concreto de 3.000 psi para bordillos de cunetas entre las abscisas K0+010 al K0-004.
* Se da finalizacion de obras de placa huella

Ing.

ANEXO 8.3.2.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

01/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde. Soleado.

Personal de obra: * 1 maestro
* 6 ayudantes
* 1 residente de obra
* 1 residente de Interventoria.

Maq. y Equipos: * 1 mezcladora de 1.5 bultos
* 1 polidora
* 1 planta eléctrica

Actividades: Se continua construcion campamento necesario para almacenamiento de materiales, Se continua ademas cortando, figurando acero de refuerzo de 60.000 PSI.

2/08/2024 Registro de llovias: Mañana: Soleado
Tarde: soleado.

Personal de obra: * 1maestro

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

* 6 ayudantes
* 1 Residente obra
* 1 Residente Interventoria

Maq. y Equipos: * 1 mezcladora.
* 1 polidora
* 1 planta eléctrica

Actividades: Se continua construcion de campamento necesario para almacenamiento de materiales de obra.

03/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: soleado
Tarde: soleado.

Personal de obra: 1 maestro
6 Ayudantes

Maq. y Equipos: 1 mezcladora 7.5 bultos
1 Polidora
1 Planta electrica

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES: * Acopio de materiales pétreos;
* Continuación de armado de campamento.

04/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes

Maq. y Equipos: 1 mezcladora
1 Pulidora
1 Planta eléctrica.

ACTIVIDADES: Se realiza armado de ferralleta y corte de acero de refuerzo de 60.000 psi para Fundición de concretos. Se realiza ingreso y acopio de materiales pétreos.

Scanned with CamScanner

5/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes.
Maq. y Equipos: 1 Mezcladora 1.5 bultos
1 polidora
1 planta eléctrica
ACTIVIDADES: * Se continoo armado de formaleta, suministro, figurado y corte de acero de refuerzo de 60.000 psi para fundición de concretos. Se acopia materiales pétreos.

6/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de obra: * 1 maestro
* 6 Ayudantes.
Maq. y Equipos: 1 mezcladora
1 Polidora

Scanned with CamScanner

1 Planta eléctrica

ACTIVIDADES: * Se continua armado de formaleta, suministro, figurado. y corte de acero de refuerzo de 60.000 psi para fundición de cementos de 3.000 psi y ciclópeo. Acopio de materiales pétreos.

7/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: sabado
Tarde: soleado.

Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes

Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 pulidora
1 planta eléctrica.

ACTIVIDADES: * Se realiza armado de formaleta.
Suministro, figurado y

INDUCONTABLES


Scanned with CamScanner

corte de acero de refuerzo de 60.000 psi.

8/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: soleado.
Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes.
Maq y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultas
1 planta eléctrica
1 soldadora.
ACTIVIDADES: Se continua armado de formaleta, suministro, figurado. y corte de acero de refuerzo de 60.000 psi.

9/8/2024 Registro de lluvias: Mañana. Soleado
Tarde: Soleado

Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes.
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos.
1 planta eléctrica
1 pulidora
ACTIVIDADES: *Se continua armado de formaleta.
* Corte y figurado de acero de refuerzo de 60.000 psi;
* Acopio de materiales pétreos.



30/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas
Tarde: Lluvias Moderadas.
Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes.
Maq. y equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 planta eléctrica
1 pulidora.

INDUCONTABLES


Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES: * Se continua armado de formaletas para huellas y cunetas.
* Corte y figurado de acero de refuerzo de 60.000 psi
* Acopio de materiales pétreos.

11/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas
Tarde: Soleado.
Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultes
1 planta eléctrica
1 pulidora.
ACTIVIDADES: Concreto de 3.000 psi para huellas y cunetas desde abscisa K0+030 a K0+055,2 y acero de refuerzo de 60.000 psi.

Scanned with CamScanner

* Concreto ciclópeo entre abscisa K0+030 - K0+32,5




12/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas
Tarde: Lluvias moderadas

Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes

Maq y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 planta eléctrica
1 pulidora.

ACTIVIDADES: Concreto de 3.000 psi, acero de refuerzo y concreto ciclópeo entre las abscisas K0+32,5 a K0+058.



INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

13/8/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 Planta eléctrica
1 pulidora.
ACTIVIDADES: * Acero de refuerzo con su corte y figurado, concreto de 3000 psi, colocación de formaletas para zonas de huellas y cunetas entre las abscisas Km0+058 a Km0+075.

14/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: soleado
Tarde: Soleado
Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes.

Scanned with CamScanner

Maq. y Equipos: * 1 mezcladora 75 bultos
* 1 planta eléctrica
* 1 pulidora.

ACTIVIDADES: * Corte, figurado e Instalacion de acero de refuerzo de 60000 psi, concreto 3.000 psi y colocacion de formaletas para huellas y cunetas entre las abscisas. K0+075 a K0+085

15/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
tardes: Soleado.

Personal de Obra: 1 maestro
6 ayudantes

Maq. y Equipos: 1 mesclabora 1.5 bultos
1 planta eléctrica
1 pulidora

ACTIVIDADES: * corte, figurado, e Instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi, concreto de 3.000 psi, formaleta en madera para huellas

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

y conetas entre las abscisas Km 0+085 a Km 0+92.

16/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal de obra: 1 Maestro
6 Ayudantes

Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 planta eléctrica
1 pulidora.

ACTIVIDADES: * Corte, figurado e instalacion de acero de refuerzo de 60.000 psi, Concreto de 3.000 psi, Formaletas en madera para huellas y conetas entre abscisas Km 0+092 a Km 0+105.

17/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes

Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos.
1 planta eléctrica
1 polidera.

ACTIVIDADES: * Corte, figurado e Instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi, concreto de 3.000 psi, formaleta en madera para huellas y cunetas, concreto ciclópeo entre las abscisas K0+105 a K0+112.

18/8/2024 Día Dominical.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

19/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes.
Maq. y Equipos: 1 mezcladora
1 planta eléctrica
1 polidora.
ACTIVIDADES: Corte, figurado e instalación, de acero de refuerzo de 60000 psi, formaleta en madera y concreto de 3.000 psi para huellas, cunetas y concreto ciclópeo entre las abscisas K0+112 a K0+105.

20/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes.

Scanned with CamScanner

Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos.
1 planta eléctrica
1 pulidora

ACTIVIDADES: * Corte, figurado e Instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi, formaleta en madera. y concreto de 3.000 psi y ciclopeo para huellas y cunetas entre las abscisas K0+105 a K0+096.

21/8/2024 Registro de lluvias: mañana: Soleado
tarde: Soleado.


Personal de obra. 1 maestro
6 ayudantes.

Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultes
1 planta eléctrica
1 pulidora.


INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES: Concreto ciclópeo sobre franja central.
Aseo general.



22/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes.
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 planta eléctrica
1 perforadora
ACTIVIDADES: * Concreto ciclópeo sobre franja central.
Aseo general.



Scanned with CamScanner

23/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de Obra: 1 maestro
6 ayudantes.
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 planta eléctrica
1 pulidora.
ACTIVIDADES: * Concreto ciclópeo para franja central.
* Aseo general

24/8/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de Obra. 1 maestro
6 ayodantes.
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 planta eléctrica
1 pulidora.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES: * Concreto ciclópeo franja central.
* Corte, figurado de acero de refuerzo de 60.000 psi.

25/8/2024 Día Dominical

26/8/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes.
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 planta eléctrica
1 pulidora

ACTIVIDADES: * Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi, formaleta en madera, y concreto de 3.000 psi para huellas y cunetas entre las abscisas K0+096 a K0+087.

27/8/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes.
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 7.5 bultos.
1 planta eléctrica
1 polidera.
ACTIVIDADES: Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi, formaleta en

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

madera, y concreto de 3.000 psi para huellas y cunetas entre abscisas Ko+087 a Ko+071.

28/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: soleado.

Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes

Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 planta eléctrica
1 pulidora

ACTIVIDADES: * Corte, figurado e instalacion de acero de refuerzo de 60.000 psi, formaleta de madera, concreto de 3.000 psi. y adópeo para huellas. y cunetas entre las abscisas.

Scanned with CamScanner

Km0+071 a Km0+059.

29/8/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes.
Maq. y Equipos: 1 mezcladora. 7.5 bultos
1 planta eléctrica
1 pulidora
ACTIVIDADES: Corte, figrado e instalacion de acero de refuerzo de 60.000 psi, formaleta en madera, concreto de 3.000 psi y ciclopeo en zonas para huellas y cunetas entre abscisas Km0+059 a Km0+044.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

30/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de obra: 1 maestro
6 ayudantes
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 7.5 bultos
1 planta eléctrica
1 polidera.
ACTIVIDADES: * Corte, figurado e instalacion de acero de refuerzo de 60.000 psi; formaleta en madera concreto ciclopeo y concreto de 3.000 psi para huellas y enetas entre las abscisas K0+044 a K0+032.

31/8/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de obra: 1 maestro

Scanned with CamScanner

6 ayudantes.

ACTIVIDADES: * Aseo general y detalles de terminado de concretos de huellas y cunetas
* Colocacion de formaleta y excavaciones zanjas. para vigas riostras.

7/9/2024 Dia Dominical

2/9/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de obra: 1 maestro

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

ANEXO 8.3.3.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

01/08/2024 Registro lluvias. Mañana: Soleado
Tarde: Nublado.

NOTA: Se continua restauracion y reforzamiento de puente en madera existente por parte de la comunidad de la vereda Bienes aires.

02/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

NOTA: Se continua restauracion y reforzamiento de puente en madera existente por parte de JAC de Buenos Aires bajo.

03/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Nublado
Tarde: Soleado

Scanned with CamScanner

NOTA: Se continua restauración y reforzamiento de puente en madera. existente por parte de la JAC de la vereda de Buenos Aires Bajo.

04/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Nublado
Tarde: Soleado.

NOTA: Se descansa, Día dominical.


05/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
tarde: Soleado

NOTA: No se adelantaron actividades.


INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner


06/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia
Tarde: Nublado
NOTA: No se adelantaron actividades.



07/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia
Tarde: Nublado.
NOTA: No se adelantaron actividades.




08/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia
Tarde: Nublado
NOTA: No se reporta actividades




Scanned with CamScanner


09/08/2024 Registros lluvias: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
NOTA: No se reportan actividades



10/08/2024 Registros lluvias: Mañana: Soleada
tarde: Soleada.
NOTA: No se reportan actividades.



11/08/2024 Registros lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Soleada
NOTA: Día Dominical.



INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

12/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Lluvia suave
NOTA: Se ingresan materiales pétreos como sub-base granular.

13/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia
Tarde: Nublado
NOTA: Se continuan materiales pétreos como Sub-base granular.

14/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleada.
NOTA: Se continua ingreso o acopio de materiales pétreos.

Scanned with CamScanner

15/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia
Tarde: Nublado.
NOTA: Se Ingresan materiales de pétreos para sub-base. Acopio en sitio de obra.

16/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Nublado
NOTA: Se acopia materiales pétreos como material granular sub-base.

17/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Nublado.
NOTA: Nose reporta actividades.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

18/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
NOTA: Se acopio de material granular en sitio de obra.

19/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Lluvia
NOTA: Se continua acopio de materiales petreos.

20/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Llovia
Tarde: Nublado.
NOTA: Se ingresan materiales de Forestora.

Scanned with CamScanner

21/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: soleada.
NOTA: Se continuan el ingreso de materiales de ferretería en la vereda de Buenos Aires Bajo.

22/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia
Tarde: Nublado
NOTA: No se reporta actividades.

23/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Nublado
NOTA: No se reporta actividades.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner


24/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Nublado.
NOTA: Se continua acopio de materiales pétreos, arena, grava y sub-base.

25/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
NOTA: Dia dominical.


26/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleada
Tarde: Nublada.
NOTA: Se continua ingreso o acopio de materiale granulares

Scanned with CamScanner

27/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Nublado
NOTA: No se reporta actividades



28/08/2024 Registro lluvias: mañana: Soleado
Tarde: Soleado
NOTA: Se reporta ingreso de maquinaria cosurita y benitin.




29/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleade
ACTIVIDADES: * Se realiza extendido de material granular sub-base a lo largo del ramo de intersección y construcción

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner


de placa Huella

* Se realiza compactacion de material sub-base granular con equipo benitin.




30/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleada.

* No se reporta actividades en obra



31/08/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

*No se reporta actividades en obra



Scanned with CamScanner

ANEXO 8.4.

INFORMES SEMANALES

ANEXO 8.4.1.

Informe semanal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	11/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 19 del 5/08/2024 al 11/08/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3379 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 89.623.431,10	45,264%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 86.298.671,00	43,585%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.324.760,10)	-1,679%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.683.152,04	10,951%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.205.325,00	22,831%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 45,264% Avance o Atraso Físico % -1,679%
Meta Física Ejecutada % 43,585%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	45,73				46,7%
Ejec	42,71				43,6%
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Benitin	1	
Motoniveladora	1	
Volqueta	2	1
Pulidora	1	1
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda La Esmeralda de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La esmeralda – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS ENTRE EL ABSCISADO DE K0+000 A K0+045 MARGEN IZQUIERDA (BAJANDO) Y SOBRE MARGEN DERECHA HASTA ABSCISA K0+032 (BAJANDO).

2) COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CONCRETO CICLÓPEO, SOBRE MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA.

3) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CUNETA ENTRE EL ABSCISADO DE K0+000 A K0+045 MARGEN IZQUIERDA (BAJANDO) Y SOBRE MARGEN DERECHA HASTA ABSCISA K0+032 (BAJANDO).

4) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO CICLÓPEO (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA) DE ANCHO 90CM Y 45CM ENTRE EL ABSCISADO DE K0+000 A K0+045 MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) CONTINUAR CON COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y PARA CONCRETO CICLÓPEO.

2) CONTINUAR CON EL CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLO, TANTO LONGITUDINAL COMO TRANSVERSAL.

3) CONTINUAR CON LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DEL CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS, AL IGUAL QUE EL CONCRETO CICLÓPEO.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Rampa en cocnreto 3.000 psi, ubicada en zona alta



Seguimiento y control técnico por parte de interventoría en obra



Vista general de placa huella, abscisa K0+020

NOTA: - Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	18/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 20 del 12/08/2024 al 18/08/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3379 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 106.297.143,39	53,685%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 118.701.861,00	59,950%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 12.404.717,61	6,265%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.673.712,29	8,421%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 32.403.189,00	16,365%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 53,685% Avance o Atraso Físico % 6,265%
Meta Física Ejecutada % 59,950%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	52,27				53,3%
Ejec	58,75				59,9%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora	1	1
Pulidora	1	1
Volqueta	2	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda La Esmeralda de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La esmeralda – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI	X NO
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	2
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS ENTRE EL ABSCISADO DE K0+045 A K0+067 MARGEN IZQUIERDA (BAJANDO) Y SOBRE MARGEN DERECHA HASTA ABSCISA K0+067 (BAJANDO).

2) COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CONCRETO CICLÓPEO, SOBRE MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA.

3) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CUNETA ENTRE EL ABSCISADO DE K0+045 A K0+067 MARGEN IZQUIERDA (BAJANDO) Y SOBRE MARGEN DERECHA HASTA ABSCISA K0+067 (BAJANDO).

4) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO CICLÓPEO (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA) DE ANCHO 90CM Y 45CM ENTRE EL ABSCISADO DE K0+045 A K0+067 MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) CONTINUAR CON COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y PARA CONCRETO CICLÓPEO.

2) CONTINUAR CON EL CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLO, TANTO LONGITUDINAL COMO TRANSVERSAL.

3) CONTINUAR CON LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DEL CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS, AL IGUAL QUE EL CONCRETO CICLÓPEO.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Acero de refuerzo para huellas



Concreto 3.000 psi para bordillos



Vista general de placa huella, abscisa K0+042

NOTA: - Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	25/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 21 del 19/08/2024 al 25/08/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3379 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 122.970.855,69	62,106%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 135.127.530,00	68,246%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 12.156.674,31	6,140%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.673.712,29	8,421%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.425.669,00	8,296%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 62,106% Avance o Atraso Físico % 6,140%
Meta Física Ejecutada % 68,246%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	58,80				60,0%
Ejec	66,88				68,2%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora	1	1
Pulidora	1	1
Volqueta	2	1
Total	4	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda La Esmeralda de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La esmeralda – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	2
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS ENTRE EL ABSCISADO DE K0+067 A K0+080 MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA.

2) COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CONCRETO CICLÓPEO, ENTRE EL ABSCISADO DE K0+067 A K0+080 SOBRE MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA.

3) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CUNETA ENTRE EL ABSCISADO DE K0+067 A K0+080 MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA.

4) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO CICLÓPEO (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA) DE ANCHO 90CM Y 45CM ENTRE EL ABSCISADO DE K0+067 A K0+080 MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) CONTINUAR CON COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y PARA CONCRETO CICLÓPEO.

2) CONTINUAR CON EL CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLO, TANTO LONGITUDINAL COMO TRANSVERSAL.

3) CONTINUAR CON LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DEL CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS, AL IGUAL QUE EL CONCRETO CICLÓPEO.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general de placa huella, abscisa k0+060



Concreto 3.000 psi para huella



Vista general de señalización en sitio de obra

NOTA: - Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA 1110521785 de Ibague

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	1/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 22 del 26/08/2024 al 1/09/2024 Último Informe Semanal SI☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA
INTEGRANTES: N/A
CONVENIO No. 3379 de 2023 VALOR INICIAL: $ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4136 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO: 10/11/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 139.644.567,98	70,527%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 198.001.571,00	100,000%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 58.357.003,02	29,473%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.673.712,29	8,421%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 62.874.041,00	31,754%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 70,527% Avance o Atraso Físico % 29,473%
Meta Física Ejecutada % 100,000%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	65,33				66,7%
Ejec	98,00				100,0%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora	1	1
Pulidora	1	1
Volqueta	2	1
Total	4	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda La Esmeralda de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La esmeralda – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	2
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS ENTRE EL ABSCISADO DE K0+080 A K0+105 MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA.

2) COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CONCRETO CICLÓPEO, ENTRE EL ABSCISADO DE K0+080 A K0+105 SOBRE MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA.

3) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CUNETA ENTRE EL ABSCISADO DE K0+080 A K0+105 MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA.

4) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO CICLÓPEO (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA) DE ANCHO 90CM Y 45CM ENTRE EL ABSCISADO DE K0+080 A K0+106 MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) DAR INICIO DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.

2) DAR INICIO DE ENTREGA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE LA SUPERVICIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general de placa huella, abscisa k0+030



Vista general de placa huella, abscisa k0+060



Vista general de placa huella, abscisa k0+095

NOTA: - Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.4.2.

Informe semanal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	11/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 19 del 5/08/2024 al 11/08/2024 Último Informe Semanal SI☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3441 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 87.368.123,20	44,125%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 55.227.590,00	27,893%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (32.140.533,20)	-16,232%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.342.589,34	10,779%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.653.820,00	8,916%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 44,125% Avance o Atraso Físico % -16,232%
Meta Física Ejecutada % 27,893%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	109,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	48,10				44,1%
Ejec	30,40				27,9%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	-
Volqueta	2	1
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	1
Pulidora	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Bajo Platanillo en Km 45+000 de la vía – Cruce la Sevilla hacia La Anguilla –Milán código: 185030

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MTERIALES PÉTREOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS ENTRE EL ABSCISADO DE K0+000 A K0+033 MARGEN DERECHA (BAJANDO).

2) COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CONCRETO CICLÓPEO, SOBRE MARGEN DERECHA (BAJANDO).

3) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CUNETA ENTRE EL ABSCISADO DE K0+000 A K0+033 MARGEN DERECHA (BAJANDO).

4) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO CICLÓPEO (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA) DE ANCHO 45CM ENTRE EL ABSCISADO DE K0+000 A K0+033 MARGEN DERECHA (BAJANDO).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) CONTINUAR CON COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y PARA CONCRETO CICLÓPEO.

2) CONTINUAR CON EL CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLO, TANTO LONGITUDINAL COMO TRANSVERSAL.

3) CONTINUAR CON LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DEL CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS, AL IGUAL QUE EL CONCRETO CICLÓPEO.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Colocación de formaletas para huellas y cunetas



Concreto ciclópeo y concreto 3.000 psi para huellas y cunetas



Vista general de señalización general en obra

NOTA: - Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	18/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 20 del 12/08/2024 al 18/08/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3441 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 104.428.008,56	52,741%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 93.115.210,00	47,028%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11.312.798,56)	-5,713%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.059.815,36	8,616%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37.887.619,00	19,135%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 52,741% Avance o Atraso Físico % -5,713%
Meta Física Ejecutada % 47,028%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	109,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	57,49				52,7%
Ejec	51,26				47,0%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	-
Volqueta	2	1
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	1
Pulidora	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Bajo Platanillo en Km 45+000 de la vía – Cruce la Sevilla hacia La Anguilla –Milán código: 185030

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MTERIALES PÉTREOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS ENTRE EL ABSCISADO DE K0+033 A K0+112 MARGEN DERECHA (BAJANDO).

2) COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CONCRETO CICLÓPEO, SOBRE MARGEN DERECHA (BAJANDO).

3) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CUNETA ENTRE EL ABSCISADO DE K0+033 A K0+112 MARGEN DERECHA (BAJANDO).

4) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO CICLÓPEO (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA) DE ANCHO 45CM ENTRE EL ABSCISADO DE K0+033 A K0+112 MARGEN DERECHA (BAJANDO).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) CONTINUAR CON COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y PARA CONCRETO CICLÓPEO.

2) CONTINUAR CON EL CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLO, TANTO LONGITUDINAL COMO TRANSVERSAL.

3) CONTINUAR CON LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DEL CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS, AL IGUAL QUE EL CONCRETO CICLÓPEO.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Señalización en obra



Concreto ciclópeo y concreto 3.000 psi para huellas y cunetas



Formaleta para huellas y cunetas

NOTA: - Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	25/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 21 del 19/08/2024 al 25/08/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3441 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 121.487.823,92	61,357%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 113.320.738,00	57,232%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (8.167.085,92)	-4,125%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.059.815,36	8,616%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.205.528,00	10,205%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 61,357% Avance o Atraso Físico % -4,125%
Meta Física Ejecutada % 57,232%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	109,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	66,88				61,4%
Ejec	62,38				57,2%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	-
Volqueta	2	1
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	1
Pulidora	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Bajo Platanillo en Km 45+000 de la vía – Cruce la Sevilla hacia La Anguilla –Milán código: 185030

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MTERIALES PÉTREOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS ENTRE EL ABSCISADO DE K0+112 A K0+096 MARGEN IZQUIERDA (BAJANDO).

2) COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CONCRETO CICLÓPEO, SOBRE MARGEN IZQUIERDA (BAJANDO).

3) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CUNETA ENTRE EL ABSCISADO DE K0+112 A K0+096 MARGEN IZQUIERDA (BAJANDO).

4) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO CICLÓPEO (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA) DE ANCHO 45CM ENTRE EL ABSCISADO DE K0+112 A K0+096 MARGEN IZQUIERDA (BAJANDO).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) CONTINUAR CON COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y PARA CONCRETO CICLÓPEO.

2) CONTINUAR CON EL CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLO, TANTO LONGITUDINAL COMO TRANSVERSAL.

3) CONTINUAR CON LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DEL CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS, AL IGUAL QUE EL CONCRETO CICLÓPEO.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestras concreto 3.000 psi - Interventoria



Acero de refuerzo de 60.000 psi, concreto ciclópeo y concreto 3.000 psi para huellas y cunetas



Formaleta para huellas y cunetas

NOTA: - Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	1/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 22 del 26/08/2024 al 1/09/2024 Último Informe Semanal SI☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 109 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3441 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 138.547.639,28	69,973%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 150.958.348,00	76,241%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 12.410.708,72	6,268%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.059.815,36	8,616%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37.637.610,00	19,009%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 69,973% Avance o Atraso Físico % 6,268%
Meta Física Ejecutada % 76,241%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	109,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	76,27				70,0%
Ejec	83,10				76,2%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	-
Volqueta	2	1
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	1
Pulidora	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Bajo Platanillo en Km 45+000 de la vía – Cruce la Sevilla hacia La Anguilla –Milán código: 185030

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ	PERMISO MINERO: SI	X NO
	MTERIALES PÉTREOS	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS ENTRE EL ABSCISADO DE K0+096 A K0+030 MARGEN IZQUIERDA (BAJANDO).

2) COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CONCRETO CICLÓPEO, SOBRE ABSCISADO K0+096 A K0+030 MARGEN IZQUIERDA (BAJANDO).

3) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y CUNETA ENTRE EL ABSCISADO DE K0+096 A K0+030 MARGEN IZQUIERDA (BAJANDO).

4) PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DE CONCRETO CICLÓPEO (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA) DE ANCHO 45CM ENTRE EL ABSCISADO DE K0+096 A K0+030 MARGEN IZQUIERDA (BAJANDO).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) CONTINUAR CON COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y PARA CONCRETO CICLÓPEO.

2) CONTINUAR CON EL CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLO, TANTO LONGITUDINAL COMO TRANSVERSAL.

3) CONTINUAR CON LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, VACIADO Y TERMINADO DEL CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS, AL IGUAL QUE EL CONCRETO CICLÓPEO.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Colocación de formaleta para huella, margen izquierda bajando.



Vista general de Placa huella al presente informe semanal



Acero de refuerzo de 60.000 psi y concreto 3.000 psi para huellas.

NOTA: - Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.4.3.

Informe semanal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	11/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 19 del 5/08/2024 al 11/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3760 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.663.426,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.663.426,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.663.426,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.663.426,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 90.241.878,65	45,197%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 18.923.126,00	9,478%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (71.318.752,65)	-35,719%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.855.158,61	10,946%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.854,00	1,580%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 45,197% Avance o Atraso Físico % -35,719%
Meta Física Ejecutada % 9,478%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	45,73				46,7%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo topografía RTK	1	-
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	1	1,00
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	1,00
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE DA INICIO DE INGRESO DE MATERIALES DE OBRA, UNA VEZ SUPERADAS Y MEJORADA LAS CONDICIONES DE ESTADO DEL PUENTE EN MADERA.

2) TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS COMO SUB-BASE GRANULAR PARA EL TRAMO NECESARIO DE PLACA HUELLA.

3) SE CONTINUAN MEJORANDO POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES BAJO PUNTOS CRÍTICOS, QUE PERMITA EL INGRESO DE MATERIALES DE OBRA SIN DIFICULTADES.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) DAR INICIO DE ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DEL ÁREA DE PROYECCIÓN DEL TRAMO DE PLACA HUELLA.

2) EXTENDER, HUMEDECER Y COMPACTAR MATERIAL SUB-BASE GRANULAR.

3) DAR INICIO DE ACTIVIDADES ARMADO DE FORMALETAS PARA HUELLAS, CUNETAS, ETC.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Acarreo de materiales de ferretería para la obra



Apoyo manual por parte de la comunidad para ingreso de materiales



Acopio de materiales de obra en la Vereda Buenos Aires Bajo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	18/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 20 del 12/08/2024 al 18/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3760 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.663.426,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.663.426,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.663.426,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.663.426,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 107.089.478,54	53,635%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 22.076.980,00	11,057%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (85.012.498,54)	-42,578%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.847.599,89	8,438%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.854,00	1,580%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 53,635% Avance o Atraso Físico % -42,578%
Meta Física Ejecutada % 11,057%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	52,27				53,3%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo topografía RTK	1	-
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	2	2,00
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	1,00
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	2
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE CONTINUA INICIO DE INGRESO DE MATERIALES DE OBRA, UNA VEZ SUPERADAS Y MEJORADA LAS CONDICIONES DE ESTADO DEL PUENTE EN MADERA.

2) TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS COMO SUB-BASE GRANULAR PARA EL TRAMO NECESARIO DE PLACA HUELLA.

3) SE CONTINUAN MEJORANDO POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES BAJO PUNTOS CRÍTICOS, QUE PERMITA EL INGRESO DE MATERIALES DE OBRA SIN DIFICULTADES.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) DAR INICIO DE ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DEL ÁREA DE PROYECCIÓN DEL TRAMO DE PLACA HUELLA.

2) EXTENDER, HUMEDECER Y COMPACTAR MATERIAL SUB-BASE GRANULAR.

3) DAR INICIO DE ACTIVIDADES ARMADO DE FORMALETAS PARA HUELLAS, CUNETAS, ETC.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Transporte de materiales pétreos - sub-base granular



Mejoramiento de puntos críticos existentes en la via



Acopio materiales pétreos en obra - Vereda Buenos Aires Bajo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	25/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 21 del 19/08/2024 al 25/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3760 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.663.426,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.663.426,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.663.426,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.663.426,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 123.937.078,42	62,073%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 25.230.834,00	12,637%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (98.706.244,42)	-49,436%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.847.599,89	8,438%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.854,00	1,580%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 62,073% Avance o Atraso Físico % -49,436%
Meta Física Ejecutada % 12,637%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	58,80				60,0%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo topografía RTK	1	-
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	2	2
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	2
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE CONTINUA INICIO DE INGRESO DE MATERIALES DE FERRETERÍA.

2) TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS COMO SUB-BASE GRANULAR PARA EL TRAMO NECESARIO DE PLACA HUELLA.

3) SE CONTINUAN MEJORANDO POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES BAJO PUNTOS CRÍTICOS, QUE PERMITA EL INGRESO DE MATERIALES DE OBRA SIN DIFICULTADES.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) DAR INICIO DE ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DEL ÁREA DE PROYECCIÓN DEL TRAMO DE PLACA HUELLA.

2) EXTENDER, HUMEDECER Y COMPACTAR MATERIAL SUB-BASE GRANULAR.

3) DAR INICIO DE ACTIVIDADES ARMADO DE FORMALETAS PARA HUELLAS, CUNETAS, ETC.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general de lluvias fuertes, se espera 2 días de sol para ingresar volquetas



Material granular sub-base para tramo de placa huella



Materiales pétreos de arena y gravilla en stop, sitio de obra

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	1/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 22 del 26/08/2024 al 1/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3760 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.663.426,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.663.426,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.663.426,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.663.426,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 140.784.678,31	70,511%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 73.051.973,00	36,588%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (67.732.705,31)	-33,923%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.847.599,89	8,438%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 47.821.138,00	23,951%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 70,511% Avance o Atraso Físico % -33,923%
Meta Física Ejecutada % 36,588%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	58,80				60,0%
Ejec	15,00				15,3%
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo topografía RTK	1	-
Retroexcavadora Pajarita	1	-
Volqueta	2	2
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	1
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	2
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE REALIZARON ACTIVIDADES DE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN DE MATERIAL GRANULAR SUB-BASE PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DE LA PLACA HUELLA DE 98 METROS LINEALES.

2) TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS COMO ARENA Y GRAVILLA, COMO TAMBIEN MATERIALES DE FERRETERÍA (CEMENTO) PARA PLACA HUELLA.

3) SE CONTINUAN MEJORANDO POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES BAJO PUNTOS CRÍTICOS, QUE PERMITA EL INGRESO DE MATERIALES DE OBRA SIN DIFICULTADES.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLAS Y CUNETAS.

2) CONTINUAR CON EL CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA HUELLAS DE LA PLACA HUELLA.

3) CONTINUAR CON LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE FORMALETAS PARA HUELLAS Y CUNETAS PARA LA PLACA HUELLA.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Acopio de materiales de ferretería necesarios para la construcción de placa huella



Chequeo visual de espesor de capa de sub-base granular > 15cm



Extendido, humedecimiento y compactación de sub-base granular, tramo de intervención de placa huella de 98 mL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.5.1.

Maquinaria y equipo de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETÁ** **PERIODO MES:** **6**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3379 DE 2023

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE AGOSTO																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETRO EXCAVADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE RODILLO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RANA COMPACTADORA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			TOTAL ACTIVO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	93	50,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	93	50,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	-
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	93	50,00

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): NORMAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NINGUNA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma 1110521785 de Ibague

Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.2.

Maquinaria y equipo de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETÁ** **PERIODO MES:** **6**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3441 DE 2023

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE AGOSTO																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETRO EXCAVADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE RODILLO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RANA COMPACTADORA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			TOTAL ACTIVO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	93	50,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	93	50,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	-
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	93	50,00

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): NORMAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NINGUNA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Firma

1110521765 de Ibague

Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.3.

Maquinaria y equipo de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETÁ** **PERIODO MES:** **6**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3760 DE 2023

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE AGOSTO																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETRO EXCAVADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE RODILLO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RANA COMPACTADORA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			TOTAL ACTIVO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	93	50,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	93	50,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	-
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	93	50,00

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): NORMAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NINGUNA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma 1110521785 de Ibague

Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.6.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.6.1.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 6

CONVENIO SOLIDARIO No: 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4136 DE 2024 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

NOMBRE ARL: POSITIVA SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N/A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ROJAS PARRA JAIVER	1116916984	MAESTRO	$ 1.300.000	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	79923021	$ 162.500	COLPENSIONES	79923021	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
2	OYOLA PEREZ HUGO	1118023094	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	79923021	$ 162.500	PORVENIR	79923021	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	OYOLA ALVAREZ YIMMY FABIAN	1118023887	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	79923021	$ 162.500	COLPENSIONES	79923021	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	OYOLA PEREZ EDUAR FERLEY	1119214526	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	79923021	$ 162.500	COLPENSIONES	79923021	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	OQUENDO DIAZ CARLOS ARTURO	1119218192	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	79923021	$ 162.500	COLPENSIONES	79923021	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
6	GUTIERREZ SANTOS NELSON ENRIQUE	80117524	AYUDANTE	$ 2.320.000	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA	$ 2.320.000	$ 161.500	V	NUEVA EPS	79923021	$ 290.000	PROTECCIÓN (ING+PROTECCIÓN)	79923021	$ 371.200	$ 92.800	$ 46.400	$ 69.600	
7	ESPINEL VALENCIA JOSÉ ANTONIO	96303251	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	79923021	$ 162.500	COLPENSIONES	79923021	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
8	CARDOZO ARNOBIS	1118022695	AYUDANTE	$ 1.126.667					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA	$ 1.126.667	$ 78.500	V	NUEVA EPS	79923021	$ 140.900	COLPENSIONES	79923021	$ 180.300	$ 45.100	$ 22.600	$ 33.900	
9																																													
10																																													

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NINGUNA

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: HERNÁN SANCHEZ HUERTAS
Rep. Legal: Presidente de la Junta de Acción Comunal

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.6.2.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 6

CONVENIO SOLIDARIO No: 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4136 DE 2024 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

NOMBRE ARL: N/A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N/A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	YOVANI MUÑOZ SILVA	17605250	MAESTRO	$ 2.158.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	$ 575.467	$ 40.100	V	NUEVA EPS		$ 72.000	PROTECCION		$ 92.100	$ 23.100	$ 11.600	$ 17.300	
2	YESID GONZALEZ ARIZA	1117233677	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	$ 346.667	$ 15.100	IV	NUEVA EPS		$ 43.400	PORVENIR		$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
3	ARNULFO HUL SANJUAN	17656633	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	$ 346.667	$ 15.100	IV	NUEVA EPS		$ 43.400	PORVENIR		$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
4	BRAYAN MENDEZ PERDOMO	1006484377	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	$ 346.667	$ 15.100	IV	NUEVA EPS		$ 43.400	PORVENIR		$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
5	DAIMER NOGUERA FAJARDO	1006483957	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	$ 346.667	$ 15.100	IV	NUEVA EPS		$ 43.400	PORVENIR		$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
6	CARLOS ORTIZ PALOMARES	1117235947	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	$ 346.667	$ 15.100	IV	NUEVA EPS		$ 43.400	PORVENIR		$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
7	WILMER ÑAÑEZ MENDEZ	1117234029,00	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	$ 346.667	$ 15.100	IV	NUEVA EPS		$ 43.400	PORVENIR		$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
8																			
9																			
10																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

EL INGRESO DEL PERSONAL AL SITIO DE LA OBRA SE REGISTRA A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2024

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS
Rep. Legal: Presidente de la Junta de Acción Comunal

Firma
Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.6.3.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 6

CONVENIO SOLIDARIO No: 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4136 DE 2024 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

NOMBRE ARL: N/A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N/A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NO SE RELACIONA PERSONAL EN EL FORMATO, DEBIDO A QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO NO CUENTA CON MATERIALES DE FERRETERÍA EN SITIO DE OBRA.

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: GEAN CARLOS TAPIERO MONGE
Rep. Legal: Presidente de la Junta de Acción Comunal

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.7.1.

Informe financiero y presupuestal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 6

CONVENIO SOLIDARIO No: 3379 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1113323		10	NACIÓN	3379-0	$ 197.824.563,00	$ 197.824.563,00
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.001.571,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	N/A		

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.2.

Informe financiero y presupuestal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 6

CONVENIO SOLIDARIO No: 3441 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1114423		10	NACIÓN	3441-0	$ 197.824.563,00	$ 197.824.563,00
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.001.571,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	N/A		

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.3.

Informe financiero y presupuestal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 6

CONVENIO SOLIDARIO No: 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1137923		10	NACION	3760-0	$ 199.486.418,00	$ 199.486.418,00
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200.663.426,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	N/A		

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

ANEXO 8.8.1.

Estado general del tiempo climático de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 6

CONVENIO SOLIDARIO No: 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	12	24	24	12	24	24	24	24	24	18	18	18	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	24	24	24	24	24		696
Lluvias moderadas	6	0	0	12	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Lluvias intensas	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	24
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma 1110521985 de Ibagué
Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.2.

Estado general del tiempo climático de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 6

CONVENIO SOLIDARIO No: 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	12	24	24	12	24	24	24	24	24	18	18	18	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	24	24	24	24	24	696
Lluvias moderadas	6	0	0	12	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Lluvias intensas	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	24
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Firma 1110521985 de Ibagué

Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.3.

Estado general del tiempo climático de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 6

CONVENIO SOLIDARIO No: 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	12	24	24	12	24	24	24	24	24	18	18	18	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	24	24	24	24	24		696
Lluvias moderadas	6	0	0	12	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Lluvias intensas	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	24
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma 1110521985 de Ibagué
Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

ANEXO 8.9.1.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 6

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

PARA ESTE MES NO SE REPORTA RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.2.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 6

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

PARA ESTE MES NO SE REPORTA RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.3.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 6

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

PARA ESTE MES NO SE REPORTA RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.10.1.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 6

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 27/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.001.571,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.001.571,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 39.800.314,00	29/09/2023	3/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.950.079,00	29/09/2023	3/01/2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.700.471,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3749854-1

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurad	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	117%	$ 232.000.000,00	29/09/2023	31/12/2023
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0931402-2 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurad	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.2.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 6

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 28/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.001.571,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.001.571,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 39.800.314,20	19/09/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.950.078,55	19/09/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.700.471,30	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3746473-3

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	117%	$ 232.000.000,00	19/09/2023	31/12/2023
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0930728-3 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.3.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 6

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 29/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.663.426,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.663.426,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.132.685,00	5/10/2023	6/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.033.171,00	5/10/2023	6/01/2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.199.028,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3752670-2

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 10/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	$ 232.000.000,00	5/10/2023	31/12/2023
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0932022-1 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 10/10/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.

PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.11.1.

Plan de inversión de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	18/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3379 de 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 59.749.142,00	$ 44.811.856,00	$ 44.811.856,00		$ 149.372.854,00	75,4%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.481.186,00		$ 4.481.186,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.659.013,00	$ 13.244.259,00	$ 13.244.259,00		$ 44.147.531,00	22,3%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 77.408.155,00	$ 58.056.115,00	$ 62.537.301,00		$ 198.001.571,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: HERNÁN SÁNCHEZ HUERTAS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: ALVARO GASCA TORRES
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 96892-T

Contratista

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.2.

8.11.2. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	18/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3441 DE 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMACAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 59.749.142,00	$ 44.811.856,00	$ 44.811.856,00		$ 149.372.854,00	75,4%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.481.186,00		$ 4.481.186,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.659.013,00	$ 13.244.259,00	$ 13.244.259,00		$ 44.147.531,00	22,3%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 77.408.155,00	$ 58.056.115,00	$ 62.537.301,00		$ 198.001.571,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: ROBINSON ALMARIO PENAGOS
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 93901-T

Contratista

Firma:
Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.3.

8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	18/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3760 de 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 60.392.026,00	$ 45.294.019,00	$ 45.294.019,00		$ 150.980.064,00	75,6%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.529.402,00		$ 4.529.402,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.661.584,00	$ 13.246.188,00	$ 13.246.188,00		$ 44.153.960,00	22,1%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 78.053.610,00	$ 58.540.207,00	$ 63.069.609,00		$ 199.663.426,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Gean Carlos Tapiero.
Nombre: GEAN CARLOS TAPIERO MONGE
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: ALVARO GASCA TORRES
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 96892-T

Contratista

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.12.

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.12.1.

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ 1 de 2

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **6** **MES:** AGOSTO del 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3379 del 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: **100** **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 198.001.571,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

"UNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 del 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
Nota de Contabilidad 004	31/08/2024	Banco de Occidente	Gastos bancarios e Impuestos	$ 476.851,71	$ -	$ -	$ -	$ 476.851,71	3	Gastos Administrativos
021	5/08/2024	Benavides Duran Polania	Transporte materiales de construcción	4.100.000,00	-	41.000,00	-	4.059.000,00	1	Costo directo de obra
022	5/08/2024	RPM Suministros y Dotaciones S.A.S	Elementos de protección personal	212.000,00	-		-	212.000,00	3	Gastos Administrativos
023	5/08/2024	Benavides Duran Polania	Transporte material granular	11.900.000,00	-	119.000,00	-	11.781.000,00	1	Costo directo de obra
024	5/08/2024	Isidro Sanchez Huertas	Liquidación contrato de obra o labor	26.838,00	-		-	26.838,00	1	Costo directo de obra
025	5/08/2024	MI PLANILLA	Seguridad Social y Aportes Parafiscales - COSTO DIRECTO	1.214.500,00	-	-	-	1.214.500,00	1	Costo directo de obra
025	5/08/2024	MI PLANILLA	Seguridad Social y Aportes Parafiscales - ADMINISTRACION	309.700,00	-	-	-	309.700,00	3	Gastos Administrativos
026	5/08/2024	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Pago Retención en la Fuente Julio 2024	1.704.000,00	-		-	1.704.000,00	N/A	Gastos Administrativos
027	12/08/2024	Laboremos SSA S.A.S	Pago exámen médico laboral Arnobis Cardozo	25.000,00	-		-	25.000,00	3	Gastos Administrativos
028	12/08/2024	Benavides Duran Polania	Pago transporte de materiales de ferretería	3.375.000,00	-	33.750,00	-	3.341.250,00	1	Costo directo de obra
029	13/08/2024	Juan Albero Marin Loaiza	Pago papelería	151.700,00	-		-	151.700,00	3	Gastos Administrativos
030	15/08/2024	Nelson Enrique Gutierrez Santos	Anticipo sueldo Agosto 2024 - ADMINISTRACION	1.241.000,00	-		-	1.241.000,00	3	Gastos Administrativos
031	15/08/2024	Nómina costo directo de la obra	Anticipo sueldo Agosto 2024 - COSTO DIRECTO	4.922.067,00	-		-	4.922.067,00	1	Costo directo de obra
032	15/08/2024	Constructora - Obras Kris Zoomac S.A.S	Pago materiales de ferretería	1.300.000,00	-	13.000,00	-	1.287.000,00	1	Costo directo de obra
033	27/08/2024	Benavides Duran Polania	Pago servicio de transporte materiales de construcción	14.400.000,00	-	144.000,00	-	14.256.000,00	1	Costo directo de obra
034	27/08/2024	Constructora - Obras Kris Zoomac S.A.S	Pago de materiales de ferretería	3.200.000,00	-	67.227,00	-	3.132.773,00	1	Costo directo de obra
035	27/08/2024	Hernán Sanchez Huertas	Subsidio de transporte Presidente Julio 2024	400.000,00	-		-	400.000,00	3	Gastos Administrativos
036	27/08/2024	Apolo & Agregados S.A.S	Pago material granular	3.040.425,00	-	63.874,00	-	2.976.551,00	1	Costo directo de obra

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 149.372.854,00	$ 89.034.097,00	$ 47.478.830,00	$ 136.512.927,00	$ 12.859.927,00
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	4.481.186,00	-	-	-	4.481.186,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.147.531,00	$ 18.629.759,85	2.816.251,71	21.446.011,56	22.701.519,44
	TOTALES	**$ 198.001.571,00**	**$ 107.663.856,85**	**$ 50.295.081,71**	**$ 157.958.938,56**	**$ 40.042.632,44**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **(Agosto del 2024):** **$ 10.933,93**
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: **$ 445.966,61**
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
1	$ 361.147,99	$ -	Mayo del 2024	26/06/2024	$ 361.147,99


OBSERVACIONES:

El valor de los rendimientos financieros consignados es el valor acumulado a 31 de mayo del 2024.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**


Firma: Hernan Sanchez H
Nombre: **HERNAN SANCHEZ HUERTAS**
Representante Legal OAC



Firma:
Nombre: **ALVARO GASCA TORRES**
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: **96892-T**



Firma:
Nombre: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
Interventor
Matrícula Profesional No.: **19202-61820 CAU**



Firma:
Nombre: **CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **25202-72334 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.12.2.

8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 3

FECHA 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 4 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3441 DE 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** **198.001.571,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMACAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
C.E. 007	CTA COBRO 1	6/08/2024	ELIANA CONSTANZA GARZON BERNAL	$ 13.005.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 008	CTA COBRO 1	8/08/2024	JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ	$ 3.500.000,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
C.E. 009	CTA COBRO	9/08/2024	ANGIE VIVIANA HERNANDEZ ALVARADO	$ 4.000.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 010	LIQ NOMINA	9/08/2024	ARNULFO HUL SANJUAN	$ 828.221,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 011	LIQ NOMINA	9/08/2024	WILMER ÑAÑEZ MENDEZ	$ 828.221,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 012	LIQ NOMINA	9/08/2024	YOVANY MUÑOZ SILVA	$ 1.312.455,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
C.E. 013	LIQ NOMINA	9/08/2024	BRAYAN MENDEZ PERDOMO	$ 828.221,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 014	LIQ NOMINA	12/08/2024	ANULADO	$ -	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 015	LIQ NOMINA	12/08/2024	DAIMER ALEXIS NOGUERA FAJARDO	$ 828.221,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 016	LIQ NOMINA	16/08/2024	CARLOS ANDRES ORTIZ PALOMARES	$ 828.221,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 017	CTA COBRO 1	14/08/2024	ELIANA CONSTANZA GARZON BERNAL	$ 12.375.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 018	FEST-1673	16/08/2024	INVERSIONES TQR SAS	$ 245.000,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
C.E. 019	FEV 602	16/08/2024	LUIS ANTONIO AVILEZ	$ 773.500,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
C.E. 020	LIQUIDACION	16/08/2024	YESID GONZALEZ ARIZA	$ 828.221,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 021	CTA COBRO	21/08/2024	ROBINSON ALMARIO PENAGOS	$ 2.100.000,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
C.E. 022	FEI 1232	22/08/2024	FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC SAS	$ 2.725.911,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
C.E. 022	FE 15095	22/08/2024	FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC SAS	$ 17.647,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 023	CTA COBRO	22/08/2024	DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS	$ 1.200.000,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
C.E. 024	POLIZAS	27/08/2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VDA BAJO PLATANIL	$ 1.530.997,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
C.E. 026	PLANILLA SEG	22/08/2024	APORTES EN LINEA	$ 1.165.200,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 027	LIQ NOMINA	27/08/2024	ARNULFO HUL SANJUAN	$ 828.221,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 028	LIQ NOMINA	27/08/2024	WILMER ÑAÑEZ MENDEZ	$ 828.221,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 029	LIQ NOMINA	27/08/2024	YOVANY MUÑOZ SILVA	$ 1.312.455,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
C.E. 030	LIQ NOMINA	27/08/2024	BRAYAN MENDEZ PERDOMO	$ 828.221,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 031	LIQ NOMINA	27/08/2024	YESID GONZALEZ ARIZA	$ 828.221,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 032	LIQ NOMINA	27/08/2024	DAIMER ALEXIS NOGUERA FAJARDO	$ 828.221,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
C.E. 033	LIQ NOMINA	29/08/2024	CARLOS ANDRES ORTIZ PALOMARES	$ 828.221,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
	EXTRACTO	31/08/2024	BANCO DE OCCIDENTE	$ 611.439,90	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 149.372.854,00	$ 50.578.108,00	$ 40.501.499,00	$ 91.079.607,00	$ 58.293.247,00
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ 4.481.186,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.481.186,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531,00	$ 2.378.699,68	$ 15.311.757,90	$ 17.690.457,58	$ 26.457.073,42
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTALES	$ 198.001.571,00	$ 52.956.807,68	$ 55.813.256,90	$ 108.770.064,58	$ 89.231.506,42

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2 de 3

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (AGOSTO DE 2024): $ 22.699,06
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 463.825
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
	$ 32.550		DICIEMBRE DE 2023		
	$ 83.843		ENERO DE 2024		
	$ 78.424		FEBRERO DE 2024		
	$ 83.824		MARZO DE 2024		
	$ 40.572		ABRIL DE 2024		
	$ 41.934		MAYO DE 2024		
	$ 40.589		JUNIO DE 2024		
TRANSFERENCIA ENVIADA M500410	$ 39.388		JULIO DE 2024	22/08/2024	$ 441.125

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: **DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS**
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional N: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: **ROBINSON ALMARIO PENAGOS**
Contador del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 193901-T

Firma:
Nombre: **JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.12.3.

8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#33760

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 6 **MES:** AGOSTO del 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3760 del 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 199.663.426,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 del 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
009	1/08/2024	Argemiro Moreno Alvis	Transporte de material granular	$ 5.400.000,00	$ -	$ 54.000	$ -	$ 5.346.000,00	1	Costo Directo
010	5/08/2024	RPM Suministro y dotaciones S.A.S	Elementos de protección personal	2.821.000,00	-	59.784,00	-	2.761.216,00	3	Gastos Administrativos
011	8/08/2024	Constructora - Obras Kris Zoomac S.A.S	Transporte de materiales de ferretería	3.120.000,00	-	31.200,00	-	3.088.800,00	1	Costo Directo
012	8/08/2024	Argemiro Moreno Alvis	Transporte de material granular	9.000.000,00	-	90.000,00	-	8.910.000,00	1	Costo Directo
013	9/08/2024	Alvaro Gasca Torres	Pago No. 2 Contador Julio 2024	2.100.000,00	-	-	-	2.100.000,00	3	Gastos Administrativos
014	12/08/2024	RPM Suministro y dotaciones S.A.S	Elementos de protección personal	636.000,00	-		-	636.000,00	3	Gastos Administrativos
015	13/08/2024	Juan Alberto Marin Loaiza	Pago papelería	151.700,00	-		-	151.700,00	3	Gastos Administrativos
016	14/08/2024	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	Pago Retención en la fuente Julio 2024	1.049.000,00	-		-	1.049.000,00	N/A	
017	20/08/2024	Apolo & Agregados S.A.S	Pago material granular	12.740.400,00	-	267.655,00	-	12.472.745,00	1	Costo Directo
018	20/08/2024	Laboremos SSA S.A.S	Pago exámenes médicos laborales	275.000,00	-		-	275.000,00	3	Gastos Administrativos
019	22/08/2024	Eveimar León Laguna	Pago servicio de topografía	1.600.000,00	-	96.000,00	-	1.504.000,00	3	Gastos Administrativos
020	22/08/2024	Argemiro Moreno Alvis	Transporte de material granular	9.629.000,00	-	96.290,00	-	9.532.710,00	1	Costo Directo
021	23/08/2024	Benavides Durán Polania	Transporte de material granular	15.150.000,00	-	151.500,00	-	14.998.500,00	1	Costo Directo
022	23/08/2024	Benavides Durán Polania	Transporte de material granular	2.240.000,00	-	22.400,00	-	2.217.600,00	1	Costo Directo

023	30/08/2024	Jhon Jairo Saavedra Torres	Transporte de materiales de ferretería	1.000.000,00	-	10.000,00	-	990.000,00	1	Costo Directo
N.C 006	31/08/2024	Banco de Occidente	Gastos Financieros	710.254,68	-	-	-	710.254,68	3	Gastos Administrativos

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 150.980.064,00	$ 49.871.897,00	$ 58.279.400,00	$ 108.151.297,00	$ 42.828.767,00
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	4.529.402,00	-	-	-	4.529.402,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.153.960,00	7.712.759,30	$ 8.293.954,68	16.006.713,98	28.147.246,02
	TOTALES	**$ 199.663.426,00**	**$ 57.584.656,30**	**$ 66.573.354,68**	**$ 124.158.010,98**	**$ 75.505.415,02**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **Agosto** (Indicar el mes) **$ 22.367,88** (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: **$ 215.951,82** (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Gean carlos tapiero.
Nombre: **GEAN CARLOS TAPIERO MONGE**
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: **ALVARO GASCA TORRES**
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: **96892-T**

Firma:
Nombre: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
Interventor
Matrícula Profesional No.: **19202-61820 CAU**

Firma:
Nombre: **CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **25202-72334 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.13.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

ANEXO 8.13.1.

Seguimiento programa de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379-2023

HERNÁN SANCHEZ HUERTAS
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 15 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	$ 0,00																**$ 0,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 179.200,00	$ 59.733,33	$ 59.733,33	$ 59.733,33													**$ 179.200,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 95.094,00				$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40			**$ 95.094,00**
320.3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 25.052.077,00			$ 5.010.415,40	$ 5.010.415,40	$ 5.010.415,40	$ 5.010.415,40	$ 5.010.415,40									**$ 25.052.077,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 79.685.538,00					$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67			**$ 79.685.538,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 19.837.643,00					$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56			**$ 19.837.643,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 24.523.302,00			$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20				**$ 24.523.302,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.481.186,00													$ 1.792.474,40	$ 1.792.474,40	$ 896.237,20	**$ 4.481.186,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531,00		$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	**$ 44.147.531,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 198.001.571,00	**$ 59.733,33**	**$ 3.213.128,40**	**$ 10.675.874,00**	**$ 10.625.650,07**	**$ 21.683.781,29**	**$ 21.683.781,29**	**$ 21.683.781,29**	**$ 16.673.365,89**	**$ 16.673.365,89**	**$ 16.673.365,89**	**$ 16.673.365,89**	**$ 16.673.365,89**	**$ 16.013.510,09**	**$ 4.945.869,47**	**$ 4.049.632,27**	**$ 198.001.571,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,030%	1,623%	5,392%	5,366%	10,951%	10,951%	10,951%	8,421%	8,421%	8,421%	8,421%	8,421%	8,088%	2,498%	2,045%	100,000%
	ACUMULADO	0,030%	1,653%	7,045%	12,411%	23,362%	34,313%	45,264%	53,685%	62,106%	70,527%	78,948%	87,369%	95,457%	97,955%	100,00%	

EJECUTADO	**SEMANAL**	0,000%	1,593%	1,593%	1,593%	1,593%	14,384%	22,831%	16,365%	8,296%	31,754%						
	ACUMULADO	0,000%	1,593%	3,185%	4,778%	6,370%	20,754%	43,585%	59,950%	68,246%	100,000%						

ANEXO 8.13.2.

Seguimiento programa de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441-2023

DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 15 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	$ 0,00																**$ 0,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 278.204,00	$ 92.734,67	$ 92.734,67	$ 92.734,67													**$ 278.204,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 106.440,00				$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00			**$ 106.440,00**
320.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 21.422.151,00			$ 4.284.430,20	$ 4.284.430,20	$ 4.284.430,20	$ 4.284.430,20	$ 4.284.430,20									**$ 21.422.151,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 81.738.617,00					$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56			**$ 81.738.617,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 20.714.774,00					$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56			**$ 20.714.774,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 25.112.668,00			$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80				**$ 25.112.668,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.481.186,00													$ 1.792.474,40	$ 1.792.474,40	$ 896.237,20	**$ 4.481.186,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531,00		$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	**$ 44.147.531,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 198.001.571,00	**$ 92.734,67**	**$ 3.246.129,74**	**$ 10.041.826,74**	**$ 9.959.736,07**	**$ 21.343.446,18**	**$ 21.343.446,18**	**$ 21.343.446,18**	**$ 17.059.015,98**	**$ 17.059.015,98**	**$ 17.059.015,98**	**$ 17.059.015,98**	**$ 17.059.015,98**	**$ 16.340.223,58**	**$ 4.945.869,47**	**$ 4.049.632,27**	**$ 198.001.571,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,047%	1,639%	5,072%	5,030%	10,779%	10,779%	10,779%	8,616%	8,616%	8,616%	8,616%	8,616%	8,253%	2,498%	2,045%	100,000%
	ACUMULADO	0,047%	1,686%	6,758%	11,788%	22,567%	33,346%	44,125%	52,741%	61,357%	69,973%	78,589%	87,205%	95,458%	97,956%	100,00%	

EJECUTADO	**SEMANAL**	0,141%	1,593%	1,593%	1,593%	1,593%	12,466%	8,916%	19,135%	10,205%	18,908%						
	ACUMULADO	0,141%	1,733%	3,326%	4,918%	6,511%	18,977%	27,893%	47,028%	57,232%	76,140%						

ANEXO 8.13.3.

Seguimiento programa de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760-2023

GEAN CARLOS TAPIERO MONGE
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 15 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	$ 0,00																**$ 0,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 202.690,00	$ 67.563,33	$ 67.563,33	$ 67.563,33													**$ 202.690,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 89.865,00				$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50			**$ 89.865,00**
320.3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 25.038.882,00			$ 5.007.776,40	$ 5.007.776,40	$ 5.007.776,40	$ 5.007.776,40	$ 5.007.776,40									**$ 25.038.882,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 80.323.942,00					$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44			**$ 80.323.942,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 20.381.837,00					$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56			**$ 20.381.837,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 24.942.848,00			$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80				**$ 24.942.848,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.529.402,00													$ 1.811.760,80	$ 1.811.760,80	$ 905.880,40	**$ 4.529.402,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.153.960,00		$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	**$ 44.153.960,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 199.663.426,00	**$ 67.563,33**	**$ 3.221.417,62**	**$ 10.723.478,82**	**$ 10.664.901,99**	**$ 21.854.432,99**	**$ 21.854.432,99**	**$ 21.854.432,99**	**$ 16.846.656,59**	**$ 16.846.656,59**	**$ 16.846.656,59**	**$ 16.846.656,59**	**$ 16.846.656,59**	**$ 16.164.132,59**	**$ 4.965.615,09**	**$ 4.059.734,69**	**$ 199.663.426,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,034%	1,613%	5,371%	5,341%	10,946%	10,946%	10,946%	8,438%	8,438%	8,438%	8,438%	8,438%	8,096%	2,487%	2,033%	100,000%
	ACUMULADO	0,034%	1,647%	7,018%	12,359%	23,305%	34,251%	45,197%	53,635%	62,073%	70,511%	78,949%	87,387%	95,483%	97,970%	100,00%	

EJECUTADO	**SEMANAL**	0,000%	1,580%	1,580%	1,580%	1,580%	1,580%	1,580%	1,580%	1,580%	23,951%							
	ACUMULADO	0,000%	1,580%	3,159%	4,739%	6,318%	7,898%	9,478%	11,057%	12,637%	36,588%							

ANEXO 8.14.

8.14. ACTAS DE REUNIÓN DE OBRA

ANEXO 8.14.1.

Actas de reunión de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

ANEXO 8.14.2.

Actas de reunión de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

ANEXO 8.14.3.

Actas de reunión de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

ANEXO 8.15.

EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO:** 6

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	**DESCRIPCIÓN**	**DÍAS DEL MES**																														
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
CAMIIONETA	MITSUBISHI DOBLE CABINA CON PLACA DE MATRICULA (**HQX980**)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
MOTOCICLETA	HONDA CON CILINDRAJE 150 Cc CON PLACA DE MATRICULA (**RGK09F**)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO:** 6

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NARIÑO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.16.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO SOLIDARIO No: 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

CONVENIO SOLIDARIO No: 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

CONVENIO SOLIDARIO No: 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

NOMBRE ARL: POSITIVA ARL **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	7.692.245	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 4.060.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOQUERA	$4.060.000,00	$ 282.600,00	V	SANITAS	30575474	$ 507.500,00	COLPENSIONES	30575474	$ 649.600,00	$ -	$ -	$ -	
2	CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA	1.110.521.985	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOQUERA	$1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SANITAS	30976861	$ 52.000,00	PORVENIR	30976861	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
3	INGRID YULIETH MEJIA PEÑA	1.117.505.206	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOQUERA	$1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30976861	$ 52.000,00	PORVENIR	30976861	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
4	ADRIANA JULIETH MONTOYA GONZALEZ	1.118.027.920	BIÓLOGA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOQUERA	$1.300.000,00	$ 90.500,00	V	ESSC ASMET SALUD	30976861	$ 52.000,00	COLPENSIONES	30976861	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
5	MAYRA KATHERINE BERMUDEZ PARRA	1.117.492.838	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOQUERA	$1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SANITAS	30976861	$ 52.000,00	PORVENIR	30976861	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 9.260.000,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 3-sep-24 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma

Nombre: José Ricardo Burbano Barcenas

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NARIÑO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.17.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 3/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MES INFORME MENSUAL: 01/08/2024 al 31/08/2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO # 3441 DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO # 3379 DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO # 3760 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO – MUNICIPIO DE MILAN, CAQUETA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA ESMERALDA – MUNICIPIO DE MONTAÑITA, CAQUETA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO - MUNICIPIO DE MONTAÑITA, CAQUETA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1235223	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 107.999.997	$ 107.999.997
TOTAL						$ 107.999.997	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 107.999.997

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	jun-24	$ 16.059.055,00	$ 3.051.220,45	$ 19.110.275,45	$ -	$ 19.110.275,45	$ -		$ 88.889.721,55	$ 88.889.721,55		
2	jul-24	$ 24.850.815,00	$ 4.721.654,85	$ 29.572.469,85	$ -	$ 29.572.469,85	$ -		$ 59.317.251,70	$ 59.317.251,70		
TOTALES		**$ 24.850.815,00**	**$ 4.721.654,85**	**$ 29.572.469,85**	**$ -**	**$ 29.572.469,85**	**$ -**	**$ -**	**$ 59.317.251,70**	**$ 59.317.251,70**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)	$ 90.756.300,00		$ 90.756.300,00
IVA = 19% * (C) = (D)		$ 17.243.697,00	$ 17.243.697,00
VALOR TOTAL	$ 90.756.300,00	$ 17.243.697,00	$ 107.999.997,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.18.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 10-nov-23

PLAZO INICIAL: HASTA 31/DIC/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30-sep-24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 107.999.997,00

VALOR ACUMULADO: $ 107.999.997,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.800.000	26/10/2023	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.600.000	26/10/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	30%	$ 32.400.000	26/10/2023	31/12/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100009288

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10-nov-23

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.800.000	26/10/2023	30/09/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.600.000	26/10/2023	31/03/2027
Calidad del servicio	30%	$ 32.400.000	26/10/2023	31/03/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100009288

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.800.000	26/10/2023	30/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.600.000	26/10/2023	30/04/2027
Calidad del servicio	30%	$ 32.400.000	26/10/2023	30/04/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100009288

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.800.000	26/10/2023	31/12/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.600.000	26/10/2023	30/06/2027
Calidad del servicio	30%	$ 32.400.000	26/10/2023	30/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100009288

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 4-may-24

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.19.

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☐ **No.** 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 3230 DE 15/09/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO # 3441 DE 2023, CONVENIO SOLIDARIO # 3379 DE 2023, CONVENIO SOLIDARIO # 3760 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO – MUNICIPIO DE MILAN, CAQUETA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA ESMERALDA – MUNICIPIO DE MONTAÑITA, CAQUETA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO - MUNICIPIO DE MONTAÑITA, CAQUETA

PLAZO INICIAL: HASTA 31/DIC/2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/11/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 107.999.997,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 107.999.997,00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 31/03/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha		AÑO 2024				AÑO 2024														TOTAL	
											MES		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT		MES		MES		MES		
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		Director de Interventoría	5.000.000,00		0,50	2.500.000,00			1,32	$ 6.600.000			0,11	$ 550.000	0,11	$ 550.000	0,11	$ 550.000	0,33	$ 1.650.000	0,33	$ 1.650.000	0,33	$ 1.650.000							1,32	$ 6.600.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	4.000.000,00		4,00	16.000.000,00			4,00	$ 16.000.000			0,33	$ 1.333.333	0,33	$ 1.333.333	0,33	$ 1.333.333	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000							4,00	$ 16.000.000,00
		Profesional ambiental	2.800.000,00		0,40	1.120.000,00			1,32	$ 3.696.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000							1,32	$ 3.696.000,00
		Profesional social	2.800.000,00		0,40	1.120.000,00			1,32	$ 3.696.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000							1,32	$ 3.696.000,00
		Profesional SST	2.800.000,00		-	-			1,32	$ 3.696.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000							1,32	$ 3.696.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	3.000.000,00			3.000.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		Especialista en Estructuras	5.500.000,00																													
		Especialista en Vía y/o Pavimentos	5.500.000,00																													
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	5.500.000,00																													
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	5.500.000,00																													
		Especialista en diseño Geométrico	5.500.000,00																													
		Inspector	1.300.000,00		6,00	7.800.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		Inspector SST	1.300.000,00		0,50	650.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -								$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						32.190.000,00				$ 33.688.000				$ 1.883.333		$ 1.883.333		$ 1.883.333		$ 9.346.000		$ 9.346.000		$ 9.346.000								$ 33.688.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36				2,36				2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36								2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						75.968.400,00				$ 79.503.680				$ 4.444.667		$ 4.444.667		$ 4.444.667		$ 22.056.560		$ 22.056.560		$ 22.056.560								$ 79.503.680,00

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2024				AÑO														TOTAL	
											MES		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT		MES		MES		MES		
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIÁTICOS																												
		Viáticos Director y/o Especialistas	140.000,00	Día	4,00	560.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	550.000,00	Mes	12,00	6.600.000,00			12,00	$ 6.600.000			0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.650.000	3,00	$ 1.650.000	3,00	$ 1.650.000	3,00	$ 1.650.000							12,00	$ 6.600.000,00
		Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	2.800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	5.600.000,00			1,10	$ 3.067.820			0,00	$ -	0,00	$ -	0,27	$ 766.955	0,27	$ 766.955	0,27	$ 766.955	0,27	$ 766.955							1,10	$ 3.067.819,83
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	300.000,00	Según comprobante por mes	3,00	900.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		OTROS COSTOS								$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	176.200,00	Según comprobante por mes	2,00	352.400,00			4,00	$ 704.800			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 176.200	1,00	$ 176.200	1,00	$ 176.200	1,00	$ 176.200							4,00	$ 704.800,00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	80.000,00	Según comprobante por mes	3,00	240.000,00			4,00	$ 320.000			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 80.000	1,00	$ 80.000	1,00	$ 80.000	1,00	$ 80.000							4,00	$ 320.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	140.000,00	Según comprobante por mes	3,00	420.000,00			4,00	$ 560.000			0,33	$ 46.667	0,33	$ 46.667	0,33	$ 46.667	1,00	$ 140.000	1,00	$ 140.000	1,00	$ 140.000							4,00	$ 560.000,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	38.500,00	Según comprobante	3,00	115.500,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																												
*		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				14.787.900,00				$ 11.252.620				$ 46.667		$ 46.667		$ 2.719.822		$ 2.813.155		$ 2.813.155		$ 2.813.155								$ 11.252.619,83
*		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)				90.756.300,00				$ 90.756.299,83				$ 4.491.334		$ 4.491.334		$ 7.164.489		$ 24.869.715		$ 24.869.715		$ 24.869.715								$ 90.756.299,83
*		IVA = 19% * (C) = (D)				17.243.697,00				$ 17.243.697				$ 853.353		$ 853.353		$ 1.361.253		$ 4.725.246		$ 4.725.246		$ 4.725.246								$ 17.243.697,00
*		COSTO TOTAL = (C) + (D)				107.999.997,00				$ 107.999.997				$ 5.344.687		$ 5.344.687		$ 8.525.742		$ 29.594.961		$ 29.594.961		$ 29.594.961								$ 107.999.996,83

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

- El profesional ambiental de la Interventoría deberá realizar seguimiento y control al Plan de Gestión Ambiental (complejidad baja) elaborado y presentar informes durante la ejecución del proyecto.
- El profesional social de la Interventoría deberá acompañar y/o asesorar a las OAC en la elaboración del Plan de Gestión Social, que es responsabilidad de la OAC, ya que en los presupuestos de los convenios suscritos con las OAC no existe rubro que cubra esos gastos.
- El profesional social de la Interventoría deberá realizar seguimiento al Plan de Gestión Social y presentar informes durante la ejecución del proyecto.
- La Interventoría debe vincular un profesional en SST, que deberá acompañar y/o asesorar a las OAC en la elaboración del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, que es responsabilidad de la OAC, ya que en los presupuestos de los convenios suscritos con las OAC no existe rubro que cubra esos gastos.

En la oferta económica de la Interventoría existe un Inspector SST el cual no posee la idoneidad para responsabilizarse del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

- El profesional en SST que vincule de la Interventoría deberá realizar seguimiento al Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y presentar informes durante la ejecución del proyecto.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada período, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada período del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
