FECHA DE LA SOLICITUD	**22 DE OCTUBRE DE 2024**		
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA**		
N° Y FECHA DEL CONTRATO	**CONTRATO 019 DE FEBRERO 23 DE 2023**		
OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.			
CONTRATISTA	CONSORCIO ABASTECER 23		
SUPERVISOR	JORGE ELMER DIAZ MORALES Director de Planeación – IBAL S.A E.S.P		
INTERVENTOR	CONSORCIO TOLIMA 2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$26.353.092.065,00		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**		
16-03-2023	24-10-2024		
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES			
PRÓRROGAS:			
PRORROGA N. 01	**DE FECHA:** 15 DE ENERO DE 2024	**PLAZO PRORROGADO:**	**DOS (2) MESES**
PRORROGA N. 02	**DE FECHA:** 15 DE MARZO DE 2024	**PLAZO PRORROGADO:**	**DOS (2) MESES**
PRORROGA N. 03	**DE FECHA:** 15 DE MAYO DE 2024	**PLAZO PRORROGADO:**	**UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS**
PRORROGA N. 04	**DE FECHA:** 28 DE JUNIO DE 2024	**PLAZO PRORROGADO:**	**UN (1) MES**
PRORROGA N. 05	**DE FECHA:** 30 DE JULIO DE 2024	**PLAZO PRORROGADO:**	**DOS (2) MESES**
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS:			**OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:			**DIECIOCHO (18) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**
SUSPENSIONES:			

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	**DE FECHA:** 15 DE AGOSTO DE 2024	**No. DÍAS DE SUSPENSIÓN:**	CINCO (5) DÍAS
ACTA DE REINICIACIÓN No. 01	**DE FECHA:** 20 DE AGOSTO DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	**DE FECHA:** 3 DE OCTUBRE DE 2024	**No. DÍAS DE SUSPENSIÓN:**	QUINCE (15) DÍAS
PRÓRROGA No. 01 SUSPENSIÓN No. 02	17 DE OCTUBRE DE 2024	**DURACIÓN:**	QUINCE (15) DÍAS
ACTA DE REINICIACIÓN No. 02	**DE FECHA:** 22 DE OCTUBRE DE 2024		
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES		**TREINTA Y CINCO (35) DÍAS**	
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN		**24 DE OCTUBRE DE 2024**	
ADICIONES:			
ADICIÓN N. 01	**DE FECHA:** 01 DE DICIEMBRE DE 2023	**VALOR:**	**$4.151.483.338**
ADICIÓN N. 02	**DE FECHA:** 30 DE JULIO DE 2024	**VALOR:**	**$954.726.859**
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES			**$5.106.210.197**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO			**$31.459.302.262**

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

El contrato a la fecha se encuentra en el siguiente avance:

AVANCE FÍSICO:	**Programado:** 100%	**Ejecutado:** 99%
AVANCE FINANCIERO:	**Programado:** 100%	**Ejecutado: 94.29%**

El valor facturado a la fecha corresponde a VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE. ($29.663.532.273) equivalente a 94.29%, del valor actual del contrato.

ANTICIPO DEL CONTRATO

Valor anticipo amortizado $ 7.905.927.620	Valor anticipo por amortizar $ -

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si la solicitud es de una modificación, adición o prorroga o seleccione las que le apliquen al contrato.

Modificación: ☐ **Adición:** ☐ **Prórroga:** ☒

Cláusula que solicita modificar. (indicar que solicita modificación)	**Valor de la adición solicitada (incluir si solicita adición)**	**Tiempo de prórroga solicitada (incluir si solicita prórroga)**
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.		QUINCE (15) DÍAS

5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD

Que la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado celebro contrato de obra No. 019 de 23 de febrero de 2023, cuyo objeto consiste en **CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ**, con el CONSORCIO ABASTECER 23, con el fin de suplir las necesidades del sistema de abastecimiento de agua potable y poder garantizar el suministro de agua potable para la mayoría de los barrios de las comunas 12 y 13, las cuales están siendo actualmente abastecidas por acueductos comunitarios que no cuentan con suministro de agua apta para el consumo humano.

Que el **CONSORCIO ABASTECER 23**, contratista de obra a través de su representante presenta oficio No. COM-COOR-ABAS-87-24 de fecha 22 de octubre de 2024 con destino al interventor del contrato CONSORCIO TOLIMA 2023, mediante el cual solicita la aprobación de la prórroga de plazo No. 06 del contrato de obra, teniendo en cuenta lo siguiente:

> *"... Teniendo en cuenta que para la fecha del presente comunicado, las obras civiles y de interconexión que hacen parte del objeto del contrato, ya se encuentran ejecutadas en su totalidad y que la funcionalidad del sistema se puede garantizar dentro del mismo, nos permitimos solicitar se conceda prórroga del contrato 019 de 2023, con el fin de brindar un apoyo técnico y acompañamiento a la operación de los sistemas por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, para así garantizar el correcto funcionamiento que hasta la fecha tienen las obras ejecutadas por el CONSORCIO ABASTECER 23.*
> *Dicho lo anterior, se solicita prorrogar el contrato de obra, por un término de QUINCE (15) DÍAS, para así poder realizar dicho acompañamiento y apoyo técnico, el cual permitirá un mejor empalme entre el constructor y el operador de la PLANTA DE AGUA POTABLE BOQUERÓN E INTERCONEXIONES.*

Que el 22 de octubre de 2024, el consorcio interventor **CONSORCIO TOLIMA 2023**, mediante comunicado **CTMAI-123-198**, remite aprobación de la solicitud de prórroga.

Con base en lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la solicitud del contratista **CONSORCIO ABASTECER 23** y teniendo el informe de aval presentado por el **CONSORCIO TOLIMA 2023**, en su calidad de interventor, el supervisor del contrato considera viable la solicitud de prorrogar el contrato de obra, por un término de QUINCE (15) DÍAS, para así

poder realizar el acompañamiento y apoyo técnico, el cual permitirá un mejor empalme entre el constructor y el operador de la PLANTA DE AGUA POTABLE BOQUERÓN E INTERCONEXIONES.

6. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOLICITUD

Acuerdo 001 de 14 de julio de 2020, por medio del cual se adopta el manual de contratación de la empresa ibaguereña IBAL S.A E.S.P OFICIAL, Articulo 59 "Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten su prórroga o adición, el interventor o superviso deberá justifica la necesidad durante la vigencia del contrato (...) las adiciones en valor deben contar con la correspondiente aprobación presupuestal y no podrá adicionarse en más del cincuenta (50%) por ciento de su valor inicial, no hay límite para las prórrogas en tiempo".

6. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA

El supervisor del contrato en mención es responsable de la información registrada en este documento y velará porque las razones por las cuales solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos de la Entidad.

JORGE ELMER DÍAZ MORALES
Director de Planeación
IBAL S.A E.S.P. OFICIAL
Supervisor contrato 019 de 2023

Anexos: Oficio Consorcio Abastecer 23 No. COM-COOR-ABAS-087-24
Oficio CTMAI-123-198 Consorcio Tolima 2023

CONSORCIO TOLIMA 2023
NIT 901.687.324-8

Ibagué, 22 de octubre de 2024.
CTMAI-123-198

SEÑORES:
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA E.S.P
Ing. Jorge Elmer Diaz Morales
Supervisor. Contrato 022 de 2023
Carrera 3 # 1 – 04 Barrio la Pola
Ibagué – Tolima.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 022 DE 2023 "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ."

Asunto: Aval Prorroga No. 06 Contrato de obra 019 de 2023.

Cordial saludo;

Por medio de la presente esta interventoría dando cumplimento a sus obligaciones contractuales hace entrega del aval respectivo con sus observaciones, a la solicitud realizada por el contratista **CONSORCIO ABASTECER 23 NIT 901.683.056-0**, de realizar Prorroga No.06 al contrato de obra 019 de 2023 mediante comunicación oficio No. **COM-COOR-ABAS-087-24 de fecha 22 de octubre de 2024**

En virtud de lo anterior, se le solicita al Ibal iniciar las gestiones necesarias y protocolizar la prórroga propuesta previa revisión y aprobación de la información entregada.

Adicionalmente, la interventoría le solicita a la entidad contratante realizar Otro Sí correspondiente al contrato de obra, y también que se le exija al Contratista de obra presentar la actualización de las respectivas pólizas de acuerdo con la nueva fecha de terminación del contrato.

Agradeciendo la atención a la presente.

Cordialmente,

ING. Nelson Alfonso Casas Alfonso
Representante Legal.

Anexo: Aval Prorroga contrato 019 de 2023.
oficio No. COM-COOR-ABAS-087-24
CC. Consecutivo

E-MAIL: consorciotolima2023@gmail.com

CONSORCIO TOLIMA 2023
NIT 901.687.324-8

AVAL PRORROGA CONTRATO 019 DE 2023

El contratista CONSORCIO ABASTECER 23, presentó a consideración de esta interventoría mediante comunicación oficio No. **COM-COOR-ABAS-087-24 de fecha 22 de octubre de 2024**, en la cual solicita se avale prorroga a el contrato de obra 019 de 2023, de acuerdo a los aspectos allí descritos, por lo tanto, esta interventoría, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales que se tiene como es de aprobar, revisar y firmar todos los documentos del contrato, sobre el cuál se ejerce la interventoría. Y por ende mantener informada a la supervisión del IBAL y ordenador del gasto en forma oportuna y periódica sobre el avance presentado en el desarrollo del contrato, además de los hechos o circunstancias que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento de este nos permitimos manifestar:

- **El día 22 de octubre de 2024 ,** el **CONSORCIO ABASTECER 23** radica oficio COM- COM-COOR-ABAS-087-24, en el cual solicita "...**solicita se conceda una prórroga ,por un tiempo no menor a QUINCE (15) DIAS, justificados en Teniendo en cuenta que para la fecha del presente comunicado, las obras civiles y de interconexión que hacen parte del objeto del contrato, ya se encuentran ejecutadas en su totalidad y que la funcionalidad del sistema se puede garantizar dentro del mismo, nos permitimos solicitar se conceda prórroga del contrato 019 de 2023, con el fin de brindar un apoyo técnico y acompañamiento a la operación de los sistemas por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, para así garantizar el correcto funcionamiento que hasta la fecha tienen las obras ejecutadas por el CONSORCIO ABASTECER 23...."** Lo anterior basados en:

En virtud de lo anterior, esta interventoría una vez se realiza la evaluación respectiva en conjunto con la supervisión del contrato se estima conveniente otorgar un tiempo de prorroga equivalente a **QUINCE (15) DÍAS** lo anterior justificados en:

Como manifiesta el contratista, "...**a la fecha las obras civiles y de interconexión que hacen parte del objeto del contrato, ya se encuentran ejecutadas en su totalidad y que la funcionalidad del sistema se puede garantizar dentro del mismo, nos**

E-MAIL: consorciotolima2023@gmail.com

permitimos solicitar se conceda prórroga del contrato 019 de 2023, con el fin de brindar un apoyo técnico y acompañamiento a la operación de los sistemas por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, para así garantizar el correcto funcionamiento que hasta la fecha tienen las obras ejecutadas por el CONSORCIO ABASTECER 23."

Por ende, se le solicita al **IBAL S.A E.S.P OFICIAL** iniciar las gestiones necesarias y protocolizar la prórroga propuesta previa revisión y aprobación de la información entregada. Adicionalmente, la Interventoría le solicita a la Entidad Contratante realizar Otro Sí correspondiente al contrato de obra, y también que se le exija al Contratista de obra presentar la actualización de las respectivas pólizas y la reprogramación de obra de acuerdo con la nueva fecha de terminación del contrato.

Cordialmente,

ING. Nelson Alfonso Casas Alfonso
Representante Legal.

E-MAIL: consorciotolima2023@gmail.com

CONSORCIO ABASTECER 23

COM-COOR-ABAS-087-24

Ibagué, 22 de octubre de 2024

Señores

CONSORCIO TOLIMA 2023

ATN. RICARDO GAONA

Director de interventoría

Ciudad **ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA No.06 CONTRATO 019 DE 2023.**

REF: CONTRATO 019 DE 2023 **OBJETO:** CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

Respetado ingeniero,


Teniendo en cuenta que para la fecha del presente comunicado, las obras civiles y de interconexión que hacen parte del objeto del contrato, ya se encuentran ejecutadas en su totalidad y que la funcionalidad del sistema se puede garantizar dentro del mismo, nos permitimos solicitar se conceda prórroga del contrato 019 de 2023, con el fin de brindar un apoyo técnico y acompañamiento a la operación de los sistemas por parte de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL**, para así garantizar el correcto funcionamiento que hasta la fecha tienen las obras ejecutadas por el **CONSORCIO ABASTECER 23**.

Dicho lo anterior, se solicita prorrogar el contrato de obra, por un término de **QUINCE (15) DÍAS**, para así poder realizar dicho acompañamiento y apoyo técnico, el cual permitirá un mejor empalme entre el constructor y el operador de la **PLANTA DE AGUA POTABLE BOQUERÓN E INTERCONEXIONES**.

YOLI MARCELA LOZANO BARRETO

R.L CONSORCIO ABASTECER 23

NIT. 901.683.056-0

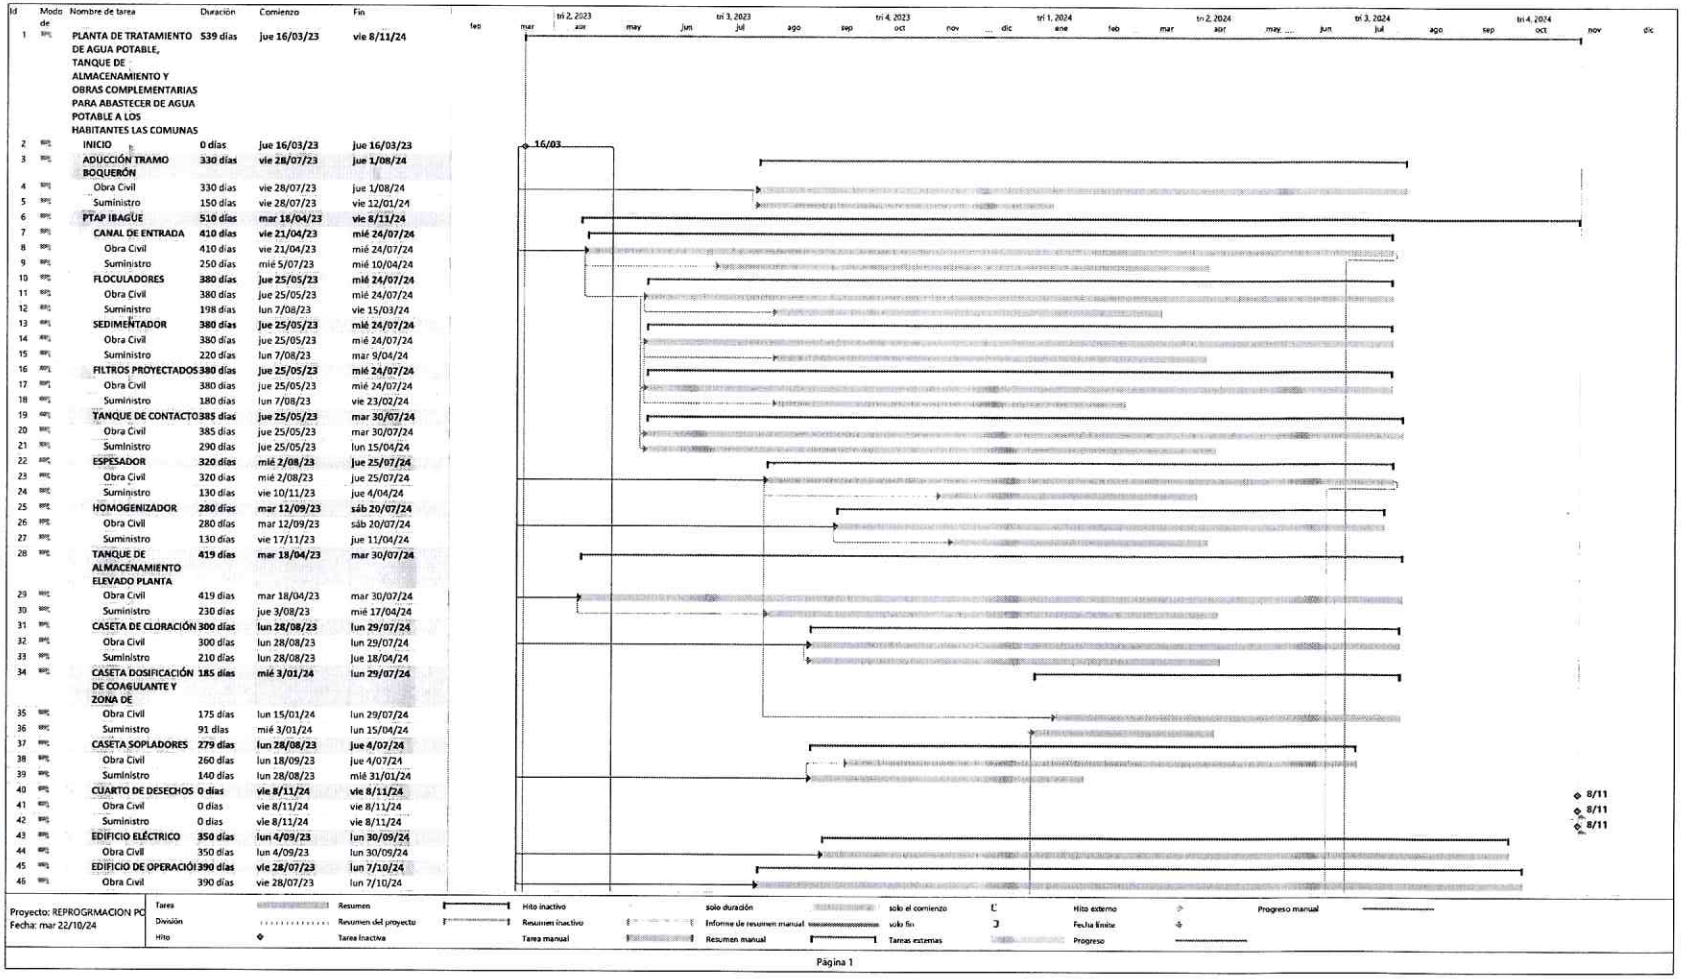


Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS**	**539 días**	**jue 16/03/23**	**vie 8/11/24**
2		**INICIO**	**0 días**	**jue 16/03/23**	**jue 16/03/23**
3		**ADUCCIÓN TRAMO BOQUERÓN**	**330 días**	**vie 28/07/23**	**jue 1/08/24**
4		Obra Civil	330 días	vie 28/07/23	jue 1/08/24
5		Suministro	150 días	vie 28/07/23	vie 12/01/24
6		**PTAP IBAGUÉ**	**510 días**	**mar 18/04/23**	**vie 8/11/24**
7		**CANAL DE ENTRADA**	**410 días**	**vie 21/04/23**	**mié 24/07/24**
8		Obra Civil	410 días	vie 21/04/23	mié 24/07/24
9		Suministro	250 días	mié 5/07/23	mié 10/04/24
10		**FLOCULADORES**	**380 días**	**jue 25/05/23**	**mié 24/07/24**
11		Obra Civil	380 días	jue 25/05/23	mié 24/07/24
12		Suministro	198 días	lun 7/08/23	vie 15/03/24
13		**SEDIMENTADOR**	**380 días**	**jue 25/05/23**	**mié 24/07/24**
14		Obra Civil	380 días	jue 25/05/23	mié 24/07/24
15		Suministro	220 días	lun 7/08/23	mar 9/04/24
16		**FILTROS PROYECTADOS**	**380 días**	**jue 25/05/23**	**mié 24/07/24**
17		Obra Civil	380 días	jue 25/05/23	mié 24/07/24
18		Suministro	180 días	lun 7/08/23	vie 23/02/24
19		**TANQUE DE CONTACTO**	**385 días**	**jue 25/05/23**	**mar 30/07/24**
20		Obra Civil	385 días	jue 25/05/23	mar 30/07/24
21		Suministro	290 días	jue 25/05/23	lun 15/04/24
22		**ESPESADOR**	**320 días**	**mié 2/08/23**	**jue 25/07/24**
23		Obra Civil	320 días	mié 2/08/23	jue 25/07/24
24		Suministro	130 días	vie 10/11/23	jue 4/04/24
25		**HOMOGENIZADOR**	**280 días**	**mar 12/09/23**	**sáb 20/07/24**
26		Obra Civil	280 días	mar 12/09/23	sáb 20/07/24
27		Suministro	130 días	vie 17/11/23	jue 11/04/24
28		**TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO PLANTA**	**419 días**	**mar 18/04/23**	**mar 30/07/24**
29		Obra Civil	419 días	mar 18/04/23	mar 30/07/24
30		Suministro	230 días	jue 3/08/23	mié 17/04/24
31		**CASETA DE CLORACIÓN**	**300 días**	**lun 28/08/23**	**lun 29/07/24**
32		Obra Civil	300 días	lun 28/08/23	lun 29/07/24
33		Suministro	210 días	lun 28/08/23	jue 18/04/24
34		**CASETA DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE Y ZONA DE**	**185 días**	**mié 3/01/24**	**lun 29/07/24**
35		Obra Civil	175 días	lun 15/01/24	lun 29/07/24
36		Suministro	91 días	mié 3/01/24	lun 15/04/24
37		**CASETA SOPLADORES**	**279 días**	**lun 28/08/23**	**jue 4/07/24**
38		Obra Civil	260 días	lun 18/09/23	jue 4/07/24
39		Suministro	140 días	lun 28/08/23	mié 31/01/24
40		**CUARTO DE DESECHOS**	**0 días**	**vie 8/11/24**	**vie 8/11/24**
41		Obra Civil	0 días	vie 8/11/24	vie 8/11/24
42		Suministro	0 días	vie 8/11/24	vie 8/11/24
43		**EDIFICIO ELÉCTRICO**	**350 días**	**lun 4/09/23**	**lun 30/09/24**
44		Obra Civil	350 días	lun 4/09/23	lun 30/09/24
45		**EDIFICIO DE OPERACIÓI**	**390 días**	**vie 28/07/23**	**lun 7/10/24**
46		Obra Civil	390 días	vie 28/07/23	lun 7/10/24

Proyecto: REPROGRMACION PC
Fecha: mar 22/10/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
47		**PORTERÍA**	**185 días**	**lun 11/03/24**	**jue 3/10/24**
48		Obra Civil	185 días	lun 11/03/24	jue 3/10/24
49		**INTERCONEXIONES A PRESIÓN**	**94 días**	**jue 20/06/24**	**jue 3/10/24**
50		Obra Civil	84 días	mar 2/07/24	jue 3/10/24
51		Suministro	91 días	jue 20/06/24	mar 1/10/24
52		**INTERCONEXIONES A FLUJO LIBRE**	**52 días**	**vie 2/08/24**	**lun 30/09/24**
53		Obra Civil	37 días	lun 19/08/24	lun 30/09/24
54		Suministro	36 días	vie 2/08/24	mié 11/09/24
55		**URBANISMO**	**92 días**	**mar 2/07/24**	**sáb 12/10/24**
56		Obra Civil	84 días	mar 2/07/24	jue 3/10/24
57		Suministro	92 días	mar 2/07/24	sáb 12/10/24
58		**PUESTA EN MARCHA PTAP**	**45 días**	**jue 19/09/24**	**vie 8/11/24**
59		Obra Civil	45 días	jue 19/09/24	vie 8/11/24
60		**AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL**	**34 días**	**vie 21/06/24**	**mar 30/07/24**
61		Obra Civil	34 días	vie 21/06/24	mar 30/07/24
62		Suministro	34 días	vie 21/06/24	mar 30/07/24
63		**REDES ELECTRICAS**	**112 días**	**vie 21/06/24**	**vie 25/10/24**
64		Obra Civil	112 días	vie 21/06/24	vie 25/10/24
65		**CANAL PERIMETRAL**	**41 días**	**lun 19/08/24**	**jue 3/10/24**
66		Obra Civil	41 días	lun 19/08/24	jue 3/10/24
67		Suministro	41 días	lun 19/08/24	jue 3/10/24
68		**LECHOS DE SECADO (3 MODULOS)**	**232 días**	**lun 15/01/24**	**mar 1/10/24**
69		Obra Civil	232 días	lun 15/01/24	mar 1/10/24
70		Suministro	232 días	lun 15/01/24	mar 1/10/24
71		**CCM2**	**30 días**	**mar 2/07/24**	**lun 5/08/24**
72		Obra Civil	30 días	mar 2/07/24	lun 5/08/24
73		Suministro	30 días	mar 2/07/24	lun 5/08/24
74		**TANQUE SEMIENTERRADO**	**440 días**	**jue 16/03/23**	**sáb 20/07/24**
75		Obra Civil	440 días	jue 16/03/23	sáb 20/07/24
76		Suministro	440 días	jue 16/03/23	sáb 20/07/24
77		**ESTACIÓN DE BOMBEO**	**43 días**	**mié 12/06/24**	**mar 30/07/24**
78		Obra Civil	43 días	mié 12/06/24	mar 30/07/24
79		Suministro	43 días	mié 12/06/24	mar 30/07/24
80		**REDES DE DISTRIBUCIÓN**	**461 días**	**vie 5/05/23**	**mié 2/10/24**
81		**RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO COMUNITARIO VEREDA 2 ALBANIA**	**120 días**	**mar 16/05/23**	**mié 27/09/23**
82		Obra Civil	120 días	mar 16/05/23	mié 27/09/23
83		Suministro	120 días	mar 16/05/23	mié 27/09/23
84		**RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO COMUNITARIO**	**120 días**	**mar 16/05/23**	**mié 27/09/23**
85		Obra Civil	120 días	mar 16/05/23	mié 27/09/23
86		Suministro	120 días	mar 16/05/23	mié 27/09/23
87		**RED DE DISTRIBUCIÓN TRAMO JAZMIN CON PASO ELEVADO**	**103 días**	**mié 7/06/23**	**vie 29/09/23**
88		Obra Civil	103 días	mié 7/06/23	vie 29/09/23
89		Suministro	103 días	mié 7/06/23	vie 29/09/23
90		**RES DE DISTRIBUCIÓN TRAMO DARIO**	**410 días**	**jue 22/06/23**	**mar 24/09/24**
91		Obra Civil	410 días	jue 22/06/23	mar 24/09/24

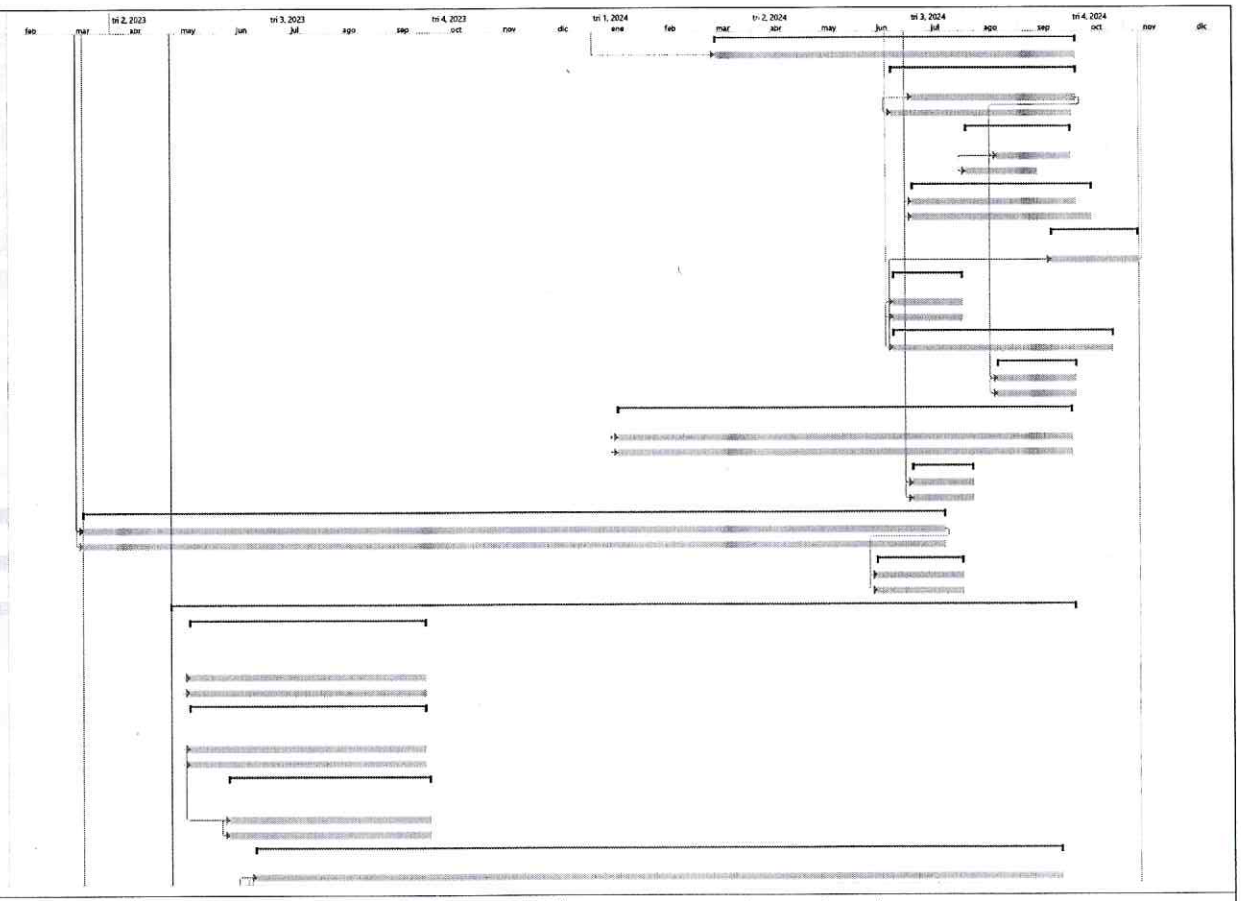

Proyecto: REPROGRMACION PC
Fecha: mar 22/10/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
92		Suministro	410 días	jue 22/06/23	mar 24/09/24
93		**RED DE DISTRIBUCIÓN LA UNIÓN CON PASO SIN ZANJA**	**410 días**	**mié 28/06/23**	**lun 30/09/24**
94		Obra Civil	410 días	mié 28/06/23	lun 30/09/24
95		Suministro	410 días	mié 28/06/23	lun 30/09/24
96		**RED DE DISTRIBUCIÓN GRANATE**	**430 días**	**vie 5/05/23**	**jue 29/08/24**
97		Obra Civil	430 días	vie 5/05/23	jue 29/08/24
98		Suministro	430 días	vie 5/05/23	jue 29/08/24
99		**RED DE DISTRIBUCIÓN TRAMO GRANADA**	**410 días**	**sáb 24/06/23**	**jue 26/09/24**
100		Obra Civil	410 días	sáb 24/06/23	jue 26/09/24
101		Suministro	410 días	sáb 24/06/23	jue 26/09/24
102		**RED DE DISTRIBUCIÓN TRAMO SAN ISIDRO**	**410 días**	**jue 15/06/23**	**lun 16/09/24**
103		Obra Civil	410 días	jue 15/06/23	lun 16/09/24
104		Suministro	410 días	jue 15/06/23	lun 16/09/24
105		**RED DE DISTRIBUCIÓN TRAMO COLINA 1 CON PASO SIN ZANJA**	**290 días**	**mar 16/05/23**	**jue 4/04/24**
106		Obra Civil	290 días	mar 16/05/23	jue 4/04/24
107		Suministro	290 días	mar 16/05/23	jue 4/04/24
108		**RED DE DISTRIBUCIÓN TRAMO COLINA 2**	**440 días**	**mar 16/05/23**	**jue 19/09/24**
109		Obra Civil	440 días	mar 16/05/23	jue 19/09/24
110		Suministro	440 días	mar 16/05/23	jue 19/09/24
111		**RED DE DISTRIBUCIÓN TRAMO LA ISLA CON PASO ELEVADO**	**10 días**	**jue 19/09/24**	**mar 1/10/24**
112		Obra Civil	10 días	jue 19/09/24	mar 1/10/24
113		Suministro	10 días	jue 19/09/24	mar 1/10/24
114		**RED DE DISTRIBUCIÓN TRAMO MIRAMAR**	**380 días**	**mar 18/07/23**	**lun 16/09/24**
115		Obra Civil	380 días	mar 18/07/23	lun 16/09/24
116		Suministro	380 días	mar 18/07/23	lun 16/09/24
117		**CAJAS DE PURGAS Y VENTOSAS**	**45 días**	**mar 13/08/24**	**mié 2/10/24**
118		Obra Civil	45 días	mar 13/08/24	mié 2/10/24
119		Suministro	45 días	mar 13/08/24	mié 2/10/24

