DATUM X S.A.S

NIT. 901.544.149-1

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 5083 de 2023

INFORME MENSUAL No.8

INTERVENTORIA:
DATUM X S.A.S

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3612 de 2023, 3478 de 2023, 3381 de 2023, 3091 de 2023, 3096 de 2023, 3241 de 2023, 3779 de 2023, 3793 de 2023, 4612 de 2023, 4567 de 2023

Contratista: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA ALTO YASAL, JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA QUEBRADA HONDA, JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA BAJO PASUNCHA, JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA CAPIRA, JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN RAFAEL, JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA FLORESTA, JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAGUNA VERDE, JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LOS RÍOS, JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA MONTE BELLO Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA MATA DE RAMO

Contrato de Interventoría No. 5083 de 2023

Interventoría: DATUM X S.A.S

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EN LA VEREDA ALTO YASAL MUNICIPIO DE PACHO EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAPIRA DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTE BELLO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MATA DE RAMO DEL MUNICIPIO TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8 **MES O PERIODO:** JULIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		N/A
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCION

A continuación, se presenta el Informe Mensual No. 8 correspondiente a las actividades realizadas desde 01 de julio hasta el 31 de julio de 2024 en cumplimiento del Contrato de Interventoría No. 8053 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1" cuyo principal objetivo es dar a conocer el desarrollo del proyecto y el control sobre las actividades de los contratos de obra derivados de los convenios Interadministrativos 3612 de 2023, 3478 de 2023, 3381 de 2023, 3091 de 2023, 3096 de 2023, 3241 de 2023, 3779 de 2023, 3793 de 2023, 4612 de 2023 y 4567 de 2023 suscritos respectivamente con las juntas de acción comunal de Alto Yasal, Quebrada Honda, Bajo Pasuncha, Capira, San Rafael, La Floresta, Laguna Verde, Los Ríos, Monte Bello y Mata de Ramo de los municipio de Pacho, Paime, San Cayetano, El Peñón y Topaipi de la región del Río Negro, departamento de Cundinamarca, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total que nace debido a la necesidad de mejorar el estado de la conectividad vial de zonas rurales. En el presente informe se consignan las actividades realizadas por los Contratistas de obra, la Interventoría, conclusiones y recomendaciones y las evidencias que muestran el desarrollo del proyecto (Gráficos, Actas, Formatos, Cuadros de control, etc.).

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.


Este proyecto tiene como objeto realizar obras de infraestructura vial que permitan mejorar las condiciones de circulación por las vías de los municipios del departamento de Cundinamarca como lo son: Pacho, Paime, San Cayetano, El Peñón y Topaipi; al igual que mejorar la accesibilidad a los predios adyacentes de la vías intervenidas, facilitar el libre desplazamiento de los habitantes, recuperar los niveles de servicio y capacidad vial, reducir los costos de operación vehicular, reducir tiempos de viaje, mejorar la comodidad para circulación vehicular, reducir niveles de accidentalidad y contribuir con el desarrollo de los procesos productivos que contribuyen a la generación de empleo y al intercambio comercial porque se estimula el crecimiento económico sostenido y la equidad social.

De igual manera se busca realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

2.1 Localización del proyecto:

El Departamento de Cundinamarca está situado El Departamento de Cundinamarca está situado al Centro de la República de Colombia y sus territorios hacen parte de la región Andina, localizado entre 03°40'04" y 05°50'14" de latitud norte y 73°03'16" y 74°53'39" de longitud oeste, tiene una extensión de 24.210 kilómetros cuadrados (Km2) lo que corresponde a 2.12 % del territorio nacional y limita por el Norte con el departamento de Boyacá (franja de territorio en litigio), al Este con los departamentos de Boyacá y Meta, al Sur con los departamentos del Meta, Huila y Tolima y al Oeste con el río Magdalena, que lo separa de los departamentos del Tolima y Caldas.

Ilustración 1. Localización

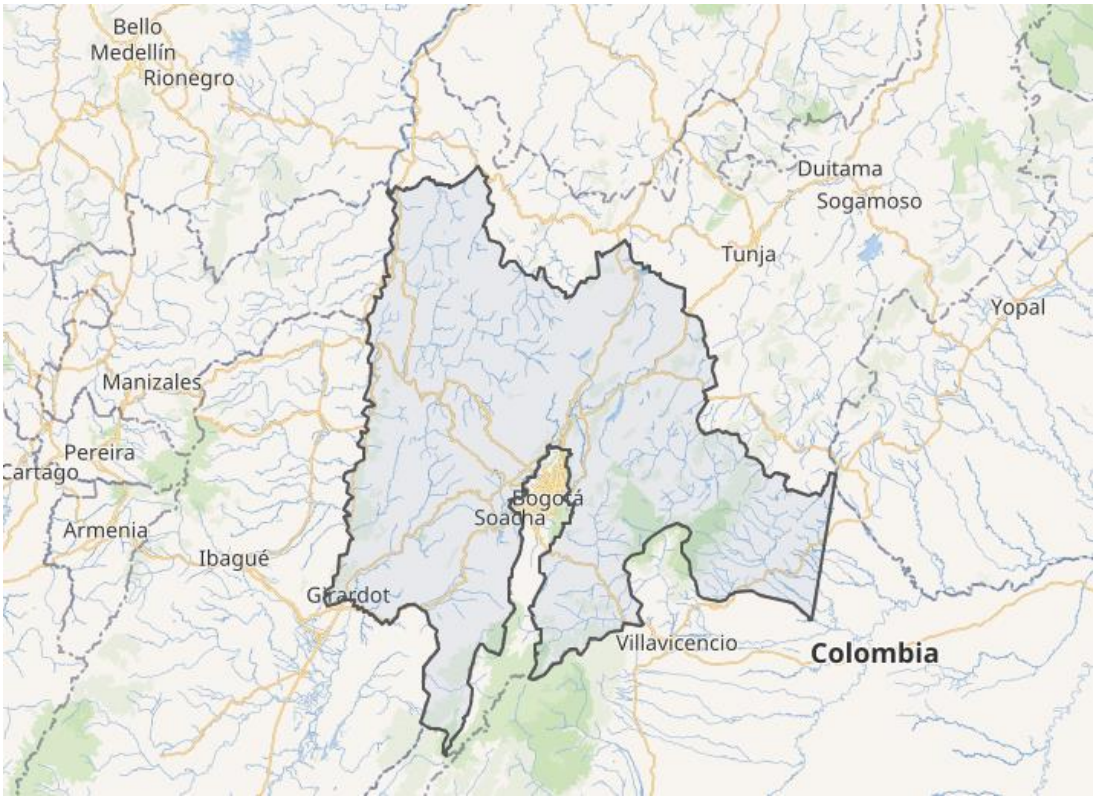


Fuente. https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca#/map/0

2.1.1. Localización Vereda Alto Yasal, Pacho.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pacho del departamento de Cundinamarca, en la vereda Alto Yasal, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 y coordenadas Norte 5.2711605, Este -

74.22230 punto de referencia final el PR1+027, con coordenadas Norte 5.2682530, Este -74.2192336.

Ilustración 2. Localización

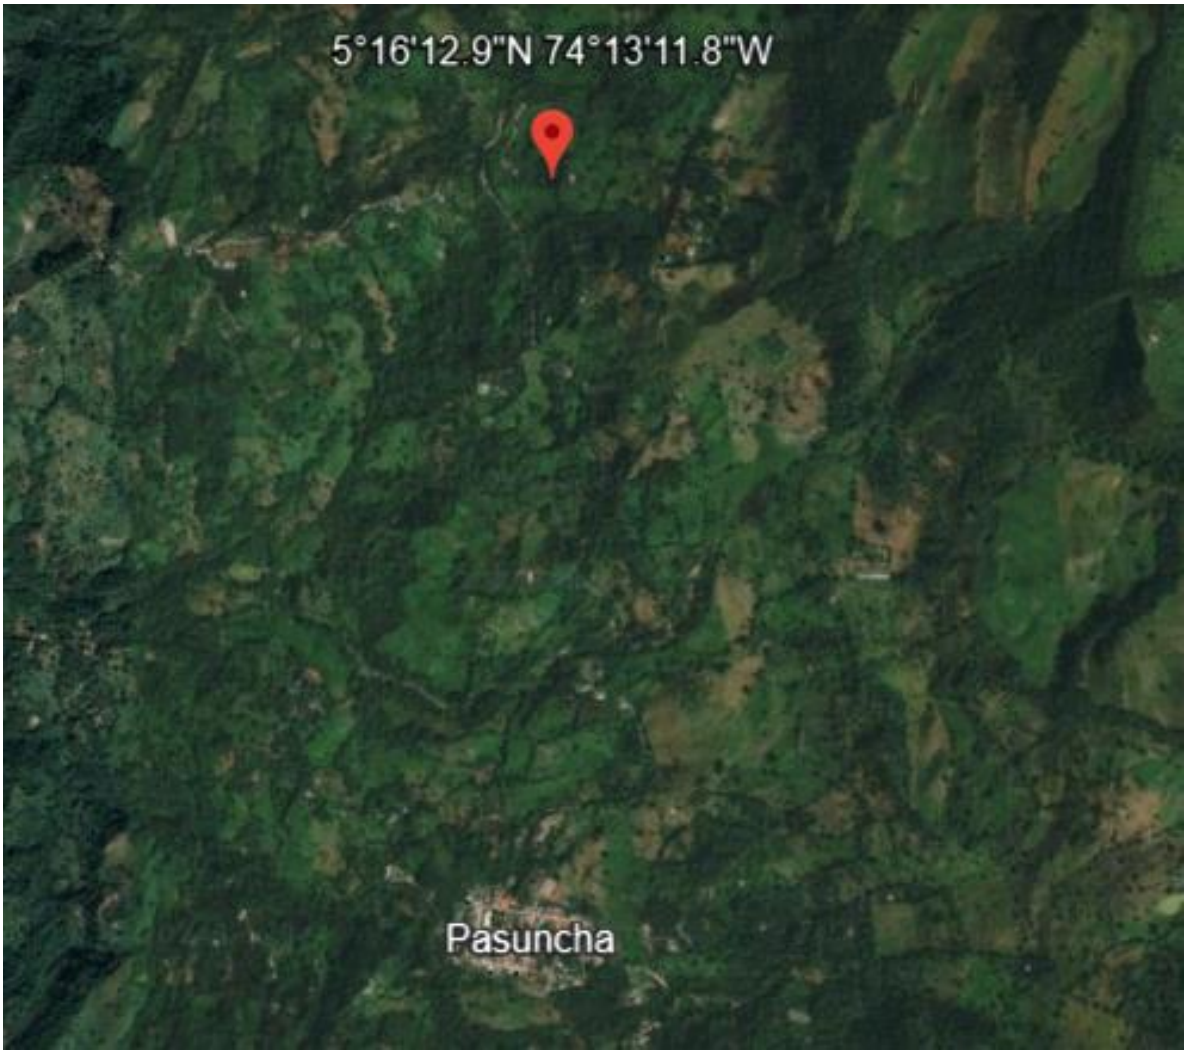


Fuente. Google Earth

2.1.2. Localización Vereda Quebrada Honda y La Palancana, Pacho.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pacho del departamento de Cundinamarca, en la vereda Quebrada Honda y La Palancana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 y coordenadas Norte 5.257104172, Este -74.23876006 punto de referencia final el PR1+030, con coordenadas Norte 5.298008251, Este -74.21992806.

Ilustración 3. Localización

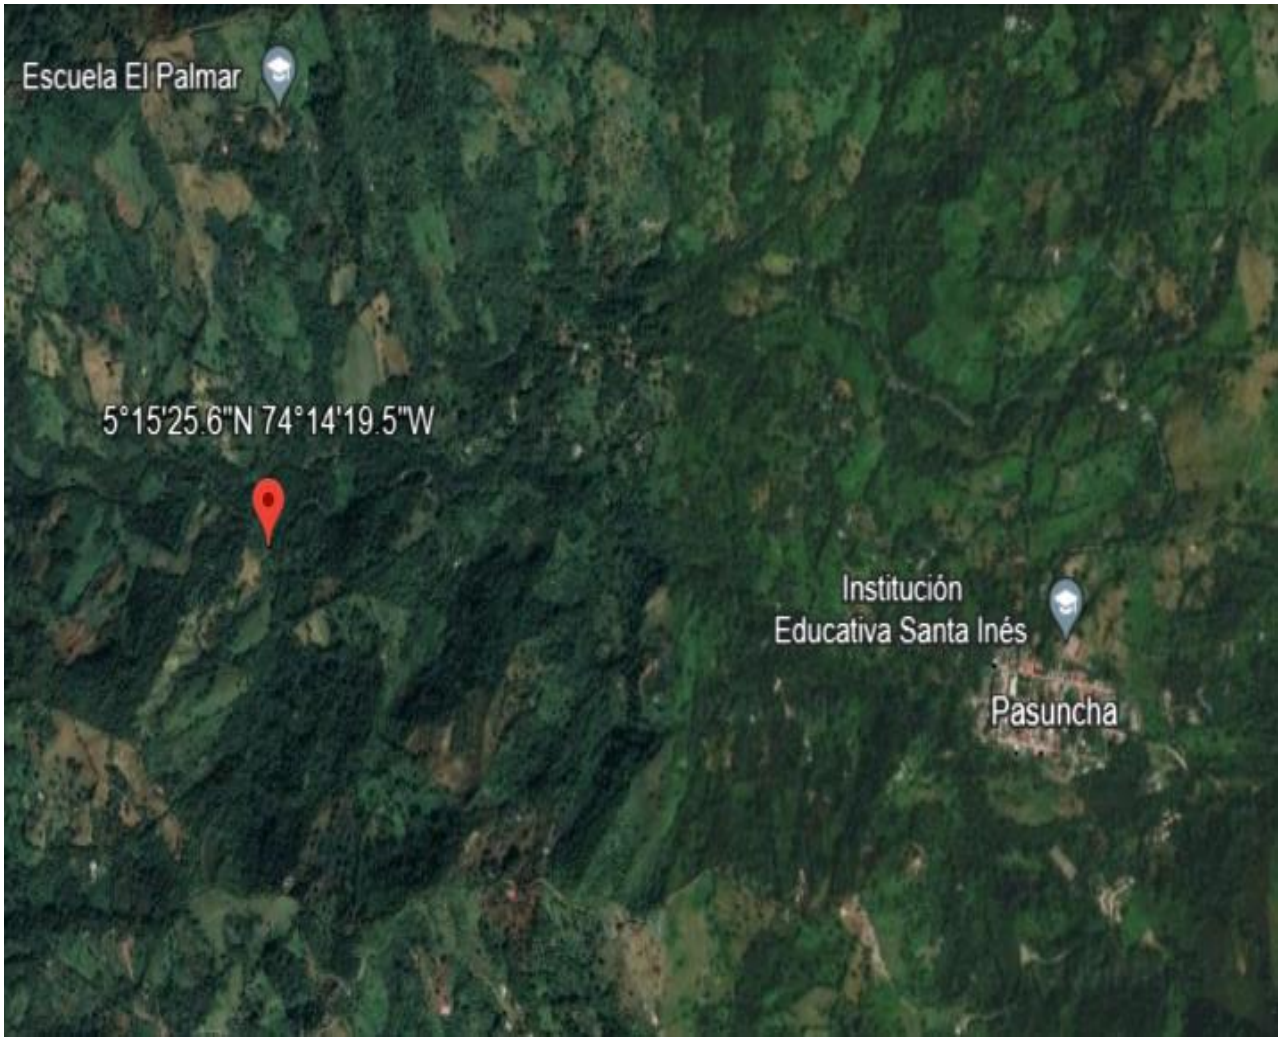

Fuente. Google Earth

2.1.3. Localización Vereda Bajo Pasuncha, Pacho.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pacho del departamento de Cundinamarca, en la vereda Bajo Pasuncha, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 y coordenadas Norte 5.25487, Este -74.22223 punto de referencia final el PR1+060, con coordenadas Norte 5.26056, Este -74.23122.

Ilustración 4. Localización



Fuente. Google Earth

2.1.4. Localización Vereda Capira, Paime.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paime del departamento de Cundinamarca, en la vereda Capira, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 y coordenadas Norte 5,33145110528432, Este -74,1899043501056 punto de referencia final el PR0+256, con coordenadas Norte 5,33145110528432, Este -74,1893622270851.

Ilustración 5. Localización



Fuente. Google Earth

2.1.5. Localización Vereda San Rafael, Paime.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paime del departamento de Cundinamarca, en la vereda San Rafael, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 y coordenadas Norte 5,35800505279099, Este -74,164125191924 punto de referencia final el PR0+200, con coordenadas Norte 5,35641664681083, Este -74,1643144830269.

Ilustración 6. Localización



Fuente. Google Earth

2.1.6. Localización Vereda La Floresta, San Cayetano.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del departamento de Cundinamarca, en la vereda La Floresta, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 y coordenadas Norte 5.289112394, Este -74.14591937 punto de referencia final el PR0+485, con coordenadas Norte 5.288785, Este -74.14503167.

Ilustración 7. Localización



Fuente. Google Earth

2.1.7. Localización Vereda Laguna Verde, San Cayetano.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del departamento de Cundinamarca, en la vereda Laguna Verde, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 y coordenadas Norte 5.245993447, Este -74.09093629 punto de referencia final el PR0+485, con coordenadas Norte 5.244825, Este -74.09082833.

Ilustración 8. Localización



Fuente. Google Earth

2.1.8. Localización Vereda Los Ríos, San Cayetano.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del departamento de Cundinamarca, en la vereda Los Ríos, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 y coordenadas Norte 5.27555389061944, Este -74.126230438506 punto de referencia final el PR0+485, con coordenadas Norte 5.27498617803638, Este -74.12551093.

Ilustración 9. Localización



Fuente. Google Earth

2.1.9. Localización Vereda Monte Bello, El Peñón.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Peñón del departamento de Cundinamarca, en la vereda Monte Bello, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 y coordenadas Norte 5.268, Este -74.272 punto de referencia final el PR0+207, con coordenadas Norte 5.268, Este -74.271.

Ilustración 10. Localización




Fuente. Google Earth

2.1.10. Localización Vereda Mata de Ramo, Topaipi.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipi del departamento de Cundinamarca, en la vereda Mata de Ramo, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 y coordenadas Norte 5.296989335, Este -74.22299852 punto de referencia final el PR0+460, con coordenadas Norte 5.298008251, Este -74.21992806.

Ilustración 11. Localización

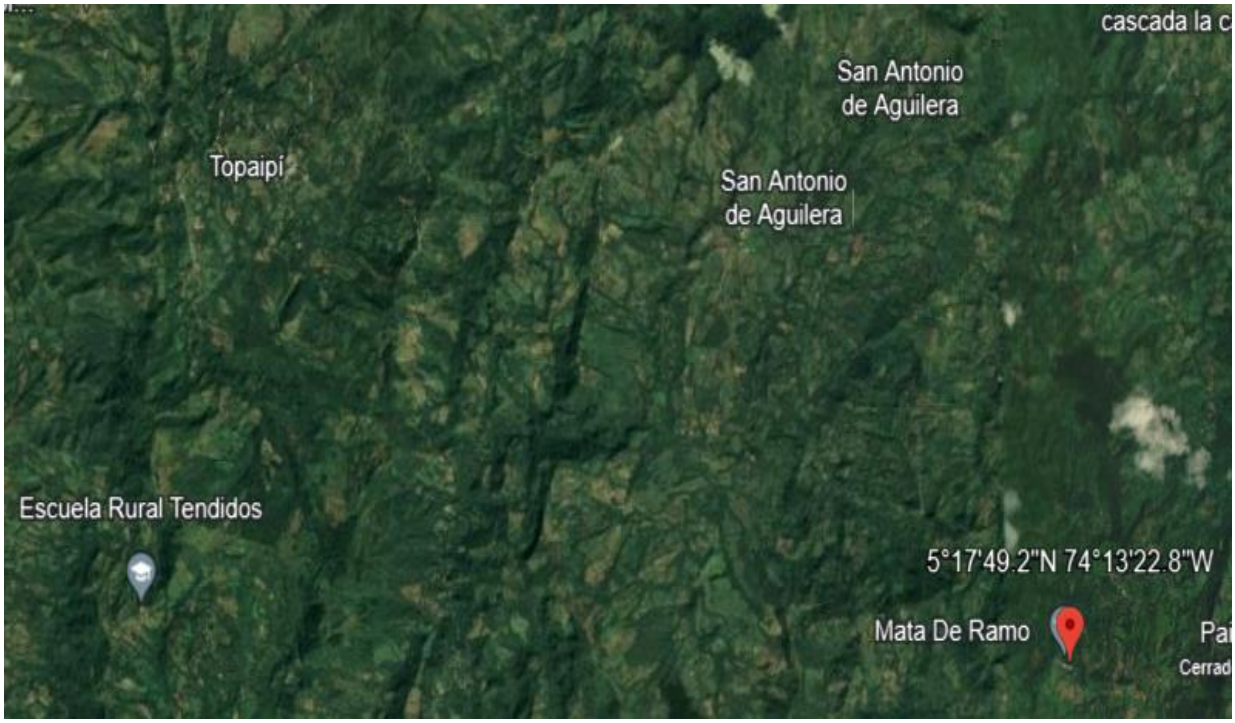

Fuente. Google Earth

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Los contratos de mejoramiento vial tienen como objetivo mejorar las condiciones de movilidad, puesto que tienen como fin brindar mayores medias de seguridad al momento de trasladarse, disminución de costos adicionales que se generan a la hora de transportarse y el deterioro de vehículos, por lo cual se priorizaron zonas de los corredores viales de los siguientes municipios: Pacho, Paime, San Cayetano, El Peñón y Topaipi.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto estado inicial Alto Yasal</td><td>Foto estado inicial Quebrada Honda y La Palancana</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto estado inicial Bajo Pasuncha</td><td>Foto estado inicial Capira</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto estado inicial San Rafael</td><td>Foto estado inicial La Floresta</td></tr>
</table>



Foto estado inicial Laguna Verde



Foto estado inicial Los Ríos



Foto estado inicial Monte Bello



Foto estado inicial Mata de Ramo

2.4 Características técnicas del proyecto.

El proyecto comprende el mejoramiento de infraestructura vial rural existente, por medio de la construcción de placa huellas, teniendo en cuenta que se genera una distribución óptima de los esfuerzos transmitidos a la subrasante, provenientes de los vehículos que transitan por la misma. La duración de una estructura de concreto es mucho mayor que el material de afirmado, hace que el agua de escorrentía pase sobre ella, eliminando el problema de segregación y transporte de material granular.

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1 Información general.

A continuación, se presenta la información general de los contratos celebrados con las juntas de acción comunal de la Región del Rionegro del departamento de Cundinamarca:

3.1.1. Alto Yasal, Pacho.

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE ALTO YASAL
CONTRATO DE OBRA NO.	3612 de 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EN LA VEREDA ALTO YASAL MUNICIPIO DE PACHO EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
PROCESO DE SELECCION	SPSC-CD-CS-372-2023
ID SECOP II	CO1.REQ.5107591
UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($198.779.288)
FECHA ORDEN DE INICIO	13 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.1	20 DE DICIEMBRE DE 2023 (HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No.2	20 DE ABRIL DE 2023 (HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	31 DE AGOSTO DE 2024

3.1.2. Quebrada Honda y La Palancana.

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA
CONTRATO DE OBRA NO.	3478 de 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

PROCESO DE SELECCION	SPSC-CD-CS-298-2023
ID SECOP II	CO1.REQ.5092710
UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($199.674.031)
FECHA ORDEN DE INICIO	21 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN No.1	29 DE DICIEMBRE DE 2023 (HASTA EL 17 DE ENERO DE 2024)
PRORROGA No.1	18 DE ENERO DE 2024 (HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No.2	20 DE ABRIL DE 2023 (HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	31 DE AGOSTO DE 2024

3.1.3. Bajo Pasuncha.

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BAJO PASUNCHA
CONTRATO DE OBRA NO.	3381 de 2023
OBJETO	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
PROCESO DE SELECCION	SPSC-CD-CS-237-2023
ID SECOP II	CO1.REQ.5064603
UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($200.312.049)
FECHA ORDEN DE INICIO	13 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.1	20 DE DICIEMBRE DE 2023 (HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No.2	20 DE ABRIL DE 2023 (HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	31 DE AGOSTO DE 2024

3.1.4. Capira.

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CAPIRA
CONTRATO DE OBRA NO.	3091 de 2023
OBJETO	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAPIRA DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
PROCESO DE SELECCION	SPSC-CD-CS-120-2023
ID SECOP II	CO1.REQ.5010452
UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($195.105.319)
FECHA ORDEN DE INICIO	21 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN No.1	29 DE DICIEMBRE DE 2023 (HASTA EL 17 DE ENERO DE 2024)
PRORROGA No.1	18 DE ENERO DE 2024 (HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	19 DE ENERO DE 2024
PRORROGA No.2	20 DE ABRIL DE 2023 (HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	31 DE AGOSTO DE 2024

3.1.5. San Rafael.

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA NO.	3096 de 2023
OBJETO	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
PROCESO DE SELECCION	SPSC-CD-CS-124-2023
ID SECOP II	CO1.REQ.5010715
UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($195.105.319)
FECHA ORDEN DE INICIO	21 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN No.1	29 DE DICIEMBRE DE 2023 (HASTA EL 17 DE ENERO DE 2024)
PRORROGA No.1	18 DE ENERO DE 2024 (HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	19 DE ENERO DE 2024
PRORROGA No.2	20 DE ABRIL DE 2023 (HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	31 DE AGOSTO DE 2024

3.1.6. La floresta.

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA FLORESTA
CONTRATO DE OBRA NO.	3241 de 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
PROCESO DE SELECCION	SPSC-CD-CS-189-2023
ID SECOP II	CO1.REQ.5038814
UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($199.166.367)
FECHA ORDEN DE INICIO	13 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.1	20 DE DICIEMBRE DE 2023 (HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No.2	20 DE ABRIL DE 2023 (HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	31 DE AGOSTO DE 2024

3.1.7. Laguna Verde.

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAGUNA VERDE
CONTRATO DE OBRA NO.	3779 de 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
PROCESO DE SELECCION	SPSC-CD-CS-494-2023
ID SECOP II	CO1.REQ.5137362
UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($198.947.680)
FECHA ORDEN DE INICIO	21 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN No.1	29 DE DICIEMBRE DE 2023 (HASTA EL 17 DE ENERO DE 2024)
PRORROGA No.1	18 DE ENERO DE 2024 (HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No.2	20 DE ABRIL DE 2023 (HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	31 DE AGOSTO DE 2024

3.1.8. Los Ríos.

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS RÍOS
CONTRATO DE OBRA NO.	3793 de 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
PROCESO DE SELECCION	SPSC-CD-CS-497-2023
ID SECOP II	CO1.REQ.5138129
UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($199.276.933)
FECHA ORDEN DE INICIO	27 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023

SUSPENSIÓN No.1	29 DE DICIEMBRE DE 2023 (HASTA EL 17 DE ENERO DE 2024)
PRORROGA No.1	19 DE ENERO DE 2024 (HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No.2	20 DE ABRIL DE 2023 (HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	31 DE AGOSTO DE 2024

3.1.9. Monte Bello.

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MONTE BELLO
CONTRATO DE OBRA NO.	4612 de 2023
OBJETO	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTE BELLO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
PROCESO DE SELECCION	SPSC-CD-CS-992-2023
ID SECOP II	CO1.REQ.5326404
UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($200.940.745)
FECHA ORDEN DE INICIO	28 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN No.1	29 DE DICIEMBRE DE 2023 (HASTA EL 17 DE ENERO DE 2024)
PRORROGA No.1	18 DE ENERO DE 2024 (HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No.2	20 DE ABRIL DE 2023 (HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	31 DE AGOSTO DE 2024

3.1.10. Mata de Ramo.

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MATA DE RAMO
CONTRATO DE OBRA NO.	4567 de 2023
OBJETO	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MATA DE RAMO DEL MUNICIPIO TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE

	CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
PROCESO DE SELECCION	SPSC-CD-CS-1024-2023
ID SECOP II	CO1.REQ.5338029
UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($199.186.308)
FECHA ORDEN DE INICIO	27 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN No.1	29 DE DICIEMBRE DE 2023 (HASTA EL 17 DE ENERO DE 2024)
PRORROGA No.1	18 DE ENERO DE 2024 (HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No.2	20 DE ABRIL DE 2023 (HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024)
FECHA DE TERMINACION	31 DE AGOSTO DE 2024

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

Actividades realizadas

CONVENIO SOLIDARIO 3612 DE 2023 - JAC ALTO YASAL

	
Actividades de Explanaciones y Conformación del Terreno – JAC Alto Yasal	**Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

	
Actividades De Explanación y Conformación Del Terreno – JAC Alto Yasal	**Actividades de Explanación y Conformación del terreno – JAC Alto Yasal**
	
Ejecución del ítem Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	**Ejecución del ítem Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)**
	
Ejecución del ítem Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	**Ejecución del ítem Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)**

INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)** "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

CONVENIO SOLIDARIO 3381 DE 2023 - JAC BAJO PASUNCHA

	
Ejecución del ítem Excavaciones varias sin Clasificar	**Ejecución del ítem Excavaciones varias sin Clasificar**
	
Ejecución del ítem Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	**Ejecución del ítem Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)**


	
Ejecución del ítem concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	**Ejecución del ítem concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ**

CONVENIO SOLIDARIO 3478 DE 2023 - JAC QUEBRADA HONDA

	
Ejecución del ítem concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	**Ejecución del ítem concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ**
	
Ejecución del ítem Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	**Ejecución del ítem Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

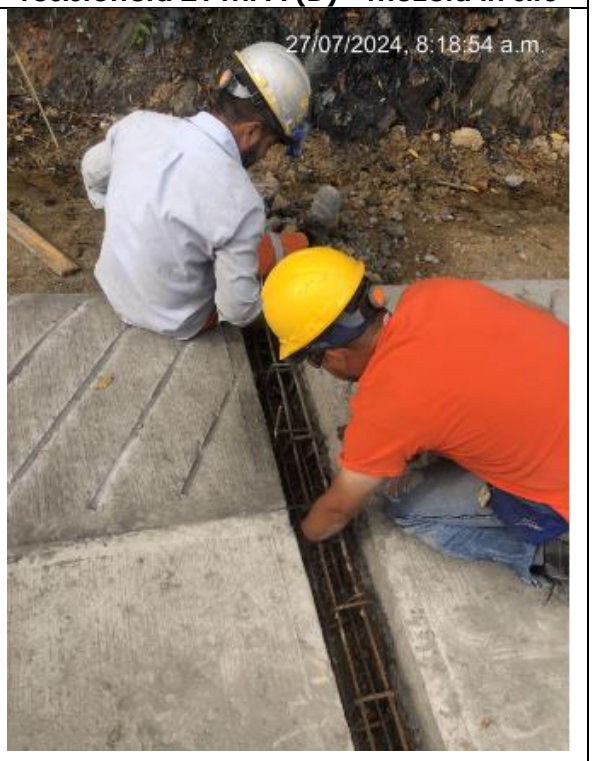	
Ejecución del ítem concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	**Ejecución del ítem concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ**
	
Ejecución del ítem Excavaciones varias sin Clasificar	**Ejecución del ítem Excavaciones varias sin Clasificar**





INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)** "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

CONVENIO SOLIDARIO 4612 DE 2023 - JAC MONTEBELLO - PEÑON

	
Visita Técnica de Obra	**Visita Técnica de obra**
	
• **Levantamiento de formatos Socioeconómicos – Área Social**	• **Levantamiento de formatos Socioeconómicos – Área Social**

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)** "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

CONVENIO SOLIDARIO 3092 DE 2023 - JAC VEREDA SAN RAFAEL

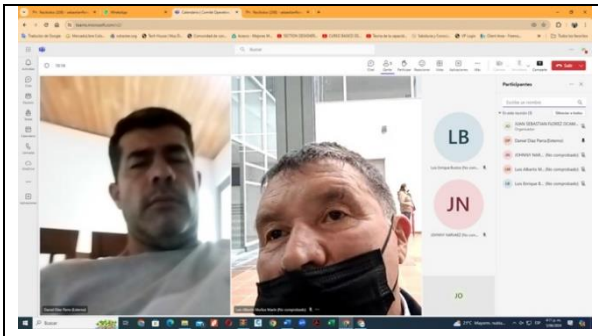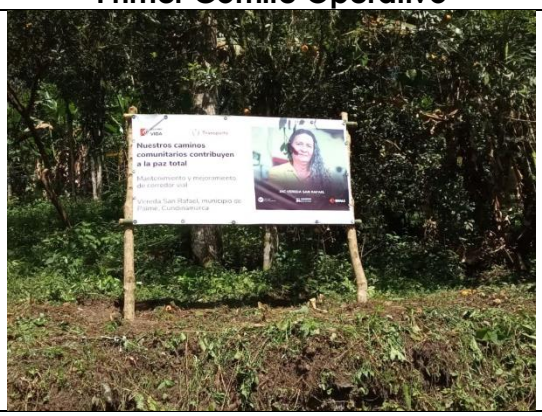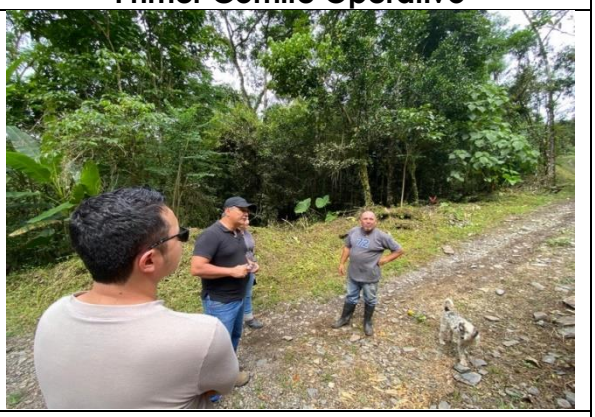	
Primer Comité Operativo	**Primer Comité Operativo**
	
Visitas Tecnica	**Comité Operativo**

CONVENIO SOLIDARIO 3096 DE 2023 - JAC VEREDA CAPIRA

	
Comité operativo – Compra de materiales	**Comité Operativo – Compra de Materiales**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

CONVENIO SOLIDARIO 3793 DE 2023 – JAC LA FLORESTA– SAN CAYETANO

	
Ejecución del ítem concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	**Ejecución del ítem concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ**
	
Ejecución del ítem concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	**Ejecución del ítem concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ**

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)** "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

CONVENIO SOLIDARIO 3779 DE 2023 – JAC LAGUNA VERDE– SAN CAYETANO


	
Ejecución de la conformación de la calzada e instalación de la súbase	**Ejecución de la conformación de la calzada e instalación de la súbase**
	
Ejecución del ítem Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	**Ejecución del ítem Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G**

CONVENIO SOLIDARIO 3793 DE 2023 - JAC LOS RIOS – SAN CAYETANO

	
Ejecución del ítem concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	**Ejecución del ítem concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ**
	
Ejecución del ítem Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	**Ejecución del ítem Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)**

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)** "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

CONVENIO SOLIDARIO 3478 DE 2023 - JAC MATA DE RAMO - TOPAIPI

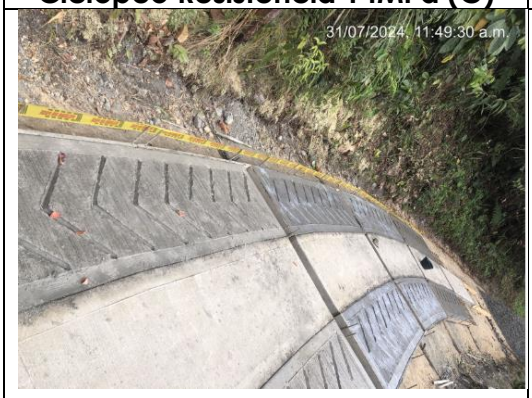
	
Ejecución del ítem Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	**Ejecución del ítem concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ**
	
Ejecución del ítem Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	**Ejecución del ítem concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ**

	
Ejecución del ítem Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	**Ejecución del ítem Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)**
	
Ejecución del ítem Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	**Ejecución del ítem Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)**

3.3 Estado de avance financiero convenios


CONVENIO SOLIDARIO 3612 DE 2023 - JAC ALTO YASAL

	COSTOS ADMINISTRATIVOS	COSTOS DE OBRA	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	COSTOS DE TOTAL CONVENIO
PRESUPUESTO	$ 41,257,890	$ 151,962,522	$ 4,558,876	$ 197,779,288
EJECUTADO	$ 12,919,201	$ 49,168,122	$ -	$ 62,087,323
FALTANTE POR EJECUTAR	$ 28,338,689	$ 102,794,400	$ 4,558,876	$ 135,691,965

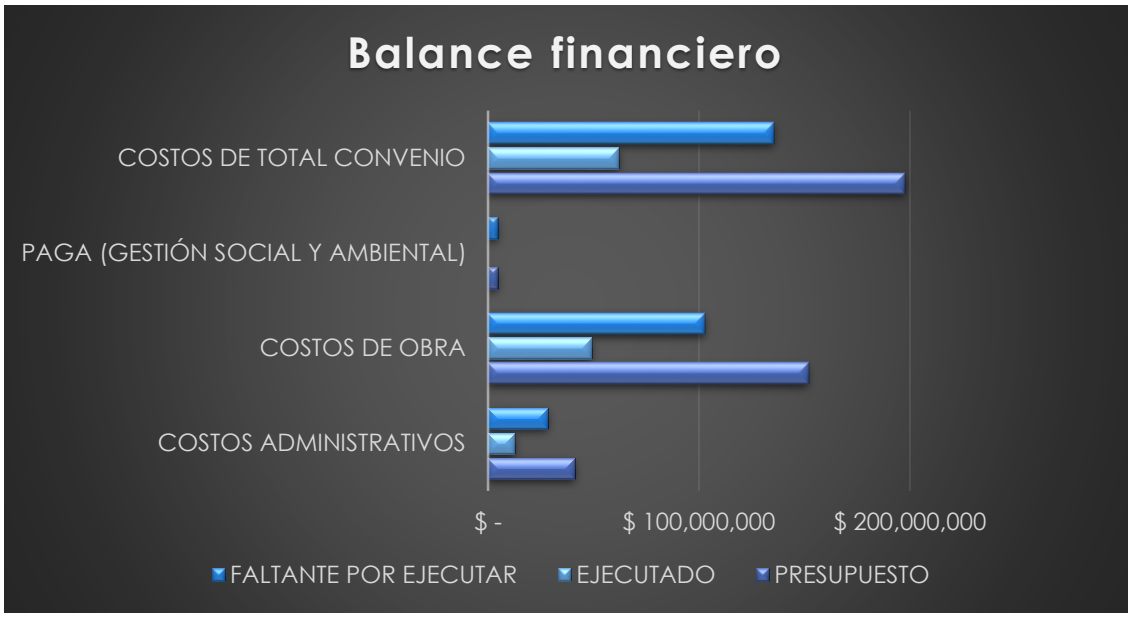


CONVENIO SOLIDARIO 3381 DE 2023 - JAC BAJO PASUNCHA

	COSTOS ADMINISTRATIVOS	COSTOS DE OBRA	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	COSTOS DE TOTAL CONVENIO
PRESUPUESTO	$ 44,750,280	$ 150,059,970	$ 4,501,799	$ 199,312,049
EJECUTADO	$ 13,575,372	$ 37,074,153	$ -	$ 50,649,525
FALTANTE POR EJECUTAR	$ 31,174,908	$ 112,985,817	$ 4,501,799	$ 148,662,524

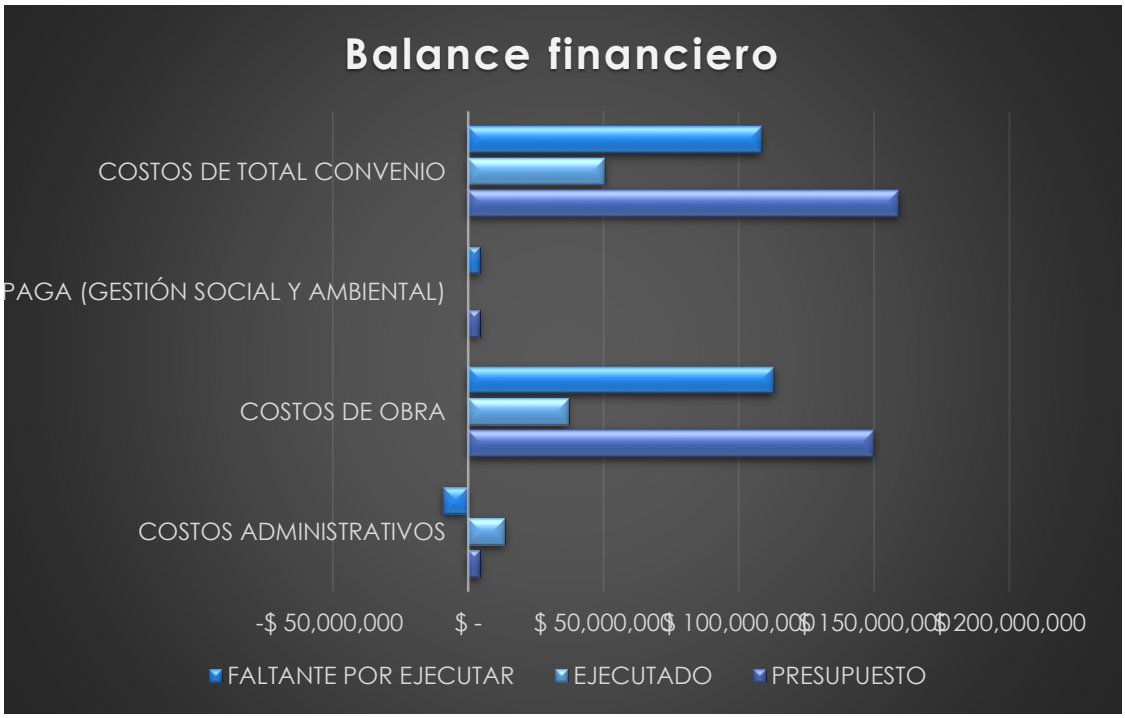

CONVENIO SOLIDARIO 3478 DE 2023 - JAC QUEBRADA HONDA


	COSTOS ADMINISTRATIVOS	COSTOS DE OBRA	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	COSTOS DE TOTAL CONVENIO
PRESUPUESTO	$ 44,747,812	$ 149,442,931	$ 4,483,288	$ 194,190,743
EJECUTADO	$ 12,669,063	$ 15,264,642	$ -	$ 27,933,705
FALTANTE POR EJECUTAR	$ 32,078,749	$ 134,178,289	$ 4,483,288	$ 166,257,038

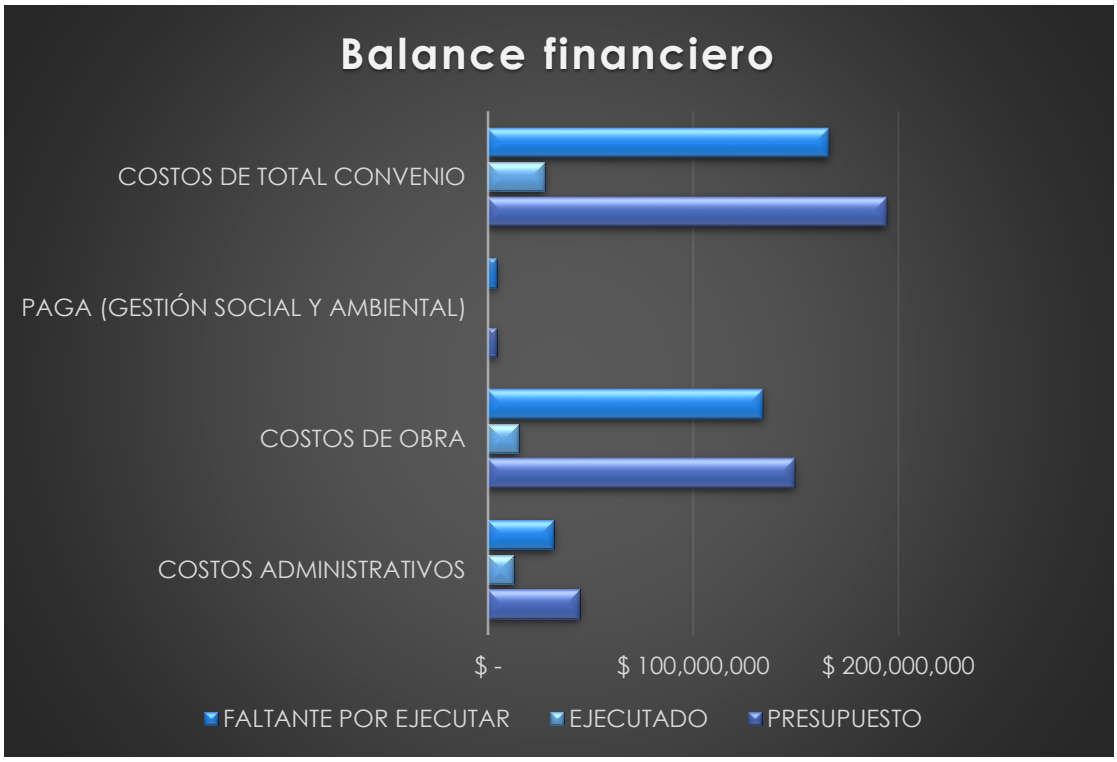

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)** "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

CONVENIO SOLIDARIO 4612 DE 2023 - JAC MONTEBELLO – PEÑON

	COSTOS ADMINISTRATIVOS	COSTOS DE OBRA	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	COSTOS DE TOTAL CONVENIO
PRESUPUESTO	$ 44,644,251	$ 150,773,295	$ 4,523,199	$ 199,940,745
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -
FALTANTE POR EJECUTAR	$ 44,644,251	$ 150,773,295	$ 4,523,199	$ 199,940,745

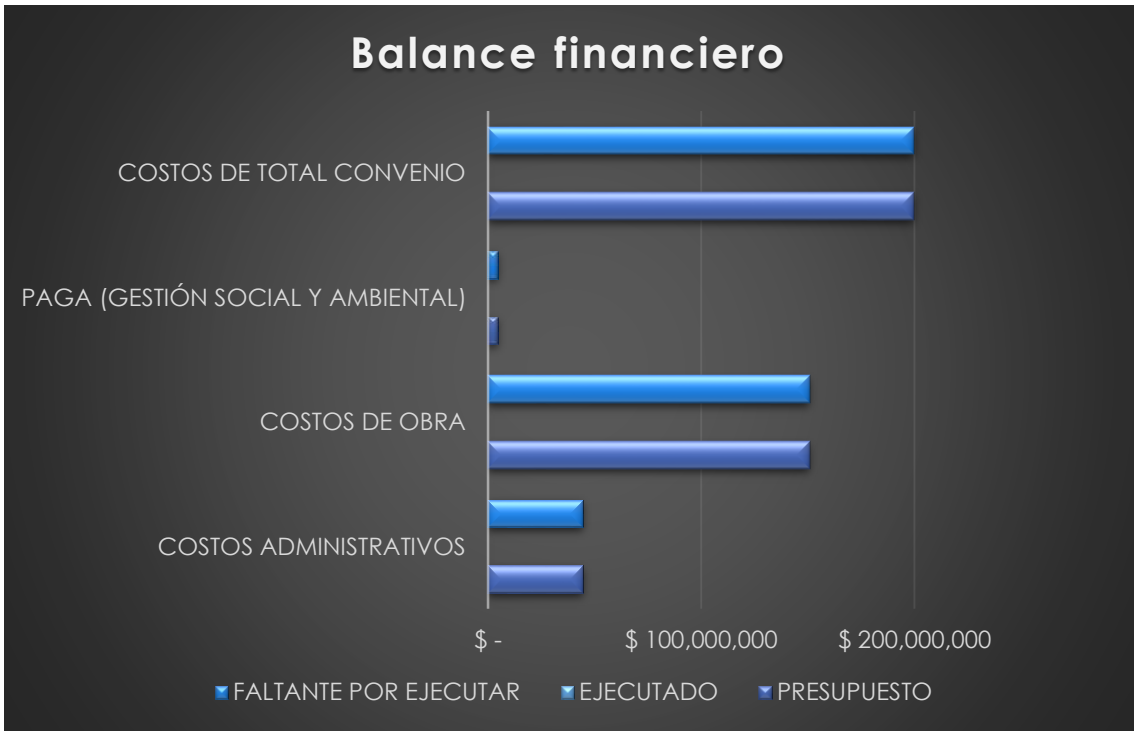

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

CONVENIO SOLIDARIO 3092 DE 2023 - JAC VEREDA SAN RAFAEL

	COSTOS ADMINISTRATIVOS	COSTOS DE OBRA	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	COSTOS DE TOTAL CONVENIO
PRESUPUESTO	$ 43,625,545	$ 146,096,868	$ 4,382,906	$ 194,105,319
EJECUTADO	$ 8,053,573	$ 68,301,143	$ -	$ 76,354,716
FALTANTE POR EJECUTAR	$ 35,571,972	$ 77,795,725	$ 4,382,906	$ 117,750,603




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

CONVENIO SOLIDARIO 3096 DE 2023 - JAC VEREDA CAPIRA


	COSTOS ADMINISTRATIVOS	COSTOS DE OBRA	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	COSTOS DE TOTAL CONVENIO
PRESUPUESTO	$ 44,008,719	$ 146,695,729	$ 4,400,872	$ 195,105,319
EJECUTADO	$ 11,473,095	$ 79,599,839	$ -	$ 91,072,934
FALTANTE POR EJECUTAR	$ 32,535,624	$ 67,095,890	$ 4,400,872	$ 104,032,385

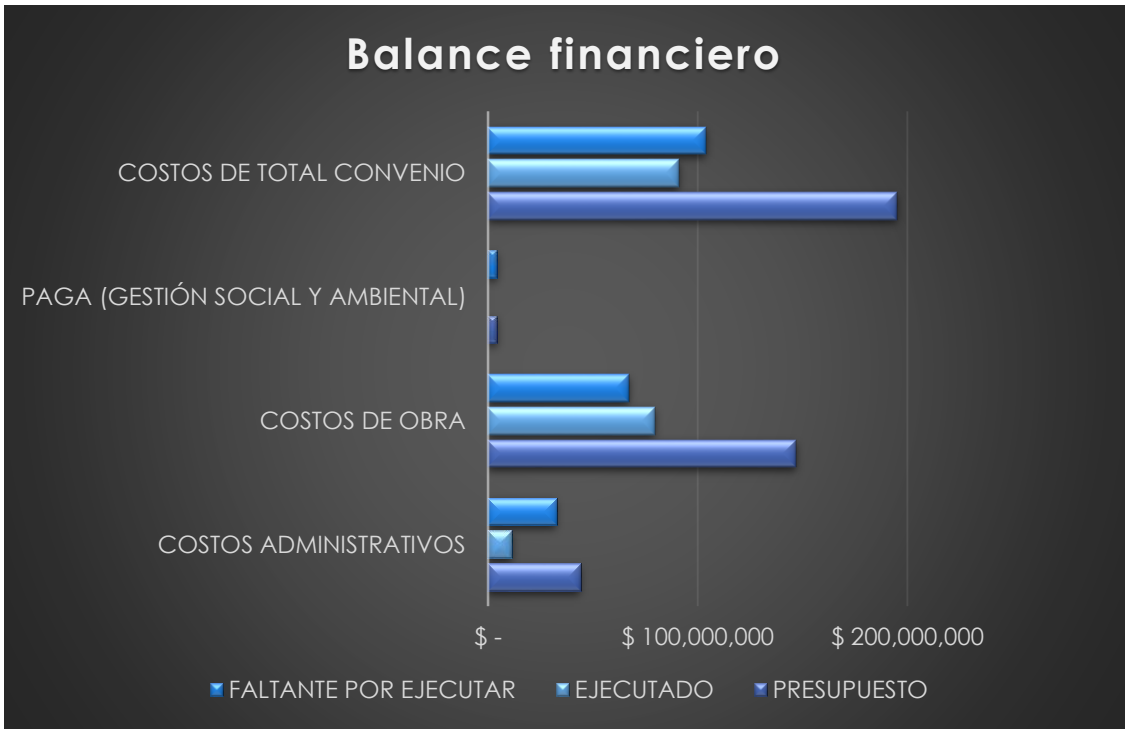

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)** "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"


CONVENIO SOLIDARIO 3793 DE 2023 – JAC LA FLORESTA– SAN CAYETANO

	COSTOS ADMINISTRATIVOS	COSTOS DE OBRA	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	COSTOS DE TOTAL CONVENIO
PRESUPUESTO	$ 44,476,892	$ 149,213,083	$ 4,476,392	$ 198,166,367
EJECUTADO	$ 11,679,322	$ 41,500,000	$ -	$ 53,179,322
FALTANTE POR EJECUTAR	$ 32,797,570	$ 107,713,083	$ 4,476,392	$ 144,987,045

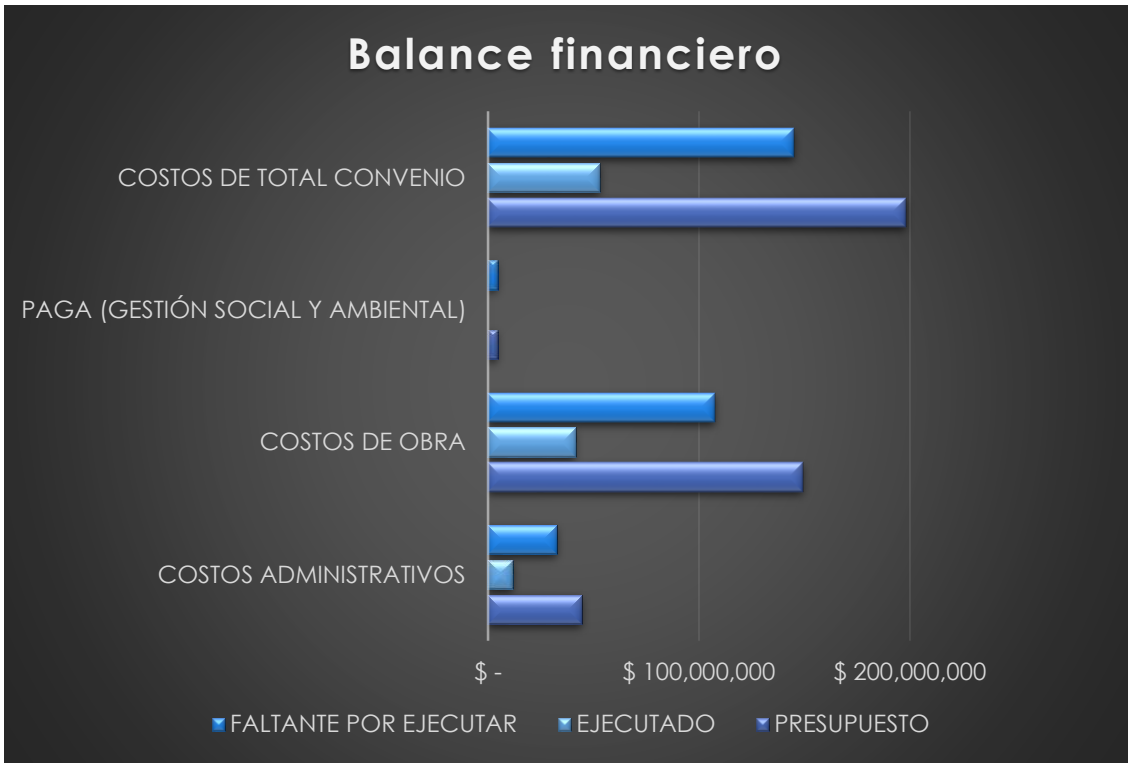


CONVENIO SOLIDARIO 3779 DE 2023 – JAC LAGUNA VERDE– SAN CAYETANO

	COSTOS ADMINISTRATIVOS	COSTOS DE OBRA	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	COSTOS DE TOTAL CONVENIO
PRESUPUESTO	$ 44,396,356	$ 149,078,955	$ 4,472,369	$ 197,947,680
EJECUTADO	$ -	$ 41,500,000	$ -	$ 41,500,000
FALTANTE POR EJECUTAR	$ 44,396,356	$ 107,578,955	$ 4,472,369	$ 156,447,680

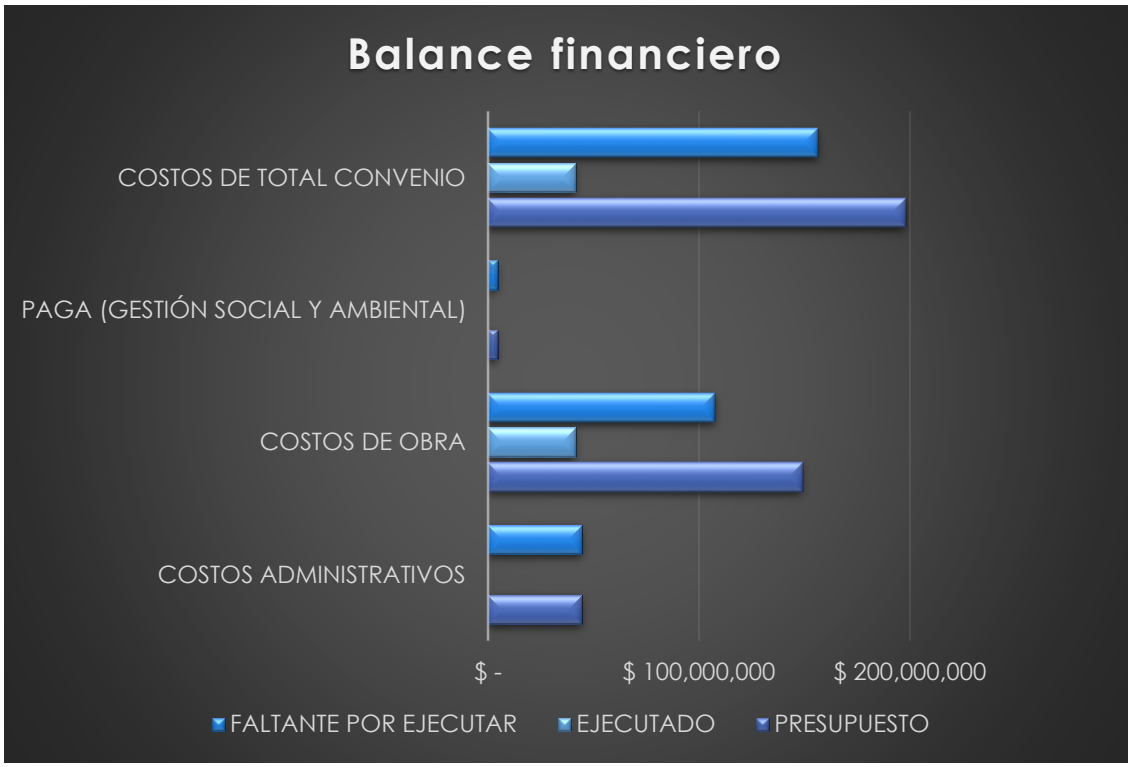


CONVENIO SOLIDARIO 3793 DE 2023 - JAC LOS RIOS – SAN CAYETANO

	COSTOS ADMINISTRATIVOS	COSTOS DE OBRA	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	COSTOS DE TOTAL CONVENIO
PRESUPUESTO	$ 47,734,670	$ 146,157,537	$ 4,384,726	$ 198,276,933
EJECUTADO	$ -	$ 41,500,000	$ -	$ 41,500,000
FALTANTE POR EJECUTAR	$ 47,734,670	$ 104,657,537	$ 4,384,726	$ 156,776,933

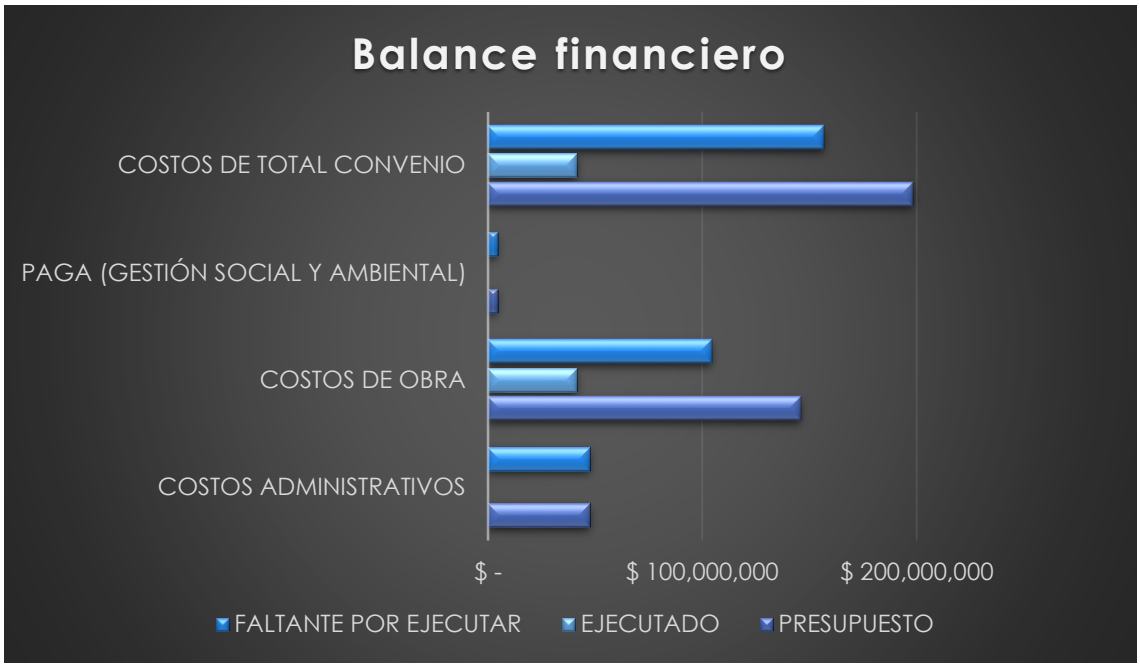

CONVENIO SOLIDARIO 3478 DE 2023 - JAC MATA DE RAMO - TOPAIPI

	COSTOS ADMINISTRATIVOS	COSTOS DE OBRA	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	COSTOS DE TOTAL CONVENIO
PRESUPUESTO	$ 42,255,596	$ 151,389,041	$ 4,541,671	$ 198,186,308
EJECUTADO	$ 12,941,912	$ 44,833,031	$ -	$ 57,774,943
FALTANTE POR EJECUTAR	$ 29,313,684	$ 106,556,010	$ 4,541,671	$ 140,411,365

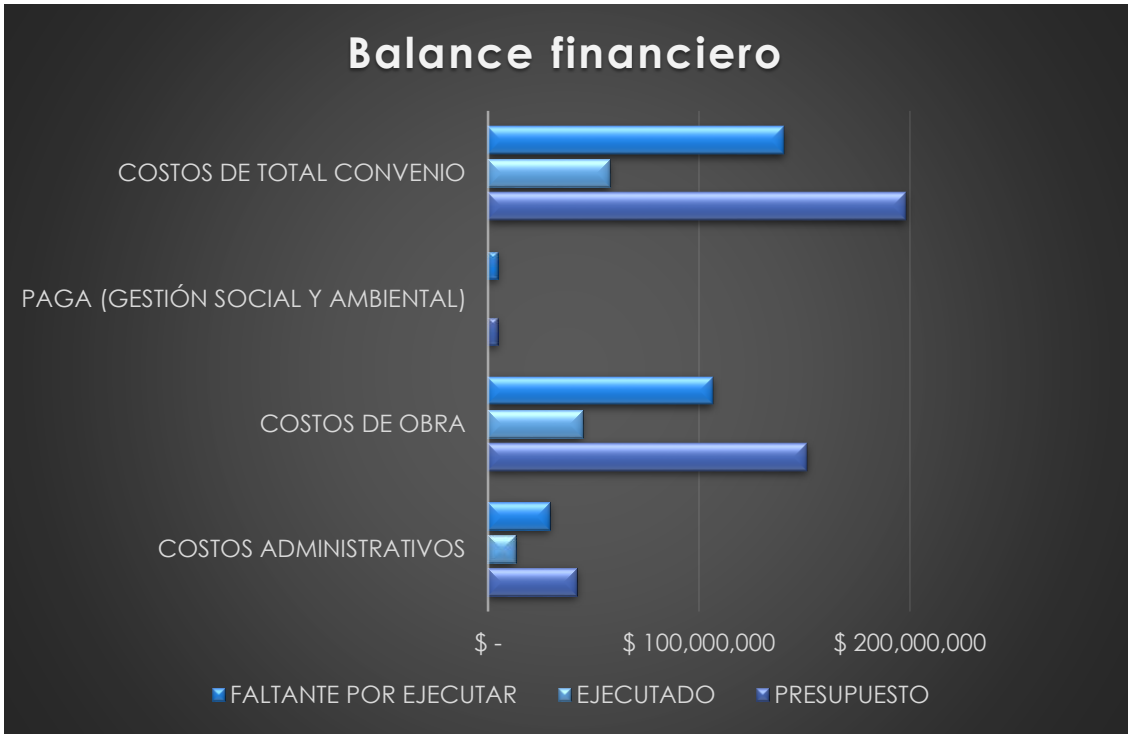

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

La interventoría ha realizado el control, vigilancia y seguimiento del proyecto por

3.4.1 Componente social

ACTIVIDADES SOCIALES MONTEBELLO:

Se realizaron visitas de seguimiento desde el componente social, donde se destacan las siguientes actividades:

1. Verificación de construcción de veedurías ciudadanas y avances del trámite de la resolución con personería municipal para la debida legalización.



2. Se fomentaron espacios de diálogo comunitarios donde se escucharon las necesidades de la comunidad, se solucionaron inquietudes frente al convenio y su respectivo desarrollo desde el componente social.



3. Durante las visitas a los convenios se verificó si habían PQRS para dar trazabilidad, no se registraron.



4. Diligenciamiento de ficha de caracterización junto con la comunidad e identificación de población objeto.

ACTIVIDADES SOCIALES ALTO YASAL:

Se realizaron visitas de seguimiento desde el componente social, donde se destacan las siguientes actividades:

1. Verificación de construcción de veedurías ciudadanas y avances del trámite de la resolución con personería municipal para la debida legalización.



2. Se fomentaron espacios de diálogo comunitarios donde se escucharon las necesidades de la comunidad, se solucionaron inquietudes frente al convenio y su respectivo desarrollo desde el componente social.
3. Durante las visitas a los convenios se verificó si habían PQRS para dar trazabilidad, no se registraron.
4. Diligenciamiento de ficha de caracterización junto con la comunidad e identificación de población objeto.

ACTIVIDADES SOCIALES BAJO PASUNCHA:

Se realizaron visitas de seguimiento desde el componente social, donde se destacan las siguientes actividades:

1. Verificación de construcción de veedurías ciudadanas y avances del trámite de la resolución con personería municipal para la debida legalización.
2. Se fomentaron espacios de diálogo comunitarios donde se escucharon las necesidades de la comunidad, se solucionaron inquietudes frente al convenio y su respectivo desarrollo desde el componente social.
3. Durante las visitas a los convenios se verificó si habían PQRS para dar trazabilidad, no se registraron.
4. Diligenciamiento de ficha de caracterización junto con la comunidad e identificación de población objeto.

ACTIVIDADES SOCIALES QUEBRADA HONDA:

Se realizaron visitas de seguimiento desde el componente social, donde se destacan las siguientes actividades:

1. Verificación de construcción de veedurías ciudadanas y avances del trámite de la resolución con personería municipal para la debida legalización.



2. Se fomentaron espacios de diálogo comunitarios donde se escucharon las necesidades de la comunidad, se solucionaron inquietudes frente al convenio y su respectivo desarrollo desde el componente social.



3. Durante las visitas a los convenios se verificó si habían PQRS para dar trazabilidad, no se registraron.



4. Diligenciamiento de ficha de caracterización junto con la comunidad e identificación de población objeto.



ACTIVIDADES SOCIALES MATA DE RAMO:

Se realizaron visitas de seguimiento desde el componente social, donde se destacan las siguientes actividades:

1. Verificación de construcción de veedurías ciudadanas y avances del trámite de la resolución con personería municipal para la debida legalización.
2. Se fomentaron espacios de diálogo comunitarios donde se escucharon las necesidades de la comunidad, se solucionaron inquietudes frente al convenio y su respectivo desarrollo desde el componente social.



3. Durante las visitas a los convenios se verificó si habían PQRS para dar trazabilidad, no se registraron.



4. Diligenciamiento de ficha de caracterización junto con la comunidad e identificación de población objeto.



ACTIVIDADES SOCIALES LAGUNA VERDE:

Se realizaron visitas de seguimiento desde el componente social, donde se destacan las siguientes actividades:

1. Verificación de construcción de veedurías ciudadanas y avances del trámite de la resolución con personería municipal para la debida legalización.



2. Se fomentaron espacios de diálogo comunitarios donde se escucharon las necesidades de la comunidad, se solucionaron inquietudes frente al convenio y su respectivo desarrollo desde el componente social.



3. Durante las visitas a los convenios se verificó si habían PQRS para dar trazabilidad, no se registraron.



4. Diligenciamiento de ficha de caracterización junto con la comunidad e identificación de población objeto.



ACTIVIDADES SOCIALES LOS RIOS:

Se realizaron visitas de seguimiento desde el componente social, donde se destacan las siguientes actividades:

1. Verificación de construcción de veedurías ciudadanas y avances del trámite de la resolución con personería municipal para la debida legalización.



2. Se fomentaron espacios de diálogo comunitarios donde se escucharon las necesidades de la comunidad, se solucionaron inquietudes frente al convenio y su respectivo desarrollo desde el componente social.
3. Durante las visitas a los convenios se verificó si habían PQRS para dar trazabilidad, no se registraron.
4. Diligenciamiento de ficha de caracterización junto con la comunidad e identificación de población objeto.

ACTIVIDADES SOCIALES LA FLORESTA:

Se realizaron visitas de seguimiento desde el componente social, donde se destacan las siguientes actividades:

1. Verificación de construcción de veedurías ciudadanas y avances del trámite de la resolución con personería municipal para la debida legalización.

2. Se fomentaron espacios de diálogo comunitarios donde se escucharon las necesidades de la comunidad, se solucionaron inquietudes frente al convenio y su respectivo desarrollo desde el componente social.
3. Durante las visitas a los convenios se verificó si habían PQRS para dar trazabilidad, no se registraron.
4. Diligenciamiento de ficha de caracterización junto con la comunidad e identificación de población objeto.



ACTIVIDADES SOCIALES SAN RAFAEL:

Se realizaron visitas de seguimiento desde el componente social, donde se destacan las siguientes actividades:

1. Verificación de construcción de veedurías ciudadanas y avances del trámite de la resolución con personería municipal para la debida legalización.



2. Se fomentaron espacios de diálogo comunitarios donde se escucharon las necesidades de la comunidad, se solucionaron inquietudes frente al convenio y su respectivo desarrollo desde el componente social.



3. Durante las visitas a los convenios se verificó si habían PQRS para dar trazabilidad, no se registraron.
4. Diligenciamiento de ficha de caracterización junto con la comunidad e identificación de población objeto.

ACTIVIDADES SOCIALES LA CAPIRA:

Se realizaron visitas de seguimiento desde el componente social, donde se destacan las siguientes actividades:

1. Verificación de construcción de veedurías ciudadanas y avances del trámite de la resolución con personería municipal para la debida legalización.
2. Se fomentaron espacios de diálogo comunitarios donde se escucharon las necesidades de la comunidad, se solucionaron inquietudes frente al convenio y su respectivo desarrollo desde el componente social.



3. Durante las visitas a los convenios se verificó si habían PQRS para dar trazabilidad, no se registraron.
4. Diligenciamiento de ficha de caracterización junto con la comunidad e identificación de población objeto.

3.4.1 Componente ambiental

Se ejecutaron visitas de seguimiento a las Organizaciones de Accion Comunal, con el fin de verificar el manejo ambiental de las obras en construcción, donde se destacan las siguientes actividades:

ACTIVIDADES AMBIENTALES BAJO PASUNCHA:

1. Verificación de licencias ambientales para el suministro de materiales.
2. Se realiza charla sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, su tratamiento y disposición final.
3. Se realiza verificación de la procedencia del agua que se utiliza en el desarrollo de la obra, la cual proviene de aguas lluvias recolectadas en la vivienda del señor y se transporta a traves de manguera hasta la obra.
4. Se verifica la señalización y valla informativa.
5. Se realiza charla sobre el manejo del material producto de las excavaciones y los sobrantes, los cuales se deben disponer y/o utilizar en el desarrollo de la misma obra.



Foto No. 1. Charla manejo ambiental.



Foto No. 2. Señalización y valla informativa

ACTIVIDADES AMBIENTALES QUEBRADA HONDA:

1. Verificación de licencias ambientales para el suministro de materiales.
2. Se realiza charla sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, su tratamiento y disposición final.
3. Se realiza verificación de la procedencia del agua que se utiliza en el desarrollo de la obra, la cual proviene de aguas lluvias recolectadas en la vivienda del señor y se transporta a traves de manguera hasta la obra.
4. Se verifica la señalización y valla informativa.
5. Se realiza charla sobre el manejo del material producto de las excavaciones y los sobrantes, los cuales se deben disponer y/o utilizar en el desarrollo de la misma obra.



Foto No. 3. Disposición adecuada de material de excavación



Foto No. 4. Señalización y valla informativa.

ACTIVIDADES AMBIENTALES MATA DE RAMO:

1. Verificación de licencias ambientales para el suministro de materiales.
2. Se realiza charla sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, su tratamiento y disposición final.
3. Se realiza verificación de la procedencia del agua que se utiliza en el desarrollo de la obra, la cual proviene de aguas lluvias recolectadas en la vivienda del señor y se transporta a traves de manguera hasta la obra.
4. Se verifica la señalización y valla informativa.
5. Se realiza charla sobre el manejo del material producto de las excavaciones y los sobrantes, los cuales se deben disponer y/o utilizar en el desarrollo de la misma obra.



Foto No. 5. Charla manejo ambiental de la obra



Foto No. 6. Señalización



Foto No. 7. Inadecuado manejo de bolsas de semento.



Foto No. 8. Tanque de almacenamiento de aguas lluvias

ACTIVIDADES AMBIENTALES LAGUNA VERDE:

5. Verificación de licencias ambientales para el suministro de materiales.
6. Se realiza charla sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, su tratamiento y disposición final.
7. Se realiza verificación de la procedencia del agua que se utiliza en el desarrollo de la obra, la cual proviene de aguas lluvias recolectadas en la vivienda del señor y se transporta a traves de manguera hasta la obra.
8. Se verifica la señalización y valla informativa.
9. Se realiza charla sobre el manejo del material producto de las excavaciones y los sobrantes, los cuales se deben disponer y/o utilizar en el desarrollo de la misma obra.



Foto No. 9. Transporte de agua por gravedad.



Foto No. 10. Adecuación de terreno material de excavación.

ACTIVIDADES AMBIENTALES LOS RIOS:

1. Verificación de licencias ambientales para el suministro de materiales.
2. Se realiza charla sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, su tratamiento y disposición final.

3. Se realiza verificación de la procedencia del agua que se utiliza en el desarrollo de la obra, la cual proviene de aguas lluvias recolectadas en la vivienda del señor y se transporta a traves de manguera hasta la obra.
4. Se verifica la señalización y valla informativa.
5. Se realiza charla sobre el manejo del material producto de las excavaciones y los sobrantes, los cuales se deben disponer y/o utilizar en el desarrollo de la misma obra.



Foto No. 11. Charla manejo ambiental de la obra



Foto No. 12. Disposición adecuada de material de excavación.



Foto No. 13. Charla manejo ambiental de la obra



Foto No. 14. Valla informativa.

ACTIVIDADES AMBIENTALES LA FLORESTA:

1. Verificación de licencias ambientales para el suministro de materiales.
2. Se realiza charla sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, su tratamiento y disposición final.
3. Se realiza verificación de la procedencia del agua que se utiliza en el desarrollo de la obra, la cual proviene de aguas lluvias recolectadas en la vivienda del señor y se transporta a traves de manguera hasta la obra.
4. Se verifica la señalización y valla informativa.
5. Se realiza charla sobre el manejo del material producto de las excavaciones y los sobrantes, los cuales se deben disponer y/o utilizar en el desarrollo de la misma obra.



Foto No. 15. Valla informativa



Foto No. 16. Disposición adecuada de material de excavación y sobrantes.



Foto No. 17. Inadecuado manejo de residuos solidos.

ANEXOS

INFORMES SEMANALES

INFORMES SEMANALES

SEMANA 25, 5 DE JULIO DEL 2024 AL 11 DE JULIO DEL 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 25 del 5 de julio al 11 de julio — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTE BELLO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 195 ml de mejoramiento vial con placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE MONTEBELLO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4612 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,940,745.00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S		
INTEGRANTES:	REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO		
CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,940,745	$ 199,940,745		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,940,745	$ 199,940,745		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,940,745.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 4,320,930.00	2.161%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 4,320,930.00	2.161%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 760,900.00	0.381%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.283%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,890,650.00	0.946%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

ALCANTARILLAS
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	100				100.0%
					Ejec	100				100.0%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,31			Prog	2.40				
					Ejec					
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	139,51			Prog	78.60				
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	106,18			Prog					
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,20			Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5.094,22			Prog	2456.00				
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Fuentes de materiales estan aproximadamente 85 Km de distancia del sitio donde se construira la Placa Huella.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No se Requiere

OBSERVACIONES: Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisiscion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se realizo reuniones con la J.A.C para organizar el inicio de obra

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el comité operativo No.01 junto a la veeeduria constituida, presidente de la junta de accion comunal y residente de obra, aprobando proveedores y programando pagos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
se verifica medidas e instalacion del acero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 11-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 25 del 5 de julio al 11 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EN LA VEREDA ALTO YASAL MUNICIPIO DE PACHO EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Dos tramos para un total 196 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, Recebo Seleccionado, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE ALTO YASAL			INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3612 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,779,288.00	CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,779,288	$ 198,779,288		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 5,000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,779,288	$ 193,779,288		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 25,000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 322,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198,779,288.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 24,068,108.85	12.108%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 8,091,945.85	4.071%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 6,340,900.00	3.190%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 15,976,163.00	8.037%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 4,560,800.00	2.294%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,638,496.30	2.333%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10,901,700.00	5.484%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,802,000.00	0.907%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada %: 10% — Avance o Atraso Físico %: -9%
Meta Física Ejecutada %: 1%

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada % — Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%	100%			100%
					Ejec	100%	100%			100.0%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.202			Prog	2.1				
					Ejec	0.5				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	134.64			Prog	78.4				
					Ejec	12.4				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	86.904			Prog	5.3				
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	41.31			Prog	12.1				
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4344.211			Prog	2500.0				
					Ejec	8970.0				
ALCANTARILLA										
* Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.5			Prog					
					Ejec					
* Excavaciones en roca en seco	M3	8.2			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.5			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9.6			Prog					
					Ejec					
* Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.9			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.4			Prog					
					Ejec					
* Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	43			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Dorada - Caldas	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	Zipaquira- Cundinamarca	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: fuente de materiales petreos

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO x	N/A	
EMISIONES:	SI	NO x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO x	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: No se requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizar el acopio de materiales tales como acero, arena, grava y piedra del tramo 2 la parte alta,

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el figurado y armado de parillas contamos con maestro y ayudantes en obra,

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente de los proveedores y servicios presentados por la parte tecnica.
Realizar la revision de los documentos preoperaciones de la maquinaria en obra
Revisar la documentacion de los materiales descargados en obra
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
Realizar la preparación y figurado del acero para las placas de huella.
Realizar la coordinación de comités operativos para la compra y distribución de materiales.
Realizar inspección y control de calidad de los materiales adquiridos.
Realizar programación y logística de transporte de materiales y equipos

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

* Realizar reuniones en campo junto a los representantes de cada junta de acción comunal en campo. con el fin de realizar la verificación en sitio de las condiciones de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construcción de las actividades descritas en el anexo técnico.
*revisar y aprobar hojas de vida remitidas por las Juntas de accion comunal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 25 del 5 de julio al 11 de julio — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+045, 45 ml de placa huella de un ancho de 5 m.
TRAMO 2: PR 0+000 AL PR 0+060, 60 ml de placa huella de un ancho de 5 m.
1 Alcantarilla de 6 ml. Construccion de 165 ml de Placa Huellas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, tubería de concreto reforzado 900 MM (tipo 2), Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, concreto clase D (210 kg/cm2 0 3000 PSI) para la construccion de alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE BAJO PASUNCHA			INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3381 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,312,049.00	CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,312,049	$ 200,312,049		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,312,049	$ 200,312,049		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,312,049.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 26,291,925.25	13.125%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 1,018,522.08	0.508%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 560,900.00	0.280%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 25,273,403.17	12.617%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 3,605,700.00	1.800%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,650,700.00	7.314%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,166,600.00	2.080%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,547,500.00	0.773%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

ALCANTARILLAS
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,41			Prog	2.50				
					Ejec					
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	138,85			Prog	136.75				
					Ejec	27.90				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	90,31			Prog	48.50				
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	42,96			Prog	10.50				
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.500,26			Prog	3497.90				
					Ejec	2130.00				
ALCANTARILLA										
* Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46,50			Prog	46,50				
					Ejec	32.6				
* Excavaciones en roca en seco	M3	8,20			Prog	8.2				
					Ejec	0.0				
* Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50			Prog	0.5				
					Ejec	0.0				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9.6			Prog	8.5				
					Ejec	0.0				
* Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.9			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.4			Prog					
					Ejec					
* Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					
Estudios y diseños					Prog	100%				
					Ejec	100%				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Dorada - Caldas	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN: Zipaquira- Cundinamarca	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizar el acopio de materiales tales como acero, grava, arena se inicia con la formaleteada de los centros de ciclopeo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se realizara la fundida de ciclopeo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente de los proveedores y servicios presentados por la parte tecnica.
Realizar la revision de los documentos preoperaciones de la maquinaria en obra
Revisar la documentacion de los materiales descargados en obra
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
Realizar la preparación y figurado del acero para las placas de huella.
Realizar la coordinación de comités operativos para la compra y distribución de materiales.
Realizar inspección y control de calidad de los materiales adquiridos.
Realizar programación y logística de transporte de materiales y equipos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 25 del 5 de julio al 11 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: 78 ml de placa huella de un ancho de 5 m.
TRAMO 2: 78 ml de placa huella de un ancho de 5 m. 156 ml de placa huella en total

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, tubería de concreto reforzado 900 MM (tipo 2), Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, concreto clase D (210 kg/cm2 0 3000 PSI) para la construccion de alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE QUEBRADA HONDA
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3478 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 199,674,031.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,674,031	$ 199,674,031		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 5,000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,674,031	$ 194,674,031		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,674,031.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 17,923,788.08	8.977%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 10,624,579.67	5.321%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 5,409,000.00	2.709%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 7,299,208.41	3.656%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,450,790.00	6.736%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5,409,000.00	2.709%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,685,500.00	0.844%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog	100%				
						Ejec	100%				
	PLACA HUELLA										
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4.28			Prog	3.2				
						Ejec					
*	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	109.4			Prog	109.4				
						Ejec	80.9				
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	71.26			Prog	50.3				
						Ejec	0.0				
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	33.88			Prog	21.9				
						Ejec	12.7				
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3551.15			Prog	2507.0				
						Ejec	2134.0				
	ALCANTARILLA										
*	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92.9			Prog					
						Ejec					
*	Excavaciones en roca en seco	M3	16.4			Prog					
						Ejec					
*	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.5			Prog					
						Ejec					
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19.1			Prog					
						Ejec					
*	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157.8			Prog					
						Ejec					
*	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50.9			Prog					
						Ejec					
*	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12			Prog					
						Ejec					
*	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	35			Prog					
						Ejec					
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
						Ejec					
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
*	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Dorada - Caldas	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....
UBICACIÓN: Zipaquira- Cundinamarca	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: Se realiza la socializacion inicial

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se funden 7 modulos de ciclopeo y se instala el acero de las huellas, se tienen 13 modulos de 3x0.9x0.15 de ciclopeo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se fundiran 13 modulos de huella para un total de 39 metrol lineales intervenidos y terminados sin cuneta

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente de los proveedores y servicios presentados por la parte tecnica.
Realizar la revision de los documentos preoperaciones de la maquinaria en obra
Revisar la documentacion de los materiales descargados en obra
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
Realizar la preparación y figurado del acero para las placas de huella.
Realizar la coordinación de comités operativos para la compra y distribución de materiales.
Realizar inspección y control de calidad de los materiales adquiridos.
Realizar programación y logística de transporte de materiales y equipos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO

Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 25 del 5 de julio al 11 de julio — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAPIRA DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+190, 190 ml de placa huella de un ancho de 6,00 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE CAPIRA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3091 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 195,105,319.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 195,105,319		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 5,000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 190,105,319		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 195,105,319.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19,674,796.00	10.084%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 906,596.00	0.465%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 350,800.00	0.180%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 18,768,200.00	9.620%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 3,509,000.00	1.799%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.463%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,859,800.00	1.978%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,697,500.00	0.870%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada % — Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada % — Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog	100%				
						Ejec	100%				
	PLACA HUELLA										
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6,12			Prog	3.12				
						Ejec	0.0				
*	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	159,89			Prog	120.2				
						Ejec	0.0				
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	102,56			Prog					
						Ejec					
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	48,76			Prog					
						Ejec					
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5.137,26			Prog					
						Ejec					
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	5			Prog					
						Ejec					
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
*	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	5			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

la interventoria solicita a la J.A.C el inicio de las actividades ya que se cuenta con los proveedores y diseños para comenzar con la construccion de la placa huella

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se iniciara las actividades de construccion de la placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Conversión programado

MANTENIMIENTO | CONSTRUCCION | MEJORAMIENTO | SEÑALIZACION | ALCANTARILLAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
Solicitar el levantamiento del estado actual de los predios aledaños a la via (actas de vecindad)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 25 del 5 de julio al 11 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+190, 165 ml de placa huella de un ancho de 4,10m.
1 Alcantarilla de 6 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE SAN RAFAEL
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3096 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 195,105,319.00
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
CONTRATO No.: 5083 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO: 29/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 195,105,319		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 5,000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 190,105,319		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 195,105,319.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 23,373,940.00	11.980%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 3,936,320.00	2.018%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 1,250,800.00	0.641%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 19,437,620.00	9.963%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 2,509,000.00	1.286%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.463%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,759,800.00	1.927%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 297,500.00	0.152%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FISICO

PLACA HUELLA
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

ALCANTARILLAS
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog	100%				
					Ejec	100				
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6,12			Prog	3.12				
					Ejec	0.0				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	159,89			Prog	120.20				
					Ejec	0.0				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	102,56			Prog					
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	48,76			Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5.137,26			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ML	5			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	5			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: **No se requieren permisos ambietales**
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: **Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)**

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: **Se realizo la socializacion de inicio**

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

la interventoria solicita a la J.A.C el inicio de las actividades ya que se cuenta con los proveedores y diseños para comenzar con la construccion de la placa huella

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se iniciara las actividades de construccion de la placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
Solicitar el levantamiento del estado actual de los predios aledaños a la via (actas de vecindad)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 25 del 5 de julio al 11 de julio — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+164, 164 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE LA FLORESTA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3241 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199,166,367.00
FECHA DE INICIO: 13/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
CONTRATO No.: 5083 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO: 29/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,166,367	$ 199,166,367		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,166,367	$ 199,166,367		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,166,367.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 10,000,000.00	5.021%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 10,000,000.00	5.021%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 2,350,800.00	1.180%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.311%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,350,800.00	1.180%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,658,800.00	0.833%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FISICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	100				100.0%
					Ejec	100				100.0%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.3			Prog	1.50				
					Ejec	0.00				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	138.01			Prog	23.50				
					Ejec	11.50				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	95.07			Prog					
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	42.15			Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4440.4			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: Fuentes de materiales estan aproximadamente 85 Km de distancia del sitio donde se construira la Placa Huella.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A	

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No se Requiere

OBSERVACIONES:Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisiscion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo el acopio de material de soporte granular y llegan la maquinaria al sitio de obra

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la conformacion de la via, se instalo la subbase parcial utilizando el vibro compactador y motoniveladora

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
se revisa la conformacion e instalacion del material soporte de la via
Se revisa la documentacion de la maquinaria utilizada en la obra

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA SEMANA No.: 25 del 5 de julio al 11 de julio Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+172, 172 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE LAGUNA VERDE			INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3779 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,947,680.00	CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,947,680	$ 198,947,680		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,947,680	$ 198,947,680		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198,947,680.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8,142,800.00	4.093%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 8,142,800.00	4.093%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 1,250,900.00	0.629%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:		
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.319%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,250,900.00	0.629%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,758,800.00	0.884%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA
Meta Física Programada %: Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

ALCANTARILLAS
Meta Física Programada %: Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	1	1			Prog	100				100.0%
					Ejec	50				50.0%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.05			Prog	1.35				
					Ejec	0.00				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	131.58			Prog	39.60				
					Ejec	12.60				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	99.84			Prog					
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	32.22			Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4576.85			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: LA DORADA	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN: ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: Fuentes de materiales estan aproximadamente 85 Km de distancia del sitio donde se construira la Placa Huella.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No se Requiere

OBSERVACIONES: Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisiscion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo el acopio de material de soporte granular y llegan la maquinaria al sitio de obra

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la conformacion de la via, se instalo la subbase parcial utilizando el vibro compactador y motoniveladora

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
se revisa la conformacion e instalacion del material soporte de la via
Se revisa la documentacion de la maquinaria utilizada en la obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 25 del 5 de julio al 11 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+160, 160 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE REGION DE LOS RIOS
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3793 DE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 199,276,933.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,276,933	$ 199,276,933		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,276,933	$ 199,276,933		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,276,933.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9,810,120.00	4.923%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 9,810,120.00	4.923%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 2,500,600.00	1.255%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:		
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.307%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,500,600.00	1.255%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,758,800.00	0.883%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

ALCANTARILLAS
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog	100				
					Ejec	100				
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.05			Prog	2.30				
					Ejec	0.00				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	131.58			Prog	56.70				
					Ejec	0.00				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	99.84			Prog					
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	32.22			Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4576.85			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec	1.20				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Fuentes de materiales estan aproximadamente 85 Km de distancia del sitio donde se construira la Placa Huella.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A	

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No se Requiere

OBSERVACIONES:Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisisccion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo el acopio de materiales granulares

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la roceria de la via para iniciar labores de acopio e inicio de actividades de obra en campo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
Solicitar el levantamiento del estado actual de los predios aledaños a la via (actas de vecindad)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 25 del 5 de julio al 11 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MATA DE RAMO DEL MUNICIPIO TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+185, 185 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.
1 Alcantarilla de 6 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, tubería de concreto reforzado 900 MM (tipo 2), Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, concreto clase D (210 kg/cm2 0 3000 PSI) para la construccion de alcantarillas,

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE MATA DE RAMO
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4657 DE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 199,186,308.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,186,308	$ 199,186,308		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,186,308	$ 199,186,308		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,186,308.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 60,599,306.00	30.423%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 4,320,930.00	2.169%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 1,350,860.00	0.678%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 56,278,376.00	28.254%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 12,540,900.00	6.296%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.310%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13,891,760.00	6.974%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,890,650.00	0.949%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201,004,656.44	57.920%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

ALCANTARILLAS
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.202			Prog	1.50				
					Ejec	0.00				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	134.64			Prog	32.50				
					Ejec	13.40				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	86.904			Prog					
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	41.31			Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4344.211			Prog	1250.00				
					Ejec	960.00				
ALCANTARILLA										
* Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.5			Prog					
					Ejec					
* Excavaciones en roca en seco	M3	8.2			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) -	M3	0.5			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) -	M3	9.6			Prog					
					Ejec					
* Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.9			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.4			Prog					
					Ejec					
* Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	43			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Fuentes de materiales estan aproximadamente 85 Km de distancia del sitio donde se construira la Placa Huella.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo el acopio de materiales como acero, grava y arena

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el amarre y figurado de parrillas de huellas vehiculares

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
se verifica medidas e instalacion del acero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMES SEMANALES

SEMANA 26, 12 DE JULIO DEL 2024 AL 18 DE JULIO DEL 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 26 del 12 de julio al 18 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTE BELLO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 195 ml de mejoramiento vial con placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE MONTEBELLO
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4612 DE 2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 199,940,745.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,940,745	$ 199,940,745		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,940,745	$ 199,940,745		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,940,745.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5,601,900.00	2.802%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 5,601,900.00	2.802%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 1,280,970.00	0.641%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.283%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,890,650.00	0.946%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	1	1			Prog	100				100.0%
						Ejec	100				100.0%
	PLACA HUELLA										
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,31			Prog	2.40				
						Ejec					
*	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	139,51			Prog	78.60				
						Ejec					
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	106,18			Prog					
						Ejec					
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,20			Prog					
						Ejec					
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5.094,22			Prog	2456.00				
						Ejec					
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
						Ejec					
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
*	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Fuentes de materiales estan aproximadamente 85 Km de distancia del sitio donde se construira la Placa Huella.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No se Requiere

OBSERVACIONES: Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisiscion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizara el comité operativo No.01 junto a la veeeduria constituida, presidente de la junta de accion comunal y residente de obra, aprobando proveedores y programando pagos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el suministro de maeriales

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
se verifica medidas e instalacion del acero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 18-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 26 del 12 de julio al 18 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EN LA VEREDA ALTO YASAL MUNICIPIO DE PACHO EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Dos tramos para un total 196 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, Recebo Seleccionado, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE ALTO YASAL			INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3612 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,779,288.00	CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,779,288	$ 198,779,288		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 5,000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,779,288	$ 193,779,288		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 25,000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 322,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198,779,288.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 44,969,358.85	22.623%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 16,542,265.85	8.322%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 8,450,320.00	4.251%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 28,427,093.00	14.301%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 12,450,930.00	6.264%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,638,496.30	2.333%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31,128,443.00	15.660%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,802,000.00	0.907%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada %: 15% — Avance o Atraso Físico %: -13%
Meta Física Ejecutada %: 2%

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada % — Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%	100%			100%
					Ejec	100%	100%			100.0%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.202			Prog	3.1				
					Ejec	1.2				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	134.64			Prog	78.4				
					Ejec	30.1				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	86.904			Prog	10.5				
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	41.31			Prog	21.1				
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4344.211			Prog	3750.0				
					Ejec	15600.0				
ALCANTARILLA										
* Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.5			Prog					
					Ejec					
* Excavaciones en roca en seco	M3	8.2			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.5			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9.6			Prog					
					Ejec					
* Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.9			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.4			Prog					
					Ejec					
* Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	43			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Dorada - Caldas	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	Zipaquira- Cundinamarca	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: fuente de materiales petreos

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: No se requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizar el acopio de materiales tales como acero, arena, grava y piedra del tramo 2 la parte alta, se figura y armado de parillas contamos con maestro y ayudantes en obra,

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el armado de formaletas y fundida de huellas y ciclopeo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente de los proveedores y servicios presentados por la parte tecnica.
Realizar la revision de los documentos preoperaciones de la maquinaria en obra
Revisar la documentacion de los materiales descargados en obra
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
Realizar la preparación y figurado del acero para las placas de huella.
Realizar la coordinación de comités operativos para la compra y distribución de materiales.
Realizar inspección y control de calidad de los materiales adquiridos.
Realizar programación y logística de transporte de materiales y equipos

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

* Realizar reuniones en campo junto a los representantes de cada junta de acción comunal en campo. con el fin de realizar la verificación en sitio de las condiciones de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construcción de las actividades descritas en el anexo técnico.
*revisar y aprobar hojas de vida remitidas por las Juntas de accion comunal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 26 del 12 de julio al 18 de julio — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+045, 45 ml de placa huella de un ancho de 5 m.
TRAMO 2: PR 0+000 AL PR 0+060, 60 ml de placa huella de un ancho de 5 m.
1 Alcantarilla de 6 ml. Construccion de 165 ml de Placa Huellas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, tubería de concreto reforzado 900 MM (tipo 2), Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, concreto clase D (210 kg/cm2 0 3000 PSI) para la construccion de alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE BAJO PASUNCHA			INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3381 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,312,049.00	CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,312,049	$ 200,312,049		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,312,049	$ 200,312,049		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,312,049.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 47,803,125.25	23.864%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 10,878,972.08	5.431%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 9,860,450.00	4.923%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 36,924,153.17	18.433%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 11,650,750.00	5.816%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,650,700.00	7.314%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,511,200.00	10.739%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,547,500.00	0.773%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

ALCANTARILLAS
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** ____	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,41			Prog	4.60				
					Ejec	0.30				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	138,85			Prog	138.85				
					Ejec	100.50				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	90,31			Prog	50.60				
					Ejec	0.0				
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	42,96			Prog	12.60				
					Ejec	0.0				
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.500,26			Prog	3500.00				
					Ejec	1200.00				
ALCANTARILLA										
* Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46,50			Prog	46,50				
					Ejec	32.6				
* Excavaciones en roca en seco	M3	8,20			Prog	8.2				
					Ejec	0.0				
* Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50			Prog	0.5				
					Ejec	0.0				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	9.6			Prog	8.5				
					Ejec	0.0				
* Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.9			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.4			Prog					
					Ejec					
* Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					
Estudios y diseños					Prog	100%				
					Ejec	100%				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Dorada - Caldas	PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	Zipaquira- Cundinamarca	PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizar el acopio de materiales tales como acero, grava, arena se inicia con la formaleteada de los centros de ciclopeo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se realizara la fundida de ciclopeo y se inicia con la instalacion del acero de huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente de los proveedores y servicios presentados por la parte tecnica.
Realizar la revision de los documentos preoperaciones de la maquinaria en obra
Revisar la documentacion de los materiales descargados en obra
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
Realizar la preparación y figurado del acero para las placas de huella.
Realizar la coordinación de comités operativos para la compra y distribución de materiales.
Realizar inspección y control de calidad de los materiales adquiridos.
Realizar programación y logística de transporte de materiales y equipos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 26 del 12 de julio al 18 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: 78 ml de placa huella de un ancho de 5 m.
TRAMO 2: 78 ml de placa huella de un ancho de 5 m. 156 ml de placa huella en total

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, tubería de concreto reforzado 900 MM (tipo 2), Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, concreto clase D (210 kg/cm2 0 3000 PSI) para la construccion de alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE QUEBRADA HONDA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3478 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,674,031.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S		
INTEGRANTES:	REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO		
CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,674,031	$ 199,674,031		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 5,000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,674,031	$ 194,674,031		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,674,031.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 29,234,998.09	14.641%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 12,975,249.68	6.498%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 2,350,670.00	1.177%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 16,259,748.42	8.143%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 8,960,540.00	4.488%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,450,790.00	6.736%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11,311,210.00	5.665%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,685,500.00	0.844%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog	100%				
						Ejec	100%				
	PLACA HUELLA										
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4.28			Prog	3.2				
						Ejec					
*	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	109.4			Prog	109.4				
						Ejec	80.9				
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	71.26			Prog	50.3				
						Ejec	0.0				
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	33.88			Prog	21.9				
						Ejec	12.7				
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3551.15			Prog	2507.0				
						Ejec	2134.0				
	ALCANTARILLA										
*	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92.9			Prog					
						Ejec					
*	Excavaciones en roca en seco	M3	16.4			Prog					
						Ejec					
*	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.5			Prog					
						Ejec					
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19.1			Prog					
						Ejec					
*	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157.8			Prog					
						Ejec					
*	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50.9			Prog					
						Ejec					
*	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12			Prog					
						Ejec					
*	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	35			Prog					
						Ejec					
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
						Ejec					
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
*	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Dorada - Caldas	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....
UBICACIÓN: Zipaquira- Cundinamarca	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: Se realiza la socializacion inicial

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se funden 7 modulos de ciclopeo y se instala el acero de las huellas, se tienen 13 modulos de 3x0.9x0.15 de ciclopeo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se fundiran 13 modulos de huella para un total de 39 metrol lineales intervenidos y terminados sin cuneta

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra Realizar la revision de la documentacion pertiente de los proveedores y servicios presentados por la parte tecnica. Realizar la revision de los documentos preoperaciones de la maquinaria en obra Revisar la documentacion de los materiales descargados en obra Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra Realizar la preparación y figurado del acero para las placas de huella. Realizar la coordinación de comités operativos para la compra y distribución de materiales. Realizar inspección y control de calidad de los materiales adquiridos. Realizar programación y logística de transporte de materiales y equipos	FIRMA NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 26 del 12 de julio al 18 de julio — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAPIRA DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+190, 190 ml de placa huella de un ancho de 6,00 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE CAPIRA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3091 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 195,105,319.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 195,105,319		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 5,000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 190,105,319		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 195,105,319.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 52,642,720.00	26.982%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 10,423,760.00	5.343%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 1,357,800.00	0.696%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 42,218,960.00	21.639%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 23,450,760.00	12.020%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.463%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24,808,560.00	12.715%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,697,500.00	0.870%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada % — Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada % — Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog	100%				
					Ejec	100%				
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6,12			Prog	3.12				
					Ejec	0.0				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	159,89			Prog	120.2				
					Ejec	0.0				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	102,56			Prog					
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	48,76			Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5.137,26			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	5			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	5			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

la interventoria solicita a la J.A.C el inicio de las actividades ya que se cuenta con los proveedores y diseños para comenzar con la construccion de la placa huella

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se iniciara las actividades de construccion de la placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
Solicitar el levantamiento del estado actual de los predios aledaños a la via (actas de vecindad)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 26 del 12 de julio al 18 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+190, 165 ml de placa huella de un ancho de 4,10m.
1 Alcantarilla de 6 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE SAN RAFAEL
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3096 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 195,105,319.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 195,105,319		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 5,000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 190,105,319		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 195,105,319.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 36,722,579.00	18.822%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 4,743,979.00	2.431%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 807,659.00	0.414%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 31,978,600.00	16.390%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 12,540,980.00	6.428%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.463%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13,348,639.00	6.842%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 297,500.00	0.152%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FISICO

PLACA HUELLA
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

ALCANTARILLAS
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog	100%				
					Ejec	100				
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6,12			Prog	3.12				
					Ejec	0.0				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	159,89			Prog	120.20				
					Ejec	0.0				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	102,56			Prog					
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	48,76			Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5.137,26			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ML	5			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	5			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: **No se requieren permisos ambietales**
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: **Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)**

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: **Se realizo la socializacion de inicio**

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

la interventoria solicita a la J.A.C el inicio de las actividades ya que se cuenta con los proveedores y diseños para comenzar con la construccion de la placa huella

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


se iniciara las actividades de construccion de la placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
Solicitar el levantamiento del estado actual de los predios aledaños a la via (actas de vecindad)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA SEMANA No.: 26 del 12 de julio al 18 de julio Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+164, 164 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE LA FLORESTA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3241 DE 2023
FECHA DE INICIO: 13/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 199,166,367.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,166,367	$ 199,166,367		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,166,367	$ 199,166,367		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,166,367.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 52,450,780.00	26.335%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 12,450,780.00	6.251%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 2,450,780.00	1.231%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 40,000,000.00	20.084%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 40,000,000.00	20.084%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.311%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42,450,780.00	21.314%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,658,800.00	0.833%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FISICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada %: Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	100				100.0%
					Ejec	100				100.0%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.3			Prog	2.40				
					Ejec	0.00				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	138.01			Prog	50.70				
					Ejec	20.10				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	95.07			Prog					
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	42.15			Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4440.4			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Fuentes de materiales estan aproximadamente 85 Km de distancia del sitio donde se construira la Placa Huella.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A	

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No se Requiere

OBSERVACIONES:Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisiscion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la conformacion de la via, se instalo la subbase parcial utilizando el vibro compactador y motoniveladora

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la instalacion de la formaleta y se fundira el ciclopeo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
se revisa la conformacion e instalacion del material soporte de la via
Se revisa la documentacion de la maquinaria utilizada en la obra

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 26 del 12 de julio al 18 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+172, 172 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE LAGUNA VERDE			INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3779 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,947,680.00	CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,947,680	$ 198,947,680		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,947,680	$ 198,947,680		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198,947,680.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 51,650,800.00	25.962%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 11,650,800.00	5.856%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 3,508,000.00	1.763%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 40,000,000.00	20.106%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 40,000,000.00	20.106%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.319%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 43,508,000.00	21.869%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,758,800.00	0.884%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA
Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

ALCANTARILLAS
Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	100				100.0%
					Ejec	50				50.0%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.05			Prog	2.40				
					Ejec	0.00				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	131.58			Prog	50.70				
					Ejec	20.10				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	99.84			Prog					
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	32.22			Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4576.85			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Fuentes de materiales estan aproximadamente 85 Km de distancia del sitio donde se construira la Placa Huella.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A	

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No se Requiere

OBSERVACIONES: Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisiscion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la conformacion de la via, se instalo la subbase parcial utilizando el vibro compactador y motoniveladora

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la instalacion de la formaleta y se fundira el ciclopeo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
se revisa la conformacion e instalacion del material soporte de la via
Se revisa la documentacion de la maquinaria utilizada en la obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 26 del 12 de julio al 18 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+160, 160 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE REGION DE LOS RIOS
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3793 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,276,933.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,276,933	$ 199,276,933		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,276,933	$ 199,276,933		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,276,933.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 50,560,790.00	25.372%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 10,560,790.00	5.300%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 750,670.00	0.377%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 40,000,000.00	20.073%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 40,000,000.00	20.073%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.307%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40,750,670.00	20.449%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,758,800.00	0.883%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: No cuenta con recursos en la cuenta bancaria del convenio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

ALCANTARILLAS
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog	100				
					Ejec	100				
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.05			Prog	2.30				
					Ejec	0.00				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	131.58			Prog	56.70				
					Ejec	0.00				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	99.84			Prog					
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	32.22			Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4576.85			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec	1.20				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: LA DORADA	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN: ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: Fuentes de materiales estan aproximadamente 85 Km de distancia del sitio donde se construira la Placa Huella.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No se Requiere

OBSERVACIONES:Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisisccion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la roceria de la via para iniciar labores de acopio e inicio de actividades de obra en campo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el acopio de materiales e inicio de instalacion de formaleta

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
Solicitar el levantamiento del estado actual de los predios aledaños a la via (actas de vecindad)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 26 del 12 de julio al 18 de julio — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MATA DE RAMO DEL MUNICIPIO TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+185, 185 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.
1 Alcantarilla de 6 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, tubería de concreto reforzado 900 MM (tipo 2), Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, concreto clase D (210 kg/cm2 0 3000 PSI) para la construccion de alcantarillas,

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE MATA DE RAMO			INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4657 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,186,308.00	CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,186,308	$ 199,186,308		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,186,308	$ 199,186,308		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,186,308.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 93,531,176.00	46.957%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 5,601,900.00	2.812%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 1,280,970.00	0.643%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 87,929,276.00	44.144%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 31,650,900.00	15.890%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.310%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 32,931,870.00	16.533%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,890,650.00	0.949%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 218,237,408.20	62.886%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada % — Avance o Atraso Físico % —
Meta Física Ejecutada %

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada % — Avance o Atraso Físico % —
Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.202			Prog	2.40				
					Ejec	0.00				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	134.64			Prog	78.60				
					Ejec	21.30				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	86.904			Prog					
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	41.31			Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4344.211			Prog	2456.00				
					Ejec	1895.00				
ALCANTARILLA										
* Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.5			Prog					
					Ejec					
* Excavaciones en roca en seco	M3	8.2			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) -	M3	0.5			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) -	M3	9.6			Prog					
					Ejec					
* Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.9			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.4			Prog					
					Ejec					
* Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	43			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										

*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ML	12			Prog					
						Ejec					
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
*	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Fuentes de materiales estan aproximadamente 85 Km de distancia del sitio donde se construira la Placa Huella.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo el amarre y figurado de parrillas de huellas vehiculares

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la instalacion e inicio de fundida de ciclopeo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
se verifica medidas e instalacion del acero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMES SEMANALES

SEMANA 27, 19 DE JULIO DEL 2024 AL 25 DE JULIO DEL 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 27 del 18 de julio al 25 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTE BELLO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 195 ml de mejoramiento vial con placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE MONTEBELLO
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4612 DE 2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 199,940,745.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,940,745	$ 199,940,745		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,940,745	$ 199,940,745		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,940,745.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5,601,900.00	2.802%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 5,601,900.00	2.802%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.283%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,890,650.00	0.946%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 95.12 — Avance o Atraso Físico ml: -95.12
Meta Física Ejecutada ml:

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	1	1			Prog	100				100.0%
						Ejec	100				100.0%
	PLACA HUELLA										
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,31			Prog	2.40				
						Ejec					
*	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	139,51			Prog	78.60				
						Ejec					
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	106,18			Prog	12.60				
						Ejec					
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,20			Prog	21.50				
						Ejec					
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5.094,22			Prog	3569.00				
						Ejec					
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
						Ejec					
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
*	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Fuentes de materiales estan aproximadamente 85 Km de distancia del sitio donde se construira la Placa Huella.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No se Requiere

OBSERVACIONES: Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisiscion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoria esta a la espera de la informacion por parte del contador para pago de materiales para iniciar despacho de materiales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el suministro de maeriales

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
se verifica medidas e instalacion del acero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 27 del 19 de julio al 25 de julio — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EN LA VEREDA ALTO YASAL MUNICIPIO DE PACHO EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Dos tramos para un total 196 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, Recebo Seleccionado, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE ALTO YASAL
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3612 DE 2023
FECHA DE INICIO: 13/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 198,779,288.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,779,288	$ 198,779,288		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 5,000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,779,288	$ 193,779,288		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 25,000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 322,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198,779,288.00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		0.000%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 62,087,323.00	31.234%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		0.000%
TOTAL INVERSION PAGADA COSTO ADMON:	$ 12,919,201.00	6.499%
INVERSION SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ -	0.000%
TOTAL INVERSION PAGADA BASICO DE OBRA:	$ 49,168,122.00	24.735%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 20,741,029.00	10.434%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 28,500,700.00	14.338%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20,741,029.00	10.434%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,802,000.00	0.907%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		0.000%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 93 — Avance o Atraso Físico ml: -93
Meta Física Ejecutada ml: 0

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%	100%			100%
					Ejec	100%	100%			100.0%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.202			Prog	3.1				
					Ejec	1.2				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	134.64			Prog	78.4				
					Ejec	30.1				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	86.904			Prog	10.5				
					Ejec	0.0				
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	41.31			Prog	21.1				
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4344.211			Prog	3750.0				
					Ejec	2600.0				
ALCANTARILLA										
* Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.5			Prog					
					Ejec					
* Excavaciones en roca en seco	M3	8.2			Prog	0%				
					Ejec	0%				
* Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.5			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9.6			Prog					
					Ejec	0%				
* Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.9			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.4			Prog					
					Ejec	0%				
* Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	43			Prog					
					Ejec	0%				
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec	0%				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACION: Dorada - Caldas	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN: Zipaquira- Cundinamarca	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: fuente de materiales petreos

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: No se requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizar el armado de parrillas de acero para las huellas vehiculares y se dispuso a lo largo de la via para tener la facilidad de instalacion

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el armado de formaletas y fundida de huellas y ciclopeo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoria.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Junto a los contadores, se está llevando a cabo una revisión minuciosa para asegurar que la documentación necesaria para la autorización de pagos esté completa y adecuadamente preparada.
Se realiza una revisión detallada de los plano de secciones transversales con el objetivo de garantizar su integridad y asegurar una construcción correcta.
Actualmente se está procediendo a revisar cuidadosamente las estrategias para la contratación del personal necesario para el inicio de la obra, evaluando opciones que aseguren la selección de candidatos idóneos y el cumplimiento eficiente de los requerimientos del proyecto.
Se está llevando a cabo una revisión de la documentación presentada por los proveedores para el suministro de materiales, garantizando que cumpla con todos los requisitos necesarios.
Se lleva a cabo un proceso de acompañamiento por parte del inspector de interventoría para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Este seguimiento minucioso asegura que todas las actividades se realicen de acuerdo con los estándares establecidos y los requisitos del proyecto, contribuyendo así a su éxito y cumplimiento dentro de los plazos previstos.

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

* Realizar reuniones en campo junto a los representantes de cada junta de acción comunal en campo. con el fin de realizar la verificación en sitio de las condiciones de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construcción de las actividades descritas en el anexo técnico.
*revisar y aprobar hojas de vida remitidas por las Juntas de accion comunal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 27 del 19 de julio al 25 de julio — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+045, 45 ml de placa huella de un ancho de 5 m.
TRAMO 2: PR 0+000 AL PR 0+060, 60 ml de placa huella de un ancho de 5 m.
1 Alcantarilla de 6 ml. Construccion de 165 ml de Placa Huellas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, tubería de concreto reforzado 900 MM (tipo 2), Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, concreto clase D (210 kg/cm2 0 3000 PSI) para la construccion de alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE BAJO PASUNCHA			INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3381 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,312,049.00	CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,312,049	$ 200,312,049		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,312,049	$ 200,312,049		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,312,049.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 50,649,525.00	25.285%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 13,575,372.00	6.777%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 2,696,399.92	1.346%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 37,074,153.00	18.508%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 149,999.83	0.075%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,650,700.00	7.314%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,846,399.75	1.421%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 1,547,500.00	0.773%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 93.33 — Avance o Atraso Físico ml: -60.33
Meta Física Ejecutada ml: 33.00

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada % — Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,41			Prog	4.60				
					Ejec	4.10				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	138,85			Prog	138.85				
					Ejec	100.50				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	90,31			Prog	50.60				
					Ejec	5.5				
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	42,96			Prog	12.60				
					Ejec	6.1				
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.500,26			Prog	3500.00				
					Ejec	1567.00				
ALCANTARILLA										
* Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46,50			Prog	46,50				
					Ejec	32.6				
* Excavaciones en roca en seco	M3	8,20			Prog	8.2				
					Ejec	0.0				
* Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50			Prog	0.5				
					Ejec	0.0				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9.6			Prog	8.5				
					Ejec	0.0				
* Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.9			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.4			Prog					
					Ejec					
* Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					
Estudios y diseños					Prog	100%				
					Ejec	100%				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Dorada - Caldas	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	Zipaquira- Cundinamarca	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizar la construccion de 33 metros lineales de ciclopeo central y huellas vehiculares derecha e inzquierda

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se realizara la fundida de sobre ancho en ciclopeo y cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Junto a los contadores, se está llevando a cabo una revisión minuciosa para asegurar que la documentación necesaria para la autorización de pagos esté completa y adecuadamente preparada.
Se realiza una revisión detallada de los plano de secciones transversales con el objetivo de garantizar su integridad y asegurar una construcción correcta.
Actualmente se está procediendo a revisar cuidadosamente las estrategias para la contratación del personal necesario para el inicio de la obra, evaluando opciones que aseguren la selección de candidatos idóneos y el cumplimiento eficiente de los requerimientos del proyecto.
Se está llevando a cabo una revisión de la documentación presentada por los proveedores para el suministro de materiales, garantizando que cumpla con todos los requisitos necesarios.
Se lleva a cabo un proceso de acompañamiento por parte del inspector de interventoría para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Este seguimiento minucioso asegura que todas las actividades se realicen de acuerdo con los estándares establecidos y los requisitos del proyecto, contribuyendo así a su éxito y cumplimiento dentro de los plazos previstos.
Se realiza la toma de cilindros de concreto para muestra de resistencia del concreto

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA | SEMANA No.: 27 del 18 de julio al 25 de julio (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: 78 ml de placa huella de un ancho de 5 m.
TRAMO 2: 78 ml de placa huella de un ancho de 5 m. 156 ml de placa huella en total

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, tubería de concreto reforzado 900 MM (tipo 2), Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, concreto clase D (210 kg/cm2 0 3000 PSI) para la construccion de alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE QUEBRADA HONDA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3478 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,674,031.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S		
INTEGRANTES:	REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO		
CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,674,031	$ 199,674,031		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,674,031	$ 199,674,031		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,674,031.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 29,234,998.09	14.641%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 12,975,249.68	6.498%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 16,259,748.42	8.143%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,450,790.00	6.736%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,685,500.00	0.844%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 93.33 Avance o Atraso Físico ml: -60.33
Meta Física Ejecutada ml: 33.00

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog	100%				
					Ejec	100%				
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4.28			Prog	3.2				
					Ejec	3.97				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	109.4			Prog	109.4				
					Ejec	80.9				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	71.26			Prog	50.3				
					Ejec	4.8				
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	33.88			Prog	21.9				
					Ejec	15.5				
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3551.15			Prog	2507.0				
					Ejec	2490.0				
ALCANTARILLA										
* Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92.9			Prog					
					Ejec					
* Excavaciones en roca en seco	M3	16.4			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.5			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19.1			Prog					
					Ejec					
* Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157.8			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50.9			Prog					
					Ejec					
* Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	35			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Dorada - Caldas	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN: Zipaquira- Cundinamarca	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza la socializacion inicial

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se funden modulos de ciclopeo y de huellas, se tienen 30 ml de placa huella ejecutada sin cunetas

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se fundiran 13 modulos de huella para un total de 59 metros lineales intervenidos y terminados con cuneta

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Junto a los contadores, se está llevando a cabo una revisión minuciosa para asegurar que la documentación necesaria para la autorización de pagos esté completa y adecuadamente preparada. Se realiza una revisión detallada de los plano de secciones transversales con el objetivo de garantizar su integridad y asegurar una construcción correcta. Actualmente se está procediendo a revisar cuidadosamente las estrategias para la contratación del personal necesario para el inicio de la obra, evaluando opciones que aseguren la selección de candidatos idóneos y el cumplimiento eficiente de los requerimientos del proyecto. Se está llevando a cabo una revisión de la documentación presentada por los proveedores para el suministro de materiales, garantizando que cumpla con todos los requisitos necesarios. Se lleva a cabo un proceso de acompañamiento por parte del inspector de interventoría para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Este seguimiento minucioso asegura que todas las actividades se realicen de acuerdo con los estándares establecidos y los requisitos del proyecto, contribuyendo así a su éxito y cumplimiento dentro de los plazos previstos. Se realiza la toma de cilindros de concreto para muestra de resistencia del concreto	FIRMA NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 27 del 18 de julio al 25 de julio — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAPIRA DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+190, 190 ml de placa huella de un ancho de 6,00 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE CAPIRA
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3091 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 195,105,319.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 195,105,319		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 195,105,319		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 195,105,319.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 91,072,934.00	46.679%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 11,473,095.00	5.880%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 1,049,335.00	0.538%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 79,599,839.00	40.798%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 37,380,879.00	19.159%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.463%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 38,430,214.00	19.697%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,697,500.00	0.870%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 110.83 — Avance o Atraso Físico ml: -110.83
Meta Física Ejecutada ml:

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog	100%				
					Ejec	100%				
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6,12			Prog	3.12				
					Ejec	0.0				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	159,89			Prog	120.2				
					Ejec	0.0				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	102,56			Prog	35.60				
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	48,76			Prog	12.50				
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5.137,26			Prog	2350.00				
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	5			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	5			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

la interventoria solicita a la J.A.C el inicio de las actividades ya que se cuenta con los proveedores con pagos desembolsados

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se iniciara las actividades de construccion de la placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
Solicitar el levantamiento del estado actual de los predios aledaños a la via (actas de vecindad)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 27 del 18 de julio al 25 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+190, 165 ml de placa huella de un ancho de 4,10m.
1 Alcantarilla de 6 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE SAN RAFAEL
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3096 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 195,105,319.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 195,105,319		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 5,000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 190,105,319		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 195,105,319.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 76,354,716.00	39.135%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 8,053,573.00	4.128%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 3,309,594.00	1.696%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 68,301,143.00	35.007%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 36,322,543.00	18.617%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.463%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39,632,137.00	20.313%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 297,500.00	0.152%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 95.66 — Avance o Atraso Físico ml: -59.66
Meta Física Ejecutada ml: 36.00

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada % — Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog	100%				
					Ejec	100				
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6,12			Prog	3.12				
					Ejec	2.1				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	159,89			Prog	120.20				
					Ejec	100.2				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	102,56			Prog	21.50				
					Ejec	13.50				
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	48,76			Prog	12.30				
					Ejec	10.50				
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5.137,26			Prog	2300.00				
					Ejec	15000.00				
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ML	5			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	5			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: **No se requieren permisos ambietales**
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: **Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)**

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: **Se realizo la socializacion de inicio**

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

la interventoria solicita a la J.A.C el inicio de las actividades ya que se cuenta con los proveedores con desembolso de recursos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se iniciara las actividades de construccion de la placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
Solicitar el levantamiento del estado actual de los predios aledaños a la via (actas de vecindad)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 27 del 18 de julio al 25 de julio — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+164, 164 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE LA FLORESTA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3241 DE 2023
FECHA DE INICIO: 13/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024
VALOR INICIAL: $ 199,166,367.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024
VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,166,367	$ 199,166,367		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,166,367	$ 199,166,367		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,166,367.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 53,950,780.00	27.088%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 12,450,780.00	6.251%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 41,500,000.00	20.837%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 1,500,000.00	0.753%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.311%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,500,000.00	0.753%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,658,800.00	0.833%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 93.33 — Avance o Atraso Físico ml: -66.33
Meta Física Ejecutada ml: 27.00

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	100				100.0%
					Ejec	100				100.0%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.3			Prog	2.40				
					Ejec	0.00				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	138.01			Prog	50.70				
					Ejec	20.10				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	95.07			Prog	21.50				
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	42.15			Prog	12.50				
					Ejec	9.50				
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4440.4			Prog	1350.00				
					Ejec	1100.00				
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Fuentes de materiales estan aproximadamente 85 Km de distancia del sitio donde se construira la Placa Huella.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A	

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No se Requiere

OBSERVACIONES:Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisiscion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la construccion de 36 metros lineales de placa huella sin cuenta, se fundio vigas, huellas vehiculares y ciclopeos centrales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la continuacion de la construccion de placa huella continuando con las cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Junto a los contadores, se está llevando a cabo una revisión minuciosa para asegurar que la documentación necesaria para la autorización de pagos esté completa y adecuadamente preparada.
Se realiza una revisión detallada de los plano de secciones transversales con el objetivo de garantizar su integridad y asegurar una construcción correcta.
Actualmente se está procediendo a revisar cuidadosamente las estrategias para la contratación del personal necesario para el inicio de la obra, evaluando opciones que aseguren la selección de candidatos idóneos y el cumplimiento eficiente de los requerimientos del proyecto.
Se está llevando a cabo una revisión de la documentación presentada por los proveedores para el suministro de materiales, garantizando que cumpla con todos los requisitos necesarios.
Se lleva a cabo un proceso de acompañamiento por parte del inspector de interventoría para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Este seguimiento minucioso asegura que todas las actividades se realicen de acuerdo con los estándares establecidos y los requisitos del proyecto, contribuyendo así a su éxito y cumplimiento dentro de los plazos previstos.
Se realiza la toma de cilindros de concreto para muestra de resistencia del concreto

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 27 del 18 de julio al 25 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+172, 172 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE LAGUNA VERDE
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3779 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 198,947,680.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,947,680	$ 198,947,680		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,947,680	$ 198,947,680		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198,947,680.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 53,150,800.00	26.716%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 11,650,800.00	5.856%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 41,500,000.00	20.860%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 1,500,000.00	0.754%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.319%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,500,000.00	0.754%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,758,800.00	0.884%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 100.33 — Avance o Atraso Físico ml: -100.33
Meta Física Ejecutada ml:

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	100				100.0%
					Ejec	50				50.0%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.05			Prog	2.40				
					Ejec	0.00				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	131.58			Prog	50.70				
					Ejec	45.60				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	99.84			Prog	21.50				
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	32.22			Prog	12.50				
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4576.85			Prog	1255.00				
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: LA DORADA	PERMISO MINERO: SI X NO		
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		
UBICACIÓN: ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO: SI X NO		
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		

OBSERVACIONES: Fuentes de materiales estan aproximadamente 85 Km de distancia del sitio donde se construira la Placa Huella.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No se Requiere

OBSERVACIONES: Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisiscion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continuo la conformacion de la via, se instalo la subbase parcial utilizando el vibro compactador y motoniveladora

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la instalacion de la formaleta y se fundira el ciclopeo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
se revisa la conformacion e instalacion del material soporte de la via
Se revisa la documentacion de la maquinaria utilizada en la obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 27 del 18 de julio al 25 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+160, 160 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE REGION DE LOS RIOS
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3793 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199,276,933.00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

CONTRATO No.: 5083 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO: 29/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,276,933	$ 199,276,933		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,276,933	$ 199,276,933		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,276,933.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 52,060,790.00	26.125%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 10,560,790.00	5.300%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 41,500,000.00	20.825%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 1,500,000.00	0.753%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.307%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,500,000.00	0.753%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,758,800.00	0.883%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: No cuenta con recursos en la cuenta bancaria del convenio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA
Meta Física Programada ml: 95.66 — Avance o Atraso Físico ml: -59.66
Meta Física Ejecutada ml: 36.00

ALCANTARILLAS
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog	100				
					Ejec	100				
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.05			Prog	2.30				
					Ejec	0.00				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	131.58			Prog	56.70				
					Ejec	0.00				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	99.84			Prog					
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	32.22			Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4576.85			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec	1.20				

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Fuentes de materiales estan aproximadamente 85 Km de distancia del sitio donde se construira la Placa Huella.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No se Requiere

OBSERVACIONES:Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisisccion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la construccion de 27 metros lineales de placa huella sin cuenta, se fundio vigas ciclopeos centrales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la continuacion de la construccion de placa huella continuando con las cunetas, huellas y vigas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Junto a los contadores, se está llevando a cabo una revisión minuciosa para asegurar que la documentación necesaria para la autorización de pagos esté completa y adecuadamente preparada.
Se realiza una revisión detallada de los plano de secciones transversales con el objetivo de garantizar su integridad y asegurar una construcción correcta.
Actualmente se está procediendo a revisar cuidadosamente las estrategias para la contratación del personal necesario para el inicio de la obra, evaluando opciones que aseguren la selección de candidatos idóneos y el cumplimiento eficiente de los requerimientos del proyecto.
Se está llevando a cabo una revisión de la documentación presentada por los proveedores para el suministro de materiales, garantizando que cumpla con todos los requisitos necesarios.
Se lleva a cabo un proceso de acompañamiento por parte del inspector de interventoría para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Este seguimiento minucioso asegura que todas las actividades se realicen de acuerdo con los estándares establecidos y los requisitos del proyecto, contribuyendo así a su éxito y cumplimiento dentro de los plazos previstos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25-jul-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 27 del 18 de julio al 25 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MATA DE RAMO DEL MUNICIPIO TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+185, 185 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.
1 Alcantarilla de 6 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, tubería de concreto reforzado 900 MM (tipo 2), Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, concreto clase D (210 kg/cm2 0 3000 PSI) para la construccion de alcantarillas,

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE MATA DE RAMO		INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S	
INTEGRANTES:	N/A		INTEGRANTES:	REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO	
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4657 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 199,186,308.00	CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,186,308	$ 199,186,308		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,186,308	$ 199,186,308		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,186,308.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 104,531,176.00	52.479%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 6,601,900.00	3.314%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 1,000,000.00	0.502%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 97,929,276.00	49.165%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 10,000,000.00	5.020%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.310%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11,000,000.00	5.522%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,890,650.00	0.949%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 235,470,159.96	67.852%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 102.80 — Avance o Atraso Físico ml: -87.80
Meta Física Ejecutada ml: 15.00

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.202			Prog	2.40				
					Ejec	0.00				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	134.64			Prog	110.00				
					Ejec	96.40				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	86.904			Prog	21.40				
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	41.31			Prog	25.20				
					Ejec	12.50				
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4344.211			Prog	3250.00				
					Ejec	2500.00				
ALCANTARILLA										
* Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.5			Prog					
					Ejec					
* Excavaciones en roca en seco	M3	8.2			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) -	M3	0.5			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) -	M3	9.6			Prog					
					Ejec					
* Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.9			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.4			Prog					
					Ejec					
* Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	43			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Fuentes de materiales estan aproximadamente 85 Km de distancia del sitio donde se construira la Placa Huella.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: No se requieren permisos ambietales
Obras de bajo impacto ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: Se requiere PMA (Plan de Manejo Ambiental)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la construccion de 15 metros lineales de placa huella sin cuenta, se fundio vigas ciclopeos centrales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la continuacion de la construccion de placa huella continuando con las cunetas, huellas y vigas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Junto a los contadores, se está llevando a cabo una revisión minuciosa para asegurar que la documentación necesaria para la autorización de pagos esté completa y adecuadamente preparada.
Se realiza una revisión detallada de los plano de secciones transversales con el objetivo de garantizar su integridad y asegurar una construcción correcta.
Actualmente se está procediendo a revisar cuidadosamente las estrategias para la contratación del personal necesario para el inicio de la obra, evaluando opciones que aseguren la selección de candidatos idóneos y el cumplimiento eficiente de los requerimientos del proyecto.
Se está llevando a cabo una revisión de la documentación presentada por los proveedores para el suministro de materiales, garantizando que cumpla con todos los requisitos necesarios.
Se lleva a cabo un proceso de acompañamiento por parte del inspector de interventoría para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Este seguimiento minucioso asegura que todas las actividades se realicen de acuerdo con los estándares establecidos y los requisitos del proyecto, contribuyendo así a su éxito y cumplimiento dentro de los plazos previstos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMES SEMANALES

SEMANA 28, 26 DE JULIO DEL 2024 AL 1 DE AGOSTO DEL 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1-ago-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 28 del 26 de julio al 1 de agosto (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTE BELLO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 195 ml de mejoramiento vial con placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE MONTEBELLO
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4612 DE 2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 199,940,745.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,940,745	$ 199,940,745		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,940,745	$ 199,940,745		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,940,745.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5,601,900.00	2.802%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 5,601,900.00	2.802%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.283%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,890,650.00	0.946%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 104.50 — Avance o Atraso Físico ml: -104.50
Meta Física Ejecutada ml:

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	100				100.0%
					Ejec	100				100.0%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,31			Prog	2.90				
					Ejec					
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	139,51			Prog	83.50				
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	106,18			Prog	21.50				
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,20			Prog	22.40				
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5.094,22			Prog	3984.00				
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: La OAC allega documentación de la procedencia del material la cual entra a evaluación para aprobación.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: Se solicita a las OAC soliciatar a la autoridad ambiental certificado de no encontrarce inmerso en procesos sancionatorios ambeintales anteriores y/o por ejecución de la obra. se obtiene radicado No. 08241000999 del 1/08/2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: No se requiere PAGA, por ser obra de baja complejidad, se genera certificado por parte de la interventoria, se procede a solicitar Plan de Manejo Ambiental el cual continua en elaboración.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisiscion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoria esta a la espera de la informacion por parte del contador para pago de materiales para iniciar despacho de materiales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el suministro de maeriales

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
se verifica medidas e instalacion del acero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1-ago-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 28 del 26 de julio al 1 de agosto — Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EN LA VEREDA ALTO YASAL MUNICIPIO DE PACHO EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Dos tramos para un total 196 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, Recebo Seleccionado, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE ALTO YASAL
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3612 DE 2023
FECHA DE INICIO: 13/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 198,779,288.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,779,288	$ 198,779,288		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 5,000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,779,288	$ 193,779,288		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 25,000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 322,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198,779,288.00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		0.000%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 63,635,459.00	32.013%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		0.000%
TOTAL INVERSION PAGADA COSTO ADMON:	$ 16,712,125.00	8.407%
INVERSION SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 3,792,924.00	1.908%
TOTAL INVERSION PAGADA BASICO DE OBRA:	$ 46,923,334.00	23.606%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ -	0.000%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,300,700.00	8.703%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,792,924.00	1.908%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,802,000.00	0.907%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		0.000%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 106.66 — Avance o Atraso Físico ml: -107
Meta Física Ejecutada ml: 0

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%	100%			100%
					Ejec	100%	100%			100.0%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.202			Prog	4.1				
					Ejec	1.2				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	134.64			Prog	103.4				
					Ejec	30.1				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	86.904			Prog	21.1				
					Ejec	0.0				
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	41.31			Prog	32.3				
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4344.211			Prog	3980.0				
					Ejec	3980.0				
ALCANTARILLA										
* Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.5			Prog					
					Ejec					
* Excavaciones en roca en seco	M3	8.2			Prog	0%				
					Ejec	0%				
* Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.5			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9.6			Prog					
					Ejec	0%				
* Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.9			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.4			Prog					
					Ejec	0%				
* Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	43			Prog					
					Ejec	0%				
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec	0%				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACION: Dorada - Caldas	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN: Zipaquira- Cundinamarca	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: La OAC allega documentación de la procedencia del material la cual entra a evaluación para aprobación.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A	

OBSERVACIONES:Se solicita a las OAC soliciatar a la autoridad ambiental certificado de no encontrarce inmerso en procesos

OBSERVACIONES:Se solicita a las OAC solicitar a la autoridad ambiental certificado de no encontrarce inmerso en procesos sancionatorios ambeintales anteriores y/o por ejecución de la obra. se obtiene radicado No. 08241001000 del 1/08/2024 .

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: No se requiere PAGA, por ser obra de baja complejidad, se genera certificado por parte de la interventoria, se procede a solicitar Plan de Manejo Ambiental el cual continua en elaboración.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continuo el armado de parrillas de acero para las huellas vehiculares y se dispuso a lo largo de la via para tener la facilidad de instalacion

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el armado de formaletas y fundida de huellas y ciclopeo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Junto a los contadores, se está llevando a cabo una revisión minuciosa para asegurar que la documentación necesaria para la autorización de pagos esté completa y adecuadamente preparada.
Se realiza una revisión detallada de los plano de secciones transwersales con el objetivo de garantizar su integridad y asegurar una construcción correcta.
Actualmente se está procediendo a revisar cuidadosamente las estrategias para la contratación del personal necesario para el inicio de la obra, evaluando opciones que aseguren la selección de candidatos idóneos y el cumplimiento eficiente de los requerimientos del proyecto.
Se está llevando a cabo una revisión de la documentación presentada por los proveedores para el suministro de materiales, garantizando que cumpla con todos los requisitos necesarios.
Se lleva a cabo un proceso de acompañamiento por parte del inspector de interventoría para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Este seguimiento minucioso asegura que todas las actividades se realicen de acuerdo con los estándares establecidos y los requisitos del proyecto, contribuyendo así a su éxito y cumplimiento dentro de los plazos previstos.

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

* Realizar reuniones en campo junto a los representantes de cada junta de acción comunal en campo. con el fin de realizar la verificación en sitio de las condiciones de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construcción de las actividades descritas en el anexo técnico.
*revisar y aprobar hojas de vida remitidas por las Juntas de accion comunal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1-ago-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 28 del 26 de julio al 1 de agosto — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+045, 45 ml de placa huella de un ancho de 5 m.
TRAMO 2: PR 0+000 AL PR 0+060, 60 ml de placa huella de un ancho de 5 m.
1 Alcantarilla de 6 ml. Construccion de 165 ml de Placa Huellas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, tubería de concreto reforzado 900 MM (tipo 2), Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, concreto clase D (210 kg/cm2 0 3000 PSI) para la construccion de alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE BAJO PASUNCHA		INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S.	
INTEGRANTES:	N/A		INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3381 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 200,312,049.00	CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,312,049	$ 200,312,049		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,312,049	$ 200,312,049		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,312,049.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 57,444,936.00	28.678%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 17,518,983.00	8.746%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ 6,640,010.92	3.315%
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 39,925,953.00	19.932%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 3,001,799.83	1.499%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,650,700.00	7.314%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9,641,810.75	4.813%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 1,547,500.00	0.773%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 106.66 — Avance o Atraso Físico ml: -66.66
Meta Física Ejecutada ml: 40.00

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada % — Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,41			Prog	4.60				
					Ejec	4.10				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	138,85			Prog	138.85				
					Ejec	100.50				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	90,31			Prog	50.60				
					Ejec	5.5				
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	42,96			Prog	12.60				
					Ejec	6.1				
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.500,26			Prog	3500.00				
					Ejec	1567.00				
ALCANTARILLA										
* Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46,50			Prog	46,50				
					Ejec	32.6				
* Excavaciones en roca en seco	M3	8,20			Prog	8.2				
					Ejec	0.0				
* Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50			Prog	0.5				
					Ejec	0.0				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9.6			Prog	8.5				
					Ejec	0.0				
* Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.9			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.4			Prog					
					Ejec					
* Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					
Estudios y diseños					Prog	100%				
					Ejec	100%				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Dorada - Caldas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	Zipaquira- Cundinamarca	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: La OAC allega documentación de la procedencia del material la cual entra a evaluación para aprobación.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES: Se solicita a las OAC soliciatar a la autoridad ambiental certificado de no encontrarce inmerso en procesos sancionatorios ambeintales anteriores y/o por ejecución de la obra. se obtiene radicado No. 08241001001 del 1/08/2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: No se requiere PAGA, por ser obra de baja complejidad, se genera certificado por parte de la interventoria, se procede a solicitar Plan de Manejo Ambiental el cual continua en elaboración.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizar la construccion de 40 metros lineales de ciclopeo central y huellas vehiculares derecha e izquierda

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se realizara la fundida de sobre ancho en ciclopeo y cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Junto a los contadores, se está llevando a cabo una revisión minuciosa para asegurar que la documentación necesaria para la autorización de pagos esté completa y adecuadamente preparada.
Se realiza una revisión detallada de los plano de secciones transversales con el objetivo de garantizar su integridad y asegurar una construcción correcta.
Actualmente se está procediendo a revisar cuidadosamente las estrategias para la contratación del personal necesario para el inicio de la obra, evaluando opciones que aseguren la selección de candidatos idóneos y el cumplimiento eficiente de los requerimientos del proyecto.
Se está llevando a cabo una revisión de la documentación presentada por los proveedores para el suministro de materiales, garantizando que cumpla con todos los requisitos necesarios.
Se lleva a cabo un proceso de acompañamiento por parte del inspector de interventoría para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Este seguimiento minucioso asegura que todas las actividades se realicen de acuerdo con los estándares establecidos y los requisitos del proyecto, contribuyendo así a su éxito y cumplimiento dentro de los plazos previstos.
Se realiza la toma de cilindros de concreto para muestra de resistencia del concreto

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1-ago-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 28 del 26 de julio al 1 de agosto (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: 78 ml de placa huella de un ancho de 5 m.
TRAMO 2: 78 ml de placa huella de un ancho de 5 m. 156 ml de placa huella en total

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, tubería de concreto reforzado 900 MM (tipo 2), Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, concreto clase D (210 kg/cm2 0 3000 PSI) para la construccion de alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE QUEBRADA HONDA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3478 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,674,031.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S		
INTEGRANTES:	REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO		
CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,674,031	$ 199,674,031		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,674,031	$ 199,674,031		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,674,031.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 48,745,881.00	24.413%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 3,838,650.00	1.922%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 44,907,231.00	22.490%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 28,647,482.58	14.347%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,450,790.00	6.736%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 28,647,482.58	14.347%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,685,500.00	0.844%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 83.33 Avance o Atraso Físico ml: -16.03
Meta Física Ejecutada ml: 67.30

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños					Prog	100%				
					Ejec	100%				
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4.28			Prog	4.1				
					Ejec	3.97				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	109.4			Prog	109.4				
					Ejec	109.4				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	71.26			Prog	55.1				
					Ejec	9.5				
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	33.88			Prog	25.6				
					Ejec	18.5				
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3551.15			Prog	2970.1				
					Ejec	2876.4				
ALCANTARILLA										
* Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92.9			Prog					
					Ejec					
* Excavaciones en roca en seco	M3	16.4			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.5			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19.1			Prog					
					Ejec					
* Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157.8			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50.9			Prog					
					Ejec					
* Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	35			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Dorada - Caldas

PERMISO MINERO: SI x NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: Zipaquira- Cundinamarca

PERMISO MINERO: SI x NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

DISPONIBLE

OBSERVACIONES: La OAC allega documentación de la procedencia del material la cual entra a evaluación para aprobación.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES: Se solicita a las OAC soliciatar a la autoridad ambiental certificado de no encontrarce inmerso en procesos sancionatorios ambeintales anteriores y/o por ejecución de la obra. se obtiene radicado No. 08241001000 del 1/08/2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:No se requiere PAGA, por ser obra de baja complejidad, se genera certificado por parte de la interventoria, se procede a solicitar Plan de Manejo Ambiental el cual continua en elaboración.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza la socializacion inicial

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se funden modulos de ciclopeo y de huellas, se tienen 67.3 ml de placa huella ejecutada sin cunetas

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se fundiran 13 modulos de huella para un total de 59 metros lineales intervenidos y terminados con cuneta

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Junto a los contadores, se está llevando a cabo una revisión minuciosa para asegurar que la documentación necesaria para la autorización de pagos esté completa y adecuadamente preparada.
Se realiza una revisión detallada de los plano de secciones transversales con el objetivo de garantizar su integridad y asegurar una construcción correcta.
Actualmente se está procediendo a revisar cuidadosamente las estrategias para la contratación del personal necesario para el inicio de la obra, evaluando opciones que aseguren la selección de candidatos idóneos y el cumplimiento eficiente de los requerimientos del proyecto.
Se está llevando a cabo una revisión de la documentación presentada por los proveedores para el suministro de materiales, garantizando que cumpla con todos los requisitos necesarios.
Se lleva a cabo un proceso de acompañamiento por parte del inspector de interventoría para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Este seguimiento minucioso asegura que todas las actividades se realicen de acuerdo con los estándares establecidos y los requisitos del proyecto, contribuyendo así a su éxito y cumplimiento dentro de los plazos previstos.
Se realiza la toma de cilindros de concreto para muestra de resistencia del concreto

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1-ago-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 28 del 26 de julio al 1 de agosto — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAPIRA DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+190, 190 ml de placa huella de un ancho de 6,00 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE CAPIRA
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3091 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 195,105,319.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 195,105,319		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 195,105,319		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 195,105,319.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 91,072,934.00	46.679%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 11,473,095.00	5.880%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 79,599,839.00	40.798%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.463%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,697,500.00	0.870%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 110.83 — Avance o Atraso Físico ml: -110.83
Meta Física Ejecutada ml:

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog	100%				
					Ejec	100%				
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6,12			Prog	4.10				
					Ejec	0.0				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	159,89			Prog	130.4				
					Ejec	0.0				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	102,56			Prog	37.80				
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	48,76			Prog	21.30				
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5.137,26			Prog	3124.00				
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	5			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	5			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La OAC allega documentación de la procedencia del material la cual entra a evaluación para aprobación.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES: Se solicita a las OAC soliciatar a la autoridad ambiental certificado de no encontrarce inmerso en procesos sancionatorios am beintales anteriores y/o por ejecución de la obra. se obtiene radicado No. 08241000997 del 1/08/2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: No se requiere PAGA, por ser obra de baja complejidad, se genera certificado por parte de la interventoria, se procede a solicitar Plan de Manejo Ambiental el cual continua en elaboración.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

la interventoria reitera la solicitud a la J.A.C el inicio de las actividades ya que se cuenta con los proveedores con pagos desembolsados

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se iniciara las actividades de construccion de la placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
Solicitar el levantamiento del estado actual de los predios aledaños a la via (actas de vecindad)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1-ago-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 28 del 26 de julio al 1 de agosto — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+190, 165 ml de placa huella de un ancho de 4,10m.
1 Alcantarilla de 6 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE SAN RAFAEL
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3096 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 195,105,319.00
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
CONTRATO No.: 5083 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO: 29/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 195,105,319		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,105,319	$ 195,105,319		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 195,105,319.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 77,522,216.00	39.734%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 7,291,073.00	3.737%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 70,231,143.00	35.997%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 1,930,000.00	0.989%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.463%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,930,000.00	0.989%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 297,500.00	0.152%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 126.66 — Avance o Atraso Físico ml: -126.66
Meta Física Ejecutada ml:

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog	100%				
					Ejec	100				
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6,12			Prog	3.50				
					Ejec					
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	159,89			Prog	159.89				
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	102,56			Prog	29.80				
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	48,76			Prog	21.50				
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5.137,26			Prog	3190.00				
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ML	5			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	5			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: La OAC allega documentación de la procedencia del material la cual entra a evaluación para aprobación.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Se solicita a las OAC soliciatar a la autoridad ambiental certificado de no encontrarce inmerso en procesos sancionatorios ambeintales anteriores y/o por ejecución de la obra. se obtiene radicado No. 08241000993 del 1/08/2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: No se requiere PAGA, por ser obra de baja complejidad, se genera certificado por parte de la interventoria, se procede a solicitar Plan de Manejo Ambiental el cual continua en elaboración.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

la interventoria reitera la solicitud a la J.A.C el inicio de las actividades ya que se cuenta con los proveedores con desembolso de recursos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se iniciara las actividades de construccion de la placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
Solicitar el levantamiento del estado actual de los predios aledaños a la via (actas de vecindad)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1-ago-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 28 del 26 de julio al 1 de agosto (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+164, 164 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE LA FLORESTA
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3241 DE 2023
FECHA DE INICIO: 13/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 199,166,367.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,166,367	$ 199,166,367		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,166,367	$ 199,166,367		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,166,367.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 53,950,780.00	27.088%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 12,450,780.00	6.251%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 41,500,000.00	20.837%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.311%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,658,800.00	0.833%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 109.33 — Avance o Atraso Físico ml: -15.33
Meta Física Ejecutada ml: 94.00

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	100				100.0%
					Ejec	100				100.0%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.3			Prog	3.40				
					Ejec	2.50				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	138.01			Prog	110.50				
					Ejec	138.01				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	95.07			Prog	31.80				
					Ejec	23.90				
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	42.15			Prog	31.90				
					Ejec	12.80				
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4440.4			Prog	3786.00				
					Ejec	2987.00				
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN: ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: La OAC allega documentación de la procedencia del material la cual entra a evaluación para aprobación.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: Se solicita a las OAC soliciatar a la autoridad ambiental certificado de no encontrarce inmerso en procesos sancionatorios ambeintales anteriores y/o por ejecución de la obra. se obtiene radicado No. 08241000996 del 1/08/2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: No se requiere PAGA, por ser obra de baja complejidad, se genera certificado por parte de la interventoria, se procede a solicitar Plan de Manejo Ambiental el cual continua en elaboración.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisisccion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la construccion de 94 metros lineales de placa huella sin cuenta, se fundio vigas, huellas vehiculares, ciclopeos centrales y cunetas

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la continuacion de la construccion de placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Junto a los contadores, se está llevando a cabo una revisión minuciosa para asegurar que la documentación necesaria para la autorización de pagos esté completa y adecuadamente preparada.
Se realiza una revisión detallada de los plano de secciones transversales con el objetivo de garantizar su integridad y asegurar una construcción correcta.
Actualmente se está procediendo a revisar cuidadosamente las estrategias para la contratación del personal necesario para el inicio de la obra, evaluando opciones que aseguren la selección de candidatos idóneos y el cumplimiento eficiente de los requerimientos del proyecto.
Se está llevando a cabo una revisión de la documentación presentada por los proveedores para el suministro de materiales, garantizando que cumpla con todos los requisitos necesarios.
Se lleva a cabo un proceso de acompañamiento por parte del inspector de interventoría para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Este seguimiento minucioso asegura que todas las actividades se realicen de acuerdo con los estándares establecidos y los requisitos del proyecto, contribuyendo así a su éxito y cumplimiento dentro de los plazos previstos.
Se realiza la toma de cilindros de concreto para muestra de resistencia del concreto

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1-ago-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 28 del 26 de julio al 1 de agosto (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+172, 172 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE LAGUNA VERDE			INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3779 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,947,680.00	CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,947,680	$ 198,947,680		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,947,680	$ 198,947,680		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198,947,680.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 53,150,800.00	26.716%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 11,650,800.00	5.856%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 41,500,000.00	20.860%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.319%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,758,800.00	0.884%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA
Meta Física Programada ml: 114.66 — Avance o Atraso Físico ml: -114.66
Meta Física Ejecutada ml:

ALCANTARILLAS
Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	1	1			Prog	100				100.0%
					Ejec	50				50.0%
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.05			Prog	3.40				
					Ejec	0.00				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	131.58			Prog	67.50				
					Ejec	67.50				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	99.84			Prog	34.40				
					Ejec					
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	32.22			Prog	19.70				
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4576.85			Prog	2178.40				
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: La OAC allega documentación de la procedencia del material la cual entra a evaluación para aprobación.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A	

OBSERVACIONES: Se solicita a las OAC soliciatar a la autoridad ambiental certificado de no encontrarce inmerso en procesos sancionatorios ambeintales anteriores y/o por ejecución de la obra. se obtiene radicado No. 08241000994 del 1/08/2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: No se requiere PAGA, por ser obra de baja complejidad, se genera certificado por parte de la interventoria, se procede a solicitar Plan de Manejo Ambiental el cual continua en elaboración.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisiscion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continuo la conformacion de la via, se instalo la subbase parcial utilizando el vibro compactador y motoniveladora

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la instalacion de la formaleta y se fundira el ciclopeo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Relizar diferentes reuniones junto con los residentes de obra para evaluar el avance y programacion de obra
Realizar la revision de la documentacion pertiente a los poveedores
Realizar diferentes visitas a campo con el fin de evaluar el avance de la obra
se revisa la conformacion e instalacion del material soporte de la via
Se revisa la documentacion de la maquinaria utilizada en la obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1-ago-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 28 del 26 de julio al 1 de agosto (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+160, 160 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE REGION DE LOS RIOS			INTERVENTOR:	DATUM X S.A.S		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3793 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,276,933.00	CONTRATO No.	5083 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 347,035,899.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 199,276,933	$ 199,276,933		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,276,933	$ 199,276,933		
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,276,933.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 52,060,790.00	26.125%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 10,560,790.00	5.300%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 41,500,000.00	20.825%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.307%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,758,800.00	0.883%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: No cuenta con recursos en la cuenta bancaria del convenio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 106.66 — Avance o Atraso Físico ml: -10.66
Meta Física Ejecutada ml: 96.00

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños					Prog	100				
					Ejec	100				
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.05			Prog	2.30				
					Ejec	0.00				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	131.58			Prog	56.70				
					Ejec	56.70				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	99.84			Prog	21.40				
					Ejec	19.50				
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	32.22			Prog	12.50				
					Ejec	10.50				
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4576.85			Prog	2450.00				
					Ejec	2350.00				
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec	1.20				

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: La OAC allega documentación de la procedencia del material la cual entra a evaluación para aprobación.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A	

OBSERVACIONES: Se solicita a las OAC soliciatar a la autoridad ambiental certificado de no encontrarce inmerso en procesos sancionatorios ambeintales anteriores y/o por ejecución de la obra. se obtiene radicado No. 08241000995 del 1/08/2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: No se requiere PAGA, por ser obra de baja complejidad, se genera certificado por parte de la interventoria, se procede a solicitar Plan de Manejo Ambiental el cual continua en elaboración.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: No es necesario adquisiscion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la construccion de 27 metros lineales de placa huella sin cuenta, se fundio vigas ciclopeos centrales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la continuacion de la construccion de placa huella continuando con las cunetas, huellas y vigas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Junto a los contadores, se está llevando a cabo una revisión minuciosa para asegurar que la documentación necesaria para la autorización de pagos esté completa y adecuadamente preparada.
Se realiza una revisión detallada de los plano de secciones transversales con el objetivo de garantizar su integridad y asegurar una construcción correcta.
Actualmente se está procediendo a revisar cuidadosamente las estrategias para la contratación del personal necesario para el inicio de la obra, evaluando opciones que aseguren la selección de candidatos idóneos y el cumplimiento eficiente de los requerimientos del proyecto.
Se está llevando a cabo una revisión de la documentación presentada por los proveedores para el suministro de materiales, garantizando que cumpla con todos los requisitos necesarios.
Se lleva a cabo un proceso de acompañamiento por parte del inspector de interventoría para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Este seguimiento minucioso asegura que todas las actividades se realicen de acuerdo con los estándares establecidos y los requisitos del proyecto, contribuyendo así a su éxito y cumplimiento dentro de los plazos previstos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1-ago-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 28 del 26 de julio al 1 de agosto (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MATA DE RAMO DEL MUNICIPIO TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+185, 185 ml de placa huella de un ancho de 4,10 m.
1 Alcantarilla de 6 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto, y Excavaciones varias sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto clase F, Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, tubería de concreto reforzado 900 MM (tipo 2), Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, concreto clase D (210 kg/cm2 0 3000 PSI) para la construccion de alcantarillas,

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE MATA DE RAMO
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4657 DE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 199,186,308.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
INTEGRANTES: REPRS LEGAL PRIN: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

CONTRATO No.: 5083 de 2023
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,186,308	$ 199,186,308		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,186,308	$ 199,186,308		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 347,035,899	$ 347,035,899		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,186,308.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 104,531,176.00	52.479%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA COSTO ADMON:	$ 6,601,900.00	3.314%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA COSTO ADMON:		
TOTAL INVERSIÓN PAGADA BÁSICO DE OBRA:	$ 97,929,276.00	49.165%
INVERSIÓN SEMANAL PAGADA BÁSICO DE OBRA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,560,800.00	7.310%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
Topografia, estudios y diseños	$ 1,890,650.00	0.949%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 252,702,911.72	72.818%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,232,751.76	4.966%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	58,325,361.20
Amortizado $	$ -
Saldo $	58,325,361.20

III. AVANCE FÍSICO

PLACA HUELLA

Meta Física Programada ml: 116.66 — Avance o Atraso Físico ml: -68.60
Meta Física Ejecutada ml: 48.06

ALCANTARILLAS

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
PLACA HUELLA										
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.202			Prog	3.10				
					Ejec	2.70				
* SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	134.64			Prog	129.30				
					Ejec	129.30				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	86.904			Prog	31.50				
					Ejec	28.10				
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	41.31			Prog	29.50				
					Ejec	21,1				
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4344.211			Prog	3759.00				
					Ejec	2987.00				
ALCANTARILLA										
* Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.5			Prog					
					Ejec					
* Excavaciones en roca en seco	M3	8.2			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) -	M3	0.5			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) -	M3	9.6			Prog					
					Ejec					
* Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.9			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.4			Prog					
					Ejec					
* Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6			Prog					
					Ejec					
* Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	43			Prog					
					Ejec					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ML	12			Prog					
					Ejec					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	12			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA DORADA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	ZIPAQUIRA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: La OAC allega documentación de la procedencia del material la cual entra a evaluación para aprobación.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Se solicita a las OAC soliciatar a la autoridad ambiental certificado de no encontrarce inmerso en procesos sancionatorios ambeintales anteriores y/o por ejecución de la obra. se obtiene radicado No. 08241000998 del 1/08/2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: No se requiere PAGA, por ser obra de baja complejidad, se genera certificado por parte de la interventoria, se procede a solicitar Plan de Manejo Ambiental el cual continua en elaboración.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo la socializacion de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Actividades Sociales Levantamiento de formatos Socio Económicos


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la construccion de 48.06metros lineales de placa huella sin cuenta, se fundio vigas ciclopeos centrales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la continuacion de la construccion de placa huella continuando con las cunetas, huellas y vigas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Junto a los contadores, se está llevando a cabo una revisión minuciosa para asegurar que la documentación necesaria para la autorización de pagos esté completa y adecuadamente preparada.
Se realiza una revisión detallada de los plano de secciones transversales con el objetivo de garantizar su integridad y asegurar una construcción correcta.
Actualmente se está procediendo a revisar cuidadosamente las estrategias para la contratación del personal necesario para el inicio de la obra, evaluando opciones que aseguren la selección de candidatos idóneos y el cumplimiento eficiente de los requerimientos del proyecto.
Se está llevando a cabo una revisión de la documentación presentada por los proveedores para el suministro de materiales, garantizando que cumpla con todos los requisitos necesarios.
Se lleva a cabo un proceso de acompañamiento por parte del inspector de interventoría para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Este seguimiento minucioso asegura que todas las actividades se realicen de acuerdo con los estándares establecidos y los requisitos del proyecto, contribuyendo así a su éxito y cumplimiento dentro de los plazos previstos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO
Matrícula Profesional No.: 2520223759CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **PERIODO MES:** 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIODE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 4567 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MATA DE RAMO DEL MUNICIPIO TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA MATA DE RAMO

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE PRÓRROGA: 18/01/2024
PLAZO DE PRÓRROGA: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES Y 5 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199,186,308.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/D
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199,186,308.00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/D
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5083 DE 2023 **INTERVENTOR:** DATUM X S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	12
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4.68
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	123.17
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	92.96
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	22.73
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4574.61
Construcción de Alcantarillas	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.5
	Excavaciones en roca en seco	M3	8.2
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.5
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9.6
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.9
	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.4
	Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6
Construcción de Muro en Gaviones	Excavaciones varias sin clasificar	M3	33.6
	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2	20
	alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc	M3	18
	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0.6
	Relleno para Estructuras con recebo	M3	8
	Material Drenante	M3	3.6
	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	ML	6.6

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	0	0
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	1.5	0
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	96.4	0
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	0	0
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	12.5	0
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2500	0
Construcción de Alcantarillas	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0	0
	Excavaciones en roca en seco	M3	0	0
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0	0
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	0	0
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0	0
	21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	0	0
Construcción de Muro en Gaviones	Excavaciones varias sin clasificar	M3	0	0
	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2	0	0
	acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc	M3	0	0
	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0	0
	Relleno para Estructuras con recebo	M3	0	0
	Material Drenante	M3	0	0
	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	ML	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 175,560,400.49	$ 24,171,359.49	$ 151,389,041.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 5,266,811.75	$ 725,140.75	$ 4,541,671.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49,002,287.80	$ 6,746,691.80	$ 42,255,596.00
APORTE DE LA JUNTA	$ 1,000,000.00	$ -	$ 1,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 31,643,192.00	$ 199,186,308.00

Éstos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 44,833,031.00	$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 12,941,912.00	$ -	$ -	$ -
APORTE DE LA JUNTA	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 57,774,943.00	$ -	$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 57,774,943.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 9.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO INICIAL VIA JAC VEREDA MATA DE RAMO



ESTADO INICIAL VIA JAC VEREDA MATA DE RAMO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
PERIODO MES: 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 3612 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EN LA VEREDA ALTO YASAL MUNICIPIO DE PACHO EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE ALTO YASAL

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/D
FECHA DE REANUDACIÓN: N/D
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES 18 DÍAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198,779,288.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/D
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198,779,288.00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/D
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5083 DE 2023
INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	12
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.20
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	134.64
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	86.90
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	41.31
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4344.21
Construcción de Alcantarillas	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.5
	Excavaciones en roca en seco	M3	8.2
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.5
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9.6
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.9
	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.4
	Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6
	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	43

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	0	0
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	1.2	1.2
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	30.1	30.1
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	0	0
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	0	0
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3980.0	3980
Construcción de Alcantarillas	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0	0
	Excavaciones en roca en seco	M3	0	0
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0	0
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	0	0
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0	0
	21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	0	0
	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 127,699,598.32	$ 24,262,923.68	$ 151,962,522.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3,830,988.24	$ 727,887.76	$ 4,558,876.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 34,670,495.80	$ 6,587,394.20	$ 41,257,890.00
APORTE DE LA JUNTA	$ 1,000,000.00	$ -	$ 1,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 31,578,206.00	$ 198,779,288.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 46,923,334.00	$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 12,919,201.00	$ -	$ -	$ -
APORTE DE LA JUNTA	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 59,842,535.00	$ -	$ -	$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 59,842,535.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8

REGISTRO FOTOGRÁFICO



JAC ALTO YASAL ESTADO INICIAL DE LA VIA VEREDAL



JAC ALTO YASAL ESTADO INICIAL DE LA VIA VEREDAL

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
PERIODO MES: 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JUNLIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 3478 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE PRÓRROGA: 18/01/2024
PLAZO DE PRÓRROGA: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES Y 11 DÍAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199,674,031.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/D
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199,674,031.00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/D
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5083 DE 2023
INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	12
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4.28
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	109.40
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	71.26
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	33.88
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3551.15
Construcción de Alcantarillas	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92.9
	Excavaciones en roca en seco	M3	16.4
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.9
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19.1
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157.8
	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50.9
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12
	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	35

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	0	0
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3.97	3.97
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	109.4	109.4
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	9.5	9.5
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	18.5	18.5
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2876.4	2876.4
Construcción de Alcantarillas	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0	0
	Excavaciones en roca en seco	M3	0	0
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0	0
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	0	0
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0	0
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	0	0
	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 125,582,294.96	$ 23,860,636.04	$ 149,442,931.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3,843,056.91	$ 715,819.09	$ 4,483,288.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 34,113,281.36	$ 7,144,608.64	$ 44,747,812.00
APORTE DE LA JUNTA	$ 1,000,000.00	$ -	$ 1,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 31,721,064.00	$ 199,674,031.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 44,907,231.00	$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 3,838,650.00	$ -	$ -	$ -
APORTE DE LA JUNTA	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 48,745,881.00	$ -	$ -	$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 48,745,881.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	43.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO INICIAL JAC VEREDA QUEBRADA HONDA



ESTADO INICIAL JAC VEREDA QUEBRADA HONDA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
PERIODO MES: 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 3381 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA BAJO PASUNCHA

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/D
FECHA DE REANUDACIÓN: N/D
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE AGOSTO 2023
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES 18 DÍAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200,312,049.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/D
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200,312,049.00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/D
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5083 DE 2023
INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	12
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.41
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	138.85
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	90.31
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	42.96
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4500.26
Construcción de Alcantarillas	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.5
	Excavaciones en roca en seco	M3	8.2
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.5
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9.6
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.9
	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25.4
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6
	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	0	0
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4.1	0
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	100.5	0
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	5.51	0
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6.1	0
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	1567	0
Construcción de Alcantarillas	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0	0
	Excavaciones en roca en seco	M3	0	0
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0	0
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	0	0
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0	0
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	0	0
	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 126,100,815.13	$ 23,959,154.87	$ 150,059,970.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3,840,101.37	$ 718,774.63	$ 4,501,799.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 34,112,887.31	$ 7,145,002.69	$ 44,750,280.00
APORTE DE LA JUNTA	$ 1,000,000.00	$ -	$ 1,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 31,822,932.00	$ 200,312,049.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 39,925,953.00	$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17,518,983.00	$ -	$ -	$ -
APORTE DE LA JUNTA	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 57,444,936.00	$ -	$ -	$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 57,444,936.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	25.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO INICIAL VIA JAC BAJO PASUNCHA



ESTADO INICIAL VIA JAC BAJO PASUNCHA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
PERIODO MES: 01 DEABRIL DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 3091 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAPIRA DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA CAPIRA

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE PRÓRROGA: 18/01/2024
PLAZO DE PRÓRROGA: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES Y 11 DÍAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 195,105,319.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/D
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 195,105,319.00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/D
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5083 DE 2023
INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	5
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	5
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6.12
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	159.89
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	102.56
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	48.76
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5137.26

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	0	0
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0	0
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	0	0
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	0	0
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	0	0
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 122,770,477.31	$ 23,326,390.69	$ 146,096,868.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3,859,084.29	$ 699,791.71	$ 4,382,906.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 34,292,466.85	$ 6,965,423.15	$ 43,625,545.00
APORTE DE LA JUNTA	$ 1,000,000.00	$ -	$ 1,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 30,991,606.00	$ 195,105,319.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 79,599,839.00	$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 11,473,095.00	$ -	$ -	$ -
APORTE DE LA JUNTA	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 91,072,934.00	$ -	$ -	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 91.072.934,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	**Foto 2**
ESTADO INICIAL JAC VEREDA CAPIRA	**ESTADO INICIAL JAC VEREDA CAPIRA**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
PERIODO MES: 01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 3096 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN RAFAEL

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE PRÓRROGA: 18/01/2024
PLAZO DE PRÓRROGA: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES Y 11 DÍAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 195,105,319.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/D
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 195,105,319.00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/D
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5083 DE 2023
INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	5
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	5
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6.12
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	159.89
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	102.56
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	48.76
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5137.26

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	0	0
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0	0
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	0	0
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	0	0
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	0	0
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 122,770,477.31	$ 23,326,390.69	$ 146,096,868.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3,859,084.29	$ 699,791.71	$ 4,382,906.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 34,292,466.85	$ 6,965,423.15	$ 43,625,545.00
APORTE DE LA JUNTA	$ 1,000,000.00	$ -	$ 1,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 30,991,606.00	$ 195,105,319.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 68,301,143.00	$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 8,053,573.00	$ -	$ -	$ -
APORTE DE LA JUNTA	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 76,354,716.00	$ -	$ -	$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 76,354,716.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.00%


EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO INICIAL VIA JAC VEREDA SAN RAFAEL



ESTADO INICIAL VIA JAC VEREDA SAN RAFAEL

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
PERIODO MES: 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 3241 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA FLORESTA

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/D
FECHA DE REANUDACIÓN: N/D
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE AGOSTO 2023
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES Y 19 DÍAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199,166,367.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/D
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199,166,367.00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/D
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5083 DE 2023
INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	12
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.30
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	138.01
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	95.70
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	42.15
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4440.40

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	0	0
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	1.4	0
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	20.1	0
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	13.5	0
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	9.5	0
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	1100	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 125,389,145.38	$ 23,823,937.62	$ 149,213,083.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3,844,157.95	$ 714,718.05	$ 4,476,392.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 34,156,537.50	$ 7,101,352.50	$ 44,476,892.00
APORTE DE LA JUNTA	$ 1,000,000.00	$ -	$ 1,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 31,640,008.00	$ 199,166,367.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 41,500,000.00	$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 11,679,322.00	$ -	$ -	$ -
APORTE DE LA JUNTA	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 53,179,322.00	$ -	$ -	$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 53,179,322.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	16%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO INICIAL JAC VEREDA LA FLORESTA



ESTADO INICIAL JAC VEREDA LA FLORESTA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
PERIODO MES: 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 3779 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAGUNA VERDE

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE PRÓRROGA: 18/01/2024
PLAZO DE PRÓRROGA: HASTA EL 31 DE agosto DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES Y 11 DÍAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198,947,680.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/D
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198,947,680.00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/D
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5083 DE 2023
INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	12
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.05
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	131.58
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	99.84
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	32.22
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4576.85

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	0	0
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0	0
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	0	0
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	0	0
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	0	0
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 125,276,432.77	$ 23,802,522.23	$ 149,078,955.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3,844,800.28	$ 714,075.72	$ 4,472,369.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 34,169,396.18	$ 7,088,493.82	$ 44,396,356.00
APORTE DE LA JUNTA	$ 1,000,000.00	$ -	$ 1,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 31,605,092.00	$ 198,947,680.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 41,500,000.00	$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -
APORTE DE LA JUNTA	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 43,500,000.00	$ -	$ -	$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 43,500,000.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO INICIAL JAC LAGUNA VERDE



ESTADO INICIAL JAC LAGUNA VERDE

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
PERIODO MES: 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 3793 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LOS RÍOS

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE PRÓRROGA: 19/01/2024
PLAZO DE PRÓRROGA: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES Y 5 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199,276,933.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/D
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199,276,933.00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/D
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5083 DE 2023
INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	12
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.20
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	134.64
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	93.79
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	41.31
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4344.21

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	0	0
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	2.5	2.5
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	131.58	131.58
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	25.6	25.6
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	19.8	19.8
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2439	2439

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 122,821,459.66	$ 23,336,077.34	$ 146,157,537.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3,858,793.70	$ 700,082.30	$ 4,384,726.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 33,636,388.07	$ 7,621,501.93	$ 47,734,670.00
APORTE DE LA JUNTA	$ 1,000,000.00	$ -	$ 1,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 31,657,662.00	$ 199,276,933.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 41,500,000.00	$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
APORTE DE LA JUNTA	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 41,500,000.00	$ -	$ -	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 41.500.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	23.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO INICIAL JAC REGION DE LOS RIOS



ESTADO INICIAL JAC REGION DE LOS RIOS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
PERIODO MES: 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 4612 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTE BELLO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA MONTE BELLO

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE PRÓRROGA: 18/01/2024
PLAZO DE PRÓRROGA: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES Y 4 DÍAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200,940,745.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/D
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200,940,745.00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/D
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5083 DE 2023
INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	12
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.31
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	139.51
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	106.18
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25.20
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5094.22

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Obras Menores de Drenaje	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	ha	0	0
Construcción Placa Huella	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0	0
	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	0	0
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	0	0
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	0	0
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 126,700,247.90	$ 24,073,047.10	$ 150,773,295.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3,836,684.56	$ 722,191.44	$ 4,523,199.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 34,129,816.31	$ 7,128,073.69	$ 44,644,251.00
APORTE DE LA JUNTA	$ 1,000,000.00	$ -	$ 1,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 31,923,312.00	$ 200,940,745.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 3,507,500.00	$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
APORTE DE LA JUNTA	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 3,507,500.00	$ -	$ -	$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	**Foto 2**
ESTADO INICIAL VIA JAC VEREDA MONTEBELLO	**ESTADO INICIAL VIA JAC VEREDA MONTEBLLO**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO DEL CLIMA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 3612 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE ALTO YASAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EN LA VEREDA ALTO YASAL MUNICIPIO DE PACHO EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 8053 de 2023

INTERVENTOR: DATUM X SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	16	17	10	17	22	23	24	24	24	17	20	24	24	24	24	24	22	24	24	21	24	23	24	22	20	21	24	24	24	679
Lluvias moderadas	0	0	5	6	9	6	2	1	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	0	2	4	3	0	0	0	54
Lluvias intensas	0	0	3	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 3478 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 8053 de 2023

INTERVENTOR: DATUM X SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	16	17	10	17	22	23	24	24	24	17	20	24	24	24	24	24	22	24	24	21	24	23	24	22	16	18	24	24	24	672
Lluvias moderadas	0	0	5	6	9	6	2	1	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	0	2	8	6	0	0	0	61
Lluvias intensas	0	0	3	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 3381 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA BAJO PASUNCHA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24

PROYECTO: COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 8053 de 2023

INTERVENTOR: DATUM X SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	16	17	10	17	22	23	24	24	24	17	20	24	24	24	24	24	22	24	24	21	24	23	24	22	17	22	24	24	24	677
Lluvias moderadas	0	0	5	6	9	6	2	1	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	0	2	7	2	0	0	0	56
Lluvias intensas	0	0	3	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 3091 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA CAPIRA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAPIRA DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 8053 de 2023

INTERVENTOR: DATUM X SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	24	24	19	20	23	16	24	24	24	24	24	24	19	24	24	24	24	24	24	19	24	24	24	24	21	24	22	24	24	24	709
Lluvias moderadas	0	0	0	4	0	1	7	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	27
Lluvias intensas	2	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 3096 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN RAFAEL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 8053 de 2023 **INTERVENTOR:** DATUM X SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	24	24	19	20	23	16	24	24	24	24	24	24	19	24	24	24	24	24	24	19	24	24	24	24	21	24	22	24	24	24	709
Lluvias moderadas	0	0	0	4	0	1	7	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	27
Lluvias intensas	2	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 3241 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA FLORESTA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 8053 de 2023 **INTERVENTOR:** DATUM X SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	21	24	24	24	24	19	24	24	24	24	24	19	24	24	24	24	24	11	24	24	24	24	21	24	24	24	18	24	24	709
Lluvias moderadas	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	30
Lluvias intensas	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 3779 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAGUNA VERDE

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 8053 de 2023 **INTERVENTOR:** DATUM X SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	21	24	24	24	24	19	24	24	24	24	24	19	24	24	24	24	24	11	24	24	24	24	21	24	24	24	18	24	24	709
Lluvias moderadas	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	30
Lluvias intensas	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 3793 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LOS RÍOS

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 8053 de 2023 **INTERVENTOR:** DATUM X SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	21	24	24	24	24	19	24	24	24	24	24	19	24	24	24	24	24	11	24	24	24	24	21	24	24	24	18	24	24	709
Lluvias moderadas	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	30
Lluvias intensas	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 4612 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA MONTE BELLO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTE BELLO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 8053 de 2023 **INTERVENTOR:** DATUM X SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	16	17	10	17	22	23	24	24	24	17	20	24	24	24	24	24	22	24	24	21	24	23	24	22	18	22	24	24	24	678
Lluvias moderadas	0	0	5	6	9	6	2	1	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	0	2	6	2	0	0	0	55
Lluvias intensas	0	0	3	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 4567 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA MATA DE RAMO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MATA DE RAMO DEL MUNICIPIO TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 8053 de 2023 **INTERVENTOR:** DATUM X SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	16	17	10	17	22	23	24	24	24	17	20	24	24	24	24	24	22	24	24	21	24	23	24	22	18	22	24	24	24	678
Lluvias moderadas	0	0	5	6	9	6	2	1	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	0	2	6	2	0	0	0	55
Lluvias intensas	0	0	3	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-24

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 3478 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 8053 de 2023 **INTERVENTORÍA:** DATUM X SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Mezcladora	FORTE	1 bulto y medio	QUEBRADA HONDA													A4		A7				A6			A5	A5	A6	A6	A6	A3		A5	A5	
MOTO NIVELADORA																																	
MINICARGADOR																																	
VIBROCOMPACTADOR																																	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):


OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: Álvaro Julián Perez Otalora
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-335503 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CUNDINAMARCA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-24

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EN LA VEREDA ALTO YASAL MUNICIPIO DE PACHO EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 3612 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE ALTO YASAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 8053 de 2023 **INTERVENTORÍA:** DATUM X SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Mezcladora	IMPERIAL	1 bulto	ALTO YASAL	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR																																		
MINICARGADOR																																		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**


REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):NO SE A EMPEZADO A FUNDIR PORQUE NO HAN HECHO EL REPLANTEO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: Álvaro Julián Perez Otalora
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-335503 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-24

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 3381 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA BAJO PASUNCHA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 8053 de 2023 **INTERVENTORÍA:** DATUM X SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Mezcladora	FORTE	1 bulto Y MEDIO	BAJO PASUNCHA																			A6				A5	A6		A2					A6
MOTO NIVELADORA																		A3																
VIBROCOMPACTADOR																		A3																
MINI CARGADOR																		A3																
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Álvaro Julián Perez Otalora
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-335503 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-24

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MATA DE RAMO DEL MUNICIPIO TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4567 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA MATA DE RAMO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 8053 de 2023 **INTERVENTORÍA:** DATUM X SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Mezcladora	IMPERIAL	1 bulto	MATA DE RAMO																								A5	A4	A7	A4			A7	A5
MOTO NIVELADORA																							A3	A2										
MINI CARGADOR																							A3	A2										
VIBROCOMPACTADOR																							A3	A2										
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Álvaro Julián Perez Otalora
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-335503 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

5. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

5.1 Información general del contrato de Interventoría.

CONTRATISTA	DATUM X S.A.S.
CONTRATO DE OBRA NO.	5083 de 2023
OBJETO	“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"
PROCESO DE SELECCION	CMA-DEO-SVR-159-2023
ID SECOP II	CO1.PCCNTR.5686190
UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($347.035.899)
FECHA ORDEN DE INICIO	13 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN No.1	30 DE DICIEMBRE DE 2023 (HASTA EL 23 DE ENERO DE 2024)
PRORROGA No.1	24 DE ENERO DE 2024 (DOS MESES)
PRORROGA No.2	30 DE ABRIL DE 2024 (TRES MESES Y 6 DIAS)
PRORROGA No.3	30 DE JUNIO DE 2024 (DOS MESES)
PRORROGA No.3	31 DE AGOSTO DE 2024 (DOS MESES)
FECHA DE TERMINACION	31 DE AGOSTO DE 2024

5.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

- Prórroga No. 4 del contrato de interventoría.
- Seguimiento de Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.
- Manejo conjunto de cuentas bancarias para el manejo de desembolso para convenio y cambio de firmas
- Solicitud de hojas de vida de residente y contador
- El día 30 de enero de 2024 se asiste a reunión general en las instalaciones del INVIAS.

5.5. Informe matriz de riesgos.

No.	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Controles a ser implementados	Persona responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
				CONTRATISTA	INVIAS					Actividades de seguimiento al tratamiento y control por parte de la interventoría	Mejoras propuestas por la interventoría a los tratamientos y controles definidos
1	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	**Precios Por debajo del Presupuesto Oficial** (por debajo del presupuesto oficial, o por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Impacto económico al Contratista	**PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**		Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Ejecución del contrato	Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Análisis del impacto económico, verificación de precio de los insumos en el mercado
2	Riesgo	**Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de**	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	**PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**	**INVIAS**	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual	Si el insumo es materia prim	Gestores y/o Supervisores, Interventor,	Ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación	Verificación de proveedores

		las obras objeto del contrato.					a básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna.	Contratista		en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	
3	Riesgo Económico	**Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato** en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con el INVIAS. Riesgo que asume INVIAS hasta en los ajustes estipulados contractualmente.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	**PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**	**INVIAS**	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Realización de Cotizaciones y seguimiento al cambio de los precios.
4	Riesgo Económico	**Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra**.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto.	**PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**		Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Ejecución del contrato	Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Verificación de proveedores

5	Riesgo Operacional - Social	**Cambio en la ubicación de las obras menores.** Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales.	Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto.		**INVIAS**	Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento de este.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Análisis técnico de las necesidades de la obra, seguimiento en obra por parte de la interventoría.
6	Riesgo Sociales o Políticos	**Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes).	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.		**INVIAS**	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de INVIAS, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
7	Riesgo Operacional	**Accidentalidad:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	**PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**		El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Exigir el cumplimiento de PMT propuesto. Exigir personal idóneo. Exigir capacitaciones en las que se enmarque las acciones necesarias a desarrollar en un eventual accidente.

		operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.									
8	Riesgo Operacional	**Por Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista:** Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra.	**PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**		Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	al final de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto.	El contrato en cuestión no contiene Estudios y Diseño, se plantea realizar obras con inspecciones visuales, por lo que es necesario exponer la necesidad de realización de Estudios y Diseños simultáneamente se realiza la atención del punto.
9	Riesgo Operacional	**Por Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios requeridos:** Actividad requerida para la correcta ejecución y operación de las obras.	Necesidad de realizar estudios y/o intervenciones	**PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**		Verificar propuesta adecuada por el proponente y realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	al final de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista	El contrato en cuestión no contiene Estudios y Diseño, se plantea realizar obras con inspecciones visuales, por lo que es necesario exponer la necesidad de realización de Estudios y Diseños simultáneamente se realiza la atención del punto.

10	Riesgo Operacional	**Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o** por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	**PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**		Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Alertar oportunamente a el contratista, los aspectos técnicos deficientes para su correcta ejecución.
11	Riesgo Operacional	**Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:** Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. INVIAS asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	**AMBOS**		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	La entidad no otorgo Planos de las obras a ejecutar, desarrollo un planteamiento por inspección visual y plasmo obras que deben ser verificadas por los especialistas del proyecto
14	Riesgo Operacional	**Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la	Impacto económico al Contratista	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales para el proyecto. En la fase contractual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. informes de interventoría.	Verificación el PAGA, requerimientos ambientales necesarios para que las fuentes de materiales sean usados en obra

		presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.									
15	Riesgo de la Naturaleza	**Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El r**iesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA asumirá los riesgos geológicos, geotécnico e hidrogeológicos identificados, y los que debió identificar en el ajuste y/o elaboración de estudios y diseños y los que se presenten durante la ejecución del contrato. El INVIAS asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias,	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra, y eventuales mayores plazos	**AMBOS**		Monitoreo del corredor vial por parte de Especialistas en Geotecnia para recomendar medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial; recomendación de especialistas para solución definitiva, provisional o de mitigación, análisis e implementación. En todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar, en cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere necesario.	En emergencias de gran magnitud puede afectarse la ejecución del contrato.	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación del INVIAS, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	El contrato contiene Atención a Sitios Críticos PR 14+950, para lo cual la interventoría velara por la atención pronta por parte del contratista. Conceptos Tecnicos por parte de los especialistas.

		siempre y cuando no sean de responsabilidad del Contratista.									
16	Riesgo Operacional	**Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes:** Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL INVIAS asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	**AMBOS**		Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	cuando se solucione la interferencia de las redes de servicio público existentes	Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos.	Cuando se presenta la interferencia, seguimiento semanal.
17	Riesgo Financiero	**Riesgo Financiero:** Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones	Impacto económico al Contratista	**PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**		Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	NO	Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual

		encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.									
18	Riesgo Regulatorio	**Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	**INVIAS**		Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual
19	Riesgo Ambiental	**Gestión Ambiental:** Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios.	Retraso en la Ejecución de los trabajos	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		Seguimiento por parte del Interventora la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales	Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por parte de Especialista Ambiental del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión ambiental, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal

20	Riesgo Ambiental	**Pasivos Ambientales:** Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección del Medio Ambiente. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría. Seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal
21	Riesgo Ambiental	**Ambiental:** Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales.	Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes.	**PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**		Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al contratista. Verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	SI	Contratista - Interventoría	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Verificación del Cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e Informes de los Especialistas Ambientales del Proyecto. Informes de Interventoría Ambiental. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual

22	Riesgo Social	**Social**: Riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el Contratista que estén en cabeza de éste.	Inconformidad de la comunidad en proceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra.	**PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**		Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior.	semanal mientras se resuelve la consulta previa
23	Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor asegurable**. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de INVIAS.	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	**PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**		Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.	SI	Contratista	Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones.	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia
24	Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor no asegurable.** Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación o del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	**INVIAS**		Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendientes a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las	SI	Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.

						modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con Invias el tratamiento contractual al proyecto					
25	Riesgos de la Salud	**Presencia de Riesgos Biológicos.** Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	Contratista		La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	SI	contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor Invias	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
26	Riesgos de la Salud	**Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal.** Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de las Obras, Interventoría y demás los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos	Contratista		El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	SI	contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor Invias	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario

7. Conclusiones y recomendaciones

- Se inicia la construcción de las obras en los 10 diez convenios.
- Las juntas se encuentran en el proceso de construcción de placas huellas
- Se realiza el seguimiento en obra de las actividades en obra junto a inspectores y residente de interventoría
- Se realizan los diferentes ensayos de materiales y de concretos pertinentes

ANEXOS DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5083 de 2023 **INTERVENTOR:** DATUM X S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"LOTE 1"

FECHA DE INICIO: 29/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 347,035,899.00

VALOR ACUMULADO: $ - (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10%	$ 34,703,590.00	28/12/2023	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17%	$ 58,325,362.00	28/12/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 69,407,180.00	28/12/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	30%	$ 104,110,770.00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 55-44-101079764

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 34,703,590.00	28/12/2023	24/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17%	$ 58,325,362.00	28/12/2023	24/07/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 69,407,180.00	28/12/2023	24/01/2027
Calidad del servicio	30%	$ 104,110,770.00	31/12/2023	24/01/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 55-44-101079764

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PEREIRA	**PEREIRA**	**55**	**55-44-101079764**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**12**	**2023**	**28**	**12**	**2023**	**00:00**	**31**	**12**	**2028**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DATUM X S.A.S.	**NIT: 901.544.149-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 1 NRO. 42 - 200 VDA LA FLORIDA URB NATTURA C56	MANIZALES, CALDAS	6063440166

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 5083 DE 2023, RELATIVO A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LAPAZ TOTAL LOTE 1 .

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE BUENA MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
LA VIGENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/12/2023	30/06/2024	$34,703,590.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	28/12/2023	30/06/2024	$58,325,362.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/12/2023	31/12/2026	$69,407,180.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	31/12/2028	$104,110,770.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,900,050.00	$ ******20,000.00	$ *****554,809.00	$ *********3,474,860.00	$ ******266,546,902.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JOHN JAIRO LONDOÑO RIVERA	81800	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

55-44-101079764

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PEREIRA	**PEREIRA**	**55**	**55-44-101079764**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	**01**	**2024**	**28**	**12**	**2023**	**00:00**	**24**	**01**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DATUM X S.A.S.		**NIT: 901.544.149-1**
DIRECCIÓN: CR 1 NRO. 42 - 200 VDA LA FLORIDA URB NATTURA C56	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TELÉFONO:	6063440166

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 5083 DE 2023, RELATIVO A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LAPAZ TOTAL LOTE 1 .

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE BUENA MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
LA VIGENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**28/12/2023**	**24/07/2024**	**$34,703,590.00**	**$34,703,590.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**28/12/2023**	**24/07/2024**	**$58,325,362.00**	**$58,325,362.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**28/12/2023**	**24/01/2027**	**$69,407,180.00**	**$69,407,180.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2023**	**24/01/2029**	**$104,110,770.00**	**$104,110,770.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No 1 FECHADA EL 30/12/2023 Y ACTA DE REINICIO FECHADA EL 23/01/2024 AL CONTRATO N 5083/2023, SE AMPLIA LA EJECUCION CONTRACTUAL DEL MISMO HASTA EL 24/01/2024, SEGUN SE REGISTRA.

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS CON EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******266,546,902.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JOHN JAIRO LONDOÑO RIVERA	81800	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

55-44-101079764

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PEREIRA	PEREIRA	55	55-44-101079764	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	01	2024	28	12	2023	00:00	24	01	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DATUM X S.A.S.		**NIT: 901.544.149-1**
DIRECCIÓN: CR 1 NRO. 42 - 200 VDA LA FLORIDA URB NATTURA C56	**CIUDAD:** MANIZALES, CALDAS	**TELÉFONO:**	6063440166

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

55-44-101079764

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
