


INFORME MENSUAL No.02	CONTRATO No. 5087 de 2023 Versión 1	23/01/2024 AL 31/01/2024
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		

Distribución de copias:

No. de Copia	Destinatario de la Copia
1	INVIAS – TERRITORIAL CUNDINAMARCA
2	INVIAS – CENTRAL BOGOTÁ

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Ing. Donal Bogotá Bautista	Ing. Donal Bogotá Bautista	Ing. Donal Bogotá Bautista

INFORME MENSUAL N° 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 5087 DE 2023

“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2".".

SEGUIMIENTO A LOS COVENIOS:

3823 del 2023, 3503 del 2023, 3389 del 2023, 3084 del 2023, 3895 del 2023, 3776 del 2023, 3722 del 2023, 3476 del 2023, 3095 del 2023.

ENERO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

MUNICIPIO DE LENGUZAQUE

1. INTRODUCCIÓN 4

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4

3. PROYECTOS AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 5

4. Alcance 7

5. Localizaciones 9

6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO *10*

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL INTERVENTOR *11*

8. CORRESPONDENCIA 12

71. ANEXOS 13

1. INTRODUCCIÓN

El contrato de interventoría número 5087 de 2023 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2".".

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 23 de enero del 2024 al 31 de enero del 2024, en el que se describen las actividades desarrolladas tanto por el Contratista como por la Interventoría en los aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales, seguridad y salud, calidad y financieros.

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades y organizaciones

tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

Así el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales de las veredas:Fiantoque Chirvaneque del Municipio de Lenguazaque.Hato de Rojas del Municipio de Cucunuba.Peñas del Boqueron del Municipio de Sutatausa, Sector Camacho del Municipio de Nemocon, La popa del Municipio de Beltran, Calandaima del Municipio de Anolaima, El Volcan del Municipio de Bituima, Resguardo del Municipio de Guayabal de Siquima, Los Alpes del Municipio de Alban del Departamento de Cundinamarca, cuyos objetos buscan “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”; para lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar el contrato de interventoría número 5087 de 2023 que realizará las labores de interventoría.

Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de la interventoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma.

Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de la interventoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de una Propuesta Técnica.

3. PROYECTOS AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA

El proyecto de las obras al cual se le realizará interventoría corresponde a las derivadas de los convenios solidarios suscritos, cuyo fin corresponde al “MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” los cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

A continuación, se presentan los datos de los convenios, de los cuales se derivan las obras a realizar interventoría:

-AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FIANTOQUE CHIRVANEQUE DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

-AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE HATO DE ROSAS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

-AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE PEÑAS DEL BOQUERON DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

-AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE SECTOR CAMACHO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

-AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE BELTRAN, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

-AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC DE LA VEREDA DE CALANDAIMA DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

-AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC DE LA VEREDA EL VOLCAN DEL MUNICIPIO DE BITUIMA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

-AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC DE LA VEREDA RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

4. Alcance

En el desarrollo de las obras se consideran el control de los recursos disponibles de los convenios donde se pretende atender las vías rurales con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantarán las obras prioritarias de mejoramiento y mantenimiento, descritas de la siguiente manera:

a) Localización, replanteo y topografía de las obras.

b) Replanteo y perfilamiento de las vías.

c) Construcción de sistemas de drenaje (Alcantarillas, cunetas, filtros, Box Culvert (entre otros) Pavimentos Convencionales

d) Mejoramiento de los corredores viales con la construcción de Placa Huella. Construcción de Filtros y/o cunetas

e) Construcción de sistemas de contención, tales como Muros en Concreto o Gavión. Tecnologías Alternativas

f) Mejoramiento de la subrasante con adición de material

g) Señalización vertical y horizontal del corredor intervenido.

h) Mantenimiento Períodico y/o Rutinario.

i) Revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños basados en la Cartilla de obras menores y estructuras viales vigente del INSTITUTO.

j) Y las demás que pudiesen resultar y que fuesen requeridas durante la vigencia de los convenios a realizar interventoría.


En la tabla No. 1 se podrá encontrar las actividades por organismo de acción comunal estimadas dentro de su alcance:

ORGANISMO DE ACCION COMUNAL	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA (ml)	ROSERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLA (und)	BOX (und)	GAVIONES (und)	MUNICIPIO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FIANTOQUE CHIRVANEQUE	12	12	100	2	0	0	LENGUAZAUE
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO DE ROJAS	12	12	16	1	0	0	CUCUNUBA
JUNTA ACCION COMUNAL PEÑAS DEL BOQUERON	12	12	165	1	0	0	SUTATAUSA
JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR CAMACHO	5	5	190	0	0	0	NEMOCON
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA POPA	5	5	190	0	0	0	BELTRAN
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CALANDAIMA	12	12	153	1	0	0	ANOLAIMA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCAN	12	12	148	1	0	0	BITUIMA
JUNTA ACCION COMUNAL RESGUARDO	12	12	171	0	0	0	GUAYABAL DE SIQUIMA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ALPES	5	5	90	4	0	0	ALBAN

Igualmente, el alcance de los proyectos consiste en realizar la revisión, ajuste, actualización, modificación, complementación y/o implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

5. Localizaciones

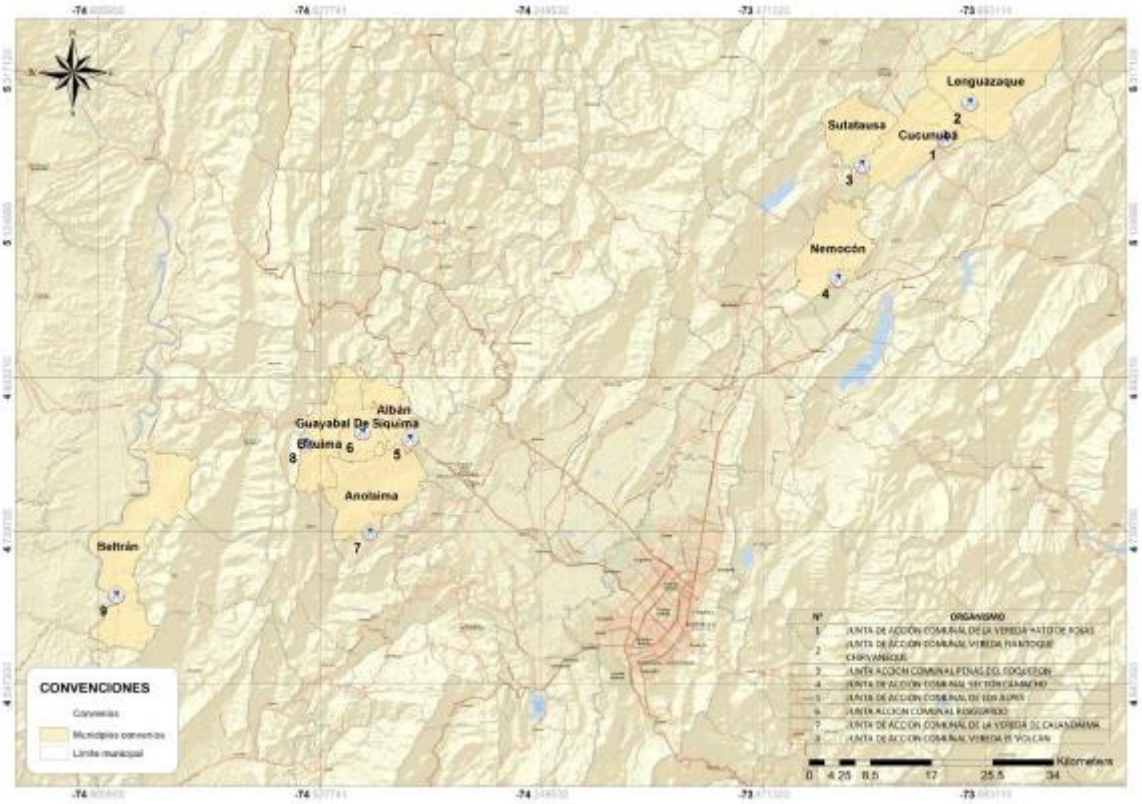

El proyecto objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Lenguazaque, Cucunuba, Sutatausa, Nemocon, Beltran, Anolaima, Bituima, Guayabal de Siquima, Alban en el departamento de Cundinamarca, cuyas coordenadas aproximadas de localización se encuentran anexas en la tabla 2.

MUNICIPIO	NOMBRE DE LA VEREDA	JAC	Longitud	Latitud
CUCUNUBÁ	HATO DE ROJAS	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HATO DE ROJAS	-73,74360943	5,231351205
LENGUAZAQUE	FIANTOQUE	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FIANTOQUE CHIRVANEQUE	-73,71265477	5,277423816
TAUSA	RASGATA ALTO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RASGATA ALTO	-73,87554833	5,189183333
SUTATAUSA	PEÑAS DE BOQUERON	JUNTA ACCION COMUNAL PEÑAS DEL BOQUERON	-73,847975	5,199831667
NEMOCÓN	ASTORGA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SECTOR CAMACHO	-73,8775156	5,05719053
GUAYABAL DE SÍQUIMA	RESGUARDO	JUNTA ACCION COMUNAL RESGUARDO	-74,47527964	4,86350949
ANOLAIMA	CALANDAIMA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CALANDAIMA	-74,4658908	4,73794897
BITUIMA	VOLCAN	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCAN	-74,54643234	4,85051833
BELTRÁN	LA POPA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA POPA	-74,78360613	4,659581507

6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Interventoría:	DBB INGENIERIA S.A.S
NIT:	901.564.916-1
Representante legal:	DONAL BOGOTA BAUTISTA C.C. 79.557.205
Dirección:	Calle 98 No.70-91 oficina 1012 Bogotá
Teléfono:	7435910 - 3184634459
Proceso de selección:	CMA-DEO-SVR-159-2023
Contrato No:	5087 DE 2023.
Fecha de suscripción:	26 de diciembre de 2023
Valor contrato inicial:	$ 319.783.709,00
Anticipo:	(Se renuncia al anticipo)
Objeto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2"
Plazo Inicial:	hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Iniciación:	30 de diciembre de 2023.
Fecha de Suspensión 1:	30 de diciembre de 2023.
Plazo de prorroga 1:	dos (2) meses.
Fecha de Terminación Final:	24 de marzo de 2024.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL INTERVENTOR

- Elaboración de informe semanal y mensual de la obra.
- Asistir a las reuniones iniciales convocadas por INVIAS en donde se establecieron las estrategias para dar un correcto cumplimiento a la ejecución del contrato
- Revisar toda la documentación pertinente a los convenios asignados al contrato de interventoría
- Informar a los representantes de cada junta de acción comunal el inicio de la interventoría y convocar una revisión en campo
- Informar a la Entidad los incumplimientos de las O.A.C frente a sus obligaciones contractuales.
- Realizar diferentes oficios dirigidos a la junta de acción comunal, con el fin de solicitar información inicial de la etapa 1 de la ejecución del convenio
- Realizar acompañamiento a los presidentes de junta para realizar el trámite de consulta en la ARL para identificar los documentos faltantes para iniciar las afiliaciones
- Se llevó a cabo reunión inicial, el día 30 de enero de 2024 junto con el supervisor del contrato de interventoría para definir las mejores estrategias de ejecución de los convenios del programa caminos comunitarios para la paz total, se participó en la capacitación de nuevas tecnologías de uso de fibras.

8. CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA
CONTRATO No. 5087 de 2023
"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2

FECHA	CONSECUTIVO COMUNICADO / CORREO	DESTINATARIO ENTIDAD / MUNICIPIO	ASUNTO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA SI/NO	FECHA Y NUMERO DE RADICADO DE LA RESPUESTA
22/01/2024	DBB-CUND-021-002-2024	INVIAS	Remisión pólizas actualizadas de acuerdo con la orden de inicio y acta de suspensión No. 01	2024E-VUVRAZ-005335	22/01/2024 10:11	NO	
23/01/2024	DBB-CUND-022-003-2024	INVIAS	Solicitud Prórroga No. 1 del Contrato de interventoría No. 5087 DE 2023	2024E-VUVRAZ-020265	5/03/2024 11:37	NO	
25/01/2024	DBB-CUND-023-004-2024	INVIAS	Remisión hoja de vida ingeniero residente de interventoría	2024E-VUVRAZ-006664	25/01/2024 13:09	NO	
29/01/2024	DBB-CUND-024-005-2024	INVIAS	Remisión pólizas actualizadas de acuerdo con la Prórroga No. 1	2024E-VUVRAZ-007460	29/01/2024 10:08	NO	

71. ANEXOS

ANEXO No.1

FORMATO MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN

CARGAS MOD SEMANAL

E-mail: interventoriasdonalb@gmail.com

ANEXO No.2

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG

GARANTIAS INT

ANEXO No.3

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7A.

PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	23/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

PLAN DE CARGAS INICIAL ■ **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ■ **No.** ___
(Es a numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al área de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ■

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5087 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2

INTERVENTOR:
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CERPEDA OCAMPO
RESOLUCIÓN No.: ___ DE ___ (Fecha de resolución)

CONTRATO DE OBRA No.: ___ CONTRATISTA: ___

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 319.783.709,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 319.783.709,00

PLAZO ACUMULADO: ___ (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: ___ (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: ___ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ ___

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / ORCIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha _____ | | AÑO | | | |

ANEXO No.2

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG

GARANTIAS INT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5087 DE 2023 **INTERVENTOR:** DBB INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/01/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 319,783,709.00

VALOR ACUMULADO: $ 319,783,709.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 31,978,371	26	12	2023	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 63,956,742	26	12	2023	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 63,956,742	26	12	2023	1	1	2027
Calidad del servicio	30%	$ 95,935,113	1	1	2024	1	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433483

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/01/2024
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 31,978,371	30	12	2023	24	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 63,956,742	30	12	2023	24	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 63,956,742	30	12	2023	24	1	2027
Calidad del servicio	30%	$ 95,935,113	5	1	2024	5	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433483

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma
Nombre: DONAL BOGOTA BAUTISTA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-57650 CND

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO No.3

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7A.

PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5087 DE 2023 **INTERVENTOR:** DBB INGENIERÍA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-24 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO 3084-2023; 3389-2023; 3503-2023;3776-2023;3823-2023;3095-2023;3722-2023; 3895-2023 Y 3476-2023. **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO DE ROJAS; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FIANTOQUE CHIRVANEQUE; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LOS ALPES; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PEÑAS DEL BOQUERON; JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR CAMACHO; JUNTA DE ACCION COMUNAL RESGUARDO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CALANDAIMA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCÁN; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA POPA.

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Donal Bogota Batusita	79557205	Director residente interventoria	$ 7,200,000																						x	x	x	x	x	x	x	x	50%	DBB INGENIERIA SAS	$ 3,600,000.00	$ 417,600	5	Suramericana de servicios de salud	7914539689	$ 750,000	Colpensiones	7914539689	$ 960,000	$ 36,000			
