

CONTRATO 4804 DEL 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



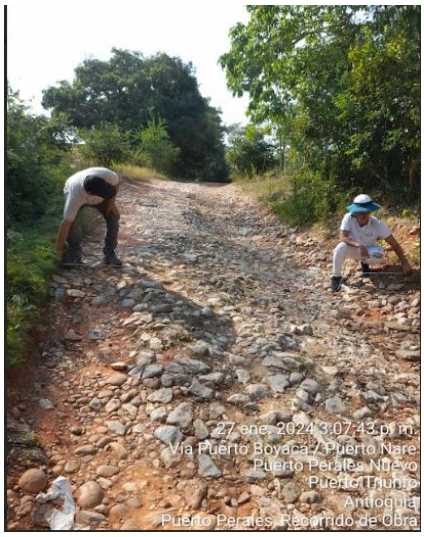

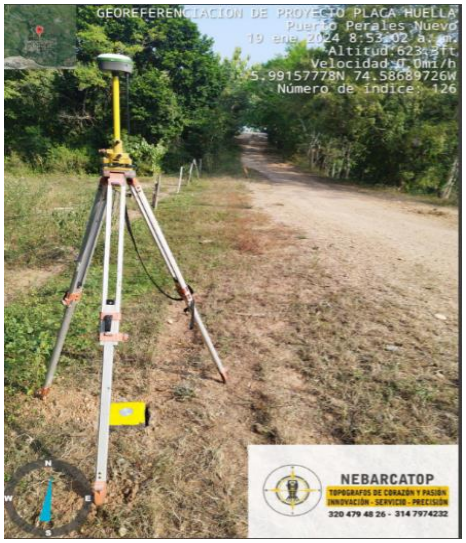

INFORME MENSUAL No. 2

ENERO DEL 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

INFORME MENSUAL NO. _____ **MES O PERIODO:** _____

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**				
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**				
2.1	Localización				
2.2	Inventario y estado inicial de la vía				
2.3	Características técnicas del proyecto				
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				
3.1	Información general del contrato				
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				
3.3	Seguimiento Ítems no previstos				
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría				
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3			
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4			
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6			
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8			
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10			
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11			
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12			
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14			
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15			
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17			
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1 MINFRA-MN-IN-2-FR-2			
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1 MINFRA-MN-IN-6-FR-2			
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1			
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2			
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2			
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato				
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor				
5.3	Informes especialistas				
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				
5.5	Información otros programas y aplicativos				
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5			
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7			
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9			
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13			
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16			
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18			
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1 MINFRA-MN-IN-3-FR-2			
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**				
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo				
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras				
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales				

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

_____

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTROL DE APROBACIÓN

Nombre del documento:		Informe Mensual de interventoría No 2
Código del documento:		
Versión:	**1**	

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			
Actividad	**Fecha**	**Nombre del ejecutor**	**Firma**
Elaboración	31/01/2024	Gabriel Vesga	
Revisión	31/01/2024	Jesús Orlando Vivas	
Verificación			
Aprobación			

DISTRIBUCIÓN		
Persona a quien se envía	**Cargo**	**Organización**
Mauricio Hoyos	Supervisor	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	**Fecha**	**Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior**
1	31/01/2024	Correcciones por parte de supervisor de invias
2		

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
2.1 LOCALIZACIÓN 8
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 10
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 10
3.1.1 Información contractual 10
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 11
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 11
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato 12
3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra. 12
3.4.3 Estado de pólizas 12
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 13
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 13
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 20
4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 20
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 20
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 20
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 20
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 20
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 22
5.1.1 Aspectos legales del contrato 22
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 23
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 24

6.1 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 24

6.2 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 25

6.3 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 26

6.4 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 28

6.5 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 28

6.5.1 Seguimiento a la inversión del anticipo 28

8. ANEXOS 28

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato 10
Tabla 2. Póliza de cumplimiento 12
Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual 13
Tabla 4. Aspectos legales del contrato de interventoría 31
Tabla 5. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría 32
Tabla 6. Personal Activo de la Interventoría. 34
Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida 37
Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada 44

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto 8

LISTA DE ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 37
Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras 58

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 1-31 de enero de 2024, para el proyecto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

Las actividades corresponden principalmente a labores de seguimiento, control y verificación a los trabajos correspondientes al convenio No. 3317 de 2023 en proceso de revisión y aprobación de documentos, cuyo objeto es: "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."(código BPIN No. 202300000000001)"** El seguimiento a la ejecución del proyecto se ha realizado periódicamente a través de reuniones y recorridos en conjunto con la JAC de las veredas de Puerto Perales, Director territorial y supervisor de INVIAS, a diario con Ingenieros Directores, Residentes e Interventoría para dar cumplimiento a lo estipulado en el pliego de condiciones y anexo técnico del Contrato 4804 de 2023 y en las Especificaciones Técnicas de INVIAS.

El presente informe se remite a INVÍAS, a la Dirección Territorial de Medellín, al despacho del Supervisor del Contrato de interventoría N° 4804-2023, Ingeniero Mauricio Hoyos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN



Ilustración 4. Localización de vía a intervenir en Corregimiento Puerto Perales.

Imagen 1. Localización del proyecto

El área del proyecto se encuentra ubicada en el departamento de Antioquia, municipio de Puerto Triunfo, en la vereda de Puerto Perales. Con este proyecto se pretende cumplir las especificaciones de vía secundaria; es decir, realizar el mejoramiento de suelo, aumentar el ancho de la vía y disminuir la presencia de curvas sucesivas.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Las vías de Puerto Perales, se encuentran en mal estado debido a la falta de intervención y debido al tráfico constante de vehículos de carga pesada hacia los sectores de producción agrícola y minera que se encuentran en la zona, además de extender los tiempos de viaje y aumentar los costos de carga.





2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Alcance del proyecto será el mejoramiento con la pavimentación de 111 metros en Puerto perales en el tramo comprendido entre el K0+000 al K0+111 respectivamente. Estas vías internas se encuentran en muy mal estado debido a la poca intervención por parte de los entes territoriales, las precipitaciones que a su vez dificultan el tráfico y aumentan los costos de operación y aumento en el recorrido de las mismas.

El departamento Antioquia realiza inversiones en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras, pero en muchos de los casos se terminan atendiendo situaciones de emergencia por lo limitado de los recursos.

De acuerdo con lo indicado en los pliegos de condiciones, el objeto de esta intervención es efectuar obras de mejoramiento de vía terciaria en la vereda de Puerto perales y las obras complementarias que garanticen la estabilidad de la vía, según los estudios y diseños aprobados por el INVIAS y de acuerdo con la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales de INVIAS.

De igual manera se contempla la ejecución de actividades ambientales del programa de adaptación de la guía de manejo ambiental (PAGA), orientados a evitar, prevenir, corregir y mitigar o compensar los impactos generados en desarrollo del proceso de mejoramiento de la vía mencionada en el objeto del contrato 4804 de 2023.

3. INFORMACIÓN CONVENIO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

3.1.1 Información contractual

Tabla 1. Información general del convenio

CONVENIO No. - FECHA	3317 del 13 de septiembre de 2023
TIPO DE CONVENIO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Dirección territorial INVIAS
CONTRATISTA	JAC PUERTO PERALES, MPIO PTO TRIUNFO
C.C. o N.I.T.	811017456-1
REPRESENTANTE LEGAL	Edgar Álvaro Macias Quintana
C.C. o N.I.T	7.252.077
OBJETO DEL CONVENIO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."(código BPIN No. 202300000000001)"
VALOR DEL CONVENIO	$201.333.957.00
PLAZO O DURACIÓN	Tres (3) meses.
PLAZO ADICIONAL DE DURACIÓN	De acuerdo con el Adicional No. 01: "Modificar el plazo de ejecución tres (03) meses más".
LUGAR DE EJECUCIÓN	PUERTO TRIUNFO – PUERTO PERALES
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	MAURICIO HOYOS. Director territorial INVIAS Antioquia.
INTERVENTOR (Externo)	Interventor Externo Jesús Orlando Vivas Noguera del INVIAS, Contrato de Interventoría No. 4804 de 2023
FECHA ACTA DE INICIO	12/12/2023
FECHA DE SUSCRIPCION	13/09/2023
FECHA DE INICIO	12/12/2023
FECHA DE TERMINACION	30/04/2024

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo correspondiente del 1-31 de enero de 2024 de ejecución del contrato 4804 de 2023. El Contratista JAC Puerto perales, realizó las siguientes actividades.

- Se realiza el envío de hojas de vida de los profesionales civil y topógrafo.
- Se empieza el envío de documentos, proveedores para etapa de revisión y aprobación de interventoría.

Se adelantarán las siguientes actividades técnicas:

- ➔ Se realizan recorridos periódicos por el corredor vial a intervenir y toma de registro fotográfico.
- ➔ Durante este periodo se ejecutaron actividades como localización y replanteo de los tramos de vía a intervenir, instalación de mojones para la estación.





3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato

A la fecha no se han presentado modificaciones de cantidades.

3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra.

A la fecha no se han presentado actas de recibo parcial.

3.4.3 Estado de pólizas

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presentó la póliza de cumplimiento No 100284287, con respecto a la fecha de inicio, expedida por la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS S.A. A continuación, se relacionan los amparos actualizados de esta póliza, la interventoría hace la respectiva revisión y aprobación de esas pólizas presentadas.

Tabla 2. Póliza de cumplimiento

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.266.791,40	13/09/2023	1/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.066.697,85	13/09/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.400.187,10	30/04/2024	30/04/2029

De igual manera y de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presento la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.100069231, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, y aprobada por la gobernación de norte de Santander. A continuación, se relaciona el amparo inicial de esta póliza.

Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	30/04/2024
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	30/04/2024
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	30/04/2024
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	30/04/2024

Página 2

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 – 31 de enero de 2024, la información se relaciona en el Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSIÓN: 01**
	INFORME MENSUAL No. 2	**FECHA:1- 31 de enero de 2024**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** ene-24

CONVENIO No.: 3317 - 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, MPIO PUERTO TRIUNFO

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 12/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: -
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
PLAZO ACUMULADO: 30/04/2024

VALOR INICIAL : $ 201.333.957,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.333.957,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 200.333.957,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTOR: 4804 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	111
Estructuras	Alcantarillas	GBL	2
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas	GBL	0	0
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 151.512.376,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.545.371,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.276.210,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.333.957,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ -	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	0,00
VALOR EJECUTADO		0,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #¡DIV/0!

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto

Indicar la localización y actividad.




Foto 2

Indicar la localización y actividad.




o 3

Indicar la localización y actividad.






Indicar la localización y actividad.



Indicar la localización y actividad.



Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre JESUS ORLANDO VIVAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

El desarrollo semanal del contrato de obra se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los Informes Semanales están suscritos por el director de Interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III. Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. gestión predial, VI. Gestión social, VII. Actividades realizadas en la semana, VIII. Actividades que realizar en la siguiente semana, IX. Esquema gráfico alcance del contrato, X. registro fotográfico y XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto.

Informe N°4. (5-11 ene)

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSIÓN: 01**
	INFORME MENSUAL No. 2	**FECHA:1- 31 de enero de 2024**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	12/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 4 del 5/01/2024 al 11/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de placa huella y la elaboracion de 2 alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 111 m de placa huella en el corregimiento de Puerto Perales y la contruccion de dos alcantarilla, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES

CONVENIO No.	3317-2023	VALOR INICIAL:	$ 201.333.957,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.333.957,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.	4804 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.596.402,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 57.596.402,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.333.957	$ 200.333.957		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.333.957	$ 200.333.957		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.596.402	$ 57.596.402		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.596.402	$ 57.596.402		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.333.957,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ene-24

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás posiciones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza acompañamiento de parte de la interventoria a la JAC de puerto perales en la gestion documental y socializacion de temas administrativos para inicio de actividades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se programa levantamiento topografico e instalacion de mojones en la via a intervenir.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
	0	Ejecutado
Placa huella	0	Programado
	0	Ejecutado
alcantarillas	0	Programado
	0	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202-95679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Informe N°5. (12-18 ene)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA: 18/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA | SEMANA No.: 5 del 12/01/2024 al 18/01/2024 | Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SERRA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de placa huella y la elaboracion de 2 alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 111 m de placa huella en el corregimiento de Puerto Perales y la contruccion de dos alcantarilla, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES

CONVENIO No. 3317-2023 | FECHA DE INICIO: 12/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 201.333.957,00 | VALOR ADICIONES: $ - | VALOR ACUMULADO: $ 201.333.957,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA | INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No. 4804 de 2023 | FECHA DE INICIO: 14/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/03/2024

VALOR INICIAL: $ 57.596.402,00 | VALOR ADICIONES: | VALOR ACUMULADO: $ 57.596.402,00 | VALOR ANTICIPO: $ - | VALOR AMORTIZADO: $ - | SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.333.957	$ 200.333.957		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.333.957	$ 200.333.957		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.596.402	$ 57.596.402		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.596.402	$ 57.596.402		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.333.957,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ene-24

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	____

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G. A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza acompañamiento de parte de la interventoria a la JAC de puerto perales en la gestion documental y socializacion de temas administrativos para inicio de actividades.
Se realiza el levantamiento topografico altiplanimetrico con gps y estacion total de la via a intervenir y la instalacion de mojones.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se programa visita de interventoria a la territorial de antioquia y acompañamiento a la JAC de perales para cambio de firmas en el banco AV Villas.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
	0	Ejecutado
Placa huella	0	Programado
	0	Ejecutado
alcantarillas	0	Programado
	0	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ORLADO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSIÓN: 01**
	INFORME MENSUAL No. 2	**FECHA:1- 31 de enero de 2024**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

Informe N°6. (19- 25 ene)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	25/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 6 del 19/01/2024 al 25/01/2024 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de placa huella y la elaboracion de 2 alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 111 m de placa huella en lel corregimiento de Puerto Perales y la contruccion de dos alcantarilla, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES

CONVENIO No.	3317-2023	VALOR INICIAL:	$ 201.333.957,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.333.957,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.	4804 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.596.402,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 57.596.402,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.333.957	$ 200.333.957		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.333.957	$ 200.333.957		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.596.402	$ 57.596.402		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.596.402	$ 57.596.402		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.333.957,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.000.000,00	5,21%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.000.000,00	5,21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 3.000.000,00	5,21%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.000.000,00	5,21%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ene-24

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (no debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		DISPONIBLE
	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A ___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A ___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A ___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A ___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza acompañamiento de parte de la interventoria a la JAC de puerto perales en la gestion documental y socializacion de temas administrativos
Se realiza visita con la presidenta de la JAC la señora Damaris en acompañamiento del interventor Jesus Orlando Vivas para el cambio de firmas conjuntas en el banco Av Villas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera la entrega de la documentacion solicitada.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0			
	Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
		0	Ejecutado
	Placa huella	0	Programado
		0	Ejecutado
	alcantarillas	0	Programado
		0	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSIÓN: 01**
	INFORME MENSUAL No. 2	**FECHA:1- 31 de enero de 2024**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

Informe N°7. (26 ene – 1 feb)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	2/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 7 del 26/01/2024 al 1/02/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de placa huella y la elaboracion de 2 alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 111 m de placa huella en el corregimiento de Puerto Perales y la contruccion de dos alcantarilla, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES

CONVENIO No.	3317-2023	VALOR INICIAL:	$ 201.333.957,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.333.957,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.	4804 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.596.402,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 57.596.402,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.333.957	$ 200.333.957		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.333.957	$ 200.333.957		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.596.402	$ 57.596.402		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.596.402	$ 57.596.402		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.333.957,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.000.000,00	10,42%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.669.540,00	9,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.000.000,00	5,21%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.669.540,00	4,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ene-24
VALOR FACTURA: $ 5.669.540,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza acompañamiento de parte de la interventoria a la JAC de puerto perales en la gestion documental y socializacion de temas administrativos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera la entrega de la documentacion solicitada.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
	0	Ejecutado
Placa huella	0	Programado
	0	Ejecutado
alcantarillas	0	Programado
	0	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202-35678 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Informe mensual 02 – enero 2023

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

Hasta el momento no se han ejecutado actividades con maquinaria o equipos.

4.3 PERSONAL CONVENIO DE OBRA

En el presente período no se reporta personal contratado.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA

No aplica.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica en este mes ya que hasta el momento no se han ejecutado actividades.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo aún no se han tomado muestras.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS del contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3317-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, MPIO DE PTO TRIUNFO

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 12/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 201.333.957,00
VALOR ACUMULADO: $ 201.333.957,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4804 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.266.791,40	13/09/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.066.697,85	13/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.400.187,10	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100284287
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	31/12/2023
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	31/12/2023
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	31/12/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE 100069231 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.266.791,40	13/09/2023	1/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.066.697,85	13/09/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.400.187,10	30/04/2024	30/04/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100284027
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	30/04/2024
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	30/04/2024
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	30/04/2024
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	30/04/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE 100069231 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Seguimiento al plan de calidad contrato de obra FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-14

Nota: A la fecha se ha los documentos del plan de calidad por parte del contratista de obra a la interventoría.

4.9 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

Hasta el momento no se han realizado actividades de obra, debido a que estamos en la etapa de revisión y aprobación.

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

No aplica para este periodo.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Aspectos legales del contrato

Tabla 4. Aspectos legales del contrato de interventoría

CONTRATO:	4804-2023
CONTRATISTA:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

N° PROCESO DE SELECCION	IP-DT-ANT-029-2023
N° ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.5620712
NIT CONTRATISTA	13.451.988-3
DIRECCION	Calle 51 No. 79-51 Medellín Antioquia COLOMBIA
FECHA DE SUSCRIPCION	1/12/2023
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
FECHA INICIO:	14/12/2023
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	14/03/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 57.596.402

5.1.2 Pólizas y seguros

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías, gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual. La aprobación de la póliza única de cumplimiento No 49-44-101028514 de SEGUROS DEL ESTADO S.A. fue indicada mediante en la plataforma SECOP II.

Tabla 5. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA						
			Desde			Hasta			
Cumplimiento	10%	$ 10,000,000.00	29	8	2022	15	12	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 20,000,000.00	29	8	2022	15	6	2026
Calidad del servicio	30%	$ 30,000,000.00	14	11	2022	14	11	2027

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 - 31 de enero de 2024, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra N° 4804 de 2023

Dentro de las actividades administrativas se encuentran:

- ✓ Elaboración de Informes Semanales y Mensuales de interventoría.
- ✓ Seguimiento y aprobación del personal profesional del convenio.
- ✓ Seguimiento, control y aprobación de cuentas.

Dentro de las actividades técnicas se realizaron:

- ✓ Se realizaron recorridos periódicos por el corredor vial a intervenir y toma de registro fotográfico a los sitios del proyecto.

- ✓ Se realiza acompañamiento para el seguimiento y verificación de la topografía, donde se realiza el replanteo e instalación de mojones.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el cuadro “Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría”, presentado en el anexo denominado “Formatos de seguimiento mensual” y logrado con el desarrollo de la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se presenta parcialmente, con detalle a nivel diario, la participación o utilización de los profesionales en desarrollo de las actividades objeto de la Interventoría, en el periodo objeto del informe.

Se podrá identificar la utilización de equipos y/o vehículos del contrato de interventoría durante el desarrollo del convenio 3317-2023 por medio del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

En este periodo ha intervenido el personal que está desarrollando las actividades de seguimiento y control a la ejecución de obras, de acuerdo a los estudios y diseños y a los documentos técnicos entregados por la entidad contratante, que hacen parte del proyecto.

Tabla 6. Personal Activo de la Interventoría.

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
Jesús Orlando Vivas Noguera	Director de Interventoría	20%
Ezequiel Cárdenas Henao	Residente de Interventoría	30%

6.2 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Cuadro “Información financiera del contrato de interventoría”, presentado en el anexo denominado “Formatos de seguimiento mensual” y logrado con el desarrollo de la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-9 se presentan los movimientos a nivel mensual de costos de la interventoría, del saldo de contrato y del saldo del registro presupuestal.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 23-mar-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4804 - 2023 — **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

MES INFORME MENSUAL: 2 — **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No: 0 — **CONTRATISTA:** 0

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO 3317 de 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES,PUERTO TRIUNFO

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO 4398 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ESTACION PUERTO PITA, PUERTO TRIUNFO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1343423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	Contrato Principal	$ 57.596.402,00	$ -
			TOTAL			$ 57.596.402,00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 57.596.402

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
01	Diciembre 2023	$ -	$ -	$ -	-	-	-	1343423 DEL 7 /12/2023	$ 57.596.402,00	$ 57.596.402,00		
02	Enero 2024	$ 5.669.540,00	$ -	$ 5.669.540,00	-	-	-	1343423 DEL 7 /12/2023	$ 51.926.862,00	$ 51.926.862,00		
TOTALES		**$ 5.669.540,00**	**$ -**	**$ 5.669.540,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 51.926.862,00**	**$ 51.926.862,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 4.578.400,00	$ -	$ 4.578.400,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 1.091.140,00	$ -	$ 1.091.140,00
*			
VALOR TOTAL	**$ 5.669.540,00**	$ -	**$ 5.669.540,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Matrícula Profesional 25202-35679NTS
Drector de Interventoría
ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Firma
MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional 05202-096971 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.3 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías del INTERVENOR (Garantía única), gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4804 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/03/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 57.596.402,00
VALOR ACUMULADO: $ 57.596.402,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 7.200.000,00	1/12/2023	30/09/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.400.000,00	1/12/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	30%	$ 21.600.000,00	1/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100007003
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 4/03/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 7.200.000,00	18/12/2023	15/09/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.400.000,00	18/12/2023	15/03/2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.600.000,00	15/03/2024	15/03/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100007003
Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 4/03/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-096961 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se elevará consulta ante el INVIAS para establecer las condiciones y la forma de presentación del plan de calidad para su aprobación.

6.5 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1 Seguimiento a la inversión del anticipo

El contrato de interventoría No 4804-2023 no pactó anticipo.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se requiere por parte del contratista, acatar todas las recomendaciones dadas por la interventoría, así mismo la entrega de oportuna de la documentación solicitada, con el fin de evitar inconvenientes que desenfunden en multas y sanciones, de acuerdo a las cláusulas establecidas en el convenio de obra.

8. ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre INVIAS, contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"					
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DESDE El 1-31 DE ENERO DE 2024					
FECHA	**CORREO**	**REMITENTE**	**ENTIDAD**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
9 de enero de 2024		María Paulina Tabares	Supervisora contrato	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	Solicitud documentación para cambio de titular cuenta conjunta

16 de enero de 2024		María Paulina Tabares	Supervisora contrato	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	Solicitud de aprobación y activación profesionales y técnicos interventoría puerto triunfo
17 de enero de 2024		María Paulina Tabares	Supervisora contrato	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	Solicitud de documentos para etapa de revisión
18 de enero de 2024		María Paulina Tabares	Supervisora contrato	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	Solicitud firma de contrato de prórroga del convenio 3317-2023

Gmail **jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>**

SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PARA CAMBIO DE TITULAR CUENTA CONJUNTA

Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co> 9 de enero de 2024, 14:34
Para: jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>

Cordial saludo,

Los documentos que se requieren para el cambio de titular de la cuenta bancaria son los siguientes:

Persona natural:

- Copia de la cédula legible al 150%.
- Soporte de ingresos (carta labora, contratos, declaración de renta año 2022, otros que considere)

Esto con el fin de enviar la carta dirigida a la junta firmada por el Director Territorial que figura como supervisor del contrato indicando el cambio de firma de la cuenta. Una vez se remita esta carta, al día hábil siguiente se debe presentar en la sede del banco donde se hizo la apertura de la cuenta (AV VILLAS RIONEGRO) el representante legal de la interventoría y el presidente de la junta, para firma de los documentos establecidos en los procedimientos del banco.

Quedo atenta, gracias.

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

28/2/24, 11:29 Gmail - Oficio: TERRITORIAL-2024-001 Solicitud de aprobación y activación Profesionales y Técnicos Interventoría Puerto Triunfo

Gmail **Jesus Vivas <interventoria4804.2023@gmail.com>**

Oficio: TERRITORIAL-2024-001 Solicitud de aprobación y activación Profesionales y Técnicos Interventoría Puerto Triunfo

Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co> 16 de enero de 2024, 3:47 p.m.
Para: Jesus Vivas <interventoria4804.2023@gmail.com>

Buenas tardes, Ingeniero

La aprobación de personal se hizo mediante radicaco oficio no. 2024S-VANT-001511

Quedo atenta,

De: Jesus Vivas <interventoria4804.2023@gmail.com>
Enviado: martes, 16 de enero de 2024 10:46
Para: Mauricio Hoyos Sierra <mhoyos@invias.gov.co>
Cc: Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co>; Ezequecardenas@gmail.com <Ezequecardenas@gmail.com>
Asunto: Oficio: TERRITORIAL-2024-001 Solicitud de aprobación y activación Profesionales y Técnicos Interventoría Puerto Triunfo

[Texto citado oculto]

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

28/2/24, 11:35 Gmail - Oficio: PTO PERALES-002-2024 Solicitud Documentos para ETAPA DE REVISIÓN

Gmail Jesus Vivas <interventoria4804.2023@gmail.com>

Oficio: PTO PERALES-002-2024 Solicitud Documentos para ETAPA DE REVISIÓN

Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co> 17 de enero de 2024, 8:59 a.m.
Para: Jesus Vivas <interventoria4804.2023@gmail.com>, "j.a.c.depuertoperalesantioquia@gmail.com" <j.a.c.depuertoperalesantioquia@gmail.com>
CC: "Ezequecardenas@gmail.com" <ezequecardenas@gmail.com>

Buenas tardes,

Me permito enviar algunos documentos solicitados en el oficio.

El levantamiento topográfico aun está por contratar y el diseño de placa huella se encuentra en la cartilla del invias de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del INSTITUTO, que se puede descargar del siguiente link: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/14788-cartilla-de-obras-menores-de-drenaje-y-estructuras-viales/file

Los documentos para celebración de contrato se puede encontrar en el siguiente link:

Corregimiento de Puerto Perales (3317-2023): https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4950867&isFromPublicArea=True&isModal=False

Quedo atenta,

De: Jesus Vivas <interventoria4804.2023@gmail.com>
Enviado: jueves, 11 de enero de 2024 16:45
Para: j.a.c.depuertoperalesantioquia@gmail.com <j.a.c.depuertoperalesantioquia@gmail.com>
Cc: Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co>; Ezequecardenas@gmail.com <Ezequecardenas@gmail.com>
Asunto: Oficio: PTO PERALES-002-2024 Solicitud Documentos para ETAPA DE REVISIÓN

[Texto citado oculto]

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

22. Presupuesto Obra JAC Puerto Perales.xlsx
2395K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=faca0aff7c&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1788346385435894643&simpl=msg-f:17883463854358... 1/1

Gmail **jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>**

SOLICITUD FIRMA FORMATO DE PRORROGA CONV 3317-2023

Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co> 18 de enero de 2024, 19:57
Para: jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>

Buenas tardes, ingeniero

Solicito comedidamente se firme el formato adjunto para la prorroga del convenio 3317-2023

Quedo atenta

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

MEPI PRORROGA 3317-2023 PTO PERALES.pdf
97K

Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"				
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DESDE EL 1-31 DE ENERO DE 2024				
FECHA	**No DE OFICIO**	**DESTINATARIO**	**ENTIDAD/EMPRESA**	**ASUNTO**
9 de enero de 2024		María Paulina Tabares	Supervisora de contrato INVIAS	Solicitud documentación para cambio de titular cuenta conjunta
11 de enero de 2024	Pto Perales-002-2024	Álvaro Macías presidente JAC Puerto Perales	Representante legal JAC Puerto Perales	Solicitud de documentos para etapa de revisión
16 de enero de 2024	Territorial 2024-001	Mauricio Hoyos	Director de INVIS y supervisor de convenios e interventoría	Solicitud de aprobación y activación de profesionales y técnicos de interventoría puerto triunfo.
17 de enero de 2024	Pto Perales-003-2024	Álvaro Macías presidente JAC Puerto Perales	Representante legal JAC Puerto Perales	Aprobación de hojas de vida

Gmail

jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>

SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PARA CAMBIO DE TITULAR CUENTA CONJUNTA

jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com> 9 de enero de 2024, 17:34
Para: Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co>

Cordial saludo
Ingeniera María Paulina Tabares

mtabares@invias.gov.co

Anexo lo solicitado

estaré atento por si se necesita ampliar la información

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

CONTRATO-INTERVENTORIA-4804-2023-INVIAS.zip
2188K

DOCUMENTOS-JVIVAS-PARA-CAMBIO-DE-TITULAR.zip
7292K

A
Ve

28/2/24, 11:33 Gmail - Oficio: PTO PERALES-002-2024 Solicitud Documentos para ETAPA DE REVISIÓN

Gmail **Jesus Vivas <interventoria4804.2023@gmail.com>**

Oficio: PTO PERALES-002-2024 Solicitud Documentos para ETAPA DE REVISIÓN

Jesus Vivas <interventoria4804.2023@gmail.com> 11 de enero de 2024, 4:45 p.m.
Para: j.a.c.depuertoperalesantioquia@gmail.com
CC: mtabares@invias.gov.co, Ezequecardenas@gmail.com

Señor
EDGAR ALVARO MACIAS
Presidente JAC Corregimiento Puerto Perales
Municipio Puerto Triunfo, Departamento de Antioquia
correo j.a.c.depuertoperalesantioquia@gmail.com

Anexo
Oficio: PTO PERALES-002-2024

Copias

a. María Paulina Tabares Saldarriaga, Ingeniera INVIAS Territorial Antioquia mtabares@invias.gov.co
b. Ezequiel Cárdenas Henao, Ingeniero Residente de Interventoría, Ezequecardenas@gmail.com

--

Gracias.
Atentamente,

JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista enEstructuras
Director de Interventoría

Gmail

Jesus Vivas <interventoria4804.2023@gmail.com>

Oficio: TERRITORIAL-2024-001 Solicitud de aprobación y activación Profesionales y Técnicos Interventoría Puerto Triunfo

Jesus Vivas <interventoria4804.2023@gmail.com> 16 de enero de 2024, 10:46 a.m.
Para: Mhoyos@invias.gov.co
CC: mtabares@invias.gov.co, Ezequecardenas@gmail.com

Ingeniero
MAURICIO HOYOS SIERRA
Director Territorial INVIAS ANTIOQUIA y
Supervisor de Convenios e Interventoría
Mhoyos@invias.gov.co

Cordial saludo

Anexo

Oficio: TERRITORIAL-2024-001

Copias

a. María Paulina Tabares Saldarriaga, Ingeniera INVIAS Territorial Antioquia mtabares@invias.gov.co

b. Ezequiel Cárdenas Henao, Ingeniero Residente de Interventoría, Ezequecardenas@gmail.com

--

Gracias.
Atentamente,

JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Ingeniero civil – Especialista enEstructuras

Director de Interventoría

OFICIO-TERRITORIAL-01_SOLICITUD-APROBACION-PERSONAL-INICIO.pdf
89K

Gmail

Jesus Vivas <interventoria4804.2023@gmail.com>

Oficio: PTO PERALES-003-2024 Aprobación de Hojas de Vida

Jesus Vivas <interventoria4804.2023@gmail.com> 17 de enero de 2024, 9:43 a.m.
Para: j.a.c.depuertoperalesantioquia@gmail.com
CC: mtabares@invias.gov.co, Ezequecardenas@gmail.com, edgaralvaromacias@gmail.com

Señor
EDGAR ALVARO MACIAS
Presidente JAC Corregimiento Puerto Perales
Municipio Puerto Triunfo, Departamento de Antioquia
correo j.a.c.depuertoperalesantioquia@gmail.com

Anexo
Oficio: PTO PERALES-003-2024

Copias

a. María Paulina Tabares Saldarriaga, Ingeniera INVIAS Territorial Antioquia mtabares@invias.gov.co
b. Ezequiel Cárdenas Henao, Ingeniero Residente de Interventoría, Ezequecardenas@gmail.com
c. Edgar Alvaro Macias edgaralvaromacias@gmail.com

--

Gracias.
Atentamente,

JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Ingeniero civil – Especialista enEstructuras

Director de Interventoría

4 archivos adjuntos

OFICIO-PTO-PERALES-03_APROBACION-HV.pdf 86K

HOJA DE VIDA CARLOS CASTRILLON TOPO.pdf 248K

HOJA DE VIDA SERGIO FEB 2023.pdf 108K

COTIZACION 2023011_PROPUESTA INVIAS.pdf 218K

Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras

Hasta el momento no se han ejecutado actividades de obra.

Firma

Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS
