

Vereda La Cabaña – Garzón
Mantenimiento
Mejoramiento – Placa huella y Alcantarilla



Vereda San Luis – Garzón
Mantenimiento
Mejoramiento – Placa huella



Vereda Potrerillos – Garzón
Mantenimiento
Mejoramiento – Placa huella y Alcantarilla

Construcción – Consultoría - Interventoría

INFORME DE INTERVENTORÍA NO. 7
CONTRATO 4597 – 2023
CONVENIOS GARZÓN, HUILA

PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA:
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA

INTERVENTOR:
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

SUPERVISOR:
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

JULIO DE 2024

Contenido

RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – LA CABAÑA 4

RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – SAN LUIS 6

RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – POTRERILLOS 8

INTRODUCCIÓN 10

1. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3802 DE 2023, JAC VEREDA LA CABAÑA 10

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10

1.1.1 Localización 10

1.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 11

1.1.3 Inventario y estado inicial de la vía 11

1.1.4 Características técnicas del proyecto 12

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 12

1.2.1 Información general del contrato 12

1.2.2 Descripción de las actividades 13

1.2.3 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 14

2. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4176 DE 2023, JAC VEREDA SAN LUIS 15

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 15

2.1.1 Localización 15

2.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 16

2.1.3 Inventario y estado inicial de la vía 16

2.1.4 Características técnicas del proyecto 17

2.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 17

2.2.1 Información general del contrato 17

2.2.2 Descripción de las actividades 18

2.2.3 Seguimiento Ítems no previstos 19

2.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 19

2.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 20

2.3.1 Informe semanal 20

2.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 20

2.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 20

2.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 21
2.3.5 Estado general del tiempo 22
2.3.6 Resumen ensayos de laboratorio 22
2.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 22
2.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 24
2.3.9 Otros documentos seguimiento mensual 24
3. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4126 DE 2023, JAC VEREDA POTRERILLOS 25
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 25
3.1.1 Localización 25
3.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 26
3.1.3 Inventario y estado inicial de la vía 26
3.1.4 Características técnicas del proyecto 27
3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 27
3.2.1 Información general del contrato 27
3.2.2 Descripción de las actividades 28
3.2.3 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 29
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 30
4.1 Información general del contrato 30
4.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor 30
4.3 Informes especialistas y profesionales 32
4.4 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 32
5. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 33
5.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría 33
5.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 33
5.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría 33
5.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría 33
5.5 Otros documentos seguimiento mensual 35
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 35
7. ANEXOS 37
7.1 Relación de la correspondencia 37

7.2 Registro fotográfico 38

7.3 Formatos Convenios Solidarios.....39

7.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios.....39

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** JUNIO DE 2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3802 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

PLAZO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE INICIO:	14/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/04/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 189.105.183,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 189.105.183,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** WILDER ORLEY SALAZAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	60,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,36
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,08
	Subbase Granular Clase C	M3	106,03
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in	M3	73,27
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	32,23
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI	KG	3407,21
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	43,40
	Excavaciones en roca en seco	M3	7,70
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in	M3	0,80
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in	M3	9,60
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578,90
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	23,00
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm d	M	5,00
	Suministro e instalación de saco suelo	M2	45,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	40
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	1,2
Excavaciones varias sin Clasificar	0	5,01
Subbase Granular Clase C	0	112,5
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	0	111,21
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	0	17,77
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	0	4631,14
Excavaciones varias sin Clasificar	0	33,58
Excavaciones en roca en seco	0	0
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	0	2,22
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	0	4,83
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	0	305,08
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	0	11,96
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	0	6
Suministro e instalación de saco suelo	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	142.026.250,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.260.788,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.818.145,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	188.105.183,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	0,00	138.431.908,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.248.700,00	4.248.700,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	42.841.039,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	4.248.700,00	185.521.647,00

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 142.026.250,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 138.431.908,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 97,47%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Antes y después de construcción de placa huella y alcantarilla JAC La Cabaña



Socialización de entrega JAC La Cabaña

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma

Nombre SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO VERSION PÁGINA

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** JUNIO DE 2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4176 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

PLAZO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	30/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	19/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA No. 2:	25/04/2024
FECHA DE PRÓRROGA No. 3:	29/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/06/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 188.483.432,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 188.483.432,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** WILDER ORLEY SALAZAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	42,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,80
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,69
	Subbase Granular Clase C	M3	122,02
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in s	M3	84,49
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	37,19
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3923,81

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	50	50
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0,6	0,6
Excavaciones varias sin Clasificar	9,41	9,41
Subbase Granular Clase C	127,5	127,5
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	107,66	107,66
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	18,14	18,14
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	4593,42	4593,42

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	140.457.826,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.213.735,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.811.871,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	187.483.432,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	29.391.900,00	143.105.244,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	4.034.999,57
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.074.816,00	18.395.989,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	34.466.716,00	165.536.232,57

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 140.457.826,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 143.105.244,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	101,88%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	

	FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Estado inicial de la vía antes de la intervención	**Estado final de la vía después de la intervención**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma
Nombre SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** JUNIO DE 2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4126 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 1/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA: 7/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.252.458,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.252.458,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** WILDER ORLEY SALAZAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	36,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	2,00
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,95
	Subbase Granular Clase C	M3	102,51
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in	M3	77,71
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,06
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI	KG	3566,30
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	43,40
	Excavaciones en roca en seco	M3	7,70
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in	M3	0,80
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in	M3	9,60
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578,90
	Relleno para estructuras con suelo	M3	23,00
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm d	M	5,00
	Suministro e instalación de saco suelo	M2	45,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	55
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	0,97
Excavaciones varias sin Clasificar	0	4,4
Subbase Granular Clase C	0	81
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	0	116,63
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	0	8,32
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	0	4468,86
Excavaciones varias sin Clasificar	0	24,72
Excavaciones en roca en seco	0	0
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	0	1,33
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	0	3,92
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	0	190,99
Relleno para estructuras con suelo	0	9,12
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	0	5
Suministro e instalación de saco suelo	0	2,78

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	142.168.683,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.265.060,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.818.715,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	188.252.458,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	0,00	145.984.989,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	4.279.949,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	34.016.252,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	0,00	184.281.190,00

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 142.168.683,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 145.984.989,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 102,68%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Antes y después de la intervención del convenio solidario



Entrega del proyecto de placa huella

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma

Nombre SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTRODUCCIÓN

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS suscribió convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal del departamento, bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Para lo cual, en el municipio de Garzón las JAC La Cabaña, San Luis, Potrerillos y El Mesón, suscribieron los convenios solidarios No. 3802, 4176, 4126 y 4777 de 2023, respectivamente.

Dado lo anterior, el INVIAS mediante proceso IP-DT-HUI-010-2023 efectuó el contrato No. 4597 de 2023 con orden de inicio 2023S-VHUI-029107 para realizar la interventoría a los convenios solidarios anteriormente mencionados, con el objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Para lo anterior, el INVIAS designó como Supervisor del contrato de interventoría al ing. Wilder Orley Salazar Cuellar.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El presente informe parcial contempla las actividades realizadas en cada uno de los convenios en el periodo entre el 01 de junio de 2024 hasta el 30 de junio de 2024. Los convenios solidarios No. 3802 y 4126 de 2024 correspondientes a las JAC La Cabaña y Potrerillos, respectivamente, se terminaron el 30 de abril de 2024 y el convenio solidario No. 4176 de 2024 de la JAC San Luis contempla una fecha de terminación de 30 de junio de 2024.

1. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3802 DE 2023, JAC VEREDA LA CABAÑA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.1 Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Garzón departamento del Huila, en la vereda la Cabaña, teniendo como punto de referencia inicial la vía denominada la Parabólica en la coordenada NORTE 2.193402 OESTE 75.593027 y punto de referencia final la coordenada NORTE 2.191511 OESTE 75.592453, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.

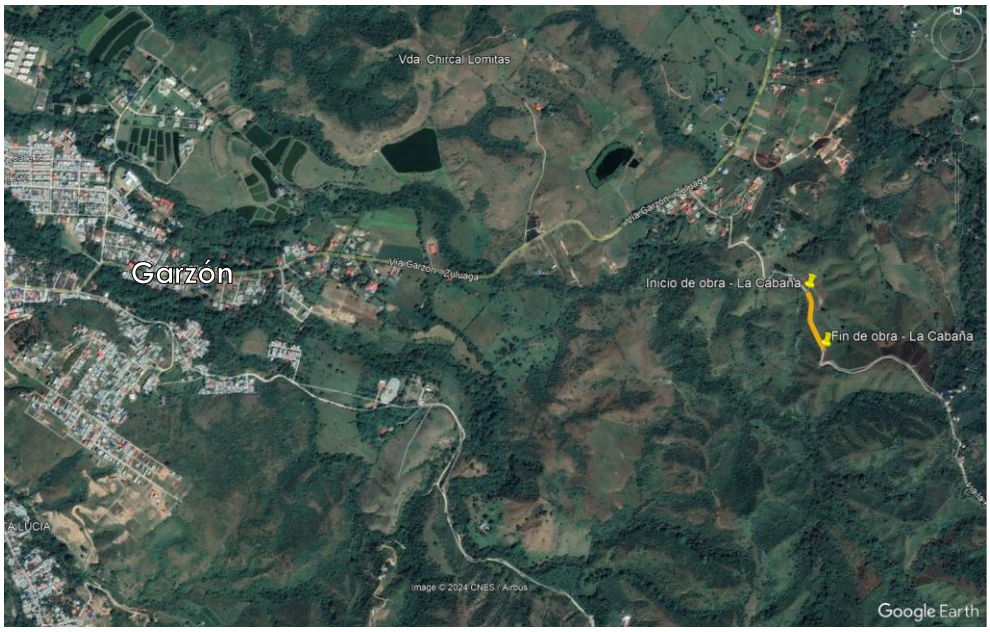


Ilustración 1. Localización de la obra del convenio 3802 de 2023 - JAC La Cabaña

1.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Con la ejecución del proyecto, la población de las veredas ubicadas sobre la vía la Parabólica, la cual corresponde a una variante generada sobre la vía que comunica a Garzón – Zuluaga; allí se encuentran principalmente las poblaciones de La Cabaña y Mesón, que son veredas productoras y comercializadores de café, lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte, principalmente al municipio de Garzón.

Por otra parte, a 2.2 km del cruce de la vía que comunica a Zuluaga, sobre la vía la Parabólica se encuentra el sitio turístico denominado Mirador La Torre Garzón el cual genera un volumen considerable de tránsito atraído.

1.1.3 Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 126 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)

1.1.4 Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
10,00	1,36	126,00	1

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

1.2.1 Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	3802 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	9/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal de La Cabaña del municipio de Garzón – Huila
RUT	891.101.472-1
VALOR INICIAL	$ 189.105.183,00

VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.105.183,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VBOG-028489 de fecha 14/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	28/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	17/01/2024
PRÓRROGA No. 1	17/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/04/2024
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

1.2.2 Descripción de las actividades

De acuerdo con el componente social, el 12 de junio de 2024 se realizó la socialización final del convenio solidario en la escuela de la vereda La Cabaña, con la participación del INVIAS, la comunidad y la interventoría. Se presentó la obra de participación comunitaria realizada mediante el mejoramiento de la escuela, la cual tuvo un costo de $ 4.248.679,00; además, se encuentra en elaboración el plan de gestión social de acuerdo con los lineamientos dados por el INVIAS.

Para el componente ambiental, mediante radicado 2024E-VUVRAZ-058419 de fecha 28 de junio de 2024, se realizó la entrega del plan de gestión inicial ambiental como documento previo requerido para la liquidación del convenio solidario.

En cuanto al componente técnico, se socializó el alcance ejecutado por 141 m de placa huella y dos losas de transición inicial y final de 2 m cada una, para una longitud total de 145 m de placa huella; así como la ejecución de 1 alcantarilla de 36", superando el alcance inicial del convenio de acuerdo con el presupuesto original.

Por otra parte, en relación con el componente financiero se realizó la transferencia de rendimientos financieros vía SEBRA de los periodos de abril y mayo de 2024 por un valor total de $440,41; quedando pendiente por realizar desembolso del saldo no ejecutado y cancelación de la cuenta bancaria de manejo conjunto.

Se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados; en cuanto al valor Básico de Obra se contemplan las cantidades ejecutadas con corte a 30 de abril, superando el valor del presupuesto inicial y por ende la meta física; así mismo, el valor de gastos Socioambientales y el valor de Administración a corte 30 de junio de 2024, quedando pendiente el cierre financiero que se presentará en los documentos de acta de recibo parcial de obra, acta de entrega y recibo definitivo y acta de liquidación.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 142.026.250,00	N/A	$ 0	$ 170.498.657,00	-$ 28.472.407,00

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.260.788,00	N/A	$ 0	$ 4.248.700,00	$ 12.088,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.818.145,00	N/A	$ 0	$ 42.841.039,00	-$ 1.022.894,00
TOTAL	**$ 188.105.183,00**	**N/A**	**$ 0**	**$ 217.457.531,00**	**-$ 29.352.151,00**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 115,60%. Se está realizando cierre financiero para poder definir el total de los gastos.

1.2.3 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial y la suspensión No. 1:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. 3002981 certificado No. 1 de fecha 1/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 certificado No. 0 de fecha 18/10/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.821.037,00	09/10/2023	31/10/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.731.555,00	31/12/2023	31/12/2028
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.455.260,00	09/10/2023	31/12/2026
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**30/10/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	18/10/2023	31/12/2023

- Suspensión No. 1: Póliza de cumplimiento No. 3002981 certificado No. 2 de fecha 29/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 certificado No. 1 de fecha 29/01/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.821.037,00	31/10/2023	20/11/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.731.555,00	20/01/2024	20/01/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.455.260,00	31/12/2026	20/01/2027

TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**20/01/2024**	**20/01/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31/12/2023	20/01/2024

- Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. 3002981 certificado No. 3 de fecha 30/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 certificado No. 2 de fecha 30/01/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.821.037,00	20/11/2024	02/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.731.555,00	30/04/2024	30/04/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.455.260,00	20/01/2027	02/05/2027
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**27/01/2024**	**30/04/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	20/01/2024	30/04/2024

No se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS", ya que no se modifica.

- Actas de reunión y comités de obra:

  Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
03/07/2024	Comité operativo No. 17	Se presentó el avance ejecutado y se dieron lineamientos para el cierre financiero y administrativo del convenio solidario. Se aprobaron transferencias No. 14 y 15.

  Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

2. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4176 DE 2023, JAC VEREDA SAN LUIS

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1 Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Garzón departamento del Huila, en la vereda San Luis, teniendo como punto de referencia inicial el portón donde Alberto en la vereda San Luis con la coordenada NORTE 2.065109 OESTE 75.64341 y punto de referencia final la coordenada NORTE 2.064123 OESTE 75.642938, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 2. Localización de la obra del convenio 4176 de 2023 - JAC San Luis

2.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

En el tramo postulado por la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Luis, en el municipio de Garzón, transitan diariamente más de 50 vehículos al día, transportando los productos agrícolas como café, yuca, maíz, arracacha, así como también se desarrolla la actividad ganadera de doble propósito, porcícola y avícola. Es de destacar que se cuenta con actividad turística alrededor de fincas de la zona.

2.1.3 Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 145 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)

2.1.4 Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
7,00	0,80	145,00	0

2.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2.2.1 Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	4176 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	2/12/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda San Luis del municipio de Garzón – Huila
RUT	900.016.133-6
VALOR INICIAL	$ 188.483.432,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 188.483.432,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VBOG-033843 de fecha 30/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1	30/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	19/01/2024
PRÓRROGA No. 1	19/01/2024
PRÓRROGA No. 2	25/04/2024
PRÓRROGA No. 3	29/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/06/2024
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

2.2.2 Descripción de las actividades

Durante la primera semana se realizó el acopio de material pétreo tales como ciclópeo, triturado y arena; así como la madera para formaleta. Se realizó la adecuación de bodega de almacenamiento. Por otra parte, se efectuó el figurado y armado de acero de vigas riostras. Además, la alcaldía municipal mediante el préstamo de volquetas y material de relleno, permitieron que los trabajadores y personal de la junta realizaran una jornada de mejoramiento de la calzada antes de la ubicación de la placa huella a construir. El 01 de junio se dio el inicio al personal operativo, se les realizó la inducción correspondiente y la entrega de dotación.

Durante la segunda semana se realizó la instalación de la formaleta en madera y la fundición del concreto ciclópeo en una longitud de 39 m, para luego realizar las excavaciones manuales de vigas riostras y poder efectuar la instalación del acero de refuerzo armado previamente. Así mismo, se instaló el acero en las secciones de huellas y berma-cunetas, para fundir el concreto de placa huella en una longitud de 24 m.

El viernes 14/06/2024 se realizó el comité operativo No. 6 donde se autorizó la transferencia de recursos No. 4 correspondiente al pago de honorarios de contadora y residente, primera quincena de junio del personal operativo, el saldo de los materiales de construcción, viajes de agregados y el pago a la JAC del reintegro de póliza que ampara la prórroga No. 3 hasta 30 de junio de 2024 y retenciones del mes de mayo de 2024. Dicha transferencia fue radicada el 18/06/2024.

Durante la tercera semana se realizó la instalación de la formaleta en madera y la fundición del concreto ciclópeo en una longitud de 54 m, para luego realizar las excavaciones manuales de vigas riostras y poder efectuar la instalación del acero de refuerzo armado previamente. Así mismo, se instaló el acero en las secciones de huellas y berma-cunetas, para fundir el concreto de placa huella en una longitud de 60 m.

El martes 25/06/2024 se realizó trámite a la transferencia de recursos No. 5 correspondiente al pago de nómina de la segunda quincena del mes de junio. Durante la semana se realizó la instalación de la formaleta en madera y la fundición del concreto ciclópeo en una longitud acumulada de 129 m, para luego realizar las excavaciones manuales de vigas riostras y poder efectuar la instalación del acero de refuerzo armado

previamente. Así mismo, se instaló el acero en las secciones de huellas para realizar una fundición en una longitud acumulada de 123 m y berma-cunetas en una longitud acumulada de 81 m.

Durante la semana se remitieron los documentos correspondientes a la gestión socio ambiental para su revisión y radicación ante el INVIAS, los cuales se encuentran en revisión por parte de la profesional ambiental y residente de la interventoría. Por otra parte, se completó la meta física de 146 m acumulados de placa huella, incluyendo la losa de transición inicial, dando cumplimiento a la longitud presupuestada en el convenio solidario. Es importante mencionar que la Junta de Acción Comunal tiene previsto continuar con la construcción de placa huella con aporte de mano de obra, empleando los materiales sobrantes y gestionados por los socios.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de junio de 2024.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 140.457.826,00	N/A	$ 153.843.880,00	$ 153.843.880,00	-$ 13.386.054,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.213.735,00	N/A	$ 0,00	$ 4.034.999,57	$ 178.735,43
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.811.871,00	N/A	$ 5.074.816,00	$ 18.395.989,00	$ 24.415.882,00
TOTAL	**$ 187.483.432,00**	**N/A**	**$ 158.918.696,00**	**$ 176.274.868,57**	**$ 11.208.563,43**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 94,02%.

2.2.3 Seguimiento Ítems no previstos

Teniendo en cuenta que el contratista no cuenta con el desembolso de los recursos no se ha evaluado el presupuesto y, por ende, no se ha requerido la legalización de ítems no previstos al presupuesto.

2.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado del convenio.

Se efectuaron los comités dirigidos por la interventoría, con la participación de la Junta de Acción Comunal, presidente y tesorero, así como de los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentaron comparativos acompañados de cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la

aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

La interventoría garantiza que la Junta realice la verificación de los antecedentes del personal y su proceso de vinculación, el cual debe estar encaminada en garantizar la participación de la comunidad mediante una contratación directa con la Junta y que la ejecución de las actividades dé cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Con relación al personal calificado, residente y contador, se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia.

2.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

2.3.1 Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 25: Desde el 31 de mayo de 2024 al 06 de junio de 2024.
- Semana 26: Desde el 07 de junio de 2024 al 13 de junio de 2024.
- Semana 27: Desde el 14 de junio de 2024 al 20 de junio de 2024.
- Semana 28: Desde el 21 de junio de 2024 al 27 de junio de 2024.
- Semana 29: Desde el 28 de junio de 2024 al 04 de julio de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

2.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

En el mes de junio de 2024 se realizó la intervención de la vía mediante motoniveladora, instalación y compactación de la subbase granular con vibro compactador fueron aportados por la alcaldía municipal; es de anotar que dada la distancia del municipio de Garzón a la vereda San Luis, la cual se extiende aproximadamente 30 km con pendientes pronunciadas, encarecía el valor del transporte de maquinaria y materiales.

Mediante el convenio solidario se realizó la contratación de una volqueta para el transporte de materiales.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

2.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Para el periodo de junio de 2024 se realizó la contratación del maestro de obra y personal operativo. Además, en el periodo reportado se mantuvo vinculado el personal calificado:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	YURI ANDREA PARRA SERRANO	Contadora	15/04/2024	Prestación de servicios
2	NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA	Residente	15/04/2024	Prestación de servicios
3	JOSE EDGAR MEDINA VILLANUEVA	Maestro	01/06/2024	Obra o labor
4	JOSE EDIMER FIERRO URRIAGO	Ayudante	01/06/2024	Obra o labor
5	ELKIN ALEXIS FIERRO MURCIA	Ayudante	01/06/2024	Obra o labor
6	MANUEL AGUSTIN NARANJO GOMEZ	Ayudante	01/06/2024	Obra o labor
7	BENEDICTO MEDINA VILLANUEVA	Ayudante	01/06/2024	Obra o labor

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

2.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 4176 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1450023 de fecha 2023-12-30 por valor $ 187.483.432,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02 "VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 184.689.694,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 "VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 2.793.738,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS", ya que no se modifica.

Se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

Se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

2.3.5 Estado general del tiempo

Dado el reporte de la bitácora de obra y el formato adjunto, se evidencia que no se presentaron atrasos por lluvia o condiciones climáticas adversas.

Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

2.3.6 Resumen ensayos de laboratorio

De acuerdo con las actividades de fundición realizadas en el periodo, la empresa SEND SUELOS Y CONCRETOS los días 25/06/2024 realizó la toma de muestras de cilindros de las mezclas de concreto ciclópeo; luego, el 27/06/2024 realizó la toma de muestras de cilindros de las mezclas de concreto de placa huella de acuerdo con el ensayo INV-E-410 "RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO". Se está a la espera de los resultados de la falla de cilindros a los 7 y 28 días.

Se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO".

2.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. NB-100299715 anexo No. 0 de fecha 14/12/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. NB-100074298 anexo No. 0 de fecha 14/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.696.687,00	02/12/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.424.172,00	02/12/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.545.030,00	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**30/10/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	02/12/2023	31/12/2023

- Suspensión No. 1 y Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. NB-100299715 anexo No. 1 de fecha 01/03/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. NB-100074298 anexo No. 0 de fecha 01/03/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.696.687,00	31/12/2023	01/03/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.424.172,00	31/12/2023	30/04/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.545.030,00	30/04/2024	30/04/2029
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**30/10/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	02/12/2023	30/04/2024

- Prórroga No. 2: Póliza de cumplimiento No. NB-100299715 anexo No. 2 de fecha 17/05/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. NB-100074298 anexo No. 2 de fecha 17/05/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.696.687,00	30/04/2024	01/04/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.424.172,00	30/04/2024	31/05/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.545.030,00	31/05/2024	31/05/2029
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**02/12/2023**	**31/05/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	02/12/2023	31/05/2024

- Prórroga No. 3: Póliza de cumplimiento No. NB-100299715 anexo No. 3 de fecha 31/05/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. NB-100074298 anexo No. 3 de fecha 31/05/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.696.687,00	30/04/2024	01/05/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.424.172,00	30/04/2024	30/06/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.545.030,00	30/06/2024	30/06/2029
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**02/12/2023**	**30/06/2029**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	02/12/2023	30/06/2024

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS".

2.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra


Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

2.3.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

  Teniendo en cuenta la programación No. 1 presentada por el ingeniero residente de obra, a la fecha de corte se tiene un porcentaje de ejecución del 94,02% con respecto a un porcentaje programado del 100% del proyecto.

  Lo anterior, se debe a que se ejecutó el alcance inicial del proyecto correspondiente a 145 m con una longitud final de 146 m para un 100% de ejecución. Cabe resaltar que la Junta de Acción Comunal continuará con la construcción de la placa huella con los materiales sobrantes y aporte de los socios, tanto de materiales como de mano de obra.

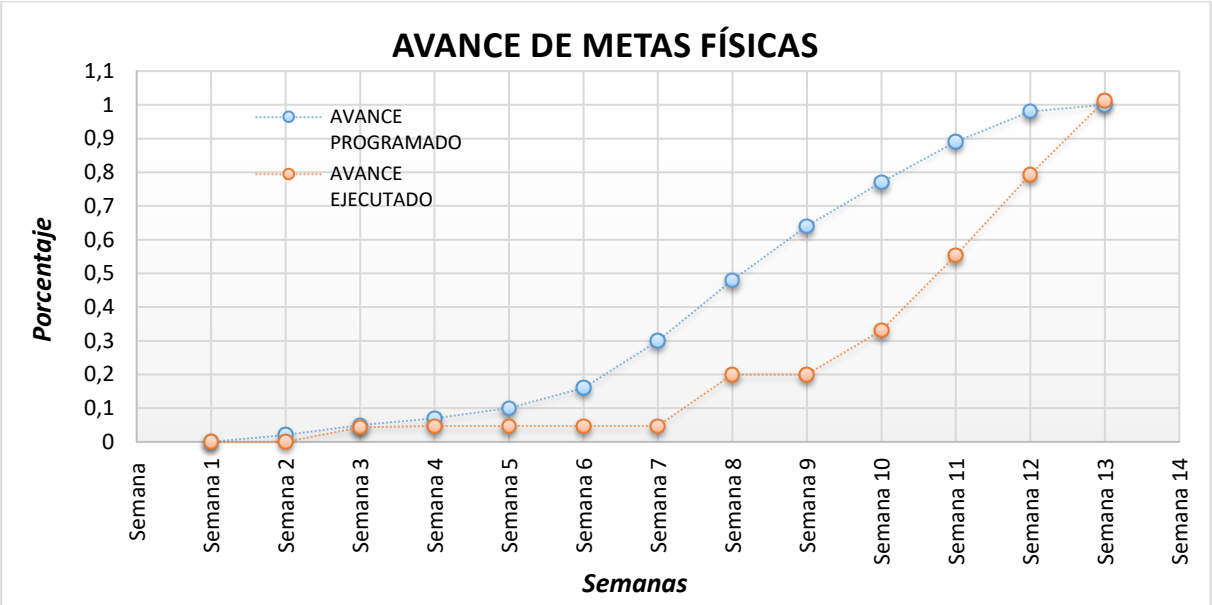

De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-actas, acta de recibo parcial de obra para convenios y plano récord.

- Actas de reunión y comités de obra:

  Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
14/06/2024	Comité operativo No. 6	Se aprobó la transferencia de recursos No. 4 correspondiente a pago del saldo de materiales, transporte, retenciones, honorarios y nómina.

  Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

3. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4126 DE 2023, JAC VEREDA POTRERILLOS

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1.1 Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Garzón departamento del Huila, en la vereda Potrerillos, teniendo como punto de referencia inicial la vía hacia la vereda Potrerillos desde la vereda Paraíso, en la curva del portón blanco con coordenadas NORTE 2.146264 OESTE 75.604431 y punto de referencia final la coordenada NORTE 2.147764 OESTE 75.603286, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 3. Localización de la obra del convenio 4126 de 2023 - JAC Potrerillos

3.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

En el tramo postulado por la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos, en el municipio de Garzón, transitan diariamente entre 30 y 50 vehículos al día, transportando los productos agrícolas como café, plátano cacao y frutales como mandarina y guanábana, así como también se desarrolla la actividad ganadera para producción de leche, la actividad piscícola de tilapia de Nilo y roja. Por la vía postulada se estima un tránsito menor a 20 vehículos al día, lo cual indica una actividad tranquila y un ambiente rural en la vereda, donde los desplazamientos son principalmente para actividades locales y de proximidad.

3.1.3 Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 134 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor; además, se presenta una erosión del afirmado.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)

3.1.4 Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
6,00	2,00	134,00	1

3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.2.1 Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	4126 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	26/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda Potrerillos del municipio de Garzón – Huila
RUT	813.005.618-3
VALOR INICIAL	$ 189.252.458,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.252.458,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VBOG-025348 de fecha 01/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023

PRÓRROGA No. 1	07/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/04/2024
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

3.2.2 Descripción de las actividades

De acuerdo con el componente social, el 12 de junio de 2024 se realizó la socialización final del convenio solidario en la escuela de la vereda Potrerillos, con la participación del INVIAS, la comunidad y la interventoría. Se presentó la obra de participación comunitaria realizada la compra de un equipo de cómputo y dotación de silletería, la cual tuvo un costo de $ 4.279.949,00; además, se encuentra en elaboración el plan de gestión social de acuerdo con los lineamientos dados por el INVIAS.

Para el componente ambiental, se está elaborando el documento PAGA como documento previo requerido para la liquidación del convenio solidario de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.

En cuanto al componente técnico, se socializó el alcance ejecutado por 132 m de placa huella y dos losas de transición inicial de 1,5 m y final de 1 m, para una longitud total de 134,5 m de placa huella; así como la ejecución de 1 alcantarilla de 36", superando el alcance inicial del convenio de acuerdo con el presupuesto original.

Por otra parte, en relación con el componente financiero se realizó la transferencia de rendimientos financieros vía SEBRA del periodo de mayo de 2024 por un valor de $23,2; quedando pendiente por realizar desembolso del saldo no ejecutado y cancelación de la cuenta bancaria de manejo conjunto.

Se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados; en cuanto al valor Básico de Obra se contemplan las cantidades ejecutadas con corte a 30 de abril, superando el valor del presupuesto inicial y por ende la meta física; así mismo, el valor de gastos Socioambientales y el valor de Administración a corte 30 de junio de 2024, quedando pendiente el cierre financiero que se presentará en los documentos de acta de recibo parcial de obra, acta de entrega y recibo definitivo y acta de liquidación.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 142.168.683,00	N/A	$0,00	$ 162.955.968.00	-$ 20.787.285,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.265.060,00	N/A	$ 0,00	$ 4.279.949,00	-$ 14.889,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.818.715,00	N/A	$ 0,00	$ 34.016.252,00	$ 7.802.463,00
TOTAL	**$ 188.252.458,00**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 201.252.169,00**	**-$ 12.999.711,00**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 106,91%. Se está realizando cierre financiero para poder definir el total de los gastos.

3.2.3 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. 137105283 certificado No. 0 de fecha 08/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007889 certificado No. 0 de fecha 14/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.850.492,00	26/10/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.462.623,00	26/10/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.775.738,00	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 104.088.853,00**	**26/10/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	26/10/2023	31/12/2023

- Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. 3002994 certificado No. 1 de fecha 19/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007889 certificado No. 1 de fecha 19/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.850.492,00	31/10/2024	01/03/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.462.623,00	31/12/2026	01/05/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.775.738,00	30/04/2024	30/04/2029
TOTAL		**$ 104.088.853,00**	**17/01/2024**	**30/04/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31/12/2023	30/04/2024

No se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS", ya que no se modifica.

- Actas de reunión y comités de obra:

Durante el periodo reportado no se realizaron reuniones y comités de obra, tendiendo en cuenta que las actividades de obra finalizaron el 30 de abril de 2024. Se realizó la reunión de socialización final el 12 de junio de 2024.

No se anexan las actas de reunión y comités de obra.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 Información general del contrato

PROCESO DE SELECCIÓN	IP-DT-HUI-010-2023
FECHA DE PUBLICACIÓN	9/11/2023 10:09 AM
ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.PCCNTR.5580987
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	4597 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/11/2023
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATISTA	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
CC	55.181.920
VALOR INICIAL	$ 82.643.855,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 82.643.855,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VHUI-029107 de fecha 18/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	17/01/2024
PRÓRROGA No. 1	17/01/2024
PRÓRROGA No. 2	24/04/2024
PRÓRROGA No. 3	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/06/2024
DIRECCIÓN	Calle 18 # 42-72, Neiva – Huila
NÚMERO DE TELÉFONO	3235785141
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

4.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

Durante el periodo la interventoría realizó seguimiento al convenio solidario No. 4176 de 2023 de la JAC San Luis que se encuentra en ejecución.

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en campo, como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- Recorrido en los frentes de obra, para identificar los sitios críticos que serán intervenidos mediante el contrato y demarcación de los puntos de intervención.
- Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
- Control de permanencia del personal calificado y no calificado.
- Revisión de los diferentes documentos presentados por el contratista.
- Control del pago de parafiscales del personal que labora para el contrato.
- Archivo actualizado de la Interventoría.
- Comunicados dirigidos al contratista.
- Comunicados dirigidos al INVIAS.
- Reuniones con el contratista.
- Asistir a las reuniones citadas por el INVIAS.
- Seguimiento y acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas por el Contratista en los sectores donde se desarrollan las obras.
- Elaboración de informes semanales.
- Elaboración de informe mensual.
- Medición y cuantificación de cantidades de obra.
- Supervisión de ejecución de obras.
- Revisión de pre-actas y actas de obra.

Lo anterior, mediante la realización de comités operativos de seguimiento con la participación invias, de la Junta de Acción Comunal mediante el presidente y tesorero, así como los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados, con el fin de evaluar y tomar decisiones técnicas y administrativas, correspondientes principalmente a la vinculación de mano de obra, presentación de cotizaciones para una evaluación costo/beneficio y trámite de transferencia de recursos que permite la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

La interventoría busca garantizar que la JAC realice la verificación de los antecedentes del personal y su proceso de vinculación, el cual debe estar encaminada en la participación de la comunidad mediante una contratación directa con gente de la zona y que la ejecución de las actividades dé cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Con relación al personal calificado, residente y contador, se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia.

En cuanto al suministro de materiales se solicitaron los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas.

Por otra parte, se verificó que la obra cuente con los elementos que permitan la señalización preventiva y los controles ambientales a que haya lugar.

4.3 Informes especialistas y profesionales

Durante el mes de junio de 2024, las labores del director y residente de interventoría consistieron en requerir al residente del proyecto, atender los requerimientos técnicos contemplados en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales.

Así mismo, se requiere al residente y al contador el diligenciamiento de los formatos entregados por el INVIAS adoptados a los convenios solidarios, los cuales permiten llevar un seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, jurídico del convenio.

- Componente ambiental:

De acuerdo con las indicaciones dadas por el INVIAS se presentó a la Entidad la gestión ambiental inicial del convenio solidario No. 3802 de 2023 JAC La Cabaña mediante radicado 2024E-VUVRAZ-058419 de fecha 28/06/2024.

- Componente social:

Con relación al plan de gestión social inicial se presentó al INVIAS el PSG del convenio solidario No. 3802 de 2024 JAC La Cabaña mediante comunicado INVIAS-4597-2023/14 de fecha 08/06/2024.

Se está recopilando la información de las otras JAC para realizar la radicación de los planes de gestión ambiental y social para presentarlos ante la Entidad teniendo en cuenta las directrices que se han venido recibiendo por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

4.4 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

La interventoría realiza la revisión para la aprobación definitiva de estudios y diseños entregados por JAC de acuerdo con la instrucción del INVIAS, teniendo en cuenta los parámetros técnicos de topografía y estudios de laboratorio e in situ; así como los diseños geométrico y estructural para la construcción de las estructuras de placa huella y alcantarilla.

5. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría

Durante el periodo reportado no fueron requeridos los equipos y vehículos empleados durante la ejecución de los convenios solidarios, de acuerdo con el plan de cargas.

No se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

5.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

Durante el mes de junio de 2024 se generó pago de aportes de seguridad social del personal que se relaciona a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO
1	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	Directora	18/12/2023
2	EDGAR MAURICIO ARGÜELLO MALDONADO	Residente	1/01/2024

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

5.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría

Con base en el CDP No. 183223 de fecha 2023-11-01. Se hizo el registro presupuestal No. 1294023 de fecha 2023-11-24 por valor 82.643.855,00 para el contrato principal. Lo anterior, sin adiciones a la fecha.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

5.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Contrato inicial: Póliza de cumplimiento No. CHU-100011070 anexo No. 0 de fecha 23/11/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA

			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	22/11/2023	30/06/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	22/11/2023	31/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**22/11/2023**	**31/12/2028**

- Suspensión No. 1: Póliza de cumplimiento No. CHU-100011070 anexo No. 3 de fecha 22/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	17/01/2024	14/08/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	17/01/2024	14/02/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	14/02/2024	14/02/2029
TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**18/12/2023**	**14/02/2029**

- Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. CHU-100011070 anexo No. 4 de fecha 22/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	17/01/2024	20/11/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	17/01/2024	30/04/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	30/04/2024	30/04/2029
TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**18/12/2023**	**30/04/2029**

- Prórroga No. 2: Póliza de cumplimiento No. CHU-100011070 anexo No. 5 de fecha 29/04/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	24/04/2024	31/12/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	24/04/2024	31/05/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	31/05/2024	31/05/2029

TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**18/12/2023**	**31/05/2029**

- Prórroga No. 3: Póliza de cumplimiento No. CHU-100011070 anexo No. 6 de fecha 30/05/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	28/05/2024	31/01/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	28/05/2024	01/07/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	30/06/2024	30/06/2029
TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**18/12/2023**	**30/06/2029**

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

5.5 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento al Plan de cargas o Reprogramación al plan de cargas aprobado:

  De acuerdo con las indicaciones dadas por el supervisor, se presenta el plan de cargas con fecha de terminación el 30 de junio de 2024 presentado al supervisor.

  No se anexa el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En relación con el convenio solidario No. 3802 de 2023 JAC La Cabaña, se presentan las siguientes conclusiones para cada uno de los componentes: social, ambiental, técnico y financiero.

De acuerdo con el componente social, el 12 de junio de 2024 se realizó la socialización final del convenio solidario en la escuela de la vereda La Cabaña, con la participación del INVIAS, la comunidad y la interventoría. Se presentó la obra de participación comunitaria realizada mediante el mejoramiento de la escuela, la cual tuvo un costo de $ 4.248.679,00; se presentó el plan de gestión social inicial mediante comunicado INVIAS-4597-2023/14 de fecha 08/06/2024.

Para el componente ambiental, mediante radicado 2024E-VUVRAZ-058419 de fecha 28 de junio de 2024, se realizó la entrega del plan de gestión inicial ambiental como documento previo requerido para la liquidación del convenio solidario.

En cuanto al componente técnico, se socializó el alcance ejecutado por 141 m de placa huella y dos losas de transición inicial y final de 2 m cada una, para una longitud total de 145 m de placa huella; así como la ejecución de 1 alcantarilla de 36", superando el alcance inicial del convenio de acuerdo con el presupuesto original.

Por otra parte, en relación con el componente financiero se realizó la transferencia de rendimientos financieros vía SEBRA de los periodos de abril y mayo de 2024 por un valor total de $440,41; quedando pendiente por realizar desembolso del saldo no ejecutado y cancelación de la cuenta bancaria de manejo conjunto.

En relación con el convenio solidario No. 4176 de 2023 JAC San Luis, se presentan las siguientes conclusiones para cada uno de los componentes: social, ambiental, técnico y financiero.

En cuanto al componente social y ambiental se está realizando la recolección de información y elaboración de los documentos requeridos para la presentación de los planes de la gestión social y ambiental de acuerdo con las directrices dadas por la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

Por otra parte, se completó la meta física inicial de 145 m con una ejecución total de 146 m acumulados de placa huella, incluyendo la losa de transición inicial. Es importante mencionar que la Junta de Acción Comunal tiene previsto continuar con la construcción de placa huella con aporte de mano de obra, empleando los materiales sobrantes y gestionados por los socios.

Financieramente se realizó el desembolso de los rendimientos financieros del mes de mayo de 2024 por valor de 805,71; además, se tiene pendiente realizar la transferencia de recursos No. 6 correspondiente al pago de saldos y liquidación del personal de obra; para realizar posteriormente la devolución del saldo no ejecutado y cierre de cuenta bancaria.

En relación con el convenio solidario No. 4126 de 2023 JAC Potrerillos, se presentan las siguientes conclusiones para cada uno de los componentes: social, ambiental, técnico y financiero.

De acuerdo con el componente social, el 12 de junio de 2024 se realizó la socialización final del convenio solidario en la escuela de la vereda Potrerillos, con la participación del INVIAS, la comunidad y la interventoría. Se presentó la obra de participación comunitaria realizada mediante la compra de un equipo de cómputo y dotación de silletería, lo cual tuvo un costo de $ 4.279.949,00; además, se encuentra en elaboración el plan de gestión social de acuerdo con los lineamientos dados por el INVIAS.

Para el componente ambiental, se está elaborando el documento PAGA como documento previo requerido para la liquidación del convenio solidario de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.

En cuanto al componente técnico, se cumplió el alcance inicial mediante la construcción de 132 m de placa huella y dos losas de transición inicial de 1,5 m y final de 1 m, para una longitud total de 134,5 m de placa huella; así como la ejecución de 1 alcantarilla de 36".

Por otra parte, en relación con el componente financiero se realizó la transferencia de rendimientos financieros vía SEBRA del periodo de mayo de 2024 por un valor de $23,2; quedando pendiente por realizar desembolso del saldo no ejecutado y cancelación de la cuenta bancaria de manejo conjunto.

Por lo anterior, queda pendiente efectuar el cierre financiero que se presentará en los documentos de acta de recibo parcial de obra, acta de entrega y recibo definitivo y acta de liquidación, de cada uno de los convenios solidarios.

7. ANEXOS

7.1 Relación de la correspondencia

Durante el mes de junio de 2024 se tuvo la siguiente trazabilidad de correspondencia de las Juntas de Acción Comunal, Interventoría y Supervisión:

- Interventoría

FECHA	COMUNICADO	DESCRIPCIÓN
08/06/2024	INVIAS 4597-2023/14	Solicitud de documentación socioambiental inicial Convenio 3802 de 2023.
08/06/2024	INVIAS 4597-2023/15	Solicitud de documentación socioambiental inicial Convenio 4176 de 2023
08/06/2024	INVIAS 4597-2023/16	Solicitud de documentación socioambiental inicial Convenio 4126 de 2023

- Supervisión

FECHA	COMUNICADO	DESCRIPCIÓN
20/06/2024	2024S-VHUI-040139	Reiteración solicitud de información para el recibo y liquidación de los convenios solidarios a su cargo.

7.2 Registro fotográfico

JAC San Luis	
	
Corte y armado de acero	Instalación formaleta ciclópeo
	
Fundición de concreto ciclópeo	Instalación de acero de refuerzo
	
Cierre de vía	Fundición de concreto placa huella
	
Mezcla de concreto	Fundición de concreto placa huella

	
Fundición de concreto placa cunetas	Curado del concreto
	
Fundición de concreto placa huella	Fundición de concreto placa huella
	
Placa huella	Placa huella

7.3 Formatos Convenios Solidarios

Teniendo en cuenta que la interventoría se ejecuta en simultaneo para los proyectos activos, presentan los siguientes documentos: Informes semanales, maquinaria y equipo, personal control aportes legales y seguridad social, informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios acta parcial de pagos de convenios, estado general del tiempo, resumen ensayos de laboratorio, bitácora, comités operativos.

Se anexa formato "Bitácora" de cada uno de los convenios.

7.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios

Equipo y vehículos, personal control aportes legales y seguridad social, información financiera y presupuestal.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
LA CABAÑA

- Comités operativos

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 17	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 03/07/2024

Vereda – Municipio - Departamento: La Cabaña – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 3802 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Cabaña

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Arturo Bustos Rojas	Junta de Acción Comunal	Presidente
Lucila Ardila Ramírez	Junta de Acción Comunal	Tesorera
Norman Nicolas Velásquez Mancera	Junta de Acción Comunal	Residente
Yuri Andrea Parra Serrano	Junta de Acción Comunal	Contadora
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y avance del convenio

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Resumen de avance de obra y administración.
3- Autorización de transferencia de recursos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorera, así como el secretario, la contadora y el residente. por parte de la interventoría, la directora y el residente
2.	**Avance técnico y financiero:** Se presentan los siguientes avances del proyecto por parte de los profesionales: • Residente: A la fecha se ha dado cumplimiento al alcance del proyecto con la construcción de 141 m de placa huella y losa de transición de 2 m. A corte 30 de abril de 2024 en bodega se encuentra cemento, material de arena, triturado y acero de refuerzo; los cuales fueron utilizados por la JAC para ampliar el alcance de placa huella a una longitud total de 141 m y losa de transición final de 2 m, para un total de 145 m. • Contadora: Rendimientos financieros: Se tiene pendiente el extracto bancario de marzo de 2024 y realizar el traslado de los rendimientos de junio de 2024 por un valor de $ 2,91. También, se tienen pendientes los Reportes de comprobante de operación de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2024. Se indica el orden de las carpetas de información financiera: ➢ Carpeta 1: Cotizaciones. Los comité operativos + Cuadro comparativo + Cotizaciones. ➢ Carpeta 2: Transferencias. Solicitud transferencia radicada + Facturas / Cuentas de cobro. ➢ Carpeta 3: Rendimientos. Solicitud rendimientos radicada + Extracto SEBRA (reporte comprobante de operación). ➢ Carpeta 4: Extractos bancarios. ➢ Carpeta 5: Paz y salvos. Proveedores y Personal. ➢ Carpeta 6: Obligaciones tributarias. Certificaciones de retenciones de proveedores y Relación de las cuentas (información requerida para la exógena en el 2025). ➢ Carpeta 7: Documentos de cancelación. Extracto a la fecha, Reintegro rendimientos, Nota de cancelación INVIAS. Se indica que no se tienen cuentas por pagar a la fecha y el saldo de la cuenta bancaria a 30 de junio de 2024 es de $ 264.671,69.

	Los formatos soporte de los informes mensuales se tienen a fecha de abril de 2024, por lo cual, se tiene el compromiso a fecha 04/07/2024 de realizar la consolidación y entrega de los formatos de los meses de mayo y junio de 2024: ➢ Informe de inversión y buen manejo del anticipo ➢ Acta parcial de pagos convenio ➢ Personal, control de aportes legales y seguridad social Por lo anterior, se indica que está pendiente la planilla del maestro de obra correspondiente al mes de abril de 2024. Además, dada la fecha de terminación de los contratos de prestación de servicios y pagos de honorarios autorizados, se tiene pendiente la planilla de seguridad social del residente y contadora correspondiente al mes de mayo de 2024. Por otra parte, la junta presenta carta de aporte por valor de $ 1.000.000,00 de acuerdo con las obligaciones del convenio solidario.
➢	**Autorización de transferencia de recursos:** Se realizan las autorizaciones de transferencia de los proveedores aprobados en este comité y el anterior: • Diseño estructural. Luis Fernando Calderón. Por valor de $ 1.000.000,00. • Retenciones mayo. Lucila Ardila Ramirez. Por valor de $ 143.000,00.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	**Aprobación:** Transferencias de recursos No. 14. • Se aprueba la transferencia de recursos por un valor total de $ 1.000.000,00. **Aprobación:** Transferencias de recursos No. 15. • Se aprueba la transferencia de recursos por un valor total de $ 143.000,00.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Realizar transferencia de recursos No. 11	Contadora	23/04/2024
Culminar la construcción de placa huella de acuerdo con el alcance del proyecto	Residente	27/04/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor

Nombre: Arturo Bustos Rojas
Cargo: Presidente OAC La Cabaña

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor

Nombre: Lucila Ardila Ramírez
Cargo: Tesorero OAC La Cabaña

Nombre: Norman Nicolas Velasquez
Cargo: Residente Convenio La Cabaña

Nombre: Yuri Andrea Parra Serrano
Cargo: Contador Convenio La Cabaña

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
SAN LUIS

- Informes semanales
- Personal, control de aportes legales y seguridad social
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso
- Acta parcial de pagos del convenio
- Estado general del tiempo
- Resumen ensayos de laboratorio
- Seguimiento de garantías y convenios
- Comités operativos
- Bitácora de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 25 (Numeración consecutiva) del 31/05/2024 al 6/06/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,80 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 145 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	EDWIN JOVAN GARZON CARVAJAL				
CONVENIO No.	4176 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	188.483.432,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	188.483.432,00
SUSPENSIÓN No. 1:	30/12/2023 hasta	18/01/2024		$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	19/01/2024			$	-
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	25/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	29/05/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
PRÓRROGA No. 2:	24/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	29/05/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.483.432			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 131.338.319			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 56.145.113			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 18.406.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 64.237.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 140.457.826,00**	**74,92%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 98.320.478,20	70,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 19.704.825,00	14,03%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (78.615.653,20)	-55,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 28.091.565,20	20,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (28.091.565,20)	-20,00%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.213.735,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 1.179.845,80	28,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ 4.034.999,57	95,76%
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.811.871,00**	**22,84%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 29.540.190,99	69,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 13.738.262,65	32,09%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 77.676.959,31	93,99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 77.676.959,31	93,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.657.009,29	2,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.657.009,29	2,01%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 18.406.000,00

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$**	**188.105.183,00**	**100,33%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	129.040.514,99	68,60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$	37.478.067,22	19,92%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$**	**187.483.432,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$	-	
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$	131.338.318,80	70,05%

Observaciones:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/06/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 70,00%
Meta Física Ejecutada % 14,03%

Avance o Atraso Físico % -55,97%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,8
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	145

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	7				100,0%
Ejec					
Prog	0,8				100,0%
Ejec					
Prog	145				100,0%
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Luis

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ S.A.S	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	KM0+300 Vía Agrado - Muelle Guaraní	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 3
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Luis - Garzón

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Durante la semana se realizó el acopio de material pétreo tales como piedra ciclopeo, triturado y arena; así como la madera para formaleta. Se realizó la adecuación de bodega de almacenamiento. Por otra parte, se efectuó el figurado y armado de acero de vigas riostras. Además, la alcaldía municipal mediante el préstamo de volquetas y material de relleno, permitieron que los trabajadores y personal de la junta realizaran una jornada de mejoramiento de la calzada antes de la ubicación de la placa huella a construir.

El 01 de junio se dio el inicio al personal operativo, se les realizó la inducción correspondiente y la entrega de dotación.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado realizar la instalación de formaleta en madera y fundición de concreto ciclopeo; además, la excavación manual de las vigas riostras.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

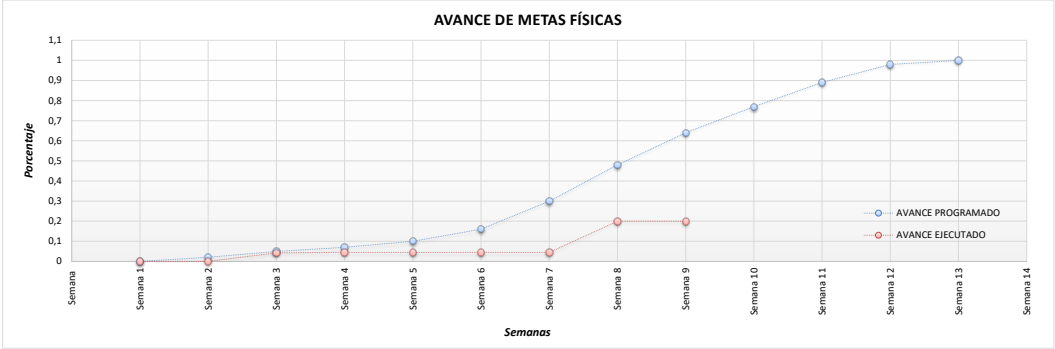

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Relleno con material seleccionado de tramo previo a la obra



Armado de acero de vigas riostras



Acopio de material pétreo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar comités operativos para aprobación de proveedores y desembolsos que halla lugar, con el fin de dar inicio a las obras, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas.	FIRMA: NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 26 del 7/06/2024 al 13/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,80 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 145 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	EDWIN JOVAN GARZON CARVAJAL				
CONVENIO No.	4176 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	188.483.432,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	188.483.432,00
SUSPENSIÓN No. 1:	30/12/2023 hasta	18/01/2024		$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	19/01/2024			$	-
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	25/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	29/05/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
PRÓRROGA No. 2:	24/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	29/05/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.483.432			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 131.338.319			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 56.145.113			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 15.943.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 66.700.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 140.457.826,00**	**74,92%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 116.579.995,58	83,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 44.909.629,41	31,97%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (71.670.366,17)	-51,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.259.517,38	13,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.204.804,41	17,94%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 6.945.287,03	4,94%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.213.735,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 2.149.004,85	51,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ 4.034.999,57	95,76%
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.811.871,00**	**22,84%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 33.393.259,38	78,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 13.738.262,65	32,09%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 79.329.836,41	95,99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 79.329.836,41	95,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.657.009,29	2,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.657.009,29	2,01%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MARZO
VALOR FACTURA: $ 15.943.000,00

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$**	**188.105.183,00**	**100,33%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	152.122.259,81	80,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$	62.682.891,63	33,32%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$**	**187.483.432,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$	-	
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$	131.338.318,80	70,05%

Observaciones:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/06/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 83,00%
Meta Física Ejecutada % 31,97%

Avance o Atraso Físico % -51,03%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,8
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	145

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	7				100,0%
Ejec					
Prog	0,8				100,0%
Ejec					
Prog	145				100,0%
Ejec	24				16,6%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Luis

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ S.A.S	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	KM0+300 Vía Agrado - Muelle Guaraní	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 3
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Luis - Garzón

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizó la instalación de la formaleta en madera y la fundición del concreto ciclopeo en una longitud de 39 m, para luego realizar las excavaciones manuales de vigas riostras y poder efectuar la instalación del acero de refuerzo armado previamente. Así mismo, se instaló el acero en las secciones de huellas y berma-cunetas, para fundir el concreto de placa huella en una longitud de 24 m.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado continuar con las excavaciones de vigas riostras, instalación de aceros y fundición de concretos ciclópeo y concreto reforzado de placa huella.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

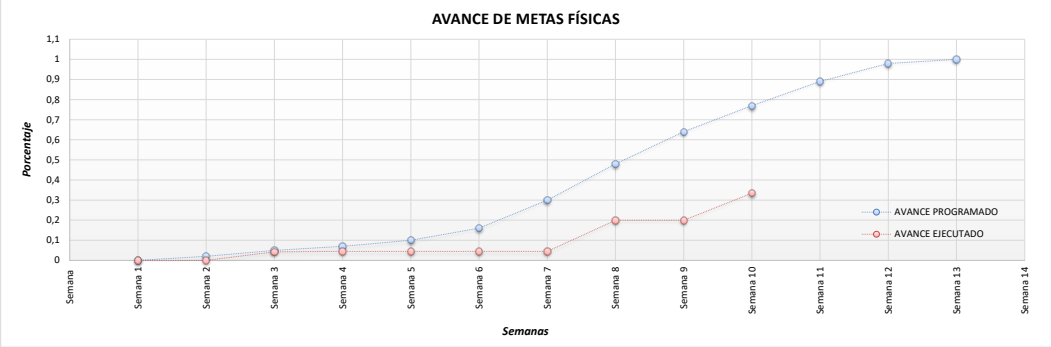

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundición de ciclópeo e instalación de acero



Fundición de huella y berma



Mezcla de concreto insitu para fundición de bordillo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar comités operativos para aprobación de proveedores y desembolsos que halla lugar, con el fin de dar inicio a las obras, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas.	FIRMA: NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 27 (Numeración consecutiva) del 14/06/2024 al 20/06/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,80 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 145 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	EDWIN JOVAN GARZON CARVAJAL				
CONVENIO No.	4176 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	188.483.432,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	188.483.432,00
SUSPENSIÓN No. 1:	30/12/2023 hasta	18/01/2024		$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	19/01/2024			$	-
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	25/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	29/05/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
PRÓRROGA No. 2:	24/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	29/05/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.483.432			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 164.197.035			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 23.286.397			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 15.943.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 66.700.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$**	**140.457.826,00**	**74,92%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	132.030.356,44	94,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$	81.019.705,06	57,68%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(51.010.651,38)	-36,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	15.450.360,86	11,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	36.110.075,65	25,71%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$	20.659.714,79	14,71%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$**	**4.213.735,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$	3.033.889,20	72,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$	4.034.999,57	95,76%
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$**	**42.811.871,00**	**22,84%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$	37.674.446,48	88,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$	19.280.495,70	45,04%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$	805,71	

INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	80.990.977,90	98,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	80.990.977,90	98,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	1.657.009,29	2,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	1.657.009,29	2,01%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MARZO
VALOR FACTURA: $ 15.943.000,00

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$**	**188.105.183,00**	**100,33%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	172.738.692,12	91,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$	104.335.200,33	55,47%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$**	**187.483.432,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$	32.858.716,00	17,53%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$	164.197.034,80	87,58%

Observaciones: Los rendimientos financieros reportados corresponden al mes de mayo de 2024.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/06/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94,00%
Meta Física Ejecutada % 57,68%
Avance o Atraso Físico % -36,32%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,8
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	145

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	7				100,0%
Ejec					
Prog	0,8				100,0%
Ejec					
Prog	145				100,0%
Ejec	60				41,4%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Luis

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ S.A.S	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
	KM0+300 Vía Agrado - Muelle Guaraní	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 3
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Luis - Garzón

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


El viernes 14/06/2024 se realizó el comité operativo No. 6 donde se autorizó la transferencia de recursos No. 4 correspondiente al pago de honorarios de contadora y residente, primera quincena de junio del personal operativo, el saldo de los materiales de construcción, viajes de agregados y el pago a la JAC del reintegro de póliza que ampara la prórroga No. 3 hasta 30 de junio de 2024 y retenciones del mes de mayo de 2024. Dicha transferencia fue radicada el 18/06/2024.

Durante la semana se realizó la instalación de la formaleta en madera y la fundición del concreto ciclopeo en una longitud de 54 m, para luego realizar las excavaciones manuales de vigas riostras y poder efectuar la instalación del acero de refuerzo armado previamente. Así mismo, se instaló el acero en las secciones de huellas y berma-cunetas, para fundir el concreto de placa huella en una longitud de 60 m.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado continuar con las excavaciones de vigas riostras, instalación de aceros y fundición de concretos ciclópeo y concreto reforzado de placa huella.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

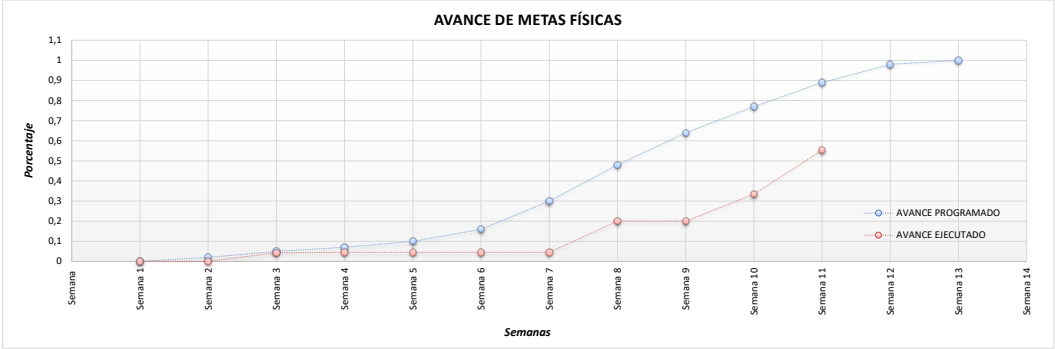

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundición de ciclópeo



Mezcla de concreto insitu para fundición de bordillo



Fundición de huella y berma

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar comités operativos para aprobación de proveedores y desembolsos que halla lugar, con el fin de dar inicio a las obras, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas.	FIRMA: NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 28 del 21/06/2024 al 27/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,80 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 145 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	EDWIN JOVAN GARZON CARVAJAL				
CONVENIO No.	4176 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	188.483.432,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	188.483.432,00
SUSPENSIÓN No. 1:	30/12/2023 hasta	18/01/2024		$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	19/01/2024			$	-
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	25/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	29/05/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
PRÓRROGA No. 2:	24/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	29/05/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.483.432			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 167.051.035			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 20.432.397			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 15.943.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 66.700.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 140.457.826,00**	**74,92%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 139.053.247,74	99,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 126.004.315,79	89,71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (13.048.931,95)	-9,29%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.022.891,30	5,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 44.984.610,73	32,03%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 37.961.719,43	27,03%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.213.735,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 3.960.910,90	94,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ 4.034.999,57	95,76%
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.811.871,00**	**22,84%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 41.527.514,87	97,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 19.280.495,70	45,04%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.817.416,45	99,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 81.817.416,45	99,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 826.438,55	1,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 826.438,55	1,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MARZO
VALOR FACTURA: $ 15.943.000,00

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$**	**188.105.183,00**	**100,33%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	184.541.673,51	98,11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$	149.319.811,06	79,38%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$**	**187.483.432,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$	2.854.000,00	1,52%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$	167.051.034,80	89,10%

Observaciones:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/06/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,00%
Meta Física Ejecutada % 89,71%

Avance o Atraso Físico % -9,29%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,8
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	145

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	7				100,0%
Ejec					
Prog	0,8				100,0%
Ejec					
Prog	145				100,0%
Ejec	123				84,8%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Luis

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ S.A.S	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	KM0+300 Vía Agrado - Muelle Guaraní	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 3
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Luis - Garzón

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El martes 25/06/2024 se realizó trámite a la transferencia de recursos No. 5 correspondiente al pago de nómina de la segunda quincena del mes de junio. Durante la semana se realizó la instalación de la formaleta en madera y la fundición del concreto ciclopeo en una longitud acumulada de 129 m, para luego realizar las excavaciones manuales de vigas riostras y poder efectuar la instalación del acero de refuerzo armado previamente. Así mismo, se instaló el acero en las secciones de huellas para realizar una fundición en una longitud acumulada de 123 m y berma-cunetas en una longitud acumulada de 81 m.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado continuar con las excavaciones de vigas riostras, instalación de aceros y fundición de concretos ciclópeo y concreto reforzado de placa huella.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

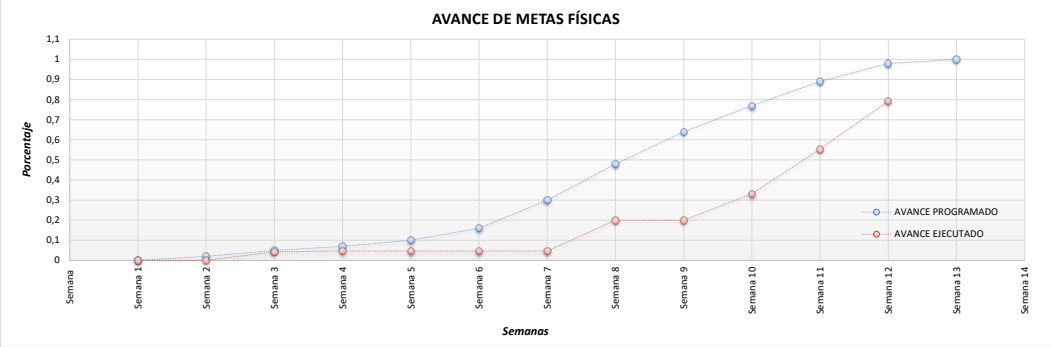

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundición de ciclópeo e instalación de acero de refuerzo



Fundición de concreto reforzado de placa huella



Terminado de superficie del concreto de placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar comités operativos para aprobación de proveedores y desembolsos que halla lugar, con el fin de dar inicio a las obras, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas.	FIRMA: NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 29 del 28/06/2024 al 4/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,80 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 145 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	EDWIN JOVAN GARZON CARVAJAL				
CONVENIO No.	4176 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	188.483.432,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	188.483.432,00
SUSPENSIÓN No. 1:	30/12/2023 hasta	18/01/2024		$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	19/01/2024			$	-
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	25/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	29/05/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
PRÓRROGA No. 2:	24/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	29/05/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.483.432			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 167.051.035			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 20.432.397			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 15.943.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 66.700.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 140.457.826,00**	**74,92%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 140.457.826,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 166.259.786,03	118,37%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 25.801.960,03	18,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.404.578,26	1,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40.831.940,64	29,07%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 39.427.362,38	28,07%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.213.735,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 4.213.735,00	100,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ 4.034.999,57	95,76%
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.811.871,00**	**22,84%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 42.811.871,00	100,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 19.548.193,89	45,66%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.643.855,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.643.855,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 826.438,55	1,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 826.438,55	1,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MARZO
VALOR FACTURA: $ 15.943.000,00

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 187.483.432,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 187.483.432,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 189.842.979,49	101,26%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 187.483.432,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ -	
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 167.051.034,80	89,10%

Observaciones:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/06/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00%
Meta Física Ejecutada % 118,37%

Avance o Atraso Físico % 18,37%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,8
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	145

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	7				100,0%
Ejec	6				85,7%
Prog	0,8				100,0%
Ejec	0,6				75,0%
Prog	145				100,0%
Ejec	146				100,7%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Luis

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ S.A.S	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	KM0+300 Vía Agrado - Muelle Guaraní	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 3
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Luis - Garzón

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Durante la semana se remitieron los documentos correspondientes a la gestión socio ambiental para su revisión y radicación ante el INVIAS, los cuales se encuentran en revisión por parte de la profesional ambiental y residente de la interventoría.

Por otra parte, se completó la meta física de 146 m acumulados de placa huella, incluyendo la losa de transición inicial, dando cumplimiento a la longitud presupuestada en el convenio solidario.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado realizar comité operativo de consolidación de trámites administrativos, financieros, de la gestión socio ambiental, con el fin de poder adelantar la liquidación del convenio solidario. Adicionalmente, se tiene programado revisar los materiales en bodega para que la Junta de Acción Comunal pueda continuar en la construcción de placa huella y losa de transición final, según lo han manifestado durante la semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

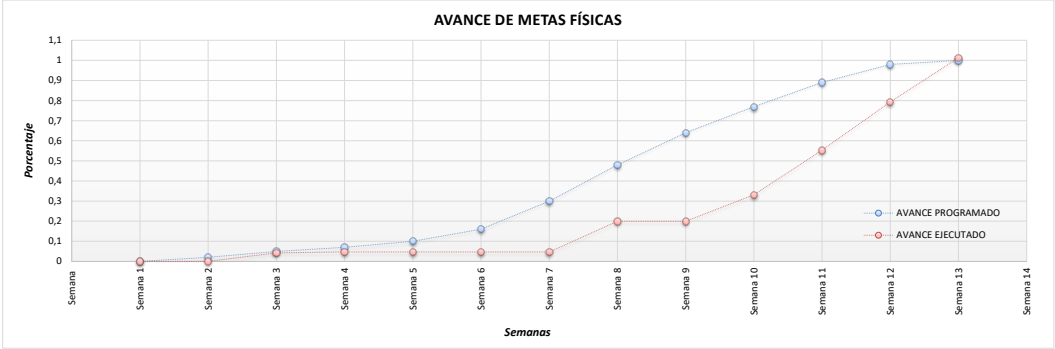

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundición de concreto reforzado de placa huella



Fundición de concreto reforzado de placa huella



Fundición de concreto reforzado de placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar comités operativos para aprobación de desembolsos que halla lugar, así como la revisión de las obras ejecutadas y el cumplimiento de los trámites administrativos y de la gestión socio ambiental.	FIRMA: NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No: 4170 DE 0000 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

NOMBRE ARL: COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BENEDICTO MEDINA	12190726	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.600.000	$ 111.400	V	SANITAS	9467864774	$ 200.000	COLPENSIONES	9469715674	$ 256.000	$ 64.000	$ -	$ -	
2	MANUEL AGUSTIN NARANJO	1077876326	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.300.000	$ 90.500	V	EMSANAR	9467864774	$ 162.500	COLPENSIONES	9469715674	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
3	JOSE EDIMER FIERRO	12197886	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9467864774	$ 162.500	COLFONDOS	9469715674	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4	ELKIN ALEXIS FIERRO	1077847222	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9467864774	$ 162.500	COLFONDOS	9469715674	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
5	JOSE EDGAR MEDINA VILLANUEVA	12188565	MAESTRO	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.400.000	$ 97.500	V	N/A	9469781508		N/A	9469781508					
6	NORMAN NICOLA MANCERA V	109164759	RESIDENTE	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.400.000	$ 97.500	V	N/A	9469781508		N/A	9469781508					
	YURI PARRA	1077868669	CONTADORA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.300.000	$ 6.800	I	NUEVA EPS	9467864774	$ 162.500	COLPENSIONES	9467864774	$ 208.000				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: Norman Nicolas Velasquiz Mancera
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Etnica
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Firma:
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 26202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900016133	6	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLANTA	VEREDA SAN LUIS	GARZON-HUILA	3208638205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07		9469715674	E	2024/07/09			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1077847222	FIERRO MURCIA ELKIN ALEXIS	X	X																25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
2	CC	12197886	FIERRO URRIAGO JOSE EDIMER	X	X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
3	CC	12190726	MEDINA VILLANUEVA BENEDICTO	X	X																25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$1,600,000	$80,000	No	$711,400
4	CC	1077876326	NARANJO GOMEZ MANUEL AGUSTIN	X	X																230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$162,500	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
Total	**Afiliados(4)**																						$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$687,500			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$382,900		$5,500,000	$275,000		$2,445,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900016133	6	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLANTA	VEREDA SAN LUIS	GARZON-HUILA	3208638205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07		9469715674	E	2024/07/09			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$880,000	$0	$0	$880,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$464,000	$0	$0	$464,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$382,900	$0	$0	$382,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$382,900	$0	$0	$382,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$220,000	$0	$0	$220,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	$220,000	$0	$0	$220,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$687,500	$0	$0	$687,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$0	$0	$200,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$165,000	$0	$0	$165,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$165,000	$0	$0	$165,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$110,000	$0	$0	$110,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$110,000	$0	$0	$110,000
TOTAL				**4**	**$2,445,400**	**$0**	**$0**	**$2,445,400**

2024/07/08 09:21 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077868669		PARRA SERRANO YURI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12a # 3 - 21 BR floresta	GARZON-HUILA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	1000000466	9467864774	I	2024/06/19	2024/06/13	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1077868669	PARRA YURI	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077868669		PARRA SERRANO YURI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12a # 3 - 21 BR floresta	GARZON-HUILA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	1000000466	9467864774	I	2024/06/19	2024/06/13	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3 **MES:** JUNIO 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

CONVENIO No. 4176 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 187.483.432,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4597 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Cuenta de cobro		13-jun-24	EDWIN JOVAN GARZÓN CARVAJAL JAC SAN LUIS	$ 1.246.000,00	6	RETENCIONES MAYO
Cuenta de cobro		13-jun-24	EDWIN JOVAN GARZÓN CARVAJAL JAC SAN LUIS	$ 174.816,00	6	POLIZA
Cuenta de cobro	2	17-jun-24	INGENIERO RESIDENTE NORMAN NICOLÁS VELASQUEZ	$ 3.500.000,00	6	HONORARIOS RESIDENTE
Cuenta de cobro	2	13-jun-24	CONTADORA YURI ANDREA PARRA SERRANO	$ 1.400.000,00	6	HONORARIOS CONTADORA
Cuenta de cobro	3	12-jun-24	JACINTO CARVAJAL BLASQUEZ	$ 12.500.000,00	3	TRANSPORTE DE AGREGADOS
Factura electrónica	F3FJ - 7014	17-jun-24	COOCENTRAL PAGO SALDO	$ 11.183.900,00	2	MATERIALES DE OBRA
Cuenta de cobro	1	17-jun-24	BENEDICTO MEDINA	$ 817.000,00	4	PAGO 1RA QUINCENA JUNIIO
Cuenta de cobro	1	17-jun-24	MANUEL AGUSTIN NARANJO	$ 679.000,00	4	PAGO 1RA QUINCENA JUNIIO
Cuenta de cobro	1	17-jun-24	JOSE EDIMER FIERRO	$ 679.000,00	4	PAGO 1RA QUINCENA JUNIIO
Cuenta de cobro	1	17-jun-24	ELKIN ALEXIS FIERRO	$ 679.000,00	4	PAGO 1RA QUINCENA JUNIIO
Cuenta de cobro	2	26-jun-24	BENEDICTO MEDINA	$ 817.000,00	4	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO
Cuenta de cobro	2	26-jun-24	MANUEL AGUSTIN NARANJO	$ 679.000,00	4	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO
Cuenta de cobro	2	26-jun-24	JOSE EDIMER FIERRO	$ 679.000,00	4	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO
Cuenta de cobro	2	26-jun-24	ELKIN ALEXIS FIERRO	$ 679.000,00	4	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 16.723.419,00	$ 8.356.672,00		$ 8.356.672,00	$ 8.366.747,00
2	MATERIALES	$ 80.706.064,00	$ 90.756.672,00	$ 11.183.900,00	$ 101.940.572,00	$ (21.234.508,00)
3	TRANSPORTE	$ 25.940.177,00	$ 14.600.000,00	$ 12.500.000,00	$ 27.100.000,00	$ (1.159.823,00)
4	MANO DE OBRA	$ 17.088.166,00	$ -	$ 5.708.000,00	$ 5.708.000,00	$ 11.380.166,00
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.213.735,00	$ 3.968.801,57		$ 3.968.801,57	$ 244.933,43
6	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 42.811.871,00	$ 13.321.173,00	$ 5.074.816,00	$ 18.395.989,00	$ 24.415.882,00
	TOTALES	$ 187.483.432,00	$ 131.003.318,57	$ 34.466.716,00	$ 165.470.034,57	$ 22.013.397,43

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (MAYO) : $ 805,71
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 1.113,06
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
REP_204_18/09/2024	$ 805,71		MAYO 2024	30/05/2024	$ 806

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
Se tiene pendiente la entrega por parte de la entidad financiera del comprobante de consignación de rendimientos financieros del mes de marzo de 2024, de acuerdo con la solicitud de realizar la transferencia VIA SEBRA al Tesorio Nacional.

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Edwin Jovan Garzón C.
Nombre: Edwin Jovan Garzón Carvajal
Presidente
Junta de Acción Comunal Vereda San Luis - Garzón

Firma:
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Firma:
Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Etnica
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Nombre: Yuri Andrea Parra
Contador del Proyecto
Apoyo Administrativo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 285997-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** 3

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 4176 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VÍA INTERVENIDA: Vereda San Luis - Vereda La Trinidad

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **CONTRATO No.** 4597 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	30 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 188.483.432,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	30 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE PRÓRROGA No. 1:	19 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 188.483.432,00
FECHA DE PRÓRROGA No. 2:	25 (Día)	DE	4 (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA DE PRÓRROGA No. 2:	29 (Día)	DE	5 (Mes)	DE	2024 (Año)		
PLAZO (MESES):	5						
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)		
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:	30 (Día)	DE	6 (Mes)	DE	2024 (Año)		

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	EDWIN JOVAN GARZÓN CARVAJAL	12.199.212	CTA COBRO	13/06/2024	$ 1.420.816,00		$ 1.420.816,00
2	NORMAN NICOLÁS VELASQUEZ MANCERA	1.091.674.759	CTA COBRO	17/06/2024	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00
3	YURI ANDREA PARRA SERRANO	1.077.868.669	CTA COBRO	13/06/2024	$ 1.400.000,00		$ 1.400.000,00
4	JACINTO CARVAJAL BLASQUEZ	12.193.068	CTA COBRO	12/06/2024	$ 12.500.000,00		$ 12.500.000,00
5	COOCENTRAL SALDO FACTURA	891101158-1	F3FJ - 7014	17/06/2024	$ 11.183.900,00		$ 11.183.900,00
6	BENEDICTO MEDINA	12.190.726	CTA COBRO	17-jun-24	$ 817.000,00		$ 817.000,00
7	MANUEL AGUSTIN NARANJO	12.197.886	CTA COBRO	17-jun-24	$ 679.000,00		$ 679.000,00
8	JOSE EDIMER FIERRO	1.077.847.222	CTA COBRO	17-jun-24	$ 679.000,00		$ 679.000,00
9	ELKIN ALEXIS FIERRO	1.077.876.326	CTA COBRO	17-jun-24	$ 679.000,00		$ 679.000,00
8	BENEDICTO MEDINA	12.190.726	CTA COBRO	26-jun-24	$ 817.000,00		$ 817.000,00
9	MANUEL AGUSTIN NARANJO	12.197.886	CTA COBRO	26-jun-24	$ 679.000,00		$ 679.000,00
10	JOSE EDIMER FIERRO	1.077.847.222	CTA COBRO	26-jun-24	$ 679.000,00		$ 679.000,00
11	ELKIN ALEXIS FIERRO	1.077.876.326	CTA COBRO	26-jun-24	$ 679.000,00		$ 679.000,00

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 35.712.716	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 161.577.627
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 8.928.323
TOTAL PAGOS	$ 35.712.716	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 170.505.950

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Edwin Jovan Garzón C.

Firma:
Nombre: Edwin Jovan Garzón Carvajal
Presidente
Junta de Acción Comunal Vereda San Luis - Garzón

Firma:
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Firma:
Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Etnica
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Nombre: Yuri Andrea Parra
Contador del Proyecto
Apoyo Administrativo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 285997-T

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No: 4176 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco			24		14	24	24	24		24	24	24	22	22			24	24	24	24	24			24	24	24	24	24	24			490
Lluvias moderadas			0		2	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			2
Lluvias intensas			0		8	0	0	0		0	0	0	2	2			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			12
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Firma
Nombre: Edgar Mauricio Argüello Maldonado
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0582894 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No.: 4176 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
1	8/05/2024	Determinación de CBR	INV E-148	PR 00+000 PR 00+150	6	< = 3%	8,29	SÍ	
2	30/05/2024	Densidad (cono y arena)	INV E-161	PR 00+030	2	95%	97,45	SÍ	
3	30/05/2024	Densidad (cono y arena)	INV E-161	PR 00+070	3	95%	95,64	SÍ	
4	30/05/2024	Densidad (cono y arena)	INV E-161	PR 00+110	2	95%	98,17	SÍ	
5	30/05/2024	Densidad (cono y arena)	INV E-161	PR 00+140	3	95%	99,20	SÍ	
6		Resistencia a la compresión (7 días)	INV E-410	PR 00+000 PR 00+150	1	N.A			Fundida del 25/06/2024 Concreto ciclópeo
7		Resistencia a la compresión (28 días)	INV E-410		2	14 Mpa			Fundida del 25/06/2024 Concreto ciclópeo
8		Resistencia a la compresión (7 días)	INV E-410	PR 00+050 PR 00+150	1	N.A			Fundida del 27/06/2024 Placa huella
9		Resistencia a la compresión (28 días)	INV E-410		2	21 Mpa			Fundida del 27/06/2024 Placa huella
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Se está a la espera de los resultados de las muestras de cilindros de concreto.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Firma

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 4176 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 188.483.432,00

VALOR ACUMULADO: $ 188.483.432,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 37.696.687,00	2	12	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.424.172,00	2	12	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 56.545.030,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299715

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	2	12	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100074298 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 37.696.687,00	31	12	2023	01/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.424.172,00	31	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 56.545.030,00	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299715

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/03/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	2	12	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100074298 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/03/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 37.696.687,00	30	4	2024	01/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.424.172,00	30	4	2024	31	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 56.545.030,00	31	5	2024	31	5	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299715
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	2	12	2023	31	5	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100074298 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/05/2024

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 37.696.687,00	30	4	2024	01/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.424.172,00	30	4	2024	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 56.545.030,00	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299715

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA						
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	2	12	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100074298 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/06/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

interventoría a las obras de adecuación de cubiertasACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 6	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 14/06/2024

Vereda – Municipio - Departamento: San Luis – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 4176 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal Vereda San Luis

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Edwin Jovan Garzón Carvajal	Junta de Acción Comunal	Presidente
Luis Enrique López Arias	Junta de Acción Comunal	Tesorero
Norman Nicolas Velásquez Mancera	Junta de Acción Comunal	Residente
Yuri Andrea Parra Serrano	Junta de Acción Comunal	Contadora
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y avance del convenio

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Avance técnico y financiero.
3- Autorización de transferencia de recursos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorero, así como el secretario, la contadora y el residente. por parte de la interventoría, la directora y el residente

2.	**Avance técnico y financiero:** Se presentan los siguientes avances del proyecto por parte de los profesionales: • Residente: A la fecha se ha realizado la fundición de 48 m de placa huella con la respectiva rampa de acceso de 2 m. Se está realizando el acopio de arena y triturado, para luego continuar con el cargue de material de construcción faltante de acuerdo con el saldo pendiente a pagar en la transferencia aprobada el día de hoy. • Contadora: Se realizaron las minutas de contratación, seguimiento al proceso de afiliación del personal operativo, entrega de los elementos de la gestión social en la JAC. Además, se realizaron la presentación y pago de los impuestos del mes de mayo de 2024. A la fecha, se está realizando la conciliación bancaria con corte a 31 de mayo de 2024 de acuerdo con el extracto bancario.
3.	**Autorización de transferencia de recursos:** Se realizan las autorizaciones de transferencia de los proveedores aprobados en este comité: • Materiales de construcción: COOCENTRAL. Saldo del 20%. Por valor de $ 11.183.900,00. • Retenciones mayo: EDWIN JOVAN GARZÓN. Por valor de $ 1.246.000,00. • Reembolso de pólizas: EDWIN JOVAN GARZÓN. Prórrogas No. 2 y No. 3 por valor de $ 174.816,00. • Transporte de materiales pétreos: JACINTO CARVAJAL BLASQUEZ. 25 viajes de arena y triturado. Por valor de $ 12.500.000,00. • Nómina: Primera quincena del 01 al 15 de junio de 2024. Por valor de $ 2.854.000,00. • Honorarios residente: $ 3.500.000,00. • Honorarios contadora: $ 1.400.000,00.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	**Aprobación:** Transferencias de recursos No. 4. • Se aprueba la transferencia de recursos por un valor total de $ 32.858.716,00.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

2.	Informe Ejecución Financiera:	SI ____	NO _X_	No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO _X_	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI ____	NO _X_	No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Realizar transferencia de recursos No. 4	Contadora	17/06/2024
Realizar georreferenciación del tramo y las alcantarillas localizadas en él	Residente	17/06/2024
Informes contables y administrativos	Contadora	18/06/2024
Diseño geométrico y estructural	Residente	18/06/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación


FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor




Nombre: Edwin Jovan Garzón Carvajal
Cargo: Presidente OAC San Luis



Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor



Nombre: Luis Enrique López Arias
Cargo: Tesorero OAC San Luis



Nombre: Norman Nicolas Velasquez
Cargo: Residente Convenio San Luis



Nombre: Yuri Andrea Parra Serrano
Cargo: Contador Convenio San Luis

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

Instituno Nacional de Vias - INVIAS
Nit: 800.215.807-2
Junta de Acción Comunal de San Luis
Nit: 900.016.133-6
Convenio Solidario No. 4176 de 2023, Garzón (Huila)
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($188.483.432)
-Lunes 15 de Abril de 2024.
Se realiza socialización del proyecto de la mano del equipo de trabajo social de INVIAS, JAC e Interventoria, donde se solicita apoyo a la comunidad en general para la ejecución del mismo, a su vez, se relaciona el personal administrativo a laborar en el proyecto.

Ing. Norman Velasquez Mancera // Ing. Mauricio Argüello
Residente de Obra. Residente interventoria

-Martes 16 de Abril a Sabado 20 de Abril - 2024.
Se inicia con el proceso de cotizaciones y revisión de proveedores para el proyecto, donde se crea y registra una base de datos para la buena gestión y trasparencia del proceso, se realiza acojida de hojas de vida para la contratación de mano de obra no calificada, se acuerda sitio de bodega, punto de suministro de agua sitio de disposición final de escombros.

Ing. Norman Velasquez M. // Ing. Mauricio Argüello
Residente de Obra Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

-Lunes 22 de Abril a Sabado 27 de Abril -2024
Se realizan trasferencias a proveedores y/o prestadores de servicios para la ejecución de los diseños geometrico y estructural, topografia, laboratorios de suelos, suministros de materiales petreos, suministro de materiales de ferreteria, se proyecta y presenta programación de la obra, se presenta flujograma de inversión de recursos.

Ing. Norman Velasquez Mancera // Ing. Mauricio Argüello
Residente de Obra. // Residente de interventoria

-Martes 30 de Abril de 2024.
Tiempo: Soleado.
Personal Obra: 1 Ingeniero, 1 Cuadrilla Laboratorios.
Se realizan apiques y analisis respectivo a sitio de obra donde se construira la placa huella.

Ing. Norman Velasquez M. // Ing. Mauricio Argüello
Residente de Obra. // Residente de interventoria

-Miercoles 1 de Mayo a Sabado 4 de Mayo -2024.
Tiempo: Soleado.
Personal de obra: 1 Ingeniero, 1 Cuadrilla topografica.
Se realiza levantamiento topografico de via, se realiza abscisado a via, inicia proceso de diseño geometrico y estructural del proyecto.

Ing. Norman Velasquez Mancera // Ing. Mauricio Argüello
Residente de Obra. // Residente de interventoria

-Lunes 6 de Mayo de 2024
Tiempo: Soleado
Maquinaria Utilizada: 1 Motoniveladora
Personal de Obra: 1 Ingeniero, 1 Operador, 2 paresiga.
Inicia actividad de corte, relleno y cereo de rasante existente,

Scanned with CamScanner

Se realiza ampliación de vía existente.
Llegada a obra de elementos de medidas ambientales y valla del proyecto.
Se realiza instalación de valla informativa.

Ing. Norman Velasquez M
Residente de obra.

Ing. Mauricio Argüello
Residente de interventoría

-Martes 7 de Mayo de 2024.
Tiempo: fuertes lluvias entre las 03:00 a.m. a las 09:00 a.m.
Maquinaria utilizada: 1 motoniveladora.
Personal de Obra: 1 Ingeniero, 1 Operador, 2 paresiga.
Se realiza conformación total de subrasante, ampliación de vía y cortes y rellenos necesarios.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.

Ing Mauricio Argüello
Residente de interventoría

-Miercoles 8 de Mayo a Sabado 11 de Mayo -2024.
Se realiza contratación con la empresa que suministra material de subbase para el proyecto, se realiza contratación de Equipo de trasporte de materiales Petreos desde MASSEQ (Ubicada en el municipio de Agrado-Huila) a sitio de obra, con un recorrido aproximado de ±60 Km.

Ing. Norman Velasquez Mancera
Residente de Obra.

Ing. Mauricio Argüello
Residente de interventoría

-Lunes 13 de Mayo a Sabado 18 de Mayo -2024.
Se realiza cargue, transporte y descargue de subbase a sitio de obra, donde a su vez se realiza programación de maquinaria amarilla según disponibilidad por parte de gobierno local que brindara aporo a la JAL.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra

Ing. Mauricio Argüello
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

-Lunes 20 de Mayo de 2024
Tiempo: Soleado
Se realiza visita autorizada a MASSTQ, planta de suministro de materiales petreos para toma de muestras de material aleatoriamente para laboratorio.

Ing. Norman Velasquez M. // Ing. Mauricio Argüello
Residente de obra. Residente de interventoria

-Martes 21 de Mayo y Miercoles 22 de Mayo-2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria utilizada: 2 Volquetas.
Personal obra: 1 Ingeniero, 2 Operadores.
Continua Cargue, transporte y descargue de subbase en sitio de obra.

Ing. Norman Velasquez M. // Ing. Mauricio Argüello
Residente de obra. Residente de interventoria

-Jueves 23 de Mayo de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria utilizada: 2 Volquetas
Personal de Obra: 1 Ingeniero, 2 operadores.
Continua cargue, tranporte y descargue de subbase en sitio de obra.
Llegada de materiales de ferreteria, adecuación de bodega.

Ing. Norman Velasquez M. // Ing. Mauricio Argüello
Residente de obra. Residente de interventoria

-Lunes 27 de mayo de 2024
Tiempo: Soleado.
Maquinaria Utilizada: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 2 volquetas sencillas, 1 volqueta doble troque.
Personal de Obra: 1 Ingeniero, 5 operadores, 2 paresigas.

Scanned with CamScanner

Extensión y compactación de subbase a tramo de ± 250 metros lineales.
Continua cargue, transporte y descargue de material de subbase a sitio de obra.
Cerramiento provisional a vía.

Ing. Norman Velasquez M. // Ing. Mauricio Argüello
Residente de Obra. // Residente de interventoría

- Martes 28 de Mayo a Miercoles 29 de Mayo - 2024
Tiempo: Soleado.
Transporte y llegada de formaleta de madera a sitio de obra.
Aprobación y pagos de proveedores y/o suministro de materiales de obra.

Ing. Norman Velasquez M. // Ing. Mauricio Argüello
Residente de obra. // Residente de interventoria

- Jueves 30 de Mayo de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria utilizada: 2 Volquetas, 1 Camioneta.
Personal Obra: 1 Ingeniero, 2 Operadores, 1 cuadrilla de Laboratorios.
Toma de densidades a subbase instalada.
Llegada de materiales de ferreteria.

Ing. Norman Velasquez M. // Ing. Mauricio Argüello
Residente de obra. // Residente de interventoria

- Viernes 31 de Mayo de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria utilizada: 1 Volqueta
Personal obra: 1 Ingeniero, 1 Operador.
Llegada a sitio de obra de material de ferreteria, almacenado en bodega.

Ing. Norman Velasquez M. // Ing Mauricio Argüello
Residente de obra. // Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

-Lunes 3 de Junio y Martes 4 de Junio -2024.
Tiempo: Soleado.
Personal Obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes de obra.
Figurado y corte de acero para flejes y conformación de vigas riostras.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.

Ing. Mauricio Argüello
Residente interventoría

-Miercoles 5 de Junio de 2024.
Tiempo: Lluvias, entre las 04:00 a.m a 02:00 p.m.
Maquinaria utilizada: 3 volquetas.
Personal de obra: 1 Ingeniero, 3 operadores, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes de obra.
Transporte de materiales petreos a sitio de obra, tales coma arena y triturado.
Continua figurado de estribos de refuerzo.
Continua armado de vigas riostras.
Adecuación de bodega.
Mejoramiento de via de acceso a proyecto.

Ing. Norman Velasquez Mancera
Residente de obra.

Ing. Mauricio A
Residente interventoría

-Jueves 6 de Junio de 2024.
Tiempo: Soleado
Maquinaria utilizada: 1 mezcladora de concreto, 2 volquetas
Personal Obra: 1 Ingeniero, 2 operadores, 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes de obra, 6 ayudantes JAC.
Transporte de materiales petreos a sitio de obra
Formaleteo de 24 ml de concreto ciclopeo
Fundido de concreto ciclopeo entre los PR0+000 al PR0+024.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de obra.

Ing. Mauricio Argüello
Residente de interventoría

-Viernes 7 d
Tiempo: Sol
Maquinaria u
Personal de o
1 oficial, 3 a
Transporte de
Instalación
placa huella
Ing. Norman
Residente Ob
-Sabado 8
Tiempo: Sole
Llegada de
Llegado de
obra, segun
trabajo en
Ing. Norman
Residente de
-Lunes 10 d
Tiempo: Sole
Maquinaria Ut
Personal de ob
ayudantes de
Fundido de
Instalación
placa Huella
Ing. Norman
Residente de
-Martes 11
Tiempo: Sole
Maquinaria u
Personal de O
dantes de ob

- Viernes 7 de Junio de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria Utilizada: 2 volquetas.
Personal de obra: 1 Ingeniero, 2 operadores, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes de obra, 8 ayudantes JAC.
Transporte de materiales petreos a sitio de obra.
Instalación y armado de acero estructural de placa huella entre los PROTOOO al PROTOLS.

Ing. Norman Velasquez M. // Ing Mauricio Argüello
Residente Obra. Residente de interventoria

- Sabado 8 de Junio de 2024.
Tiempo: Soleado.
Llegada de materiales petreos a sitio de obra.
Llegado de mezcladora de concreto a sitio de obra, segunda mezcladora para 2ª cuadrilla de trabajo en obra.

Ing. Norman Velasquez M. // Ing. Mauricio Argüello
Residente de Obra. Residente de interventoria

- Lunes 10 de Junio de 2024.
Tiempo: Soleado
Maquinaria Utilizada: 2 mezcladoras de concreto.
Personal de Obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes de obra, 10 ayudantes JAC.
Fundido de placa huella entre los PROTOOO al PROTO24.
Instalación y armado de acero estructural de placa huella entre los PROTOLS al PROTO24.

Ing. Norman Velasquez M. // Ing Mauricio Argüello
Residente de Obra. Residente de interventoria

- Martes 11 de Junio de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria Utilizada: 2 mezcladoras de concreto.
Personal de Obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes de obra, 6 ayudantes JAC.

Scanned with CamScanner

Fundido de berma cuneta de placa huella entre los PR 0+000 al PR 0+024, margen derecha e izquierda.
Encofrado y fundido de concreto ciclopeo entre los PR 0+024 al PR 0+039.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.

Ing. Mauricio Agudelo
Residente de interventoría

-Miercoles, 12 de Junio de 2024
Tiempo: Soleado.
Maquinaria utilizada: 2 mezcladoras de concreto
Personal de obra: 1 Ingeniero 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes de obra, 8 ayudantes de obra.
Armado figurado e instalación de acero estructural de placa huella entre los PR 0+024 al PR 0+039.
Fundido de concreto ciclopeo entre los PR 0+039 al PR 0+048.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.

Ing. Mauricio Agudelo
Residente de interventoría

-Jueves 13 de Junio de 2024
Tiempo: Lluvias fuertes entre las 1200 p.m. a 02:00 p.m
Maquinaria utilizada: 2 mezcladoras de concreto.
Personal de obra: 1 Ingeniero 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes de obra, 8 ayudantes JAC
Fundido de placa huella entre los PR 0+024 al PR 0+048 margen derecha e izquierda

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.

Ing. Mauricio Agudelo
Residente de interventoría

- Viernes 14 de Junio de 2024.
Tiempo Lluvias fuertes entre las 04:00 a.m. a 10:00 a y las 02:00 p.m. y 03:00 p.m.
Maquinaria utilizada: 2 mezcladoras de concreto.
Personal de Obra: 1 Ingeniero 1 maestro, 1 oficial,

Scanned with CamScanner

3 ayudantes de obra, 8 ayudantes JAC.
Fundido de beima cuneta de placa huella entre los PR 0+024 al PR 0+048, margen derecha e izquierda.
Fundido de bordillo entre los PR 0+000 al PR 0+024.

Ing. Norman Velasquez M. / Ing. Mauricio Argüello
Residente de obra. / Residente de interventoría

-Lunes 17 de Junio de 2024
Tiempo: soleado.
Maquinaria utilizada: 2 mezcladoras de concreto.
Personal de obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes de obra, 6 ayudantes JAC.
Fundido de bordillo entre los PR 0+024 al PR 0+050.
Fundido de concreto ciclopeo entre los PR 0+048 al PR 0+090.

Ing. Norman Velasquez M. / Ing. Mauricio Argüello
Residente de obra. / Residente de interventoría

-Martes 18 de Junio de 2024
Tiempo: soleado.
Maquinaria utilizada: 2 mezcladoras de concreto.
Personal de obra: 1 Ingeniero, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes de obra, 4 ayudantes JAC.
Fundido de placa huella entre los PR 0+048 al PR 0+060.
Armado de acero estructural de placa huella entre los PR 0+048 al PR 0+090.
Instalación de vigas riostras entre los PR 0+048 al PR 0+090.

Ing. Norman Velasquez M. / Ing. Mauricio Argüello
Residente de obra. / Residente de interventoría

-Miercoles 19 de Junio de 2024.
Tiempo: Soleado
Maquinaria utilizada: 2 mezcladoras de concreto.

Scanned with CamScanner

Personal de obra: 1 Ingeniero, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes de obra, 6 ayudantes JAC.
Llegada de materiales petreos a obra.
Corte, figurado e instalación de acero estructural de berma cuneta.

Ing. Norman Velasquez Mancera.
Residente de Obra

Ing. Mauricio Argüello
Residente de interventoria

-Jueves 20 de Junio de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria Utilizada: 2 mezcladoras de concreto.
Personal de Obra: 1 Ingeniero, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes de obra, 5 ayudantes JAC.
Llegada de materiales petreos.
Fundido de placa huella entre los PR0+060 al PR 0+090.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.

Ing. Mauricio Argüello
Residente de interventoria

-Viernes 21 de Junio de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria Utilizada: 2 mezcladoras de concreta
Personal de Obra: 1 Ingeniero, 1 Maestro 1 oficial de obra, 3 ayudantes de Obra, 6 ayudantes JAC.
Figurado y armado de acero estructural de berma cuneta entre los PR 0+048 al PR 0+070.
Fundido de berma cuneta entre los PR0+048 al PR0+060, margen derecha eizquierda.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.

Ing. Mauricio Argüello
Residente de interventoria

-Lunes 24 de Junio de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria Utilizada: 2 mezcladoras de concreto.
Personal de Obra: 1 Ingeniero, 1 Maestro 1 oficial de Obra, 3 ayudantes de obra, 6 Ayudantes JAC.

Scanned with CamScanner

Fundido de berma cuneta entre los PR0+000 al PR 0+090, margén derecha e izquierda.
Formaleteo y fundido de concreto ciclopéo entre los PR0+090 al PR 0+144.
Fundido de placa huella entre los PR0+090 al PR 0+120.
Instalación de acero estructural entre los PR0+090 al PR 0+120.

Ing. Norman Velasquez M. // Ing. Mauricio Argüello
Residente de Obra. Residente de interventoría
-Martes 24 de Junio de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria Utilizada: 2 mezcladoras de concreto.
Personal de Obra: 1 Ingeniero, 1 Maestro, 1 Oficial de obra, 3 ayudantes de obra, 7 Ayudantes de JAC.
Continua fundido de placa huella entre los PR0+090 al PR0+120.

Ing. Norman Velasquez Mancera. // Ing. Mauricio Argüello
Residente de Obra. Residente de interventoría
-Miercoles 26 de Junio de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria Utilizada: 2 mezcladoras de concreto.
Personal de Obra: 1 Ingeniero, 1 Maestro, 1 Oficial de obra, 3 ayudantes de obra, 7 Ayudantes JAC.
Fundido de berma cuneta entre los PR0+090 al PR 0+130 margén izquierda y derecha.

Ing. Norman Velasquez M. // Ing. Mauricio Argüello
Residente de Obra. Residente de interventoría
- Jueves 27 de Junio de 2024.
Tiempo: Soleado
Maquinaria Utilizada: 1 Ingeniero, 1 Maestro, 1 oficial 3 ayudantes de obra, 7 Ayudantes JAC.
Formaleteo y fundido de concreto ciclopéo entre

Scanned with CamScanner

los PR0+130 al PR0+147.
Figurado e instalación de vigas Riostras entre los PR0+130 al PR0+147.

Ing. Norman Velasquez M. / Ing. Mauricio Argüello
Residente de Obra. / Residente de interventoria
- Viernes 28 de Junio de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria Utilizada: 2 mezcladoras de concreto.
Personal de Obra: 1 Ingeniero, 1 Maestro, 1 Oficial, 3 ayudantes de obra, 7 ayudantes JAC.
Fundido de placa huella entre los PR0+130 al PR0+147

Ing. Norman Velasquez M. / Ing. Mauricio Argüello
Residente de Obra. / Residente de interventoria
- Sabado 29 de Junio de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria Utilizada: 2 mezcladoras de concreto
Personal de Obra: 1 Ingeniero, 1 Maestro, 1 Oficial Obra, 3 ayudantes de obra, 7 ayudantes JAC
Fundido de berma cuneta entre los PR0+130 al PR0+147.
Fundido de bordillo entre los PR0+048 al PR0+130.

Ing. Norman Velasquez M. / Ing. Mauricio Argüello
Residente de Obra. / Residente de interventoria
- Lunes 1 de Julio de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria Utilizada: 2 mezcladoras de concreto.
Personal de Obra: 1 Ingeniero, 1 Maestro, 1 Oficial Obra, 3 ayudantes obra, 7 Ayudantes JAC.
Se cumple meta contractual del proyecto, por cuenta propia de la JAC se responsabilizan de la ejecución de los siguientes metros lineales a construir de placa huella.
Fundido de bordillo entre los PR0+130 al PR0+147.

Scanned with CamScanner

Fundido de concreto ciclopeo entre los PR 0+147 al PR 0+180

Ing. Norman Velasquez M
Residente de Obra

Ing. Mauricio Argüello
Residente de interventoría

- Martes 2 de Julio de 2024.
Tiempo: Soleada
Maquinaria Utilizada: 2 mezcladoras de concreto.
Personal de obra: 1 Ingeniero, 1 Maestro, 1 oficial, 8 ayudantes JAC.
Fundido de placa huella entre los PR 0+147 al PR 0+180.
Armado e instalación de acero estructural de placa huella.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente Obra

Ing. Mauricio Argüello
Residente de interventoría

- Miercoles 3 de Julio de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria Utilizada: 2 mezcladoras de concreto.
Personal de Obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 7 ayudantes de obra.
Armado e instalación de acero estructural de berma cuneta entre los PR 0+147 al PR 0+180.
Fundido de berma cuneta entre los PR 0+147 al PR 0+180 margen derecha e izquierda.

Ing. Norman Velasquez Marcera.
Residente de Obra.

Ing. Mauricio Argüello
Residente de interventoría

INTERVENTORÍA

- Personal, control de aportes legales y seguridad social
- Informe financiero y presupuestal
- Seguimiento garantías

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30 / 6 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4597 DE 2023

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024

PROYECTO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATO DE OBRA No.: 3802 DE 2023, 4176 DE 2023, 4126 DE 2023, 4777 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARZON - LA CABAÑA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARZON - SAN LUIS; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARZON - POTRERILLOS; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARZON - EL MESON

NOMBRE ARL: ARL POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR HUILA

VERIFICACION PERSONAL, DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	55.181.920	Directora de interventoria	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	$ 1.300.000	$ 31.700	V	SANITAS	7933880103	$ 162.500	COLPENSIONES	7933880103	$ 208.000	$ 26.000	$ -	$ -	
2	EDGAR MAURICIO ARGUELLO MALDONADO	1.075.297.121	Ingeniero Residente	$ 2.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 2.600.000	$ 181.000	V	NUEVA EPS	7934409064	$ 104.000	COLFONDOS	7934409064	$ 416.000	$ 104.000	$ -	$ -	
								$ -												
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 3.900.000																

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma

WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No: Matrícula profesional No.: 25202-087784 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	55181920
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SILVIA LORENA ORDONEZ OBANDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 18 41 00	TELÉFONO:	8577542
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - PENSION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7934409064**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		21			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		802141019

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 208.000	$ 3.300	$ 211.300
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.600	$ 0	$ 416.000	$ 6.600	$ 422.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.600	$ 0	$ 416.000	$ 6.600	$ 422.600
SUBTOTALES:										**$ 1.040.000**	**$ 16.500**	**$ 1.056.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 104.000	$ 1.700	$ 0	$ 105.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 156.000	$ 2.500	$ 0	$ 158.500
SUBTOTALES:													**$ 260.000**	**$ 4.200**	**$ 0**	**$ 264.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 285.100	$ 285.100	$ 4.500	$ 0	$ 289.600
SUBTOTALES:									**$ 285.100**	**$ 4.500**	**$ 0**	**$ 289.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 260.000	$ 4.200	$ 264.200
SUBTOTALES:			**$ 260.000**	**$ 4.200**	**$ 264.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	55181920
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SILVIA LORENA ORDONEZ OBANDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 18 41 00	TELÉFONO:	8577542
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - PENSION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7933880103**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	773692604

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 208.000	$ 1.600	$ 209.600
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 1.600**	**$ 209.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 162.500	$ 1.300	$ 0	$ 163.800
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 163.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 300	$ 0	$ 32.000
SUBTOTALES:									**$ 31.700**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 32.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 26.000	$ 200	$ 26.200
SUBTOTALES:			**$ 26.000**	**$ 200**	**$ 26.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 55181920	ORDOÑEZ OBANDO SILVIA LORENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	55181920	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 431.600**

Planilla Pagada

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30 6 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4597 DE 2023

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

MES INFORME MENSUAL: 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024

PROYECTO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATO DE OBRA No:	CONTRATISTA:
3802 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - LA CABAÑA
4176 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - SAN LUIS
4126 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - POTRERILLOS
4777 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - EL MESON

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1294023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	82.643.855,00	$ 6.626.855,00
					TOTAL	$ 82.643.855,00	$ 6.626.855,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 82.643.855,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DICIEMBRE	0,00		0,00					0,00	0,00		
2	ENERO	$ 16.880.000,00		$ 16.880.000,00				1294023 DEL 2023	$ 65.763.855,00	$ 65.763.855,00		
3	FEBRERO	$ 18.406.000,00		$ 18.406.000,00				1294023 DEL 2023	$ 47.357.855,00	$ 47.357.855,00		
4	MARZO	$ 15.943.000,00		$ 15.943.000,00				1294023 DEL 2023	$ 31.414.855,00	$ 31.414.855,00		
5	ABRIL	$ 12.689.000,00		$ 12.689.000,00				1294023 DEL 2023	$ 18.725.855,00	$ 18.725.855,00		
6	MAYO	$ 12.099.000,00		$ 12.099.000,00				1294023 DEL 2023	$ 6.626.855,00	$ 6.626.855,00		
7	JUNIO	$ 6.626.500,00		$ 6.626.500,00				1294023 DEL 2023	$ 355,00	$ 355,00		
TOTALES		**$ 82.643.500,00**	**$ 0,00**	**$ 82.643.500,00**					**$ 355,00**	**$ 355,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Ejecutado Año 2024	$ 82.643.500	$ -	$ 82.643.500,00
VALOR TOTAL	**$ 82.643.500,00**	**$ 0,00**	**$ 82.643.500,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. Matrícula profesional No.: 25202-087784 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4597 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 82.643.855,00

VALOR ACUMULADO: $ 82.643.855,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 8.264.390	22	11	2023	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 16.528.780	22	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30	$ 24.793.170	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100011070

Certificado de modificación o anexo No.: 533018645
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 8.264.390	17	1	2024	14/08/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 16.528.780	17	1	2024	14	2	2027
Calidad del servicio	30	$ 24.793.170	14	2	2024	14	2	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100011070

Certificado de modificación o anexo No.: 53302645 ANEXO 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 8.264.390	17	1	2024	20/11/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20	$ 16.528.780	17	1	2024	30	4	2027
Calidad del servicio	30	$ 24.793.170	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100011070

Certificado de modificación o anexo No.: 533026154 ANEXO 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 8.264.390	24	4	2024	31/12/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20	$ 16.528.780	24	4	2024	31	5	2027
Calidad del servicio	30	$ 24.793.170	31	5	2024	31	5	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100011070

Certificado de modificación o anexo No.: 533037427 ANEXO 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 8.264.390	28	5	2024	31/01/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20	$ 16.528.780	28	5	2024	1	7	2027
Calidad del servicio	30	$ 24.793.170	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100011070

Certificado de modificación o anexo No.: 533040799 ANEXO 6

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-093187

Firma

Nombre: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

Supervisor Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:25202-087784

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.
