	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - TOMO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3502 de 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

Contrato de Interventoría No. 5066 de 2023 **Interventoría:** CONSTRUMAJ SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		7/8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8/9
2.4	Características técnicas del proyecto		9/10
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		11
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12/16
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		16
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		16/17
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		17
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	17 - 67/78
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	18 - 79/80
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	18 - 81/85
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	18
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	18 - 86/88
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	18
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	18 - 89/112
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		19
	• Seguimiento a la inversión de los desembolsos		19 - 113/256
	• Seguimiento Programa de Obra		19 - 257/258
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	19
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	19 - 259/263
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	19 - 264/266
	• Informes especialistas y profesionales		19
	• Informe matriz de riesgos		N/A
5	**Conclusiones y recomendaciones**		20
6	**Anexos**		21
6,1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		22/23
6.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		24/25
6.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		26/27
6.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		28/65

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA
ERIODO MES: 01/07/2024 al 31/07/2024

CONVENIO No.: 3502 de 2023

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre del 2023
FECHA DE INICIO: 12 de diciembre del 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 de abril del 2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 31de mayo de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 05 de agosto del 2024
PLAZO ACUMULADO: 6 meses

VALOR INICIAL : $ 199.101.158,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.101.158,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5066 de 2023
INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD(ml)
Construcción de caminos comunitarios	ML	337
Construcción de carcamos	UNIDAD	4

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD(ml)	CANTIDAD ACUMULADA
Construcción de caminos comunitarios	ML	190	311
Construcción de carcamos	UNIDAD	4	4

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	144.580.384,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.337.412,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.183.362,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	198.101.158,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	97.806.089,59	141.775.723,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.395.461,00	34.244.311,00
VALOR EJECUTADO	**113.201.550,59**	**176.020.034,00**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 183.753.427,40
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 176.020.034,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 95,79%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 11
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **22**














ACTIVIDES EJECUTADAS EN TERMINOS GENERALES DURANTE ESTE MES DE REPORTE.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: Juan Diego Jimenez Serna
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. : 25202 - 097497 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATO INVIAS N° 5066-2023

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°6



Versión 2
Tomo 6

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

CONSTRUMAJ SAS
Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Residente de Interventoría **Julio César Córdoba**	**Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**	**Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**

CONVENIO SOLIDARIO No. 3502 DE 2023

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ASTILLERO – VALDIVIA, ANTIOQUIA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo del 01 al 31 de julio de 2024 por la Junta de Acción Comunal vereda El Astillero del municipio de Valdivia, Antioquia del convenio solidario No. 3502 de 2023 con número de proceso en SECOP II: SPSC-CD-CS-300-2023, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", y cuyo número de ID en SECOP II es CO1.PCCNTR.5401102.

La interventoría del Contrato del convenio la realiza Construmaj S.A.S. bajo el contrato No. 5066 de 2023 con ID en SECOP II: CO1.SLCNTR.11855324 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1. Generado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS como entidad contratante y adjudicado mediante resolución No. 4637 del 18 de diciembre de 2023 a través del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DEO-SVR-149-2023.

Mediante resolución No. 4993 de fecha 30 de diciembre de 2023, se designó como supervisor al Ing. Mauricio Hoyos Sierra, mediante Resolución No. 2418 del 14 de julio de 2022 se designó como gestor técnico al ingeniero Diego Felipe Pabón Carrillo; Gestor Social - Subdirección de Sostenibilidad: Carlos Andrés Ossa Gestor Ambiental - Subdirección de Sostenibilidad: Audry Dayanna Menjura

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS estructuró el programa "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, mediante ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO VERDA ASTILLERO-VALDIVIA, ANTIOQUIA.

De acuerdo con el Convenio No. 3502 de 2023, suscrito entre la Junta de Acción Comunal de la vereda Astillero - Valdivia, Ant. y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural de esta vereda, se tiene que; la entidad entrara a construir 440 metros de camino comunitario y 4 alcantarillas.

La vía objeto del alcance del convenio se encuentra catalogada como vía rural, y se encuentra en mal estado y sin ningún tipo de mantenimiento, deterioro en la superficie de rodadura, por lo cual se realizará la intervención a la vía, con el fin de restituir la normalidad al sitio descrito a continuación:

IDENTIFICACIÓN LAS COORDENADAS DEL TRAMO A INTERVENIR EN LA VEREDA ASTILLERO, VALDIVIA	
VEREDA ASTILLERO	• INICIA: N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6" • FINAL: N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9"

Tabla 3. Identificación de coordenadas.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA ASTILLERO – VALDIVIA, ANTIOQUIA.

Astillero es una vereda del municipio de Valdivia, Antioquia, Colombia y tiene una altitud de 1.572 Metros sobre el nivel del mar. La vereda Astillero está situada a 3 kilómetros al suroeste de Valdivia. Esta cerca de la localidad Mellizas y Santana. El tramo para mejorar se localiza desde el K0(Coordenadas de inicio N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6") a.

Figura 1. Zona de localización de la vereda Astillero.



Fuente: Google mapa

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Valdivia es un municipio de Colombia, localizado en la subregión norte del departamento de Antioquia. Limita al norte con el municipio de Taraza, por el este con los municipios de Taraza, Anorí y Yarumal, por el sur con los municipios de Yarumal y Briceño, y por el oeste con los municipios de Briceño e Ituango. Su cabecera dista 153 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 545 kilómetros cuadrados. El Municipio de Valdivia tiene un total de 13,801 Habitantes. De los cuales 7,240 habitantes son hombres lo que equivale al 49,6% del total de la población y 7,356 habitantes son mujeres lo que equivale al 50.4% del total de la población. El municipio de Valdivia tiene una población Urbana de 3,637

habitantes lo que equivale al 26,35% del total de la población y un a población Rural de 10,164 habitantes lo que equivale al 73,64% del total de la población.

Valdivia es un municipio de vocación agrícola en donde sus principales ingresos dependen de la ganadería multi propósito, la pesca, el cultivo de yuca, el plátano, maíz, madera y el cacao en menor escala. También la minería artesanal de piedra ornamental ha servido de sustento para muchas de las familias y la cual ha sido ejercida de manera tradicional. Es un municipio, que su economía se encuentra en transición, dado que esta dependía en gran parte de los cultivos de uso ilícito, los cuales fueron erradicados de manera voluntaria gracias a la implementación de los acuerdos de paz. Por ser un municipio en desarrollo, presenta muchos vacíos a nivel de movilidad vial e infraestructura.

Con el desarrollo del proyecto que se pretende ejecutar, se busca principalmente brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transpirabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el desarrollo económico de la región.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario recibido por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte de la Junta de Acción Comunal para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

VEREDA	TRAMO VIAL POR INTERVENIR	LONGITUD CAMINOS COMUNITARIO(M)	CARCAMOS (UND)
Astillero	Coordenadas de inicio N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6" Coordenadas final N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9"	337,00	4

Tabla 4. Inventario y coordenadas del tramo a intervenir.

Figura 2. Estado inicial de la vía.



Fuente: Levantamiento técnico.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía por intervenir está catalogada de tipo rural, a la cual se le realizará mejoramiento, por medio de la construcción de caminos comunitarios, y alcantarilla.

Tramo por intervenir:

Dimensiones (m)			Obra por ejecutar
L	a	H	
337,00	2,0	0,10	CAMINOS COMUNITARIOS
			4 CALCAMOS CON REJILLAS

Tabla 5. Inventario Vial.

Para las secciones, se muestran las siguientes ilustraciones, en las cuales se encuentran las secciones transversales presentadas, por el INVIAS en la cartilla de Colombia rural.

Figura 3. Diseños de camino ancestral.

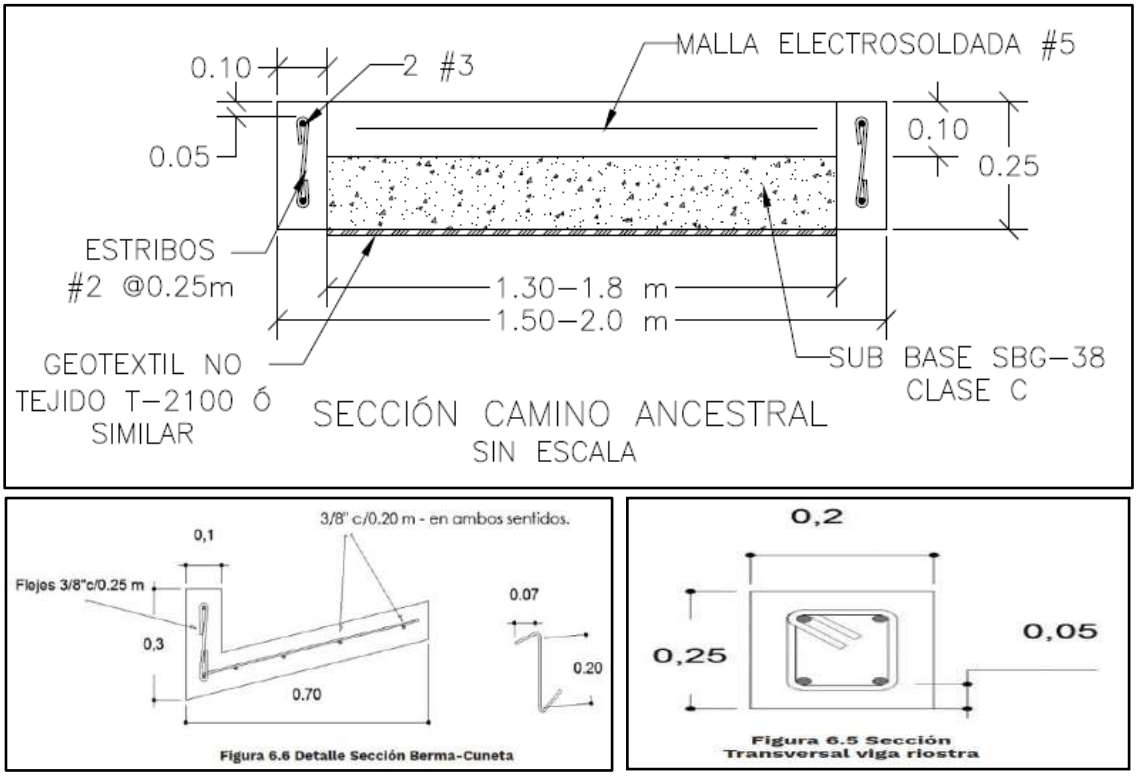


Figura 6.6 Detalle Sección Berma-Cuneta

Figura 6.5 Sección Transversal viga riostra

Fuente: Presupuesto oficial

3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO DE LA VEREDA ASTILLERO, VALDIVIA.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO DE LA VEREDA ASTILLERO, VALDIVIA.

Concepto	Fecha / Valor
NÚMERO PROCESO DE SELECCIÓN	**SPSC-CD-CS-300-2023**
NÚMERO ID DEL SECOP	**CO1.PCCNTR.5401102**
NÚMERO DEL CONTRATO	3502 de 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 de septiembre de 2023
CONTRATISTA	**JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO**
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 199.101.158
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	Vereda Astillero Calle central, sector el alto, droguería ferbland.
NÚMERO DE TELÉFONO	3015277810
CORREO ELECTRÓNICO	VEREDAASTILLEROS@GMAIL.COM
FECHA DE INICIO	12 DICIEMBRE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	31 DICIEMBRE DEL 2023
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2024
SUSPENSIÓN No. 1	26 DE ABRIL DE 2024
AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN 1	17 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	HASTA EL 05 DE AGOSTO DE 2024

Tabla 5. Información del convenio.

3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

COMPONENTE TÉCNICO:

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2024 se realizaron las siguientes actividades:

- Se termino la conformación y adecuación del terreno para instalación de malla electrosoldada.
- Se termino aplicación y compactación de subbase.
- Se termino encofrado para vaciado de concreto.
- Se termino excavaciones para vigas riostras.
- Se termino excavaciones, figurado y vaciado de concreto para cárcamos.
- Se termino vaciado de concreto de losas para camino ancestral.
- Se termino figuración e instalación de acero para vigas riostras, cárcamos

Los días 13 y 30 de julio de 2024 se realizaron los comités operativos para los desembolsos 3 y 4, respectivamente, para la compra de materiales y pago de nómina. Por parte de la JAC estuvo el presidente de la JAC, el contador, el residente de obra, un veedor de la comunidad y el tesorero y de parte de la interventoría estuvo; la profesional social y el residente de interventoría. En dichos comités, se expuso los detalles de cada transacción a realizar a cada proveedor, con el fin de que el veedor y tesorero de la junta aprobaran los pagos respectivos, para que sean los voceros de la comunidad ante alguna duda sobre los movimientos de los recursos.

Los porcentajes de avance de ejecución y el seguimiento a la programación de obra se ven reflejados en los informes semanales adjuntos.

Dado a la suspensión de obra desde el 26 de abril hasta el 30 de mayo de 2024, hubo costos administrativos que se incrementaron ya que el personal profesional y otros gastos se venían ejecutando desde el mes de marzo de 2024, adicionalmente la prórroga No. 2 otorgada al convenio, también generó incremento en costos del proyecto, lo cual afectó la meta física; sin embargo, el balance de obra final con los ajustes necesarios está en elaboración por parte de la Junta de acción comunal, se conoce que el alcance final con los pagos ejecutados del convenio es de 336.95 ml de camino ancestral y 4 cárcamos en concreto con tapa metálica.

COMPONENTE SOCIAL:

Durante este periodo en el acompañamiento desde el área social se adelantaron las siguientes actividades:

- Acompañamiento social, Comités Operativos, Reuniones con Comité de Veedurías, Gestiones con los presidentes de las Juntas de Acciones comunales los cuales encabezan con su liderazgo, y sobre todo las comunidades puesto que esto ayuda al desarrollo de los pueblos como tal.
- Para la realización de la Ficha Socioeconómica se realizó un inventario del estado, tipo y número de instalaciones existentes parques, vías, andenes, sardineles, antejardines, senderos peatonales, ciclo rutas, Instituciones educativas, mobiliario urbano, (bancas, canecas, señalización y luminarias), incluidos dentro de la zona directa de la obra, con su respectivo registro fotográfico y audiovisual. El estado actual de los espacios de sensibilidad ambiental como: Humedales, zonas recreativas, zonas verdes, zonas de ronda y manejo y preservación ambiental y describir las actividades a realizar para proteger el patrimonio cultural y ecológico.
- Para las OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA) se tramitó ante la entidad contratante la solicitud de emplear el recurso disponible en la ejecución de una cuneta, la cual permita darle manejo al flujo de agua de un nacimiento en el tramo vial que se interviene mediante el convenio solidario 3502-2023. A la fecha de corte del presente informe estamos a la espera del concepto por parte de sostenibilidad.

COMPONENTE SST:

Durante este periodo en el acompañamiento desde el área SST se adelantaron las siguientes actividades:

- Se realizo seguimiento y revisión a las afiliaciones con la seguridad social del personal, validando de que fueran legales.
- Se superviso que cada colaborador durante las jornadas labores portara sus implementos de seguridad y salud en el trabajo completos.
- Se le brindo capacitación en SST, haciendo énfasis en la prevención de accidentes laborales y utilización de los elementos de seguridad.
- Se coordino y se validó que a cada colaborador se le haya entregado su dotación correspondiente.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Durante este periodo en el acompañamiento desde el área ambiental se adelantaron las siguientes actividades:

- **IMPACTOS AMBIENTALES.**

Impacto sobre el suelo: La remoción de la cubierta vegetal y las actividades de construcción pueden aumentar la susceptibilidad a la erosión, mientras que el uso de maquinaria pesada puede compactar el suelo, afectando su estructura y capacidad de infiltración de agua.
Impacto sobre el agua: Las escorrentías de sedimentos y residuos de construcción pueden contaminar cuerpos de agua cercanos, mientras que la construcción puede alterar el flujo natural de cursos de agua, afectando su ecología y disponibilidad.
Impacto sobre la flora y fauna:
Pérdida de vegetación: La remoción de plantas y árboles puede llevar a la pérdida de hábitats y especies vegetales.
Desplazamiento de fauna: La perturbación del hábitat puede desplazar a la fauna local, afectando su comportamiento y supervivencia.
Impacto sobre la calidad del aire y ruido:
Emisiones de polvo y gases: las actividades de construcción pueden generar polvo y emisiones de maquinaria.
Ruido: el uso de maquinaria y actividades de construcción pueden generar niveles elevados de ruido, afectando a las comunidades locales y la fauna.
Impacto social:
Interrupción de actividades locales: Las actividades de construcción pueden alterar la rutina diaria de las comunidades locales.
Conflictos sociales: La intervención en territorios comunitarios puede generar conflictos si no se manejan adecuadamente los intereses y expectativas de la comunidad.

- **MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**

Para mitigar y gestionar los impactos ambientales identificados, se implementaron diversas medidas de manejo ambiental:
Manejo del suelo: Para el control de la erosión se implementó una tubería de drenaje temporal parta controlar aguas de escorrentías por lluvias y para la compactación controlada se empleó maquinaria adecuada y técnicas específicas para minimizar la compactación del suelo.

Gestión del agua: se diseñó e instalo un sistema de drenaje para manejar las escorrentías y prevenir la contaminación de cuerpos de agua.

Protección de la flora y fauna: Se realizó una capacitación para el personal de la obra, enfocada en la preservación de la fauna local; durante esta capacitación, se destacó la importancia de permitir el paso seguro de las especies que habitan en el área de construcción

Gestión de residuos: Se fomenta el desarrollo de buenas prácticas de reciclaje y reutilización de materiales de construcción. Durante las actividades en obra, los materiales reciclables se almacenan en costales, los cuales, una vez llenos, se trasladan a un centro de acopio en la vereda. Allí, los residuos que no pueden ser tratados adecuadamente se disponen de manera responsable, siendo entregados a la empresa prestadora de servicios públicos de aseo del municipio para su disposición final en el relleno sanitario. Este enfoque asegura una gestión eficiente y sostenible de los desechos generados en la obra.

Medidas de control de calidad del aire y ruido: Se implemento medidas para reducir las emisiones de polvo y gases, como el uso de agua para controlar el polvo y se programaron las actividades ruidosas en horarios que minimicen el impacto sobre la comunidad.

Aspectos sociales: Se realizaron reuniones informativas con las comunidades locales para involucrarlas en el proceso y manejar sus expectativas.

Manejo de materiales de construcción: La cantidad de material programada para ingresar a la obra se ajusta a la disponibilidad de espacio para su almacenamiento. El material se mantiene cubierto con plásticos para evitar que las lluvias lo laven y contaminen el lugar, o que la brisa lo disperse.

- **SEGUIMIENTO Y CONTROL**

El seguimiento y control son fundamentales para garantizar la efectividad del PMA y el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental por lo tanto se implementarán las siguientes acciones:

Sistema de monitoreo continuo: Se estableció un sistema de monitoreo continuo para evaluar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y detectar posibles desviaciones.

Auditorías ambientales: Se realizarán auditorías ambientales periódicas para evaluar la implementación y efectividad del PMA. También se elaborarán informes de auditoría que incluyan recomendaciones y acciones correctivas.

Informes de progreso: Se elaborarán informes periódicos sobre el progreso y los resultados del PMA, que serán presentados a las autoridades competentes y a la comunidad local al finalizar la obra, mientras se mantiene una comunicación abierta y transparente con las partes interesadas para asegurar su participación y colaboración en el proceso

Acciones correctivas: En caso de detectar desviaciones o impactos no previstos, se implementarán acciones correctivas de manera oportuna para mitigar los efectos negativos, y se revisará y ajustará el PMA según sea necesario para mejorar su efectividad y adaptarlo a las condiciones cambiantes del proyecto.

El objetivo final es asegurar que la construcción del camino ancestral en la vereda Astillero, Valdivia se realice de manera sostenible y responsable, protegiendo el medio ambiente y promoviendo el bienestar de las comunidades locales.

SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO:

Durante este periodo la interventoría continuo con el acompañamiento y la supervisión en la ejecución de las actividades.

En el mes de julio de 2024 se fundieron 216 ml de camino ancestral con un ancho de 2ml con un espesor de 10 cm, se construyó 1 cárcamo y 3 tapas de cárcamos con tubos de hierro, alcanzando a construir un total de 4 cárcamos y 336.95 ml de camino ancestral. Queda pendiente la construcción de bordillos.

En lo financiero, al estar al pendiente de la aprobación y ejecución del presupuesto destinado al PAGA, queda en un 80,62%.

Ejecutando el PAGA, el convenio quedaría ejecutado 100% en lo financiero, como en lo físico. A la fecha de este reporte la aprobación del PAGA está en proceso de aprobación por parte del INVIAS, una vez sea aprobado, será ejecutado.

AVANCE FINANCIERO DEL MES DE JULIO DE 2024:

VALOR PROGRAMADO PERIODO	$ 199.101.158,00
VALOR EJECUTADO	$ 159.717.220,00

AVANCE FÍSICO DEL MES DE JULIO DE 2024:

PROGRAMADO	100,00%
EJECUTADO	98,00%

AVANCE PREDIAL AL MES DE JULIO DE 2024:

- Predios por intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE JULIO DE 2024:

- Fuentes de material: Jurisdicción del municipio de Valdivia.
- Permiso minero: Numero G5945005
- Licencia ambiental: Numero G5945005
- Aprovechamiento forestal: N/A
- Concesión de aguas: N/A

AVANCE SOCIAL AL MES DE JULIO DE 2024:

- Empleos generados: 22
- Empleos directos: 11
- Empleos indirectos: 11
- Socializaciones de inicio: 13/03/2024
- Capacitaciones: 1
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Durante este periodo de reporte, la interventoría continúo haciéndole seguimiento a la programación de obra, así como a la calidad de las actividades que se desarrollaron durante la ejecución del convenio, hasta cumplir con la meta física del 100%, dando cumplimiento a lo establecido por las normas vigentes del INVIAS.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO

4.1 INFORME SEMANAL

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el corte del presente informe, los cuales se adjuntan en el Anexo Informes semanales.

SEMANA	DESDE	HASTA
Semana 20	01/07/2024	07/07/2024
Semana 21	08/07/2024	14/07/2024
Semana 22	15/07/2024	21/07/2024
Semana 23	22/07/2024	31/07/2024

Por lo anterior, anexamos los informes semanales mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo del presente informe se continuo con la ejecución de las actividades en obra, por lo cual se ha vinculado maquinaria al proyecto, por ende, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 con la información del personal vinculado al proyecto.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 no aplica para el programa "Caminos comunitarios de la paz total

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Se anexan reportes del estado del tiempo mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo del presente informe se continuaron con las actividades en obra, sin embargo, la JAC no ha entregado resultados de laboratorio (fallo de cilindro de concreto), por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11. Se le ha realizado la solicitud y hasta la fecha no los han entregado, una vez entreguen los resultados serán cargado en este dicho formato.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO

Anexamos el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 con la relación de las garantías actualizadas a corte del presente informe.

4.8 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión de los desembolsos.**

Para el periodo del presente informe ya se aprobaron los desembolsos 2, 3 y 4, por lo cual, se anexa el informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios. En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

- **Seguimiento Programa de Obra**

Para el periodo del presente informe se continuo con la ejecución de las actividades en obra, por lo cual, la interventoría continúo realizando el seguimiento y supervisión a la programación entregada por la Junta de Acción comunal.

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

Para el periodo del presente informe la JAC entrego a interventoría el programa de inversión de los desembolsos, el cual, fue revisado y aprobado por la interventoría. Al mismo, se le ha hecho seguimiento, para el buen manejo de los recursos, del primer desembolso.

- **Actas de Comité de Obra**

Para este reporte se realizaron comités de obra, los cuales serán anexados en el formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

- **Actas de Reunión**

Se anexa mediante formato MEPI-MN1-N-14-FR-2.

- **Informes especialistas y profesionales**

no se requirió de especialistas para el presente periodo.

.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se modificó la meta física inicial proyectada por INVIAS, pasó de 440 ml de camino ancestral y 4 alcantarillas, a 336.95 ml de camino ancestral y 4 cárcamos. El ajuste realizado se debe principalmente a un error por parte de la entidad contratante al momento de formular el presupuesto del proyecto, en el Excel del presupuesto inicial no se formuló de forma correcta el valor unitario del ítem de Concreto Hidráulico MR - 3,8 Mpa - Mezcla in situ, pues quedo por un valor de $ 258.429,00; sin embargo al revisar el APU y corregir los errores, arroja un valor de $ 968.164,00, que para el alcance de 440 ml y las 4 alcantarillas se requeriría un presupuesto total de $ 262.681.364,00.

  Por lo anterior, al hacer los ajustes pertinentes y actualizar los valores de los Análisis de Precios Unitarios – APU, el presupuesto designado al convenio, alcanza para la meta física final descrita anteriormente.

- Se contempla para el componente social invertir el recurso asignado del PAGA para la construcción de una cuneta que permita garantizar la estabilidad de la obra, pues en el tramo vial intervenido existe un nacimiento de agua, que al no darle un correcto manejo, puede afectar las obras realizadas, por ende, para beneficio de la comunidad buscando garantizar la durabilidad del camino ancestral, por parte de la Junta de acción Comunal se solicitó invertir el recurso en ducha actividad, por parte de la interventoria se dio aprobación y se realizo el tramite correspondiente ante la entidad contratante.

- Se recomienda a la Junta de Acción Comunal tramitar con el banco la información detallada de los rendimientos financieros generados del recurso del convenio, para poder realizar el cierre financiero del proyecto de forma precisa.

6. ANEXOS.

6.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

6.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras

6.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

6.4. Copia de la Bitácora del mes correspondiente

6.5. Otros anexos:

- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 - Informe Semanal.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 – Estado General del Tiempo.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.
- Informe de inversión de los desembolsos.
- Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1. Acta de comité de obra.
- Formatos MEPI-MN-IN-14-FR-2 – Acta de reunión.

6.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

ENVIADA

FECHA	No. DE COMUNICADO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
25/07/2024	C.MAJ-CI-5066-23-358	Direccionamiento del presupuesto del plan de adaptación de la guía ambiental (PAGA).	Interventoría	OAC Valdivia

RECIBIDA

FECHA	No. DE COMUNICADO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
10-jul-24	Sin consecutivo	Solicitud Factura Acta de Costos 04 - Abril	OAC Valdivia	Interventoría
11-jul-24	Sin consecutivo	Planilla nómina Julio 01 al 15	OAC Valdivia	Interventoría
12-jul-24	Sin consecutivo	Planillas de seguridad social	OAC Valdivia	Interventoría
12-jul-24	Sin consecutivo	Nuevas planillas seguridad social	OAC Valdivia	Interventoría
12-jul-24	Sin consecutivo	Planillas seguridad social	OAC Valdivia	Interventoría
12-jul-24	Sin consecutivo	Documentos pendientes del desembolso 1	OAC Valdivia	Interventoría
13-jul-24	Sin consecutivo	Solicitud desembolso 3	OAC Valdivia	Interventoría
13-jul-24	Sin consecutivo	Acta de comité 02	OAC Valdivia	Interventoría
24-jul-24	Sin consecutivo	Fwd: Acta de comité 02	OAC Valdivia	Interventoría
24-jul-24	Sin consecutivo	Ambiental Vereda El Astillero	OAC Valdivia	Interventoría
24-jul-24	Sin consecutivo	Acta De Reunión- Mesa De Trabajo 18/07/2024	OAC Valdivia	Interventoría
26-jul-24	Sin consecutivo	Desembolso 4_ El Astillero	OAC Valdivia	Interventoría
26-jul-24	Sin consecutivo	Cotizaciones del PAGA	OAC Valdivia	Interventoría

6.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.	**CONVENIO N°**	3502-2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSTRUMAJ S.A	**CONTRATO N°**	5066-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"				



Actividad de instalacion de rejilla para carcamo



Descripción: Vaciado de concreto

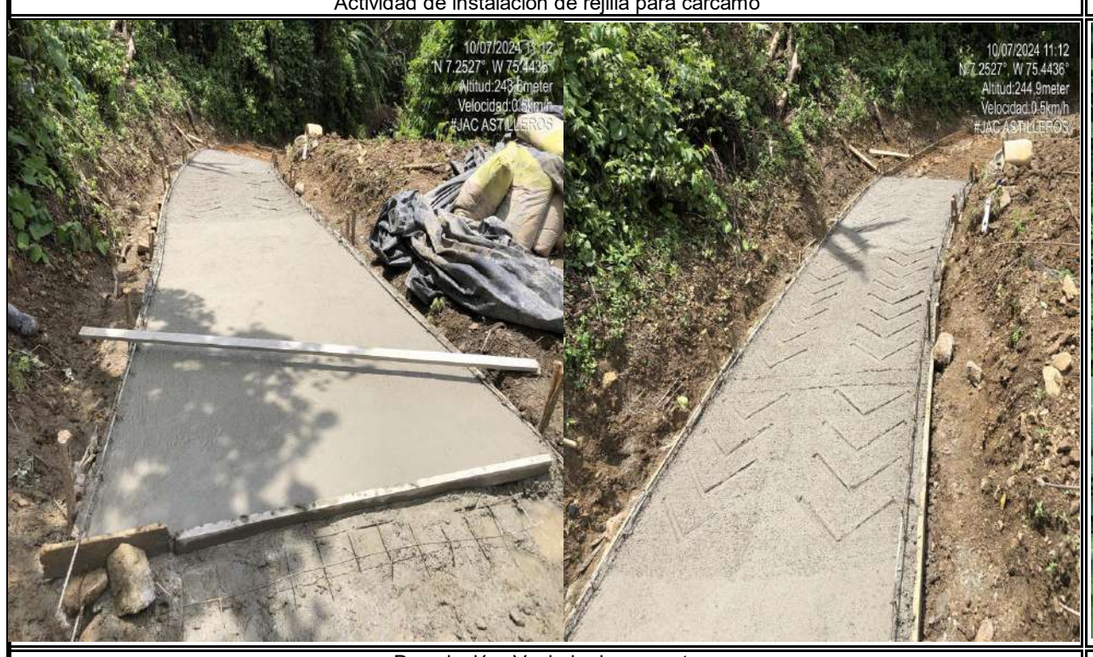

Descripción: Vaciado de concreto



Descripción: Placa de camino comunitaria terminada

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

6.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	Versión 1	
		Res: Coord. Ambiental	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	F-CCPT-AMB-001	
		FECHA	31/07/2024

TEMA DEL REGISTRO: Almacenamiento y utilizacion de herramientas y material para la construccion de placa huella	
FECHA:	UBICACIÓN: VEREDA ASTILLEROS

Fotografía 1	Fotografía 2
	
Descripción: Bodega de alamcenamiento	**Descripción: Amacenamiento de herramiento de obra**
Fotografía 3	**Fotografía 4**
	
Descripción: Almacenamiento de matererial en la via con prevencion de cono	**Descripción: Utilizacion de equipo de mezcla para prevenir contaminacion en el suelo**
Fotografía 5	**Fotografía 6**
	
Descripción: Utilizacion de herramientas para minimizar impactos negativos en el entorno	**Descripción:** Utilizacion de herramientas para minimizar impactos negativos en el entorno

6.4. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.

02/Julio/2024 Hora de inicio 7:00 am
Hora Final 4:00 pm

Actividades de obra:
- Nivelacion del terreno con material de Playa y material de la zona.
- Preparacion de concreto y aplicacion de concreto
- Corte, Figuacion y amarre de acero
- Transporte interno de material

Personal del dia:
1 Oficial 1 Ing residente de obra
5 ayudantes 1 inspector de int

Herramientas y equipos:
Concretadora
Aspersor
Circular
Pulidora
Planta electrica
Cizalla
Coches metalicos
Vibrador de Concreto
Rana
Herramienta menor (Bichiroqui, machete, Pica, Pala)

Clima:
Noche anterior, no hay registro
Mañana despejada con sol radiante
Tarde despejada, sol radiante y bastante humeda

R. Mercado.

30

03/Julio/2024 Hora de inicio 7:00 am
Hora final 4:00 pm

Actividades de obra:
- Nivelacion de terreno con material de playa y material de la zona.
- Preparacion de concreto y aplicacion de concreto
- Corte, figuracion y amarre de acero
- Transporte interno de material

Personal del dia:
1 Oficial 1 ing residente de Obra
5 ayudantes 1 inspector de int

Herramientas y equipos
Concretadora
Aspersor
circular
Polidora
Planta electrica
Cizalla
coches metalicos
Vibrador de concreto
Rana
Herramienta menor (Bichiroqui, machete, Pica, Pala)

Materiales que llegan a la obra:
20 bultos de cemento 50kg
5 mallas electrosoldada de 6*2.35m

Clima:
Noche anterior, sin registro
Mañana despejada con sol radiante
Tarde despejada, sol radiante y bastante humedad

04/Julio/2024 Hora de inicio 7:00 am
Hora Final 4:00 Pm

Actividades de obra:
- Nivelacion de terreno con material de Playa y material de la zona
- Preparacion de concreto y aplicacion de concreto
- Corte, Figuracion y amarre de acero
- Transporte interno de material

Personal del dia:
1 oficial 1 ing residente de obra
5 ayudantes 1 inspector de int

Herramientas y equipos:
concretadora
Aspersor
circular
Poladora
Planta electrica
Cizalla
coches metalicos
Vibrador de Concreto
Rana
Herramienta menor(Pichiroqui, machete, Pica, Pala)

Materiales que llegan a la obra:
10 bultos de Cemento 50kg
2 viajes de material de Playa aproximadamente 14m3

Clima:
Noche anterior, sin registro
Mañana con mucha lluvia
Tarde despejada y Poco sol

05/Julio/2024 Hora de inicio 7:00 am
Hora Final 4:00 pm

Actividades de la obra:
- Nivelacion de terreno con material de Playa y material de la zona
- Preparacion de Concreto y aplicacion de Concreto
- corte, Figuracion y amarre de acero
- Transporte interno de material

Personal del dia:
1 Oficial 1 ing residente de obra
4 ayudantes 1 inspector de inte

Herramientas y equipos:
concretadora
Aspersor
circular
Pulidora
Planta electrica
Cizalla
coches metalicos
Vibrador de concreto
Rana
Herramienta menor (Bichiroqui, machete, Pica, Pala)

Material que llega a la obra:
20 bultos de cemento 50kg
20 Varillas corrugadas de 3/8"

Climas:
Noche anterior, no hay registro
Mañana con muchas lluvias hasta la 1 de la tarde
Tarde opaca.

06/Jul/2024 Hora de inicio 7:00 am
Hora final 12:00 pm

Actividades de Obra:
- Nivelacion del terreno con material de Playa y material de la zona.
- Preparacion de concreto y aplicacion de Concreto
- Corte, Figuracion y amarre de acero
- Transporte interno de material

Personal del dia:
1 oficial 1 Ing residente de Obra
5 Ayudante 1 inspector de int

Herramientas y equipos:
concretadora
Aspersor
circular
Pulidora
planta electrica
cizalla
coches metalicos
vibrador de concreto
Rana
Herramienta menor (Bichiroqui, machete, Pica, Pala)

Materiales que llegan a la obra:
20 bultos de cemento 50kg
10 varillas corrugadas de 3/8"

Climas:
Noche anterior, no hay registro
Mañana con lluvias cortas.

08/Julio/2024

Hora de inicio 7:00 am
Hora Final 4:00 pm

Actividades de la obra:
- Preparacion de concreto y aplicacion de concreto
- Corte, Figuracion y amarre de acero
- Transporte interno de material

Personal del dia:
1 oficial 1 ing residente de obra
5 ayudantes 1 inspector de int

Herramientas y equipos:
concretadora
Aspersor
circular
Pulidora
Planta electrica
Cizalla
coches metalicos
Vibrador de concreto
Rana
Herramienta menor(Bichiroqui, machete, Pica, Pala)

Materiales que llegan a la obra:
60 bultos de cemento 50kg

Clima:
Noche anterior con Fuertes lluvias
Mañana despejada
Tarde despejada y sol fuerte.

09/Julio/2024 Hora de inicio 7:00 am
Hora Final 4:00 pm

Actividades de obra:
- Preparacion de concreto y aplicacion de concreto
- Corte, Figuracion y amarre de acero
- Transporte interno de material
- Conformacion del terreno y corte

Personal del dia:
1 oficial 1 ing residente de obra
5 ayudantes 1 inspector de int

Herramientas y equipos:
concretadora
Asperdor
Circular
Pulidora
Planta electrica
Cizalla
Coches metalicos
Vibrador de concreto
Rana
Herramienta menor (Bichiroqui, machete, Pica, Pala)

Materiales que llegan a la obra:
100 Varillas corrugadas de 3/8"
10 Kilos de alambre quemado
10 discos de corte de metal de 7"

Clima:
Noche anterior, sin registro
Mañana despejada, tiempo seco
tarde despejada y sol fuerte.

10/julio/2024

Hora de Inicio 7:00 am
Hora Final 4:00pm

Actividades de obra:
- Preparacion de concreto y aplicacion de concreto
- Transporte interno de material

Personal del dia:
1 oficial 1 ing residente de obra
5 ayudantes 1 inspector de int

Herramientas y equipos:
Concretadora
Aspersor
circular
Pulidora
Planta electrica
Cizalla
coches metalicos
Vibador de concreto
Rana
Herramienta menor (Bichiroqui, machete, Pica, Pala)

Clima:
Noche anterior, con lluvias
Mañana despejada, tiempo seco
Tarde despejada y sol fuerte.

11/julio/2024 Hora de inicio 7:00 am
Hora final 4:00 pm

Actividades del día
- Preparacion de concreto y aplicacion de concreto
- Corte, figuracion y amarre de acero
- Transporte interno de material
- Conformacion de terreno y corte

Personal del día:
1 oficial 1 ing residente de obra
5 ayudantes 1 inspector de int

Herramientas y equipos:
Concretadora
Asperson
Circular
Polidora
Planta electrica
Cizalla
coches metalicos
Vibrador de concreto
Rana
Herramienta menor (Pichirogui, machete, Pica, Pala)

Materiales que llegan a la obra:
60 varillas corrugadas de 3/8"
30 bultos de cemento 50kg

Clima:
Noche anterior, con lluvia
Mañana despejada, tiempo seco
Tarde despejada y sol fuerte.

12/Julio/2024

Hora de Inicio 7:00 am
Hora final 4:00 pm

Actividades del dia:
- Preparacion de concreto y aplicacion del concreto
- Corte, Figuracion y amarre de acero
- Transporte interno de material
- Conformacion del terreno y corte

Personal del dia:
1 oficial 1 ing residente de obra
5 ayudantes 1 inspector de int

Herramientas y equipos:
Concretadora
Aspersor
circular
Pulidora
Planta electrica
Cizalla
coches metalicos
vibrador de concreto
Rana
Herramienta menor (Bichiroguí, machete, Pica, Pala)

Materiales que llegan a la obra:
40 bultos de cemento 50 kg

Clima:
Noche anterior, Con lluvia
Mañana con lluvias a la primera hra, luego despejada con sol fuerte
tarde despejada y sol fuerte

13/Julio/2024 Hora de inicio 7:00 am
Hora final 12:00 pm

Actividades del dia:
- Preparacion de concreto y aplicacion de concreto
- Corte, figuracion y amarre de acero
- Transporte interno de material
- Conformacion del terreno y corte.

Personal del dia:
1 oficial 1 ing residente de obra
5 ayudantes 1 inspector de int

Herramientas y equipos:
Concretadora
Asperson
Circular
Pulidora
Planta electrica
Cizalla
Coches metalicos
Vibrador de concreto
Rana
Herramienta menor (Bichiroques, machetes, Pica, Pala, barra)

Clima:
Noche anterior, no hay registro
Mañana con lluvias a primera hora, luego despejado con sol fuerte.

Lunes 15 de Julio 2024

Frente de obra Valvidivia
Vereda Astilleros

Personal:
obreros:
Maestro: 1
oficial: 1

clima
Mañana: Nublado
Tarde: soleado

Actividad:

Se inicia con la Actividad de compomacion de trano con nivelacion y excavacion de vigas nivostras no se esta suministrando base granular por motivos de que el terreno es rocoso y de una firmeza considerable ademas se evidencia que en el proyecto no se cuenta al momento de preparacion de dicho trano de elementos de compactacion

mecanica la jornada laboral termina con el vaciado de 5 placas y 4 vigas. nuestras

residente de obra

inspector de obra

Powered by CamScanner

Martes 16 Julio 2024.

Frente de obra Valdivia
Vereda Astilleros


Personal
obreros:
Maestro: 1
oficial: 1

Clima:
Mañana: Nouzns
Tarde: Nouzns

Actividades

.Se inicia labores de conformacion y excavacion de vigas y terreno para el vaciado de tres placas y tres vigas riostras se deja por Evidenciado que no se utilizaron equipos de compactacion y tampoco esta suministrando base granular para nivelacion ya que el terreno es de buena firmeza y rocoso

Powered by CamScanner

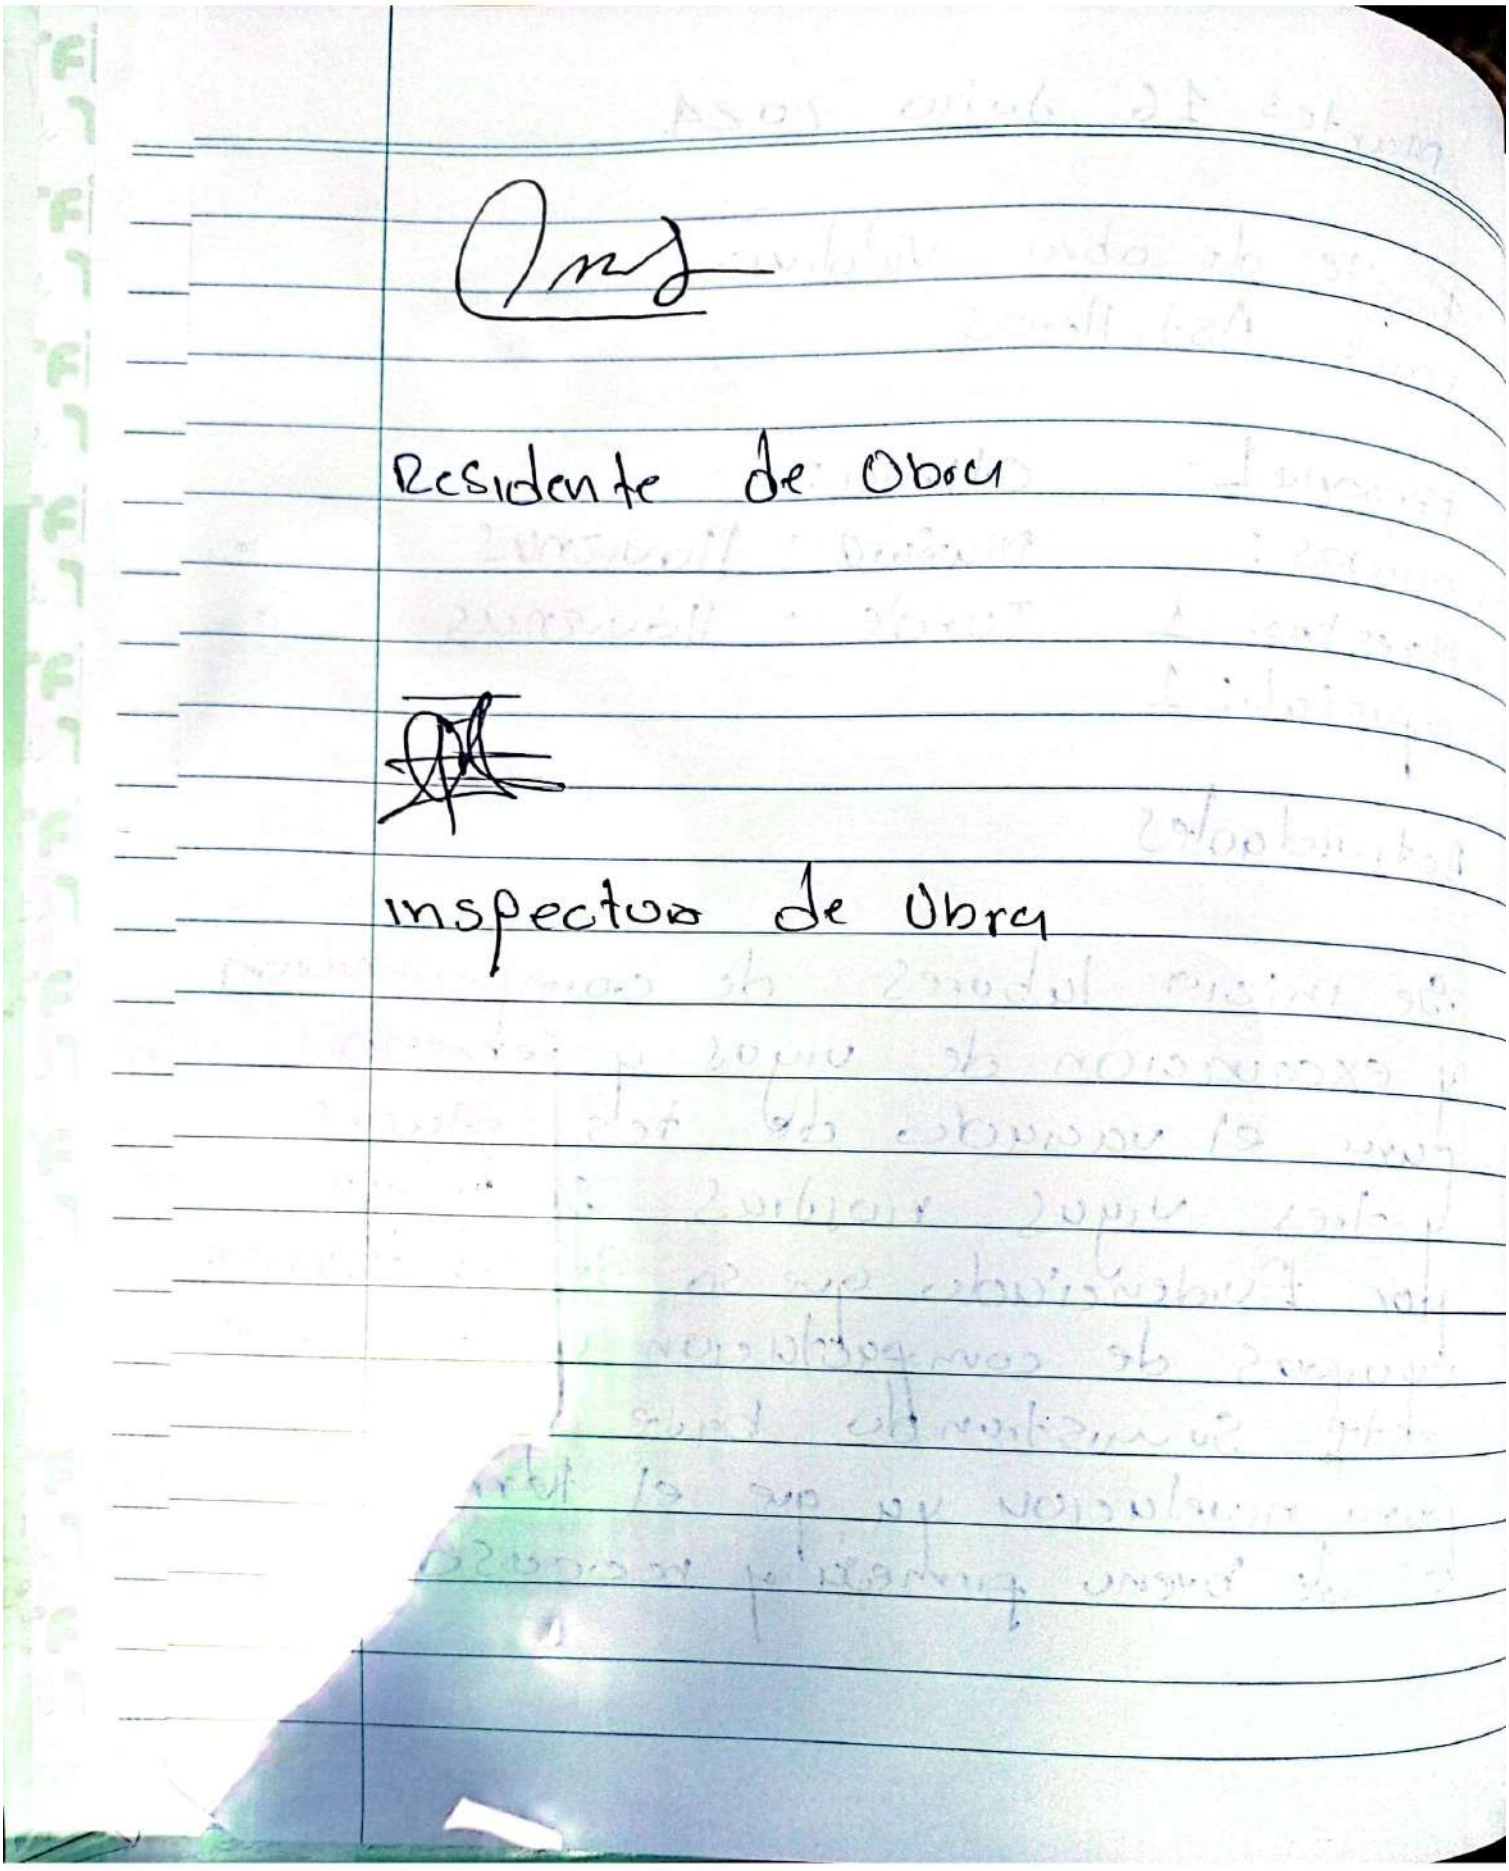

Residente de Obra

inspectora de Obra

Powered by CamScanner

Miercoles 17 Julio 2024

Frente de obra Voldivia
vereda Astilleros.

Personal
obreros 3
Maestro 1
oficial: 1

clima:
Mañana: Soleada
tarde: Soleada

Se inician labores con la compomacion nivelacion y excavacion de terreno para vigas riostras
Se continua con el armado de Acero de vigas y bordillos el vaciado se aplaza para el dia Jueves ya que no se cuenta con el personal suficiente para vaciar Segun el presidente de junta de Accion comunal estan de compensatorio por se les debian dia que se habian trabajado Domingos anteriores

tampoco se estan empleando equipos de compactacion mecanica para compactacion de base granular segun lo J.A.C. no se cuenta con el porque el contrato estipulado para esos equipos fueron de 25 dias no mas al inicio del proyecto

Residente de Obra

inspector de Obra

Powered by CamScanner

Jueves 19 de Julo 2024.

Frente de obra valdivia
vereda Astilleros

· Personal:
Maestro : 1
Oficial : 1
Obreros : 1

Clima:
Mañana Soleada
Tarde : soleada

Actividades:

Se inicia con la formacion de terreno y la aplicacion de base granular en frano de mejoramiento de terreno

se continua con el armado de accero e instalacion de vigas maestras

Se continua con la aplicacion de concreto de vigas y placas

Powered by CamScanner

en total de 12.00 m² en total

también se realizan transporte internos de materiales internos

Mega Materiales son mayor de 18

Residente de Obra

Inspector de Obra

Powered by CamScanner

Viernes 19 Julio 2024

Frente de obra valdivia
vereda Astilleros

Personal
Maestro: 1
Oficial: 1
Obreros: 5

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: Lluvias

- Se inicia labores de conformacion de terreno y armado de acero para su posterior instalación

Se continua con el vaciado de concreto en placas y vigas muestras para una totalidad de 15,00 m2

Se realizan actividades de transporte interno de materiales de playa y concreto

Powered by CamScanner

la jornada termina sin incidentes ni accidentes

Residente de Obra

Inspector de Obra

Powered by CamScanner

Lunes 22 dulio 2024

Frente de obra valdivia.
vereda Astilleros

Personal:
Obreros:
Maestro: 1
Oficial: 1


Clima:
Mañana: Nuvia
Tarde: Nublada

Se inicia labores de compomacion y nivelacion de terreno
Excavacion de vigas riostras
Configacion de Acero para vigas y bordillos
El cargador se emplea con el acarreo de Material de playa y el suministro de cemento para el vaciado de las placas programadas para el dia de Hoy

En todal de placas vaciados fueron 5 para un total de 15m2

Powered by CamScanner

4 5 vogus mestres



Residente de Obra



Inspector de Obra

Powered by CamScanner

Martes 23 dulio 2024

Frente de obra valdivia
vereda Astilleros.

Personal: clima:
Obreros: Mañana: nublado
Maestro: 1 Tarde : soleado
Oficial: 1

Se inicia labores de Excavacion y
comformacion de terreno y vigas
nostras
Se hace nivelacion de terreno
con base granular en puntos donde
se ameritó reemplazo de material
por Humedad no se compacta con
equpo mecanicos ya que en la
obra no se cuenta con ninguno

- Se termino labor con 15 metro lineales
discriminado en 5 vigas nostras

Powered by CamScanner

El minicargado se emplea para el suministro o acarreo de material de playa desde la carretera principal

Residente de obra

Inspector de obra

Powered by CamScanner

Miercoles 24 dulio 2024.

frente de obra valdivia.
vereda hastilleros


Personal
Maestro : 1
oficial : 1
obreros :

Clima:
Mañana: Soleada
Tarde : Soleada

Se inicia con labores de limpieza de terreno ya por el invierno del dia anterior se retira y se hace reemplazo de materia humedo se compacta manualmente ya que no se cuenta con elementos mecanicos
Se excavan terreno para vigas nostras
En total se fundien 5 placas y 4 vigas Riostras con sus respetivos Aceros correspondiente y empleando malla electrosoldada

Powered by CamScanner

Residente de Obra



Inspector de Obra

Powered by CamScanner

Jueves 25 Julio 2024

Frente de obra valdivia
Vereda Astilleros

Personal:
Obreros:
Maestro: 1
Oficial: 1

Clima:
Mañana: Nublado - lluvizna
Tarde: lluvias

Actividad se inicia con la compomacion de tramo para nivelacion y excavacion de vigas riostras
comacion de 3 placas y 3 vigas riostras para vaciado con su respectiva figuracion e instacion de Acero y malla electro soldada,

Nota: No se utiliza equipo de compactacion mecanica para aplicacion de base granular

Powered by CamScanner

Se realizo canalizacion en costado derecho una cuneta para garantizar la estabilidad de terreno ya que de la montaña estan bajando corrientes de Aguas que pueden afectar la obra

Se estan solicitando recurso para la elaboracion de una cuneta que ayudara a canalizar dicha agu

Residente de Obra

Inspector de Obra

Powered by CamScanner

viernes 26 Julio 2024

Frente de obra Valdivia
vereda Valdivia – Astilleros.

Personal
Maestro: 1
oficial: 1
Obreros: 5

clima:
Mañana: Frente lluvia
Tarde: Nublado

- Actividad

- Se realiza excavacion para carcamo y se realiza el conformado y figurado de terreno para el vaciado de 2.5 placas 2.3 m2 y se funden las 2 losas del carcamo 3 y 4 se funden tambien dos vigas muestras

Residente de Obra



Inspector de Obra

Powered by CamScanner

Sabado 27 Julio 2024

Frente de obra Valdivia
vereda Astilleros

Personal :
Maestro: 1
Oficial: 1
Obreros: 5

clima:
Mañana: Nublado
Tarde : Soleado

Actividades

Se realiza figuracion y armado de Acero para el vaciado de laterales de carcamo

- Se continua con corte terreno para compomacion de cunetas laterales. de 0,00 mL

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Inspector de Obra

Powered by CamScanner

Martes 30 Julio 2024

Frente de obra Valdivia
Vereda Astilleros

Personal
Obreros: 5
Maestro: 1
Oficial: 1

Clima:
Mañana: Soleada
Tarde soleada

Actividad

Se inicia jornada con el corte y conformacion de terreno para la construccion de 15.00 ml de cunetas

- Se hace reemplazo de material y mejoramiento de terreno

- se Realza la instalacion de Rejas cardasanales para los cargamos 3-4. en tuberia de ϕ 3" en acero calibre 14 mm

Powered by CamScanner

Se termino la obra sin incidentes ni Accidentes

Residente de Obra

Inspector de Obra

Powered by CamScanner

Miercoles 31 Julio 2024

Frente de obra valdivia
vereda Astilleros

Personal:
Obreros 5
maestro: 1
opicial: 1

Clima:
Mañana Soleado
tarde: Soleado

Clima: Soleado

Actividades:

Se inicia labores de armado de formaletas para el vaciado de bordillos fundidos se continua con la excavacion de cunetas para luego fundir en concreto

la jornada termina con tranquilidad sin incidentes ni Accidentes

Powered by CamScanner

Ing

Residente Obra



Inspector de Obra

Powered by CamScanner

6.5. OTROS ANEXOS:

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3- INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 7/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS-CONTRUCCION DE CARCAMOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 20 del 1/07/2024 al 7/07/2024 Último Informe Semanal ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — Apoyo Técnico y Administrativo a la Supervisión de Contratos de Interventoría. — MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIAVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 336,95 ML DE CAMINOS ANCESTRAL - CONSTRUCCIÓN DE 4 UND DE CARCAMO EN CONCRETO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA ASTILLERO, DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6" - N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9"" las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria de la Vereda Astillero del municipio de Valdivia Antioquia, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.			INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3502-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.101.158,00	CONTRATO No.	5066 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.780.410,00
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 89.969.895,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.101.158,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 278.750.305,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 de agosto de 2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 de agosto de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.101.158			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 130.795.850			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 68.305.308			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.780.410	$ 89.969.895		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 184.262.266	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.518.144	$ 89.969.895		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.101.158,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 140.450.171,31	70,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 118.586.296,08	59,56%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (21.863.875,23)	-10,98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 128.866.798,50	64,72%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 130.795.850,00	65,69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.929.051,50	0,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.075.848,50	3,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.900.200,00	10,50%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.458.384,17	83,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.852.453,12	66,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.322.919,21	4,17%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.357.585,00	6,02%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Acta aprobada por DT Antioquia por valor de $ 58.889.340,00 correspondiente al mes de junio de 2024. revisada y aprobada por planta central, a la espera de notificacion para facturar

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 70,54% — Avance o Atraso Físico %: -10,98%

Meta Física Ejecutada %: 59,56%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
Prog	1,00	1,00	100,00%
Ejec	1,00	1,00	100,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retro excavadora CATERPILA	1	
Motosierra STHIL 382	1	

Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	M3	70,75
Subbase granular clase C	M3	91,00
Concreto Hidráulico MR - 3,8 Mpa - Mezcla in situ	M3	60,70
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	M3	11,20
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLOS	M3	20,20
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	4036,00
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CÁRCAMO	M3	1,40
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	185,00

Prog	50,24	50,24	71,01%
Ejec	42,51	42,51	60,08%
Prog	60,20	60,20	66,15%
Ejec	45,21	45,21	49,68%
Prog	40,90	40,90	67,38%
Ejec	37,52	37,52	61,81%
Prog	7,41	7,41	66,16%
Ejec	6,51	6,51	58,13%
Prog	13,36	13,36	66,15%
Ejec	9,54	9,54	47,23%
Prog	2669,97	2669,97	66,15%
Ejec	1864,25	1864,25	46,19%
Prog	0,92	0,92	65,71%
Ejec	0,79	0,79	56,43%
Prog	122,38	122,38	66,15%
Ejec	104,52	104,52	56,50%

Guadaña STHIL 280	1	
Aspersor manual	1	1
Circular INCO	1	1
Pulidora 4"	1	1
Planta eléctrica	1	1
Cizalla grande	1	1
Taladro	1	1
Rana	1	
Mezcladora	1	1
Total		7

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: La información plasmada corresponde a la entregada por la JAC.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Por el tipo de convenio y en la zona donde se contruye el proyecto, los permisos anteriores no aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACION POR LA JAC

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado a utilizar los recursos del PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	15	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Astillero Calle central, sector el alto, droguería

OBSERVACIONES: Se realizó comite operativo No.2 para dar a conocer al comite de participacion ciudadana el desembolso solicitado por la JAC, el cual fue aprobado por la comunidad para su posterior desembolso.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A LA FECHA LA FECHA DE ESTE INFORME LA JAC AUN NO ENTREGADO EL NUEVO BALANCE CON LOS SOPORTES DE LOS CAMBIOS DE PRECIOS, DESPUES DE VER TAL INCUMPLIMIENTO, LA INTERVENTORÍA LE SOLICITO UNA RESPUESTA, DE PORQUE TAL DEMORA Y EL PRESIDENTE DE LA JAC MANIFESTO, QUE SE LES HA DIFICULTADO CONSEGUIR NUEVAS COTIZACIONES EN LA ZONA, PERO QUE ESTAN CON LAS BOTAS PUESTAS, PARA CUMPLIR PRONTO CON DICHO COMPROMISO.


EL CONVENIO SE SUSPENDIO EL DÍA 26 DE ABRIL, CON FECHA TENTATIVA REINICIO PARA EL 17 DE MAYO. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA ACTUAL.
SE CONTINUO CON LA ADECUACIÓN DEL TERRENO A PAVIMENTAR.
EXCAVACIÓN PARA BORDILLOS Y BIGAS DE CONFINAMIENTO, O (RIOSTRAS.)
FIGURACIÓN DE ACERO PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO, (RIOSTRAS) Y CARCAMOS.
INSTALACIÓN DE ACERO Y MALLA ELECTROSOLDADA.
PREPARACIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE CONCRETO Y TALLADO DE LOZA EN CONCRETO.
CONSTRUCCION DE CARCAMOS.

ESTA SEMANA 20 SE CONTINUA CON LA EXCAVACION PARA VIGAS RIOSTRAS Y CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO GENERAL , NO SE CONSIDERA EL USO DE COMPACTACION DE TERREANO DE BASE GRANULAR CON EQUIPOS MECANICOS YA QUE TERRENO DEMUESTRA SER DE BUENA FIRMESA ROCOSA , EN ESTAS ACTIVIDADES DIARIAS SE INCLUYEN EL ARMADO Y FIGURACION DE ACEROS PARA VIGAS RIOSTRAS Y LA INSTALACION DE MALLA ELECTRO SOLDADA EN CADA TRAMO QUE SE INTERVIENE CON EL FUNDIDO DE CONCRETO TODO BAJO LAS ESPESICACIONES TECNICAS Y ACABADOS DEL DISEÑO DE CONCRETOS SE CONSIDERA EL AVANCE DE VACIADO DE PARTE DEL BORDILLOS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SEMANA VENIDERA SE PROGRAMA, CONTINUAR CON EL VACIADO DE CONCRETO Y DEMAS ACTIVIDADES PRELIMINARES. Y MEJORAR EL RENDIMIENTO YA TENIENDO STOCK DE MATERIALES EN OBRA.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



MEJORAMIENTO DE TERRENO



EXCAVACION PARA VIGA RIOSTRA



INSTALACIÓN DE MALLA ELETROSOLDAD

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
LA INTERVENTORÍA CONTINUARA APOYANDO LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, CON EL FIN, QUE SE CONSIGAN LOS MAYORES RENDIMIENTOS, ASÍ COMO TAMBIEN, SE EJECUTE EL PROYECTO CON CALIDAD. DESPUES DE REALIZAR LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES, LA INTERVENTORÍA LE A SOLICITADO A LA JAC QUE PARA LA SEMANA VENIDERA GENERA UN MAYOR RENDIMIENTO.	FIRMA NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS-CONTRUCCION DE CARCAMOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 21 del 8/07/2024 al 14/07/2024 — ☐ Último Informe Semanal

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — Apoyo Técnico y Administrativo a la Supervisión de Contratos de Interventoría. — MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIAVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 336,95 ML DE CAMINOS ANCESTRAL - CONSTRUCCIÓN DE 4 UND DE CARCAMO EN CONCRETO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA ASTILLERO, DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6" - N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9"" las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria de la Vereda Astillero del municipio de Valdivia Antioquia, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.			INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3502-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.101.158,00	CONTRATO No.	5066 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.780.410,00
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 89.969.895,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.101.158,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 278.750.305,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 de agosto de 2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 de agosto de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.101.158			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 141.361.283			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.739.875			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.780.410,00	$ 89.969.895,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 188.780.410,00	$ 12.269.780,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 77.700.115,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	199.101.158,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	136.877.288,21	68,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	125.627.968,84	63,10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(11.249.319,36)	-5,65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	135.942.647,00	68,28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	141.361.283,00	71,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	5.418.636,00	2,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	7.075.848,50	3,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10.565.433,00	5,31%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	48.781.303,38	87,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	40.210.038,12	72,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	2.322.919,21	4,17%
28303394 INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	3.357.585,00	6,02%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Acta aprobada por DT Antioquia por valor de $ 58.889.340,00 correspondiente al mes de junio de 2024. Revisada y aprobada por planta central, a la espera de notificacion para facturar

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 68,75% — Avance o Atraso Físico %: -5,65%

Meta Física Ejecutada %: 63,10%

Meta Fisica (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad
*	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1,00
*	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	M3	70,75
	Subbase granular clase C	M3	91,00
	Concreto Hidráulico MR - 3,8 Mpa - Mezcla in situ	M3	60,70

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
Prog	1,00	1,00	100,00%
Ejec	1,00	1,00	100,00%
Prog	44,45	44,45	62,83%
Ejec	39,54	39,54	55,89%
Prog	60,20	60,20	66,15%
Ejec	49,24	49,24	54,11%
Prog	40,90	40,90	67,38%
Ejec	39,85	39,85	65,65%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retro excavadora CATERPILA	1	
Motosierra STHIL 382	1	
Guadaña STHIL 280	1	
Aspersor manual	1	1
Circular INCO	1	1
Pulidora 4"	1	1
Planta eléctrica	1	1
Cizalla grande	1	1

Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	M3	11,20
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLOS	M3	20,20
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	4036,00
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CÁRCAMO	M3	1,40
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	185,00

Prog	7,41	7,41	66,16%
Ejec	7,02	7,02	62,68%
Prog	13,36	13,36	66,14%
Ejec	11,54	11,54	57,13%
Prog	2669,96	2669,96	66,15%
Ejec	2451,52	2451,52	60,74%
Prog	0,92	0,92	65,71%
Ejec	0,78	0,78	55,71%
Prog	107,67	107,67	58,20%
Ejec	103,54	103,54	55,97%

Taladro	1	1
Rana	1	
Mezcladora	1	1
Total		7

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: La información plasmada corresponde a la entregada por la JAC.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Por el tipo de convenio y en la zona donde se contruye el proyecto, los permisos anteriores no aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACION POR LA JAC

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha recibido solicitud formal del PAGA por parte de la JAC, se recomienda hacerlo lo antes posible dado al tiempo de tramite para su aporbacion por parte de sostenibilidad de INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	15	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Astillero Calle central, sector el alto, droguería

OBSERVACIONES: Se realizó comite operativo No.3 para dar a conocer al comite de participacion ciudadana el desembolso solicitado por la JAC, el cual fue aprobado por la comunidad para su posterior desembolso.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ESTA SEMANA 21 SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE EXCAVACION PARA VIGAS RIOSTRAS Y CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO GENERAL. SE APLICA Y SE COMPACTA SUBBASE. EN ESTAS ACTIVIDADES DIARIAS SE INCLUYEN EL ARMADO Y FIGURACION DE ACEROS PARA VIGAS RIOSTRAS Y LA INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN CADA TRAMO QUE SE INTERVIENE CON EL FUNDIDO DE CONCRETO TODO BAJO LAS ESPESICACIONES TECNICAS Y ACABADOS DEL DISEÑO DE CONCRETOS SE CONSIDERA EL AVANCE DE VACIADO DE PARTE DEL BORDILLOS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SEMANA VENIDERA SE PROGRAMA, CONTINUAR CON EL VACIADO DE CONCRETO Y DEMAS ACTIVIDADES PRELIMINARES. Y MEJORAR EL RENDIMIENTO YA TENIENDO STOCK DE MATERIALES EN OBRA.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



PREPADO Y VACIADO DE CONCRETO



INSTALACIÓN DE MALLA ELETROSOLDAD Y VACIADO DE CONCRETO



VACIADO DE CONCRETO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

LA INTERVENTORÍA CONTINUARA APOYANDO LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, CON EL FIN, QUE SE CONSIGAN LOS MAYORES RENDIMIENTOS, ASÍ COMO TAMBIEN, SE EJECUTE EL PROYECTO CON CALIDAD. DESPUES DE REALIZAR LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES, LA INTERVENTORÍA LE A SOLICITADO A LA JAC QUE PARA LA SEMANA VENIDERA GENERA UN MAYOR RENDIMIENTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA

Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS-CONTRUCCION DE CARCAMOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 22 del 15/07/2024 al 21/07/2024 — Último Informe Semanal ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — Apoyo Técnico y Administrativo a la Supervisión de Contratos de Interventoría. — MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIAVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 336,95 ML DE CAMINOS ANCESTRAL - CONSTRUCCIÓN DE 4 UND DE CARCAMO EN CONCRETO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA ASTILLERO, DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6" - N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9"" las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria de la Vereda Astillero del municipio de Valdivia Antioquia, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.			INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3502-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.101.158,00	CONTRATO No.	5066 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.780.410,00
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 89.969.895,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.101.158,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 278.750.305,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 de agosto de 2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 de agosto de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.101.158			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 141.361.283			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.739.875			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.780.410	$ 89.969.895,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 188.780.410	$ 29.057.705,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 60.912.190,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.101.158,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 153.178.193,16	76,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141.960.443,38	71,30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11.217.749,79)	-5,63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 143.018.495,50	71,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 141.361.283,00	71,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.657.212,50)	-0,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.075.848,50	3,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 51.104.222,58	91,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 43.567.623,12	78,15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.322.919,21	4,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.357.585,00	6,02%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Acta aprobada por DT Antioquia por valor de $ 58.889.340,00 correspondiente al mes de junio de 2024. Revisada y aprobada por planta central, a la espera de notificacion para facturar.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 76,93% — Avance o Atraso Físico %: -5,63%
Meta Física Ejecutada %: 71,30%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1,00
*	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	M3	70,75
	Subbase granular clase C	M3	91,00
	Concreto Hidráulico MR - 3,8 Mpa - Mezcla in situ	M3	60,70
	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	M3	11,20
	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLOS	M3	20,20

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
Prog	1,00	1,00	100,00%
Ejec	1,00	1,00	100,00%
Prog	54,42	54,42	76,92%
Ejec	48,62	48,62	68,72%
Prog	70,00	70,00	76,92%
Ejec	65,84	65,84	72,35%
Prog	46,69	46,69	76,92%
Ejec	42,58	42,58	70,15%
Prog	8,62	8,62	76,96%
Ejec	8,02	8,02	71,61%
Prog	15,54	15,54	76,93%
Ejec	11,54	11,54	57,13%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retro excavadora CATERPILA	1	
Motosierra STHIL 382	1	
Guadaña STHIL 280	1	
Aspersor manual	1	1
Circular INCO	1	1
Pulidora 4"	1	1
Planta eléctrica	1	1
Cizalla grande	1	1
Taladro	1	1
Rana	1	
Mezcladora	1	1

Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	4036,00
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CÁRCAMO	M3	1,40
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	185,00

Prog	3104,62	3104,62	76,92%
Ejec	3089,52	3089,52	76,55%
Prog	1,08	1,08	77,14%
Ejec	1,08	1,08	77,14%
Prog	142,00	142,00	76,76%
Ejec	142,00	142,00	76,76%

Total		7

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: La información plasmada corresponde a la entregada por la JAC.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Por el tipo de convenio y en la zona donde se contruye el proyecto, los permisos anteriores no aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACION POR LA JAC

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha recibido solicitud formal del PAGA por parte de la JAC, se recomienda hacerlo lo antes posible dado al tiempo de tramite para su aporbacion por parte de sostenibilidad de INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	15	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Astillero Calle central, sector el alto, droguería ferbland.

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe ya inicio labores en campo fisico y se esta llevando una buena gestion social.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ESTA SEMANA 22 SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE EXCAVACION PARA VIGAS RIOSTRAS Y CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO GENERAL. SE APLICA Y SE COMPACTA SUBBASE. EN ESTAS ACTIVIDADES DIARIAS SE INCLUYEN EL ARMADO Y FIGURACION DE ACEROS PARA VIGAS RIOSTRAS Y LA INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN CADA TRAMO QUE SE INTERVIENE CON EL FUNDIDO DE CONCRETO TODO BAJO LAS ESPESICACIONES TECNICAS Y ACABADOS DEL DISEÑO DE CONCRETOS SE CONSIDERA EL AVANCE DE VACIADO DE PARTE DEL BORDILLOS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SEMANA VENIDERA SE PROGRAMA, CONTINUAR CON EL VACIADO DE CONCRETO Y DEMAS ACTIVIDADES PRELIMINARES. Y MEJORAR EL RENDIMIENTO YA TENIENDO STOCK DE MATERIALES EN OBRA.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO.



ARMADO DE ACERO PARA VIGA RIOSTRAS.



VACIADO DE CONCRETO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

LA INTERVENTORÍA CONTINUARA APOYANDO LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, CON EL FIN, QUE SE CONSIGAN LOS MAYORES RENDIMIENTOS, ASÍ COMO TAMBIEN, SE EJECUTE EL PROYECTO CON CALIDAD. DESPUES DE REALIZAR LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES, LA INTERVENTORÍA LE A SOLICITADO A LA JAC QUE PARA LA SEMANA VENIDERA GENERA UN MAYOR RENDIMIENTO Y ASÍ PODER CUMPLIR CON LA META, YA QUE ESTA PROXIMO A VENCER EL TIEMPO CONTRATUAL.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA

Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS-CONTRUCCION DE CARCAMOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

SEMANA No.: 23 del 22/07/2024 al 31/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — Apoyo Técnico y Administrativo a la Supervisión de Contratos de Interventoría. — MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIAVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 336,95 ML DE CAMINOS ANCESTRAL - CONSTRUCCIÓN DE 4 UND DE CARCAMO EN CONCRETO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA ASTILLERO, DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6" - N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9"" las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria de la Vereda Astillero del municipio de Valdivia Antioquia, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.			INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3502-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.101.158,00	CONTRATO No.	5066 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.780.410,00
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 89.969.895,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.101.158,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 278.750.305,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 de agosto de 2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 de agosto de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.101.158			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 159.717.220			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 39.383.938			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.780.410	$ 89.969.895		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 188.780.410	$ 45.845.630		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 44.124.265		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.101.158,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 183.753.427,40	92,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 176.020.034,23	88,41%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (7.733.393,17)	-3,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 150.094.344,00	75,39%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 159.717.220,00	80,22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 9.622.876,00	4,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.075.848,50	3,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.355.937,00	9,22%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 53.427.141,79	95,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.925.208,12	84,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.322.919,21	4,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.357.585,00	6,02%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Acta aprobada por DT Antioquia por valor de $ 58.889.340,00 correspondiente al mes de junio de 2024. Revisada y aprobada por planta central, a la espera de notificacion para facturar

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 92,29% — Avance o Atraso Físico % -3,88%

Meta Física Ejecutada % 88,41%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1,00
*	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	M3	70,75
	Subbase granular clase C	M3	91,00
	Concreto Hidráulico MR - 3,8 Mpa - Mezcla in situ	M3	60,70
	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	M3	11,20

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
Prog	1,00	1,00	100,00%
Ejec	1,00	1,00	100,00%
Prog	65,31	65,31	92,31%
Ejec	62,35	62,35	88,13%
Prog	84,00	84,00	92,31%
Ejec	81,24	81,24	89,27%
Prog	56,03	56,03	92,31%
Ejec	52,36	52,36	86,26%
Prog	10,34	10,34	92,32%
Ejec	10,10	10,10	90,18%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retro excavadora CATERPILA	1	
Motosierra STHIL 382	1	
Guadaña STHIL 280	1	
Aspersor manual	1	1
Circular INCO	1	1
Pulidora 4"	1	1
Planta eléctrica	1	1
Cizalla grande	1	1
Taladro	1	1
Rana	1	

Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLOS	M3	20,20
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	4036,00
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CÁRCAMO	M3	1,40
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	185,00

Prog	18,65	18,65	92,33%
Ejec	16,98	16,98	84,06%
Prog	3725,54	3725,54	92,31%
Ejec	3598,25	3598,25	89,15%
Prog	1,29	1,29	92,14%
Ejec	1,25	1,25	89,29%
Prog	170,77	170,77	92,31%
Ejec	168,20	168,20	90,92%

Mezcladora	1	1
Total		7

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: La información plasmada corresponde a la entregada por la JAC.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Por el tipo de convenio y en la zona donde se contruye el proyecto, los permisos anteriores no aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN TRAMITE ANTE EL AREA DE SOSTENIBILIDAD INVIAS

OBSERVACIONES: Se da viabilidad por parte de intervemtoria ante el PAGA, se radica a INVIAS para el concepto final.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	15	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Astillero Calle central, sector el alto, droguería

OBSERVACIONES: El componente social del proyecto a utilizar por parte del PAGA, será empleado en la construccion de una cuneta para dar manejo a un nacimiento de agua que se encuentra presente en el tramo vial intervenido, con el fin de garantizar la durabilidad de la obra y buscar el mayor beneficio de la comunidad, se determinó que el mejor uso a dihco recurso se invierta en esta obra.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ESTA SEMANA 23 SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE EXCAVACION PARA VIGAS RIOSTRAS Y CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO GENERAL. SE APLICA Y SE COMPACTA SUBBASE. EN ESTAS ACTIVIDADES DIARIAS SE INCLUYEN EL ARMADO Y FIGURACION DE ACEROS PARA VIGAS RIOSTRAS Y LA INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN CADA TRAMO QUE SE INTERVIENE, SE CONSTRUYO UN CARCARMO. TODO SE CONSTRUYO CON EL FUNDIDO DE CONCRETO BAJO LAS ESPESICACIONES TECNICAS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SEMANA VENIDERA SE PROGRAMA, CONTINUAR CON EL VACIADO DE CONCRETO PARA BORDILLOS.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



VACIADO DE CONCRETO



VACIADO DE CONCRETO



VACIADO DE CONCRETO DE CALCAMO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

LA INTERVENTORÍA CONTINUARA APOYANDO LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, CON EL FIN, QUE SE CONSIGAN LOS MAYORES RENDIMIENTOS, ASÍ COMO TAMBIEN, SE EJECUTE EL PROYECTO CON CALIDAD. DESPUES DE REALIZAR LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES, LA INTERVENTORÍA LE A SOLICITADO A LA JAC QUE PARA LA SEMANA VENIDERA GENERA UN MAYOR RENDIMIENTO Y ASÍ PODER CUMPLIR CON LA META, YA QUE ESTA PROXIMO A VENCER EL TIEMPO CONTRATUAL.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA

Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO

PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO No. 3502-2023 **CONTRATISTA:** JAC ASTILLERO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5066-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSTRUMAJ S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Vibro para Concreto	DEWALT	3 HP	Vereda Astillero	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Concretadora 1 Bulto	MASTER	1 B CEMENTO	Vereda Astillero	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Pulidora	DEWALT	11,000 R/M	Vereda Astillero	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Radial	DEWALT	5800 R/M	Vereda Astillero	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Cizalla Manual de 90 Cm	N/A	N/A	Vereda Astillero	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Motocarguero (Vehiculo)	AUTECO CERONTE 200	500 K	Vereda Astillero	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Caneca Plastica de 50 Litros	N/A	50 L	Vereda Astillero	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Planta Elecrtica	Honda EP 5500 CX	110/240v	Vereda Astillero	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Aspersor manual	RoyalCondor	8L	Vereda Astillero	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Taladro demoledor	Fujita SDS	48J	Vereda Astillero		X	X	X	X	X		X	X	X													X						X	X	X
Taladro roto-percutor	Einhell TC-ID 800 W 650E	15mm en roca/cemento	Vereda Astillero	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Minicarguero	CAT Gecolsa 236D3	N/A	Vereda Astillero		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Rana			Vereda Astillero	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Volqueta	Plca DDT 912		Vereda Astillero	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				14																														
TOTAL ACTIVO				14																														
TOTAL EN REPARACIÓN				0																														
TOTAL INACTIVO				0																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	14	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Para este mes se tuvo en obra todo el equipo adscrito al contratista; hubo daño en el minicarcador CAT (cambio de llanta), pero fue reparado y puesto

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202-425337 ANT

Firma
Nombre: Julio Córdoba
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	2
PAGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No: 3502 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.096.089-2

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE CAMINOS COMUNITARIOS CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5066 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO ANTIOQUIA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (60%)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MARTA LUCIA GIL TORRES	32561870	CONTADORA PUBLICA	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MARTA LUCIA GIL TORRES	$ 1.300.000	$ 6.800	I	SURA	71963046	$ 162.500	COLPENSIONES	71963046	$ 208.000				
2	HERNAN DE JESUS MEJIA SUAREZ	8407228	INGENIERO RESIDENTE	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	HERNAN DE JESUS MEJIA SUAREZ	$ 1.300.000		V	SURA	1065874657	$ 162.500	COLPENSIONES	1065874657	$ 208.000				
3	LUIS ALBERTO SEPULVEDA CORREA	15295958	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA EL ASTILLERO	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	1065055613	$ 52.000	COLPENSIONES	1065055613	$ 208.000	$ 52.000			
4	JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO	15329751	MAESTRO DE OBRA	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA EL ASTILLERO	$ 2.320.000	$ 161.500	V	COOSALUD	1065055613	$ 92.800	PORVENIR	1065055613	$ 371.200	$ 92.800			
5	JOSE MIGUEL MEJIA	98673646	OFICIAL DE OBRA	$ 1.950.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA EL ASTILLERO	$ 1.950.000	$ 135.800	V	SALUD TOTAL	1065055613	$ 78.000	PORVENIR	1065055613	$ 312.000	$ 78.000			
6	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA	1002065163	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA EL ASTILLERO	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	1065055613	$ 52.000	PORVENIR	1065055613	$ 208.000	$ 52.000			
7	OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ	1007285195	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA EL ASTILLERO	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	1065055613	$ 52.000	PORVENIR	1065055613	$ 208.000	$ 52.000			
8	FABIAN DE JESUS MORA VILLA	1045076532	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA EL ASTILLERO	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	1065055613	$ 52.000	PORVENIR	1065055613	$ 208.000	$ 52.000			
9	EINSON MANUEL ORREGO OSORIO	1045080335	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA EL ASTILLERO	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	1065055613	$ 52.000	PORVENIR	1065055613	$ 208.000	$ 52.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Juan Diego Jimenez Serna
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: No.25202 - 097497 CND.

Firma
Nombre: JULIO CORDOBA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-14, 09:24:26 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1065055613

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

PAGADO 25/08/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAC VEREDA EL ASTILLERO		
Documento	NI900296088	**Dirección**	VTE 1 #1 - 1 VEREDA EL ASTILLERO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3117645833
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VALDIVIA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GALEANO DIDIAN ANDRES	**Identificación**	CC 1045078079
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002065163	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1007285195	OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1045076532	FABIAN DE JESUS MORA VILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1045080335	EINSON MANUEL ORREGO OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 15295958	LUIS ALBERTO SEPULVEDA CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 15329751	JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.320.000	$ 371.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.320.000	$ 92.800	6,960	$ 2.320.000	$ 161.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.320.000	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.300
CC 98673646	JOSE MIGUEL MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.950.000	$ 312.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.950.000	$ 78.000	6,960	$ 1.950.000	$ 135.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.950.000	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.770.000	$ 10.770.000	$ 10.770.000	$ 10.770.000	$ 1.723.200	$ 430.800	$ 749.800	$ 430.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.334.600	$ 7.600	$ 3.342.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-05, 03:00:36 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 71963046

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 05/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTA LUCIA GIL TORRES		
Documento	CC32561870	**Dirección**	CR 19 #17 - 55
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8538074
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	YARUMAL	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 32561870	MARTA LUCIA GIL TORRES	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-13, 02:17:39 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1065874657

Periodo Cotización: julio de 2024 Periodo Servicio: julio de 2024 Referencia pago 8810613211

PAGADA 13/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HERNAN DE JESUS MEJIA SUAREZ		
Documento	CC8407228	Dirección	CL 71 #60 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3117729159
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BELLO	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 8407228	HERNAN DE JESUS MEJIA SUAREZ	3	0																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$1.300.000	$208.000	(EPS010) EPS SURA	$1.300.000	$162.500	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$370.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.300.000	$1.300.000	$0	$0	$208.000	$162.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$370.500	$1.500	$372.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10 – ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONVENIO No: 3502-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

MES Y AÑO DEL INFORME SEMANAL: JULIO DEL 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5066 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	0	18	18	8	8	18	0	16	24	18	18	16	18	0	24		24	24	6	0	0	16	24	24	8	16	24	0	0	24	24	418
Lluvias moderadas		6	6			6				6	6	8	6			24			18			8			16							110
Lluvias intensas				16	16			8																		8						48
Total horas	0	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	24	0	0	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Julio Cesar Cordoba
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Radicado N°. 20249050075014 - PIN: 3028
Fecha: 2024-07-30 10:52 Anexos: 0
Destino: 905 RADICACION Remite: CONSTRUMAJ S
Consulte su trámite en:
https://www.ideam.gov.co

Bogotá, 30 de julio de 2024

Señores
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales
Ciudad

Asunto : INFORME PLUVIOMETRICO

Estimados señores del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM):

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el registro pluviométrico correspondiente a la estación meteorológica más cercana a la vereda Los Astilleros, ubicada en el municipio de Valdivia, departamento de Antioquia, para los meses de junio y julio del presente año.

La información solicitada es de vital importancia para llevar un control enlazada con nuestras labores.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a cualquier documentación o información adicional que se requiera para procesar esta solicitud.

Se adjuntan los siguientes archivos:

Por favor responder a través de mi correo electrónico: interventoria@construryj.com

Atentamente,

CONSTRUMAJ SAS
Documento: 901563205
cra 58#90-53 BOGOTA D.C, BOGOTA D.C..
COLOMBIA
Tel. 6013225888
interventoria@construryj.com

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3502 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 12 de Diciembre de 2023
PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 199.101.158,00
VALOR ACUMULADO: $ 199.101.158,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

CONDICIONES INICIALES

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.820.231,60	22	9	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.955.057,90	22	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.730.347,40	22	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100284893

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 6/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	22	9	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 6/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.820.231,60	22	9	2023	1	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.955.057,90	22	9	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.730.347,40	22	12	2023	30	4	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100284893

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 1/04/2024

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	22	9	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 1/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.820.231,60	22	9	2023	1	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.955.057,90	22	9	2023	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.730.347,40	22	12	2023	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100284893

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	22	9	2023	30	6	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.820.231,60	22	9	2023	22	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.955.057,90	22	9	2023	22	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.730.347,40	22	12	2023	22	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100284893

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	22	9	2023	22	7	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **AMPLIACION DE LA SUSPENSION 1** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.820.231,60	22	9	2023	5	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.955.057,90	22	9	2023	5	8	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.730.347,40	22	12	2023	5	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100284893

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	22	9	2023	5	8	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Juan Diego Jimenez Serna
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.27 20:14:59 -05:00

Código de Seguridad: JDYrSjMfwMyu9TVnyvd4cw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100284893	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71755822	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO	**TELÉFONO**	3042723813
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**TELÉFONO**	7056000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**TELÉFONO**	7056000

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

TOMADOR / GARANTIZADO: LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO) CON NIT (900.296.088-2.)

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 22/09/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.820.231,60	132.552,28
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 22/09/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.955.057,90	97.859,58
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 22/09/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.730.347,40	946.030,52
		TOTAL ASEGURADO	$ 109.505.636,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA DE SEGUROS L	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.176.442,38
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.176.442,38
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	225.006,05
TOTAL A PAGAR	$	1.409.248,43

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Andres Gutierrez
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100284893	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71755822	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (22/09/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA APF

Seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.27 20:15:40 -05:00

Código de Seguridad: PRp1oY3VeH2/VQ+B0beXxA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069480	**No. ANEXO**	0	**No. CERTIFICADO**	71755823	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	27/09/2023	**SUC. EXPEDIDORA**	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		**VIGENCIA HASTA**		**DÍAS**	**VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE**		**VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA**	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO	**TELÉFONO**	3042723813
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO	**TELÉFONO**	3042723813
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	127.123,29
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA DE SEGUROS L	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	127.123,29
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	127.123,29
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	25.103,43
TOTAL A PAGAR	$	157.226,72

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

FIRMA TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - FASE III

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 · **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069480	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71755823	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO) CON NIT (900.296.088-2.)

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (22/09/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.12 15:31:18 -05:00

Código de Seguridad: ROTENq2yI7GlxrIv8fmi2w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100284893	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71872182	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO	**TELÉFONO**	3042723813
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA 30/04/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 01.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 01/03/2025	39.820.231,60	39.602,04
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 30/04/2027	9.955.057,90	9.818,69
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/04/2029	59.730.347,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 109.505.636,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	49.420,73
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	49.420,73
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.389,94
TOTAL A PAGAR	$	58.810,67

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100284893	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71872182	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / GARANTIZADO: LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO) CON NIT (900.296.088-2.)

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (22/09/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.12 16.16.09 -05:00

Código de Seguridad: hevpwOWD7Xr5xQVVbdt6tQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069480	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71872281	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO	**TELÉFONO**	3042723813
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO	**TELÉFONO**	3042723813
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA 30/04/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 01.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	172.383,56
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	172.383,56
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	172.383,56
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	32.752,88
TOTAL A PAGAR	$	205.136,44

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Andres Galeano
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069480	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71872281	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	12/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO) CON NIT (900.296.088-2.)

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (22/09/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: f+akoC9tn7AfhJOIxbSUJw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100284893	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71945684	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	30/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO	**TELÉFONO**	3042723813
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	7056000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	7056000

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30/06/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 02.
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

TOMADOR / GARANTIZADO: LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO) CON NIT (900.296.088-2.)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 01/05/2025	39.820.231,60	19.964,66
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/06/2027	9.955.057,90	12.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/06/2024	24:00 Horas Del 30/06/2029	59.730.347,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 109.505.636,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	31.964,66
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	31.964,66
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.073,29
TOTAL A PAGAR	$	38.037,95

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100284893	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71945684	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	30/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (22/09/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: FNeYhZ7f/dAKuYBev9LpIg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069480	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71945687	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO	No. DOC. IDENTIDAD	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO	TELÉFONO	3042723813
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO	No. DOC. IDENTIDAD	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO	TELÉFONO	3042723813
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30/06/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 02.
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA (JUNTA DE ACCION

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	86.904,11
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	86.904,11
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	86.904,11
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	16.511,78
TOTAL A PAGAR	$	103.415,89

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069480	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71945687	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

COMUNAL EL ASTILLERO), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO) CON NIT (900.296.088-2.)

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (22/09/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: yyKKDGJzV+GPzQxmQWHKCg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100284893	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71960988	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	22/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO	**TELÉFONO**	3042723813
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL ACTA DE SUSPENSIOIN No. 1 AL CONVENIO DESDE EL 26/04/2024 HASTA EL 18/05/2024, CONFORME A LA CUAL SE ACTUALIZA LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO AL 22/07/2024.
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

TOMADOR / GARANTIZADO: LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO) CON NIT (900.296.088-2.)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 22/05/2025	39.820.231,60	15.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 22/07/2027	9.955.057,90	15.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 22/07/2024	24:00 Horas Del 22/07/2029	59.730.347,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 109.505.636,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	30.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	30.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.700,00
TOTAL A PAGAR	$	35.700,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100284893	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71960988	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	22/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (22/09/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Bgv+CVMDdltvcB430kau8g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069480	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71960989	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	22/07/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO	**TELÉFONO**	3042723813
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO	**TELÉFONO**	3042723813
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL ACTA DE SUSPENSIOIN No. 1 AL CONVENIO DESDE EL 26/04/2024 HASTA EL 18/05/2024, CONFORME A LA CUAL SE ACTUALIZA LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO AL 22/07/2024.
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA (JUNTA DE ACCION

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	31.342,47
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	31.342,47
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	31.342,47
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.955,07
TOTAL A PAGAR	$	37.297,54

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069480	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71960989	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	22/07/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

COMUNAL EL ASTILLERO), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO) CON NIT (900.296.088-2.)

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (22/09/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ERp54Meif4wQboWHgDvkOw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100284893	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71964812	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	05/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO	**TELÉFONO**	3042723813
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 1 AL CONVENIO DESDE EL 26/04/2024 HASTA EL 31/05/2024, CONFORME A LA CUAL SE ACTUALIZA LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO AL 05/08/2024.
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

TOMADOR / GARANTIZADO: LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO) CON NIT (900.296.088-2.)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 05/06/2025	39.820.231,60	15.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 05/08/2027	9.955.057,90	15.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 05/08/2024	24:00 Horas Del 05/08/2029	59.730.347,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 109.505.636,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	30.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	30.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.700,00
TOTAL A PAGAR	$	35.700,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100284893	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71964812	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	05/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (22/09/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: DVXks3gizpY4mnQwymZgdw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069480	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71964814	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	05/08/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO	No. DOC. IDENTIDAD	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO	TELÉFONO	3042723813
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO	No. DOC. IDENTIDAD	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO	TELÉFONO	3042723813
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 1 AL CONVENIO DESDE EL 26/04/2024 HASTA EL 31/05/2024, CONFORME A LA CUAL SE ACTUALIZA LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO AL 05/08/2024.
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA (JUNTA DE ACCION

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	19.945,21
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	19.945,21
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	19.945,21
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.789,59
TOTAL A PAGAR	$	23.734,80

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069480	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71964814	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	05/08/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

COMUNAL EL ASTILLERO), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO) CON NIT (900.296.088-2.)

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (22/09/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

INFORME DE INVERSIÓN DE LOS DESEMBOLSOS.

C.MAJ-CI-5066-23
410

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

Bogotá D.C. 06 de septiembre de 2024.

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Atn: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Calle 51 No. 79-51
Medellín, Antioquia

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5066 de 2023 "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.**

ASUNTO: **INFORME FINANCIERO DE DESEMBOLSOS - CONVENIO 3502 DEL 2023.**

Respetados señores:

Por medio del presente comunicado, nos permitimos presentar el informe de los desembolsos aprobados por parte de la interventoría para el convenio citado en el asunto. Este incluirá un desglose detallado de los tres (03) desembolsos efectuados en el mes de julio de 2024, conforme a lo estipulado en el plan de inversiones aprobado.

Desembolso No. 2 de fecha 01 de julio del 2024

Gastos Administrativos	
Detalle	**Valor**
Marta Lucia Gil Torres (Contadora)	$ 2.800.000,00
Hernan de Jesus mejía Suárez (Residente)	$ 3.500.000,00
Bodega	$ 400.000,00
Javier Dario Monsalve Restrepo (Maestro)	$ 2.304.900,00
Subtotal	$ 9.004.900,00
Mano de Obra	
Detalle	**Valor**
Eison Manuel Orrego Osorio	$ 679.000,00
Fabian de Jesus Mora Villa	$ 679.000,00

JAC Remolinos - Préstamo nómina del 01 al 15 de junio 2024	$	6.843.300,00
Luis Alberto Sepulveda	$	679.000,00
Luis Enrique Mejia Mejia	$	679.000,00
Jose Miguel Mejia	$	978.000,00
Omar de Jesus Betancourt	$	679.000,00
Jefferson Daniel Mejia Villa	$	679.000,00
Subtotal	**$**	**11.895.300,00**
TOTAL	**$**	**20.900.200,00**

Desembolso No. 3 de fecha 13 de Julio de 2024

Gastos Administrativos	
JAC El Astillero - Exámenes de ingreso	$164.000,00
Javier Darío Monsalve Restrepo (Maestro)	$1.148.200,00
Seguridad social Maestro de obra	$718.300,00
Subtotal	$ 2.030.500,00
Mano de Obra	
Eison Manuel Orrego Osorio	$ 679.000,00
Fabian de Jesús Mora Villa	$ 679.000,00
Jac Remolinos	$ 258.233,00
Luis Alberto Sepúlveda	$ 679.000,00
Luis Enrique Mejía Mejía	$ 679.000,00
José Miguel Mejía	$ 978.000,00
Omar de Jesús Betancourt	$ 679.000,00
Planilla de seguridad social - Junio	$ 3.018.800,00
Planilla de seguridad social - mayo	$ 884.900,00
Subtotal	**$ 8.534.933,00**
TOTAL	**$ 10.565.433,00**

Desembolso No. 4 de fecha 30 de Julio de 2024

Alquileres y Transporte		
Mezcladora de concreto 1 bulto	$	1.152.000,00
Moto carguera vehículo	$	9.000.000,00
Rete fuente	-$	1.015.624,00
Gasolina Corriente	$	350.000,00
Biodiesel	$	150.000,00
Rete fuente	-$	13.500,00

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
410

Subtotal	**$**	**9.622.876,00**
Gastos administrativos		
Prueba de CBR	$	3.211.861,00
Javier Darío Monsalve Restrepo (Maestro)	$	1.148.200,00
Subtotal	**$**	**4.360.061,00**
Mano de Obra		
Eison Manuel Orrego Osorio	$	679.000,00
Fabian de Jesús Mora Villa	$	679.000,00
Luis Alberto Sepúlveda	$	679.000,00
Luis Enrique Mejía Mejía	$	679.000,00
José Miguel Mejía	$	978.000,00
Omar de Jesús Betancourt	$	679.000,00
Subtotal	**$**	**4.373.000,00**
TOTAL		**$ 18.355.937,00**

El total desembolsado en el mes de julio de 2024 para él convenio 3502 de 2024, es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS **($ 49.821.570,00)** M/CTE

Con el fin de respaldar los pagos mencionados previamente, se adjuntan los siguientes documentos que sirven como verificación del desembolso efectuado, asegurando la transparencia y precisión en los registros financieros:

- Plan de inversión desembolso convenio.
- Informe inversión buen manejo desembolso
- Actas de comité operativo.
- Soportes Contables desembolso No. 02
- Soportes Contables desembolso No. 03
- Soportes Contables desembolso No. 04

Agradecemos de antemano su atención quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional en caso de requerirse.

Cordialmente.
CONSTRUMAJ S.A.S.

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal.

Copia:	Archivo.

C.MAJ-CI-5066-23
410

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

Proyectó:	Valentina Torres – Auxiliar de ingeniería
Aprobó:	Juan Diego Jiménez Serna - director de interventoría.

PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	1 de 1
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2, 3 y 4
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3502 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ S.A.S. Interventorías y Obras Civiles

JUSTIFICACIÓN:

El convenio 3502 de 2023 fue suspendido el 26 de abril de 2024 hasta el 30 de mayo de 2024, ambas fechas inclusive, el inicio de actividades en obra se dio para el 01 de junio de 2024, el proyecto estaba proyectado para ua ejecucion de 02 meses; sin embargo, dado a inconvenientes a la hora de realizar los primeros desembolsos a traves de cheques, fue necesario realizar cambio en la modalidad, lo cual llevo a que se retrasara la ejecucion de las obras en aproximadamente 25 dias, esto generó la necesidad de prorrogar el contrato incrementando costos de mano de obra.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	$ 48.030.800		$ 14.395.651	$ 62.426.451,00	31,5%
2	MANO DE OBRA	$ 11.895.300	$ 12.907.933	$ 8.833.005	$ 33.636.238,22	17,0%
3	ALQUILER DE EQUIPOS Y TRANSPORTES	$ 43.016.000		$ 9.622.876	$ 52.638.876,00	26,6%
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Personal, Seguridad Industrial, Medidas Ambientales, Gastos Bancarios, Otros costos, PAGA)	$ 18.848.850	$ 15.395.461	$ 11.651.052,78	$ 45.895.363,78	23,2%
5	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)			$ 3.504.239,00	$ 3.504.239,00	1,8%
TOTAL		$ 121.790.950,00	$ 28.303.394,00	$ 48.006.824,00	$ 198.101.168,00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Andres galeano
Nombre: DIDIAN ANDRÉS GALEANO PALACIO
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 05202-425337 ANT

Contratista

Firma:
Nombre: GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
410

INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

Carrera 58 # 90 - 53 Telefax: 3225888 Cel: 304 379 0061
Bogotá D.C. cmaj2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 30/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3502-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 25,15% **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 49.821.570,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, TRANSFERENCIA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Documento equivalente (Cuenta de cobro)	2	30-jun-24	Martha Lucia Gil Torres	$ 2.800.000,00	4	HONORARIOS CONTADORA
Documento equivalente (Cuenta de cobro)	2	30-jun-24	Hernan de Jesús Mejia Suarez	$ 3.500.000,00	4	HONORARIOS RESIDENTE DE OBRA
Documento equivalente (Cuenta de cobro)	2	15-jun-24	Alexandra Yanneth Arboleda Correa	$ 400.000,00	4	ALQUILER DE BODEGA
Documento equivalente (Cuenta de cobro)	1	30-jun-24	Junta de accion comunal Barrio Tapias Remolinos	$ 8.000.000,00	2 y 4	PRESTAMO NOMINA PRIMERA QUINCENA
Nomina del 16 al 30 de junio de 2024	N/A	30-jun-24	Javier Dario Monsalve Restrepo	$ 1.148.200,00	4	MAESTRO DE OBRA
Nomina del 16 al 30 de junio de 2024	N/A	30-jun-24	Eison Manuel Orrego Osorio	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA
Nomina del 16 al 30 de junio de 2024	N/A	30-jun-24	Fabian de Jesus Mora Villa	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA
Nomina del 16 al 30 de junio de 2024	N/A	30-jun-24	Luis Alberto sepulveda	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA
Nomina del 16 al 30 de junio de 2024	N/A	30-jun-24	Luis Enrique Mejia Mejia	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA
Nomina del 16 al 30 de junio de 2024	N/A	30-jun-24	Jose Miguel Mejia	$ 978.000,00	2	OFICIAL DE OBRA
Nomina del 16 al 30 de junio de 2024	N/A	30-jun-24	Omar de Jesus Betancour	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA
Nomina del 16 al 30 de junio de 2024	N/A	30-jun-24	Jefferson Daniel Mejia Villa	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA
Factura Electronica	A-3401	13-jul-24	Alvaro Alejandro Espinosa Rojas	$ 164.000,00	4	Examenes de Ingreso
Cuenta de Cobro	1	30-jun-24	Junta de accion comunal Barrio Tapias Remolinos	$ 258.233,00	2	Excedente JAC remolinos nomina No. 1
Nomina del 01 al 15 de julio de 2024	N/A	13-jul-24	Einson Manuel	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA
Nomina del 01 al 15 de julio de 2024	N/A	13-jul-24	Fabian Mora	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA
Nomina del 01 al 15 de julio de 2024	N/A	13-jul-24	Javier Monsalve (Maestro)	$ 1.148.200,00	2	MAESTRO DE OBRA
Nomina del 01 al 15 de julio de 2024	N/A	13-jul-24	Jose Miguel Mejia (Oficial)	$ 978.000,00	2	OFICIAL DE OBRA
Nomina del 01 al 15 de julio de 2024	N/A	13-jul-24	Luis Enrique Mejia	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA

Nomina del 01 al 15 de julio de 2024	N/A	13-jul-24	Luis Alberto Sepulveda	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA
Nomina del 01 al 15 de julio de 2024	N/A	13-jul-24	Omar Betancourt	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA
Cuenta de Cobro	2	24-jun-24	Junta de Accion Comunal Vereda el Astillero	$ 4.622.000,00	2	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Nomina del 16 al 30 de julio de 2024	N/A	30-jul-24	Javier Dario Monsalve Restrepo	$ 1.148.200,00	4	MAESTRO DE OBRA
Nomina del 16 al 30 de julio de 2024	N/A	31-jul-24	Jose Miguel Mejia	$ 978.000,00	2	OFICIAL DE OBRA
Nomina del 16 al 30 de julio de 2024	N/A	1-ago-24	Luis Enrique Mejia	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA
Nomina del 16 al 30 de julio de 2024	N/A	2-ago-24	Omar de Jesus Betancout	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA
Nomina del 16 al 30 de julio de 2024	N/A	3-ago-24	Fabian de Jesus Mora	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA
Nomina del 16 al 30 de julio de 2024	N/A	4-ago-24	Einson Manuel Orrego	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA
Nomina del 16 al 30 de julio de 2024	N/A	5-ago-24	Luis Alberto Sepulveda	$ 679.000,00	2	AYUDANTE DE OBRA
Factura Electronica	FE3371	21-jun-24	Fabio Hernan Jaramillo Cardona	$ 3.211.861,00	4	Ensayo prueba CBR
Ctizacion	N/A	22-jul-24	Miguel Angel Echavarria Jaramillo	$ 486.500,00	3	Combustible
Cotizacion	N/A	22-jul-24	Hernando Albeiro Arango	$ 9.136.376,00	3	Alquiler Equipos
				$ 49.821.570,00		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 62.426.451,00	$ 48.030.800,00	$ -	$ 48.030.800,00	$ 14.395.651,00
2	MANO DE OBRA	$ 33.636.238,22	$ -	$ 26.669.733,00	$ 26.669.733,00	$ 6.966.505,22
3	ALQUILER DE EQUIPOS Y TRANSPORTES	$ 52.638.876,00	$ 43.016.000,00	$ 9.622.876,00	$ 52.638.876,00	$ -
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Personal, Seguridad Industrial, Medidas Ambientales, Gastos Bancarios, Otros costos, PAGA)	$ 45.895.363,78	$ 18.848.850,00	$ 13.528.961,00	$ 32.377.811,00	$ 13.517.552,78
5	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 3.504.239,00		$ -	$ -	$ 3.504.239,00
	TOTALES	**$ 198.101.168,00**	**$ 109.895.650,00**	**$ 49.821.570,00**	**$ 159.717.220,00**	**$ 38.383.948,00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_07_) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Andres Galeano
Nombre: DIDIAN ANDRÉS GALEANO PALACIO
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Giovanni Luchini Luchini
Representante Legal
Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
Nombre: HERNAN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 05202-425337 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
410

ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO

Carrera 58 # 90 - 53 Telefax: 3225888 Cel: 304 379 0061
Bogotá D.C. cmaj2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 3502
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASTILLEROS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASTILLEROS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZAR LOS DESEMBOLSOS SOLICITADOS POR LA JAC

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Presentación
2. Explicación del objeto del comité operativo: Residente de Obra
3. Informe de desembolso solicitado: Contadora
4. Dudas e inquietudes: Participantes
5. Acuerdos, compromisos y conclusiones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El presidente de la junta Didian Andres Galeano efectúa un corto saludo, también realiza una corta presentación de todos los participantes y agradece a los compañeros por su participacion.
De parte de la interventoría saludan el ingeniero Julio Córdoba, la profesional social Daniela; Se dio paso a la intervencion de la profesional social de interventoria quien da la bienvenida, los motivos de la reunion. se da la intervencion del ingeniero Julio Cordoba con los respectivos balances.

Debidamente se le da paso al ingeniero residente de obra para su intervenicion, quien proyecta a través de una tabla excel los pagos a desembolsar correspondiente al pago de nomina del personal de las dos quincenas de junio, el pago de los honorarios de los profesionales y el alquiler de la bodega de la sigueinte manera:

Nomina del 01 al 15 de junio (incluye maestro de obra) por valor de $8.258.233; sin ambergo, se prueba pago de $8.000.000 que prestó la JAC Remolinos.
Nomina del 16 al 30 de junio (incluye maestro de obra) por valor de $6.200.200
Valor honorarios Residente de obra del mes de junio de 2024 por valor de $3.500.000
Valor honorarios Contadora del mes de junio de 2024 por valor de $2.800.000
Alquiler de Bodega por valor de $400,000

Luego de revisar la solicitud de la JAC la interventoria aprueba desembolsar un total de $20.900.200,00, donde los participantes del comite tambien aprobaron realizar dicho desembolso.

El Ingeniero Julio Córdoba agradece a los miembros del comité por la atención y el compromiso que tiene con la obra
Así se da por terminado el comité operativo número 2
4. Dudas e Inquietudes:
se dio paso a resolver las dudas e inquietudes.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DANIELA RIVERO MUENTES	PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA	CONSTRUMAJ	
JULIO CESAR CORDIBA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSTRUMAJ	
HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUAREZ	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO	
DIDIAN ANDRÉS GALEANO PALACIO	REPRESENTANTE LEGAL	J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO	Andres Galeano
MARTA LUCIA GIL TORRES	CONTADORA	J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO	
SANDRA PATIÑO	VEEDORA	J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO	
CESAR HUMBERTO OCHOA MISAS	TESORERO	J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO	Cesar Ochoa

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 3502
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASTILLEROS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASTILLEROS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZAR LOS DESEMBOLSOS SOLICITADOS POR LA JAC

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Presentación
2. Explicación del objeto del comité operativo: Residente de Obra
3. Informe de desembolso solicitado: Contadora
4. Dudas e inquietudes: Participantes
5. Acuerdos, compromisos y conclusiones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El presidente de la junta Didian Andres Galeano efectúa un corto saludo, también realiza una corta presentación de todos los participantes y agradece a los compañeros por su participacion.

De parte de la interventoría saludan el ingeniero Julio Córdoba, la profesional social Daniela; Se dio paso a la intervencion de la profesional social de interventoria quien da la bienvenida, los motivos de la reunion. se da la intervencion del ingeniero Julio Cordoba con los respectivos balances.

Debidamente se le da paso al ingeniero residente de obra para su intervenicion, quien proyecta a través de una tabla excel los pagos a desembolsar mediante el presente comite.

La iterventoria menciona que de la solicitud recibida previamente al comite operativo, aprueba realizar los siguientes pagos:

Examenes medicos de ingreso por valor de $164,000
Nomina del 01 al 15 de julio (incluye maestro de obra) por valor de $5.521.200
Saldo de la nomina del 01 al 15 de junio de 2024 por valor de $258.233
Planillas de seguridad social por valor de $4.622.000 (incluye al maestro de obra)

Para un total de $10.565.433, donde los participantes del comite tambien aprobaron realizar dicho desembolso.

El Ingeniero Julio Córdoba agradece a los miembros del comité por la atención y el compromiso que tiene con la obra

Así se da por terminado el comité operativo número 3

Dudas e Inquietudes:
se dio paso a resolver las dudas e inquietudes.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/07/2024 (Día / Mes / Año)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DANIELA RIVERO MUENTES	PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA	CONSTRUMAJ	
JULIO CESAR CORDIBA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSTRUMAJ	
HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUAREZ	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO	
DIDIAN ANDRÉS GALEANO PALACIO	REPRESENTANTE LEGAL	J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO	Andres Galeano
MARTA LUCIA GIL TORRES	CONTADORA	J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO	
SANDRA PATIÑO	VEEDORA	J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO	Sandra Patiño O
CESAR HUMBERTO OCHOA MISAS	TESORERO	J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO	Cesar Ochoa

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 3502
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASTILLEROS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASTILLEROS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Presentación
2. Explicación del objeto del comité operativo: Residente de Obra
3. Informe de desembolso solicitado: Contadora
4. Dudas e inquietudes: Participantes
5. Acuerdos, compromisos y conclusiones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El presidente de la junta Didian Andres Galeano efectúa un corto saludo, también realiza una corta presentación de todos los participantes y agradece a los compañeros por su participacion.

De parte de la interventoría saludan el ingeniero Julio Córdoba, la profesional social Daniela; Se dio paso a la intervencion de la profesional social de interventoria quien da la bienvenida, los motivos de la reunion. se da la intervencion del ingeniero Julio Cordoba con los respectivos balances.

Debidamente se le da paso al ingeniero residente de obra para su intervenicion, quien proyecta a través de una tabla excel los pagos a desembolsar mediante el presente comite.

La iterventoria menciona que de la solicitud recibida previamente al comite operativo, aprueba realizar los siguientes pagos:

Alquiler de mezcladora por valor de $1.152.000 y Moto carguero por valor de $9.000.000 - se aplica retencion en la fuente por valor de $1.015.624
Combustible por valor de $500,000 - se aplica retencion en la fuente por valor de $13.500
Ensayos de laboratorio (Saldo) por valor de $3.211.861
Nomina del 16 al 30 de julio de 2024 (incluye al maestro de obra) por valor de $5.521.200

Para un total de $18.355.937, donde los participantes del comite tambien aprobaron realizar dicho desembolso.

El Ingeniero Julio Córdoba agradece a los miembros del comité por la atención y el compromiso que tiene con la obra

Así se da por terminado el comité operativo número 4

Dudas e Inquietudes:
se dio paso a resolver las dudas e inquietudes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/07/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DANIELA RIVERO MUENTES	PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA	CONSTRUMAJ	
JULIO CESAR CORDIBA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSTRUMAJ	
HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUAREZ	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO	
DIDIAN ANDRÉS GALEANO PALACIO	REPRESENTANTE LEGAL	J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO	Andres galeano
MARTA LUCIA GIL TORRES	CONTADORA	J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO	
SANDRA PATIÑO	VEEDORA	J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO	
CESAR HUMBERTO OCHOA MISAS	TESORERO	J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO	Cesar OCHOA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
410


SOPORTES CONTABLES DESEMBOLSO No. 2

Valdivia, Junio 30 de 2024

JAC VEREDA EL ASTILLERO

Nit. 900.296.088

Debe a **MARTA LUCIA GIL TORRES**, identificada con cédula de ciudadanía numero 32.561.870 de Yarumal, la suma de Dos millones ochocientos mil pesos m/l ($2.800.000.oo) por concepto de Asesoría contable, Financiera y tributaria, correspondiente al periodo Junio 01 a Junio 30 de 2024 , organización y procesamiento de información contable, elaboración de informes contables.



MARTA LUCIA GIL TORRES

C.C 32.561.870 de Yarumal

Contadora Pública Titulada U. de M

Cuenta ahorros Bancolombia número 5033-6027605.

Cuenta ahorros CFA número 024-0102211-9

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-07, 09:47:51 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 70902374

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024

PAGADO 07/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTA LUCIA GIL TORRES		
Documento	CC32561870	**Dirección**	CR 19 #17 - 55
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8538074
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	YARUMAL	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 32561870	MARTA LUCIA GIL TORRES	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

A continuación, en mi condición de contadora de la Junta de Acción Comunal Vereda El Astillero, del municipio de Valdivia, me permito presentar el INFORME del periodo de Mayo 15 a Junio 15 de 2024, para la supervisión de las actividades contratadas, tal como se expresa a continuación.

1. CONTRATISTA Y CONTRATO.

Contratista:	**MARTA LUCIA GIL TORRES**	**Contrato Nro.**		**Mes:**	Mayo	
Fecha informe:	**Junio de 204**	**Rango del Informe:**	**Del: 15 de Mayo de 2024**	**Junio 30 de 2024**	**Días**:	**30**
Objeto del contrato:						
EL CONTRATISTA de manera independiente, usando para ello sus propios medios, con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, bajo los términos de referencia y condiciones relacionadas en este CONTRATO, prestará al CONTRATANTE, los servicios y conocimientos necesarios para desarrollar las funciones propias como **CONTADORA PÚBLICA.**						

2. TABLA DE ACTIVIDADES.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Recibir y clasificar todos los documentos, debidamente enumerados que le sean asignados (comprobante de ingreso, cheques, cuentas por cobrar y otros).	Se realizó el debido proceso de recepción y clasificación de los documentos contables, para Comprobantes de egresos, documentos soporte electrónico y factura de venta.
Examinar y analizar la información que contienen los documentos que le sean asignados.	Se analizó el balance de prueba, para ver todos los movimientos asentados en las cuentas de contables usadas por la corporación.
Codificar las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos establecidos	Todas las transacciones y movimientos contables se fueron asentadas de acuerdo a las necesidades de cada caso, utilizando para ello los códigos establecidos para la corporación.
Preparar los estados financieros de la entidad.	Identifica los activos, pasivos, ingresos o gastos, determinando periódicamente el estado de la empresa. No se han presentado los estados financieros a la fecha de elaboración este informe con corte parcial.
Contabilizar las nóminas de pagos del personal de la Institución.	No se ha requerido contabilizar las nóminas de pagos para personal.

Implementar el sistema contable y realizar el registro de la información contable.	Verificar la aplicación de las normas legales Instaurar las cuentas necesarias en el Software de contabilidad para el registro de ingresos, y gastos efectuados durante el desarrollo del proyecto en curso.
Elaborar los asientos contables, de acuerdo al manual de procedimientos de la unidad de registro, en la documentación asignada.	Se realizó asientos contables, sobre el procedimiento a seguir para elaborar cada asiento de contabilidad.
Verificar la exactitud de los registros contables en el comprobante de diario procesado con el programa de contabilidad.	Se verificaron las cuentas usadas para el registro de cada uno de los movimientos y transacciones contables.
Emitir cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicios de personal, etc.	No fue requerida la emisión de cheques para tales fines, durante el periodo que comprende el presente informe.
Llevar el control de cuentas por pagar	Se realizó consulta en el Balance de prueba, de las cuentas por pagar, para posteriormente rectificar sus estados contables.
Llevar el control bancario de los ingresos de la Institución que entran por caja	No se han recibido ingresos por caja hasta la fecha.
Realizar conciliaciones bancarias	se realizó conciliaciones bancarias

Fortalecer administrativamente y financiera la entidad en procesos de control interno y manuales.	Hasta el momento no se han implementado manuales para fortalecimiento administrativo y contable para la organización.
Atender oportunamente los requerimientos del CONTRATANTE	Se atendieron por vía telefónica todos requerimientos solicitados por el contratante.
Cumplir con las obligaciones al CONTRATANTE de cualquier inconveniente que surja e incida en la debida y oportuna ejecución del CONTRATO.	No se presentaron inconvenientes a la fecha.
Guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre toda la información que llegue a conocer en relación con los SERVICIOS y toda la información relacionada con la entidad y los procesos que desarrolla, con excepción de aquella que expresamente sea indicada de pública divulgación o que por virtud de la ley sea pública, Las obligaciones acá previstas se harán extensivas a los subcontratistas del CONTRATO, si a ello hubiere lugar.	Toda la información relacionada con la corporación ha sido manejada con confidencialidad absoluta, para todos los casos que lo ameriten.
Atender las sugerencias, recomendaciones y advertencias que imparta Corporación de Comunicaciones Valdivia, siempre que éstas se relacionen con el objeto CONTRATO.	A la fecha la Junta de acción comunal, no ha impartido sugerencias, recomendaciones, advertencias.
Tener disposición de asesorar vía mail o telefónicamente cuando se presente alguna inquietud al respecto de temas que sean vital para el desarrollo del proyecto, las demás que se deriven de la ejecución del CONTRATO o de la ley.	Se atendieron las llamadas telefónicas de la auxiliar administrativa y contable, para resolver dudas sobre el manejo de los códigos en los documentos contables que maneja la Junta.
Mantener permanente comunicación con los demás integrantes del equipo de trabajo acerca de las actividades desarrollados dentro del proyecto.	Se realizó una continua retroalimentación de las actividades a desarrollar en marco del proyecto.
Apoyar al CONTRATANTE en la construcción y presentación de propuestas a convocatorias para la gestión de recursos en temas comunicaciones o audiovisuales.	Para la fecha no se han presentado propuestas a convocatorias
Cumplir con la normatividad nacional e internacional inherente a las funciones establecidas en el contrato	Toda la normatividad se ha cumplido de acuerdo a lo establecido por la ley.
Demás funciones que sean asignadas.	El contratante no asigno más actividades para la fecha.



MARTA LUCIA GIL TORRES
CONTRATISTA

Formulario del Registro Único Tributario

001 135

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14899544224

(415)7707212489984(8020) 000001489954422 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 2 5 6 1 8 7 0	4	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 2 5 6 1 8 7 0	1 9 9 8 0 5 0 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Yarumal 8 8 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GIL	TORRES	MARTA	LUCIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Yarumal 8 8 7

41. Dirección principal: CR 19 17 55

42. Correo electrónico: MALUGITO323@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 7 6 4 5 8 3 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 2 0	2 0 0 5 0 6 2 0	0 1 5 0	2 0 1 8 0 1 0 2				2 4 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 28 / 13 : 22: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GIL TORRES MARTA LUCIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE


COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
99479-T
MARTA LUCIA
GIL TORRES
C.C. 32561870
RESOLUCION INSCRIPCION 26 FECHA 2004/03/18
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

COPIA VÁLIDA

JAC VEREDA EL ASTILLERO

NIT. 900.296.088

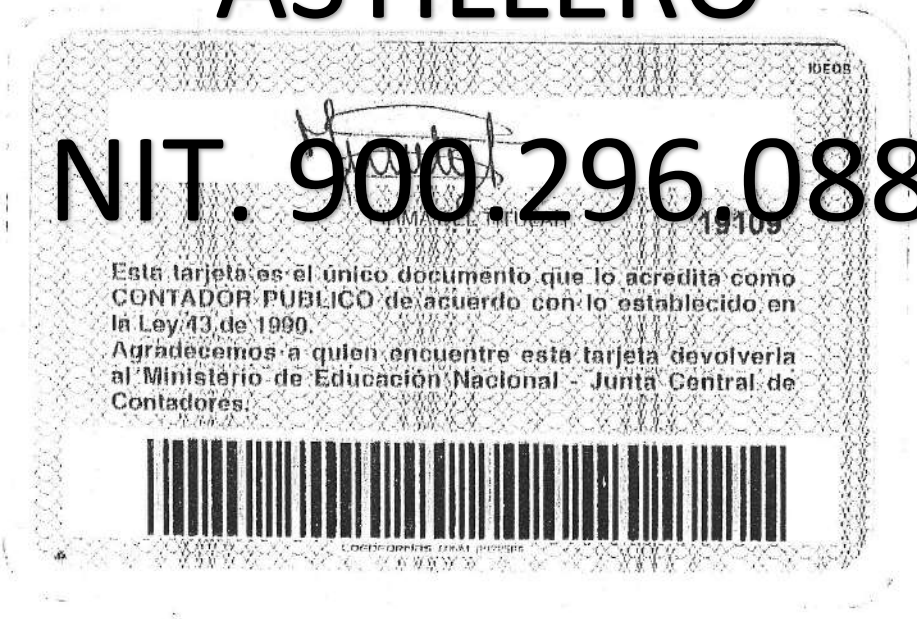
IDEOS
19109
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Certificado Bancario

Jueves, 4 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARTA LUCIA GIL TORRES identificado(a) con CC 32561870, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	50336027605	2007/09/05	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 2.807.100,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Contadora

******7605**

Monto a acreditar $ 2.800.000,00

Monto $
2.800.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	--
Descripción:	pago junio

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
Nit. 900.296.088-2

DEBE A:

HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ
CC: 8.407.228

Dirección:
Calle 71 # 60 – 14 Apto 201- Bello (Ant)


Celular:
3117729159 --- 3117821767--- 2725379

LA SUMA DE: Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/L ($ 3.500.000,oo)

Por concepto de:

(3.500.000,oo) POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 COMO INGENIERO CIVIL, RESIDENTE DE OBRA PARA EL **CONVENIO SOLIDARIO 3502 DEL 2023** FIRMADO ENTRE **INVIAS** Y LA **J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO**; PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

Ciudad y fecha: Bello, Antioquia – 30 de junio de 2024



HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ
Ing. Civil; Residente de Obras
C.C. 8.407.228 Bello (Ant)

F*avor consignar en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA, Número 311-524688-25*

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8.407.228

MEJIA SUAREZ
APELLIDOS

HERNAN DE JESUS
NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

6



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-NOV-1962

DON MATIAS
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

08-ENE-1981 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100150-00236981-M-0008407228-20100428 0022064670A 1 7010731489

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

05202-426337 ANT

Fecha de Expedición: 20/06/2019

Matrícula Profesional

Nombre:
HERNAN DE JESUS
MEJIA SUAREZ

Identificación:
C.C. 8407228

Profesión:
INGENIERO CIVIL

Institución:
POLITECNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID



15

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

Certificación Bancaria

Bancolombia

Viernes, 21 de enero de 2022

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **HERNAN DE JESUS MEJIA SUAREZ** identificado(a) con cc. **8407228** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	311-524688-25	2009/08/24	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Dorian Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 3.507.100,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Residente

******8825**

Monto a acreditar $ 3.500.000,00

Monto $
3.500.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	--
Descripción:	geniero hernan

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

CUENTA DE COBRO No. 02

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASTILLEROS
NIT: 900296088-2

DEBE A:
ALEXANDRA YANNET ARBOLEDA CORREA
CC:32.559.482

LA SUMA DE: $400.000
VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos mil pesos M/L

POR CONCEPTO DE: Alquiler de local del 01 al 15 de junio a fines del convenio 3502 de 2023, “aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal vereda el astillero, municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total”.

Dado en Puerto Valdivia, el 15 de junio de 2024

Cordial saludo,

Alexandra Arboleda C

ALEXANDRA YANNET ARBOLEDA CORREA
CC:32.559.482
Celular:3218558034

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14821895873

(415)7707212489984(8020) 000001482189587 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 2 5 5 9 4 8 2	3	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 2 5 5 9 4 8 2	1 9 9 3 1 2 1 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Yarumal 8 8 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARBOLEDA	CORREA	ALEXANDRA	JANNETH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Yarumal 8 8 7

41. Dirección principal: CL 18 23 A 41

42. Correo electrónico: alexa0675@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 8 5 5 8 0 3 4	3 2 1 8 5 5 8 0 3 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 0 5 0 1 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	2																								

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2022 - 04 - 05 / 12 : 40: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ POSSO LUIS HERNANDO
985. Cargo Gestor III

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **32.559.482**

ARBOLEDA CORREA

APELLIDOS

ALEXANDRA YANNETH

NOMBRES

Alexandra Arboleda

FIRMA



10:53 a. m. ✓



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-NOV-1975**

VALDIVIA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

13-DIC-1993 YARUMAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0102500-00810170-F-0032559482-20160406 0049206558 4A 1 45513404

10:53 a. m. ✓

Certificado Bancario

Martes, 27 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALEXANDRA YANNETH ARBOLEDA CORREA identificado(a) con CC 32559482, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	50386039779	2012/07/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 407.100,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Bodega

******9779**

Monto a acreditar $ 400.000,00

Monto $
400.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	--
Descripción:	arriendo bodega

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Puerto Valdivia, 30 de junio de 2024

Cuenta de cobro JACTR 01

Junta de acción comunal vereda El Astillero
Nit: 900296088

Debe a la:

Junta de Acción Comunal Barrio Tapias Remolinos con **NIT 900387469,** con domicilio en puerto valdivia Antioquia

La suma de ocho millones docientos
cincuenta y ocho mil docientos treinta y tres
pesos .($8.258.233)

Por concepto de:

Préstamo

Autorizamos consignar a la cuenta bancaria que se encuentra a nombre de la JAC Barrio Tapias Remolinos, Cuenta de Ahorros número: **50300003335**

Javier Monsalve

Javier Darío Monsalve Restrepo
CC 15 329 751
Tel. 312 8467961
Presidente JAC Barrio tapias Remolinos

LOGO

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 900.296.088-2

NOMINA

Fecha de corte Junio 15 de 2024

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	DIAS LABORADOS	SUELDO BASICO	DEVENGADO			DOMINICALES Y FESTIVOS	HORAS CON RECARGO	INCENTIVO DE APOYO	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO POR NOMINA	OTROS PAGOS	TOTAL A PAGAR	CARGO
					BASICO	AUXI TRANS	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					SALUD	PENSION						
1	JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO	15.329.751	15	2.320.000	$ 1.160.000	$ 81.000	$ -	-	-	-	1.241.000	46.400	46.400		92.800	1.156.700	-	$ 1.156.700	MAESTRO DE OBA
2	JOSE MIGUEL MEJIA	98673646	15	$ 1.950.000	$ 1.755.000	$ 145.800	$ -	-	-	$ -	$ 1.900.800	$ 70.200	$ 70.200	$ -	$ 140.400	$ 1.760.400	-	$ 1.760.400	OFICIAL DE CONSTRUCCION
3	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA	1.002.065.163	15	$ 1.300.000	$ 823.333	$ 102.600	$ -	-	-		$ 925.933	$ 33.000	$ 33.000	$ -	$ 66.000	$ 859.933	-	$ 859.933	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
4	OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ	1.007.285.195	15	$ 1.300.000	$ 1.170.000	$ 145.800	$ -	-	-	$ -	$ 1.315.800	$ 46.800	$ 46.800	$ -	$ 93.600	$ 1.222.200	-	$ 1.222.200	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
5	FABIAN DE JESUS MORA VILLA	1.045.076.532	15	$ 1.300.000	$ 866.667	$ 108.000	$ -	-	-	$ -	$ 974.667	$ 34.700	$ 34.700	$ -	$ 69.400	$ 905.267	-	$ 905.267	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
6	YEFERSON DANIEL MEJIA VILLA	1.044.150.170	15	$ 1.300.000	$ 866.667	$ 108.000	$ -	-	-	$ -	$ 974.667	$ 34.700	$ 34.700	$ -	$ 69.400	$ 905.267	-	$ 905.267	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
7	EINSON MANUEL ORREGO OSORIO	1.045.080.335	15	$ 1.300.000	$ 866.667	$ 108.000	$ -	-	-	$ -	$ 974.667	$ 34.700	$ 34.700	$ -	$ 69.400	$ 905.267	-	$ 905.267	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
8	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	15.295.958	12	$ 1.300.000	$ 520.000	$ 64.800	$ -	-	-	$ -	$ 584.800	$ 20.800	$ 20.800	$ -	$ 41.600	$ 543.200	-	$ 543.200	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
																		$ 8.258.233	

Redeban

JUN 15 2024 15:03:03 REMDES 9,90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CHACHIRIME VALD
VRD CACHIRIME CHACHIRIM
C.UNICO: 3007038394 TER: 90072932
MAESTRO
**360* RECIBO: 025965 RRN: 038935
CTA ORIGEN: *********
PROD DESTINO: 0000000031371277
ARQC: 8E8078E69F944689
ATC: 0000000041010

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

MUNICIPIO DE VALDIVIA **NIT. 900.296.088-2**

COLILLA DE PAGO

NOMBRE EMPLEADO:	YEFERSON DANIEL MEJIA VILLA
CC:	1.044.150.170
PERIODO PAGADO:	Del 1 al 15/06/2024
CARGO:	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
DIAS LABORADOS:	15
DEVENGADOS	
SALARIO QUINCENAL	650.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	81.000
INCENT DE APOYO	0
RECARGO DOMINICAL	246.067
HORAS EXTRAS	0
TOTAL DEVENGADO	977.067
DEDUCCIONES	
APORTES A SALUD	35.900
APORTES A PENSIÓN	35.900
OTRAS DEDUCCIONES	0
TOTAL DEDUCCIONES	71.800
OTROS PAGOS	-
NETO A PAGAR	**905.267**

CONSIGNADO N° DE CUENTA el 28 de mayo

FIRMA DEL EMPLEADO

Yeferson Mejia

CC 1044150170

HUELLA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA **NIT. 900.296.088-2**

COLILLA DE PAGO

NOMBRE EMPLEADO:	JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO
CC:	98673646
PERIODO PAGADO:	Del 1 al 15/06/2024
CARGO:	MAESTRO DE OBA
DIAS LABORADOS:	12
	928.000
SALARIO QUINCENAL	81.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	0
BONIFICACION	0
RECARGO DOMINICAL	0
HORAS EXTRAS	1.009.000
TOTAL DEVENGADO	
DEDUCCIONES	
	56.400
APORTES A SALUD	56.400
APORTES A PENSIÓN	0
OTRAS DEDUCCIONES	112.800
TOTAL DEDUCCIONES	
OTROS PAGOS	1.377.800
NETO A PAGAR	

CONSIGNADO N° DE CUENTA el 5de junoo

FIRMA DEL EMPLEADO

Javier Monsalve

CC 1539751

HUELLA

Redeban

JUN 15 2024 15:01:25 RBMDES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CHACHIRIME VALD
VRD CACHIRIME CHACHIRIM
C.UNICO: 3007038394 TER: 90022932
MAESTRO
**360 RECIBO: 025964 RRN: 038934
CTA ORIGEN: **********
PROD DESTINO: 0000000037 48266827
ARQC: 868F7FF0846707EA
AID: A0000000041010
AP LABEL: Debit Mast
TRANSFERENCIA APRO: 404797

VALOR $ 905.267

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA **NIT. 900.296.088-2**

COLILLA DE PAGO

	EINSON MANUEL ORREGO OSORIO
	1.045.080.335
	Del 1 al 15/06/2024
	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
	15
SALARIO QUINCENAL	650.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	81.000
BONIFICACION	0
RECARGO DOMINICAL	246.067
HORAS EXTRAS	0
TOTAL DEVENGADO	977.067
DEDUCCIONES	
APORTES A SALUD	35.900
APORTES A PENSIÓN	35.900
OTRAS DEDUCCIONES	0
TOTAL DEDUCCIONES	71.800
OTROS PAGOS	-
NETO A PAGAR	**905.267**

CONSIGNADO N° DE CUENTA el 28 e amyo

FIRMA DEL EMPLEADO

Einson Orrego

CC 1045080335

HUELLA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA **NIT. 900.296.088-2**

COLILLA DE PAGO

NOMBRE EMPLEADO:	JOSE MIGUEL MEJIA
CC:	98.673.646
PERIODO PAGADO:	Del 1 al 15/06/2024
CARGO:	OFICIAL DE CONSTRUCCION
DIAS LABORADOS:	15
DEVENGADOS	
SALARIO QUINCENAL	975.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	81.000
BONIFICACION	0
RECARGO DOMINICAL	850.600
HORAS EXTRAS	0
TOTAL DEVENGADO	1.906.600
DEDUCCIONES	
APORTES A SALUD	73.100
APORTES A PENSIÓN	73.100
OTRAS DEDUCCIONES	0
TOTAL DEDUCCIONES	146.200
OTROS PAGOS	-
NETO A PAGAR	**1.760.400**

CONSIGNADO N° DE CUENTA 20 al 15

FIRMA DEL EMPLEADO

CC 98673646.

HUELLA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA **NIT. 900.296.088-2**

COLILLA DE PAGO

NOMBRE EMPLEADO:	FABIAN DE JESUS MORA VILLA
CC:	1.045.076.532
PERIODO PAGADO:	Del 1 al 15/06/2024
CARGO:	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
DIAS LABORADOS:	15
DEVENGADOS	
SALARIO QUINCENAL	650.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	81.000
BONIFICACION	0
RECARGO DOMINICAL	246.067
HORAS EXTRAS	0
TOTAL DEVENGADO	977.067
DEDUCCIONES	
APORTES A SALUD	35.900
APORTES A PENSIÓN	35.900
OTRAS DEDUCCIONES	0
TOTAL DEDUCCIONES	71.800
OTROS PAGOS	-
NETO A PAGAR	905.267

CONSIGNADO N° DE CUENTA el 28 de mayo

FIRMA DEL EMPLEADO

Fabian Mora

CC 1045076532

HUELLA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA **NIT. 900.296.088-2**

COLILLA DE PAGO	
NOMBRE EMPLEADO:	LUIS ALBERTO SEPULVEDA
CC:	15.295.958
PERIODO PAGADO:	Del 1 al 15/06/2024
CARGO:	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
DIAS LABORADOS:	12
DEVENGADOS	
SALARIO QUINCENAL	520.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	64.800
BONIFICACION	0
RECARGO DOMINICAL	0
HORAS EXTRAS	0
TOTAL DEVENGADO	584.800
DEDUCCIONES	
APORTES A SALUD	20.800
APORTES A PENSIÓN	20.800
OTRAS DEDUCCIONES	0
TOTAL DEDUCCIONES	41.600
OTROS PAGOS	-
NETO A PAGAR	**543.200**

CONSIGNADO N° DE CUENTA el 4 de junio

FIRMA DEL EMPLEADO

CC 15 295 958

HUELLA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA **NIT. 900.296.088-2**

COLILLA DE PAGO

NOMBRE EMPLEADO:	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA
CC:	1.002.065.163
PERIODO PAGADO:	Del 1 al 15/06/2024
CARGO:	0
DIAS LABORADOS:	15
DEVENGADOS	
SALARIO QUINCENAL	650.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	81.000
BONIFICACION	0
RECARGO DOMINICAL	0
HORAS EXTRAS	0
TOTAL DEVENGADO	927.733
DEDUCCIONES	
APORTES A SALUD	33.900
APORTES A PENSIÓN	33.900
OTRAS DEDUCCIONES	0
TOTAL DEDUCCIONES	67.800
OTROS PAGOS	-
NETO A PAGAR	**859.933**

CONSIGNADO N° DE CUENTA el 28 mayo

FIRMA DEL EMPLEADO

Luis

CC



HUELLA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14903850420

(415)7707212489984(8020) 000001490385042 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 7 4 6 9	6	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO TAPIAS-REMOLINOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Valdivia 8 5 4

41. Dirección principal
BRR TAPIAS REMOLINOS CORR PUERTO VALDIVIA

42. Correo electrónico jactapiasremolinos@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 3 6 0 2 4 6	3 1 2 8 4 6 7 9 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 0 6 0 2 1 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	1	6	4	8	5	2	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 21 / 09 : 40: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MONSALVE RESTREPO JAVIER DARIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001 159

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14903850420

(415)7707212489984(8020) **000001490385042 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 7 4 6 9	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	2 0	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 8	
72. Número	2 7 2 7	
73. Fecha	2 0 0 6 0 2 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 4	
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 2 1 6	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	8 5 4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 2 1 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado Bancario

Jueves, 8 de diciembre de 2022

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO TAPIAS RE identificado(a) con CC 900387469, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	50300003335	2022/03/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 8.007.100,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3335**

Monto a acreditar $ 8.000.000,00

Monto $
8.000.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	--
Descripción:	prestamo jac remolinos

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


A LOGO

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 900.296.088-2

NOMINA

Fecha de corte Junio 30 de 2024

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	CUENTA DE DEPOSITO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			DOMINICALES Y FESTIVOS	HORAS CON RECARGO	INCENTIVO DE APOYO	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO POR NOMINA	OTROS PAGOS	TOTAL A PAGAR	CARGO
						BASICO	AUXI TRANS	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					SALUD	PENSION						
1	JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO	15.329.751		2.320.000	15	$ 1.160.000	$ 81.000		-	-	-	1.241.000	46.400	46.400		92.800	1.148.200	-	$ 1.148.200	MAESTRO DE OBA
2	JOSE MIGUEL MEJIA	98673646		$ 1.950.000	15	$ 975.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 1.056.000	$ 39.000	$ 39.000	$ -	$ 78.000	$ 978.000	-	$ 978.000	OFICIAL DE CONSTRUCCION
3	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA	1.002.065.163		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-		$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
4	OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ	1.007.285.195		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
5	FABIAN DE JESUS MORA VILLA	1.045.076.532		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
6	YEFERSON DANIEL MEJIA VILLA	1.044.150.170		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
7	EINSON MANUEL ORREGO OSORIO	1.045.080.335		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
8	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	15.295.958		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
																		$	$ 6.200.200	

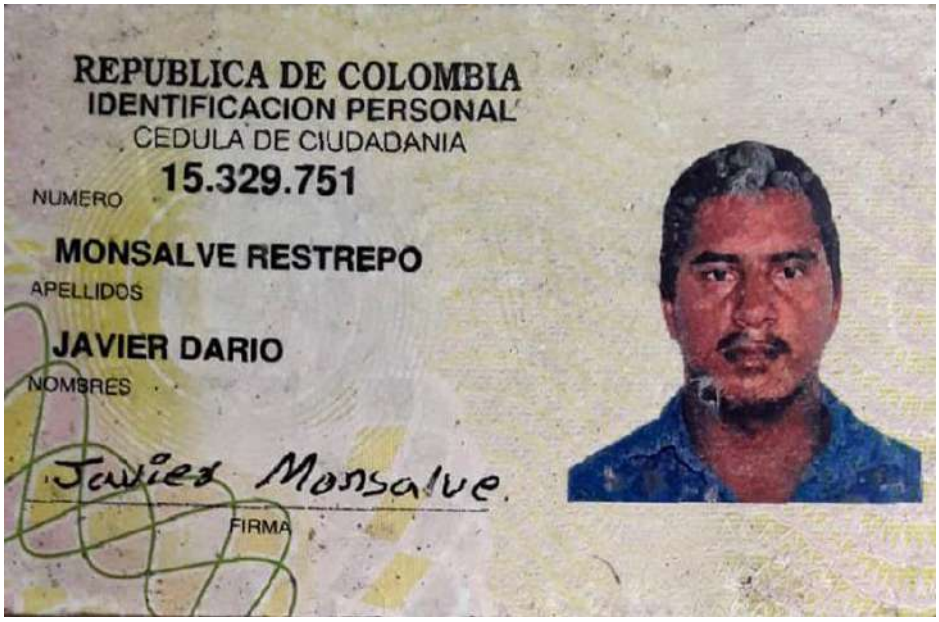
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 15.329.751
MONSALVE RESTREPO
APELLIDOS
JAVIER DARIO
NOMBRES
Javier Monsalve
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1978
VALDIVIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO
06-AGO-1996 YARUMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0128600-16158881-M-0015329751-20070713 05827 07194A 02 224563043

Certificación Bancaria

Bancolombia

Yarumal, 10 de Mayo de 2023.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO identificado(a) con CC No. 15329751 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PLAN BASICO	50300026084	2019/04/09	A ACTIVA

BANCOLOMBIA
Yarumal - Of. 503 Yarumal
Cajero Nº 093
Cédula Nº 22217816

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345, Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 1.155.300,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******6084**

Monto a acreditar $ 1.148.200,00

Monto $
1.148.200,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	--
Descripción:	mamina javier monsalve

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.673.646

MEJIA

APELLIDOS

JOSE MIGUEL

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1980

CACERES
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

15-MAR-2000 CACERES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MEJIA JOSE MIGUEL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 98673646, se encuentra vinculado (a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04944-9, con saldo a la fecha de: PESOS CON 00/100 M/CTE ($0.00) y con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a losa los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. VALDIVIA - ANT.
PLT 01
23 MAYO 2024
Cod. Of. 1484
PROCESADO

DIRECTOR (A) OFICINA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 978.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9449**

Monto a acreditar $ 978.000,00

Monto $
978.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	mina 30 de junio

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.002.065.163
MEJIA MEJIA
APELLIDOS
LUIS ENRIQUE
NOMBRES
NO FIRMA
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-1987
VALDIVIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
16-MAY-2006 VALDIVIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-0128600-00941235-M-1002065163-20170930
0057611317A 2
49328559
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el compo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MEJIA MEJIA LUIS ENRIQUE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1002065163, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04969-4, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los diez y ocho (18) días del mes de junio de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. VALDIVIA - ANT.
PAT 01
18 JUN. 2024
Cod. Of. 1484
DIRECTOR (A) OFICINA
PROCESADO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9694**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00


Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	mina 30 de junio

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

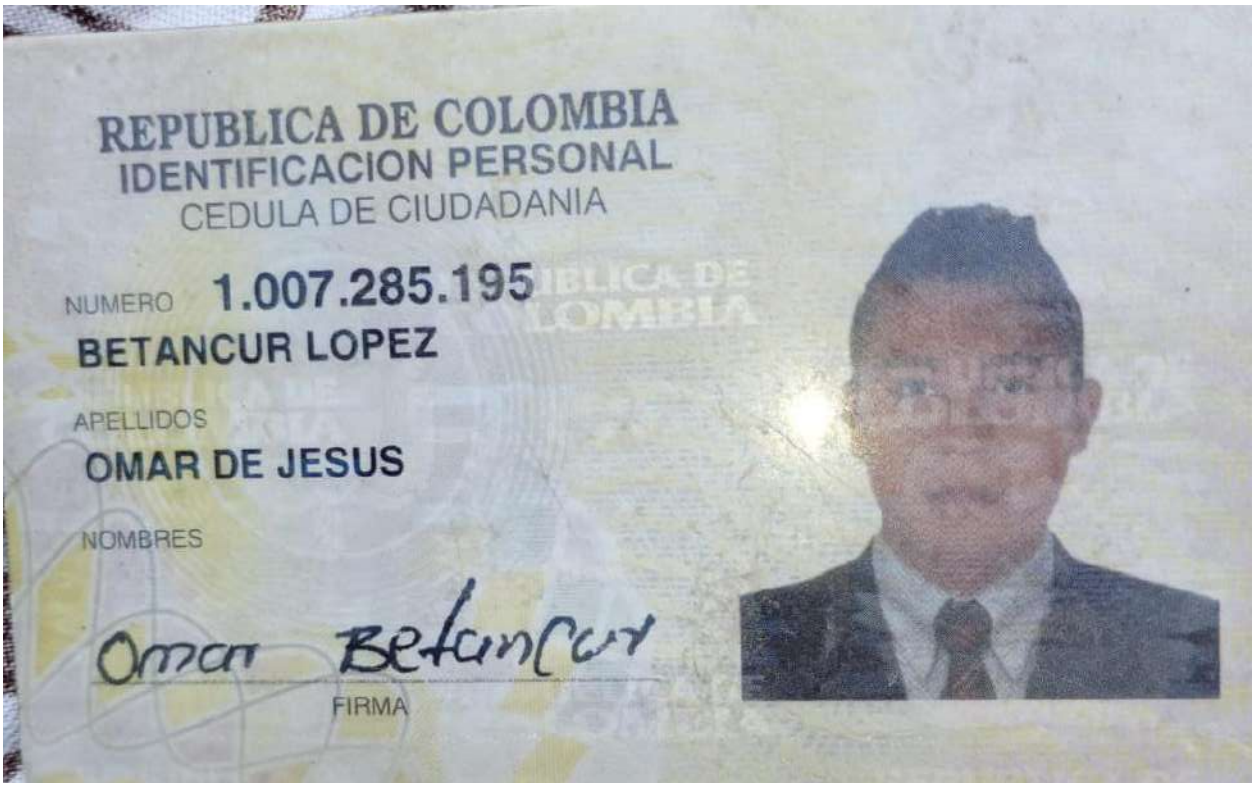

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.007.285.195

BETANCUR LOPEZ

APELLIDOS

OMAR DE JESUS

NOMBRES

Omar Betancur

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1996

TARAZA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

18-SEP-2015 TARAZA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0127000-00759794-M-1007285195-20151106 0047352780A 1 44544743

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: BETANCUR LOPEZ OMAR DE JESUS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1007285195, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04946-5, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR



Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9465**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	mina 30 de junio

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.045.076.532

MORA VILLA

APELLIDOS

FABIAN DE JESUS

NOMBRES

Fabian Mora

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 06-SEP-2004

VALDIVIA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

28-SEP-2022 VALDIVIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

P-0128600-01327931-M-1045076532-20221111 0089658331A 1 54886191

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MORA VILLA FABIAN DE JESUS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1045076532, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04947-3, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. VALDIVIA - ANT.
PLT 01
23 MAYO 2024
Cod. Of. 1484
PROCESADO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9473**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	mina 30 de junio

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.044.150.170
MEJIA VILLA
APELLIDOS
YEFFERSON DANIEL
NOMBRES
Yefferson Mejia
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 17-MAR-2004
VALDIVIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
23-MAR-2022 VALDIVIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO
P-0128600-01335355-M-1044150170-20221222
0093153388A 1
54886256

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MEJIA VILLA YEFFERSON DANIEL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1044150170, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04948-1, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR



Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9481**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción	Nomina 30 junio

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.045.080.335
ORREGO OSORIO

APELLIDOS
EINSON MANUEL

NOMBRES

EINSON ORTEGO

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-MAY-1994
TARAZA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

22-MAY-2012 VALDIVIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

IND. D. DERECHO

P-0129600-00392339-M-1045080335-20120810 0030774410A 1 38304557

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: ORREGO OSORIO EINSON MANUEL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1045080335, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04943-0, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. VALDIVIA - ANT.
PLT 01
23 MAYO 2024
Cod. Of. 1484
PROCESADO
DIRECTOR (A) OFICINA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9430**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	mina 30 de junio

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 15.295.958
SEPULVEDA CORREA
APELLIDOS
LUIS ALBERTO
NOMBRES
NO FIRMA
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1972
ITUANGO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
31-MAR-1993 VALDIVIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
0479807120O 02 220784596

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: SEPULVEDA CORREA LUIS ALBERTO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 15295958, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04945-7, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR



Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9457**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	mina 30 de junio

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
410

SOPORTES CONTABLES DESEMBOLSO No. 3

métrica
PREVENCIÓN Y SALUD

NIT 1.128.271.386-5
Cel. 311 778 7971
Calle 18 No 20 - 14
info@metricasalud.com
Yarumal, Antioquia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº A - 3401

31 | 5 | 2024

HORA: 1:13 p.m.

Cliente: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Dirección: VEREDA EL ASTILLERO **NIT:** 900296088 - 2

Ciudad: VALDIVIA **Teléfono:** 3194341968 3136090301

Acuerdo Comercial: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Forma de Pago: CRÉDITO **Fecha de Vencimiento:** 30/06/2024 **Plazo(dias):** 30

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764064012971 FECHA: 19/01/2024 NUMERACIÓN AUTORIZADO CON PREFIJO A DEL 3046 AL 4000 Vigencia por 6 meses Régimen COMÚN

Cant	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
2	AUDIOMETRÍA	28,000	56,000
2	VISIOMETRÍA	11,000	22,000
2	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL - INGRESO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	43,000	86,000

APROBADA

Sub Total	164,000.00
Descuento	0.00
I.V.A	0.00
Ret I.V.A	0.00
Retefuente	0.00
Rete I.C.A	0.00
Vr. Pagado	0.00
Vr. Saldo	$164.000,00
Vr. Total	$164.000,00

Paciente:

Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

CUENTA DE AHORROS Bancolombia 50300038911

Firma Autorizada

1-Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitída.

2- De acuerdo al articulo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión.

Aceptada

Fecha

D M A

Recibi CC y sello

CUFE: 66845a8bfbb6768fe35169b709f2c1ec0b4b0dd017b008522d67bf792700a6a001db34b22f320d7eeda3769ee07ce691

Emitido por: BIOFILE S.A.S. NIT: 901.080.631-8 Biofile www.biofile.com.co Impreso el 31/05/2024 - 1:14:32 p.m.

Certificado Bancario

Jueves, 11 de enero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALVARO ALEJANDRO ESPINOSA ROJAS identificado(a) con CC 1128271386, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	50300038911	2019/09/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 171.100,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******8911**

Monto a acreditar $ 164.000,00

Monto $
164.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	--
Descripción:	examenes ingreso

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones


IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

LOGO

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 900.296.088-2

NOMINA
Fecha de corte Julio 15 de 2024

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	CUENTA DE DEPOSITO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			DOMINICALES Y FESTIVOS	HORAS CON RECARGO	INCENTIVO DE APOYO	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO POR NOMINA	OTROS PAGOS	TOTAL A PAGAR	CARGO
						BASICO	AUXI TRANS	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					SALUD	PENSION						
1	JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO	15.329.751		2.320.000	15	$ 1.160.000	$ 81.000		-	-	-	1.241.000	46.400	46.400		92.800	1.148.200	-	$ 1.148.200	MAESTRO DE OBA
2	JOSE MIGUEL MEJIA	98673646		$ 1.950.000	15	$ 975.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 1.056.000	$ 39.000	$ 39.000	$ -	$ 78.000	$ 978.000	-	$ 978.000	OFICIAL DE CONSTRUCCION
3	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA	1.002.065.163		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-		$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
4	OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ	1.007.285.195		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
5	FABIAN DE JESUS MORA VILLA	1.045.076.532		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
7	EINSON MANUEL ORREGO OSORIO	1.045.080.335		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
8	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	15.295.958		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
																			$ 5.521.200	

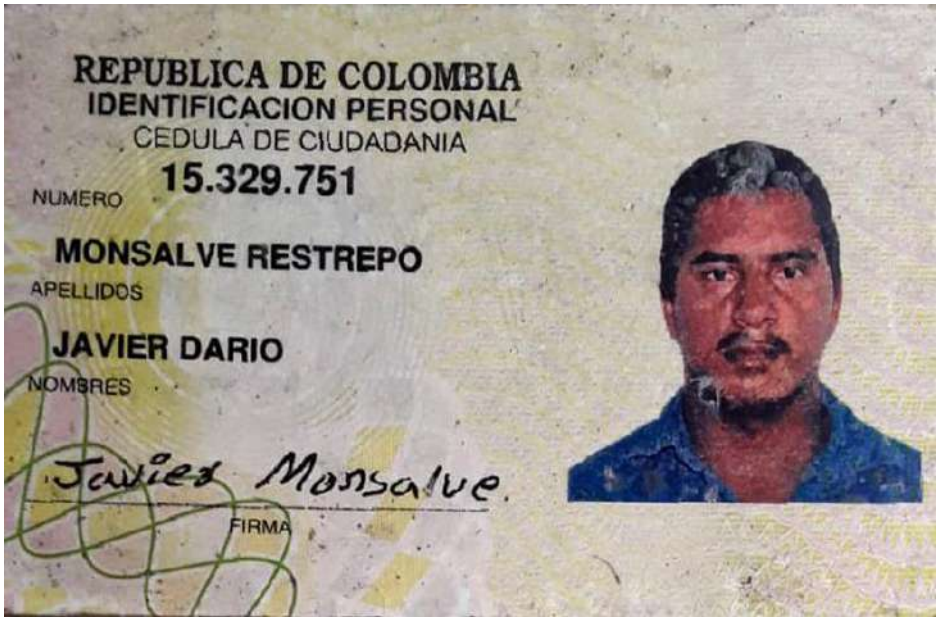
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 15.329.751
MONSALVE RESTREPO
APELLIDOS
JAVIER DARIO
NOMBRES
Javier Monsalve
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1978
VALDIVIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO
06-AGO-1996 YARUMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0128600-16158881-M-0015329751-20070713 05827 07194A 02 224563043

Certificación Bancaria

Bancolombia

Yarumal, 10 de Mayo de 2023.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO identificado(a) con CC No. 15329751 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PLAN BASICO	50300026084	2019/04/09	A ACTIVA

BANCOLOMBIA
Yarumal - Of. 503 Yarumal
Cajero Nº 093
Cédula Nº 22217816

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345, Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 1.155.300,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******6084**

Monto a acreditar $ 1.148.200,00

Monto $
1.148.200,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	--
Descripción:	Javier maestro

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.673.646

MEJIA

APELLIDOS

JOSE MIGUEL

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1980

CACERES
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

15-MAR-2000 CACERES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MEJIA JOSE MIGUEL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 98673646, se encuentra vinculado (a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04944-9, con saldo a la fecha de: PESOS CON 00/100 M/CTE ($0.00) y con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a losa los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. VALDIVIA - ANT.
PLT 01
23 MAYO 2024
Cod. Of. 1484
PROCESADO

DIRECTOR (A) OFICINA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 978.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9449**

Monto a acreditar $ 978.000,00

Monto $
978.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	Jose miguel oficial

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.002.065.163
MEJIA MEJIA
APELLIDOS
LUIS ENRIQUE
NOMBRES
NO FIRMA
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-1987
VALDIVIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
16-MAY-2006 VALDIVIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-0128600-00941235-M-1002065163-20170930
0057611317A 2
49328559
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el compo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MEJIA MEJIA LUIS ENRIQUE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1002065163, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04969-4, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los diez y ocho (18) días del mes de junio de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. VALDIVIA - ANT.
PAT 01 18 JUN. 2024 Cod. Of. 1484
DIRECTOR (A) OFICINA
PROCESADO

200

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9694**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00


Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	Luis Enrique construccio

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

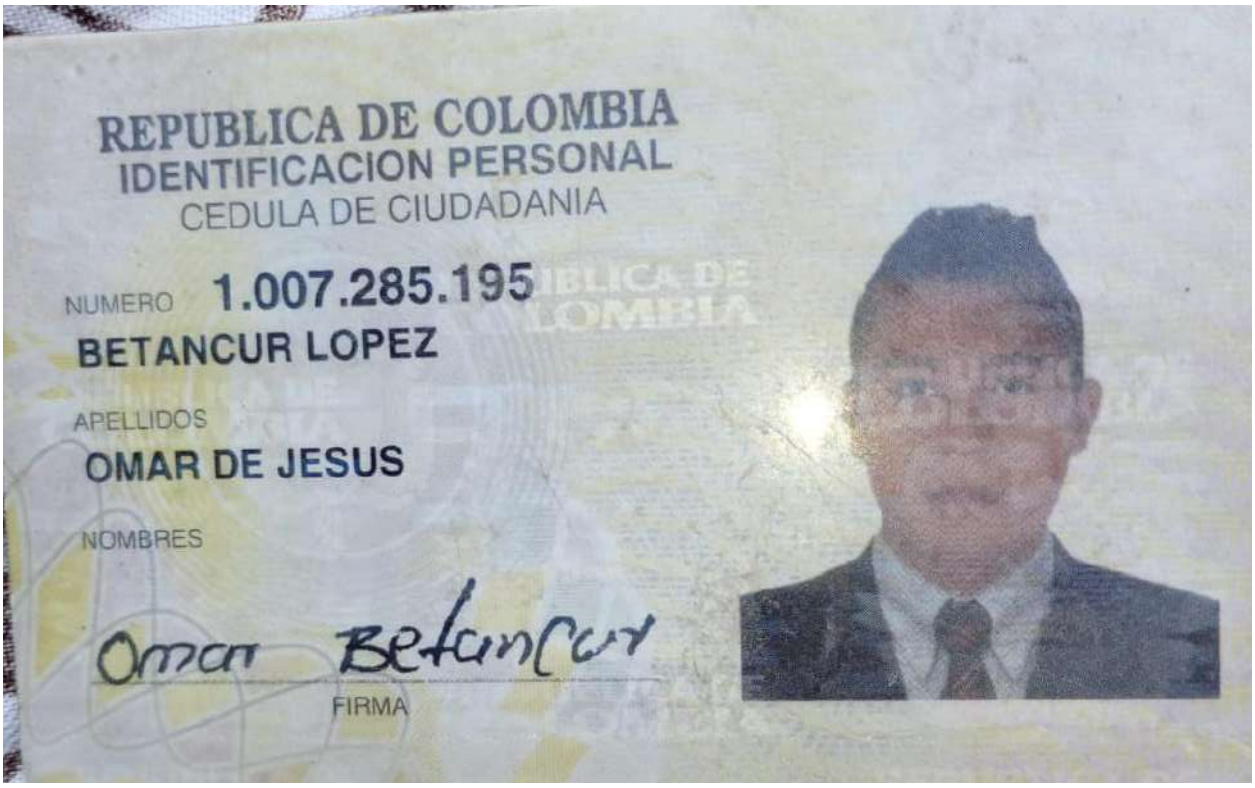

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.007.285.195

BETANCUR LOPEZ

APELLIDOS

OMAR DE JESUS

NOMBRES

Omar Betancur

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1996

TARAZA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

18-SEP-2015 TARAZA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0127000-00759794-M-1007285195-20151106 0047352780A 1 44544743

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: BETANCUR LOPEZ OMAR DE JESUS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1007285195, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04946-5, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. VALDIVIA - ANT.
PLT 01
23 MAYO 2024
Cod. Of. 1484
DIRECCIÓN PROCESADO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9465**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	Omar Betancur construcc

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.045.076.532

MORA VILLA

APELLIDOS

FABIAN DE JESUS

NOMBRES

Fabian Mora

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 06-SEP-2004

VALDIVIA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

28-SEP-2022 VALDIVIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

P-0128600-01327931-M-1045076532-20221111 0089658331A 1 54886191

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MORA VILLA FABIAN DE JESUS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1045076532, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04947-3, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. VALDIVIA - ANT.
PLT 01
23 MAYO 2024
Cod. Of. 1484
PROCESADO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9473**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	Fabian Mora auxili

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.045.080.335
ORREGO OSORIO

APELLIDOS
EINSON MANUEL

NOMBRES

EINSON ORREGO

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-MAY-1994
TARAZA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

22-MAY-2012 VALDIVIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

IND. D. DERECHO

P-0129600-00392339-M-1045080335-20120810 0030774410A 1 38304557

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: ORREGO OSORIO EINSON MANUEL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1045080335, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04943-0, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. VALDIVIA - ANT.
PLT 01
23 MAYO 2024
Cod. Of. 1484
PROCESADO
DIRECTOR (A) OFICINA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9430**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	Finson Manuel construcci

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 15.295.958
SEPULVEDA CORREA
APELLIDOS
LUIS ALBERTO
NOMBRES
NO FIRMA
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1972
ITUANGO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
31-MAR-1993 VALDIVIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR
INDICE DERECHO
0479807120O 02 220784596

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: SEPULVEDA CORREA LUIS ALBERTO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 15295958, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04945-7, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR



Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9457**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	Luis Alberto constructor

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

JUNTA DE ACCION COMUNA VEREDA EL ASTILLERO
Correo: veredaastilleros@gmail.com
Nit: 900.296.088-2

CUENTA DE COBRO No. 02

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASTILLEROSNIT: 900296088-2

DEBE A:
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASTILLEROSNIT: 900296088-2

LA SUMA DE: $ 4.622.000

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS M/L

POR CONCEPTO DE:

($4.622.000) Pago de Planillas de seguridad social y parafiscales para 6 ayudantes, 1 oficial y 1 maestro dentro del convenio 3502 de 2023 “aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acciónconcomunal vereda el astillero, municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total”.

Dado en Puerto Valdivia, el 24 de junio del 2024

Atentamente

Cesar Ochoa

Cesar Humberto Ochoa
MisasCC:15.296.393
Tesorero JAC Astillero

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-07-12, 05:57:25 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1064509298

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

Fecha limite de pago: 2024-06-25

GUARDADA 18/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAC VEREDA EL ASTILLERO				
Documento	NI900296088	**Dirección**	VTE 1 #1 - 1 VEREDA EL ASTILLERO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3117645833		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	6
Ciudad	VALDIVIA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GALEANO DIDIAN ANDRES	**Identificación**	CC1045078079		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 98673646	MEJIA JOSE MIGUEL	01	00	X															0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 650.000	$ 104.000	SALUD TOTAL EPS	$ 650.000	$ 26.000	ARL SURA	$ 650.000	$ 45.300	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.300
CC 1002065163	MEJIA MEJIA LUIS ENRIQUE	01	00	X															0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 433.334	$ 69.400	EPS-S COOSALUD	$ 433.334	$ 17.400	ARL SURA	$ 433.334	$ 30.200	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400
CC 1007285195	BETANCUR LOPEZ OMAR DE JESUS	01	00	X															0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 433.334	$ 69.400	EPS-S COOSALUD	$ 433.334	$ 17.400	ARL SURA	$ 433.334	$ 30.200	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400
CC 1044150170	MEJIA VILLA YEFFERSON DANIEL	01	00	X															0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 433.334	$ 69.400	EPS-S COOSALUD	$ 433.334	$ 17.400	ARL SURA	$ 433.334	$ 30.200	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400
CC 1045076532	MORA VILLA FABIAN DE JESUS	01	00	X															0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 433.334	$ 69.400	EPS-S COOSALUD	$ 433.334	$ 17.400	ARL SURA	$ 433.334	$ 30.200	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400
CC 1045080335	ORREGO OSORIO EINSON MANUEL	01	00	X															0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 433.334	$ 69.400	EPS-S COOSALUD	$ 433.334	$ 17.400	ARL SURA	$ 433.334	$ 30.200	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 2.816.670	$ 2.816.670	$ 2.816.670	$ 2.816.670	$ 451.000	$ 0	$ 0	$ 113.000	$ 196.300	$ 113.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 873.300	$ 11.600	$ 884.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-07-12, 05:57:30 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1064515120

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

Fecha limite de pago: 2024-07-22

GUARDADA 18/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAC VEREDA EL ASTILLERO				
Documento	NI900296088	**Dirección**	VTE 1 #1 - 1 VEREDA EL ASTILLERO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3117645833		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	8
Ciudad	VALDIVIA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GALEANO DIDIAN ANDRES	**Identificación**	CC1045078079		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15295958	SEPULVEDA CORREA LUIS ALBERTO	01	00	X															0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	EPS-S COOSALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 90.500	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 15329751	MONSALVE RESTREPO JAVIER DARIO	01	00	X															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.320.000	$ 371.200	EPS-S COOSALUD	$ 2.320.000	$ 92.800	ARL SURA	$ 2.320.000	$ 161.500	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.320.000	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.300
CC 98673646	MEJIA JOSE MIGUEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.950.000	$ 312.000	SALUD TOTAL EPS	$ 1.950.000	$ 78.000	ARL SURA	$ 1.950.000	$ 135.800	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.950.000	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.800
CC 1002065163	MEJIA MEJIA LUIS ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	EPS-S COOSALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 90.500	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1007285195	BETANCUR LOPEZ OMAR DE JESUS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	EPS-S COOSALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 90.500	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1044150170	MEJIA VILLA YEFFERSON DANIEL	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	EPS-S COOSALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 90.500	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1045076532	MORA VILLA FABIAN DE JESUS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	EPS-S COOSALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 90.500	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1045080335	ORREGO OSORIO EINSON MANUEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	EPS-S COOSALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 90.500	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 12.070.000	$ 12.070.000	$ 12.070.000	$ 12.070.000	$ 1.931.200	$ 0	$ 0	$ 482.800	$ 840.300	$ 482.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.737.100	$ 0	$ 3.737.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificado Bancario

Martes, 08 de agosto de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAC EL ASTILLERO identificado(a) con NIT 900296088, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	50300004152	2023/03/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 892.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

JAC Astillero

******4152**

Monto a acreditar $ 884.900,00

Monto $
884.900,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	--
Descripción:	seguridad social mayo

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 3.744.200,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

JAC Astillero

******4152**

Monto a acreditar $ 3.737.100,00

Monto $
3.737.100,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	--
Descripción:	seguridad social junio

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
410

SOPORTES CONTABLES DESEMBOLSO No 4.

COTIZACIÓN

Señores: **J.A.C VEREDA ASTILLEROS** Fecha: 22/07/2024

Atención: Didian Andrés Galeano
Tel: 3015277810

Identificación del proveedor: Hernando Albeiro Arango Identificación:15297112

No.	Unidad de medida	Cantidad	Descripción del bien	Precio	
				Unitario	Total
1	hora	144	Mezcladora de concreto 1 bulto (18 dias*8 horas)	8.000	1.152.000
2	hora	200	Moto carguero vehículo (25 días * 8 horas)	45.000	9.000.000

- **Plazo de vigencia de la cotización : 30 días**
- **Forma de pago: efectivo o transferencia**

HAAo

Hernando Albeiro Arango



Formulario del Registro Único Tributario

001 221

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario 141041226380

(415)7707212489984(8020) 000014104122638 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1529711126		Impuestos de Medellín 11	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	15297112	2002/01/09

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Antioquia 05	Valdivia 854

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARANGO	OCHOA	HERNANDO	ALBEIRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Antioquia 05	Valdivia 854

41. Dirección principal: CRT 0000 AA BIS Norte # 0000 AA BIS Norte CRR PUERTO VALDIVIA

42. Correo electrónico: np6068990@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
000000	3127772527	3148974657

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0010	2023/11/01							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 20																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros										Exportadores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2024 - 05 - 19 / 11 : 03: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARANGO OCHOA HERNANDO ALBEIRO

985. Cargo Contribuyente

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
15297112
ARANGO OCHOA
APELLIDOS
HERNANDO ALBEIRO
NOMBRES
NO FIRMA
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
25-SEP-1983
VALDIVIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
09-ENE-2002 VALDIVIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
P-0128600-14103775-M-0015297112-20020617
04350 02168A 02 104938945

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016559844

PLACA
287ACN

MARCA
AKT

LÍNEA
AK200ZW

MODELO
2019

CILINDRADA CC
197

COLOR
BLANCO

SERVICIO
PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO
MOTOCARRO

TIPO CARROCERÍA
PICO

COMBUSTIBLE
GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PSJ
339 - 1

NÚMERO DE MOTOR
ZS163QML8K100246

REG
N

VIN
9F2A4200XK5000360

NÚMERO DE SERIE
******

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
9F2A4200XK5000360

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
PEREZ AREIZA NIDIA YANET

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1045080300

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
12

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352018000172385

I/E
I

FECHA IMPORT.
27/04/2018

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - LA ALEGRIA EB S.A.S

FECHA MATRÍCULA
01/08/2018

FECHA EXP. LIC. TTO.
01/08/2018

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO YARUMAL



LT02005098007

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	5	16	2024	5	17	2025	5	16

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3244454200	287ACN	MOTO CARRO	PARTICULAR	197	2019

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
1	AKT	
	LÍNEA VEHÍCULO: AK200ZW	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
ZS163QML8K100246	9F2A4200XK5000360	9F2A4200XK5000360	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PEREZ AREIZA, NIDIA YANET	3222783663	CC	1045080300	VALDIVIA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	55763623	3244454200	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
114	$227.400,00	$118.200,00	$2.100,00

TOTAL A PAGAR

$347.700,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el compo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: ARANGO OCHOA HERNANDO ALBEIRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 15297112, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04910-4, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los veinte y un (21) días del mes de abril de 2024, con destino a: A QUIEN INTERESE

Banco Agrario de Colombia
OF. VALDIVIA - ANT
PLT 01
21 ABR 2024
Cod. Of. 1484
PROCESADO

Powered by CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 9.136.376,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

Alquiler Equipos

******9104**

Monto a acreditar $ 9.136.376,00

Monto $
9.136.376,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	alquiler hernando Albe

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

EDS MONTERREY
NIT. 15.321.303-9

Señores:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL ASTRILLERO

Asunto: Cotización consumo de combustible.

La Estación de Servicios Monterrey de Valdivia con Nit: 15.321.303-9, quien es de propiedad del señor Miguel Ángel Echavarría Jaramillo identificado con Cédula de Ciudadanía Nº15.321.303 de Yarumal y quien actúa como representante legal, hace llegar a ustedes la siguiente cotización de precios en combustibles según la necesidad de su empresa para los equipos de trabajo que requieren de este tipo de combustibles a los cuales se pretende suministrar los mismos.

Precio por galón:

Biodiesel: 9.760

Gasolina Corriente: 16.300

Nota: Se tomó como presupuesto según su requerimiento 500.000 pesos, de los cuales se despacharían 15.368 galones en Biodiesel que significarían en pesos 150.000 y 21.472 galones de gasolina corriente.

Nota 2: Los precios serán ajustados toda vez que desde el ministerio de Minas y Energía se emitan las resoluciones que aumenten o disminuyan los precios de los combustibles.

Cordialmente

ESTACIÓN DE SERVICIOS MONTERREY
terpel
NIT 15.321.303-9 VALDIVIA ANT

22 de Julio 2024

Bibiana Andrea Echavarría Betancur

CC. 22.193.649

Administradora

Powered by CamScanner

Certificado Bancario

Viernes, 8 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA JARAMILLO identificado(a) con CC 15321303, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	10697097836	2002/04/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 493.600,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Combustible

******7836**

Monto a acreditar $ 486.500,00

Monto $
486.500,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	--
Descripción:	miguel echavarria combus

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

232

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS

FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA
NIT: 3371227-7
CL 38 53 17 BRR SAN JOSE OBRERO
Telefono: 5703857 - 6124999 / Celular: 3122878464
Correo: ensaseauxiliar@hotmail.com

Numeración Factura electrónicaResolución DIAN 18764070462173 De: 2024/05/09 Rango Desde el 3277 Hasta el 10000 Prefijo FE Vigencia 2024/11/09

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No FE3371

Cliente:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
NIT	900,296,088 - 2
Direccion:	VDA ASTILLERO
E-mail:	veredaastilleros@gmail.com
Telefonos:	3 1 6 6 6 2 0 7 2 2 **Ciudad:** Valdivia

Fecha Fac:	**Fecha Ven:**
2024/06/21	2024/06/28
Fecha Emision:	**Fecha Validacion DIAN:**
2024/06/21 07:55 am	
Calidad Retencion	**Tipo de negociacion**
No somos retenedores de IVA	Credito
Forma de pago	**Plazo de pago**
Transferencia Debito Bancaria	dias

CUFE: 6c00047ca96ebc3c41f7a9a6106712ed9cb8ccf10d62beaba78133b323f44dce7ded619dae964ee71c4166c14c5f5c5c

Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Tipo IVA	IVA	Total
	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO	4	410,000	0	IVA 19%	311,600	1,951,600
	CURVA DE COMPACTACION - PROCTOR	1	175,000	0	IVA 19%	33,250	208,250
	PRUEBA DE CBR CON CONO DINAMICO	4	160,000	0	IVA 19%	121,600	761,600
	CLASIFICACION	4	202,000	0	IVA 19%	153,520	961,520
	TRANSPORTE	1	1,980,000	0	IVA 19%	376,200	2,356,200
	EXCAVACION DE APIQUE	4	120,000	0	IVA 19%	91,200	571,200

Observaciones:
Obra: Mejoramiento de camino comunitario vereda El Astillero - Valdivia
Esta factura tiene un anticipo el dia
20-06-24 por $ 3.456.500

Subtotal	IVA	Descuento	Total	Retenciones	Anticipos
5,723,000	1,087,370	0	6,810,370		0
TOTAL A PAGAR			6,810,370		

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Por favor consignar al número de cuenta Ahorros Bancolombia 10872454843 a nombre de Fabio Jaramillo.

Entregado Por: FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

Recibido Por: _____

Certificación Bancaria

Bancolombia

Martes, 13 de febrero de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA** identificado(a) con cc. **3371227** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	108-724548-43	1993/10/06	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 3.218.961,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Laboratorio

******4843**

Monto a acreditar $ 3.211.861,00

Monto $
3.211.861,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	--
Descripción:	Fabio Hernanjllo

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp




LOGO

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 900.296.088-2

NOMINA

Fecha de corte Julio 31de 2024

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	CUENTA DE DEPOSITO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			DOMINICALES Y FESTIVOS	HORAS CON RECARGO	INCENTIVO DE APOYO	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO POR NOMINA	OTROS PAGOS	TOTAL A PAGAR	CARGO
						BASICO	AUXI TRANS	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					SALUD	PENSION						
1	JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO	15.329.751		2.320.000	15	$ 1.160.000	$ 81.000		-	-	-	1.241.000	46.400	46.400		92.800	1.148.200	-	$ 1.148.200	MAESTRO DE OBA
2	JOSE MIGUEL MEJIA	98673646		$ 1.950.000	15	$ 975.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 1.056.000	$ 39.000	$ 39.000	$ -	$ 78.000	$ 978.000	-	$ 978.000	OFICIAL DE CONSTRUCCION
3	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA	1.002.065.163		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-		$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
4	OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ	1.007.285.195		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
5	FABIAN DE JESUS MORA VILLA	1.045.076.532		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
7	EINSON MANUEL ORREGO OSORIO	1.045.080.335		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
8	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	15.295.958		$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ -	-	-	$ -	$ 731.000	$ 26.000	$ 26.000	$ -	$ 52.000	$ 679.000	-	$ 679.000	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
																		$	**5.521.200**	

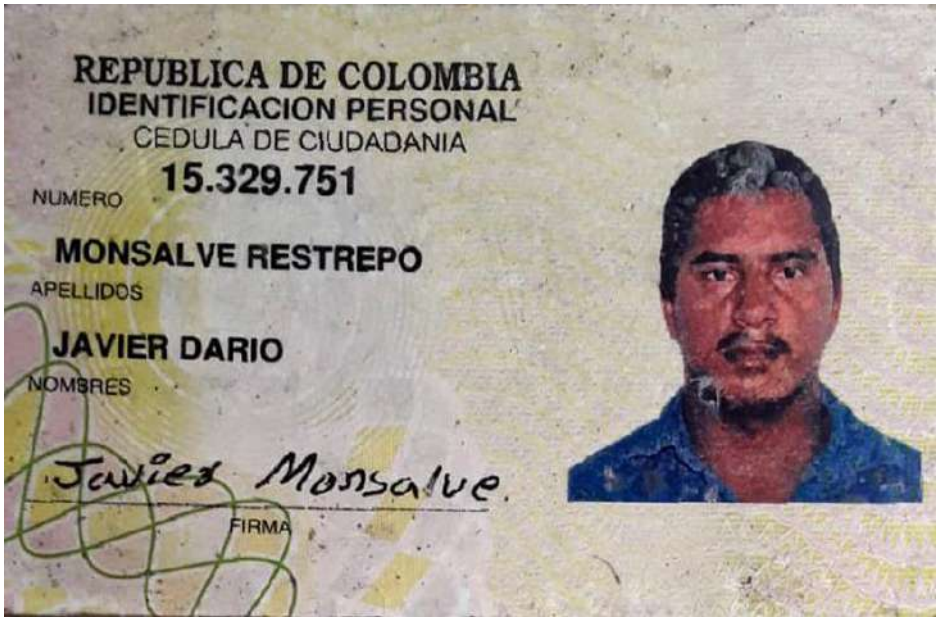

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 15.329.751
MONSALVE RESTREPO
APELLIDOS
JAVIER DARIO
NOMBRES
Javier Monsalve
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1978
VALDIVIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO
06-AGO-1996 YARUMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0128600-16158881-M-0015329751-20070713 05827 07194A 02 224563043

Certificación Bancaria

Bancolombia

Yarumal, 10 de Mayo de 2023.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO identificado(a) con CC No. 15329751 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PLAN BASICO	50300026084	2019/04/09	A ACTIVA

BANCOLOMBIA
Yarumal - Of. 503 Yarumal
Cajero Nº 093
Cédula Nº 22217816

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345, Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

238

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 1.155.300,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******6084**

Monto a acreditar $ 1.148.200,00

Monto $
1.148.200,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	--
Descripción:	Quincena Dario Monsalve

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.673.646

MEJIA

APELLIDOS

JOSE MIGUEL

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1980

CACERES
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

15-MAR-2000 CACERES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MEJIA JOSE MIGUEL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 98673646, se encuentra vinculado (a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04944-9, con saldo a la fecha de: PESOS CON 00/100 M/CTE ($0.00) y con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a losa los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. VALDIVIA - ANT.
PLT 01
23 MAYO 2024
Cod. Of. 1484
PROCESADO

DIRECTOR (A) OFICINA

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 978.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9449**

Monto a acreditar $ 978.000,00

Monto $
978.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	Quincena Jose Mejia

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.002.065.163
MEJIA MEJIA
APELLIDOS
LUIS ENRIQUE
NOMBRES
NO FIRMA
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-1987
VALDIVIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
16-MAY-2006 VALDIVIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-0128600-00941235-M-1002065163-20170930
0057611317A 2
49328559
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el compo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MEJIA MEJIA LUIS ENRIQUE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1002065163, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04969-4, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los diez y ocho (18) días del mes de junio de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. VALDIVIA - ANT.
PAT 01
18 JUN. 2024
Cod. Of. 1484
DIRECTOR (A) OFICINA
PROCESADO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9694**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00


Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	Quincena Luis Enrique Me

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

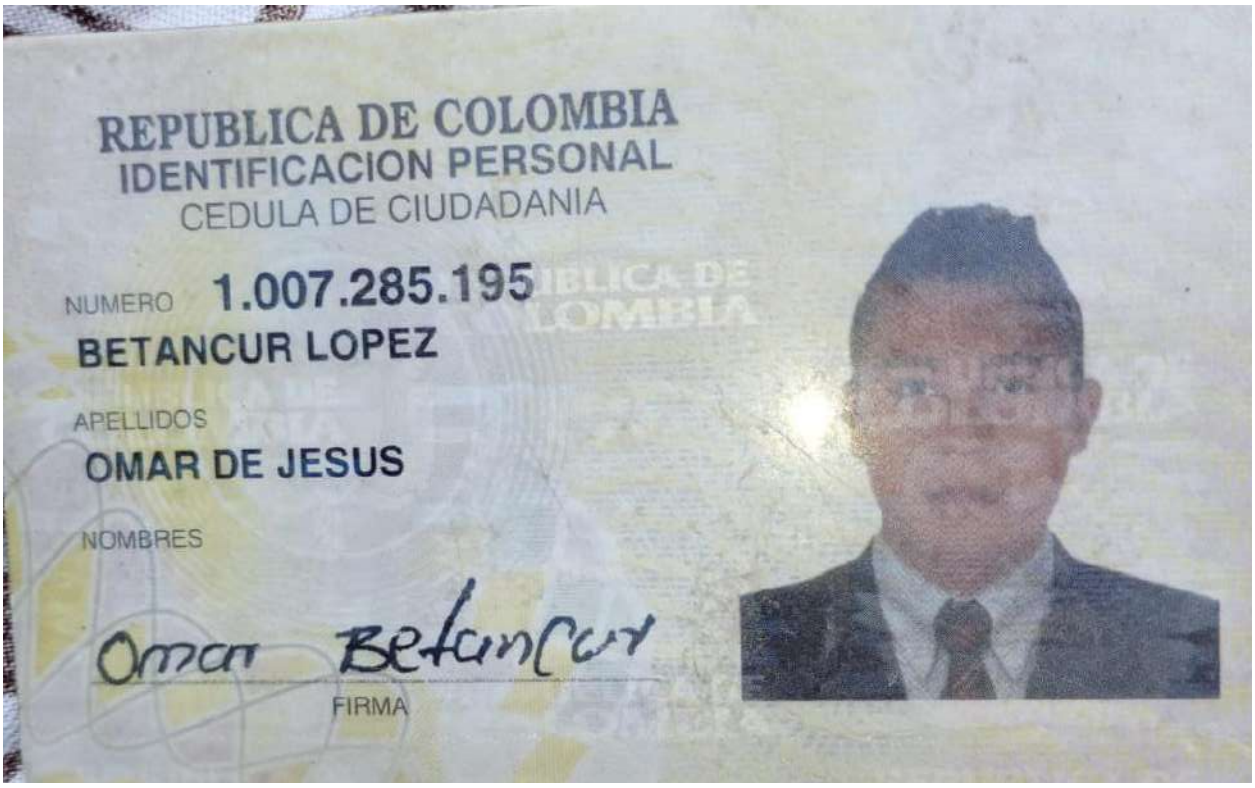

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.007.285.195

BETANCUR LOPEZ

APELLIDOS

OMAR DE JESUS

NOMBRES

Omar Betancur

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1996

TARAZA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

18-SEP-2015 TARAZA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0127000-00759794-M-1007285195-20151106 0047352780A 1 44544743

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: BETANCUR LOPEZ OMAR DE JESUS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1007285195, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04946-5, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR



Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9465**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	Quincena Omar betancur

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.045.076.532

MORA VILLA

APELLIDOS

FABIAN DE JESUS

NOMBRES

Fabian Mora

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 06-SEP-2004

VALDIVIA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

28-SEP-2022 VALDIVIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

P-0128600-01327931-M-1045076532-20221111 0089658331A 1 54886191

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MORA VILLA FABIAN DE JESUS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1045076532, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04947-3, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. VALDIVIA - ANT.
PLT 01
23 MAYO 2024
Cod. Of. 1484
PROCESADO

250

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9473**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	Quincena Fabian Mora

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.045.080.335
ORREGO OSORIO

APELLIDOS
EINSON MANUEL

NOMBRES

EINSON ORREGO

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-MAY-1994
TARAZA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

22-MAY-2012 VALDIVIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

IND. D. DERECHO

P-0129600-00392339-M-1045080335-20120810 0030774410A 1 38304557

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: ORREGO OSORIO EINSON MANUEL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1045080335, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04943-0, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. VALDIVIA - ANT.
PLT 01
23 MAYO 2024
Cod. Of. 1484
PROCESADO
DIRECTOR (A) OFICINA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9430**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	Erinson Manuel

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 15.295.958
SEPULVEDA CORREA
APELLIDOS
LUIS ALBERTO
NOMBRES
NO FIRMA
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1972
ITUANGO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
31-MAR-1993 VALDIVIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR
INDICE DERECHO
0479807120O 02 220784596

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: SEPULVEDA CORREA LUIS ALBERTO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 15295958, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-42-04945-7, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en VALDIVIA, a los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR



256

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

******1197**

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar $ 679.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9457**

Monto a acreditar $ 679.000,00

Monto $
679.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Descripción:	Quicena Luis Alberto sep

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERA DE EJECUCIÓN DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO SOLIDARIO **NÚMERO 3502 DE 2023** ENTRE **INVIAS** Y LA **J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NÚMERO 5066 DE 2023** ENTRE **INVIAS** Y **CONSTRUMAJ S.A.S.** Interventoría y Obras Civiles

Mes #7 - Julio

No	ITEM - INVIAS	ACTIVIDAD	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	SEMANA25	SEMANA26	SEMANA27	SEMANA28	SEMANA29	SEMANA30
		1. ETAPA DE REVISIÓN Proceso de contratación, envío de información, estudios de diseño, balance presupuestal, informes de avances, compra y actualización de pólizas y seguros, adqusición de EPP y compra de elementos de protección ambiental.											
		2. ETAPA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO I. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COMUNITARIO					%						
1	200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	1	$ 298.963,0	$ 298.963,0	0,21						
2	600.2. P	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	m3	62,26378	$ 18.933,0	$ 1.178.840,0	0,81	168.406	168.406	168.406			
3	320.3 P	Subbase granular clase C	m3	72,7	$ 94.355,0	$ 6.859.609,0	4,71	979.944	979.944	979.944			
4	500.1.1. P	Concreto Hidráulico MR - 3,8 Mpa - Mezcla in situ	m3	72,7	$ 900.744,0	$ 65.484.089,0	44,99	8.185.511	8.185.511	8.185.511	8.185.511	4.092.756	
5	630.4 PH	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	m3	10,8	$ 758.138,0	$ 8.187.890,0	5,63	1.169.699	1.169.699	1.169.699	1.169.699		
6	630.4 PH	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLOS	m3	24,2	$ 758.138,0	$ 18.346.940,0	12,61	2.620.991	2.620.991	2.620.991	2.620.991		
7	640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	5214	$ 7.382,0	$ 38.489.748,0	26,44	5.498.535	5.498.535	5.498.535	5.498.535		
		2. ETAPA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO II. CONTROL DE AGUAS CON CÁRCAMO DE 2*0,60*0,60m; e=0,10m											
8	630.4 PH	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CÁRCAMO	m3	4,3	$ 758.138,0	$ 3.259.993,0	2,24		1.086.664		1.086.664		
9	640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	323	$ 7.382,0	$ 2.384.386,0	1,64		794.795		794.795		
		3. ETAPA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO I. CONTROL DE AGUAS CON CÁRCAMO DE 2*0,60*0,60m; e=0,10m											
10	211.1 P	Remoción de derrumbes	m3	85	$ 12.480,0	$ 1.060.800,0	0,73						
		OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	Global	1	$ 4.366.538,0	$ 4.366.538,0		873.308					
		4. ETAPA DE LIQUIDACIÓN Envío de informe final, liquidaciones, paz y salvos y cierre financiero.						1.639.445	1.639.445	1.639.445	1.639.445	1.639.445	1.639.445
					SUB TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 145.551.258**	**100,0**	**18.623.086**	**20.504.546**	**18.623.086**	**19.356.196**	**4.092.756**	**-**
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.183.362	33,79	1.639.445	1.639.445	1.639.445	1.639.445	1.639.445	1.639.445
					PAGA	$ 4.366.538	3,00	873.308	-	-	-	-	-
					VALOR TOTAL DE OBRA	**$ 199.101.158**		**21.135.839**	**22.143.991**	**20.262.532**	**20.995.642**	**5.732.201**	**1.639.445**
							AVANCE SEMANAL	10,6%	11,1%	10,2%	10,5%	2,9%	0,8%
							AVANCE ACUMULADO EN %	0,64	0,76	0,86	0,96	0,99	1,00
							INVERSIÓN ACUMULADA	**128.327.347**	**150.471.338**	**170.733.870**	**191.729.512**	**197.461.713**	**199.101.158**

MEPI-MN1-IN-14-FR-1. ACTA DE COMITÉ DE OBRA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 19/07/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **ON TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 3502
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

DURANTE ESTE COMITÉ TECNICO CON PARTICIPIACION DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.
EN OBRA SE CONTINÚA TRABAJANDO CON LA VOLUNTAD DE ALCANZAR UN RENDIMIENTO MAYOR, SIN EMBARGO, LAS CODICIONES DEL TERRO A INTERVENIR NO LO PERMITEN. PERO SE ESTABA TRABAJANDO FUERTE, MANIFIESTA EL RESIDENTE. Y LA INTERVENTORIA DA FE DE ESO.
EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE ESTA EJCUTANDO DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS ENTEGADOS POR EL INVIAS.
TENIENDO UN ATRAZO DEL -14,70%, EL CUAL VA EN AUMENTO, EL RESIDENTE MANIFIESTA QUE EL RENDIMIENTO A BAJADO UN POCO, PORQUE A MEDIDA QUE SE AVANZA EN LA OBRA, POR LA INCLINADA PENDIENTE A INTERVENIR, ES MUCHO MAS DIFICIL LLEVAR EL MATERIA ESE PUNTO. PERO AUN, ASI ESTA BUSCA AESTRATEGIAS PARA MEJOR EL RENDIMIENTO.

PORCENTAJE PROGRAMDO: 44,28%
PORCENTAJE EJECUTADO: 29,57%
ADELANTO DEL: -14,70%

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

RENDIMIENTOS DE OBRA

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

DURANTE ESTE COMITÉ TECNICO CON PARTICIPIACION DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y EL INSPECTOR DE OBRA DE INTERVENTORÍA. EN OBRA SE CONTINÚA TRABAJANDO CON LA VOLUNTAD DE ALCANZAR UN RENDIMIENTO MAYOR, SIN EMBARGO, LAS CODICIONES DEL TERRENO HAN SIDO FAVORABLES EN ESTA SEMANA INGRESA EL NUEVO INPECTOR DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTERIOA
DURANTE EL COMITE EL INSPECTOR PREGUNTA POR QUE MOTIVO NO SE ESTA APLICANDO BASE EN TERRENO CON LA COMPARTACION MECANICA ANTE A ESTO CONTESTA EL RESIDENTE DE OBRA QUE POR SE UN TERRENO CON ALTA DENSIDAD DE ROCA EL CUAL NO ES VIABLE NI EFICIENTE LA LA APLIACION DE CAPAS SUDBASE. EL RESIDENTE DE OBRA MANIFIESTA QUE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL TRAMO EJECUPTADO A LA FECHA IDENTIFICÓ EN OBRA LA IMPORTA DE CONSTRUIR TRAMOS DE CUNETAS DE EN TRAMOS DEL CARMINO LOS CUALES GARANTIZARAN LA CANALIZAR NACIMIENTOS DE AGUAS DE EMERGEN DEL LA MONTAÑA QUE GARANTIZAR LA ESTABILIADA DEL TERRENO Y LA OBRA, . ESTE ÍTEM NO ESTABA EN PRESUPUESTO INICIALMENTE, POR TAL MOTIVO SE LE SOLICITO AL RESIDENTE DE OBRA, QUE REALIZARA UN NUEVO BALANCE DE OBRA PARA PODER DEFINIR EL ALCANCE REAL A EJECUTAR CON ESTOS IMPREVISTOS. LA RESIDENTE SE COMPROME A ENTREGAR UN NUEVO BALANCE PARA SU REVISION Y APROBACION DE LA INTERVENTORIA.
EN CUANTO A LO DEMAS SE EVIDENCIA QUE EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS ENTEGADOS POR EL INVIAS.TENIENDO UN ATRAZO DEL -24,01%, EL CUAL VA EN AUMENTO, ,EL RESIDENTE MANIFIESTA QUE EL RENDIMIENTO SEA SOSTENIDO CON EN METAS PARA IR MEJORANDO MEDIDA QUE VALLE AVANZANDO EN LA OBRA, AUN ASI SE CONTINUA BUSCANDO ESTRATEGIAS PARA MEJOR EL RENDIMIENTO.LA JORNADA ESTA SEMANA ESTUVO SIN NOVEDADES.

PORCENTAJE PROGRAMDO: 82,25%
PORCENTAJE EJECUTADO: 58,24%
ADELANTO DEL: -24,01%

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
LA JAC SE COMPROMETE A CONTINUAR TRABAJADO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO PARA LA SEMANA VENIDERA.	viernes, 26 de julio de 2024	HERNAN DE JESUS MEJIA SUAREZ RESIDENTE DE OBRA
CONTINUAR APOYANDO Y SUPERVISANDO QUE EL COMPROMISO SE CUMPLA		JOHAN FELIPE CHICA ALVAREZ INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HERNAN DE JESUS MEJIA SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	JAC	
JOHAN FELIPE CHICA ALVAREZ	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	CONSTRUMAJ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 26/07/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **ON TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 3502
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

DURANTE ESTE COMITÉ TECNICO CON PARTICIPIACION DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y EL INSPECTOR DE OBRA DE INTERVENTORÍA. EN OBRA SE CONTINÚA TRABAJANDO CON LA VOLUNTAD DE ALCANZAR UN RENDIMIENTO MAYOR, SIN EMBARGO, LAS CODICIONES DEL TERRENO HAN SIDO FAVORABLES EN ESTA SEMANA INGRESA EL NUEVO INPECTOR DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTERIOA
DURANTE EL COMITE EL INSPECTOR PREGUNTA POR QUE MOTIVO NO SE ESTA APLICANDO BASE EN TERRENO CON LA COMPARTACION MECANICA ANTE A ESTO CONTESTA EL RESIDENTE DE OBRA QUE POR SE UN TERRENO CON ALTA DENSIDAD DE ROCA EL CUAL NO ES VIABLE NI EFICIENTE LA LA APLIACION DE CAPAS SUDBASE. EL RESIDENTE DE OBRA MANIFIESTA QUE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL TRAMO EJECUPTADO A LA FECHA IDENTIFICÓ EN OBRA LA IMPORTA DE CONSTRUIR TRAMOS DE CUNETAS DE EN TRAMOS DEL CARMINO LOS CUALES GARANTIZARAN LA CANALIZAR NACIMIENTOS DE AGUAS DE EMERGEN DEL LA MONTAÑA QUE GARANTIZAR LA ESTABILIADA DEL TERRENO Y LA OBRA, . ESTE ÍTEM NO ESTABA EN PRESUPUESTO INICIALMENTE, POR TAL MOTIVO SE LE SOLICITO AL RESIDENTE DE OBRA, QUE REALIZARA UN NUEVO BALANCE DE OBRA PARA PODER DEFINIR EL ALCANCE REAL A EJECUTAR CON ESTOS IMPREVISTOS. LA RESIDENTE SE COMPROME A ENTREGAR UN NUEVO BALANCE PARA SU REVISION Y APROBACION DE LA INTERVENTORIA. EN CUANTO A LO DEMAS SE EVIDENCIA QUE EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS ENTEGADOS POR EL INVIAS.TENIENDO UN ATRAZO DEL -24,01%, EL CUAL VA EN AUMENTO, ,EL RESIDENTE MANIFIESTA QUE EL RENDIMIENTO SEA SOSTENIDO CON EN METAS PARA IR MEJORANDO MEDIDA QUE VALLE AVANZANDO EN LA OBRA, AUN ASI SE CONTINUA BUSCANDO ESTRATEGIAS PARA MEJOR EL RENDIMIENTO.LA JORNADA ESTA SEMANA ESTUVO SIN NOVEDADES.

PORCENTAJE PROGRAMDO: 82,25%
PORCENTAJE EJECUTADO: 58,24%
ADELANTO DEL: -24,01%

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

RENDIMIENTOS DE OBRA

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

DURANTE ESTE COMITÉ TECNICO CON PARTICIPIACION DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y EL INSPECTOR DE OBRA DE INTERVENTORÍA. EN OBRA SE CONTINÚA TRABAJANDO CON LA VOLUNTAD DE ALCANZAR UN RENDIMIENTO MAYOR SIN EMBARGO DURANTE EL COMITE EL INSPECTOR EVIDENCIA QUE SE HAN ESTADO EJUCUTANDO TRABAJOS DE EXCAVACION DE CUNETAS PREGUNTA POR QUE MOTIVO SE ESTA SEMANA ESTAN ADELATADO OBRAS LA CUALES NO ESTAN PACTADAS EN LOS DISEÑOS INICIALES LO CUAL CONTESTA EL RESIDENTE DE OBRA QUE SON LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CUNETAS CON EL FIN DE CANALIZAR NACIMIENTOS DE AGUAS DE EMERGEN DEL LA MONTAÑA QUE GARANTIZAR LA ESTABILIADA DEL TERRENO Y LA OBRA, EL ESTOS RECURSOS FUERON SOCLITADOS Y DOCUMENTADOS AL PROGRAMA " PAGA" LOS CUALES A LA FECHA ESTOS RECURSOS NO ESTAN UTORIZADOS PERO LA JAC EN SU ADELANTO A ESTAS OBRAS DE MITIGACION GESTIONA MATERIALES CON LOS PROVEDORES FIADOS POR CON EL COMPROMISO DE CANCELAR EN EL MOMENTO QUE ESTOS RECURSOS SEAN APROBADOS
SE EVIDENCIA QUE EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE ESTA EJCUTANDO DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS ENTEGADOS POR EL INVIAS.ENIENDO UN ATRAZO DEL -25,04%, EL CUAL VA EN AUMENTO, EL RESIDENTE MANIFIESTA QUE EL RENDIMIENTO SE SOSTENIDO CON EN METAS PARA IR MEJORANDO MEDIDA QUE VALLA AVANZANDO EN LA OBRA, AUN ASI SE CONTINUA BUSCANDO ESTRATEGIAS PARA MEJOR EL RENDIMIENTO.LA JORNADA ESTA SEMANA ESTUVO SIN NOVEDADES.

PORCENTAJE PROGRAMDO:95,00%
PORCENTAJE EJECUTADO: 92,00%
ADELANTO DEL: -3,00%

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
LA JAC SE COMPROMETE A CONTINUAR TRABAJADO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO PARA LA SEMANA VENIDERA.	martes, 30 de julio de 2024	HERNAN DE JESUS MEJIA SUAREZ RESIDENTE DE OBRA
CONTINUAR APOYANDO Y SUPERVISANDO QUE EL COMPROMISO SE CUMPLA	martes, 30 de julio de 2024	JOHAN FELIPE CHICA ALVAREZ INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 2/08/2024
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HERNAN DE JESUS MEJIA SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	JAC	
JOHAN FELIPE CHICA ALVAREZ	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	CONSTRUMAJ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MEPI-MN-IN-14-FR-2 – ACTA DE REUNIÓN.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONVENIO No.
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL:

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALES VEREDAS CORRALES Y CORRENTOSO, DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

REVISIÓN PRORROGA INTERVENTORÍA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

REVISION GENERL DE AVANCE DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS OBJETO DE LA INTERVENTORIA 5066-2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO.
SE REVISÓ EL AVANCE DE CADA UNO DE LOS CONVENIOS DONDE SE INFORMÓ POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE CADA UNO Y LAS RAZONES QUE HAN AFECTADO EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS.

SE DETERMINÓ QUE SE IBA A TRAMITAR PRÓRROGA PARA LOS CONVENIOS 3502 DE 2023 VEREDA EL ASTILLERO, 3705 VEREDA LOS NARANJOS HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2024, FUNDAMENTADO EN LA NECESIDAD DE CULMINAR ACTIVIDADES QUE SE HAN VISTO AFECTADAS ESPECIALMENTE POR FACTORES CLIMÁTICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE AFECTARON LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.

POR OTRO LADO, PARA LOS CONVENIOS 4082 VEREDA CORRALES Y 4002 VEREDA CORRENTOSO SE DETERMINÓ LA NECESIDAD DE PRORROGAR LOS CONVENIOS HASTA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN LA VEREDA DE CORRENTOSO SE VIO AFECTADA LA PROGRAMACIÓN DE OBRA DEBIDO A TEMAS ADMINISTRATIVOS (CAMBIO EN LA MODALIDAD DE LOS DESEMBOLSOS) Y POR FACTORES CLIMÁTICOS.

EN EL CASO DE LA VEREDA CORRALES, SE VIO AFECTADA LA PROGRAMACIÓN DE OBRA POR EL FACTOR SST, YA QUE HASTA EL 23 DE JULIO ENTREGARON LAS AFILIACIONES DE ARL, RAZÓN POR LA CUAL NO FUE POSIBLE INICIAR ACTIVIDADES HASTA EL 24 DE JULIO DE 2024.

FINALMENTE, PARA EL CONVENIO 3180 VEREDA PALO BLANCO, NO REQUIERE DE PRÓRROGA, YA QUE LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ AL 100% DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR, SE REVISÓ EN CONJUNTO CON PLANTA CENTRAL Y LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ANTIOQUIA, EL PLAN DE CARGAS DE LA INTERVENTORÍA, Y SE DEFINIÓ QUE EL SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO, PERMITE PRORROGAR HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2024, DEJANDO COMO POSIBILIDAD UNA ADICIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONVENIOS 4082 Y 4002 HASTA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/07/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
INVIAS SE COMPROMETE REVISAR SI ES POSIBLE GENERAR OTRA ADICIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA HASTA EL 05 DE SEPTIEMBRE		INVIAS
LA JAC DE CORRENTOSO SE COMPROMETE A GENERAR UN MAYOR RENDIMIENTO PARA PODER TERMINAR OBRA EL 20 DE AGOSTO		JAC CORRENTOSO
LA JAC DE CORRALES SE COMPROMETE REALIZAR COMITES CON LA COMUNIDAD PARA GENERAR MAYOR RENDIMIENTO, ASÍ COMO TAMBIEN CONSEGUIR MAS PERSONAL Y TRABAJAR MAS HORARIOS EXTENDIDOS, FESTIVOS Y DOMINICALES.		JAC CORRALES
LA JAC DE BRICEÑO SE COMPROMETE A SEGUIR TRABAJANDO A BUEN RITMO PARA PODER TERMINAR OBRA EL 20 DE AGOSTO		JAC BRICEÑO






FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
CARLOS DAVID PINEDA	APOYO DE SUPERVISION	INVIAS	
MIGUEL ANGEL TOCACHON	APOYO TECNICO DE PROYECTOS	CONSTRUMAJ SAS	
JULIO CESAR CORDOBA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSTRUMAJ SAS	
FREDYS SAEZ	PRESIDENTE	JAC CORRENTOSO	
WALTER CUELLO	PRESIDENTE	JAC CORRALES	
DIDIAN ANDRES GALEANO	PRESIDENTE	JAC ASTILLERO	
ELDER MUÑOZ	PRESIDENTE	JAC LOS NARANJOS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial
