MINISTERIO DEL TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

PLANTA CENTRAL – TERRITORIAL NARIÑO

INFORME DE INTERVENTORÍA N° 6

1 a 30 DE JUNIO DE 2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.”

CONSORCIO MASO 10

CONTRATO 5065 DE 2023

JUNIO DE 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 3089 DE 2023 / 3119 DE 2023 / 3121 DE 2023 / 3122 DE 2023 / 3153 DE 2023 / 3157 DE 2023 / 3281 DE 2023

Contratista: JAC DE LA VEREDA LLANO GRANDE - JAC VEREDA EL PELIGRO - JAC VEREDA SAUCE - JAC DE QUIROZ ALTO - JAC QUIROZ - JAC VEREDA OLIVOS - JAC VEREDA NUEVA FLORIDA DE LA UNION Y SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Contrato de Interventoría No. 5065 de 2023

Interventoria: CONSORCIO MASO 10

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO,LLANO GRANDE,EL SAUCE,QUIROS ALTO,QUIROZ BAJO,OLIVOS DEL MUNICIPIO Y NUEVA FLORIDA EN LOS MUNICIPOS DE LA UNIÓN Y SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
4	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		18
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		20
2.1	Localización		21
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		22
2,3	beneficios de la obra		22
2,4	Inventario y estado inicial de la vía		22
2,5	Características técnicas del proyecto		28
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		34
3.1	Información general del contrato		34
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		41
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		71
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		71
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		78
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	79
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	107
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	114
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	121
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	128
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	135
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	142
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	149
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	156
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	163
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	172
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	172
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	187
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	NA
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA**		196
5.1	Información general del contrato		196
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		197
5.3	Informes especialistas y profesionales		197
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		NA
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		198
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	198
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	199
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	201
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	202
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	203
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	204
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	205
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	206
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	206
7	**Conclusiones y recomendaciones**		207
8	**Anexos**		208
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia,		208
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		211
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		227
	Informe control de topografía por interventoría		256
	Control de densidades interventoría		290
	Componente social		293
	Estudios y diseños		323
	Seguridad social OAC		418

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO MINFRA-MN1-IN-15-FR-2

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

- **VEREDA LLANO GRANDE LA UNION (N)**
- **VERDA QUIROZ BAJO LA UNION (N)**
- **VEREDA QUIROZ ALTO LA UNION (N)**
- **VEREDA OLIVOS LA UNION (N)**
- **VEREDA EL PELIGRO LA UNION (N)**
- **VEREDA EL SAUCE LA UNION (N)**
- **VEREDA NUEVA FLORIDA SAN PABLO (N)**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	2
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3089 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 2
FECHA DE INICIO: 12/30/23
FECHA DE SUSPENSIÓN: 12/30/23
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/22/24
FECHA DE VENCIMIENTO: 7/30/24
PLAZO ACUMULADO: 6.2

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201,005,912
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201,005,912
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5065 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	120
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	FILTRO	ML	100

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	60	60
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	FILTRO	ML	100	100

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS		154,161,286.00	154,161,286.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		41,216,697.00	41,216,697.00
JAC		1,000,000.00	1,000,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD		4,624,929.00	4,624,929.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			201,002,912.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			74,366,323.00	74,366,323.00
AJUSTES			0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS			1.00	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			0.00	0.00
VALOR EJECUTADO			0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	74,366,323.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	74,366,323.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	37%	

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	2

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3119 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 2
FECHA DE INICIO: 12/30/23
FECHA DE SUSPENSIÓN: 12/30/23
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/22/24
FECHA DE VENCIMIENTO: 7/30/24
PLAZO ACUMULADO: 6.2

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200,741,050
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200,741,050
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5065 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	144
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	und	1
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	FILTRO		130

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	0	0
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	alcantarill	und	1	1
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	FILTRO	ML	130	130

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS		$ 150,233,906.00	150,233,906.00
JAC		$ 1,000,000.00	1,000,000.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN		$ 45,000,972.00	45,000,972.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD		$ 4,506,993.00	4,506,993.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200,741,871.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			$ 105,332,461.00	105,332,461.00
AJUSTES			0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			0.00	0.00
VALOR EJECUTADO			0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	105,332,461.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	105,332,461.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	52.47%	

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	2

FECHA: 30/06/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3122 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 2
FECHA DE INICIO: 12/30/23
FECHA DE SUSPENSIÓN: 12/30/23
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/22/24
FECHA DE VENCIMIENTO: 7/30/24
PLAZO ACUMULADO: 6.2

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199,318,829
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199,318,829
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5065 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	94.04
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	UND	1
Otros (Especificar cuales)	FILTRO	ML	95

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	47.2	0
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Otros (Especificar	FILTRO	ML	95	95
Otros (Especificar cuales)	ALCANTARILLA	UND	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			150,695,153.00
ADMINISTRTATIVOS			43,102,821.00
JAC			1,000,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			4,520,855.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199,318,829.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			66,489,802.00	66,489,802.00
AJUSTES			0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS		0.19	$ 8,924,711.00	8,924,711.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			0.00	0.00
VALOR EJECUTADO			0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	66,489,802.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	66,489,802.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		33.36%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12

REGISTRO FOTOGRÁFICO







SOCIALIZACION **COMITÉ OPERATIVO**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MAURICIO ROMERO
Director de Interventoria
Matricula Profesional No. 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	2

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO — **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3281 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL:	2
FECHA DE INICIO:	12/30/23
FECHA DE SUSPENSIÓN:	12/30/23
FECHA DE REANUDACIÓN:	1/22/24
FECHA DE VENCIMIENTO:	7/30/24
PLAZO ACUMULADO:	6.2

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200,698,283
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200,698,283
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5065 de 2023 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10 — **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	180
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	FILTRO	ML	180

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	0	0
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Otros (Especificar	FILTRO	ML	180	180
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ 8,919,165.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 200,698,283

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			95,642,784.00	95,642,784.00
AJUSTES			0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			0.00	0.00
VALOR EJECUTADO			0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	95,642,784.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	95,642,784.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	48%	

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SOCIALIZACION





COMITÉ OPERATIVO 1

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	2
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3157 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL:	2		
FECHA DE INICIO:	12/30/23	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 201,402,474.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	12/30/23	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$
FECHA DE REANUDACIÓN:	1/22/24	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 201,402,474.00
FECHA DE VENCIMIENTO:	7/30/24	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$
PLAZO ACUMULADO:	6.2	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5065 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	144
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	54	0
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS		150,988,815.00	150,988,815.00
JAC		1,000,000.00	1,000,000.00
ADMINISTRATIVOS		44,833,995.00	44,833,995.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD		4,529,664.00	4,529,664.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			201,402,474.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			66,489,602.00	66,489,602.00
AJUSTES			0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS			0.00	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			0.00	0.00
VALOR EJECUTADO			0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	66,489,602.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	66,489,602.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		33.01%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3


REGISTRO FOTOGRÁFICO













PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	2

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO — **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3121 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL:	2	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 200,048,634.00
FECHA DE INICIO:	12/30/23	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN:	12/30/23	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 200,048,634.00
FECHA DE REANUDACIÓN:	1/22/24	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO:	7/30/24	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	6.2		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5065 de 2023 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10 — **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	145
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	0	0
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151,400,952.00
ADMINISTRATIVOS			43,105,653.00
JAC			1,000,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			4,542,029.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200,048,634.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			69,243,883.00	69,243,883.00
AJUSTES			0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS		19.00	$ 9,041,884.00	9,041,884.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			0.00	0.00
VALOR EJECUTADO			0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	69,243,883.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	69,243,883.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		34.61%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO










PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	2

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3153 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 2
FECHA DE INICIO: 12/30/23
FECHA DE SUSPENSIÓN: 12/30/23
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/22/24
FECHA DE VENCIMIENTO: 7/30/24
PLAZO ACUMULADO: 6.2

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 202,406,606.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 202,406,606.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5065 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	154
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	77	0
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			153,681,398.00
JAC			1,000,000.00
ADMINISTRATIVOS			43,114,766.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			4,610,442.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			202,406,606.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			69,243,883.00	69,243,883.00
AJUSTES			0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			0.00	0.00
VALOR EJECUTADO			0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	69,243,883.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	69,243,883.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		34.21%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5065 DE 2023

CONSORCIO MASO 10

"Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2"

CONVENIOS DE OBRA (3119-3089-3122-3181- 3157-3153-3121) DE 2023



INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10





INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10





INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10





INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 14

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 16

2.1 Localización 17

2.2 Municipios en zona de influencia 18

2.3 Inventario y Estado inicial de la vía 18

2.4 Características técnicas del proyecto 27

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA 28

3.1 Información general de los convenios de obra 28

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 35

3.3 Seguimiento ítems no previstos 37

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 37

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 38

4.1 Informe Semanal: se adjunta copia en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 de los Informes semanales realizados para los siete convenios. ver en el anexo No 1 38

4.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra: El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 ……. 38

4.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra: no Se adjunta diligenciado para ninguno de los convenios, porque aún no se REALIZAN DESEMBOLSOS en el formato MEPI- MN1-IN-15-FR-8 38

4.4 Resumen Ensayos de Laboratorio: MEPI-MN1-IN 15-FR-11 se presentaron ensayos en el presente periodo 38

4.5 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra: no Se adjunta diligenciado para ninguno de los convenios el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 38

4.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra: no Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14. para ninguno de los convenios 38

4.7 Otros documentos seguimiento mensual 38

4.7.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo: No Aplica el formato MEPI-MN-IN-2-FR-2 38

4.7.2 Programa de Inversiones o Reprogramación al Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-1. Seguimiento Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-2. No Aplica el formato para los convenios 38

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

4.7.3 Actas de comité de obra: no se adjunta copia de los comités semanales realizados con los convenios en el formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 38

4.7.4 Actas de reunión: se adjunta copia de REUNION realizado con en el formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 anexo No 3 38

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 39

5.1 Información general del contrato 39

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor 40

5.3 Informes de especialistas 40

5.4 Información otros programas y aplicativos 40

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 41

6.1 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 41

6.2 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 41

6.3 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPIMN1- IN-15-FR-13 41

6.4 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 41

6.5 Seguimiento a la inversión del Anticipo: no aplica en el formato MEPI-MN-IN-3-FR-2 41

6.6 Seguimiento al Plan de Cargas: Se adjunta el seguimiento mensual en el formato MEPI-MNIN-9-FR-2 41

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 47

8. ANEXOS 48

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista, interventoría 48

8.2 Registro fotográfico 51

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional pretende intervenir 33.102 km de vías regionales y caminos ancestrales con recursos destinados a mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación. El programa “Caminos comunitarios de la Paz total” es un vehículo para activar la participación de la comunidad en todo el territorio nacional y así poder mejorar la transitabilidad en caminos vecinales y vías terciarias, este programa es ejecutado a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS, involucrando a las Juntas de Acción Comunal (JAC).

El programa caminos comunitarios de la paz total, contempla el mejoramiento y mantenimiento de siete (7) Caminos vecinales y vías regionales, en los municipios de: La Unión y San pablo (Departamento de Nariño). A partir de la información entregada por el INVIAS, de la “implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías,” del INVIAS, los Contratistas, bajo la supervisión de la Interventoría, ajustaron los estudios y diseños para cada sitio de implantación.

El INVIAS, a través el Proceso de convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales de las veredas Llano Grande, El Peligro, Sauce, Quiroz Alto, Quiroz, Olivos, La Florida, en los municipios de La Unión y San Pablo del Departamento de Nariño fueron seleccionadas para construir las obras y a través del proceso de, CMA-DEO-SVR-119-2023 escogió a un solo Interventor para supervisar los siete contratos. En desarrollo del contrato N.°5065 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS y el CONSORCIO MASO 10**,** cuyo objeto es la realización de la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2 a cargo del invias se presenta este informe de interventoría N.°1, correspondiente a las labores ejecutadas durante el periodo 1 al 29 del mes de febrero de 2024 del seguimiento a los contratos de construcción caminos comunitarios de la paz total:

Convenio 3089-2023 aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal llano grande del municipio de la Unión, departamento de Nariño para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total
convenio 3157-2023 aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal los olivos del municipio de la Unión, departamento de Nariño para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total
convenio 3119-2023 aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda el peligro del municipio de la Unión, departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total
Convenio 3121-2023 aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda el Sauce del municipio de la Unión, departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total
Convenio 3122-2023 aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Quiroz Alto del municipio de la Unión, departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total
Convenio 3153-2023 aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción

comunal de la vereda Quiroz del municipio de la Unión, departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

Convenio 3281-2023 aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda nueva florida del municipio de San Pablo, departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total .Los proyectos iniciaron el 30 de diciembre de 2023 con plazo inicial de ejecución hasta el 23 de marzo de 2023, en la fecha de 30 de diciembre hubo suspensión de todos los convenios, prorrogados inicialmente hasta enero 22 de 2024

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los proyecto en desarrollo se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Unión, y San Pablo en el Departamento de Nariño, en la vereda El Peligro ,Sauce, Los olivos, Llano Grande, Quiroz, Quiroz alto y Nueva florida en San Pablo El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales yambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente. Las obras quese van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías
-Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente

Los contratos de obra contemplaron dos etapas; la primera que se encuentra en ejecución para seleccionar el sitio de implantación y completar y ajustar los estudios y diseños acorde a las características propias y condiciones técnicas particulares encontradas de cada lugar, y una segunda etapa en ejecución correspondiente a su construcción, utilizando los diseños de la cartilla del invias. Para la etapa de estudios y diseños se contempló un plazo de 45 días a partir del inicio de los contratos.

2.1 Localización

En la figura 1 se muestra la localización de los sitios de ubicación de los siete convenios con referencia al departamento de Nariño.



Ilustración 1 localización general de placas huellas – imagen tomada de Field maps.

A la Nueva florida # 1 se puede acceder desde San Juan de Pasto la capital del departamento de Nariño, por vía terrestre hasta la vereda nueva florida en recorrido de 123 km También desde la unión puede acceder y este recorrido es de 32 km,

A sauce # 2 se llega partiendo desde San Juan de Pasto la capital del departamento de Nariño, por vía terrestre hasta la vereda el sauce en recorrido de 100 km También desde la unión puede acceder y este recorrido es de 7 km

A peligro # 3 desde San Juan de Pasto la capital del departamento de Nariño, por vía terrestre hasta la vereda El peligro en recorrido de 110 km También desde la unión puede acceder y este recorrido es de 10 km

A llano grande # 4 desde San Juan de Pasto la capital del departamento de Nariño, por vía terrestre hasta la vereda Llano grande en recorrido de 106 km También desde la unión puede acceder y este recorrido es de 6 km,

A Quiroz bajo # 5 desde San Juan de Pasto la capital del departamento de Nariño, por vía terrestre hasta la vereda Quiroz bajo en recorrido de 110 km También desde la unión puede acceder y este recorrido es de 10 km, para llegar a esta vereda se pasa por la veredallano grande

A Quiroz Alto # 6 desde San Juan de Pasto la capital del departamento de Nariño, por vía terrestre hasta la vereda Quiroz alto en recorrido de 115 km También desde la unión puede acceder y este recorrido es de 15 km, para llegar a esta vereda se pasa por la vereda Quiroz bajo

A olivos # 7 se puede acceder desde San Juan de Pasto la capital del departamento de Nariño, por vía terrestre hasta la vereda los olivos en recorrido de 111 km También desde la unión pueden acceder y este recorrido es de 15 km, vía que comunica a la vereda de olivos desde la vereda de la Playa del municipio de la unión se encuentra en muy malas condiciones

2.2 Municipios en zona de influencia

En el municipio de La unión y San pablo en el departamento de Nariño sus veredas como lo son Olivos, Llano Grande, Quiroz bajo, Quiroz alto, El peligro, El sauce y Nueva florida son sus zonas dispersas y alejadas del casco urbano de estos dos municipios se definió la construcción de placas huellas, solicitado por la comunidad sentada en estos lugares ya que son zonas rurales de difícil acceso, en las que se dan cultivos de café y limón principalmente entre otros productos , por las vías que se encuentran en mal estado es difícil el acceso a estos lugares y por tal motivo se convierte en una dificultad para la comercialización de sus productos

2.3 Beneficios de la obra

La comunidad de los municipios de influencia se beneficia en primer lugar por el mejoramiento que tiene la comunidad tanto la que vive en el sector como la que usan estos corredores viales para realizar sus diferentes actividades económicas, en segundo lugar, la comunidad se beneficia ya que se generan empleos por estar cerca de la zona del proyecto, en tercer lugar, por la compra de materiales necesarios para la construcción de la obra.

2.4 Inventario y Estado inicial de la vía

El proyecto se encuentra ubicado en el norte del departamento de Nariño en los municipios de La unión con los convenios de las siguientes juntas de acción comunal: Los olivos, Sauce, El peligro, Llano Grande, Quiroz bajo, Quiroz alto y en el municipio de San pablo el convenio de Nueva florida, en total con siete convienes entre los dos municipios, a continuación, se indican unas fotografías del estado actual de los tramos que se van a intervenir en los diferentes convenios

EL PELIGRO convenio 3119-2023 es un tramo de vía en un pendiente que supera 7%, en algunos de sus tramos no se encuentra cuneta, no tiene 5m de calzada, el tramo de calzada tiene curvas consecutivas, de igual manera se tiene una placa huella existente que se va a demoler por las condiciones en las que se encuentra, tiene una alcantarilla existente y que se encuentran en funcionamiento y otra la cual fue suspendida por un habitante de esta localidad, a continuación se presenta el registro fotográfico de este convenio.





LLANO GRANDE Convenio 3089-2023 este tramo de vía se encuentra con una pendiente de más del 4 %, tiene curvas sucesivas tiene una alcantarilla, se evidencia que las aguas provenientes de algunas de las viviendas desembocan en las cunetas de la vía, también se observa que la calzada no cumple con los 5m establecidos a continuación se presenta el registro fotográfico de este tramo de vía



OLIVOS convenio 3157-2023 Este tramo de vía es recto en un 80 % tiene una alcantarilla que se encuentra en buen estado, se necesita realizarle limpieza, se tiene un inconveniente con el agua proveniente del acueducto de la vereda que al rebosar el tanque de almacenamiento de esta, llegan a la cuneta de la vía y estas aguas recorren untramo de vía de aproximadamente 120m,el tramo de vía es completamente plano en un 90% y tiene una pendiente al inicio de la vía de un 3% aproximadamente. A continuación, se presenta la evidencia fotográfica



EL SAUCE Convenio 3121-2023 en el tramo de vía a intervenir se encuentra que en un 90% es plano, la zona a intervenir se encuentra el colegio la concentración continuación se presenta la evidencia fotográfica



QUIROZ ALTO Convenio 3122-2023 el tramo de vía a intervenir no cuenta con los 5m de calzada establecidos, se tienen dos alcantarillas, de igual manera a las cunetas de esta vía llegan aguas negras provenientes de las viviendas de este sector, se cuentas con dos viviendas que tiene afectaciones (grietas pronunciadas) en sus interiores, tiene curvas sucesivas y tiene pendientes del 7% de igual manera cuenta con una alcantarilla, y un filtro . a continuación, se indica la evidencia fotográfica.



QUIROZ BAJO Convenio 3153-2023 este tramo de vía a intervenir no cuenta con alcantarillas, en algunos puntos no cuenta con los 5m de calzada, tiene pendientes de 3% aproximadamente.



NUEVA FLORIDA Convenio 3281-2023 este tramo a intervenir se encuentra en el municipio de San pablo, cuenta con una pendiente aproximadamente de 7% tiene obras de drenaje y curvas sucesivas en este tramo de vía no se cuenta con viviendas, solamente con fincas cafeteras y árboles nativos del lugar, también tiene un filtro



2.5 Características técnicas del convenio

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Unión y San Pablo del departamento de Nariño, en las veredas El Peligro, Llano grande, Quiroz alto, Quiroz bajo, El sauce, Los Olivos, y Nueva florida teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto final en el PR0+200 en todos los convenios. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividadvigente.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías-Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente. Que dentro de las funciones del INVIAS se encuentra la de brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

- ✓ **Vereda el Peligro**

  140 ML DE Placa huella


  1 alcantarilla

  130 ml de filtro

Construcción de Placa Huella: Se establece la construcción de un tramo de placa huella de 140 m.l. y 3 ml de placas de transición en cada extremo de la vía, con pendiente superior al 5%, espesor de 15 cm y un ancho de 5 ml con sobreancho al final de las vías, y acero de refuerzo.



SECCIÓN LONGITUDINAL VIGA RIOSTRA
SIN ESCALA

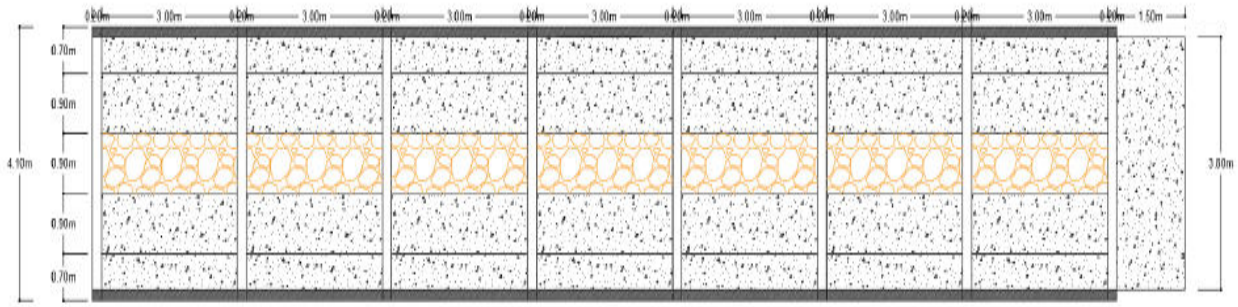


Actividades de mejoramiento construcción alcantarillas: En la zona existe una alcantarilla con ausencia de mantenimiento tanto en la entrada como en la salida por lo cual se plantea realizar el mantenimiento adecuado.

Desmonte y limpieza de zonas no boscosas: Se realizará rocería en la zona por ambos lados de la vía a partir de la mitad de la misma aproximadamente 0.4 Ha.

Construcción de filtro: en este tramo de vía se realizará un filtro de acuerdo a la catilla del invias.

- ✓ **Vereda el Sauce**


Construcción de pavimento rígido: Se plantea la construcción de un tramo en pavimento rígido de 126 ml, la cual presenta pendientes del 3 % con espesor de 20 cm con un ancho promedio de 5ml,

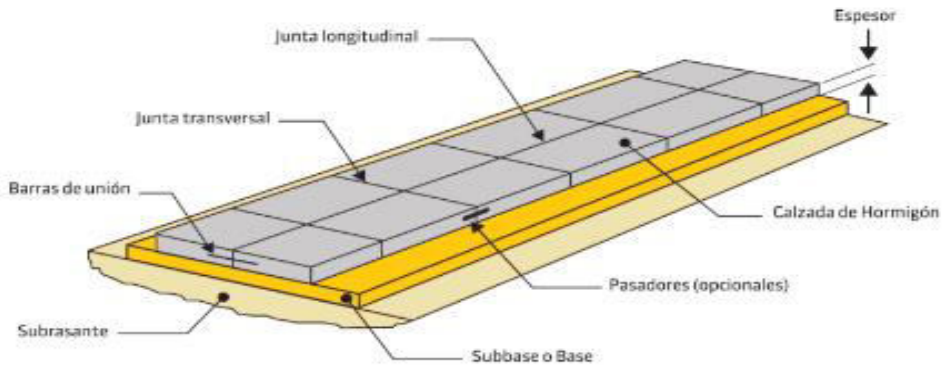


- ✓ **Vereda Olivos**

Construcción de Placa Huella: Se establece la construcción de un tramo de placa

huella de 144 m y 3 ml de placas de transición en cada extremo de la vía, con pendiente superior al 5%, espesor de 15 cm y un ancho de 5m l con sobreancho al final de las vías, y acero de refuerzo.

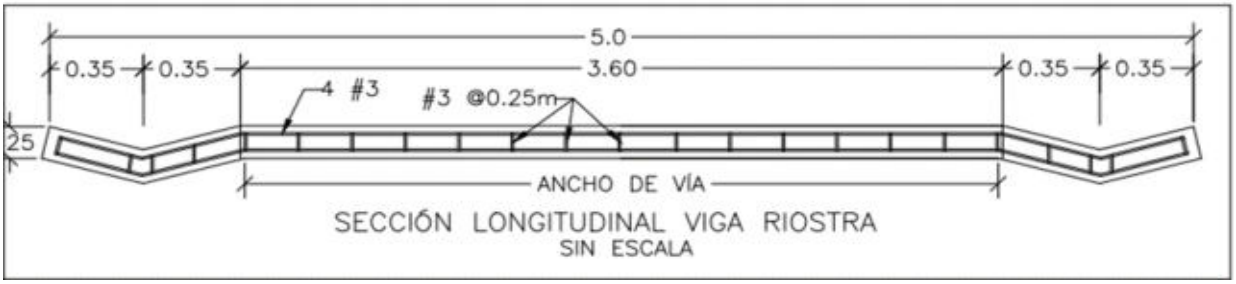

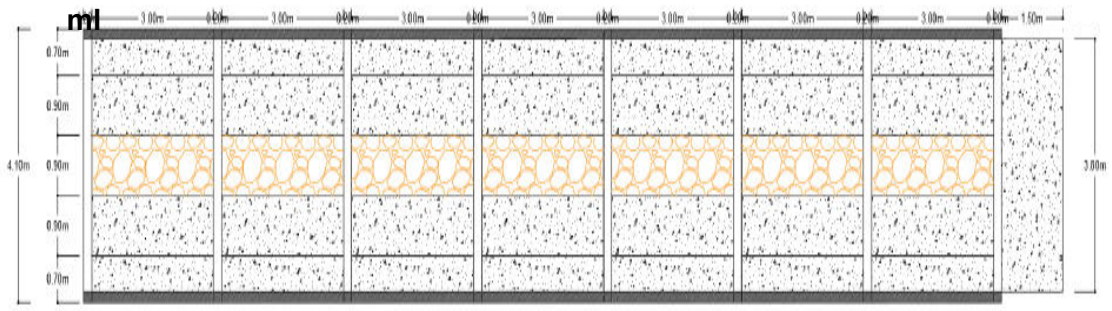

Actividades de mejoramiento construcción alcantarillas: En la zona existe una alcantarilla con ausencia de mantenimiento tanto en la entrada como en la salida por lo cual se plantea realizar el mantenimiento adecuado.

Desmonte y limpieza de zonas no boscosas: Se realizará rocería en la zona por ambos lados de la vía a partir de la mitad de la misma aproximadamente 0.4 Ha.

Construcción de filtro: en este tramo de vía se realizará un filtro de acuerdo a la catilla del invias.

- ✓ **Vereda Quiroz Alto**


Construcción de pavimento rígido: Se plantea la construcción de un tramo en pavimento rígido de 94.4 ml, la cual presenta pendientes del 3 % con espesor de 20 cm con un ancho promedio de 5ml,. una alcantarilla, filtro de 95ml

Actividades de mejoramiento construcción alcantarillas: En la zona existe una alcantarilla con ausencia de mantenimiento tanto en la entrada como en la salida por lo cual se plantea realizar el mantenimiento adecuado. Actividades de mejoramiento construcción alcantarillas: Se plantea el mejoramiento y limpieza de la alcantarilla existente de 12 ml


Desmonte y limpieza de zonas no boscosas: Se realizará rocería en la zona por

ambos lados de la vía a partir de la mitad de la misma aproximadamente 0.4 Ha.

Construcción de filtro: en este tramo de vía se realizará un filtro de acuerdo a la catilla del invias.

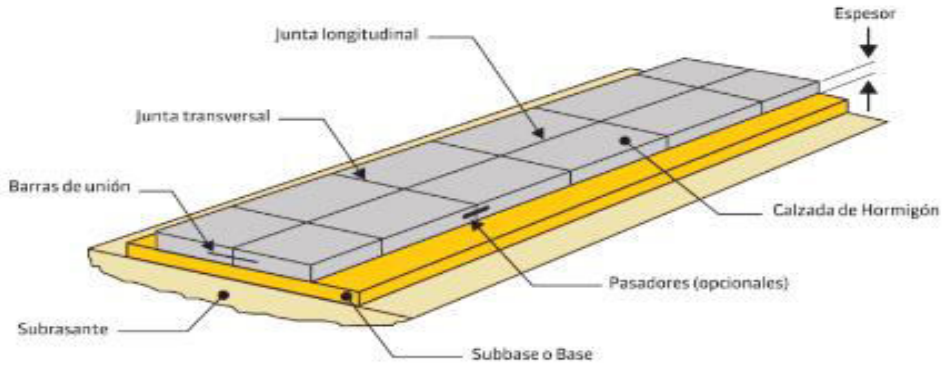


- ✓ **Vereda Quiroz Bajo**
- ✓ **Construcción de pavimento rígido:** Se plantea la construcción de un tramo en pavimento rígido de 154 ml, la cual presenta pendientes del 3 % con espesor de 20 cm con un ancho promedio de 5ml.

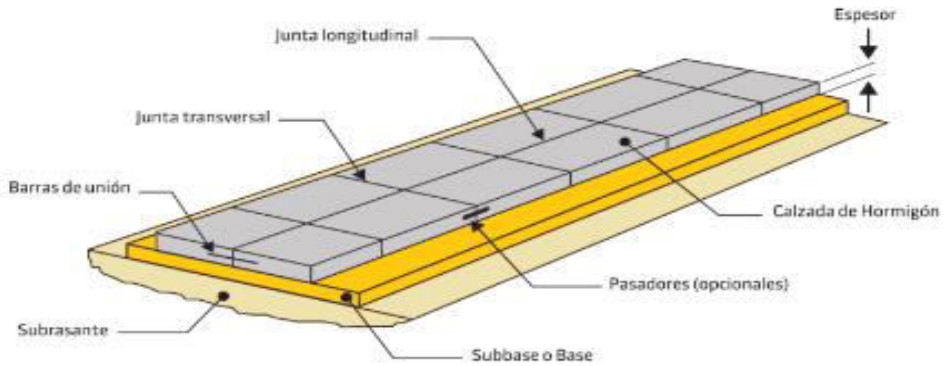


- ✓ **Vereda Llano Grande**
- ✓


Construcción de pavimento rígido: Se plantea la construcción de un tramo en pavimento rígido de 120 ml, la cual presenta pendientes del 3 % con espesor de 20 cm con un ancho promedio de 5ml. filtro de 100ml.

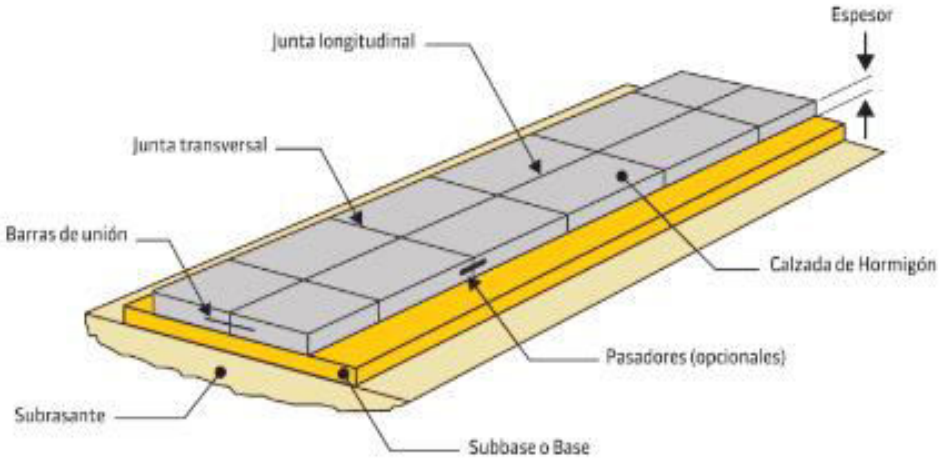

- ✓ **Vereda Nueva Florida**

Construcción de Placa Huella: Se establece la construcción de un tramo de placa huella de 180m y 3 ml de placas de transición en cada extremo de la vía, con pendiente superior al 5%, espesor de 15 cm y un ancho de 5m l con sobreancho al final de las vías, y acero de refuerzo de refuerzo y filtro de 180ml.

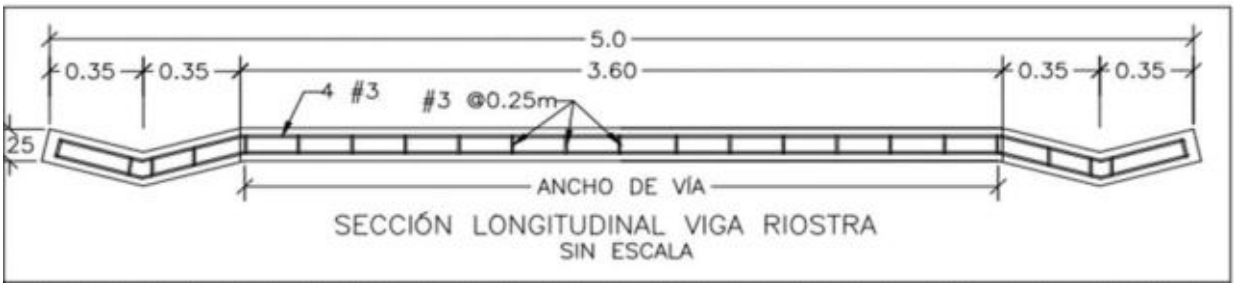



Desmonte y limpieza de zonas no boscosas: Se realizará rocería en la zona por ambos lados de la vía a partir de la mitad de la misma aproximadamente 0.4 Ha.

Construcción de filtro: en este tramo de vía se realizará un filtro de acuerdo a la cartilla del invias.

3. INFORMACIÓN CONVENIOS DE OBRA

3.1 Información general de los convenios de obra

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3089 DE 2023	
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATO	3089 DE 2023
CONTRATISTA	JAC LLANO GRANDE
REPRESENTANTE LEGAL	ONEY VALDEZ
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE E INSTITUTO NACIONAL DE VÍASY LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 201,005,912
ANTICIPO	-
FECHA DE INICIACION	14/12/24
PLAZO DE EJECUCION	4.53 MESES
GESTOR AMBIENTAL	N/A
PRORROGA No 3 (PLAZO DEL CONTRATO)	30 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR DE CONTRATOS	UVEIMAR LAGOS VEGA
GESTOR TECNICO	HERNRY LEANDRO PAZMIÑO MORA
DIRECTOR DE OBRA	N/A

ANTICIPO	N/A
FECHA DE INICIACION	14/12/23
PLAZO DE EJECUCION	4.53 MESES
GESTOR AMBIENTAL	N/A
GESTOR SOCIAL	N/A
SUPERVISOR DE CONTRATOS	UVEIMAN LAGOS
GESTOR TECNICO	HERNRY LEANDRO PAZMIÑO MORA
DIRECTOR DE OBRA	N/A

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3157 DE 2023	
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATO	3157 DE 2023
CONTRATISTA	JAC LOS OLIVOS
REPRESENTANTE LEGAL	ELIZABETH TORO CHALA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 201,402,474

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

ANTICIPO	-
FECHA DE INICIACION	14/12/24
PRORROGA No 3 (PLAZO DEL CONTRATO)	30 DE JULIO DE 2024
GESTOR AMBIENTAL	N/A
GESTOR SOCIAL	N/A
SUPERVISOR DE CONTRATOS	UVEIMAN LAGOS
GESTOR TECNICO	HERNRY LEANDRO PAZMIÑO MORA
DIRECTOR DE OBRA	N/A

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3121 DE 2023	
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATO	3121 DE 2023
CONTRATISTA	JAC EL SAUCE
REPRESENTANTE LEGAL	RAUL URBANO LUNA

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAJUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA ELMANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 200,048,634
ANTICIPO	-
FECHA DE INICIACION	14/12/24
PRORROGA No 3 (PLAZO DEL CONTRATO)	30 DE JULIO DE 2024
GESTOR AMBIENTAL	N/A
GESTOR SOCIAL	N/A
SUPERVISOR DE CONTRATOS	UVEIMAN LAGOS
GESTOR TECNICO	HERNRY LEANDRO PAZMIÑO MORA
DIRECTOR DE OBRA	N/A

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3122 DE 2023	
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATO	3122 DE 2023
CONTRATISTA	JAC QUIROZ ALTO
REPRESENTANTE LEGAL	YONIER DEMETRIO TUQUERRES
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS

VALOR DEL CONTRATO	$ 199,318,829
ANTICIPO	-
FECHA DE INICIACION	14/12/24
PRORROGA No 3 (PLAZO DEL CONTRATO)	30 DE JULIO DE 2024
GESTOR AMBIENTAL	N/A
GESTOR SOCIAL	N/A
SUPERVISOR DE CONTRATOS	UVEIMAN LAGOS
GESTOR TECNICO	HERNRY LEANDRO PAZMIÑO MORA
DIRECTOR DE OBRA	N/A

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3153 DE 2023	
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATO	3153 DE 2023
CONTRATISTA	JAC QUIROZ BAJO
REPRESENTANTE LEGAL	ROBINSON VALDES MARTINEZ
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCODEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 202,406,606
ANTICIPO	-
FECHA DE INICIACION	14/12/24

PRORROGA No 3 (PLAZO DEL CONTRATO)	30 DE JULIO DE 2024
GESTOR AMBIENTAL	N/A
GESTOR SOCIAL	N/A
SUPERVISOR DE CONTRATOS	UVEIMAN LAGOS
GESTOR TECNICO	HERNRY LEANDRO PAZMIÑO MORA
DIRECTOR DE OBRA	N/A

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3281 DE 2023	
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATO	3281 DE 2023
CONTRATISTA	JAC NUEVA FLORIDA
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER FERNEY RAMOS PALADINES
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 200,698,283
ANTICIPO	-
FECHA DE INICIACION	14/12/24

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

PRORROGA No 3 (PLAZO DEL CONTRATO)	30 DE JULIO DE 2024
GESTOR AMBIENTAL	N/A

GESTOR SOCIAL	N/A
SUPERVISOR DE CONTRATOS	UVEIMAN LAGOS
GESTOR TECNICO	HERNRY LEANDRO PAZMIÑO MORA
DIRECTOR DE OBRA	N/A

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Los contratistas ante la suspensión de fin del año 2.023 reanudaron sus actividades en el mes de enero del presente año 2.024 se comunicó con los representantes legales de cada convenio para dar inicio a las diferentes actividades para lograr el desarrollo de los convenios. Actualmente se dio una prórroga hasta el día 30 de julio de 2024.

Respecto al **contrato 3089 de 2.023 correspondiente** a la vereda **Llano Grande** en el municipio de la unión en el departamento de Nariño según lo previsto anteriormente este convenio realizo las siguientes actividades:

- Por parte de la JAC se realiza la instalación de la valla informativa



- Por parte de la JAC hacen entrega del diseño de mezcla, y las densidades tomadas en

el tramo que se va a intervenir.

- La interventoría realizo la rectificación de la topografía enviada por la JAC de la Vereda Llano Grande



- El día 17 de junio la JAC hace entrega de las densidades la subbase dando resultados óptimos para dar inicio a las actividades de fundición de pavimento rígido

- El día 26 de junio se da inicio a la actividad de formaleteo y fundición de pavimento rígido con paños de 3.5 m de largo y 2.5 de ancho






25 jun. 2024 16:50:57
El Empate
La Unión
Nariño
Altitud:1513.0m

- La interventoría realiza la toma de muestra de vigas para ser falladas y ver la resistencia del concreto



- Se realiza la toma del slump para rectificar la cantidad de agua que se debe agregar a la mezcla, acorde al diseño aprobado por interventoría.





- En este convenio se presentó un inconveniente que las volquetas no pueden pasar a dejar material al lugar donde termina la placa huella, por esta razón se debe utilizar un retrocargador para que deje el material al otro extremo



Respecto al **contrato 3157 de 2.023 correspondiente** a la vereda Olivos en el municipio de la unión en el departamento de Nariño según lo previsto anteriormente este convenio entrego los estudios y diseños estos fueron revisados y aprobados por interventoría.

- La JAC hace la instalación de la valla informativa



- Se realiza el tercer comité operativo, dando la información del avance de la obra, y las actividades a ejecutar.

- En el mes de junio se realizó la actividad de conformación de la subbase, esta actividad tuvo dificultades por las condiciones de la vía que conduce a la vereda, ya que es un terreno arcilloso y no es fácil el acceso a la localidad.


Pena Negra
Quebrada
El Molino
Google
viernes, 14 de junio de 202
1°39'27.58562"N -77°12'48.89542"V



La confirmación de la subbase toma 6 días, por las lluvias presentadas en este lugar, se dificulto esta actividad.

- De igual manera se continúa con el corte y figuración de acero para la placa huella, de igual manera esta actividad se mira afectada por las lluvias ya que los trasportadores no se pueden desplazar al lugar.

  Sin embargo, esta actividad finaliza el día 26 de julio, por lo cual la primera semana del mes julio se prevé iniciar con la fundición del concreto ciclópeo.



- Esta localidad es productora de limón que semanalmente ingresan 12 camiones, produce alrededor de 1000 toneladas de limón por lo cual se convocan a una reunión para tratar este tema ya que el paso queda totalmente prohibido para las próximas semanas la reunión se realiza el día 27 de junio a las 3pm.



Respecto al **contrato 3119 de 2.023 correspondiente** a la vereda el **Peligro**. En el mes de junio se realizan las siguientes actividades, se da apertura al segundo comité operativo, en conjunto con la veeduría, residente de obra, y director de interventoría.

- La JAC de la vereda el peligro realiza la instalación de la valla informativa de este convenio




- Se realiza el tercer comité operativo en este convenio, dando a conocer a la comunidad las actividades realizadas durante este tiempo, despejando las dudas de cada uno d ellos asistentes y generando la lista de compras y pagos que se deben realizar



- Se da inicio a la actividad de corte y figuración de acero.

- Las lluvias que se han presentado en el sector han afectado la conformación de la subbase y el ingreso de material a la obra.

- El día 18 de julio llega la maquinaria a la obra, pero por las lluvias presentadas no es posible realizar trabajos.

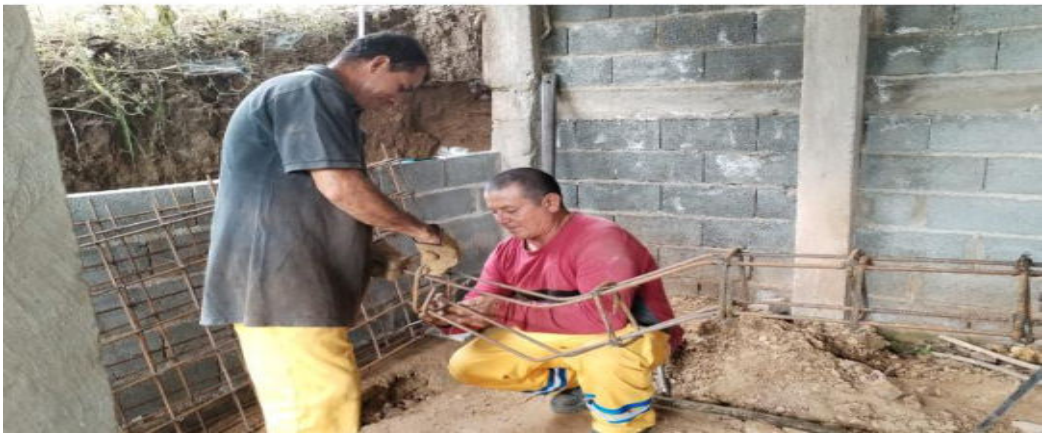


viernes, 14 de junio de 2024
Vía sin nombre
La Unión
Nariño


Rotoplast
viernes, 14 de junio de 2024
1°38'37.57125"N -77°7'47.42421"W
Vía sin nombre
La Unión

- Se da inicio a la actividad de conformación de la subbase, pero las condiciones climáticas no dejan avanzar en esta actividad.





- Por las fuertes lluvias se debe escarificar la subbase y agregar cemento para garantizar una buena conformación de la subbase.



- Por parte de interventoría se realiza la toma de densidades en el sector.



- **Subbase granular y compactación:** Se realiza disposición de subbase granular para la nivelación de la calzada, debido a que se encontraban baches y sobre todo en las cunetas le faltaba material para nivelar, se compacta con vibro compactador a lo largo de la vía.





INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10



Respecto al **contrato 3121 de 2.023 correspondiente** a la vereda el Sauce en el municipio de la unión en el departamento de Nariño.

- Instalación de la valla informativa del convenio de la vereda el Sauce en el municipio de la unión.



- **Inicio físico de la obra:** El día 6 de junio se dio inicio a la ejecución de la estructura del pavimento rígido, en el cual se llevó a cabo con el encofrado.
- **Rectificación de topografía y subbase por parte de interventoría:** El día 11 de junio por parte de interventoría se realiza el levantamiento topográfico del tramo a intervenir, continuación se anexa el registro fotográfico.





- **Encofrado de pavimento rígido** se da inicio con la instalación de la formaleta, para la fundición.



- Por parte de interventoría se toma las densidades de este sector



- Se realiza la instalación del concreto de M.R. 3.8 MPa, con H=20 cm y paños de 3.5 m.l. de longitud.



- **Corte de juntas** de realiza el corte de juntas con la cortadora y los elementos de seguridad del operador de esta herramienta



- **Bordillo:** se realiza la formaleta fara la fundición del bordillo y dar por terminado un tramo completo de la vía, se debe esperar que este fragüe para dar vía y continuar con el siguiente tramo.





En esta obra no se continuaron con los trabajos porque se completó un carril y se debe esperar que el concreto fragüe y que la JAC entregue los resultados de las muestras tomadas del concreto para que continúen con el segundo tramo.

Respecto al **contrato 3122 de 2.023 correspondiente** a la vereda Quiroz Alto en el municipio de la unión en el departamento de Nariño, se realiza las siguientes actividades:

- Por parte de la interventoría se realiza la toma de densidades.



Instalación de valla informativa: El día 18 de junio se instaló la valla informativa:



Fundición de pavimento rígido: el día 17 de junio se iniciaron las actividades de fundición de pavimento rígido, Del carril derecho







INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10


Texturizado de pavimento rígido: se realiza el texturizado por cada uno de los paños





contrato 3153 de 2.023 correspondiente a la vereda Quiroz Bajo en el municipio de la unión en el departamento de Nariño. Se realizaron las siguientes actividades.

- **Instalación de valla informativa**: se instala la valla informativa.

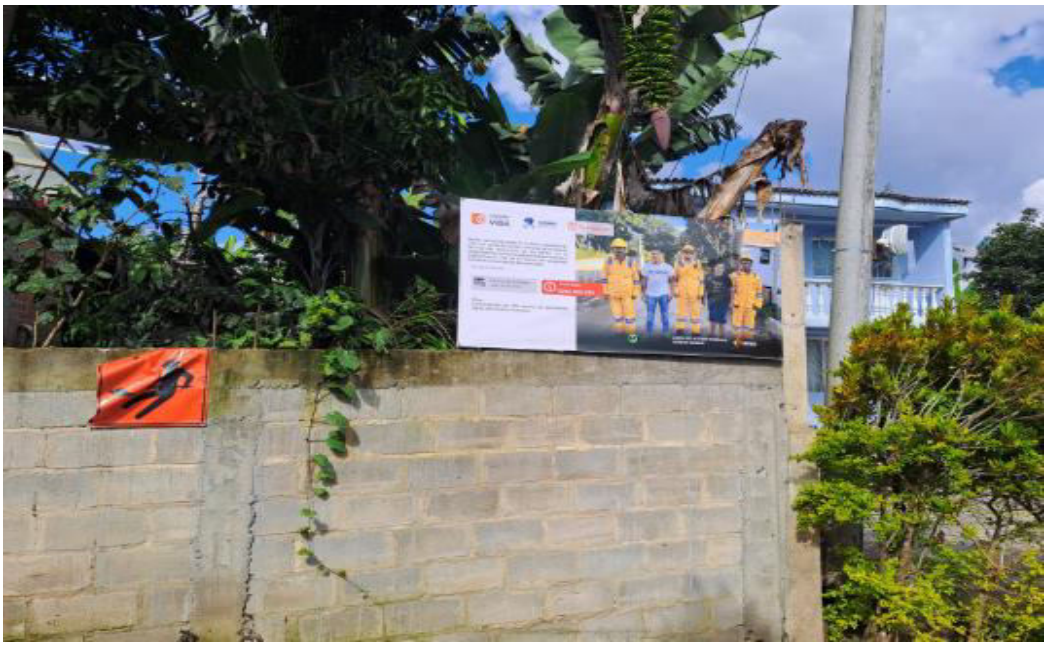

- Toma de densidades por parte de interventoría y rectificación de la topografía







Comité de obra: se realizó el 3er comité de obra donde se trataron temas como la compra de subbase, contrato con proveedores de material granulares, pago de nómina de personal entre otras.

- Corte y figuración de acero





Respecto al **contrato 3281 de 2.023 correspondiente** a la vereda Nueva Florida en el municipio de San Pablo en el departamento de Nariño, en esta vereda se realizan las siguientes actividades.

- **Localización y replanteo:** por parte de interventoría y verificar la topografía enviada por la JAC.
- **Corte y figuración de acero** Esta actividad ya tiene un avance del 100% está totalmente terminada.





- Toma de densidades por parte de interventoría



- Instalación de la señalización de la obra.





- Por las fuertes lluvias presentadas en la zona se tuvo que tapar el acero y hacer un campamento para los obreros.





- En este convenio las densidades no fueron las adecuadas de acuerdo a la norma (menores al 85% del Proctor modificado), por tal motivo se debe escarificar y compactar nuevamente, pero en la zona es difícil disponer de maquinaria y no se ha conseguido hasta la fecha, una maquinaria que apoye a la JAC en este proceso.

3.3 Seguimiento ítems no previstos


No aplica para este periodo.

3.4 Estado de avance

- **Vereda el peligro**

A continuación, se presenta las actividades programadas para este mes y su estado de porcentaje programado vs el ejecutado, en general se puede concluir que este mes en la vereda el Peligro tubo retrasos en la ejecución de actividades.


VEREDA EL PELIGRO MUNICIPO DE LA UNION NARIÑO		
ACTIVIDAD	%PROGRAMADO	% EJECUTADO
subbase	100%	90%
corte y figuracion de acero	100%	100%
concreto	100%	0%

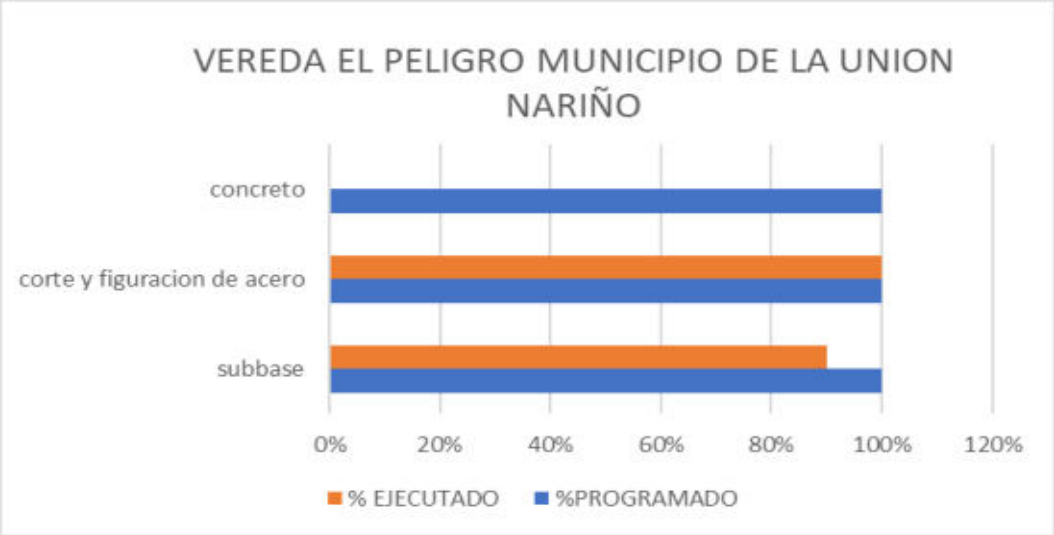

- **Vereda llano grande**

A continuación, se presenta las actividades programadas para este mes y su estado de porcentaje programado vs el ejecutado, en general se puede concluir que este mes en la vereda Llano Grande tubo retrasos en la ejecución de actividades.


VEREDA LLANO GRANDE MUNICIPO DE LA UNION NARIÑO		
ACTIVIDAD	%PROGRAMADO	% EJECUTADO
subbase	100%	100%
corte y figuracion de acero	100%	100%
pavimento rigido (concreto)	100%	50%
bordillo	100%	0%

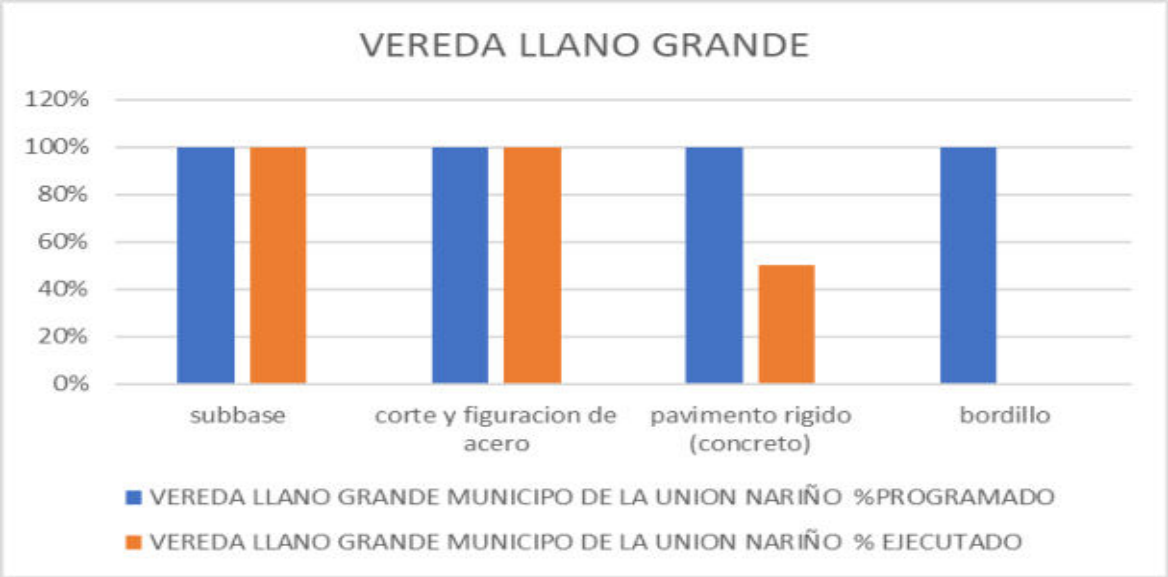

- VEREDA NUEVA FLORIDA

A continuación, se presenta las actividades programadas para este mes y su estado de porcentaje programado vs el ejecutado, en general se puede concluir que este mes en la vereda nueva Florida presenta retrasos en la ejecución de actividades.


VEREDA NUEVA FLORIDA MUNICIPO DE SAN PABLO NARIÑO		
ACTIVIDAD	%PROGRAMADO	% EJECUTADO
conformacion de la subbase	100%	90%
corte y figuracion de acero	100%	100%
placa huella (concreto 3000psi y concreto ciclopeo)	100%	0%

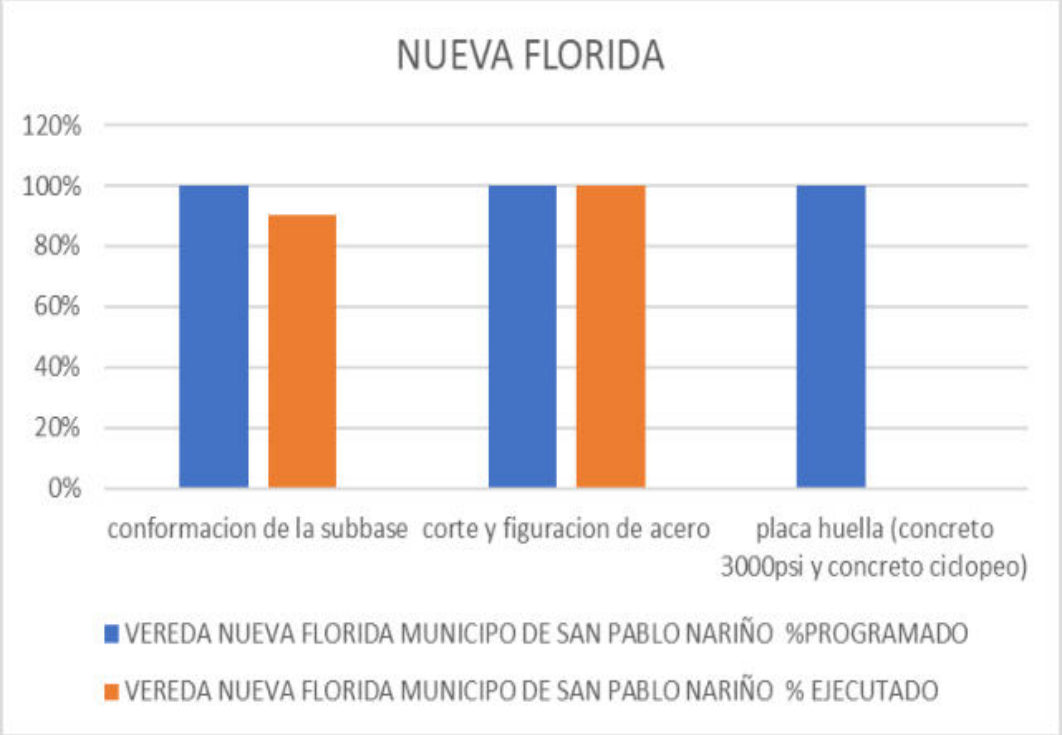

- **Quiroz alto**

A continuación, se presenta las actividades programadas para este mes y su estado de porcentaje programado vs el ejecutado, en general se puede concluir que este mes en la vereda Quiroz Alto presenta retraso de ejecución de actividades.


VEREDAQUIROZ ALTO MUNICIPO DE LA UNION NARIÑO		
ACTIVIDAD	%PROGRAMADO	% EJECUTADO
corte y figuracion de acero	100%	100%
pavimento rigido (concreto)	100%	50%
bordillo	100%	50%

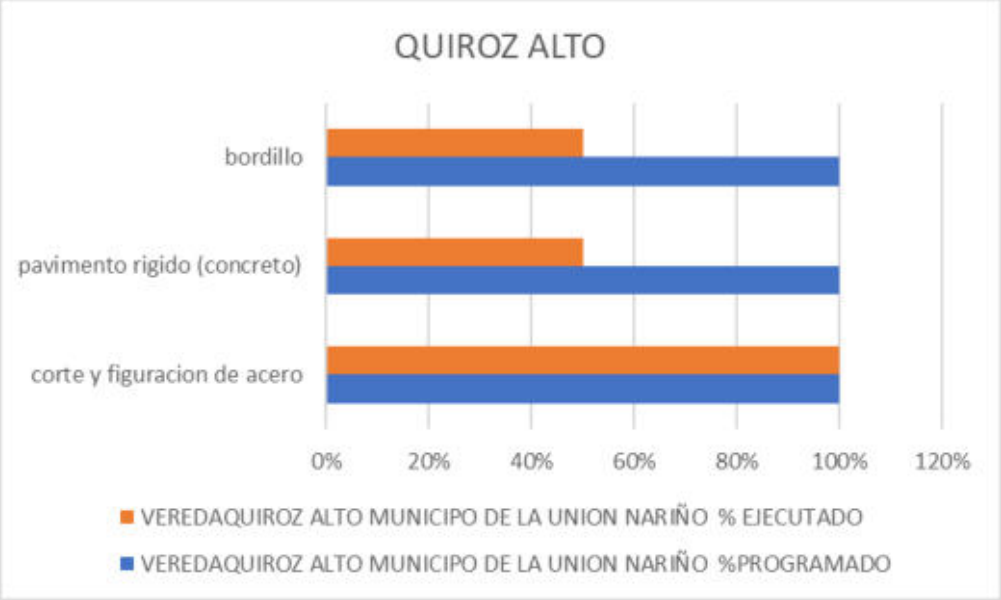

- **Quiroz bajo**

A continuación, se presenta las actividades programadas para este mes y su estado de porcentaje programado vs el ejecutado, en general se puede concluir que este mes en la vereda Quiroz bajo presenta retraso en la ejecución de actividades.


VEREDA QUIROZ BAJO MUNICIPO DE LA UNION NARIÑO		
ACTIVIDAD	%PROGRAMADO	% EJECUTADO
corte y figuracion de acero	100%	100%
pavimento rigido (concreto)	100%	0%
bordillo	100%	0%

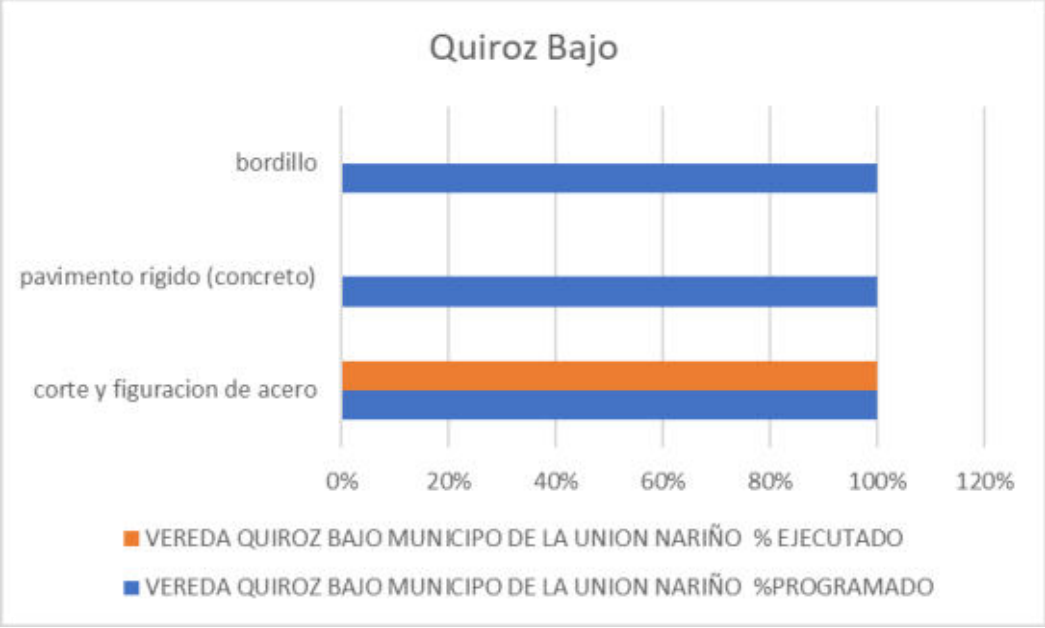

- Olivos

A continuación, se presenta las actividades programadas para este mes y su estado de porcentaje programado vs el ejecutado, en general se puede concluir que este mes en la vereda Olivos presenta retraso en la ejecución de actividades.


VEREDA OLIVOS MUNICIPO DE LA UNION NARIÑO		
ACTIVIDAD	%PROGRAMADO	% EJECUTADO
conformacion de la subbase	100%	100%
corte y figuracion de acero	100%	100%
concreto	100%	20%

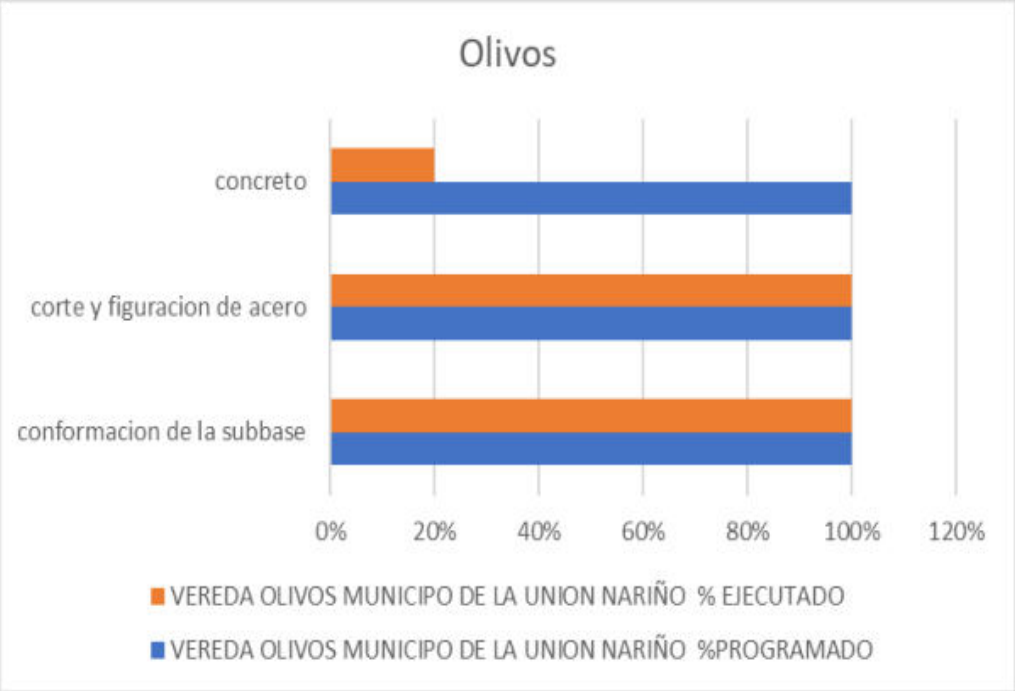

- **El sauce**

  A continuación, se presenta las actividades programadas para este mes y su estado de porcentaje programado vs el ejecutado, en general se puede concluir que este mes en la vereda Olivos presenta retraso en la ejecución de actividades.

VEREDA EL SAUCE MUNICIPO DE LA UNION NARIÑO		
ACTIVIDAD	%PROGRAMADO	% EJECUTADO
corte figuracion de acero	100%	100%
pavimento rigido (concreto)	100%	50%
bordillo	100%	50%

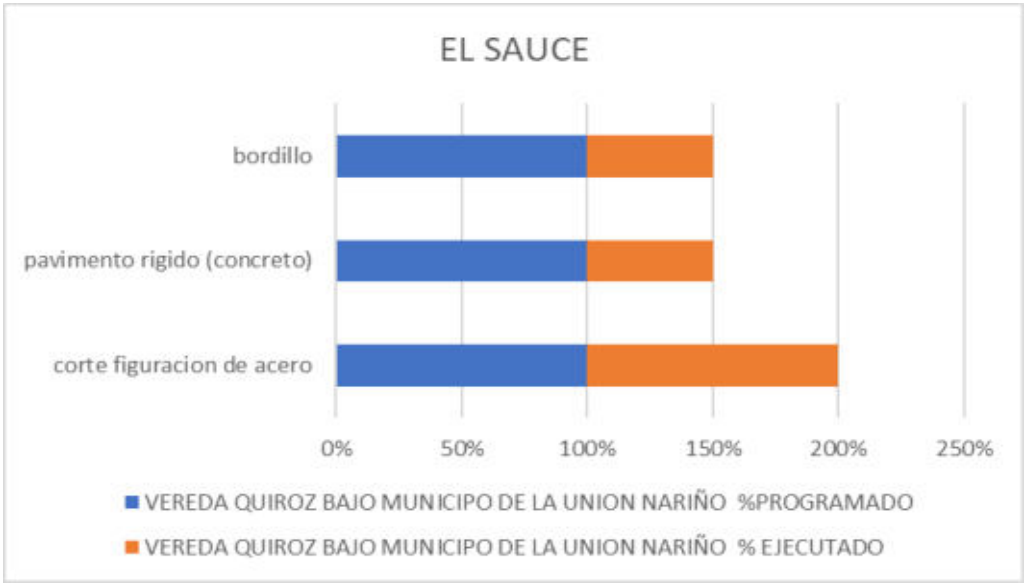

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal: se adjunta copia en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 de los Informes semanales realizados para los siete convenios.

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPS-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 2
FECHA	6/06/2024 (DD / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 17 del 30/05/2024 al 6/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANO GRANDE	INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES:	ONEY VALDES	INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3089 DE 2023	CONTRATO No.	5065 de 2023
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024.	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/03/2024
VALOR INICIAL:	$ 201,005,912.00	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 201,005,912.00	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,005,912	$ 201,005,912		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,005,912	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,005,912	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 37,882,878	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 37,882,878	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 37,882,878	18.85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 37,882,878	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (año)	Vigencia (m)
PLACA HUELLA (M)	M	173		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico			Total	%
Prog				
Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico sectorial acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 31 de mayo 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, se encontró una solicitud del Sr. Ever Orlando Cerón, con la cual, se inicio tramite desde el 06/junio/2024 para dar respuesta a las inquietudes presentadas en la misma.
Encuentro presencial con la presidente de la Veeduría Ciudadana la Sra. Leidy Patricia Benites Carvajal (responsable de la apertura del buzón de PQRS) con el fin, de recepcionar la queja de manera física y dar oportuna respuesta a la solicitud realizada.
Direccionamiento de la PQRS a la Junta de Acción Comunal de la vereda de Llano Grande, a través de envió de oficio N-GR-013-2024 al correo de la JAC jacllanogrande2023@gmail.com, con copia al Ingeniero Residente de Obra, puesto que, por la naturaleza de la petición (información de la ejecución de la obra), se considera responsabilidad del contratista dar trámite a este tipo de solicitud.
Entrega de acciones ejecutadas por Interventoría de manera escrita al Sr. Ever Orlando Cerón, el día 05 junio 2024.
Reunión presencial programada el 06/junio del 2024 a las 6:00 pm en la vereda Llano Grande, con el acompañamiento de: Junta de Acción Comunal, Ingeniero Residente de obra, contadora, Veeduría Ciudadana, Profesional Social de Interventoría y comunidad en general, con el propósito de informar el desarrollo de la obra y despejar dudas e inquietudes al respecto.
Finalización del formato de Plan de Inversión Social MASPS-MN1-IN-3-FR-5

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En esta semana no se presentaron actividades en obra, pero si se realizó figuración de acero

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE ESPERA LOS RESULTADOS DE AS DENSIDADES

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



subbase



PQR

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 2

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL.: NARIÑO — SEMANA No.: 17 del 30/05/2024 al 6/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MOYA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO		
INTEGRANTES:	LILIANA VALENCIA MUÑOZ		
CONTRATO No.	/ENO SOLIDARIO No. 3119 DE	VALOR INICIAL:	$ 200,741,050.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,741,050.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. Y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,741,050	$ 200,741,050		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	$		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,741,050	$		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	$		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,741,050	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 37,724,080	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 37,724,080	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 37,724,080	18.79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 37,724,080	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.2536			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	207			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Se realizó apertura del buzón de PQRS el 24 de mayo 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Finalización del proceso de recolección de información, diligenciada en las fichas del Plan de Gestión Social (C4. Ficha protocolo para el servicio de atención al usuario, C4. Ficha contratación de mano de obra local y C5. Ficha de Inclusión Social con perspectiva de género) debidamente firmadas por el presidente de la J.A.C.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se finaliza la construcción de la alcantarilla, armado de acero y la fundición de esta, se realiza aseo a la obra, llega material para dar continuación con el relleno de la alcantarilla

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

acopio de material para dar inicio a la conformacion de la subbase

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO A INTERVENIR



frundicion de alcantarilla



terminado de alcantarilla

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-98107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 17 del 30/05/2024 al 6/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO			INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	YONIER DEMETRIO TUQUERRES ERASO			INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3122 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,318,829.00	CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,318,829.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,318,829	$ 199,318,829		-
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		-
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,318,829	$ -		-
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		-
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		-
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		-

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,318,829	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 32,173,811	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 32,173,811	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 32,173,811	16.14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 32,173,811	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI — NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI x — NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
* LIMPEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
* ROCERIA (Ha)	Ha	0.2			Prog				
					Ejec				
* PLACA HUELLA (M)	M	183			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	SAN PABLO NARIÑO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariosconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 31 de mayo 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la vereduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud. Sin embargo, el 04 junio se recepciona derecho de petición de la Sra. Gladis Moncayo. Ante la solicitud realizada, la interventoría desde el área de Atención al Usuario realiza direccionamiento del derecho de petición al Ingeniero Residente de Obra: Jefferson Fernando Ordoñez Ortega, el 05 de junio 2024 a las 10:00 a.m. Se anexa el correo adjuntado al correo jefferson_ordonez1984@hotmail.com con copia al presidente de la JAC el Sr. Yonier Demetrio Túquerres al correo juaquinrosero@gmail.com puesto que, por la naturaleza de la petición (actas de vecindad), se considera responsabilidad del contratista dar trámite a este tipo de solicitud.
Considerando que, la interventoría realiza acompañamiento a la ejecución del convenio 3122-2023 se orientó el 06 de junio 7:00 am al ingeniero residente de obra, para articular información y dar respuesta a la solicitud realizada, en los términos establecidos por la legislación nacional aplicable.
Finalización del formato de Plan de Inversión Social **MASPS-MN1-IN-3-FR-1**

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se termina de construir a alcantarilla, se realiza el relleno de esta estructura, se espera que el clima mejore para empezar la escarificación de la subrasante,se presentaro fuertes lluvias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA.

Se espera que el clima acompañe para poder dar inicio a la conformación de la subbase

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



OFICIO COMPONENTE SOCIAL | **compactacion de subbase** | **corte y figuracion de acero,subbase**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 17 del 30/05/2024 al 6/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la VÍA TERCIARIA UBICADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ			INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	ROBINSON VALDES MARTINEZ			INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3153 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 202,406,606.00	CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 202,406,606.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/062024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 202,406,606	$ 202,406,606		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202,406,606	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 202,406,606	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 29,805,450	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 29,805,450	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29,805,450	14,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 29,805,450	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
* LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1		
ROCERIA (Ha)	Ha	0.34		
* PLACA HUELLA (M)	M	170		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico			Total	%
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____
UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A ____
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A ____
OTROS	SI	____	NO	____	N/A ____

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariosconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 31 de mayo 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Finalización del formato de Plan de Inversión Social **MASPS-MN1-IN-3-FR-5**

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

en esta semana no se realizaron actividades en obra,Se realiza acopio de materiales pétreos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ESPERA DE RESULTADOS DE DENSIDADES

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las Indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMPACTACION SUBBASE



TOMA DE DENSIDADES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 17 del 30/05/2024 al 6/06/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE			INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	RAUL URBANO LUNA			INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3121 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.048.634,00	CONTRATO No.	5005 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33.558.477,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.048.634,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33.558.477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.048.634	$ 200.048.634		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.048.634	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33.558.477	$ 33.558.477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33.558.477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.048.634	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 41.417.868	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41.417.868	20,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 41.417.868	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI / NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI / NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (____)	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0,22			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	151			Prog				
					Ejec				
ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI / DISPONIBLE / NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO
UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI / NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico asesoriasocialconsorciomaso10@gmail.com con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 24 de mayo 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Finalización del proceso de recolección de información, diligenciada en las fichas del Plan de Gestión Social (C1. Ficha protocolo para el servicio de atención al usuario, C4. Ficha contratación de mano de obra local y C5. Ficha de inclusión Social con perspectiva de género) debidamente firmadas por el presidente de la J.A.C.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La junta de acción comunal hace entrega de las densidades tomadas en el sitio de la obra, de igual manera se realiza acopio de material como arena y triturado para dar inicio a la fundición de del pavimento.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fortaleo para continuar con tel pavimento rigido

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		
ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



figuracion y corte de acero



acopio de material

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 17 del 30/05/2024 al 6/06/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS
INTEGRANTES: ELIZABETH TORO CHALA
CONTRATO No. CONVENIO SOLIDARIO No. 3157 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 201.402.474,00 — VALOR ADICIONES: $ - — VALOR ACUMULADO: $ 201.402.474,00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/05/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES: MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S
CONTRATO No. 5065 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 33.558.477,00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 33.558.477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/05/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.402.474	$ 201.402.474		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.402.474	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33.558.477	$ 33.558.477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33.558.477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.402.474	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 60.413.073	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 60.413.073	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34.774.073	17,27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 34.774.073	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI — NO X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI — NO X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
* LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	2			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.14			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	178			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariosconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, durante la semana no se presentaron.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 31 de mayo 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Solicitud de actas de vecindad a través de oficio N -DL-012-2024 el 30 mayo a través de correo electrónico a la ingeniera residente de obra Emilia soldarte22@gmail.com
Con copia a la presidenta de la JAC de Olivos jverretealvoz@gmail.com

Finalización del formato de Plan de Inversión Social MASPS-MN1-IN-3-FR-5

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

por las fuertes lluvias la maquinaria no pudo llegar a la obra, pero se realizó acopio de material de subbase

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se esta a la espera que la maquinaria llegue a la obra ,la cual ya esta en camino el dia de hoy 6 de junio del 2024

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



limpieza y canalizacion de aguas



solicitud



acopio de material

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-46107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 16 del 30/05/2024 al 6/06/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: UNIR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA NUEVA FLORIDA DEL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA		
INTEGRANTES:	WILDER FERNEY RAMOS PALADINES		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3281 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,698,283.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,698,283.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,698,283	$ 200,698,283		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,698,283	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,698,283	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8,919,165	4.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 8,919,165	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
* LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
* ROCERIA (Ha)	Ha	0.22			Prog				
					Ejec				
* PLACA HUELLA (M)	M	207			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariosconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 31 de mayo 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Solicitud de actas de vecindad a través de oficio N-NF-012-2024 el 30 mayo a través de correo electrónico del ingeniero residente de obra oberagredo@gmail.com con copia a la JAC de Nueva Florida veredanuevaflorida@gmail.com

Finalización del formato de Plan de Inversión Social MASPS-MN1-IN-3-FR-5

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se da inicio a excavación de filtro. Se termina la escarificación de la subrasante, llega a obra material para filtro.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

acopio de material mapara continuar con la actividad de la subbase

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACION FILTRO



SOLICITUD



EXCAVACION FILTRO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	14/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 18 (Numeración consecutiva) del 6/06/2024 al 13/06/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE		
INTEGRANTES:	RAUL URBANO LUNA		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3121 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,048,634.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,048,634.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024.		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,048,634	$ 200,048,634		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,048,634	$ 200,048,634		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,048,634	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 41,417,868	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41,417,868	20.70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 41,417,868	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (%)	Avance Físico			Total	%
LIMPEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.22			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	151			Prog				
					Ejec				
ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	____	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	.....	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI ____	NO ____		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	____
VERTIMENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	____
OTROS	SI ____	NO ____	N/A	____

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariosconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 7 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la vendurla ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
11 junio 2024, envió de oficio N-SA-013-2024 sobre correcciones en valla informativa.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

conformacion de pavimento rigido,tercer comité operativo,acopio de material.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fortalso para continuar con tal pavimento rigido

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		
ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICON DE PAVIMENTO RIGIDO



FUNDICON DE PAVIMENTO RIGIDO



FUNDICON DE PAVIMENTO RIGIDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-38107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-PR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 18 del 6/06/2024 al 13/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO		
INTEGRANTES:	YONIER DEMETRIO TUQUERRES ERASO		
CONTRATO No:	CONVENIO SOLIDARIO No. 3122 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.318.829,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.318.829,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No:	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33.558.477,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33.558.477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,318,829	$ 199,318,829		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,318,829	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,318,829	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 32,173,811	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 32,173,811	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 32,173,811	16,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 32,173,811	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
* LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1		
* ROCERIA (Ha)	Ha	0.2		
* PLACA HUELLA (M)	M	183		
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico			Total	%
	Prog			
	Ejec			
	Prog			
	Ejec			
	Prog			
	Ejec			

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n): VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	SAN PABLO NARIÑO	PERMISO MINERO:	SI	X NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS	SI	NO		

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariosconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 7 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
11 junio 2024, envió de oficio N-QA-015- 2024 sobre aprobación valla informativa.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza la verificación de la topografía por parte de la interventoría. Se toma densidades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

accopto de material

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO,
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



rectificacion de topografia



TOMA DE DENSIDADES



TOMA DE DENSIDADES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15.FR.3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 18 del 6/06/2024 al 13/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA NUEVA FLORIDA DEL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA		
INTEGRANTES:	WILDER FERNEY RAMOS PALADINES		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3281 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,698,283.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,698,283.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,698,283	$ 200,698,283		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,698,283	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,698,283	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8,919,165	4.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 8,919,165	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.22			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	207			Prog				
					Ejec				

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó seguimiento al buzón de PQRS el 7 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en compañía del veedor de la ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
11 junio 2024, envió de oficio N-NF-013-2024 sobre solicitud diseño de la valla informativa.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

conformacion de la subbase

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

acopio de materiales,toma de densidades

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

		ACUMULADO PROYECTO	
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



conformacion de subbase



conformacion de subbase



conformacion de subbase

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-68107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 18 del 6/06/2024 al 13/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUEIMAR HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:EL CAC debera desarrollar el objeto del Convenio en la VÍA TERCIARIA UBICADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ
INTEGRANTES: ROBINSON VALDES MARTINEZ
CONTRATO No: CONVENIO SOLIDARIO No. 3153 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 202,406,606.00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 202,406,606.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES: MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S
CONTRATO No. 5065 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 202,406,606	$ 202,406,606		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202,406,606	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 202,406,606	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 29,805,450	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 29,805,450	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29,805,450	14.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 29,805,450	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		#¡DIV/0!

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base — Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada — Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.34			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	170			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____
UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A
OTROS	SI	____	NO	____	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariooconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 7 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
11 junio 2024, envió de oficio N-QB-012-2024 sobre aprobación valla informativa

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

en esta semana se realizaron actividades en obra como acopio de materiales ,Se realiza acopio de materiales pétreos ,y rectificacion d etopografia por interventoria

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ESPERA DE RESULTADOS DE DENSIDADES

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RECTIFICACION DE TOPOGRAFIA



TOMA DE DENSIDADES



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 18 del 6/06/2024 al 13/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO	INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	LILIANA VALENCIA MUÑOZ	INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No:	CENIO SOLIDARIO No. 3119 DE	VALOR INICIAL:	$ 200,741,050.00	CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,741,050.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,741,050	$ 200,741,050		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,741,050	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,741,050	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 37,724,080	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 37,724,080	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 37,724,080	18.79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 37,724,080	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (año)	Vigencia (%)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.2536			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	207			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
UBICACIÓN:

		DISPONIBLE	
PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 7 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
11 junio 2024, envió de oficio N-PE-014-2024 sobre correcciones en valla informativa.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En esta semana se realizó el armado de acero, en un avance del 70% en esta actividad, por parte de interventoría se realizo el acompañamiento y la verificación de medidas de acuerdo a los planos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

acopio de material para dar inicio a la conformacion de la subbase

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



armado de acero



armado de acero



armado de acero

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 18 del 6/06/2024 al 13/06/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANO GRANDE			INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	ONEY VALDES			INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3089 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.005.912,00	CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33.558.477,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.005.912,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33.558.477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.005.912	$ 201.005.912		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.005.912	$		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33.558.477	$ 33.558.477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33.558.477	$		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.005.912	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 37.882.878	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 37.882.878	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 37.882.878	18,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 37.882.878	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____
Meta Física Ejecutada % _____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
PLACA HUELLA (M)	M	173			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 7 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
11 junio 2024, envió de oficio N-GR-014-2024 sobre correcciones en valla informativa.
11 junio 2024 a las 5:00 pm – reunión con la comunidad, con el fin de informar sobre las acciones de obra realizadas hasta la fecha y de esta manera, dar cierre al PQRS del Sr. Ever Orlando Cerón, recibido el 31 mayo 2024 en la apertura del buzón.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En esta semana se realizaron actividades como el omite operativo número tres, de igual manera por parte de interventoría se realiza la rectificación de topografía, se hace orden y aseo en la obra

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE ESPERA LOS RESULTADOS DE AS DENSIDADES

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ OPERATIVO





COMITÉ OPERATIVO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSION	1
PAGINA	1 DE 2
FECHA	13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 18 del 6/06/2024 al 13/06/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:EI OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS		
INTEGRANTES:	ELIZABETH TORO CHALA		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3157 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,402,474.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,402,474.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No:	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,402,474	$ 201,402,474		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,402,474	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,402,474	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 60,413,073	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 60,413,073	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34,774,073	17.27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 34,774,073	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (año)	Vigencia (m)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	2			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.14			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	178			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariosconsorciomaso10@gmail.com; con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 7 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
7 junio 2024, envió oficio N-OL-013-2024 sobre observaciones de actas de vecindad entregadas 01 junio 2024.
11 junio 2024, envió de oficio N-OL-014-2024 sobre correcciones en valla informativa.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

conformacion de la subbse

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

acopio de materiales,toma de densidaded

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONFORMACION DE SUB-BASE



CONFORMACION DE SUB-BASE



CONFORMACION DE SUB-BASE

NOTA: Las cantidades y valores consignadas en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual y Memorias de Actividades (PAPA)
Copias: Unidad Ejecutora, Supervisor, Interventor, Archivo Contractual, Archivo Técnico

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 19 del 13/06/2024 al 20/06/2024 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO
INTEGRANTES: YONIER DEMETRIO TUQUERRES ERASO

CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3122 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.318.829,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.318.829,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES: MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S.

CONTRATO No.	2065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33.558.477,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33.558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.318.829	$ 199.318.829		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.318.829	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33.558.477	$ 33.558.477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33.558.477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	199.318.829
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	32.173.811
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	32.173.811
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	32.173.811 — 16,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	32.173.811
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
* LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
* ROCERIA (Ha)	Ha	0,2			Prog				
					Ejec				
* PLACA HUELLA (M)	M	183			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	SAN PABLO NARIÑO	PERMISO MINERO:	SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____ NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____ NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____ NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____ NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____ NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____ NO ____	N/A	
OTROS	SI ____ NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariosconsorciomaso1@gmail.com; con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, durante la semana no se presentaron.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 14 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
14 junio se hace entrega de respuesta N°-QA-016-2024, al derecho de petición interpuesto por la Sra. Gladis Edilma Moncayo Moncayo, a quien se le entregó todos los documentos solicitados de manera física en la casa de habitación, en compañía del presidente de la J.A.C. el Sr. Yonier Demetrio Tuquerres, presidente de la veeduría ciudadana el Sr. Wilson Ingay y la profesional social: Evelyn Juliana Díaz Gómez.
Organización de los siguientes documentos: fichas del programa de gestión social (5 formatos debidamente diligenciados y firmados), certificación de no afectación a territorios colectivos, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 y plan de gestión social, con el fin de recopilar la información y radicar al ente territorial de INVIAS-Nariño, sobre la ejecución de actividades desde el componente de Control y Gestión Social

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se inicio con las actividades de fundición de pavimento rígido

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundicion de pavimento

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO			
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		-
	Ejec		-
ROCERIA (Ha)	Prog		-
	Ejec		-
PLACA HUELLA (M)	Prog		-
	Ejec		-



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



fundicion



fundicion



fundicion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 19 (Numeración consecutiva) del 13/06/2024 al 20/06/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UWEIMAR HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS
INTEGRANTES: ELIZABETH TORO CHALA

CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3157 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,402,474.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,402,474.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES: MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S

CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRAPOR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,402,474	$ 201,402,474		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,402,474	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,402,474	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 60,413,073	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 60,413,073	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34,774,073	17.27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 34,774,073	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ☐ NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ☐ NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ____ Avance o Atraso Físico % ____
Meta Física Ejecutada % ____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
1 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	2			Prog				
					Ejec				
2 ROCERIA (Ha)	Ha	0.14			Prog				
					Ejec				
3 PLACA HUELLA (M)	M	178			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: ____ PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ DISPONIBLE
UBICACIÓN: ____ PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____		
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____		
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____		
OTROS	SI ____	NO ____	N/A ____		

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ____

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso1@hotmail.com con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 14 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la vereduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Envió de observaciones actas de vecindad recibidas 13 junio 2024, a través de correo de gestión social.
Organización de los siguientes documentos: fichas del programa de gestión social (5 formatos debidamente diligenciados y firmados), certificación de no afectación a territorios colectivos, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 y plan de gestión social, con el fin de recopilar la información y radicar al ente territorial de INVIAS- Nariño, sobre la ejecución de actividades desde el componente de Control y Gestión Social.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ____
AVALÚOS APROBADOS: ____
PREDIOS ADQUIRIDOS: ____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

corte y figuracion de acero

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

acopio de materiales

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





armado de acero



armado de acero

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 19 del 13/06/2024 al 20/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE		
INTEGRANTES:	RAUL URBANO LUNA		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3121 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,048,634.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,048,634.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO_10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,048,634	$ 200,048,634		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,048,634	$		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos.)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,048,634	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 41,417,868	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	-	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41,417,868	20.70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 41,417,868	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
* LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1		Prog				
				Ejec				
* ROCERIA (Ha)	Ha	0.22		Prog				
				Ejec				
* PLACA HUELLA (M)	M	151		Prog				
				Ejec				
ALCANTARILLAS (UND)	UND	1		Prog				
				Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n): — TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico pte.contratosinterventoria@invias.gov.co con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 14 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la vereduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Organización de los siguientes documentos: fichas del programa de gestión social (5 formatos debidamente diligenciados y firmados), certificación de no afectación a territorios colectivos, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 y plan de gestión social, con el fin de recopilar la información y radicar al ente territorial de INVIAS- Nariño, sobre la ejecución de actividades desde el componente de Control y Gestión Social.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza la fundición de un carril completo de pavimento rígido

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundicion de bordillo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		
ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICON DE PAVIMENTO RIGIDO



FUNDICON DE PAVIMENTO RIGIDO



FUNDICON DE PAVIMENTO RIGIDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 19 del 13/06/2024 al 20/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la VÍA TERCIARIA UBICADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ			INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	ROBINSON VALDES MARTINEZ			INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3163 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 202.406.606,00	CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33.558.477,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 202.406.606,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33.558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/062024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 202.406.606	$ 202.406.606		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.406.606	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33.558.477	$ 33.558.477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33.558.477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 202.406.606	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 29.805.450	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 29.805.450	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.805.450	14,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 29.805.450	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.34			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	170			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso3@hotmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 14 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la vendurla ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Organización de los siguientes documentos: fichas del programa de gestión social (5 formatos debidamente diligenciados y firmados), certificación de no afectación a territorios colectivos, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5-y plan de gestión social, con el fin de recopilar la información y radicar al ente territorial de INVIAS- Nariño, sobre la ejecución de actividades desde el componente de Control y Gestión Social.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

en esta semana se realizaron actividades en obra como acopio de materiales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

armado y figuracion de acero

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO			
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



acopio de material



acopio de material



acopio de material

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 19 del 13/06/2024 al 20/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El DAC debera desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO		INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10	
INTEGRANTES:	LILIANA VALENCIA MUÑOZ		INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S	
CONTRATO No:	/ENIO SOLIDARIO No. 3119 DE	VALOR INICIAL: $ 200,741,050.00	CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL: $ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 200,741,050.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,741,050	$ 200,741,050		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,741,050	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,741,050	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 37,724,080	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 37,724,080	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 37,724,080	18.79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 37,724,080	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	1			Prog				
					Ejec				
* ROCERIA (Ha)	Ha	0.2536			Prog				
					Ejec				
* PLACA HUELLA (M)	M	207			Prog				
					Ejec				

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@hotmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 14 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Se anexa el siguiente documentos: fichas del programa de gestión social (5 formatos debidamente diligenciados y firmados), certificación de no afectación a territorios colectivos, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 y plan de gestión social, con el fin de recopilar la información y radicar al ente territorial de INVIAS- Nariño, sobre la ejecución de actividades desde el componente de Control y Gestión Social

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Armado de acero, llega maquinaria a obra por el mal clima no se realiza la conformación de la subbase


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Acopio de material para dar inicio a la conformacion de la subbase

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 2

FECHA: 20/06/2024 (DD / MM / AAA)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 19 del 13/06/2024 al 20/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANO GRANDE		
INTEGRANTES:	ONEY VALDES		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3089 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.005.912,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.005.912,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33.558.477,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33.558.477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.005.912	$ 201.005.912		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.005.912	$		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33.558.477	$ 33.558.477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33.558.477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	201.005.912
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	37.882.878
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	37.882.878
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	37.882.878 — 18,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	37.882.878
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI — NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$	-
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI x — NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
PLACA HUELLA (M)	M	173			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Tipo Disponible
		-
		-
		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 14 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Envió de observaciones actas de vecindad recibidas 17 junio 2024, a través de correo de interventoría.
Organización de los siguientes documentos: fichas del programa de gestión social (5 formatos debidamente diligenciados y firmados), certificación de no afectación a territorios colectivos, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 y plan de gestión social, con el fin de recopilar la información y radicar al ente territorial de INVIAS- Nariño, sobre la ejecución de actividades desde el componente de Control y Gestión Social

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se hace orden y aseo en la obra

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

acopio de material para subbase

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO			
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSION	1
PAGINA	1 DE 2
FECHA	13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 18 del 6/06/2024 al 13/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA NUEVA FLORIDA DEL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA	INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES:	WILDER FERNEY RAMOS PALADINES	INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3281 DE 2023	CONTRATO No.	5065 de 2023
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024
VALOR INICIAL:	$ 200,698,283.00	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200,698,283.00	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,698,283	$ 200,698,283		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,698,283	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,698,283	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8,919,165	4.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 8,919,165	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ____ Avance o Atraso Físico %: ____
Meta Física Ejecutada %: ____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
* LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
* ROCERIA (Ha)	Ha	0.22			Prog				
					Ejec				
* PLACA HUELLA (M)	M	207			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariosconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Se realizo revisión de la ventanilla única del buzón de PQRS el 14 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Organización de los siguientes documentos: fichas del programa de gestión social (5 formatos debidamente diligenciados y firmados), certificación de no afectación a territorios colectivos, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 y plan de gestión social, con el fin de recopilar la información y radicar al ente territorial de INVIAS- Nariño, sobre la ejecución de actividades desde el componente de Control y Gestión Social.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

corte y figuracion de acero

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

acopio de materiales,toma de densidades

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 252002-68107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 20 del 20/06/2024 al 27/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO				
INTEGRANTES:	LILIANA VALENCIA MUÑOZ				
CONTRATO No:	CONVENIO SOLIDARIO No. 3119 DE	VALOR INICIAL:	$ 200,741,050.00		
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,741,050.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No:	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,741,050	$ 200,741,050		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,741,050	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,741,050	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 37,724,080	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 37,724,080	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 37,724,080	18.79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 37,724,080	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.2536			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	207			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarios@corporacionlaoficentral.com con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
21 de junio 2024, la profesional social realiza visita de seguimiento, haciendo un recorrido comunitario, con el fin de indagar diferentes aspectos relacionadas al componente social, que se hayan desencadenado a partir de la ejecución de la obra.
24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N-031-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucía Zúñiga Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Olivos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

en esta semana se realizaron actividades de corte y figuración de acero de igual manera, se inició con la configuración de la subbase, por las condiciones climáticas no se avanzo de manera satisfactoria y un daño de la motoniveladora retraso aun mas los procesos y no se están realizando actividades por parte de interventoria se toman densidades

continuar con la conformacion de la subbase

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



conformacion subbase



conformacion subbase



toma de densidades por intervntoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Gestión Social, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-19-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 20 del 20/06/2024 al 27/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVERMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA NUEVA FLORIDA DEL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA		
INTEGRANTES:	WILDER FERNEY RAMOS PALADINES		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3281 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,698,283.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,698,283.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,698,283	$ 200,698,283		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,698,283	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,698,283	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8,919,165	4.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 8,919,165	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	-	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (n)	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
* LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
* ROCERIA (Ha)	Ha	0.22			Prog				
					Ejec				
* PLACA HUELLA (M)	M	207			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____
UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____		
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____		
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____		
OTROS	SI ____	NO ____	N/A ____		

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@hotmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 14 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veedora ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Por otra parte, en el componente de Gestión Social, se radicó oficio N-033-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucía Ortiz Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Olivos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

corte y figuracion de acero,toma de densidades por parte de interventoria

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundicion de placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



corte y figuracion de acero



corte y figuracion de acero



corte y figuracion de acero

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 2
	FECHA	27/06/2024 (día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 20 del 20/06/2024 al 27/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANO GRANDE				
INTEGRANTES:	ONEY VALDES				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3089 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	201,005,912.00	
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	201,005,912.00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10				
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S				
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$	33,558,477.00	
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	33,558,477	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
		VALOR AMORTIZADO:	$	-	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,005,912	$ 201,005,912		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,005,912	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,005,912	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 37,882,878	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 37,882,878	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 37,882,878	18.85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 37,882,878	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
PLACA HUELLA (M)	M	173			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INF'LUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N -031- 2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucia Jiltiva Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Llano Grande.
25 de junio 2024, la profesional social realiza visita de seguimiento, haciendo un recorrido comunitario, con el fin de indagar diferentes aspectos relacionados al componente social, que se hayan desencadenado a partir de la ejecución de la obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

fundicion de pavimento rigido

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundicion de pavimento rigido

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



fundicion de pavimento



fundicion de pavimento



fundicion de pavimento

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 2
FECHA	27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 20 del 20/06/2024 al 27/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:EI OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS		
INTEGRANTES:	ELIZABETH TORO CHALA		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3157 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,402,474.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,402,474.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,402,474	$ 201,402,474		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,402,474	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,402,474	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 60,413,073	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 60,413,073	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34,774,073	17.27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 34,774,073	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ -	✔ #¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	✔ #¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		✔ #¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	2			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.14			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	178			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO — DISPONIBLE
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna .
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud. 24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N -031-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucía Ibtiva Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Olivos

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

corte y figuracion de acero

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

acopio de materiales

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



corte y figuracion de acero



corte y figuracion de acero



acopio de material

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 20 del 20/06/2024 al 27/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO
INTEGRANTES: YONIER DEMETRIO TUQUERRES ERASO
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 3122 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199,318,829.00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199,318,829.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES: MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S
CONTRATO No.: 5095 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,318,829	$ 199,318,829		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,318,829	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,318,829	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 32,173,811	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 32,173,811	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 32,173,811	16.14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 32,173,811	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI — NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI X — NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (A)	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada — Avance Físico			Total	%
* LIMPEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.2			Prog				
					Ejec				
* PLACA HUELLA (M)	M	183			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Requerido
		-
		-
		-
		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: SAN PABLO NARIÑO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico pqrdsnariñosolucionescomunes10@gmail.com con el fin de verificar las solicitudes radicadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.

Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm., en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.

24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N-031-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucia Jiliva Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Olivos.

25 de junio 2024, la profesional social realiza visita de seguimiento, haciendo un recorrido comunitario, con el fin de indagar diferentes aspectos relacionados al componente social, que se hayan desencadenado a partir de la ejecución de la obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se finaizo con las actividades de fundición de pavimento rígido en carril derecho


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundicion de pavimento

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	ACUMULADO PROYECTO TOTAL
LIMPEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



carril derecho terminado la fundicion



toma de densidades por parte de interventoria



carril derecho terminado la fundicion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-84107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 20 del 20/06/2024 al 27/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la VÍA TERCIARIA UBICADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ			INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	ROBINSON VALDES MARTINEZ			INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3153 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 202.406.606,00	CONTRATO No.	5085 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33.558.477,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 202.406.606,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33.558.477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/062024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 202,406,606	$ 202,406,606		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202,406,606	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 202,406,606	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 29,805,450	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 29,805,450	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29,805,450	14.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 29,805,450	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
* LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
* ROCERIA (Ha)	Ha	0.34			Prog				
					Ejec				
* PLACA HUELLA (M)	M	170			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

	DISPONIBLE		
ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N-031-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucia Ibtiva Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, con radicado de entrada 2024-409-030242-2 del 20 de junio del 2024.
25 de junio 2024, la profesional social realiza visita de seguimiento, haciendo un recorrido comunitario, con el fin de indagar diferentes aspectos relacionados al componente social, que se hayan desencadenado a partir de la ejecución de la obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

corte y figuracion de acero,toma de densidades por parte de interventoria


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

armado y figuracion de acero

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



corte y figuracion de acero



corte y figuracion de acero



toma de densidades por parte de interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 20 del 20/06/2024 al 27/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE		
INTEGRANTES:	RAUL URBANO LUNA		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3121 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,048,634.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,048,634.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,048,634	$ 200,048,634		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,048,634	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,048,634	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 41,417,868	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41,417,868	20.70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 41,417,868	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI — NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI — NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	$ 41,417,868.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % — Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
1 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
2 ROCERIA (Ha)	Ha	0.22			Prog				
					Ejec				
3 PAVIMENTO R(M)	M	145			Prog				
					Ejec				
4 ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LEVANTAMIENTO	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarios@consorciomaso10.gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Se realizo visita de seguimiento del buzón de PQRS el 21de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, temposo se encontró ninguna solicitud.
24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N.-031-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucia Ativa Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario del Sauce.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


formaleteo de bordillo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundicion de bordillo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		
ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



formaleteo de bordillo



formaleteo de bordillo



instalacion de valla informativa

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

4.2 Maquinaria y equipo convenio de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	53

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 3119 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO MASO 10

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
herramienta menor			el peligro	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
motoniveladora	caterpilar / 1988		el peligro																				A	A	A		A	A		A	A	A	
vibro-compactador			el peligro																				A	A	A		A	A		A	A	A	
mezcladora			el peligro																														
vibrador de aguja de concreto			el peligro																														
volqueta			el peligro																		A		A				A	A					
retrocargador			el peligro																														
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	2	1	4	3	3		4	4	1	3	3	3	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	45	75.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: ALVARO MAYA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5220274760NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA 53

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO — PROYECTO: ALIANZA ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No.: 3069 DE 2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 — INTERVENTORÍA: CONSORCIO MASO 10

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
herramienta menor			LLANO GRANDE	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
mezcladora			LLANO GRANDE																								A	A	A	A	A	A	
vibrador de aguja de concreto			LLANO GRANDE																								A	A	A	A	A	A	
volqueta			LLANO GRANDE																A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
retrocargador			LLANO GRANDE																														
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		2	2	2	2	2	2		4	4	4	4	4	4	
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	49	81.67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactivo" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: ALVARO MAYA
Residente de Obra	Residente de Interventoría 522027479 DE NARIÑO
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	53

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3122 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 — **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO MASO 10

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Herramienta menor			QUIROZ ALTO	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
mezcladora			QUIROZ ALTO																	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
vibrador de aguja de concreto			QUIROZ ALTO																	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
volqueta			QUIROZ ALTO											A	A	A	A	A		A													
vibrocompactador			QUIROZ ALTO																														
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						1	1	1	1	1	1		1	2	2	2	2	2		4	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	1
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	56	93.33%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:


LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentren EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: ALVARO MAYA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 522027478DNÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

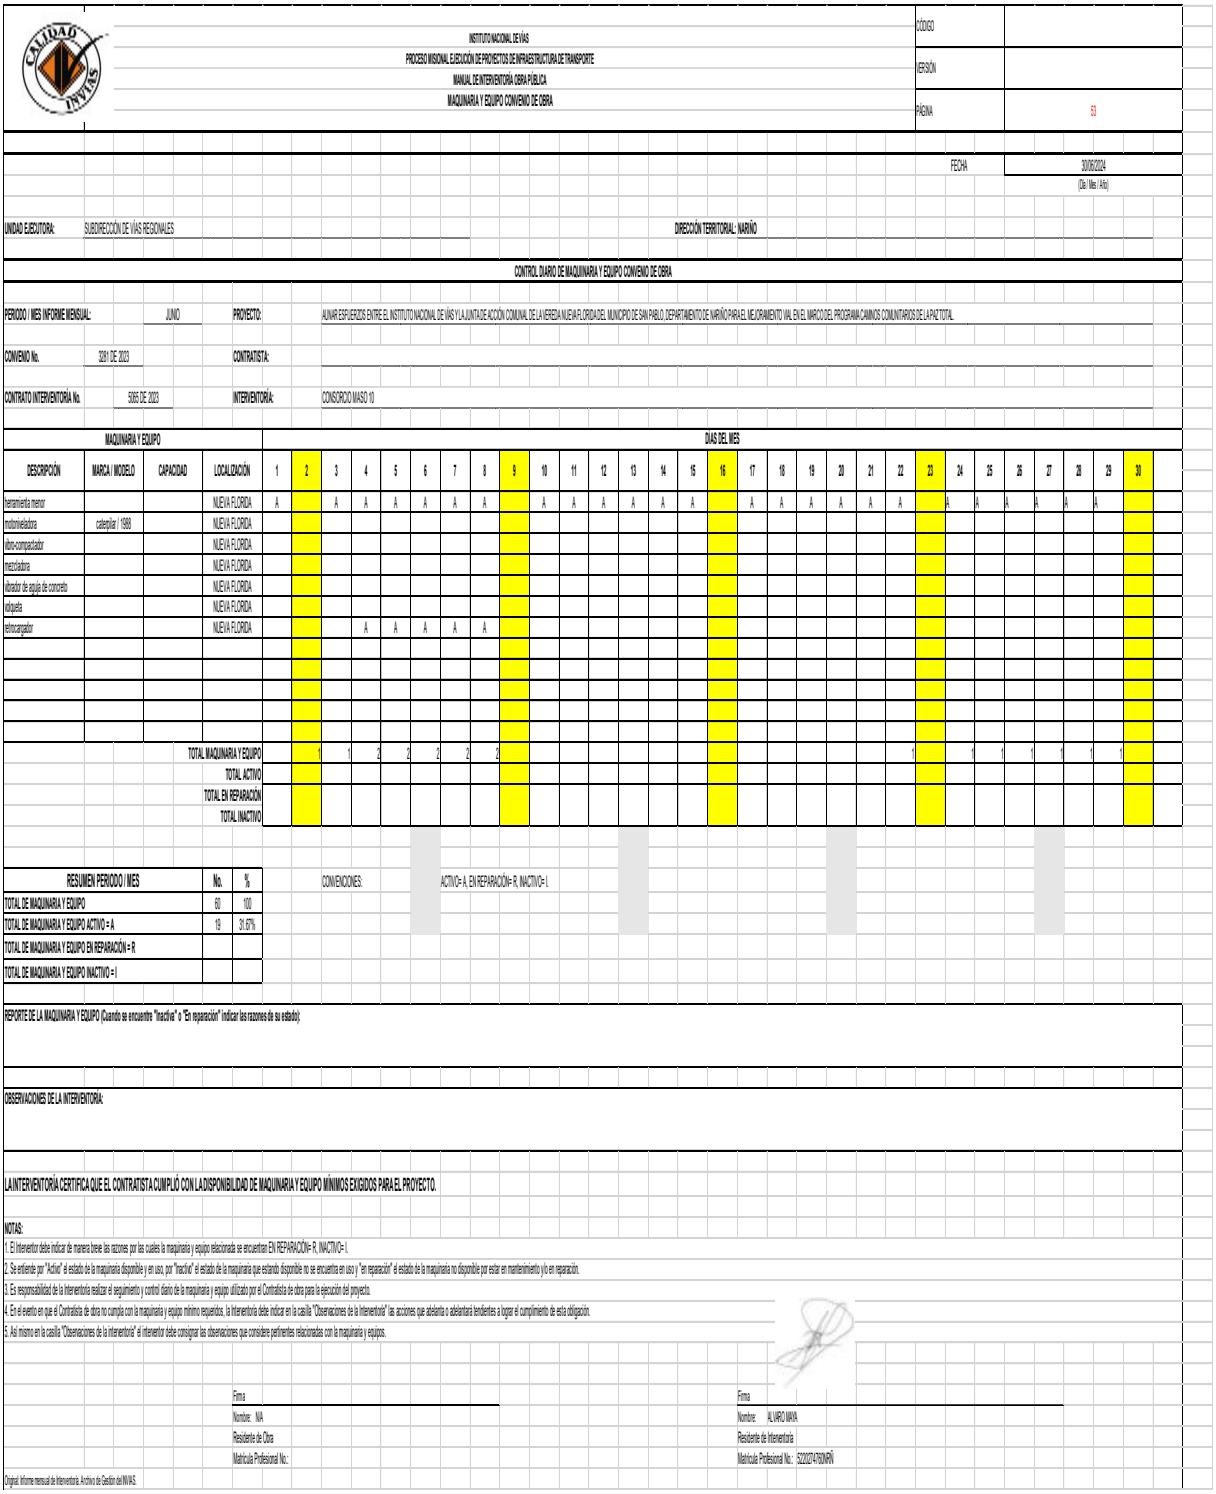

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

CÓDIGO
VERSIÓN
PAGINA 53

FECHA 30/06/2024
(Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO — PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3391 DE 2023 — CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3365 DE 2023 — INTERVENTORÍA: CONSORCIO MASO 10

MAQUINARIA Y EQUIPO				DIAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
herramienta menor			NUEVA FLORIDA	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
motoniveladora	caterpillar / 1988		NUEVA FLORIDA																														
rodo-compactador			NUEVA FLORIDA																														
mezcladora			NUEVA FLORIDA																														
vibrador de agujja de concreto			NUEVA FLORIDA																														
volqueta			NUEVA FLORIDA																														
retrocargador			NUEVA FLORIDA				A	A	A	A	A																						
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	1	1	1	2	2	2	2	2														1		1	1	1	1	1	1	
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	19	31,67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

COMENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactiva" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoria realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: N/A
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ALVARO MAYA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 522027-167DRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	53

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO — PROYECTO: ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No.: 3157 DE 2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 — INTERVENTORÍA: CONSORCIO MASO 10

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
herramienta menor			OLIVOS	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
motoniveladora	caterpilar / 1998		OLIVOS												A	A	A	A		A												
retro-compactador			OLIVOS												A	A	A	A		A												
mezcladora			OLIVOS																													
vibrador de aguja de concreto			OLIVOS																													
volqueta			OLIVOS						A	A	A		A	A	A	A																
retrocargador			OLIVOS																													
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1		1	1	1	2	2	2		2	2	4	4	3	3		3	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
TOTAL ACTIVO																																
TOTAL EN REPARACIÓN																																
TOTAL INACTIVO																																

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	39	65.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la Interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: N/A
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ALVARO MAYA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 522027-47ONRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	53

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3153 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5065-DE 2023 — **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO MASO 10

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
herramienta menor			QUIROZ BAJO	A	A	A	A																		A	A							
motoniveladora	caterpilar / 1988		QUIROZ BAJO		A	A																			A	A							
vibro-compactador			QUIROZ BAJO		A	A																			A	A							
mezcladora			QUIROZ BAJO																													
vibrador de aguja de concreto			QUIROZ BAJO																													
volqueta			QUIROZ BAJO		A	A																			A	A							
retrocargador			QUIROZ BAJO																													
		TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1	4	4	1																		4	4							
		TOTAL ACTIVO																															
		TOTAL EN REPARACIÓN																															
		TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	18	30.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactiva" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: ALVARO MAYA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 522027476NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del IVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA 53

FECHA 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 3121 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO MASO 10

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
herramienta menor			SAUCE	A		A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
mezcladora			SAUCE						A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
vibrador de aguja de concreto			SAUCE						A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
volqueta			SAUCE													A	A	A		A										A	A	A	
retrocargador			SAUCE																														
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1		1	1		3	3	3		3	3	3	4	4	4		4	3		3	3	3		3	3	3	3	3	3	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	67	111.67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.


NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma	Firma
Nombre:	Nombre: ALVARO MAYI NA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 522027476DNRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra: El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

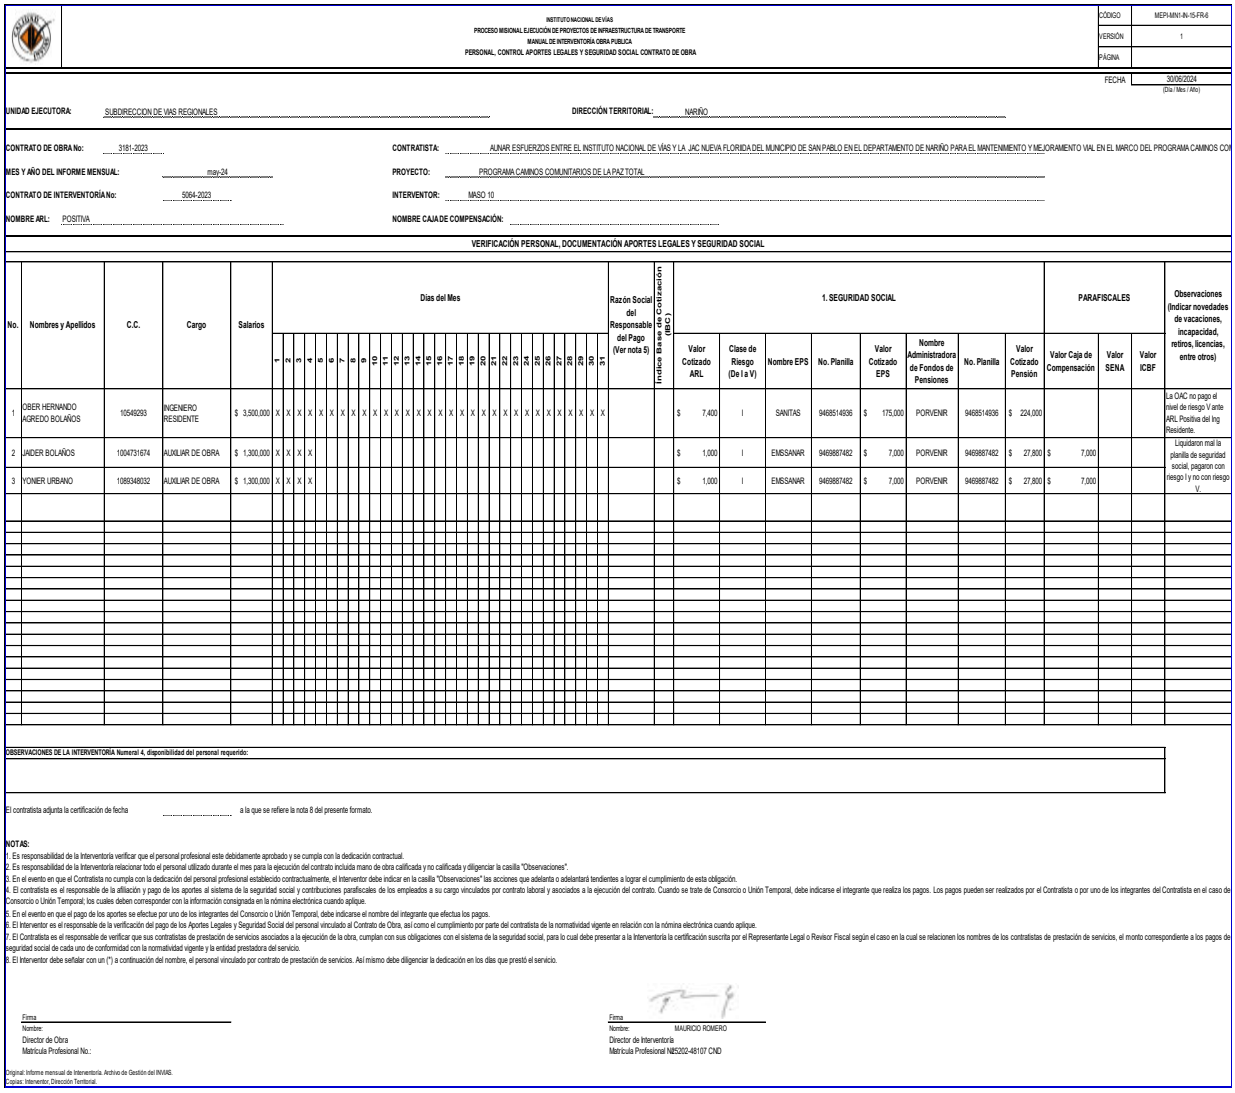

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN: 1
PÁGINA:
FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3181-2023 — CONTRATISTA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS CO
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 — PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5064-2023 — INTERVENTOR: MASO 10
NOMBRE ARL: POSITIVA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	OBER HERNANDO AGREDO BOLAÑOS	10549293	INGENIERO RESIDENTE	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 7,400	I	SANITAS	9468514936	$ 175,000	PORVENIR	9468514936	$ 224,000				La OAC no pago el nivel de riesgo V ante ARL Positiva del Ing Residente.
2	JAIDER BOLAÑOS	1004731674	AUXILIAR DE OBRA	$ 1,300,000	X X X X			$ 1,000	I	EMSSANAR	9469887482	$ 7,000	PORVENIR	9469887482	$ 27,800	$ 7,000			Liquidaron mal la planilla de seguridad social, pagaron con riesgo I y no con riesgo V.
3	YONIER URBANO	1089348032	AUXILIAR DE OBRA	$ 1,300,000	X X X X			$ 1,000	I	EMSSANAR	9469887482	$ 7,000	PORVENIR	9469887482	$ 27,800	$ 7,000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N#5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	M-EP-MINT-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3157-2023 **CONTRATISTA:** ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS D

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5064-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARMEN EMILIA SOLARTE	59788832	INGENIERA RESIDENTE	$ 3,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 6,800	I	NUEVA EPS	59788832	$ 162,500	PORVENIR	59788832	$ 208,000				La OAC no pago el nivel de riesgo V ante ARL Positiva del Ing Residente.
2	LEONEL ANTONIO BENAVIDES	87026655	AUXILIAR DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					$ 33,200	V	MALLAMAS	9468845637	$ 59,600	PORVENIR	9468845637	$ 76,300	$ 19,100			
3	ANDRES FELIPE ORTEGA TUQUERRES	1089487405	AUXILIAR DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					$ 33,200	V	EMSANAR	9468845637	$ 59,600	COLPENSIONES	9468845637	$ 76,300	$ 19,100			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 6 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N@5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPAIMN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3153-2023 **CONTRATISTA:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS C

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5064-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ORLANDO ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ	1081992267	ING RESIDENTE	$ 3,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						$ 22,500	V	ASMET SALUD	30209364	$ 162,500	PORVENIR	30209364	$ 208,000				
2	YORDAN ESTIVEN ERASO ORTEGA	1089478795	AUXLIAR DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X																														$ 1,000	I	NUEVA EPS	9468925727	$ 7,000	PORVENIR	9468925727	$ 27,800	$ 7,000			Liquidaron mal la planilla de seguridad social, pagaron con riesgo I y no con riesgo V.
3	ESNEIDER SANTIAGO MARTINEZ	1004255408	AUXLIAR DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X																														$ 1,000	I	ASMET SALUD	9468925727	$ 7,000	PORVENIR	9468925727	$ 27,800	$ 7,000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N85202-48107 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MINT-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3122-2023 **CONTRATISTA:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNIT

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5064-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

NOMBRE ARL: POSITIVA - SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JEFERSON ESTIBEN CARDENAS ERAZO	1094950740	ING RESIDENTE	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 6,800	V	NUEVA EPS	9468457051	$ 162,500	PORVENIR	9468457051	$ 208,000				La OAC no pago el nivel de riesgo V ante ARL Positiva del Ing Residente.
2	FABIO ANDRES SOLARTE DOMINGUEZ	1089480155	AUXILIAR DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 87,500	V	EMSSANAR	9469815650	$ 157,100	PORVENIR	9469815650	$ 201,000	$ 50,300	$ 63,000		
3	ALBER ANDRES TUQUERRES ERASO	1089483126	AUXILIAR DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 87,500	V	MALLAMAS	9469815650	$ 157,100	PORVENIR	9469815650	$ 201,000	$ 50,300	$ 63,000		
4	ARLEY FAVIAN MUÑOZ ERAZO	13075571	AUXILIAR DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							$ 72,400	V	EMSSANAR	1064586830	$ 41,600	PORVENIR	1064586830	$ 140,000	$ 41,600			
5	JOSE ALVARO SOLARTE VELASCO	15812366	MAESTRO DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							$ 72,400	V		1064586830	$ 41,600	PORVENIR	1064586830	$ 140,000	$ 41,600			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los dias que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional NBS202-46107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MEPMIN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3089-2023 — CONTRATISTA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 — PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5084-2023 — INTERVENTOR: MASO 10

NOMBRE ARL: POSITIVA - SURA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JUAN GUILLERMO MARTINEZ ERAZO	1089480405	ING RESIDENTE	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 34.600	V	SOS EPS	29890671	$ 176.800	PORVENIR	29890671	$ 226.300				
2	LUIS HUMBERTO CARVAJAL	12996523	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 90.500	V	ASMET SALUD	9468435553	$ 52.000	PORVENIR	9468435553	$ 208.000	$ 52.000			
3	LUIS OJEDA	15817113	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 90.500	V	ASMET SALUD	9468435553	$ 52.000	PORVENIR	9468435553	$ 208.000	$ 52.000			
4	KEVIN ANDRES REALPE	1004675102	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								$ 72.400	V	NUEVA EPS	1094586876	$ 41.600	PORVENIR	1094586876	$ 166.400	$ 41.600			
5	JESUS ALVEIRO ORDOÑEZ	15812221	MAESTRO DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								$ 72.400	V	ASMET SALUD	1094586876	$ 41.600	PORVENIR	1094586876	$ 166.400	$ 41.600			
6																																																	
7																																																		
8																																																		
9																																																		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma _____
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma _____
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N85202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MINT-IN-15-FR-6
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3119-2023 **CONTRATISTA:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5064-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

NOMBRE ARL: POSITIVA - SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDGAR ALVEIRO AROCA	15816461	ING RESIDENTE	$ 3,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 81,500	V	SANITAS	9470109983	$ 162,500	COLPENCIONES	28891159	$ 208,000				
2	SEGUNDO MACARIO	15811494	AUXILIAR DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 90,500	V	NUEVA EPS	9569856830	$ 162,500	PORVENIR	9569856830	$ 208,000	$ 52,000			
3	CARLOS MAURICIO LOPEZ	1089485200	AUXILIAR DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 90,500	V	SANITAS	9569856830	$ 162,500	PORVENIR	9569856830	$ 208,000	$ 52,000			
4	VICTOR JESUS DAVILA	4948861	MAESTRO DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									$ 69,400	V	SANITAS	1064527949	$ 39,100	PORVENIR	1064527949	$ 158,500	$ 39,900			
5	HECTOR VALENCIA LUNA	15814401	AUXILIAR DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						$ 33,200	V	NUEVA EPS	1064527949	$ 19,100	PORVENIR	1064527949	$ 76,300	$ 19,100			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MINT-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3121-2023 **CONTRATISTA:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS CO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5064-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN** COMFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LIZETH DIAZ URBANO	1032497441	INGENIERA RESIDENTE	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 52,000	V	NUEVA EPS	9498826396	$ 93,300	COLPENSIONES	9498826396	$ 119,400				
2	NELSON URRETY	15812457	AUXILIAR DE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X			$ 96,600	V	EMSSANAR	9488259168	$ 86,700	PORVENIR	9488259168	$ 222,000	$ 55,600	$ 27,800	$ 27,800	
3	JESÚS EVER VALDES	15813917	AUXILIAR DE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X			$ 96,600	V	NUEVA EPS	9488259168	$ 86,700	PORVENIR	9488259168	$ 222,000	$ 55,600	$ 27,800	$ 27,800	
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra:el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	67

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3119 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAEL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: N/A
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	67

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3089 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDALLANOGRANDE

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CLAUDIALLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizad	Valor Total	Saldo Anticipo	No. de Registro y	Saldo Registro	Saldo del Contrato	No. y Fecha de	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	67

		FECHA	30/06/2024
			(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3122 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIODE LA UNION

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizad	Valor Total	Saldo Anticipo	No. de Registro y	Saldo Registro	Saldo del Contrato	No. y Fecha de	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	67

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3281 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DESAN PABLO . DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizad	Valor Total	Saldo Anticipo	No. de Registro y	Saldo Registro	Saldo del Contrato	No. y Fecha de	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	67

		FECHA	30/06/2024
			(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3157 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CLAUDIA

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizad	Valor Total	Saldo Anticipo	No. de Registro y	Saldo Registro	Saldo del Contrato	No. y Fecha de	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	67

FECHA: 30/06/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3153 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAQUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizad	Valor Total	Saldo Anticipo	No. de Registro y	Saldo Registro	Saldo del Contrato	No. y Fecha de	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	67

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3614 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCEDEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3121 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizad	Valor Total	Saldo Anticipo	No. de Registro y	Saldo Registro	Saldo del Contrato	No. y Fecha de	Indicar pago según		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 Estado General del Tiempo. MEPI-MN1-IN-15-FR-10

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3089 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X					X	X								X		X	X	X	X					X	X					
Lluvias moderadas			X	X	X	X			X	X	X				X		X					X	X		X			X				
Lluvias intensas												X	X	X										X						X	X	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: N/A
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ALVARO MAYA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220274760NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	65

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 319-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO — **PROYECTO:** ALIANZA ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X					X	X								X		X	X	X	X					X	X					
Lluvias moderadas			X	X	X	X			X	X	X				X		X					X	X		X			X				
Lluvias intensas												X	X	X										X					X	X		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: ALVARO MAYA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 522027-47DNRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor. Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	65

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3122 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO — **PROYECTO:** AUNA ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X					X	X								X		X	X	X	X					X	X					
Lluvias moderadas			X	X	X	X			X	X	X				X		X					X	X		X			X				
Lluvias intensas												X	X	X										X					X	X		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: N/A
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ALVARO MAYA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 522027476NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	65

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3281 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNA ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X					X	X								X		X	X	X	X					X	X					
Lluvias moderadas			X	X	X	X			X	X	X				X		X					X	X		X			X				
Lluvias intensas												X	X	X										X					X	X		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: ALVARO MAYA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 522027476NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	65

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3157 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X					X	X								X		X	X	X	X					X	X					
Lluvias moderadas			X	X	X	X			X	X	X				X		X					X	X		X			X				
Lluvias intensas												X	X	X										X					X	X		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma	Firma
Nombre: NA	Nombre: ALVARO MAYA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5220274780NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del MVAS.

Copias: Interventor. Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	65

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3153 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** ALIANZA ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X					X	X								X		X	X	X	X					X	X					
Lluvias moderadas			X	X	X	X			X	X	X				X		X					X	X		X			X				
Lluvias intensas												X	X	X										X					X	X		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma	Firma
Nombre: NA	Nombre: ALVARO MAYA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 522027478 DNRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	65

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3121 DE 2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO — PROYECTO: ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X					X	X								X		X	X	X	X					X	X					
Lluvias moderadas			X	X	X	X			X	X	X				X		X					X	X		X			X				
Lluvias intensas												X	X	X										X					X	X		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: ALVARO MAYA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 522027478DNRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio: MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No.: 3281-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA NUEVA FLORIDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	22/06/2024	densidades	INV E – 164 – 13	k0+050	2		70	no	
2		topografia		todo el tramo					

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No.: 3089-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LLANO GRANDE

MES Y AÑO DEL INFORME MI jun-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTO 5065-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	cripción/Ens	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	o. De Muestr	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1		densidad	INV E – 161 – 13	SUBBASE	2				no entregan el resultado la
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	22/06/2024	densidades	INV E – 164 – 13	k0+045	2	>90	95	si	
2		topografia		todo el tramo					

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de

Firma	Firma
Nombre:	Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No.: 3122-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA QUIROZ A

MES Y AÑO DEL INFORME MI jun-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTO 5065-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	cripción/Ens	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	o. De Muestr	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
3	17/06/2024	DISEÑO DE MEZCLA						SI	
4	17/01/1900	DENSIDADES	V E – 164 – 1	K0+058	2		96		
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	22/06/2024	densidades	INV E – 164 -	k0+045	2	>90	94	si	
2		topografia		todo el tramo					

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la

Firma	Firma
Nombre:	Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 15202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No.: 3119-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PELIGRO

MES Y AÑO DEL INFORME MI jun-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTO 5065-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	crípción/Ens	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	o. De Muestr	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
3	6/06/2024	DISEÑO DE MEZCLA						SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	22/06/2024	densidades	INV E – 164 -	k0+045	2	>90	96	si	
2		topografia		todo el tramo					

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de

Firma	Firma
Nombre:	Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No.: 3157-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA OLIVOS

MES Y AÑO DEL INFORME MI jun-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTO 5065-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Dia/Mes/Año)	cripción/Ens	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	o. De Muestra	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
3	21/06/2024	DISEÑO DE MEZCLA						SI	
4	17/06/2024	densidades	IV E – 164 – 1	K0+055	3	>90	95	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	22/06/2024	densidades	INV E – 164 –	k0+045	2	>90	94	si	
2		topografia		todo el tramo					

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la

Firma	Firma
Nombre:	Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No.: 3153-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA QUIROZ B

MES Y AÑO DEL INFORME MI jun-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTO 5065-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

97

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Dia/Mes/Año)	cripción/Ens	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	o. De Muestr	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	17/06/2024	densidad	INV E – 161 – 13	SUBBASE	2		96	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	22/06/2024	densidades	INV E – 164 – 13	k0+045	2	>90	97	si	
2		topografia		todo el tramo					

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma

Firma	Firma
Nombre:	Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No.: 3121-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAUCE

MES Y AÑO DEL INFORME MI jun-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTO 5065-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	cripción/Ens	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	o. De Muestr	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	3/06/2024	densidad	INV E – 161 – 13	SUBBASE	2		96	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	22/06/2024	densidades	INV E – 164 – 13	k0+045	2	>90	95	si	
2		topografia		todo el tramo					

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma

Firma	Firma
Nombre:	Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra: Se adjunta diligenciado para los convenios el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 6 (Mes) | 24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3119-2023 **CONTRATISTA:** JAC EL PELIGRO

OBJETO DEL CONTRATO:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200,741,050
VALOR ACUMULADO: $ 200,741,050.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40,148,210.00	29	4	24	1/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,037,052.00	29	4	24	30	6	27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,222,315.00	30	7	24	30	7	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100280842
Certificado de modificación o anexo No.: -
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% SOBRE EL VALOR DD CLA PERDIDA	MIN 2SMMLV	1	9	23	30	6	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100068309 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3089-2023 **CONTRATISTA:** JAC LLANO GRANDE

OBJETO DEL CONTRATO:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 201,005,912
VALOR ACUMULADO: $ 201,005,912.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 40,201,182,400.0	29	4	24	1/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,050,295,600.00	29	4	24	30	6	27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,301,773,600.00	30	7	24	30	7	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100282344
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% SOBRE EL VALOR DD ELA PERDIDA	MIN 2SMMLV	1	9	23	30	6	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100078731 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3121-2023 **CONTRATISTA:** JAC EL SAUCE

OBJETO DEL CONTRATO:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200,048,634
VALOR ACUMULADO: $ 200,048,634.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			29	4	24	1/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			29	4	24	30	6	27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			30	7	24	30	7	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100068309
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% SOBRE EL VALOR DD ELA PERDIDA	MIN 2SMMLV	8	9	23	30	6	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3122-2023 **CONTRATISTA:** JAC QUIROZ ALTO

OBJETO DEL CONTRATO:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 199,318,829
VALOR ACUMULADO: $ 199,318,829.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39,863,765,800.00	29	4	24	1/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9,965,941,450.00	29	4	24	30	6	27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59,795,648,700.00	30	7	24	30	7	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100280830
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% SOBRE EL VALOR DD ELA PERDIDA	MIN 2SMMLV	6	9	23	30	6	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100068303 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
ESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3153 **CONTRATISTA:** JAC QUIROZ BAJO

OBJETO DEL CONTRATO:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 202,406,606
VALOR ACUMULADO: $ 202,406,606.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40,481,321,200.00	29	4	24	1/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,120,330,300.00	29	4	24	30	6	27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,721,988,000.00	30	7	24	30	7	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100281097
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% SOBRE EL VALOR DD ELA PERDIDA	MIN 2SMMLV	6	9	23	30	6	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100068374 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3281 **CONTRATISTA:** JAC NUEVA FLORIDA

OBJETO DEL CONTRATO:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200,698,283
VALOR ACUMULADO: $ 200,698,283.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			29	4	24	1/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			29	4	24	30	6	27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			30	7	24	30	7	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100068309
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% SOBRE EL VALOR DD ELA PERDIDA	MIN 2SMMLV	6	9	23	30	6	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra: no Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14. Para ninguno de los convenios

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	78-79

FECHA 30/06/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No. 3119 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PELIGRO

FECHA DE INICIO: 20/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4.2 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ N _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma Nombre: N/A Director de la Obra Matrícula Profesional No.:	Firma Nombre: N/A Profesional en Calidad Contrato de Obra Matrícula Profesional No.:	Firma Nombre: MAURICIO ROMERO Q Director de la Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND	Firma N/A Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	78-79

FECHA: 30/06/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No. 3089 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATIS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

FECHA DE INICIO: 20/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4.2 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI ____ N ____ PROBADO: SI ____ N ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTA SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍ SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO SI ____ N ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL I SI ____ ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contr** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrat **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contr** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

ítulo Indicador de Gestió lor del IG m	**Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)**
IG1: Índice de gestión 1 =	
IG2: Índice de gestión 2 =	
IG3: Índice de gestión 3 =	
IG4: Índice de gestión 4 =	
IG5: Índice de gestión 5 =	
IGn: Índice de gestión n =	

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento o Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma N/A
Nombre: N/A	Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202-48107 C	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	78-79

FECHA: 30/06/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No. 3122 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATIS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ

FECHA DE INICIO: 20/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4.2 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI ____ N ____ PROBADO: SI ____ N ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTA SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍ S ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO SI ____ N ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL S ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contr** ____
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrat **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contr** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

ítulo Indicador de Gestió	**lor del IG m**	**Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)**
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma N/A
Nombre: N/A	Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202-48107 C	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	78-79

30/06/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No. 3281 DE 2023
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATIS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA

FECHA DE INICIO: 20/12/2023 **PLAZO INICIAL:** 4.2 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/07/2024
(Indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI ____ N PROBADO: SI ____ N ____ VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTA SI: N No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍ S N

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO SI ____ N APROBADO: SI ____ NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL S ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:**

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato**

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contr**

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrat **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contr**

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

itulo Indicador de Gestió	**lor del IG m**	**Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)**
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma N/A
Nombre: N/A	Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202-48107 C	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	78-79

FECHA 30/06/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No. 3157 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATIS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS

FECHA DE INICIO: 20/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4.2 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 6065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI ____ N ____ APROBADO: SI ____ N ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTA SI: ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍ SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO SI ____ N ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL SI: ____ ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contr** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrat **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contr** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

itulo Indicador de Gestió/lor del IG m	**Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)**
IG1: Índice de gestión 1 =	
IG2: Índice de gestión 2 =	
IG3: Índice de gestión 3 =	
IG4: Índice de gestión 4 =	
IG5: Índice de gestión 5 =	
IGn: Índice de gestión n =	

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento o Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma N/A
Nombre: N/A	Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202-48107 C	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	78-79

FECHA: 30/06/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No. 3153 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATIS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE

FECHA DE INICIO: 20/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4.2 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI ____ N ____ APROBADO: SI ____ N ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTA SI ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍ S ____ N ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO SI ____ N ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL S ____ ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato**

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contr**

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrat **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contr**

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

itulo Indicador de Gestió	lor del IG m	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma N/A
Nombre: N/A	Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202-48107 C	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No. 3121-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATIS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE

FECHA DE INICIO: 20/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4.2 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI ____ N ____ PROBADO: SI ____ N ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTA SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍ S ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO SI ____ N ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL S ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contr** ____
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrat **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contr** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

itulo Indicador de Gestió	**lor del IG m**	**Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)**
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma N/A
Nombre: N/A	Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202-48107 C	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. .....
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO DE OBRA No. 3119-2023 3089-2023 3122-2023 3281-2023 3157-2023 3153-2023 3121-2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDAEL PELIGRO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OLIVOS UNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SAUCE UNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA QUIROZ ALTO J UNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA QUIROZ BAJO UNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVA FLORIDA

OBJETO DEL CONVENIO:

1. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

2. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO EL LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

3.AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

4.AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

5.AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

6.AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

7. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	63

FECHA 30/06/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. .....
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3119 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10
(Indicar número y año)

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: _____
Nombre: LILIANA VALENCIA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma: _____
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma: _____
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	63

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3089 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRN

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRNADE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTOR 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el

Firma:
Nombre: ONEY VALDEZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Contratista

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	63

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3122 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTOR 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el

Firma:	Firma:
Nombre: YONIER TUQUERREZ	Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado	Representante Legal o su Apoderado
Contratista	Interventor
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	63

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3281 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLO

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DESAN PABLO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTOR 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el

Firma: Wilder Forney Ramos
Nombre: WILDER RAMOS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Contratista

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	63

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3157 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTOR 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el

Firma:
Nombre: ELIZABETH TORO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	63

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3153 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTOR 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el

Firma:
Nombre: ROBINSON VALDEZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA 63

FECHA 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3121 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTOR 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como,
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el


Firma:
Nombre: RAUL URBANO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual.

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo: No Aplica el formato MEPI-MN-IN-2-FR-2

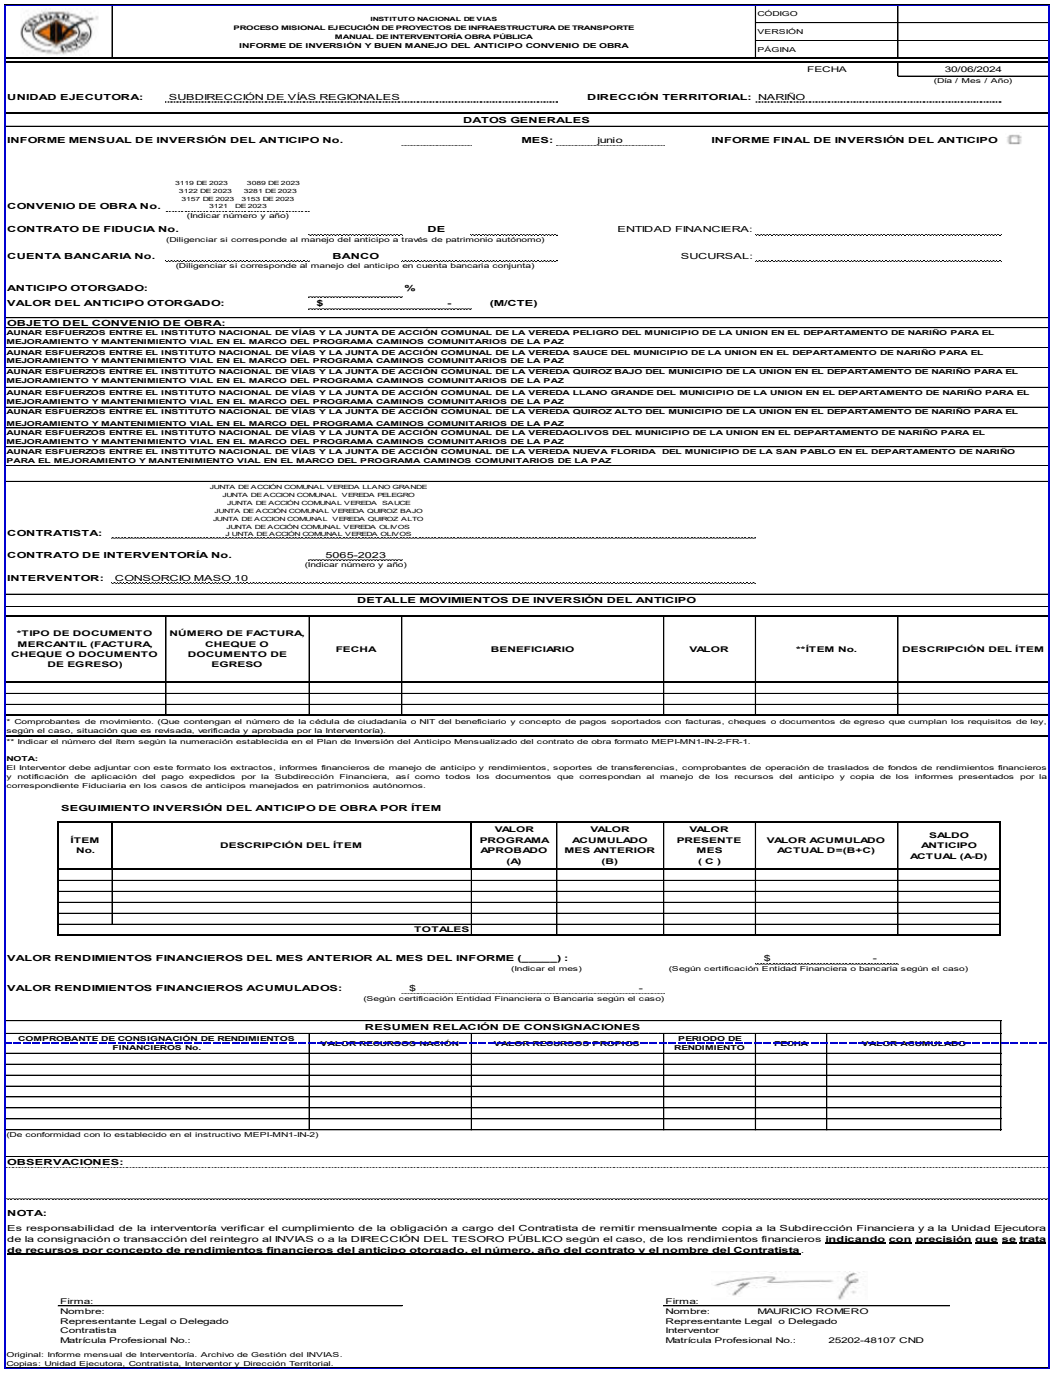

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONVENIO DE OBRA

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. ____ MES: junio — INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐

CONVENIO DE OBRA No. 3119 DE 2023 3089 DE 2023 3122 DE 2023 3281 DE 2023 3157 DE 2023 3153 DE 2023 3121 DE 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. ____ DE ____ ENTIDAD FINANCIERA: ____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. ____ BANCO ____ SUCURSAL: ____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: ____ %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ - (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAOLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE LA SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PELEGRO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAUCE; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUIROZ BAJO; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA QUIROZ ALTO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OLIVOS; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA OLIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.

Firma: ____
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matricula Profesional No.:

Firma: ____
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matricula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. ..... **MES:** junio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3119 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: ..... **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 200,741,050.00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAEL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: _____
Nombre: LILIANA VALENCIA
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma: _____
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma: _____
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** junio **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3089 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 201,005,912.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma:
Nombre: ONEY VALDEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** junio **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3122 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 199,318,829.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligacion a cargo del Organismo de Accion Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma:
Nombre: YONIER TUQUERRES
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** junio **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3281 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200,698,283.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligacion a cargo del Organismo de Accion Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma: Wilder Forney Ramos
Nombre: WILDER RAMOS
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** junio **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3157 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 201,402,474.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma:
Nombre: ELIZABETH TORO
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** junio **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3153 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 202,406,606.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligacion a cargo del Organismo de Accion Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma:
Nombre: ROBINSON MARTINEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** junio **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3121 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200,048,634.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma:
Nombre: RAUL LUNA
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.2 Programa de Inversiones o Reprogramación al Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-1. Seguimiento Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-2. No Aplica el formato para los convenios

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENIO No: 3119 DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAEL PELIGRO DEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 ,ESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: ____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 200,741,050.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 200,741,050.00

PLAZO ACUMULADO: 5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: ____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	%Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
GPP1				% P / $ P / $ E / % E										
GPP2				% P / $ P / $ E / % E										
GPP3				% P / $ P / $ E / % E										
GPP4				% P / $ P / $ E / % E										
GPP5				% P / $ P / $ E / % E										
GPP6				% P / $ P / $ E / % E										
GPP7				% P / $ P / $ E / % E										
GPP8				% P / $ P / $ E / % E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P / $ P / $ E / % E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ -		
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LILIANA VALENCIA
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC EL PELIGRO

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ

Revisó Firma:
Nombre:
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 87

FECHA 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENI 3089 DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 ESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRA: 14/12/2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO AC: 30/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 201,005,912.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (Incluido IV $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 201,005,912.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BASICO DE OBRA (A)														
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

% (top) … 0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO PROVISIONES Y OTROS	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba	Aprueba	Revisó	Aprueba
Firma:	Firma:	Firma:	Firma
Nombre: ONEY VALDEZ	Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA	Nombre:	Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor	Titular Gerencia:	Jefe de Unidad Ejecutora
REPRESENTANTE LEGAL JAC LLANO GRANDE	Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Revisó	Revisó	Revisó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA	Nombre:	Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría	Director Territorial	Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 87

FECHA 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENIO No: 3122 DE 2023

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTODEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 085 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 ESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRA ######## (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 30/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 199,318,829.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (Incluido IVA $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B** $ 199,318,829.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL VALOR OBRA EJECUTAD	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...	
GPP1				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP4				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP5				% P											
				$ P											%
				$ E											
				% E											
GPP6				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')															

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

VISIONES Y OTROS CONCEPT	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: YONER TUQUERREZ Representante legal o apoderado del Contratista REPRESENTANTE LEGAL JAC QUIROZ ALTO

Aprueba Firma: Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA Representante legal o apoderado del Interventor Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND

Revisó Firma: Nombre: Titular Gerencia: Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma Nombre: Jefe de Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ

Revisó Firma: Nombre: Director Territorial Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 87 | FECHA 30/06/2024

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENI 3281 DE 2023

OBJETO CONVENIO: AÚNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 ESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRA ######## (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 30/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 200,698,283.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B** $ 200,698,283.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTAD	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BASICO DE OBRA (A)														
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO OTROS CONTRATOS (	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba	Aprueba	Revisó	Aprueba
Firma: Wilder Kenney Ramos	Firma:	Firma:	Firma
Nombre: WILDER RAMOS	Nombre: QUIROGA	Nombre:	Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor	Titular Gerencia:	Jefe de Unidad Ejecutora
REPRESENTANTE LEGAL JAC NUEVA FLORIDA	Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Revisó	Revisó	Revisó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA	Nombre:	Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría	Director Territorial	Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	87
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENI 3157 DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 ESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRA 14/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 30/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 201,402,474.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 201,402,474.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / % ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	% Programado $ Valor programado / $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BASICO DE OBRA (A)														
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (														

SUSPENSIÓN No. 1
Reprogramación No.1
100%
0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL	$ -		
VALOR ACUMULADO DE CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:	Aprueba Firma:	Revisó Firma:	Aprueba Firma
Nombre: ELIZABETH TORO	Nombre: JUIROGA	Nombre:	Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor	Titular Gerencia:	Jefe de Unidad Ejecutora
REPRESENTANTE LEGAL JAC OLIVOS	Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:	Revisó Firma:	Revisó Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA	Nombre:	Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría	Director Territorial	Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	87
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENI 3153 DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 ESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRA: 14/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 30/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 202,406,606.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 202,406,606.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BASICO DE OBRA (A)														
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=A+B	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=A+B	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba	Aprueba	Revisó	Aprueba
Firma:	Firma:	Firma:	Firma
Nombre: ROBINSON VALDEZ	Nombre: QUIROGA	Nombre:	Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor	Titular Gerencia:	Jefe de Unidad Ejecutora
REPRESENTANTE LEGAL JAC QUIROZ BAJO	Matrícula Profesional No.25202-48107 CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Revisó	Revisó	Revisó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA	Nombre:	Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría	Director Territorial	Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENI 3121 DE 2023 — PLAZO INICIAL: 4.2 ESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — FECHA DE INICIO DEL CONTRA 14/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 30/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE — FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10 — VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 200,048,634.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ - — VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 200,048,634.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / % ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
GPP1				% P / $ P / $ E / % E										
GPP2				% P / $ P / $ E / % E										
GPP3				% P / $ P / $ E / % E										
GPP4				% P / $ P / $ E / % E										
GPP5				% P / $ P / $ E / % E										
GPP6				% P / $ P / $ E / % E										
GPP7				% P / $ P / $ E / % E										
GPP8				% P / $ P / $ E / % E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P / $ P / $ E / % E										
VALOR BASICO DE OBRA (A)														
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba	Aprueba	Revisó	Aprueba
Firma:	Firma:	Firma:	Firma
Nombre: RAUL LUNA	Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA	Nombre:	Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor	Titular Gerencia:	Jefe de Unidad Ejecutora
REPRESENTANTE LEGAL JAC SAUCE	Matrícula Profesional No..25202-48107 CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Revisó	Revisó	Revisó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA	Nombre:	Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría	Director Territorial	Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	89

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUT SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** **DE** (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No.
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENIO No: 3119 DE 2023


OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONVEN ######## (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 30/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 200,741,050.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B** $ 200,741,050.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAM	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	VALOR OBRA EJECUTADA	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A														

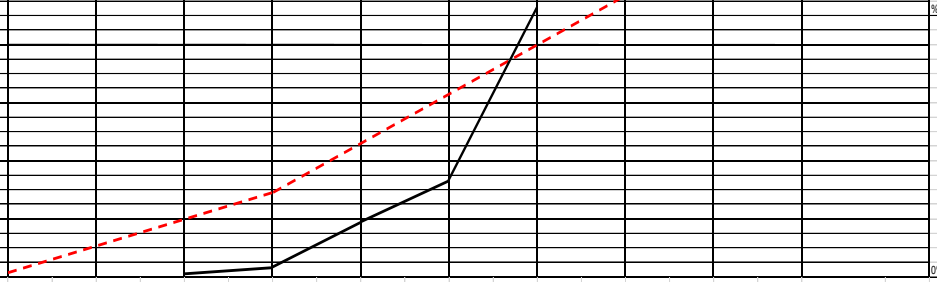

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra pro
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													

0.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realic

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LILIANA VALENCIA
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA EL PELIGRO

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENIO No: 3089 DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNTARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 20/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: ____ (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: ____ (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 201,005,912.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 201,005,912.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

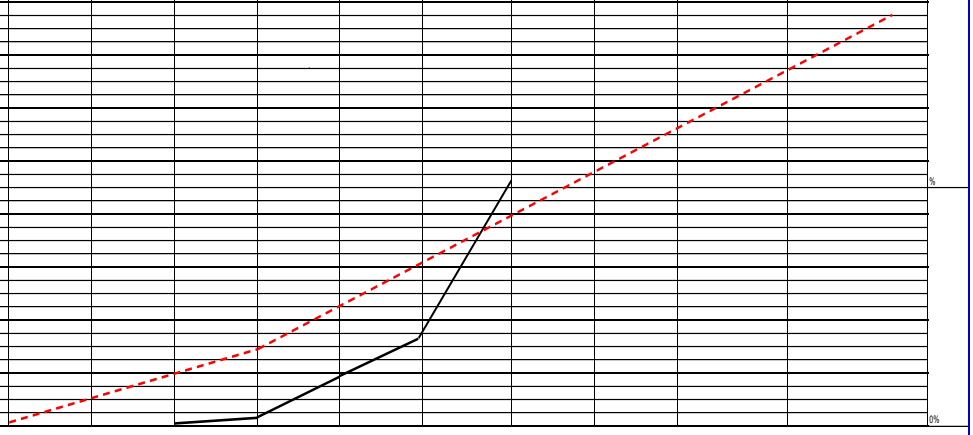

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

0.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: ____
Nombre: ONEY VALDEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA LLANO GRANDE

Aprueba Firma: ____
Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No: 25202-48107 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	89

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** **DE** (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No.
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENI DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ


CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONVEN ######## (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 199,318,829.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B** $ 199,318,829.00

PLAZO ACUMULADO: 5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 30/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAM / VALOR OBRA EJECUTADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…	
GPP1				% P / $ P / $ E / % E											
GPP2				% P / $ P / $ E / % E											
GPP3				% P / $ P / $ E / % E											
GPP4				% P / $ P / $ E / % E											
GPP5				% P / $ P / $ E / % E											%
GPP6				% P / $ P / $ E / % E											
GPP7				% P / $ P / $ E / % E											
GPP8				% P / $ P / $ E / % E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P / $ P / $ E / % E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (															

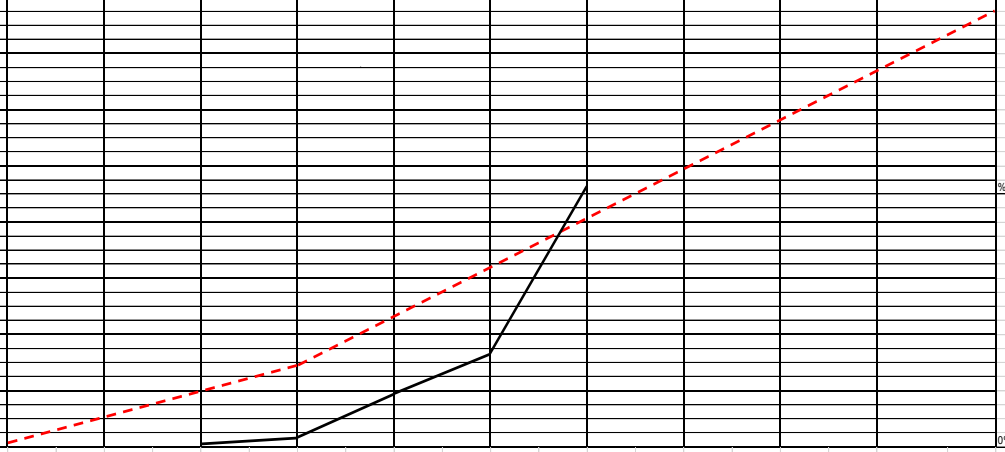

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra pro
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
RSIÓN OBRA EJECUTADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO PROVISIONES Y OTROS DEL CONTRATO (VAP	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: YONIER TUQUERRES
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA QUIROZ ATO

Aprueba Firma:
Nombre: N
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	89

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUT: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** **DE** (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No.
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENIO No: 3119 DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** 5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE INICIO DEL CONVEN ######## (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTU** 30/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 200,741,050.00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (incluido IVA** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B $ 200,741,050.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAM / VALOR OBRA EJECUTADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...	
GPP1				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP4				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP5				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP6				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A															

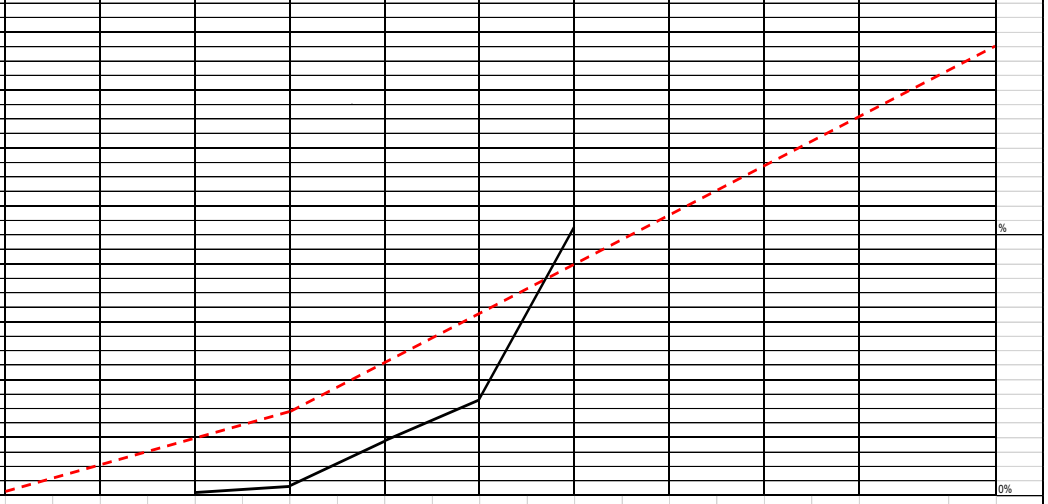

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra pro
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%														0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS: (PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS)	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realic

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LILIANA VALENCIA
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA EL PELIGRO

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	89

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** **DE** (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENI DE 2023


OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL:	4.2 (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONVEN	20/12/2023 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTU	30/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 201,402,474.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 201,402,474.00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	((% OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAM VALOR OBRA EJECUTADA	% Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (														

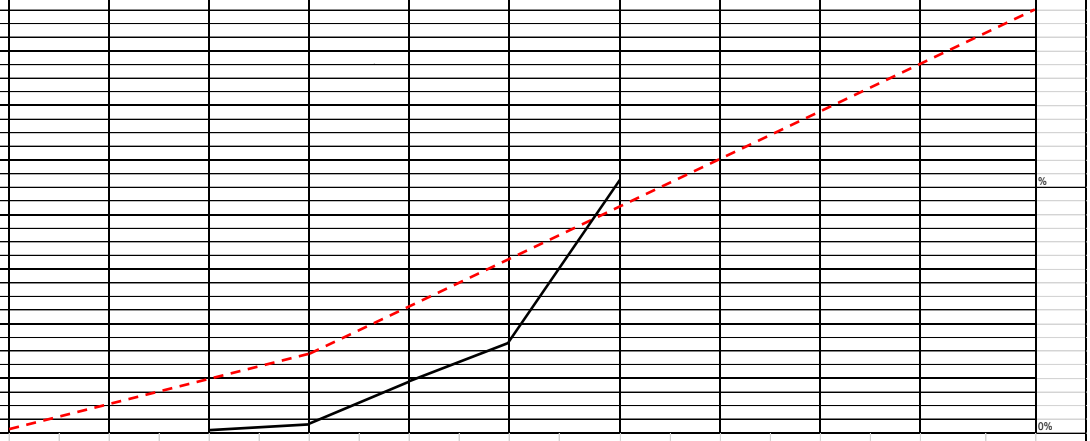

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra progr
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%													0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)													
RSIÓN OBRA EJECUTADA	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL OTROS	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO SIN AIU	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la r

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ELIZABETH TORO
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA OLIVOS

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	89

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. ____ DE ____ (Indicar mes y año) | VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENI 3153 DE 2023 | PLAZO INICIAL: 4.2 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QAUROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


FECHA DE INICIO DEL CONVEN ######## (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 30/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA | FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 | INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10 | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 202,406,606.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B $ 202,406,606.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAM VALOR OBRA EJECUTADA	% Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
GPP1				% P / $ P / $ E / % E										
GPP2				% P / $ P / $ E / % E										
GPP3				% P / $ P / $ E / % E										
GPP4				% P / $ P / $ E / % E										
GPP5				% P / $ P / $ E / % E										
GPP6				% P / $ P / $ E / % E										
GPP7				% P / $ P / $ E / % E										
GPP8				% P / $ P / $ E / % E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P / $ P / $ E / % E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

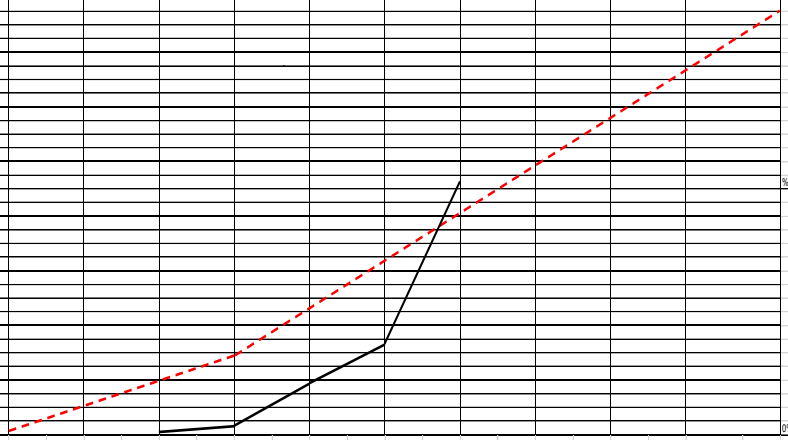

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra pro
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	% / VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	% / VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	% / VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% / VALOR (Miles de Pesos)										

0.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la r

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: ____
Nombre: ROBINSON VALDEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA QUROZ BAJO

Aprueba Firma: ____
Nombre: ____
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No :25202-48107 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	89

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** **DE** (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No.
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENI DE 2023

PLAZO INICIAL: 4.2 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO DEL CONVEN: 20/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 30/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)


CONTRAT JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 200,048,634.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA $ -

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 200,048,634.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAM / VALOR OBRA EJECUTADA	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
GPP1				% P / $ P / $ E / % E										
GPP2				% P / $ P / $ E / % E										
GPP3				% P / $ P / $ E / % E										
GPP4				% P / $ P / $ E / % E										
GPP5				% P / $ P / $ E / % E										
GPP6				% P / $ P / $ E / % E										
GPP7				% P / $ P / $ E / % E										
GPP8				% P / $ P / $ E / % E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P / $ P / $ E / % E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (														

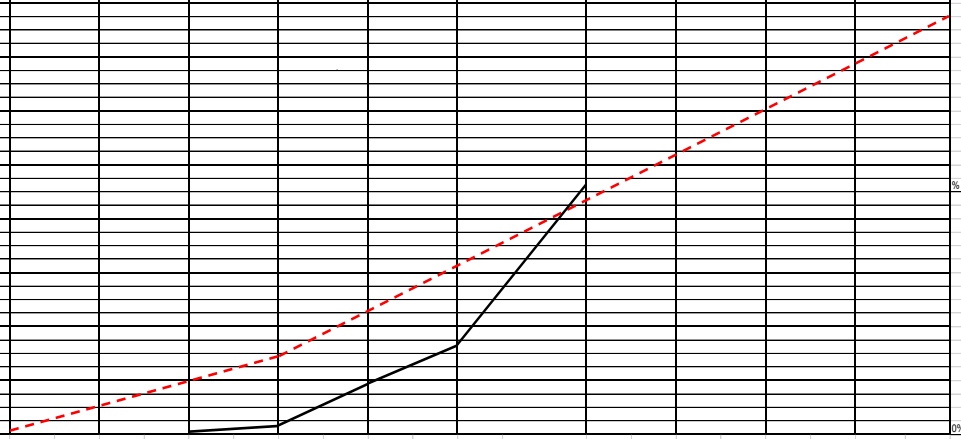

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada"
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
RSIÓN OBRA EJECUTADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realida

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: RAULURBANO
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA SAUCE3

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

4.9.3 Actas de comité de obra: no se adjunta copia de los comités semanales realizados con los convenios en el formato MEPI-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3281-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se lee los compromisos adquiridos en el comité #1 y se da a conocer las decisiones tomadas en este. De igual manera se da a conocer los pagos que se realizaron anteriormente, y de igualmente el avance de la obra hasta la fecha.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades de obra
4-pago de señalizacio y ensayos de laboratorio
5-pagos de personal de nomina,ing residente y maestro por contrato, contadora
6-pagos de papeleria,polizas
7-pagos de recebo,subbase,arena y triturado
8-pagos de fletes,pago de materiales de ferreteria

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades aproximadas de obra
4-Presentación de las cotizaciones de proveedores de materiales, maquinaria, agregados, mano de obra, dotación, overoles
5-aprobacion de pagos
6-Proposiciones y varios

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
La JAC se compromete a enviar los soportes para los respectivos pagos	miércoles, 26 de junio de 2024	JAC
interventoría se compromete a revisar las cuentas de cobro enviadas por la JAC	lunes, 27 de junio de 2024	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ONEY VALDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	JAC	
LEYDI BENITES	PRESIDENTA VEEDURÍA	JAC	
YERALDIN BURBANO	CONTADORA	JAC	
MAURICIO ROMERO	DIRECTOR	INTERVNETORIA	
	RESIDENTE	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	13/04/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3153-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se lee los compromisos adquiridos en el comité #2 y se da a conocer las decisiones tomadas en este. De igual manera se da a conocer los pagos que se realizaron anteriormente, y de igualmente el avance de la obra hasta la fecha.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades de obra
4-pago de señalizacio y ensayos de laboratorio
5-pagos de personal de nomina,ing residente y maestro por contrato, contadora
6-pagos de papeleria,polizas
7-pagos de recebo,subbase,arena y triturado
8-pagos de fletes,pago de materiales de ferreteria

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades aproximadas de obra
4-aprobacion de pagos
5-Proposiciones y varios

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
La JAC se compromete a enviar los soportes para los respectivos	sábado, 0 de enero de 1900	JAC
interventoría se compromete a revisar las cuentas de cobro enviada	sábado, 0 de enero de 1900	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ROBINSON VALDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	JAC	
YERALDIN BURBANO	CONTADORA	JAC	
EDWIN MARTINEZ	PRESIDENTE VEEDURIA	JAC	
MAURICIO ROMERO	DIRECTOR	INTERVENTORIA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	14/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3157-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se lee los compromisos adquiridos en el comité #2 y se da a conocer las decisiones tomadas en este. De igual manera se da a conocer los pagos que se realizaron anteriormente, y de igualmente el avance de la obra hasta la fecha.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades de obra
4-pago de señalizacio y ensayos de laboratorio
5-pagos de personal de nomina,ing residente y maestro por contrato, contadora
6-pagos de papeleria,polizas
7-pagos de recebo,subbase,arena y triturado
8-pagos de fletes,pago de materiales de ferreteria

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades aproximadas de obra
4-aprobacion de pagos
5-Proposiciones y varios

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
La JAC se compromete a enviar los soportes para los respectivos	lunes, 17 de junio de 2024	JAC
interventoría se compromete a revisar las cuentas de cobro enviada	martes, 18 de junio de 2024	INTERVENTORIA

FECHA PROXIMO COMITÉ DE OBRA
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ELIZABETH TORO	REPRESENTANTE LEGAL	JAC	
MAURICIO ROMERO	DIRECTOR	INTERVENTORIA	
YERALDIN BURBANO	CONTADORA	JAC	
MILLER ORTEGA	PRESIDENTE VEEDURIA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORÍA N.6 JUNIO 2024
CONSORCIO MASO 10

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3119-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se lee los compromisos adquiridos en el comité #2 y se da a conocer las decisiones tomadas en este. De igual manera se da a conocer los pagos que se realizaron anteriormente, y de igualmente el avance de la obra hasta la fecha.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades de obra
4-pago de señalizacio y ensayos de laboratorio
5-pagos de personal de nomina,ing residente y maestro por contrato, contadora
6-pagos de papeleria,polizas
7-pagos de recebo,subbase,arena y triturado
8-pagos de fletes,pago de materiales de ferreteria

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades aproximadas de obra
4-aprobacion de pagos
5-Proposiciones y varios

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	17/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3122-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se lee los compromisos adquiridos en el comité #2 y se da a conocer las decisiones tomadas en este. De igual manera se da a conocer los pagos que se realizaron anteriormente, y de igualmente el avance de la obra hasta la fecha.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades de obra
4-pago de señalizacio y ensayos de laboratorio
5-pagos de personal de nomina,ing residente y maestro por contrato, contadora
6-pagos de papeleria,polizas
7-pagos de recebo,subbase,arena y triturado
8-pagos de fletes,pago de materiales de ferreteria

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades aproximadas de obra
4-aprobacion de pagos
5-Proposiciones y varios

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
La JAC se compromete a enviar los soportes para los respectivos	miércoles, 19 de junio de 2024	JAC
interventoría se compromete a revisar las cuentas de cobro enviada	jueves, 20 de junio de 2024	INTERVENTORIA

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MAURICIO ROMERO	DIRECTOR	INTERVENTORIA	
DEYANIRA ORTEGA	CONTADORA	JAC	
YONIER TUQUERRREZ	REPRESENTANTE	JAC	
WILSON INGA	PRESIDENTE VEEDURIA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	8/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3121-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS N/A
Se lee los compromisos adquiridos en el comité #2 y se da a conocer las decisiones tomadas en este. De igual manera se da a conocer los pagos que se realizaron anteriormente, y de igualmente el avance de la obra hasta la fecha.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades de obra
4-pago de señalizacio y ensayos de laboratorio
5-pagos de personal de nomina,ing residente y maestro por contrato, contadora
6-pagos de papeleria,polizas
7-pagos de recebo,subbase,arena y triturado
8-pagos de fletes,pago de materiales de ferreteria

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades aproximadas de obra
4-aprobacion de pagos
5-Proposiciones y varios

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
La JAC se compromete a enviar los soportes para los respectivos	miércoles, 19 de junio de 2024	JAC
interventoría se compromete a revisar las cuentas de cobro enviada	jueves, 20 de junio de 2024	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZEETH DIAZ	ING RESIDENTE	JAC SAUCE	
RAUL URBANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAÑ	
MONICA VALDEZ	PRESIDENTA VEDURIA	JAC SAUCE	
MAURICIO ROMERO	DIRECTOR	INTERVENTORIA	
YUDY SOARTE	CONTADORA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.4 Actas de reunión: NO se adjunta copia de REUNION en el formato MEPI-MN-IN-14-FR-2

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE SELECCIÓN	CONCURSO DE MERITO ABIERTO
CONTRATO	5065 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO MASO 10
CONSORCIO CONFORMADO POR	CMA-DEO-SVR-119-2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL-LOTE2
REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE SARRIA
SISTEMA	
VALOR DEL CONTRATO	$ 235.028.339
ANTICIPO	0
FECHA DE INICIACIÓN	30/12/23
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	UVEIMAN LAGOS
GESTOR TÉCNICO	DIEGO PABON
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	MAURICIO ROMERO

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

Durante este periodo del mes de junio, la interventoría realizó el acompañamiento y verificación de ejecución de las siguientes actividades:

Durante el mes de junio de 2024, se llevaron a cabo una serie de actividades y gestiones importantes relacionadas con la ejecución de proyectos en la Dirección Territorial de Nariño. Se destacan la presentación del equipo de trabajo de la Interventoría en dicha dirección, así como las reuniones de seguimiento técnico y administrativo entre la Interventoría y la supervisión por parte del INVIAS en los primeros días del mes. Además, se realizaron acciones clave como la revisión y solicitud de ampliación de prórroga del convenio, la radicación de cuentas de cobro y la revisión de documentos relacionados con el reembolso de pagos de pólizas a los presidentes de las Juntas.

- Disposición de subbase y compactación en la vereda peligro
- Se realizaron comités de obra con el objetivo de tratar temas de inicio de obra en las veredas LLANO GRANDE, QUIROZ ALTO, QUIROZ BAJO, SAUCE, LOS OLIVOS, EL PELIGRO, NUEVA FLORIDA.
- Se realizaron planes de compras para pagos de proveedores.
- Corte y figuración de acero en todos los convenios esta actividad se terminó en un 100%.
- En la vereda el SAUCE, QUIROZ ALTO, LLANO GRANDE se dio inicio a las actividades de fundición de concreto de 3000psi.la interventoría realizo acompañamiento toma de slump.
- Acompañamiento a la comunidad encanto a la parte social de interventoría realizando vistas a cada uno de los convenios.

5.3 Informes de especialistas

En el presente mes de junio la profesional Social y ambiental efectuaron el seguimiento a las actividades sociales realizadas por los contratistas y la revisión y presentación de las observaciones correspondientes a los diferentes documentos sociales y ambientales que entregaron los contratistas en el presente mes para revisión de la Interventoría.

5.4 Información otros programas y aplicativos.

En el presente mes de junio no se desarrollaron otros programas

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VEHICULOS DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: junio **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5065 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO MASO 10

CONTRATO DE OBRA No. 3089 DE 2023 / 3119 DE 2023 / 3121 DE 2023 / 3122 DE 2023 / 3153 DE 2023 / 3157 DE 2023 / 3281 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC DE LA VEREDA LLANO GRANDE - JAC VEREDA EL PELIGRO - JAC VEREDA SAUCE - JAC DE QUIROZ ALTO - JAC QUIROZ - JAC VEREDA OLIVOS - JAC VEREDA NUEVA FLORIDA DE LA UNION Y SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MOTOCICLETA	PLACA NSA-13G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA JPE-59E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA EXU-62G			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA JCV-106						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA INU-90D						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA ZEA-97G						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA BVZ-63E																							X	X	X	X	X	X	X	X

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma	Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA	Nombre: UVEIMAN LAGOS
Director de Interventoría	Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND	Matrícula Profesional No.:52202-77462

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.1 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPAMN1-IN-15-FR-7
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCION TERRITORIAL** : Nariño

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 — **INTERVENTOR:** Consorcio MASO 10

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: junio 2024 — **PROYECTO** : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA ELMEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

CONVENIO SOLIDARIO No: 3089-2023, 3119-2023, 3157-2023, 3281-2023, 3121-2023, 3122-2023, 3153-2023. — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA OAC EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANO GRANDE, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PEUGRO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ.

NOMBRE ARL: POSITIVA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAFAM — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION :** CAFAM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Mauricio Romero Quiroga	79.394.462	Director	$ 3.450.000	X . . . X . X F . X X X F X . . . . X F . X . . . X F X	0.50	OSAC SAS	$ 3.450.000	$ 18.100	I	COMPENSAR	9489522598	$ 138.000	SKANDIA	9489522598	$ 552.000,00	$ 138.000	NO APLICA	NO APLICA	
2	Alvaro Efrain Aguirre Maya	13.063.945	Residente	$ 5.150.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X F X X X X X F X X X	1.00	OSAC SAS	$ 5.150.000	$358.500	V	NUEVA EPS	9489522598	$ 206.000	PORVENIR	9489522598	$ 824.000,00	$ 206.000	NO APLICA	NO APLICA	
3	Evelin Juliana Diaz	1.089.482.890	Profesional Social	$ 3.750.000	X X X X X X F X X X X X X F X X X X X F X X X X X F X X X	1.00	OSAC SAS	$ 3.750.000	$ 19.800	I	ENSANNAR	9489522598	$ 150.000	PORVENIR	9489522598	$ 600.000,00	$ 150.000	NO APLICA	NO APLICA	
4	Felipe Sarria Vélez	79.981.543	Profesional Ambiental	$ 1.125.000	. . . . . F . . . X . F . . . X F . . X . . F X . . .	0.25	OSAC SAS	$ 1.300.000	$ 6.800	I	SANITAS	9489522598	$ 52.000	SKANDIA	9489522598	$ 208.000,00	$ 52.000	NO APLICA	NO APLICA	
6	Dayany Marcela Peña	1.089.485.628	Inspector	$ 2.000.000	X X X X X X F X X X . X X F X X X X X F X X X X X F X X X	1.00	OSAC SAS	$ 2.000.000	$139.200	V	NUEVA EPS	9489522598	$ 80.000	PORVENIR	9489522598	$ 320.000,00	$ 80.000	NO APLICA	NO APLICA	
7	Julieth Zúñiga Gomez	1.083.814.242	Inspector	$ 2.000.000	X X X X X X F X X X X X X F X X X X X F X X X X X F X X X	1.00	OSAC SAS	$ 2.000.000	$139.200	V	ENSANNAR	9489522598	$ 80.000	PORVENIR	9489522598	$ 320.000,00	$ 80.000	NO APLICA	NO APLICA	
8	Jorge Andres Muñoz Sosque	1.087.647.864	Inspector	$ 2.000.000	X X X X X X F X X X X X X F X X X X X F X X X X X F X X X	1.00	OSAC SAS	$ 2.000.000	$139.200	V	MALLAMAS	9489522598	$ 80.000	PORVENIR	9489522598	$ 320.000,00	$ 80.000	NO APLICA	NO APLICA	
9	Abel Leyton	86.031.149	Inspector	$ 1.000.000	X . . X . X F . . X . . . X F X . . . . X F . . X F X .	0.50	OSAC SAS	$ 1.300.000	$ 6.800	I	SANITAS	9489522598	$ 52.000	PORVENIR	9489522598	$ 208.000,00	$ 52.000	NO APLICA	NO APLICA	
10	Gissel Andrea Muñoz Rivera	1.089.484.424	Inspector SST	$ 2.200.000	X X X X X X F X X X X X X F X X X X X F X X X X X F X X X	1.00	OSAC SAS	$ 2.200.000	$153.200	V	SANITAS	9489522598	$ 88.000	PORVENIR	9489522598	$ 352.000,00	$ 88.000	NO APLICA	NO APLICA	
11	Nicol Paola Muñoz Zúñiga	1.083.814.806	Inspector	$ 2.000.000	X X X X X X F X X X X X X F X X X X X F X X X X X F X X X	1.00	OSAC SAS	$ 2.000.000	$139.200	V	PROTISALUD	9489522598	$ 80.000	PORVENIR	9489522598	$ 320.000,00	$ 80.000	NO APLICA	NO APLICA	
12	John Alexander Muñoz Pasaje	1.081.594.141	Topografo	$ 303.334	. . . . . X X F X X X	0.23	OSAC SAS	$ 303.334	$ 21.200	V	NUEVA EPS	9489522598	$ 12.200	PORVENIR	9489522598	$ 48.600,00	$ 12.200	NO APLICA	NO APLICA	
13	Harold Andres Muñoz Pasaje	1.081.592.978	Cadenero	$ 303.334	. . . . . X X F X X X	0.23	OSAC SAS	$ 303.334	$ 21.200	V	SANITAS	9489522598	$ 12.200	PORVENIR	9489522598	$ 48.600,00	$ 12.200	NO APLICA	NO APLICA	
14	Jesus Alberto Dorado	13.040.145	Cadenero	$ 303.334	. . . . . X X F X X X	0.23	OSAC SAS	$ 303.334	$ 21.200	V	NUEVA EPS	9489522598	$ 12.200	COLPENSIONES	9489522598	$ 48.600,00	$ 12.200	NO APLICA	NO APLICA	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 24.578.334																

El Interventor adjunta la certificación de fecha — N/A — a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-48107

Firma:
Nombre: Ueiman Hernando Lagos Vela
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77462

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

MES INFORME MENSUAL: 1 a 30 de junio de 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3089-2023, 3119-2023, 3157-2023, 3281-2023, 3121-2023, 3122-2023, 3153-2023.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE / JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PELIGRO / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS / JUNTA DE ACCIONCOMUNAL DE LA VEREDA NUEVA / FLORIDA / JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAUCE / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIROZ ALTO / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIROZ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1446523	C-2402-0600-14-0-2402041- 02	10	Nación	Principal	$ 230,211,152.22	
2023	1446523	C-2402-0600-14-0- 2402112-02	10	Nación	Principal	$ 4,698,186.78	
2024	535624	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	Nación	Adicional No 1	$ 66,994,000.00	
TOTAL						$ 301,903,339.00	$ 68,690,067.60

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 301,903,339

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
anticipo							$ -					
1	22 a 31 de enero de 2024	$ 2,781,440.00	$ 528,473.60	$ 3,309,913.60	$ -	$ 3,309,913.60	$ -	1446523 - 2023/12/29	$ 231,599,425.40	$ 231,599,425.40		
2	feb-24	$ 17,450,000.00	$ 3,315,500.00	$ 24,075,413.60	$ -	$ 20,765,500.00	$ -	1446523 - 2023/12/29	$ 210,833,925.40	$ 210,833,925.40		
3	mar-24	$ 24,517,400.00	$ 4,658,306.00	$ 53,251,119.60	$ -	$ 29,175,706.00	$ -	1446523 - 2023/12/29	$ 181,658,219.40	$ 181,658,219.40		
4	abr-24	$ 36,906,500.00	$ 7,012,235.00	$ 97,169,854.60	$ -	$ 43,918,735.00	$ -	1446523 - 2023/12/29	$ 137,739,484.40	$ 137,739,484.40		
5	may-24	$ 58,024,720.00	$ 11,024,696.80	$ 166,219,271.40	$ -	$ 69,049,416.80	$ -	1446523 - 2023/12/29	$ 68,690,067.60	$ 68,690,067.60		
6	jun-24	$ 70,486,000.00	$ 13,392,340.00	$ 250,097,611.40	$ -	$ 83,878,340.00	$ -	1446523 - 2023/12/29 535624 - 2024/06/13	$ 51,805,727.60	$ 51,805,727.60		
TOTALES		**$ 210,166,060.00**	**$ 39,931,551.40**	**$ 250,097,611.40**	**$ 0.00**	**$ 250,097,611.40**						

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 182,743,060.00	$ 34,721,181.40	$ 217,464,241.40
*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 27,423,000.00	$ 5,210,370.00	$ 32,633,370.00
*			
VALOR TOTAL	$ 210,166,060.00	$ 39,931,551.40	$ 250,097,611.40

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-48107

Firma
Nombre: Uveiman Hernando Lagos Vela
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 52202-77462

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.3 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPIMN1- IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDURECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS,SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

FECHA DE INICIO: 22/01/2024
PLAZO INICIAL: 30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 234,909,339.00
VALOR ACUMULADO: $ 234,909,339.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: UVEIMAN LAGOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 23,490,933.90	26	12	23	7/12/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 39,480,561,200	26	12	23	7/12/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 46,981,867,800	26	12	23	7	6	27
Calidad del servicio		$ 70,472,801,700	2	1	24	2	1	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433305
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma
Nombre: UVEIMAN LAGOS V
Supervisor Contrato de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	139-140
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
NTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS,SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

INTERVENTOR: MASO 10

FECHA DE INICIO: 21/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/07/2024 (Incluya prórrogas y suspensiones)

CONVENIO DE OBRA No: 3119-2023, 3089-2023, 3122-2023, 3281-2023, 3157-2023, 3153-2023, 3121-2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: JAC VEREDA EL SAUCE,JAC VEREDA EL PELIGRO,JAC VEREDA LLANO GRANDE,JAC VEREDA QUIROZ ALTO, JAC VEREDA QUIROZ BAJO,JAC VEREDAQ OLIVOS,JAC VEREDA NUEVA FLORIDA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____. APROBADO: SI _____ N _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____. No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____. No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____. APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma
Nombre: N/A
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: UVEIMAN LAGOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77462

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.5 Seguimiento a la inversión del Anticipo: no aplica en el formato MEPI-MN-IN-3-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. .....
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS,SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....

ANTICIPO OTORGADO: ..... %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ - (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS,SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre MAURICIO ROMERO Q
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profes 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6 Seguimiento al Plan de Cargas: Se adjunta el seguimiento mensual en el formato MEPI-MNIN-9-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 31/06/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL: X

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS: ____ No. ____
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **5065/2023**

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VE

RESOLUCIÓN No.: ____ DE ____ (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 3089-2023, 3119-2023, 3157-2023, 3281-2023, 3121-2023, 3122-2023, 3153-2023. CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE / JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PELIGRO / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA / FLORIDA / JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAUCE / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIROZ ALTO / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIROZ

PLAZO INICIAL: 2 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 234,909,339.00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 6.3 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: ____ (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 22/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 234,909,339.00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		AÑO 2024				TOTAL	
											MES 1		MES 2			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Director de Interventoría	$ 6,900,000.00		1.0	$ 6,900,000.00					0.4	$ 2,760,000.00	0.6	$ 4,140,000.00	1.0	$ 6,900,000.00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,150,000.00		2.0	$ 10,300,000.00					1.0	$ 5,150,000.00	1.0	$ 5,150,000.00	2.0	$ 10,300,000.00
3	1	Profesional Social	$ 3,750,000.00		2.0	$ 7,500,000.00					1.0	$ 3,750,000.00	1.0	$ 3,750,000.00	2.0	$ 7,500,000.00
4	1	Profesional Ambiental	$ 3,750,000.00		2.0	$ 7,500,000.00					1.0	$ 3,750,000.00	1.0	$ 3,750,000.00	2.0	$ 7,500,000.00
5	1	**MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS**	$ 7,580,850.00			$ 7,580,850.00					0.5	$ 3,790,425.00	0.5	$ 3,790,425.00	1.0	$ 7,580,850.00
6	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 6,100,000.00									$ -		$ -	0.0	$ -
7	1	Especialista en Estructuras	$ 6,100,000.00									$ -		$ -	0.0	$ -
8	1	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 6,100,000.00									$ -		$ -	0.0	$ -
9	1	Especialista Ambiental	$ 6,100,000.00									$ -		$ -	0.0	$ -
10	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,100,000.00									$ -		$ -	0.0	$ -
11	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,100,000.00									$ -		$ -	0.0	$ -
		PERSONAL TÉCNICO														
12	5	Inspector	$ 2,000,000.00		2.0	$ 20,000,000.00					1.0	$ 10,000,000.00	1.0	$ 10,000,000.00	2.0	$ 20,000,000.00
13	1	Inspector SST	$ 2,200,000.00		2.0	$ 4,400,000.00					1.0	$ 2,200,000.00	1.0	$ 2,200,000.00	2.0	$ 4,400,000.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO														
14	1	Técnico administrativo	$ 1,300,000.00		2.0	$ 2,600,000.00					1.0	$ 1,300,000.00	1.0	$ 1,300,000.00	2.0	$ 2,600,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 66,780,850.00**					**$**	**32,700,425.00**	**$**	**34,080,425.00**	**$**	**66,780,850.00**
FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 2.36**						**2.36**		**2.36**		**2.36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 157,602,806.00**					**$**	**77,173,003.00**	**$**	**80,429,803.00**	**$**	**157,602,806.00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2024 MES 1 H-M	AÑO 2024 MES 1 VALOR	AÑO 2024 MES 2 H-M	AÑO 2024 MES 2 VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS														
		VIÁTICOS														
15	5.00	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 210,000.00	Dia	10.00	$ 2,100,000					3.00	$ 630,000	7.00	$ 1,470,000	10.00	$ 2,100,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA														
16	1.00	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5,500,000.00	Mes	2.00	$ 11,000,000					1.00	$ 5,500,000	1.00	$ 5,500,000	2.00	$ 11,000,000.00
17	6.00	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 650,000.00	Mes	12.00	$ 7,800,000					6.00	$ 3,900,000	6.00	$ 3,900,000	12.00	$ 7,800,000.00
18	1.00	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,000,000.00	Según com probante por mes	2.00	$ 12,000,000					1.00	$ 6,000,000	1.00	$ 6,000,000	2.00	$ 12,000,000.00
19	1.00	Ensayos de laboratorios.	$ 600,000.00	Según com probante por mes	2.00	$ 1,200,000					1.00	$ 600,000	1.00	$ 600,000	2.00	$ 1,200,000.00
20	1.00	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800,000.00	Según com probante por mes	2.00	$ 1,600,000					1.00	$ 800,000	1.00	$ 800,000	2.00	$ 1,600,000.00
		OTROS COSTOS														
21	1.00	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1,300,000.00	Según com probante por mes	2.00	$ 2,600,000					1.00	$ 1,300,000	1.00	$ 1,300,000	2.00	$ 2,600,000.00
22	1.00	Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc.	$ 300,000.00	Según com probante por mes	2.00	$ 600,000					1.00	$ 300,000	1.00	$ 300,000	2.00	$ 600,000.00
23	1.00	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300,000.00	Según com probante por mes	2.00	$ 600,000					1.00	$ 300,000	1.00	$ 300,000	2.00	$ 600,000.00
24	1.00	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150,000.00	Según com probante por mes	2.00	$ 300,000					1.00	$ 150,000	1.00	$ 150,000	2.00	$ 300,000.00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE														
		*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 39,800,000.00**					**$**	**19,480,000.00**	**$**	**20,320,000.00**	**$**	**39,800,000.00**
		*Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 197,402,806.00**					**$**	**96,653,003.00**	**$**	**100,749,803.00**	**$**	**197,402,806.00**
		*Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**$ -**					**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**
		*Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 197,402,806.00**					**$**	**96,653,003.00**	**$**	**100,749,803.00**	**$**	**197,402,806.00**
		*IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 37,506,533.00**					**$**	**18,364,071.00**	**$**	**19,142,463.00**	**$**	**37,506,534.00**
		*Costo Total = (E) + (F)				**$ 234,909,339.00**					**$**	**115,017,074.00**	**$**	**119,892,266.00**	**$**	**234,909,339.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
La presente reprogramación se realiza en correspondencia a la prórroga No 1 del contrato 5065 de 2023 para atender los contratos de obra No 3089-2023, 3119-2023, 3157-2023, 3281-2023, 3121-2023, 3122-2023, 3153-2023.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: Arturo Sarria Ruiz
Representante Legal Interventor
Matrícula Profesional No.: 25000-08029

Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77462
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Revisión de materiales pétreos que cumplan, en los siete convenios cumple con lo reglamentario.

- Se recomienda a la junta de la vereda nueva florida en el municipio de San Pablo, la entrega de la dotación completa a los trabajadores.

- Por las fuertes lluvias presentadas en el mes de junio se vieron afectadas todas obras, presentados retraso en sus actividades.

- Se ha recomendado en todos los comités tener un control ajustado al presupuesto asignado a cada convenio, dejar en reserva el dinero necesario para cumplir con todos los compromisos ante entidades nacionales como la DIAN, SENA entre otros.

- Se recomienda una eficiente disposición de materiales, mano de obra y herramientas necesarias para tener un buen rendimiento de pavimento.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista, interventoría

correspondencia cursada entre la JAC LLANO GRANDE CONVENIO 3089 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
4/06/2024	N-GR-013-2024	ENVIO DE PQRS RECIBIDO EL 31 MAYO 2024 EN LA APERTURA DEL BUZÓN DE SUGENERNCIA	X	
11/06/2024	N-GR-014-2024	VALLA INFORMATIVA	X	
16/06/2024	N-GR-015-2024	RESPUESTA CAMBIO DE PLACA HUELLA A PAVIMENTO RIGUIDO	X	
17/06/2024		ACTAS DE VECINDAD CORREGIDAS		X
18/06/2024		SEGUNDAS OBSERVACIONES DE ACTAS DE VECINDAD	X	
20/06/2024		PLAN DE GESTION AMBIENTAL		X
15/06/2024		SOLICITUD DE PRORROGA		X
12/06/2024		CRONOGRAMA ACTUALIZADO		X
20/06/2024		COMITE # 3		X

correspondencia cursada entre la JAC LOS OLIVOS CONVENIO 3157 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
1/06/2024		ACTAS DE VECINDAD		X
7/06/2024	N-OL-013-2024	OBSERVACIONES ACTAS DE VECINDAD	X	
11/06/2024	N-OL-014-2024	VALLA INFORMATIVA	X	
13/06/2024		CORRECCIONES ACTAS DE VECINDAD		X
17/06/2024		SEGUNDAS OBSERVACIONES ACTAS DE VECINDAD	X	
21/06/2024		DISEÑO DE MEZCLA		X
21/06/2024		COMITE # 3		X
15/06/2024		SOLICITUD DE PRORROGA		X

correspondencia cursada entre la JAC QUIROZ BAJO CONVENIO 3153 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
11/06/2024	N-QB-012-2024	VALLA INFORMATIVA	X	
16/06/2024	N-QB-013-2024	RESPUESTA CAMBIO DE PLACA HUELLA A PAVIMENTO RIGUIDO	X	
19/06/2024		PLAN DE GESTION AMBIENTAL		X
15/06/2024		SOLICITUD DE PRORROGA		X
13/06/2024		CRONOGRAMA ACTUALIZADO		X
28/06/2024		COMITE # 3		X

correspondencia cursada entre la JAC NUEVA FLORIDA CONVENIO 3281 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
11/06/2024	N-NF-013-2024	VALLA INFORMATIVA	X	
13/06/2024		CRONOGRAMA ACTUALIZADO		X
15/06/2024		SOLICITUD DE PRORROGA		X
26/06/2024		COMITE # 2		X

correspondencia cursada entre la JAC EL PELIGRO CONVENIO 3119 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
6/06/2024		DISEÑO DE MEZCLA		x
3/06/2024		ACTUALIZACION CRONOGRAMA		X
11/06/2024	N-PE-014-2024	VALLA INFORMATIVA	X	
21/06/2024		IN FORMACION DEL CONVENIO		X
15/06/2024		SOLICITUD DE PRORROGA		X
25/06/2024		COMITE #3		X

correspondencia cursada entre la JAC EL SAUCE CONVENIO 3121 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
4/06/2024		DISEÑO DE MEZCLA		X
3/04/2024		ENTREGA DE DENSIDADES		X
11/06/2024	N-SA-013-2024	VALLA INFORMATIVA	X	
16/06/2024	N-SA-014-2024	RESPUESTA CAMBIO DE PLACA HUELLA A PAVIMENTO RIGUIDO	X	
19/06/2024		PLAN DE GESTION AMBIENTAL		X
17/06/2024		COMITE # 3		X
15/06/2024		SOLICITUD DE PRORROGA		X
12/06/2024		CRONOGRAMA ACTUALIZADO		X

correspondencia cursada entre la JAC EL QUIROZ ALTO CONVENIO 3122 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
5/06/2024	N-QA-014-2024	ENVIO PQRS RECIBIDO EL 5 JUNIO 2024	X	
11/06/2024	N-QA-015-2024	VALLA INFORMATIVA	X	
13/06/2024	N-QA-016-2024	RESPUESTA DERECHO PETICIÓN SRA. GLADIS EDILMA MONCAYO	X	
16/06/2024	N-QA-017-2024	RESPUESTA CAMBIO DE PLACA HUELLA A PAVIMENTO RIGUIDO		
22/06/2024		COMITE # 3		X
17/06/2024		SOLICITUD DE PRORROGA		X
17/06/2024		DISEÑO DE MEZCLA		X
17/06/2024		PLAN DE GESTION AMBIENTAL		X
14/06/2024		RESULTADO DE DENSIDADES		X
15/06/2024		SOLICITUD DE PRORROGA		X

8.2 Registro fotográfico

EL SAUCE














13 jun. 2024 15:14:01
La Unión, San Pablo
La Unión
Nariño
Altitud:1643.0m


14 jun. 2024 09:58:01
Altitud:1657.0m

OLIVOS


viernes, 14 de junio de 2024
1°39'26.88269"N -77°12'46.28017"W
La Union
La Unión
Nariño


viernes, 14 de junio de 2024
1°39'27.17735"N -77°12'47.02005"W
La Union
La Unión
Nariño


Pena Negra
miércoles, 12 de junio de 2024
1°39'27.75927"N -77°12'49.4449"W
La Unio
La Unió
Nariño


jueves, 27 de junio de 2024
1°39'26.02392"N -77°12'45.27082"W
La Union
La Unión
Nariño




Pena Negra
viernes, 21 de junio de 2024
1°39'27.36579"N -77°12'50.13349"W
La Union
La Unión
Nariño


viernes, 21 de junio de 2024
1°39'28.3071"N -77°12'49.91231"W
La Union
La Unión
Nariño


viernes, 14 de junio de 2024
1°39'27.64657"N -77°12'50.08552"W
La Union
La Unión
Nariño

NUEVA FLORIDA














martes, 25 de junio de 2024

EL PELIGRO






jueves, 20 de junio de 2024
La Union
La Unión
Nariño


jueves, 20 de junio de 2024
1°38'37.61817"N -77°7'55.24553"W
La Union
La Unión
Nariño


jueves, 13 de junio de 2024
1°38'38.63009"N -77°7'54.52224"W


jueves, 13 de junio de 2024


Rotoplast
viernes, 14 de junio de 2024
1°38'37.57125"N -77°7'47.42421"W
Vía sin nombre
La Unión
Nariño








sábado, 22 de junio de 2024
1°38'37.94889"N -77°7'53.46522"W
La Unión
La Unión
Nariño



QUIROZ BAJO







QUIROZ ALTO


miércoles, 12 de junio de 2024, 1:55:06 p. m.
La Unión-Quiroz alto


lunes, 17 de junio de 2024, 4:00:08 p. m.
La Unión-Quiroz alto


miércoles, 19 de junio de 2024, 2:43:09 p. m.
La Unión-Quiroz alto




miércoles, 19 de junio de 2024, 11:15:50 a. m.
La Unión-Quiroz alto


miércoles, 19 de junio de 2024, 2:50:44 p. m.
La Unión-Quiroz alto



miércoles, 19 de junio de 2024, 4:37:31 p. m.
La Unión-Quiroz alto


martes, 18 de junio de 2024, 12:42:23 p. m.
La Unión-Quiroz alto



jueves, 20 de junio de 2024, 3:33:45 p. m.
La Unión-Quiroz Alto

LLANO GRANDE



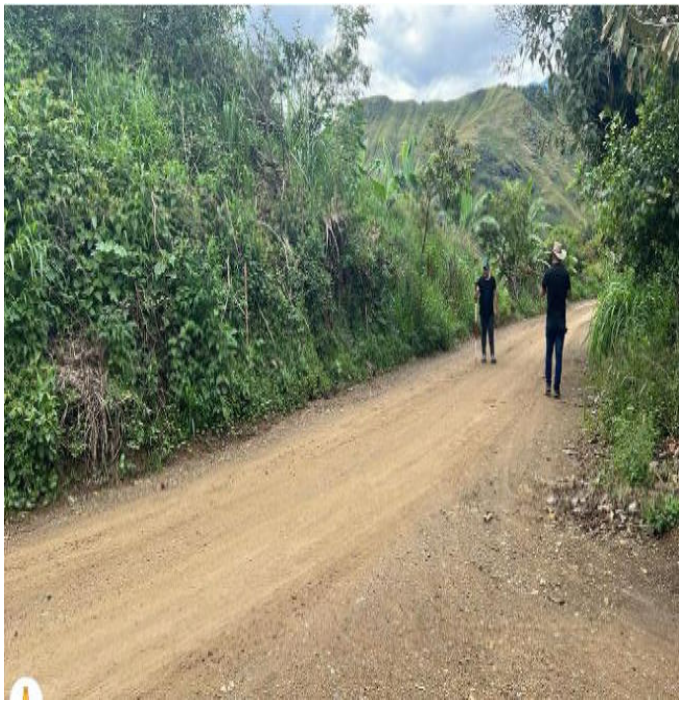



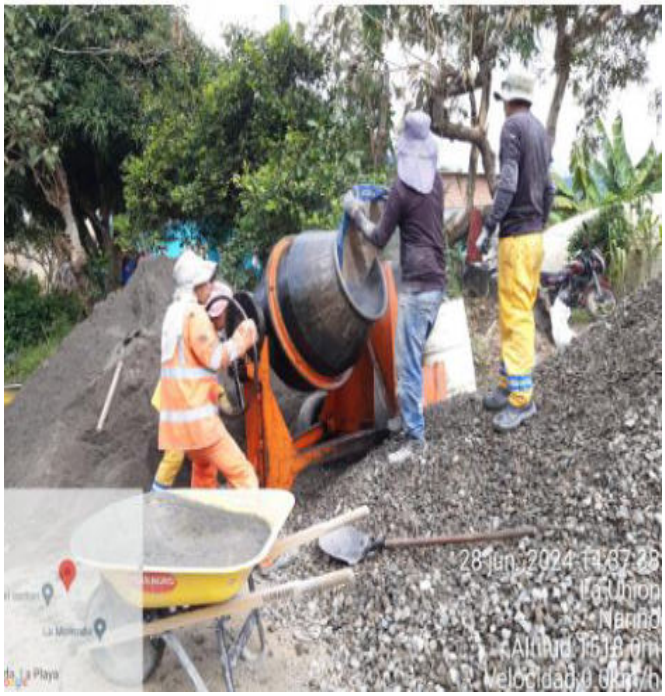


28 jun. 2024 11:57:19
La Unión
Nariño
Altitud:1515.0m
Velocidad:0.0km/h


28 jun. 2024 15:33:34
La Unión
Nariño
Altitud:1519.0m
Velocidad:0.0km/h






27 jun. 2024 16:43:37
La Unión
Nariño
Altitud:1538.0m
Velocidad:1.6km/h


27 jun. 2024 16:48:54
Altitud:1524.0m
Velocidad:0.0km/h


27 jun. 2024 11:56:32
La Unión
Nariño
Altitud:1524.0m
Velocidad:0.0km/h

BITÁCORA EL PELIGRO

29-5-24 clima Soleado - lluvioso.
Personal en obra: Ing residente obra, Aspecto residente de Interventoria, Maestro, obreros.
se continua con la figuracion y corte de acero llega material y herramienta a obra como la mezcladora, se hace el armado del acero de la alcantarilla y a conbocar las medidas por parte de interventoria, el maestro se dispone a Refil el terreno para el templete de las aletas corroboracion de niveles y medidas en el plano. Ing Residente Interventor

30-5-24 clima Soleado
Personal en Obra: Ing. residente obra, inspector residente de interventoria, Maestro, obreros
Se continua con la Construccion alcantarilla, llega material triturado y arena se comienza a fundir las aletas de la alcantarilla con su respectivo vibrado. Ing residente interventor

31-5-24. clima Soleado. lluvioso.
Personal en Obra: Ing residente obra Inspector residente de Interventoria, Maestro Obreros. Se Continua con la Construccion de la alcantarilla. Se retira todo, a causa de las lluvias, de la tuberia; se inicia la Construccion de la Cajilla con el Solado, y el armado del acero Ing residente interventor.

01-6-24. clima Soleado.
Personal en Obra: Ing residente Obra, inspector residente de Interventoria, Maestro, Obreros, Se continua con el armado del acero para la cajilla, y la Construccion de los tableros para la Cajilla. Ing residente interventor.

03-06-24. Clima. Soleado

Personal en Obra: Ing. residente, Inspector residente de interventoria, Maestro, Obreros.
Se continuo. con la Construcción de la cajilla. armado de acero. y tableros.

Ing residente.

04-06-24 Clima Lluvioso-

Personal en obra: Ing residente, Inspector residente de interventoria; Maestro, Obreros. Se recibe material en obra. 20 bolsas de cemento. y se lleva. a Cabo la fundición, de la Cajilla.
Se trabajo. hasta. las 6:00 Pm

Ing residente.

05-06-24 Clima. Soleado - Lluvioso.

Personal en Obra: Ing residente. Inspector residente de Interventoria. Maestro, Obreros. Se recibe material en Obra 25 Kg de Alambre y se lleva. a cabo el cambio de sitio del material Triturado y Arena para almacenar. se almacena. sobrantes de tabla. para estacas, se lleva. a cabo limpieza de tubo de la alcantarilla.

Ing residente

06-06-2024 Clima: Seco

Personal en Obra: Residente Contratista, Inspector Interventoría, Maestro, 3 Obreros, SISO
→ Se continuará con actividades de armado de vigas, se espera un buen avance puesto que se cuenta con fleges ya listos para vaciar.
Se recibe la visita de la SISO de Interventoría, quien da una charla sobre riesgos en obra y hace entrega de un botiquín.

Ing residente

07-06-2024 Clima: Seco

Personal en Obra: Residente contratista, Inspector Int., Maestro, 30breros
→ Se avanza con actividades de armado de vigas.
Llega 50 Kg de hierro y 10 discos de Corte

Res. Contratista Ing residente

Interventoría.

Powered by CamScanner

08/06/2024 Clima: Seco
Personal en Obra: Residente Contratista, Inspector Int. Maestro, 3 Obreros

Se continúa con el armado de vigas, se lleva un buen avance en esta actividad, se corta hierro de 90 cm para las losas.

Ing. residente

10/06/2024 Clima: Seco
Personal en Obra: Residente contratista, Inspector Int. Maestro, 3 Obreros
Se continúa con el armado de acero y la figuración de este de igual manera esta actividad es evaluada y supervisada por interventoría.

Responsable Contratista

Ing residente

Interventoría.

11/06/2024 Clima: Seco
Personal en Obra: Residente contratista, Inspector Int. Maestro, 3 Obreros

Armado de vigas, corte de acero transversal para (parrillas) losas.
Se recibe material 400 varillas 3/8", 50 kg alambre de amarre.

Resp. Contratista

Ing residente

Interventoría.

12/06/2024 Clima:
Personal en Obra: Residente contratista, Inspector Int. Maestro, 3 Obreros.


Armado de vigas, corte de acero transversal para losas, y para canetas.
Se realizo doblado de acero de las vigas en los extremos

Ing residente

13/06/2024 Clima:
Personal en Obra: Residente contratista, Inspector Int. Maestro, 3 Obreros.


Se continúa con algunos últimos detalles de las vigas maestras, dobles para caneta se procede también al desencofrado del cajón de la alcantarilla, se

realizo el acopio del material sobrante de esta actividad.

Resp. Contratista  Interventoria.

/2024 Clima: Seco
Personal en obra: Residente contratista, Inspector Int. Maestro, 3 Obreros

Se adelantan actividades de corte de acera y figurado, con una medida de 0,7 m dispuesto para relleno de cunetas. faltantes


Resp. Contratista  Interventoria.

/2024 Clima: Seco
Personal en Obra:
Residente contratista, Inspector Int, Maestro 3 Obreros.
Se terminaron actividades de corte de acero, para losas y cunetas faltantes.



06/2024 Clima, Seco
Personal en Obra: Residente Junto, Inspector Int, Maestro, Obreros

Culminadas las actividades correspondientes a flejado de acero, se procede el día de hoy con tareas de relleno y compactación de material en el cajón de la alcantarilla. De igual manera se procedera con la limpieza de la alcantarilla puesto que se encuentra cubierta de residuos debido a las lluvias presentados el día de ayer.

Resp. Contratista  Interventoria

18/06/2024 Clima: Seco
Personal en Obra: Presidente Junta, Inspector Int., Maestro, Obreros.
Equipo: Maquinaria tipo motoniveladora, Vibrocompactador.

, llegada de maquinaria amarilla, motoniveladora y vibrocompactador para dar continuidad a las actividades de nivelación de la calzada; se reciben un total de 5 viajes de cada uno de 6m³.
El día de hoy se llevara a cabo el cómite N°3, correspondiente al cómite ejecutivo del mes de , en conjunto con personal de la junta, vecinos, contratista e Interventoría.

Resp. Contratista Ing. Residente

Interventoría.

19/06/2024. Clima: Lluvioso
Personal en Obra: Presidente Junta, Inspector Int, Maestro, Obreros.
Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador.

Sin actividades, no se pudo dar continuidad a las actividades de nivelación y posterior extensión de subbase debido a las fuertes lluvias presentadas el día de ayer en horas de la noche; el suelo se encuentra muy saturado, por lo que se esperara que se seque para seguir con estas faenas.


Resp. Contratista. Ing. Residente

Interventoría.

20/06/2024 Clima: Lluvioso
Personal en Obra: Presidente Junta, Inspector Int, Maestro, Obreros.
Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador.

El día de ayer 19 de Junio, se presentan nuevamente lluvias, por lo cual no se pueden adelantar actividades de nivelación ni riego de material.
Se deja claridad junto al Presidente de Obra que cualquier tipo de material que sea extendido y compactado sin previa autorización de él o Interventoría será asumido por la Junta
3:20pm, se presentan lluvias fuertes.

Powered by CamScanner

Resp. Contratista  Interventoría.

/2024 Clima:
Personal en Obra:
Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador

El día de ayer en horas de la tarde según nos da a conocer la presidenta de la junta, la sra Liliana Valencia, que se trajo un material tipo rajón; cabe anotar que en ningún momento el residente, el maestro o la interventoría pidió ese material, razón por la cual ese viaje no se tendrá en cuenta a la hora de los pagos puesto que es un material que no se utilizará, ni se autorizó.
De igual manera se deja registro de que cualquier actividad que sea llevada a cabo en la obra por personal de la junta, sale de responsabilidad del residente y de la inspección de interventoría, puesto que se había llegado a la decisión en conjunto con el residente que se pararían las actividades de nivelación y riego de material hasta que las condiciones del clima sean favorables.

/6/24 clima 
Personal en obra
equipo:
El día 21 de junio en horas de la tarde llego material a obra el cual no fue solicitado por el residente y no fue inspeccionado por interventoría. Se reitera a la representante legal de la JAC. que este material debe pasar todas las pruebas de laboratorio para su respectiva aprobación, de lo contrario debe ser retirado y remplazado, ya que se encuentra saturado, el día de hoy 22 de junio continuan con el suministro de Subbase el cual esta humedo y se aplico cemento para mejorar la calidad y que cumpla a lo hora de la toma de ensayo de laboratorio.

Resp. contratista.  interventoría.

6-24 clima
Personal en obra.
equipo:
Por parte de la JAC se realiza la instalacion de la valla informativa correspondiente al convenio 319, no se

realizan actividades en obra.

25-6-24 clima
Personal de obra.
equipo:
No se realizan actividades, la Maquinaria esta Presentado Fallas Mecanicas.

26-6-24 clima
No se realizan actividades Por Fallas de Maquinaria por Parte de Interventoria se realizo toma de densidades.

27-6-24 No se realizan actividades

28-6-24 clima Soleado lluviosa.
Personal de obra : Maestro., Inspector Interventoria,
equipo.
el dia de hoy se realizo trabajos Para la conFormacion de la subbase., tendido de material con la motoniveladora y compactacion, con ayuda del maestro se rectifico los niveles. se advierte que el material a cota mojado.

29-6-24 clima: Soleado - lluvioso.
Personal de obra: Maestro 3 Obreros. Ins. de interveto
equipo
Pa los condiciones climaticas que estan presentandose en el tramo a intervenir no se Puede continuar con las actividades debido a que el material suministrado se encuentra saturado. y en malas condiciones.

1-7-24 clima: Soleado - lluvioso.
Personal de obra: Maestro, 3 obreros, Ins Interventoria
equipo.
Pa las condiciones climaticas no se logra la compactacion al 100% de la subbase.

2-7-24 clima: Soleado.
Personal de obra: Maestro, Inspector Int. 3 Obreros
equipo.
Se realiza la compactacion de la subbase, se espera que el laboratorio llege a la obra a la toma de densidades, Por el Paro Presentado en el departamento se le dificulta desplazarse.

Powered by CamScanner

BITÁCORA EL SAUCE

3-06-2024 Lunes.

✓Clima: seco.
✓Equipo: Equipo necesario para construccion de canastillas.
✓Personal en obra: Ing. residente de obra, (2) Ayudantes, presidenta de la JAC, contadora.
✓ se continúa con la construccion de canastillas.
✓ Llegada de material a la obra.
- Tablo, canastillos, acero 3/8", 1/2", canecas para agua, alambre de amarre, malla electrosoldada, cemento, pintura de esmalte.

4-06-2024 Martes

✓Clima: seco.
✓Equipo: herramienta menor, volteadora.
✓Personal en obra: (1) maestro, (3) ayudantes, ing. residente de obra, contadora, presidente de la JAC, ing. inspectora interventoría.
✓ Se hace acopio de material (arena)
✓ Corte de acero para.

5-06-2024 Miércoles.

✓ Clima: dia seco- tarde nublado.
✓ Equipo: herramienta menor
✓ Personal en obra: (1) maestro, (3) ayudantes, ing. residente de obra, presencia de SST, contadora, ing. inspectora interventoría, presidente de la JAC
✓ Se realiza acopio de material (arena y triturado)
✓ Se chequean y reorganizan niveles.
✓ Se hace corte de madera para formaletas de la vía.
✓ Llegada de insumos.
✓ - 3 cilindros de ensayo
- 3 vigas de ensayo
- flota.
- Vibrador completo.
- 50 Tablas.
- 48 canastillas.
- 6 apisadores sueltos.
✓ Se presencia reunión de comité 3. Hora-4:Pm

6-06-2024 Jueves.

✓ Clima: seco - Tarde húmedo - lluviosa.
✓ Equipo: herramienta menor, pajarita, trompo, retroexcavadora
✓ Personal en obra: (1) Maestro, (6) Ayudantes, operario de de maquinaria, ing. residente de obra, contadora, ing. inspectora de

Scanned with ACE Scanner

interventoría ; presencia del presidente de la JAC.
✓ Se inicia formaleteo y fundición del eje izquierdo vía sauce - La Unión
✓ con rendimiento de 2 paños (2.6m x 3.5m) cada paño.
✓ Llegada de insumos. ✓ Se realizan 3 vigas de ensayo y 2 cilindros.
- 1 antisol
- 30 metros de plástico.
- 40 bultos de cemento Argos.
- 175 Kilos de chipa 1/4 (Ganchos)
- Perfil C18 pesado
✓ La máquina realiza acopio de material (arena- grava) para dejar espacio para proceder al formaleteo y posterior fundición.

7-06-2024 Viernes
✓ Clima : Seco.
✓ Equipo : herramienta menor, trompo, equipo necesario para realizar fundición de pavimento rígido.
✓ Personal en obra : (1) maestro, (5) Ayudantes, ing. residente de obra, contadora, ing. inspectora interventoría, presencia presidente de la JAC, presencia SST, presencia Ing. residente interventoría.
✓ Se continúa con formaleteo y fundición del eje izquierdo de la vía. Sauce- La Unión con un rendimiento de 5 paños (2.6m x 3.5m c/p) con una dosificación de 1: 2: 2,5

8-06-2024 Sábado.
✓ Clima : Seco
✓ Equipo : herramienta menor, equipo necesario para realizar fundición.
✓ Personal en obra : (1) maestro (6) Ayudantes, ing residente de obra. contadora, ing. inspectora de interventoría, presidente de la JAC.
✓ Se continúa con formaleteo y fundición del eje izq. vía Sauce- La Unión con un rendimiento de 3 paños (2.60 m x 3.50 m c/p)
✓ corte de dilatación. (juntas)

10-06-2024 Lunes.
✓ Clima : Seco.
✓ Equipo : herramienta menor, equipo necesario para realizar pavimento rígido.
✓ Personal en obra : (1) Maestro (4) Ayudantes, ing. residente de obra. contadora, presencia presidente de la JAC.
✓ Se continúa con formaleteo y fundición del eje izq. vía Sauce-Launión con un rendimiento de 5 paños (2.60m x 3.50m c/p)

11-06-2024 Martes.
Clima : Seco
✓ Equipo : herramienta menor, equipo necesario para realizar pav. rígido.
Equipo topográfico.

Scanned with ACE Scanner

✓ Personal en obra: (1) Maestro (2) Ayudantes, Ing residente de obra, Ing. inspectora de interventoría, contadora, presencia de presidente de la JAC, presencia de SST, cuadrilla topográfica
✓ Se continúa con formaleteo y fundición del carril izquierdo vía Sauce - La Unión con un rendimiento de 5 paños (2.60 x 3.50 m c/p) ✓ Descargue de 100 bultos de cemento.
✓ Se realiza corte de dilatación (juntas).

12-06-2024 Miércoles
✓ Clima: seco
✓ Equipo: herramienta menor, equipo necesario para realizar pavimento rígido
✓ Personal en obra: (1) Maestro (7) Ayudantes, Ing. residente de obra. Ing. inspectora de interventoría, contadora, presencia del presidente de la JAC
✓ Se continúa con formaleteo y fundición de carril izquierdo vía Sauce - La unión con un rendimiento de 6 paños (2.60 x 3.50 m c/p)
✓ Se realiza corte de juntas.

13-06-2024 Jueves.
✓ Clima: seco
✓ Equipo: herramienta menor, equipo necesario para realizar pavimento rígido
✓ Personal en obra: (1) maestro (8) Ayudantes, Ing. residente de obra, Ing. inspectora interventoría
✓ Se continúa con formaleteo y fundición de carril izquierdo vía sauce-La Unión con un rendimiento de 5 paños (2.60 x 3.50) c/p
✓ Llegada de cemento (80 bultos)

14-06-2024 Viernes.
✓ Clima: seco - nublado
✓ Equipo: herramienta menor, tiempo. equipo necesario para realizar pavimento rígido.
✓ Personal en obra: (1) maestro, 7 Ayudantes, ing residente de obra, presencia de SST, Ing. inspectora de interventoría.
✓ Se continua con la fundición y formaleteo de carril izquierdo vía Sauce - La Unión con rendimiento de 2 paños y una parte del sobrecancho de la vía.
✓ Se inicia formaleteo de bordillo con un alcance de 8.75 m.
✓ Se realiza corte de juntas.
✓

15-06-2
Sábado
17-06-2
Lunes
18-06-
Marte
19-06-
Miérc
20-0
Jueu
21-0
Vier
22-0
Sá
24-0
Lu
25-0
M
26-
M
27
2

Scanned with ACE Scanner

15-06-2024 Sábado
✓ Clima: Nublado
✓ Equipo: Herramienta menor, trompo, equipo necesario para realizar pavimento rigido.
✓ Personal en obra: (1) Maestro, (7) Ayudantes, ing. residente de obra, contadora, presencia de presidente de la JAC, Ing. inspectora de interventoría
✓ Se continúa y finaliza la fundición de carril izquierdo de la vía Sauce - Zo unión, la parte del sobreancho que hacía falta y se realiza fundición de 10.5 ml de bordillo.

17-06-2024 Lunes
✓ No hay novedades
Julieth Zúñiga G.

18-06-2024 Martes
✓ No hay novedades
Julieth Zúñiga G.

19-06-2024 Miércoles
✓ No hay novedades
Julieth Zúñiga G.

20-06-2024 Jueves
✓ No hay novedades
Julieth Zúñiga G.

21-06-2024 Viernes
✓ No hay novedades
Julieth Zúñiga G.

22-06-2024 Sábado
✓ No hay novedades
Julieth Zúñiga G.

24-06-2024 Lunes
✓ No hay novedades
Julieth Zúñiga G.

25-06-2024 Martes
✓ No hay novedades
Julieth Zúñiga G.

26-06-2024 Miércoles
✓ Clima: Seco
✓ Equipo: herramienta menor
✓ Personal en obra: (1) Maestro, (3) Ayudantes, ing residente de obra, ing. inspectora de interventoría.
✓ Se continúa con formaleteo y fundición de bordillo con un alcance de 24.5 ml
Julieth Zúñiga G.

27-06-2024 Jueves
✓ No hay Novedades
Julieth Zúñiga G.

28-06-2024 Viernes
✓ No hay novedades
Julieth Zúñiga G.

Scanned with ACE Scanner

BITÁCORA LLANO GRANDE

01/06/2024 Sábado	-No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez
03/06/2024. 04Lunes	-No hay novedades.	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez
04/06/2024 Martes	-No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez
05/06/2024 Miercoles	-No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez
06/06/2024 Jueves	- No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez
07/06/2024 Viernes	- No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez
08/06/2024 Sábado	- No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez
10/06/2024 Lunes	- No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez.
11/06/2024 Martes	- No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez
12/06/2024 Miercoles	- No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez.
13/06/2024 Jueves	- No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez.
14/06/2024 Viernes	- No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez
15/06/2024 Sábado	- No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez
17/06/2024 Lunes	- No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez
18/06/2024 Martes	-No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez.
19/06/2024 Miércoles	- No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G. Martinez.
20/06/2024 Jueves	- No hay novedades	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez.
21/06/2024 Viernes	-No hay novedades.	Julieth Zuñiga G.	Juan G Martinez.

Scanned with ACE Scanner

22/06/2024 Sábado - No hay novedades.

Julieth Zúñiga G. Juan G. Martinez

29/06/2024 Lunes. - Clima: Seco

- Personal en obra: (1) Maestro, (7) Ayudantes, Ing. residente de obra, Ing. inspector de interventoría.
- Equipo: Herramienta menor, vibrador de concreto, trompo, formaletas, elementos necesarios para realizar pavimento rígido, cortadora de pav
- Se inicia actividad de formaleteo y fundición de pavimento del carril derecho vía Llano Grande - La Unión con un rendimiento de 6 paños (70bultos) (de 3.5m x 2.5m) Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

25/06/2024 Martes - Clima = Mañana (Lluvioso), medio día (Nublado), tarde (Seco)

- Personal en obra: (1) Maestro, (7) ayudantes, Ing. residente de obra. Ing. inspector de interventoría, presencia de SST, la social, ing residente de interventoría.
- Equipo: herramienta menor, vibrador de concreto, trompo, formaletas, elementos necesarios para realizar pav. rígido; cortadora de pav.
- Se continúa con formaleteo y fundición de pav. del carril derecho vía Llano G. - La Unión. con un rendimiento de 6 paños (de 3.5m x 2.5m). (70bultos)
- Se realiza slum de ensayo para las respectivas muestras de resistencia (vigas)
- Se recibió 1 viaje de triturado
- Se realiza corte de juntas de la fundición del día anterior.

Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

26/06/2024 Miércoles - Clima: Seco

- Personal en obra: (1) maestro, (7) ayudantes, ing. residente de obra, ing. inspector de interventoría
- Equipo: herramienta menor, trompo, vibrador de concreto, formaletas, elementos necesarios para realizar pav. rígido; cortadora de pav.
- Se continúa con formaleteo y fundición de pav. del carril derecho vía Llano Grande - La Unión. con un rendimiento de 6 paños (de 3.50x 2.50m) (62 bultos de cemento) - Corte de juntas del día anterior.
- La bujía del trompo presenta fallas, por lo que se compra una nueva y esto causa retraso en la meta física del día.

Julieth Zúñiga Gomez. Juan G. Martinez.

Scanned with ACE Scanner

27/06/2024
Jueves

- Clima: Nublado.
- Personal en obra: (1) Maestro, (8) Ayudantes, ing. residente de obra, ing. inspector de interventoría, presencia de SST
- Equipo: herramienta menor, trompo, vibrador de concreto, formaletas, elementos necesarios para la fundición de pav. rígido; cortadora de pav.
- Se continúa con formaleteo y fundición de pav. rígido; carril derecho vía Llano G - La Unión con un rendimiento de 7 paños (de 3.50 x 2.50) y 69 bultos de cemento - Corte de juntas del día anterior.
- Se recibe 2 viajes de arena que cubican 6 m^3

Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

28/06/2024
Viernes

- Clima: Seco
- Personal en obra: (1) Maestro, (7) Ayudantes, Ing. residente de obra. Ing. inspectora de interventoría, operario de pajarita
- Equipo: herramienta menor, trompo, vibrador de concreto, formaletas, elementos necesarios para la fundición de pav. rígido, pajarita.
- Se continúa con formaleteo y fundición de pav. del carril derecho vía Llano G - La unión, con un rendimiento de 4 paños (de 3.50 x 2.50) y 44 bultos de cemento.
- Llegada de cemento cemex a las 10:00 am (120 bultos descargados)
- Llegada de cemento cemex a las 11:00 am (60 bultos descargados)
- El trompo presenta fallas a las 9:40, retrasa la obra
- Se realiza cambio de trompo por fallas en la bujía a las 2:40pm
- Acopio de material (arena) con pajarita.
- A Las 2:00 pm ingresan 2 ayudantes más a trabajar.
- Corte de juntas de la fundición del día anterior.

Julieth Zúñiga G. Juan G. Martinez

29/06/2024.
Sábado

- Clima: Seco
- Personal en obra: (1) Maestro, (8) Ayudantes, ing. residente de obra, Ing. inspectora de interventoría, presidenta de la asociación de las JAC.
- Equipo: herramienta menor, vibrador de concreto, trompo, formaletas - elementos necesarios para la fundición pav de rígido, cortadora de pav.
- Se continúa con formaleteo y fundición de pav. rígido del carril derecho vía Llano G.- La Unión, con un rendimiento de 3 paños (de 3.50m x 2.50m) y 33 bultos de cemento.

Julieth Zúñiga Gómez. Juan G. Martinez.

Scanned with ACE Scanner

01/07/2024 Lunes
- Clima: Seco
- Personal en obra: (1) Maestro (8) Ayudantes, ing. residente de obra, ing. inspector de interventoría.
- Equipo: herramienta menor, trompo, vibrador de concreto, formaletas, elementos necesarios para la fundición de pav. rígido, cortadora de pav.
- Se continúa y finaliza con formaleteo y fundición de pav del carril derecho vía Llano G- La unión, con un rendimiento de 8 paños de (3.50m x 2.50m) y corte de juntas de fundición del día anterior.
Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

02/07/2024 Martes
- Clima: Seco.
- Personal en obra: (1) Maestro, (1) Ayudante, ing. residente de obra. ing. inspectora de interventoría.
- Equipo: cortadora de pavimento
- Corte de juntas de la fundición del día anterior.
Julieth Zúñiga Gómez. Juan G Martinez

03/07/2024 Miércoles
- No hay novedades
Julieth Zúñiga G. Juan G martinez

04/07/2024 Jueves
- No hay novedades
Julieth Zúñiga G. Juan G martinez

05/07/2024 Viernes
- No hay novedades
Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

06/07/2024 Sábado
- No hay novedades
Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

08/07/2024 Lunes
- No hay novedades
Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

09/07/2024 Martes
- No hay novedades
Julieth Zúñiga G. Juan G martinez

10/07/2024 Miércoles
- No hay novedades
Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

11/07/2024 Jueves
- No hay novedades
Julieth Zúñiga G. Juan G martinez

12/07/2024 Viernes
- No hay novedades
Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

13/07/2024 Sábado
- No hay novedades
Julieth Zúñiga G. Juan G martinez

15/07/2024 Lunes
- No hay novedades
Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

Scanned with ACE Scanner

BITÁCORA QUIROZ ALTO

29-05-24 Miercoles
- clima: Lluvioso
- personal en obra: Residente, Inspector Inter., obrero
- Equipo: Herramienta menor
- se continuo realizando actividades de soldadura de canastillos

30-05-24 Jueves
- clima: seco
- personal en obra: Residente, Inspector Interv. Maestro de obra, 6 obreros
- Equipo: Soldadora, herramienta menor.
- se continúan actividades de soldadura de canastillos
- se Reciben cuatro viaje de recebo para relleno de de cajo y aletas de alcantarillo y para tapar la superficie del filtro

31-05-24 Viernes
- clima: seco
- personal en obra: Residente obra. Residente de Interven., Inspector de Inteven, Maestro de obra, 4 obreros
- Equipo: Herramienta menor
- Continuón actividades de soldadura de canastillos
- se termina de tapar todo la longitud del filtro con material

01-06-24 Sábado
- clima: seco
- personal en obra: Residente Obra, Inspector, 2 obreros
- Equipo: Alejadora, herramienta menor
- Continuón actividades de soldadura de canastillos
- se realizan actividades de corte y alleje de acero para pasadores y ganchos para bordillos.

03-06-24 Lunes
- clima: seco
- personal en obra: Residente de obra, Inspector, Operario motoniveladora, Operario Vibro compactador, Maestro de obra, operarios Volquetes
- Equipo: Motoniveladora, Vibro compactador, Volquetes, herramienta Me
- se realizan actividades de excorificación y reniveleción de Sub-Rasante.
- se suministran 23 viajes de material para la sub-base placas de los volquetes que hicieron los viajes: TOH-033, OFJ-726 LUB-487
- se procede a la conformación de la sub-base.

Powered by CamScanner

4-06-24
lartes
- clima: seco
- personal en obra: Residente, Inspector Interv, operario retroexcavadora Maestro de obra, Operario motoniveladora, operario vibrocompactador, 2 obreros
- Equipo: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, herramienta menor
- se continua con actividades de soldadura de conectillos
- se continuó con actividades de conformación de sub-base
- se encuentro material contaminado en la abscisa Km 0+95 y se procede a desalojar este material con ayuda de la retroexcavadora
-
- se realizo por otra parte la construcción de una caja para canalizar aguas procedentes de una vivienda ubicada al lado de la vía

5-06-24
rercoles
- clima: seco
- personal en obra: Residente, Inspector Inter; operarios de Motoniveladora, retroexcavadora, vibrocompactador, Maestro de obra
- Equipo: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora herramienta menor
- se continua con actividades de corte de acero para pasadores y ganchos para bordillo
- se continua con la conformación de la sub-base pero se encuentra una falla en la parte lateral donde termina el filtro de material barro, este material es retirado con la ayuda de la retroexcavadora, y se vuelve a rellenar con material de recebo, y se terminan actividades de conformación y compactación de sub-base

-06-24
ues
- clima: seco
- personal en obra: Residente de Obra, Inspector Inter, 1 obrero
- Equipo: herramienta menor
- Continuan actividades de corte de acero para pasadores y ganchos para bordillo.
-

-06-24
ernes
- clima: seco
- personal en obra: Residente, Inspectos, 1 obrero
- Equipo: herramienta menor
- Continuan actividades de corte de acero para pasadores y ganchos
dillo

Powered by CamScanner

08-06-24 Sábado
- Clima: Seco
- personal en obra: Residente, Inspector, 1 obrero
- Equipo: herramienta menor
- continúan actividades de corte de acero para pasadores y ganchos para bordillo

10-06-24 Lunes
- Clima: Seco
- personal en obra: Residente, Inspector, 1 obrero
- Equipo: herramienta menor
- Continúan actividades de corte de acero para pasadores y gancho para bordillo.

11-06-24 Martes
- Clima: Seco
- personal en obra: Inspector Inter, Topógrafo, 2 ayudantes
- Equipo: estación total, herramienta menor
- Por parte de interventoría se realizan actividades de topografía para corroborar y ratificar topografía anteriormente tomada.

12-06-24 Miércoles
- clima: seco
- personal en obra: Residente, Inspector Interven, 1 ayudante
- Equipo: Herramientas para tomar ensayos y muestras de densidades
- Se toman muestras en la abscisa K0+020 y en la abscisa K0+80, para sacar densidades.

13-06-24 Jueves
- clima: seco . personal en obra: Residente Inspector, Presidente JAC . Equipo: volqueta
- Se acopia material petreo (6 viajes de arena)

14-06-24 Viernes
- clima: Seco . personal en Obra: Residente, Inspector, Pre. JAC . Equipo: volqueta
- Acopio de material petreo (3 viajes triturado)

15-06-24 sábado
- clima: seco . personal en obra: Residente, Inspector, Presi. JAC . Equipo: Volqueta
- Acopio de material (1 viaje triturado)

Powered by CamScanner

7-06-24 lunes
- Clima: Seco
- Personal en obra: Residente, Inspector Interventoría, Maestro de obra 6 obreros
- Equipo: Trompo Mezclador, Vibrador de concreto, herramienta menor
- Se empieza con el armado de formaleta para iniciar con obra fundición de la losa de concreto rígido
- Se inicia con la fundición del concreto rígido
- Llegan dos viajes de cemento (total: 380 bultos de cemento)
- Se funden en total 3,36 m^3 de concreto rígido. (2 losas)

-06-24 orles
- clima: Seco
- personal en obra: Residente, Inspector Inter., Maestro de obra, 7 obreros
- Equipo: Trompo Mezclador, Vibrador de concreto, herramienta menor, cortadora
- Se arma formaleta para continuar con la fundición del concreto rígido y se prosigue con la fundición del mismo
- Se hace la instalación de la valla informativa del convenio
- Se termina con 6 losas fundidas (total: 10,08 m^3)
- Se toman muestras de vigas desde la abs. Ko+88 hasta la Ko+067

-06-24 Miércoles
- Clima: Seco
- personal en obra: Residente, Inspector Inter., Maestro de obra, 6 obreros
- Equipo: Trompo Mezclador, Vibrador de concreto, herramienta menor, cortadora
- Continúan trabajos de fundición de concreto rígido, 6 losas fundidas (total: 10,08 m^3)
- Se toman muestras de vigas para testigos
- Se hacen cortes transversales sobre el concreto

06/24 Jueves
- clima: lluvioso
- personal en obra: Residente, Inspectos Interventoría, Maestro de obra, 6 obreros
- Equipo: Mezcladora, Vibrador de concreto, herramienta menor, cortadora
- continúan trabajos de fundición de concreto rígido, en horas de la tarde (3:00 pm) se presenta lluvias leves, pero sin más novedades continuan con la fundición y cortes transversales de las losas fundidas anteriormente

Nicol Paola Flórez

Powered by CamScanner

21/06/24 Viernes
- clima: Seco
- personal en obra: Residente, Inspector, Maestro de obra, 7 obreros
- Equipo: Mezcladora, vibro-concreto, cortadora, H. menor
- continuan normalmente con la fundición del concreto rigido
- al finalizar con la fundición, el maestro hace los cortes transversales a los losas fundidos el dia anterior
- se funden en total 6 losas
- también se hace acopio de los bolsas de cemento, en octopos y son almacenados en la obodega del lugar.

Nicol Paola Muñoz

22/06/24 Sábado
- clima: Seco
- personal en obra: Residente, Inspector, Maestro de obra, 7 obreros
- Equipo: Mezcladora, vibro-concreto, cortadora, H. menor
- continuan con las actividades de fundición sin mayor novedades
- Se realizan los cortes transversales de las losas
- y se terminan con las actividades de fundición de concreto rigido del carril requerido. desde la Km000 a Km4+400

Nicol Paola Muñoz

24/06/24 Lunes — Sin Actividades

25/06/24 Martes — Sin Actividades

26/06/24 Miercoles — Sin Actividades

27/06/24 Jueves — Sin Actividades

28/06/24 Viernes
- clima: Seco
- personal en obra: Residente, Inspector Junior, Maestro de obra, 2 obreros
- Equipo: Herramienta menor
- Debido al paso de vehiculos con carga pesada se presentó un ahuellamiento en el carril derecho en la sub-base y con la ayuda de herramienta menor (picos) se escarifico el borde longitudinal que presentaba este ahuellamiento, debido a que el tramo es casi todo en tangentes

Powered by CamScanner

se necesita la ayuda de la retro-excavadora, pero el día de hoy no se pudo conseguir la maquinaria, entonces se continuara con la estabilización el día de mañana.

Nicol Paola Huaman

9/06/24. clima: seco

sábado
- personal en obra: Residente, Inspector Inter, operario retro-ex, Maestro de obra, 2 obreros. y operario volqueta
- Equipo: Retroexcavadora, H. menor, volqueta
- continua el trabajo de estabilización del material que presenta abultamiento por todo el lado longitudinal del carril derecho y se hace el retiro de este material con la retroexcavadora y una volqueta para el desalojo del mismo.

Nicol Paola Huaman

1/07/24 lunes
- clima: seco
- personal en obra: Residente, Inspector, operario volqueta, Maestro de obra, 2 obreros.
- Equipo: volqueta, Rana - compactadora, H. menor
- llego tres viajes de recebo para conformar la parte lateral de donde se saco el material de sub-base, y con la rana se procede a compactar.
- se termina de compactar todo el lado lateral del carril derecho.

Nicol Paola Huaman

/07/24 Sin actividades
/07/24 Sin actividades
/07/24 Sin actividades
/07/24 Sin Actividades
/07/24 Sin Actividades
3/07/24 Sin Actividades
4/07/24 Sin Actividades
5/07/24 Sin Actividades

Powered by CamScanner

BITÁCORA QUIROZ BAJO

28/05/24 Martes — No se presentaron actividades

29/05/24 Miércoles — No se presentaron actividades

30/05/24 Jueves — No se presentaron actividades

31/05/24 Viernes — No se presento actividades

3/06/24 Lunes — No se presentan actividades

04/06/24 Martes — No se presentan actividades

05/06/24 Miércoles — No se presentan actividades

06/06/24 Jueves — No se presentan actividades

07/06/24 Viernes — No se presentan actividades

08/06/24 Sábado — No se presenta actividades

10/06/24 Lunes — No se presentan actividades

11/06/24 Martes — No se presentan actividades

12/06/24 Miércoles
- Clima: seco
- Equipo: estación total, herramienta menor
- personal en obra: Inspector Interventoría, Residente, Topógrafo, y un ayudante
- por parte de la interventoría se realiza topografía para corroborar la topografía anteriormente presentada por el contratista

Powered by CamScanner

13/06/24 Jueves — No se realizaron actividades

14/06/24 Viernes — No se realizaron actividades

15/06/24 Sábado — No se presentaron actividades

17/06/24 Lunes — No se presentan actividades

18/06/24 Martes
- clima: seco
- personal en obra: Residente, Inspector, presidente de la JAC Quiroz Bajo y operario volqueta
- Equipo: Volquetas
- se realizan actividades de acopio de material
  triturado: 7
  Arena: 6

19/06/24 Miércoles
- clima: lluvioso
- personal en obra: Residente, Inspector, presidente de la JAC, Quiroz Bajo operario volqueta
- Equipo: Volquetas
- Continúan con el acopio de material petreo (arena, triturado)

viajes arena: 1 viajes triturado: 2

20/06/24 Jueves
- No se realizan actividades

21/06/24 Viernes
- clima: seco
- personal en obra: Residente, Inspectors, Presidente de la JAC, Contadora, Ma
- Se realiza el comite operativo # 3 a las 4:00 PM en la casa del señor Robinson Presidente de la JAC.

22/06/24 Sábado
- No se realizan Actividades

24/06/24 Lunes
- clima: seco
- Personal en obra: Residente, Inspectors, 10 obreros (soldados)
- Equipo: Cortadora de acero, soldadora, herramienta menor
- se realizan actividades de corte de acero para la elaboración de las canastillas y se instala la valla informativa del proyecto.

Powered by CamScanner

5/06/24 . clima: seco
antes
- personal en obra: Residente, Inspectors, Soldador, profesional social
- Equipo: cortadora de acero, soldadora, herramienta menor
- continúan con el corte de acero para canastillas
- Visita de la profesional social a la comunidad de Quiroz bajo

6/06/24 . clima: seco
Miercoles
- personal en obra: Residente de interventoria, personal de laboratorio encargado de tomar densidades, 1 obrero (soldador)
- Equipo: Equipos para la toma de densidades, cortadora, soldadora.
- se toman densidades por parte de interventoria
- continúan actividades de corte y soldadura de canastillas

7/06/24 . clima: seco
Jueves
- personal en obra: Residente, Inspector, 1 obrero (soldador)
- Equipo: cortadora de acero, soldadora, herramienta menor
- continúan actividades de corte y soldadura de canastillas

8/06/24 . clima: seco
Viernes
- personal en obra: Residente, Inspector, 1 obrero (soldador)
- Equipo: cortadora de acero, soldadora, herramienta menor
- se realizan actividades de corte y soldadura de canastillas

9/06/24 . clima: seco
Sábado
- personal en obra: Residente, Inspector, 1 obrero (soldador)
- Equipo: cortadora de acero, soldadora, herramienta menor
- se continúa realizando actividades de corte y soldadura de canastillas

1/07/24 . clima: seco
Lunes
- personal en obra: Residente, Inspector, 1 obrero (soldador)
- Equipo: cortadora de acero, soldadora, H. menor
- continuan trabajos de corte y soldadura de canastillas

Powered by CamScanner

INFORME CONTROL DE TOPOGRAFÍA POR INTERVENTORÍA

LLANO GRANDE

CONSORCIO MASO 10 NIT 901.782.848-1		INFORME ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA
CONTRATO DE INTERVETORÍA No. 5065-2023	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2
CONTRATO DE OBRA No.	OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANOGRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
	CONTRATISTA:	

INTRODUCCION

El presente informe de topografía corresponde al seguimiento y control realizado a las actividades ejecutadas por la interventoría CONSORCIO MASO-10 durante el periodo correspondiente al mes de Junio de 2024.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

TRAMO: Vereda Los LLANOGRANDE, en el Municipio de la Unión, Nariño.

Actividad 1:

Se realiza como primera actividad el replanteo del eje, para verificación de anchos de vía, se inicia desde el PR0+030 hasta el PR0+190, se ajusta el alineamiento horizontal para garantizar el ancho de la calzada, en el tramo comprendido desde el PR0+030 hasta PR0+050 con un acho de vía de 4.5m, y la curva con elemento del PI desde PR0+060 hasta PR0+110 y el PI 5 desde el PR0+150 hasta PR0+180 con un ancho de vía de 4.5m.

Actividad 2:

Se procede a sacar anchos de vía de 2.25m a todo el tramo desde el PR0+030 hasta PR0+190 para cada lado, con un ancho de 2.25m, después iniciamos con el chequeo de niveles del diseño, por lo cual se realiza unos ajustes para conservar el espesor de 0.20m de capa de subbase, se realiza la nivelación de la capa de subbase se recibe cotas de céreo y cartera de la misma con la cual se controla ejecución en campo de material.


Actividad 3:

Se recibe tramo de subbase del PR 0+030.00 - PR 0+190 con niveles de cartera de subbase.

Actividad 4:

Actividad 5:

REGISTRO FOTOGRAFICO

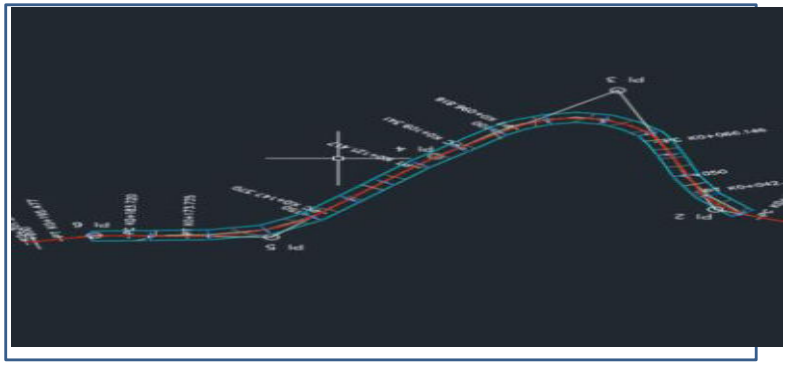











EQUIPO DE TOPOGRAFIA

EQUIPO	MARCA	MODELO	FECHA CALIBRACIÓN.
ESTACION TOTAL	CYGNUS KS-102	2019	07/06/2024

OBSERVACIONES /CONCLUSIONES

Elaboró: John Alexander Muñoz Pasaje
Topógrafo **Interventoría Consorcio MASO 10**

Revisó: Álvaro Aguirre Maya
Ingeniero Residente **Interventoría Consorcio MASO 10**

Reporte Volumen Sub-Base

CONSORCIO MASO 10-INTERVENTORIA INIVIAS

Grupo de líneas de muestreo: SECCIONES SUB-BASE

P.K. inicial: 0+030.00

P.K. final: 0+190.00

P.K. inicial ejecutado: 0+030.00

P.K. final ejecutado: 0+190.00

P.K.	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. neto acumul. (Metros cúbicos)
0+030.00	0.9	0	0
0+040.00	0.9	9.01	9.01
0+050.00	0.89	9	18.01
0+060.00	0.95	9.21	27.22
0+070.00	0.95	9.43	36.65
0+080.00	0.94	9.44	46.08
0+090.00	0.9	9.24	55.33
0+100.00	0.94	9.16	64.48
0+110.00	0.9	9.19	73.67
0+120.00	0.9	9.02	82.69
0+130.00	0.89	8.98	91.67
0+140.00	0.9	8.96	100.63
0+150.00	0.9	8.99	109.62
0+160.00	0.93	9.18	118.8
0+170.00	0.91	9.22	128.02
0+180.00	0.9	9.06	137.08
0+190.00	0.9	8.86	145.94

Vol Compacto Total desde PK. 0+095.60 - 0+242.00	145.94	m3
Vol Suelto F.C. 1.30% Total desde PK. 0+095.60 - 0+242.00	189.722	m3

Top. Interventotia

T.P. No: 01-20813

TOPTECH

Pasto, Junio 7 de 2024

Topógrafo:
Jesús Dorado

Pasto Nariño

Cordial saludo.

La estación total marca TOPCON modelo CYGNUS KS-102, número de serie HV4136, fue revisada y cumple con los parámetros del fabricante TOPCON y se encuentra en el rango de precisión, referente a las características técnicas para este modelo de instrumentos y en perfectas condiciones ópticas - mecánicas.

INSTRUMENTO DE VERIFICACION COLIMADOR KERN LEVEL GK 3245
DE ALTA PRECISIÓN (0.001 mm)

AUMENTO	30 X	OK
DIAMETRO DE OBJETIVO	40 mm	OK
COMPENSADOR	4´/0.5´´	OK
SENSIBILIDAD NIVEL ESFERICO	40´´/1div	OK
NIVEL ELECTRONICO	(1´´)	OK
PRECISION HZ,V(ISO17123-3)	2´´/5CC	OK
ALCANCE	2300 MTS	OK
MINIPRISMA	1200 MTS	OK
PRECISION DE MEDIDAS:	A 300M,A1000M =+/- 0.002mm	OK
MODO ESTANDAR	±(2mm+2ppmxD)mm	OK
MOTORIZACIÓN: V. DE GIRO	50 gon/seg	OK
MEMORIA INTERNA	24000 Bloques	OK
PLOMADA OPTICA		OK
AUXILIAR DE PUNTERIA: RANGO DE TRABAJO: PRECISION:	 5 a 150 mts. 5cm a 100 mts.	OK

PERIODO PROMEDIO ÓPTIMO DE VERIFICACIÓN CALIBRACIÓN

Fecha de verificación:	07 / 06 / 2024
Próxima verificación calibración:	06 / 12 / 2024

Se realizaron los procesos de prueba de acuerdo a los parámetros técnicos, dando un certificado de calibración y verificación por una duración de 6 meses.

Att:

CARLOS ALEJANDRO CITELY V.
C.C. 98385507
Técnico en Instrumentos Topográficos e Ingeniería
Tecnologo en topográfia CESMAG MP 01-16527 C.P.N.T

TOPTECH CALIBRACIÓN

Calle 12 No 17-177 Av. Boyacá 3122441362 - 3164033688

NUEVA FLORIDA

CONSORCIO MASO 10 NIT 901.782.848-1		INFORME ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA
CONTRATO DE INTERVETORÍA No. 5065-2023	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2
CONTRATO DE OBRA No.	OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORDA DEL MUNICIPIO DE LA SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
	CONTRATISTA:	

INTRODUCCION

El presente informe de topografía corresponde al seguimiento y control realizado a las actividades ejecutadas por la interventoría CONSORCIO MASO-10 durante el periodo correspondiente al mes de Junio de 2024.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

TRAMO: Vereda Nueva Florida, en el Municipio de San Pablo Nariño.

Actividad 1:

Se inicia con la búsqueda de las placas GPS del proyecto, lo cual se evidencia que al pasar la motoniveladora las mueve, por lo cual se adopta iniciar con un levantamiento topográfico arbitrario, pero conservando las cotas de las placas, para tener con algún desface de altimetría.

Actividad 2:

Se continua con la siguiente actividad, con la verificación de anchos de vía de 2.2m para cada lado, se aprecia que hay unas estacas en campo que están a una referencia del eje de diseño, se va por cada ABS del corredor sacando anchos de vía, desde la PR0+000 hasta el PR0+180

Actividad 3:

Se realiza el chequeo de la capa de Subbase de espesor de 0.15m en todo el corredor para obtener las carteras topográficas y así realizar el chequeo de volumen instalado en campo.

Actividad 4:

Se recibe tramo de subbase del PR 0+000 - PR 0+180 con niveles de subbase.

Actividad 5:

REGISTRO FOTOGRAFICO













EQUIPO DE TOPOGRAFIA

EQUIPO	MARCA	MODELO	FECHA CALIBRACIÓN.
ESTACION TOTAL	CYGNUS KS-102	2019	07/06/2024

OBSERVACIONES /CONCLUSIONES

Por las fuertes lluvias se presencio en el corredor que en los bordes hay segregación de material y algunos puntos con erosiones del material.

Elaboró: John Alexander Muñoz Pasaje
Topógrafo **Interventoría Consorcio MASO 10**

Revisó: Álvaro Aguirre Maya
Ingeniero Residente **Interventoría Consorcio MASO 10**

Reporte Volumen Sub-Base

CONSORCIO MASO 10-INTERVENTORIA INIVIAS

Grupo de líneas de muestreo: SECCIONES SUB-BASE

P.K. inicial: 0+000.00

P.K. final: 0+181.39

P.K. inicial ejecutado: 0+000.00

P.K. final ejecutado: 0+181.39

P.K.	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. neto acumul. (Metros cúbicos)
0+000.00	0.66	0	0
0+010.00	0.66	6.61	6.61
0+020.00	0.66	6.59	13.2
0+030.00	0.65	6.6	19.8
0+040.00	0.66	6.57	26.36
0+050.00	0.66	6.61	32.97
0+060.00	0.65	6.58	39.56
0+070.00	0.65	6.54	46.09
0+080.00	0.62	6.34	52.43
0+090.00	0.65	6.34	58.78
0+100.00	0.64	6.54	65.31
0+110.00	0.65	6.58	71.89
0+120.00	0.62	6.39	78.28
0+130.00	0.64	6.34	84.62
0+140.00	0.66	6.53	91.15
0+150.00	0.65	6.54	97.69
0+160.00	0.65	6.48	104.16
0+170.00	0.64	6.42	110.58
0+180.00	0.56	5.98	116.57
0+181.39	0	0.39	116.95

Vol Compacto Total desde PK. 0+000.00 - 0+181.39	116.95	m3
Vol Suelto F.C. 1.30% Total desde PK. 0+000.00 - 0+181.39	152.035	m3



Top. Interventotia

T.P. No: 01-20813

TOPTECH

Pasto, Junio 7 de 2024

Topógrafo:
Jesús Dorado

Pasto Nariño

Cordial saludo.

La estación total marca TOPCON modelo CYGNUS KS-102, número de serie HV4136, fue revisada y cumple con los parámetros del fabricante TOPCON y se encuentra en el rango de precisión, referente a las características técnicas para este modelo de instrumentos y en perfectas condiciones ópticas - mecánicas.

INSTRUMENTO DE VERIFICACION COLIMADOR KERN LEVEL GK 3245
DE ALTA PRECISIÓN (0.001 mm)

AUMENTO	30 X	OK
DIAMETRO DE OBJETIVO	40 mm	OK
COMPENSADOR	4´/0.5´´	OK
SENSIBILIDAD NIVEL ESFERICO	40´´/1div	OK
NIVEL ELECTRONICO	(1´´)	OK
PRECISION HZ,V(ISO17123-3)	2´´/5CC	OK
ALCANCE	2300 MTS	OK
MINIPRISMA	1200 MTS	OK
PRECISION DE MEDIDAS:	A 300M,A1000M =+/- 0.002mm	OK
MODO ESTANDAR	±(2mm+2ppmxD)mm	OK
MOTORIZACIÓN: V. DE GIRO	50 gon/seg	OK
MEMORIA INTERNA	24000 Bloques	OK
PLOMADA OPTICA		OK
AUXILIAR DE PUNTERIA: RANGO DE TRABAJO: PRECISION:	 5 a 150 mts. 5cm a 100 mts.	OK

PERIODO PROMEDIO ÓPTIMO DE VERIFICACIÓN CALIBRACIÓN

Fecha de verificación:	07 / 06 / 2024
Próxima verificación calibración:	06 / 12 / 2024

Se realizaron los procesos de prueba de acuerdo a los parámetros técnicos, dando un certificado de calibración y verificación por una duración de 6 meses.

Att:

CARLOS ALEJANDRO CITELY V.
C.C. 98385507
Técnico en Instrumentos Topográficos e Ingeniería
Tecnologo en topográfia CESMAG MP 01-16527 C.P.N.T

TOPTECH CALIBRACIÓN

Calle 12 No 17-177 Av. Boyacá 3122441362 - 3164033688

OLIVOS

CONSORCIO MASO 10 NIT 901.782.848-1		INFORME ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA
CONTRATO DE INTERVETORÍA No. 5065-2023	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2
CONTRATO DE OBRA No.	OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
	CONTRATISTA:	

INTRODUCCION

El presente informe de topografía corresponde al seguimiento y control realizado a las actividades ejecutadas por la interventoría CONSORCIO MASO-10 durante el periodo correspondiente al mes de Junio de 2024.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

TRAMO: Vereda Los Olivos, en el Municipio de la Union Nariño.

Actividad 1:

Se realiza como primera actividad el replanteo del eje, para verificación de anchos de vía, se inicia desde el PR0+000 hasta el PR0+199.89, se observa que el eje del diseño esta desplazado por lo tanto se realiza algunas modificación del eje horizontal, se tiene como puntos fijos paramentos de casa para dar mejor alineamiento para garantizar el ancho de la calzada de 5m.

Actividad 2:

Se continua con la siguiente actividad, con la verificación de anchos de vía de 2.5m para cada lado, se aprecia que hay unas estacas en campo que están a una referencia del eje de diseño, se va por cada ABS del corredor sacando anchos de vía, desde la PR0+000 hasta el PR0+199.89

Actividad 3:

Se realiza el chequeo de la capa de Subbase de espesor de 0.15m en todo el corredor para obtener las carteras topográficas y así realizar el chequeo de volumen instalado en campo.


Actividad 4:


Se recibe tramo de subbase del PR 0+000 - PR 0+199.89 con niveles de subbase.

Actividad 5:

REGISTRO FOTOGRAFICO



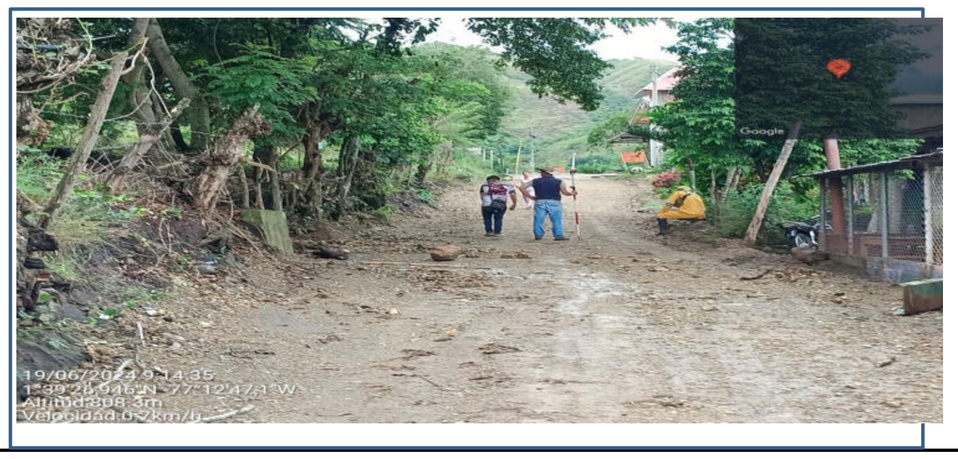

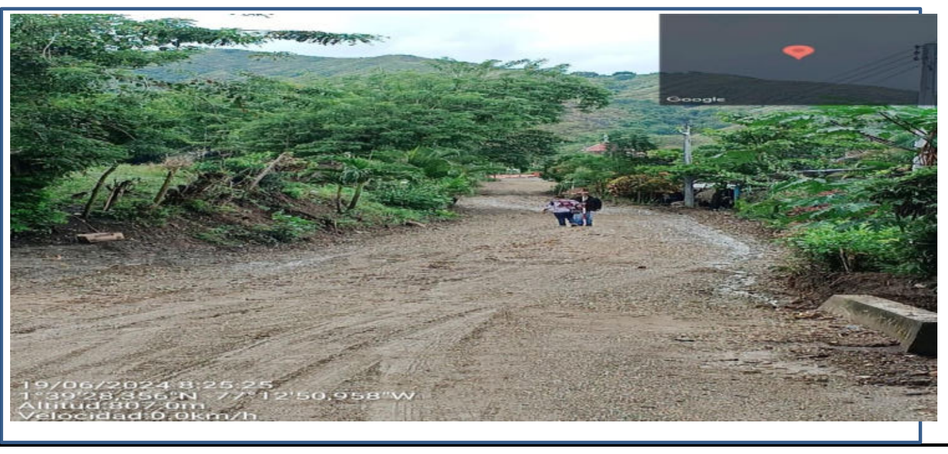







EQUIPO DE TOPOGRAFIA

EQUIPO	MARCA	MODELO	FECHA CALIBRACIÓN.
ESTACION TOTAL	CYGNUS KS-102	2019	07/06/2024

OBSERVACIONES /CONCLUSIONES

En la madrugada del dia 19 de junio, cae una fuerte lluvia lo cual como se aprecia en el registro fotografico, se observa arena, algunas rocas y un poco segregado el material subbase granular.

Elaboró: John Alexander Muñoz Pasaje
Topógrafo **Interventoría Consorcio MASO 10**

Revisó: Álvaro Aguirre Maya
Ingeniero Residente **Interventoría Consorcio MASO 10**

Reporte Volumen Sub-Base

CONSORCIO MASO 10-INTERVENTORIA INIVIAS

Grupo de líneas de muestreo: SECCIONES SUB-BASE

P.K. inicial: 0+000.00

P.K. final: 0+199.89

P.K. inicial ejecutado: 0+000.00

P.K. final ejecutado: 0+199.89

P.K.	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)
0+001.14	0.64	0	0
0+010.00	0.75	6.13	6.13
0+020.00	0.75	7.48	13.61
0+030.00	0.71	7.29	20.9
0+040.00	0.73	7.17	28.07
0+050.00	0.74	7.33	35.4
0+060.00	0.72	7.29	42.69
0+070.00	0.74	7.3	49.99
0+080.00	0.73	7.36	57.35
0+090.00	0.74	7.36	64.71
0+100.00	0.75	7.45	72.17
0+110.00	0.74	7.43	79.6
0+120.00	0.76	7.5	87.1
0+130.00	0.75	7.56	94.66
0+140.00	0.74	7.45	102.11
0+150.00	0.76	7.48	109.6
0+160.00	0.75	7.53	117.12
0+170.00	0.8	7.77	124.89
0+180.00	0.6	7.02	131.91
0+190.00	0.45	5.22	137.14
0+199.89	0.31	3.71	140.85

Vol Compacto Total desde PK. 0+000.00 - 0+199.89	140.85	m3
Vol Suelto F.C. 1.30% Total desde PK. 0+000.00 - 0+199.89	183.105	m3

Top. Interventotia

T.P. No: 01-20813

TOPTECH

Pasto, Junio 7 de 2024

Topógrafo:
Jesús Dorado

Pasto Nariño

Cordial saludo.

La estación total marca TOPCON modelo CYGNUS KS-102, número de serie HV4136, fue revisada y cumple con los parámetros del fabricante TOPCON y se encuentra en el rango de precisión, referente a las características técnicas para este modelo de instrumentos y en perfectas condiciones ópticas - mecánicas.

INSTRUMENTO DE VERIFICACION COLIMADOR KERN LEVEL GK 3245
DE ALTA PRECISIÓN (0.001 mm)

AUMENTO	30 X	OK
DIAMETRO DE OBJETIVO	40 mm	OK
COMPENSADOR	4´/0.5´´	OK
SENSIBILIDAD NIVEL ESFERICO	40´´/1div	OK
NIVEL ELECTRONICO	(1´´)	OK
PRECISION HZ,V(ISO17123-3)	2´´/5CC	OK
ALCANCE	2300 MTS	OK
MINIPRISMA	1200 MTS	OK
PRECISION DE MEDIDAS:	A 300M,A1000M =+/- 0.002mm	OK
MODO ESTANDAR	±(2mm+2ppmxD)mm	OK
MOTORIZACIÓN: V. DE GIRO	50 gon/seg	OK
MEMORIA INTERNA	24000 Bloques	OK
PLOMADA OPTICA		OK
AUXILIAR DE PUNTERIA: RANGO DE TRABAJO: PRECISION:	 5 a 150 mts. 5cm a 100 mts.	OK

PERIODO PROMEDIO ÓPTIMO DE VERIFICACIÓN CALIBRACIÓN

Fecha de verificación:	07 / 06 / 2024
Próxima verificación calibración:	06 / 12 / 2024

Se realizaron los procesos de prueba de acuerdo a los parámetros técnicos, dando un certificado de calibración y verificación por una duración de 6 meses.

Att:

CARLOS ALEJANDRO CITELY V.
C.C. 98385507
Técnico en Instrumentos Topográficos e Ingeniería
Tecnologo en topográfia CESMAG MP 01-16527 C.P.N.T

TOPTECH CALIBRACIÓN

Calle 12 No 17-177 Av. Boyacá 3122441362 - 3164033688

QUIROZ ALTO

CONSORCIO MASO 10 NIT 901.782.848-1		INFORME ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA
CONTRATO DE INTERVETORÍA No. 5065-2023	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2
CONTRATO DE OBRA No.	OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
	CONTRATISTA:	

INTRODUCCION

El presente informe de topografía corresponde al seguimiento y control realizado a las actividades ejecutadas por la interventoría CONSORCIO MASO-10 durante el periodo correspondiente al mes de Junio de 2024.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

TRAMO: Vereda Los QUIROZ ALTO, en el Municipio de la Unión, Nariño.

Actividad 1:

Se realiza como primera actividad el replanteo del eje, para verificación de anchos de vía, se inicia desde el PR0+000 hasta el PR0+150, se observa que el eje del diseño esta desplazado por lo se realiza algunas modificación del eje para garantizar el ancho de la calzada de 4.80m

Actividad 2:

Se procede a sacar anchos de vía de 2.4m para cada lado desde el PR0+000 hasta el PR0+150, después iniciamos con el chequeo de niveles del diseño, por lo cual se realiza unos ajustes para conservar el espesor de 0.20m de capa de subbase, se realiza la nivelación de la capa de subbase se recibe cotas de céreo y cartera de la misma con la cual se controla ejecución en campo de material.

Actividad 3:


El ajuste del eje horizontal en los PR0+020, PR0+050 al PR0+110, esta condición se da por el desplazamiento del eje al costado izquierdo ya que hacia el costado derecho se tiene la estabilidad del talud,.

Actividad 4:

Se recibe tramo de subbase del PR 0+000 - PR 0+130 con niveles de cartera de subbase, y desde el PR0+135 a PR0+150 con espesor promedio de 0.10m

Actividad 5:

REGISTRO FOTOGRAFICO

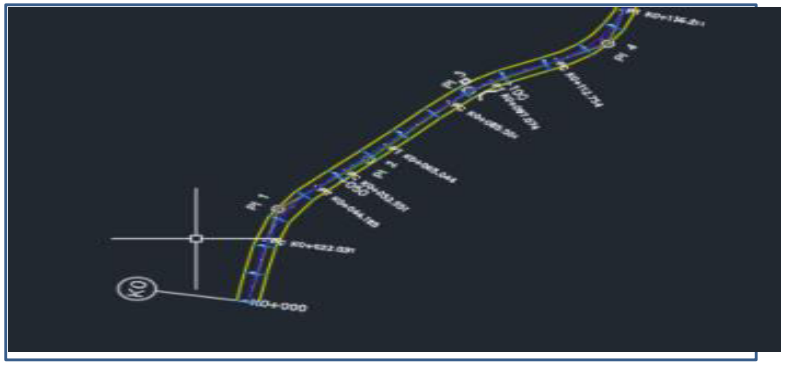











EQUIPO DE TOPOGRAFIA

EQUIPO	MARCA	MODELO	FECHA CALIBRACIÓN.
ESTACION TOTAL	CYGNUS KS-102	2019	07/06/2024

OBSERVACIONES /CONCLUSIONES

Elaboró: John Alexander Muñoz Pasaje
Topógrafo **Interventoría Consorcio MASO 10**

Revisó: Álvaro Aguirre Maya
Ingeniero Residente **Interventoría Consorcio MASO 10**

Reporte Volumen Sub-Base

CONSORCIO MASO 10-INTERVENTORIA INIVIAS

Grupo de líneas de muestreo: SECCIONES SUB-BASE

P.K. inicial: 0+000.00

P.K. final: 0+150.11

P.K. inicial ejecutado: 0+000.00

P.K. final ejecutado: 0+150.11

P.K.	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. neto acumul. (Metros cúbicos)
0+000.00	0.91	0	0
0+010.00	0.96	9.38	9.38
0+020.00	0.96	9.64	19.02
0+030.00	0.96	9.63	28.65
0+040.00	0.95	9.58	38.24
0+050.00	0.96	9.56	47.8
0+060.00	0.98	9.7	57.5
0+070.00	0.98	9.81	67.31
0+080.00	0.96	9.7	77.01
0+090.00	0.96	9.59	86.6
0+100.00	1	9.79	96.39
0+110.00	0.98	9.89	106.28
0+120.00	0.96	9.68	115.96
0+130.00	0.96	9.58	125.54
0+140.00	0.19	5.75	131.28
0+150.00	0.18	1.86	133.14
0+150.11	0.18	0.02	133.16

Vol Compacto Total desde PK. 0+000.00 - 0+150.11	133.16	m3
Vol Suelto F.C. 1.30% Total desde PK. 0+000.00 - 0+150.11	173.108	m3

Top. Interventotia

T.P. No: 01-20813

TOPTECH

Pasto, Junio 7 de 2024

Topógrafo:
Jesús Dorado

Pasto Nariño

Cordial saludo.

La estación total marca TOPCON modelo CYGNUS KS-102, número de serie HV4136, fue revisada y cumple con los parámetros del fabricante TOPCON y se encuentra en el rango de precisión, referente a las características técnicas para este modelo de instrumentos y en perfectas condiciones ópticas - mecánicas.

INSTRUMENTO DE VERIFICACION COLIMADOR KERN LEVEL GK 3245
DE ALTA PRECISIÓN (0.001 mm)

AUMENTO	30 X	OK
DIAMETRO DE OBJETIVO	40 mm	OK
COMPENSADOR	4´/0.5´´	OK
SENSIBILIDAD NIVEL ESFERICO	40´´/1div	OK
NIVEL ELECTRONICO	(1´´)	OK
PRECISION HZ,V(ISO17123-3)	2´´/5CC	OK
ALCANCE	2300 MTS	OK
MINIPRISMA	1200 MTS	OK
PRECISION DE MEDIDAS:	A 300M,A1000M =+/- 0.002mm	OK
MODO ESTANDAR	±(2mm+2ppmxD)mm	OK
MOTORIZACIÓN: V. DE GIRO	50 gon/seg	OK
MEMORIA INTERNA	24000 Bloques	OK
PLOMADA OPTICA		OK
AUXILIAR DE PUNTERIA: RANGO DE TRABAJO: PRECISION:	 5 a 150 mts. 5cm a 100 mts.	OK

PERIODO PROMEDIO ÓPTIMO DE VERIFICACIÓN CALIBRACIÓN

Fecha de verificación:	07 / 06 / 2024
Próxima verificación calibración:	06 / 12 / 2024

Se realizaron los procesos de prueba de acuerdo a los parámetros técnicos, dando un certificado de calibración y verificación por una duración de 6 meses.

Att:

CARLOS ALEJANDRO CITELY V.
C.C. 98385507
Técnico en Instrumentos Topográficos e Ingeniería
Tecnologo en topográfia CESMAG MP 01-16527 C.P.N.T

TOPTECH CALIBRACIÓN

Calle 12 No 17-177 Av. Boyacá 3122441362 - 3164033688

QUIROZ BAJO

CONSORCIO MASO 10 NIT 901.782.848-1		INFORME ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA
CONTRATO DE INTERVETORÍA No. 5065-2023	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2
CONTRATO DE OBRA No.	OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
	CONTRATISTA:	

INTRODUCCION

El presente informe de topografía corresponde al seguimiento y control realizado a las actividades ejecutadas por la interventoría CONSORCIO MASO-10 durante el periodo correspondiente al mes de Junio de 2024.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

TRAMO: Vereda Los QUIROZ BAJO, en el Municipio de la Unión, Nariño.

Actividad 1:

Se realiza como primera actividad el replanteo del eje, para verificación de anchos de vía, se inicia desde el PR0+080 hasta el PR0+245, se observa que el eje del diseño esta desplazado por lo se realiza algunas modificación del eje para garantizar el ancho de la calzada, desde el PR0+080 hasta PR0+130 con un acho de via de 4.5m, desde PR0+130 hasta PR0+235 con un ancho de via de 5m y el PR0+235 hasta PR0+242 con un ancho de via de 4.5m.

Actividad 2:

Se procede a sacar anchos de vía de 2.25m desde el PR0+080 hasta PR0+130 para cada lado, desde el PR0+130 hasta PR0+235 2.5m y desde el PR0+235 hasta el PR0+242 con un ancho de 2.25m, después iniciamos con el chequeo de niveles del diseño, por lo cual se realiza unos ajustes para conservar el espesor de 0.20m de capa de subbase, se realiza la nivelación de la capa de subbase se recibe cotas de céreo y cartera de la misma con la cual se controla ejecución en campo de material.

Actividad 3:

Se ajusta el eje horizontal en los PR0+080 hasta el PR0+110, se realiza un ajuste al PI 4 y PI 6 esta condición se da por la silueta de los bordes de via existentes.

Actividad 4:

Se recibe tramo de subbase del PR 0+095.60 - PR 0+242 con niveles de cartera de subbase, pero la instalacion de material granular de subbase se encuentra desde el PR0+080 a PR0+245.

Actividad 5:

REGISTRO FOTOGRAFICO












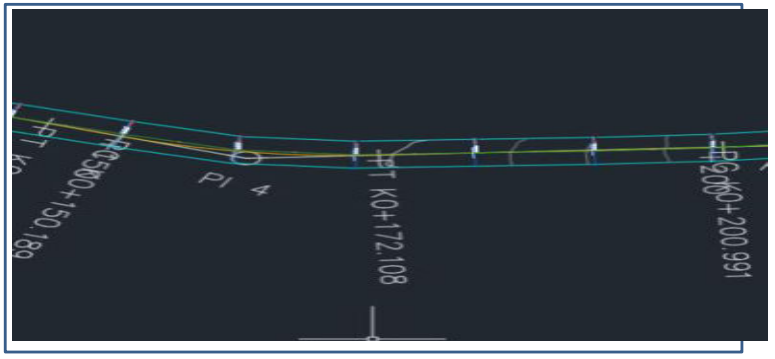

EQUIPO DE TOPOGRAFIA

EQUIPO	MARCA	MODELO	FECHA CALIBRACIÓN.
ESTACION TOTAL	CYGNUS KS-102	2019	07/06/2024

OBSERVACIONES /CONCLUSIONES

Elaboró: John Alexander Muñoz Pasaje
Topógrafo **Interventoría Consorcio MASO 10**

Revisó: Álvaro Aguirre Maya
Ingeniero Residente **Interventoría Consorcio MASO 10**

Reporte Volumen Sub-Base

CONSORCIO MASO 10-INTERVENTORIA INIVIAS

Grupo de líneas de muestreo: SECCIONES SUB-BASE

P.K. inicial: 0+080.00

P.K. final: 0+245.00

P.K. inicial ejecutado: 0+095.60

P.K. final ejecutado: 0+242.00

P.K.	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. neto acumul. (Metros cúbicos)
0+080.00	0.9	0	0
0+095.60	0.9	9.01	9.01
0+100.00	0.9	9	18
0+110.00	0.9	8.98	26.99
0+120.00	0.89	8.95	35.94
0+130.00	1.01	9.5	45.44
0+140.00	1.04	10.25	55.69
0+150.00	1.04	10.41	66.09
0+160.00	1.04	10.4	76.5
0+170.00	0.99	10.19	86.69
0+180.00	0.99	9.95	96.64
0+190.00	0.99	9.91	106.55
0+200.00	1	9.92	116.47
0+210.00	0.99	9.92	126.38
0+220.00	1	9.94	136.32
0+230.00	0.97	9.88	146.2
0+240.00	0.86	9.17	155.37
0+242.00	0.77	4.22	159.59

Vol Compacto Total desde PK. 0+095.60 - 0+242.00	159.59	m3
Vol Suelto F.C. 1.30% Total desde PK. 0+095.60 - 0+242.00	207.467	m3

Top. Interventotia

T.P. No: 01-20813

TOPTECH

Pasto, Junio 7 de 2024

Topógrafo:
Jesús Dorado

Pasto Nariño

Cordial saludo.

La estación total marca TOPCON modelo CYGNUS KS-102, número de serie HV4136, fue revisada y cumple con los parámetros del fabricante TOPCON y se encuentra en el rango de precisión, referente a las características técnicas para este modelo de instrumentos y en perfectas condiciones ópticas - mecánicas.

INSTRUMENTO DE VERIFICACION COLIMADOR KERN LEVEL GK 3245
DE ALTA PRECISIÓN (0.001 mm)

AUMENTO	30 X	OK
DIAMETRO DE OBJETIVO	40 mm	OK
COMPENSADOR	4´/0.5´´	OK
SENSIBILIDAD NIVEL ESFERICO	40´´/1div	OK
NIVEL ELECTRONICO	(1´´)	OK
PRECISION HZ,V(ISO17123-3)	2´´/5CC	OK
ALCANCE	2300 MTS	OK
MINIPRISMA	1200 MTS	OK
PRECISION DE MEDIDAS:	A 300M,A1000M =+/- 0.002mm	OK
MODO ESTANDAR	±(2mm+2ppmxD)mm	OK
MOTORIZACIÓN: V. DE GIRO	50 gon/seg	OK
MEMORIA INTERNA	24000 Bloques	OK
PLOMADA OPTICA		OK
AUXILIAR DE PUNTERIA: RANGO DE TRABAJO: PRECISION:	 5 a 150 mts. 5cm a 100 mts.	OK

PERIODO PROMEDIO ÓPTIMO DE VERIFICACIÓN CALIBRACIÓN

Fecha de verificación:	07 / 06 / 2024
Próxima verificación calibración:	06 / 12 / 2024

Se realizaron los procesos de prueba de acuerdo a los parámetros técnicos, dando un certificado de calibración y verificación por una duración de 6 meses.

Att:

CARLOS ALEJANDRO CITELY V.
C.C. 98385507
Técnico en Instrumentos Topográficos e Ingeniería
Tecnologo en topográfia CESMAG MP 01-16527 C.P.N.T

TOPTECH CALIBRACIÓN

Calle 12 No 17-177 Av. Boyacá 3122441362 - 3164033688

EL SAUCE

CONSORCIO MASO 10 NIT 901.782.848-1		INFORME ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA
CONTRATO DE INTERVETORÍA No. 5065-2023	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2
CONTRATO DE OBRA No.	OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
	CONTRATISTA:	

INTRODUCCION

El presente informe de topografía corresponde al seguimiento y control realizado a las actividades ejecutadas por la interventoría CONSORCIO MASO-10 durante el periodo correspondiente al mes de Junio de 2024.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

TRAMO: Vereda Los Sauces, en el Municipio de la Union, Nariño.

Actividad 1:

Se realiza un ajuste de los PI del diseño horizontal del diseño geométrico, se ajusta el PI 2 y PI 3, hacia el costado derecho de la calzada, así garantizando la estabilidad del borde izquierdo de la vía, así mismo se ajusta el PI 3 de la curva para garantizar un sobre ancho interno del borde derecho en transicion de la curva. desde el PR 0+125-PR0+145.

Actividad 2:

Se realiza la nivelación de la capa de subbase para corregir baches en céreo de subbase, Se coloca eje para formaleta de calzada. Recibe cotas de céreo y cartera de la misma con la cual se controla ejecución en campo de material de sub base.

Actividad 3:

Se inspecciona anchos de via que cumplan con los anchos del diseño geometrico, el cual cumple con el ancho de 5m

Actividad 4:

Se recibe tramo de subbase del PR 0+030 - PR 0+210 niveles de cartera.

Actividad 5:

REGISTRO FOTOGRAFICO












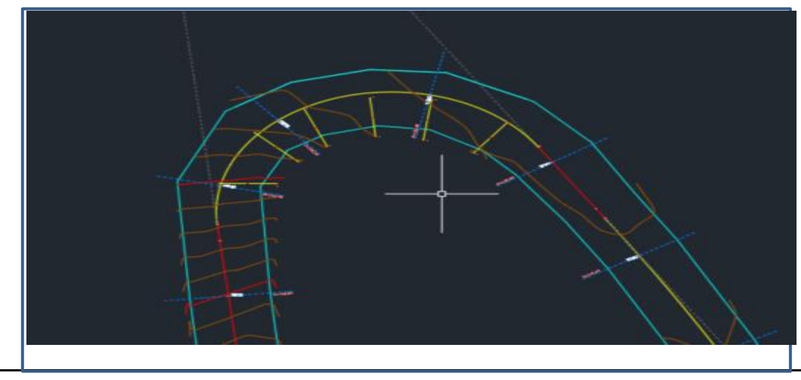

EQUIPO DE TOPOGRAFIA

EQUIPO	MARCA	MODELO	FECHA CALIBRACIÓN.
ESTACION TOTAL	CYGNUS KS-102	2019	07/06/2024

OBSERVACIONES /CONCLUSIONES

Elaboró: John Alexander Muñoz Pasaje
Topógrafo **Interventoria Consorcio MASO 10**

Revisó: Alvaro Aguirre Maya
Ingeniero Residente **Interventoria Consorcio MASO 10**

Reporte Volumen Sub-Base

CONSORCIO MASO 10-INTERVENTORIA INIVIAS

Grupo de líneas de muestreo: SECCIONES SUB-BASE

P.K. inicial: 0+030.00

P.K. final: 0+210.00

P.K. inicial ejecutado: 0+030.00

P.K. final ejecutado: 0+210.00

P.K.	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)	Vol. neto acumul. (Metros cúbicos)
0+020.00	0	0	0
0+030.00	1	4.97	4.97
0+040.00	1.1	10.45	15.41
0+050.00	1.04	10.69	26.11
0+060.00	1.03	10.33	36.44
0+070.00	1.03	10.32	46.76
0+080.00	1.04	10.35	57.11
0+090.00	1.04	10.37	67.48
0+100.00	1.02	10.3	77.79
0+110.00	1.14	10.8	88.59
0+120.00	1.14	11.38	99.97
0+130.00	1.22	11.46	111.44
0+140.00	1.31	11.85	123.28
0+150.00	1.22	8.48	131.76
0+160.00	1.15	11.72	143.48
0+170.00	1.05	10.98	154.47
0+180.00	0.99	10.17	164.63
0+190.00	0.5	7.45	172.09
0+200.00	0.52	5.09	177.17
0+210.00	0.25	3.85	181.02

Vol Compacto Total desde PK. 0+030.00 - 0+210.00	181.02	m3
Vol Suelto F.C. 1.30% Total desde PK. 0+030.00 - 0+210.00	235.326	m3

Top. Interventotia

T.P. No: 01-20813

TOPTECH

Pasto, Junio 7 de 2024

Topógrafo:
Jesús Dorado

Pasto Nariño

Cordial saludo.

La estación total marca TOPCON modelo CYGNUS KS-102, número de serie HV4136, fue revisada y cumple con los parámetros del fabricante TOPCON y se encuentra en el rango de precisión, referente a las características técnicas para este modelo de instrumentos y en perfectas condiciones ópticas - mecánicas.

INSTRUMENTO DE VERIFICACION COLIMADOR KERN LEVEL GK 3245
DE ALTA PRECISIÓN (0.001 mm)

AUMENTO	30 X	OK
DIAMETRO DE OBJETIVO	40 mm	OK
COMPENSADOR	4´/0.5´´	OK
SENSIBILIDAD NIVEL ESFERICO	40´´/1div	OK
NIVEL ELECTRONICO	(1´´)	OK
PRECISION HZ,V(ISO17123-3)	2´´/5CC	OK
ALCANCE	2300 MTS	OK
MINIPRISMA	1200 MTS	OK
PRECISION DE MEDIDAS:	A 300M,A1000M =+/- 0.002mm	OK
MODO ESTANDAR	±(2mm+2ppmxD)mm	OK
MOTORIZACIÓN: V. DE GIRO	50 gon/seg	OK
MEMORIA INTERNA	24000 Bloques	OK
PLOMADA OPTICA		OK
AUXILIAR DE PUNTERIA: RANGO DE TRABAJO: PRECISION:	 5 a 150 mts. 5cm a 100 mts.	OK

PERIODO PROMEDIO ÓPTIMO DE VERIFICACIÓN CALIBRACIÓN

Fecha de verificación:	07 / 06 / 2024
Próxima verificación calibración:	06 / 12 / 2024

Se realizaron los procesos de prueba de acuerdo a los parámetros técnicos, dando un certificado de calibración y verificación por una duración de 6 meses.

Att:

CARLOS ALEJANDRO CITELY V.
C.C. 98385507
Técnico en Instrumentos Topográficos e Ingeniería
Tecnologo en topográfia CESMAG MP 01-16527 C.P.N.T

TOPTECH CALIBRACIÓN

Calle 12 No 17-177 Av. Boyacá 3122441362 - 3164033688

EL PELIGRO

CONSORCIO MASO 10 NIT 901.782.848-1		INFORME ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA
CONTRATO DE INTERVETORÍA No. 5065-2023	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2
CONTRATO DE OBRA No.	OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
	CONTRATISTA:	

INTRODUCCION

El presente informe de topografía corresponde al seguimiento y control realizado a las actividades ejecutadas por la interventoría CONSORCIO MASO-10 durante el periodo correspondiente al mes de Junio de 2024.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

TRAMO: Vereda EL PELIGRO, en el Municipio de la Unión, Nariño.

Actividad 1:

Se realiza como primera actividad el replanteo del eje, para verificación de anchos de vía, se inicia desde el PR0+000 hasta el PR0+159, se observa que el eje del diseño esta desplazado hacia el costado derecho en el sentido del abs,por lo tanto se realiza algunas modificación del eje para garantizar el ancho de la calzada, desde el PR0+000 hasta PR0+159 con un acho de via de 5.0m.

Actividad 2:

Se procede a sacar anchos de vía de 2.5m desde el PR0+000 hasta PR0+159 para cada lado, después iniciamos con el chequeo de niveles del diseño, por lo cual se realiza unos ajustes para conservar el espesor de 0.15m de capa de subbase, se realiza la nivelación de la capa de subbase se recibe cotas de céreo y cartera de la misma con la cual se controla ejecución en campo de material.

Actividad 3:

Se ajusta el eje horizontal en el PI 1- PR0+000 hasta el PR0+023, se realiza un ajuste al PI 2- en el PR0+050 -PR0+072 y PI 3- PR0+096-PR0+150 esta condición se da por la silueta de los bordes de via existentes.

Actividad 4:

Se recibe tramo de subbase del PR 0+000 - PR 0+159 con niveles de subbase, pero la instalacion de material granular de subbase se encuentra desde el PR0+000 a PR0+150 con espesor de 0.15m y PR0+150 A PR0+159 con espesor de 0.05m.

Actividad 5:

Se evidenvia en campo que la obra de arte alcantarilla proyectada en el PR0+170 no se realiza en tal PR, por lo cual la trasladan y se ejecuta en el PR0+132.

REGISTRO FOTOGRAFICO













EQUIPO DE TOPOGRAFIA

EQUIPO	MARCA	MODELO	FECHA CALIBRACIÓN.
ESTACION TOTAL	CYGNUS KS-102	2019	07/06/2024

OBSERVACIONES /CONCLUSIONES

De acuerdo a la información del contratista en la cantidad de volumen instalado en campo, nos hacen una relación de 27 viajes volqueta de 6m3 un volumen de 162m3 y el reporte realizado por topografía interventoría un volumen de subbase de 115.34m3 vol. Compacto y en volumen suelto por el factor de expanción de 1.3% un volumen de 149.942m3.

Elaboró: John Alexander Muñoz Pasaje
Topógrafo **Interventoría Consorcio MASO 10**

Revisó: Álvaro Aguirre Maya
Ingeniero Residente **Interventoría Consorcio MASO 10**

Reporte Volumen Sub-Base

CONSORCIO MASO 10-INTERVENTORIA INIVIAS

Grupo de líneas de muestreo: SECCIONES SUB-BASE

P.K. inicial: 0+000.00

P.K. final: 0+159.07

P.K. inicial ejecutado: 0+000.00

P.K. final ejecutado: 0+159.07

P.K.	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. neto acumul. (Metros cúbicos)
0+000.00	0.75	0	0
0+010.00	0.74	7.44	7.44
0+020.00	0.75	7.45	14.89
0+030.00	0.74	7.48	22.37
0+040.00	0.76	7.51	29.87
0+050.00	0.75	7.52	37.39
0+060.00	0.74	7.44	44.83
0+070.00	0.74	7.42	52.25
0+080.00	0.74	7.43	59.69
0+090.00	0.75	7.46	67.15
0+100.00	0.74	7.45	74.6
0+110.00	0.75	7.44	82.04
0+120.00	0.76	7.54	89.58
0+130.00	0.64	6.95	96.53
0+140.00	0.75	6.95	103.48
0+150.00	0.75	7.51	110.99
0+159.07	0.21	4.36	115.34

Vol Compacto Total desde PK. 0+000.00 - 0+159.07	115.34	m3
Vol Suelto F.C. 1.30% Total desde PK. 0+000.00 - 0+159.07	149.942	m3

Top. Interventotia

T.P. No: 01-20813

TOPTECH

Pasto, Junio 7 de 2024

Topógrafo:
Jesús Dorado

Pasto Nariño

Cordial saludo.

La estación total marca TOPCON modelo CYGNUS KS-102, número de serie HV4136, fue revisada y cumple con los parámetros del fabricante TOPCON y se encuentra en el rango de precisión, referente a las características técnicas para este modelo de instrumentos y en perfectas condiciones ópticas - mecánicas.

INSTRUMENTO DE VERIFICACION COLIMADOR KERN LEVEL GK 3245
DE ALTA PRECISIÓN (0.001 mm)

AUMENTO	30 X	OK
DIAMETRO DE OBJETIVO	40 mm	OK
COMPENSADOR	4´/0.5´´	OK
SENSIBILIDAD NIVEL ESFERICO	40´´/1div	OK
NIVEL ELECTRONICO	(1´´)	OK
PRECISION HZ,V(ISO17123-3)	2´´/5CC	OK
ALCANCE	2300 MTS	OK
MINIPRISMA	1200 MTS	OK
PRECISION DE MEDIDAS:	A 300M,A1000M =+/- 0.002mm	OK
MODO ESTANDAR	±(2mm+2ppmxD)mm	OK
MOTORIZACIÓN: V. DE GIRO	50 gon/seg	OK
MEMORIA INTERNA	24000 Bloques	OK
PLOMADA OPTICA		OK
AUXILIAR DE PUNTERIA: RANGO DE TRABAJO: PRECISION:	 5 a 150 mts. 5cm a 100 mts.	OK

PERIODO PROMEDIO ÓPTIMO DE VERIFICACIÓN CALIBRACIÓN

Fecha de verificación:	07 / 06 / 2024
Próxima verificación calibración:	06 / 12 / 2024

Se realizaron los procesos de prueba de acuerdo a los parámetros técnicos, dando un certificado de calibración y verificación por una duración de 6 meses.

Att:

CARLOS ALEJANDRO CITELY V.
C.C. 98385507
Técnico en Instrumentos Topográficos e Ingeniería
Tecnologo en topográfia CESMAG MP 01-16527 C.P.N.T

TOPTECH CALIBRACIÓN

Calle 12 No 17-177 Av. Boyacá 3122441362 - 3164033688

CONTROL DE DENSIDADES INTERVENTORIA

DENSIDADES EN CAMPO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA - INV - E-161- 13

PROYECTO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

LOCALIZACION : MUNICIPIO DE LA UNION - NARIÑO

FECHA : miércoles, 26 de junio de 2024

SOLICITA: CONSORCIO MASO 10 (INTERVENTORIA)

MUESTRA No.	Unidad	1	2	3	4	5	6				
ABSCISAS		PR 0 + 150	PR 0 + 050	PR 0 + 035	PR 0 + 085	PR 0 + 065	PR 0 + 051				
		EJE	DERECHA	EJE	IZQUIERDA	EJE	DERECHA				
		VEREDA NUEVA FLORIDA	VEREDA PELIGRO	VEREDA QUIROZ ALTO	VEREDA QUIROZ BAJO	VEREDA LLANO GRANDE	VEREDA EL SAUCE				
MATERIAL		SUB BASE	SUB BASE	SUB BASE	SUB BASE	SUB BASE	SUB BASE				
MINA		LA PLAYA	LA PLAYA	LA PLAYA	LA PLAYA	LA PLAYA	LA PLAYA				
PESO FRASCO ARENA INICIAL	gr	6043	5993	5986	5977	5969	5963				
PESO FRASCO ARENA RESTANTE	gr	2676	2711	2763	2827	2675	2737				
PESO ARENA TOTAL USADA	gr	3367	3282	3223	3150	3294	3226				
CONSTANTE DEL CONO	gr	1672,60	1672,60	1672,60	1672,60	1672,60	1672,60				
PESO DE ARENA EN EL HUECO	gr	1694,40	1609,40	1550,40	1477,40	1621,40	1553,40				
DENSIDAD DE LA ARENA	gr/cm3	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41				
VOLUMEN DEL HUECO	cm3	1201,70	1141,42	1099,57	1047,80	1149,93	1101,70				
PESO MATERIAL FINO EXTRAIDO HUMEDO	gr	2185	1998	2155	2017	2003	2088				
PESO MATERIAL GRUESO EXTRAIDO HUMEDO	gr	503	494	186	234	476	236				
HUMEDAD FINOS	%	11,95	11,16	11,16	11,62	11,23	10,95				
HUMEDAD GRUESOS	%	2,30	1,28	1,94	1,35	1,28	1,57				
CORRECCION HUMEDAD TOTAL	%	8,85	7,04	7,33	7,37	7,30	7,25				
PESO MATERIAL FINO EXTRAIDO SECO	gr	1951,77	1797,43	1938,60	1806,96	1800,82	1881,92				
PESO MATERIAL GRUESO EXTRAIDO SECO	gr	491,70	487,74	182,47	230,88	469,98	232,35				
PESO TOTAL SECO	gr	564,60	573,70	567,40	560,90	563,50	567,30				
DENSIDAD TOTAL HUMEDA EN CAMPO	gr/cm3	2,24	2,18	2,13	2,15	2,16	2,11				
DENSIDAD TOTAL SECA EN CAMPO	gr/cm3	2,06	2,04	1,98	2,00	2,01	1,97				
DENSIDAD SECA CORREGIDA DE PARTICULAS FINAS	gr/cm3	**1,95**	**1,93**	**1,94**	**1,94**	**1,90**	**1,91**				
DENSIDAD MAX LABORATORIO	gr/cm3	1,970	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000				
HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO	%	12,50	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20				
PARTICULAS FINAS DE LA MUESTRA SECO	%	79,88	78,66	91,40	88,67	79,30	89,01				
PARTICULAS SOBRETAMAÑOS SECO	%	20,12	21,34	8,60	11,33	20,70	10,99				
PARTICULAS FINAS DE LA MUESTRA HUMEDO	%	81,29	80,18	92,05	89,60	80,80	89,85				
PARTICULAS SOBRETAMAÑOS HUMEDO	%	18,71	19,82	7,95	10,40	19,20	10,15				
COMPACTACION ALCANZADA EN TERRERNO	%	**99**	**96**	**97**	**97**	**95**	**95**				
COMPACTACION ESPECIFICADA	%	95	95	95	95	95	95				
ACEPTACION		**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**				

HUMEDAD									FINOS		GRUESOS	
PESO HUMEDO PASANTE 3/4" (g)	**PESO SECO PASANTE 3/4" (g)**	**PESO HUMEDO RETENIDO 3/4" (g)**	**PESO SECO RETENIDO 3/4" (g)**	**HUMEDAD PASANTE 3/4" (%)**	**HUMEDAD RETENIDO 3/4" (%)**	**% SOBRE TAMAÑOS**	**% FRACCION FINA**	**CORRECCION HUMEDAD TOTAL**	**RECIPIENTE NO.**	**PESO RECIPIENTE**	**RECIPIENTE NO.**	**PESO RECIPIENTE**
423,30	382,30	185,60	182,30	11,95	2,30	32,873	67,712	**8,8**	92	39,20	84	38,70
367,90	334,10	242,20	239,60	11,16	1,28	42,217	58,236	**7,0**	100	31,20	83	37,10
364,80	331,10	240,30	236,30	11,16	1,94	42,351	58,354	**7,3**	112	29,20	114	29,60
363,30	328,30	235,30	232,60	11,62	1,35	41,950	58,531	**7,4**	110	27,20	67	32,60
375,30	340,90	225,10	222,60	11,23	1,28	39,947	60,497	**7,3**	71	34,50	118	27,40
377,10	343,00	227,20	224,30	10,95	1,57	40,049	60,462	**7,2**	113	31,60	86	39,50

OBSERVACIONES: LA DENSIDAD MAXIMA Y HUMEDAD OPTIMA DE LABORATORIO PARA EL PRIMER PUNTO FUE SUMINISTRADA POR EL CONTRATANTE.

REALIZO: ING. JEISON ALEXANDER GOMEZ CH.

Jeisson Gómez Ingeniería Civil	**ENSAYOS DE LABORATORIO** **COMPACTACIÓN - PROCTOR MODIFICADO** **INVE - 142**	**SOLICITA: CONSORCIO MASO 10 (INTERVENTORIA)** **MUESTRA** **0001**

IDENTIFICACION DEL MATERIAL.

OBRA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

PROCEDENCIA OBRA **FECHA** : jueves, 27 de junio de 2024

TIPO DE CAPA SUBBASE **MINA** : LA PLAYA

COMPACTACIÒN DINÀMICA


Peso	10 lbs	Número de Capas	5
Altura de Caida	18 plg	Golpes por Capa	56

DATOS DE COMPACTACIÓN

Punto No.	1	2	3	
Molde No.	1	1	1	
Peso Muestra + Molde (gr)	6728	6922	6925	
Peso del molde (gr)	2223	2223	2223	
Peso muestra húmeda (gr)	4505	4699	4702	
Volumen molde (cm3)	2133	2133	2133	
Densidad húmeda (gr/cm3)	2,112	2,203	2,204	
Densidad seca (gr/cm3)	1,952	2,000	1,961	

CONTENIDO DE HUMEDAD

Recipiente No.	77	80	93	
Peso humedo + Recip. (gr)	386,2	452,2	396,3	
Peso seco + Recip. (gr)	359,3	414,3	356,8	
Peso recipiente (gr)	31,50	41,30	39,20	
Humedad (%).	8,2	10,2	12,4	

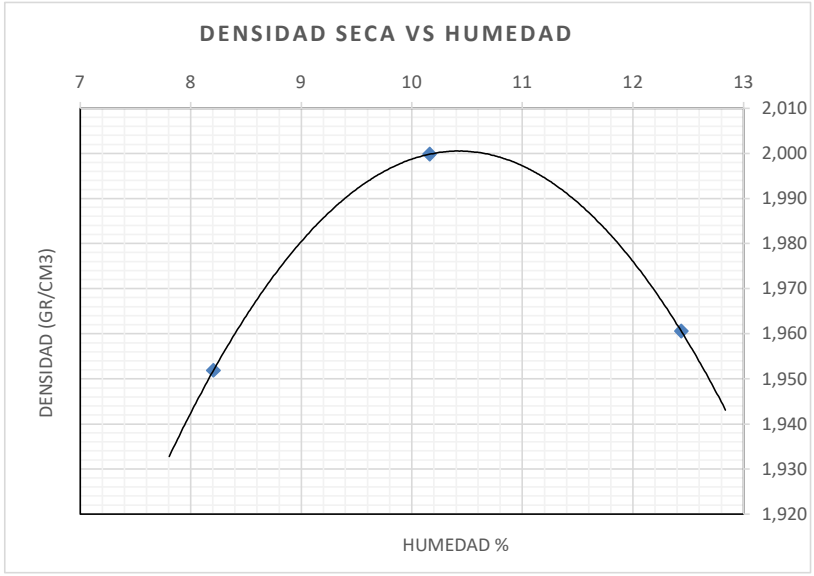

RESULTADOS.

Densidad Seca Máxima (gr/cm3) 2,000

Humedad Óptima (%) 10,2 %


OBSERVACIONES

REALIZO: ING. JEISON ALEXANDER GÓMEZ CH


COMPONENTE SOCIAL

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL COMPONENTE DE CONTROL Y GESTION SOCIAL MES DE JUNIO 2024

EL PELIGRO

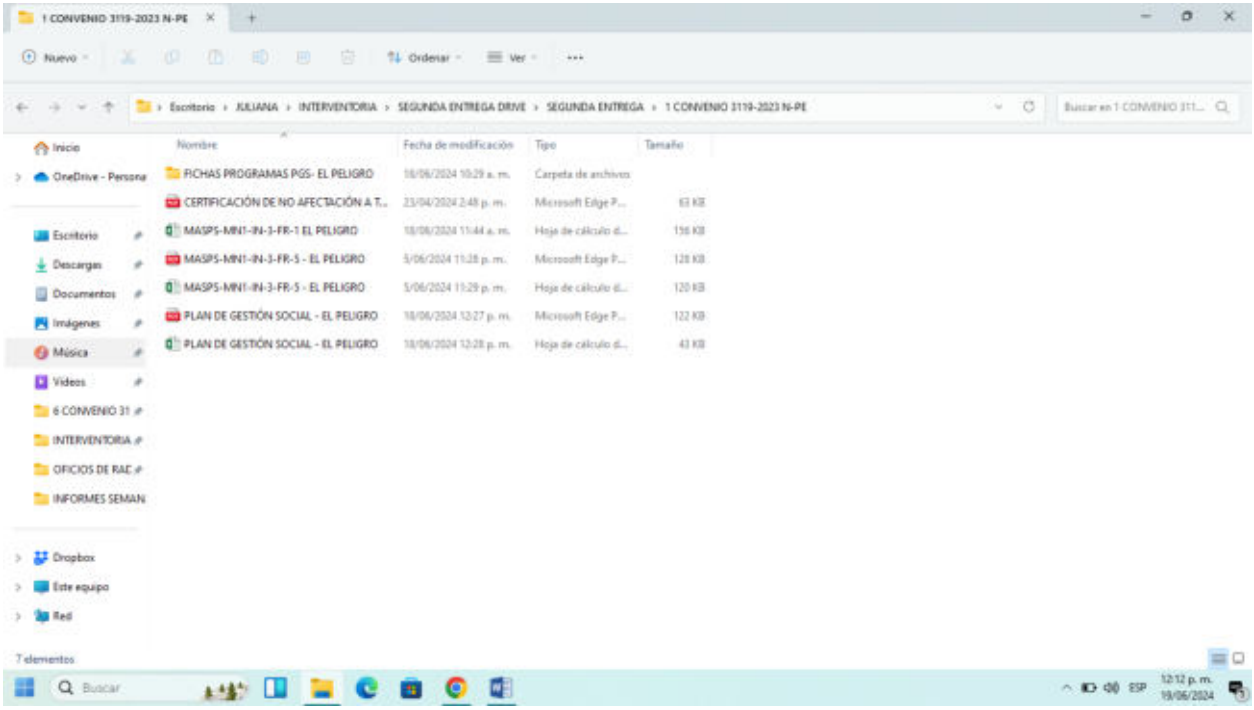

Organización de documentos del Peligro para radicar a INVIAS

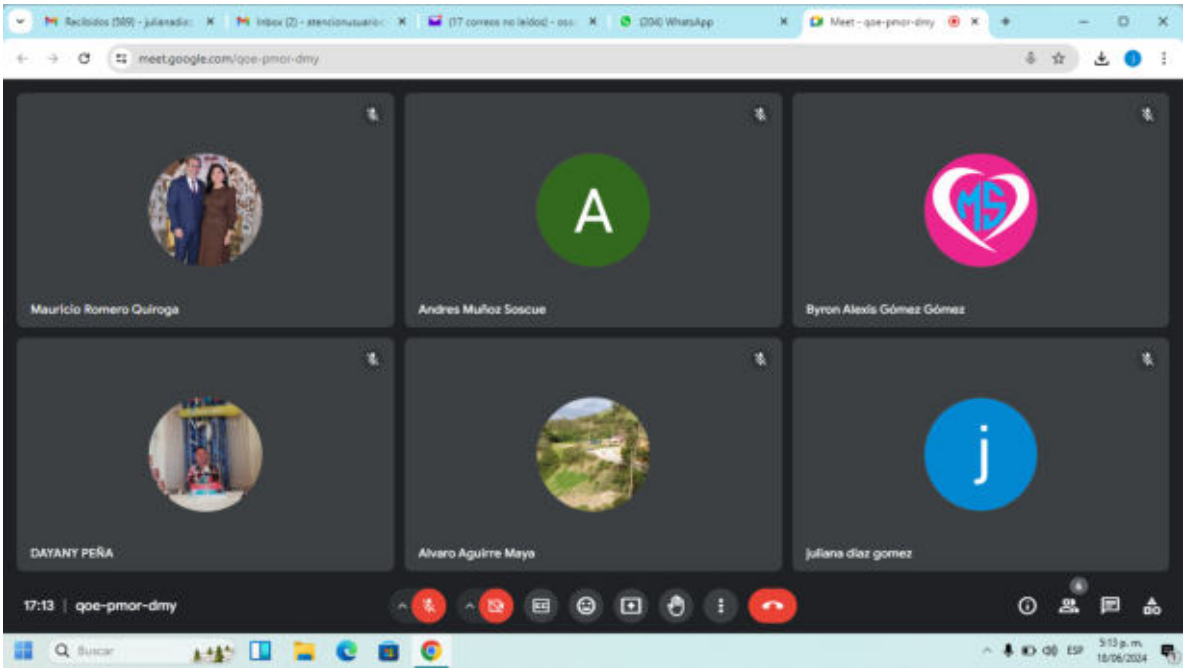

Asistencia a comité operativo del convenio El Peligro.




Visita de seguimiento comunidad del convenio El Peligro- 21 junio 2024.




Visita de seguimiento comunidad del convenio El Peligro- 21 junio 2024.



Visita de seguimiento comunidad del convenio El Peligro- 21 junio 2024.

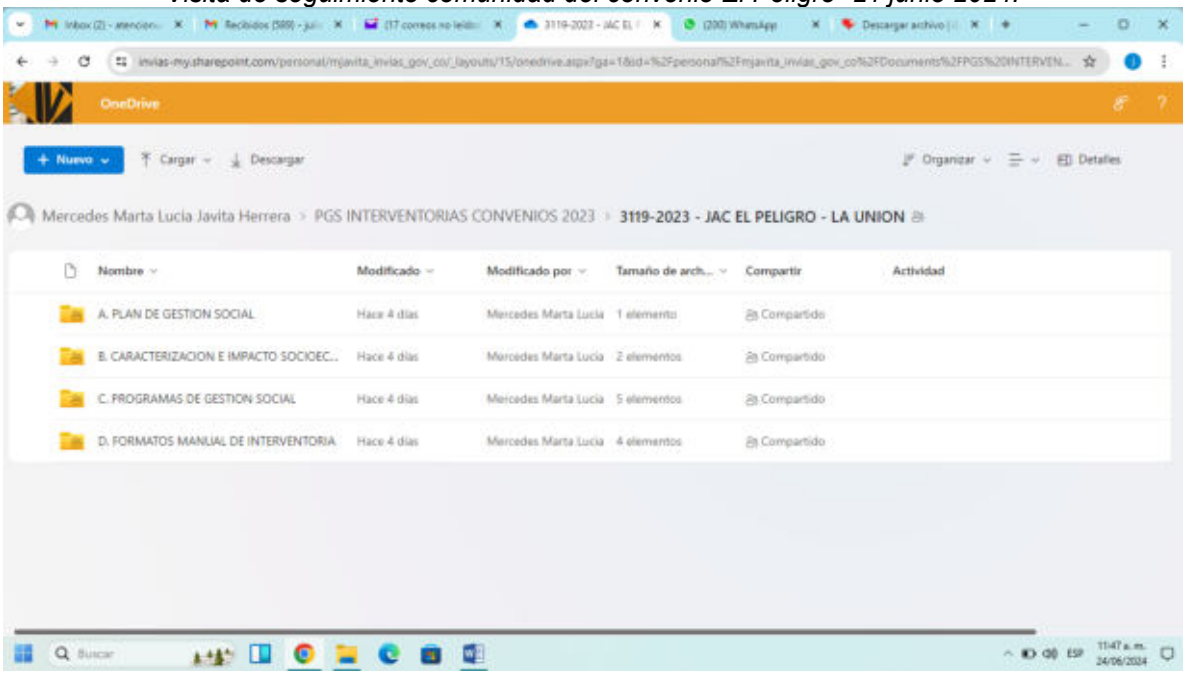

Anexo fotográfico 2: Cargue de documentos convenio de El Peligro.

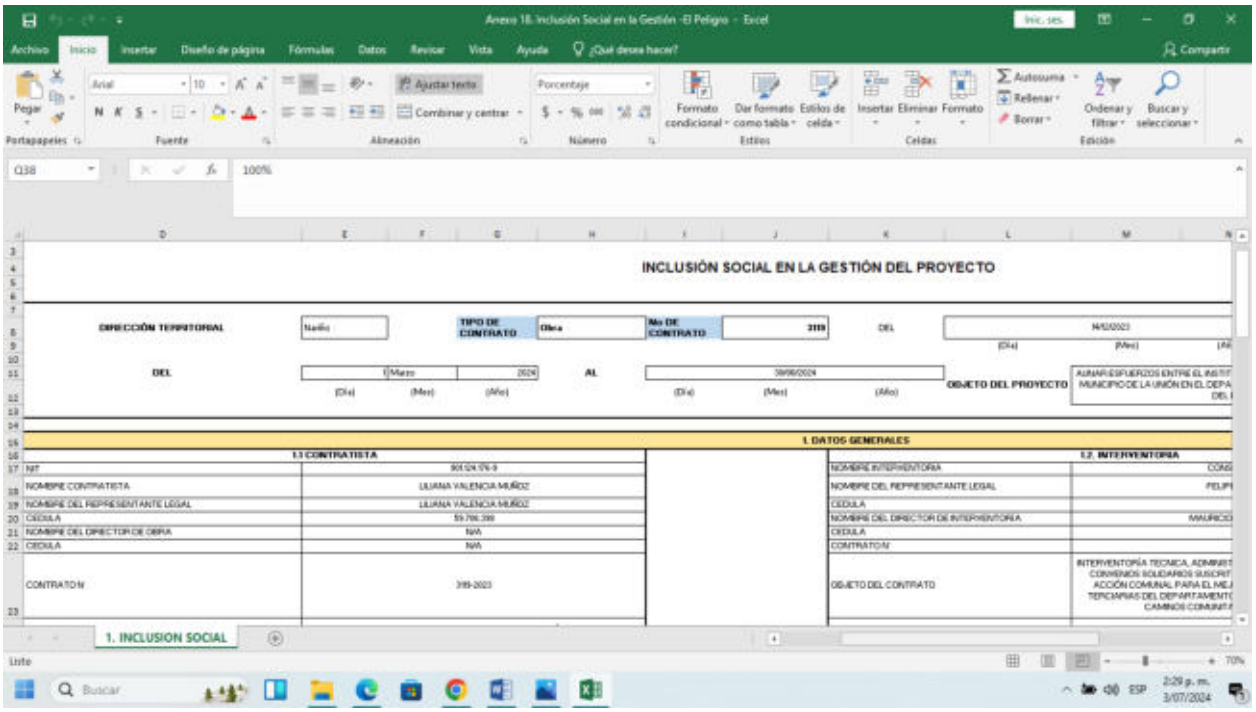

Diligenciamiento formato de Inclusión social – El Peligro.

LLANO GRANDE

CONSORCIO MASO 10

N-GR-013-2024

Bogotá D.C. 04 de junio de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE
Municipio de La Unión – Nariño
Presidente Junta de Acción Comunal
Att. Oney Valdés
ingjuanchomartinez@gmail.com
jacllanogrande2023@gmail.com

REF: Convenio 3089-2023 Vereda Llano Grande Municipio La Unión – Recepción de PQRS – 31 mayo 2024.

Respetados señores:

Considerando que, para el normal desarrollo del convenio de referencia, se hace necesario atender los compromisos adquiridos con la suscripción de los mismos y también con las obligaciones que derivan de los documentos que los complementan. Por lo cual, esta Interventoría desde el área de Atención al Usuario, comparte copia de queja escrita, recibida el 31 de mayo 2024 en la apertura del buzón de PQRS realizada a las 4:00 pm, en compañía de la presidenta de la Veeduría Ciudadana la Sra. Leidy Patricia Benites Carvajal, en la cual, se solicita información sobre la ejecución de la obra a través de una reunión programada con la comunidad.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 y Ley 1712 de 2014, se solicita realizar las acciones necesarias para dar tramite a la solicitud realizada, en los términos establecidos por la legislación nacional aplicable.

Cordialmente.

CONSORCIO MASO 10

Evelyn Juliana Díaz Gómez
Profesional Social de Interventoría

CC/
Juan Martínez
Ingeniero Residente de Obra

Oficio de direccionamiento PQRS a la Junta de Acción Comunal vereda Llano Grande.



CONSORCIO MASO 10

Bogotá D.C. 04 de junio de 2024

Sr.
Ever Orlando Cerón
Vicepresidente
VEEDURIA CIUDADANA
Vereda Llano Grande
Municipio de La Unión – Nariño

REF: Convenio 3089-2023 Vereda Llano Grande Municipio La Unión – Recepción de PQRS – 31 mayo 2024.

Respetado señor:

En cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 y Ley 1712 de 2014, esta Interventoría desde el área de Atención al Usuario, comparte las acciones realizadas para el tramite correspondiente a la queja escrita, recibida el 31 de mayo 2024 a las 4:00 pm, en la apertura del buzón de PQRS ubicado en el tramo de intervención:

1. Encuentro presencial con la presidente de la Veeduría Ciudadana la Sra. Leidy Patricia Benites Carvajal (responsable de la apertura del buzón de PQRS) con el fin, de recepcionar la queja de manera física y dar oportuna respuesta a la solicitud realizada.
2. Direccionamiento de la PQRS a la Junta de Acción Comunal de la vereda de Llano Grande, a través de envió de oficio **N-GR-013-2024** (*anexo documento adjunto)* al correo de la JAC: jacllanogrande2023@gmail.com, con copia al ingeniero Residente de Obra, puesto que, por la naturaleza de la petición (información de la ejecución de la obra), se considera responsabilidad del contratista dar tramite a este tipo de solicitud.
3. Reunión presencial programada el 06 junio del 2024 a las 6:00 pm en la vereda Llano Grande, con el acompañamiento de: Junta de Acción Comunal, Ingeniero Residente de obra, contadora, Veeduría Ciudadana, Profesional Social de Interventoría y comunidad en general, con el propósito de informar el desarrollo de la obra y despejar dudas e inquietudes al respecto.

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se reitera el compromiso de la Interventoría Consorcio MASO 10 para recibir las PQRS, direccionar y hacer seguimiento al trámite de las mismas, en los términos establecidos por la legislación nacional aplicable.


Cordialmente.
CONSORCIO MASO 10

Evelyn Juliana Díaz Gómez
Profesional Social de Interventoría

5-06-2024.

Oficina – Calle 140A No 15-25 (204) Bogotá
Contacto: 3136418242 / 3106085775. Correo electrónico: [illegible]

Visita a la casa de habitación del Sr. Ever Orlando Cerón para entrega de respuesta PQRS de la vereda de Llano Grande.

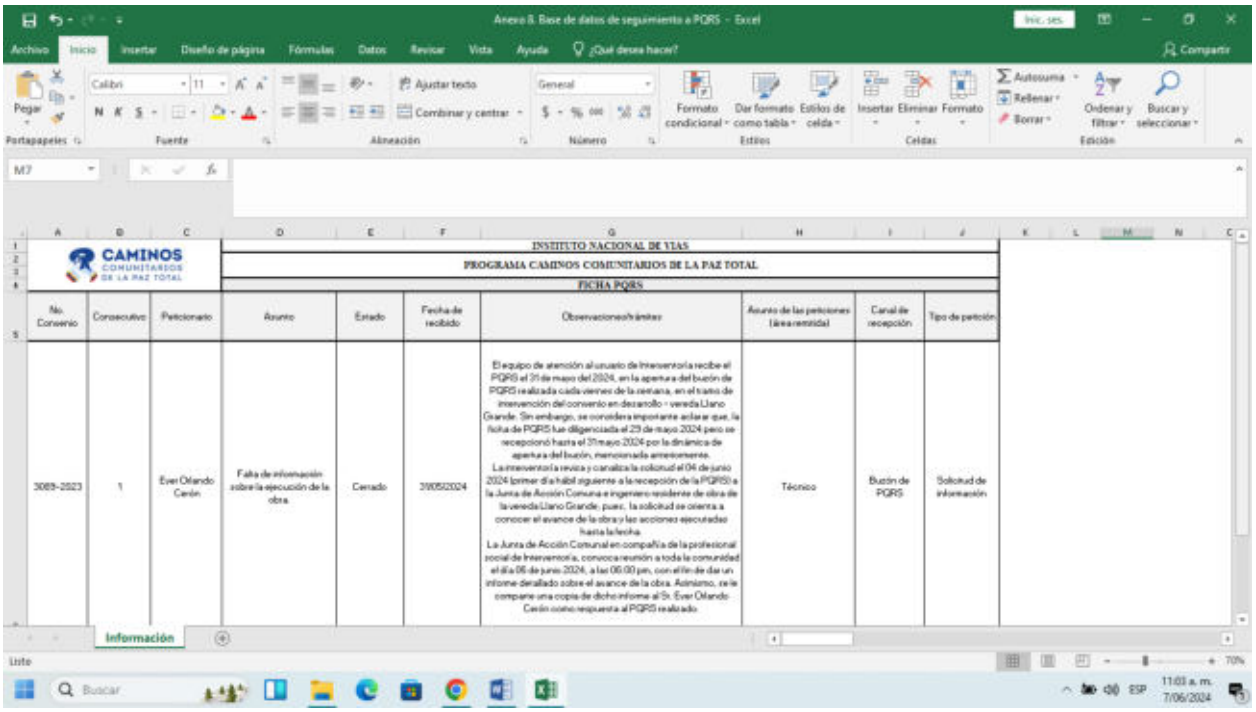

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FICHA PQRS

No. Convenio	Consecutivo	Peticionario	Asunto	Estado	Fecha de recibido	Observaciones/trámites	Asunto de las peticiones (área remitida)	Canal de recepción	Tipo de petición
3089-2023	1	Ever Orlando Cerón	Falta de información sobre la ejecución de la obra	Cerrado	31052024	El equipo de atención al usuario de Interventoría recibe el PQRS el 31 de mayo del 2024, en la apertura del buzón de PQRS realizada cada viernes de la semana, en el trabajo de intervención del convenio en desarrollo - vereda Llano Grande. Sin embargo, se considera importante aclarar que, la ficha de PQRS fue diligenciada el 29 de mayo 2024 pero se recepcionó hasta el 31 mayo 2024 por la dinámica de apertura del buzón, mencionada anteriormente. La interventoría revisa y canaliza la solicitud el 04 de junio 2024 (primer día hábil siguiente a la recepción de la PQRS) a la Junta de Acción Comunal e ingeniero residente de obra de la vereda Llano Grande; pues, la solicitud se orienta a conocer el avance de la obra y las acciones ejecutadas hasta la fecha. La Junta de Acción Comunal en compañía de la profesional social de Interventoría, convoca a reunión a toda la comunidad el día 06 de junio 2024, a las 06:00 pm, con el fin de dar un informe detallado sobre el avance de la obra. Asimismo, se le comparte una copia de dicho informe al Sr. Ever Orlando Cerón como respuesta al PQRS realizado.	Técnico	Buzón de PQRS	Solicitud de información

Diligenciamiento formato base de datos de seguimiento a PQRS – Llano Grande.



Reunión con la comunidad para el cierre del PQRS del Sr. Ever Orlando Cerón, convenio Llano Grande.



Reunión con la comunidad para el cierre del PQRS del Sr. Ever Orlando Cerón- Convenio de Llano Grande.

CONSORCIO MASO 10

N-GR-014-2024

Bogotá D.C. 11 de junio de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE
Municipio de La Unión – Nariño
Representante Legal
Att. ONEY VALDEZ
yolitza@gmail.com
acllanogrande2023@gmail.com

REF: Convenio 3089-2023 Vereda Llano Grande Municipio La Unión – Valla de información.

Respetados señores:

Considerando lo estipulado en La Resolución 20233040025285 del 20 de junio 2023 "Por la cual se establece la distribución, diseño y parámetros de las vallas y demás elementos de información de las obras y proyectos de infraestructura de transporte que contrate el Instituto Nacional De Vías- INVIAS, la Agencia Nacional De Infraestructura – ANI y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL". Esta interventoría, realiza algunas recomendaciones de forma, antes de imprimir la valla informativa diseñada para el convenio de referencia, compartida el 10 junio 2024 a través de WhatsApp:

1. En la parte denominada "obra" complementar la información colocando el ancho de la vía. Asimismo, en este mismo apartado, se recomienda agregar la palabra "rígido" en la descripción del pavimento.

En consecuencia, de lo mencionado anteriormente, después de realizar los debidos ajustes, se recomienda, realizar la instalación de la valla informativa, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Resolución mencionada, específicamente en el Artículo 4 "Parámetros técnicos e instalación" en el numeral B. "Instalación de Vallas" pág. 3. Y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido por El Instituto Nacional de Vías -INVIAS.


Cordialmente.

CONSORCIO MASO 10
Mauricio Romero Quiroga
Director Interventoría

CC/ Ing. Juan Martínez – Residente de Obra.

Oficina – Calle 140A No 15-26 (204). Bogotá.
Contacto: 3139416242 / 3136085775. Correo electrónico: gpa2017@yahoo.com

Oficio recomendaciones valla informativa – Llano Grande.

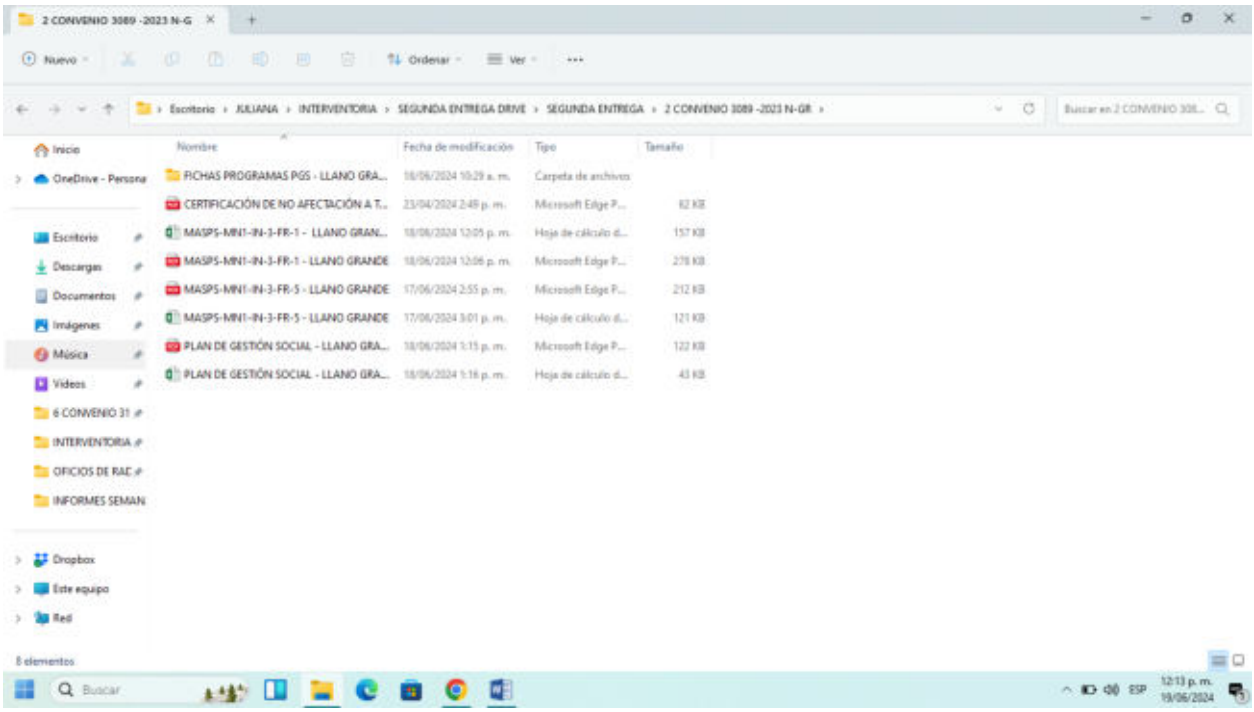

Organización de documentos de Llano Grande para radicar a INVIAS



6/19/24, 12:00 PM Yahoo Mail - Re: actas corregidas

Re: actas corregidas

De: OSAC S.A.S 2017 (osac2017@yahoo.com)
Para: heinzstiven@gmail.com; ingjuanchomartinez@gmail.com
CC: asojuntalaunion019@gmail.com
Fecha: martes, 18 de junio de 2024, 10:51 a. m. COT

Buenos dias

Ing. Juan Martinez
Residente de obra
Vereda LLano Grande

Cordial saludo

Con relación a las actas de vecindad enviadas, se hace necesario realizar la siguiente observación:

1. Acta de vecindad de la Sra. Nelsy Realpe Jojoa, falta firma del testigo en la pag 5.


De acuerdo a lo mencionado, se recomienda realizar el ajuste correspondiente y volver a enviar el acta corregida.

Cordialmente.


Consorcio MASO 10
Evelyn Juliana Díaz Gómez
Profesional Social.

El lunes, 17 de junio de 2024, 06:53:45 p. m. COT, heinz ordoñez <heinzstiven@gmail.com> escribió:

Soporte de envió observaciones de actas de vecindad convenio de Llano Grande

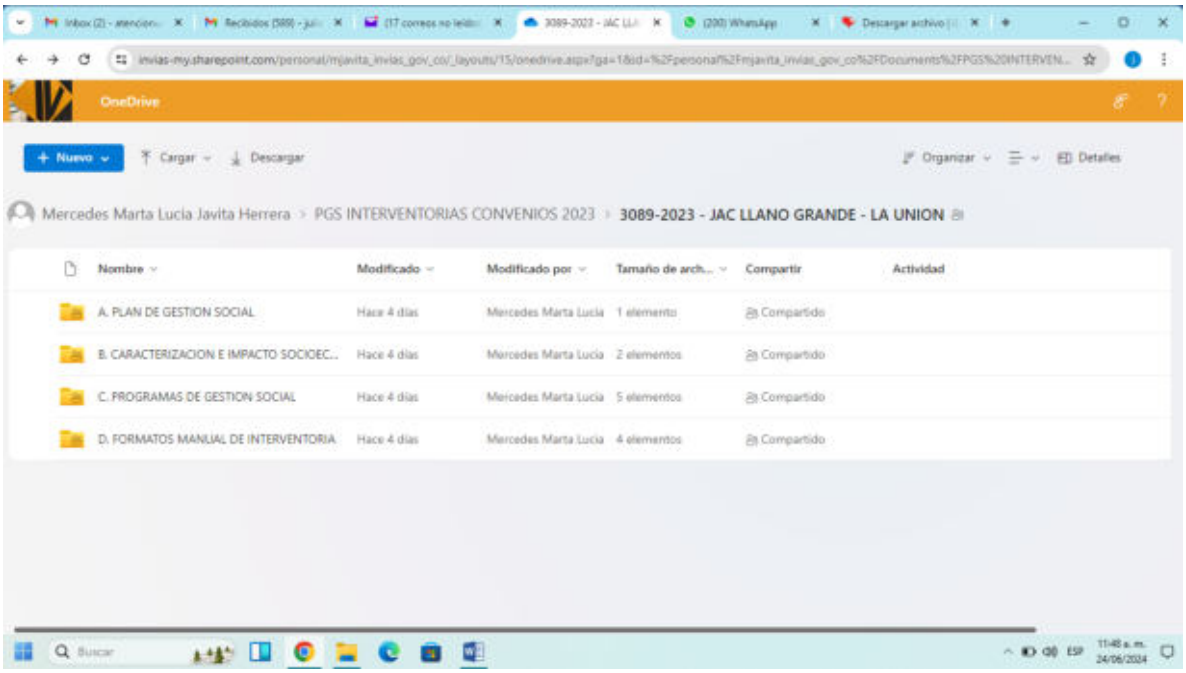

Cargue de documentos convenio de Llano Grande

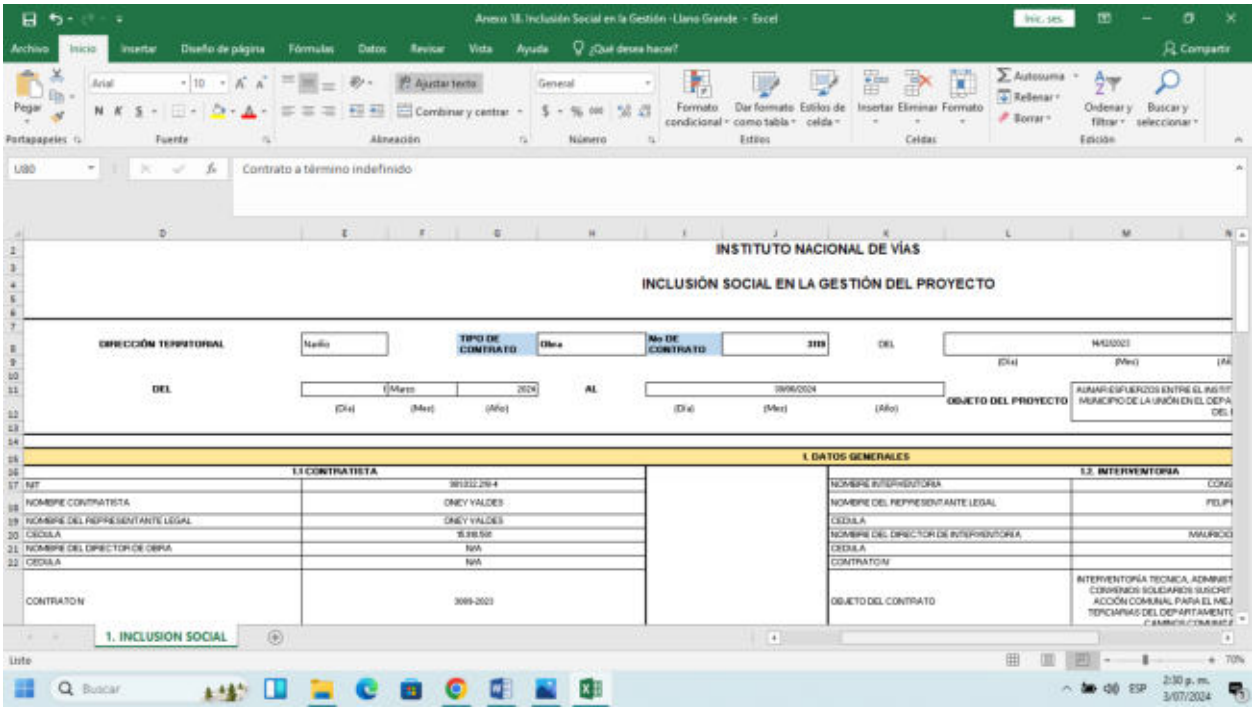

Diligenciamiento formato de Inclusión social – Llano Grande.



Visita presencial desde el componente de gestión Social – Llano Grande. 25 junio 2024.



Visita presencial desde el componente de gestión Social – Llano Grande. 25 junio 2024.

QUIROZ ALTO

CONSORCIO MASO 10

N-QA-014-2024

Bogotá D.C. 05 de junio de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO
Municipio de La Unión - Nariño
Ingeniero Residente de Obra
Att. Jeferson Cárdenas Erazo
Jeferson_cardenas98@hotmail.com
tuquerresyonier@gmail.com

REF: Convenio 3122-2023 Vereda Quiroz Alto
Municipio La Unión – Derecho de petición de la Sra. Gladis Moncayo.

Respetados señores:

Considerando que, para el normal desarrollo del convenio de referencia, se hace necesario atender los compromisos adquiridos con la suscripción de los mismos y también con las obligaciones que derivan de los documentos que los complementan. Por lo cual, esta Interventoría desde el área de Atención al Usuario, comparte copia de derecho de petición recibido el 04 junio 2024, con el fin de articular la información solicitada desde su competencia y dar cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 y Ley 1712 de 2014 y de esta manera, iniciar el trámite a la solicitud realizada, en los términos establecidos por la legislación nacional aplicable.


Cordialmente.

CONSORCIO MASO 10

Evelyn Juliana Díaz Gómez
Profesional Social de Interventoría

CC/
Yonier Demetrio Túquerres
Presidente
Junta de Acción Comunal Quiroz Alto


Direccionamiento derecho de petición Sra. Gladis Edilma Moncayo.

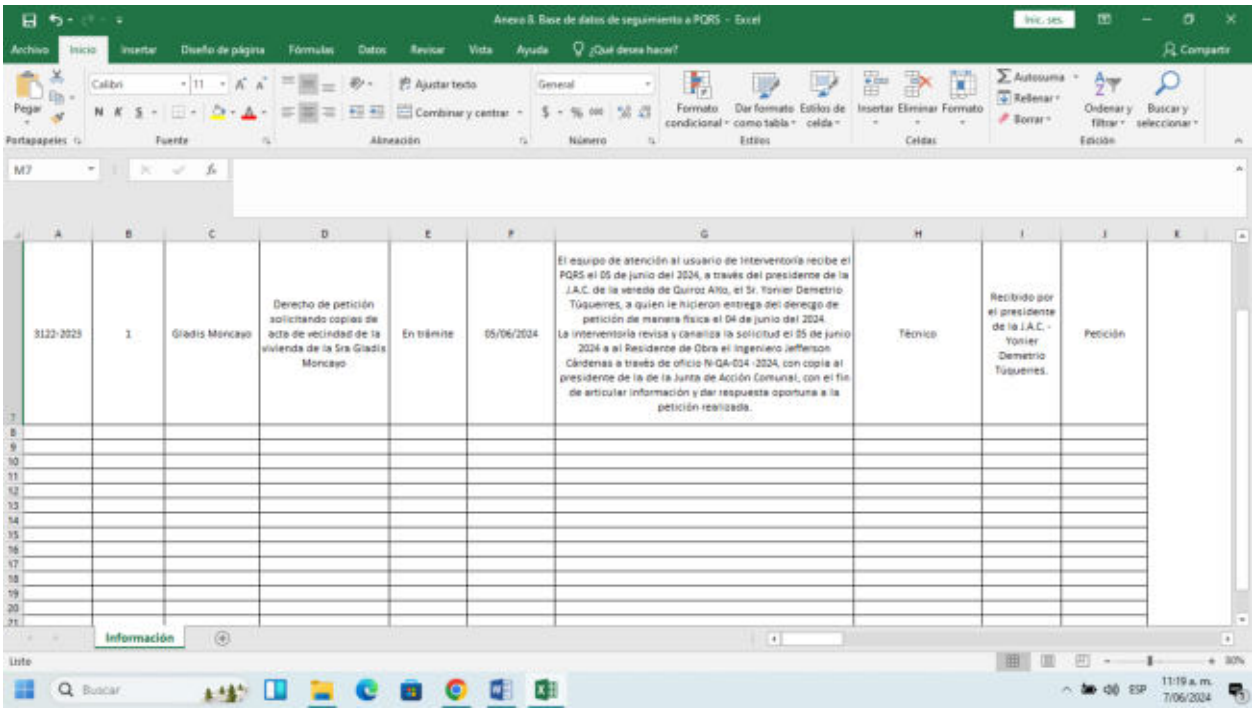

Diligenciamiento formato base de datos de seguimiento a PQRS, Quiroz Alto.



Oficio de respuesta N-QA-016-2024 derecho de petición Sra. Gladis Moncayo.

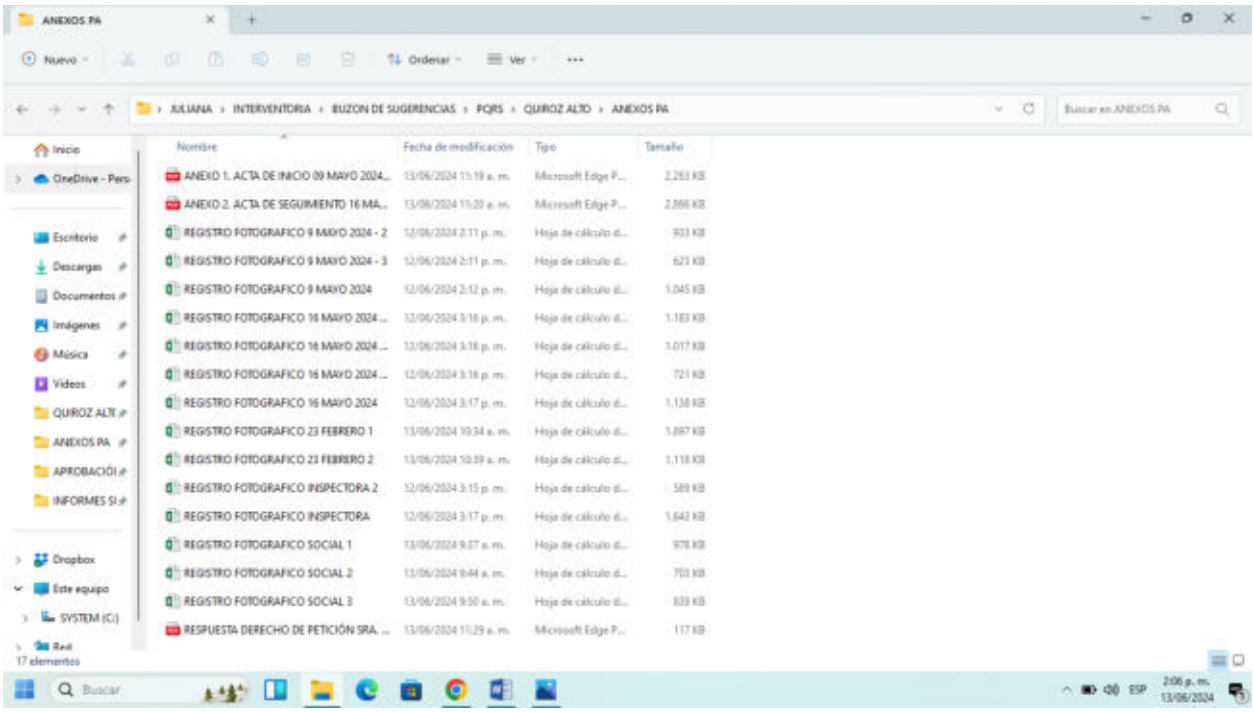

Organización de documentos respuesta a derecho de petición Sra. Gladis Moncayo.

CONSORCIO MASO 10

La Unión - Nariño 13 de junio de 2024

N-QA-016-2024

recibido
14 de junio
3:51 PM
gladis moncayo

Sra.
Gladis Edilma Moncayo
Vereda Quiroz Alto
Municipio de La Unión – Nariño

REF: Convenio 3122-2023 Vereda Quiroz Alto, Municipio La Unión – respuesta a Derecho de Petición Sra. Gladis Edilma Moncayo (04 junio 2024).

Respetada señora:

Considerando que, el derecho de petición interpuesto el 04 de junio 2024, tiene las mismas peticiones, se procede a responder de manera conjunta.

En cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 y Ley 1712 de 2014, la Interventoría Consorcio MASO 10, desde el área de Atención al Usuario, recibe el derecho de petición el día 05 de junio 2024, por los cual, en mutuo acuerdo con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Quiroz Alto, el Sr. Yonier Demetrio Túquerres y el Ingeniero Jeferson Cárdenas, en calidad de residente de obra, hace entrega de los documentos solicitados en el derecho de petición de la siguiente manera:

1. Copia de acta de vecindad de inicio realizada el 09 de mayo 2024 (5 folios) *Anexo 1.*
2. Copia de acta de vecindad de seguimiento realizado el 16 de mayo 2024 (5 folios) *Anexo 2.*
3. Copia de 10 evidencias fotográficas de acta de vecindad de inicio del 09 de mayo 2024. *Anexo 3.*
4. Copia de 15 evidencias fotográficas de acta de vecindad de seguimiento del 16 de mayo 2024. *Anexo 4.*
5. Copia de 6 evidencias fotográficas de Inspector de interventoría, en el acompañamiento del acta de vecindad de seguimiento realizado 16 de mayo 2024. *Anexo 5.*
6. Copia de 12 evidencias fotográficas de Profesional Social, en el acompañamiento a acta de vecindad de seguimiento realizada el 16 mayo 2024. *Anexo 6.*
7. Por concepto de privacidad no se anexa copia de tarjeta profesional del Ingeniero Jeferson Cárdenas Erazo – residente de obra; sin embargo, se relaciona número de matrícula profesional n°: 66202-403439 RIS fecha de expedición: 11/ 10/ 2018.

Otros Anexos


1. Copia de ficha socioeconómica (5 folios) diligenciada el 23 de febrero 2024 por la profesional social: Evelyn Juliana Díaz Gómez a través de visita domiciliaria. *Anexo 7.*
2. Copia de listado de asistencia (1 folio), del acompañamiento realizado al levantamiento de acta de vecindad de seguimiento del 16 mayo 2024, con

Oficina – Calle 140A No 15-35 (204), Bogotá.
Contacto: 3136418343 / 3136085775. Correo electrónico: [illegible]


Visita presencial a la vivienda de la Sra. Gladis Moncayo para entregar en físico la Rta al derecho de petición interpuesto.




Visita presencial a la vivienda de la Sra. Gladis Moncayo para entregar en físico la Rta al derecho de petición interpuesto.

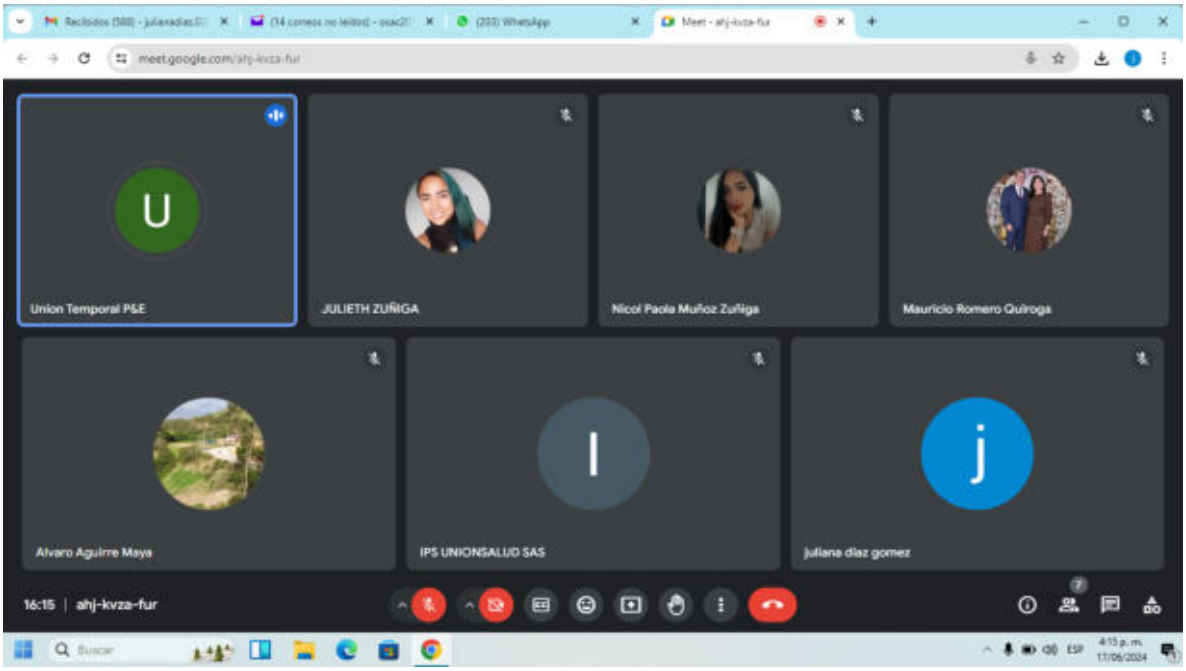

Asistencia a comité operativo del convenio de Quiroz Alto.

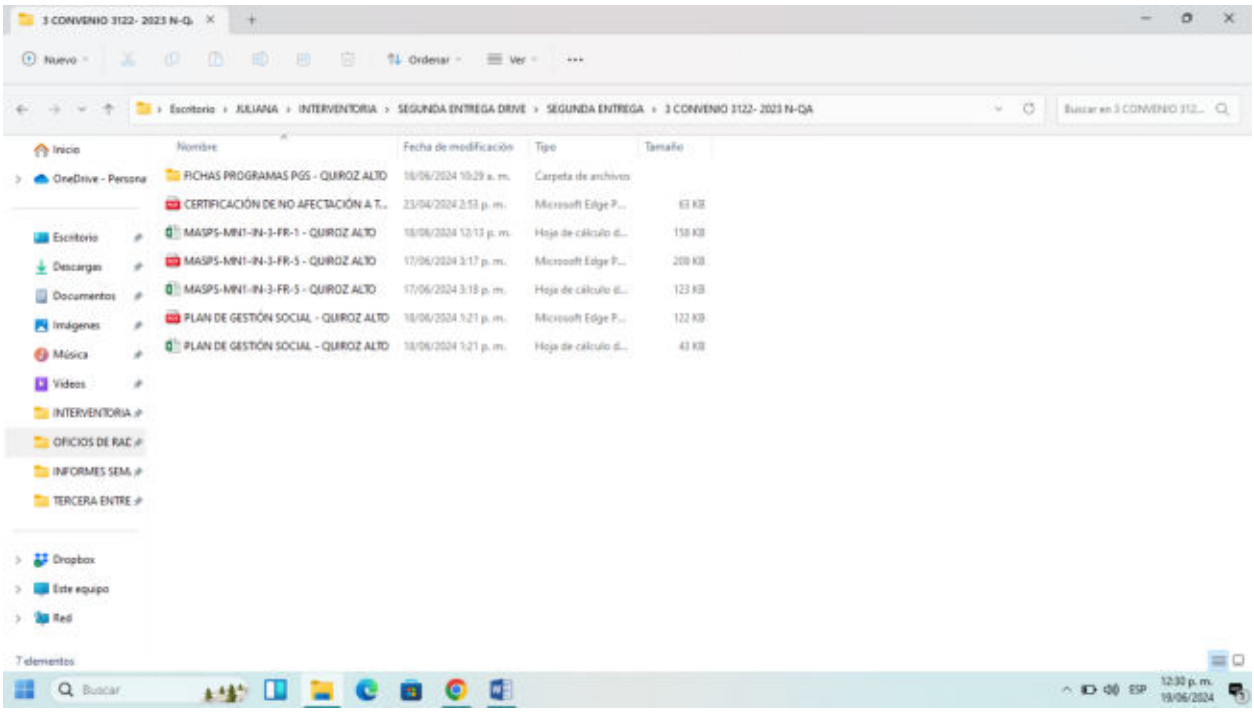

Organización de documentos de Quiroz Alto para radicar a INVIAS

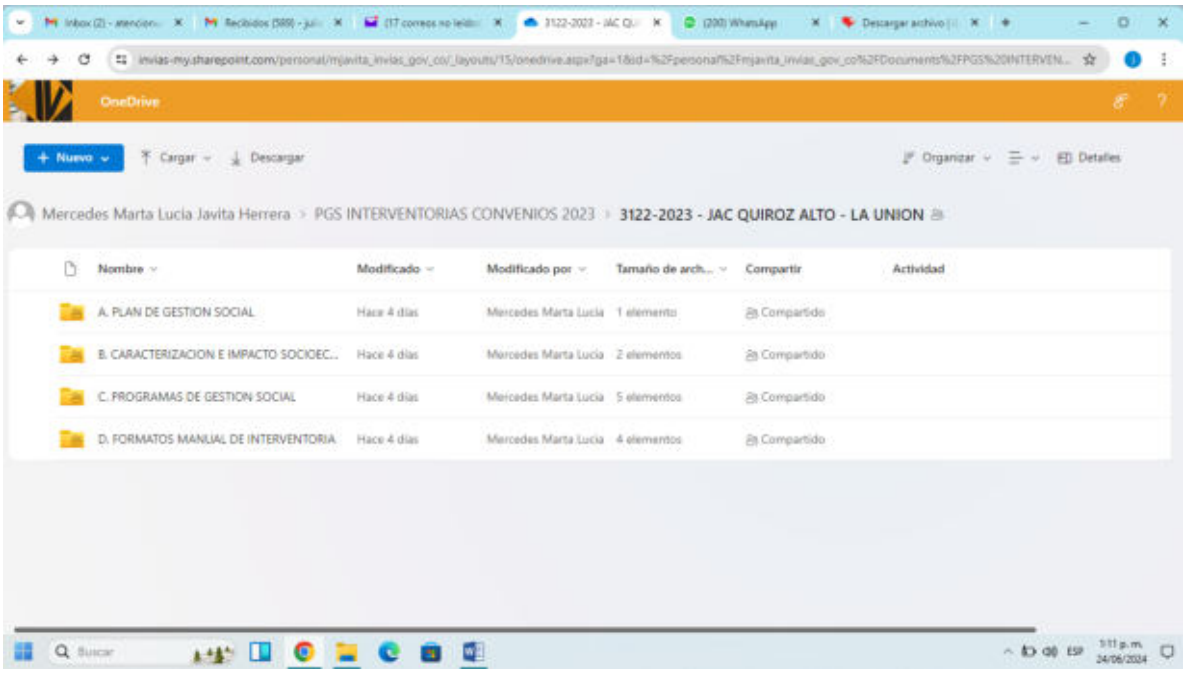


Anexo fotográfico 4: Cargue de documentos convenio Quiroz Alto.



Visita presencial desde el componente de gestión social – Quiroz Alto




Visita presencial desde el componente de gestión social – Quiroz Alto

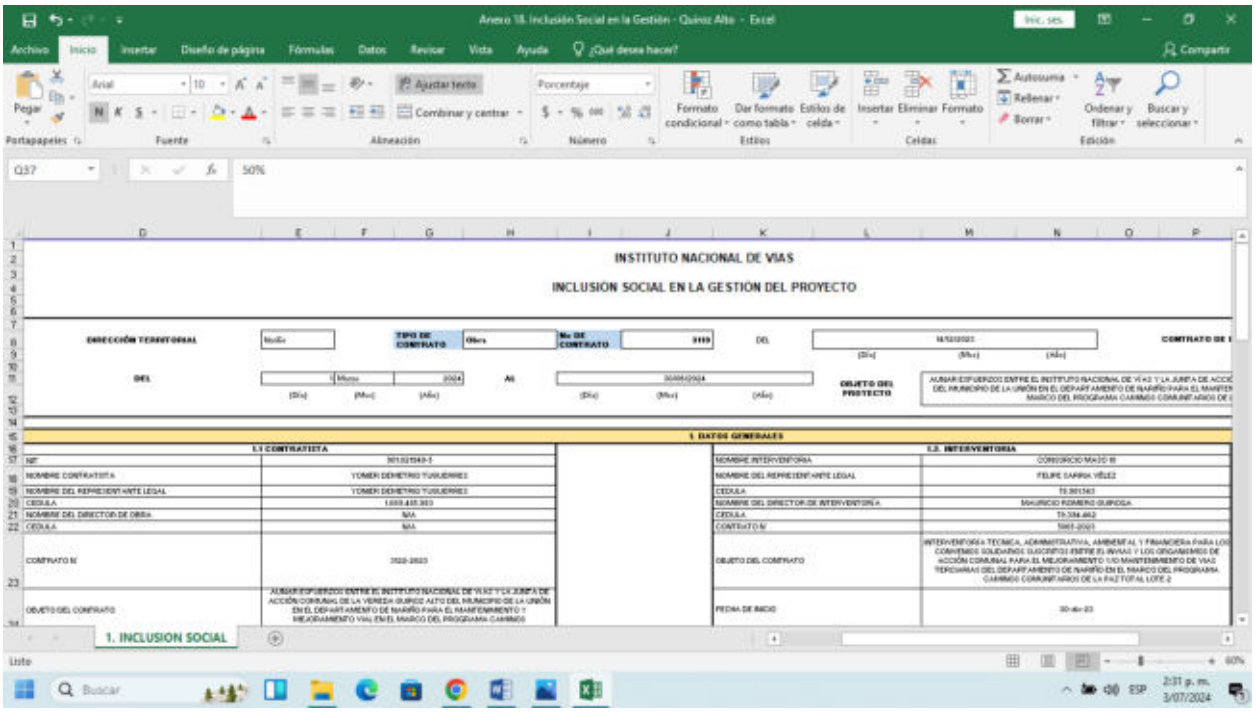


Diligenciamiento formato inclusión social de Quiroz Alto.


NUEVA FLORIDA

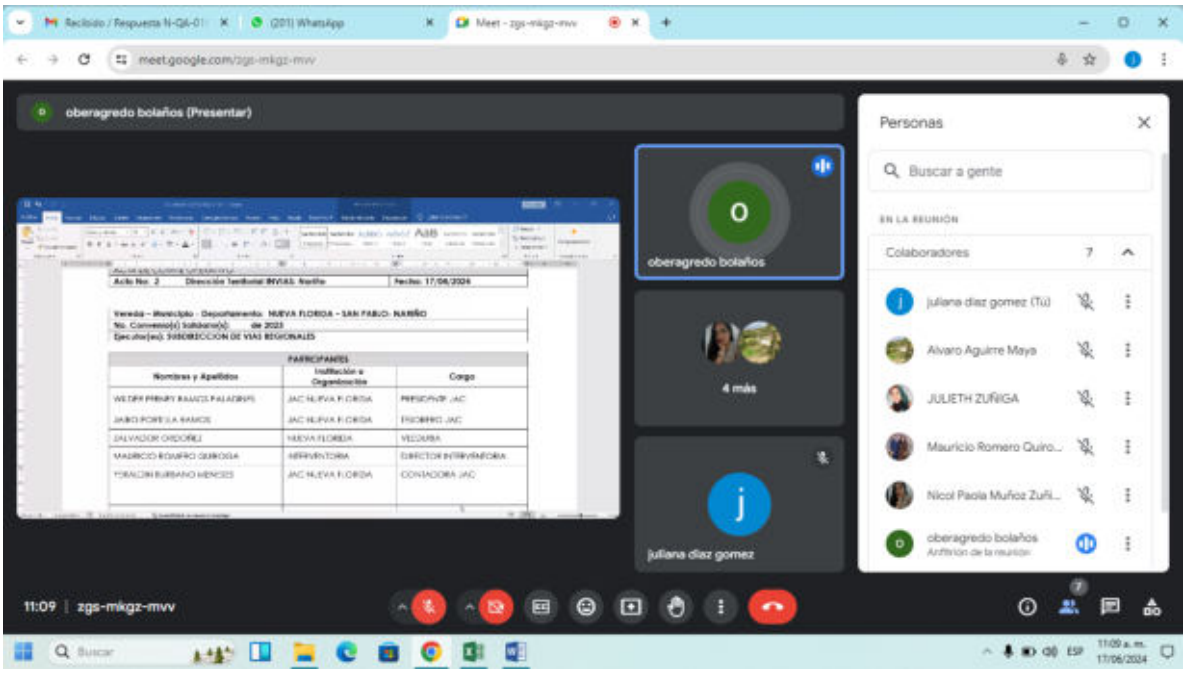


Asistencia al comité operativo de Nueva Florida.

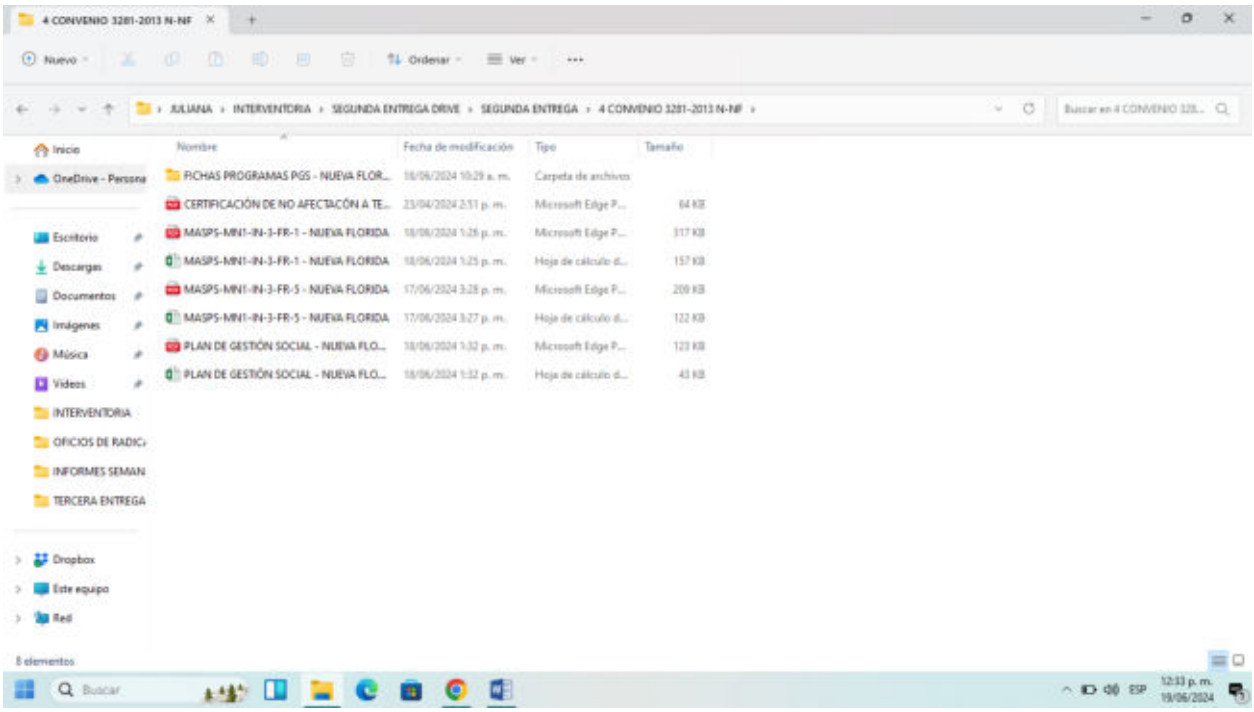


Organización de documentos de Nueva Florida para radicar a INVIAS

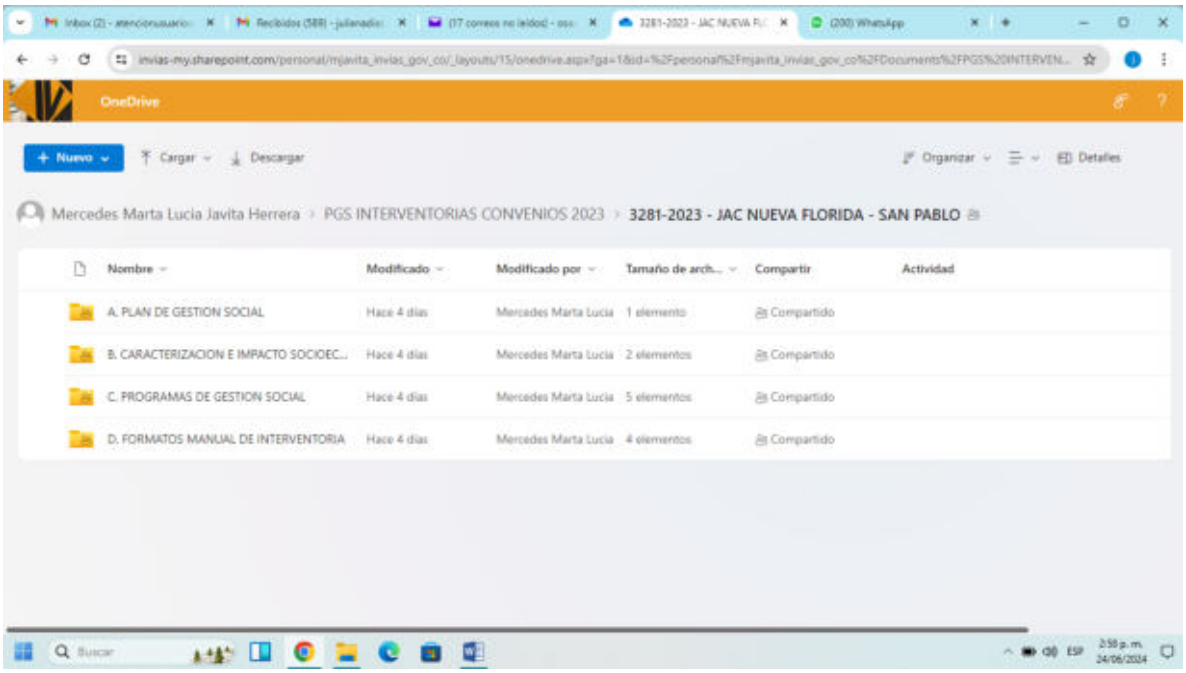

Cargue de documentos convenio de Nueva Florida

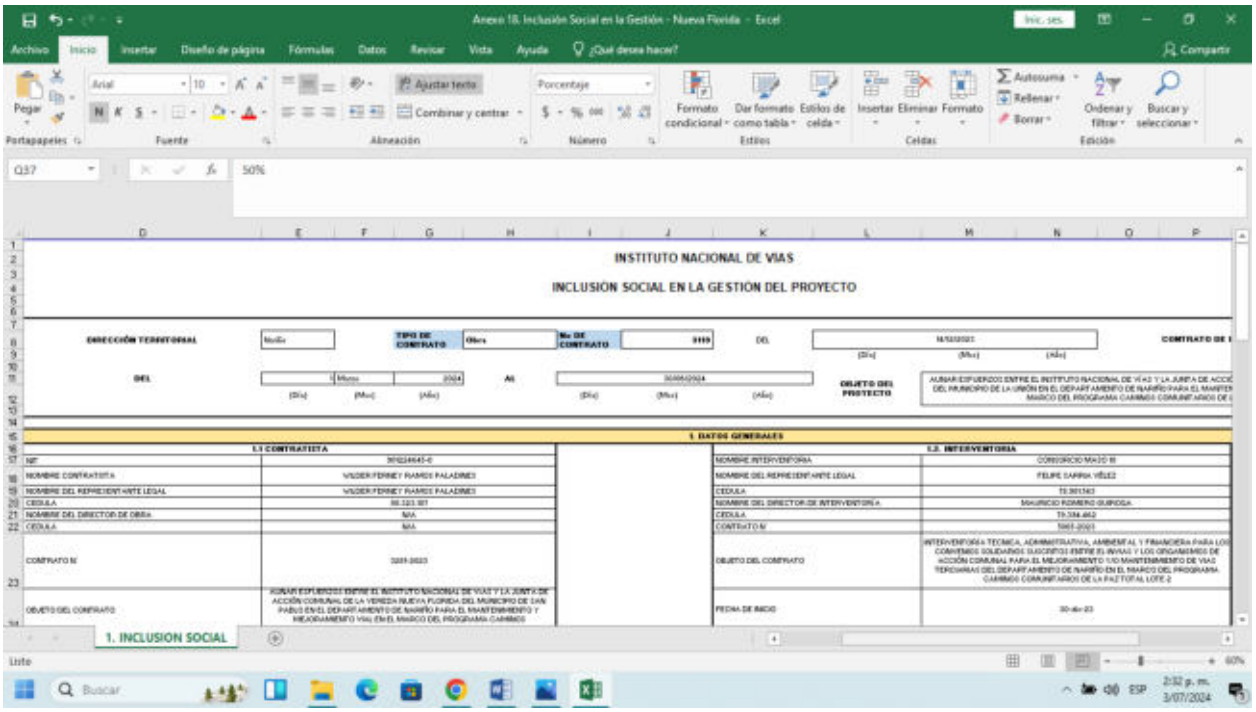

Diligenciamiento formato inclusión social de Nueva Florida.

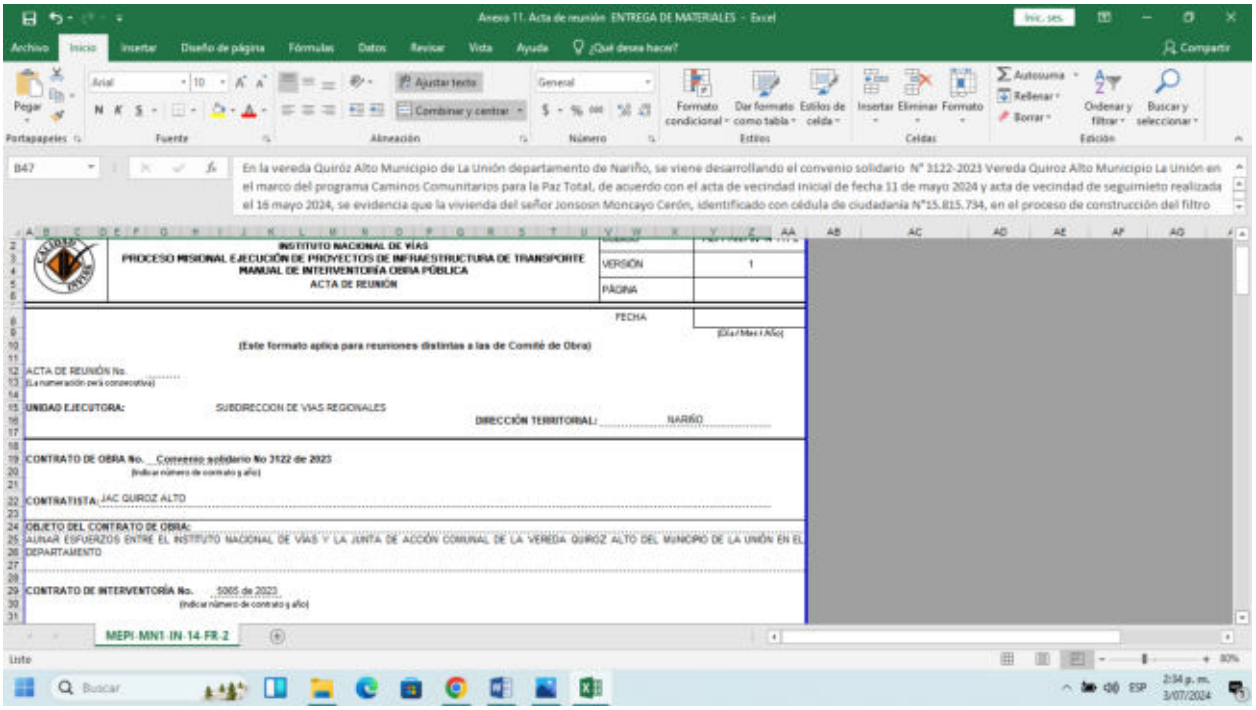

Diligenciamiento acta de entrega reparación de daños - Quiroz Alto.

OLIVOS



Re: ACTAS DE VECINDAD CORREGIDAS SEGUN OBSERVACIONES

De: OSAC S.A.S 2017 (osac2017@yahoo.com)
Para: anamariaerazo1116@gmail.com
CC: emiliasolarte32@gmail.com; ascjuntaslaurico019@gmail.com
Fecha: lunes, 17 de junio de 2024, 01:46 p. m. COT

Buenos dias

Ing. Carmen Emilia Solarte
Residente de obra
Vereda Olivos

Cordial saludo

En las actas de vecindad adjuntas, se encuentran las siguientes observaciones:


1. Acta de vecindad de la Sra. Jenny Ortega: falta firma del responsable de la unidad social en la pagina 3 y 5.
2. Acta de vecindad del Sr. Miller Ortega: falta firma del responsable de la unidad social en la pagina 3 y 5.
3. Acta de vecindad del Sr. Hernan Erazo: firma la misma persona como responsable de la unidad social y como testigo, lo cual, no es adecuado, considerando que, el testigo es un tercero que acompaña el proceso de levantamiento de vecindad.

De acuerdo a lo mencionado, se recomienda realizar los ajustes correspondientes para enviar la información corregida, a traves de éste mismo medio.


Cordialmente.

Consorcio MASO 10
Evelyn Juliana Díaz Gómez
Profesional Social


Observaciones actas de vecindad del convenio de Olivos.

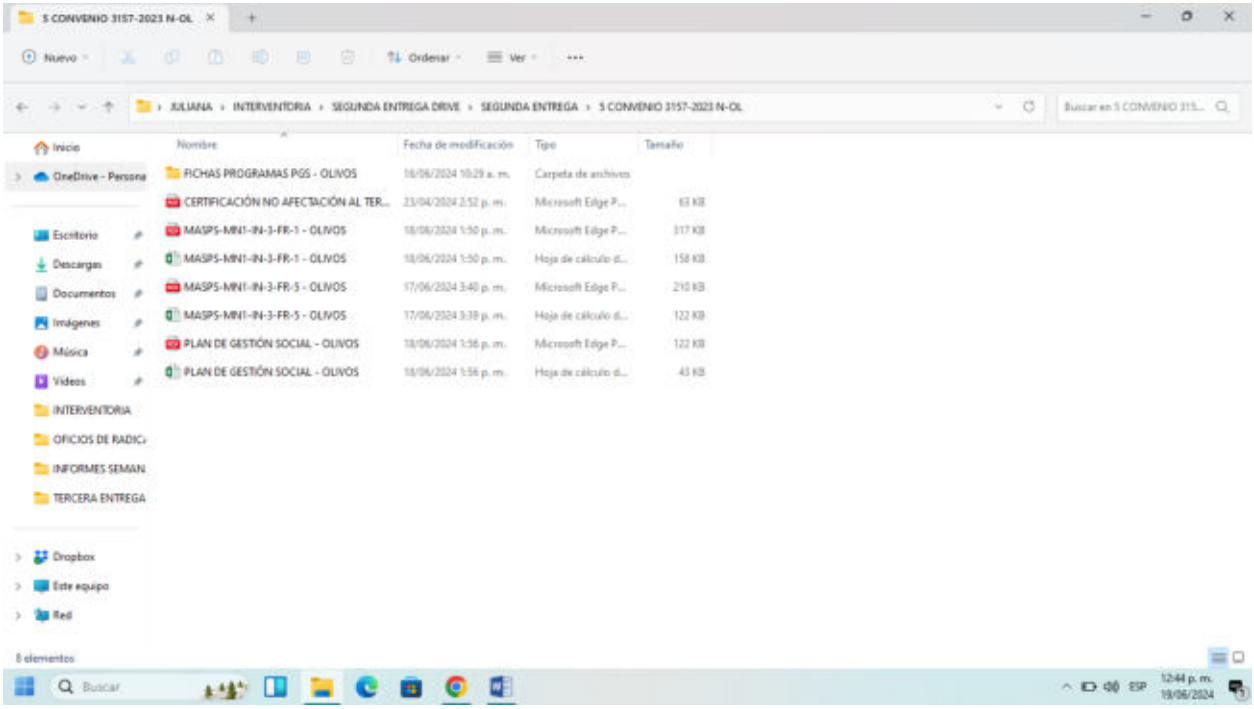

Organización de documentos de Olivos para radicar a INVIAS

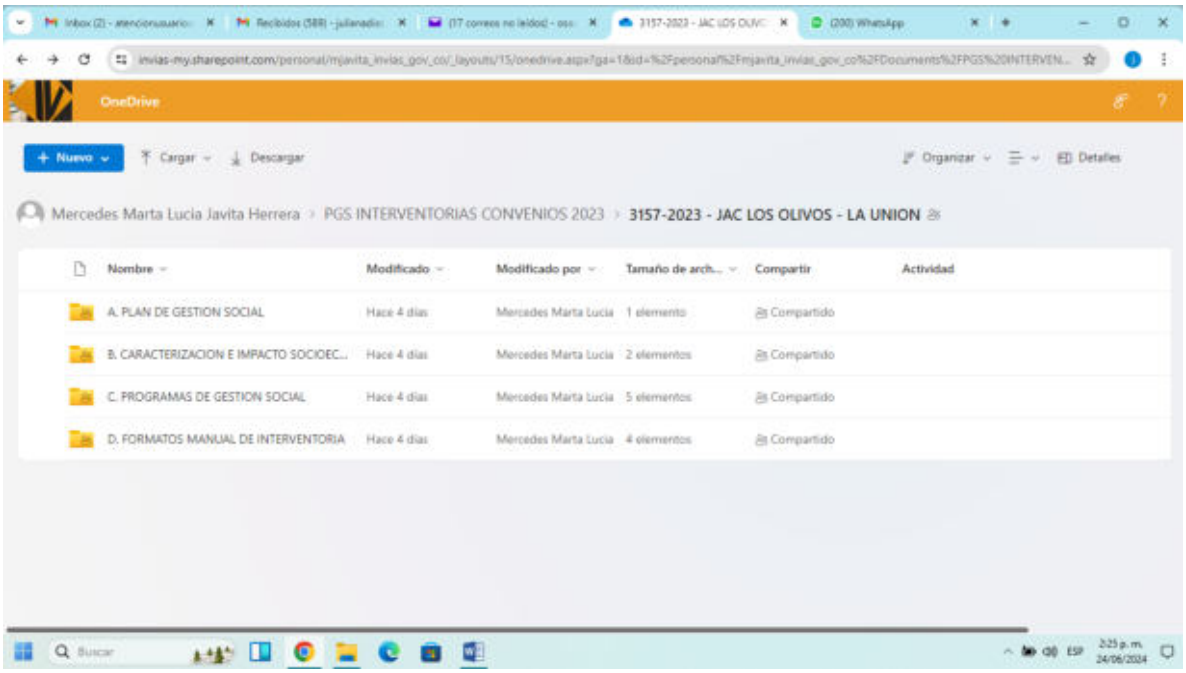

Cargue de documentos convenio de Olivos.

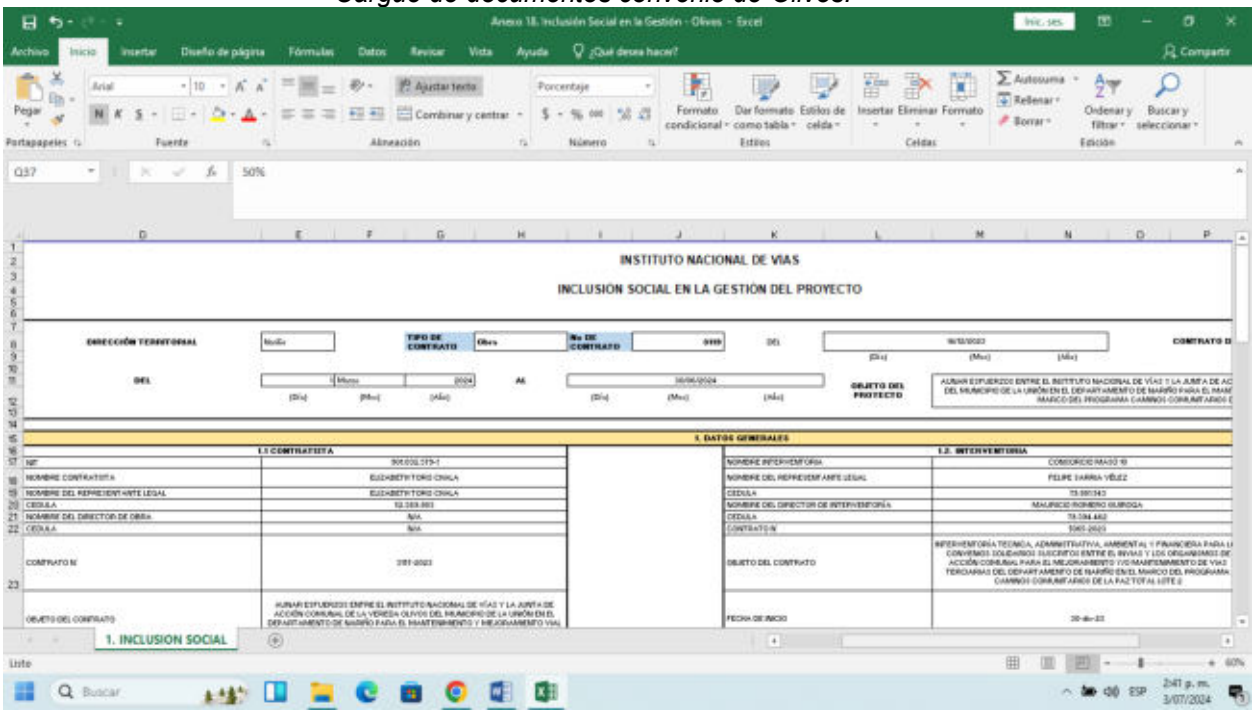

Diligenciamiento formato de inclusión social del convenio de Olivos.




Reunión comunitaria del convenio de Olivos – 27 junio 2024.




Reunión comunitaria del convenio de Olivos – 27 junio 2024.


QUIROZ BAJO

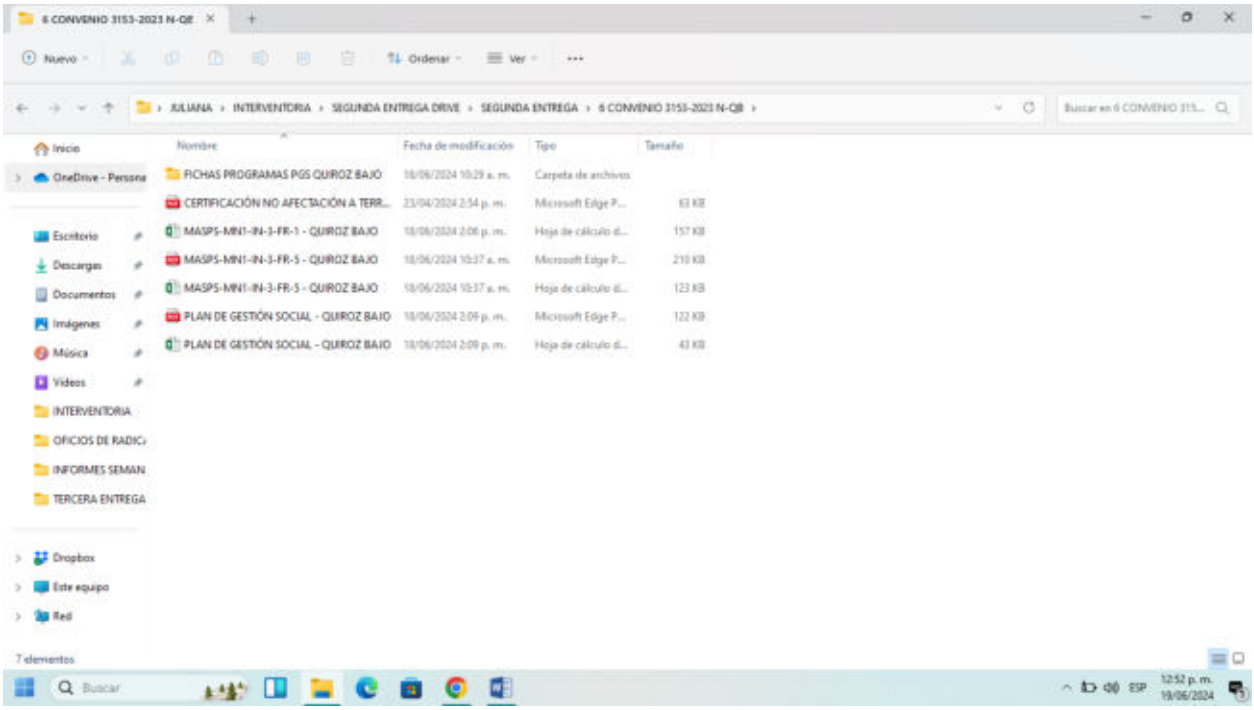

Organización de documentos de Quiroz Bajo para radicar a INVIAS

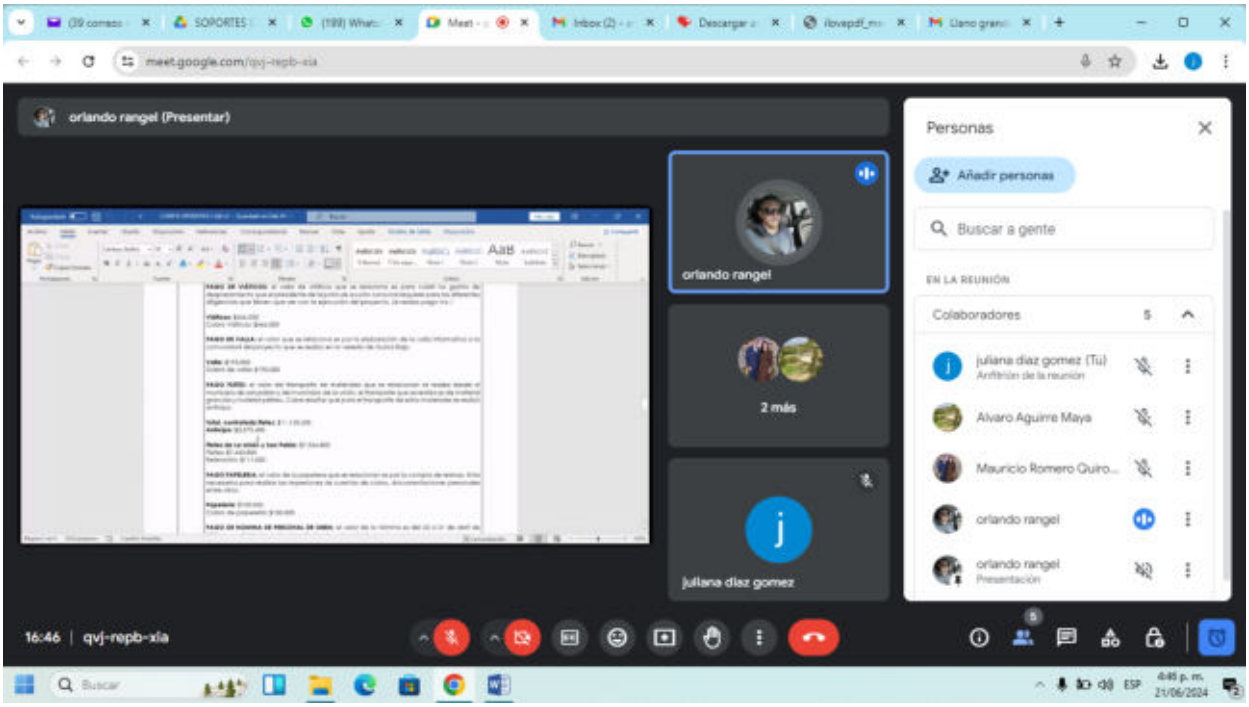

Asistencia a comité operativo de Quiroz Bajo.

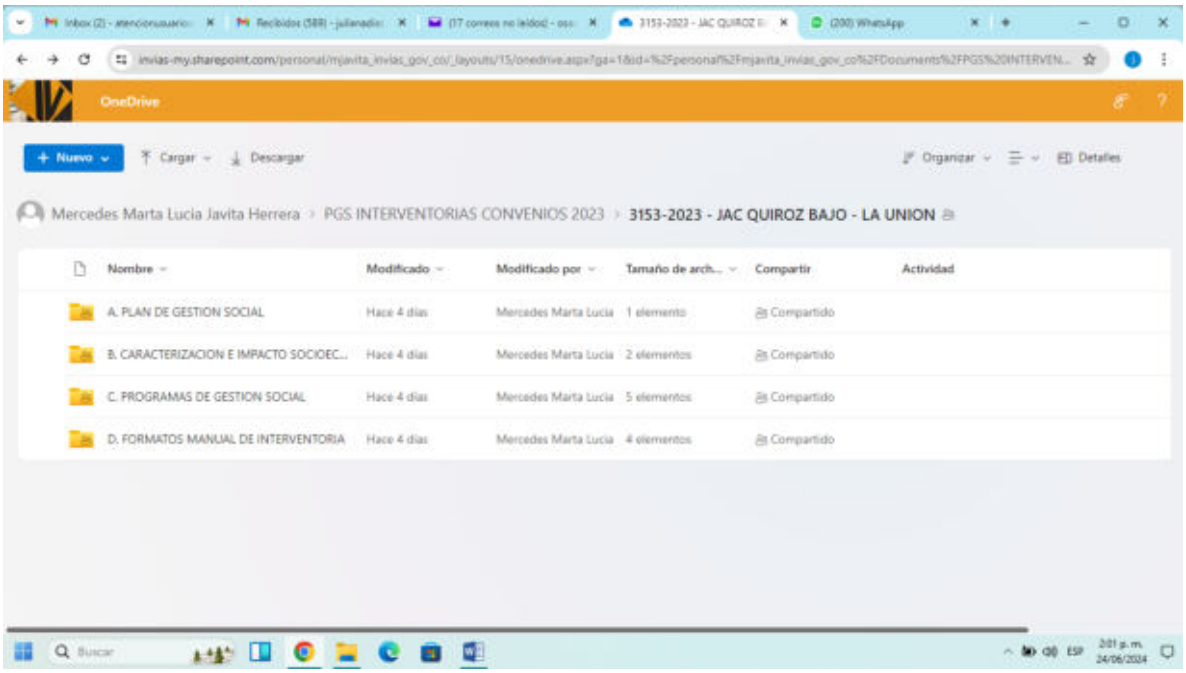


Anexo fotográfico 5: Cargue de documentos convenio Quiroz Bajo.



Visita presencial desde el componente de Gestión social – Quiroz Bajo – 25 junio 2024.




Visita presencial desde el componente de Gestión social – Quiroz Bajo – 25 junio 2024.

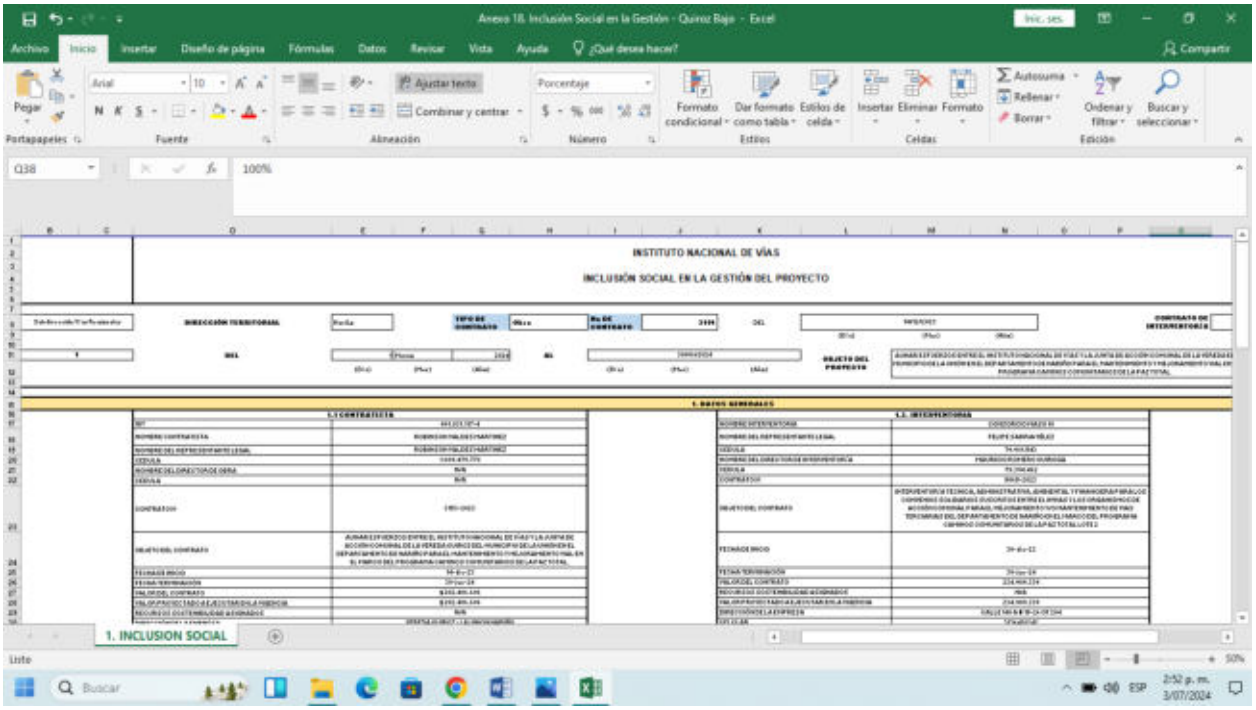

Diligenciamiento al formato: inclusión social convenio de Quiroz Bajo.


SAUCE

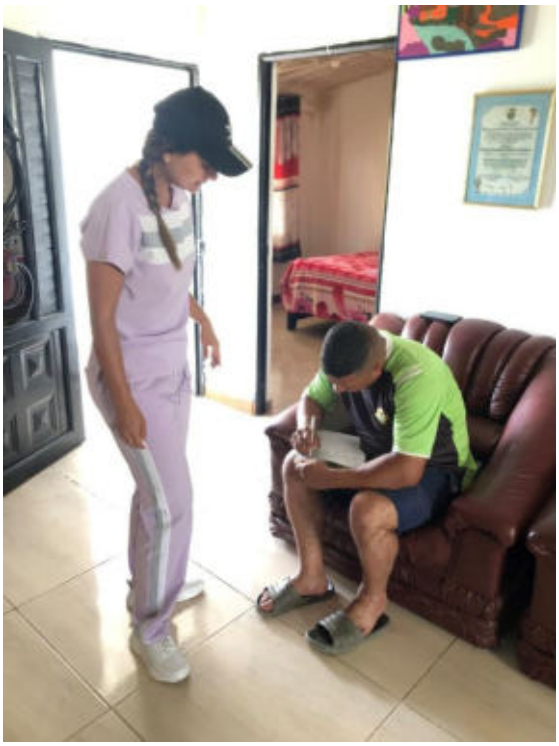


Visita de seguimiento convenio solidario de la vereda El Sauce.




Reunión comité operativo 3 de la vereda del Sauce 05 junio 2024.

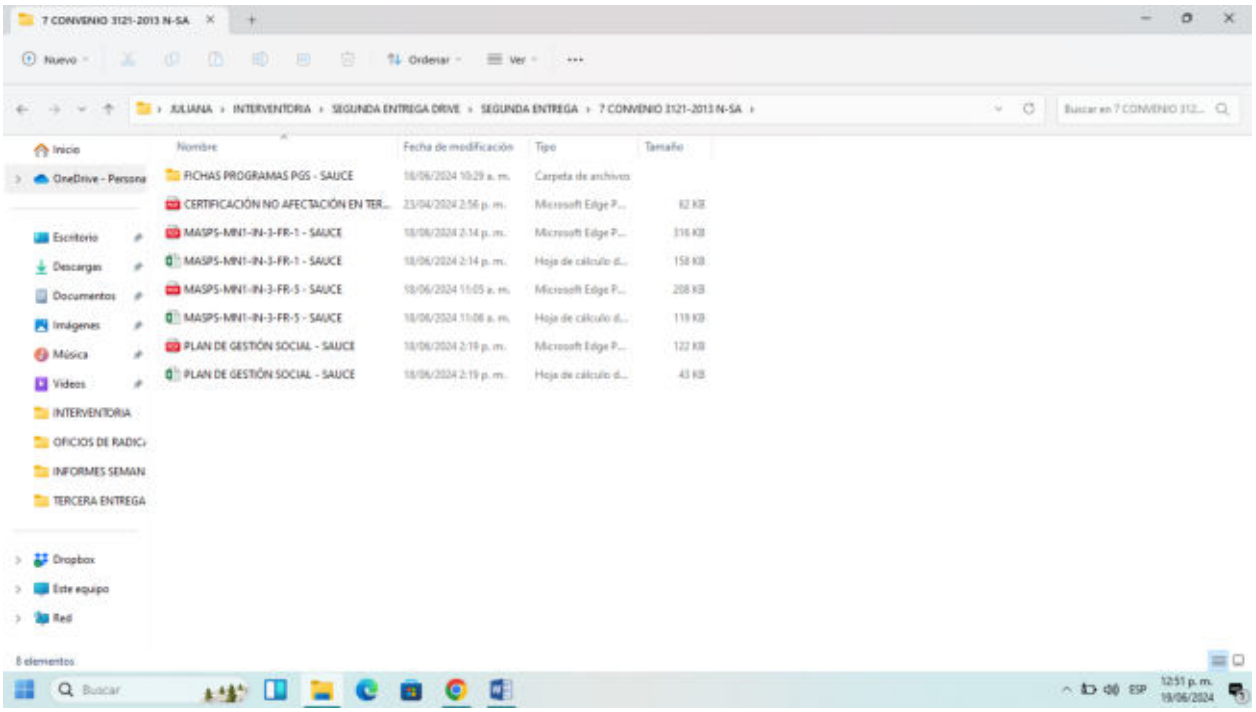

Organización de documentos de Sauce para radicar a INVIAS

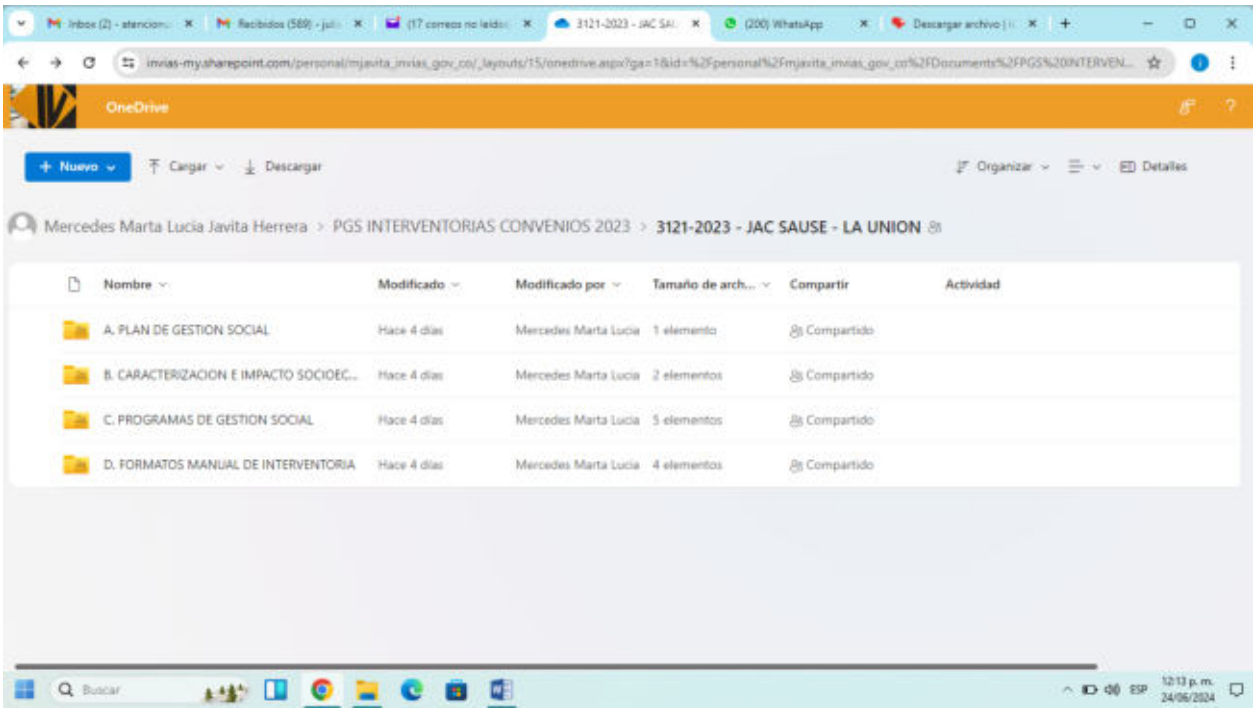

Cargue de documentos convenio del Sauce.

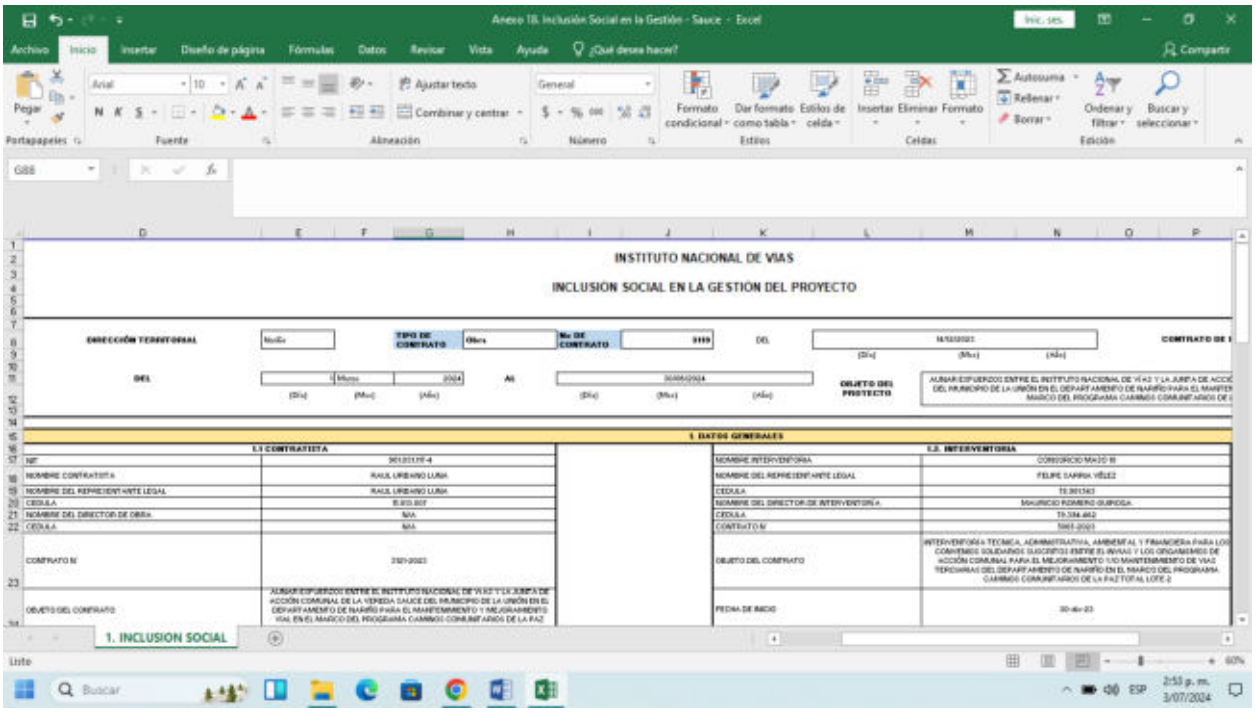

Anexo fotográfico 25: diligenciamiento al formato: inclusión social convenio de Sauce.

ESTUDIOS Y DISEÑOS

EAR ESTUDIO DE SUELOS CONSTRUCCION E INGENIERIA	**GRADO DE COMPACTACIÓN ALCANZADO EN EL TERRENO METODO CONO DE ARENA** **INV - E - 161**

SOLICITANTE: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SAUCE

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UBICACION: VEREDA DE EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

DESCRIPCIÓN DEL SUELO: SUB BASE GRANULAR CANTERA LA PLAYA LA UNION

CAPA: SUB BASE GRANULAR

Fecha Toma Muestra: lunes, 27 de mayo de 2024

Fecha de Entrega: sábado, 1 de junio de 2024

NUMERO DEL HOYO	1	2	3	4	5
ABSCISA:	K0+030	K0+070	K0+110		
Margen:	DER	IZQ	DER		
1. Peso Frasco y Arena Inicial (g)	5490	5484	5478		
2. Peso Frasco y Arena Restante (g)	2679	2747	2891		
3. Constate del Cono (g)	1590	1590	1590		
4. Peso de la Arena en en el Hoyo (1-2-3) (g)	1221	1147	997		
5. Densidad de la Arena (g/cm3)	1,386	1,386	1,386		
6. Volumne Total del Hoyo (4/5) (g)	881	828	719		
7. Peso Humendo Material Pasa 3/4" (g) - Recipiente 117gr	1931	1877	1638		
8. Peso Unitario Humedo (7/6) (g/cm3)	2,192	2,268	2,277		
9. Contenido de Humedad en Humedometro	11,45	15,30	15,48		
10. Peso Unitario Seco [(100*8)/(100+9)] (g/cm3)	1,967	1,967	1,972		
11. Densidad Seca Max. De Laboratorio (g/cm3)	1,970	1,970	1,970		
12. Humedad Optima (%)	12,50%	12,50%	12,50%	TRAMO PROMEDIO	
13. Compactación del Terreno (10/11)*100 (%)	**99,8**	**99,9**	**100,1**	**99,9**	
14. % de Compactación Especificada	95,0%	95,0%	95,0%		
15, OBSERVACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

HUMEDADES

MUESTRA Nº	1	1	1		
Nº RECIPIENTE	1	1	1		
LECTURA SPEEDY	13,8	18	18,2		
PROYECCION HORNO W%	11,45	15,30	15,48		
	Y= 0,9167X - 1,2				

OBSERVACIONES:

Edwin A. Ruiz E.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
Mat. 52769-025775 NRÑ

PRFSNL: EDWIN RUIZ
JEFE DE LABORATORIO

EAR ESTUDIO DE SUELOS CONSTRUCCION E INGENIERIA	**GRADO DE COMPACTACIÓN ALCANZADO EN EL TERRENO METODO CONO DE ARENA** **INV - E - 161**

SOLICITANTE: JUNTA DE ACCION COMUNAL 0LIVO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UBICACION: VEREDA OLIVO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

DESCRIPCIÓN DEL SUELO: SUB BASE GRANULAR CANTERA LA PLAYA LA UNION

CAPA: SUB BASE GRANULAR

Fecha Toma Muestra: miércoles, 12 de junio de 2024

Fecha de Entrega: jueves, 13 de junio de 2024

NUMERO DEL HOYO	1	2	3	4	5
ABSCISA:	K0+020	K0+090	K0+115		
Margen:	DER	IZQ	DER		
1. Peso Frasco y Arena Inicial (g)	5437	5431	5426		
2. Peso Frasco y Arena Restante (g)	2711	2922	2711		
3. Constate del Cono (g)	1590	1590	1590		
4. Peso de la Arena en en el Hoyo (1-2-3) (g)	1136	919	1125		
5. Densidad de la Arena (g/cm3)	1,386	1,386	1,386		
6. Volumne Total del Hoyo (4/5) (g)	820	663	812		
7. Peso Humendo Material Pasa 3/4" (g) - Recipiente 303gr	1856	1488	1723		
8. Peso Unitario Humedo (7/6) (g/cm3)	2,264	2,244	2,123		
9. Contenido de Humedad en Humedometro	13,28	13,47	12,55		
10. Peso Unitario Seco [(100*8)/(100+9)] (g/cm3)	1,999	1,978	1,886		
11. Densidad Seca Max. De Laboratorio (g/cm3)	1,970	1,970	1,970		
12. Humedad Optima (%)	12,50%	12,50%	12,50%	TRAMO PROMEDIO	
13. Compactación del Terreno (10/11)*100 (%)	**101,5**	**100,4**	**95,7**	99,2	
14. % de Compactación Especificada	95,0%	95,0%	95,0%		
15, OBSERVACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

HUMEDADES

MUESTRA Nº	1	1	1		
Nº RECIPIENTE	1	1	1		
LECTURA SPEEDY	15,8	16	15		
PROYECCION HORNO W%	13,28	13,47	12,55		
	Y= 0,9167X - 1,2				

OBSERVACIONES:

Edwin A. Ruiz E.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
Mat. 52769-025775 NRÑ

PRFSNL: EDWIN RUIZ
JEFE DE LABORATORIO

EAR ESTUDIO DE SUELOS CONSTRUCCION E INGENIERIA	**GRADO DE COMPACTACIÓN ALCANZADO EN EL TERRENO METODO CONO DE ARENA** **INV - E - 161**

SOLICITANTE: JUNTA DE ACCION COMUNAL QUIROZ ALTO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UBICACION: VEREDA DE QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

DESCRIPCIÓN DEL SUELO: SUB BASE GRANULAR CANTERA LA PLAYA LA UNION

CAPA: SUB BASE GRANULAR

Fecha Toma Muestra: miércoles, 12 de junio de 2024

Fecha de Entrega: jueves, 13 de junio de 2024

NUMERO DEL HOYO	1	2	3	4	5
ABSCISA:	K0+020	K0+080			
Margen:	IZQ	DER			
1. Peso Frasco y Arena Inicial (g)	5445	5441			
2. Peso Frasco y Arena Restante (g)	2815	2661			
3. Constate del Cono (g)	1590	1590			
4. Peso de la Arena en en el Hoyo (1-2-3) (g)	1040	1190			
5. Densidad de la Arena (g/cm3)	1,386	1,386			
6. Volumne Total del Hoyo (4/5) (g)	750	859			
7. Peso Humendo Material Pasa 3/4" (g) - Recipiente 303gr	1786	2012			
8. Peso Unitario Humedo (7/6) (g/cm3)	2,380	2,343			
9. Contenido de Humedad en Humedometro	14,93	15,30			
10. Peso Unitario Seco [(100*8)/(100+9)] (g/cm3)	2,071	2,032			
11. Densidad Seca Max. De Laboratorio (g/cm3)	1,970	1,970			
12. Humedad Optima (%)	12,50%	12,50%		TRAMO PROMEDIO	
13. Compactación del Terreno (10/11)*100 (%)	**105,1**	**103,2**		**104,1**	
14. % de Compactación Especificada	95,0%	95,0%		95,0%	
15, OBSERVACION	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	

HUMEDADES

MUESTRA Nº	1	1			
Nº RECIPIENTE	1	1			
LECTURA SPEEDY	17,6	18			
PROYECCION HORNO W%	14,93	15,30			
	Y= 0,9167X - 1,2				

OBSERVACIONES:

Edwin A. Ruiz E.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
Mat. 52769-025775 NRÑ

PRFSNL: EDWIN RUIZ
JEFE DE LABORATORIO

EAR ESTUDIO DE SUELOS CONSTRUCCION E INGENIERIA	**GRADO DE COMPACTACIÓN ALCANZADO EN EL TERRENO METODO CONO DE ARENA** **INV - E - 161**

SOLICITANTE: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL OLIVOS

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UBICACION: VEREDA OLIVO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

DESCRIPCIÓN DEL SUELO: SUB BASE GRANULAR CANTERA LA PLAYA LA UNION

CAPA: SUB BASE GRANULAR

Fecha Toma Muestra: miércoles, 12 de junio de 2024

Fecha de Entrega: jueves, 13 de junio de 2024

NUMERO DEL HOYO	1	2	3	4	5
ABSCISA:	K0+020	K0+090	K0+115		
Margen:	DER	IZQ	DER		
1. Peso Frasco y Arena Inicial (g)	5437	5431	5426		
2. Peso Frasco y Arena Restante (g)	2711	2922	2711		
3. Constate del Cono (g)	1590	1590	1590		
4. Peso de la Arena en en el Hoyo (1-2-3) (g)	1136	919	1125		
5. Densidad de la Arena (g/cm3)	1,386	1,386	1,386		
6. Volumne Total del Hoyo (4/5) (g)	820	663	812		
7. Peso Humendo Material Pasa 3/4" (g) - Recipiente 303gr	1856	1488	1723		
8. Peso Unitario Humedo (7/6) (g/cm3)	2,264	2,244	2,123		
9. Contenido de Humedad en Humedometro	13,28	13,47	12,55		
10. Peso Unitario Seco [(100*8)/(100+9)] (g/cm3)	1,999	1,978	1,886		
11. Densidad Seca Max. De Laboratorio (g/cm3)	1,970	1,970	1,970		
12. Humedad Optima (%)	12,50%	12,50%	12,50%	TRAMO PROMEDIO	
13. Compactación del Terreno (10/11)*100 (%)	**101,5**	**100,4**	**95,7**	**99,2**	
14. % de Compactación Especificada	95,0%	95,0%	95,0%		
15, OBSERVACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

HUMEDADES

MUESTRA Nº	1	1	1		
Nº RECIPIENTE	1	1	1		
LECTURA SPEEDY	15,8	16	15		
PROYECCION HORNO W%	13,28	13,47	12,55		
	Y= 0,9167X - 1,2				

OBSERVACIONES:

Edwin A. Ruiz E.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
Mat. 52769-025775 NRÑ

PRFSNL: EDWIN RUIZ
JEFE DE LABORATORIO

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA UNA RESISTENCIA DE 210 KG/CM2

Solicita:

Junta Acción Comunal Vereda El Peligro Municipio de la Unión.

Elaborado por:



DARIO ALEXANDER MARTINEZ R.
Esp. En geotecnia vial y pavimentos
M.P. 52850-014904 NRÑ
Coordinador general de Laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec

SAN JUAN DE PASTO

MAYO 2024

DISEÑO DE MEZCLAS

PROYECTO: DISEÑO DE MEZCLAS DE 210 kg/cm2

TIPO DE OBRA: Construcción Placa huella Vereda el peligro.

CEMENTO: CEMEX por 50 kg

TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO GRUESO: 1 1/2”

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE AGREGADO GRUESO: 1”

TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO FINO: 2”

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE AGREGADO FINO: 3/8”

PROCEDENCIA DE LOS AGREGADOS:

AGREGADO FINO: Cantera Arenas del Mayo Municipio de San Pablo

AGREGADO GRUESO: Cantera Arenas del Mayo Municipio de San Pablo

RELACION AGUA - CEMENTO: 0.47

Asentamiento o Slump: de 1” a 3” como máximo

CANTIDAD DE AGUA POR METRO CUBICO DE CONCRETO: 160 LITROS

CANTIDAD DE CEMENTO EN KILOS: 350 KL POR METRO CUBICO

DOSIFICACIÓN 1: 2: 3

1 PARTE: CEMENTO

2 PARTES DE AGREGADO FINO (ARENA)

3 PARTES DE AGREGADO GRUESO (GRAVA)

RECOMENDACIONES:

Se recomienda dosificar por volumen cada uno de los componentes de la mezcla tal como se especifica.

Datos generales

Agregados	Fino	Grueso
Masa Unitaria suelta kg/m3	1.200	1.380
Masa Unitaria compactada kg/m3	1.344	1.497
Densidad aparante kg/m3	1.344	1.497
Absorción %	2.0	1.51
Humedad W%	6.08	1.94
Tamaño máximo nominal mm	3/8"	1"

Calculo F´cr (resistencia promedio requerida)

F'c	210	kg/cm2
Factor de seguridad	84	

Nota: cuando no se tiene registro de resistencia de probetas correspondientes a obras anteriores

F´c	F´cr
Menos de 210	F'c + 70
210 - 350	F'c + 84
Más de 350	F'c + 98

se trabajará con este factor

210 + 84

284	**kg/cm2**	Resistencia requerida

Asentamiento escogido:

Elemento estructural	Asentamiento, mm	
	Mínimo	Máximo
Zapatas	25	75
Vigas	25	100
Columnas	25	100
Pavimentos y Losas	25	75

Asentamiento requerido	1" a 3"

Según la tabla anexa:

Tipo de estructura	Asentamiento, mm	
	Mínimo	Máximo [A]
Zapatas y muros de cimentación reforzados	25	75
Zapatas, cajones y muros de subestructuras sin refuerzo	25	75
Vigas y muros reforzados	25	100
Columnas de edificios	25	100
Pavimentos y losas	25	75
Concreto masivo	25	75

	PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS I.N.V. E – 222-223 – 13	Código:	
		Versión:	2024
		Fecha:	
		Aprobó:	

Proyecto:	"DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETOS DE 3000 PSI"		
Material:	Triturado y Arena		
Fuente:	municipio de la unión	**Muestra No**	1
Fecha de Ensayo:	3-may.-24	**Módulo**	N/A

Gravedad Especifica de Arena gruesa P No. 4 RET No. 40

	Ensayo	1	2	Promedio
a	**Peso seco de la muestra en gr.**	1983.00		
b	**Peso de la muestra saturada superficialmente seca**	2018.00		
c	**Peso sumergido de la muestra saturada con canastilla**	1955.00		
d	**Peso sumergido de la muestra saturada sin canastilla**	1285.00		
e	**Peso de la canastilla, en aire**	782.00		
f	**Peso de la canastilla sumergida**	682.00		
g	**Peso Especifico Aparente (a/(b-d))**	2.705		
h	**Peso Especifico Aparente S.S.S (b/(b-d))**	2.753		
i	**Peso Especifico Nominal (a/(a-d))**	2.841		
j	**% Absorción (b-a)/a**	1.7650		
	Gs Aparente	2.705		

Gravedad Especifica de Arena Finas pasante tamiz No. 40

	Ensayo	1	2	**Promedio**
a	**Peso seco final de la muestra, en (gr)**	495.00		
b	**Peso del picnómetro aforado lleno de agua, en (gr)**	695.00		
c	**Peso total del picnómetro aforado con la muestra y lleno de agua, en (gr)**	980.00		
s	**Peso de la muestra saturada, con superficie seca en (SSS) (gr)**	505.0		
d	**Peso Especifico Aparente (a/(b+s-c))**	2.250		
e	**Peso Especifico Aparente S.S.S (s/(b+s-c))**	2.295		
f	**Peso Especifico Nominal (a/(b+a-c))**	2.357		
g	**% Absorción (s-a)/a*100**	2.020		
	Promedio Gs Aparente	2.250		

OBSERVACIONES: _____

ELABORÓ	**REVISÓ:**	
DARIO MARTINEZ		DARIO MARTÍNEZ
LABORATORIO DE SUELOS		

	PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS I.N.V. E – 222-223 – 13	Código:	
		Versión:	2024
		Fecha:	
		Aprobó:	

Proyecto:	construccion de placa huellas		
Material:	arenas		
Fuente:	Municipio de la Unión	**Muestra No**	1
Fecha de Ensayo:	mayo de 2024	**Módulo**	N/A

Gravedad Especifica de Agregados Gruesos

	Ensayo	1	2	Promedio
a	**Peso seco de la muestra en gr.**	2980.00		
b	**Peso de la muestra saturada superficialmente seca**	3025.00		
c	**Peso sumergido de la muestra saturada con canastilla**	3933.00		
d	**Peso sumergido de la muestra saturada sin canastilla**	1756.00		
e	**Peso de la canastilla, en aire**	891.00		
f	**Peso de la canastilla sumergida**	792.00		
g	**Peso Especifico Aparente (a/(b-d))**	2.348		
h	**Peso Especifico Aparente S.S.S (b/(b-d))**	2.384		
i	**Peso Especifico Nominal (a/(a-d))**	2.435		
j	**% Absorción (b-a)/a**	1.51		
	Gs Aparente	2.348		

OBSERVACIONES: _____

ELABORÓ	**REVISÓ:**	
DARIO MARTINEZ		DARIO MARTINEZ
LABORATORIO DE SUELOS		

Tamaño máximo nominal (TMN)

Parámetros	Pulgada	mm	Medida mm	Tamaños máximos, según los parámetros		
				Ancho 1/5 d	Altura 1/3 h	Separación libre entre barras 3/4
Factor				5	3	0.75
TMN Gruesos (d)	1"	19.1				
TMN Finos (d)	3/8"	50.8				
Espesor del elemento estructural más pequeño:			200	40	66.7	
Separación de barras máximo:			60			45
Tamaño máximo nominal de agregado que cumple				1 1/2"	2"	1 1/2"
Tamaño máximo nominal de agregado sugerido				**1 1/2"**		

Contenido de aire en la mezcla:

% promedio aproximado de aire atrapado en la mezcla	TMN	
	Pulgadas	mm
1.7	1"	19.1

TMN		% Promedio aproximado de aire atrapado
Pulgadas	mm	
⅜	9,5	2,7
½	12,5	2,5
¾	19	2,0
1	25	1,7
1 ½	38	1,5
2	50	1,0
3	75	0,3
6	150	0,2

Contenido de agua en la mezcla:

Contenido de aire	Asentamiento cm	Agua en kg/m3
		38.1 mm
Concreto sin aire incluido	3 -- 5	160
Agua	160	l/m3

Contenido de aire	Asentamiento (cm)	Agua, en kg/m³ de concreto para los TMN del agregado indicados [A], mm							
		9,5	12,5	19	25	37,5	50 [B]	75 [B]	150 [B]
Concreto sin aire incluido	3 a 5	205	200	185	180	160	155	145	125
	8 a 10	225	215	200	195	175	170	160	140
	15 a 18	240	230	210	205	185	180	170	-
	Cantidad aproximada de aire atrapado en concreto sin aire incluido, %	3	2,5	2	1,5	1	0,5	0,3	0,2
Concreto con aire incluido	3 a 5	180	175	165	160	145	140	135	120
	8 a 10	200	190	180	175	160	155	150	135
	15 a 18	215	205	190	185	170	165	160	-
	Promedio recomendable de contenido total de aire, %	8	7	6	5	4,5	4	3,5	3

Masas unitarias sueltas y compactadas del agregado fino y grueso

Peso Unitario suelto				
ARENA	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	11.8	11.78	11.81	11.80
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	2155.32	2151.67	2157.15	2154.72
Peso material suelto + recipiente g	8235	8219	8265	8239.67
Peso del recipiente g	5654	5654	5654	5654.00
Masa del material g	2581	2565	2611	2585.67
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.197**	**1.192**	**1.210**	**1.200**
Humedad del material %	6.08	6.08	6.08	6.08

Peso compactado				
ARENA	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	11.8	11.78	11.81	11.80
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	2155.32	2151.67	2157.15	2154.72
Peso material suelto + recipiente g	8530	8549	8570	8549.67
Peso del recipiente g	5654	5654	5654	5654.00
Masa del material g	2876	2895	2916	2895.67
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.334**	**1.345**	**1.352**	**1.344**
Humedad del material %	6.08	6.08	6.08	6.08


Peso Unitario suelto				
TRITURADO	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	16.83	16.83	16.83	16.83
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	3074.08	3074.08	3074.08	3074.08
Peso material suelto + recipiente g	11499	11457	11456	11470.67
Peso del recipiente g	7227	7227	7227	7227.00
Masa del material g	4272	4230	4229	4243.67
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.390**	**1.376**	**1.376**	**1.380**
Humedad del material %	1.94	1.94	1.94	1.94

Peso Compactado				
TRITURADO	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	16.83	16.83	16.83	16.83
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	3074.08	3074.08	3074.08	3074.08
Peso material suelto + recipiente g	11840	11830	11820	11830.00
Peso del recipiente g	7227	7227	7227	7227.00
Masa del material g	4613	4603	4593	4603.00
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.501**	**1.497**	**1.494**	**1.497**
Humedad del material %	1.94	1.94	1.94	1.94

Relación agua-cemento:

Relación Agua-Cemento

Resistencia requerida	284	kg/cm2
R a/c	0.46	

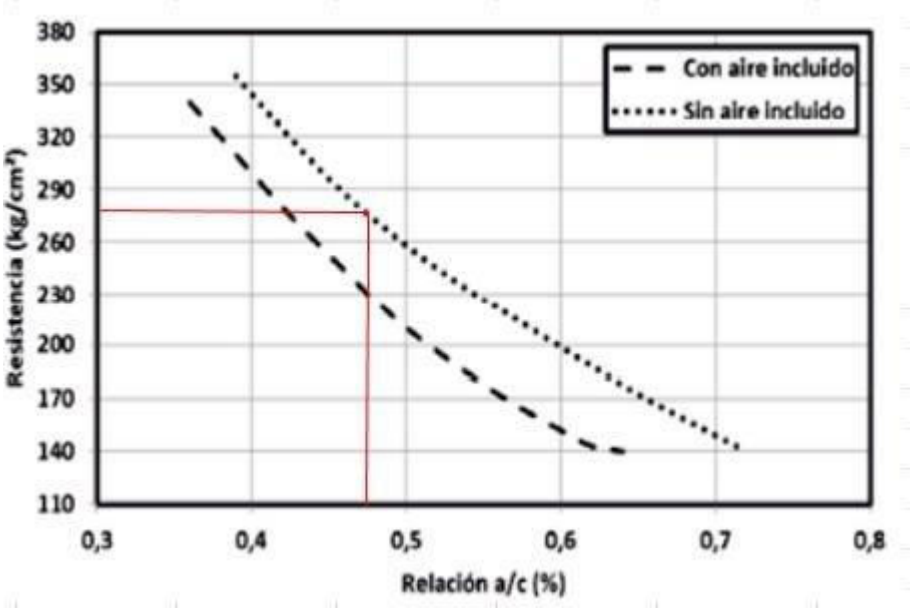

Contenido de cemento:

Contenido de cemento		
Cantidad de agua normal	160	lts
Relación Agua-cemento	0.46	
Cemento	347.8	kg/m3
Factor cemento	6.96	Sacos * 50 kg

Contenido de agregado grueso

Contenido de agregado grueso

Volumen de agregado grueso por m3 de concreto

b/bo

donde,

b:	Volumen de las partículas de agregado grueso * m3 de concreto		
bo:	Volumen de las partículas de agregado grueso * m3 de agregado grueso		
TMN Grava	1"		
Módulo de finura de arenas	3.6		
Factor	0.58	m3	
MUC-AGRUESO	1.497	Kg/m3	
PESO AGREGADO GRUESO	2.58165545	Kg	

	M dulo de finura del agragado fino																
TMN de la grava	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
25	0.74	0.73	0.72	0.71	0.7	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.6	0.59	0.58

Contenido de agregado fino

Contenido de agregado fino

Material			Peso unitario		Volumen Absoluto	
aire	1.7	%	100		0.01700	m3
agua	160	kg	1000	kg/m3	0.16000	m3
cemento	347.83	kg	2400	kg/m3	0.14493	m3
Agre. Grueso	2.582	kg	1.497	kg/m3	1.72455	m3
agre. Fino	0.33	kg	1.344	kg/m3	0.24382	m3

Total	2.290	m3

Corrección por humedad:

CORRECCIÓN POR HUMEDAD DE LOS AGREGADOS DE LA MEZCLA								
Material			**masa unitario compacta**		**Peso corregido**		**% humedad**	**% Absorción**
Agre. Grueso	2.58	kg	1.497	kg/m3	2.632	kg	1.94	1.51
Agre. Fino	2.29	kg	1.344	kg/m3	2.43	kg	6.08	2.02

APORTE DE AGUA A LA MEZCLA								
Material			**Peso unitario**		**Aporte de agua**		**% humedad**	**% Absorción**
Agre. Grueso	2.58	kg	1.497	kg/m3	0.0113	kg	1.94	1.51
Agre. Fino	2.29	kg	1.344	kg/m3	0.10	kg	6.08	2.02
			Total aporte de agua		**0.11**	**lts**		

Agua solicitada:	160.00	l/m3
Aporte de agua agregados	0.11	l/m3
Total agua efectiva	**160.11**	**l/m3**

Proporciones generales por volumen en el diseño de mezclas de un concreto hidráulico de 3000 PSI con cemento Cemex por 50 kg cada saco

CEMENTO	A. FINO	A. GRUESO	AGUA
1	2	3	160

Lts

HUMEDAD NATURAL

INV E -122

PROYECTO : Diseño de mezclas de concreto para placahuella

SOLICITA: Alcaldía del muncipio de la Unión **FECHA:** abril de 2024

ELABORÓ: Laboratorio de suelos Ingeomec

UBICACIÓN: Municipio de la Univón - Nariño

TIPO DE MATERIAL: **TRITURADO**

MUESTRA: 1 **PROFUNDIDAD:** Variable

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE LAS MUESTRAS

MUESTRA	SIGLAS	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3
Peso tara+muestra humeda (g)	**P1**	3318.00		
Peso tara+muestra seca (g)	**P2**	3258.00		
Peso tara (g)	**P3**	167.00		
Peso suelo húmedo (g)	**Psh**	3151.00		
Peso Suelo seco (g)	**Pss**	3091.00		
Contenido de agua (g)	**Pw**	60.00		
Humedad (%)	**W**	**1.94**		
Humedad (%) promedio	**w%**	1.94		

OBSERVACIONES :

ELABORÓ:

DARIO ALEXANDER MARTINEZ R
M.P. 52850-014904 NRÑ
Esp. En geotecnia vial y pavimentos
Coordinador general de laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec

HUMEDAD NATURAL

INV E -122

PROYECTO : Diseño de mezclas de concreto para placahuella

SOLICITA: Alcaldía del muncipio de la Unión **FECHA:** abril de 2024

ELABORÓ: Laboratorio de suelos Ingeomec

UBICACIÓN: Municipio de la Univón - Nariño

MUESTRA: 1 **PROFUNDIDAD:** Variable

TIPO DE MATERIAL: **ARENA TONALIDAD AMARILLENTA CON MATICES GRISÁCEOS**

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE LAS MUESTRAS

MUESTRA	SIGLAS	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3
Peso tara+muestra humeda (g)	**P1**	741.00		
Peso tara+muestra seca (g)	**P2**	708.00		
Peso tara (g)	**P3**	165.00		
Peso suelo húmedo (g)	**Psh**	576.00		
Peso Suelo seco (g)	**Pss**	543.00		
Contenido de agua (g)	**Pw**	33.00		
Humedad (%)	**W**	**6.08**		
Humedad (%) promedio	**w%**	6.08		

OBSERVACIONES :

ELABORÓ:

DARIO ALEXANDER MARTINEZ R
M.P. 52850-014904 NRÑ
Esp. En geotecnia vial y pavimentos
Coordinador general de laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec


	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO **I.N.V. E – 213 –13**	Código:	
		Versión:	2024

Proyecto:	Elaboración de diseño de mezclas de concreto hidráulico		
Material:	Triturado Tamaño Maximo 2"	**Tamaño Maximo Nominal**	1"
Fuente:	De cantera	**Tamaño máximo**	1 1/2"
Fecha de Ensayo:	mayo de 2024	**TIPO MUESTRA**	Triturado

GRANULOMETRIA

Humedad natural W%:	1.94	%			
Peso Humedo:	7033.0	gr	Peso seco lavado	6909	gr
peso seco:	6899.1	gr			

Tamiz		*Peso retenido*	*Retenido*	*Acumulado*	*Pasa*
Pulgadas	***Milímetros***	***(gr)***	***(%)***	***(%)***	***(%)***
2"	*50.800*	0.00	0.000	0.00	100.00
1.1/2"	*38.100*	0.00	0.000	0.00	100.00
1.0"	*25.400*	113.57	1.644	1.64	98.36
3/4"	19.100	1607.00	23.260	24.90	75.10
1/2"	12.700	2712.00	39.253	64.16	35.84
3/8"	9.510	1559.00	22.565	86.72	13.28
No 4	4.760	898.00	12.998	99.72	0.28
Fondo		19.43	0.281	100.00	0.00
TOTAL		6909.00	100		

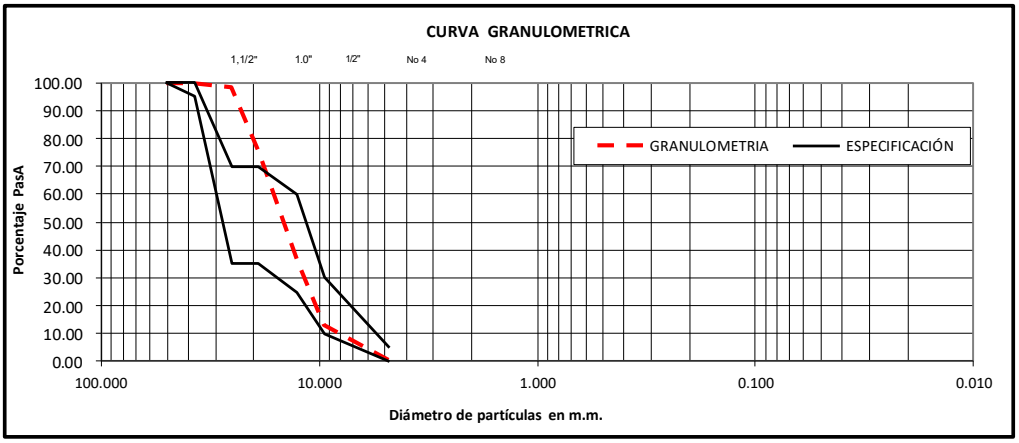

Módulo de finura 2.77

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	**REVISÓ:**
DARIO ALEXANDER MARTINEZ R M.P. 52850-014904 NRÑ Esp. En geotecnia vial y pavimentos Coordinador general de laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec	


	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO **I.N.V. E – 213 – 13**	Código:	
		Versión:	2024
		Fecha:	
		Aprobó:	

Proyecto:	Construcción de placa huellas en el municipio de la Unión		
Material:	Arena Tamaño Maximo de 2"	**Tamaño máximo nominal**	3/8"
Fuente:	De Peña	**Tamaño máximo**	2"
Fecha de Ensayo	mayo de 2024	**tipo de material**	Arena gris

GRANULOMETRIA

Humedad natural W%:	6.08	%			
Peso Humedo:	3927.0	gr	Peso seco lavado	3655	gr
peso seco:	3702.0	gr			

Tamiz		***Peso retenido***	***Retenido***	***Acumulado***	***Pasa***
Pulgadas	***Milímetros***	***(gr)***	***(%)***	***(%)***	***(%)***
2 1/2"	63.5	0.00	0.000	0.00	100.00
2"	50.8	0.00	0.000	0.00	100.00
1 1/2"	38.1	69.17	1.892	1.89	98.11
1"	25.4	129.51	3.543	5.44	94.56
3/4"	19.1	25.49	0.697	6.13	93.87
1/2"	12.7	150.11	4.107	10.24	89.76
3/8"	9.75	53.34	1.459	11.70	88.30
No 4	4.75	184.06	5.036	16.74	83.26
No 8	2.36	288.13	7.883	24.62	75.38
No 16	1.18	520.00	14.227	38.85	61.15
No 30	0.6	747.00	20.438	59.28	40.72
No 50	0.3	1010.00	27.633	86.92	13.08
No 100	0.15	394.00	10.780	97.70	2.30
P		84.19	2.303	100.00	0.00
TOTAL		3655.00	100.0		

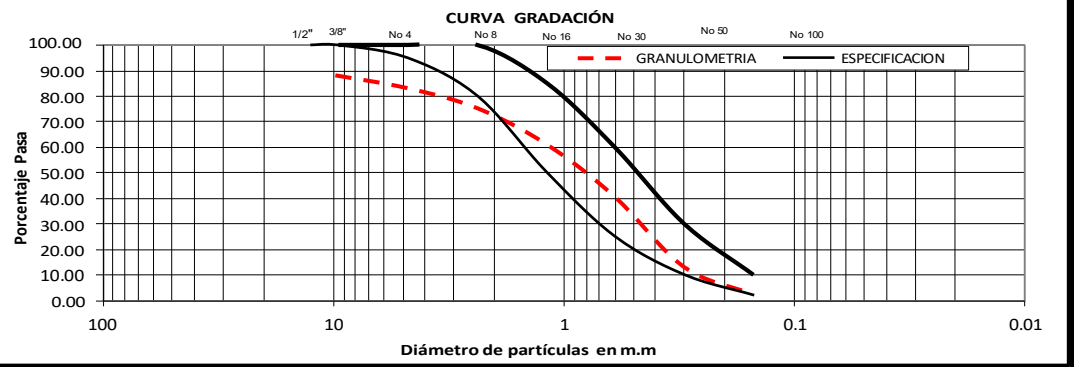

D60 0.7 D D1 0.15

Módulo de finura 3.6

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	**REVISÓ:**
DARIO ALEXANDER MARTINEZ R M.P. 52850-014904 NRÑ Esp. En geotecnia vial y pavimentos Coordinador general de laboratorio de	

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA UNA RESISTENCIA DE 3.8 MR

Solicita:

VEREDA OLIVOS

Elaborado por:



DARIO ALEXANDER MARTINEZ R.
Esp. En geotecnia vial y pavimentos
M.P. 52850-014904 NRÑ
Coordinador general de Laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec

SAN JUAN DE PASTO

MAYO 2024

DISEÑO DE MEZCLAS

PROYECTO: DISEÑO DE MEZCLAS DE 3.8 MR

TIPO DE OBRA: Construcción Placa huellas

CEMENTO: Cemex por 50 kg

TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO GRUESO: 1 1/2”

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE AGREGADO GRUESO: 1”

TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO FINO: 2”

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE AGREGADO FINO: 3/8”

PROCEDENCIA DE LOS AGREGADOS:

AGREGADO FINO: Municipio de San Pablo

AGREGADO GRUESO: Municipio de San Pablo

RELACION AGUA - CEMENTO: 0.44

Asentamiento o Slump: de 1” a 3” como máximo

CANTIDAD DE AGUA POR METRO CUBICO DE CONCRETO: 185 LITROS

CANTIDAD DE CEMENTO EN KILOS: 420 KL POR METRO CUBICO

DOSIFICACIÓN 1: 2: 2.5

1 PARTE: CEMENTO

2 PARTES DE AGREGADO FINO (ARENA)

2.5 PARTES DE AGREGADO GRUESO (GRAVA)

RECOMENDACIONES:

Se recomienda dosificar por volumen cada uno de los componentes de la mezcla tal como se especifica.

Datos generales

Agregados	Fino	Grueso
Masa Unitaria suelta kg/m3	1.200	1.380
Masa Unitaria compactada kg/m3	1.344	1.497
Densidad aparante kg/m3	1.344	1.497
Absorción %	2.0	1.51
Humedad W%	6.08	1.94
Tamaño máximo nominal mm	3/8"	1"

Calculo F´cr (resistencia promedio requerida)

F'c	210	kg/cm2
Factor de seguridad	84	

Nota: cuando no se tiene registro de resistencia de probetas correspondientes a obras anteriores

F´c	F´cr	
Menos de 210	F'c + 70	
210 - 350	F'c + 84	se trabajará con este factor
Más de 350	F'c + 98	

210 + 84

294	**kg/cm2**	Resistencia requerida

Asentamiento escogido:

Elemento estructural	Asentamiento, mm	
	Mínimo	Máximo
Zapatas	25	75
Vigas	25	100
Columnas	25	100
Pavimentos y Losas	25	75

Asentamiento requerido	1" a 3"

Según la tabla anexa:

Tipo de estructura	Asentamiento, mm	
	Mínimo	Máximo [A]
Zapatas y muros de cimentación reforzados	25	75
Zapatas, cajones y muros de subestructuras sin refuerzo	25	75
Vigas y muros reforzados	25	100
Columnas de edificios	25	100
Pavimentos y losas	25	75
Concreto masivo	25	75

	PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS I.N.V. E – 222-223 – 13	Código:
		Versión: 2024
		Fecha:
		Aprobó:

Proyecto:	"DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETOS DE 3000 PSI"		
Material:	Triturado y Arena		
Fuente:	municipio de la unión	**Muestra No**	1
Fecha de Ensayo:	3-may.-24	**Módulo**	N/A

Gravedad Especifica de Arena gruesa P No. 4 RET No. 40

	Ensayo	1	2	Promedio
a	**Peso seco de la muestra en gr.**	1983.00		
b	**Peso de la muestra saturada superficialmente seca**	2018.00		
c	**Peso sumergido de la muestra saturada con canastilla**	1955.00		
d	**Peso sumergido de la muestra saturada sin canastilla**	1285.00		
e	**Peso de la canastilla, en aire**	782.00		
f	**Peso de la canastilla sumergida**	682.00		
g	**Peso Especifico Aparente (a/(b-d))**	2.705		
h	**Peso Especifico Aparente S.S.S (b/(b-d))**	2.753		
i	**Peso Especifico Nominal (a/(a-d))**	2.841		
j	**% Absorción (b-a)/a**	1.7650		
	Gs Aparente	2.705		

Gravedad Especifica de Arena Finas pasante tamiz No. 40

	Ensayo	1	2	**Promedio**
a	**Peso seco final de la muestra, en (gr)**	495.00		
b	**Peso del picnómetro aforado lleno de agua, en (gr)**	695.00		
c	**Peso total del picnómetro aforado con la muestra y lleno de agua, en (gr)**	980.00		
s	**Peso de la muestra saturada, con superficie seca en (SSS) (gr)**	505.0		
d	**Peso Especifico Aparente (a/(b+s-c))**	2.250		
e	**Peso Especifico Aparente S.S.S (s/(b+s-c))**	2.295		
f	**Peso Especifico Nominal (a/(b+a-c))**	2.357		
g	**% Absorción (s-a)/a*100**	2.020		
	Promedio Gs Aparente	2.250		

OBSERVACIONES: _____

ELABORÓ	**REVISÓ:**	
DARIO MARTINEZ		DARIO MARTÍNEZ
LABORATORIO DE SUELOS		

	PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS I.N.V. E – 222-223 – 13	Código:	
		Versión:	2024
		Fecha:	
		Aprobó:	

Proyecto:	construccion de placa huellas		
Material:	arenas		
Fuente:	Municipio de la Unión	**Muestra No**	1
Fecha de Ensayo:	mayo de 2024	**Módulo**	N/A

Gravedad Especifica de Agregados Gruesos

	Ensayo	1	2	Promedio
a	**Peso seco de la muestra en gr.**	2980.00		
b	**Peso de la muestra saturada superficialmente seca**	3025.00		
c	**Peso sumergido de la muestra saturada con canastilla**	3933.00		
d	**Peso sumergido de la muestra saturada sin canastilla**	1756.00		
e	**Peso de la canastilla, en aire**	891.00		
f	**Peso de la canastilla sumergida**	792.00		
g	**Peso Especifico Aparente (a/(b-d))**	2.348		
h	**Peso Especifico Aparente S.S.S (b/(b-d))**	2.384		
i	**Peso Especifico Nominal (a/(a-d))**	2.435		
j	**% Absorción (b-a)/a**	1.51		
	Gs Aparente	2.348		

OBSERVACIONES: _____

ELABORÓ	**REVISÓ:**	
DARIO MARTINEZ		DARIO MARTÍNEZ
LABORATORIO DE SUELOS		

Tamaño máximo nominal (TMN)

Parámetros	Pulgada	mm	Medida mm	Tamaños máximos, según los parámetros		
				Ancho 1/5 d	Altura 1/3 h	Separación libre entre barras 3/4
Factor				5	3	0.75
TMN Gruesos (d)	1"	19.1				
TMN Finos (d)	3/8"	50.8				
Espesor del elemento estructural más pequeño:			200	40	66.7	
Separación de barras máximo:			60			45
Tamaño máximo nominal de agregado que cumple				1 1/2"	2"	1 1/2"
Tamaño máximo nominal de agregado sugerido				**1 1/2"**		

Contenido de aire en la mezcla:

% promedio aproximado de aire atrapado en la mezcla	TMN	
	Pulgadas	mm
1.7	1"	19.1

TMN		% Promedio aproximado de aire atrapado
Pulgadas	mm	
⅜	9,5	2,7
½	12,5	2,5
¾	19	2,0
1	25	1,7
1 ½	38	1,5
2	50	1,0
3	75	0,3
6	150	0,2

Contenido de agua en la mezcla:

Contenido de aire	Asentamiento cm	Agua en kg/m3
		38.1 mm
Concreto sin aire incluido	3 -- 5	185
Agua	185	l/m3

Contenido de aire	Asentamiento (cm)	Agua, en kg/m³ de concreto para los TMN del agregado indicados ^, mm							
		9,5	12,5	19	25	37,5	50 ª	75 ª	150 ª
Concreto sin aire incluido	3 a 5	205	200	185	180	160	155	145	125
	8 a 10	225	215	200	195	175	170	160	140
	15 a 18	240	230	210	205	185	180	170	-
	Cantidad aproximada de aire atrapado en concreto sin aire incluido, %	3	2,5	2	1,5	1	0,5	0,3	0,2
Concreto con aire incluido	3 a 5	180	175	165	160	145	140	135	120
	8 a 10	200	190	180	175	160	155	150	135
	15 a 18	215	205	190	185	170	165	160	-
	Promedio recomendable de contenido total de aire, %	8	7	6	5	4,5	4	3,5	3

Masas unitarias sueltas y compactadas del agregado fino y grueso

Peso Unitario suelto				
ARENA	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	11.8	11.78	11.81	11.80
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	2155.32	2151.67	2157.15	2154.72
Peso material suelto + recipiente g	8235	8219	8265	8239.67
Peso del recipiente g	5654	5654	5654	5654.00
Masa del material g	2581	2565	2611	2585.67
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.197**	**1.192**	**1.210**	**1.200**
Humedad del material %	6.08	6.08	6.08	6.08

Peso compactado				
ARENA	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	11.8	11.78	11.81	11.80
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	2155.32	2151.67	2157.15	2154.72
Peso material suelto + recipiente g	8530	8549	8570	8549.67
Peso del recipiente g	5654	5654	5654	5654.00
Masa del material g	2876	2895	2916	2895.67
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.334**	**1.345**	**1.352**	**1.344**
Humedad del material %	6.08	6.08	6.08	6.08


Peso Unitario suelto				
TRITURADO	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	16.83	16.83	16.83	16.83
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	3074.08	3074.08	3074.08	3074.08
Peso material suelto + recipiente g	11499	11457	11456	11470.67
Peso del recipiente g	7227	7227	7227	7227.00
Masa del material g	4272	4230	4229	4243.67
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.390**	**1.376**	**1.376**	**1.380**
Humedad del material %	1.94	1.94	1.94	1.94

Peso Compactado				
TRITURADO	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	16.83	16.83	16.83	16.83
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	3074.08	3074.08	3074.08	3074.08
Peso material suelto + recipiente g	11840	11830	11820	11830.00
Peso del recipiente g	7227	7227	7227	7227.00
Masa del material g	4613	4603	4593	4603.00
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.501**	**1.497**	**1.494**	**1.497**
Humedad del material %	1.94	1.94	1.94	1.94

Relación agua-cemento:

Relación Agua-Cemento

Resistencia requerida	294	kg/cm2
R a/c	0.44	

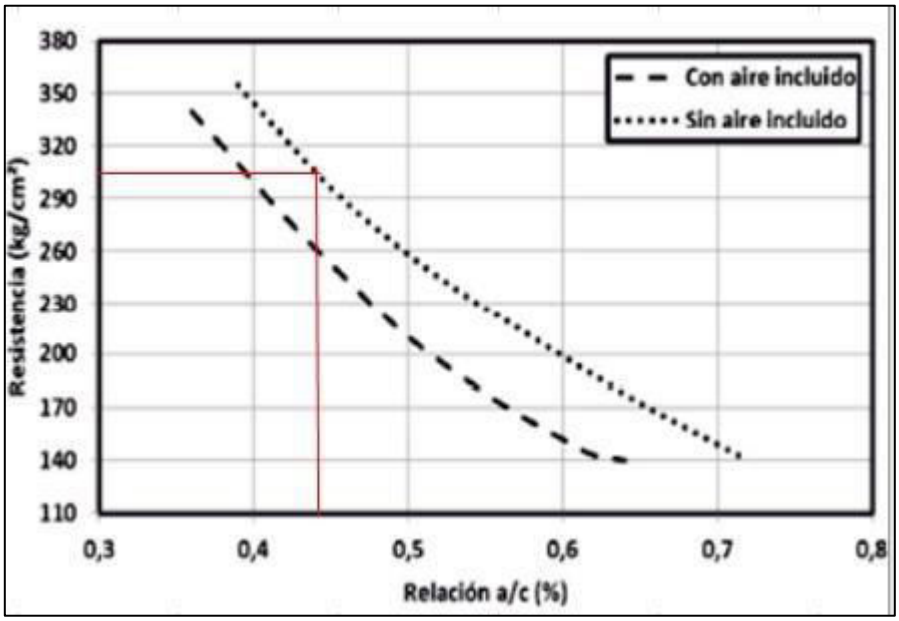

Contenido de cemento:

Contenido de cemento		
Cantidad de agua normal	185	lts
Relación Agua-cemento	0.44	
Cemento	420.5	kg/m3
Factor cemento	8.41	Sacos * 50 kg

Contenido de agregado grueso

Contenido de agregado grueso

Volumen de agregado grueso por m3 de concreto

b/bo

donde,

b: Volumen de las partículas de agregado grueso * m3 de concreto

bo: Volumen de las partículas de agregado grueso * m3 de agregado grueso

TMN Grava	1"	
Módulo de finura de arenas	3.6	
Factor	0.58	m3
MUC-AGRUESO	1.497	Kg/m3
PESO AGREGADO GRUESO	2.58165545	Kg

	M dulo de finura del agragado fino																
TMN de la grava	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
25	0.74	0.73	0.72	0.71	0.7	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.6	0.59	0.58

Contenido de agregado fino

Contenido de agregado fino

Material			Peso unitario		Volumen Absoluto	
aire	1.7	%	100		0.01700	m3
agua	185	kg	1000	kg/m3	0.18500	m3
cemento	420.45	kg	2400.00	kg/m3	0.17519	m3
Agre. Grueso	2.582	kg	1.497	kg/m3	1.72455	m3
agre. Fino	0.33	kg	1.344	kg/m3	0.24382	m3

Total	2.346	m3

Corrección por humedad:

CORRECCIÓN POR HUMEDAD DE LOS AGREGADOS DE LA MEZCLA								
Material			**masa unitario compacta**		**Peso corregido**		**% humedad**	**% Absorción**
Agre. Grueso	2.58	kg	1.497	kg/m3	2.632	kg	1.94	1.51
Agre. Fino	2.35	kg	1.344	kg/m3	2.49	kg	6.08	2.02

APORTE DE AGUA A LA MEZCLA								
Material			**Peso unitario**		**Aporte de agua**		**% humedad**	**% Absorción**
Agre. Grueso	2.58	kg	1.497	kg/m3	0.0113	kg	1.94	1.51
Agre. Fino	2.35	kg	1.344	kg/m3	0.10	kg	6.08	2.02
			Total aporte de agua		**0.11**	**lts**		

Agua solicitada:	185.00	l/m3
Aporte de agua agregados	0.11	l/m3
Total agua efectiva	**185.11**	**l/m3**

HUMEDAD NATURAL

INV E -122

PROYECTO : Diseño de mezclas de concreto para placahuella

SOLICITA: Alcaldía del muncipio de la Unión **FECHA:** abril de 2024

ELABORÓ: Laboratorio de suelos Ingeomec

UBICACIÓN: Municipio de la Univón - Nariño

TIPO DE MATERIAL: **TRITURADO**

MUESTRA: 1 **PROFUNDIDAD:** Variable

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE LAS MUESTRAS

MUESTRA	SIGLAS	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3
Peso tara+muestra humeda (g)	**P1**	3318.00		
Peso tara+muestra seca (g)	**P2**	3258.00		
Peso tara (g)	**P3**	167.00		
Peso suelo húmedo (g)	**Psh**	3151.00		
Peso Suelo seco (g)	**Pss**	3091.00		
Contenido de agua (g)	**Pw**	60.00		
Humedad (%)	**W**	**1.94**		
Humedad (%) promedio	**w%**	1.94		

OBSERVACIONES :



ELABORÓ: **DARIO ALEXANDER MARTINEZ R**

M.P. 52850-014904 NRÑ

Esp. En geotecnia vial y pavimentos

Coordinador general de laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec

HUMEDAD NATURAL

INV E -122

PROYECTO : Diseño de mezclas de concreto para placahuella

SOLICITA: Alcaldía del muncipio de la Unión **FECHA:** abril de 2024

ELABORÓ: Laboratorio de suelos Ingeomec

UBICACIÓN: Municipio de la Univón - Nariño

MUESTRA: 1 **PROFUNDIDAD:** Variable

TIPO DE MATERIAL: **ARENA TONALIDAD AMARILLENTA CON MATICES GRISÁCEOS**

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE LAS MUESTRAS

MUESTRA	SIGLAS	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3
Peso tara+muestra humeda (g)	**P1**	741.00		
Peso tara+muestra seca (g)	**P2**	708.00		
Peso tara (g)	**P3**	165.00		
Peso suelo húmedo (g)	**Psh**	576.00		
Peso Suelo seco (g)	**Pss**	543.00		
Contenido de agua (g)	**Pw**	33.00		
Humedad (%)	**W**	**6.08**		
Humedad (%) promedio	**w%**	6.08		

OBSERVACIONES :



ELABORÓ: **DARIO ALEXANDER MARTINEZ R**
M.P. 52850-014904 NRÑ
Esp. En geotecnia vial y pavimentos
Coordinador general de laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec


	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO I.N.V. E – 213 –13	Código:	
		Versión:	2024

Proyecto:	Elaboración de diseño de mezclas de concreto hidráulico		
Material:	Triturado Tamaño Maximo 2"	**Tamaño Maximo Nominal**	1"
Fuente:	De cantera	**Tamaño máximo**	1 1/2"
Fecha de Ensayo:	mayo de 2024	**TIPO MUESTRA**	Triturado

GRANULOMETRIA

Humedad natural W%:	1.94	%			
Peso Humedo:	7033.0	gr	Peso seco lavado	6909	gr
peso seco:	6899.1	gr			

Tamiz		*Peso retenido*	*Retenido*	*Acumulado*	*Pasa*
Pulgadas	***Milímetros***	***(gr)***	***(%)***	***(%)***	***(%)***
2"	*50.800*	0.00	0.000	0.00	100.00
1.1/2"	*38.100*	0.00	0.000	0.00	100.00
1.0"	*25.400*	113.57	1.644	1.64	98.36
3/4"	19.100	1607.00	23.260	24.90	75.10
1/2"	12.700	2712.00	39.253	64.16	35.84
3/8"	9.510	1559.00	22.565	86.72	13.28
No 4	4.760	898.00	12.998	99.72	0.28
Fondo		19.43	0.281	100.00	0.00
TOTAL		6909.00	100		

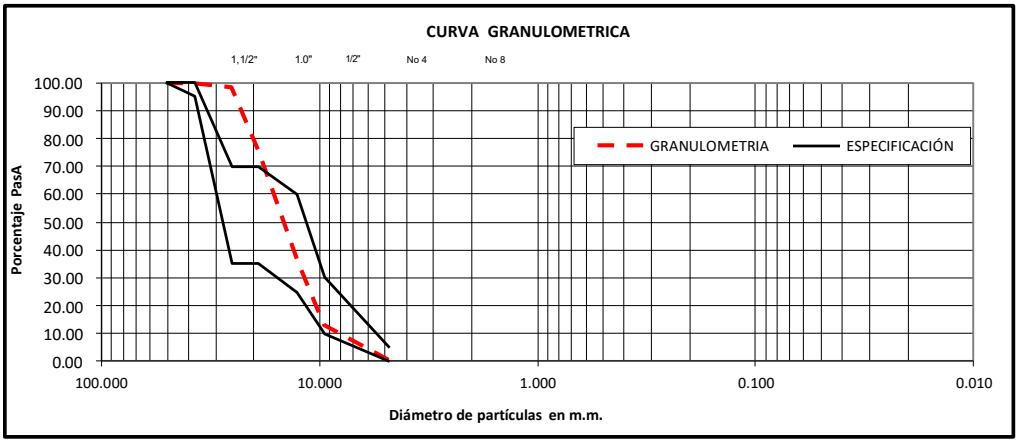

Módulo de finura 2.77

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	**REVISÓ:**
DARIO ALEXANDER MARTINEZ R M.P. 52850-014904 NRÑ Esp. En geotecnia vial y pavimentos Coordinador general de laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec	


	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO I.N.V. E – 213 – 13	Código:	
		Versión:	2024
		Fecha:	
		Aprobó:	

Proyecto:	Construcción de placa huellas en el municipio de la Unión		
Material:	Arena Tamaño Maximo de 2"	**Tamaño máximo nominal**	3/8"
Fuente:	De Peña	**Tamaño máximo**	2"
Fecha de Ensayo	mayo de 2024	**tipo de material**	Arena gris

GRANULOMETRIA

Humedad natural W%:	6.08	%			
Peso Humedo:	3927.0	gr	Peso seco lavado	3655	gr
peso seco:	3702.0	gr			

Tamiz		*Peso retenido*	*Retenido*	*Acumulado*	*Pasa*
Pulgadas	***Milímetros***	***(gr)***	***(%)***	***(%)***	***(%)***
2 1/2"	63.5	0.00	0.000	0.00	100.00
2"	50.8	0.00	0.000	0.00	100.00
1 1/2"	38.1	69.17	1.892	1.89	98.11
1"	25.4	129.51	3.543	5.44	94.56
3/4"	19.1	25.49	0.697	6.13	93.87
1/2"	12.7	150.11	4.107	10.24	89.76
3/8"	9.75	53.34	1.459	11.70	88.30
No 4	4.75	184.06	5.036	16.74	83.26
No 8	2.36	288.13	7.883	24.62	75.38
No 16	1.18	520.00	14.227	38.85	61.15
No 30	0.6	747.00	20.438	59.28	40.72
No 50	0.3	1010.00	27.633	86.92	13.08
No 100	0.15	394.00	10.780	97.70	2.30
P		84.19	2.303	100.00	0.00
TOTAL		3655.00	100.0		

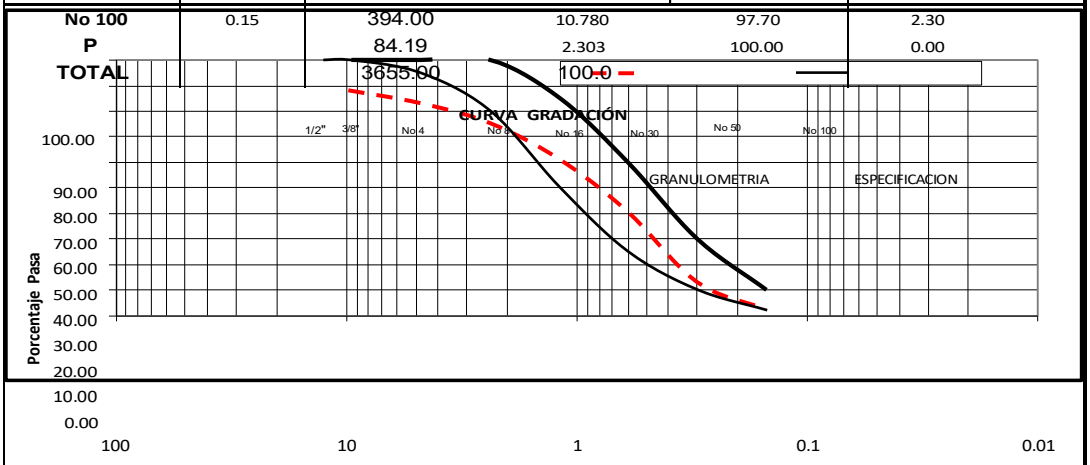

D60 0.7 D D1 0.15

Módulo de finura 3.6

OBSERVACIONES:

ELABORÓ

REVISÓ:

DARIO ALEXANDER MARTINEZ R
M.P. 52850-014904 NRÑ
Esp. En geotecnia vial y pavimentos

Coordinador general de laboratorio de

PROPORCIONES EN VOLUMEN PARA RESISTENCIA									
MASA/DENSIDAD		AGUA (kg/m³)	CEMENTO (kg/m³)	AGREGADO FINO	AGREGADO GRUESO	R=A/C	AGUA LITROS		
PESO MATERIAL		185	420.0	737.5	1106.23				
VOL. ABS. MATERIAL (dm³/m³Concreto)		185	140.0	274.8	400.2				
PROPORCIONES			1.0	1.8	2.6	0.44	185		

CEMENTO	A. FINO	A. GRUESO	AGUA
1	2	2.5	185.00

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA UNA RESISTENCIA DE 3.8 MR

Solicita:

Alcaldía municipal de la Unión

Elaborado por:



DARIO ALEXANDER MARTINEZ R.
Esp. En geotecnia vial y pavimentos
M.P. 52850-014904 NRÑ
Coordinador general de Laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec

SAN JUAN DE PASTO

MAYO 2024

DISEÑO DE MEZCLAS

PROYECTO: DISEÑO DE MEZCLAS DE 3.8 MR

TIPO DE OBRA: Construcción Placa huellas

CEMENTO: Argos por 50 kg

TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO GRUESO: 1 1/2”

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE AGREGADO GRUESO: 1”

TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO FINO: 2”

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE AGREGADO FINO: 3/8”

PROCEDENCIA DE LOS AGREGADOS:

AGREGADO FINO: Municipio de la Unión

AGREGADO GRUESO: Municipio de la Unión

RELACION AGUA - CEMENTO: 0.44

Asentamiento o Slump: de 1” a 3” como máximo

CANTIDAD DE AGUA POR METRO CUBICO DE CONCRETO: 185 LITROS

CANTIDAD DE CEMENTO EN KILOS: 420 KL POR METRO CUBICO

DOSIFICACIÓN 1: 2: 2.5

1 PARTE: CEMENTO

2 PARTES DE AGREGADO FINO (ARENA)

2.5 PARTES DE AGREGADO GRUESO (GRAVA)

RECOMENDACIONES:

Se recomienda dosificar por volumen cada uno de los componentes de la mezcla tal como se especifica.

Datos generales

Agregados	Fino	Grueso
Masa Unitaria suelta kg/m3	1.200	1.380
Masa Unitaria compactada kg/m3	1.344	1.497
Densidad aparante kg/m3	1.344	1.497
Absorción %	2.0	1.51
Humedad W%	6.08	1.94
Tamaño máximo nominal mm	3/8"	1"

Calculo F´cr (resistencia promedio requerida)

F'c	210	kg/cm2
Factor de seguridad	84	

Nota: cuando no se tiene registro de resistencia de probetas correspondientes a obras anteriores

F´c	F´cr	
Menos de 210	F'c + 70	
210 - 350	F'c + 84	se trabajará con este factor
Más de 350	F'c + 98	

210 + 84

294	**kg/cm2**	Resistencia requerida

Asentamiento escogido:

Elemento estructural	Asentamiento, mm	
	Mínimo	Máximo
Zapatas	25	75
Vigas	25	100
Columnas	25	100
Pavimentos y Losas	25	75

Asentamiento requerido	1" a 3"

Según la tabla anexa:

Tipo de estructura	Asentamiento, mm	
	Mínimo	Máximo [A]
Zapatas y muros de cimentación reforzados	25	75
Zapatas, cajones y muros de subestructuras sin refuerzo	25	75
Vigas y muros reforzados	25	100
Columnas de edificios	25	100
Pavimentos y losas	25	75
Concreto masivo	25	75

	PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS I.N.V. E – 222-223 – 13	Código:	
		Versión:	2024
		Fecha:	
		Aprobó:	

Proyecto:	"DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETOS DE 3.8 MR"		
Material:	Triturado y Arena		
Fuente:	municipio de la unión	**Muestra No**	1
Fecha de Ensayo:	3-may.-24	**Módulo**	N/A

Gravedad Especifica de Arena gruesa P No. 4 RET No. 40

	Ensayo	1	2	Promedio
a	**Peso seco de la muestra en gr.**	1983.00		
b	**Peso de la muestra saturada superficialmente seca**	2018.00		
c	**Peso sumergido de la muestra saturada con canastilla**	1955.00		
d	**Peso sumergido de la muestra saturada sin canastilla**	1285.00		
e	**Peso de la canastilla, en aire**	782.00		
f	**Peso de la canastilla sumergida**	682.00		
g	**Peso Especifico Aparente (a/(b-d))**	2.705		
h	**Peso Especifico Aparente S.S.S (b/(b-d))**	2.753		
i	**Peso Especifico Nominal (a/(a-d))**	2.841		
j	**% Absorción (b-a)/a**	1.7650		
	Gs Aparente	2.705		

Gravedad Especifica de Arena Finas pasante tamiz No. 40

	Ensayo	1	2	**Promedio**
a	**Peso seco final de la muestra, en (gr)**	495.00		
b	**Peso del picnómetro aforado lleno de agua, en (gr)**	695.00		
c	**Peso total del picnómetro aforado con la muestra y lleno de agua, en (gr)**	980.00		
s	**Peso de la muestra saturada, con superficie seca en (SSS) (gr)**	505.0		
d	**Peso Especifico Aparente (a/(b+s-c))**	2.250		
e	**Peso Especifico Aparente S.S.S (s/(b+s-c))**	2.295		
f	**Peso Especifico Nominal (a/(b+a-c))**	2.357		
g	**% Absorción (s-a)/a*100**	2.020		
	Promedio Gs Aparente	2.250		

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	**REVISÓ:**	
DARIO MARTINEZ		DARIO MARTÍNEZ
LABORATORIO DE SUELOS		

	PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS I.N.V. E – 222-223 – 13	Código:	
		Versión:	2024
		Fecha:	
		Aprobó:	

Proyecto:	construccion de placa huellas		
Material:	arenas		
Fuente:	Municipio de la Unión	**Muestra No**	1
Fecha de Ensayo:	mayo de 2024	**Módulo**	N/A

Gravedad Especifica de Agregados Gruesos

	Ensayo	1	2	Promedio
a	**Peso seco de la muestra en gr.**	2980.00		
b	**Peso de la muestra saturada superficialmente seca**	3025.00		
c	**Peso sumergido de la muestra saturada con canastilla**	3933.00		
d	**Peso sumergido de la muestra saturada sin canastilla**	1756.00		
e	**Peso de la canastilla, en aire**	891.00		
f	**Peso de la canastilla sumergida**	792.00		
g	**Peso Especifico Aparente (a/(b-d))**	2.348		
h	**Peso Especifico Aparente S.S.S (b/(b-d))**	2.384		
i	**Peso Especifico Nominal (a/(a-d))**	2.435		
j	**% Absorción (b-a)/a**	1.51		
	Gs Aparente	2.348		

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	**REVISÓ:**	
DARIO MARTINEZ		DARIO MARTÍNEZ
LABORATORIO DE SUELOS		

Tamaño máximo nominal (TMN)

Parámetros	Pulgada	mm	Medida mm	Tamaños máximos, según los parámetros		
				Ancho 1/5 d	Altura 1/3 h	Separación libre entre barras 3/4
Factor				5	3	0.75
TMN Gruesos (d)	1"	19.1				
TMN Finos (d)	3/8"	50.8				
Espesor del elemento estructural más pequeño:			200	40	66.7	
Separación de barras máximo:			60			45
Tamaño máximo nominal de agregado que cumple				1 1/2"	2"	1 1/2"
Tamaño máximo nominal de agregado sugerido				**1 1/2"**		

Contenido de aire en la mezcla:

% promedio aproximado de aire atrapado en la mezcla	TMN	
	Pulgadas	mm
1.7	1"	19.1

TMN		% Promedio aproximado de aire atrapado
Pulgadas	mm	
⅜	9,5	2,7
½	12,5	2,5
¾	19	2,0
1	25	1,7
1 ½	38	1,5
2	50	1,0
3	75	0,3
6	150	0,2

Contenido de agua en la mezcla:

Contenido de aire	Asentamiento cm	Agua en kg/m3
		38.1 mm
Concreto sin aire incluido	3 -- 5	185
Agua	185	l/m3

Contenido de aire	Asentamiento (cm)	Agua, en kg/m³ de concreto para los TMN del agregado indicados [A], mm							
		9,5	12,5	19	25	37,5	50 [B]	75 [B]	150 [B]
Concreto sin aire incluido	3 a 5	205	200	185	180	160	155	145	125
	8 a 10	225	215	200	195	175	170	160	140
	15 a 18	240	230	210	205	185	180	170	-
	Cantidad aproximada de aire atrapado en concreto sin aire incluido, %	3	2,5	2	1,5	1	0,5	0,3	0,2
Concreto con aire incluido	3 a 5	180	175	165	160	145	140	135	120
	8 a 10	200	190	180	175	160	155	150	135
	15 a 18	215	205	190	185	170	165	160	-
	Promedio recomendable de contenido total de aire, %	8	7	6	5	4,5	4	3,5	3

Masas unitarias sueltas y compactadas del agregado fino y grueso.

Peso Unitario suelto				
ARENA	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	11.8	11.78	11.81	11.80
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	2155.32	2151.67	2157.15	2154.72
Peso material suelto + recipiente g	8235	8219	8265	8239.67
Peso del recipiente g	5654	5654	5654	5654.00
Masa del material g	2581	2565	2611	2585.67
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.197**	**1.192**	**1.210**	**1.200**
Humedad del material %	6.08	6.08	6.08	6.08

Peso compactado				
ARENA	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	11.8	11.78	11.81	11.80
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	2155.32	2151.67	2157.15	2154.72
Peso material suelto + recipiente g	8530	8549	8570	8549.67
Peso del recipiente g	5654	5654	5654	5654.00
Masa del material g	2876	2895	2916	2895.67
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.334**	**1.345**	**1.352**	**1.344**
Humedad del material %	6.08	6.08	6.08	6.08


Peso Unitario suelto				
TRITURADO	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	16.83	16.83	16.83	16.83
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	3074.08	3074.08	3074.08	3074.08
Peso material suelto + recipiente g	11499	11457	11456	11470.67
Peso del recipiente g	7227	7227	7227	7227.00
Masa del material g	4272	4230	4229	4243.67
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.390**	**1.376**	**1.376**	**1.380**
Humedad del material %	1.94	1.94	1.94	1.94

Peso Compactado				
TRITURADO	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	16.83	16.83	16.83	16.83
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	3074.08	3074.08	3074.08	3074.08
Peso material suelto + recipiente g	11840	11830	11820	11830.00
Peso del recipiente g	7227	7227	7227	7227.00
Masa del material g	4613	4603	4593	4603.00
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.501**	**1.497**	**1.494**	**1.497**
Humedad del material %	1.94	1.94	1.94	1.94

Relación agua-cemento:

Relación Agua-Cemento

Resistencia requerida	294	kg/cm2
R a/c	0.44	

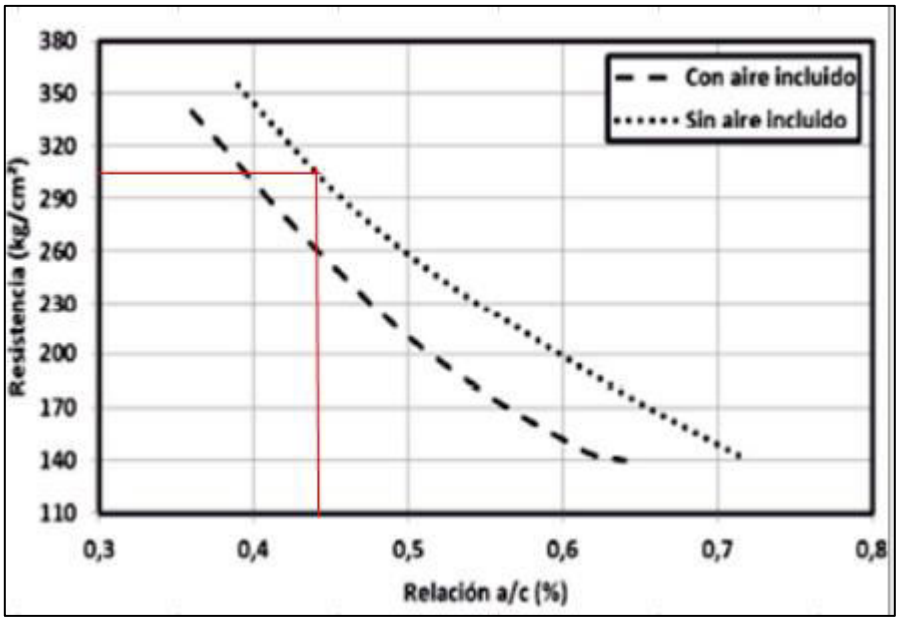

Contenido de cemento:

Contenido de cemento		
Cantidad de agua normal	185	lts
Relación Agua-cemento	0.44	
Cemento	420.5	kg/m3
Factor cemento	8.41	Sacos * 50 kg

Contenido de agregado grueso

Contenido de agregado grueso

Volumen de agregado grueso por m3 de concreto
b/bo
donde,

b:	Volumen de las partículas de agregado grueso * m3 de concreto	
bo:	Volumen de las partículas de agregado grueso * m3 de agregado grueso	
TMN Grava	1"	
Módulo de finura de arenas	3.6	
Factor	0.58	m3
MUC-AGRUESO	1.497	Kg/m3
PESO AGREGADO GRUESO	2.58165545	Kg

	Módulo de finura del agragado fino																
TMN de la grava	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
25	0.74	0.73	0.72	0.71	0.7	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.6	0.59	0.58

Contenido de agregado fino

Corrección por humedad:

Contenido de agregado fino

Material			Peso unitario		Volumen Absoluto	
aire	1.7	%	100		0.01700	m3
agua	185	kg	1000	kg/m3	0.18500	m3
cemento	420.45	kg	2421	kg/m3	0.17367	m3
Agre. Grueso	2.582	kg	1.497	kg/m3	1.72455	m3
agre. Fino	0.33	kg	1.344	kg/m3	0.24382	m3

Total	2.344	m3

CORRECCIÓN POR HUMEDAD DE LOS AGREGADOS DE LA MEZCLA								
Material			**masa unitario compacta**		**Peso corregido**		**% humedad**	**% Absorción**
Agre. Grueso	2.58	kg	1.497	kg/m3	2.632	kg	1.94	1.51
Agre. Fino	2.34	kg	1.344	kg/m3	2.49	kg	6.08	2.02

APORTE DE AGUA A LA MEZCLA								
Material			**Peso unitario**		**Aporte de agua**		**% humedad**	**% Absorción**
Agre. Grueso	2.58	kg	1.497	kg/m3	0.0113	kg	1.94	1.51
Agre. Fino	2.34	kg	1.344	kg/m3	0.10	kg	6.08	2.02
			Total aporte de agua		**0.11**	**lts**		

Agua solicitada:	185.00	l/m3
Aporte de agua agregados	0.11	l/m3
Total agua efectiva	**185.11**	**l/m3**

HUMEDAD NATURAL

INV E -122

PROYECTO : Diseño de mezclas de concreto para placahuella

SOLICITA: Alcaldía del muncipio de la Unión **FECHA:** abril de 2024

ELABORÓ: Laboratorio de suelos Ingeomec

UBICACIÓN: Municipio de la Univón - Nariño

MUESTRA: 1 **PROFUNDIDAD:** Variable

TIPO DE MATERIAL: **TRITURADO**

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE LAS MUESTRAS

MUESTRA	SIGLAS	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3
Peso tara+muestra humeda (g)	**P1**	3318.00		
Peso tara+muestra seca (g)	**P2**	3258.00		
Peso tara (g)	**P3**	167.00		
Peso suelo húmedo (g)	**Psh**	3151.00		
Peso Suelo seco (g)	**Pss**	3091.00		
Contenido de agua (g)	**Pw**	60.00		
Humedad (%)	**W**	**1.94**		
Humedad (%) promedio	**w%**	1.94		

OBSERVACIONES :

ELABORÓ:

DARIO ALEXANDER MARTINEZ R
M.P. 52850-014904 NRÑ
Esp. En geotecnia vial y pavimentos
Coordinador general de laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec

HUMEDAD NATURAL

INV E -122

PROYECTO : Diseño de mezclas de concreto para placahuella

SOLICITA: Alcaldía del muncipio de la Unión **FECHA:** abril de 2024

ELABORÓ: Laboratorio de suelos Ingeomec

UBICACIÓN: Municipio de la Univón - Nariño

MUESTRA: 1 **PROFUNDIDAD:** Variable

TIPO DE MATERIAL: **ARENA TONALIDAD AMARILLENTA CON MATICES GRISÁCEOS**

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE LAS MUESTRAS

MUESTRA	SIGLAS	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3
Peso tara+muestra humeda (g)	**P1**	741.00		
Peso tara+muestra seca (g)	**P2**	708.00		
Peso tara (g)	**P3**	165.00		
Peso suelo húmedo (g)	**Psh**	576.00		
Peso Suelo seco (g)	**Pss**	543.00		
Contenido de agua (g)	**Pw**	33.00		
Humedad (%)	**W**	**6.08**		
Humedad (%) promedio	**w%**	6.08		

OBSERVACIONES :

ELABORÓ:

DARIO ALEXANDER MARTINEZ R
M.P. 52850-014904 NRÑ
Esp. En geotecnia vial y pavimentos
Coordinador general de laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec


	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO I.N.V. E – 213 –13	Código:	
		Versión:	2024

Proyecto:	Elaboración de diseño de mezclas de concreto hidráulico		
Material:	Triturado Tamaño Maximo 2"	**Tamaño Maximo Nominal**	1"
Fuente:	De cantera	**Tamaño máximo**	1 1/2"
Fecha de Ensayo:	mayo de 2024	**TIPO MUESTRA**	Triturado

GRANULOMETRIA

Humedad natural W%:	1.94	%			
Peso Humedo:	7033.0	gr	Peso seco lavado	6909	gr
peso seco:	6899.1	gr			

Tamiz		*Peso retenido*	*Retenido*	*Acumulado*	*Pasa*
Pulgadas	***Milímetros***	***(gr)***	***(%)***	***(%)***	***(%)***
2"	*50.800*	0.00	0.000	0.00	100.00
1.1/2"	*38.100*	0.00	0.000	0.00	100.00
1.0"	*25.400*	113.57	1.644	1.64	98.36
3/4"	19.100	1607.00	23.260	24.90	75.10
1/2"	12.700	2712.00	39.253	64.16	35.84
3/8"	9.510	1559.00	22.565	86.72	13.28
No 4	4.760	898.00	12.998	99.72	0.28
Fondo		19.43	0.281	100.00	0.00
TOTAL		6909.00	100		

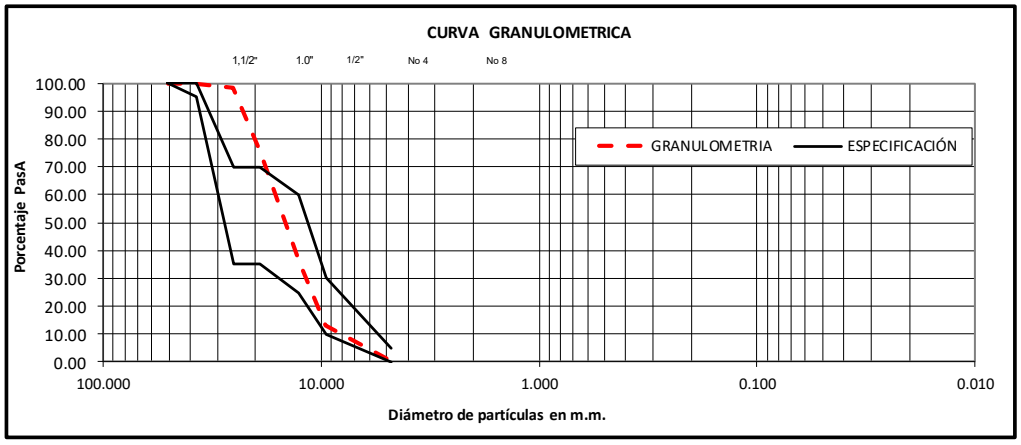

Módulo de finura 2.77

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	**REVISÓ:**
DARIO ALEXANDER MARTINEZ R M.P. 52850-014904 NRÑ Esp. En geotecnia vial y pavimentos Coordinador general de laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec	


	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO I.N.V. E – 213 – 13	Código:	
		Versión:	2024
		Fecha:	
		Aprobó:	

Proyecto:	Construcción de placa huellas en el municipio de la Unión		
Material:	Arena Tamaño Maximo de 2"	**Tamaño máximo nominal**	3/8"
Fuente:	De Peña	**Tamaño máximo**	2"
Fecha de Ensayo	mayo de 2024	**tipo de material**	Arena gris

GRANULOMETRIA

Humedad natural W%:	6.08	%			
Peso Humedo:	3927.0	gr	Peso seco lavado	3655	gr
peso seco:	3702.0	gr			

Tamiz		***Peso retenido (gr)***	***Retenido (%)***	***Acumulado (%)***	***Pasa (%)***
Pulgadas	***Milímetros***				
2 1/2"	63.5	0.00	0.000	0.00	100.00
2"	50.8	0.00	0.000	0.00	100.00
1 1/2"	38.1	69.17	1.892	1.89	98.11
1"	25.4	129.51	3.543	5.44	94.56
3/4"	19.1	25.49	0.697	6.13	93.87
1/2"	12.7	150.11	4.107	10.24	89.76
3/8"	9.75	53.34	1.459	11.70	88.30
No 4	4.75	184.06	5.036	16.74	83.26
No 8	2.36	288.13	7.883	24.62	75.38
No 16	1.18	520.00	14.227	38.85	61.15
No 30	0.6	747.00	20.438	59.28	40.72
No 50	0.3	1010.00	27.633	86.92	13.08
No 100	0.15	394.00	10.780	97.70	2.30
P		84.19	2.303	100.00	0.00
TOTAL		3655.00	100.0		

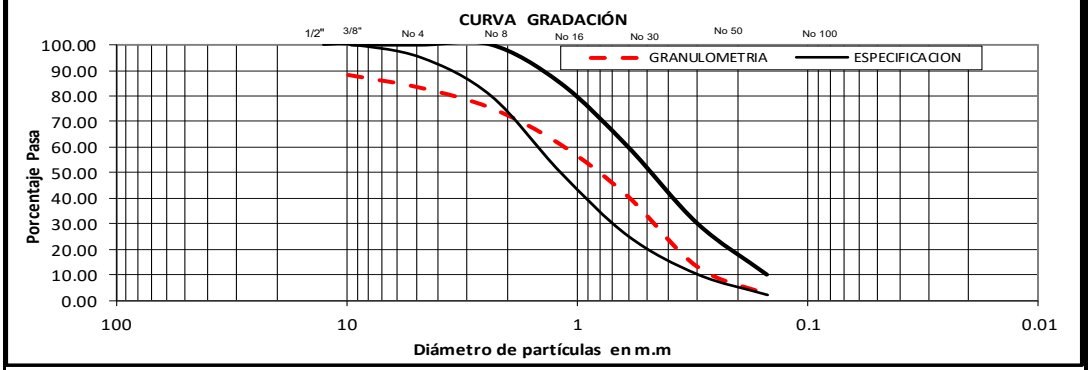

D60 0.7 D1 0.15

Módulo de finura 3.6

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	**REVISÓ:**
DARIO ALEXANDER MARTINEZ R M.P. 52850-014904 NRÑ Esp. En geotecnia vial y pavimentos Coordinador general de laboratorio de	

PROPORCIONES EN VOLUMEN PARA RESISTENCIA									
MASA/DENSIDAD		AGUA (kg/m³)	CEMENTO (kg/m³)	AGREGADO FINO	AGREGADO GRUESO	R=A/C	AGUA LITROS		
PESO MATERIAL		185	420.0	737.5	1106.23				
VOL. ABS. MATERIAL (dm³/m³Concreto)		185	140.0	274.8	400.2				
PROPORCIONES			1.0	1.8	2.6	0.44	185		

CEMENTO	A. FINO	A. GRUESO	AGUA
1	2	2.5	185.00

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA UNA RESISTENCIA DE 210 KG/CM2

Solicita:

Vereda Olivos

Elaborado por:



DARIO ALEXANDER MARTINEZ R.
Esp. En geotecnia vial y pavimentos
M.P. 52850-014904 NRÑ
Coordinador general de Laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec

SAN JUAN DE PASTO

MAYO 2024

DISEÑO DE MEZCLAS

PROYECTO: DISEÑO DE MEZCLAS DE 210 kg/cm2

TIPO DE OBRA: Construcción Placa huellas

CEMENTO: CEMEX por 50 kg

TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO GRUESO: 1 1/2”

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE AGREGADO GRUESO: 1”

TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO FINO: 2”

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE AGREGADO FINO: 3/8”

PROCEDENCIA DE LOS AGREGADOS:

AGREGADO FINO: Municipio de la Unión

AGREGADO GRUESO: Municipio de la Unión

RELACION AGUA - CEMENTO: 0.47

Asentamiento o Slump: de 1” a 3” como máximo

CANTIDAD DE AGUA POR METRO CUBICO DE CONCRETO: 160 LITROS

CANTIDAD DE CEMENTO EN KILOS: 350 KL POR METRO CUBICO

DOSIFICACIÓN 1: 2: 3

1 PARTE: CEMENTO

2 PARTES DE AGREGADO FINO (ARENA)

3 PARTES DE AGREGADO GRUESO (GRAVA)

RECOMENDACIONES:

Se recomienda dosificar por volumen cada uno de los componentes de la mezcla tal como se especifica.

Datos generales

Agregados	Fino	Grueso
Masa Unitaria suelta kg/m3	1.200	1.380
Masa Unitaria compactada kg/m3	1.344	1.497
Densidad aparante kg/m3	1.344	1.497
Absorción %	2.0	1.51
Humedad W%	6.08	1.94
Tamaño máximo nominal mm	3/8"	1"

Calculo F´cr (resistencia promedio requerida)

F'c	210	kg/cm2
Factor de seguridad	84	

Nota: cuando no se tiene registro de resistencia de probetas correspondientes a obras anteriores

F´c	F´cr
Menos de 210	F'c + 70
210 - 350	F'c + 84
Más de 350	F'c + 98

se trabajará con este factor

210 + 84

284	**kg/cm2**	Resistencia requerida

Asentamiento escogido:

Elemento estructural	Asentamiento, mm	
	Mínimo	Máximo
Zapatas	25	75
Vigas	25	100
Columnas	25	100
Pavimentos y Losas	25	75

Asentamiento requerido	1" a 3"

Según la tabla anexa:

Tipo de estructura	Asentamiento, mm	
	Mínimo	Máximo [A]
Zapatas y muros de cimentación reforzados	25	75
Zapatas, cajones y muros de subestructuras sin refuerzo	25	75
Vigas y muros reforzados	25	100
Columnas de edificios	25	100
Pavimentos y losas	25	75
Concreto masivo	25	75

	PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS I.N.V. E – 222-223 – 13	Código:	
		Versión:	2024
		Fecha:	
		Aprobó:	

Proyecto:	"DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETOS DE 3000 PSI"		
Material:	Triturado y Arena		
Fuente:	municipio de la unión	**Muestra No**	1
Fecha de Ensayo:	3-may.-24	**Módulo**	N/A

Gravedad Especifica de Arena gruesa P No. 4 RET No. 40

	Ensayo	1	2	Promedio
a	**Peso seco de la muestra en gr.**	1983.00		
b	**Peso de la muestra saturada superficialmente seca**	2018.00		
c	**Peso sumergido de la muestra saturada con canastilla**	1955.00		
d	**Peso sumergido de la muestra saturada sin canastilla**	1285.00		
e	**Peso de la canastilla, en aire**	782.00		
f	**Peso de la canastilla sumergida**	682.00		
g	**Peso Especifico Aparente (a/(b-d))**	2.705		
h	**Peso Especifico Aparente S.S.S (b/(b-d))**	2.753		
i	**Peso Especifico Nominal (a/(a-d))**	2.841		
j	**% Absorción (b-a)/a**	1.7650		
	Gs Aparente	2.705		

Gravedad Especifica de Arena Finas pasante tamiz No. 40

	Ensayo	1	2	**Promedio**
a	**Peso seco final de la muestra, en (gr)**	495.00		
b	**Peso del picnómetro aforado lleno de agua, en (gr)**	695.00		
c	**Peso total del picnómetro aforado con la muestra y lleno de agua, en (gr)**	980.00		
s	**Peso de la muestra saturada, con superficie seca en (SSS) (gr)**	505.0		
d	**Peso Especifico Aparente (a/(b+s-c))**	2.250		
e	**Peso Especifico Aparente S.S.S (s/(b+s-c))**	2.295		
f	**Peso Especifico Nominal (a/(b+a-c))**	2.357		
g	**% Absorción (s-a)/a*100**	2.020		
	Promedio Gs Aparente	2.250		

OBSERVACIONES: _____

ELABORÓ	**REVISÓ:**	
DARIO MARTINEZ		DARIO MARTÍNEZ
LABORATORIO DE SUELOS		

	PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS I.N.V. E – 222-223 – 13	Código:	
		Versión:	2024
		Fecha:	
		Aprobó:	

Proyecto:	construccion de placa huellas		
Material:	arenas		
Fuente:	Municipio de la Unión	**Muestra No**	
Fecha de Ensayo:	mayo de 2024	**Módulo**	

Gravedad Especifica de Agregados Gruesos

	Ensayo	
a	**Peso seco de la muestra en gr.**	
b	**Peso de la muestra saturada superficialmente seca**	
c	**Peso sumergido de la muestra saturada con canastilla**	
d	**Peso sumergido de la muestra saturada sin canastilla**	
e	**Peso de la canastilla, en aire**	
f	**Peso de la canastilla sumergida**	
g	**Peso Especifico Aparente (a/(b-d))**	
h	**Peso Especifico Aparente S.S.S (b/(b-d))**	
i	**Peso Especifico Nominal (a/(a-d))**	
j	**% Absorción (b-a)/a**	
	Gs Aparente	

OBSERVACIONES:

Tamaño máximo nominal (TMN)

Parámetros	Pulgada	mm	Medida mm	Tamaños máximos, según los parámetros		
				Ancho 1/5 d	Altura 1/3 h	Separación libre entre barras 3/4
Factor				5	3	0.75
TMN Gruesos (d)	1"	19.1				
TMN Finos (d)	3/8"	50.8				
Espesor del elemento estructural más pequeño:			200	40	66.7	
Separación de barras máximo:			60			45
Tamaño máximo nominal de agregado que cumple				1 1/2"	2"	1 1/2"
Tamaño máximo nominal de agregado sugerido				**1 1/2"**		

Contenido de aire en la mezcla:

% promedio aproximado de aire atrapado en la mezcla	TMN	
	Pulgadas	mm
1.7	1"	19.1

TMN		% Promedio aproximado de aire atrapado
Pulgadas	mm	
⅜	9,5	2,7
½	12,5	2,5
¾	19	2,0
1	25	1,7
1 ½	38	1,5
2	50	1,0
3	75	0,3
6	150	0,2

Contenido de agua en la mezcla:

Contenido de aire	Asentamiento cm	Agua en kg/m3
		38.1 mm
Concreto sin aire incluido	3 -- 5	160
Agua	160	l/m3

Contenido de aire	Asentamiento (cm)	Agua, en kg/m³ de concreto para los TMN del agregado indicados [A], mm							
		9,5	12,5	19	25	37,5	50 [B]	75 [B]	150 [B]
Concreto sin aire incluido	3 a 5	205	200	185	180	160	155	145	125
	8 a 10	225	215	200	195	175	170	160	140
	15 a 18	240	230	210	205	185	180	170	-
	Cantidad aproximada de aire atrapado en concreto sin aire incluido, %	3	2,5	2	1,5	1	0,5	0,3	0,2
Concreto con aire incluido	3 a 5	180	175	165	160	145	140	135	120
	8 a 10	200	190	180	175	160	155	150	135
	15 a 18	215	205	190	185	170	165	160	-
	Promedio recomendable de contenido total de aire, %	8	7	6	5	4,5	4	3,5	3

Masas unitarias sueltas y compactadas del agregado fino y grueso.

Peso Unitario suelto				
ARENA	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	11.8	11.78	11.81	11.80
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	2155.32	2151.67	2157.15	2154.72
Peso material suelto + recipiente g	8235	8219	8265	8239.67
Peso del recipiente g	5654	5654	5654	5654.00
Masa del material g	2581	2565	2611	2585.67
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.197**	**1.192**	**1.210**	**1.200**
Humedad del material %	6.08	6.08	6.08	6.08

Peso compactado				
ARENA	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	11.8	11.78	11.81	11.80
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	2155.32	2151.67	2157.15	2154.72
Peso material suelto + recipiente g	8530	8549	8570	8549.67
Peso del recipiente g	5654	5654	5654	5654.00
Masa del material g	2876	2895	2916	2895.67
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.334**	**1.345**	**1.352**	**1.344**
Humedad del material %	6.08	6.08	6.08	6.08


Peso Unitario suelto				
TRITURADO	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	16.83	16.83	16.83	16.83
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	3074.08	3074.08	3074.08	3074.08
Peso material suelto + recipiente g	11499	11457	11456	11470.67
Peso del recipiente g	7227	7227	7227	7227.00
Masa del material g	4272	4230	4229	4243.67
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.390**	**1.376**	**1.376**	**1.380**
Humedad del material %	1.94	1.94	1.94	1.94

Peso Compactado				
TRITURADO	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	16.83	16.83	16.83	16.83
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	3074.08	3074.08	3074.08	3074.08
Peso material suelto + recipiente g	11840	11830	11820	11830.00
Peso del recipiente g	7227	7227	7227	7227.00
Masa del material g	4613	4603	4593	4603.00
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.501**	**1.497**	**1.494**	**1.497**
Humedad del material %	1.94	1.94	1.94	1.94

Relación agua-cemento:

Relación Agua-Cemento

Resistencia requerida	284	kg/cm2
R a/c	0.46	

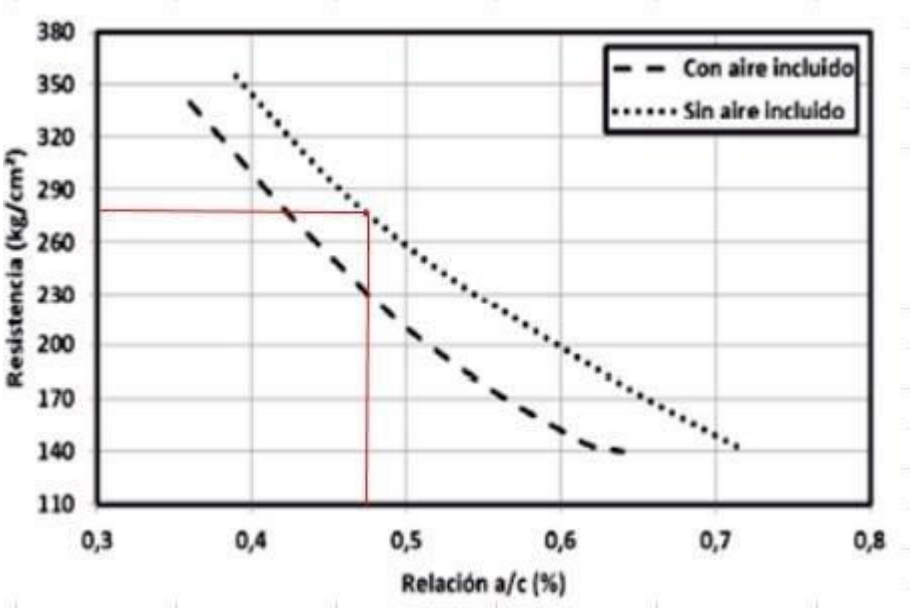

Contenido de cemento:

Contenido de cemento		
Cantidad de agua normal	160	lts
Relación Agua-cemento	0.46	
Cemento	347.8	kg/m3
Factor cemento	6.96	Sacos * 50 kg

Contenido de agregado grueso

Contenido de agregado grueso

Volumen de agregado grueso por m3 de concreto		
b/bo		
donde,		
b:	Volumen de las partículas de agregado grueso * m3 de concreto	
bo:	Volumen de las partículas de agregado grueso * m3 de agregado grueso	
TMN Grava	1"	
Módulo de finura de arenas	3.6	
Factor	0.58	m3
MUC-AGRUESO	1.497	Kg/m3
PESO AGREGADO GRUESO	2.58165545	Kg

	M dulo de finura del agragado fino																
TMN de la grava	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
25	0.74	0.73	0.72	0.71	0.7	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.6	0.59	0.58

Contenido de agregado fino

Contenido de agregado fino

Material			Peso unitario		Volumen Absoluto	
aire	1.7	%	100		0.01700	m3
agua	160	kg	1000	kg/m3	0.16000	m3
cemento	347.83	kg	2400	kg/m3	0.14493	m3
Agre. Grueso	2.582	kg	1.497	kg/m3	1.72455	m3
agre. Fino	0.33	kg	1.344	kg/m3	0.24382	m3
			Total		2.290	m3

Corrección por humedad:

Proporciones generales por volumen en el diseño de mezclas de un concreto hidráulico de 3000 PSI con cemento Cemex por 50 kg cada saco

CEMENTO	A. FINO	A. GRUESO	AGUA
1	2	3	160 Lts

HUMEDAD NATURAL

INV E -122

PROYECTO : Diseño de mezclas de concreto para placahuella

SOLICITA: Alcaldía del muncipio de la Unión **FECHA:** abril de 2024

ELABORÓ: Laboratorio de suelos Ingeomec

UBICACIÓN: Municipio de la Univón - Nariño

MUESTRA: 1 **PROFUNDIDAD:** Variable

TIPO DE MATERIAL: **TRITURADO**

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE LAS MUESTRAS

MUESTRA	SIGLAS	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3
Peso tara+muestra humeda (g)	**P1**	3318.00		
Peso tara+muestra seca (g)	**P2**	3258.00		
Peso tara (g)	**P3**	167.00		
Peso suelo húmedo (g)	**Psh**	3151.00		
Peso Suelo seco (g)	**Pss**	3091.00		
Contenido de agua (g)	**Pw**	60.00		
Humedad (%)	**W**	**1.94**		
Humedad (%) promedio	**w%**	1.94		

OBSERVACIONES :

ELABORÓ:

DARIO ALEXANDER MARTINEZ R
M.P. 52850-014904 NRÑ
Esp. En geotecnia vial y pavimentos
Coordinador general de laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec

HUMEDAD NATURAL

INV E -122

PROYECTO : Diseño de mezclas de concreto para placahuella

SOLICITA: Alcaldía del muncipio de la Unión **FECHA:** abril de 2024

ELABORÓ: Laboratorio de suelos Ingeomec

UBICACIÓN: Municipio de la Univón - Nariño

MUESTRA: 1 **PROFUNDIDAD:** Variable

TIPO DE MATERIAL: **ARENA TONALIDAD AMARILLENTA CON MATICES GRISÁCEOS**

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE LAS MUESTRAS

MUESTRA	SIGLAS	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3
Peso tara+muestra humeda (g)	**P1**	741.00		
Peso tara+muestra seca (g)	**P2**	708.00		
Peso tara (g)	**P3**	165.00		
Peso suelo húmedo (g)	**Psh**	576.00		
Peso Suelo seco (g)	**Pss**	543.00		
Contenido de agua (g)	**Pw**	33.00		
Humedad (%)	**W**	**6.08**		
Humedad (%) promedio	**w%**	6.08		

OBSERVACIONES :

ELABORÓ:

DARIO ALEXANDER MARTINEZ R
M.P. 52850-014904 NRÑ
Esp. En geotecnia vial y pavimentos
Coordinador general de laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec


	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO I.N.V. E – 213 –13	Código:	
		Versión:	2024

Proyecto:	Elaboración de diseño de mezclas de concreto hidráulico		
Material:	Triturado Tamaño Maximo 2"	**Tamaño Maximo Nominal**	1"
Fuente:	De cantera	**Tamaño máximo**	1 1/2"
Fecha de Ensayo:	mayo de 2024	**TIPO MUESTRA**	Triturado

GRANULOMETRIA

Humedad natural W%:	1.94	%			
Peso Humedo:	7033.0	gr	Peso seco lavado	6909	gr
peso seco:	6899.1	gr			

Tamiz		*Peso retenido*	*Retenido*	*Acumulado*	*Pasa*
Pulgadas	***Milímetros***	***(gr)***	***(%)***	***(%)***	***(%)***
2"	*50.800*	0.00	0.000	0.00	100.00
1.1/2"	*38.100*	0.00	0.000	0.00	100.00
1.0"	*25.400*	113.57	1.644	1.64	98.36
3/4"	19.100	1607.00	23.260	24.90	75.10
1/2"	12.700	2712.00	39.253	64.16	35.84
3/8"	9.510	1559.00	22.565	86.72	13.28
No 4	4.760	898.00	12.998	99.72	0.28
Fondo		19.43	0.281	100.00	0.00
TOTAL		6909.00	100		

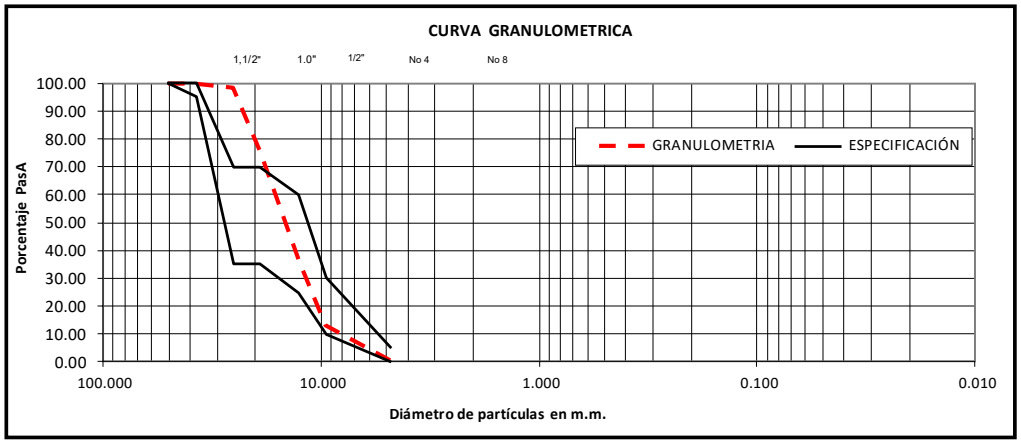

Módulo de finura 2.77

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	**REVISÓ:**
DARIO ALEXANDER MARTINEZ R M.P. 52850-014904 NRÑ Esp. En geotecnia vial y pavimentos Coordinador general de laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec	


	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO I.N.V. E – 213 – 13	Código:	
		Versión:	2024
		Fecha:	
		Aprobó:	

Proyecto:	Construcción de placa huellas en el municipio de la Unión		
Material:	Arena Tamaño Maximo de 2"	**Tamaño máximo nominal**	3/8"
Fuente:	De Peña	**Tamaño máximo**	2"
Fecha de Ensayo	mayo de 2024	**tipo de material**	Arena gris

GRANULOMETRIA

Humedad natural W%:	6.08	%			
Peso Humedo:	3927.0	gr	Peso seco lavado	3655	gr
peso seco:	3702.0	gr			

Tamiz		***Peso retenido***	***Retenido***	***Acumulado***	***Pasa***
Pulgadas	***Milímetros***	***(gr)***	***(%)***	***(%)***	***(%)***
2 1/2"	63.5	0.00	0.000	0.00	100.00
2"	50.8	0.00	0.000	0.00	100.00
1 1/2"	38.1	69.17	1.892	1.89	98.11
1"	25.4	129.51	3.543	5.44	94.56
3/4"	19.1	25.49	0.697	6.13	93.87
1/2"	12.7	150.11	4.107	10.24	89.76
3/8"	9.75	53.34	1.459	11.70	88.30
No 4	4.75	184.06	5.036	16.74	83.26
No 8	2.36	288.13	7.883	24.62	75.38
No 16	1.18	520.00	14.227	38.85	61.15
No 30	0.6	747.00	20.438	59.28	40.72
No 50	0.3	1010.00	27.633	86.92	13.08
No 100	0.15	394.00	10.780	97.70	2.30
P		84.19	2.303	100.00	0.00
TOTAL		3655.00	100.0		

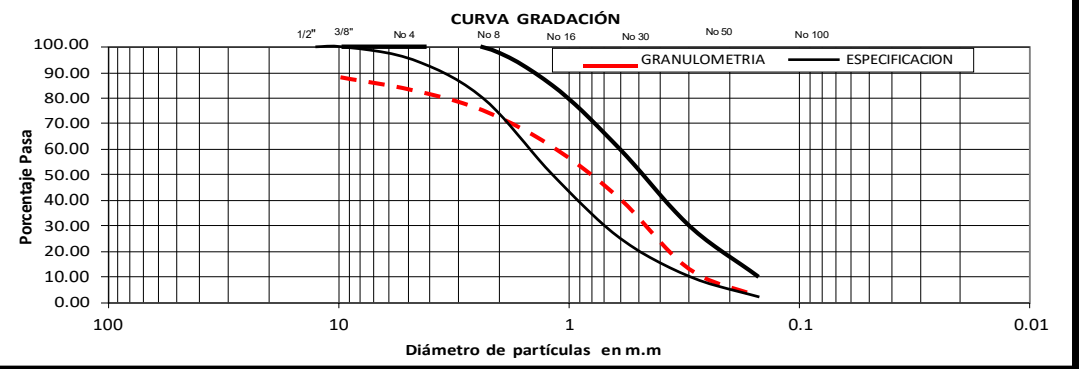

D60 0.7 D D1 0.15

Módulo de finura 3.6

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	**REVISÓ:**
DARIO ALEXANDER MARTINEZ R M.P. 52850-014904 NRÑ Esp. En geotecnia vial y pavimentos Coordinador general de laboratorio de	

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA UNA RESISTENCIA DE 3.8 MR

Solicita:

Junta de acción comunal vereda Quiroz Alto

Elaborado por:



DARIO ALEXANDER MARTINEZ R.
Esp. En geotecnia vial y pavimentos
M.P. 52850-014904 NRÑ
Coordinador general de Laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec

SAN JUAN DE PASTO

MAYO 2024

DISEÑO DE MEZCLAS

PROYECTO: DISEÑO DE MEZCLAS DE 3.8 MR

TIPO DE OBRA: Construcción Placa huellas

CEMENTO: Cemex por 50 kg

TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO GRUESO: 1 1/2”

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE AGREGADO GRUESO: 1”

TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO FINO: 2”

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE AGREGADO FINO: 3/8”

PROCEDENCIA DE LOS AGREGADOS:

AGREGADO FINO: Municipio de la Unión

AGREGADO GRUESO: Municipio de la Unión

RELACION AGUA - CEMENTO: 0.44

Asentamiento o Slump: de 1” a 3” como máximo

CANTIDAD DE AGUA POR METRO CUBICO DE CONCRETO: 185 LITROS

CANTIDAD DE CEMENTO EN KILOS: 420 KL POR METRO CUBICO

DOSIFICACIÓN 1: 2: 2.5

1 PARTE: CEMENTO

2 PARTES DE AGREGADO FINO (ARENA)

2.5 PARTES DE AGREGADO GRUESO (GRAVA)

RECOMENDACIONES:

Se recomienda dosificar por volumen cada uno de los componentes de la mezcla tal como se especifica.

Datos generales

Agregados	Fino	Grueso
Masa Unitaria suelta kg/m3	1.200	1.380
Masa Unitaria compactada kg/m3	1.344	1.497
Densidad aparante kg/m3	1.344	1.497
Absorción %	2.0	1.51
Humedad W%	6.08	1.94
Tamaño máximo nominal mm	3/8"	1"

Calculo F´cr (resistencia promedio requerida)

F'c	210	kg/cm2
Factor de seguridad	84	

Nota: cuando no se tiene registro de resistencia de probetas correspondientes a obras anteriores

F´c	F´cr	
Menos de 210	F'c + 70	
210 - 350	F'c + 84	se trabajará con este factor
Más de 350	F'c + 98	

210 + 84

294	**kg/cm2**	Resistencia requerida

Asentamiento escogido:

Elemento estructural	Asentamiento, mm	
	Mínimo	Máximo
Zapatas	25	75
Vigas	25	100
Columnas	25	100
Pavimentos y Losas	25	75

Asentamiento requerido	1" a 3"

Según la tabla anexa:

Tipo de estructura	Asentamiento, mm	
	Mínimo	Máximo [A]
Zapatas y muros de cimentación reforzados	25	75
Zapatas, cajones y muros de subestructuras sin refuerzo	25	75
Vigas y muros reforzados	25	100
Columnas de edificios	25	100
Pavimentos y losas	25	75
Concreto masivo	25	75

	PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS I.N.V. E – 222-223 – 13	Código:	
		Versión:	2024
		Fecha:	
		Aprobó:	

Proyecto:	"DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETOS DE 3000 PSI"		
Material:	Triturado y Arena		
Fuente:	municipio de la unión	**Muestra No**	1
Fecha de Ensayo:	3-may.-24	**Módulo**	N/A

Gravedad Especifica de Arena gruesa P No. 4 RET No. 40

	Ensayo	1	2	Promedio
a	**Peso seco de la muestra en gr.**	1983.00		
b	**Peso de la muestra saturada superficialmente seca**	2018.00		
c	**Peso sumergido de la muestra saturada con canastilla**	1955.00		
d	**Peso sumergido de la muestra saturada sin canastilla**	1285.00		
e	**Peso de la canastilla, en aire**	782.00		
f	**Peso de la canastilla sumergida**	682.00		
g	**Peso Especifico Aparente (a/(b-d))**	2.705		
h	**Peso Especifico Aparente S.S.S (b/(b-d))**	2.753		
i	**Peso Especifico Nominal (a/(a-d))**	2.841		
j	**% Absorción (b-a)/a**	1.7650		
	Gs Aparente	2.705		

Gravedad Especifica de Arena Finas pasante tamiz No. 40

	Ensayo	1	2	**Promedio**
a	**Peso seco final de la muestra, en (gr)**	495.00		
b	**Peso del picnómetro aforado lleno de agua, en (gr)**	695.00		
c	**Peso total del picnómetro aforado con la muestra y lleno de agua, en (gr)**	980.00		
s	**Peso de la muestra saturada, con superficie seca en (SSS) (gr)**	505.0		
d	**Peso Especifico Aparente (a/(b+s-c))**	2.250		
e	**Peso Especifico Aparente S.S.S (s/(b+s-c))**	2.295		
f	**Peso Especifico Nominal (a/(b+a-c))**	2.357		
g	**% Absorción (s-a)/a*100**	2.020		
	Promedio Gs Aparente	2.250		

OBSERVACIONES: _____

ELABORÓ	**REVISÓ:**	
DARIO MARTINEZ		DARIO MARTÍNEZ
LABORATORIO DE SUELOS		

	PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS I.N.V. E – 222-223 – 13	Código:	
		Versión:	2024
		Fecha:	
		Aprobó:	

Proyecto:	construccion de placa huellas		
Material:	arenas		
Fuente:	Municipio de la Unión	**Muestra No**	1
Fecha de Ensayo:	mayo de 2024	**Módulo**	N/A

Gravedad Especifica de Agregados Gruesos

	Ensayo	1	2	Promedio
a	**Peso seco de la muestra en gr.**	2980.00		
b	**Peso de la muestra saturada superficialmente seca**	3025.00		
c	**Peso sumergido de la muestra saturada con canastilla**	3933.00		
d	**Peso sumergido de la muestra saturada sin canastilla**	1756.00		
e	**Peso de la canastilla, en aire**	891.00		
f	**Peso de la canastilla sumergida**	792.00		
g	**Peso Especifico Aparente (a/(b-d))**	2.348		
h	**Peso Especifico Aparente S.S.S (b/(b-d))**	2.384		
i	**Peso Especifico Nominal (a/(a-d))**	2.435		
j	**% Absorción (b-a)/a**	1.51		
	Gs Aparente	2.348		

OBSERVACIONES: _____

ELABORÓ	**REVISÓ:**	
DARIO MARTINEZ		DARIO MARTÍNEZ
LABORATORIO DE SUELOS		

Tamaño máximo nominal (TMN)

Parámetros	Pulgada	mm	Medida mm	Tamaños máximos, según los parámetros		
				Ancho 1/5 d	Altura 1/3 h	Separación libre entre barras 3/4
Factor				5	3	0.75
TMN Gruesos (d)	1"	19.1				
TMN Finos (d)	3/8"	50.8				
Espesor del elemento estructural más pequeño:			200	40	66.7	
Separación de barras máximo:			60			45
Tamaño máximo nominal de agregado que cumple				1 1/2"	2"	1 1/2"
Tamaño máximo nominal de agregado sugerido				**1 1/2"**		

Contenido de aire en la mezcla:

% promedio aproximado de aire atrapado en la mezcla	TMN	
	Pulgadas	mm
1.7	1"	19.1

TMN		% Promedio aproximado de aire atrapado
Pulgadas	mm	
⅜	9,5	2,7
½	12,5	2,5
¾	19	2,0
1	25	1,7
1 ½	38	1,5
2	50	1,0
3	75	0,3
6	150	0,2

Contenido de agua en la mezcla:

Contenido de aire	Asentamiento cm	Agua en kg/m3
		38.1 mm
Concreto sin aire incluido	3 -- 5	185
Agua	185	l/m3

Contenido de aire	Asentamiento (cm)	Agua, en kg/m³ de concreto para los TMN del agregado indicados ^, mm							
		9,5	12,5	19	25	37,5	50 ª	75 ª	150 ª
Concreto sin aire incluido	3 a 5	205	200	185	180	160	155	145	125
	8 a 10	225	215	200	195	175	170	160	140
	15 a 18	240	230	210	205	185	180	170	-
	Cantidad aproximada de aire atrapado en concreto sin aire incluido, %	3	2,5	2	1,5	1	0,5	0,3	0,2
Concreto con aire incluido	3 a 5	180	175	165	160	145	140	135	120
	8 a 10	200	190	180	175	160	155	150	135
	15 a 18	215	205	190	185	170	165	160	-
	Promedio recomendable de contenido total de aire, %	8	7	6	5	4,5	4	3,5	3

Masas unitarias sueltas y compactadas del agregado fino y grueso

Peso Unitario suelto				
ARENA	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	11.8	11.78	11.81	11.80
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	2155.32	2151.67	2157.15	2154.72
Peso material suelto + recipiente g	8235	8219	8265	8239.67
Peso del recipiente g	5654	5654	5654	5654.00
Masa del material g	2581	2565	2611	2585.67
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.197**	**1.192**	**1.210**	**1.200**
Humedad del material %	6.08	6.08	6.08	6.08

Peso compactado				
ARENA	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	11.8	11.78	11.81	11.80
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	2155.32	2151.67	2157.15	2154.72
Peso material suelto + recipiente g	8530	8549	8570	8549.67
Peso del recipiente g	5654	5654	5654	5654.00
Masa del material g	2876	2895	2916	2895.67
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.334**	**1.345**	**1.352**	**1.344**
Humedad del material %	6.08	6.08	6.08	6.08


Peso Unitario suelto				
TRITURADO	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	16.83	16.83	16.83	16.83
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	3074.08	3074.08	3074.08	3074.08
Peso material suelto + recipiente g	11499	11457	11456	11470.67
Peso del recipiente g	7227	7227	7227	7227.00
Masa del material g	4272	4230	4229	4243.67
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.390**	**1.376**	**1.376**	**1.380**
Humedad del material %	1.94	1.94	1.94	1.94

Peso Compactado				
TRITURADO	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Altura del recipiente (cm)	16.83	16.83	16.83	16.83
Diámetro del recipiente (cm)	15.25	15.25	15.25	15.25
Radio del recipiente (cm)	7.625	7.625	7.625	7.63
Área del recipiente cm3	182.65	182.65	182.65	182.65
volumen recipiente cm3	3074.08	3074.08	3074.08	3074.08
Peso material suelto + recipiente g	11840	11830	11820	11830.00
Peso del recipiente g	7227	7227	7227	7227.00
Masa del material g	4613	4603	4593	4603.00
Peso Unitario suelto g/cm3	**1.501**	**1.497**	**1.494**	**1.497**
Humedad del material %	1.94	1.94	1.94	1.94

Relación agua-cemento:

Relación Agua-Cemento

Resistencia requerida	294	kg/cm2
R a/c	0.44	

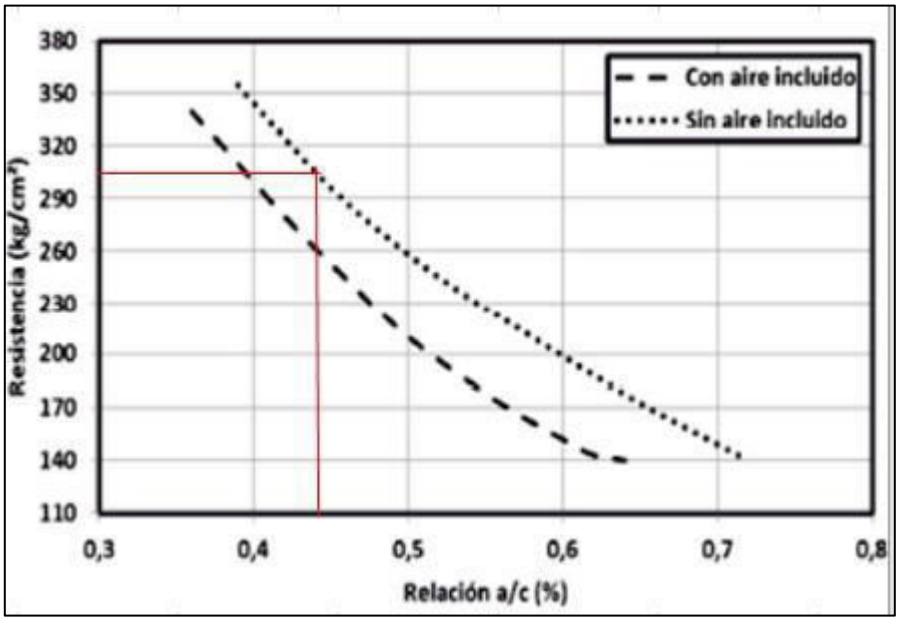

Contenido de cemento:

Contenido de cemento		
Cantidad de agua normal	185	lts
Relación Agua-cemento	0.44	
Cemento	420.5	kg/m3
Factor cemento	8.41	Sacos * 50 kg

Contenido de agregado grueso

Contenido de agregado grueso

Volumen de agregado grueso por m3 de concreto

b/bo

donde,

b:	Volumen de las partículas de agregado grueso * m3 de concreto		
bo:	Volumen de las partículas de agregado grueso * m3 de agregado grueso		
TMN Grava	1"		
Módulo de finura de arenas	3.6		
Factor	0.58	m3	
MUC-AGRUESO	1.497	Kg/m3	
PESO AGREGADO GRUESO	2.58165545	Kg	

	M dulo de finura del agragado fino																
TMN de la grava	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
25	0.74	0.73	0.72	0.71	0.7	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.6	0.59	0.58

Contenido de agregado fino

Contenido de agregado fino

Material			Peso unitario		Volumen Absoluto	
aire	1.7	%	100		0.01700	m3
agua	185	kg	1000	kg/m3	0.18500	m3
cemento	420.45	kg	2400.00	kg/m3	0.17519	m3
Agre. Grueso	2.582	kg	1.497	kg/m3	1.72455	m3
agre. Fino	0.33	kg	1.344	kg/m3	0.24382	m3

Total	2.346	m3

Corrección por humedad:

CORRECCIÓN POR HUMEDAD DE LOS AGREGADOS DE LA MEZCLA								
Material			**masa unitario compacta**		**Peso corregido**		**% humedad**	**% Absorción**
Agre. Grueso	2.58	kg	1.497	kg/m3	2.632	kg	1.94	1.51
Agre. Fino	2.35	kg	1.344	kg/m3	2.49	kg	6.08	2.02

APORTE DE AGUA A LA MEZCLA								
Material			**Peso unitario**		**Aporte de agua**		**% humedad**	**% Absorción**
Agre. Grueso	2.58	kg	1.497	kg/m3	0.0113	kg	1.94	1.51
Agre. Fino	2.35	kg	1.344	kg/m3	0.10	kg	6.08	2.02
			Total aporte de agua		**0.11**	**lts**		

Agua solicitada:	185.00	l/m3
Aporte de agua agregados	0.11	l/m3
Total agua efectiva	**185.11**	**l/m3**

HUMEDAD NATURAL

INV E -122

PROYECTO : Diseño de mezclas de concreto para placahuella

SOLICITA: Junta de acción comunal Quirozalto **FECHA:** abril de 2024

ELABORÓ: Laboratorio de suelos Ingeomec

UBICACIÓN: Municipio de la Univón - Nariño

TIPO DE MATERIAL: **TRITURADO**

MUESTRA: 1 **PROFUNDIDAD:** Variable

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE LAS MUESTRAS

MUESTRA	SIGLAS	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3
Peso tara+muestra humeda (g)	**P1**	3318.00		
Peso tara+muestra seca (g)	**P2**	3258.00		
Peso tara (g)	**P3**	167.00		
Peso suelo húmedo (g)	**Psh**	3151.00		
Peso Suelo seco (g)	**Pss**	3091.00		
Contenido de agua (g)	**Pw**	60.00		
Humedad (%)	**W**	**1.94**		
Humedad (%) promedio	**w%**	1.94		

OBSERVACIONES :

ELABORÓ:

DARIO ALEXANDER MARTINEZ R
M.P. 52850-014904 NRÑ
Esp. En geotecnia vial y pavimentos
Coordinador general de laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec

HUMEDAD NATURAL

INV E -122

PROYECTO : Diseño de mezclas de concreto para placahuella

SOLICITA: Junta de acción comunal Quirozalto **FECHA:** abril de 2024

ELABORÓ: Laboratorio de suelos Ingeomec

UBICACIÓN: Municipio de la Univón - Nariño

MUESTRA: 1 **PROFUNDIDAD:** Variable

TIPO DE MATERIAL: **ARENA TONALIDAD AMARILLENTA CON MATICES GRISÁCEOS**

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE LAS MUESTRAS

MUESTRA	SIGLAS	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3
Peso tara+muestra humeda (g)	**P1**	741.00		
Peso tara+muestra seca (g)	**P2**	708.00		
Peso tara (g)	**P3**	165.00		
Peso suelo húmedo (g)	**Psh**	576.00		
Peso Suelo seco (g)	**Pss**	543.00		
Contenido de agua (g)	**Pw**	33.00		
Humedad (%)	**W**	**6.08**		
Humedad (%) promedio	**w%**	6.08		

OBSERVACIONES :



ELABORÓ: **DARIO ALEXANDER MARTINEZ R**

M.P. 52850-014904 NRÑ

Esp. En geotecnia vial y pavimentos

Coordinador general de laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec


	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO I.N.V. E – 213 –13	Código:	
		Versión:	2024

Proyecto:	Elaboración de diseño de mezclas de concreto hidráulico		
Material:	Triturado Tamaño Maximo 2"	**Tamaño Maximo Nominal**	1"
Fuente:	De cantera	**Tamaño máximo**	1 1/2"
Fecha de Ensayo:	mayo de 2024	**TIPO MUESTRA**	Triturado

GRANULOMETRIA

Humedad natural W%:	1.94	%			
Peso Humedo:	7033.0	gr	Peso seco lavado	6909	gr
peso seco:	6899.1	gr			

Tamiz		*Peso retenido*	*Retenido*	*Acumulado*	*Pasa*
Pulgadas	***Milímetros***	***(gr)***	***(%)***	***(%)***	***(%)***
2"	*50.800*	0.00	0.000	0.00	100.00
1.1/2"	*38.100*	0.00	0.000	0.00	100.00
1.0"	*25.400*	113.57	1.644	1.64	98.36
3/4"	19.100	1607.00	23.260	24.90	75.10
1/2"	12.700	2712.00	39.253	64.16	35.84
3/8"	9.510	1559.00	22.565	86.72	13.28
No 4	4.760	898.00	12.998	99.72	0.28
Fondo		19.43	0.281	100.00	0.00
TOTAL		6909.00	100		

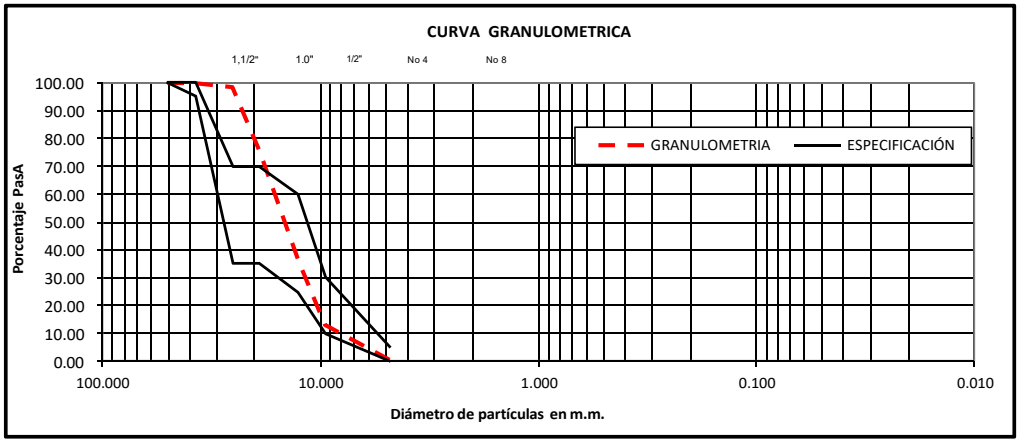

Módulo de finura 2.77

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	**REVISÓ:**
DARIO ALEXANDER MARTINEZ R M.P. 52850-014904 NRÑ Esp. En geotecnia vial y pavimentos Coordinador general de laboratorio de suelos y agregados - Ingeomec	


	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO **I.N.V. E – 213 – 13**	Código:	
		Versión:	2024
		Fecha:	
		Aprobó:	

Proyecto:	Construcción de placa huellas en el municipio de la Unión		
Material:	Arena Tamaño Maximo de 2"	**Tamaño máximo nominal**	3/8"
Fuente:	De Peña	**Tamaño máximo**	2"
Fecha de Ensayo	mayo de 2024	**tipo de material**	Arena gris

GRANULOMETRIA

Humedad natural W%:	6.08	%			
Peso Humedo:	3927.0	gr	Peso seco lavado	3655	gr
peso seco:	3702.0	gr			

Tamiz		***Peso retenido***	***Retenido***	***Acumulado***	***Pasa***
Pulgadas	***Milímetros***	***(gr)***	***(%)***	***(%)***	***(%)***
2 1/2"	63.5	0.00	0.000	0.00	100.00
2"	50.8	0.00	0.000	0.00	100.00
1 1/2"	38.1	69.17	1.892	1.89	98.11
1"	25.4	129.51	3.543	5.44	94.56
3/4"	19.1	25.49	0.697	6.13	93.87
1/2"	12.7	150.11	4.107	10.24	89.76
3/8"	9.75	53.34	1.459	11.70	88.30
No 4	4.75	184.06	5.036	16.74	83.26
No 8	2.36	288.13	7.883	24.62	75.38
No 16	1.18	520.00	14.227	38.85	61.15
No 30	0.6	747.00	20.438	59.28	40.72
No 50	0.3	1010.00	27.633	86.92	13.08
No 100	0.15	394.00	10.780	97.70	2.30
P		84.19	2.303	100.00	0.00
TOTAL		3655.00	100.0		

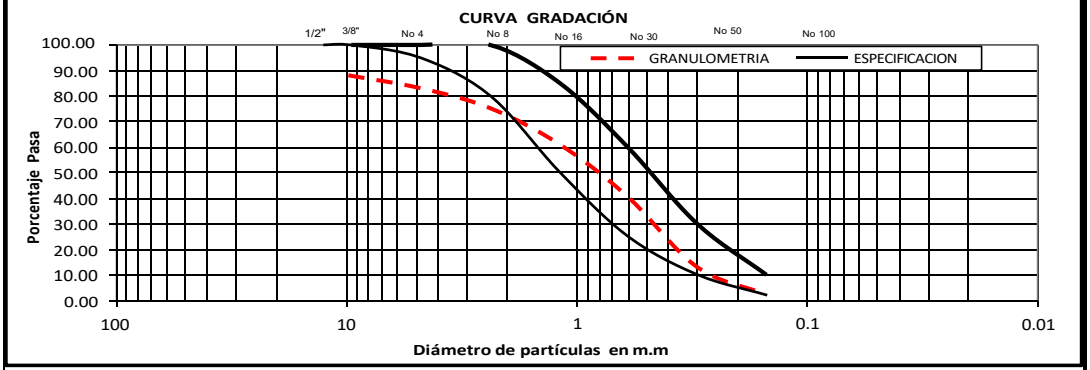

D60 0.7 D D1 0.15

Módulo de finura 3.6

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	**REVISÓ:**
DARIO ALEXANDER MARTINEZ R M.P. 52850-014904 NRÑ Esp. En geotecnia vial y pavimentos Coordinador general de laboratorio de	

PROPORCIONES EN VOLUMEN PARA RESISTENCIA									
MASA/DENSIDAD		AGUA (kg/m³)	CEMENTO (kg/m³)	AGREGADO FINO	AGREGADO GRUESO	R=A/C	AGUA LITROS		
PESO MATERIAL		185	420.0	737.5	1106.23				
VOL. ABS. MATERIAL (dm³/m³Concreto)		185	140.0	274.8	400.2				
PROPORCIONES			1.0	1.8	2.6	0.44	185		

CEMENTO	A. FINO	A. GRUESO	AGUA
1	2	2.5	185.00

EAR
EDWIN ALBERTO RUIZ
ESTUDIO DE SUELOS
CONSTRUCCION E INGENIERIA


ENSAYO DE COMPACTACION - PROCTOR MODIFICADO
MATERIAL DE BASE VERIFICACION DE PRODUCCION DE PROPIEDADES

PROCEDENCIA: MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR CANTERA LA PLAYA MUNICIPIO DE LA UNION

DESCRIPCION: SUB BASE GRANULAR

FECHA DE TOMA: lunes, 27 de mayo de 2024 MUESTRA No. 1
FECHA DE ENTREGA: sábado, 1 de junio de 2024

PRUEBA	1	2	3	4	5
N° de golpes	56	56	56		
Peso muestra húmeda+tara (g)	132,2	272,6	298,1		
Peso muestra seca+tara (g)	123,0	245,6	263,3		
Peso tara (g)	31,0	30,0	31,0		
Peso agua (g)	9,2	27,0	34,8		
Peso material seco (g)	92,0	215,6	232,3		
% Humedad	**10,0**	**12,5**	**15,0**		
MOLDE N°	1	1	1		
Peso muestra húmeda+Molde (g)	7041	7272	7260		
Peso Molde (g)	2729	2729	2729		
Peso muestra húmeda (g)	4312	4543	4531		
Peso material seco (g)	3920	4039	3940		
Volumen Molde (cm^3)	2050	2050	2050		
Densidad muestra seca (g/cm^3)	**1,912**	**1,970**	**1,922**		

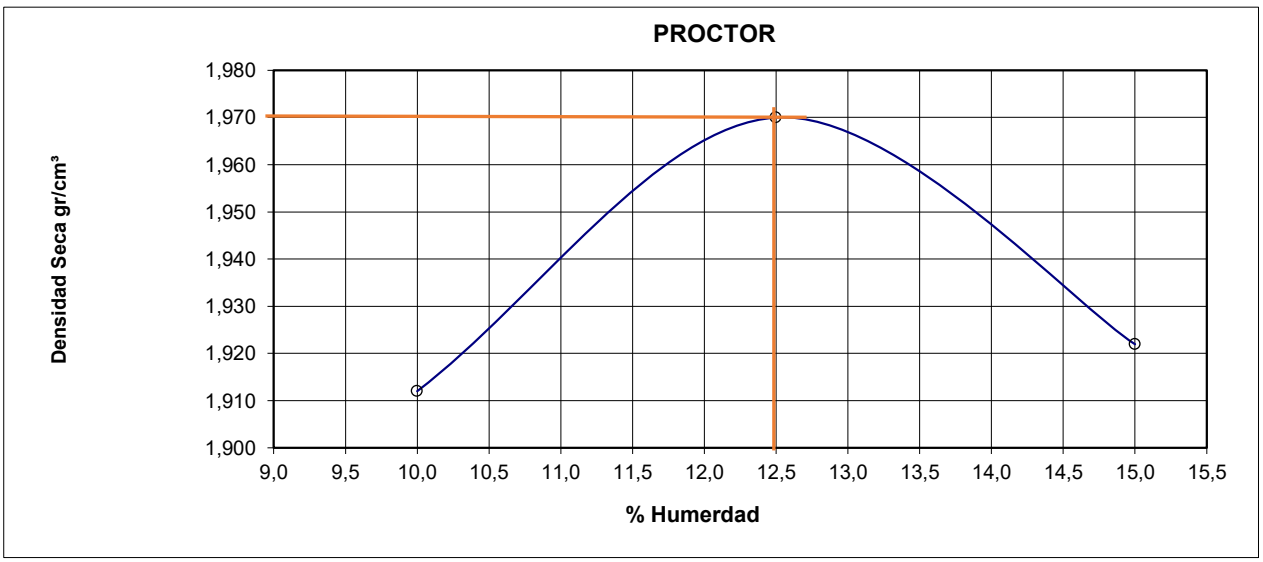

Peso unitario: **1,970 gr/cm³**
Humeda **12,5%**

NORMA DE ENSAYO : INV-E-142

OBSERVACIONES:

Edwin A. Ruiz E.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
Mat. 52769-025775 NRÑ

PFNL. EDWIN RUIZ
JEFE DE LABORATORIO

REVSIO

SEGURIDAD SOCIAL OAC

EL PELIGRO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901124176	9	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	VDA EL PELIGRO	LA UNION-NARIÑO	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	790025722	9470110042	Y	2024/07/18	2024/07/22	BANCOLOMBIA	4	$90,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	15816461	AROCA GAVIRIA EDGAR ALVEIRO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$300	$0	$90,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$300	$0	$90,800
TOTAL				**1**	**$90,500**	**$300**	**$0**	**$90,800**

2024/07/20 10:47 AM

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2024-07-08, 01:15:19 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	VECTRA CONSULTORES SAS
NIT	NI 900362493
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1064941229
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1125894312
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 536.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	1	$ 52.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS SA	1	$ 17.400	$ 0
N800144331	230301	PORVENIR	2	$ 277.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 120.700	$ 0
N891280008	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	2	$ 69.400	$ 0
		SubTotales:		$ 536.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 536.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-08, 01:05:22 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1064941229

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADA

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VECTRA CONSULTORES SAS		
Documento	NI900362493	**Dirección**	AV 4B NORTE #52 N - 70 APTO 301
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3055686
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GRAJALES MONTOYA LUIS MIGUEL	**Identificación**	CC 6320501
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15814401	HECTOR VALENCIA LUNA	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 433.334	$ 69.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 433.334	$ 17.400	6,960	$ 433.334	$ 30.200	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400
CC 4948861	VICTOR JESUS DAVILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.733.334	$ 1.733.334	$ 1.733.334	$ 1.733.334	$ 277.400	$ 69.400	$ 120.700	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.900	$ 0	$ 536.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901124176	9	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	VDA EL PELIGRO	LA UNION-NARIÑO	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	787108049	9469856630	E	2024/07/18	2024/07/19	BANCOLOMBIA	1	$1,157,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1089485200	LOPEZ VILLAMUEZ CARLOS MAURICIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
2	CC	15811494	MUÑOZ MENESES SEGUNDO MACARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
Total	**Afiliados(2)**					**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$325,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$2,600,000**	**$130,000**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$400	$0	$416,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$400	$0	$416,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$200	$0	$181,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$181,000	$200	$0	$181,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$100	$0	$104,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$104,000	$100	$0	$104,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$325,000	$400	$0	$325,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$200	$0	$162,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$200	$0	$162,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,000	$100	$0	$78,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$78,000	$100	$0	$78,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$52,000	$100	$0	$52,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$52,000	$100	$0	$52,100
TOTAL				2	$1,156,000	$1,300	$0	$1,157,300

2024/07/18 08:50 PM

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EDGAR ALVEIRO AROCA GAVIRIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-15816461
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-15
FECHA DE PAGO:	2024-07-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30194262
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30194262
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2024

LLANO GRANDE

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901032218	4	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LLANO GRANDE	II - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	VDA LLANO GRANDE	LA UNION-NARIÑO	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-07	754136534	9468668100	E	2024/07/05	2024/07/09	BANCO AGRARIO	4	$807,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$1,300	$0	$417,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$1,300	$0	$417,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$600	$0	$181,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$181,000	$600	$0	$181,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$400	$0	$104,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$104,000	$400	$0	$104,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$400	$0	$104,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$104,000	$400	$0	$104,400
TOTAL				2	$805,000	$2,700	$0	$807,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901032218	4	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LLANO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	VDA LLANO GRANDE	LA UNION-NARIÑO	3111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	764136534	9468688100	E	2024/07/08	2024/07/09	BANCO AGRARIO	4	$807,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: LA UNION Depto: NARIÑO (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
1	CC	12990523	CARVAJAL LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC03	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	15817713	OJEDA LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC03	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total		**Afiliados(2)**			$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-18, 11:15:04 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1065223557

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADA

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VECTRA CONSULTORES SAS		
Documento	NI900362493	**Dirección**	AV 4B NORTE #52 N - 70 APTO 301
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3055686
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GRAJALES MONTOYA LUIS MIGUEL	**Identificación**	CC 6320501
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004675311	JEREMY SNEIDER ORTEGA MORENO	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 303.334	$ 48.600	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 303.334	$ 12.200	6,960	$ 303.334	$ 21.200	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.200
CC 1084222199	MAURICIO HERNANDO PINTA ROMERO	01	00	X																0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 303.334	$ 48.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 303.334	$ 12.200	6,960	$ 303.334	$ 21.200	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.200
CC 1089478458	FABIAN RICARDO GOMEZ MARTINEZ	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 303.334	$ 48.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 303.334	$ 12.200	6,960	$ 303.334	$ 21.200	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.200
CC 13075571	ARLEY FAVIAN MUÑOZ ERAZO	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 303.334	$ 48.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 303.334	$ 12.200	6,960	$ 303.334	$ 21.200	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.200
CC 15816314	EIVAR FREDY CASTILLO MARTINEZ	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 303.334	$ 48.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 303.334	$ 12.200	6,960	$ 303.334	$ 21.200	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.516.670	$ 1.516.670	$ 1.516.670	$ 1.516.670	$ 243.000	$ 61.000	$ 106.000	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.000	$ 0	$ 471.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2024-07-18, 11:20:32 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	VECTRA CONSULTORES SAS
NIT	NI900362493
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1065223557
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	767115623
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 471.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 194.400	$ 0
N800138188	230201	PROTECCION	1	$ 48.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS SA	2	$ 24.400	$ 0
N837000084	EPSC05	EPS MALLAMAS	1	$ 12.200	$ 0
N901021565	ESSC18	EMSSANAR EPS	2	$ 24.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 106.000	$ 0
N891280008	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	5	$ 61.000	$ 0
		SubTotales:		$ 471.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 471.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

RAZÓN SOCIAL :	JUAN GUILLERMO MARTINEZ ERASO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1089480405
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-15
FECHA DE PAGO:	2024-07-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30205538
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30205538
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 1.400.000	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 175.000	$ 176.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.400.000	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 224.000	$ 226.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.400.000	$ 0	$ 0	$ 400	$ 34.200	$ 34.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 433.200	$ 437.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/08/2024

NUEVA FLORIDA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10549293		AGREDO BOLAÑOS OBER HERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 2 No. 3-49	SAN PABLO-NARIÑO	7286009	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	754509975	9469686613	I	2024/07/22	2024/07/05	BANCOLOMBIA	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10549293	AGREDO OBER									X									230301	30	$224,000	EPS005	30	$175,000		0	$0	14-23	30	0.522	$7,400	0	$0	No	$406,400
Total	**Afiliados(1)**																						$224,000			$175,000			$0				$7,400		$0		$406,400

2024/07/05 07:26 AM

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10549293		AGREDO BOLAÑOS OBER HERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 2 No. 3-49	SAN PABLO-NARIÑO	7286009	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	754509975	9469686613	I	2024/07/22	2024/07/05	BANCOLOMBIA	0	$406,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				**1**	**$406,400**	**$0**	**$0**	**$406,400**

OLIVOS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901032379	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JAC OLIVOS	VEREDA OLIVOS	LA UNION-NARIÑO	3136647275	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	758927868	9469735144	E	2024/07/18	2024/07/08	BANCOLOMBIA	0	$1,156,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	87026655	BENAVIDES TENORIO LEONEL ANTONIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$162,500	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
2	CC	1089487405	ORTEGA TUQUERRES ANDRES FELIPE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$162,500	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
Total	**Afiliados(2)**					**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$325,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$2,600,000**	**$130,000**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$0	$181,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$181,000	$0	$0	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$325,000	$0	$0	$325,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$162,500	$0	$0	$162,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$162,500	$0	$0	$162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,000	$0	$0	$78,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$78,000	$0	$0	$78,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$52,000	$0	$0	$52,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**2**	**$1,156,000**	**$0**	**$0**	**$1,156,000**

2024/07/09 09:56 AM

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-21, 10:50:41 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1064586910

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADA

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VECTRA CONSULTORES SAS		
Documento	NI900362493	**Dirección**	AV 4B NORTE #52 N - 70 APTO 301
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3055686
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GRAJALES MONTOYA LUIS MIGUEL	**Identificación**	CC 6320501
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 5217490	AFRANIO ESPADA ESTRELLA	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.040.000	$ 166.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.040.000	$ 41.600	6,960	$ 1.040.000	$ 72.400	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.040.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.040.000	$ 1.040.000	$ 1.040.000	$ 1.040.000	$ 166.400	$ 41.600	$ 72.400	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.000	$ 0	$ 322.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2024-06-21, 10:55:19 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	VECTRA CONSULTORES SAS
NIT	NI 900362493
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1064586910
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1097325643
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 332.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N901021565	ESSC18	EMSSANAR EPS	1	$ 41.600	$ 0
N800144331	230301	PORVENIR	1	$ 166.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 72.400	$ 0
N891280008	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	2	$ 41.600	$ 0
		SubTotales:		$ 332.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 332.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	59788832
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARMEN EMILIA SOLARTE PORTILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CR 2 # 17 42	TELÉFONO:	3165664
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7930167791**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	761703117

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 59788832	SOLARTE PORTILLA CARMEN EMILIA	INDEPEND		$ 1.300.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 370.500**

Planilla Pagada

QUIROZ

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901031117	4	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRACION	VEREDA QUIROZ	LA UNION-NARIÑO	3146974894	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	790587281	9470010870	Y	2024/07/05	2024/07/22	BANCOLOMBIA	17	$91,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1081592267	RANGEL RODRIGUEZ ORLANDO ALBERTO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$1,200	$0	$91,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$1,200	$0	$91,700
TOTAL				1	$90,500	$1,200	$0	$91,700

2024/07/20 04:42 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15817516
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA UNION	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CR 2 # 17 42	TELÉFONO:	3165664
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7931783712**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		771599708

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 208.000	$ 1.100	$ 209.100
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 1.100**	**$ 209.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 900	$ 0	$ 162.500	$ 900	$ 0	$ 163.400
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 163.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90.500	$ 90.500	$ 500	$ 0	$ 91.000
SUBTOTALES:									**$ 90.500**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 91.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSION								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 15817516	MORENO CERON JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	15817516	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 463.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15817516
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA UNION	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CR 2 # 17 42	TELÉFONO:	3165664
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7931783712**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		771599708

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 209.100
SUBTOTAL:			1	**$ 209.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 163.400
SUBTOTAL:			1	**$ 163.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 91.000
SUBTOTAL:			1	**$ 91.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 461.000**
VALOR MORA:	**$ 2.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 463.500**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ORLANDO ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1081592267
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-16
FECHA DE PAGO:	2024-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30405238
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30405238
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500	$ 90.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.000	$ 461.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/08/2024

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901031117	4	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRACION	VEREDA QUIROZ	LA UNION-NARIÑO	3146974894	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	766857990	9469145711	E	2024/07/05	2024/07/10	NEQUI	5	$640,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: LA UNION Depto: NARIÑO (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	1089478715	ERASO YORDAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1004255408	MARTINEZ CAMPOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESS042	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**				$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901031117	4	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRACION	VEREDA QUIROZ	LA UNION-NARIÑO	3146974894	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	766857990	9469145711	E	2024/07/05	2024/07/10	NEQUI	5	$640,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$1,600	$0	$417,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$1,600	$0	$417,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,600	$100	$0	$13,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$13,600	$100	$0	$13,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$400	$0	$104,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$104,000	$400	$0	$104,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$400	$0	$104,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000	$200	$0	$52,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$200	$0	$52,200
TOTAL				2	$637,600	$2,500	$0	$640,100

QUIROZ ALTO

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901021948	5	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALBERTH ERNEY JURADO GOMEZ	VEREDA QUIROZ ALTO	LA UNION-NARIÑO	3136647275	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	771555941	9469816101	E	2024/07/11	2024/07/12	BANCOLOMBIA	1	$1,177,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1004675102	RORIGUEZ REALPE KEVIN ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
2	CC	1089480155	SOLARTE DOMINGUEZ FABIO ANDRES	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC18	1	$43,334	$5,500	CCF35	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$43,334	$2,300
3	CC	1089483126	TUQUERRES ERASO ALBERT ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$162,500	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
Total	**Afiliados(3)**					**$2,643,334**	**$423,000**			**$2,643,334**	**$330,500**			**$2,643,334**	**$105,800**			**$2,643,334**	**$184,100**		**$2,643,334**	**$132,300**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$423,000	$400	$0	$423,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$423,000	$400	$0	$423,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$184,100	$200	$0	$184,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$184,100	$200	$0	$184,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$105,800	$100	$0	$105,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	$105,800	$100	$0	$105,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$330,500	$500	$0	$331,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$5,500	$100	$0	$5,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$162,500	$200	$0	$162,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$200	$0	$162,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$79,400	$100	$0	$79,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$79,400	$100	$0	$79,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$52,900	$100	$0	$53,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$52,900	$100	$0	$53,000
TOTAL				**3**	**$1,175,700**	**$1,400**	**$0**	**$1,177,100**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-18, 11:01:10 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1065223357

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADA

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VECTRA CONSULTORES SAS		
Documento	NI900362493	**Dirección**	AV 4B NORTE #52 N - 70 APTO 301
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3055686
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GRAJALES MONTOYA LUIS MIGUEL	**Identificación**	CC 6320501
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004675311	JEREMY SNEIDER ORTEGA MORENO	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 260.000	$ 41.600	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 260.000	$ 10.400	6,960	$ 260.000	$ 18.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.500
CC 1089478458	FABIAN RICARDO GOMEZ MARTINEZ	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 260.000	$ 41.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 260.000	$ 10.400	6,960	$ 260.000	$ 18.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.500
CC 13075571	ARLEY FAVIAN MUÑOZ ERAZO	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 260.000	$ 41.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 260.000	$ 10.400	6,960	$ 260.000	$ 18.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.500
CC 15812366	JOSE ALVARO SOLARTE VELASCO	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 260.000	$ 41.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 260.000	$ 10.400	6,960	$ 260.000	$ 18.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.500
CC 15816314	EIVAR FREDY CASTILLO MARTINEZ	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 260.000	$ 41.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 260.000	$ 10.400	6,960	$ 260.000	$ 18.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500	$ 0	$ 402.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2024-07-18, 11:10:59 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	VECTRA CONSULTORES SAS
NIT	NI900362493
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1065223357
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	767162354
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 402.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 166.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 41.600	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	$ 10.400	$ 0
N837000084	EPSC05	EPS MALLAMAS	1	$ 10.400	$ 0
N901021565	ESSC18	EMSSANAR EPS	2	$ 20.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS SA	1	$ 10.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	5	$ 90.500	$ 0
N891280008	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	5	$ 52.000	$ 0

SubTotales:	$ 402.500	$ 0
Total a Pagar:		$ 402.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094950740		CARDENAS ERAZO JEFERSON ESTIBEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 40 20-58	PASTO-NARIÑO	7310206	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	754460963	9469257544	I	2024/07/10	2024/07/05	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1094950740	CARDENAS JEFERSON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094950740		CARDENAS ERAZO JEFERSON ESTIBEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 40 20-58	PASTO-NARIÑO	7310206	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	754460963	9469257544	I	2024/07/10	2024/07/05	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

SAUCE

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15817516		JUAN CARLOS MORENO CERON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CARLOS	Cr 2 # 17 42	POPAYAN-CAUCA	3165664006	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	777310289	9469941472	N	2024/07/05	2024/07/15	BANCO DAVIVIENDA	10	$89,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	15816314	CASTILLO MARTINEZ EIVAR FREDY	Dependiente	0	No	No		X	2024/06/08	X	2024/06/15							A								▫							
2	CC	15816314	CASTILLO MARTINEZ EIVAR FREDY	Dependiente	0	No	No		X	2024/06/08	X	2024/06/15							C															
3	CC	1089478458	GOMEZ MARTINEZ FABIAN RICARDO	Dependiente	0	No	No		X	2024/06/08	X	2024/06/15							A								▫							
4	CC	1089478458	GOMEZ MARTINEZ FABIAN RICARDO	Dependiente	0	No	No		X	2024/06/08	X	2024/06/15							C															
5	CC	1004675311	ORTEGA MORENO JEREMY SNEIDER	Dependiente	0	No	No		X	2024/06/08	X	2024/06/15							A								▫							
6	CC	1004675311	ORTEGA MORENO JEREMY SNEIDER	Dependiente	0	No	No		X	2024/06/08	X	2024/06/15							C															
7	CC	1084222199	PINTA ROMERO MAURICIO HERNANDO	Dependiente	0	No	No		X	2024/06/08	X	2024/06/15							A								▫							
8	CC	1084222199	PINTA ROMERO MAURICIO HERNANDO	Dependiente	0	No	No		X	2024/06/08	X	2024/06/15							C															

Total **Afiliados(4)**

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	8	($ 346.667)	26%	ALTO RIESGO	($ 90.200)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	($ 90.200)		NUEVA E.P.S.	8	($ 346.667)	12,5%	($ 43.400)	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	8	$ 346.667	26%	ALTO RIESGO	$ 90.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.200		NUEVA E.P.S.	8	$ 346.667	12,5%	$ 43.400	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	8	($ 346.667)	26%	ALTO RIESGO	($ 90.200)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	($ 90.200)		EMSSANAR	8	($ 346.667)	12,5%	($ 43.400)	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	8	$ 346.667	26%	ALTO RIESGO	$ 90.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.200		EMSSANAR	8	$ 346.667	12,5%	$ 43.400	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	8	($ 346.667)	26%	ALTO RIESGO	($ 90.200)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	($ 90.200)		MALLAMAS	8	($ 346.667)	12,5%	($ 43.400)	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	8	$ 346.667	26%	ALTO RIESGO	$ 90.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.200		MALLAMAS	8	$ 346.667	12,5%	$ 43.400	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PROTECCION	8	($ 346.667)	26%	ALTO RIESGO	($ 90.200)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	($ 90.200)		NUEVA EPS MOVILIDAD	8	($ 346.667)	12,5%	($ 43.400)	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PROTECCION	8	$ 346.667	26%	ALTO RIESGO	$ 90.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.200		NUEVA EPS MOVILIDAD	8	$ 346.667	12,5%	$ 43.400	$
																					$ 0						$ 0	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	($ 43.400)		COMFACAUCA	8	($ 346.667)	4%	($ 13.900)	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	8	($ 346.667)	0,522%	5	($ 1.900)	8	($ 346.667)	2%	($ 7.000)	3%	($10.500)	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 43.400		COMFACAUCA	8	$ 346.667	4%	$ 13.900	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	8	$ 346.667	6,96%	5	$ 24.200	8	$ 346.667	2%	$ 7.000	3%	$10.500	0%	$0	0%	$0	No
0	($ 43.400)		COMFACAUCA	8	($ 346.667)	4%	($ 13.900)	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	8	($ 346.667)	0,522%	5	($ 1.900)	8	($ 346.667)	2%	($ 7.000)	3%	($10.500)	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 43.400		COMFACAUCA	8	$ 346.667	4%	$ 13.900	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	8	$ 346.667	6,96%	5	$ 24.200	8	$ 346.667	2%	$ 7.000	3%	$10.500	0%	$0	0%	$0	No
0	($ 43.400)		COMFACAUCA	8	($ 346.667)	4%	($ 13.900)	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	8	($ 346.667)	0,522%	5	($ 1.900)	8	($ 346.667)	2%	($ 7.000)	3%	($10.500)	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 43.400		COMFACAUCA	8	$ 346.667	4%	$ 13.900	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	8	$ 346.667	6,96%	5	$ 24.200	8	$ 346.667	2%	$ 7.000	3%	$10.500	0%	$0	0%	$0	No
0	($ 43.400)		COMFACAUCA	8	($ 346.667)	4%	($ 13.900)	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	8	($ 346.667)	0,522%	5	($ 1.900)	8	($ 346.667)	2%	($ 7.000)	3%	($10.500)	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 43.400		COMFACAUCA	8	$ 346.667	4%	$ 13.900	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	8	$ 346.667	6,96%	5	$ 24.200	8	$ 346.667	2%	$ 7.000	3%	$10.500	0%	$0	0%	$0	No
	$ 0						$ 0						$ 89.200				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15817516		JUAN CARLOS MORENO CERON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CARLOS	Cr 2 # 17 42	POPAYAN-CAUCA	3165664006	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	777310289	9469941472	N	2024/07/05	2024/07/15	BANCO DAVIVIENDA	10	$89,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$89,200	$700	$0	$89,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$89,200	$700	$0	$89,900
TOTAL				4	$89,200	$700	$0	$89,900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15817516
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA UNION	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CR 2 # 17 42	TELÉFONO:	3165664
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7931783712**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		771599708

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 208.000	$ 1.100	$ 209.100
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 1.100**	**$ 209.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 900	$ 0	$ 162.500	$ 900	$ 0	$ 163.400
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 163.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90.500	$ 90.500	$ 500	$ 0	$ 91.000
SUBTOTALES:									**$ 90.500**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 91.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSION								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 15817516	MORENO CERON JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	15817516	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 463.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15817516
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA UNION	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CR 2 # 17 42	TELÉFONO:	3165664
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7931783712**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		771599708

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 209.100
SUBTOTAL:			1	**$ 209.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 163.400
SUBTOTAL:			1	**$ 163.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 91.000
SUBTOTAL:			1	**$ 91.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 461.000**
VALOR MORA:	**$ 2.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 463.500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901031819	6	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SAUCE	VEREDA EL SAUCE A	LA UNION-NARIÑO	3116007617	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	771528355	9468845460	Y	2024/07/05	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	7	$499,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1032497441	DIAZ URBANO LISSETTE VIVIANA																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$97,500	0	$0	$0	No	$496,500
Total	**Afiliados(1)**																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$97,500		$0	$0		$496,500

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901031819	6	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SAUCE	VEREDA EL SAUCE A	LA UNION-NARIÑO	3116007617	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	771528355	9468845460	Y	2024/07/05	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	7	$499,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$1,200	$0	$225,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,000	$1,200	$0	$225,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,500	$600	$0	$98,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$97,500	$600	$0	$98,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$1,000	$0	$176,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$1,000	$0	$176,000
TOTAL				**1**	**$496,500**	**$2,800**	**$0**	**$499,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15817516		JUAN CARLOS MORENO CERON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CARLOS	Cr 2 # 17 42	POPAYAN-CAUCA	3165664006	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	771654106	9469901377	E	2024/07/05	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	7	$671,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	15816314	CASTILLO EIVAR	X	X																230301	8	$346,667	$90,200	EPS037	8	$346,667	$43,400	CCF14	8	$346,667	$13,900	14-23	8	$346,667	$1,900	8	$346,667	$17,500	No	$166,900
2	CC	1089478458	GOMEZ FABIAN	X	X																230301	8	$346,667	$90,200	ESSC18	8	$346,667	$43,400	CCF14	8	$346,667	$13,900	14-23	8	$346,667	$1,900	8	$346,667	$17,500	No	$166,900
3	CC	1004675311	ORTEGA JEREMY	X	X																230301	8	$346,667	$90,200	EPSIC5	8	$346,667	$43,400	CCF14	8	$346,667	$13,900	14-23	8	$346,667	$1,900	8	$346,667	$17,500	No	$166,900
4	CC	1084222199	PINTA MAURICIO	X	X																230201	8	$346,667	$90,200	EPS041	8	$346,667	$43,400	CCF14	8	$346,667	$13,900	14-23	8	$346,667	$1,900	8	$346,667	$17,500	No	$166,900
Total	**Afiliados(4)**																						$1,386,668	$360,800			$1,386,668	$173,600			$1,386,668	$55,600			$1,386,668	$7,600		$1,386,668	$70,000		$667,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15817516		JUAN CARLOS MORENO CERON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CARLOS	Cr 2 # 17 42	POPAYAN-CAUCA	3165664006	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	771654106	9469901377	E	2024/07/05	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	7	$671,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$360,800	$2,000	$0	$362,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$270,600	$1,500	$0	$272,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$90,200	$500	$0	$90,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$7,600	$100	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$7,600	$100	$0	$7,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$55,600	$300	$0	$55,900
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$55,600	$300	$0	$55,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$173,600	$1,200	$0	$174,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$43,400	$300	$0	$43,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$43,400	$300	$0	$43,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$43,400	$300	$0	$43,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$43,400	$300	$0	$43,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$42,000	$300	$0	$42,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$42,000	$300	$0	$42,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$28,000	$200	$0	$28,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$28,000	$200	$0	$28,200
TOTAL				**4**	**$667,600**	**$4,100**	**$0**	**$671,700**
