INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1
CONTRATO No. 5040 de 2023.

PERIODO: DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DEACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.

CONTRATISTA: CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

INTERVENTOR:
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

SUPERVISOR:
ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI.

ENERO 2024.

TABLA DE CONTENIDO.

1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CAÑO BONITO. 9
2. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CERRITOS. 11
3. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - EL RECREO. 13
4. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN LUCAS. 15
5. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN FRANCISCO II. 17
6. INTRODUCCIÓN. 19
7. CONVENIO SOLIDARIO No. 3613 DE 2023 JAC VEREDA CAÑO BONITO. 20
   - 7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 20
     - 7.1.1 Localización del proyecto. 20
     - 7.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 21
     - 7.1.3 Características técnicas del convenio. 22
   - 7.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 22
     - 7.2.1 Información General del Convenio. 22
     - 7.2.2 Descripción de actividades. 23
     - 7.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 23
     - 7.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 23
   - 7.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 24
     - 7.3.1 Informe semanal. 24
     - 7.3.2 Maquinaria y Equipo. 24
     - 7.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 24
     - 7.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 24
     - 7.3.5 Estado general del tiempo. 25
     - 7.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 25
     - 7.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 25

7.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 26

7.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 26

8. CONVENIO SOLIDARIO No. 4143 DE 2023 JAC VEREDA CERRITOS. 27

8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 27

8.1.1 Localización del proyecto. 27

8.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 28

8.1.3 Características técnicas del convenio. 29

8.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 29

8.2.1 Información General del Convenio. 29

8.2.2 Descripción de actividades. 30

8.2.3 Seguimiento Items No Previstos. 30

8.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 30

8.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 31

8.3.1 Informe semanal. 31

8.3.2 Maquinaria y Equipo. 31

8.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 31

8.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 31

8.3.5 Estado general del tiempo. 32

8.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 32

8.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 32

8.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 33

8.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 33

9. CONVENIO SOLIDARIO No. 4240 DE 2023 JAC VEREDA EL RECREO. 34

9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 34

9.1.1 Localización del proyecto. 34

9.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 35

9.1.3 Características técnicas del convenio. 36

9.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 36

9.2.1 Información General del Convenio. 36

9.2.2 Descripción de actividades. 37

9.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 37

9.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 37

9.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 38

9.3.1 Informe semanal. 38

9.3.2 Maquinaria y Equipo. 38

9.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 38

9.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 38

9.3.5 Estado general del tiempo. 39

9.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 39

9.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 39

9.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 40

9.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 40

10. CONVENIO SOLIDARIO No. 3752 DE 2023 JAC VEREDA SAN LUCAS. ... 41

10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 41

10.1.1 Localización del proyecto. 41

10.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 42

10.1.3 Características técnicas del convenio. 43

10.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 43

10.2.1 Información General del Convenio. 43

10.2.2 Descripción de actividades. 44

10.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 44

10.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 44

10.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 45

10.3.1 Informe semanal. 45

10.3.2 Maquinaria y Equipo. 45

10.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 45

10.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 45

10.3.5 Estado general del tiempo. 46

10.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 46

10.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 46

10.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 47

10.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 47

11. CONVENIO SOLIDARIO No. 4222 DE 2023 JAC VEREDA SAN FRANCISCO II. 48

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 48

1.1.1 Localización del proyecto. 48

1.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 49

1.1.3 Características técnicas del convenio. 50

1.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 50

1.2.1 Información General del Convenio. 50

1.2.2 Descripción de actividades. 51

1.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 51

1.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 51

1.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 51

1.3.1 Informe semanal. 51

1.3.2 Maquinaria y Equipo. 52

1.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 52

1.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 52

1.3.5 Estado general del tiempo. 53

1.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 53

1.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 53

1.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 54

1.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 54

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 55

12.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 55

12.2 Informes especialistas y profesionales. 56

12.3 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría. 56

3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 56

3.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría. 56

3.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. 56

3.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría. 56

3.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría. 57

3.5 Otros documentos seguimiento mensual. 57

4. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES. 58

5. ANEXOS. 58

5.1 Relación Correspondencia. 58

5.2 Registro fotográfico. 58

5.3 Formatos Interventorías Convenios Solidarios. 58

LISTA DE ILUSTRACIONES.

Ilustración 1. Zona de intervención Vereda Caño Bonito. 21
Ilustración 2. Zona de intervención Vereda Cerritos. 28
Ilustración 3. Zona de intervención Vereda El Recreo. 35
Ilustración 4. Zona de intervención Vereda San Lucas. 42
Ilustración 5. Zona de intervención Vereda San Francisco II. 49

LISTA DE TABLAS.

Tabla 1. Fotos iniciales del tramo a intervenir vereda Caño Bonito. 21
Tabla 2. Relación alcance físico del convenio JAC Caño Bonito. 22
Tabla 3. Información general del convenio JAC Caño Bonito. 22
Tabla 4. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 23
Tabla 5. Seguimiento garantías del convenio JAC Caño Bonito. 25
Tabla 6. Foto inicial del tramo a intervenir vereda Cerritos. 28
Tabla 7. Relación alcance físico del convenio JAC Cerritos. 29
Tabla 8. Información general del convenio JAC Cerritos. 29
Tabla 9. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 30
Tabla 10. Seguimiento garantías del convenio JAC Cerritos 32
Tabla 11. Foto inicial del punto a intervenir vereda El Recreo. 35
Tabla 12. Relación alcance físico del convenio JAC El Recreo. 36
Tabla 13. Información general del convenio JAC El Recreo. 36
Tabla 14. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 37
Tabla 15. Seguimiento garantías del convenio JAC El Recreo. 39
Tabla 16. Foto inicial del tramo a intervenir vereda San Lucas. 42
Tabla 17. Relación alcance físico del convenio JAC San Lucas. 43
Tabla 18. Información general del convenio JAC San Lucas. 44
Tabla 19. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 44
Tabla 20. Seguimiento garantías del convenio JAC San Lucas. 47
Tabla 21. Foto inicial del punto a intervenir vereda San Francisco II. 49
Tabla 22. Relación alcance físico del convenio JAC San Francisco II. 50
Tabla 23. Información general del convenio JAC San Francisco II. 50
Tabla 24. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 51
Tabla 25. Seguimiento garantías del convenio JAC San Francisco II. 53
Tabla 26. Información general del contrato de interventoría. 55

Tabla 27. Disponibilidad presupuestal contrato de interventoría. 56
Tabla 28. Garantías contrato de interventoría anexo 0. 57
Tabla 29. Garantías contrato de interventoría anexo 5. 57

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** ENERO 2024

CONVENIO No.: 3613 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA:	30/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2024
PLAZO ACUMULADO:	4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 207.992.007,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 207.992.007,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	18,90
CONSTRUCCIÓN DE (1) ALCANTARILLA	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	52,40
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	9,30
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	15,80
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	9,50
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	2,00
	Tuberia De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diametro Interior	M	5,00
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	781,70
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	11,90
	Demolición De Estructuras	M3	7,16
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, LONGITUD APROXIMADA: 70,00 M	Conformación De La Calzada Existente	M2	420,00
	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	69,70
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	42,60
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	28,30
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2004,10
	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	2,90
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	19,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Tuberia De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diametro Interior	M	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Demolición De Estructuras	M3	0	0
Conformación De La Calzada Existente	M2	0	0
Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 157.148.903,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.714.468,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.128.636,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 207.992.007,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ -**	**$ -**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

	FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	**Foto 2**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** ENERO 2024

CONVENIO No.: 4143 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE PRORROGA:	30/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2024
PLAZO ACUMULADO:	4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 203.603.516,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 203.603.516,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	6,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	1,00
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, LONGITUD APROXIMADA: 130,00 M	Conformación De La Calzada Existente	M2	780,00
	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	129,30
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	79,10
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	52,80
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3709,50
	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	5,20
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	35,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	0	0
Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	0	0
Conformación De La Calzada Existente	M2	0	0
Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 156.265.803,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.687.975,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.649.738,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 203.603.516,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ -**	**$ -**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre/GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** ENERO 2024

CONVENIO No.: 4240 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	16/01/2024
FECHA PRORROGA :	16/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2024
PLAZO ACUMULADO:	4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.041.344,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.041.344,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	30,00
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX COULVERT	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	10,20
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	1,80
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	7,70
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	22,90
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	5,00
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2456,80
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	590,80

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 152.820.763,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.584.623,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.635.958,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 200.041.344,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ -**	**$ -**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024

(Día / Mes / Año)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** ENERO 2024

CONVENIO No.: 3752 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCAS

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	18/01/2024
FECHA DE PRORROGA 1:	18/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2024
PLAZO ACUMULADO:	4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 216.314.958,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 216.314.958,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	6,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	1,00
CONSTRUCCIÓN DE (2) ALCANTARILLA	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	92,90
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	16,40
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	50,90
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	19,10
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0,90
	Tuberia De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diametro Interior	M	12,00
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157,80
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	13,00
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, LONGITUD APROXIMADA: 100,00 M	Conformación De La Calzada Existente	M2	420,00
	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	69,70
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	42,60
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	28,30
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2004,10
	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	2,90
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	19,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	NTIDAD ACUMULA
Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	0	0
Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Tuberia De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diametro Interior	M	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Conformación De La Calzada Existente	M2	0	0
Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 168.583.093,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 5.057.493,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.674.372,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 216.314.958,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ -**	**$ -**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

	FECHA	31/01/2024
		(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	**Foto 2**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** ENERO 2024

CONVENIO No.: 4222 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO II

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE PRORROGA 1:	30/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2024
PLAZO ACUMULADO:	4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 208.194.251,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 208.194.251,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	6,00
CONSTRUCCIÓN DE (3) BOX COULVERT	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	12,80
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	2,30
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	16,40
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	22,70
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	3,50
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2280,20
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	764,40

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 160.705.586,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.821.168,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.667.497,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 208.194.251,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ -**	**$ -**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

6. INTRODUCCIÓN.

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS suscribió convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal del departamento del Guaviare, bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Para lo cual, en el municipio de El Retorno las JAC Caño Bonito, Cerritos, El Recreo, San Lucas y San Francisco II, suscribieron los convenios solidarios No. 3613, 4143, 4240, 3752, 4222 de 2023, respectivamente.

Dado lo anterior, el INVIAS mediante proceso CMA-DEO-SVR-150-2023 efectuó el contrato No. 5040 de 2023 con orden de inicio 2023S-VBOG-033951 para realizar la interventoría a los convenios solidarios anteriormente mencionados, con el objeto "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2".

Para lo anterior, el INVIAS designó como Supervisor del contrato de interventoría al ingeniero Carlos German Corzo Upegui.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El presente informe parcial contempla las actividades realizadas en cada uno de los convenios en el periodo entre el 23 de enero de 2024 hasta el 31 de enero de 2024.

7. CONVENIO SOLIDARIO No. 3613 DE 2023 JAC VEREDA CAÑO BONITO.

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

7.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas - 72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O



Ilustración 1. Zona de intervención Vereda Caño Bonito.

7.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 100 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada compactación y conformación de cunetas que permitan un correcto drenaje en la vía, esto ocasiona que en temporada de lluvias se genere erosión del material superficial y sea muy complicado su transitabilidad.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)

Tabla 1. Fotos iniciales del tramo a intervenir vereda Caño Bonito.

7.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior y placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS (UND)
18,90	0,00	70,00	1

Tabla 2. Relación alcance físico del convenio JAC Caño Bonito.

Es menester aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

7.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

7.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	3613 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	29/09/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO
NIT:	901.010.660-2
VALOR INICIAL	$207.992.007,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$208.992.007,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 3. Información general del convenio JAC Caño Bonito.

7.2.2 Descripción de actividades.

En el periodo reportado se efectuó el trámite de prórroga No. 1 del convenio solidario con nueva fecha de terminación el 30 de abril de 2024. Adicionalmente, se inició revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de enero de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 157.148.903	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.148.903
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.714.468	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.714.468
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.128.636	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.128.636
TOTAL	**$ 207.992.007**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 207.992.007**

Tabla 4. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%.

7.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

7.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado legal del convenio, revisión de pólizas y documentación inicial.

Finalmente, se tendrá comunicación continua con el presidente de la OAC con el fin de socializar el convenio solidario y presupuesto oficial, así mismo para adelantar temas de contratación del personal calificado.

7.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

7.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 1: Desde el 23 al 31 de enero de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

7.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de enero de 2024 no se realizó proceso de contratación y/o gestión de maquinaria y equipo de obra, debido a que el convenio se encuentra en trámites legales ante la entidad.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

7.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Para el periodo de enero de 2024 aún no se realizaba la vinculación del personal requerido para el convenio.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

7.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3613 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 30 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $ 207.992.007.00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $207.413.317,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $578.690,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

7.3.5 Estado general del tiempo.

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

7.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Dado que, durante el periodo reportado no se realizaron actividades en obra, no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

7.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100036855 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009777 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 41.798.401,40	29/09/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.449.600,35	29/09/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 62.697.602,10	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 114.945.603,85**	**29/09/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29/09/2023	31/12/2023

Tabla 5. Seguimiento garantías del convenio JAC Caño Bonito.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

7.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

7.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC no ha presentado la programación de obra.
- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante preacta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".
- Actas comités de obra: Durante el presente periodo no se efectuaron Actas de Comité de obra con la JAC.
- Actas de Comité operativo: Durante el presente periodo no se efectuaron Actas de Comité operativo con la JAC.

8. CONVENIO SOLIDARIO No. 4143 DE 2023 JAC VEREDA CERRITOS.

8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

8.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Voragine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O

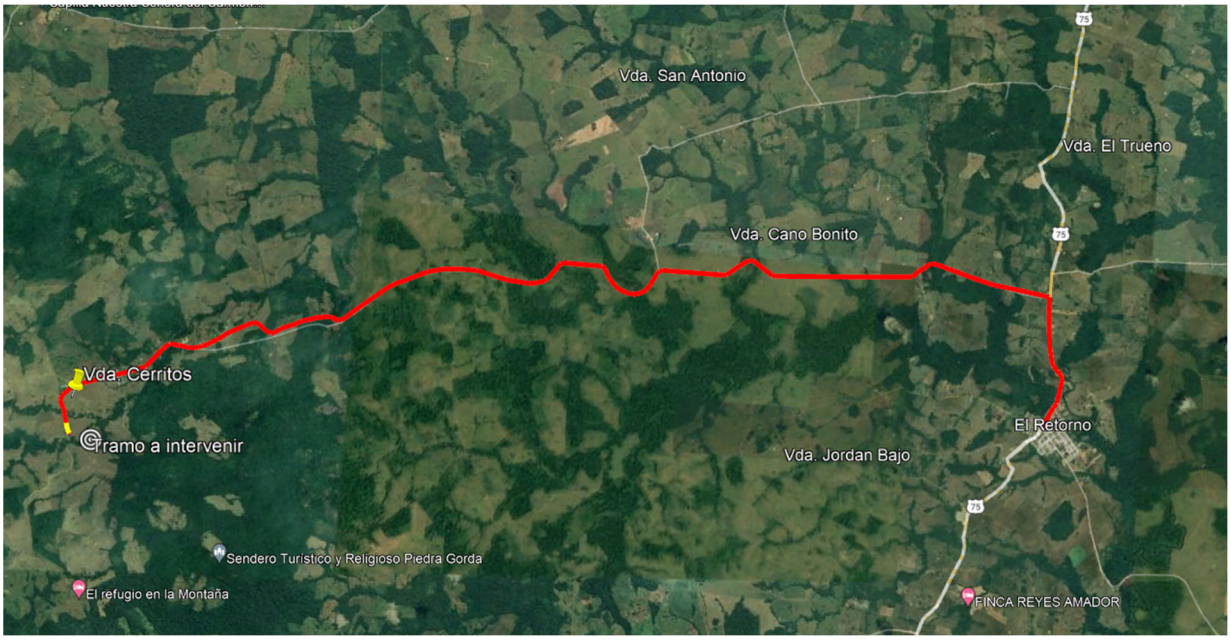


Ilustración 2. Zona de intervención Vereda Cerritos.

8.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 130 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada compactación y conformación de cunetas que permitan un correcto drenaje en la vía, esto ocasiona que en temporada de lluvias se genere erosión del material superficial y sea muy complicado su transitabilidad.



Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)

Tabla 6. Foto inicial del tramo a intervenir vereda Cerritos.

8.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje, desmonte y limpieza de zonas boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS (UND)
6,00	1,00	130,00	0,00

Tabla 7. Relación alcance físico del convenio JAC Cerritos.

Es menester aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

8.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

8.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	4143 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	30/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS
NIT:	901.282.150-4
VALOR INICIAL	$204.603.516,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$203.603.516,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 8. Información general del convenio JAC Cerritos.

8.2.2 Descripción de actividades.

En el periodo reportado se efectuó el trámite de prórroga No. 1 del convenio solidario con nueva fecha de terminación el 30 de abril de 2024. Adicionalmente, se inició revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de enero de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 156.265.803	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.265.803
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.687.975	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.687.975
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.649.738	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.649.738
TOTAL	**$ 203.603.516**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 203.603.516**

Tabla 9. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%.

8.2.3 Seguimiento Items No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

8.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado legal del convenio, revisión de pólizas y documentación inicial.

Finalmente, se tendrá comunicación continua con el presidente de la JAC con el fin de socializar el convenio solidario y presupuesto oficial, así mismo para adelantar temas de contratación del personal calificado.

8.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

8.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 1: Desde el 23 al 31 de enero de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

8.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de enero de 2024 no se realizó proceso de contratación y/o gestión de maquinaria y equipo de obra, debido a que el convenio se encuentra en trámites legales ante la entidad.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

8.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Para el periodo de enero de 2024 aún no se realizaba la vinculación del personal requerido para el convenio.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

8.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4143 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $203.603.516,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $203.246.689,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $356.827,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

8.3.5 Estado general del tiempo.

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

8.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Dado que, durante el periodo reportado no se realizaron actividades en obra, no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

8.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100037060 anexo No. 0 de fecha 01/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009844 anexo No. 0 de fecha 01/11/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 40.920.703,20	30/10/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.230.175,80	30/10/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 61.381.054,80	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 112.531.933,80**	**30/10/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	30/10/2023	31/12/2023

Tabla 10. Seguimiento garantías del convenio JAC Cerritos.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

8.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

8.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC no ha presentado la programación de obra.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante preacta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas comités de obra: Durante el presente periodo no se efectuaron Actas de Comité de obra con la JAC.

- Actas de Comité operativo: Durante el presente periodo no se efectuaron Actas de Comité operativo con la JAC.

9. CONVENIO SOLIDARIO No. 4240 DE 2023 JAC VEREDA EL RECREO.

9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

9.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O

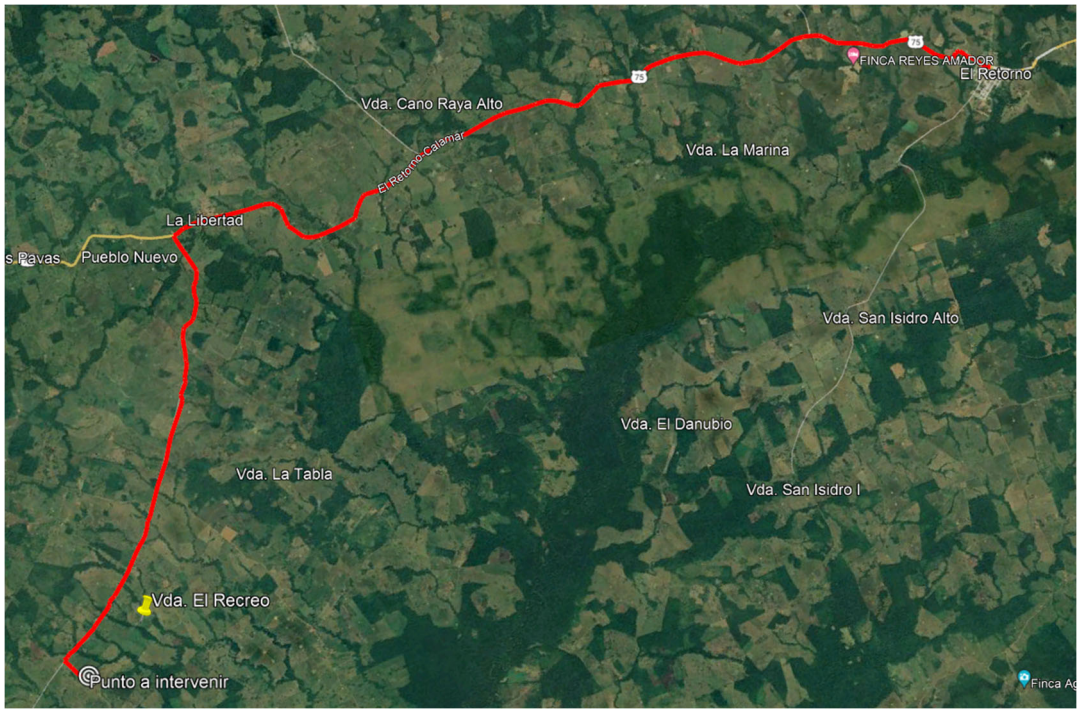


Ilustración 3. Zona de intervención Vereda El Recreo.

9.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

En el tramo a intervenir la vía se encuentra en mal estado, toda vez que carece de obras hidráulicas y tiene presencia de una laguna artificial con un gran volumen de agua que sobrepasa la rasante de la vía cada vez que se aumentan las precipitaciones, impidiendo la transitabilidad.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)

Tabla 11. Foto inicial del punto a intervenir vereda El Recreo.

9.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción obras de drenaje tipo Box Coulvert, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	BOX COULVERT (UND)
30,00	0,00	0,00	1,00

Tabla 12. Relación alcance físico del convenio JAC El Recreo.

Es menester aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

9.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

9.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	4240 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	03/11/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO
NIT:	901.199.499-4
VALOR INICIAL	$201.041.344,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$201.041.344,00
ORDEN DE INICIO	21/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	27/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	16/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO 1	20/01/2024
PRÓRROGA No. 1	16/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 13. Información general del convenio JAC El Recreo.

9.2.2 Descripción de actividades.

En el periodo reportado se realizó la reanudación del convenio solidario el día 16 de enero de 2024, misma fecha en la cual se efectuó el trámite de prórroga No. 1 con nueva fecha de terminación el 30 de abril de 2024. Adicionalmente, se inició revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de enero de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 152.820.763	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 152.820.763
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.584.623	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.584.623
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.635.958	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.635.958
TOTAL	**$ 200.041.344**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 200.041.344**

Tabla 14. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%.

9.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

9.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado legal del convenio, revisión de pólizas y documentación inicial.

Finalmente, se tendrá comunicación continua con el presidente de la JAC con el fin de socializar el convenio solidario y presupuesto oficial, así mismo para adelantar temas de contratación del personal calificado.

9.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

9.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 1: Desde el 23 al 31 de enero de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

9.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de enero de 2024 no se realizó proceso de contratación y/o gestión de maquinaria y equipo de obra, debido a que el convenio se encuentra en trámites legales ante la entidad.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

9.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Para el periodo de enero de 2024 aún no se realizaba la vinculación del personal requerido para el convenio.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

9.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4240 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $200.041.344,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $199.101.799,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $939.545,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

9.3.5 Estado general del tiempo.

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

9.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Dado que, durante el periodo reportado no se realizaron actividades en obra, no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

9.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100037316 anexo No. 0 de fecha 14/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009896 anexo No. 0 de fecha 14/11/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 40.208.268,80	31/10/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.052.067,20	31/10/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 60.312.403,20	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 110.572.739,20**	**29/09/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31/10/2023	31/12/2023

Tabla 15. Seguimiento garantías del convenio JAC El Recreo.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

9.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

9.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC no ha presentado la programación de obra.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante preacta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas comités de obra: Durante el presente periodo no se efectuaron Actas de Comité de obra con la JAC.

- Actas de Comité operativo: Durante el presente periodo no se efectuaron Actas de Comité operativo con la JAC.

10. CONVENIO SOLIDARIO No. 3752 DE 2023 JAC VEREDA SAN LUCAS.

10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

10.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O

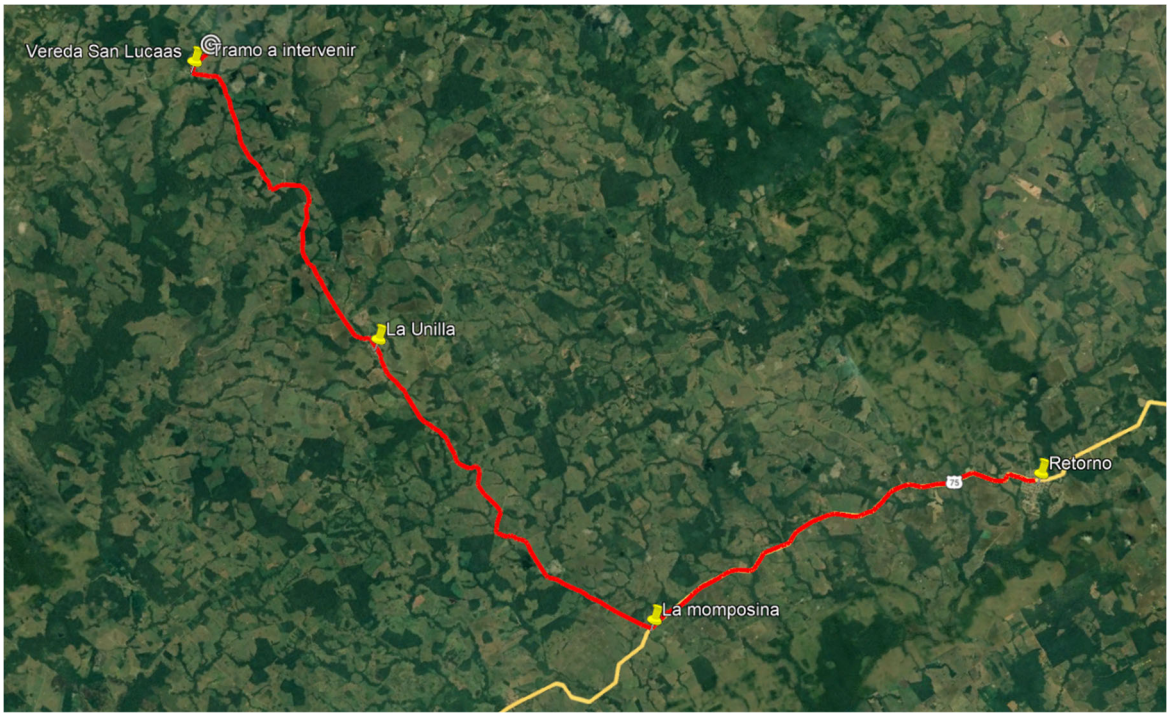


Ilustración 4. Zona de intervención Vereda San Lucas.

10.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 130 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada compactación y conformación de cunetas que permitan un correcto drenaje en la vía, esto ocasiona que en temporada de lluvias se genere erosión del material superficial y sea muy complicado su transitabilidad.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)

Tabla 16. Foto inicial del tramo a intervenir vereda San Lucas.

10.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje, desmonte y limpieza de zonas boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior y placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO	RUTINARIO	MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS (UND)
6,00	1,00	100,00	2,00

Tabla 17. Relación alcance físico del convenio JAC San Lucas.

Es menester aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

10.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

10.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	3752 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	05/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERÍO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCAS
NIT:	800.215.807-2
VALOR INICIAL	$217.314.958,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$216.314.958,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	18/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO 1	20/01/2024
PRÓRROGA No. 1	18/01/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 18. Información general del convenio JAC San Lucas.

10.2.2 Descripción de actividades.

En el periodo reportado se realizó la reanudación del convenio solidario el día 18 de enero de 2024, misma fecha en la cual se efectuó el trámite de prórroga No. 1 con nueva fecha de terminación el 30 de abril de 2024. Adicionalmente, se inició revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de enero de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 168.583.093	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.583.093
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 5.057.493	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.057.493
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.674.372	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.674.372
TOTAL	**$ 216.314.958**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 216.314.958**

Tabla 19. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%.

10.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

10.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado legal del convenio, revisión de pólizas y documentación inicial.

Finalmente, se tendrá comunicación continua con el presidente de la JAC con el fin de socializar el convenio solidario y presupuesto oficial, así mismo para adelantar temas de contratación del personal calificado.

10.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

10.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 1: Desde el 23 al 31 de enero de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

10.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de enero de 2024 no se realizó proceso de contratación y/o gestión de maquinaria y equipo de obra, debido a que el convenio se encuentra en trámites legales ante la entidad.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

10.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Para el periodo de enero de 2024 aún no se realizaba la vinculación del personal requerido para el convenio.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

10.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3752 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $216.314.958,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $215.714.594,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $600.364,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

10.3.5 Estado general del tiempo.

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

10.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Dado que, durante el periodo reportado no se realizaron actividades en obra, no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

10.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100036852 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009774 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 43.262.991,60	05/10/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.815.747,90	05/10/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 64.894.487,40	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 118.973.226,90**	**05/10/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	05/10/2023	31/12/2023

Tabla 20. Seguimiento garantías del convenio JAC San Lucas.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

10.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

10.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC no ha presentado la programación de obra.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el JAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante preacta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas comités de obra: Durante el presente periodo no se efectuaron Actas de Comité de obra con la JAC.

- Actas de Comité operativo: Durante el presente periodo no se efectuaron Actas de Comité operativo con la JAC.

11. CONVENIO SOLIDARIO No. 4222 DE 2023 JAC VEREDA SAN FRANCISCO II.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O

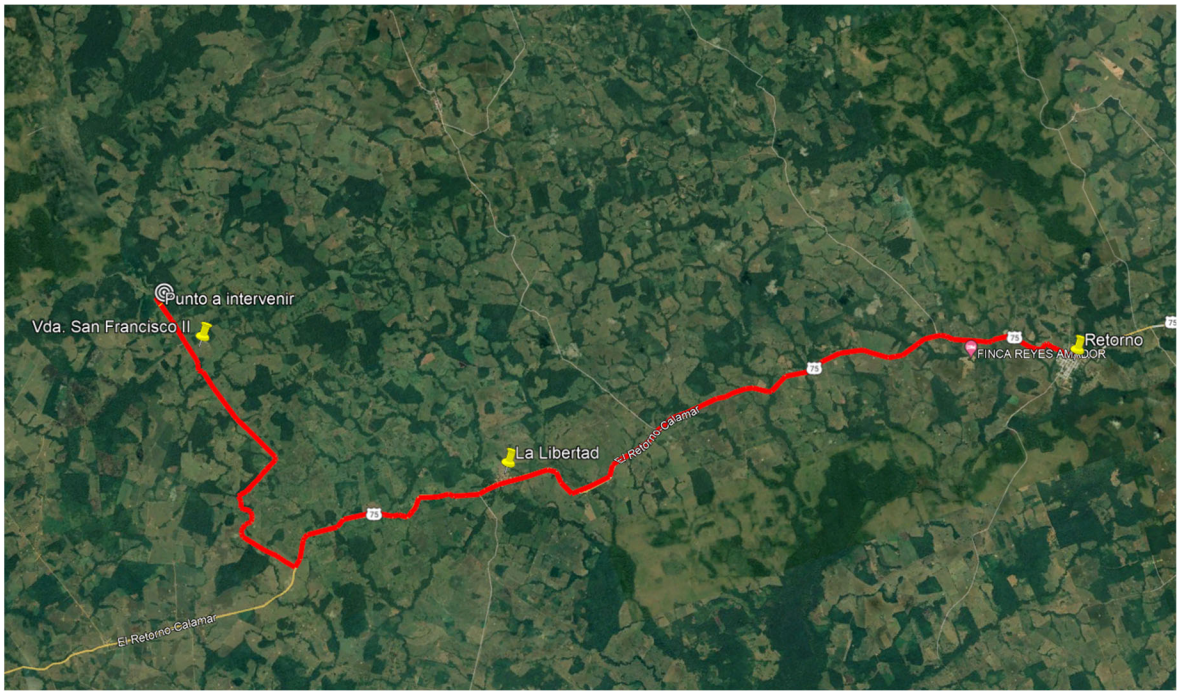


Ilustración 5. Zona de intervención Vereda San Francisco II.

1.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

En el tramo a intervenir es un terraplén con un solo carril que se encuentra en mal estado y la transitabilidad se ve afectada al presentarse precipitaciones, ya que aumenta el caudal del río que la bordea, además de tener puntos críticos y obras de paso de agua rusticas en muy mal estado.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)

Tabla 21. Foto inicial del punto a intervenir vereda San Francisco II.

1.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción obras de drenaje tipo Box Coulvert, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	BOX COULVERT (UND)
6,00	0,00	0,00	1,00

Tabla 22. Relación alcance físico del convenio JAC San Francisco II.

Es menester aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

1.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

1.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	4222 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	02/11/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO II
NIT:	901.107.641-0
VALOR INICIAL	$209.194.251,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$209.194.251,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 23. Información general del convenio JAC San Francisco II.

1.2.2 Descripción de actividades.

Se inició revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de enero de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 160.705.586	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.705.586
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.821.168	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.821.168
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.667.497	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.667.497
TOTAL	**$ 208.194.251**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 208.194.251**

Tabla 24. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%.

1.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

1.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado legal del convenio, revisión de pólizas y documentación inicial.

Finalmente, se tendrá comunicación continua con el presidente de la JAC con el fin de socializar el convenio solidario y presupuesto oficial, así mismo para adelantar temas de contratación del personal calificado.

1.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

1.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 1: Desde el 23 al 31 de enero de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

1.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de enero de 2024 no se realizó proceso de contratación y/o gestión de maquinaria y equipo de obra, debido a que el convenio se encuentra en trámites legales ante la entidad.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

1.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Para el periodo de enero de 2024 aún no se realizaba la vinculación del personal requerido para el convenio.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

1.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4222 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $208.194.251,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $208.006.342,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $187.909,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

1.3.5 Estado general del tiempo.

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

1.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Dado que, durante el periodo reportado no se realizaron actividades en obra, no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

1.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100037313 anexo No. 0 de fecha 14/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009895 anexo No. 0 de fecha 14/11/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 41.838.850,20	03/11/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.459.712,55	03/11/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 62.758.275,30	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 115.056.838,05**	**29/09/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	03/11/2023	31/12/2023

Tabla 25. Seguimiento garantías del convenio JAC San Francisco II.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

1.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

1.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC no ha presentado la programación de obra.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante preacta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas comités de obra: Durante el presente periodo no se efectuaron Actas de Comité de obra con la JAC.

- Actas de Comité operativo: Durante el presente periodo no se efectuaron Actas de Comité operativo con la JAC.

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-150-2023
FECHA DE PÚBLICACIÓN DEL PROCESO	25/10/2023
ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.SLCNTR.11850767
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5040 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/12/2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DEACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.
CONTRATISTA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA
NIT	891.101.100 – 5
VALOR INICIAL	$ 215.361.440,00
VALOR ADICIONAL	NA
VALOR TOTAL	$ 215.361.440,00
ORDEN DE INICIO	30/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	30/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	23/01/2024
PRÓRROGA No. 1	25/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 1	24/03/2024
PRÓRROGA No. 2	25/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
DIRECCIÓN	Calle 12 N. 5-07 Piso 3 Neiva, Huila.
NÚMERO DE TELÉFONO	3186081555
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO

Tabla 26. Información general del contrato de interventoría.

12.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

Las actividades ejecutadas por el interventor consistieron en iniciar la revisión de documentos contractuales de los 5 convenios, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

12.2 Informes especialistas y profesionales.

Durante el presente periodo no se generaron informes de especialistas y profesionales.

12.3 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

Durante el presente periodo no se presentó Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

3.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría.

Durante el presente periodo no se requirió Equipo y Vehículos para el desarrollo del contrato.

3.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

Durante el presente periodo no se generaron pagos de aportes de seguridad social del personal.

3.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría.

172623 del 28 de septiembre del 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $215.361.440,00 así:

POSICIÓN DE CATÁOLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	VALOR A AFECTAR
C-2402-0600-14-0-2402041-02	NACIÓN	10	$ 211.054.211
C-2402-0600-14-0-2402112-02	NACIÓN	10	$ 4.307.229

Tabla 27. Disponibilidad presupuestal contrato de interventoría.

Teniendo en cuenta que en el periodo anterior no hubo ejecución de obra, no se tienen actas de costos tramitadas anteriormente, por lo que el saldo del RP sigue siendo igual al inicialmente dado.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

3.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Contrato inicial: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 0 de fecha 28/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	22/12/2023	01/07/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	22/12/2023	01/07/2026
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	22/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$172.289.152,00**	**22/12/2023**	**31/12/2028**

Tabla 28. Garantías contrato de interventoría anexo 0.

- Contrato inicial: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 5 de fecha 26/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	30/12/2023	02/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	30/12/2023	02/10/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 29. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

3.5 Otros documentos seguimiento mensual.

De acuerdo con las indicaciones dadas por el supervisor, se presenta el plan de cargas con fecha de terminación el 25 de marzo de 2024, sin hacer ningún tipo de modificaciones.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

4. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES.

En cuanto a los proyectos con orden inicio y recursos desembolsados, la interventoría iniciará los trámites de firmas con las OAC ante las Entidades Bancarias respectivas.

Igualmente, esta interventoría está atenta a los trámites administrativos de los convenios que no cuenta con recursos con el fin de lograr una total ejecución en los cinco (5) convenios en el plazo y recurso asignado.

5. ANEXOS.

5.1 Relación Correspondencia.

Durante el periodo reportado no se generó ningún tipo de correspondencia.

5.2 Registro fotográfico.

Durante el periodo reportado no se generó registro fotográfico.

5.3 Formatos Interventorías Convenios Solidarios.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3613 DE 2023 JAC VEREDA CAÑO BONITO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/1/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 1 del 23-ene al 25-ene (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 70 m de Placa - Huella y una (1) obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 70 m de Placa - Huella y una (1) obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No. 3613 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 207,992,007.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 207,992,007.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207,992,007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207,992,007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207,992,007.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	70
*	ALCANTARILLA	Unidad	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de Anexo Técnico, Presupuesto de obra del presente convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 2 del 26-ene al 1-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 70 m de Placa - Huella y una (1) obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 70 m de Placa - Huella y una (1) obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No. 3613 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 207,992,007.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 207,992,007.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207,992,007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207,992,007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207,992,007.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10,768,072	5.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4,778,870.35	2.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,768,072.00	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA

PERIODO FACTURADO: NA

VALOR FACTURA: NA

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	70
*	ALCANTARILLA	Unidad	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de Anexo Técnico, Presupuesto de obra del presente convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 3613 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 208.992.007,00

VALOR ACUMULADO: $ 207.992.007,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.798.401,40	29	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.449.600,35	29	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.697.602,10	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036855

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009777 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/11/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

GABRIEL VELASQUEZ
Firma

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4143 DE 2023 JAC VEREDA CERRITOS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/1/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 1 del 23-ene al 25-ene (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 130 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Voragine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 130 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No. 4143 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 203,603,516.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 203,603,516.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203,603,516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203,603,516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203,603,516.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	130
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de Anexo Técnico, Presupuesto de obra del presente convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 2 del 26-ene al 1-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 130 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Voragine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 130 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No. 4143 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 203,603,516.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 203,603,516.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203,603,516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203,603,516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203,603,516.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10,768,072	5.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4,778,870.35	2.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,768,072.00	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	130
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de Anexo Técnico, Presupuesto de obra del presente convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 4143 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 204.603.516,00

VALOR ACUMULADO: $ 203.603.516,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.920.703,20	30	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.230.175,80	30	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 61.381.054,80	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037060

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	30	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009844 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/11/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4240 DE 2023 JAC VEREDA EL RECREO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/1/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 1 del 23-ene al 25-ene (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 2x2 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 2x2 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO		
CONVENIO No.	4240 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,041,344.00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,041,344.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215,361,440.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 215,361,440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/3/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,041,344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,041,344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,041,344.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 2X2 M	UNIDAD	1
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de Anexo Técnico, Presupuesto de obra del presente convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 2 del 26-ene al 1-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 2x2 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 2x2 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No. 4240 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200,041,344.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200,041,344.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,041,344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,041,344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,041,344.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10,768,072	5.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4,778,870.35	2.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,768,072.00	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 2X2 M	UNIDAD	1
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de Anexo Técnico, Presupuesto de obra del presente convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 4240 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 21/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.041.344,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.041.344,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.208.268,80	31	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.052.067,20	31	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.312.403,20	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037316

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31	10	2023	3	1	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009896 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0-4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/12/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3752 DE 2023 JAC VEREDA SAN LUCAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/1/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 1 del 23-ene al 25-ene (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No. 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216,314,958.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216,314,958.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216,314,958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216,314,958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216,314,958.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de Anexo Técnico, Presupuesto de obra del presente convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 2 del 26-ene al 1-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No. 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216,314,958.00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216,314,958.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216,314,958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216,314,958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216,314,958.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10,768,072	5.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4,778,870.35	2.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,768,072.00	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de Anexo Técnico, Presupuesto de obra del presente convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 3752 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCAS

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 217.314.958,00

VALOR ACUMULADO: $ 217.314.958,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 43.462.991,60	5	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.865.747,90	5	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 65.194.487,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036852

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009774 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4222 DE 2023 JAC VEREDA SAN FRANCISCO II.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/1/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 1 del 23-ene al 25-ene (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 208,194,251.00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 208,194,251.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208,194,251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208,194,251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208,194,251.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de Anexo Técnico, Presupuesto de obra del presente convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 2 del 26-ene al 1-feb Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 VALOR INICIAL: $ 208,194,251.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 208,194,251.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208,194,251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208,194,251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208,194,251.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10,768,072	5.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4,778,870.35	2.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,768,072.00	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de Anexo Técnico, Presupuesto de obra del presente convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 4222 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO II

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 209.194.251,00

VALOR ACUMULADO: $ 209.194.251,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.838.850,20	3	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.459.712,55	3	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.758.275,30	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037313

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009895 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/12/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 1/3/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

MES INFORME MENSUAL: enero-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". LOTE 2
OAC VEREDA CAÑO BONITO
OAC VEREDA CERRRITOS
OAC VEREDA EL RECREO
OAC VEREDA SAN LUCAS

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO No. 3613-2023, No. 4143-2023, No. 4240-2023, No. 3752-2023, No. 4222-2023

CONTRATISTA: OAC VEREDA SAN FRANCISCO II

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1448323	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 4,307,229.00	
		C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 211,054,211.00	
TOTAL						**$ 215,361,440.00**	**$ -**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 215,361,440**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	23/01/2024 al 31/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	172623 DEL 28/09/2023	$ 215,361,440	$ 215,361,440	N/A	ACTA No. 1. Cero Pesos ($0,00)
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL	$ -	$ -	$ -

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma:
Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-250038 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/3/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/3/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	21,536,144	22	12	2023	01	07	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	43,072,288	22	12	2023	01	07	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	43,072,288	22	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	64,608,432	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/3/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	21,536,144	30	12	2024	2	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	43,072,288	30	12	2024	2	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	43,072,288	30	12	2024	1	4	2027
Calidad del servicio	30%	64,608,432	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 1 AL 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: **PENDIENTE**

OBSERVACIONES:

Pendiente aprobación de la póliza de la prórroga N°1

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No. 25202 - 62095 CND

Firma

Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202 - 250038 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-0-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	24/01/2024 (Dia / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ No. (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 de 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA:
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3613-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO
CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 4240-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO
CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 4143-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CERRITOS
CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 4222-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO DOS
CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3752-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUCA
CONTRATO DE OBRA No.: — CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/23 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/23 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 215.361.440,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 215.361.440,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 24 DE ENERO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/01/24 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/24 (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha ____		AÑO				AÑO														TOTAL	
											ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (Hmes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
1	1	Director de Interventoria	$ 6.600.000,00		1,00	$ 6.600.000,00					0,12	$ 792.000,00	0,5	$ 3.300.000,00	0,38	$ 2.508.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 6.600.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.800.000,00		2,00	$ 9.600.000,00					0,24	$ 1.152.000,00	1	$ 4.800.000,00	0,76	$ 3.648.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 9.600.000,00
3	1	Profesional Social	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00					0,24	$ 840.000,00	1	$ 3.500.000,00	0,76	$ 2.660.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 7.000.000,00
4	1	Profesional Ambiental	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00					0,24	$ 840.000,00	1	$ 3.500.000,00	0,76	$ 2.660.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 7.000.000,00
		MONTO PARCIAL DE ESPECIALISTAS				$ 5.000.000,00																								
5	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000,00								0,1772	$ 1.010.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,17719	$ 1.010.000,00
6	1	Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00								0,14	$ 798.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,14	$ 798.000,00
7	1	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00								0,14	$ 798.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,14	$ 798.000,00
8	1	Especialista Ambiental	$ 5.700.000,00								0,14	$ 798.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,14	$ 798.000,00
9	1	Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 5.700.000,00								0,14	$ 798.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,14	$ 798.000,00
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00								0,14	$ 798.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,14	$ 798.000,00
		PERSONAL TÉCNICO																												
11	1	Inspector	$ 1.800.000,00		9,00	$ 16.200.000,00					0,96	$ 1.728.000	4,24	$ 7.632.000,00	3,8	$ 6.840.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	9	$ 16.200.000,00
14	1	Inspector SST	$ 1.900.000,00		4,00	$ 7.600.000,00					0,6	$ 1.140.000	2	$ 3.800.000,00	1,4	$ 2.660.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4	$ 7.600.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																												
15	1	Técnico administrativo	$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000,00					0,3	$ 390.000	1,00	$ 1.300.000,00	0,7	$ 910.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 2.600.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 61.600.000					$	11.882.000	$	27.832.000	$	21.886.000	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	61.600.000
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36		2,36		$ 2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 145.376.000					$	28.041.520,0	$	65.683.520,0	$	51.650.960,0	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	145.376.000

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO MES		MES		AÑO MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		TOTAL
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIÁTICOS																												
16	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 210.000,00	Dia	10,00	$ 2.100.000,00					5,00	$ 1.050.000	5,00	$ 1.050.000,00	0	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 2.100.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
17	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.000.000,00	Mes	2,00	$ 10.000.000,00					0,24	$ 1.200.000	1,00	$ 5.000.000,00	0,76	$ 3.800.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 10.000.000,00
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	13,00	$ 7.800.000,00					1,44	$ 864.000	6,24	$ 3.744.000,00	5,32	$ 3.192.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	13,00	$ 7.800.000,00
19	1	Trabajo de topografia (incluye personal equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	1,50	$ 9.000.000,00					0,24	$ 1.440.000	0,74	$ 4.440.000,00	0,52	$ 3.120.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,50	$ 9.000.000,00
20	1	Ensayos de laboratorios,	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.200.000,00					0,24	$ 144.000	1,00	$ 600.000,00	0,76	$ 456.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 1.200.000,00
21	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.600.000,00					0,24	$ 192.000	1,00	$ 800.000,00	0,76	$ 608.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 1.600.000,00
		OTROS COSTOS																												
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.400.000,00					0,24	$ 288.000	1	$ 1.200.000,00	0,76	$ 912.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 2.400.000,00
23	1	Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc.,	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00					0,24	$ 72.000	1	$ 300.000,00	0,76	$ 228.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 600.000,00
24	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00					0,24	$ 72.000	1	$ 300.000,00	0,76	$ 228.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 600.000,00
25	1	Veeduria Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 300.000,00					0,24	$ 36.000	1	$ 150.000,00	0,76	$ 114.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 300.000,00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																												
-		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) + (B)				$ 35.600.000				$ -	$	5.358.000	$	17.584.000	$	12.658.000	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	35.600.000
-		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)				$ 180.976.000				$ -	$	33.399.520	$	83.267.520	$	64.308.960	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	180.976.000
-		IVA = 19% * (C) = (D)				$ 34.385.440				$ -	$	6.345.909	$	15.820.829	$	12.216.702	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	34.385.440
-		COSTO TOTAL = (C) + (D)				$ 215.361.440				$ -	$	39.745.429	$	99.088.349	$	76.527.662	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	215.361.440

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS											$	39.745.429	$	135.833.778	$	215.361.440	$	215.361.440	$	215.361.440	$	215.361.440	$	215.361.440	$	215.361.440	$	215.361.440	$	215.361.440

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (Cuando aplicaron): Se debe indicar la modificación de la modalidad(es), suspensión, prórroga(s) y/o adición(es) del contrato (las cuales se marcan al momento de la solicitud, aprobación y modificación) y la fecha de suspensión.

DEBIDO A SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRTO DE INTERVENTORÍA, SE PROGRAMAN LOS RECURSOS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS: 3613-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNALVEREDA CAÑO BONITO - 4240-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO - 4143-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS - 4222-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO DOS - 3752-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: **Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal Representante legal o su Apoderado
Matrícula Profesional Interventor
Matrícula Profesional No.: 252024020S CND

Firma:
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 250038 CND
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
