INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
CONTRATO No. 5040 de 2023.

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DEACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.

CONTRATISTA: CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

INTERVENTOR:
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

SUPERVISOR:
ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI.

JUNIO 2024.

TABLA DE CONTENIDO.

1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CAÑO BONITO. 1
2. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CERRITOS. 3
3. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - EL RECREO. 5
4. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN LUCAS. 7
5. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN FRANCISCO II. 9
6. INTRODUCCIÓN. 11
7. CONVENIO SOLIDARIO No. 3613 DE 2023 JAC VEREDA CAÑO BONITO. 12

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 12

7.1.1 Localización del proyecto. 12

7.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 13

7.1.3 Características técnicas del convenio. 14

7.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 14

7.2.1 Información General del Convenio. 14

7.2.2 Descripción de actividades. 15

7.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 15

7.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 16

7.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 16

7.3.1 Informe semanal. 16

7.3.2 Maquinaria y Equipo. 16

7.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 16

7.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 17

7.3.5 Estado general del tiempo. 17

7.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 18

7.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 18

7.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 19

7.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 19

8. CONVENIO SOLIDARIO No. 4143 DE 2023 JAC VEREDA CERRITOS. 20
8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 20
8.1.1 Localización del proyecto. 20
8.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 21
8.1.3 Características técnicas del convenio. 21
8.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 22
8.2.1 Información General del Convenio. 22
8.2.2 Descripción de actividades. 22
8.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 23
8.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 23
8.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 24
8.3.1 Informe semanal. 24
8.3.2 Maquinaria y Equipo. 24
8.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 24
8.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 25
8.3.5 Estado general del tiempo. 26
8.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 26
8.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 26
8.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 27
8.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 27
9. CONVENIO SOLIDARIO No. 4240 DE 2023 JAC VEREDA EL RECREO. 29
9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 29
9.1.1 Localización del proyecto. 29
9.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 30
9.1.3 Características técnicas del convenio. 31
9.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 31
9.2.1 Información General del Convenio. 31
9.2.2 Descripción de actividades. 32

9.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 32
9.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 33
9.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 33
9.3.1 Informe semanal. 33
9.3.2 Maquinaria y Equipo. 33
9.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 34
9.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 34
9.3.5 Estado general del tiempo. 35
9.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 35
9.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 35
9.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 36
9.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 36
10. CONVENIO SOLIDARIO No. 3752 DE 2023 JAC VEREDA SAN LUCAS. 38
10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 38
10.1.1 Localización del proyecto. 38
10.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 39
10.1.3 Características técnicas del convenio. 40
10.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 40
10.2.1 Información General del Convenio. 40
10.2.2 Descripción de actividades. 41
10.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 41
10.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 41
10.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 42
10.3.1 Informe semanal. 42
10.3.2 Maquinaria y Equipo. 42
10.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 42
10.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 43

10.3.5 Estado general del tiempo. 43

10.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 43

10.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 44

10.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 44

10.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 44

11. CONVENIO SOLIDARIO No. 4222 DE 2023 JAC VEREDA SAN FRANCISCO II. 46

11.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 46

11.1.1 Localización del proyecto. 46

11.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 47

11.1.3 Características técnicas del convenio. 48

11.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 48

11.2.1 Información General del Convenio. 48

11.2.2 Descripción de actividades. 49

11.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 50

11.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 50

11.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 50

11.3.1 Informe semanal. 50

11.3.2 Maquinaria y Equipo. 51

11.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 51

11.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 51

11.3.5 Estado general del tiempo. 52

11.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 52

11.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 52

11.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 53

11.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 53

12. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 54

12.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 55

12.1.1 Actividades Generales y de Administración. 55

12.1.2 Actividades Técnicas. 55

12.1.3 Actividades financieras. 56

12.1.4 Actividades Ambientales. 56

12.2 Informes especialistas y profesionales. 56

12.3 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría. 57

13. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 57

13.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría. 57

13.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. 57

13.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría. 58

13.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría. 58

13.5 Otros documentos seguimiento mensual. 60

14. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES. 60

15. ANEXOS. 61

15.1 Relación Correspondencia. 61

15.2 Documentos de seguimiento. 61

15.3 Registro fotográfico. 61

15.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios. 63

LISTA DE ILUSTRACIONES.

Ilustración 1. Zona de intervención Vereda Caño Bonito. 13
Ilustración 2. Zona de intervención Vereda Cerritos. 21
Ilustración 3. Zona de intervención Vereda El Recreo. 30
Ilustración 4. Zona de intervención Vereda San Lucas. 39
Ilustración 5. Zona de intervención Vereda San Francisco II. 47

LISTA DE TABLAS.

Tabla 1. Fotos iniciales del tramo a intervenir vereda Caño Bonito. 13
Tabla 2. Relación alcance físico del convenio JAC Caño Bonito. 14
Tabla 3. Información general del convenio JAC Caño Bonito. 14
Tabla 4. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 15
Tabla 5. Relación profesionales aprobados. 17
Tabla 6. Seguimiento garantías del convenio JAC Caño Bonito. 18
Tabla 7. Relación de comités realizadas en el periodo reportado. **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 8. Foto inicial del tramo a intervenir vereda Cerritos. 21
Tabla 9. Relación alcance físico del convenio JAC Cerritos. 22
Tabla 10. Información general del convenio JAC Cerritos. 22
Tabla 11. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 23
Tabla 12. Relación profesionales aprobados. 25
Tabla 13. Seguimiento garantías del convenio JAC Cerritos. 27
Tabla 14. Relación de comités realizados en el periodo reportado. ... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 15. Foto inicial del punto a intervenir vereda El Recreo. 30
Tabla 16. Relación alcance físico del convenio JAC El Recreo. 31
Tabla 17. Información general del convenio JAC El Recreo. 31
Tabla 18. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 32
Tabla 19. Relación profesionales aprobados. 34
Tabla 20. Seguimiento garantías del convenio JAC El Recreo. 36
Tabla 21. Relación de comités realizados en el periodo reportado. 37
Tabla 22. Foto inicial del tramo a intervenir vereda San Lucas. 39
Tabla 23. Relación alcance físico del convenio JAC San Lucas. 40
Tabla 24. Información general del convenio JAC San Lucas. 40
Tabla 25. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 41
Tabla 26. Relación profesionales aprobados. 42

Tabla 27. Seguimiento garantías del convenio JAC San Lucas. 44
Tabla 29. Foto inicial del punto a intervenir vereda San Francisco II. 47
Tabla 30. Relación alcance físico del convenio JAC San Francisco II. 48
Tabla 31. Información general del convenio JAC San Francisco II. 48
Tabla 32. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 50
Tabla 33. Relación profesionales aprobados. 51
Tabla 34. Seguimiento garantías del convenio JAC San Francisco II. 52
Tabla 35. Relación de comités realizados en el periodo reportado. 54
Tabla 36. Información general del contrato de interventoría. 54
Tabla 37. Relación personal de interventoría. 57
Tabla 38. Disponibilidad presupuestal contrato de interventoría. 58
Tabla 39. Garantías contrato de interventoría anexo 0. 58
Tabla 40. Garantías contrato de interventoría anexo 5. 59
Tabla 41. Relación de correspondencia. 61
Tabla 42. Registro fotográfico. 63

1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CAÑO BONITO.

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** JUNIO 2024

CONVENIO No.: 3613 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 1:	30/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 2:	30/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/07/2024
PLAZO ACUMULADO:	15/07/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 207.992.007,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 207.992.007,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, LONGITUD APROXIMADA: 116,20 M	Conformación De La Calzada Existente	M2	697,20
	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	133,10
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	75,00
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	44,70
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3247,60
	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	4,60
	ITEMS NO PREVISTOS		
	Relleno Con material Seleccionado De La Región	M3	52,60
	Transporte de Maquinaria San José - Caño bonito	UND	2,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Conformación De La Calzada Existente	M2	0,00	697,20
Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	0,00	133,10
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	10,45	75,00
Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	0,00	44,70
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	452,60	3247,60
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0,00	4,60
ITEMS NO PREVISTOS			
Relleno Con material Seleccionado De La Región	M3	52,60	52,60
Transporte de Maquinaria San José - Caño bonito	UND	0,00	2,00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 157.148.903,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.714.468,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.128.636,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 207.992.007,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ 22.731.435,00	$ 135.966.968,33
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 192.500,00	$ 18.544.873,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 22.923.935,00**	**$ 154.511.841,33**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 207.992.007,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 154.511.841,33
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	74,29%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella



Placa huella



Placa huella

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CERRITOS.

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** JUNIO 2024

CONVENIO No.: 4143 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	30/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	23/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/07/2024
PLAZO ACUMULADO:	15/07/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$	203.603.516,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$	-
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$	203.603.516,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, LONGITUD APROXIMADA: 119,20 M	Conformación De La Calzada Existente	M2	596,00
	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	115,60
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	73,40
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	26,90
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3157,80
	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	3,90
	ITEMS NO PREVISTOS		
	Relleno Con material Seleccionado De La Región	M3	36,0
	Transporte de Maquinaria San José - Caño bonito	UND	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Conformación De La Calzada Existente	M2	0,00	596,00
Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	0,00	115,60
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	73,40	73,40
Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	13,36	26,90
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3157,80	3157,80
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0,00	3,90
ITEMS NO PREVISTOS			
Relleno Con material Seleccionado De La Región	M3	0,00	0,00
Transporte de Maquinaria San José - Caño bonito	UND	0,00	1,00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	
BÁSICO DE OBRA	$	156.265.803,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$	4.687.975,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$	42.649.738,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$**	**203.603.516,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO		ACUMULADO	
BÁSICO DE OBRA	$	29.700.753,00	$	116.247.753,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$	3.848.416,00	$	16.974.046,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$**	**33.549.169,00**	**$**	**133.221.799,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	203.603.516,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	133.221.799,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		65,43%


EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella



Placa huella



Placa huella

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - EL RECREO.

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** JUNIO 2024

CONVENIO No.: 4240 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	16/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA 1:	16/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA 2:	30/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/07/2024
PLAZO ACUMULADO:	15/07/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.041.344,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.041.344,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE (3) BOX COULVERT (1X1)	Excavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y Retiro	M3	143,50
	Excavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye Cargue Y Retiro	M3	6,90
	Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye Explote Y Cargue	M3	131,70
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	22,70
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	6,10
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3021,40
	Figurado E Instalacion De Aceros	M3	3021,40
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX COULVERT (1.5X1.5)	Excavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y Retiro	M3	85,00
	Excavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye Cargue Y Retiro	M3	2,90
	Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye Explote Y Cargue	M3	49,70
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	15,40
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	3,20
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1602,60
	Figurado E Instalacion De Aceros	M3	1602,60

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Excavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y Retiro	M3	95,50	143,50
Excavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye Cargue Y Retiro	M3	4,60	6,90
Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye Explote Y Cargue	M3	43,90	43,90
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	17,70	17,70
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	4,07	6,10
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2014,27	3021,40
Figurado E Instalacion De Aceros	M3	2014,27	3021,40
Excavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y Retiro	M3	0,00	85,00
Excavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye Cargue Y Retiro	M3	0,00	2,90
Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye Explote Y Cargue	M3	34,70	34,70
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	15,40	15,40
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0,00	3,20
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0,00	1602,60
Figurado E Instalacion De Aceros	M3	0,00	1602,60

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 152.820.763,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.584.623,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.635.958,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 200.041.344,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ 68.813.450,00	$ 148.331.310,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 8.766.000,00	$ 20.329.746,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 77.579.450,00**	**$ 168.661.056,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 154.031.834,88
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 168.661.056,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	84,31%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Box culvert 2(1x1)



Box culvert 3(1x1)



Box culvert 4(1.5x1.5)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN LUCAS.

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** JUNIO 2024

CONVENIO No.: 3752 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	18/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA 1:	18/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA 2:	30/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/07/2024
PLAZO ACUMULADO:	30/07/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 216.314.958,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 216.314.958,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	6,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	1,00
CONSTRUCCIÓN DE (2) ALCANTARILLA	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	92,90
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	16,40
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	50,90
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	19,10
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0,90
	Tuberia De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diametro Interior	M	12,00
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157,80
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	13,00
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, LONGITUD APROXIMADA: 100,00 M	Conformación De La Calzada Existente	M2	420,00
	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	69,70
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	42,60
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	28,30
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2004,10
	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	2,90
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	19,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	ANTIDAD ACUMULA
Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	0	0
Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Tuberia De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diametro Interior	M	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Conformación De La Calzada Existente	M2	0	0
Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 168.583.093,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 5.057.493,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.674.372,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 216.314.958,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ 8.436.659,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ -**	**$ 8.436.659,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.084.042,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	3,74%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2	Foto 3

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

5. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN FRANCISCO II.

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** JUNIO 2024

CONVENIO No.: 4222 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO II

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 1:	30/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 2:	30/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/07/2024
PLAZO ACUMULADO:	15/07/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 208.194.251,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 208.194.251,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	10,20
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	1,80
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	13,60
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	17,80
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	1,10
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1786,02
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	158,50
CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	10,20
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	1,80
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	16,00
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	29,60
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	2,90
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2582,60
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	337,60

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 160.705.586,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.821.168,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.667.497,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 208.194.251,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.661.761,00	$ 4.661.761,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 4.661.761,00**	**$ 4.661.761,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 4.661.761,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 2,24%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2	Foto 3

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

6. INTRODUCCIÓN.

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS suscribió convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal del departamento del Guaviare, bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Para lo cual, en el municipio de El Retorno las JAC Caño Bonito, Cerritos, El Recreo, San Lucas y San Francisco II, suscribieron los convenios solidarios No. 3613, 4143, 4240, 3752, 4222 de 2023, respectivamente.

Dado lo anterior, el INVIAS mediante proceso CMA-DEO-SVR-150-2023 efectuó el contrato No. 5040 de 2023 con orden de inicio 2023S-VBOG-033951 para realizar la interventoría a los convenios solidarios anteriormente mencionados, con el objeto "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2".

Para lo anterior, el INVIAS designó como supervisor del contrato de interventoría al ingeniero Carlos German Corzo Upegui.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El presente informe parcial contempla las actividades realizadas en cada uno de los convenios en el periodo entre el 01 de abril de 2024 hasta el 30 de abril de 2024.

7. CONVENIO SOLIDARIO No. 3613 DE 2023 JAC VEREDA CAÑO BONITO.

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

7.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas - 72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O

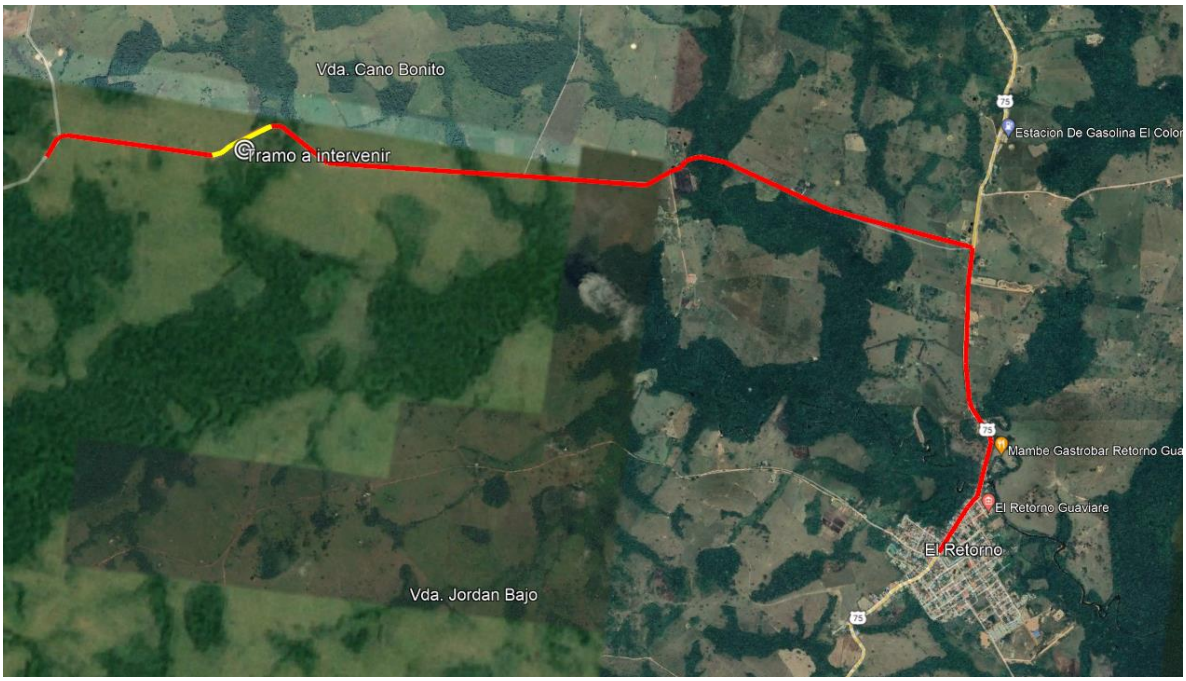


Ilustración 1. Zona de intervención Vereda Caño Bonito.

7.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 100 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada compactación y conformación de cunetas que permitan un correcto drenaje en la vía, esto ocasiona que en temporada de lluvias se genere erosión del material superficial y sea muy complicado su transitabilidad.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)

Tabla 1. Fotos iniciales del tramo a intervenir vereda Caño Bonito.

7.1.3 Características técnicas del convenio.

Según las especificaciones iniciales las actividades contempladas consistían en realizar limpieza de obras menores de drenaje, además de actividades de mejoramiento que contemplaban la construcción de obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior y placa huella.

Una vez definidas las necesidades reales en campo y realizadas las actividades preliminares como lo son el levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño geométrico y la actualización de precios de materiales y servicios se obtuvo como meta física del convenio lo siguiente:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS (UND)
0,00	0,00	116,20	0,00

Tabla 2. Relación alcance físico del convenio JAC Caño Bonito.

7.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

7.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	3613 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	29/09/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO
NIT:	901.010.660-2
VALOR INICIAL	$207.992.007,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$208.992.007,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2023
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	15/07/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 3. Información general del convenio JAC Caño Bonito.

7.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe, Se inició obra y se desarrollaron las siguientes actividades:

- Instalación de acero de refuerzo Fy 4200Mpa.
- Se realizó el mezclado y vaciado de concreto reforzado de resistencia de 21Mpa (para vigas, cuentas, huellas y bordillos).
- Se realizaron las placas de transición con concreto reforzado de resistencia de 21Mpa.
- Aplicación de Relleno con material seleccionado de la región.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de junio de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 157.148.903	N/A	$ 22.731.435,00	$ 135.966.968,33	$ 21.181.935
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.714.468	N/A	$ 0	$ 0	$ 4.714.468
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.128.636	N/A	$ 192.500,00	$ 18.544.873,00	$ 27.583.763
TOTAL	**$207.992.007**	**N/A**	**$ 22.923.935,00**	**$ 154.511.841,33**	**$ 53.480.165,67**

Tabla 4. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

El porcentaje de avance ejecutado de obra en el periodo reportado corresponde a 98,69%, por otro lado, de acuerdo con la tabla 4 el porcentaje de ejecución presupuestal corresponde al 74.29%.

7.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

Para este periodo no se presentaron modificaciones para el proyecto, por lo cual no se tiene la creación de nuevos ítems no previstos.

7.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

A fecha del presente informe la obra se encuentra al 100% de ejecución (116,20 metros lineales de placa huella). Se encuentra pendiente que la JAC soporte los costos en referencia del PAGA.
Se ha venido ejecutando la obra de buena manera, cumpliendo eficiente y técnicamente con las actividades y programación de obra.

7.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

7.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 20: Desde el 31 de mayo al 06 de junio de 2024.
- Semana 21: Desde el 07 al 13 de junio de 2024.
- Semana 22: Desde el 14 al 20 de junio de 2024.
- Semana 23: Desde el 21 al 27 de junio de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

7.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de junio se contrató el servicio de máquinas y equipos, como lo fueron mezcladora, vibrador de concretos, rana compactadora, planta eléctrica, motobomba y bomba manual. Además del servicio de maquinaria amarilla, como lo fue Retroexcavadora, para realizar las actividades de Relleno con material seleccionado de la región.

Se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

7.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

A continuación, se relaciona el personal contratado a fecha del presente informe;

No.	NOMBRE	CARGO	APROBACIÓN	VINCULACIÓN
1	CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ DOMINGUEZ	Residente de obra	01/03/2024	Prestación de servicios
2	LUZ DARY SANTAMARIA VARGAS	Contadora	01/03/2024	Prestación de servicios
3	FLORIBERTO RIOS	Maestro	06/05/2024	Nómina
4	JUAN LUIS DIAZ	Ayudante	06/05/2024	Nómina
5	JULIO CESAR AYALA	Ayudante	06/05/2024	Nómina
6	OSCAR CUBIDES	Ayudante	06/05/2024	Nómina
7	YAMIT ALFREDO HERRERA	Ayudante	06/05/2024	Nómina
8	LEIMAR ESTEBAN	Ayudante	06/05/2024	Nómina

Tabla 5. Relación profesionales aprobados.

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

7.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3613 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 30 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $ 207.992.007.00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $207.413.317,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $578.690,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".
Se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".
Se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

7.3.5 Estado general del tiempo.

Se realizó el registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

7.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Durante el periodo reportado, se realizaron actividades en obra, una de ellas la elaboración y vaciado de concretos (ciclópeo de 14Mpa y reforzado de 21Mpa) se realizaron toma de muestras de concretos en cilindros.
Se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

7.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100036855 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009777 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023.
- Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. CV-100036855 anexo No. 1-3 de fecha 18/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009777 anexo No. 1-2 de fecha 16/01/2024.

- Prórroga No. 2: Póliza de cumplimiento No. CV-100036855 anexo No. 4 de fecha 08/06/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009777 anexo No. 3 de fecha 08/06/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 41.798.401,40	29/09/2023	15/07/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.449.600,35	15/07/2025	15/07/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 62.697.602,10	31/12/2023	15/07/2029
TOTAL		**$ 114.945.603,85**	**29/09/2023**	**15/07/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	29/09/2023	23/07/2024

Tabla 6. Seguimiento garantías del convenio JAC Caño Bonito.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

7.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

7.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC ejecuto todas las actividades o ítems de obra de acuerdo con la programación de obra. Lo cual la obra se terminó en el tiempo previsto.
- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-acta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado. Se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".
- Actas de Comité de obra y operativo: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
11/06/2024	Comité operativo No. 6	Solicitud de orden de pago para aprobación de: Transporte de material, nómina y liquidación del personal de obra, compara de agregados pétreos, papelería y alimentación del personal de obra.

Se anexan las actas de comités operativos mencionadas.

8. CONVENIO SOLIDARIO No. 4143 DE 2023 JAC VEREDA CERRITOS.

8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

8.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O

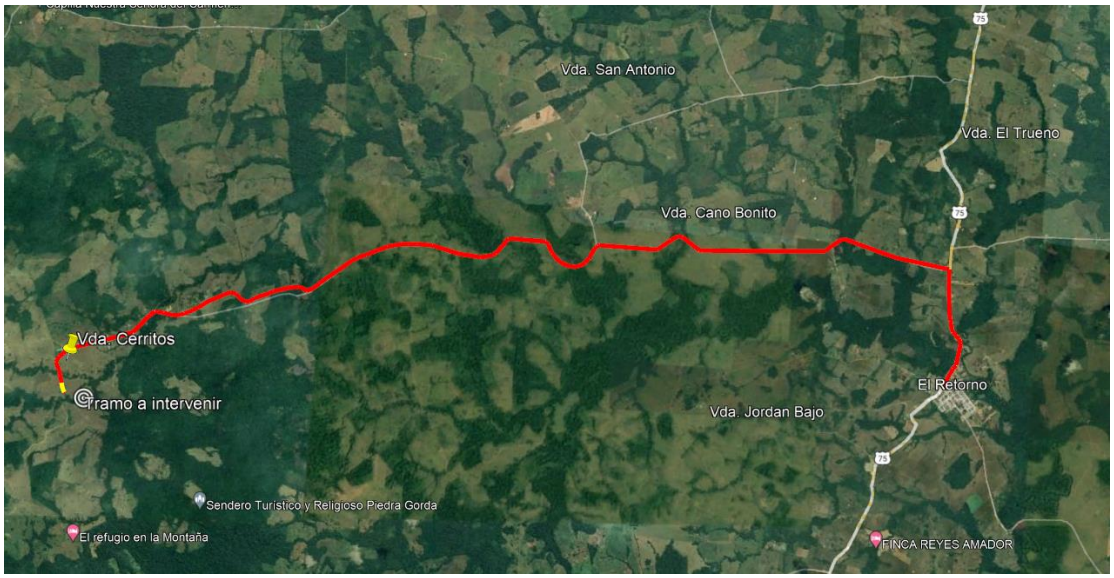


Ilustración 2. Zona de intervención Vereda Cerritos.

8.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 130 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada compactación y conformación de cunetas que permitan un correcto drenaje en la vía, esto ocasiona que en temporada de lluvias se genere erosión del material superficial y sea muy complicado su transitabilidad.


Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)

Tabla 7. Foto inicial del tramo a intervenir vereda Cerritos.

8.1.3 Características técnicas del convenio.

Según las especificaciones iniciales las actividades contempladas consistían en realizar limpieza de obras menores de drenaje, desmonte y limpieza de zonas boscosas, además de actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella

Una vez definidas las necesidades reales en campo y realizadas las actividades preliminares como lo son el levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño geométrico y la actualización de precios de materiales y servicios se obtuvo como meta física del convenio lo siguiente:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS (UND)
0,00	0,00	119,20	0,00

Tabla 8. Relación alcance físico del convenio JAC Cerritos.

8.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

8.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	4143 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	30/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS
NIT:	901.282.150-4
VALOR INICIAL	$204.603.516,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$204.603.516,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2023
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15/07/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 9. Información general del convenio JAC Cerritos.

8.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

- Se realizó el mezclado y vaciado de la totalidad de concreto ciclópeo de resistencia de 14Mpa.
- Armado de acero de refuerzo Fy 4200Mpa para huellas y bordillos.
- Se realizó el mezclado y vaciado de concreto reforzado de resistencia de 21Mpa, alcanzando 199,20m de placa huella construida con bordillos y cuentas.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de junio de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 156.265.803	N/A	$29.700.753,00	$116.247.753,00	$ 40.901.150
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.687.975	N/A	$ 0	$ 0	$ 4.714.468
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.649.738	N/A	$ 3.848.416,00	$16.974.046,00	$ 29.154.590
TOTAL	**$ 203.603.516**	**N/A**	**$ 33.549.169,00**	**$133.221.799,00**	**$74.770.208,00**

Tabla 10. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado de obra en el periodo reportado corresponde a 96%. Por otro lado, de acuerdo con la tabla 10 el avance presupuestal a la fecha es del 65,43%.

8.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

Para este periodo no se presentaron modificaciones para el proyecto, por lo cual no se tiene la creación de nuevos ítems no previstos.

8.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

A fecha del presente informe la obra se encuentra al 96% de ejecución (119,20 metros lineales de placa huella). Se encuentra pendiente realizar la actividad de relleno con material seleccionado de la región, debido que

existe un puente en madera, el cual se encuentra en mal estado lo cual impide el paso de vehículos pesados, debido a esto, no ha sido posible que el relleno con material seleccionado de la región llegue a obra y se pueda realizar esta esta actividad. Además también se tiene pendiente que la JAC soporte los costos en referencia al PAGA. Por lo cual se concluye que se ha ejecutado la obra cumpliendo eficiente y técnicamente con las actividades y programación de obra.

8.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

8.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 20: Desde el 31 de mayo al 06 de junio de 2024.
- Semana 21: Desde el 07 al 13 de junio de 2024.
- Semana 22: Desde el 14 al 20 de junio de 2024.
- Semana 23: Desde el 21 al 27 de junio de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

8.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de junio se contrató el servicio de máquinas y equipos, como lo fueron mezcladora, vibrador de concretos, rana compactadora, planta eléctrica, motobomba y bomba

Se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

8.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

A continuación, se relaciona el personal contratado a la fecha del presente informe;

No.	NOMBRE	CARGO	APROBACIÓN	VINCULACIÓN
1	HUGO ANTONIO URREGO	Residente de obra	27/02/2024	Prestación de servicios

2	JINETH MORENO PERDOMO	Contadora	27/02/2024	Prestación de servicios
3	FLORIBERTO RIOS ROMERO	Maestro	10/05/2024	Nomina
4	ESNEYDER ADRIAN RAMIREZ CARRILLO	Ayudante	10/05/2024	Nomina
5	WILSON JOSE VILLALBA BLANCO	Ayudante	10/05/2024	Nomina
6	CENAIDA URREGO MARTINEZ	Ayudante	10/05/2024	Nomina
7	VIVIANA MARCELA SANCHEZ URREGO	Ayudante	10/05/2024	Nomina
8	FREDY ALEXANDER VACCA MONDRAGON	Ayudante	10/05/2024	Nomina
9	ENALDO DE JESUS DIAZ GUTIERREZ	Ayudante	10/05/2024	Nomina
10	HEILER JOHAN PIÑEROS URREGO	Ayudante	10/05/2024	Nomina
11	DUVAN ANDRES RIVERA BERNAL	Ayudante	10/05/2024	Nomina
12	ESTEBAN ANDRES RIVERA BERNAL	Ayudante	10/05/2024	Nomina

Tabla11. Relación profesionales aprobados.

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

8.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4143 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $203.603.516,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $203.246.689,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $356.827,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

Se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

Se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

8.3.5 Estado general del tiempo.

Se realizó el registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.
Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

8.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Durante el periodo reportado, se realizaron actividades en obra, una de ellas la elaboración y vaciado de concretos (ciclópeo de 14Mpa y reforzado de 21Mpa) se realizaron toma de muestras de concretos en cilindros.

Se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

8.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100037060 anexo No. 0 de fecha 01/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009844 anexo No. 0 de fecha 01/11/2023.
- Prórroga 1: Póliza de cumplimiento No. CV-100037060 anexo No. 1-3 de fecha 18/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009844 anexo No. 1-2 de fecha 17/07/2024.
- Prórroga 2: Póliza de cumplimiento No. CV-100037060 anexo No. 4 de fecha 02/06/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009844 anexo No. 3 de fecha 3/06/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 40.920.703,20	30/10/2023	15/07/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.230.175,80	30/10/2023	15/07/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 61.381.054,80	31/12/2023	15/07/2029
TOTAL		**$ 112.531.933,80**	**30/10/2023**	15/07/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	30/10/2023	15/07/2024

Tabla 12. Seguimiento garantías del convenio JAC Cerritos.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

8.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

8.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A fecha del presente informe la obra se encuentra en el 96% de ejecución, si bien es cierto en programación de obra, para esta fecha debería estar en su 100% ejecutada la obra. Pero es importante aclarar que no ha sido posible realizar el relleno con material seleccionado de la región, debido al mal estado de un puente en madera, que imposibilita el paso de vehículos pesados, por lo cual a la fecha no se ha podido llevar el material de relleno al punto de la obra. Se espera en los próximos días, se pueda solucionar dicho percance y dar fin a la obra.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante preacta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de Comité de obra y operativo: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
06/06/2024	Comité operativo No. 7	Solicitud de orden de pago para aprobación de: nómina de obra, seguridad social, materiales de ferretería, honorarios residente de obra, alimentación de trabajadores y retenciones.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

9. CONVENIO SOLIDARIO No. 4240 DE 2023 JAC VEREDA EL RECREO.

9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

9.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O

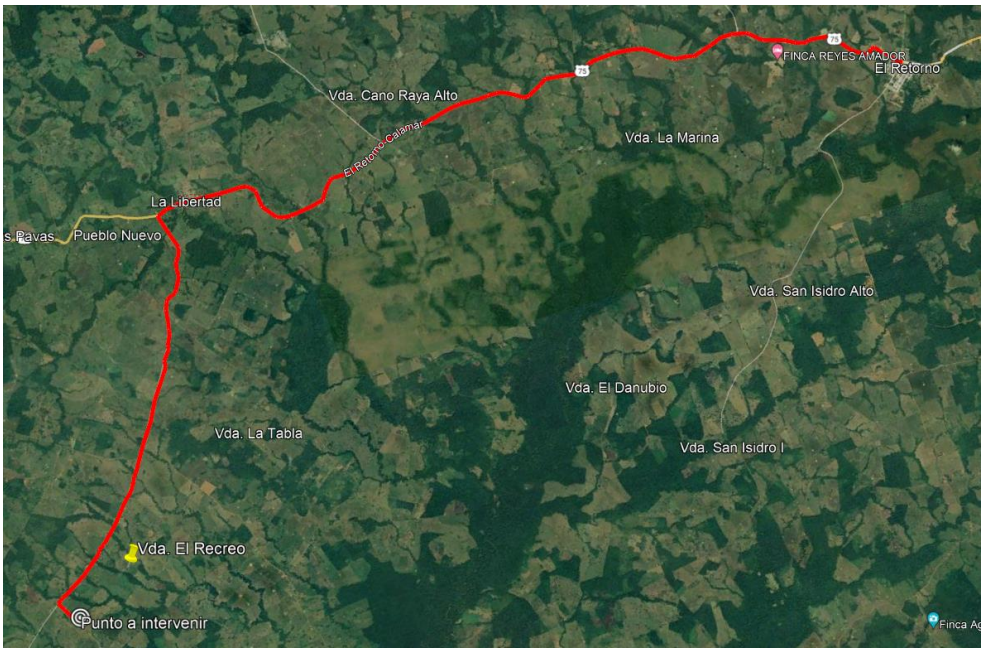


Ilustración 3. Zona de intervención Vereda El Recreo.

9.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

En el tramo a intervenir la vía se encuentra en mal estado, toda vez que carece de obras hidráulicas y tiene presencia de una laguna artificial con un gran volumen de agua que sobrepasa la rasante de la vía cada vez que se aumentan las precipitaciones, impidiendo la transitabilidad.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)

Tabla 13. Foto inicial del punto a intervenir vereda El Recreo.

9.1.3 Características técnicas del convenio.

Según las especificaciones iniciales las actividades contempladas consistían en realizar limpieza de obras menores de drenaje, además de actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de obras de drenaje tipo Box Coulvert.

Una vez definidas las necesidades reales en campo y realizadas las actividades preliminares como el levantamiento topográfico de los puntos a intervenir y la actualización de precios de materiales y servicios se obtuvo como meta física del convenio lo siguiente:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	BOX COULVERT 1X1 M (UND)	BOX COULVERT 1.5X1.5 M (UND)
0,00	0,00	3,00	1,00

Tabla 14. Relación alcance físico del convenio JAC El Recreo.

9.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

9.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	4240 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	03/11/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO
NIT:	901.199.499-4
VALOR INICIAL	$201.041.344,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$201.041.344,00
ORDEN DE INICIO	21/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	27/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	16/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO 1	20/01/2024
PRÓRROGA No. 1	16/01/2024
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15/07/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 15. Información general del convenio JAC El Recreo.

9.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

- Se realiza la instalación de la formaleta para los Boxculvert 3(1x1) y 4(1.5x1.5) y sus respectivos vaciados de concreto reforzado de 21Mpa
- Se realiza instalación de relleno con material seleccionado de la región (aproches) para los Boxculvert 3(1x1) y 4(1.5x1.5).
- Se realizan excavaciones en los Boxculvert 1(1x1) y 2(1x1).
- Elaboración y vaciado de concreto liviano (solado) para los Boxculvert 1(1x1) y 2(1x1).
- Se realiza el figurado e instalación del acero para los Boxculvert 1(1x1) y 2(1x1).
- Se realiza la instalación de la formaleta para el Boxculvert 2(1x1) y su respectivo vaciado de concreto reforzado de 21Mpa

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de junio de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 152.820.763	N/A	$ 68.813.450,00	$148.331.310,00	$ 4.489.453
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.584.623	N/A	$ 0	$ 0	$ 4.584.623
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.635.958	N/A	$ 8.766.000,00	$20.329.746,00	$ 22.306.212
TOTAL	**$ 200.041.344**	**N/A**	**$ 77.579.450,00**	**$168.661.056,00**	**$31.380.288,00**

Tabla 16. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 77%. De acuerdo con la tabla 16, el avance presupuestal del proyecto corresponde al 84.31%

9.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

Para este periodo no se presentaron modificaciones para el proyecto, por lo cual no se tiene la creación de nuevos ítems no previstos.

9.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

A fecha del presente informe se ha venido ejecutando la obra de buena forma, obteniendo un avance del 77%, el cual consta de tres (03) Boxculvert completos, uno de ellos sin aproche (Box2), otro con aproche 100% (Box3) y el ultimo con un aproche incompleto (Box4), Por otro lado el Boxculvert No.1 se encuentra en ejecución y se prevé pronta terminación. cumpliendo eficiente y técnicamente con las actividades y programación de obra.
La interventoría continuará con la supervisión de las actividades velando que se cumplan todos los requerimientos técnicos para garantizar la calidad y durabilidad de las obras.

9.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

9.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 20: Desde el 31 de mayo al 06 de junio de 2024.
- Semana 21: Desde el 07 al 13 de junio de 2024.
- Semana 22: Desde el 14 al 20 de junio de 2024.
- Semana 23: Desde el 21 al 27 de junio de 2024.

Se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

9.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de junio se contrató el servicio de máquinas y equipos, como lo fueron mezcladora, vibrador de concretos, rana compactadora, planta eléctrica, motobomba y bomba manual. Además se contra el servicio de maquinaria Amarilla, como la retroexcavadora “pajarita” para realizar los rellenos o aproches de los Box culvert 3(1x1) y 4(1.5x1.5) y también realizar las excavaciones para los Box culvert 1(1x1) y 2(1x1).

Se anexa el formato “MAQUINARIA Y EQUIPO”.

9.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

A continuación, se relaciona el personal contratado a la fecha de suscripción del presente informe;

No.	NOMBRE	CARGO	APROBACIÓN	VINCULACIÓN
1	PEDRO ANTONIO RAMIREZ	Residente de obra	08/03/2024	Prestación de servicios
2	LUZ DARY SANTAMARIA VARGAS	Contadora	08/03/2024	Prestación de servicios
3	WILMER LEANDRO CASTILLO VERGARA	Maestro	13/05/2024	Nomina
4	JUAN DE JESUS CASTILLO LESMES	Oficial	13/05/2024	Nomina
5	MARCOS FIDEL AGUILERA MARTIN	Ayudante	13/05/2024	Nomina
6	ELBIN ALEXANDER BONILLA URREGO	Ayudante	13/05/2024	Nomina
7	MAICOL DAVID CORTEZ	Ayudante	13/05/2024	Nomina
8	YILFER ANDRES CORTEZ BONILLA	Ayudante	13/05/2024	Nomina
9	CARLOS JULIO NIÑO MARTIN	Ayudante	13/05/2024	Nomina
10	EDIXON ORLANDO ROMERO CORTES	Ayudante	13/05/2024	Nomina
11	JHON JAIRO ROMERO RODRIGUEZ	Ayudante	13/05/2024	Nomina
12	RUBEN CAMILO ROERO RODRIGUEZ	Ayudante	13/05/2024	Nomina

Tabla 17. Relación profesionales aprobados.

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

9.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4240 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $200.041.344,00 para el contrato principal;

discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $199.101.799,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $939.545,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

Se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

Se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

9.3.5 Estado general del tiempo.

Se realizó el registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.
Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

9.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Durante el periodo reportado se realizaron toma de muestras de concretos en cilindros para los box culvert 2(1x1) 3(1x1) y 4(1.5x1.5), por los cual Se anexan el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

9.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100037316 anexo No. 0-1 de fecha 14/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009896 anexo No. 0-4 de fecha 14/11/2023.
- Prórroga 1: Póliza de cumplimiento No. CV-100037316 anexo No. 2 de fecha 22/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009896 anexo No. 5 de fecha 22/01/2024.
- Prórroga 2: Póliza de cumplimiento No. CV-100037316 anexo No. 3 de fecha 30/05/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009896 anexo No. 6 de fecha 30/05/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 40.208.268,80	31/10/2023	15/04/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.052.067,20	31/10/2023	15/07/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 60.312.403,20	31/12/2023	15/07/2029
TOTAL		**$ 110.572.739,20**	**29/09/2023**	**15/07/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	31/10/2023	15/07/2024

Tabla 18. Seguimiento garantías del convenio JAC El Recreo.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

9.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

9.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A fecha del presente informe la JAC se ha venido ejecutando las actividades de obra de acuerdo y siguiendo la programación de obra. A la fecha la obra no presenta retraso y se encuentra ejecutando las actividades técnica y eficientemente.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante preacta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de Comité de obra y operativo: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
13/06/2024	Comité operativo No. 6	Solicitud de orden de pago para aprobación de: Nomina del personal de obra, pago al ingeniero residente por el 50% de ejecución de la obra, pago para materiales, alquiler y transportes de máquinas,
26/06/2024	Comité operativo No. 7	Solicitud de orden de pago para aprobación de: transporte de materiales, alquiler de maquinaria, materiales de ferretería, nómina de obra, honorarios residente de obra, alimentación trabajadores y pago de retenciones.

Tabla 19. Relación de comités realizados en el periodo reportado.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

10. CONVENIO SOLIDARIO No. 3752 DE 2023 JAC VEREDA SAN LUCAS.

10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

10.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O

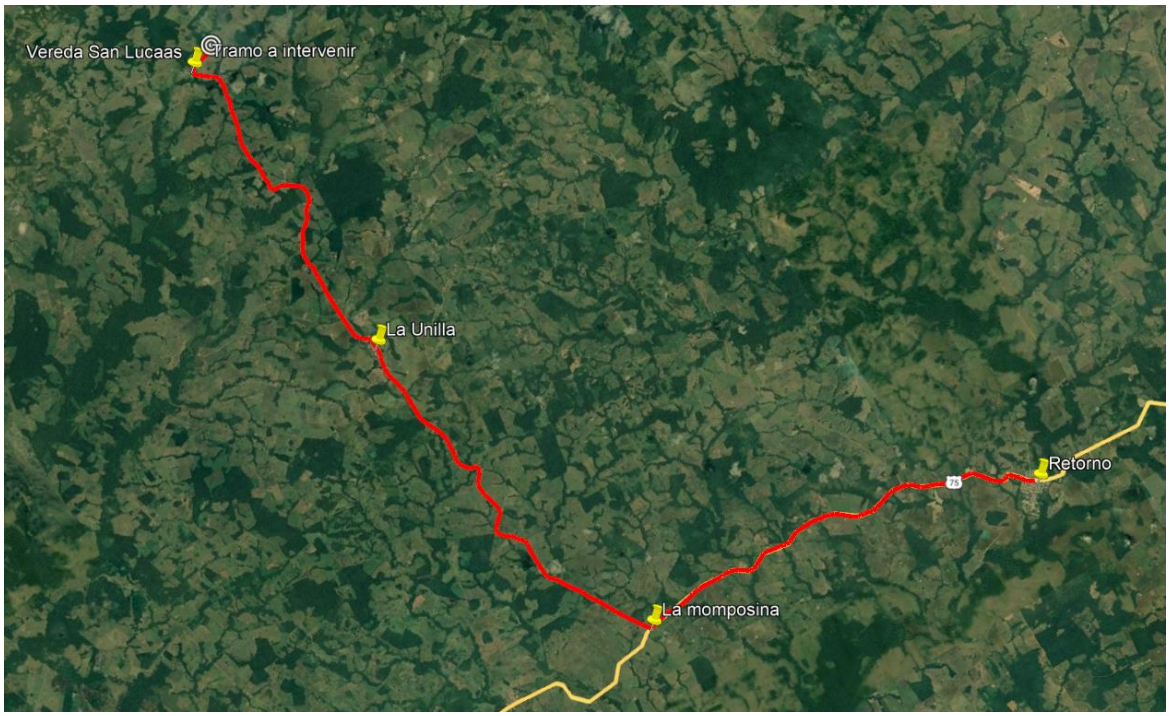


Ilustración 4. Zona de intervención Vereda San Lucas.

10.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 130 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada compactación y conformación de cunetas que permitan un correcto drenaje en la vía, esto ocasiona que en temporada de lluvias se genere erosión del material superficial y sea muy complicado su transitabilidad.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)

Tabla 20. Foto inicial del tramo a intervenir vereda San Lucas.

10.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje, desmonte y limpieza de zonas boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior y placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO	RUTINARIO	MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS (UND)
6,00	1,00	100,00	2,00

Tabla 21. Relación alcance físico del convenio JAC San Lucas.

Es menester aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

10.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

10.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	3752 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	05/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERÍO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCAS
NIT:	800.215.807-2
VALOR INICIAL	$217.314.958,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$216.314.958,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	18/01/2024
PRÓRROGA No. 1	18/01/2024
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/07/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 22. Información general del convenio JAC San Lucas.

10.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

- A la fecha se continúa a espera de los resultados de los estudios realizados y de que la JAC presente un avance el balance de presupuesto, lo cual a la fecha continua sin ser presentado por la JAC.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de abril de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 168.583.093	N/A	$ 0	$ 0	$ 168.583.093
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 5.057.493	N/A	$ 0	$ 0	$ 5.057.493
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.674.372	N/A	$ 0	$8.436.659,00	$ 34.237.713
TOTAL	**$ 216.314.958**	**N/A**	$ 0	$ 8.436.659	$ 207.878.299

Tabla 23. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance presupuestal ejecutado del proyecto al periodo reportado corresponde a 3,90%. Encontrándose el avance de obra en 0%.

10.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

10.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Se dio aprobación mediante comité operativo a desembolsos para las actividades de levantamiento topográfico, estudio de suelos y diseño geométrico, se continúa la espera de los resultados y la presentación de una primera versión del balance de presupuesto por parte de la JAC a la interventoría. A la fecha la JAC ha presentado dos cambios de ingeniero

residente, no ha sido posible que realicen el envío de la documentación pendiente y necesaria para realizar comité operativo que permita establecer y aprobar el inicio de obra.

10.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

10.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 20: Desde el 31 de mayo al 06 de junio de 2024.
- Semana 21: Desde el 07 al 13 de junio de 2024.
- Semana 22: Desde el 14 al 20 de junio de 2024.
- Semana 23: Desde el 21 al 27 de junio de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

10.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de junio de 2024 no se realizó proceso de contratación y/o gestión de maquinaria y equipo de obra.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

10.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

A continuación, se relaciona el personal contratado a la fecha de suscripción del presente informe;

No.	NOMBRE	CARGO	APROBACIÓN	VINCULACIÓN
1	DIEGO ARMANDO VELASCO	Residente de obra	07/06/2024	Prestación de servicios
2	DOLLY YORLEY ARIAS	Contadora	01/03/2024	Prestación de servicios

Tabla 24. Relación profesionales aprobados.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

10.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3752 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $216.314.958,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $215.714.594,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $600.364,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

10.3.5 Estado general del tiempo.

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

10.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Dado que, durante el periodo reportado no se realizaron actividades en obra, no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

10.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100036852 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009774 anexo No. 0-1 de fecha 24/10/2023.
- Prorroga 1: Póliza de cumplimiento No. CV-100036852 anexo No. 1 de fecha 13/02/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009774 anexo No. 2 de fecha 22/04/2024.
- Prorroga 2: Póliza de cumplimiento No. CV-100036852 anexo No. 2 de fecha 13/02/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009774 anexo No. 3 de fecha 28/05/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 43.262.991,60	05/10/2023	30/07/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.815.747,90	05/10/2023	30/07/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 64.894.487,40	31/12/2023	30/07/2029
TOTAL		**$ 118.973.226,90**	**05/10/2023**	**30/07/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	05/10/2023	30/07/2024

Tabla 25. Seguimiento garantías del convenio JAC San Lucas.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

10.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

10.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC no ha presentado la programación de obra.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el JAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-acta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de Comité de obra y operativo: Durante el periodo reportado NO se realizaron reuniones y comités de obra:

No se anexan las actas de reunión y comités de obra.

11. CONVENIO SOLIDARIO No. 4222 DE 2023 JAC VEREDA SAN FRANCISCO II.

11.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

11.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O



Ilustración 5. Zona de intervención Vereda San Francisco II.

11.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

En el tramo a intervenir es un terraplén con un solo carril que se encuentra en mal estado y la transitabilidad se ve afectada al presentarse precipitaciones, ya que aumenta el caudal del río que la bordea, además de tener puntos críticos y obras de paso de agua rusticas en muy mal estado.

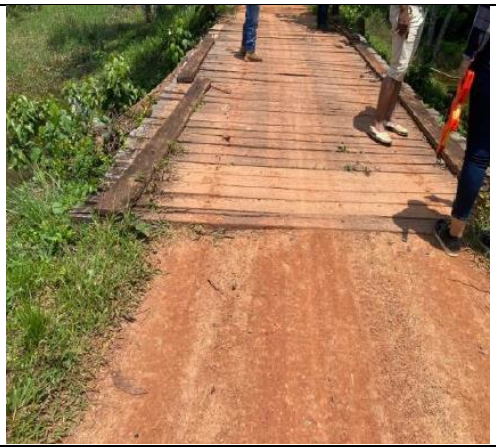
	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)

Tabla 26. Foto inicial del punto a intervenir vereda San Francisco II.

11.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción obras de drenaje tipo Box Coulvert, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	BOX COULVERT (UND)
6,00	0,00	0,00	2,00

Tabla 27. Relación alcance físico del convenio JAC San Francisco II.

Es importante aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

11.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

11.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	4222 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	02/11/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO II
NIT:	901.107.641-0
VALOR INICIAL	$209.194.251,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$209.194.251,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2023
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15/07/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 28. Información general del convenio JAC San Francisco II.

11.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

en el cual la JAC debía presentar documentos faltantes como: presupuesto, diseño o plano estructural de los boxculvert y concepto estructural de los mismos.

- El 05 de junio se realiza comité operativo, en el cual se aprueban inicialmente las diferentes órdenes de compra.
- El 07 de junio se realizan observaciones al presupuesto ya las cantidades del acero y relleno presentan observaciones y se solicita aclaración de los mismo, por ende, se le solicita a la JAC realizar el envío de los diseños o planos estructurales para los Boxculvert el de 2x2 y el de 2x1. Además, también se les socita el envío del concepto estructural que respalde las construcciones de los Boxculvert.
- El 11 de junio la JAC realiza el envío de los diseños o planos estructurales para los Boxculvert el de 2x2 y el de 2x1, y el envío del concepto estructural.
- El 14 de junio la JAC realiza envío del despiece del acero para el Boxculvert con el fin de dar claridad a las cantidades de acero.
- El 20 de junio la JAC realiza el envío del presupuesto ajustado y actualizado.
- El 21 de junio se realiza comité con la supervisión a solicitud de la comunidad, en el cual se explica el proceso que se realizado y el por qué las demoras presentadas, como conclusión se solicita más celeridad para la presentación de documentos y revisión de los mismos.
- El 22 junio se revisa y aprueba el presupuesto de obra, aprobando así el inicio de obra y el envío de los cheques.
- El 26 de junio la JAC recibe los cheques para que pueda organizar sus compras y prepararse para el inicio de obra.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de junio de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 160.705.586	N/A	$113.405.421,00	$113.405.421,00	$ 47.300.165
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.821.168	N/A	$ -	$ -	$ 4.821.168
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.667.497	N/A	$ 5.716.680,00	$ 10.378.441,00	$ 32.289.056
TOTAL	**$ 208.194.251**	**N/A**	**$119.122.101,00**	**$123.783.862,00**	**$84.410.389,00**

Tabla 29. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado de obra del proyecto en el periodo reportado corresponde a 2,24%. Sin embargo, se aprobó el desembolso para la compra de materiales para un avance presupuestal del 59.46%.

11.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

11.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Se dio aprobación mediante comité operativo a desembolsos para la compra y transporte de los materiales, se espera que la JAC inicie labores lo antes posible.

11.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

11.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 20: Desde el 31 de mayo al 06 de junio de 2024.
- Semana 21: Desde el 07 al 13 de junio de 2024.
- Semana 22: Desde el 14 al 20 de junio de 2024.
- Semana 23: Desde el 21 al 27 de junio de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

11.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de junio de 2024 no se realizó proceso de contratación y/o gestión de maquinaria y equipo de obra.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

11.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

A continuación, se relaciona el personal contratado a la fecha de suscripción del presente informe;

No.	NOMBRE	CARGO	APROBACIÓN	VINCULACIÓN
1	DIEGO ALEJANRO MANRIQUE CORREA	Residente de obra	12/03/2024	Prestación de servicios
2	ROSA EMILIANA MELO	Contadora	12/03/2024	Prestación de servicios

Tabla 30. Relación profesionales aprobados.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

11.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4222 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $208.194.251,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $208.006.342,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $187.909,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

11.3.5 Estado general del tiempo.

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

11.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Dado que, durante el periodo reportado no se realizaron actividades en obra, no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

11.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100037313 anexo No. 0-2 de fecha 14/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009895 anexo No. 0-1 de fecha 14/11/2023.
- Prórroga 1: Póliza de cumplimiento No. CV-100037313 anexo No. 3 de fecha 18/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009895 anexo No. 2 de fecha 16/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 41.838.850,20	03/11/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.459.712,55	03/11/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 62.758.275,30	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 115.056.838,05**	**29/09/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	03/11/2023	31/12/2023

Tabla 31. Seguimiento garantías del convenio JAC San Francisco II.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

11.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

11.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC presento programación de obra, la cual se encuentra en función del día de inicio de actividades, es decir no se cuenta condicionada o atada a fechas específicas, por ende no se logra determinar si presenta o no atraso, la JAC cuenta con aprobación y recursos para iniciar obra, es e entender que este organizando la logística para iniciar en los próximos días.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-acta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de Comité de obra y operativo: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
05/06/2024	Comité operativo No. 4	Selección de proveedores para adquirir servicios y materiales, aprobación cotizaciones para desembolsos (materiales de cantera, transporte de materiales, compra de

		dotación, compra de elementos para medidas ambientales, materiales de construcción y exámenes de ingreso al personal)

Tabla 32. Relación de comités realizados en el periodo reportado.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

12. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-150-2023
FECHA DE PÚBLICACIÓN DEL PROCESO	25/10/2023
ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.SLCNTR.11850767
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5040 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/12/2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DEACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.
CONTRATISTA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA
NIT	891.101.100 – 5
VALOR INICIAL	$ 215.361.440,00
VALOR ADICIONAL	NA
VALOR TOTAL	$ 215.361.440,00
ORDEN DE INICIO	30/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	30/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	23/01/2024
PRÓRROGA No. 1	25/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 1	24/03/2024
PRÓRROGA No. 2	22/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 2	30/04/2024
PRÓRROGA No. 3	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 3	30/05/2024
PRÓRROGA No. 4	30/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 4	15/06/2024
PRÓRROGA No. 5	14/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/07/2024
DIRECCIÓN	Calle 12 N. 5-07 Piso 3 Neiva, Huila.

NÚMERO DE TELÉFONO	3186081555
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO

Tabla 33. Información general del contrato de interventoría.

12.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

A continuación, se relacionan las actividades relacionadas por la interventoría:

12.1.1 Actividades Generales y de Administración.

Las actividades ejecutadas por el interventor consistieron en realizar Comités operativos, de la Junta de Acción Comunal mediante el presidente y tesorero, así como los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; con el fin de tomar decisiones técnicas y administrativas, el ellos se presentaron cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

Se ha mantenido permanente comunicación con la JAC desde la orden de iniciación para garantizar la oportuna y correcta ejecución de las actividades.

Se ha mantenido permanente comunicación con la JAC respecto a la dirección, administración, supervisión, planeación y evaluación de las actividades propias del objeto del contrato.

Se ha dispuesto del personal, implementos e instalaciones y demás servicios necesarios para el buen cumplimiento de las funciones.

Se ha realizado la revisión y posterior aprobación de la documentación previa entregada por el contratista previo al inicio de las actividades.

Se ha realizado seguimiento, reporte a las entidades contratantes de las actividades que se adelantan.

12.1.2 Actividades Técnicas.

- Se realiza revisión y ajuste a los balances de obra en aras de establecer el presupuesto oficial con su respectivo alcance real.

- Se realizó la supervisión de las actividades y procesos constructivos en obra para garantizar la calidad y durabilidad de las obras.

12.1.3 Actividades financieras.

Se ha puesto a disposición del proyecto todas las herramientas y recursos de la interventoría para hacer el acompañamiento a la JAC en cuanto a la consecución de cotizaciones y búsqueda de proveedores para la correcta
inversión de los recursos del convenio.

12.1.4 Actividades Ambientales.

Durante este periodo, se procedió con la revisión del Apéndice ambiental para los diferentes convenios, es de mencionar, que, desde este, se plantean unas medidas de manejo ambiental a establecer en los diferentes convenios, lo anterior, teniendo en cuenta, que se trata de proyectos de baja complejidad, ya que la Intervención se realiza sobre infraestructura existente, no se requiere intervención de cuerpos de agua, el suministro de material se realiza mediante terceros que cuenten con autorización por parte de las autoridades, no se genera ocupación de cauce, no se genera afectación biótica, no se genera excavaciones profundas, no se genera afectación a la infraestructura de predios y/ servicios públicos aledaños, no procede la implementación de un programa de arqueología preventiva, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente las cuales fueron plasmadas en los diferentes PGA entregados por los convenios, y que, a la fecha, se encuentran en revisión por parte de la Interventoría, es importante mencionar, que, es responsabilidad de las JAC dar cumplimiento a cada programa de manejo con sus respectivos soportes.

12.2 Informes especialistas y profesionales.

Durante el mes de mayo de 2024, las labores del director y residente de interventoría consistieron en realizar los diferentes comités con las Organismo de Acciones Comunales, el Residente de Obra, Contador, Comité de Participación ciudadana y comunidad en general, revisando y

aprobando cotizaciones presentadas, enfatizando en el alcance de las obras, atendiendo los requerimientos técnicos contemplados en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, así como los lineamientos de convenios solidarios expuestos por la Subgerencia del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total donde incluye formatos e instructivos adecuados al alcance de las obras y ser utilizados en la ejecución de los convenios para el seguimiento y control. Los profesionales del área ambiental y social durante este periodo estuvieron en permanente contacto con las juntas en pro de recolectar toda la información necesaria para el diligenciamiento y presentación de los diferentes formatos ante la entidad.

12.3 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

Durante el presente periodo no se presentó Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

13. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

13.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría.

Durante el presente periodo se requirió el alquiler de Vehículo en la zona de ejecución de los convenios para el transporte de personal.

Se anexa el formato "EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA"

13.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

Durante el presente periodo se generó el pago de aportes de seguridad social a los siguientes profesionales:

No.	NOMBRE	CARGO
1	GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
2	WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
3	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	PROFESIONAL AMBIENTAL
4	ANGELICA MARIA SEGURA GARZÓN	PROFESIONAL SOCIAL

Tabla 34. Relación personal de interventoría.

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA"

13.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría.

Para el contrato se tiene el certificado de disponibilidad presupuestal 172623 del 28 de septiembre del 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $215.361.440,00 y el CDP 72924 del 23/04/2024 por 72.490.040,00 así:

POSICIÓN DE CATÁOLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	VALOR A AFECTAR
C-2402-0600-14-0-2402041-02	NACIÓN	10	$ 211.054.211
C-2402-0600-14-0-2402112-02	NACIÓN	10	$ 4.307.229
C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	NACIÓN	10	$ 72.490.040

Tabla 35. Disponibilidad presupuestal contrato de interventoría.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 con el seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

13.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Contrato inicial: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 0 de fecha 28/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	22/12/2023	01/07/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	22/12/2023	01/07/2026
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	22/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**22/12/2023**	**31/12/2028**

Tabla 36. Garantías contrato de interventoría anexo 0.

- Acta de inicio y Prórroga 1: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 5 de fecha 26/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	30/12/2023	02/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	30/12/2023	02/10/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 37. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

- Prórroga 2: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 6 de fecha 12/04/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	30/12/2023	07/11/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	30/12/2023	07/05/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 38. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

- Prórroga 3: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 7 de fecha 02/05/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	30/12/2023	08/12/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	30/12/2023	07/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 39. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

- Prórroga 4: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 8 de fecha 31/05/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	30/12/2023	23/12/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	30/12/2023	22/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 40. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

- Prórroga 5: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 10-11 de fecha 17/06/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 28.785.148,00	30/12/2023	06/02/2025
PRESTACIONES SOCIALES		$ 57.570.296,00	30/12/2023	06/08/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 86.355.444,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 230.281.184,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 41. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

13.5 Otros documentos seguimiento mensual.

Seguimiento a la Inversión del Anticipo:

El contrato de interventoría no contempla anticipo por tal razón no se adjuntarán los formatos MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

Seguimiento al Plan de cargas o Reprogramación al plan de cargas aprobado:

Se presenta el plan de cargas con fecha de terminación el 30 de Julio de 2024, de acuerdo con la prórroga 5 del 22 de febrero de 2024.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

14. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES.

Durante este periodo se realizaron comités operativos en los cuales se aprobaron los desembolsos de gastos administrativos necesario para iniciar las actividades preliminares en obra para 1 de los 5 convenios, quedando así aprobado y en ejecución 3 de los 5 convenios.

Las JAC de Caño bonito, Cerritos y el Recreo se encuentran finalizando la ejecución y desarrollo de actividades de obra, las cuales hasta el momento se han realizado técnicamente y bajo los requerimientos establecidos.

La JAC San Francisco II ha presentado presupuesto de obra ajustado y actualizado y cuenta con la aprobación para el inicio de obra, se espera que la JAC inicie obra en los próximos días.

La JAC de la vereda de San Lucas realizo subsanación de los estudios previos realizados, ya que requerían correcciones y estaban incompletos, a la fecha se presenta renuncia (no formal) por parte del nuevo residente de obra, por lo cual la JAC presento nuevo personal idóneo (Diego Armando Velasco) para cumplir con el cargo y presentar la documentación pendiente y necesaria (planos, presupuesto, programación de obra etc.)para poder iniciar obra. Todo esto ha generado que el convenio presente un porcentaje de atraso demasiado alto en la ejecución de actividades.

15. ANEXOS.

15.1 Relación Correspondencia.

A continuación, se relaciona cuadro resumen de la correspondencia generada durante el periodo reportado:

NUMERACIÓN	FECHA	REMITE	ASUNTO	RECIBE
INV-INT-CBONITO-005	28/02/2024	Interventoría	Requerimientos Ambientales	JAC Caño Bonito
INV-INT-CERRITOS-005	28/02/2024	Interventoría	Requerimientos Ambientales	JAC Cerritos
INV-INT-RECREO-003	28/02/2024	Interventoría	Requerimientos Ambientales	JAC El Recreo
INV-INT-SANLUCAS-003	28/02/2024	Interventoría	Requerimientos Ambientales	JAC San Lucas



Tabla 39. Registro fotográfico. .

15.2 Documentos de seguimiento.

Durante el periodo reportado se realizaron un comité de seguimiento al desarrollo de la interventoría para los 5 convenios.

15.3 Registro fotográfico.

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo reportado:

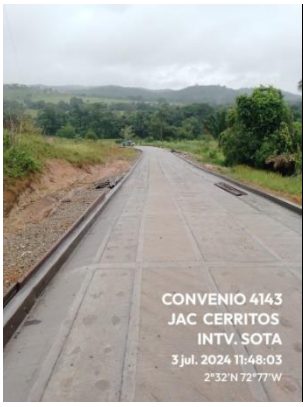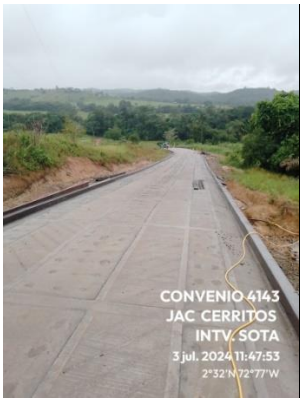	
Placa Huella, vereda Caño Bonito.	Placa Huella, vereda Caño Bonito.
	
Placa Huella, vereda Cerritos.	Placa Huella, vereda Cerritos.
	

Box culvert 4(1.5x1.5), vereda El Recreo.	Box culvert 3(1x1), vereda El Recreo.
	
Box culvert 2(1x1), vereda El Recreo.	Box culvert 1(1x1), vereda El Recreo.

Tabla 40. Registro fotográfico.

15.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3613 DE 2023 JAC VEREDA CAÑO BONITO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3613 de 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

JUSTIFICACIÓN:

N/A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 FEBRERO	VR. MES 2 MARZO	VR. MES 3 ABRIL	VR. MES 4 MAYO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NOMINA PERSONAL	$ -		$ 2.800.000	$ 27.485.538,00	$ 58.722.182	14,56%
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	$ -		$ 1.991.000	$ -	$ 2.117.000	0,96%
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ -		$ 1.310.000	$ -	$ 1.310.000	0,63%
4	GASTOS BANCARIOS	$ -	$ -		$ -	$ 1.328.596	0,00%
5	OTROS COSTOS	$ -	$ 7.227.973,00	$ 1.066.000	$ -	$ 11.659.745	3,99%
6	MATERIALES	$ -		$ 40.616.000	$ 13.862.000,00	$ 72.946.790	26,19%
7	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 31.350.000	$ -	$ 48.271.571	15,07%
8	ALQUILER EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ -	$ -		$ 3.655.000,00	$ 6.921.656	1,76%
9	PAGA	$ -	$ -		$ -	$ 4.714.468	0,00%
	TOTAL	**$ -**	**$ 7.227.973,00**	**$ 79.133.000**	**$ 45.002.538,00**	**$ 207.992.008,00**	**63,16%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.



Firma:

Nombre: MARISOL AYALA CUBIDES
Representante Legal o su Apoderado
Contratista



Firma:

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND



Firma:

Nombre: Carlos Enrique Ramirez Dominguez
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 54202-438888 NTS

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMES SEMANALES
CAÑO BONITO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 20 del 31-may al 6-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No.	3613 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 207.992.007,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 207.992.007,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	215.361.440,00 $
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	215.361.440,00 $
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/06/2024	VALOR ANTICIPO:	- $
		VALOR AMORTIZADO:	- $
		SALDO POR AMORTIZAR:	- $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207.992.007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207.992.007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207.992.007,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 113.445.895,22	54,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 145.894.978,49	70,14%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 145.894.978,49	70,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.991.000,00	0,96%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 113.445.895,22	54,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 147.885.978,49	71,10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 147.885.978,49	71,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 40.939.881,58	19,68%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.418.535,38	4,05%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 178.836.139,78	83,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 143.129.213,02	66,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.763.704,21	10,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.263.403,31	5,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 54,54% — Avance o Atraso Físico %: 16,56%

Meta Física Ejecutada %: 71,10%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	116,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	54,54%			54,54%	
Ejec	71,10%			71,10%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de bulto		1
Vibrador de Concreto		1
Total		2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el av

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la eje

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Del 31 de mayo al 06 de junio se ha realizado la instalación del acero, tanto para vigas como huellas y se ha realizado el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para los mismo (aproximadamente 106,2 ML acomulados)

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con la instalación del acero, tanto para vigas como huellas y se realizara el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para terminar con esas actividades.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

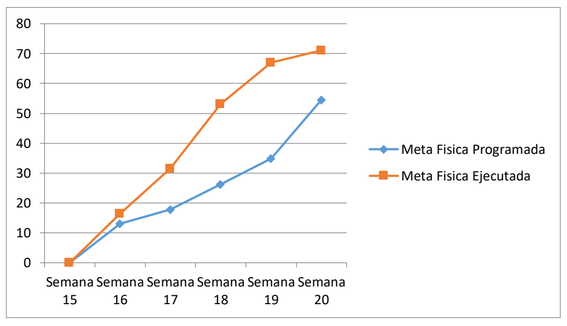

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Placa huella



Placa huella



Placa huella

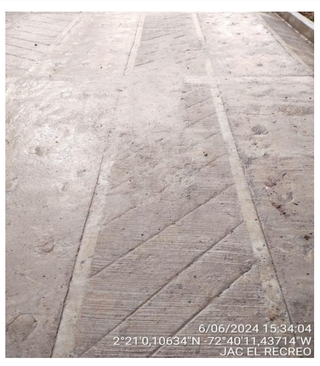

Placa huella



Placa huella



Placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Realizar seguimiento y control a la ejecución de las actividades ejecutadas. verificar instalacion de aceros Realizar toma de muestras de concreto.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 21 del 7-jun al 13-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No. 3613 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 207.992.007,00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 207.992.007,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: 215.361.440,00 $

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: 215.361.440,00 $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024 — VALOR ANTICIPO: - $

VALOR AMORTIZADO: - $

SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207.992.007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207.992.007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207.992.007,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 182.946.173,10	87,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 193.853.424,12	93,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 193.853.424,12	93,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.991.000,00	0,96%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 182.946.173,10	87,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 195.844.424,12	94,16%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 195.844.424,12	94,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 69.500.277,88	33,41%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 47.958.445,63	23,06%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201.578.307,84	93,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 154.414.152,48	71,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.763.704,21	10,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.263.403,31	5,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 87,96% — Avance o Atraso Físico % 6,20%

Meta Física Ejecutada % 94,16%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	116,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	87,96%			87,96%	
Ejec	94,16%			94,16%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de bulto		1
Vibrador de Concreto		1
Total		2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el av

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la eje

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Del 07 de junio al 13 de junio se ha realizado la instalación del acero, tanto para vigas como huellas y se ha realizado el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para los mismo (aproximadamente 116,2 ML acomulados)

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el mezcldo y vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para la ejecucion de los bordillos de la placa huella.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

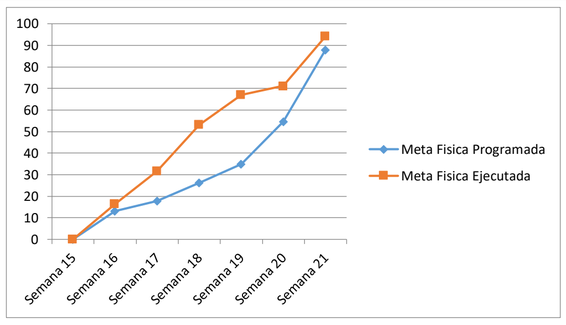

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella



Placa huella




Placa huella



Placa huella



Placa huella

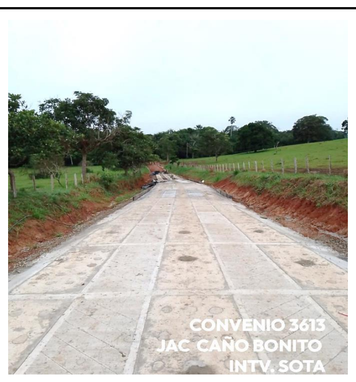

Placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a la ejecución de las actividades ejecutadas.
verificar instalacion de aceros
Realizar toma de muestras de concreto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 22 del 14-jun al 20-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No.	3613 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 207.992.007,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 207.992.007,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	215.361.440,00 $
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	72.490.040,00 $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	287.851.480,00 $
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/06/2024	VALOR ANTICIPO:	- $
		VALOR AMORTIZADO:	- $
		SALDO POR AMORTIZAR:	- $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207.992.007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207.992.007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207.992.007,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199.662.890,53	96,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 197.671.890,53	95,04%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 197.671.890,53	95,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.991.000,00	0,96%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.662.890,53	96,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.662.890,53	96,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 199.662.890,53	96,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.716.717,43	8,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.818.466,41	1,84%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171.570.100,69	59,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 171.570.100,69	59,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.155.948,21	5,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.155.948,21	5,96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 96,00% — Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física Ejecutada % 96,00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	116,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	96,00%			96,00%	
Ejec	96,00%			96,00%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de bulto		1
Vibrador de Concreto		1
Total		2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el av

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la eje

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Del 14 de junio al 20 de junio se ha realizado la instalación del acero, tanto para vigas como huellas y se ha realizado el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para los mismo (aproximadamente 116,2 ML acomulados) incluyendo los bordillos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el relleno con material seleccionado de la region

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

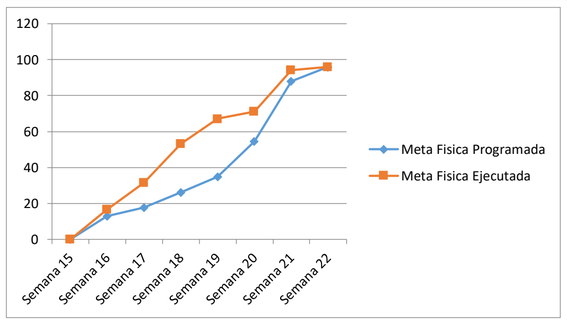

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Realizar seguimiento y control a la ejecución de las actividades ejecutadas. verificar instalacion de aceros Realizar toma de muestras de concreto.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 23 del 21-jun al 27-jun — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No.: 3613 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 207.992.007,00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 207.992.007,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: 215.361.440,00 $

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: 72.490.040,00 $

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: 287.851.480,00 $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024 — VALOR ANTICIPO: - $

VALOR AMORTIZADO: - $

SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207.992.007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207.992.007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207.992.007,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 207.992.007,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 203.277.539,00	97,73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 203.277.539,00	97,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.991.000,00	0,96%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 207.992.007,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 205.268.539,00	98,69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 205.268.539,00	98,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.329.116,47	4,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.605.648,47	2,70%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 190.942.505,29	66,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 188.726.048,90	65,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.493.824,91	6,73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.835.541,82	5,96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: -1,31%

Meta Física Ejecutada %: 98,69%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	116,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	100,00%			100,00%	
Ejec	98,69%			98,69%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de bulto		1
Vibrador de Concreto		1
Total		2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejec

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO x	N/A	
EMISIONES:	SI	NO x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO x	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Del 21 de junio al 27 de junio se ha realizado la aplicación del Relleno Con material Seleccionado De La Region. Terminando actividades de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la gestion documental para la liquidacion del convenio

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Relleno con material seleccionado de la region



Placa huella



Relleno con material seleccionado de la region



Relleno con material seleccionado de la region



Placa huella



Relleno con material seleccionado de la region

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Supervisar la aplicación del relleno con material seleccionado de la region.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/01/1900

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 3613 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JUNIO																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Motoniveladora	CAT/VHP145	215 hp	VEREDA CAÑO BONITO																														
Vibrocompactador	CASE	153 hp	VEREDA CAÑO BONITO																														
Retro excavadora	CAT	110 hp	VEREDA CAÑO BONITO																														
Mezcladora	FORTE	2 BLTO	VEREDA CAÑO BONITO																														
Rana Compactadora	FORTE	8 hp	VEREDA CAÑO BONITO																														
Planta electrica	FORTE	2500 w	VEREDA CAÑO BONITO																														
Motobomba	FORTE	16hp	VEREDA CAÑO BONITO																														
Bomba Manual Esparsor	FORTE		VEREDA CAÑO BONITO																														
Vibrador de Concreto		2,4hp	VEREDA CAÑO BONITO																														
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			2	3	2	3	2			4	3	3	2	2	1															
			TOTAL ACTIVO			2	3	2	3	2			4	3	3	2	2	1															
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9	73%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	9	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Carlos Enrique Ramirez Dominguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-438888 NTS

Firma
Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/01/1900
		FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 3/0/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 3613 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMCAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
9	JULIO CESAR AYALA	1122126428	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															JAC CAÑO BONIO	$ 1.083.334	$ 866.667	5	NUEVA EPS	9470173930	$ 108.400	PORVENIR	9468430887	$ 138.700	$ 34.700	$ 17.500	$ 26.000	RETIRO A 15 DE JUNIO DE 2024
10	OSCAR CUBIDES	18236105	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															JAC CAÑO BONIO	$ 1.083.334	$ 866.667	5	NUEVA EPS	9470173930	$ 108.400	PORVENIR	9468430887	$ 138.700	$ 34.700	$ 17.500	$ 34.667	RETIRO A 15 DE JUNIO DE 2024
5	JUAN LUIS DIAZ	18235607	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															JAC CAÑO BONIO	$ 1.083.334	$ 866.667	5	NUEVA EPS	9470173930	$ 108.400	PORVENIR	9468430887	$ 138.700	$ 34.700	$ 17.500	$ 34.667	RETIRO A 15 DE JUNIO DE 2024
12	YAMIT ALFREDO	1122124050	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X																									JAC CAÑO BONIO	$ 1.083.334	$ 260.000	5	NUEVA EPS	9470173930	$ 32.500	PORVENIR	9468430887	$ 41.600	$ 10.400	$ 5.200	$ 7.800	retiro a 05 de junio
13	LEIMAR ESTEBAN	1148944139	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X																									JAC CAÑO BONIO	$ 1.083.334	$ 260.000	5	NUEVA EPS	9470173930	$ 32.500	PORVENIR	9468430887	$ 41.600	$ 10.400	$ 5.200	$ 7.800	retiro a 05 de junio
14	FLORIBERTO RIOS	86035803	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															JAC CAÑO BONIO	$ 1.933.334	$ 1.546.667	5	NUEVA EPS	9470173930	$ 193.400	PORVENIR	9468430887	$ 247.500	$ 61.900	$ 31.100	$ 46.400	RETIRO A 15 DE JUNIO DE 2024

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 31/05/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Carlos Enrique Ramirez Dominguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-438888 NTS

Firma
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 2520222592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 30/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 3613 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco																																16
Lluvias moderadas																																12
Lluvias intensas																																2
Total horas	24	24	4	8	5	2	8	6	10	4	12	12	24	8	10	24	24	24	12	6	12	8	12	12	8	24	12	24	8	12		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Durante el mes de mayo se presentaron fuertes lluvias las cuales generaron complicaciones en obra, se presentaron grandes perdidas de material petreo, debido a la escorrentia de agua, afectaciones durante las actividades de concretos.

Firma
Nombre: Carlos Enrique Ramirez Dominguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-438888 NTS

Firma
Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1-Jan

FECHA: 5/15/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No.: 3613 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha Toma de Muestra (Día/Mes/Año)	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo(PSI)	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA										
1	5/17/2024	5/24/2024	CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLAS K0+0 HASTA EL K0+30/ ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD	NTC-673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CAÑO BONITO	1		1834.36	SI	NO
	5/17/2024	5/31/2024	CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLAS K0+0 HASTA EL K0+30/ ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD	NTC-673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CAÑO BONITO	1		2737.07	SI	NO
	5/17/2024	6/14/2024	CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLAS K0+0 HASTA EL K0+30/ ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD	NTC-673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CAÑO BONITO	1		3084.84	SI	NO
2	5/10/2024	5/17/2024	CONCRETO CICLOPEO DE 2000 PSI PARA HUELLAS K0+30 HASTA EL K0+60 / ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD	NTC-673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CAÑO BONITO	1		1520.42	SI	NO
	5/10/2024	5/24/2024	CONCRETO CICLOPEO DE 2000 PSI PARA HUELLAS K0+30 HASTA EL K0+60 / ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD	NTC-673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CAÑO BONITO	1		2259.17	SI	NO
	5/10/2024	6/7/2024	CONCRETO CICLOPEO DE 2000 PSI PARA HUELLAS K0+30 HASTA EL K0+60 / ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD	NTC-673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CAÑO BONITO	1		2598.3	SI	NO
3	5/16/2024	5/23/2024	CONCRETO CICLOPEO DE 2000 PSI PARA HUELLAS K0+90 HASTA EL K0+116 / ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD	NTC-673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CAÑO BONITO	1		1533.06	SI	NO
	5/16/2024	5/30/2024	CONCRETO CICLOPEO DE 2000 PSI PARA HUELLAS K0+90 HASTA EL K0+116 / ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD	NTC-673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CAÑO BONITO	1		2283.22	SI	NO

	5/16/2024	6/16/2024	CONCRETO CICLOPEO DE 2000 PSI PARA HUELLAS K0+90 HASTA EL K0+116 / ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD	NTC-673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CAÑO BONITO	1		2608.4	SI	NO
4	5/28/2024	6/4/2024	CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLAS K0+50 HASTA EL K0+70/ ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD	NTC-673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CAÑO BONITO	1		1827.13	SI	NO
	5/28/2024	6/11/2024	CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLAS K0+50 HASTA EL K0+70/ ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD	NTC-673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CAÑO BONITO	1		2726.42	SI	NO
	5/28/2024	6/25/2024	CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLAS K0+50 HASTA EL K0+70/ ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD	NTC-673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CAÑO BONITO	1		3087.3	SI	NO
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA										

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Carlos Enrique Ramirez D

Firma

Nombre: Carlos Enrique Ramirez Dominguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-438888 NTS

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GEOLAB IMEG
LABORATORIO DE SUELOS Y GEOTECNIA

ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD
NTC 673-2022

LAB-F-10	
VER-01	
FECHA	1/12/2023


CONTRATO DE OBRA: N/A	OBJETO:	"Aunar esfuerzos entre el Instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Caño Bonito del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

CLIENTE	JUNTA DE ACCION COMUNAL CAÑO BONITO	NIT	901010660-2
LOCALIZACIÓN	VEREDA CAÑO BONITO - EL RETORNO	RESISTENCIA	Fc= 3000 PSI

ELEMENTO 1	FECHA DE FUNDICIÓN	FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)				GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS		ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)	RESULTADOS DE RESISTENCIA							
									7 DÍAS		14 DÍAS		28 DÍAS		T - 28 DIAS	
		7	14	28	T	ALTO (cm)	DIAMETRO (cm)		FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)
CONCRETO HUELLAS ABS 00+000 - 00+030	17/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	-	30	15	176,715	223,5	1834,38	333,48	2737,01	375,86	3084,84	377,81	3100,84
RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)			3000,00			PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)			61,15%		91,23%		102,83%		103,36%	

ELEMENTO 2	FECHA DE FUNDICIÓN	FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)				GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS		ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)	RESULTADOS DE RESISTENCIA							
									7 DÍAS		14 DÍAS		28 DÍAS		T - 28 DIAS	
		7	14	28	T	ALTO (cm)	DIAMETRO (cm)		FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)
CONCRETO HUELLAS ABS 00+050 - 00+070	28/05/2024	4/06/2024	11/06/2024	25/06/2024	-	30	15	176,715	222,62	1827,13	332,19	2726,42	376,16	3087,30	376,89	3093,29
RESISTENCIA DE LA MEZCLA DISEÑADA (PSI)			3000,00			PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)			60,90%		90,88%		102,91%		103,11%	

CONCRETO HUELLAS
ABS 00+000 - 00+030

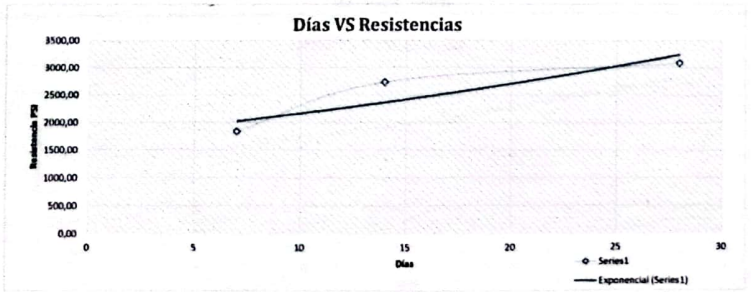

CONCRETO HUELLAS
ABS 00+050 - 00+070



OBSERVACIONES:	Los cilindros ensayados fueron elaborados en obra ; despues de realizar la recepción de los cilindros en laboratorio, se procedio a continuar con el curado de los mismos y la rotura según los terminos establecidos.

FECHA DE ENTREGA	16/07/2024

Ing. Laura Gomez
Director de Laboratorio

Powered by CamScanner

GEOLAB IMEG
LABORATORIO DE SUELOS Y GEOTECNIA

ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD
NTC 673-2022

LAB-F-10	
VER-01	
FECHA	1/12/2023


CONTRATO DE OBRA: N/A	OBJETO:	"Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Caño Bonito del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

CLIENTE	JUNTA DE ACCION COMUNAL CAÑO BONITO	NIT	901010660-2
LOCALIZACIÓN	VEREDA CAÑO BONITO - EL RETORNO	RESISTENCIA	Fc= 2500 PSI

ELEMENTO 1	FECHA DE FUNDICIÓN	FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)				GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS		ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)	RESULTADOS DE RESISTENCIA							
									7 DÍAS		14 DÍAS		28 DÍAS		T - 28 DIAS	
		7	14	28	T	ALTO (cm)	DIAMETRO (cm)		FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)
CONCRETO CICLOPEO ABS 00+030 - 00+060	10/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	7/06/2024	-	30	15	176,715	185,25	1520,42	275,26	2259,17	316,58	2598,30	315,24	2587,30
RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)			2500,00			PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)			60,82%		90,37%		103,93%		103,49%	

ELEMENTO 2	FECHA DE FUNDICIÓN	FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)				GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS		ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)	RESULTADOS DE RESISTENCIA							
									7 DÍAS		14 DÍAS		28 DÍAS		T - 28 DIAS	
		7	14	28	T	ALTO (cm)	DIAMETRO (cm)		FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)
CONCRETO CICLOPEO ABS 00+090 - 00+116	16/05/2024	23/05/2024	30/05/2024	13/06/2024	-	30	15	176,715	188,79	1533,06	278,19	2283,22	317,81	2608,40	319,26	2620,30
RESISTENCIA DE LA MEZCLA DISEÑADA (PSI)			2500,00			PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)			61,32%		91,33%		104,34%		104,81%	

CONCRETO CICLOPEO
ABS 00+030 - 00+060

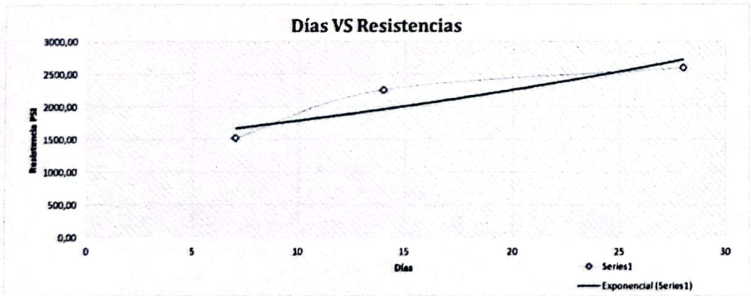

CONCRETO CICLOPEO
ABS 00+090 - 00+116



OBSERVACIONES:	Los cilindros ensayados fueron elaborados en obra ; despues de realizar la recepción de los cilindros en laboratorio, se procedio a continuar con el curado de los mismos y la rotura según los terminos establecidos.

FECHA DE ENTREGA 16/07/2024

Ing. Laura Gomez
Director de Laboratorio

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 3613 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 207.992.007,00

VALOR ACUMULADO: $ 207.992.007,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.798.401,40	29	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.449.600,35	29	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.697.602,10	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036855

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009777 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.798.401,40	30	12	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.449.600,35	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.697.602,10	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036855

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29	9	2023	22	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009777 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.798.401,40	30	4	2023	15	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.449.600,35	30	4	24	15	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.697.602,10	15	7	2024	15	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036855

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	29	9	2023	23	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009777 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE COMITÉ
CAÑO BONITO

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 06	**Dirección Territorial INVIAS: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES**	**Fecha: 11/06/2024**

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Caño Bonito, El Retorno, Guaviare.
No. Convenio(s) Solidario(s): 3613 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal Caño Bonito

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	**Institución u Organización**	**Cargo**
Marisol Ayala Cubides	JAC Caño Bonito	Presidente
Jacinto Cubides	JAC Caño Bonito	Veedor
Luz Dary Santamaría	JAC Caño Bonito	Contadora
Carlos Enrique Ramírez	JAC Caño Bonito	Ing. Residente de obra
Javier Barrero	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Representante Legal
Gabriel Velásquez	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Director de interventoría
Wualner Raúl López González	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Ing. Residente de interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Aprobación de desembolsos.

AGENDA DEL COMITÉ: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Presentación de los asistentes.
2- Aprobación de desembolsos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los asistentes:** Asisten al comité por la JAC de la vereda Caño Bonito la Presidenta, Marisol Ayala Cubides; el Veedor, Jacinto Cubides; la Contadora, Luz Dary Santamaría; el Residente de Obra, Carlos Ramírez y por parte de la interventoría asisten el Director de Obra, Gabriel Velázquez; el Residente de Obra, Wualner Lopez y el representante legal, Javier Barrero.
2.	Se presentan la relación de seis facturas y/o cuentas de cobro para aprobación y orden de pago para la obra: 2.1. JERONIMO BARON ALFONSO (Transporte de Material) 2.2. MARISOL AYALA CUBIDES (Nomina del Personal del 01/06/24 al 15/06/2024) 2.3. MARISOL AYALA CUBIDES (Liquidación de 8 ayudantes de obra a 31 de mayo) 2.4. CANTERA LAJITAS (Arena) 2.5. MARISOL AYALA CUBIDES (Compra de papelería) 2.6. NAYDA ROMERO MEJIA (Pago de alimentación del 06/05 de 20241 al 31 de mayo del 2024) 2.7. Retenciones

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	2.1. Se aprueba desembolso a JERONIMO BARON ALFONSO por $ 9.405.000,00 por concepto de transporte de material. 2.2. Se aprueba pago de la nómina de los trabajadores durante el periodo del 01/06 al 15/06 de 2024 a nombre de la JAC Caño Bonito, su representante legal MARISOL AYALA CUBIDES por el valor de $ 3.645.466,67. 2.3. Se aprueba desembolso por concepto de liquidación de ayudantes de obra entre el 06 de mayo al 31 de mayo de 2024 por el valor de $ 1.993.968,00 a nombre de la JAC Caño Bonito, su representante legal MARISOL AYALA CUBIDES. 2.4. Se aprueba desembolso a favor de CANTERAS LAJITAS SAS por $ 3.502.200,00 por concepto de compra de material pétreo. 2.5. Se aprueba reembolso a MARISOL AYA CUBIDES por $ 192.500,00 por concepto de compra de papelería. 2.6. Se aprueba desembolso a favor de NAYDA ROMERO MEJÍA por $ 3.840.000,00 por concepto de Pago de alimentación del 06/05 de 20241 al 31 de mayo del 2024 a los trabajadores. 2.7. Se realiza aprobación de cheque por $ 344.800,00 por concepto de retenciones a la fuente, a favor de la JAC Caño Bonito, su representante legal MARISOL AYALA CUBIDES.
3.	

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____


COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de la relación de pagos aprobados en el comité.	JAC Caño Bonito	11/06/2024


PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:




Nombre: Marisol Ayala Cubides
Cargo: Presidente JAC Caño Bonito



Nombre: Jacinto Cubides
Cargo: Representante Veeduría




Nombre: Luz Dary Santamaría
Cargo: Contadora JAC Caño Bonito



Nombre: Carlos Enrique Ramírez
Cargo: Ing. Residente de obra



Nombre: Javier Barrero
Cargo: R/L Interventoría



Nombre: Gabriel Velásquez
Cargo: Director de interventoría



Nombre: Wualner Raúl López
Cargo: Residente de Interventoría

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

CONVENIO SOLIDARIO No. 4143 DE 2023 JAC VEREDA CERRITOS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4143 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO,EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 FEBRERO	VR. MES 2 MARZO	VR. MES ABRIL	VR. MES 4 MAYO	VR. MES 5 JUNIO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NOMINA PERSONAL			$ 1.837.500	$ 1.050.000		$ 52.885.849	5%
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN			$ 1.823.000			$ 1.844.000	99%
3	MEDIDAS AMBIENTALES			$ 762.152			$ 834.000	91%
4	GASTOS BANCARIOS				$ 621.398		$ 1.325.063	47%
5	OTROS COSTOS		$ 7.076.630	$ 459.500	$ 495.000		$ 10.683.380	75%
6	MATERIALES			$ 38.333.848			$ 66.123.647	58%
7	TRANSPORTE			$ 44.100.000			$ 57.591.782	77%
8	ALQUILER EQUIPOS Y MAQUINARIA				$ 2.135.000		$ 6.027.820	35%
9	PAGA						$ 4.687.975	0%
10	TRANSPORTE DE MAQUINARIA				$ 1.600.000		$ 1.600.000	100%
	TOTAL		$ 7.076.630	$ 87.315.999,50	$ 5.901.398,00	$ -	$ 203.603.515	49%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Isidoro Gonzalez

Firma:
Nombre: ISIDORO GONZALEZ MORERA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Hugo Antonio Urrego

Firma:
Nombre: HUGO ANTONIO URREGO CIPRIAN
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 121037-0507307 NTS

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 4 **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

CONVENIO No. 4143 DEL 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 204.603.516,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO,EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSION DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Orden de pago N° 018 - Documento Soporte	DSVC 25 AL DSVC 34	15-jun-24	Isidoro Gonzalez Morera - Nomina mes de mayo	$ 4.697.053	1,4 - 1.4.1 - 800.1 P - 200.2 - 310.1 - 320.3.1 - 630.1.4.1 - 630.1.7 - 640.1 - 600.1.1 - 10.1	Maestro de obra (Nómina) - Carga Prestacional Maestro de Obra - Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm - Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas - Conformación De La Calzada Existente - Subbase Granular Clase C Sbg-50 - Concreto Reforzado Resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ - Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G) - Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa - Excavaciones Varias Sin Clasificar - Relleno Conmaterial Seleccionado De La Region
Planilla N° 9467980558	9467980558	15-jun-24	Aportes en linea - Seguridad Social mes de mayo	$ 2.009.500	1,4 - 1.4.1 - 800.1 P - 200.2 - 310.1 - 320.3.1 - 630.1.4.1 - 630.1.7 - 640.1 - 600.1.1 - 10.1	Maestro de obra (Nómina) - Carga Prestacional Maestro de Obra - Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm - Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas - Conformación De La Calzada Existente - Subbase Granular Clase C Sbg-50 - Concreto Reforzado Resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ - Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G) - Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa - Excavaciones Varias Sin Clasificar - Relleno Conmaterial Seleccionado De La Region
Factura Electronica		15-jun-24	Ferreteria S&F Zomac SAS	$ 10.320.000	640.1 - 630.1.7 - 630.1.4.1	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa - Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G) - Concreto Reforzado Resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ
Factura Electronica		15-jun-24	Cantera Lajitas Sas	$ 336.000	630.1.7 - 630.1.4.1	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G) - Concreto Reforzado Resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ
CuEnta de Cobro - Documento Soporte	DSVC 35	15-jun-24	Hugo Antonio Urrego Ciprian	$ 3.675.000	1.1	Residente de Obra (CPS)
Orden de pago N° 023 - Documento Soporte	DSVC 36 AL DSVC 46	15-jun-24	Isidoro Gonzalez Morera - Nomina mes de junio del 01 al 15	$ 7.938.200	1,4 - 1.4.1 - 800.1 P - 200.2 - 310.1 - 320.3.1 - 630.1.4.1 - 630.1.7 - 640.1 - 600.1.1 - 10.1	Maestro de obra (Nómina) - Carga Prestacional Maestro de Obra - Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm - Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas - Conformación De La Calzada Existente - Subbase Granular Clase C Sbg-50 - Concreto Reforzado Resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ - Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G) - Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa - Excavaciones Varias Sin Clasificar - Relleno Conmaterial Seleccionado De La Region
Factura Electronica	N° 014F9273971 - N° 014F9275415	15-jun-24	Compañía Mundia de Seguros SA	$ 173.146	5.7	Pólizas
CuEnta de Cobro - Documento Soporte	DSVC 47	15-jun-24	Edilson Mateus Martinez	$ 4.400.000	1,4 - 1.4.1 - 800.1 P - 200.2 - 310.1 - 320.3.1 - 630.1.4.1 - 630.1.7 - 640.1 - 600.1.1 - 10.1	Maestro de obra (Nómina) - Carga Prestacional Maestro de Obra - Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm - Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas - Conformación De La Calzada Existente - Subbase Granular Clase C Sbg-50 - Concreto Reforzado Resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ - Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G) - Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa - Excavaciones Varias Sin Clasificar - Relleno Conmaterial Seleccionado De La Region

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA PERSONAL	52.885.849	2.887.500	22.719.753	25.607.253	27.278.596
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	1.844.000	1.823.000		1.823.000	21.000
3	MEDIDAS AMBIENTALES	834.000	762.152		762.152	71.849
4	GASTOS BANCARIOS	1.325.063	621.398		621.398	703.665
5	OTROS COSTOS	10.683.380	8.031.130	173.146	8.204.276	2.479.104
6	MATERIALES	66.123.647	38.333.848	10.656.000	48.989.848	17.133.799
7	TRANSPORTE	57.591.782	44.100.000		44.100.000	13.491.782
8	ALQUILER EQUIPOS Y MAQUINARIA	6.027.820	2.135.000		2.135.000	3.892.820
9	PAGA	4.687.975			-	4.687.975
10	TRANSPORTE DE MAQUINARIA	1.600.000	1.600.000		1.600.000	-
	TOTALES	**203.603.515**	**100.294.027**	**33.548.899**	**133.842.926**	**69.760.589**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Isidoro Gonzalez
Nombre: ISIDORO GONZALEZ MORERA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma: Hugo Antonio Urrego
Nombre: HUGO ANTONIO URREGO CIPRIAN
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMES SEMANALES
CERRITOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 20 del 31-may al 6-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No.	4143 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 203.603.516,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 203.603.516,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215.361.440,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 215.361.440,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203.603.516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203.603.516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203.603.516,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 114.572.451,74	56,27%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 99.151.957,76	48,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (15.420.493,98)	-7,57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.991.000,00	0,98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 114.572.451,74	56,27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 101.142.957,76	49,68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (13.429.493,98)	-6,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 38.078.610,78	18,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 44.484.413,71	21,85%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 178.836.139,78	83,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 143.129.213,02	66,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.763.704,21	10,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.263.403,31	5,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 56,27% — Avance o Atraso Físico %: -6,60%

Meta Física Ejecutada %: 49,68%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	119,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	56,27%			56,27%	
Ejec.	49,68%			49,68%	
Prog.					
Ejec.					
Prog.					
Ejec.					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fi

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora tipo trompo		1
vibrador de concretos		1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ----------

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----------

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ----------

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo el vaciado total del concreto ciclopeo, se instalo el acero para bordillos, cunetas, vigas y huellas para cuarenta (40) metros, ademas se realizo el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para esos mismo cuarenta (40) metros

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con la instalacion de aceros para bordillos, cunetas, vigas y huellas, ademas de su respectivo vaciado de concreto reforzado de 21Mpa.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

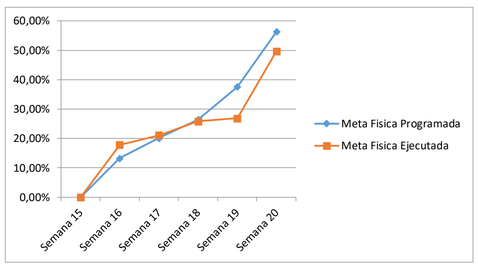

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado de concreto reforzado en cunetas



Acero de vigas, cuentas y huellas




Texturizado en huellas y cunetas



Acabado de huellas



Vaciado de concreto reforzado en vigas, huellas y cuentas

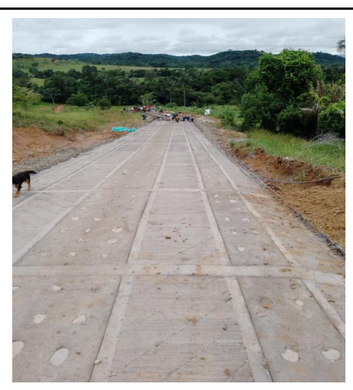

Placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Supervisar y verificar la instalacion de la formaleta, amarrado e instalacion de aceros Realizar toma de muestras de concreto.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 21 del 7-jun al 13-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No.	4143 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 203.603.516,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 203.603.516,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215.361.440,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 215.361.440,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203.603.516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203.603.516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203.603.516,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 139.296.963,00	68,42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 167.356.465,00	82,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 28.059.502,00	13,78%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.991.000,00	0,98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 139.296.963,00	68,42%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169.347.465,00	83,18%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 30.050.502,00	14,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.724.511,26	12,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 68.204.507,24	33,50%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201.578.307,84	93,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 154.414.152,48	71,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.763.704,21	10,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.263.403,31	5,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 68,42% — Avance o Atraso Físico %: 14,76%

Meta Física Ejecutada %: 83,18%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	119,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	68,42%			68,42%	
Ejec.	83,18%			83,18%	
Prog.					
Ejec.					
Prog.					
Ejec.					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fi

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora tipo trompo		1
vibrador de concretos		1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ----------

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----------

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ----------

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se instalo el acero para bordillos, cunetas, vigas y huellas para cincuenta (50) metros, ademas se realizo el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para esos mismo cincuenta (50) metros. Obteniendo un acomulado de noventa (90) metros lineales de placa huella (sin vaciado de concreto reforzado para bordillos).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con la instalacion de aceros para bordillos, cunetas, vigas y huellas, ademas de su respectivo vaciado de concreto reforzado de 21Mpa.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

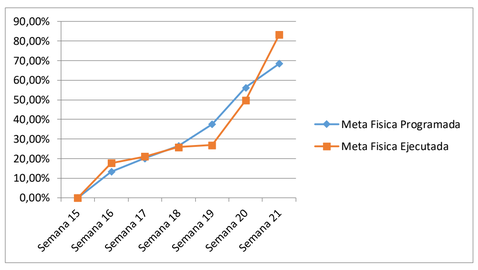

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mezclado de concreto reforzado 21Mpa



Acero de placa de transición




Placa huella



Placa huella



Placa huella

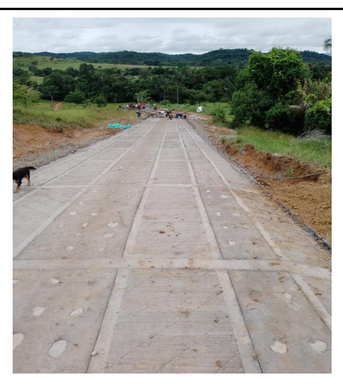

Placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Supervisar y verificar la instalacion de la formaleta, amarrado e instalacion de aceros Realizar toma de muestras de concreto.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 22 del 14-jun al 20-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No.	4143 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 203.603.516,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 203.603.516,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215.361.440,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 72.490.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 287.851.480,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203.603.516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203.603.516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203.603.516,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 183.233.341,00	90,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 187.350.406,00	92,02%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4.117.065,00	2,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.991.000,00	0,98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 183.233.341,00	90,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 189.341.406,00	93,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 6.108.065,00	3,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 43.936.378,00	21,58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.993.941,00	9,82%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171.570.100,69	59,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 171.570.100,69	59,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.155.948,21	5,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.155.948,21	5,96%

$ 171.570.100,69

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 90,00% — Avance o Atraso Físico %: 3,00%

Meta Física Ejecutada %: 93,00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	119,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	90,00%			90,00%	
Ejec.	93,00%			93,00%	
Prog.					
Ejec.					
Prog.					
Ejec.					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fi

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora tipo trompo		1
vibrador de concretos		1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ----------

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----------

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ----------

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se instalo el acero para bordillos, cunetas, vigas y huellas para veintinueve (29) metros y veinte (20) centimetros, ademas se realizo el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para esos mismos veintinueve (29) metros y veinte (20) centimetros. Terminando asi la placa huella (sin vaciado de concreto reforzado para bordillos).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara instalacion de formaletas para los bordillos de la placa huella, ademas de su respectivo vaciado de concreto reforzado de 21Mpa.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

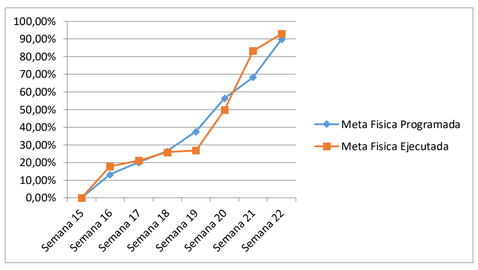

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Supervisar y verificar la instalacion de la formaleta, amarrado e instalacion de aceros Realizar toma de muestras de concreto.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 23 del 21-jun al 27-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No.	4143 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 203.603.516,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 203.603.516,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215.361.440,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 72.490.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 287.851.480,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203.603.516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203.603.516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203.603.516,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 203.603.516,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 198.915.541,00	97,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4.687.975,00)	-2,30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.991.000,00	0,98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 203.603.516,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 200.906.541,00	98,68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.696.975,00)	-1,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.370.175,00	10,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.565.135,00	5,68%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 190.942.505,29	66,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 188.726.048,90	65,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.493.824,91	6,73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.835.541,82	5,96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: -1,32%

Meta Física Ejecutada %: 98,68%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	119,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	100,00%			100,00%	
Ejec.	98,68%			98,68%	
Prog.					
Ejec.					
Prog.					
Ejec.					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fi

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora tipo trompo		1
vibrador de concretos		1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ----------

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----------

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ----------

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo instalacion de formaletas para los bordillos de la placa huella, ademas de su respectivo vaciado de concreto reforzado de 21Mpa.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se terminara de realizar el vaciado de concreto reforzado para los bordillos, y se realizara el relleno con material seleccionado de la región, Lo cual esta programado realizar antes del domingo treinta (30) de junio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

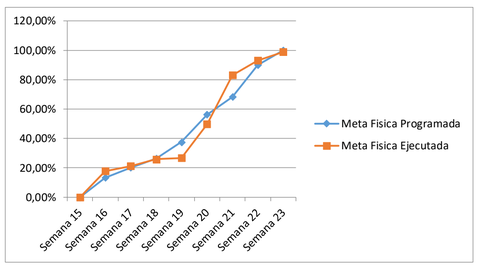

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Supervisar y verificar la instalacion de la formaleta, amarrado e instalacion de aceros Realizar toma de muestras de concreto.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/01/1900

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024

CONTRATO No. 4143 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES JUNIO																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Motoniveladora	CAT/VHP145	215 hp	VEREDA CERRITOS																															
Vibrocompactador	CASE	153 hp	VEREDA CERRITOS																															
Retro excavadora	CAT	110 hp	VEREDA CERRITOS																															
Mezcladora	FORTE	2 BLTO	VEREDA CERRITOS																															
Rana Compactadora	FORTE		VEREDA CERRITOS																															
Planta electrica	FORTE	2500 w	VEREDA CERRITOS																															
Motobomba	FORTE		VEREDA CERRITOS																															
Bomba Manual Esparsora	FORTE		VEREDA CERRITOS																															
Vibrador de Concreto			VEREDA CERRITOS																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	1	6	6	4	4	6	4	1	6	3	6	1	4	3	1	6	1	4	6	6	1	1	4	4	4	6	3	3	1	
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Hugo Antonio Urrego

Firma
Nombre: Hgo Antonio Urrego Ciprian
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0507307 NTS

Firma
Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 4143 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: SURA ARL **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMCAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	CC	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observa (Indicar nc de vaca incapacida licencias otr
1	Esneyder Adrian Ramirez Carrillo	1,010,061,991	Ayudante de Obra	$ 1,300,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1,300,000	$ 90,500	5	NUEVA EPS		$ 162,500	Proteccion		$ 208,000	$ 52,000	$ 26,000	$ 39,000	Retiro 30
2	Wilson Jose Villalba Blanco	18,878,604	Ayudante de Obra	$ 1,300,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1,300,000	$ 90,500	5	NUEVA EPS		$ 162,500	Colfondos		$ 208,000	$ 52,000	$ 26,000	$ 39,000	Retiro 30
3	Cenaida Urrego Martinez	1,122,236,593	Ayudante de Obra	$ 1,300,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1,300,000	$ 90,500	5	NUEVA EPS		$ 162,500	Porvenir		$ 208,000	$ 52,000	$ 26,000	$ 39,000	Retiro 30
4	Viviana Marcela Sanchez Urrego	1,007,585,090	Ayudante de Obra	$ 1,300,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1,300,000	$ 90,500	5	NUEVA EPS		$ 162,500	Proteccion		$ 208,000	$ 52,000	$ 26,000	$ 39,000	Retiro 30
5	Fredy Alexander Vacca Mondragon	1,122,237,984	Ayudante de Obra	$ 1,300,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1,300,000	$ 90,500	5	NUEVA EPS		$ 162,500	Porvenir		$ 208,000	$ 52,000	$ 26,000	$ 39,000	Retiro 30
6	Enaldo de Jesus Diaz Gutierrez	1,003,432,646	Ayudante de Obra	$ 1,300,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1,300,000	$ 90,500	5	NUEVA EPS		$ 162,500	Proteccion		$ 208,000	$ 52,000	$ 26,000	$ 39,000	Retiro 30
7	Heiler Johan Piñeros Urrego	1,122,236,245	Ayudante de Obra	$ 1,300,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1,300,000	$ 90,500	5	NUEVA EPS		$ 162,500	Porvenir		$ 208,000	$ 52,000	$ 26,000	$ 39,000	Retiro 30
8	Duvan Andres Rivera Bernal	1,006,723,523	Ayudante de Obra	$ 1,300,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1,300,000	$ 90,500	5	NUEVA EPS		$ 162,500	Porvenir		$ 208,000	$ 52,000	$ 26,000	$ 39,000	Retiro 30
9	Esteban Andres Rivera Bernal	1,120,955,346	Ayudante de Obra	$ 1,300,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1,300,000	$ 45,300	5	NUEVA EPS		$ 81,300	Porvenir		$ 104,000	$ 26,000	$ 13,000	$ 19,500	Retiro 15
10	Floriberto Rios Romero	86,035,803	Maestro	$ 2,320,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 2,320,000	$ 161,500	5	NUEVA EPS		$ 290,000	Proteccion		$ 371,200	$ 92,800	$ 46,400	$ 69,600	Retiro 30
11	Juan Luis Muñoz Torres	1,073,968,309	Ayudante de Obra	$ 1,300,000			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1,300,000	$ 39,300	5	NUEVA EPS		$ 70,500	Porvenir		$ 90,200	$ 22,600	$ 11,300	$ 17,000	Retiro 15

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cu corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conform normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Hugo Antonio Urrego

Firma
Nombre:HUGO ANTONIO URREGO CIPRIAN
Director de Obra
Matrícula Profesiona 121037-0507307 NTS

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

FR-6

)

NITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ıciones
ɔvedades
ciones,
ıd, retiros,
s, entre
ɔs)

de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio

ıales deben

nidad con la

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

PRESUPUESTO GENERAL

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Nº1 — **FECHA DE ELABORACIÓN** 30/06/2024

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	30 DE OCTUBRE DEL 2023	**PLAZO ACUMULADO**	
FECHA DE ORDEN DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DEL 2023	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	30/12/2024
PLAZO ADICIONAL AL CONTRATO DEL CONTRATO:	30 DE ABRIL DEL 2024	**FECHA DE REANUDACION**	23/01/2024
VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 204.603.516,00	**FECHA DE PRORROGA**	
VALOR TOTAL ACUMULADO :	$ 204.603.516,00	**VALOR INICIAL (incluido IVA) CONTRATO**	$ 204.603.516,00
		VALOR TOTAL ACUMULADO CONTRATO	$ 204.603.516,00

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCION TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
GUAVIARE	EL RETORNO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS	2,70	META	29/08/2023

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO CONTRATADAS INICIALMENTE									CONDICIONES INICIALES CON PRECIOS ACTUALIZADOS 2024	BALANCE GENERAL		ACTA DE AVANCE #2	
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL EJECUTADO
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE													
1	800.1P	800-13	X	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	6,00	$ 31.318,17	$ 187.909,00	$ 34.427,41	6,00	$ 206.565,00		
							SUB-TOTAL	**$ 187.909,00**		**SUB-TOTAL**	**$ 206.565,00**		
				DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS									
2	200.2	200-13		Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	1,00	$ 168.918,33	$ 168.918,00	$ 174.913,70	0,20	$ 34.983,00	$ 0,20	$ 34.983,00
							SUB-TOTAL	**$ 168.918,00**		**SUB-TOTAL**	**$ 34.983,00**		**$ 34.983,00**
							SUB-TOTAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	**$ 356.827,00**			**$ 241.548,00**		**$ 34.983,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO													
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada: 120,0 metros													
3	310.1			Conformación De La Calzada Existente	M2	780,00	$ 1.630,91	$ 1.272.110,00	$ 1.333,97	596	$ 795.044,00	596,00	$ 795.044,00
4	320.3.1	320-13		Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	129,30	$ 185.588,20	$ 23.996.554,00	$ 333.997,34	115,60	$ 38.610.092,00	115,60	$ 38.610.092,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto Reforzado Resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	79,10	$ 914.119,31	$ 72.306.837,00	$ 948.670,44	73,40	$ 69.632.411,00	73,40	$ 69.632.411,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	52,80	$ 536.783,45	$ 28.342.166,00	$ 725.754,31	26,90	$ 19.522.791,00	26,90	$ 19.522.791,00
7	640.1	640-13		Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3709,50	$ 6.262,28	$ 23.229.933,00	$ 5.911,96	3157,80	$ 18.668.789,00	3.157,80	$ 18.668.789,00
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	5,20	$ 34.887,77	$ 181.416,00	$ 35.047,49	3,90	$ 136.685,00	$ 2,50	$ 87.619,00
9	610.3	320-3		Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	35,00	$ 187.998,85	$ 6.579.960,00	$ 187.998,85	0,00	$ -		$ -
				ITEM NUEVOS									
10	10.1	NUEVO		Relleno Conmaterial Seleccionado De La Region	M3				$ 196.148,65	36,0	$ 7.058.443,00		$ -
11	10,20	NUEVO		Transporte de Maquinaria Para La Conformacion De La Calzada	UND				$ 1.600.000,00	1,00	$ 1.600.000,00	1,00	$ 1.600.000,00
							SUB-TOTAL	**$ 155.908.976,00**		**SUB-TOTAL**	**$ 156.024.255,00**	**$**	**148.916.746,00**
							SUB TOTAL BÁSICO DE OBRA: (SECCIONES 1 Y 2)	**$ 156.265.803,00**		**SUB TOTAL BÁSICO DE OBRA: (SECCIONES 1 Y 2)**	$ 156.265.803,00	$	148.951.729,00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.687.975,00**		**PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)**	$ 4.687.975,00		
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 42.649.738,00**		**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	$ 42.649.738,00	$	42.649.738,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 203.603.516,00**		**VALOR ESTIMADO CONVENIO**	**$ 203.603.516,00**	**$**	**191.601.467,00**

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203.603.516,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 172.958.046,13
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 148.951.729,00
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (24.006.317,13)
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$ 42.649.738,00
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 172.958.046,13
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 191.601.467,00
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 18.643.420,87
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: (%)	9,16%
PORCENTAJE DE EJECUCION (%)	94,11%

Observaciones:

Hugo Antonio Urrego

Actualizo

Nombre: Ing. Hugo Antonio Urrego Ciprian
Cargo: Residente de Obra
Matrícula Profesional: 121037-0507307 NTS

Isidoro Gonzalez

Aprobo

Nombre: Isidoro Gonzales Morera
Cargo: Representante legal JAC CERRITOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 30/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 4143 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco																																16
Lluvias moderadas																																12
Lluvias intensas																																2
Total horas	24	24	4	8	5	2	8	6	10	4	12	12	24	8	10	24	24	24	12	6	12	8	12	12	8	24	12	24	8	12		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Durante el mes de mayo se presentaron fuertes lluvias las cuales generaron complicaciones en obra, se presentaron grandes perdidas de material petreo, debido a la escorrentia de agua, afectaciones durante las actividades de concretos.

Firma: Hugo Antonio Urrego

Nombre: HUGO ANTONIO URREGO CIPRIAN
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0507307 NTS

Firma

Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
			VERSIÓN	1
			PAGINA	1-Jan

FECHA: 5/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No.: 4143 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024 **PROYECTO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha de Toma De Muestra (Día/Mes/Año)	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo(PSI)	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA										
1	5/24/2024	5/31/2024	CONCRETO CICLOPEO DE 2000PSI ABS K0+0 HASTA K0+30	NTC 673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CERRITOS	1		1512.05	SI	NO
	5/24/2024	6/7/2024	CONCRETO CICLOPEO DE 2000PSI ABS K0+0 HASTA K0+30	NTC 673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CERRITOS	1		2268.61	SI	NO
	5/24/2024	6/21/2024	CONCRETO CICLOPEO DE 2000PSI ABS K0+0 HASTA K0+30	NTC 673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CERRITOS	1		2591.57	SI	NO
2	5/28/2024	6/4/2024	CONCRETO CICLOPEO DE 2000PSI ABS K0+60 HASTA K0+90	NTC 673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CERRITOS	1		1520.26	SI	NO
	5/28/2024	6/11/2024	CONCRETO CICLOPEO DE 2000PSI ABS K0+60 HASTA K0+90	NTC 673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CERRITOS	1		2275.01	SI	NO
	5/28/2024	6/25/2024	CONCRETO CICLOPEO DE 2000PSI ABS K0+60 HASTA K0+90	NTC 673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CERRITOS	1		260.34	SI	NO
3	5/31/2024	6/7/2024	CONCRETO HUELLAS DE 3000PSI ABS K0+0 HASTA K0+30	NTC 673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CERRITOS	1		1845.6	SI	NO
	5/31/2024	6/14/2024	CONCRETO HUELLAS DE 3000PSI ABS K0+0 HASTA K0+30	NTC 673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CERRITOS	1		2737.25	SI	NO
	5/31/2024	6/28/2024	CONCRETO HUELLAS DE 3000PSI ABS K0+0 HASTA K0+30	NTC 673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CERRITOS	1		3087.55	SI	NO
4	6/10/2024	6/17/2024	CONCRETO HUELLAS DE 3000PSI ABS K0+30 HASTA K0+50	NTC 673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CERRITOS	1		1837.06	SI	NO
	6/10/2024	6/24/2024	CONCRETO HUELLAS DE 3000PSI ABS K0+30 HASTA K0+50	NTC 673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CERRITOS	1		2731.34	SI	NO
	6/10/2024	7/8/2024	CONCRETO HUELLAS DE 3000PSI ABS K0+30 HASTA K0+50	NTC 673-2022	PLACA HUELLA VEREDA CERRITOS	1		3083.61	SI	NO
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA										

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma Hugo Antonio Urrego

Nombre: HUGO ANTONIO URREGO CIPRIAN
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0507307 NTS

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GEOLAB IMEG
LABORATORIO DE SUELOS Y GEOTECNIA

ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD
NTC 673-2022

LAB-F-10	
VER-01	
FECHA	1/12/2023


CONTRATO DE OBRA: N/A	OBJETO:	"Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vias y la junta de acción comunal de la vereda Cerritos del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

CLIENTE	JUNTA DE ACCION COMUNAL CERRITOS	NIT	901282150-4
LOCALIZACIÓN	VEREDA CERRITOS - EL RETORNO	RESISTENCIA	Fc= 2500 PSI


ELEMENTO 1	FECHA DE FUNDICIÓN	FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)				GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS		ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)	RESULTADOS DE RESISTENCIA							
									7 DÍAS		14 DÍAS		28 DÍAS		T - 28 DIAS	
		7	14	28	T	ALTO (cm)	DIAMETRO (cm)		FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)
CONCRETO CICLOPEO ABS 00+000 - 00+030	24/05/2024	31/05/2024	7/06/2024	21/06/2024	-	30	15	176,715	184,23	1512,05	276,41	2268,61	315,76	2591,57	316,13	2594,61
RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)			2500,00			PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)			60,48%		90,74%		103,66%		103,78%	

ELEMENTO 2	FECHA DE FUNDICIÓN	FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)				GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS		ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)	RESULTADOS DE RESISTENCIA							
									7 DÍAS		14 DÍAS		28 DÍAS		T - 28 DIAS	
		7	14	28	T	ALTO (cm)	DIAMETRO (cm)		FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)
CONCRETO CICLOPEO ABS 00+060 - 00+090	28/05/2024	4/06/2024	11/06/2024	25/06/2024	-	30	15	176,715	185,23	1520,26	277,19	2275,01	316,95	2601,34	317,95	2609,55
RESISTENCIA DE LA MEZCLA DISEÑADA (PSI)			2500,00			PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)			60,81%		91,00%		104,05%		104,38%	

CONCRETO CICLOPEO
ABS 00+000 - 00+030

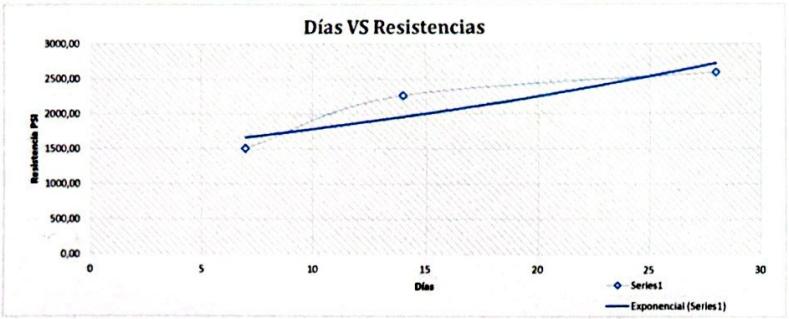

CONCRETO CICLOPEO
ABS 00+060 - 00+090

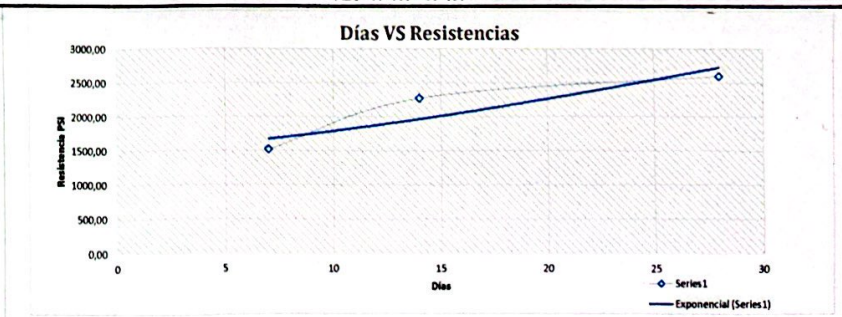

OBSERVACIONES: Los cilindros ensayados fueron elaborados en obra ; despues de realizar la recepción de los cilindros en laboratorio, se procedio a continuar con el curado de los mismos y la rotura según los terminos establecidos.

FECHA DE ENTREGA 16/07/2024

Ing. Laura Gomez
Director de Laboratorio

Powered by CamScanner

GEOLAB IMEG
LABORATORIO DE SUELOS Y GEOTECNIA

ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD
NTC 673-2022

LAB-F-10	
VER-01	
FECHA	1/12/2023


CONTRATO DE OBRA: N/A	OBJETO:	"Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vias y la junta de acción comunal de la vereda Cerritos del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

CLIENTE	JUNTA DE ACCION COMUNAL CERRITOS	NIT	901282150-4
LOCALIZACIÓN	VEREDA CERRITOS - EL RETORNO	RESISTENCIA	Fc= 3000 PSI


ELEMENTO 1	FECHA DE FUNDICIÓN	FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)				GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS		ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)	RESULTADOS DE RESISTENCIA							
									7 DÍAS		14 DÍAS		28 DÍAS		T - 28 DIAS	
		7	14	28	T	ALTO (cm)	DIAMETRO (cm)		FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)
CONCRETO HUELLAS ABS 00+000 - 00+030	31/05/2024	7/06/2024	14/06/2024	28/06/2024	-	30	15	176,715	224,87	1845,60	333,51	2737,25	376,19	3087,55	375,16	3079,09
RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)			3000,00			PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)			61,52%		91,24%		102,92%		102,64%	

ELEMENTO 2	FECHA DE FUNDICIÓN	FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)				GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS		ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)	RESULTADOS DE RESISTENCIA							
									7 DÍAS		14 DÍAS		28 DÍAS		T - 28 DIAS	
		7	14	28	T	ALTO (cm)	DIAMETRO (cm)		FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)	FUERZA (KN)	RESISTENCIA (PSI)
CONCRETO HUELLAS ABS 00+030 - 00+050	10/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	8/07/2024	-	30	15	176,715	223,83	1837,06	332,79	2731,34	375,71	3083,61	377,29	3096,57
RESISTENCIA DE LA MEZCLA DISEÑADA (PSI)			3000,00			PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)			61,24%		91,04%		102,79%		103,22%	

CONCRETO HUELLAS
ABS 00+000 - 00+030

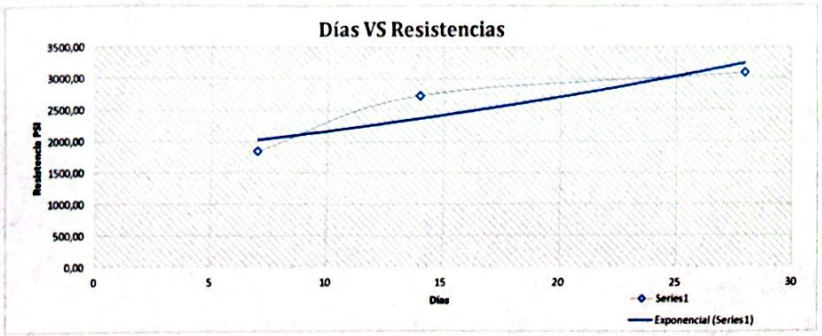

CONCRETO HUELLAS
ABS 00+030 - 00+050

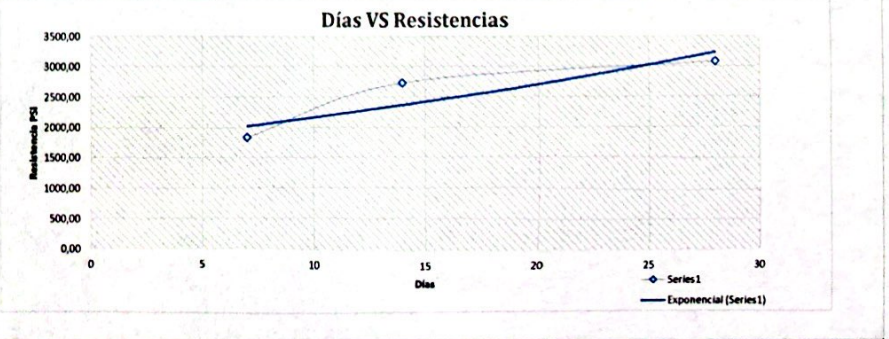

OBSERVACIONES:	Los cilindros ensayados fueron elaborados en obra ; despues de realizar la recepción de los cilindros en laboratorio, se procedio a continuar con el curado de los mismos y la rotura según los terminos establecidos.

FECHA DE ENTREGA	16/07/2024

Ing. Laura Gomez
Director de Laboratorio

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 4143 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 203.603.516,00

VALOR ACUMULADO: $ 203.603.516,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.920.703,20	30	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.230.175,80	30	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 61.381.054,80	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037060

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009844 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/11/2023

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.920.703,20	30	12	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.230.175,80	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 61.381.054,80	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037060

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	30	10	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009844 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.920.703,20	30	4	2024	15	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.230.175,80	30	4	2024	15	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 61.381.054,80	15	7	2024	15	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037060

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	30	10	2023	15	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009844 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE COMITÉ
CERRITOS

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 07	**Dirección Territorial INVIAS: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES.**	**Fecha: 06/06/2024**

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Cerritos, El Retorno, Guaviare.
No. Convenio(s) Solidario(s): 4143 de 2023.
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal Cerritos.

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	**Institución u Organización**	**Cargo**
Isidoro González	JAC Cerritos	Presidente
Jose Ramiro Quiceno	JAC Cerritos	Veedor
Jineth Moreno Perdomo	JAC Cerritos	Contadora
Hugo Antonio Urrego	JAC Cerritos	Ing. Residente de obra
Javier Barrero	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Representante Legal
Wualner Raúl López González	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Ing. Residente de interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Presentación de los participantes
2. Aprobación de desembolsos.

AGENDA DEL COMITÉ: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Presentación de los asistentes.
2- Aprobación de desembolsos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Resumen
1.	Presentación de los asistentes: siendo las 05:15 PM se da inicio al comité operativo, Asisten al comité por la JAC de la vereda Cerritos el Presidente, Isidoro González; el Veedor, Jose Ramiro Quiceno; la Contadora, Jineth Moreno Perdomo; el Residente de Obra, Hugo Antonio Urrego y por parte de la interventoría asisten el Director de Obra, Gabriel Velázquez; el Residente de Obra, Wualner Lopez y el representante legal, Javier Barrero.
2.	Se presentan la relación de facturas y/o cuentas de cobro para aprobación y orden de pago para la obra: 2.1. Orden de Pago 018 - Nómina mes de mayo por $ 4.697.053 2.2. Orden de Pago 019 – Planilla seguridad social por $ 2.009.500 2.3. Orden de Pago 020 – Materiales de ferretería por $ 10.289.382 2.4. Orden de Pago 021 – Compra de arena por $336.000 2.5. Orden de Pago 022 – Pago de honorarios residente de obra por $ 3.675.000 2.6. Orden de Pago 023 – Nómina primera quincena de junio por $ 7.938.200 2.7. Orden de Pago 024 – Pago de retenciones y actualización de pólizas por $204.034

	2.8. Orden de Pago 025 – Alimentación trabajadores mayo y quincena junio por $4.400.000

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
	Luego de ser revisadas y discutidas cada una de las ordenes de compra, se aprueban los desembolsos por parte de los miembros del comité operativo de las siguientes órdenes de pago: 2.1. Se aprueba pago de la nómina de los trabajadores durante el periodo de mayo a nombre de la JAC Caño Bonito, su representante legal Isidoro González por el valor de $ 4.697.053. 2.2. Desembolso por concepto de pago de seguridad social de obra entre mes de mayo de 2024 por el valor de 2.009.500 a nombre de la JAC Caño Bonito, su representante legal Isidoro González. 2.3. Desembolso a FERRETERIA S&F ZOMAC SAS de $ 10.289.382 por concepto de compra de materiales de ferretería. 2.4. Desembolso a Cantera Lajitas SAS de $ $336.000 por concepto de compra de arena. 2.5. Desembolso a Hugo Antonio Urrego por $ 3.675.000 por concepto de Pago de honorarios residente de obra 30%. 2.6. Pago de la nómina de los trabajadores durante el periodo 01/06 a 15/06 de 2024 a nombre de la JAC Caño Bonito, su representante legal Isidoro González por el valor de $ $ 7.938.200. 2.7. Desembolso por concepto de pago de retenciones y actualización de pólizas por el valor de $204.034 a nombre de la JAC Caño Bonito, su representante legal Isidoro González. 2.8. Desembolso a favor de Edilson Mateus Martinez de $ 1.300.000,00 por concepto de Alimentación trabajadores mayo y quincena junio por $4.400.000.
2.	

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos			
1.	Informe Técnico de Avance:	SI ____	NO __x__	No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera:	SI ____	NO __x__	No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO __x__	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI ____	NO __x__	No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Órdenes de compra de las compras aprobadas	JAC Cerritos	24/05/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES.

Isidoro Gonzalez

Nombre: Isidoro González
Cargo: Presidente JAC Cerritos

Nombre: Jose Ramiro Quiceno
Cargo: Representante de Veeduría

Hugo Antonio Urrego

Nombre: Jineth Moreno Perdomo
Cargo: Contadora JAC Cerritos

Nombre: Hugo Antonio Urrego
Cargo: Ing. Residente de obra

GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: Javier Barrero
Cargo: R/L Interventoría

Nombre: Gabriel Hernán Velásquez
Cargo: Director de Interventoría

Nombre: Wualner Raúl López González
Cargo: Residente de Interventoría

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

CONVENIO SOLIDARIO No. 4240 DE 2023 JAC VEREDA EL RECREO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1 de 1
		PÁGINA	

FECHA 05/05/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL: ÓN TERRITORIAL:** META

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4240 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

JUSTIFICACIÓN:
N.A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 MARZO	VR. MES 2 ABRIL	VR. MES 3 MAYO	VR. MES 4 JUNIO	VR. MES 4 JULIO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		$ 4.190.000		$ 1.929.600		$ 6.119.600	3,0%
2	MATERIALES		$ 42.627.500		$ 11.508.250		$ 54.135.750	26,9%
3	TRANSPORTE		$ 15.410.800		$ 10.062.800		$ 25.473.600	12,7%
4	MANO DE OBRA			$ 10.993.820	$ 27.613.300	$ 16.609.843	$ 55.216.963	27,5%
5	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL					$ 4.584.623	$ 4.584.623	2,3%
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.791.146	$ 7.022.200	$ 1.975.740	$ 9.982.500	$ 18.864.372	$ 42.635.958	21,2%
7	MAQUINARIA		$ 4.320.000	$ -	$ 4.320.000	$ 3.234.850	$ 11.874.850	5,9%
8	APORTE OAC			$ 1.000.000			$ 1.000.000	0,5%
	TOTAL	**$ 4.791.146**	**$ 73.570.500**	**$ 13.969.560**	**$ 65.416.450**	**$ 43.293.688**	$ 201.041.344	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Hector Manuel Vacca
Nombre:Hector Manuel Vacca Pinilla
Representante legal de la JAC vereda el recreo-Retorno
Contratista

Firma:
Nombre:Javier Barrero M
Representante Legal
Interventoria
Matrícula Profesional No.:22202-368027 CND

Firma: Pedro Ramirez B
Nombre:Pedro Antonio Ramirez Bayer
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:25202-305140 CND

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 De 2

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VEREDA EL RECREO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 4 **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

CONVENIO No. 4240-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 0,34 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 67.516.650,08** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO: OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR:

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
F.ELECTRONICA FUV 2	0,021	10-jun-24	LEONARDO DIAZ ORTIZ	$ 9.962.172,00	1;2;3	TRANSPORTE MATERIAL RELLENO Y EXCAVACION
F.ELECTRONICA FUV 2	0,022	10-jun-24	VLADIMIR VERA OYOLA	$ 4.174.790,00	1;2;3	MAQUINARIA
F.ELECTRONICA N FE 129	0,023	10-jun-24	FERRETERIA S&F ZOMAC S.A.S	$ 3.853.816,00	630.1.4.1; 630.1.6; 640.1;4	Compra de Materiales "Cemento, alambre negro y Acero"
F.ELECTRONICA	0,024	10-jun-24	CANTERA LAJITAS	$ 7.439.250,00	3	Relleno morado
F.ELECTRONICA N FE 129	0,025	10-jun-24	AGROVETERINARIA EL ALCARAVAN	$ 1.852.400,00	630.1.4.1; 630.1.6;3;4;5	alquiler equipos
F.ELECTRONICA	0.026-0.031	10-25/06/2024	WILMER LEANDRO	$ 2.296.800,00	1.14;1.14.1	NOMINA
F.ELECTRONICA N FE 129	0.026-0.031	10-25/06/2024	JUAN DE JESUS	$ 2.136.000,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0.026-0.031	10-25/06/2024	MAICOL DAVID	$ 1.358.000,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0.026-0.031	10-25/06/2024	RUBEN CAMILO	$ 1.358.000,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0.026-0.031	10-25/06/2024	CARLOS JULIO	$ 1.358.000,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0.026-0.031	10-25/06/2024	EDIXON ORLANDO	$ 1.358.000,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0.026-0.031	10-25/06/2024	MARCOS FIDEL	$ 1.358.000,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0.026-0.031	10-25/06/2024	YILFER ANDRES	$ 1.358.000,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0.026-0.031	10-25/06/2024	ELBIN ALEXANDER	$ 1.358.000,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0.026-0.031	10-25/06/2024	JHON JAIRO ROMERO	$ 1.358.000,00		NOMINA
	0,027	10-jun-24	MARIA CHIQUINQUIRA LINARES	$ 6.220.500,00		ALIMENTACION
F.ELECTRONICA FUV 2	0,028	10-jun-24	RAMIREZ BAYER PEDRO ANTONIO	$ 3.333.000,00	1,1	Segudo pago ingeiero
	0,030	10-jun-24	VACCA PINILLA HECTOR MANUEL	$ 697.722,08		retenciones
	0,032	25-jun-24	VACCA PINILLA HECTOR MANUEL	$ 6.253.200,00		planilla
	0,033	25-jun-24	MARIA CHIQUINQUIRA LINARES	$ 2.895.000,00		ALIMENTACION
F.ELECTRONICA FUV 2	0,034	25-jun-24	LUZ DARYSANTAMARIA VARGAS	$ 2.100.000,00	1,3	primer pago contador
F.ELECTRONICA FUV 2	0,035	25-jun-24	RAMIREZ BAYER PEDRO ANTONIO	$ 3.333.000,00	1,1	tercer pago ingeiero
	0,030	25-jun-24	VACCA PINILLA HECTOR MANUEL	$ 105.000,00		retenciones

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
6	**COSTOS ADMINISTRATIVOS**					
1	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 27.963.295,00	$ 4.225.740,00	$ 12.082.500,00	$ 16.308.240,00	$ 11.655.055,00
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION	$ 2.381.000,00	$ 2.381.000,00		$ 2.381.000,00	$ -
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ 1.435.000,00	$ 952.000,00		$ 952.000,00	$ 483.000,00
4	GASTOS BANCARIOS	$ 1.311.283,00				
5	OTROS GASTOS	$ 9.545.380,00	$ 6.230.346,00		$ 6.230.346,00	$ 3.315.034,00
	PRESUPUESTO DE OBRA					$ -
1	EQUIPOS	$ 6.119.600,00	$ 4.190.000,00	$ 1.929.600,00	$ 6.119.600,00	$ -
2	MATERIALES	$ 54.135.750,00	$ 42.627.500,00	$ 11.508.250,00	$ 54.135.750,00	$ -
3	TRANSPORTE	$ 25.473.600,00	$ 15.410.800,00	$ 10.062.800,00	$ 25.473.600,00	$ -
4	MANO DE OBRA	$ 55.216.963,00	$ 10.993.820,00	$ 27.613.300,00	$ 38.607.120,00	$ 16.609.843,00
7	MAQUINARIA	$ 11.874.850,00	$ 4.320.000,00	$ 4.320.000,00	$ 8.640.000,00	$ 3.234.850,00
8	APORTE OAC	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	$ -
	TOTALES	**$ 196.456.721,00**	**$ 92.331.206,00**	**$ 67.516.450,00**	**$ 159.847.656,00**	**$ 35.297.782,00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) : $ 88.118,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 225.653,00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

Se presentara informe de rendimientos financieros en el proximo mes ya que el banco expide los certificados los primeros 7 días de cada mes

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Hector Manuel vacca
Nombre:Hector Manuel Vacca Pinilla
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma: Pedro Ramirez B
Nombre:PEDRO RAMIREZ BAYER
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-305140 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMES SEMANALES
EL RECREO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 20 del 31-may al 6-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No. 4240 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.041.344,00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.041.344,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: 215.361.440,00 $

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: 215.361.440,00 $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024 — VALOR ANTICIPO: - $

, — VALOR AMORTIZADO: - $

SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.041.344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.041.344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.041.344,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 86.017.777,92	43,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 72.537.800,00	36,26%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (13.479.977,92)	-6,74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.991.000,00	1,00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 86.017.777,92	43,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 74.528.800,00	37,257%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (11.488.977,92)	-5,74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.005.374,72	13,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40.755.323,75	20,37%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 178.836.139,78	83,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 143.129.213,02	66,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.763.704,21	10,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.263.403,31	5,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 43,00% — Avance o Atraso Físico % -5,74%

Meta Física Ejecutada % 37,26%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1.5X1.5 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	43,00%			43,00%	
Ejec	37,26%			37,26%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se termino la instalacion del acero de los box culvert 3(1x1) y 4(1.5x1.5), se realizo el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para la placa del piso del box culvert. Ademas se instalo la formaleta para el vaciado de concreto reforzado para el cuerpo del box culvert.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará el mezclado y vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para los Box culvert 3(1x1) y 4(1.5x1.5).

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

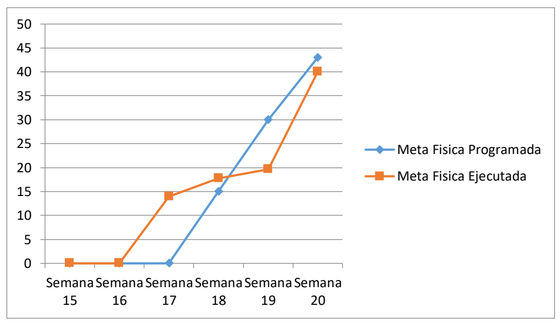

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Boxculvert No. 3 (1x1) Placa de concreto refrozado.



Boxculvert No. 3 (1x1) formaleta instalada



mezclado del concreto reforzado 21Mpa



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5) vaciado de concreto reforzado



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5) Placa de concreto reforzado



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5) Placa de concreto reforzado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Realizar seguimiento al plan de inversión y programacion de obra. Verificar la instalación del acero figurado. Supervisar el cumplimiento del diseño de mezcla.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 21 del 7-jun al 13-jun — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No. 4240 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.041.344,00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.041.344,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: 215.361.440,00 $

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: 215.361.440,00 $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024 — VALOR ANTICIPO: - $

VALOR AMORTIZADO: - $

SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.041.344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.041.344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.041.344,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 100.020.672,00	50,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 102.545.672,00	51,26%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.525.000,00	1,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.991.000,00	1,00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 100.020.672,00	50,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 104.536.672,00	52,26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.516.000,00	2,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.002.894,08	7,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 30.007.872,00	15,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201.578.307,84	93,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 154.414.152,48	71,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.763.704,21	10,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.263.403,31	5,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 50,00% — Avance o Atraso Físico % 2,26%

Meta Física Ejecutada % 52,26%

Meta Física (Programa de Obra)			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1.5X1.5 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	50,00%			50,00%	
Ejec	52,26%			52,26%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para los box culvert 3(1x1) y 4(1.5x1.5).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará los aproches para los box culvert 3(1x1) y 4(1.5x1.5), con materal de relleno seleccionado de la región. Ademas de las excavaciones para los box culvert 1(1x1) y 2(1x1)

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

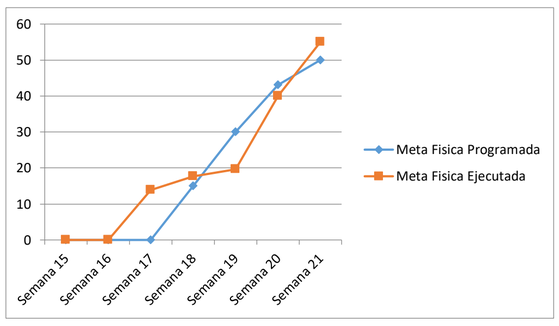

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5)



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5)



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5)



Boxculvert No. 3 (1x1)



Boxculvert No. 3 (1x1)



Boxculvert No. 3 (1x1)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Realizar seguimiento al plan de inversión y programacion de obra.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 22 del 14-jun al 20-jun — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO		
CONVENIO No.	4240 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.041.344,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.041.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	215.361.440,00 $
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	72.490.040,00 $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	287.851.480,00 $
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	- $
		VALOR AMORTIZADO:	- $
		SALDO POR AMORTIZAR:	- $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.041.344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.041.344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.041.344,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136.028.113,92	68,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 118.539.891,00	59,26%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (17.488.222,92)	-8,74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.991.000,00	1,00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 136.028.113,92	68,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 120.530.891,00	60,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (15.497.222,92)	-7,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 36.007.441,92	18,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.994.219,00	8,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171.570.100,69	59,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 171.570.100,69	59,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.155.948,21	5,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.155.948,21	5,96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 68,00% — Avance o Atraso Físico %: -7,75%

Meta Física Ejecutada %: 60,25%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1.5X1.5 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	68,00%			68,00%	
Ejec	60,25%			60,25%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron los aproches con material de relleno selleccionado de la region, para los Box culert 3(1x1-9 y 4(1.5x1.5), Ademas se realizo las Excavaciones y vaciado de concreto liviano (solado) para los Box culvert 1(1x1) y 2(1x1)

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la instalacion del acero figurado y se procedera a vaciar concreto reforzado para el piso del boxculvert.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

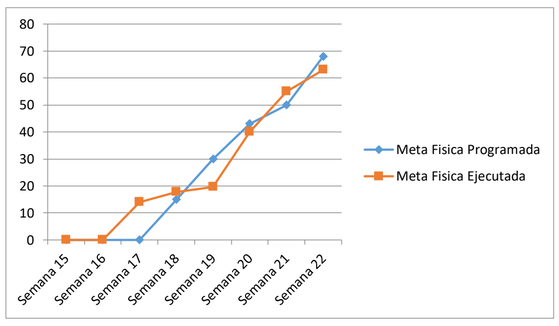

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Aproche Boxculvert No. 3(1x1)



Aproche Boxculvert No. 4(1.5x1.5)



Ubicación Boxculvert No. 2(1x1)



Ubicación Boxculvert No. 1(1x1)



Boxculvert No. 2(1x1)



Boxculvert No. 1(1x1)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Realizar seguimiento al plan de inversión y programacion de obra.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 23 del 21-jun al 27-jun — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No. 4240 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.041.344,00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.041.344,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: 215.361.440,00 $

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: 72.490.040,00 $

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: 287.851.480,00 $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024 — VALOR ANTICIPO: - $

VALOR AMORTIZADO: - $

SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.041.344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.041.344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.041.344,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 154.031.834,88	77,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 152.327.203,00	76,15%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.704.631,88)	-0,85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.991.000,00	1,00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 154.031.834,88	77,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 154.318.203,00	77,14%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 286.368,12	0,14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.003.720,96	9,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.787.312,00	16,89%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 190.942.505,29	66,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 188.726.048,90	65,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.493.824,91	6,73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.835.541,82	5,96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 77,00% — Avance o Atraso Físico % 0,14%

Meta Física Ejecutada % 77,14%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1.5X1.5 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	77,00%			77,00%	
Ejec	77,14%			77,14%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo instalacion del acero figurado para los Box culvert No. 1 y No. 2, Se realizo el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para la placa inferiro de los dos box culvert No. 1 y No. 2, se instalo formaleta y se realizo el vaciado de concreto reforzado para el Box culvert No. 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se instalara la formaleta y se realizará el vaciado de concreto reforzado para el Box culvert No. 2.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

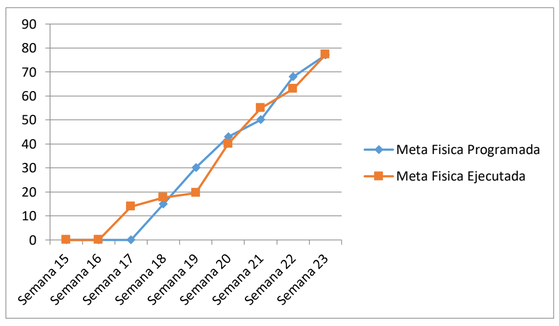

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Boxculvert No. 1(1x1). Instalacion de acero figurado



Boxculvert No. 1(1x1) vaciado de conreto reforzado 21Mpa



Boxculvert No. 1(1x1) instalacion de formaleta.



Boxculvert No. 2(1x1) Replanteo de acero figurado



Boxculvert No. 2(1x1). Instalacion de acero figurado



Boxculvert No. 2(1x1). Instalacion de acero figurado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Realizar seguimiento al plan de inversión y programacion de obra. Verificar la instalación del acero figurado. Realizar toma de muetras del Concreto de 21Mpa	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	01/01/1900

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4240 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE MAYO																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Motoniveladora																																
Vibrocompactador																																
Retro excavadora	CAT	110 hp	VEREDA EL RECREO																													
Mezcladora	SUKIYAMA	1 1/2 BLTO	VEREDA EL RECREO																													
Rana Compactadora	BRIGGS & STRATTON	9 hp	VEREDA EL RECREO																													
Planta electrica	WARRIOR	2500 w	VEREDA EL RECREO																													
Motobomba	FORTE	16hp	VEREDA EL RECREO																													
Bomba Manual Espa.																																
Vibrador de Concreto		2,4hp	VEREDA EL RECREO																													
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL ACTIVO				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL EN REPARACIÓN																																
TOTAL INACTIVO																																

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	6	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: PEDRO RAMIREZ BAYER
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-305140 CND

Firma

Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 4240 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMCAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	WILMER LEANDRO	1122678047	MAESTRO	$ 2,320,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
2	JUAN DE JESUS	18221608	OFICIAL	$ 2,100,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
3	MAICOL DAVID	1122236979	AYUDANTE	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
4	RUBEN CAMILO	1122236287	AYUDANTE	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PROTECCION	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
5	CARLOS JULIO	1111452611	AYUDANTE	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
6	EDIXON ORLANDO	1122239773	AYUDANTE	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
7	MARCOS FIDEL	18235424	AYUDANTE	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
8	YILFER ANDRES	1006811965	AYUDANTE	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
9	ELBIN ALEXANDER	1069900249	AYUDANTE	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
10	JHON JAIRO ROMERO	1006783397	AYUDANTE	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PROTECCION	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 31/05/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: PEDRO RAMIREZ BAYER
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-305140 CND

Firma
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ACATA DE AVANCE N° 1

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	30 DE OCTUBRE DEL 2023	PLAZO ACUMULADO	221 DIAS
FECHA DE ORDEN DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DEL 2023	PLAZO DE SUSPENSIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL AL CONTRATO DEL CONTRATO:	30 DE ABRIL DEL 2024	FECHA DE REANUDACION	23 DE ENERO DE 2024
VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 200,041,344.00	FECHA DE PRORROGA	30 DE ABRIL DEL 2024
VALOR TOTAL ACUMULADO :	$ 200,041,344.00	VALOR INICIAL (incluido IVA) CONTRATO	$ 200,041,344.00
		VALOR TOTAL ACUMULADO CONTRATO	

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCION TERRITORIAL	FECHA ELABORACION	FECHA PRESENTE ACTA
GUAVIARE	RETORNO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO	4.20	META	08/07/2023	30/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO									CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA1		AVANCE MES ANTERIOR		AVANCE PRESENTE MES		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
INFORMACION CONTRACTUAL																		
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																		
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																		
1	800.1P	800-13	X	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	30.00	$ 31,318.17	$ 939,545.00	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
							SUB-TOTAL	$ 939,545.00										$ -
							SUB-TOTAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	$ 939,545.00										
CONSTRUCCION DE (1) BOX CULVERT DE 2M X2M																		
2	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	10.20	$ 34,887.77	$ 355,855.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3	600.2.1	600-13		Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	1.80	$ 64,851.27	$ 116,732.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
4	610.1	610-13		Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin	M3	7.70	$ 171,331.68	$ 1,319,254.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
5	630.1.4.1	630-13		Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	22.90	$ 914,119.31	$ 20,933,332.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
6	630.1.6	630-13		Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	5.00	$ 540,230.62	$ 2,701,153.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7	640.1	640-13		Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2456.80	$ 6,262.28	$ 15,385,173.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
8	610.3	320-3		Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50	M3	590.80	$ 187,998.85	$ 111,069,719.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
							SUB-TOTAL	$ 151,881,218.00										$ -
				ITEMS COMPLEMENTARIOS														
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																		
CONSTRUCCION DE (3) BOX CULVERT DE 1M X1M X 6M																		
1	1.00		X	Excavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y	M3		$ 36,227.89		78.30	$ 2,836,643.49	26.10	$ 945,547.83	52.20	$ 1,891,095.66	78.30	$ 2,836,643.49	0.00	$ -
2	2.00			Excavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye	M3		$ 87,771.67		6.90	$ 605,624.50	2.30	$ 201,874.83	4.60	$ 403,749.67	6.90	$ 605,624.50	0.00	$ -
3	3.00	610-13		Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye Explote Y	M3		$ 177,410.12		109.60	$ 19,444,148.81	8.00	$ 1,419,280.94	50.00	$ 8,870,505.85	58.00	$ 10,289,786.78	51.60	$ 9,154,362.03
4	630.1.4.1	630-13		Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3		$ 1,417,596.16		23.60	$ 33,455,269.32	7.87	$ 11,151,756.44	9.00	$ 12,758,365.42	16.87	$ 23,910,121.86	6.73	$ 9,545,147.46
5	630.1.6	630-13		Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3		$ 1,077,563.38		6.10	$ 6,573,136.61	2.03	$ 2,191,045.54	4.07	$ 4,382,091.08	6.10	$ 6,573,136.61	0.00	$ -
6	640.1	640-13		Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG		$ 6,233.51		3456.60	$ 21,546,743.17	3456.60	$ 21,546,743.17	0.00	$ -	3456.60	$ 21,546,743.17	0.00	$ -
7	4.00			Figurado E Instalacion De Aceros	KG		$ 3,647.33		3456.60	$ 12,607,362.85	1728.30	$ 6,303,681.42	1728.30	$ 6,303,681.42	3456.60	$ 12,607,362.85	0.00	$ -
8	5.00			Manejo Agua Con Motobomba 3" Autocebante A Gasolina	DIA		$ 159,118.78		15.00	$ 2,386,781.75	5.00	$ 795,593.92	10.00	$ 1,591,187.83	15.00	$ 2,386,781.75	0.00	$ -
							SUB-TOTAL	$ -		$ 99,455,710.50		$44,555,524.08		$36,200,676.92		$80,756,201.00		$ 18,699,509.49

CONSTRUCCION DE (1) BOX CULVERT DE 1.5M X1.5M X 6M																				
1	1.00	600-13		Excavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y	M3		$ 36,227.89		30.90	$ 1,119,441.68	30.90	$ 1,119,441.68		$ -	30.90	$ 1,119,441.68	0.00	$ -
2	2.00	600-13		Excavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye	M3		$ 87,771.67		2.90	$ 254,537.83	2.90	$ 254,537.83		$ -	2.90	$ 254,537.83	0.00	$ -
3	3.00	610-13		Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye Explote Y	M3		$ 177,410.12		58.00	$ 10,289,786.78	5.00	$ 887,050.58	53.00	$ 9,402,736.20	58.00	$ 10,289,786.78	0.00	$ -
4	630.1.4.1	630-13		Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3		$ 1,417,596.16		15.40	$ 21,830,980.83	15.40	$ 21,830,980.83		$ -	15.40	$ 21,830,980.83	0.00	$ -
5	630.1.6	630-13		Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3		$ 1,077,563.38		3.20	$ 3,448,202.81	3.20	$ 3,448,202.81		$ -	3.20	$ 3,448,202.81	0.00	$ -
6	640.1	640-13		Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG		$ 6,233.51		1597.60	$ 9,958,652.11	1597.60	$ 9,958,652.11		$ -	1597.60	$ 9,958,652.11	0.00	$ -
7	4.00			Figurado E Instalacion De Aceros	KG		$ 3,647.33		1597.60	$ 5,826,975.32	1597.60	$ 5,826,975.32		$ -	1597.60	$ 5,826,975.32	0.00	$ -
8	5.00			Manejo Agua Con Motobomba 3" Autocebante A Gasolina	DIA		$ 159,118.78		4.00	$ 636,475.13	4.00	$ 636,475.13		$ -	4.00	$ 636,475.13	0.00	$ -
							SUB-TOTAL	**$ -**		**$ 53,365,052.50**		**$ 43,962,316.30**		**$ 9,402,736.20**		**$ 53,365,052.50**		**$ -**
							SUB TOTAL BÁSICO DE OBRA: (SECCIONES 1 Y 2)	**$ 152,820,763.00**		**$ 152,820,763.00**		**$ 88,517,840.39**		**$ 45,603,413.12**		**$ 134,121,253.51**		**$ 18,699,509.49**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4,584,623.00**		**$ 4,584,623.00**	**50.58%**		**27.79%**		**78.36%**		**21.64%**	**$ 4,584,623.00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 42,635,958.00**		**$ 42,635,958.00**		**$ 12,655,536.32**		**$ 9,982,500.00**		**$ 22,638,036.32**		**$ 19,997,921.68**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 200,041,344.00**		**$ 200,041,344.00**		**$ 101,173,376.71**		**$ 55,585,913.00**		**$ 156,759,289.83**		**$ 43,282,054.17**

$ 200,041,344.00

CONVENIO	
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,041,344.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 92,331,206.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 92,331,206.00
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 55,585,913.00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 9,982,500.00
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 92,331,206.00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 92,331,206.00
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: (%)	0.00%
PORCENTAJE DE EJECUCION (%)	46.16%
Observaciones:	

92331206

Actualizo
Nombre: Ing. PEDRO RAMIREZ BAYER
Cargo: Residente de Obra
Matrícula Profesional: 25202-305140 CND

Aprobo
Nombre: Hector Manuel Vacca Pinilla
Cargo: Representante legal JAC EL RECREO

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	1 JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONVENIO No.	4240 DE 2023	**INTERVENTOR PROYECTO**	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO		
ITEM	1.00	Excavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y Retiro	**UNIDAD** M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	CANT	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto			
BOX DE 1 M X 1 M						
CUERPO BOX	6.00	3.00	0.88	1.00	2.00	31.68
ALETAS	1.81	1.50	0.88	4.00	2.00	19.06
PLACA SOLERA	0.55	1.50	0.88	1.00	2.00	1.45
					TOTAL	52.20

ESQUEMA



Aprobó
EL CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO

Firma: Hector Manuel Vacca
Nombre: HECTOR MANUEL VACCA PINILLA

Aprobó
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

Firma: GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Matricula Profesional :25202227592 CND

Elaboro
RESIDENTE DE OBRA:

Firma:
Nombre: Ing.PEDRO RAMIREZ BAYER
Matricula Profesional : 25202-305140 CND

Reviso
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Matricula Profesional : 25202-387285 CND

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	**1**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**1 JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO**
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONVENIO No.	4240 DE 2023	**INTERVENTOR PROYECTO**	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO		
ITEM	**2.00**	Excavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye Cargue Y Retiro	**UNIDAD** **M3**

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			FACTOR DE COMPACTACION	CANT	TOTAL	ESQUEMA
	Largo	Ancho	Espesor			ACUMULADO	
BOX DE 1 M X 1 M							
DENTELLON-SOLERA	2.86	0.25	0.35	2.00	2.00	1.00	
NIVELACION SUELO	6.00	3.00	0.10	1.00	2.00	3.60	
					TOTAL	4.60	



Aprobó
EL CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO**

Firma: Hector Manuel Vacca
Nombre: **HECTOR MANUEL VACCA PINILLA**

Elaboro
RESIDENTE DE OBRA:

Firma: Pedro Ramirez B
Nombre: **Ing. PEDRO RAMIREZ BAYER**
Matricula Profesional : 25202-305140 CND

Aprobó
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

Firma: GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: **GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA**
Matricula Profesional :25202227592 CND

Reviso
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: **WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ**
Matricula Profesional : 25202-387285 CND

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

SOPORTE DEL ACTA No.	1	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	1 JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONVENIO No.	4240 DE 2023	**INTERVENTOR PROYECTO**	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO		
ITEM	3.00	Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye Explote Y Cargue	**UNIDAD** M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	CANT	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto			
BOX DE 1 M X 1 M						
ALETAS	2.09	0.56	0.75	4.00	1.37	4.77
LATERALES CUERPO BOX	6.00	1.50	0.75	1.00	1.37	9.25
MEJORAMIENTO DE SUELO	6.00	3.00	0.20	1.00	1.37	4.93
RAMPAS DE APROXIMACION	5.50	6.00	0.66	2.00	1.37	29.85
TALUDES LATERALES RAMPAS	5.17	0.41	0.62	4.00	1.37	1.20
BOX DE 1.5M X 1.5M						
ALETAS	2.66	0.70	0.62	4.00	1.00	4.58
LATERALES CUERPO BOX	6.00	1.50	0.62	1.00	1.00	5.58
RAMPAS DE APROXIMACION	7.01	6.00	0.84	2.00	1.00	35.39
MEJORAMIENTO DE SUELO	1.76	3.80	0.20	1.00	1.00	1.34
TALUDES LATERALES RAMPAS	7.01	0.93	1.40	4.00	1.00	6.11
					TOTAL	**103.00**

ESQUEMA

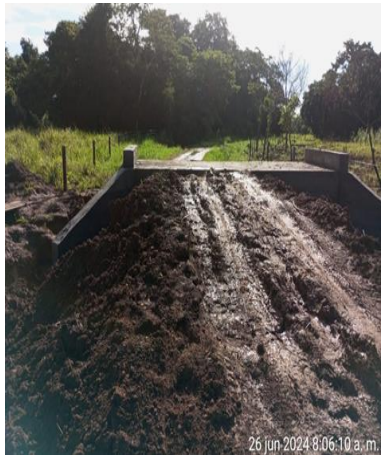



Aprobó
EL CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO

Firma: Hector Manuel Vacca
Nombre: HECTOR MANUEL VACCA PINILLA

Aprobó
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

Firma: GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Matricula Profesional :25202227592 CND

Elaboro
RESIDENTE DE OBRA:

Firma:
Nombre: Ing. PEDRO RAMIREZ BAYER
Matricula Profesional : 25202-305140 CND

Reviso
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Matricula Profesional : 25202-387285 CND

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

SOPORTE DEL ACTA No.	1	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	1 JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONVENIO No.	4240 DE 2023	**INTERVENTOR PROYECTO**	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO		
ITEM	**630.1.4.1**	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	**UNIDAD** M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
BOX DE 1 M X 1 M						
PLACA PISO CUERPO BOX	6.00	1.00	0.25	1.00	1.30	1.95
MUROS CUERPO BOX	6.00	0.25	1.50	2.00	1.30	1.15
PLACA TAPA CUERPO BOX	6.00	1.00	0.30	1.00	1.20	2.16
ZAPATAS ALETAS	1.31	0.75	0.25	4.00		0.98
ALETAS (1)	1.50	0.25	0.75	4.00		1.13
ALETAS (2)	1.25	0.25	0.50	4.00		0.31
ALETAS (3)	0.25	0.25	0.50	4.00		0.13
SOLERAS	0.55	1.50	0.25	2.00		0.41
DENTELLON	2.86	0.25	0.35	2.00		0.50
GUARDA RUEDAS	1.50	0.25	0.30	2.00		0.23
					TOTAL	9.00

ESQUEMA







Aprobó
EL CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO

Firma: Hector Manuel Vacca
Nombre: HECTOR MANUEL VACCA PINILLA

Elaboro
RESIDENTE DE OBRA:

Firma: Pedro Ramirez B
Nombre: Ing. PEDRO RAMIREZ BAYER
Matricula Profesional : 25202-305140 CND

Aprobó
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

Firma: GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Matricula Profesional :25202227592 CND

Reviso
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Matricula Profesional : 25202-387285 CND

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	1 JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONVENIO No.	4240 DE 2023	INTERVENTOR PROYECTO	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO		
ITEM	630.1.6	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	UNIDAD: M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
BOX DE 1 M X 1 M						
PLACA PISO CUERPO BOX	6.00	1.50	0.10	1.00	2.00	1.80
ZAPATAS ALETAS	1.31	0.75	0.10	4.00	2.00	0.78
SOLERAS	0.55	1.50	0.10	2.00	2.00	0.33
DENTELLON-SOLERA	2.86	1.00	0.10	2.00	2.00	1.14
					TOTAL	4.06

ESQUEMA





Aprobó
EL CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO

Firma: Hector Manuel Vacca
Nombre: HECTOR MANUEL VACCA PINILLA

Elaboro
RESIDENTE DE OBRA:

Firma: Pedro Ramirez B
Nombre: Ing. PEDRO RAMIREZ BAYER
Matricula Profesional : 25202-305140 CND

Aprobó
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

Firma: GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Matricula Profesional :25202227592 CND

Reviso
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Matricula Profesional : 25202-387285 CND

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

SOPORTE DEL ACTA No.	**1**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**1 JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIOO**
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONVENIO No.	4240 DE 2023	**INTERVENTOR PROYECTO**	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO		
ITEM	**4.00**	Figurado E Instalacion De Aceros	**UNIDAD** **KG**

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	cantidad	Peso(KG)	CANT.ELEM	CAN. BOX	TOTAL ACUMULADO
PLACA INFERIOR						
REFUERZO SUPERIOR INCLUYE ACEROS DE SOLERA	1.65	33.80	1.00	1.00	1.50	83.66
REFUERZO INFERIOR	3.50	25.00	1.00	2.00	1.50	262.50
REFUERZO LONGITUDINAL	6.00	6.40	1.00	2.00	1.50	115.20
REFUERZO LONGITUDINAL	1.50	6.4	1.00	4.00	1.50	57.60
SOPORTE ACERO REFUERZO SUPERIOR	0.80	25.00	1.00	1.00	1.50	30.00
MUROS						
REFUERZO VERTICAL	1.65	25.00	1.00	2.00	1.50	123.75
REFUERZO LONGITUDINAL	9.20	6.40	1.00	4.00	1.50	353.28
PLACA SUPERIOR						
REFUERZO INFERIOR	1.65	31.00	1.00	1.00	1.50	76.73
REFUERZO LONGITUDINAL	8.00	6.40	1.00	2.00	1.50	153.60
SOPORTE ACERO REFUERZO SUPERIOR	0.80	25.00	1.00	1.00	1.50	30.00
REFUERZO VERTICAL GUARDARUEDAS	0.88	6.00	1.00	4.00	1.50	31.50
REFUERZO LONGITUDINAL	1.65	2	1.00	4.00	1.50	19.80
CABEZAL DE SALIDA Y ENTRADA						
PLACA ALETAS						
REFUERZO INFERIOR Y SUPERIOR LONGITUDINA	1.83	6.80	1.00	4.00	1.50	74.66
REFUERZO TRANSVERSAL SUPERIOR E INFERIOR	0.90	14.24	0.56	4.00	1.50	43.06
SOPORTE ACERO REFUERZO SUPERIOR	0.80	15.00	1.00	2.00	1.50	36.00
REFUERZO TRANSVERSAL SOLERA	1.32	19.00	0.56	2.00	1.50	42.13
REFUERZO LONGITUDINAL SOLERA	4.80	4	1.00	2.00	1.50	57.60
MUROS						
REFUERZO VERTICAL	12.29	2.00	0.56	4.00	1.50	82.59
REFUERZO LONGITUDINAL	8.13	2.00	0.56	4.00	1.50	54.63
					TOTAL	**1,728.30**

ESQUEMA



Aprobó
EL CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO**

Firma: Hector Manuel Vacca
Nombre: **HECTOR MANUEL VACCA PINILLA**

Aprobó
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

Firma: GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: **GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA**
Matricula Profesional :25202227592 CND

Elaboro
RESIDENTE DE OBRA:

Firma: Pedro Ramirez B
Nombre: **Ing. PEDRO RAMIREZ BAYER**
Matricula Profesional : 25202-305140 CND

Reviso
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: **WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ**
Matricula Profesional : 25202-387285 CND

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

SOPORTE DEL ACTA No.	**1**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**1 JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO**
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONVENIO No.	4240 DE 2023	**INTERVENTOR PROYECTO**	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO		
ITEM	**5.00**	Manejo Agua Con Motobomba 3" Autocebante A Gasolina	**UNIDAD** **DIA**

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
BOX DE 1 M X 1 M						
EXCAVACION BOX				3.00		3.00
APLICACION SOLADO				3.00		3.00
CONSTRUCCION PLACA				4.00		4.00
					TOTAL	**10.00**

ESQUEMA



Aprobó
EL CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO**

Firma: Hector Manuel Vacca
Nombre: **HECTOR MANUEL VACCA PINILLA**

RESIDENTE DE OBRA:

Firma: Pedro Ramirez B
Nombre: **Ing. PEDRO RAMIREZ BAYER**
Matricula Profesional : 25202-305140 CND

Aprobó
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

Firma: GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: **GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA**
Matricula Profesional :25202227592 CND

Reviso
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: **WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ**
Matricula Profesional : 25202-387285 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 4240 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	14	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	16	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	14	24	24	24	24		687
Lluvias moderadas	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0		13
Lluvias intensas	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0		0	0	0	8	0	0	0	0		20
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Durante el mes de mayo se presentaron fuertes lluvias las cuales generaron complicaciones en obra, se presentaron grandes perdidas de material petreo, debido a la escorrentia de agua, afectaciones durante las actividades de concretos.

Firma

Nombre: PEDRO RAMIREZ BAYER
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-305140 CND

Firma

Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No.: 4240 DE 2023 **CONTRATISTA:**

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	08/06/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 4	1	67,38 %	2021,32	SI	LOSA INFERIOR 7 DIAS
1	15/06/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 4	2	90,60%	2717,97	SI	LOSA INFERIOR 14 DIAS
1	29/06/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 4	3	104,87	3146,06	SI	LOSA INFERIOR 28 DIAS
1	18/06/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 4	1	68,64 %	2059,08	SI	LOSA SUPERIOR 7 DIAS
1	25/06/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 4	2	83,19%	2731,10	SI	LOSA SUPERIOR 14 DIAS
2	12/06/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 3	1	70,87 %	2126,05	SI	LOSA INFERIOR 7 DIAS
2	19/06/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 3	2	91,77%	2753,09	SI	LOSA INFERIOR 14 DIAS
2	21/06/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 3	1	71,24	2137,21	SI	MUROS Y LOSA SUPERIOR 7 DIAS
2	28/06/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 3	2	92,21 %	2766,23	SI	MUROS Y LOSA SUPERIOR 14 DIAS
3	15/06/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 4	1	71,83 %	2154,94	SI	MUROS 7 DIAS
3	22/06/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 4	2	94,10%	2823,02	SI	MUROS 14 DIAS
3	25/06/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 4	1	70,99 %	2129,66	SI	MUROS ALETAS 7 DIAS
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: PEDRO RAMIREZ BAYER
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-305140 CND

Firma

Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GEOLAB IMEG
LABORATORIO DE SUELOS Y GEOTECNIA

ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD
NTC 673-2022

LAB-F-10
VER-01
FECHA 1/12/2023


CONTRATO DE OBRA: N/A	**OBJETO:**	**"Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda El Recreo del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"**

CLIENTE	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL RECREO	**NIT**	90119999-4
LOCALIZACIÓN	VEREDA EL RECREO - EL RETORNO	**RESISTENCIA**	**Fc= 3000 PSI**


ELEMENTO 1	**FECHA DE FUNDICIÓN**	**FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)**				**GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS**		**ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)**	**RESULTADOS DE RESISTENCIA**							
									7 DÍAS		**14 DÍAS**		**28 DÍAS**		**T - 28 DIAS**	
		7	**14**	**28**	**T**	**ALTO (cm)**	**DIAMETRO (cm)**		**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**
BOX CULVERT # 4 - PLACA INFERIOR (1.5X1.5) m	1/06/2024	8/06/2024	15/06/2024	29/06/2024	-	15	7,5	44,179	61,57	2021,32	82,79	2717,97	95,83	3146,06	95,29	3128,34
RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)			3000,00			**PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)**			67,38%		90,60%		104,87%		104,28%	

ELEMENTO 2	**FECHA DE FUNDICIÓN**	**FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)**				**GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS**		**ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)**	**RESULTADOS DE RESISTENCIA**							
									7 DÍAS		**14 DÍAS**		**28 DÍAS**		**T - 28 DIAS**	
		7	**14**	**28**	**T**	**ALTO (cm)**	**DIAMETRO (cm)**		**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**
BOX CULVERT # 4 - PLACA SUPERIOR (1.5X1.5) m	11/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	9/07/2024	-	15	7,5	44,179	62,72	2059,08	83,19	2731,10	96,27	3160,51	97,01	3184,80
RESISTENCIA DE LA MEZCLA DISEÑADA (PSI)			3000,00			**PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)**			68,64%		91,04%		105,35%		106,16%	

BOX CULVERT # 4 - PLACA INFERIOR (1.5X1.5) m

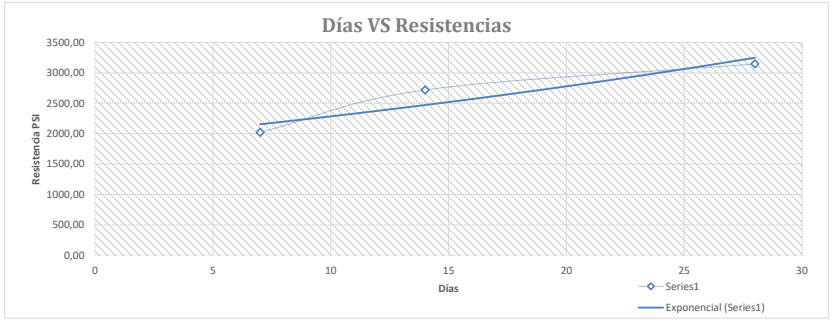

BOX CULVERT # 4 - PLACA SUPERIOR (1.5X1.5) m

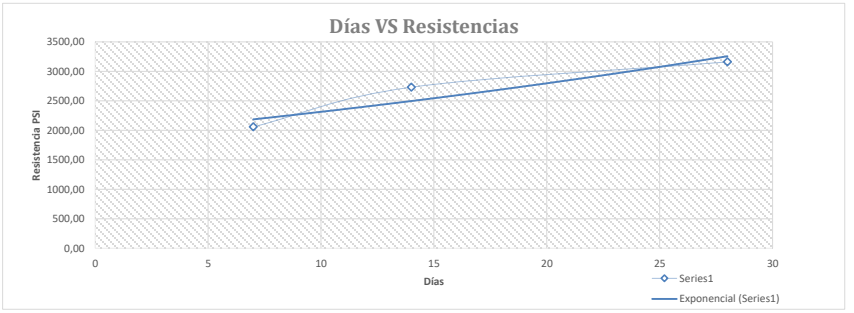

OBSERVACIONES:	Los cilindros ensayados fueron elaborados en obra ; despues de realizar la recepción de los cilindros en laboratorio, se procedio a continuar con el curado de los mismos y la rotura según los terminos establecidos.

FECHA DE ENTREGA 16/07/2024

Ing. Laura Gomez
Director de Laboratorio

GEOLAB IMEG
LABORATORIO DE SUELOS Y GEOTECNIA

ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD
NTC 673-2022

LAB-F-10
VER-01
FECHA 1/12/2023


CONTRATO DE OBRA: N/A	**OBJETO:**	**"Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Nuevo Milenio del municipio de San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"**

CLIENTE	JUNTA DE ACCION COMUNAL NUEVO MILENIO	**NIT**	
LOCALIZACIÓN	VEREDA NUEVO MULENIO - SAN JOSE DEL GUAVIARE	**RESISTENCIA**	**Fc= 3000 PSI**


ELEMENTO 3	**FECHA DE FUNDICIÓN**	**FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)**				**GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS**		**ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)**	**RESULTADOS DE RESISTENCIA**							
									7 DÍAS		**14 DÍAS**		**28 DÍAS**		**T - 28 DIAS**	
		7	**14**	**28**	**T**	**ALTO (cm)**	**DIAMETRO (cm)**		**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**
BOX CULVERT # 3 - PLACA INFERIOR (1.0X1.0) m	5/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	3/07/2024	-	15	7,5	44,179	64,76	2126,05	83,86	2753,09	93,57	3071,87	94,39	3098,79
RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)			3000,00			**PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)**			70,87%		91,77%		102,40%		103,29%	

ELEMENTO 4	**FECHA DE FUNDICIÓN**	**FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)**				**GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS**		**ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)**	**RESULTADOS DE RESISTENCIA**							
									7 DÍAS		**14 DÍAS**		**28 DÍAS**		**T - 28 DIAS**	
		7	**14**	**28**	**T**	**ALTO (cm)**	**DIAMETRO (cm)**		**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**
BOX CULVERT # 3 - PLACA SUPERIOR Y MUROS (1.0X1.0) m	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	-	15	7,5	44,179	65,1	2137,21	84,26	2766,23	95,18	3124,73	95,03	3119,80
RESISTENCIA DE LA MEZCLA DISEÑADA (PSI)			3000,00			**PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)**			71,24%		92,21%		104,16%		103,99%	

BOX CULVERT # 3 - PLACA INFERIOR (1.0X1.0) m

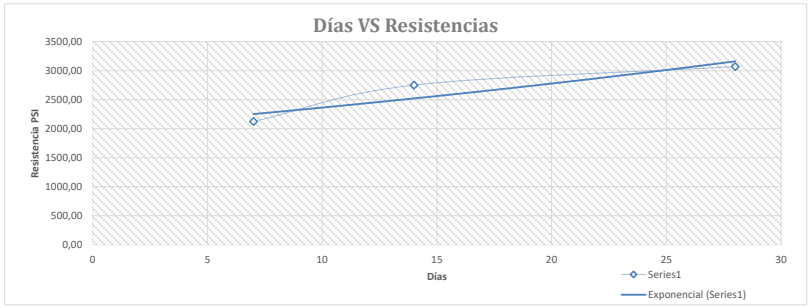

BOX CULVERT # 3 - PLACA SUPERIOR Y MUROS (1.0X1.0) m

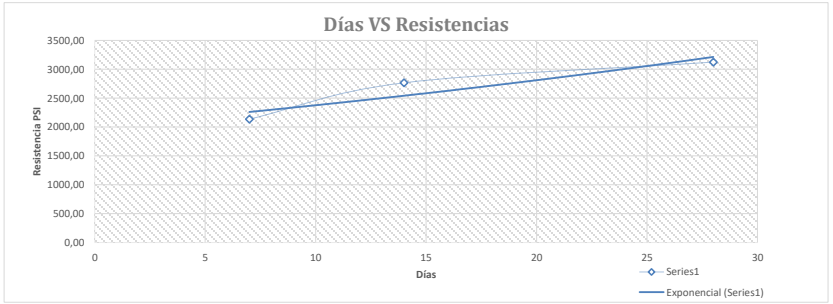

OBSERVACIONES:	Los cilindros ensayados fueron elaborados en obra ; despues de realizar la recepción de los cilindros en laboratorio, se procedio a continuar con el curado de los mismos y la rotura según los terminos establecidos.

FECHA DE ENTREGA 16/07/2024

Ing. Laura Gomez
Director de Laboratorio

GEOLAB IMEG
LABORATORIO DE SUELOS Y GEOTECNIA

ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD
NTC 673-2022

LAB-F-10
VER-01
FECHA 1/12/2023


CONTRATO DE OBRA: N/A	**OBJETO:**	**"Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Nuevo Milenio del municipio de San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"**

CLIENTE	JUNTA DE ACCION COMUNAL NUEVO MILENIO	**NIT**	
LOCALIZACIÓN	VEREDA NUEVO MULENIO - SAN JOSE DEL GUAVIARE	**RESISTENCIA**	**Fc= 3000 PSI**


ELEMENTO 9	**FECHA DE FUNDICIÓN**	**FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)**				**GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS**		**ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)**	**RESULTADOS DE RESISTENCIA**							
									7 DÍAS		**14 DÍAS**		**28 DÍAS**		**T - 28 DIAS**	
		7	**14**	**28**	**T**	**ALTO (cm)**	**DIAMETRO (cm)**		**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**
BOX CULVERT # 4 - MUROS DE CUERPO (1.5X1.5) m	8/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	6/07/2024	-	15	7,5	44,179	65,64	2154,94	85,99	2823,02	96,83	3178,89	96,36	3163,46
RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)			3000,00			**PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)**			71,83%		94,10%		105,96%		105,45%	

ELEMENTO 10	**FECHA DE FUNDICIÓN**	**FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)**				**GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS**		**ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)**	**RESULTADOS DE RESISTENCIA**							
									7 DÍAS		**14 DÍAS**		**28 DÍAS**		**T - 28 DIAS**	
		7	**14**	**28**	**T**	**ALTO (cm)**	**DIAMETRO (cm)**		**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**
BOX CULVERT # 4 - MUROS DE ALETA (1.5X1.5) m	18/06/2024	25/06/2024	2/07/2024	16/07/2024	-	15	7,5	44,179	64,87	2129,66	85,09	2793,47	96,28	3160,84	96,64	3172,66
RESISTENCIA DE LA MEZCLA DISEÑADA (PSI)			3000,00			**PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)**			70,99%		93,12%		105,36%		105,76%	

BOX CULVERT # 4 - MUROS DE CUERPO (1.5X1.5) m

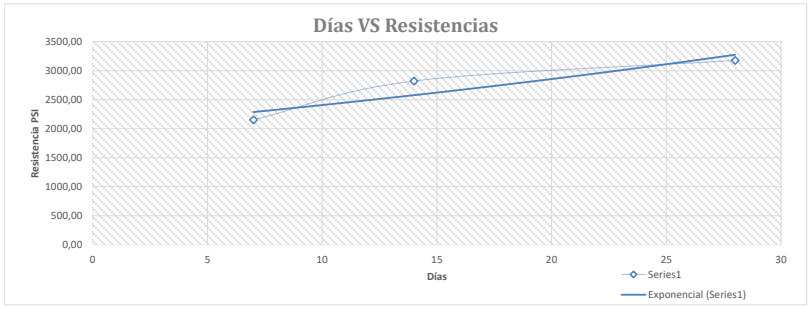

BOX CULVERT # 4 - MUROS DE ALETA (1.5X1.5) m

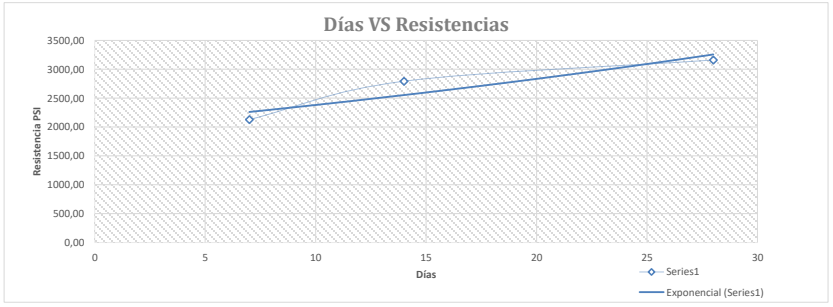

OBSERVACIONES:	Los cilindros ensayados fueron elaborados en obra ; despues de realizar la recepción de los cilindros en laboratorio, se procedio a continuar con el curado de los mismos y la rotura según los terminos establecidos.

FECHA DE ENTREGA 16/07/2024

Ing. Laura Gomez
Director de Laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 4240 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 21/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.041.344,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.041.344,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.208.268,80	30	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.052.067,20	30	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.312.403,20	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037316

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009896 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0 - 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.208.268,80	16	1	2024	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.052.067,20	16	1	2024	1	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.312.403,20	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037316

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31	10	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009896 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN PRORROGA 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.208.268,80	30	4	2024	15	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.052.067,20	30	4	2024	15	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.312.403,20	15	7	2024	15	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037316

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	31	10	2023	15	7	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009896 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE COMITÉ
EL RECREO

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 06	**Dirección Territorial INVIAS: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES.**	**Fecha: 13/06/2024**

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda El Recreo, El Retorno, Guaviare.
No. Convenio(s) Solidario(s): 4240 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal El Recreo.

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	**Institución u Organización**	**Cargo**
Manuel Vacca Pinilla	JAC Recreo	Presidente
Reinaldo Chacón	JAC Recreo	Veedor
Luz Dary Santamaría	JAC Recreo	Contadora
Pedro Antonio Ramírez	JAC Recreo	Ing. Residente de obra
Javier Barrero	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Representante Legal
Gabriel Velásquez	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Director de interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Selección de proveedores.
2. Aprobación de desembolsos.

AGENDA DEL COMITÉ: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Presentación de los asistentes.
2- Aprobación de desembolsos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Resumen
1.	Presentación de los asistentes: siendo las 10:00 AM se da inicio al comité operativo, Asisten al comité por la JAC de la vereda El Recreo el Presidente, Manuel Vacca Pinilla; el Veedor, Reinaldo Chacón; la Contadora, Luz Dary Santamaría; el Residente de Obra, Pedro Antonio Ramírez y por parte de la interventoría asisten el Director de Obra, Gabriel Velázquez; el Residente de Obra, Wualner Lopez y el representante legal, Javier Barrero.
2.	Se presentan la relación de facturas y/o cuentas de cobro para aprobación y orden de pago para la obra: 2.1. Orden de Pago 029 – Servicio de transporte de materiales por $ 9.962.172,00 2.2. Orden de Pago 022 - Servicio de alquiler de maquinaria por $ 4.174.789,92 2.3. Orden de Pago 023 – Compra de materiales de ferretería por $ 3.853.816,00 2.4. Orden de Pago 024 – Compra de recebo por $ 7.439.250,00 2.5. Orden de Pago 025 – Alquiler de equipos por $ 1.852.400,00 2.6. Orden de Pago 026 – Nómina de trabajadores primera quincena junio por $ 7.623.200,00 2.7. Orden de Pago 028 – Honorarios ingeniero residente de obra por $ 3.333.000,00

	2.8. Orden de Pago 030 – Pago de retenciones por $ 697.722,08 2.9. Orden de Pago 027 – Alimentación para trabajadores por $ 6.220.500,00

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	Luego de ser revisadas y discutidas cada una de las órdenes de compra, se aprueban los desembolsos por parte de los miembros del comité operativo de las siguientes órdenes de pago: 2.1. Desembolso a Leonardo Diaz Ortiz de $ 9.962.172,00 por concepto de servicio de transporte de materiales. 2.2. Desembolso a Vladimir Vera Oyola por concepto de alquiler de maquinaria por $ 4.174.789,92 2.3. Desembolso a FERRETERIA S&F ZOMAC S.A.S por concepto de Compra de materiales de ferretería por $ 3.853.816,00 2.4. Desembolso a CANTERA LAJITAS SAS por concepto de Compra de recebo por $ 7.439.250,00 2.5. Desembolso a YERSON DAVID ROMERO JIMENEZ por concepto de Alquiler de equipos por $ 1.852.400,00 2.6. Se aprueba pago de la nómina de los trabajadores durante el periodo del 01/06/2024-15/06/2024 a nombre de la JAC El Recreo, su representante legal Hector Manuel Vacca Pinilla por el valor de $ 7.623.200,00 2.7. Desembolso a RAMIREZ BAYER PEDRO ANTONIO de $ 3.333.000,00 por concepto de Honorarios ingeniero residente de obra. 2.8. Desembolso a JAC de la vereda El Recreo (Héctor Manuel Vacca) de $ 697.722,08 por concepto de pago de retenciones. 2.9. Desembolso a MARIA CHIQUINQUIRA LINARES de 6.220.500,00 por concepto de Alimentación para trabajadores.

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Relación de los desembolsos aprobados	JAC El Recreo	24/05/2024
Envío de cheques para desembolsos aprobados.	SOTA LTDA	14/06/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES.

Nombre: Manuel Vacca Pinilla
Cargo: Presidente JAC El Recreo

Nombre: Reinaldo Chacón
Cargo: Representante de la veeduría

Nombre: Pedro Antonio Ramírez
Cargo: Ing. Residente de obra

Nombre: Luz Dary Santamaría
Cargo: Contadora JAC El Recreo

Nombre: Wualner Raul Lopez
Cargo: Residente de Interventoría

Nombre: Javier Barrero
Cargo: R/L Interventoría

Nombre: Gabriel Velásquez
Cargo: Director de interventoría

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 07	**Dirección Territorial INVIAS: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES.**	**Fecha: 26/06/2024**

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda El Recreo, El Retorno, Guaviare.
No. Convenio(s) Solidario(s): 4240 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal El Recreo.

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	**Institución u Organización**	**Cargo**
Manuel Vacca Pinilla	JAC Recreo	Presidente
Reinaldo Chacón	JAC Recreo	Veedor
Luz Dary Santamaría	JAC Recreo	Contadora
Pedro Antonio Ramírez	JAC Recreo	Ing. Residente de obra
Javier Barrero	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Representante Legal
Gabriel Velásquez	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Director de interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Socialización de cuentas de cobro y/o facturas.
2. Aprobación de desembolsos.

AGENDA DEL COMITÉ: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Presentación de los asistentes.
2- Aprobación de desembolsos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Resumen
1.	Presentación de los asistentes: siendo las 05:00 PM se da inicio al comité operativo, Asisten al comité por la JAC de la vereda El Recreo el Presidente, Manuel Vacca Pinilla; el Veedor, Reinaldo Chacón; la Contadora, Luz Dary Santamaría; el Residente de Obra, Pedro Antonio Ramírez y por parte de la interventoría asisten el Director de Obra, Gabriel Velázquez; el Residente de Obra, Wualner Lopez y el representante legal, Javier Barrero.
2.	Se presentan la relación de facturas y/o cuentas de cobro para aprobación y orden de pago para la obra: 2.1. Orden de Pago 031 – Nómina de trabajadores segunda quincena junio por $ 7.673.600,00 2.2. Orden de Pago 032 – Planilla de seguridad social mes de junio por 6.253.200,00 2.3. Orden de Pago 033 – Alimentación del 15/06/2024 al 30/06/2024 por $ 2.895.000,00 2.4. Orden de Pago 034 – Pago honorarios contadora por $ 2.100.000,00 2.5. Orden de Pago 035 – Pago de honorarios a residente de obra por $ 3.333.000,00 2.6. Orden de Pago 036 – Retenciones por $ 105.000,00

	Además, se realizará el envío de Orden de Pago 027 – Alimentación para trabajadores por $ 6.220.500,00 que quedó aprobada en el comité anterior pero no se envió por falta de cheques y se enviará nuevamente cheque con Orden de Pago 022 - Servicio de alquiler de maquinaria por $ 4.174.789,92 ya que se firmó mal por parte del presidente, por tanto, quedó anulado el cheque anterior.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	Luego de ser revisadas y discutidas cada una de las órdenes de compra, se aprueban los desembolsos por parte de los miembros del comité operativo de las siguientes órdenes de pago: 2.1. Se aprueba pago de la nómina de los trabajadores durante el periodo del 15/06/2024-30/06/2024 a nombre de la JAC El Recreo, su representante legal Hector Manuel Vacca Pinilla por el valor de $ 7.673.600,00 2.2. Se aprueba pago de la planilla de seguridad social del mes de junio a nombre de la JAC El Recreo, su representante legal Hector Manuel Vacca Pinilla por el valor de $ 6.253.200,00 2.3. Desembolso a MARIA CHIQUINQUIRA LINARES por concepto de Alimentación del 15/06/2024 al 30/06/2024 por $ 2.895.000,00 2.4. Desembolso a LUZ DARY SANTAMARIA VARGAS por concepto de Pago honorarios contadora por $ 2.100.000,00 2.5. Desembolso a RAMIREZ BAYER PEDRO ANTONIO por concepto de Pago de honorarios a residente de obra por $ 3.333.000,00. 2.6. Desembolso a JAC de la vereda El Recreo (Héctor Manuel Vacca) de $ 105.000,00 por concepto de pago de retenciones. 2.7. Desembolso a MARIA CHIQUINQUIRA LINARES por concepto de Alimentación para trabajadores mayo y primera quincena de junio por $ 6.220.500,00 2.8. Desembolso a VERA OYOLA VLADIMIRde $ 4.174.789,92por concepto de Alquiler de maquinaria.

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Relación de los desembolsos aprobados	JAC El Recreo	26/06/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES.

Nombre: Manuel Vacca Pinilla
Cargo: Presidente JAC El Recreo

Nombre: Reinaldo Chacón
Cargo: Representante de la veeduría

Nombre: Pedro Antonio Ramírez
Cargo: Ing. Residente de obra

Nombre: Luz Dary Santamaría
Cargo: Contadora JAC El Recreo

Nombre: Wualner Raul Lopez
Cargo: Residente de Interventoría

Nombre: Javier Barrero
Cargo: R/L Interventoría

Nombre: Gabriel Velásquez
Cargo: Director de interventoría

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

CONVENIO SOLIDARIO No. 3752 DE 2023 JAC VEREDA SAN LUCAS.

INFORMES SEMANALES
SAN LUCAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 20 del 31-may al 6-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No. 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216.314.958,00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216.314.958,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215.361.440,00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215.361.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216.314.958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216.314.958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216.314.958,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 87.721.548,30	40,55%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (87.721.548,30)	-40,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.084.042,00	3,74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 87.721.548,30	40,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.084.042,00	3,74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (79.637.506,30)	-36,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.766.437,44	10,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 178.836.139,78	83,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 143.129.213,02	66,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.763.704,21	10,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.263.403,31	5,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 40,55% — Avance o Atraso Físico % -36,82%

Meta Física Ejecutada % 3,74%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	40,55%			40,55%	
Ejec	3,74%			3,74%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha ya establecieron los proveedores de materiales y se les realizaron los chekes, para los respectivos desembolsos y pagos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

la JAC realiza envio de certificados complementarios para la hoja de vida del residente de Obra, sin embargo, no presenta susbsanación alguna de los estudios y diseños.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Interventoria realizara el revision de la hoja de vida enviada con sus nuevos certificados. Aclarando que es de suma urgencia que la JAC realice entrega de pendientes, presupuesto de obra y sus anexos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

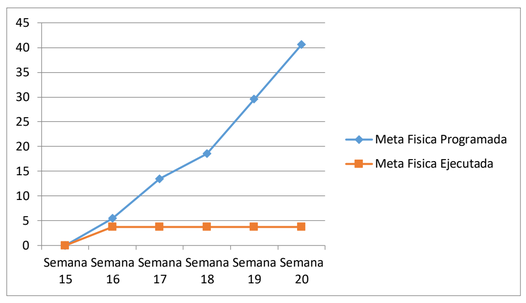

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Solicitarle a la JAC y su residente celeridad en la entrega de documentos pendientes y presupuesto de obra con sus anexos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 21 del 7-jun al 13-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No. 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216.314.958,00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216.314.958,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215.361.440,00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215.361.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216.314.958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216.314.958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216.314.958,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 116.014.221,12	53,63%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (116.014.221,12)	-53,63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.084.042,00	3,74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 116.014.221,12	53,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.084.042,00	3,74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (107.930.179,12)	-49,89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 28.292.672,82	13,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201.578.307,84	93,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 154.414.152,48	71,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.763.704,21	10,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.263.403,31	5,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 53,63% — Avance o Atraso Físico %: -49,89%

Meta Física Ejecutada %: 3,74%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	53,63%			53,63%	
Ejec	3,74%			3,74%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: A la fecha ya establecieron los proveedores de materiales y se les realizaron los chekes, para los respectivos desembolsos y pagos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	x	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	x	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	x	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	x	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	x	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	x	N/A .....
EMISIONES:	SI	.....	NO	x	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	x	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continuan con dificultades de comunicación y compromiso por parte de la JAC, el residente propuesto no realiza ningún tipo de acercamiento con la interventoría y presentan uno nuevo, se trata de establecer comunicación con el presidente y la secretaria y no es posible.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se revisa y aprueba la hoja de vida del nuevo Residente de obra (Diego Velasco), se espera que presente con celeridad los documentos faltantes y requeridos para el inicio de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

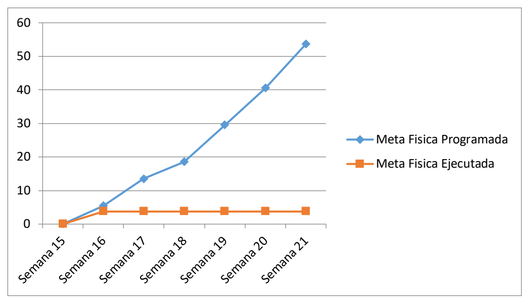

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Realizar solicitud a la JAC para que el nuevo residente presente los documentos requeridos para el inicio de obra, ademas de realizar una nueva programacion de obra que se ajuste a las actividades y nuevos tiempos.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 22 del 14-jun al 20-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No.	3752 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 216.314.958,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 216.314.958,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215.361.440,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 72.490.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 287.851.480,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216.314.958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216.314.958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216.314.958,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 144.040.521,00	66,59%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (144.040.521,00)	-66,59%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.084.042,00	3,74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 144.040.521,00	66,59%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.084.042,00	3,74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (135.956.479,00)	-62,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 28.026.299,88	12,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171.570.100,69	59,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 171.570.100,69	59,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.155.948,21	5,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.155.948,21	5,96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 66,59% — Avance o Atraso Físico %: -62,85%

Meta Física Ejecutada %: 3,74%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	66,59%			66,59%	
Ejec	3,74%			3,74%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha ya establecieron los proveedores de materiales y se les realizaron los chekes, para los respectivos desembolsos y pagos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

la JAC no presenta la documentacion susbsanada de los estudios y diseños, ni el presupuesto proyectado actualizado.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

la JAC debera enviar cuanto antes los documentos pendientes (estudios previos) y necesarios (presupuesto de obra con sus respectivos anexos).

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

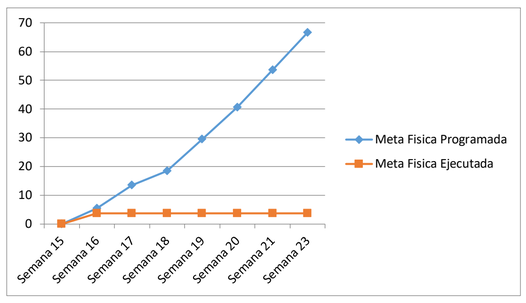

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar solicitud a la JAC para que el nuevo residente presente los documentos requeridos para el inicio de obra, ademas de realizar una nueva programacion de obra que se ajuste a las actividades y nuevos tiempos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 23 del 21-jun al 27-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No. 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216.314.958,00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216.314.958,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215.361.440,00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 72.490.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 287.851.480,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216.314.958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216.314.958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216.314.958,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 159.612.798,76	73,79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (159.612.798,76)	-73,79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.084.042,00	3,74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 159.612.798,76	73,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.084.042,00	3,74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (151.528.756,76)	-70,05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.572.277,76	7,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 190.942.505,29	66,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 188.726.048,90	65,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.493.824,91	6,73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.835.541,82	5,96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO
VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 73,79% — Avance o Atraso Físico %: -70,05%
Meta Física Ejecutada %: 3,74%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	73,79%			73,79%	
Ejec	3,74%			3,74%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha ya establecieron los proveedores de materiales y se les realizaron los chekes, para los respectivos desembolsos y pagos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

la JAC Continua sin presentar los documentos necesarios y requeridos para aprobar inicio de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

la JAC debera enviar cuanto antes los documentos pendientes (estudios previos) y necesarios (presupuesto de obra con sus respectivos anexos). Para lograr aprobar el inicio de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

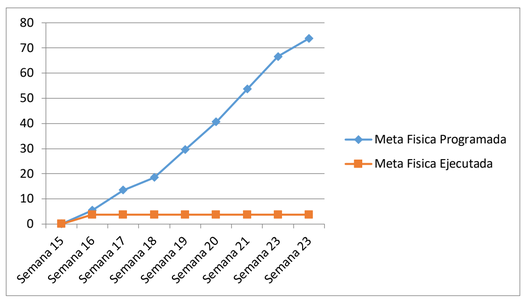

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Realizar solicitud a la JAC para que el nuevo residente presente los documentos requeridos para el inicio de obra, ademas de realizar una nueva programacion de obra que se ajuste a las actividades y nuevos tiempos.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 3752 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCAS

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 216.314.958,00

VALOR ACUMULADO: $ 216.314.958,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 43.262.991,60	5	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.815.747,90	5	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 64.894.487,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036852

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009774 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 43.262.991,60	18	1	2024	1	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.815.747,90	18	1	2024	1	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 64.894.487,40	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036852

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009774 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN PRORROGA 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 43.262.991,60	30	4	2024	30	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.815.747,90	30	4	2024	30	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 64.894.487,40	30	7	2024	30	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036852

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	5	10	2023	30	7	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009774 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4222 DE 2023 JAC VEREDA SAN FRANCISCO II.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** JUNIO 2024

CONVENIO No.: 4222 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO II

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 1:	30/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 2:	30/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/07/2024
PLAZO ACUMULADO:	15/07/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 208.194.251,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 208.194.251,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	10,20
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	1,80
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	13,60
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	17,80
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	1,10
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1786,02
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	158,50
CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	10,20
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	1,80
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	16,00
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	29,60
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	2,90
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2582,60
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	337,60

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 160.705.586,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.821.168,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.667.497,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 208.194.251,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.661.761,00	$ 4.661.761,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 4.661.761,00**	**$ 4.661.761,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 4.661.761,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 2,24%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2	Foto 3

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORMES SEMANALES
SAN FRANCISCO II

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 20 del 31-may al 6-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de dos (2) obras de drenaje tipo box coulvert una de 2x2 m y la otra de 2x1.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 208.194.251,00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 208.194.251,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215.361.440,00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215.361.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208.194.251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208.194.251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208.194.251,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	- $
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	- $
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	- $
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.661.761,00	2,24%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: La programacion de obra esta en funcion al inicio de obra, por lo cual no es posible calcular el avance o atraso de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 178.836.139,78	83,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 143.129.213,02	66,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.763.704,21	10,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.263.403,31	5,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 2X2 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 2X1 M	UNIDAD	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: A la fecha no se inician obra por lo tanto se deconoce el estado de permisos y/o licencias ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La JAC continua sin entregar el plano detallado o despiece del acero para los box, una vez sea entregado se hará comité operativo para aprobar compra de matetriales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera la entrega del plano detallado o despiece del acero para los box, para poder autorizar y aprobar las ordenes de compras.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

NO SE REALIZA ESQUEMA GRAFICO YA QUE LA PROGRAMACION ESTA EN FUNCION DEL INICIO DE OBRA POR LO CUAL NO SE PUEDE DETERMINAR AVANCE O ATRASO DE OBRA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Realizar solicitud de la entrega de los planos estruturales detallados de los box.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 21 del 7-jun al 13-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de dos (2) obras de drenaje tipo box coulvert una de 2x2 m y la otra de 2x1.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 208.194.251,00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 208.194.251,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215.361.440,00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215.361.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208.194.251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208.194.251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208.194.251,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	- $
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	- $
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	- $
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.661.761,00	2,24%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: La programacion de obra esta en funcion al inicio de obra, por lo cual no es posible calcular el avance o atraso de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201.578.307,84	93,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 154.414.152,48	71,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.763.704,21	10,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.263.403,31	5,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 2X2 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 2X1 M	UNIDAD	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: A la fecha no se inician obra por lo tanto se deconoce el estado de permisos y/o licencias ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La JAC realizo la entrega de los planos estructurales, los cuales aun no detallan el despiece y peso del acero de los boxculvert. Se realiza observación y la JAC se encuentra realizando los ajustes necesarios.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera que la JAC realice el despiece y entrega del mismo para poder verificar las cantidades del acero de los boxculvert, para poder autorizar y aprobar las ordenes de compras.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

NO SE REALIZA ESQUEMA GRAFICO YA QUE LA PROGRAMACION ESTA EN FUNCION DEL INICIO DE OBRA POR LO CUAL NO SE PUEDE DETERMINAR AVANCE O ATRASO DE OBRA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 22 del 14-jun al 20-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de dos (2) obras de drenaje tipo box coulvert una de 2x2 m y la otra de 2x1.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 208.194.251,00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 208.194.251,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215.361.440,00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 72.490.040,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 287.851.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208.194.251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208.194.251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208.194.251,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	- $
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	- $
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	- $
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.661.761,00	2,24%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: La programacion de obra esta en funcion al inicio de obra, por lo cual no es posible calcular el avance o atraso de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171.570.100,69	59,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 171.570.100,69	59,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.155.948,21	5,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.155.948,21	5,96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 2X2 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 2X1 M	UNIDAD	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: A la fecha no se inician obra por lo tanto se deconoce el estado de permisos y/o licencias ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La JAC realizo la entrega el dia 14 de junio de la cartilla de despiece del acero de los boxculvert. El dia 20 de junio la JAC realizo el envio del presupuesto de obra ajustado con las cantidades de acero correspondientes.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoria se encuentra en revisión del presupuesto de obra ajustado, de estar en orden, se realizará comité operativo y aprobación de desembolsos para compra de materiales.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

NO SE REALIZA ESQUEMA GRAFICO YA QUE LA PROGRAMACION ESTA EN FUNCION DEL INICIO DE OBRA POR LO CUAL NO SE PUEDE DETERMINAR AVANCE O ATRASO DE OBRA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Realizar revision y verificacion del presupuesto de obra.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | SEMANA No.: 23 del 21-jun al 27-jun (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de dos (2) obras de drenaje tipo box coulvert una de 2x2 m y la otra de 2x1.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No.	4222 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 208.194.251,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 208.194.251,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215.361.440,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 72.490.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 287.851.480,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208.194.251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208.194.251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.361.440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215.361.440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208.194.251,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	- $
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	- $
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	- $
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.661.761,00	2,24%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: La programacion de obra esta en funcion al inicio de obra, por lo cual no es posible calcular el avance o atraso de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 190.942.505,29	66,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 188.726.048,90	65,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.372.404,60	6,73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.155.948,21	5,96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO - MARZO

VALOR FACTURA: $ 53.774.910,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radica acta del mes de Abril el 05 de junio de 2024, a espera de observaciones.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 2X2 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 2X1 M	UNIDAD	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avan

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: A la fecha no se inician obra por lo tanto se deconoce el estado de permisos y/o licencias ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Interventoria, revisó y aprobó el presupuesto de obra ajustado y realizo el envio de los respectivos cheques aprobados. Los cheques fueron recibidos por la JAC el dia miercoles veintiseis (26) de junio de 2024.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera que la JAC realice las compras y transporte de los materiales al punto de la obra. Para que de tal forma, se logre dar inicio a las actividades de obra, lo antes posible.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

NO SE REALIZA ESQUEMA GRAFICO YA QUE LA PROGRAMACION ESTA EN FUNCION DEL INICIO DE OBRA POR LO CUAL NO SE PUEDE DETERMINAR AVANCE O ATRASO DE OBRA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento al ingreso de materiales y el inicio de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 4222 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO II

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 208.194.251,00

VALOR ACUMULADO: $ 208.194.251,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 41.838.850,20	3/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.459.712,55	3/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.758.275,30	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037313

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3/11/2023	31/12/2023
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009895 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.838.850,20	30	12	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.459.712,55	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.758.275,30	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037313

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	11	2023	17	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009895 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.838.850,20	18	4	2024	15	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.459.712,55	18	4	2024	15	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.758.275,30	15	7	2024	15	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037313

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	3	11	2023	15	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009895 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	4/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: junio-24 **PROYECTO:** IINTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 3613-2023, No. 4143-2023, No. 4240-2023, No. 3752-2023, No. 4222-2023 **CONTRATISTA:** OAC VEREDA CANO BONITO, OAC VEREDA CERRRITOS, OAC VEREDA EL RECREO, OAC VEREDA SAN LUCAS Y OAC VEREDA SAN FRANCISCO II

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL HUILA / COFREM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	GABRIEL HERNAN VELAZQUEZ PANTOJA	1.121.867.534	Director de Interventoria	$ 3.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 3.300.000	$ 229.680	V	SALUD TOTAL SA	30405545	$ 132.000	PORVENIR	30405545	$ 528.000	$ 132.000	$ -	$ -	
2	WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ	1.121.930.514	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 4.800.000	$ 334.080	V	NUEVA EPS	30405545	$ 192.000	PORVENIR	30405545	$ 768.000	$ 192.000	$ -	$ -	
3	ANGELICA MARIA SEGURA GARZON	1.121.850.008	Profesional Social	$ 1.750.000																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 1.750.000	$ 121.800	V	NUEVA EPS	30129911	$ 70.000	COLPENSIONES	30129911	$ 280.000	$ 70.000	$ -	$ -	
4	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	1.152.186.533	Profesional Ambiental	$ 1.050.000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 1.050.000	$ 73.080	V	NUEVA EPS	30405222	$ 42.000	PROTECCION	30405222	$ 168.000	$ 42.000	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 10.900.000**																																										

El Interventor adiunta la certificación de fecha 4/07/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma

Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-250038 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUA JUNIO 2024

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023

CONVENIOS No. 3613-2023, 4143-2023, 4240-2023, 3752-2023, 4222-2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

CONTRATISTA: JAC CAÑO BONITO, CERRITOS, EL RECREO, SAN LUCAS, SAN FRANCISDO II

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES DE JUNIO																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
VEHICULO	NISSAN FRONTIER - 2488 CC - JCR132	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
IMPRESORA	EPSON L3210	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
DOTACIÓN DE OFICINA	ESCRITORIO (1), MESA, SILLA (5)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 5202-250038 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

MES INFORME MENSUAL: junio-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". LOTE 2
OAC VEREDA CAÑO BONITO
OAC VEREDA CERRRITOS
OAC VEREDA EL RECREO
OAC VEREDA SAN LUCAS
OAC VEREDA SAN FRANCISCO II

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO No. 3613-2023, No. 4143-2023, No. 4240-2023, No. 3752-2023, No. 4222-2023

CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1448323	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 4.307.229,00	$ -
		C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 211.054.211,00	$ 91.057.800,40
2024	621724	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	ADICIONAL	$ 72.490.040,00	$ 72.490.040,00
				TOTAL		**287.851.480,00**	**$ 163.547.840,40**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 215.361.440**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	23/01/2024 al 31/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1448323 DEL 29/12/2023	$ 215.361.440,00	$ 215.361.440		
2	01/02/2024 al 29/02/2024	$ 20.066.000	$ 3.812.540	$ 23.878.540,00	$ -	$ 23.878.540	$ -	1448323 DEL 29/12/2023	$ 191.482.900,00	$ 191.482.900		
3	01/03/2024 al 31/03/2024	$ 25.123.000	$ 4.773.370	$ 29.896.370,00		$ 29.896.370		1448323 DEL 29/12/2023	$ 161.586.530,00	$ 161.586.530		
4	01/04/2024 al 30/04/2024	$ 25.156.000	$ 4.779.640	$ 29.935.640,00		$ 29.935.640		1448323 DEL 29/12/2023	$ 131.650.890,00	$ 131.650.890		
5	$ 01/05/2024 al 31/05/2024		$ 6.481.250	$ 40.593.089,60		$ 40.593.090		1448323 DEL 29/12/2023	$ 91.057.800,40	$ 91.057.800		
6	01/06/2024 al 30/06/2025	$ 32.211.000	$ 6.120.090	$ 38.331.090,00		$ 38.331.090		1448323 DEL 29/12/2023	$ 52.726.710,40	$ 125.216.750,40		
	TOTALES	**$ 136.667.840**	**$ 25.966.890**	**$ 162.634.729,60**	**$ -**	**$ 162.634.729,60**	**$ -**		**$ 52.726.710,40**	**$ 125.216.750**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL	$ 136.667.840,00	$ 25.966.889,60	$ 162.634.729,60

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma:
Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-250038 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 215.361.440,00

VALOR ACUMULADO: $ 287.851.480,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	22	12	2023	1	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20,00%	43.072.288,00	22	12	2023	1	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	22	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ORDEN DE INICIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	9	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	8	1	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 1, 2 y 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN SUSPENSIÓN 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	2	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	1	2	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	2	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	1	4	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	7	11	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	7	5	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	8	12	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	7	6	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 4

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	23	12	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	22	6	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 5 Y ADICIÓN

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	28.785.148,00	30	12	2023	6	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	57.570.296,00	30	12	2023	6	8	2027
Calidad del servicio	30,00%	86.355.444,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 9 - 10.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No. 25202 - 62095 CND

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202 - 250038 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-9-FR-2 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 04/06/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ **No.** 5
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

RESOLUCIÓN No.: 4636 DE 18/12/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: Convenios solidarios 3613-23, 3752-23, 4240-23, 3613-23, 4222-23. CONTRATISTA: OAC CAÑO BONITO, OAC SAN LUCAS, OAC EL RECREO, OAC CERRITOS Y OAC SAN FRANCISCO DOS

PLAZO INICIAL: 2 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 215.361.440,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 287.851.480,00

PLAZO ACUMULADO: 15/06/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 72.490.040,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 25/04/2024		2024																		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 6.600.000,00		1,00	$ 6.600.000			2,000	$ 13.200.000	0,50	$ 3.300.000	0,50	$ 3.300.000	0,50	$ 3.300.000	0,50	$ 3.300.000	0,20	$ 1.320.000	0,20	$ 1.320.000		$ -		$ -		$ -		$ -	2,40	$ 15.840.000
	1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 4.800.000,00		2,00	$ 9.600.000			4,000	$ 19.200.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	0,50	$ 2.400.000		$ -		$ -		$ -		$ -	5,50	$ 26.400.000
	1	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000			0,640	$ 2.240.000		$ -		$ -		$ -	0,64	$ 2.240.000	1,00	$ 3.500.000	0,28	$ 980.000		$ -		$ -		$ -		$ -	1,92	$ 6.720.000
	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000			0,650	$ 2.275.000		$ -		$ -		$ -	0,65	$ 2.275.000	1,00	$ 3.500.000	0,28	$ 980.000		$ -		$ -		$ -		$ -	1,93	$ 6.755.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				**$ 5.000.000**			1,000	$ 5.000.000		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 2.500.000	0,50	$ 2.500.000		$ -									1,000	$ 5.000.000
		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VIAS	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPCIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN DISEÑOS GEOMÉTRICO	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO																												
	1	INSPECTOR	$ 1.800.000,00		9,00	$ 16.200.000			5,000	$ 9.000.000		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.800.000	3,00	$ 5.400.000	3,00	$ 5.400.000		$ -		$ -		$ -		$ -	7,00	$ 12.600.000
	1	INSPECTOR SST	$ 1.900.000,00		4,00	$ 7.600.000			2,000	$ 3.800.000		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 950.000	1,00	$ 1.900.000	1,00	$ 1.900.000		$ -		$ -		$ -		$ -	2,50	$ 4.750.000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																												
	1	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000			2,000	$ 2.600.000		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 650.000	1,00	$ 1.300.000	1,00	$ 1.300.000		$ -		$ -		$ -		$ -	2,50	$ 3.250.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 61.600.000**				**$ 57.315.000**	**$**	**8.100.000,00**	**$**	**8.100.000,00**	**$**	**8.100.000,00**	**$**	**18.515.000,00**	**$**	**24.220.000,00**	**$**	**14.280.000,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**81.315.000**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**				**$ 2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 145.376.000**				**$ 135.263.400**	**$**	**19.116.000,0**	**$**	**19.116.000,0**	**$**	**19.116.000,0**	**$**	**43.695.400,0**	**$**	**57.159.200,0**	**$**	**33.700.800,0**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**191.903.400**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO																		TOTAL	
											FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIÁTICOS																												
		VIATICOS DIRECTOR Y/ ESPECIALISTAS	$ 210.000,00	DÍA	10,00	$ 2.100.000			5,00	1050000,00		$ -		$ -		$ -	2,50	$ 525.000	2,50	$ 525.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,00	$ 1.050.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
		VEHÍCULO TIPO CAMPERO O CAMIONETA (INCLUYE PEAJES, CONDUCTOR Y COMBUSTIBLES) Y CUYO MODELO SEA HASTA DIEZ (10) AÑOS ANTERIORES AL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	$ 5.000.000,00	MES	2,00	$ 10.000.000			3,00	$ 15.000.000,00		$ -	1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000	0,50	$ 2.500.000		$ -		$ -		$ -		$ -	4,50	$ 22.500.000
		MOTOCICLETAS (150 CC O MAYOR, MODELO 2014 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT)	$ 600.000,00	MES	13,00	$ 7.800.000			7,00	$ 4.200.000,00		$ -		$ -		$ -	1,50	$ 900.000	4,00	$ 2.400.000	4,00	$ 2.400.000		$ -		$ -		$ -		$ -	9,50	$ 5.700.000
		TRABAJO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE PERSONAL EQUIPO Y TRANSPORTE)	$ 6.000.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	1,50	$ 9.000.000			1,50	$ 9.000.000,00		$ -		$ -		$ -	0,45	$ 2.700.000	0,60	$ 3.600.000	0,46	$ 2.760.000		$ -		$ -		$ -		$ -	1,51	$ 9.060.000
		ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 600.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 1.200.000			2,00	$ 1.200.000,00		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 300.000	1,00	$ 600.000	0,60	$ 360.000		$ -		$ -		$ -		$ -	2,10	$ 1.260.000
		OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 800.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 1.600.000			4,00	$ 3.200.000,00	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000		$ -		$ -		$ -		$ -	6,00	$ 4.800.000
		OTROS COSTOS																												
		TRANSPORTES AÉREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLES)	$ 1.200.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 2.400.000			1,00	$ 1.200.000,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.200.000	1,00	$ 1.200.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 2.400.000
		EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.	$ 300.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 600.000			4,00	$ 1.200.000,00	0,000	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 900.000
		COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC)	$ 300.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 600.000			4,00	$ 1.200.000,00	0,500	$ 150.000	0,69	$ 207.000	0,83	$ 249.000	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000		$ -		$ -		$ -		$ -	5,02	$ 1.506.000
		VEEDURÍA TÉCNICA COMUNITARIA	$ 150.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 300.000			3,00	$ 450.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 150.000	1,00	$ 150.000	1,00	$ 150.000		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 450.000
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								$ 8.012.600,00												$ 362.600								$ 362.600
*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 35.600.000**				**$ 45.712.600**	**$**	**950.000**	**$**	**6.007.000**	**$**	**6.049.000**	**$**	**12.175.000**	**$**	**14.875.000**	**$**	**9.932.600**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**49.988.600**
*	SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS					**$ 180.976.000**				**$ 180.976.000**	**$**	**20.066.000**	**$**	**25.123.000**	**$**	**25.165.000**	**$**	**55.870.400**	**$**	**72.034.200**	**$**	**43.633.400**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**241.892.000**
*	IVA = 19%					**$ 34.385.440**				**$ 34.385.440**	**$**	**3.812.540**	**$**	**4.773.370**	**$**	**4.781.350**	**$**	**10.615.376**	**$**	**13.686.498**	**$**	**8.290.346**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**45.959.480,00**
*	COSTO TOTAL					**$ 215.361.440**				**$ 215.361.440**	**$**	**23.878.540**	**$**	**29.896.370**	**$**	**29.946.350**	**$**	**66.485.776**	**$**	**85.720.698**	**$**	**51.923.746**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**287.851.480,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS												

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
DE CONFORMIDAD CON EL ESTADO ACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA, SE REQUIERE DAR CONTINUIDAD AL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LOS CINCO (5) CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS Y EN EJECUCIÓN A CARGO DE ÉSTA, PARA LO CUAL SE HACE NECESARIO E INDISPENSABLE CONTAR TANTO CON LA ESTRUCTURA DE PERSONAL COMO DE LOGÍSTICA ADECUADA POR PARTE DE DICHA INTERVENTORÍA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA ADECUADA SUPERVISIÓN, CONTROL, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL Y FINANCIERO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DE LA MISMA ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma:
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
