INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7
CONTRATO No. 5040 de 2023.

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DEACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.

CONTRATISTA: CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

INTERVENTOR:
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

SUPERVISOR:
ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI.

JULIO 2024.

TABLA DE CONTENIDO.

1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CAÑO BONITO. 1
2. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CERRITOS. 3
3. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - EL RECREO. 5
4. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN LUCAS. 7
5. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN FRANCISCO II. 9
6. INTRODUCCIÓN. 11
7. CONVENIO SOLIDARIO No. 3613 DE 2023 JAC VEREDA CAÑO BONITO. 12
   - 7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 12
     - 7.1.1 Localización del proyecto. 12
     - 7.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 13
     - 7.1.3 Características técnicas del convenio. 14
   - 7.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 14
     - 7.2.1 Información General del Convenio. 14
     - 7.2.2 Descripción de actividades. 15
     - 7.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 15
     - 7.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 15
   - 7.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 16
     - 7.3.1 Informe semanal. 16
     - 7.3.2 Maquinaria y Equipo. 16
     - 7.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 16
     - 7.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 16
     - 7.3.5 Estado general del tiempo. 17
     - 7.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 17
     - 7.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 17
     - 7.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 18
     - 7.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 18

8. CONVENIO SOLIDARIO No. 4143 DE 2023 JAC VEREDA CERRITOS. 20
8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 20
8.1.1 Localización del proyecto. 20
8.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 21
8.1.3 Características técnicas del convenio. 22
8.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 22
8.2.1 Información General del Convenio. 22
8.2.2 Descripción de actividades. 23
8.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 23
8.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 23
8.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 24
8.3.1 Informe semanal. 24
8.3.2 Maquinaria y Equipo. 24
8.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 24
8.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 25
8.3.5 Estado general del tiempo. 25
8.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 25
8.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 25
8.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 26
8.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 26
9. CONVENIO SOLIDARIO No. 4240 DE 2023 JAC VEREDA EL RECREO. 28
9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 28
9.1.1 Localización del proyecto. 28
9.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 29
9.1.3 Características técnicas del convenio 29
9.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 30
9.2.1 Información General del Convenio. 30
9.2.2 Descripción de actividades. 31

9.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 31

9.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 31

9.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 32

9.3.1 Informe semanal. 32

9.3.2 Maquinaria y Equipo. 32

9.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 32

9.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 33

9.3.5 Estado general del tiempo. 34

9.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 34

9.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 34

9.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 35

9.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 35

10. CONVENIO SOLIDARIO No. 3752 DE 2023 JAC VEREDA SAN LUCAS. 36

10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 36

10.1.1 Localización del proyecto. 36

10.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 37

10.1.3 Características técnicas del convenio. 38

10.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 38

10.2.1 Información General del Convenio. 38

10.2.2 Descripción de actividades. 39

10.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 39

10.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 39

10.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 40

10.3.1 Informe semanal. 40

10.3.2 Maquinaria y Equipo. 40

10.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 40

10.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 41

10.3.5 Estado general del tiempo. 41

10.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 42

10.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 42

10.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 43

10.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 43

11. CONVENIO SOLIDARIO No. 4222 DE 2023 JAC VEREDA SAN FRANCISCO II. 44

11.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 44

11.1.1 Localización del proyecto. 44

11.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 45

11.1.3 Características técnicas del convenio. 46

11.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 46

11.2.1 Información General del Convenio. 46

11.2.2 Descripción de actividades. 47

11.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 48

11.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 48

11.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 48

11.3.1 Informe semanal. 48

11.3.2 Maquinaria y Equipo. 48

11.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 48

11.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 49

11.3.5 Estado general del tiempo. 50

11.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 50

11.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 50

11.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 51

11.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 51

12. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 52

12.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 52

12.1.1 Actividades Generales y de Administración. 53

12.1.2 Actividades Técnicas. 53

12.1.3 Actividades financieras. 54

12.1.4 Actividades Ambientales. 54

12.2 Informes especialistas y profesionales. 54

12.3 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría. 54

13. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 54

13.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría. 54

13.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. 55

13.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría. 55

13.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría. 56

13.5 Otros documentos seguimiento mensual. 57

14. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES. 58

15. ANEXOS. 58

15.1 Relación Correspondencia. 58

15.2 Documentos de seguimiento. 59

15.3 Registro fotográfico. 59

15.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios. 61

LISTA DE ILUSTRACIONES.

Ilustración 1. Zona de intervención Vereda Caño Bonito. 13
Ilustración 2. Zona de intervención Vereda Cerritos. 21
Ilustración 3. Zona de intervención Vereda El Recreo..... 29
Ilustración 4. Zona de intervención Vereda San Lucas. 37
Ilustración 5. Zona de intervención Vereda San Francisco II. 45

LISTA DE TABLAS.

Tabla 1. Fotos iniciales del tramo a intervenir vereda Caño Bonito. 13
Tabla 2. Relación alcance físico del convenio JAC Caño Bonito. 14
Tabla 3. Información general del convenio JAC Caño Bonito. 14
Tabla 4. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 15
Tabla 5. Relación profesionales aprobados. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 6. Seguimiento garantías del convenio JAC Caño Bonito. 18
Tabla 7. Relación de comités realizadas en el periodo reportado. **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 8. Foto inicial del tramo a intervenir vereda Cerritos. 21
Tabla 9. Relación alcance físico del convenio JAC Cerritos. 22
Tabla 10. Información general del convenio JAC Cerritos. 22
Tabla 11. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 23
Tabla 12. Relación profesionales aprobados. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 13. Seguimiento garantías del convenio JAC Cerritos. 26
Tabla 14. Relación de comités realizados en el periodo reportado. ... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 15. Foto inicial del punto a intervenir vereda El Recreo. 29
Tabla 16. Relación alcance físico del convenio JAC El Recreo. 30
Tabla 17. Información general del convenio JAC El Recreo. 30
Tabla 18. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 31
Tabla 19. Relación profesionales aprobados. 33
Tabla 20. Seguimiento garantías del convenio JAC El Recreo. 35
Tabla 21. Relación de comités realizados en el periodo reportado. ... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 22. Foto inicial del tramo a intervenir vereda San Lucas. 37
Tabla 23. Relación alcance físico del convenio JAC San Lucas. 38
Tabla 24. Información general del convenio JAC San Lucas. 39
Tabla 25. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 39

Tabla 26. Relación profesionales aprobados. 41
Tabla 27. Seguimiento garantías del convenio JAC San Lucas. 42
Tabla 29. Foto inicial del punto a intervenir vereda San Francisco II 46
Tabla 30. Relación alcance físico del convenio JAC San Francisco II 46
Tabla 31. Información general del convenio JAC San Francisco II. 47
Tabla 32. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 47
Tabla 33. Relación profesionales aprobados. 49
Tabla 34. Seguimiento garantías del convenio JAC San Francisco II 50
Tabla 35. Relación de comités realizados en el periodo reportado. ... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 36. Información general del contrato de interventoría. 52
Tabla 37. Relación personal de interventoría. 55
Tabla 38. Disponibilidad presupuestal contrato de interventoría 55
Tabla 39. Garantías contrato de interventoría anexo 0. 56
Tabla 40. Garantías contrato de interventoría anexo 5 56
Tabla 41. Relación de correspondencia. 59
Tabla 42. Registro fotográfico. 61

1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CAÑO BONITO.

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** JULIO 2024

CONVENIO No.: 3613 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 1:	30/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 2:	30/04/2024
FECHA DE PRÓRROGA 3:	15/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/08/2024
PLAZO ACUMULADO:	15/08/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 207 992 007.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 207 992 007.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, LONGITUD APROXIMADA: 116,20 M	Conformación De La Calzada Existente	M2	697.20
	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	133.10
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	75.00
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	44.70
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3247.60
	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	4.60
	ITEMS NO PREVISTOS		
	Relleno Con material Seleccionado De La Región	M3	52.60
	Transporte de Maquinaria San José - Caño bonito	UND	2.00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Conformación De La Calzada Existente	M2	0.00	697.20
Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	0.00	133.10
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0.00	75.00
Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	0.00	44.70
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0.00	3247.60
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0.00	4.60
ITEMS NO PREVISTOS			
Relleno Con material Seleccionado De La Región	M3	0.00	52.60
Transporte de Maquinaria San José - Caño bonito	UND	0.00	2.00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 157 148 903.00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4 714 468.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46 128 636.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 207 992 007.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ 21 181 934.67	$ 157 148 903.00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ 1 991 000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17 121 389.76	$ 46 128 636.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 38 303 324.43**	**$ 192 815 165.76**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 207 992 007.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192 815 165.76
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	92.70%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella



Placa huella



Placa huella

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CERRITOS.

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** JULIO 2024

CONVENIO No.: 4143 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 1:	30/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 2:	30/04/2024
FECHA DE PRÓRROGA 3:	15/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/08/2024
PLAZO ACUMULADO:	15/08/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 203 603 516.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 203 603 516.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, LONGITUD APROXIMADA: 119,20 M	Conformación De La Calzada Existente	M2	596.00
	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	115.60
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	73.40
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	26.90
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3157.80
	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	3.90
	ITEMS NO PREVISTOS		
	Relleno Con material Seleccionado De La Región	M3	36.00
	Transporte de Maquinaria San José - Caño bonito	UND	1.00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Conformación De La Calzada Existente	M2	0.00	596.00
Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	0.00	115.60
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0.00	73.40
Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	0.00	26.90
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0.00	3157.80
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0.00	3.90
ITEMS NO PREVISTOS			
Relleno Con material Seleccionado De La Región	M3	36.00	36.00
Transporte de Maquinaria San José - Caño bonito	UND	0.00	1.00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 156 265 803.00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4 687 975.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42 649 738.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 203 603 516.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ 40 018 050.00	$ 156 265 803.00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 19 728 814.00	$ 36 702 860.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 59 746 864.00**	**$ 192 968 663.00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 203 603 516.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192 968 663.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	94.78%


EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella

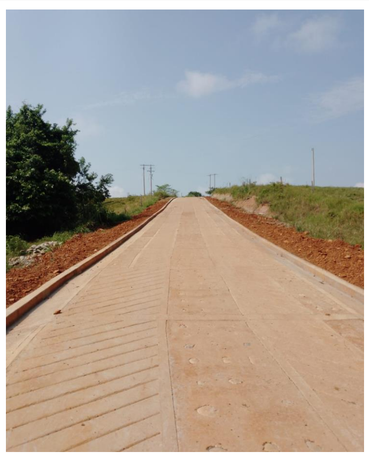

Placa huella



Placa huella

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - EL RECREO.

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** JULIO 2024

CONVENIO No.: 4240 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	16/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA 1:	16/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA 2:	30/04/2024
FECHA DE PRÓRROGA 3:	15/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/08/2024
PLAZO ACUMULADO:	15/08/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200 041 344.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200 041 344.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE (3) BOX COULVERT (1X1)	Excavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y Retiro	M3	143.50
	Excavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye Cargue Y Retiro	M3	6.90
	Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye Explote Y Cargue	M3	131.70
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	22.70
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	6.10
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3021.40
	Figurado E Instalacion De Aceros	M3	3021.40
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX COULVERT (1.5X1.5)	Excavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y Retiro	M3	85.00
	Excavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye Cargue Y Retiro	M3	2.90
	Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye Explote Y Cargue	M3	49.70
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	15.40
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	3.20
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1602.60
	Figurado E Instalacion De Aceros	M3	1602.60

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Excavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y Retiro	M3	48.00	143.50
Excavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye Cargue Y Retiro	M3	2.30	6.90
Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye Explote Y Cargue	M3	87.80	131.70
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	5.00	22.70
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	2.03	6.10
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1007.13	3021.40
Figurado E Instalacion De Aceros	M3	1007.13	3021.40
Excavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y Retiro	M3	0.00	85.00
Excavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye Cargue Y Retiro	M3	0.00	2.90
Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye Explote Y Cargue	M3	15.00	49.70
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0.00	15.40
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0.00	3.20
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0.00	1602.60
Figurado E Instalacion De Aceros	M3	0.00	1602.60

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 152 820 763.00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4 584 623.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42 635 958.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 200 041 344.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ 4 489 453.00	$ 152 820 763.00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 2 528 118.00	$ 22 857 864.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 7 017 571.00**	**$ 175 678 627.00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 193 812 458.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 175 678 627.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	96.89%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Box culvert 1(1x1) Y 2(1X1)



Box culvert 3(1x1)



Box culvert 4(1.5x1.5)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN LUCAS.

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** JULIO 2024

CONVENIO No.: 3752 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCAS

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	18/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA 1:	18/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA 2:	30/04/2024
FECHA DE PRÓRROGA 3:	30/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2024
PLAZO ACUMULADO:	30/09/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 216 314 958.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 216 314 958.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	6.00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	1.00
CONSTRUCCIÓN DE (2) ALCANTARILLA	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	92.90
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	16.40
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	50.90
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	19.10
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0.90
	Tuberia De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diametro Interior	M	12.00
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157.80
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	13.00
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, LONGITUD APROXIMADA: 100,00 M	Conformación De La Calzada Existente	M2	420.00
	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	69.70
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	42.60
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	28.30
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2004.10
	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	2.90
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	19.00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	ANTIDAD ACUMULAD
Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	0	0
Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Tuberia De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diametro Interior	M	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Conformación De La Calzada Existente	M2	0	0
Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 168 583 093.00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 5 057 493.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42 674 372.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 216 314 958.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ 8 436 659.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ -**	**$ 8 436 659.00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8 084 042.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	3.74%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2	Foto 3

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

5. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN FRANCISCO II.

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** JULIO 2024

CONVENIO No.: 4222 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO II

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 1:	30/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 2:	30/04/2024
FECHA DE PRÓRROGA 3:	15/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2024
PLAZO ACUMULADO:	30/09/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 208 194 251.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 208 194 251.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT (2x1)	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	10.20
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	1.80
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	20.50
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	17.80
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	1.10
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1646.30
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	158.50
CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT (2x2)	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	10.20
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	1.80
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	19.20
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	29.60
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	2.90
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2470.80
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	337.60

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	10.20	10.20
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	1.80	1.80
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0.00	0.00
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0.00	0.00
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	1.10	1.10
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	946.30	946.30
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0.00	0.00
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	10.20	10.20
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	1.80	1.80
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0.00	0.00
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	29.60	29.60
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	2.90	2.90
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2470.80	2470.80
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0.00	0.00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 160 705 586.00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4 821 168.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42 667 497.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 208 194 251.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ 75 497 738.00	$ 75 497 738.00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17 643 560.00	$ 22 305 321.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 93 141 298.00**	**$ 97 803 059.00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 81 200 000.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 97 803 059.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	46.98%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

6. INTRODUCCIÓN.

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS suscribió convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal del departamento del Guaviare, bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Para lo cual, en el municipio de El Retorno las JAC Caño Bonito, Cerritos, El Recreo, San Lucas y San Francisco II, suscribieron los convenios solidarios No. 3613, 4143, 4240, 3752, 4222 de 2023, respectivamente.

Dado lo anterior, el INVIAS mediante proceso CMA-DEO-SVR-150-2023 efectuó el contrato No. 5040 de 2023 con orden de inicio 2023S-VBOG-033951 para realizar la interventoría a los convenios solidarios anteriormente mencionados, con el objeto "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2".

Para lo anterior, el INVIAS designó como supervisor del contrato de interventoría al ingeniero Carlos German Corzo Upegui.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El presente informe parcial contempla las actividades realizadas en cada uno de los convenios en el periodo entre el 01 de abril de 2024 hasta el 30 de abril de 2024.

7. CONVENIO SOLIDARIO No. 3613 DE 2023 JAC VEREDA CAÑO BONITO.

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

7.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas - 72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O



Ilustración 1. Zona de intervención Vereda Caño Bonito.

7.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 100 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada compactación y conformación de cunetas que permitan un correcto drenaje en la vía, esto ocasiona que en temporada de lluvias se genere erosión del material superficial y sea muy complicado su transitabilidad.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)

Tabla 1. Fotos iniciales del tramo a intervenir vereda Caño Bonito.

7.1.3 Características técnicas del convenio.

Según las especificaciones iniciales las actividades contempladas consistían en realizar limpieza de obras menores de drenaje, además de actividades de mejoramiento que contemplaban la construcción de obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior y placa huella.

Una vez definidas las necesidades reales en campo y realizadas las actividades preliminares como lo son el levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño geométrico y la actualización de precios de materiales y servicios se obtuvo como meta física del convenio lo siguiente:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS (UND)
0,00	0,00	116,20	0,00

Tabla 2. Relación alcance físico del convenio JAC Caño Bonito.

7.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

7.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	3613 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	29/09/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO
NIT:	901.010.660-2
VALOR INICIAL	$207.992.007,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$208.992.007,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2023
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
PRÓRROGA No. 3	15/07/2024
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	15/08/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 3. Información general del convenio JAC Caño Bonito.

7.2.2 Descripción de actividades.

En este periodo no se presentan actividades realizadas de forma general en obra ya que las actividades de ejecución de obra fueron finalizadas en el mes anterior (junio), en este periodo la JAC presenta el plan de gestión social, anexando los documentos necesarios y requeridos para su respectiva aprobación.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de julio de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 157.148.903	N/A	$ 21 181 934.67	$ 157 148 903.00	$ 0
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.714.468	N/A	$ 0	$ 0	$ 4 714 468.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.128.636	N/A	$ 17 121 389.76	$ 35 666 262.76	$ 10 462 373.24
TOTAL	**$207.992.007**	**N/A**	**$ 22.923.935,00**	**$ 154.511.841,33**	**$ 15 176 841.24**

Tabla 4. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

El porcentaje de avance ejecutado de obra en el periodo reportado corresponde a 98,69%, por otro lado, de acuerdo con la tabla 4 el porcentaje de ejecución presupuestal corresponde al 92.70%.

7.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

Para este periodo no se presentaron modificaciones para el proyecto, por lo cual no se tiene la creación de nuevos ítems no previstos.

7.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

A fecha del presente informe la obra se encuentra al 100% de ejecución (116,20 metros lineales de placa huella). Se encuentra pendiente que la JAC ejecute el presupuesto de gestión social, ya que este no ha sido aprobado por sostenibilidad (el instituto INVIAS).
Se ejecutó la obra de muy buena manera, cumpliendo eficiente y técnicamente con las actividades y programación de obra.

7.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

7.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 24: Desde el 28 de junio al 04 de julio de 2024.
- Semana 25: Desde el 05 al 11 de julio de 2024.
- Semana 26: Desde el 12 al 18 de julio de 2024.
- Semana 27: Desde el 19 al 25 de julio de 2024.
- Semana 28: Desde el 26 al 31 de julio de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

7.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de julio No se contrató ningún servicio de maquinaria o equipo.

NO Se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

7.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Durante el mes de Julio no hubo personal contratado a fecha del presente informe.

No Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

7.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3613 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 30 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $ 207.992.007.00 para el contrato principal;

discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $207.413.317,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $578.690,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".
No Se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".
No Se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

7.3.5 Estado general del tiempo.

No Se realizó el registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención, ya que no se vio necesario debido que no se ejecutaron ningun tipo de actividades, en especial de obra.

No Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

7.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Durante el periodo reportado, no se realizaron actividades en obra, por lo cual no se realizaron toma de muestras de concretos en cilindros.

No Se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

7.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100036855 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009777 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023.
- Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. CV-100036855 anexo No. 1-3 de fecha 18/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009777 anexo No. 1-2 de fecha 16/01/2024.

- Prórroga No. 2: Póliza de cumplimiento No. CV-100036855 anexo No. 4 de fecha 08/06/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009777 anexo No. 3 de fecha 08/06/2024.

- Prórroga No. 3: Póliza de cumplimiento No. CV-100036855 anexo No. 5 de fecha 30/09/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009777 anexo No. 4 de fecha 30/09/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 41.798.401,40	15/07/2024	15/08/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.449.600,35	15/07/2024	15/08/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 62.697.602,10	15/08/2024	18/08/2029
TOTAL		**$114.945.603,85**	**29/09/2023**	**15/07/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	29/09/2023	15/08/2024

Tabla 5. Seguimiento garantías del convenio JAC Caño Bonito.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

7.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se ejecutaron cumplieron las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

7.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC ejecuto todas las actividades o ítems de obra de acuerdo con la programación de obra. Lo cual la obra se terminó en el tiempo previsto.
- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-acta y actas de recibo parcial de obra para convenios.

- Actas de Comité de obra y operativo: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
19/07/2024	Comité operativo No. 7	Solicitud de orden de pago para aprobación de: Nomina del personal de obra, liquidación, pago a compra de materiales, pago al ingeniero residente de obra, pago para alquiler de máquinas, equipos y transportes.

Tabla 19. Relación de comités realizados en el periodo reportado.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

8. CONVENIO SOLIDARIO No. 4143 DE 2023 JAC VEREDA CERRITOS.

8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

8.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O

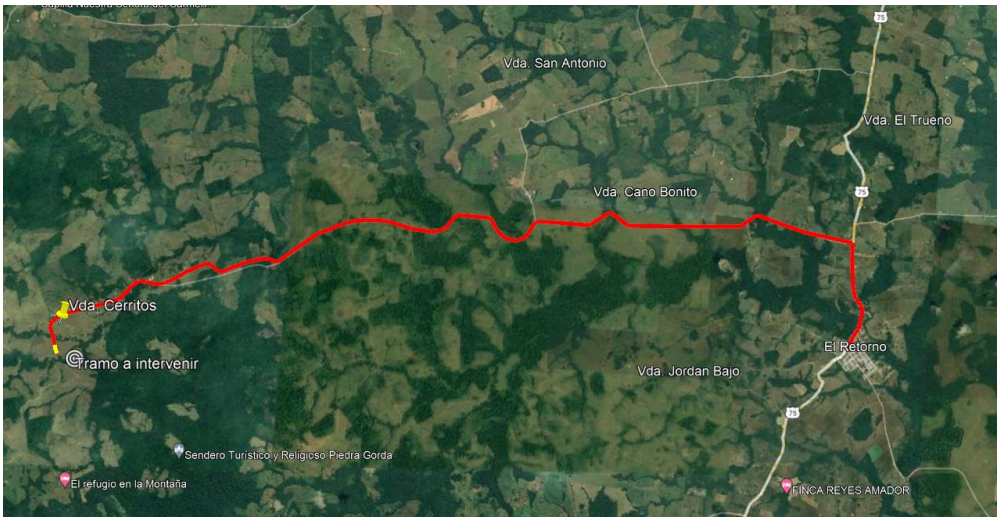


Ilustración 2. Zona de intervención Vereda Cerritos.

8.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 130 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada compactación y conformación de cunetas que permitan un correcto drenaje en la vía, esto ocasiona que en temporada de lluvias se genere erosión del material superficial y sea muy complicado su transitabilidad.



Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)

Tabla 7. Foto inicial del tramo a intervenir vereda Cerritos.

8.1.3 Características técnicas del convenio.

Según las especificaciones iniciales las actividades contempladas consistían en realizar limpieza de obras menores de drenaje, desmonte y limpieza de zonas boscosas, además de actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella

Una vez definidas las necesidades reales en campo y realizadas las actividades preliminares como lo son el levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño geométrico y la actualización de precios de materiales y servicios se obtuvo como meta física del convenio lo siguiente:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS (UND)
0,00	0,00	119,20	0,00

Tabla 8. Relación alcance físico del convenio JAC Cerritos.

8.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

8.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	4143 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	30/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS
NIT:	901.282.150-4
VALOR INICIAL	$204.603.516,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$203.603.516,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2023
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
PRÓRROGA No. 3	15/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15/08/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 9. Información general del convenio JAC Cerritos.

8.2.2 Descripción de actividades.

En este periodo no se presentan actividades realizadas de forma general en obra ya que las actividades de ejecución de obra fueron finalizadas en el mes anterior (junio), aclarando que todavía falta realizar la aplicación del material de relleno, lo cual durante este periodo no se logró realizar por diferentes factores (entre ellos el mal tiempo y el mal estado de las vías y puentes en madera, además del envío tardío de las órdenes de compra entre otros) en este periodo la JAC presenta el plan de gestión social, anexando los documentos necesarios y requeridos para su respectiva aprobación.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de julio de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 156.265.803	N/A	$ 40 018 050.00	$116.247.753,00	$ 0
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.687.975	N/A	$ 0	$ 0	$ 4 687 975.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.649.738	N/A	$ 19 728 814.00	$16.974.046,00	$ 5 946 878.00
TOTAL	**$ 203.603.516**	**N/A**	**$ 59 746 864.00**	**$ 192.968.663.0**	**$10 634 853.00**

Tabla 10. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado de obra en el periodo reportado corresponde a 96%. Por otro lado, de acuerdo con la tabla 10 el avance presupuestal a la fecha es del 94,78%.

8.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

Para este periodo no se presentaron modificaciones para el proyecto, por lo cual no se tiene la creación de nuevos ítems no previstos.

8.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

A fecha del presente informe la obra se encuentra al 100% de ejecución (119,20 metros lineales de placa huella). Por lo cual se concluye que se ha

ejecutado la obra cumpliendo eficiente y técnicamente con las actividades y programación de obra. Se encuentra pendiente el visto bueno de sostenibilidad para que la JAC realiza la Obra de Participación Comunitaria con los recursos que estaban destinado para el PAGA.

8.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

8.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 24: Desde el 28 de junio al 04 de julio de 2024.
- Semana 25: Desde el 05 al 11 de julio de 2024.
- Semana 26: Desde el 12 al 18 de julio de 2024.
- Semana 27: Desde el 19 al 25 de julio de 2024.
- Semana 28: Desde el 26 al 31 de julio de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

8.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de julio se contrató un servicio de maquinaria "Retroexcavadora" con el fin de realizar la aplicación de relleno con material seleccionado de la región.

Se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

8.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Durante el mes de Julio no hubo personal contratado a fecha del presente informe.

No Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

8.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4143 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $203.603.516,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $203.246.689,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $356.827,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

Se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

NO anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

8.3.5 Estado general del tiempo.

Se realizó el registro del reporte del tiempo durante parte de este periodo donde se realizó la actividad de aplicación de relleno con material seleccionado de la región, terminando así las actividades de obra.

Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

8.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Durante el periodo reportado, no se realizaron actividades en obra, por lo cual no se realizaron toma de muestras de concretos en cilindros.

No Se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

8.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100037060 anexo No. 0 de fecha 01/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009844 anexo No. 0 de fecha 01/11/2023.
- Prórroga 1: Póliza de cumplimiento No. CV-100037060 anexo No. 1-3 de fecha 18/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009844 anexo No. 1-2 de fecha 17/07/2024.
- Prórroga 2: Póliza de cumplimiento No. CV-100037060 anexo No. 4 de fecha 02/06/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009844 anexo No. 3 de fecha 3/06/2024.
- Prórroga 3: Póliza de cumplimiento No. CV-100037060 anexo No. 5 de fecha 30/09/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009844 anexo No. 4 de fecha 30/09/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 40.920.703,20	15/07/2024	15/08/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.230.175,80	15/07/2024	15/08/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 61.381.054,80	15/08/2024	15/08/2029
TOTAL		**$ 112.531.933,80**	**30/10/2023**	**15/08/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	30/10/2023	15/08/2024

Tabla 12. Seguimiento garantías del convenio JAC Cerritos.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

8.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se han ejecutado hasta la fecha, cumplen con las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

8.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC ejecuto todas las actividades o ítems de obra de acuerdo con la programación de obra. Lo cual la obra se terminó en el tiempo previsto

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-acta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de Comité de obra y operativo: Durante el periodo reportado se realizaron los siguientes comités:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
19/07/2024	Comité operativo No. 8	Solicitud de orden de pago para aprobación de: Transporte de material, alquiler de equipos, nómina y liquidación del personal de obra, compra de materiales, papelería y arriendo de bodega.

Se anexan las actas de reuniones o comités.

9. CONVENIO SOLIDARIO No. 4240 DE 2023 JAC VEREDA EL RECREO.

9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

9.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O

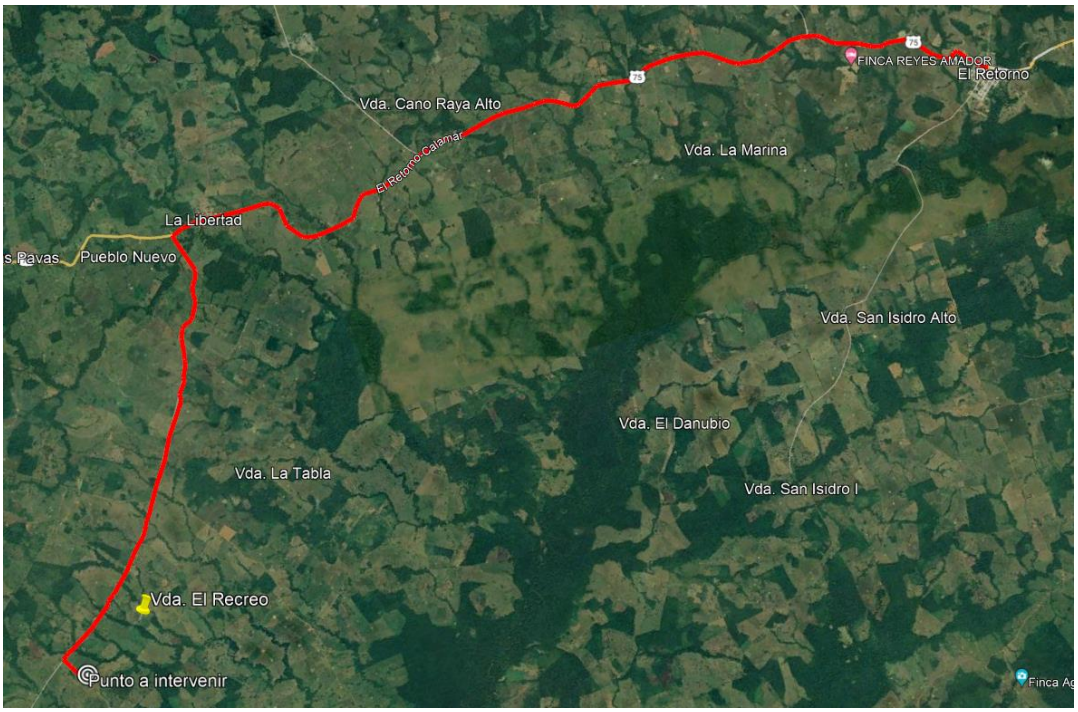


Ilustración 3. Zona de intervención Vereda El Recreo.

9.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

En el tramo a intervenir la vía se encuentra en mal estado, toda vez que carece de obras hidráulicas y tiene presencia de una laguna artificial con un gran volumen de agua que sobrepasa la rasante de la vía cada vez que se aumentan las precipitaciones, impidiendo la transitabilidad.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)

Tabla 13. Foto inicial del punto a intervenir vereda El Recreo.

9.1.3 Características técnicas del convenio

Según las especificaciones iniciales las actividades contempladas consistían en realizar limpieza de obras menores de drenaje, además de actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de obras de drenaje tipo Box Coulvert.

Una vez definidas las necesidades reales en campo y realizadas las actividades preliminares como el levantamiento topográfico de los puntos a intervenir y la actualización de precios de materiales y servicios se obtuvo como meta física del convenio lo siguiente:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	BOX COULVERT 1X1 M (UND)	BOX COULVERT 1.5X1.5 M (UND)
0,00	0,00	3,00	1,00

Tabla 14. Relación alcance físico del convenio JAC El Recreo.

9.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

9.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	4240 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	03/11/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO
NIT:	901.199.499-4
VALOR INICIAL	$201.041.344,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$201.041.344,00
ORDEN DE INICIO	21/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	27/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	16/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO 1	20/01/2024
PRÓRROGA No. 1	16/01/2024
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
PRÓRROGA No. 3	15/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15/08/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 15. Información general del convenio JAC El Recreo.

9.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

- Se realiza la instalación de la formaleta para el Boxculvert 1(1x1) y su respectivo vaciado de concreto reforzado de 21Mpa
- Se realizan los aproches para los Boxculvert 1(1x1) y 2(1x1) y se mejoran los aproches de los boxculvert 3(1x1) y 4(1.5x1.5).

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de julio de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 152.820.763	N/A	$ 4 489 453.00	$ 152.820.763	$ 0
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.584.623	N/A	$ 0	$ 0	$ 4 584 623.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.635.958	N/A	$ 2 528 118.00	$ 22 857 864.0	$ 19 778 094.00
TOTAL	**$ 200.041.344**	**N/A**	**$ 7 017 571.0**	**$175 678627.0**	**$ 24 362 716.82**

Tabla 16. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto al periodo reportado corresponde a 98%. De acuerdo con la tabla 16, el avance presupuestal del proyecto corresponde al 87.82%

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 98%.

9.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

Para este periodo no se presentaron modificaciones para el proyecto, por lo cual no se tiene la creación de nuevos ítems no previstos.

9.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

A fecha del presente informe se ha ejecutado la obra de buena forma, obteniendo un avance del 98%, el cual consta de cuatro (04) Boxculvert,

de los cuales son 3 de medidas de 1x1 y uno de 1.5x1.5. Todos ellos terminados al 100% y con los aproches realizados, lo único pendiente es la realización de la gestión socio-ambiental.

La interventoría continuará con la supervisión de las actividades velando que se cumplan todos los requerimientos técnicos para garantizar la calidad y durabilidad de las obras.

9.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

9.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 24: Desde el 28 de junio al 04 de julio de 2024.
- Semana 25: Desde el 05 al 11 de julio de 2024.
- Semana 26: Desde el 12 al 18 de julio de 2024.
- Semana 27: Desde el 19 al 25 de julio de 2024.
- Semana 28: Desde el 26 al 31 de julio de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

9.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de julio se contrató el servicio de máquinas y equipos, como lo fueron mezcladora, vibrador de concretos, planta eléctrica, motobomba y bomba manual. Además se contra el servicio de maquinaria Amarilla, como la retroexcavadora "pajarita" para realizar los rellenos o aproches de los Boxculvert 1(1x1) y 2(1x1) y también se realizó ajustes a los aproches de los Boxculvert 3(1x1) y 4(1.5x1.5)

Se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

9.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

A continuación, se relaciona el personal contratado a la fecha de suscripción del presente informe;

No.	NOMBRE	CARGO	APROBACIÓN	VINCULACIÓN
1	PEDRO ANTONIO RAMIREZ	Residente de obra	08/03/2024	Prestación de servicios
2	LUZ DARY SANTAMARIA VARGAS	Contadora	08/03/2024	Prestación de servicios
3	WILMER LEANDRO CASTILLO VERGARA	Maestro	08/03/2024	Nomina
4	JUAN DE JESUS CASTILLO LESMES	Oficial	08/03/2024	Nomina
5	MARCOS FIDEL AGUILERA MARTIN	Ayudante	08/03/2024	Nomina
6	ELBIN ALEXANDER BONILLA URREGO	Ayudante	08/03/2024	Nomina
7	MAICOL DAVID CORTEZ	Ayudante	08/03/2024	Nomina
8	YILFER ANDRES CORTEZ BONILLA	Ayudante	08/03/2024	Nomina
9	CARLOS JULIO NIÑO MARTIN	Ayudante	08/03/2024	Nomina
10	EDIXON ORLANDO ROMERO CORTES	Ayudante	08/03/2024	Nomina
11	JHON JAIRO ROMERO RODRIGUEZ	Ayudante	08/03/2024	Nomina
12	RUBEN CAMILO ROERO RODRIGUEZ	Ayudante	08/03/2024	Nomina

Tabla 17. Relación profesionales aprobados.

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

9.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4240 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $200.041.344,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $199.101.799,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $939.545,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

Se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

Se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

9.3.5 Estado general del tiempo.

Se realizó el registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.
Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

9.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Durante el periodo reportado se realizaron toma de muestras de concretos en cilindros para el boxculvert 1(1x1), por lo cual Se anexan el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

9.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100037316 anexo No. 0-1 de fecha 14/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009896 anexo No. 0-4 de fecha 14/11/2023.

- Prórroga 1: Póliza de cumplimiento No. CV-100037316 anexo No. 2 de fecha 22/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009896 anexo No. 5 de fecha 22/01/2024.

- Prórroga 2: Póliza de cumplimiento No. CV-100037316 anexo No. 3 de fecha 30/05/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009896 anexo No. 6 de fecha 30/05/2024.

- Prórroga 3: Póliza de cumplimiento No. CV-100037316 anexo No. 7 de fecha 30/05/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009896 anexo No. 7 de fecha 30/09/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 40.208.268,80	15/07/2024	15/08/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.052.067,20	15/07/2024	15/08/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 60.312.403,20	15/08/2024	15/08/2029
TOTAL		**$ 110.572.739,20**	**29/09/2023**	**15/08/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31/10/2023	15/08/2024

Tabla 18. Seguimiento garantías del convenio JAC El Recreo.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

9.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras ejecutadas cumplieron con las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

9.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A fecha del presente informe la JAC ejecuto todas las actividades de obra contratadas de acuerdo a la programación de obra presentada y aprobada. A la fecha la obra se encuentra finalizada.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante preacta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de Comité de obra y operativo: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

10. CONVENIO SOLIDARIO No. 3752 DE 2023 JAC VEREDA SAN LUCAS.

10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

10.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O

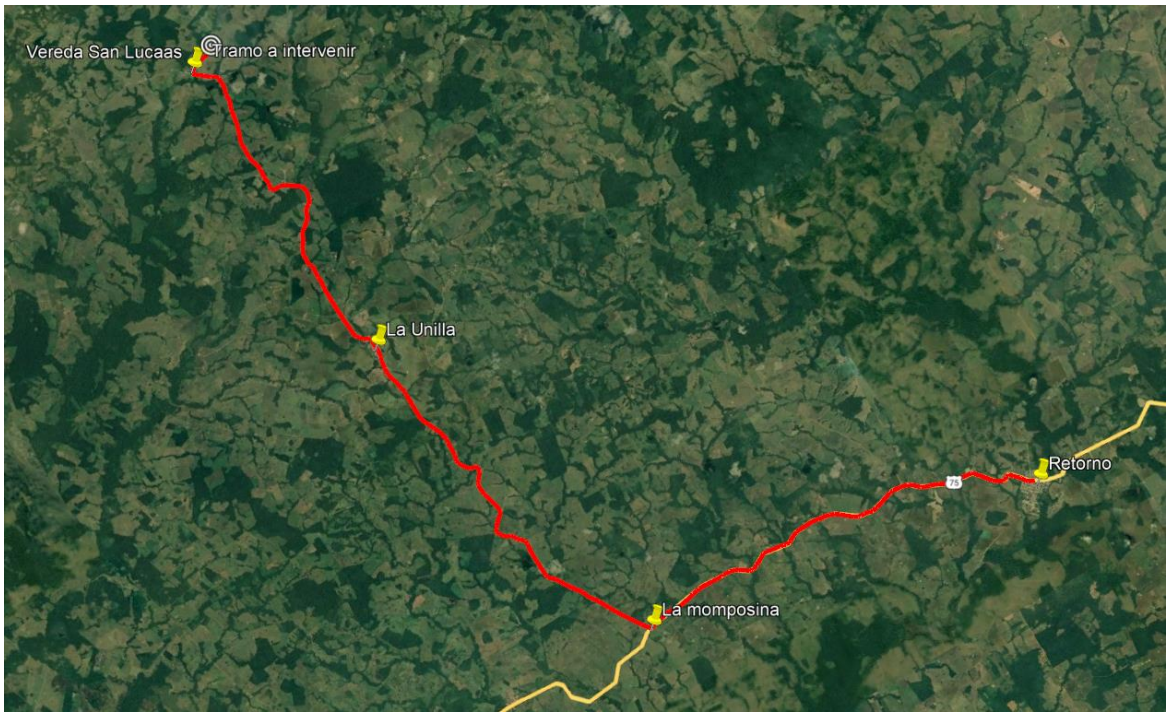


Ilustración 4. Zona de intervención Vereda San Lucas.

10.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 130 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada compactación y conformación de cunetas que permitan un correcto drenaje en la vía, esto ocasiona que en temporada de lluvias se genere erosión del material superficial y sea muy complicado su transitabilidad.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)

Tabla 20. Foto inicial del tramo a intervenir vereda San Lucas.

10.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje, desmonte y limpieza de zonas boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior y placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO	RUTINARIO	MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS (UND)
6,00	1,00	100,00	2,00

Tabla 21. Relación alcance físico del convenio JAC San Lucas.

Es menester aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

10.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

10.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	3752 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	05/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERÍO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCAS
NIT:	800.215.807-2
VALOR INICIAL	$217.314.958,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$216.314.958,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	18/01/2024
PRÓRROGA No. 1	18/01/2024
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
PRÓRROGA No. 3	30/07/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/09/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 22. Información general del convenio JAC San Lucas.

10.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

- A la fecha aún se continúa a espera de los resultados de los estudios previos realizados por la JAC además se espera el concepto de un profesional especializado en estructuras que avale el modelo o diseño de placa huella presentado por la JAC

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de julio de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 168.583.093	N/A	$ 0	$ 0	$ 168.583.093
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 5.057.493	N/A	$ 0	$ 0	$ 5.057.493
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.674.372	N/A	$ 0	$8.436.659,00	$ 34.237.713
TOTAL	**$ 216.314.958**	**N/A**	**$ 0**	**$ 8.436.659**	**$ 207.878.299**

Tabla 23. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance presupuestal ejecutado del proyecto al periodo reportado corresponde a 4.06%. Encontrándose el avance de obra en 0%.

10.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

10.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Se dio aprobación mediante comité operativo a desembolsos para las actividades de levantamiento topográfico, estudio de suelos y diseño

geométrico, se continúa la espera de los resultados la JAC presento un balance del presupuesto en el cual cambia o adopta un nuevo diseño de placa huella, el cual no se encuentra en las cartillas de obras de drenaje del instituto INVIAS, por lo cual se les solicita un concepto de un profesional especializado en estructuras que avale el diseño o modelo presentado. A la fecha la JAC no ha realizado el envío completo de la documentación necesaria para programar y realizar el comité operativo para aprobar las órdenes de compra, que permita establecer y aprobar el inicio de obra.

10.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

10.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 24: Desde el 28 de junio al 04 de julio de 2024.
- Semana 25: Desde el 05 al 11 de julio de 2024.
- Semana 26: Desde el 12 al 18 de julio de 2024.
- Semana 27: Desde el 19 al 25 de julio de 2024.
- Semana 28: Desde el 26 al 31 de julio de 2024.

Se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

10.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de julio de 2024 no se realizó proceso de contratación y/o gestión de maquinaria y equipo de obra.

No se anexa el formato “MAQUINARIA Y EQUIPO”.

10.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

A continuación, se relaciona el personal contratado a la fecha de suscripción del presente informe;

No.	NOMBRE	CARGO	APROBACIÓN	VINCULACIÓN
1	DIEGO ARMANDO VELASCO	Residente de obra	07/06/2024	Prestación de servicios

2	OSCAR ORLANDO RUBIO	Contador	01/03/2024	Prestación de servicios

Tabla 24. Relación profesionales aprobados.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

10.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3752 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $216.314.958,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $215.714.594,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $600.364,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

10.3.5 Estado general del tiempo.

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

10.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Dado que, durante el periodo reportado no se realizaron actividades en obra, no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

10.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100036852 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009774 anexo No. 0-1 de fecha 24/10/2023.
- Prorroga 1: Póliza de cumplimiento No. CV-100036852 anexo No. 1 de fecha 13/02/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009774 anexo No. 2 de fecha 22/04/2024.
- Prorroga 2: Póliza de cumplimiento No. CV-100036852 anexo No. 2 de fecha 13/02/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009774 anexo No. 3 de fecha 28/05/2024.
- Prorroga 3: Póliza de cumplimiento No. CV-100036852 anexo No. 3 de fecha 30/09/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009774 anexo No. 4 de fecha 30/09/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 43.262.991,60	30/07/2024	30/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.815.747,90	30/07/2024	30/09/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 64.894.487,40	30/09/2024	30/09/2029
TOTAL		**$118.973.226,90**	**05/10/2023**	**30/09/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	05/10/2023	30/09/2029

Tabla 25. Seguimiento garantías del convenio JAC San Lucas.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

10.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

10.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC no ha presentado la programación de obra, puesto que, no se ha definido el alcance la obra.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el JAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-acta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de Comité de obra y operativo: Durante el periodo reportado NO se realizaron reuniones y comités de obra:

No se anexan las actas de reunión y comités de obra.

11. CONVENIO SOLIDARIO No. 4222 DE 2023 JAC VEREDA SAN FRANCISCO II.

11.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

11.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O

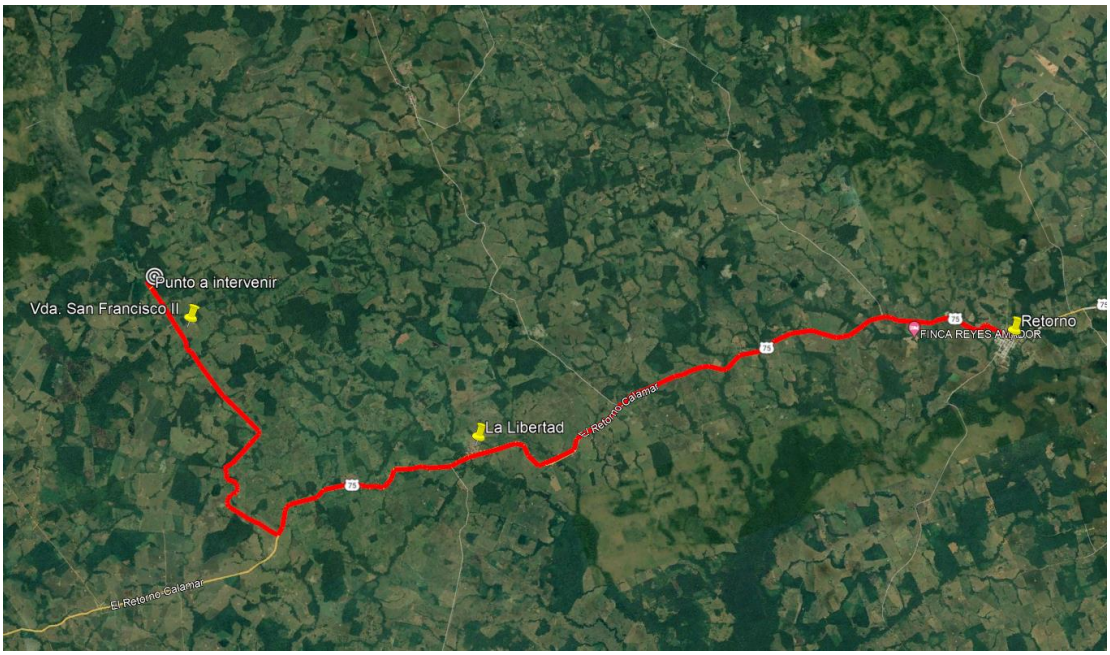
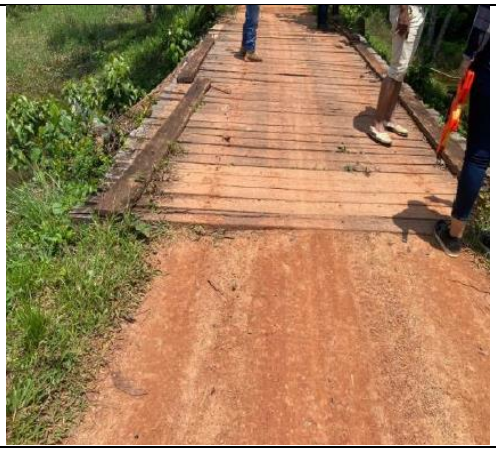


Ilustración 5. Zona de intervención Vereda San Francisco II.

11.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

En el tramo a intervenir es un terraplén con un solo carril que se encuentra en mal estado y la transitabilidad se ve afectada al presentarse precipitaciones, ya que aumenta el caudal del río que la bordea, además de tener puntos críticos y obras de paso de agua rusticas en muy mal estado.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el

24/08/2023)	24/08/2023)

Tabla 26. Foto inicial del punto a intervenir vereda San Francisco II.

11.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción obras de drenaje tipo Box Coulvert, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	BOX COULVERT (UND)
6,00	0,00	0,00	2,00

Tabla 27. Relación alcance físico del convenio JAC San Francisco II.

Es importante aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

11.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

11.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	4222 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	02/11/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO II
NIT:	901.107.641-0
VALOR INICIAL	$209.194.251,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$209.194.251,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2023
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
PRÓRROGA No. 3	15/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/09/2024

SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 28. Información general del convenio JAC San Francisco II.

11.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

- Se realiza las excavaciones para los Boxculvert (2x2 y 2x1).
- Se realiza la nivelación y replanteo para el Boxculvert 2x2 y se realiza el respectivo vaciado de concreto liviano 14Mpa (solado).
- Se figuró e instaló el acero de refuerzo para el boxculvert de 2x2
- Se realizó la instalación de la formaleta para la placa inferior del Boxculvert, además del respectivo vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para la placa inferior del Boxculvert 2x2.
- Se instaló la formaleta para todo el cuerpo y aletas del Boxculert de 2x2.
- Se realiza la nivelación y replanteo para el Boxculvert 2x1 y se realiza el respectivo vaciado de concreto liviano 14Mpa (solado).
- Se figuró e instaló el acero de refuerzo para el boxculvert de 2x1.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de julio de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$160.705.586	N/A	$113.405.421,00	$113.405.421,00	$ 47.300.165
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.821.168	N/A	$ -	$ -	$ 4.821.168
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.667.497	N/A	$ 5.716.680,00	$ 10.378.441,00	$ 32.289.056
TOTAL	**$208.194.251**	**N/A**	**$119.122.101,00**	**$123.783.862,00**	**$84.410.389,00**

Tabla 29. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado de obra del proyecto en el periodo reportado corresponde a 47%. Sin embargo, se aprobó el desembolso para la compra de materiales para un avance presupuestal del 59.46%.

11.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

11.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

A fecha del presente informe se ha ejecutado la obra de buena forma, obteniendo un avance del 47%, ya que el Boxculvert de 2x2 está casi terminado, ya se encuentra con la formaleta instalada, a falta solamente de realizar el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa. Mientras que en el Boxculvert 2x1 se está iniciando y a la fecha cuenta con acero figurado e instalado.

11.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

11.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 24: Desde el 28 de junio al 04 de julio de 2024.
- Semana 25: Desde el 05 al 11 de julio de 2024.
- Semana 26: Desde el 12 al 18 de julio de 2024.
- Semana 27: Desde el 19 al 25 de julio de 2024.
- Semana 28: Desde el 26 al 31 de julio de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

11.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de julio se contrató el servicio de máquinas y equipos, como lo fueron mezcladora, vibrador de concretos, planta eléctrica, formaletas, motobombas y bomba manual.

Se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

11.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

A continuación, se relaciona el personal contratado a la fecha de suscripción del presente informe;

No.	NOMBRE	CARGO	APROBACIÓN	VINCULACIÓN
1	DIEGO ALEJANRO MANRIQUE CORREA	Residente de obra	12/03/2024	Prestación de servicios
2	ROSA EMILIANA MELO	Contadora	12/03/2024	Prestación de servicios
3	JOSE MIGUEL DIAZ	Maestro	01/06/2024	Nomina
4	FREDDY BUITRAGO	Ayudante	01/06/2024	Nomina
5	WILLINTON RAMOS	Ayudante	01/06/2024	Nomina
6	ALEX BUITRGO FORERO	Ayudante	01/06/2024	Nomina
7	EIDER MONROY VANEGAS	Ayudante	01/06/2024	Nomina

Tabla 30. Relación profesionales aprobados.

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

11.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4222 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $208.194.251,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $208.006.342,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $187.909,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

Se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

11.3.5 Estado general del tiempo.

Se realizó el registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

11.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Durante el periodo reportado no se realizaron toma de muestras de concretos en cilindros, ya que a la fecha no se ha realizado el vaciado de concreto para el boxculvert 1(2x2), por lo cual No se anexan el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

11.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100037313 anexo No. 0-2 de fecha 14/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009895 anexo No. 0-1 de fecha 14/11/2023.
- Prórroga 1: Póliza de cumplimiento No. CV-100037313 anexo No. 3 de fecha 18/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009895 anexo No. 2 de fecha 16/01/2024.
- Prórroga 2: Póliza de cumplimiento No. CV-100037313 anexo No. 4 de fecha 04/06/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009895 anexo No. 3 de fecha 04/06/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 41.838.850,20	18/04/2024	15/07/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.459.712,55	18/04/2024	15/07/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 62.758.275,30	15/07/2024	15/07/2029
TOTAL		**$ 115.056.838,05**	**29/09/2023**	**15/07/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	03/11/2023	15/07/2024

Tabla 31. Seguimiento garantías del convenio JAC San Francisco II.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

11.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

11.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A fecha del presente informe la JAC ejecuto todas las actividades de obra contratadas de acuerdo a la programación de obra presentada y aprobada. A la fecha la obra se encuentra finalizada.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-acta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de Comité de obra y operativo: Durante el periodo reportado No se realizaron comités operativos.

No se anexan las actas de reunión y comités de obra.

12. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-150-2023
FECHA DE PÚBLICACIÓN DEL PROCESO	25/10/2023
ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.SLCNTR.11850767
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5040 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/12/2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DEACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.
CONTRATISTA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA
NIT	891.101.100 – 5
VALOR INICIAL	$ 215.361.440,00
VALOR ADICIONAL	NA
VALOR TOTAL	$ 215.361.440,00
ORDEN DE INICIO	30/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	30/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	23/01/2024
PRÓRROGA No. 1	25/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 1	24/03/2024
PRÓRROGA No. 2	25/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 2	30/04/2024
PRÓRROGA No. 3	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 3	30/05/2024
PRÓRROGA No. 4	30/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 4	15/06/2024
PRÓRROGA No. 5	14/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 5	30/07/2024
PRÓRROGA No. 6	30/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/09/2024
DIRECCIÓN	Calle 12 N. 5-07 Piso 3 Neiva, Huila.
NÚMERO DE TELÉFONO	3186081555
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO

Tabla 33. Información general del contrato de interventoría.

12.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

A continuación, se relacionan las actividades relacionadas por la interventoría:

12.1.1 Actividades Generales y de Administración.

Las actividades ejecutadas por el interventor consistieron en realizar Comités operativos, con la participación invias, de la Junta de Acción Comunal mediante el presidente y tesorero, así como los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; con el fin de tomar decisiones técnicas y administrativas, el ellos se presentaron cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

Se ha mantenido permanente comunicación con la JAC desde la orden de iniciación para garantizar la oportuna y correcta ejecución de las actividades.

Se ha mantenido permanente comunicación con la JAC respecto a la dirección, administración, supervisión, planeación y evaluación de las actividades propias del objeto del contrato.

Se ha dispuesto del personal, implementos e instalaciones y demás servicios necesarios para el buen cumplimiento de las funciones.

Se ha realizado la revisión y posterior aprobación de la documentación previa entregada por el contratista previo al inicio de las actividades.

Se ha realizado seguimiento, reporte a las entidades contratantes de las actividades que se adelantan.

12.1.2 Actividades Técnicas.

- Se realiza revisión y ajuste a los balances de obra en aras de establecer el presupuesto oficial con su respectivo alcance real.

- Se realiza seguimiento a la elaboración de los documentos de revisión de estudios y diseños que se encuentra en desarrollo por las juntas de acción comunal.

-Se supervisa y acompaña en campo la ejecución de las obras velando por la calidad y correcta ejecución de los procesos constructivos, siguiente las especificaciones técnicas y normas colombianas.

12.1.3 Actividades financieras.

Se ha puesto a disposición del proyecto todas las herramientas y recursos de la interventoría para hacer el acompañamiento a la JAC en cuanto a la consecución de cotizaciones y búsqueda de proveedores para la correctainversión de los recursos del convenio.

12.1.4 Actividades Ambientales.

Se ha realizado seguimiento a las actividades ambientales desarrolladas por las JAC, además de la solicitud de la respectiva documentación requerida por el área y tema ambiental.

12.2 Informes especialistas y profesionales.

Durante el mes de julio de 2024, las labores del director y residente de interventoría consistieron en realizar los diferentes comités con las Organismo de Acciones Comunales, el Residente de Obra, Contador, Comité de Participación ciudadana y comunidad en general, revisando y aprobando cotizaciones presentadas, enfatizando en el alcance de las obras, atendiendo los requerimientos técnicos contemplados en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, así como los lineamientos de convenios solidarios expuestos por la Subgerencia del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total donde incluye formatos e instructivos adecuados al alcance de las obras y ser utilizados en la ejecución de los convenios para el seguimiento y control.

12.3 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

Durante el presente periodo no se presentó Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

13. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

13.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría.

Durante el presente periodo se requirió el alquiler de Vehículo en la zona de ejecución de los convenios para el transporte de personal.

Se anexa el formato "EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA"

13.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

Durante el presente periodo se generó el pago de aportes de seguridad social del director de interventoría y residente de interventoría.

No.	NOMBRE	CARGO
1	GABRIEL HERNAN VELAZQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
2	WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
3	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	PROFESIONAL AMBIENTAL
4	ANGELICA MARIA SEGURA GARZÓN	PROFESIONAL SOCIAL
5	KAREN VALENTINA MONTENEGRO	PROFESIONAL SOCIAL

Tabla 34. Relación personal de interventoría.

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA"

13.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría.

Para el contrato se tiene el certificado de disponibilidad presupuestal 172623 del 28 de septiembre del 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $215.361.440,00 y el CDP 72924 del 23/04/2024 por 72.490.040,00 así:

POSICIÓN DE CATÁOLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	VALOR A AFECTAR
C-2402-0600-14-0-2402041-02	NACIÓN	10	$ 211.054.211
C-2402-0600-14-0-2402112-02	NACIÓN	10	$ 4.307.229
C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	NACIÓN	10	$ 72.490.040

Tabla 35. Disponibilidad presupuestal contrato de interventoría.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 con el seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

13.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Contrato inicial: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 0 de fecha 28/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	22/12/2023	01/07/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	22/12/2023	01/07/2026
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	22/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**22/12/2023**	**31/12/2028**

Tabla 36. Garantías contrato de interventoría anexo 0.

- Acta de inicio y Prórroga 1: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 5 de fecha 26/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	30/12/2023	02/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	30/12/2023	02/10/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 37. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

- Prórroga 2: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 6 de fecha 12/04/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	30/12/2023	07/11/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	30/12/2023	07/05/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 38. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

13.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Contrato inicial: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 0 de fecha 28/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	22/12/2023	01/07/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	22/12/2023	01/07/2026
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	22/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**22/12/2023**	**31/12/2028**

Tabla 36. Garantías contrato de interventoría anexo 0.

- Acta de inicio y Prórroga 1: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 5 de fecha 26/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	30/12/2023	02/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	30/12/2023	02/10/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 37. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

- Prórroga 2: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 6 de fecha 12/04/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	30/12/2023	07/11/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	30/12/2023	07/05/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 38. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

- Prórroga 3: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 7 de fecha 02/05/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	30/12/2023	08/12/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	30/12/2023	07/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 39. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

- Prórroga 4: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 8 de fecha 31/05/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	30/12/2023	23/12/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	30/12/2023	22/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 40. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

- Prórroga 5: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 10-11 de fecha 17/06/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 28.785.148,00	30/12/2023	06/02/2025
PRESTACIONES SOCIALES		$ 57.570.296,00	30/12/2023	06/08/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 86.355.444,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 230.281.184,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 41. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

13.5 Otros documentos seguimiento mensual.

Seguimiento a la Inversión del Anticipo:

El contrato de interventoría no contempla anticipo por tal razón no se adjuntarán los formatos MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

Seguimiento al Plan de cargas o Reprogramación al plan de cargas aprobado:

Se presenta el plan de cargas con fecha de terminación el 30 de septiembre de 2024, de acuerdo con la prórroga 6 del 30 de julio de 2024.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

14. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES.

Durante este periodo se realizaron comités operativos en los cuales se aprobaron los desembolsos de gastos administrativos necesario para iniciar las actividades preliminares en obra para 1 de los 5 convenios, quedando así aprobado y en ejecución 4 de los 5 convenios.

Las JAC de Caño bonito, Cerritos y el Recreo se encuentran ejecutadas y terminadas las actividades de obra, las cuales se realizaron técnicamente y bajo los requerimientos establecidos.

La JAC San Francisco II se encuentra ejecutando y desarrollando actividades de obra, las cuales se han venido realizando técnicamente y bajo los requerimientos establecidos.

La JAC de la vereda de San Lucas realizo subsanación de los estudios previos realizados, además de realizar el envío del balance presupuestal y el envío del modelo o diseño de placa huella, el cual recibió la observación que se debía subsanar un concepto de un profesional en estructuras el cual avale y respalde este diseño, ya que a la fecha no se encuentra establecido en las cartillas de obras menores de drenaje del instituto INVIAS. Por lo cual se espera la JAC subsane pronto para poder dar inicio a la obra.

15. ANEXOS.

15.1 Relación Correspondencia.

A continuación, se relaciona cuadro resumen de la correspondencia generada durante el periodo reportado:

NUMERACIÓN	FECHA	REMITE	ASUNTO	RECIBE
INV-INT-SANLUCAS-006	10/07/2024	Interventoría	Ajuste de diseño placa huella, balance de obra y cotizaciones.	JAC San Lucas
INV-INT-SF-006	12/07/2024	Interventoría	Requerimientos ambientales	JAC San Francisco II
INV-INT-CBONITO-006	19/07/2024	Interventoría	Aprobación Plan de Gestión Ambiental del contrato SOLIDARIO No. 3613 de 2023.	JAC Caño Bonito
INV-INT-RECREO-004	24/07/2024	Interventoría	Aprobación Plan de Gestión Ambiental del contrato SOLIDARIO No 4240 de 2023.	JAC El Recreo
INV-INT-CERRITOS -007	24/07/2024	Interventoría	Aprobación Plan de Gestión Ambiental del contrato SOLIDARIO No 4240 de 2023.	JAC El Cerritos
INV-INT-SF-007	24/07/2024	Interventoría	Presunto incumplimiento en la entrega de documentación de forma oportuna y atrasando la gestión de la interventoría – Componente ambiental	JAC San Francisco II
INV-INT-SANLUCAS-007	24/07/2024	Interventoría	Presunto incumplimiento en la entrega de documentación de forma oportuna y atrasando la gestión de la interventoría – Componente ambiental	JAC San Lucas
INV-INT-SL-008	31/07/2024	Interventoría	Respuesta a su comunicado CJAC-004, con fecha 29 de julio de 2024	JAC San Lucas
INV-INT-SF-008	31/07/2024	Interventoría	Respuesta a su correo electrónico, con fecha del 28 de julio del 2024	JAC San Francisco II

Tabla 38. Relación de correspondencia.

15.2 Documentos de seguimiento.

Durante el periodo reportado se realizó un comité de seguimiento al desarrollo de la interventoría para los 5 convenios. Se anexan acta de comité.

15.3 Registro fotográfico.

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo reportado:

	
Placa Huella, vereda Caño Bonito.	Placa Huella, vereda Caño Bonito.
	
Placa Huella, vereda Cerritos.	Placa Huella, vereda Cerritos.
	

Box culvert 4(1.5x1.5), vereda El Recreo.	Box culvert 3(1x1), vereda El Recreo.
	
Box culvert 2(1x1), vereda El Recreo.	Box culvert 1(1x1), vereda El Recreo.
	
Box culvert 1(2x2), vereda San francisco II	Box culvert 1(2x1), vereda San francisco II

Tabla 39. Registro fotográfico.

15.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3613 DE 2023 JAC VEREDA CAÑO BONITO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3613 de 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

JUSTIFICACIÓN:

N/A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 FEBRERO	VR. MES 2 MARZO	VR. MES 3 ABRIL	VR. MES 4 MAYO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NOMINA PERSONAL	$ -		$ 2.800.000	$ 27.485.538,00	$ 58.722.182	14,56%
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	$ -		$ 1.991.000	$ -	$ 2.117.000	0,96%
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ -		$ 1.310.000	$ -	$ 1.310.000	0,63%
4	GASTOS BANCARIOS	$ -	$ -		$ -	$ 1.328.596	0,00%
5	OTROS COSTOS	$ -	$ 7.227.973,00	$ 1.066.000	$ -	$ 11.659.745	3,99%
6	MATERIALES	$ -		$ 40.616.000	$ 13.862.000,00	$ 72.946.790	26,19%
7	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 31.350.000	$ -	$ 48.271.571	15,07%
8	ALQUILER EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ -	$ -		$ 3.655.000,00	$ 6.921.656	1,76%
9	PAGA	$ -	$ -		$ -	$ 4.714.468	0,00%
	TOTAL	**$ -**	**$ 7.227.973,00**	**$ 79.133.000**	**$ 45.002.538,00**	**$ 207.992.008,00**	**63,16%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.



Firma:

Nombre: MARISOL AYALA CUBIDES
Representante Legal o su Apoderado
Contratista



Firma:

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND



Firma:

Nombre: Carlos Enrique Ramirez Dominguez
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 54202-438888 NTS

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMES SEMANALES
CAÑO BONITO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 24 del 28-jun al 4-jul — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No.	3613 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 207 992 007.00
FECHA DE INICIO:	12/19/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 207 992 007.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/15/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	215 361 440.00 $
FECHA DE INICIO:	12/30/23	VALOR ADICIONES:	- $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	215 361 440.00 $
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/30/24	VALOR ANTICIPO:	- $
		VALOR AMORTIZADO:	- $
		SALDO POR AMORTIZAR:	- $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207 992 007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207 992 007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	207 992 007.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	207 992 007.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	203 277 539.00	97.73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	203 277 539.00	97.73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	1 991 000.00	0.96%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	207 992 007.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	205 268 539.00	98.69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	205 268 539.00	98.69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	8 319 680.28	4.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	5 605 548.47	2.70%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	157 351 012.57	73.06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	154 034 446.40	71.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	14 493 824.91	6.73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	12 835 541.82	5.96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: -1.31%

Meta Física Ejecutada %: 98.69%

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	116.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	100.00%			100.00%	
Ejec	98.69%			98.69%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de bulto		1
Vibrador de Concreto		1
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades de obra termadas al 100% a falta de soportar el PAGA o PGA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se iniciara la gestion documental para la liquidacion del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

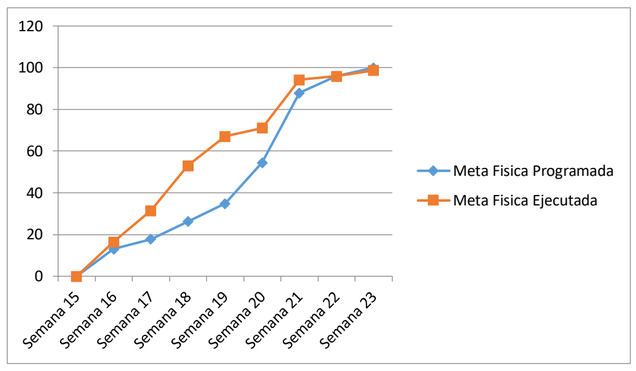

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Relleno con material seleccionado de la region



Placa huella



Relleno con material seleccionado de la region



Relleno con material seleccionado de la region



Placa huella



Relleno con material seleccionado de la region

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Revision y oontrol de documentación	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 25 del 5-jul al 11-jul Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No.	3613 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 207 992 007.00
FECHA DE INICIO:	12/19/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 207 992 007.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/15/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	215 361 440.00 $
FECHA DE INICIO:	12/30/23	VALOR ADICIONES:	- $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	215 361 440.00 $
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/30/24	VALOR ANTICIPO:	- $
		VALOR AMORTIZADO:	- $
		SALDO POR AMORTIZAR:	- $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207 992 007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207 992 007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	207 992 007.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	207 992 007.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	203 277 539.00	97.73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	203 277 539.00	97.73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	1 991 000.00	0.96%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	207 992 007.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	205 268 539.00	98.69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	205 268 539.00	98.69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	8 319 680.28	4.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	5 605 548.47	2.70%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	162 185 214.86	75.31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	159 145 029.20	73.90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó acta del mes de febrero y marzo, en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% Avance o Atraso Físico % -1.31%

Meta Física Ejecutada % 98.69%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	116.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	100.00%			100.00%	
Ejec	98.69%			98.69%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de bulto		1
Vibrador de Concreto		1
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se inicia Documentacion para el PAGA o PGA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se iniciara la gestion documental para la liquidacion del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

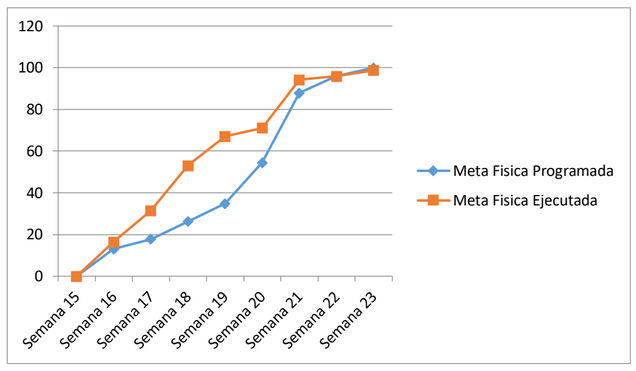

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Relleno con material seleccionado de la region



Placa huella



Relleno con material seleccionado de la region



Relleno con material seleccionado de la region



Placa huella



Relleno con material seleccionado de la region

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Revision y oontrol de documentación	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 18/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 26 del 12-jul al 18-jul — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No.	3613 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 207 992 007.00
FECHA DE INICIO:	12/19/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 207 992 007.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/15/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	215 361 440.00 $
FECHA DE INICIO:	12/30/23	VALOR ADICIONES:	- $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	215 361 440.00 $
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/30/24	VALOR ANTICIPO:	- $
		VALOR AMORTIZADO:	- $
		SALDO POR AMORTIZAR:	- $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207 992 007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207 992 007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	207 992 007.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	207 992 007.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	203 277 539.00	97.73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	203 277 539.00	97.73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	1 991 000.00	0.96%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	207 992 007.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	205 268 539.00	98.69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	205 268 539.00	98.69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	8 319 680.28	4.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	5 605 548.47	2.70%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	167 019 417.14	77.55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	164 255 612.00	76.27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó acta del mes de febrero y marzo, en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: -1.31%

Meta Física Ejecutada %: 98.69%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	116.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	100.00%			100.00%	
Ejec	98.69%			98.69%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de bulto		1
Vibrador de Concreto		1
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se trabaja en documentacion del PAGA o PGA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se iniciara la gestion documental para la liquidacion del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

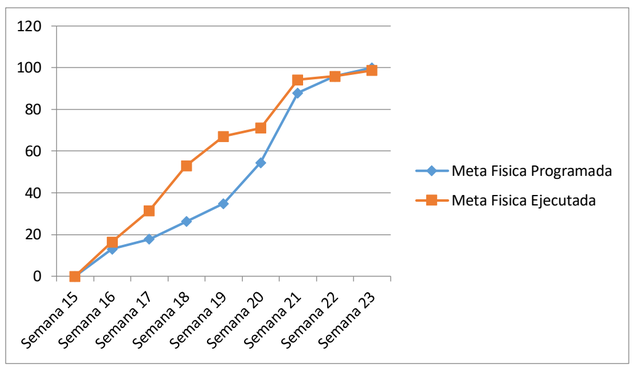

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Relleno con material seleccionado de la region



Placa huella



Relleno con material seleccionado de la region



Relleno con material seleccionado de la region



Placa huella



Relleno con material seleccionado de la region

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Revision y oontrol de documentación	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 27 del 19-jul al 25-jul — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No.	3613 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 207 992 007.00
FECHA DE INICIO:	12/19/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 207 992 007.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/15/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	215 361 440.00 $
FECHA DE INICIO:	12/30/23	VALOR ADICIONES:	- $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	215 361 440.00 $
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/30/24	VALOR ANTICIPO:	- $
		VALOR AMORTIZADO:	- $
		SALDO POR AMORTIZAR:	- $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207 992 007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207 992 007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	207 992 007.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	207 992 007.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	203 277 539.00	97.73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	203 277 539.00	97.73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	1 991 000.00	0.96%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	207 992 007.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	205 268 539.00	98.69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	205 268 539.00	98.69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	8 319 680.28	4.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	5 605 548.47	2.70%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	171 853 619.43	79.80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	169 366 194.80	78.64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó acta del mes de febrero y marzo, en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: -1.31%

Meta Física Ejecutada %: 98.69%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	116.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	100.00%			100.00%	
Ejec	98.69%			98.69%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de bulto		1
Vibrador de Concreto		1
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua avanzado en documentacion del PAGA o PGA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se iniciara la gestion documental para la liquidacion del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

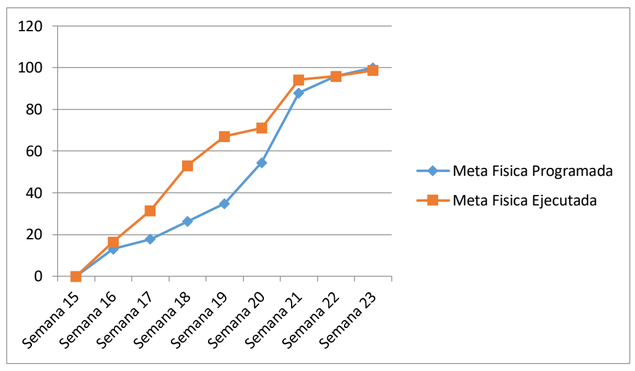

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Relleno con material seleccionado de la region



Placa huella



Relleno con material seleccionado de la region



Relleno con material seleccionado de la region



Placa huella



Relleno con material seleccionado de la region

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Revision y oontrol de documentación	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 28 del 26-jul al 1-ago — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No.	3613 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 207 992 007.00
FECHA DE INICIO:	12/19/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 207 992 007.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/15/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	215 361 440.00 $
FECHA DE INICIO:	12/30/23	VALOR ADICIONES:	- $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	215 361 440.00 $
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/30/24	VALOR ANTICIPO:	- $
		VALOR AMORTIZADO:	- $
		SALDO POR AMORTIZAR:	- $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207 992 007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207 992 007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	207 992 007.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	207 992 007.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	203 277 539.00	97.73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	203 277 539.00	97.73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	1 991 000.00	0.96%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	207 992 007.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	205 268 539.00	98.69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	205 268 539.00	98.69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	8 319 680.28	4.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	5 605 548.47	2.70%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	176 687 821.72	82.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	174 476 777.60	81.02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó acta del mes de febrero y marzo, en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: -1.31%

Meta Física Ejecutada %: 98.69%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	116.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	100.00%			100.00%	
Ejec	98.69%			98.69%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de bulto		1
Vibrador de Concreto		1
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecu

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se terminada la documentacion que soporta el PAGA o PGA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se iniciara la gestion documental para la liquidacion del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

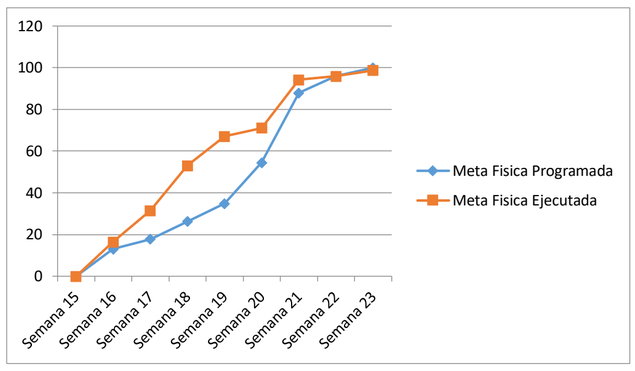

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Relleno con material seleccionado de la region



Placa huella



Relleno con material seleccionado de la region



Relleno con material seleccionado de la region



Placa huella



Relleno con material seleccionado de la region

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Revision y oontrol de documentación	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 3613 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 207.992.007,00

VALOR ACUMULADO: $ 207.992.007,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.798.401,40	29	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.449.600,35	29	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.697.602,10	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036855

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009777 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.798.401,40	30	12	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.449.600,35	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.697.602,10	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036855

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29	9	2023	22	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009777 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN PRORROGA 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.798.401,40	30	4	2024	15	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.449.600,35	30	4	2024	15	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.697.602,10	15	7	2024	15	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036855

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 15/07/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29	9	2023	23	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009777 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 15/07/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN PRORROGA 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.798.401,40	15	7	2024	15	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.449.600,35	15	7	2024	15	8	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.697.602,10	15	8	2024	18	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036855

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 3

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29	9	2023	23	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009777 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE COMITÉ
CAÑO BONITO

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 07	**Dirección Territorial INVIAS: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES**	**Fecha: 02/07/2024**

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Caño Bonito, El Retorno, Guaviare.
No. Convenio(s) Solidario(s): 3613 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal Caño Bonito

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	**Institución u Organización**	**Cargo**
Marisol Ayala Cubides	JAC Caño Bonito	Presidente
Jacinto Cubides	JAC Caño Bonito	Veedor
Luz Dary Santamaría	JAC Caño Bonito	Contadora
Carlos Enrique Ramírez	JAC Caño Bonito	Ing. Residente de obra
Javier Barrero	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Representante Legal
Gabriel Velásquez	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Director de interventoría
Wualner Raúl López González	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Ing. Residente de interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Aprobación de desembolsos.

AGENDA DEL COMITÉ: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Presentación de los asistentes.
2- Aprobación de desembolsos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los asistentes:** Asisten al comité por la JAC de la vereda Caño Bonito la Presidenta, Marisol Ayala Cubides; el Veedor, Jacinto Cubides; la Contadora, Luz Dary Santamaría; el Residente de Obra, Carlos Ramírez y por parte de la interventoría asisten el Director de Obra, Gabriel Velázquez; el Residente de Obra, Wualner Lopez y el representante legal, Javier Barrero.
2.	Se presentan la relación de facturas y/o cuentas de cobro para aprobación y orden de pago para la obra: 2.1. INVERSIONES ALFA Y OMEGA AJ SAS ZOMAC (Materiales de ferretería) 2.2. EVANGELISTA QUINTANILLA OBREGON (Alquiler de equipos) 2.3. ALVARADO LEIDY LILIANA (Estampados de uniformes) 2.4. RAMIREZ DOMINGUEZ CARLOS ENRRIQUE (Pago honorarios a Residente de Obra) 2.5. MENA GOMEZ JORDIN ESTEBAN (Acarreos internos para el transporte de materiales) 2.6. MARISOL AYALA CUBIDES (Nómina de ayudantes de obra y Maestro del 01/06 al 15/06) 2.7. MARISOL AYALA CUBIDES (Liquidación de trabajadores a corte 20/06/2024) 2.8. MARISOL AYALA CUBIDES (Planilla de seguridad social del mes de Junio) 2.9. NAYDA ROMERO MEJIA (Pago de alimentación del 01/06 de 2024 al 20/06 del 2024) 2.10. LUZ DARY SANTAMARIA VARGAS (Honorarios contadora por el 50%)

	2.11. MORA MELO LUZ EMILSEN (Alquiler de formaletas) 2.12. MARISOL AYALA CUBIDES (Pago de actualización de pólizas) 2.13. MARISOL AYALA CUBIDES (pago de retenciones)

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	2.1. Se aprueba desembolso a INVERSIONES ALFA Y OMEGA AJ SAS ZOMAC por $ 4.392.912,50 por concepto de compra de materiales de ferretería. 2.2. Se aprueba desembolso a favor de EVANGELISTA QUINTANILLA OBREGON por $ 10.877.184,00 por concepto de alquiler de equipos. 2.3. Se aprueba desembolso a favor de ALVARADO LEIDY LILIANA por $ 126.000,00 por concepto de Estampados de uniformes. 2.4. Se aprueba desembolso a favor de RAMIREZ DOMINGUEZ CARLOS ENRRIQUE por $ 3.733.000,00 por concepto pago de honorarios como Residente de Obra del 72% del valor del Contrato, con un avance físico de obra correspondiente al setenta y cinco por ciento (75%) de la ejecución del Proyecto. 2.5. Se aprueba desembolso a favor de MENA GOMEZ JORDIN ESTEBAN por $ 1.584.000,00 por concepto de Acarreos internos para el transporte de materiales. 2.6. Se aprueba pago de la nómina de los trabajadores durante el periodo del 16/06 al 20/06 de 2024 a nombre de la JAC Caño Bonito, su representante legal MARISOL AYALA CUBIDES por el valor de $ 1.053.093,33. 2.7. Se aprueba desembolso por concepto de liquidación de ayudantes de obra entre el 06 de mayo al 20 de junio de 2024 por el valor de $ 2.666.687,43 a nombre de la JAC Caño Bonito, su representante legal MARISOL AYALA CUBIDES. 2.8. Se aprueba desembolso por concepto de pago de seguridad social de obra entre el 01 de junio al 30 de junio de 2024 por el valor de $ 2.076.300,38 a nombre de la JAC Caño Bonito, su representante legal MARISOL AYALA CUBIDES. 2.9. Se aprueba desembolso a favor de NAYDA ROMERO MEJÍA por $ 1.300.000,00 por concepto de alimentación del 01/06 de 2024 al 20/06 del 2024 a los trabajadores.

	2.10. Se aprueba desembolso a favor de LUZ DARY SANTAMARIA VARGAS por $ 2.100.000,00 por concepto de honorarios como Contadora de la JAC. 2.11. Se aprueba desembolso a favor de MORA MELO LUZ EMILSEN por $ 6.720.000,00 por concepto de Alquiler de formaletas. 2.5. Se aprueba reembolso a MARISOL AYA CUBIDES por $ 32.365,00 por concepto de Pago de actualización de pólizas. 2.7. Se realiza aprobación de cheque por $ 807.903,50 por concepto de retenciones a la fuente, a favor de la JAC Caño Bonito, su representante legal MARISOL AYALA CUBIDES.

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de la relación de pagos aprobados en el comité.	JAC Caño Bonito	02/07/2024
Envío de Cheques firmados	SOTA LTDA	03/07/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Marisol Ayala Cubides
Cargo: Presidente JAC Caño Bonito

Nombre: Jacinto Cubides
Cargo: Representante Veeduría

Nombre: Luz Dary Santamaría
Cargo: Contadora JAC Caño Bonito

Nombre: Carlos Enrique Ramírez
Cargo: Ing. Residente de obra

Nombre: Javier Barrero
Cargo: R/L Interventoría

Nombre: Gabriel Velásquez
Cargo: Director de interventoría

Nombre: Wualner Raúl López
Cargo: Residente de Interventoría

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

CONVENIO SOLIDARIO No. 4143 DE 2023 JAC VEREDA CERRITOS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3613 de 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

JUSTIFICACIÓN:

N/A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 FEBRERO	VR. MES 2 MARZO	VR. MES 3 ABRIL	VR. MES 4 MAYO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NOMINA PERSONAL	$ -		$ 2.800.000	$ 27.485.538,00	$ 58.722.182	14,56%
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	$ -		$ 1.991.000	$ -	$ 2.117.000	0,96%
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ -		$ 1.310.000	$ -	$ 1.310.000	0,63%
4	GASTOS BANCARIOS	$ -	$ -		$ -	$ 1.328.596	0,00%
5	OTROS COSTOS	$ -	$ 7.227.973,00	$ 1.066.000	$ -	$ 11.659.745	3,99%
6	MATERIALES	$ -		$ 40.616.000	$ 13.862.000,00	$ 72.946.790	26,19%
7	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 31.350.000	$ -	$ 48.271.571	15,07%
8	ALQUILER EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ -	$ -		$ 3.655.000,00	$ 6.921.656	1,76%
9	PAGA	$ -	$ -		$ -	$ 4.714.468	0,00%
	TOTAL	**$ -**	**$ 7.227.973,00**	**$ 79.133.000**	**$ 45.002.538,00**	**$ 207.992.008,00**	**63,16%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.



Firma:

Nombre: MARISOL AYALA CUBIDES
Representante Legal o su Apoderado
Contratista



Firma:

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND



Firma:

Nombre: Carlos Enrique Ramirez Dominguez
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 54202-438888 NTS

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMES SEMANALES
CERRITOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 24 del 28-jun al 4-jul (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No.	4143 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 203 603 516.00
FECHA DE INICIO:	12/19/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	$ 203 603 516.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/15/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215 361 440.00
FECHA DE INICIO:	12/30/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	$ 215 361 440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/30/24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203 603 516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203 603 516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203 603 516.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 203 603 516.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 198 915 541.00	97.70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4 687 975.00)	-2.30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1 991 000.00	0.98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 203 603 516.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 200 906 541.00	98.68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2 696 975.00)	-1.32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20 360 351.60	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11 564 679.71	5.68%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 157 351 012.57	73.06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 154 034 446.40	71.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14 493 824.91	6.73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12 835 541.82	5.96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: -1.32%

Meta Física Ejecutada %: 98.68%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	119.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	100.00%			100.00%	
Ejec.	98.68%			98.68%	
Prog.					
Ejec.					
Prog.					
Ejec.					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fi

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora tipo trompo		1
vibrador de concretos		1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ----------

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----------

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ----------

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La estuctura de placa huella se encuentra terminada, falta realizar la aplicaion del relleno con material seleccionado de la region.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Falta realizar la aplicación del relleno con material seleccionado de la region.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

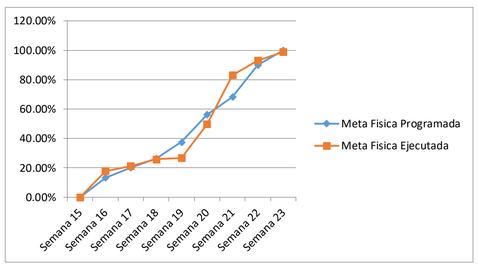

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Placa huella




Placa huella




Placa huella

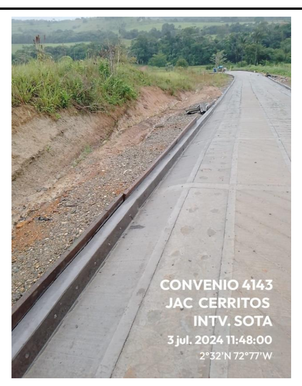

Placa huella

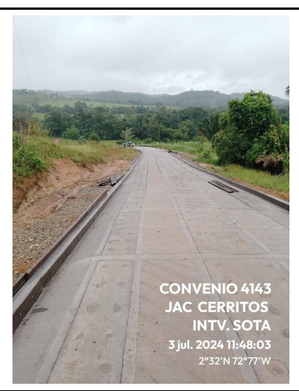

Placa huella

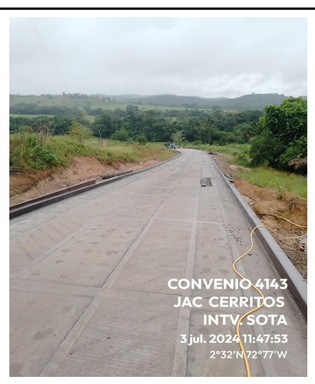

Placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Supervisar y verificar la instalacion del relleno con material seleccionado de la region.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 25 del 5-jul al 11-jul (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS		
CONVENIO No.	4143 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 203 603 516.00
FECHA DE INICIO:	12/19/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	$ 203 603 516.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/15/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215 361 440.00
FECHA DE INICIO:	12/30/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	$ 215 361 440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/30/24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203 603 516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203 603 516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	203 603 516.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	203 603 516.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	198 915 541.00	97.70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(4 687 975.00)	-2.30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	1 991 000.00	0.98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	203 603 516.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200 906 541.00	98.68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(2 696 975.00)	-1.32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20 360 351.60	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	11 564 679.71	5.68%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	162 185 214.86	75.31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	159 145 029.20	73.90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó acta del mes de febrero y marzo, en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: -1.32%
Meta Física Ejecutada %: 98.68%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	119.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	100.00%			100.00%	
Ejec.	98.68%			98.68%	
Prog.					
Ejec.					
Prog.					
Ejec.					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fi

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora tipo trompo		1
vibrador de concretos		1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ----------

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----------

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ----------

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La estuctura de placa huella se encuentra terminada, falta realizar la aplicaion del relleno con material seleccionado de la region.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Falta realizar la aplicación del relleno con material seleccionado de la region.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

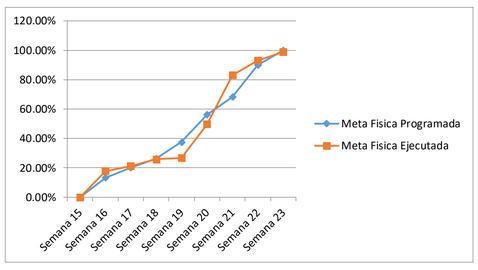

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Supervisar y verificar la instalacion del relleno con material seleccionado de la region.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 18/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 26 del 12-jul al 18-jul (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS		
CONVENIO No.	4143 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 203 603 516.00
FECHA DE INICIO:	12/19/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	$ 203 603 516.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/15/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215 361 440.00
FECHA DE INICIO:	12/30/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	$ 215 361 440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/30/24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203 603 516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203 603 516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203 603 516.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 203 603 516.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 198 915 541.00	97.70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4 687 975.00)	-2.30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1 991 000.00	0.98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 203 603 516.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 200 906 541.00	98.68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2 696 975.00)	-1.32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20 360 351.60	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11 564 679.71	5.68%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 167 019 417.14	77.55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 164 255 612.00	76.27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó acta del mes de febrero y marzo, en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: -1.32%
Meta Física Ejecutada %: 98.68%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	119.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	100.00%			100.00%	
Ejec.	98.68%			98.68%	
Prog.					
Ejec.					
Prog.					
Ejec.					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fi

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora tipo trompo		1
vibrador de concretos		1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ----------

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----------

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ----------

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La estuctura de placa huella se encuentra terminada, falta realizar la aplicaion del relleno con material seleccionado de la region.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Falta realizar la aplicación del relleno con material seleccionado de la region.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

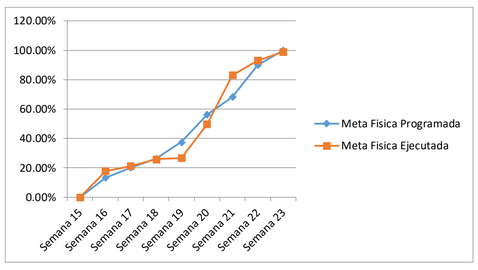

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Supervisar y verificar la instalacion del relleno con material seleccionado de la region.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 27 del 19-jul al 25-jul (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No.	4143 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 203 603 516.00
FECHA DE INICIO:	12/19/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	$ 203 603 516.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/15/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215 361 440.00
FECHA DE INICIO:	12/30/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	$ 215 361 440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/30/24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203 603 516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203 603 516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203 603 516.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 203 603 516.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 198 915 541.00	97.70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4 687 975.00)	-2.30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1 991 000.00	0.98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 203 603 516.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 200 906 541.00	98.68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2 696 975.00)	-1.32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20 360 351.60	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11 564 679.71	5.68%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171 853 619.43	79.80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169 366 194.80	78.64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó acta del mes de febrero y marzo, en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: -1.32%

Meta Física Ejecutada %: 98.68%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	119.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	100.00%			100.00%	
Ejec.	98.68%			98.68%	
Prog.					
Ejec.					
Prog.					
Ejec.					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fi

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora tipo trompo		1
vibrador de concretos		1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ----------

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----------

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ----------

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La estuctura de placa huella se encuentra terminada, falta realizar la aplicaion del relleno con material seleccionado de la region.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Falta realizar la aplicación del relleno con material seleccionado de la region.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

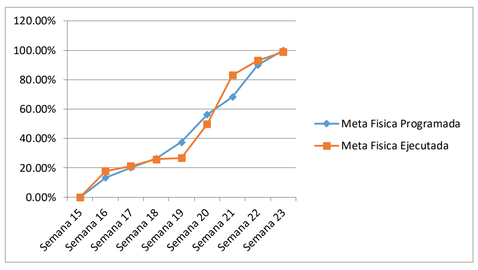

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Supervisar y verificar la instalacion del relleno con material seleccionado de la region.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 28 del 26-jul al 1-ago (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No.	4143 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 203 603 516.00
FECHA DE INICIO:	12/19/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	$ 203 603 516.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/15/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215 361 440.00
FECHA DE INICIO:	12/30/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	$ 215 361 440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/30/24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203 603 516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203 603 516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203 603 516.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 203 603 516.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 198 915 541.00	97.70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4 687 975.00)	-2.30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1 991 000.00	0.98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 203 603 516.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 200 906 541.00	98.68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2 696 975.00)	-1.32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20 360 351.60	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11 564 679.71	5.68%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 176 687 821.72	82.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 174 476 777.60	81.02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó acta del mes de febrero y marzo, en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: -1.32%

Meta Física Ejecutada %: 98.68%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	119.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	100.00%			100.00%	
Ejec.	98.68%			98.68%	
Prog.					
Ejec.					
Prog.					
Ejec.					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fi

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora tipo trompo		1
vibrador de concretos		1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ----------

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----------

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ----------

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La estuctura de placa huella se encuentra terminada, falta realizar la aplicaion del relleno con material seleccionado de la region. Se realizo comité operativo y la JAC ya cuenta con recursos para realizar esta actividad. Se espera en los proximos dias se ejecute.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Falta realizar la aplicación del relleno con material seleccionado de la region, Se espera en los proximos dias se ejecute.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

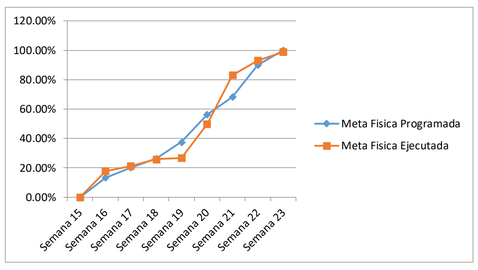

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Supervisar y verificar la instalacion del relleno con material seleccionado de la region.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	01/01/1900

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

CONTRATO No. 4143 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES JULIO																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Retro excavadora	CAT	110 hp	VEREDA CERRITOS																														
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																													1	1		1	1	
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	13%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	01/01/1900

FECHA: 30/06/2024
(Día / Mes / Año)

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Hugo Antonio Urrego

Firma

Nombre: Hgo Antonio Urrego Ciprian
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0507307 NTS

Firma

Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 30/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 4143 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																4
Lluvias moderadas																																1
Lluvias intensas																																
Total horas																										24	12		8	12	12	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
se ejecutaron las actividades de relleno de bordillos satisfactoriamente

Firma Hugo Antonio Urrego

Nombre: HUGO ANTONIO URREGO CIPRIAN
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0507307 NTS

Firma

Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 4143 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 203.603.516,00

VALOR ACUMULADO: $ 203.603.516,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.920.703,20	30	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.230.175,80	30	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 61.381.054,80	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037060

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009844 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/11/2023

FECHA	30	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.920.703,20	30	12	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.230.175,80	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 61.381.054,80	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037060

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	30	10	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009844 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN PRORROGA 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.920.703,20	30	4	2024	15	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.230.175,80	30	4	2024	15	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 61.381.054,80	15	7	2024	15	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037060

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 15/07/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	30	10	2023	15	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009844 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 15/07/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN PRORROGA 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.920.703,20	15	7	2024	15	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.230.175,80	15	7	2024	15	8	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 61.381.054,80	15	8	2024	15	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037060

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 3

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	30	10	2023	15	8	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009844 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE COMITÉ
CERRITOS

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 08	**Dirección Territorial INVIAS: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES.**	**Fecha: 19/07/2024**

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Cerritos, El Retorno, Guaviare.
No. Convenio(s) Solidario(s): 4143 de 2023.
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal Cerritos.

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	**Institución u Organización**	**Cargo**
Isidoro González	JAC Cerritos	Presidente
Jose Ramiro Quiceno	JAC Cerritos	Veedor
Jineth Moreno Perdomo	JAC Cerritos	Contadora
Hugo Antonio Urrego	JAC Cerritos	Ing. Residente de obra
Javier Barrero	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Representante Legal
Wualner Raúl López González	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Ing. Residente de interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Presentación de los participantes
2. Aprobación de desembolsos.

AGENDA DEL COMITÉ: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Presentación de los asistentes.
2- Aprobación de desembolsos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Resumen
1.	Presentación de los asistentes: siendo las 05:15 PM se da inicio al comité operativo, Asisten al comité por la JAC de la vereda Cerritos el Presidente, Isidoro González; el Veedor, Jose Ramiro Quiceno; la Contadora, Jineth Moreno Perdomo; el Residente de Obra, Hugo Antonio Urrego y por parte de la interventoría asisten el Director de Obra, Gabriel Velázquez; el Residente de Obra, Wualner Lopez y el representante legal, Javier Barrero.
2.	Se presentan la relación de facturas y/o cuentas de cobro para aprobación y orden de pago para la obra: 2.1. Orden de Pago 026 – Alquiler de equipos por 8.661.139 2.2. Orden de Pago 027 – Servicio de acarreos para equipos y formaleta por $ 2.079.000 2.3. Orden de Pago 028 – Subsidio al dignatario por $ 960.000 2.4. Orden de Pago 029 – Arriendo de bodega por $ 420.000 2.5. Orden de Pago 030 – Impresión de documentación técnica y financiera por $ 728.000 2.6. Orden de Pago 031 – Compra de arena y recebo por $ 2.416.050. 2.7. Orden de Pago 032 – Compra de triturado por $ 1.501.500,00

	2.8. Orden de Pago 033 – Transporte de material por $ 12.573.000,00 2.9. Orden de Pago 034 – Compra de madera por $ 432.000 2.10. Orden de Pago 035 – Compra de material de ferretería por $ 1.843.000 2.11. Orden de Pago 036 – Nómina de trabajadores segunda quincena de junio por $ 6.580.200 2.12. Orden de Pago 037 – Seguridad social de trabajadores por $ 6.195.500 2.13. Orden de Pago 038 – Liquidación de personal a corte 30 de junio por $ 4.214.014. 2.14. Orden de Pago 039 – Alquiler de formaleta por $ 4.032.000 2.15. Orden de Pago 040 – Compra de tríplex por $ 220.000 2.16. Orden de Pago 041 – Honorarios residente de obra por $ 3.675.000 2.17. Orden de Pago 042 – Honorarios contadora por $ 2.100.000 2.18. Orden de Pago 043 – Alimentación por $ 400.000 2.19. Orden de Pago 044 – Pago de retenciones por $ 395.450

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	Luego de ser revisadas y discutidas cada una de las órdenes de compra, se aprueban los desembolsos por parte de los miembros del comité operativo de las siguientes órdenes de pago: 2.1. Desembolso a Evangelista Quintanilla Obregón de $ 8.661.139 por concepto de compra de materiales de ferretería. 2.2. Desembolso a Gilberto Mateus Ardila de 2.079.000 por concepto de compra de arena. 2.3. Desembolso a Isidoro González por $ 960.000 por concepto de subsidio al dignatario. 2.4. Desembolso por concepto de arriendo de bodega por $ 420.000 a nombre de la Jhon Alexander Rueda. 2.5. Desembolso a favor de Mayerly Cuenca Espinosa de $ 728.500 por concepto de Impresión de documentación técnica. 2.6. Desembolso por concepto de compra de arena y recebo por $ 2.416.050,00 a nombre de la Cantera Lajitas SAS. 2.7. Desembolso por concepto de compra de triturado por $ 1.501.500 a nombre de la Ramón Rojas. 2.8. Desembolso por concepto de transporte de material de $ 12.573.000 a nombre de Nelson Linares Morales. 2.9. Desembolso por concepto compra de madera de $ 432.000 a nombre de Dora Melba Camelo Colorado.

	2.10. Desembolso por concepto compra de material de ferretería de $ 1.843.000 a nombre de FERRETERIA S&F ZOMAC SAS. 2.11. Se aprueba pago de la nómina de los trabajadores durante el periodo de 15/05 a 30/06 de 2024 a nombre de la JAC Caño Bonito, su representante legal Isidoro González por el valor de $ 6.580.200. 2.12. Desembolso por concepto de pago de seguridad social de obra mes de junio de 2024 por el valor de 6.195.500 a nombre de la JAC Caño Bonito, su representante legal Isidoro González. 2.13. Desembolso por concepto de Liquidación de personal a corte 30 de junio de 2024 por el valor de $ 4.214.014 a nombre de la JAC Caño Bonito, su representante legal Isidoro González. 2.14. Desembolso por concepto Alquiler de formaleta de $ 4.032.000 a nombre de Luz Emilce Mora Melo. 2.15. Desembolso por concepto de compra de tríplex de $ 220.000 a nombre de LUIS ISVELSO AVILA PINEDA 2.16. Desembolso por concepto de honorarios residente de obra de $ 3.675.000 a nombre de Hugo Antonio Urrego Ciprian. 2.17. Desembolso por concepto de Honorarios contadora por $ 2.100.000 a nombre de Jineth Moreno Perdomo. 2.18. Desembolso por concepto de alimentación por $ 400.000 a nombre de Edilson Mateus Martinez. 2.19. Desembolso por concepto de pago de retenciones por $ 395.450 a nombre de Isidoro González Morera.

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos			
1.	Informe Técnico de Avance:	SI ____	NO __x__	No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera:	SI ____	NO __x__	No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO __x__	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI ____	NO __x__	No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Órdenes de compra de las compras aprobadas	JAC Cerritos	24/05/2024

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES.

Isidoro Gonzalez

Nombre: Isidoro González
Cargo: Presidente JAC Cerritos

Nombre: Jose Ramiro Quiceno
Cargo: Representante de Veeduría

Hugo Antonio Urrego

Nombre: Jineth Moreno Perdomo
Cargo: Contadora JAC Cerritos

Nombre: Hugo Antonio Urrego
Cargo: Ing. Residente de obra

GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: Javier Barrero
Cargo: R/L Interventoría

Nombre: Gabriel Hernán Velásquez
Cargo: Director de Interventoría

Nombre: Wualner Raúl López González
Cargo: Residente de Interventoría

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

CONVENIO SOLIDARIO No. 4240 DE 2023 JAC VEREDA EL RECREO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3613 de 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

JUSTIFICACIÓN:

N/A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 FEBRERO	VR. MES 2 MARZO	VR. MES 3 ABRIL	VR. MES 4 MAYO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NOMINA PERSONAL	$ -		$ 2.800.000	$ 27.485.538,00	$ 58.722.182	14,56%
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	$ -		$ 1.991.000	$ -	$ 2.117.000	0,96%
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ -		$ 1.310.000	$ -	$ 1.310.000	0,63%
4	GASTOS BANCARIOS	$ -	$ -		$ -	$ 1.328.596	0,00%
5	OTROS COSTOS	$ -	$ 7.227.973,00	$ 1.066.000	$ -	$ 11.659.745	3,99%
6	MATERIALES	$ -		$ 40.616.000	$ 13.862.000,00	$ 72.946.790	26,19%
7	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 31.350.000	$ -	$ 48.271.571	15,07%
8	ALQUILER EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ -	$ -		$ 3.655.000,00	$ 6.921.656	1,76%
9	PAGA	$ -	$ -		$ -	$ 4.714.468	0,00%
	TOTAL	**$ -**	**$ 7.227.973,00**	**$ 79.133.000**	**$ 45.002.538,00**	**$ 207.992.008,00**	**63,16%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.



Firma:

Nombre: MARISOL AYALA CUBIDES
Representante Legal o su Apoderado
Contratista



Firma:

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND



Firma:

Nombre: Carlos Enrique Ramirez Dominguez
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 54202-438888 NTS

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMES SEMANALES
EL RECREO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 24 del 28-jun al 4-jul Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No. 4240 de 2023 VALOR INICIAL: $ 200 041 344.00
FECHA DE INICIO: 12/19/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/2023 VALOR ACUMULADO: $ 200 041 344.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/15/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 VALOR INICIAL: 215 361 440.00 $
FECHA DE INICIO: 12/30/23 VALOR ADICIONES: - $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/23 VALOR ACUMULADO: 215 361 440.00 $
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/24 VALOR ANTICIPO: - $
VALOR AMORTIZADO: - $
SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200 041 344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200 041 344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200 041 344.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 170 035 142.40	85.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 178 038 619.00	89.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 8 003 476.60	4.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1 991 000.00	1.00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 170 035 142.40	85.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 180 029 619.00	90.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 9 994 476.60	5.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16 003 307.52	8.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25 711 416.00	12.85%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 157 351 012.57	73.06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 154 034 446.40	71.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14 493 824.91	6.73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12 835 541.82	5.96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO
VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 85.00% Avance o Atraso Físico % 5.00%
Meta Física Ejecutada % 90.00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1.5X1.5 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	85.00%			85.00%	
Ejec	90.00%			90.00%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO x	N/A	
EMISIONES:	SI	NO x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO x	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo instalación de formaleta y se realizo el vaciado de concreto reforzado para el Box culvert No. 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el desencofrado del Box culvert No. 1, se organizara los equipos, herramienta menor y se realizara el cierre de los desvios provisionales.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

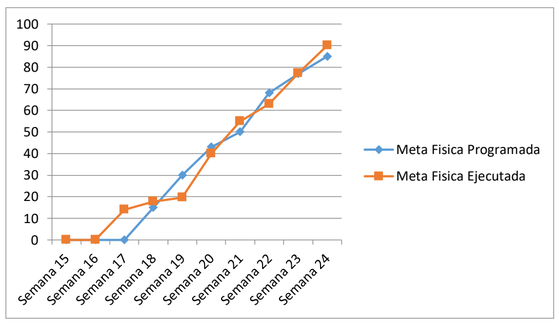

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Boxculvert No. 1(1x1). Instalacion de formaleta



Boxculvert No. 1(1x1). Instalacion de formaleta



Boxculvert No. 2(1x1)



Boxculvert No. 2(1x1)



Boxculvert No. 3(1x1).



Boxculvert No. 4(1.5x1.5).

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Realizar seguimiento al plan de inversión y programacion de obra. Verificar la instalación del acero figurado. Realizar toma de muetras del Concreto de 21Mpa	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 25 del 5-jul al 11-jul Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No. 4240 de 2023 VALOR INICIAL: $ 200 041 344.00

FECHA DE INICIO: 12/19/2023 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/2023 VALOR ACUMULADO: $ 200 041 344.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/15/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 VALOR INICIAL: 215 361 440.00 $

FECHA DE INICIO: 12/30/23 VALOR ADICIONES: - $

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/23 VALOR ACUMULADO: 215 361 440.00 $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/24 VALOR ANTICIPO: - $

VALOR AMORTIZADO: - $

SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200 041 344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200 041 344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200 041 344.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 188 038 863.36	94.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192 040 715.00	96.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4 001 851.64	2.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1 991 000.00	1.00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 188 038 863.36	94.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 194 031 715.00	97.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5 992 851.64	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18 003 720.96	9.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14 002 096.00	7.00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 162 185 214.86	75.31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 159 145 029.20	73.90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94.00% Avance o Atraso Físico % 3.00%

Meta Física Ejecutada % 97.00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1.5X1.5 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	94.00%			94.00%	
Ejec	97.00%			97.00%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo el desencofrado del Box culvert No. 1, se organizo los equipos, herramienta menor y se realizo el cierre de los desvios provisionales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el aproche para los Box culvert construidas.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

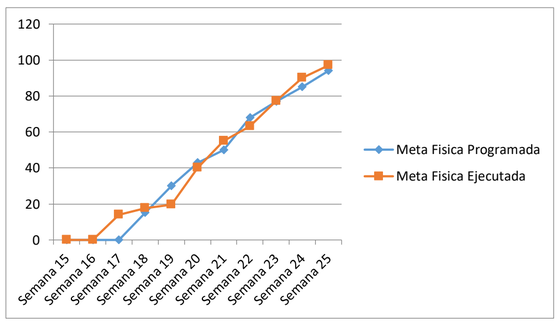

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Boxculvert No. 1(1x1). Instalacion de formaleta



Boxculvert No. 1(1x1). Instalacion de formaleta



Boxculvert No. 2(1x1)



Boxculvert No. 2(1x1)



Boxculvert No. 3(1x1).



Boxculvert No. 4(1.5x1.5).

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Realizar seguimiento a la programacion de obra.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 18/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 26 del 12-jul al 18-jul Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No.	4240 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200 041 344.00
FECHA DE INICIO:	12/19/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200 041 344.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/15/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	215 361 440.00 $
FECHA DE INICIO:	12/30/23	VALOR ADICIONES:	- $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	215 361 440.00 $
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/30/24	VALOR ANTICIPO:	- $
		VALOR AMORTIZADO:	- $
		SALDO POR AMORTIZAR:	- $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200 041 344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200 041 344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200 041 344.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 196 040 517.12	98.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 194 042 000.00	97.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1 998 517.12)	-1.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1 991 000.00	1.00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196 040 517.12	98.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 196 033 000.00	98.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (7 517.12)	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26 005 374.72	13.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16 003 381.00	8.00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 167 019 417.14	77.55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 164 255 612.00	76.27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 98.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 98.00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1.5X1.5 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	98.00%			98.00%	
Ejec	98.00%			98.00%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron aproches para los Box Culvert No. 1, 2 y 3. no se logro terminar todos los aproches debido a las lluvias.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se terminaran los aproches para los Box culvert.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

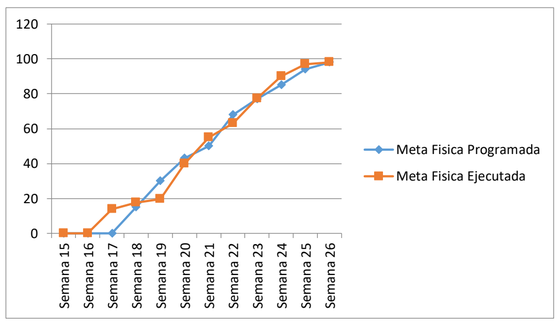

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Boxculvert No. 1(1x1).



Boxculvert No. 1(1x1).



Boxculvert No. 2(1x1)



Boxculvert No. 2(1x1)



Boxculvert No. 3(1x1).



Boxculvert No. 4(1.5x1.5).

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Supervisar la ejecucion de los aproches para los Box culvert construidos.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 27 del 19-jul al 25-jul Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No. 4240 de 2023 VALOR INICIAL: $ 200 041 344.00

FECHA DE INICIO: 12/19/2023 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/2023 VALOR ACUMULADO: $ 200 041 344.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/15/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 VALOR INICIAL: 215 361 440.00 $

FECHA DE INICIO: 12/30/23 VALOR ADICIONES: - $

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/23 VALOR ACUMULADO: 215 361 440.00 $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/24 VALOR ANTICIPO: - $

VALOR AMORTIZADO: - $

SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200 041 344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200 041 344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200 041 344.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 196 040 517.12	98.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 194 042 000.00	97.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1 998 517.12)	-1.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1 991 000.00	1.00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196 040 517.12	98.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 196 033 000.00	98.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (7 517.12)	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26 005 374.72	13.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16 003 381.00	8.00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171 853 619.43	79.80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169 366 194.80	78.64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 98.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 98.00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1.5X1.5 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	98.00%			98.00%	
Ejec	98.00%			98.00%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ha logrado terminar los aproches por las constantes luvias que se han venido presentando.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se terminaran los aproches para los Box culvert.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

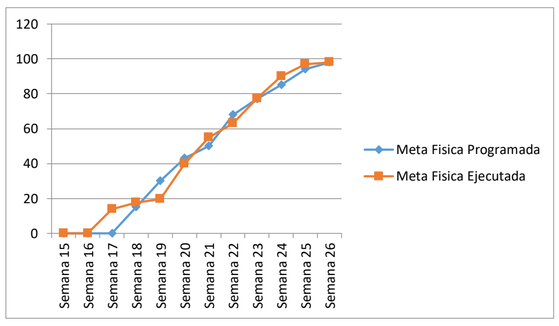

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Boxculvert No. 1(1x1).



Boxculvert No. 1(1x1).



Boxculvert No. 2(1x1)



Boxculvert No. 2(1x1)



Boxculvert No. 3(1x1).



Boxculvert No. 4(1.5x1.5).

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Supervisar la ejecucion de los aproches para los Box culvert construidos.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 28 del 26-jul al 1-ago Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 1.5x1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No. 4240 de 2023 VALOR INICIAL: $ 200 041 344.00

FECHA DE INICIO: 12/19/2023 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/2023 VALOR ACUMULADO: $ 200 041 344.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/15/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 VALOR INICIAL: 215 361 440.00 $

FECHA DE INICIO: 12/30/23 VALOR ADICIONES: - $

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/23 VALOR ACUMULADO: 215 361 440.00 $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/24 VALOR ANTICIPO: - $

VALOR AMORTIZADO: - $

SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200 041 344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200 041 344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200 041 344.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 196 040 517.12	98.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 194 042 000.00	97.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1 998 517.12)	-1.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1 991 000.00	1.00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196 040 517.12	98.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 196 033 000.00	98.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (7 517.12)	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26 005 374.72	13.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16 003 381.00	8.00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 176 687 821.72	82.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 174 476 777.60	81.02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 98.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 98.00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1.5X1.5 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	98.00%			98.00%	
Ejec	98.00%			98.00%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se terminan los aproches para los Box culvert construidos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la la respectiva documentacion y soporte del PAGA o PGA.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

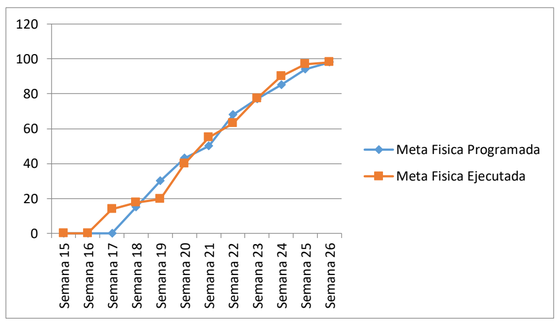

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Boxculvert No. 1(1x1).



Boxculvert No. 1(1x1).



Boxculvert No. 2(1x1)



Boxculvert No. 2(1x1)



Boxculvert No. 3(1x1).



Boxculvert No. 4(1.5x1.5).

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Supervisar la ejecucion de los aproches para los Box culvert construidos.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	01/01/1900

FECHA: 08/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4240 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JULIO																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora																																		
Vibrocompactador																																		
Retro excavadora	CAT	110 hp	VEREDA EL RECREO																															
Mezcladora	SUKIYAMA	1 1/2 BLTO	VEREDA EL RECREO																															
Rana Compactadora	BRIGGS & STRATTON	9 hp	VEREDA EL RECREO																															
Planta electrica	WARRIOR	2500 w	VEREDA EL RECREO																															
Motobomba	FORTE	16hp	VEREDA EL RECREO																															
Bomba Manual Espa.																																		
Vibrador de Concreto		2,4hp	VEREDA EL RECREO																															
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	5	5	5	5	2	2	2																								
			TOTAL ACTIVO	5	5	5	5	2	2	2																								
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	6	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: PEDRO RAMIREZ BAYER
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-305140 CND

Firma

Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 4240 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMCAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	WILMER LEANDRO	1122678047	MAESTRO	$ 2,320,000	X	X	X	X	X	X		X																			X				JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
2	JUAN DE JESUS	18221608	OFICIAL	$ 2,100,000	X	X	X	X	X			X																							JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
3	MAICOL DAVID	1122236979	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X			X																							JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
4	RUBEN CAMILO	1122236287	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X			X																							JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PROTECCION	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
5	CARLOS JULIO	1111452611	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X			X																							JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
6	EDIXON ORLANDO	1122239773	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X			X																							JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
7	MARCOS FIDEL	18235424	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X																										JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
8	YILFER ANDRES	1006811965	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X																										JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
9	ELBIN ALEXANDER	1069900249	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X			X																							JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PORVENIR	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	
10	JHON JAIRO ROMERO	1006783397	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X			X																							JAC EL RECREC	$ 1,083,334	$ 75,500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135,500	PROTECCION	9469053145	$ 173,400	$ 43,400	$ 21,800	$ 32,500	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 31/05/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: PEDRO RAMIREZ BAYER
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-305140 CND

Firma
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 08/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 4240 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	16	24	24	22	17	22	17	22																								164
Lluvias moderadas	4	0	0	2	0	2	0	2																								10
Lluvias intensas	4	0	0	0	7	0	7	0																								18
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24																								

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Durante el mes de mayo se presentaron fuertes lluvias las cuales generaron complicaciones en obra, se presentaron grandes perdidas de material petreo, debido a la escorrentia de agua, afectaciones durante las actividades de concretos.

Firma
Nombre: PEDRO RAMIREZ BAYER
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-305140 CND

Firma
Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No.: 4240 DE 2023 **CONTRATISTA:**

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	09/07/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 4	3	106,16%	3184,80	SI	LOSA SUPERIOR 28 DIAS
2	03/07/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 3	3	103,29 %	3098,79	SI	LOSA INFERIOR 28 DIAS
2	12/07/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 3	3	103,99%	3119,80	SI	PLACA SUP. Y MUROS 28 DIAS
3	06/07/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 4	3	105,45 %	3163,46	SI	MUROS 28 DIAS
3	02/07/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 4	3	93,12%	2793,47	SI	MUROS ALETAS 14 DIAS
3	16/07/2024	ENSAYO A LA COMPRESION	NTC673-2022	BOX # 4	3	105,36 %	3160,84%	SI	MUROS ALETAS 28 DIAS
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: PEDRO RAMIREZ BAYER
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-305140 CND

Firma

Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GEOLAB IMEG
LABORATORIO DE SUELOS Y GEOTECNIA

ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD
NTC 673-2022

LAB-F-10
VER-01
FECHA 1/12/2023


CONTRATO DE OBRA: N/A	**OBJETO:**	**"Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda El Recreo del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"**

CLIENTE	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL RECREO	**NIT**	90119999-4
LOCALIZACIÓN	VEREDA EL RECREO - EL RETORNO	**RESISTENCIA**	**Fc= 3000 PSI**


ELEMENTO 1	**FECHA DE FUNDICIÓN**	**FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)**				**GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS**		**ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)**	**RESULTADOS DE RESISTENCIA**							
									7 DÍAS		**14 DÍAS**		**28 DÍAS**		**T - 28 DIAS**	
		7	**14**	**28**	**T**	**ALTO (cm)**	**DIAMETRO (cm)**		**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**
BOX CULVERT # 4 - PLACA INFERIOR (1.5X1.5) m	1/06/2024	8/06/2024	15/06/2024	29/06/2024	-	15	7,5	44,179	61,57	2021,32	82,79	2717,97	95,83	3146,06	95,29	3128,34
RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)			3000,00			**PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)**			67,38%		90,60%		104,87%		104,28%	

ELEMENTO 2	**FECHA DE FUNDICIÓN**	**FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)**				**GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS**		**ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)**	**RESULTADOS DE RESISTENCIA**							
									7 DÍAS		**14 DÍAS**		**28 DÍAS**		**T - 28 DIAS**	
		7	**14**	**28**	**T**	**ALTO (cm)**	**DIAMETRO (cm)**		**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**
BOX CULVERT # 4 - PLACA SUPERIOR (1.5X1.5) m	11/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	9/07/2024	-	15	7,5	44,179	62,72	2059,08	83,19	2731,10	96,27	3160,51	97,01	3184,80
RESISTENCIA DE LA MEZCLA DISEÑADA (PSI)			3000,00			**PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)**			68,64%		91,04%		105,35%		106,16%	

BOX CULVERT # 4 - PLACA INFERIOR (1.5X1.5) m

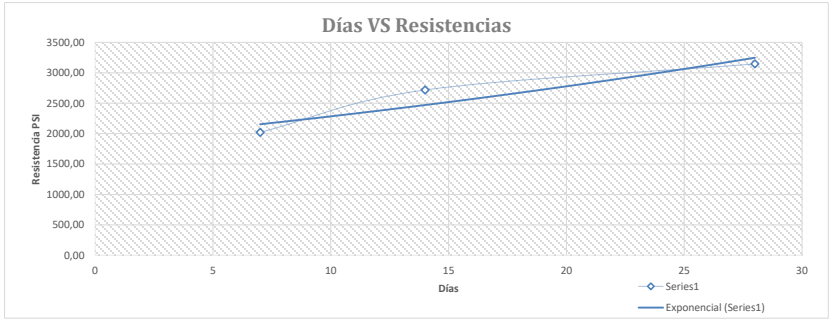

BOX CULVERT # 4 - PLACA SUPERIOR (1.5X1.5) m

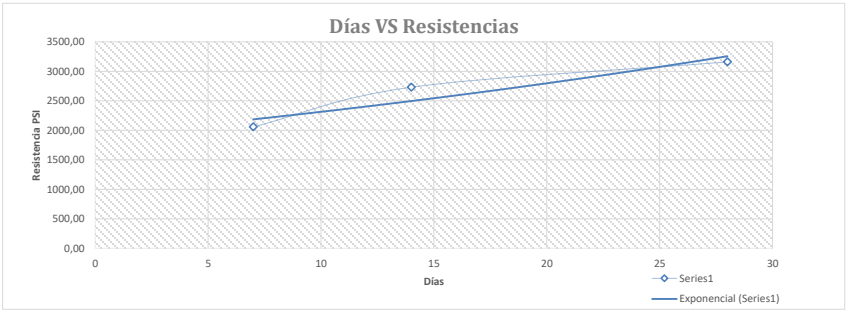

OBSERVACIONES:	Los cilindros ensayados fueron elaborados en obra ; despues de realizar la recepción de los cilindros en laboratorio, se procedio a continuar con el curado de los mismos y la rotura según los terminos establecidos.

FECHA DE ENTREGA 16/07/2024

Ing. Laura Gomez
Director de Laboratorio

GEOLAB IMEG
LABORATORIO DE SUELOS Y GEOTECNIA

ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD
NTC 673-2022

LAB-F-10
VER-01
FECHA 1/12/2023


CONTRATO DE OBRA: N/A	**OBJETO:**	**"Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Nuevo Milenio del municipio de San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"**

CLIENTE	JUNTA DE ACCION COMUNAL NUEVO MILENIO	**NIT**	
LOCALIZACIÓN	VEREDA NUEVO MULENIO - SAN JOSE DEL GUAVIARE	**RESISTENCIA**	**Fc= 3000 PSI**


ELEMENTO 3	**FECHA DE FUNDICIÓN**	**FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)**				**GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS**		**ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)**	**RESULTADOS DE RESISTENCIA**							
									7 DÍAS		**14 DÍAS**		**28 DÍAS**		**T - 28 DIAS**	
		7	**14**	**28**	**T**	**ALTO (cm)**	**DIAMETRO (cm)**		**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**
BOX CULVERT # 3 - PLACA INFERIOR (1.0X1.0) m	5/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	3/07/2024	-	15	7,5	44,179	64,76	2126,05	83,86	2753,09	93,57	3071,87	94,39	3098,79
RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)			3000,00			**PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)**			70,87%		91,77%		102,40%		103,29%	

ELEMENTO 4	**FECHA DE FUNDICIÓN**	**FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)**				**GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS**		**ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)**	**RESULTADOS DE RESISTENCIA**							
									7 DÍAS		**14 DÍAS**		**28 DÍAS**		**T - 28 DIAS**	
		7	**14**	**28**	**T**	**ALTO (cm)**	**DIAMETRO (cm)**		**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**
BOX CULVERT # 3 - PLACA SUPERIOR Y MUROS (1.0X1.0) m	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	-	15	7,5	44,179	65,1	2137,21	84,26	2766,23	95,18	3124,73	95,03	3119,80
RESISTENCIA DE LA MEZCLA DISEÑADA (PSI)			3000,00			**PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)**			71,24%		92,21%		104,16%		103,99%	

BOX CULVERT # 3 - PLACA INFERIOR (1.0X1.0) m

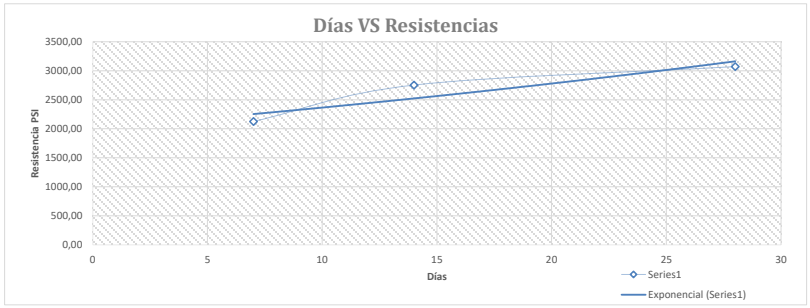

BOX CULVERT # 3 - PLACA SUPERIOR Y MUROS (1.0X1.0) m

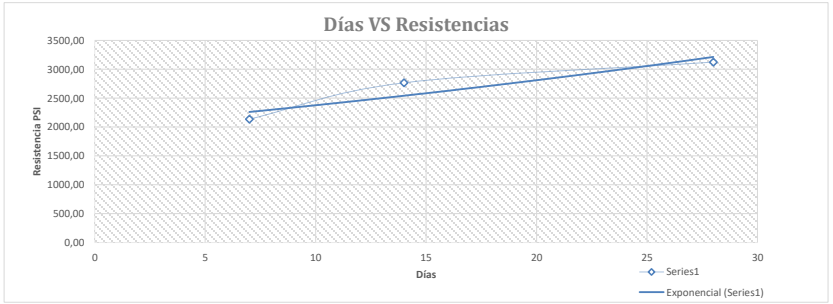

OBSERVACIONES:	Los cilindros ensayados fueron elaborados en obra ; despues de realizar la recepción de los cilindros en laboratorio, se procedio a continuar con el curado de los mismos y la rotura según los terminos establecidos.

FECHA DE ENTREGA 16/07/2024

Ing. Laura Gomez
Director de Laboratorio

GEOLAB IMEG
LABORATORIO DE SUELOS Y GEOTECNIA

ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO CONTROL DE CALIDAD
NTC 673-2022

LAB-F-10
VER-01
FECHA 1/12/2023


CONTRATO DE OBRA: N/A	**OBJETO:**	**"Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Nuevo Milenio del municipio de San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"**

CLIENTE	JUNTA DE ACCION COMUNAL NUEVO MILENIO	**NIT**	
LOCALIZACIÓN	VEREDA NUEVO MULENIO - SAN JOSE DEL GUAVIARE	**RESISTENCIA**	**Fc= 3000 PSI**


ELEMENTO 9	**FECHA DE FUNDICIÓN**	**FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)**				**GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS**		**ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)**	**RESULTADOS DE RESISTENCIA**							
									7 DÍAS		**14 DÍAS**		**28 DÍAS**		**T - 28 DIAS**	
		7	**14**	**28**	**T**	**ALTO (cm)**	**DIAMETRO (cm)**		**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**
BOX CULVERT # 4 - MUROS DE CUERPO (1.5X1.5) m	8/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	6/07/2024	-	15	7,5	44,179	65,64	2154,94	85,99	2823,02	96,83	3178,89	96,36	3163,46
RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)			3000,00			**PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)**			71,83%		94,10%		105,96%		105,45%	

ELEMENTO 10	**FECHA DE FUNDICIÓN**	**FECHAS DE ROTURAS (DÍAS)**				**GEOMETRIA DE LAS MUESTRAS**		**ÁREA DE LAS MUESTRAS (cm^2)**	**RESULTADOS DE RESISTENCIA**							
									7 DÍAS		**14 DÍAS**		**28 DÍAS**		**T - 28 DIAS**	
		7	**14**	**28**	**T**	**ALTO (cm)**	**DIAMETRO (cm)**		**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**	**FUERZA (KN)**	**RESISTENCIA (PSI)**
BOX CULVERT # 4 - MUROS DE ALETA (1.5X1.5) m	18/06/2024	25/06/2024	2/07/2024	16/07/2024	-	15	7,5	44,179	64,87	2129,66	85,09	2793,47	96,28	3160,84	96,64	3172,66
RESISTENCIA DE LA MEZCLA DISEÑADA (PSI)			3000,00			**PORCENTAJE DE RESISTENCIA ALCANZADO(%)**			70,99%		93,12%		105,36%		105,76%	

BOX CULVERT # 4 - MUROS DE CUERPO (1.5X1.5) m

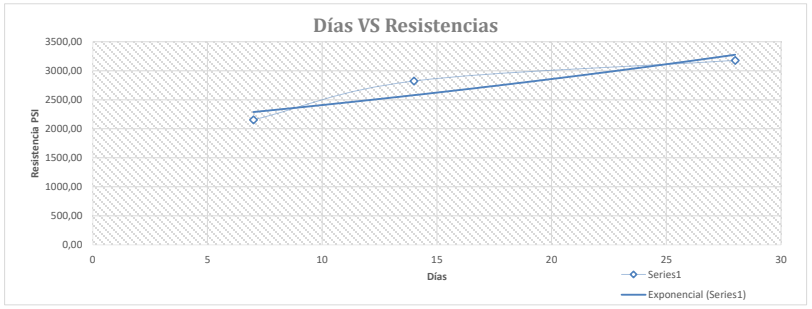

BOX CULVERT # 4 - MUROS DE ALETA (1.5X1.5) m

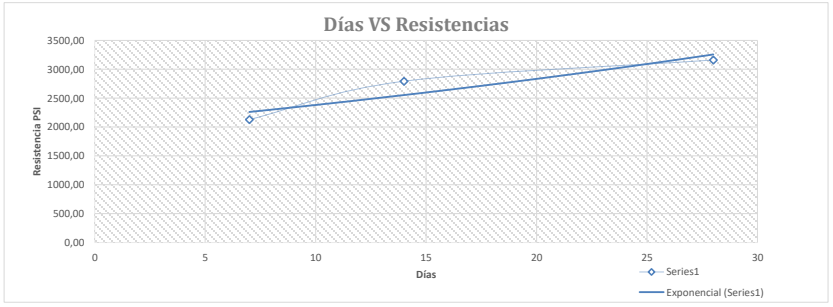

OBSERVACIONES:	Los cilindros ensayados fueron elaborados en obra ; despues de realizar la recepción de los cilindros en laboratorio, se procedio a continuar con el curado de los mismos y la rotura según los terminos establecidos.

FECHA DE ENTREGA 16/07/2024

Ing. Laura Gomez
Director de Laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 4240 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 21/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.041.344,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.041.344,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.208.268,80	30	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.052.067,20	30	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.312.403,20	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037316

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009896 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0 - 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.208.268,80	16	1	2024	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.052.067,20	16	1	2024	1	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.312.403,20	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037316

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31	10	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009896 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN SUSPENSION Y PRORROGA 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.208.268,80	30	4	2024	15	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.052.067,20	30	4	2024	15	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.312.403,20	15	7	2024	15	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037316

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 15/07/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31	10	2023	15	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009896 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 15/07/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN SUSPENSION Y PRORROGA 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.208.268,80	15	7	2024	15	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.052.067,20	15	7	2024	15	8	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.312.403,20	15	8	2024	15	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037316

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 3

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31	10	2023	15	8	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009896 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3752 DE 2023 JAC VEREDA SAN LUCAS.

INFORMES SEMANALES
SAN LUCAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 24 del 28-jun al 4-jul — Último Informe Semanal SI ☑ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No. 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216 314 958.00

FECHA DE INICIO: 12/19/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216 314 958.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215 361 440.00

FECHA DE INICIO: 12/30/23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/23 — VALOR ACUMULADO: $ 215 361 440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/24 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216 314 958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216 314 958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216 314 958.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 175 354 102.23	81.06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (175 354 102.23)	-81.06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8 084 042.00	3.74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 175 354 102.23	81.06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8 084 042.00	3.74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (167 270 060.23)	-77.33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15 741 303.47	7.28%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 157 351 012.57	73.06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 154 034 446.40	71.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14 493 824.91	6.73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12 835 541.82	5.96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 81.06% — Avance o Atraso Físico %: -77.33%

Meta Física Ejecutada %: 3.74%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	81.06%			81.06%	
Ejec	3.74%			3.74%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha ya establecieron los proveedores de materiales y se les realizaron los chekes, para los respectivos desembolsos y pagos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

la JAC Continua sin presentar los docuementos necesarios y requeridos para aprobar inicio de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

la JAC debera enviar cuanto antes los documentos pendientes (estudios previos) y necesarios (presupuesto de obra con sus respectivos anexos). Para lograr aprobar el inicio de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

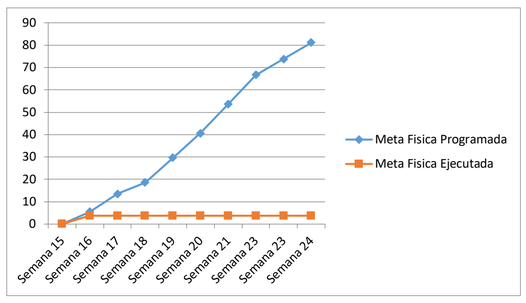

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar solicitud a la JAC para que el nuevo residente presente los documentos requeridos para el inicio de obra, ademas de realizar una nueva programacion de obra que se ajuste a las actividades y nuevos tiempos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 25 del 5-jul al 11-jul (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No. 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216 314 958.00

FECHA DE INICIO: 12/19/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216 314 958.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215 361 440.00

FECHA DE INICIO: 12/30/23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/23 — VALOR ACUMULADO: $ 215 361 440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/24 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216 314 958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216 314 958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216 314 958.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 183 867 352.16	85.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (183 867 352.16)	-85.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8 084 042.00	3.74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 183 867 352.16	85.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8 084 042.00	3.74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (175 783 310.16)	-81.26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8 513 249.93	3.94%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 162 185 214.86	75.31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 159 145 029.20	73.90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 85.00% — Avance o Atraso Físico %: -81.26%

Meta Física Ejecutada %: 3.74%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	85.00%			85.00%	
Ejec	3.74%			3.74%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha ya establecieron los proveedores de materiales y se les realizaron los chekes, para los respectivos desembolsos y pagos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

la JAC Continua sin presentar los docuementos necesarios y requeridos para aprobar inicio de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

la JAC debera enviar cuanto antes los documentos pendientes (estudios previos) y necesarios (presupuesto de obra con sus respectivos anexos). Para lograr aprobar el inicio de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

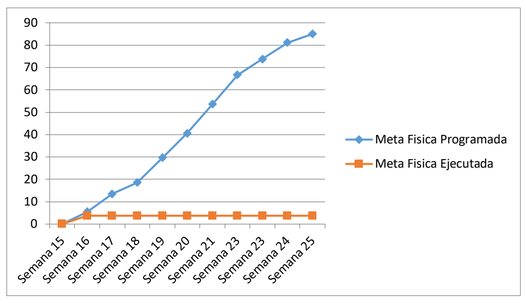

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar solicitud a la JAC para que el nuevo residente presente los documentos requeridos para el inicio de obra, ademas de realizar una nueva programacion de obra que se ajuste a las actividades y nuevos tiempos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 18/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 26 del 12-jul al 18-jul (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS		
CONVENIO No.	3752 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 216 314 958.00
FECHA DE INICIO:	12/19/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 216 314 958.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/30/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215 361 440.00
FECHA DE INICIO:	12/30/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	$ 215 361 440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/30/24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216 314 958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216 314 958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216 314 958.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 10 820 000.00	5.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 13 550 000.00	6.26%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2 730 000.00	1.26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8 084 042.00	3.74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10 820 000.00	5.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21 634 042.00	10.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 21 634 042.00	10.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10 820 000.00	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13 550 000.00	6.26%

Observaciones: La Jac presenta una nueva programacion de actividades de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 167 019 417.14	77.55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 164 255 612.00	76.27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 5.00% — Avance o Atraso Físico %: 5.00%
Meta Física Ejecutada %: 10.00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	5.00%			5.00%	
Ejec	10.00%			10.00%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha ya establecieron los proveedores de materiales y se les realizaron los chekes, para los respectivos desembolsos y pagos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la conformacion de la via existente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el alistamiento de materiales, herramientas y equipos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

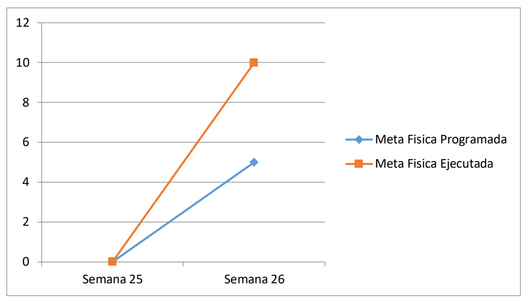

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformacion de via existente



Conformacion de via existente



Conformacion de via existente

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
verificar y supervisar el alistamiento y suministro de materiales, herramientas y equipos.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 27 del 19-jul al 25-jul (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No. 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216 314 958.00
FECHA DE INICIO: 12/19/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216 314 958.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215 361 440.00
FECHA DE INICIO: 12/30/23 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/23 — VALOR ACUMULADO: $ 215 361 440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/24 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216 314 958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216 314 958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216 314 958.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 21 640 000.00	10.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 13 550 000.00	6.26%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (8 090 000.00)	-3.74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8 084 042.00	3.74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21 640 000.00	10.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21 634 042.00	10.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 21 634 042.00	10.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10 820 000.00	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171 853 619.43	79.80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169 366 194.80	78.64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO
VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10.00% — Avance o Atraso Físico %: 10.00%
Meta Física Ejecutada %: 10.00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	10.00%			10.00%	
Ejec	10.00%			10.00%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha ya establecieron los proveedores de materiales y se les realizaron los chekes, para los respectivos desembolsos y pagos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En la presente semana, No se ejecutaron actividades, debido que no llegaron materiales, ni heramientas y tampoco equipos. Esto debido a las constantes lluvias que se vienen presentando, ya que han afectado las vias de acceso para vehiculos pesados al lugar de trabajo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el alistamiento y suministro de materiales, herramientas y equipos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

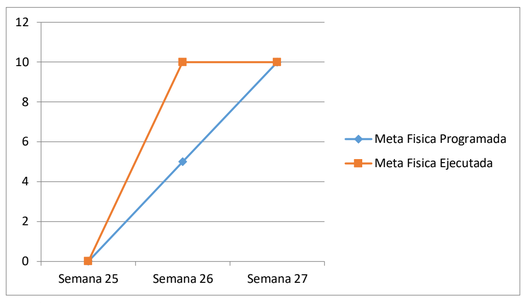

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
verificar y supervisar el alistamiento y suministro de materiales, herramientas y equipos.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 28 del 26-jul al 1-ago (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No. 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216 314 958.00

FECHA DE INICIO: 12/19/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216 314 958.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215 361 440.00

FECHA DE INICIO: 12/30/23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/23 — VALOR ACUMULADO: $ 215 361 440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/24 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216 314 958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216 314 958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216 314 958.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 36 780 000.00	17.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 13 550 000.00	6.26%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (23 230 000.00)	-10.74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8 084 042.00	3.74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 36 780 000.00	17.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21 634 042.00	10.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (15 145 958.00)	-7.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15 140 000.00	7.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 176 687 821.72	82.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 174 476 777.60	81.02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 17.00% — Avance o Atraso Físico %: -7.00%

Meta Física Ejecutada %: 10.00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	17.00%			17.00%	
Ejec	10.00%			10.00%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha ya establecieron los proveedores de materiales y se les realizaron los chekes, para los respectivos desembolsos y pagos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En la presente semana no se logro continuar con las actividades de obra, debido que ha sido muy complicado el ingreso de materiales, debido al mal estado de las vias de acceso a causas de las fuertes y constantes lluvias.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el alistamiento y suministro de materiales, herramientas y equipos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

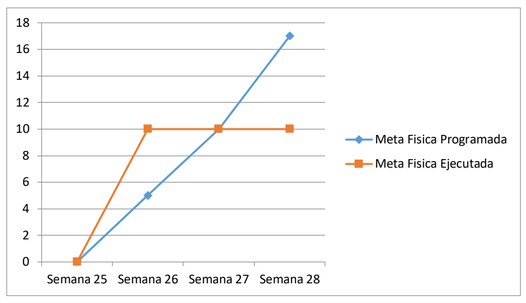

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
verificar y supervisar el alistamiento y suministro de materiales, herramientas y equipos.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 3752 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCAS

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 216.314.958,00

VALOR ACUMULADO: $ 216.314.958,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 43.262.991,60	5	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.815.747,90	5	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 64.894.487,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036852

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009774 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 43.262.991,60	18	1	2024	1	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.815.747,90	18	1	2024	1	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 64.894.487,40	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036852

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009774 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN SUSPENSION Y PRORROGA 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 43.262.991,60	30	4	2024	30	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.815.747,90	30	4	2024	30	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 64.894.487,40	30	7	2024	30	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036852

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/07/2024

FECHA	30 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	30	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009774 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/07/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN SUSPENSION Y PRORROGA 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 43.262.991,60	30	7	2024	30	9	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.815.747,90	30	7	2024	30	9	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 64.894.487,40	30	9	2024	30	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036852

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 3

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	30	9	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009774 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4222 DE 2023 JAC VEREDA SAN FRANCISCO II.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	1 de 1	
		VERSIÓN		
		PÁGINA		

FECHA: 30/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4222 de 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

JUSTIFICACIÓN:
N/A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. ABRIL	VR. MAYO	VR. JUNIO	VR. JULIO	VR. AGOSTO	VR. SEPTIEMBRE	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS ADMINISTRACIÓN - PERSONAL TÉCNICO Y ADTIVO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4 667 514.00	$ 22 991 286.00		$ 27 658 800.00	13.22%
2	COSTOS ADMINISTRACIÓN - SEGURIDAD Y DOTACION	$ 0.00	$ 0.00	$ 1 758 680.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 1 758 680.00	0.84%
3	COSTOS ADMINISTRACIÓN - MEDIDAS AMBIENTALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 813 000.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 813 000.00	0.39%
4	COSTOS ADMINISTRACIÓN - COSTOS BANCARIOS	$ 91 657.00	$ 0.00	$ 483 928.00	$ 0.00	$ 532 791.00		$ 1 116 251.00	0.53%
5	COSTOS ADMINISTRACIÓN - OTROS	$ 4 661 761.00	$ 0.00	$ 3 145 000.00	$ 0.00	$ 2 006 733.00		$ 9 813 494.00	4.69%
6	COSTO DIRECTO OBRA - MATERIALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 62 610 175.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 62 610 175.00	29.93%
7	COSTO DIRECTO OBRA - ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 8 984 000.00	$ 0.00	$ 14 272 001.00		$ 23 256 001.00	11.12%
8	COSTO DIRECTO OBRA - TRANSPORTE	$ 0.00	$ 0.00	$ 41 811 246.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 41 811 246.00	19.99%
9	COSTO DIRECTO OBRA - MANO DE OBRA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 11 484 694.00	$ 23 050 742.00		$ 34 535 436.00	16.51%
10	APORTE AOC	$ 0.00	$ 0.00	$ 1 000 000.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 1 000 000.00	0.48%
11	PAGA (PLAN GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 4 821 168.00	$ 4 821 168.00	2.30%
TOTAL		**$ 4 753 418.00**	**$ 0.00**	**$ 120 606 029.00**	**$ 16 152 208.00**	**$ 62 853 553.00**	**$ 4 821 168.00**	**$ 209 194 251.00**	**100.00%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: **MARTHA YESENIA LESMES CUBIDES**
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma:
Nombre: **DIEGO ALEJANDRO MANRIQUE CORREA**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **70202210658TLM**

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMES SEMANALES
SAN FRANCISCO II

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 24 del 28-jun al 4-jul (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de dos (2) obras de drenaje tipo box coulvert una de 2x2 m y la otra de 2x1.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 208 194 251.00
FECHA DE INICIO: 12/19/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 208 194 251.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/15/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215 361 440.00
FECHA DE INICIO: 12/30/23 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/23 — VALOR ACUMULADO: $ 215 361 440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/24 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208 194 251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208 194 251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208 194 251.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	- $
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	- $
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	- $
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4 661 761.00	2.24%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: La programacion de obra esta en funcion al inicio de obra, por lo cual no es posible calcular el avance o atraso de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 157 351 012.57	73.06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 154 034 446.40	71.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14 493 824.91	6.73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12 835 541.82	5.96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO
VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 2X2 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 2X1 M	UNIDAD	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES: A la fecha no se inician obra por lo tanto se deconoce el estado de permisos y/o licencias ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se encuentran en alistamiento, a espera de transportar materiales a sitio de obra y afiliando personal para ingresos a obra. Cuenta con dificultades por constantes lluvias y vias de acceso en mal estado, Ademas del alto nivel hidrico que se presentan en los puntos en los cuales se construiran los dos (02) Box culvert. Se espera pronto inicio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera que la JAC realice las compras y transporte de los materiales al punto de la obra. Para que de tal forma, se logre dar inicio a las actividades de obra, lo antes posible.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

NO SE REALIZA ESQUEMA GRAFICO YA QUE LA PROGRAMACION ESTA EN FUNCION DEL INICIO DE OBRA POR LO CUAL NO SE PUEDE DETERMINAR AVANCE O ATRASO DE OBRA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Box culvert 1 (2x2)



Box culvert 1 (2x2)



Box culvert 2 (2x1)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Realizar seguimiento al ingreso de materiales y el inicio de obra.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 25 del 5-jul al 11-jul (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de dos (2) obras de drenaje tipo box coulvert una de 2x2 m y la otra de 2x1.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No.	4222 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 208 194 251.00
FECHA DE INICIO:	12/19/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 208 194 251.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/15/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215 361 440.00
FECHA DE INICIO:	12/30/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/23	VALOR ACUMULADO:	$ 215 361 440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	07/30/24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208 194 251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208 194 251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208 194 251.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 10 408 000.00	5.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 7 828 104.00	3.76%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 7 828 104.00	3.76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4 661 761.00	2.24%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10 408 000.00	5.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12 489 865.00	6.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 12 489 865.00	6.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10 408 000.00	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7 828 104.00	3.76%

Observaciones:

4%

7828103.838

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 162 185 214.86	75.31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 159 145 029.20	73.90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 5% — Avance o Atraso Físico % 1%

Meta Física Ejecutada % 6%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 2X2 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 2X1 M	UNIDAD	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	5%				
Ejec	6%				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza la adecuacion de la bodega, se realiza el almacenamiento de los materiales herramientas y equipos. Se inician antividades previas para iniciar obra. Se realiza el vaciado de concreto liviano (solado).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la instalacion del acero figurado.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

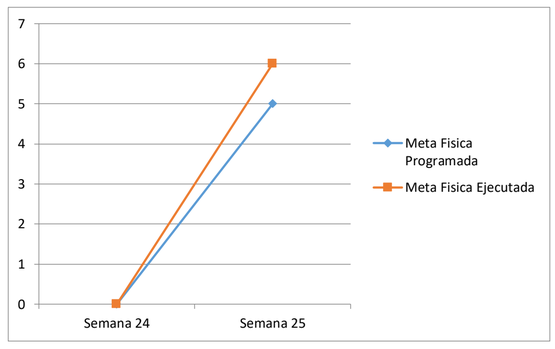

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



concreto liviano para Box culver 2x2



concreto liviano para Box culver 2x2



Ubicación para Box culver 2x2



concreto liviano para Box culver 2x2



Ubicación para Box culver 2x1



Ubicación para Box culver 2x1

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 18/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 26 del 12-jul al 18-jul Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de dos (2) obras de drenaje tipo box coulvert una de 2x2 m y la otra de 2x1.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 VALOR INICIAL: $ 208 194 251.00

FECHA DE INICIO: 12/19/2023 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/2023 VALOR ACUMULADO: $ 208 194 251.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/15/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 VALOR INICIAL: $ 215 361 440.00

FECHA DE INICIO: 12/30/23 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/23 VALOR ACUMULADO: $ 215 361 440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/24 VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208 194 251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208 194 251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208 194 251.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 24 980 000.00	12.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 26 269 000.00	12.62%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 26 269 000.00	12.62%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4 661 761.00	2.24%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 24 980 000.00	12.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 30 930 761.00	14.86%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 30 930 761.00	14.86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14 572 000.00	7.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18 440 896.00	8.86%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 167 019 417.14	77.55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 164 255 612.00	76.27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 12.00% Avance o Atraso Físico % 2.86%

Meta Física Ejecutada % 14.86%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 2X2 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 2X1 M	UNIDAD	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	12.00%				
Ejec	14.86%				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza bombeo hidraulico, con el fin de despejar o disminuir el nivel del agua ya que se encuentra demaciado alto y genera retrasos en el desarrollo de actividades. Se Realiza el alistamiento y figurado del acero, para el Box culver de 2x2.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la respectiva instalacion del acero, y realizar el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para la placa inferior del Box Culvert.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

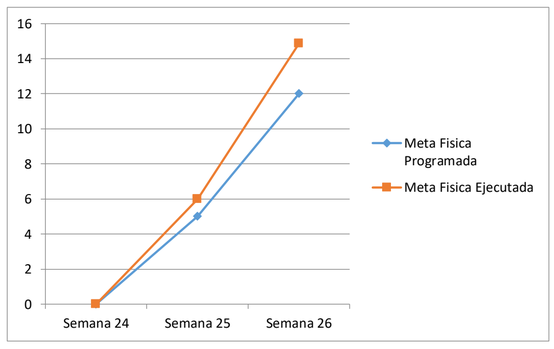

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ubicación para Box culver 2x1



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Ubicación para Box culver 2x1

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar seguimiento a la programacion de obra. Y verificar el figurado y la correcta instalacion del acero.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 27 (Numeración consecutiva) del 19-jul al 25-jul — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de dos (2) obras de drenaje tipo box coulvert una de 2x2 m y la otra de 2x1.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 208 194 251.00

FECHA DE INICIO: 12/19/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 208 194 251.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/15/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215 361 440.00

FECHA DE INICIO: 12/30/23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/23 — VALOR ACUMULADO: $ 215 361 440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/24 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208 194 251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208 194 251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208 194 251.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 35 390 000.00	17.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 33 355 000.00	16.02%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 33 355 000.00	16.02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4 661 761.00	2.24%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 35 390 000.00	17.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 38 016 761.00	18.26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 38 016 761.00	18.26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10 410 000.00	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7 086 000.00	3.40%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171 853 619.43	79.80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169 366 194.80	78.64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 17.00% — Avance o Atraso Físico %: 1.26%

Meta Física Ejecutada %: 18.26%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 2X2 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 2X1 M	UNIDAD	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	17.00%				
Ejec	18.26%				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza la instalacion del acero figurado para el Boxculvert 2x2 y se realiza el vaciado de concreto reforzado 21Mpa para la placa inferior del Box culvert de 2x2.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la instalacion de la formaleta, para vaciar el concreto del Box culvert 2x2.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

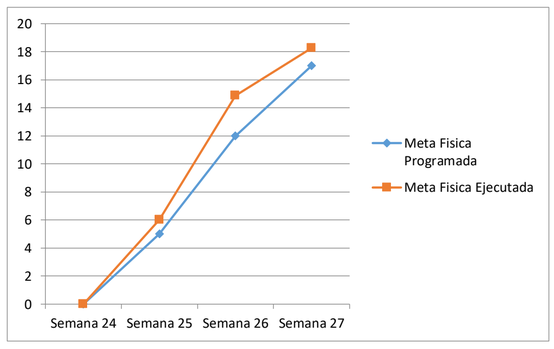

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalacion de acero Box Culvert 2x2



Instalacion de acero Box Culvert 2x2



Placa inferior Box Culvert 2x2



Instalacion de acero Box Culvert 2x2



Instalacion de acero Box Culvert 2x1



Instalacion de acero Box Culvert 2x1

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar seguimiento a la programacion de obra. Y verificar la correcta instalacion del acero.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 28 del 26-jul al 1-ago (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de dos (2) obras de drenaje tipo box coulvert una de 2x2 m y la otra de 2x1.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 208 194 251.00

FECHA DE INICIO: 12/19/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 208 194 251.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/15/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215 361 440.00

FECHA DE INICIO: 12/30/23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/23 — VALOR ACUMULADO: $ 215 361 440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/30/24 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208 194 251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208 194 251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215 361 440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215 361 440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208 194 251.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 81 200 000.00	39.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 94 310 000.00	45.30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 94 310 000.00	45.30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4 661 761.00	2.24%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81 200 000.00	39.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98 971 761.00	47.54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 98 971 761.00	47.54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45 810 000.00	22.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 60 955 000.00	29.28%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 176 687 821.72	82.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 174 476 777.60	81.02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4 834 202.29	2.24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5 110 582.80	2.37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO -MARZO

VALOR FACTURA: $ 53 774 910.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó factura del mes de febrero y marzo, en espera de pago, Además se radicó cuenta de Abril y Mayo en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 39.00% — Avance o Atraso Físico %: 8.54%

Meta Física Ejecutada %: 47.54%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 2X2 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 2X1 M	UNIDAD	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	39.00%				
Ejec	47.54%				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza la instalacion del acero figurado para el Box culvert 2x1 y se realiza el encofrado o instalacion de formaleta para el Box Culvert 2x2.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar el vaciado de concreto para el box culvert 2x2.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

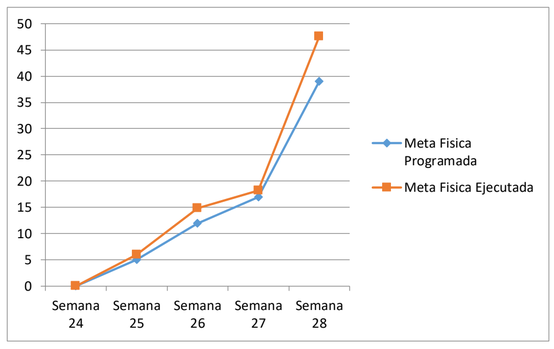

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalacion de acero Box Culvert 2x1



Instalacion de acero Box Culvert 2x1




Instalacion de acero Box Culvert 2x1



Instalacion de Formaleta Box Culvert 2x2



Instalacion de Formaleta Box Culvert 2x2

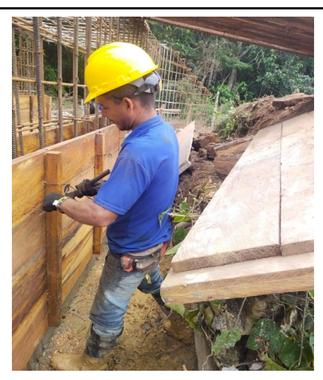

Instalacion de Formaleta Box Culvert 2x2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar seguimiento a la programacion de obra. Y revisar la instalacion de la formaleta.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4222 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JULIO																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Retro excavadora	CAT	110 hp	SAN FRANCISCO II																															
Mezcladora	FORTE	2 BLTO	SAN FRANCISCO II																															
Planta electrica	FORTE	2500 w	SAN FRANCISCO II																															
Motobomba	FORTE	16hp	SAN FRANCISCO II																															
Vibrador de Concreto		2,4hp	SAN FRANCISCO II																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO											0	4	3	3	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	3	3	3
TOTAL ACTIVO											0	4	3	3	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	3	3	3
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	65%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	5	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Diego Alejando Manrique Correa
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-423868 CND

Firma

Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 4222 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS, NIT: 901.107.641-0

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA COMCAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	José Miguel Diaz Herrera	17340712	Mestro de Obra	$ 2 320 000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	2165334	$ 150 800	V	NUEVA EPS	9471099092	$ 270 700	COLPENSIONES	9471099092	$ 346 500	$ 86 700	$ 43 400	$ 65 000	
2	Freddy Norberto Buitrago Alvarado	1122237066	Ayudante de Obra	$ 1 300 000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	1213334	$ 84 500	V	NUEVA EPS	9471099092	$ 151 700	PROTECCION	9471099092	$ 194 200	$ 48 600	$ 24 300	$ 36 500	
3	Willinton Andrés Ramos Zuluaga	1006827591	Ayudante de Obra	$ 1 300 000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	1213334	$ 84 500	V	CAJACOPI	9471099092	$ 151 700	PROTECCION	9471099092	$ 194 200	$ 48 600	$ 24 300	$ 36 500	
4	Alex Buitrago Forero	1006783101	Ayudante de Obra	$ 1 300 000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	1213334	$ 84 500	V	NUEVA EPS	9471099092	$ 151 700	PORVENIR	9471099092	$ 194 200	$ 48 600	$ 24 300	$ 36 500	
5	Eider Adrián Monroy Vanegas	1006700479	Ayudante de Obra	$ 1 300 000																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	650000	$ 45 300	V	NUEVA EPS	9471099092	$ 81 300	PORVENIR	9471099092	$ 104 000	$ 26 000	$ 13 000	$ 19 500	
6	Diego Alejandro Manrique Correa	1121942161	Ingeniero Residente de Obra	$ 3 062 500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INGENIERO	1300000	$ 90 500	V	-	9470520092	-	-	-	-	-	-	-	Se presenta seguridad social de Junio y Julio

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **DIEGO ALEJANDRO MANRIQUE CORREA**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: **70202210658TLM**

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: **GABRIEL HERNAN VELAZQUEZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 4222 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRNACISCO DOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-30 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco									■																			■		■		3
Lluvias moderadas										■	■							■	■	■							■		■			7
Lluvias intensas												■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■						12
Total horas	24	24	4	8	5	2	8	6	10	4	12	12	24	8	10	24	24	24	12	6	12	8	12	12	8	24	12	24	8	12		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Durante el mes de mayo se presentaron fuertes lluvias las cuales generaron complicaciones en obra, se presentaron grandes perdidas de material petreo, debido a la escorrentia de agua, afectaciones durante las actividades de concretos.

Firma
Nombre: DIEGO ALEJANDRO MANRIQUE CORREA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-423868 CND

Firma
Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 4222 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO II

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 208.194.251,00

VALOR ACUMULADO: $ 208.194.251,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.838.850,20	3	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.459.712,55	3	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.758.275,30	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037313

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009895 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/12/2023

FECHA: 30 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.838.850,20	30	12	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.459.712,55	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.758.275,30	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037313

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	11	2023	17	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009895 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/04/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.838.850,20	18	4	2024	15	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.459.712,55	18	4	2024	15	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.758.275,30	15	7	2024	15	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037313

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	11	2023	15	8	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009895 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: julio-24 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 3613-2023, No. 4143-2023, No. 4240-2023, No. 3752-2023, No. 4222-2023 **CONTRATISTA:** OAC VEREDA CAÑO BONITO, OAC VEREDA CERRRITOS, OAC VEREDA EL RECREO, OAC VEREDA SAN LUCAS Y OAC VEREDA SAN FRANCISCO II

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COFREM / COMCAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	GABRIEL HERNAN VELAZQUEZ PANTOJA	1.121.867.534	Director de Interventoria	$ 3.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 3.300.000	$ 229.680	V	SALUD TOTAL SA	30405545	$ 132.000	PORVENIR	30405545	$ 528.000	$ 132.000	$ -	$ -	
2	WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ	1.121.930.514	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 4.800.000	$ 334.080	V	NUEVA EPS	30405545	$ 192.000	PORVENIR	30405545	$ 768.000	$ 192.000	$ -	$ -	
3	ANGELICA MARIA SEGURA GARZON	1.121.850.008	Profesional Social	$ 1.050.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	30%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 1.050.000	$ 73.080	V	NUEVA EPS	30129911	$ 42.000	PORVENIR	30129911	$ 168.000	$ 42.000	$ -	$ -	Retiro el 23/08/2024
4	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	1.152.186.533	Profesional Ambiental	$ 2.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	60%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 2.100.000	$ 146.160	V	NUEVA EPS	30405222	$ 84.000	PROTECCION	30405222	$ 336.000	$ 84.000	$ -	$ -	
5	KAREN VALENTINA CARDENAS MONTENEGRO	1.233.894.313	Profesional Social	$ 1.050.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	30%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 1.050.000	$ 73.080	V	NUEVA EPS	30405223	$ 42.000	PROTECCION	30405223	$ 168.000	$ 42.000	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 12.300.000**																

El Interventor adiunta la certificación de fecha 31/08/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**

Representante Legal o su Apoderado

Interventoría: **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**

Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma

Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: **25202-250038 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUA JULIO 2024

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023

CONVENIOS No. 3613-2023, 4143-2023, 4240-2023, 3752-2023, 4222-2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

CONTRATISTA: JAC CAÑO BONITO, CERRITOS, EL RECREO, SAN LUCAS, SAN FRANCISDO II

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES DE JUNIO																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VEHICULO	NISSAN FRONTIER - 2488 CC - JCR132	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IMPRESORA	EPSON L3210	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DOTACIÓN DE OFICINA	ESCRITORIO (1), MESA, SILLA (5)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CUELLO LOPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 5202-250038 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 20/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

MES INFORME MENSUAL: julio-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO No. 3613-2023, No. 4143-2023, No. 4240-2023, No. 3752-2023, No. 4222-2023

CONTRATISTA: OAC VEREDA CAÑO BONITO
OAC VEREDA CERRRITOS
OAC VEREDA EL RECREO
OAC VEREDA SAN LUCAS
OAC VEREDA SAN FRANCISCO II

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1448323	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 4.307.229,00	$ -
		C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 211.054.211,00	$ 52.726.710
2024	72924	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	ADICIONAL	$ 72.490.040,00	$ 72.490.040
TOTAL						**$ 287.851.480,00**	**$ 125.216.750**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 287.851.480**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	23/01/2024 al 31/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1448323 DEL 29/12/2023	$ 215.361.440	$ 287.851.480		
2	01/02/2024 al 29/02/2024	$ 20.066.000	$ 3.812.540	$ 23.878.540,00	$ -	$ 23.878.540	$ -	1448323 DEL 29/12/2023	$ 191.482.900	$ 191.482.900		
3	01/03/2024 al 31/03/2024	$ 25.123.000	$ 4.773.370	$ 29.896.370,00		$ 29.896.370		1448323 DEL 29/12/2023	$ 161.586.530	$ 161.586.530		
4	01/04/2024 al 30/04/2024	$ 25.156.000	$ 4.779.640	$ 29.935.640,00		$ 29.935.640		1448323 DEL 29/12/2023	$ 131.650.890	$ 131.650.890		
5	01/05/2024 al 31/05/2024	$ 34.111.840	$ 6.481.250	$ 40.593.089,60		$ 40.593.090,60		1448323 DEL 29/12/2023	$ 91.057.800	$ 91.057.800		
6	01/06/2024 al 30/06/2025	$ 32.211.000	$ 6.120.090	$ 38.331.090,00		$ 38.331.090		1448323 DEL 29/12/2023	$ 52.726.710	$ 125.216.750		
7	01/07/2024 al 31/07/2024	$ 35.095.000	$ 6.668.050	$ 41.763.050,00		$ 41.763.050		1448323 DEL 29/12/2023	$ 10.963.660	$ 83.453.700		
TOTALES		**$ 171.762.840**	**$ 32.634.940**	**$ 204.397.779,60**	**$ -**	**$ 204.397.780,60**	**$ -**		**$ 10.963.660,40**	**$ 83.453.700,40**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL	$ 171.762.840	$ 32.634.940,60	$ 204.397.780,60

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma:

Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-250038 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 215.361.440,00

VALOR ACUMULADO: $ 287.851.480,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	22	12	2023	1	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20,00%	43.072.288,00	22	12	2023	1	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	22	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ORDEN DE INICIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	9	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	8	1	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 1, 2 y 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN SUSPENSIÓN 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	2	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	1	2	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	2	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	1	4	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	7	11	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	7	5	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	8	12	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	7	6	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 4

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	23	12	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	22	6	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 5 Y ADICIÓN

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	28.785.148,00	30	12	2023	6	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	57.570.296,00	30	12	2023	6	8	2027
Calidad del servicio	30,00%	86.355.444,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 9 - 10
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 6

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	28.785.148,00	30	12	2023	9	4	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	57.570.296,00	30	12	2023	7	10	2027
Calidad del servicio	30,00%	86.355.444,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No. 25202 - 62095 CND

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202 - 250038 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	22/07/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ **No.** 6
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

RESOLUCIÓN No.: 4636 DE 18/12/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: Convenios solidarios 3613-23, 3752-23, 4240-23, 3613-23, 4222-23. CONTRATISTA: OAC CAÑO BONITO, OAC SAN LUCAS, OAC EL RECREO, OAC CERRITOS Y OAC SAN FRANCISCO DOS

PLAZO INICIAL: hasta 31 de diciembre de 2024 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: hasta 30 de julio de 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 215.361.440,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 72.490.040,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 287.851.480,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 4/06/2024		2024																		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 6.600.000,00		1,00	$ 6.600.000			2,400	$ 15.840.000	0,50	$ 3.300.000	0,50	$ 3.300.000	0,50	$ 3.300.000	0,50	$ 3.300.000	0,50	$ 3.300.000	0,50	$ 3.300.000	0,21	$ 1.386.000	0,21	$ 1.386.000		$ -		$ -	3,42	$ 22.572.000
	1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 4.800.000,00		2,00	$ 9.600.000			5,500	$ 26.400.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000		$ -		$ -	8,00	$ 38.400.000
	1	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000			1,920	$ 6.720.000		$ -		$ -		$ -		$ -	0,30	$ 1.050.000	0,50	$ 1.750.000	0,60	$ 2.100.000	0,50	$ 1.750.000	0,50	$ 1.750.000		$ -		$ -	2,40	$ 8.400.000
	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000			1,930	$ 6.755.000		$ -		$ -		$ -		$ -	0,30	$ 1.050.000	0,60	$ 2.100.000	0,50	$ 1.750.000	0,50	$ 1.750.000		$ -		$ -	1,90	$ 6.650.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				**$ 5.000.000**			1,000	$ 5.000.000		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 2.500.000	0,50	$ 2.500.000									1,000	$ 5.000.000
		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VIAS	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPCIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN DISEÑOS GEOMÉTRICO	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO																												
	1	INSPECTOR	$ 1.800.000,00		9,00	$ 16.200.000			7,000	$ 12.600.000		$ -		$ -		$ -	1,30	$ 2.340.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,30	$ 2.340.000
	1	INSPECTOR SST	$ 1.900.000,00		4,00	$ 7.600.000			2,500	$ 4.750.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																												
	1	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000			2,500	$ 3.250.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 61.600.000**				**$ 81.315.000**	**$**	**8.100.000,00**	**$**	**8.100.000,00**	**$**	**8.100.000,00**	**$**	**11.490.000,00**	**$**	**13.400.000,00**	**$**	**14.800.000,00**	**$**	**9.686.000,00**	**$**	**9.686.000,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**83.362.000**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**				**$ 2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 145.376.000**				**$ 191.903.400**	**$**	**19.116.000,0**	**$**	**19.116.000,0**	**$**	**19.116.000,0**	**$**	**27.116.400,0**	**$**	**31.624.000,0**	**$**	**34.928.000,0**	**$**	**22.858.960,0**	**$**	**22.858.960,0**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**196.734.320**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO																		TOTAL	
											FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIÁTICOS																												
		VIATICOS DIRECTOR Y/ ESPECIALISTAS	$ 210.000,00	DÍA	10,00	$ 2.100.000			5,00	1050000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
		VEHÍCULO TIPO CAMPERO O CAMIONETA (INCLUYE PEAJES, CONDUCTOR Y COMBUSTIBLES) Y CUYO MODELO SEA HASTA DIEZ (10) AÑOS ANTERIORES AL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	$ 5.000.000,00	MES	2,00	$ 10.000.000			4,50	$ 22.500.000,00		$ -	1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000		$ -		$ -	7,00	$ 35.000.000
		MOTOCICLETAS (150 CC O MAYOR, MODELO 2014 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT)	$ 600.000,00	MES	13,00	$ 7.800.000			9,50	$ 5.700.000,00		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 1.200.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 1.200.000
		TRABAJO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE PERSONAL EQUIPO Y TRANSPORTE)	$ 6.000.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	1,50	$ 9.000.000			1,51	$ 9.060.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 600.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 1.200.000			2,10	$ 1.260.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,70	$ 420.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,70	$ 420.000
		OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PUBLICOS)	$ 800.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 1.600.000			6,00	$ 4.800.000,00	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000		$ -		$ -	8,00	$ 6.400.000
		OTROS COSTOS																												
		TRANSPORTES AÉREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLES)	$ 1.200.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 2.400.000			2,00	$ 2.400.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.	$ 300.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 600.000			3,00	$ 900.000,00	0,500	$ 150.000	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 150.000
		COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC)	$ 300.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 600.000			5,02	$ 1.506.000,00		$ -	0,69	$ 207.000	0,80	$ 240.000	0,90	$ 270.000	1,00	$ 300.000	1,10	$ 330.000	1,10	$ 330.000	1,00	$ 300.000		$ -		$ -	6,59	$ 1.977.000
		VEEDURÍA TÉCNICA COMUNITARIA	$ 150.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 300.000			3,00	$ 450.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								$ 362.600,00																$ 10.680				$ 10.680
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 35.600.000**				**$ 49.988.600**	**$**	**950.000**	**$**	**6.007.000**	**$**	**6.040.000**	**$**	**7.270.000**	**$**	**6.520.000**	**$**	**6.130.000**	**$**	**6.130.000**	**$**	**6.110.680**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**45.157.680**
	*	SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS				**$ 180.976.000**				**$ 241.892.000**	**$**	**20.066.000**	**$**	**25.123.000**	**$**	**25.156.000**	**$**	**34.386.400**	**$**	**38.144.000**	**$**	**41.058.000**	**$**	**28.988.960**	**$**	**28.969.640**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**241.892.000**
	*	IVA = 19%				**$ 34.385.440**				**$ 45.959.480**	**$**	**3.812.540**	**$**	**4.773.370**	**$**	**4.779.640**	**$**	**6.533.416**	**$**	**7.247.360**	**$**	**7.801.020**	**$**	**5.507.902**	**$**	**5.504.232**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**45.959.480,00**
	*	COSTO TOTAL				**$ 215.361.440**				**$ 287.851.480**	**$**	**23.878.540**	**$**	**29.896.370**	**$**	**29.935.640**	**$**	**40.919.816**	**$**	**45.391.360**	**$**	**48.859.020**	**$**	**34.496.862**	**$**	**34.473.872**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**287.851.480,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
DE CONFORMIDAD CON EL ESTADO ACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA, SE REQUIERE DAR CONTINUIDAD AL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LOS CINCO (5) CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS Y EN EJECUCIÓN A CARGO DE ÉSTA, PARA LO CUAL SE HACE NECESARIO E INDISPENSABLE CONTAR TANTO CON LA ESTRUCTURA DE PERSONAL COMO DE LOGÍSTICA ADECUADA POR PARTE DE DICHA INTERVENTORÍA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA ADECUADA SUPERVISIÓN, CONTROL, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL Y FINANCIERO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DE LA MISMA ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma:
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
