FORMATO INSTALACIÓN EQUIPO - UPS BIFÁSICA Y TRIFÁSICA

OFICINA	**Bloque Corporación Corte Constitucional**						**TIPO DE EQUIPO:**	**UPS**	**KEOR-T 80 KVA**			**UBICACIÓN:**	**Décimo Piso**						
FECHA:	24-ago.-24								**DIRECTOR**	Armando Hurtado									
CIUDAD	Bogotá																		
DEPARTAMENTO	Cundinamarca																		
DIRECCIÓN	Carrera 12 con Calle 8																		
2. DATOS EQUIPO UPS INSTALADO																			
MARCA	**LEGRAND**	**MODELO**	**KEOR-T**	**CAPACIDAD (KVA)**	**80**	**NÚMERO DE FASES**	3	**SERIE**	**2105W0719002**	**AIRE ACONDICIONADO**	SI	**TEMPERATURA AMBIENTE (°C)**	22						
ÁREA DE UBICACION DEL EQUIPO EN LA SEDE:																			

3.ESTADO DE CONEXIONES UPS (Check List)

ITEM	SI	NO	ITEM	SI	NO	ITEM	SI	NO
El equipo esta en un cuarto tecnico	X		Conexiones de entrada firmes	X		Conexiones de baterias firmes	X	
Accesibilidad al equipo buena	X		Conexiones de salida firmes	X		conexión de tierra	X	
Estado de la carcasa bueno	X		Equipo en gestión		X	Conexión del patch cord		X
Alarmas activas		X	Conductores en buen estado	X		Cantidad bancos de baterias externas	1	

4. INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES

1. CONDUCTORES DE ENTRADA		Número de fases:		3			**2. CONDUCTORES DE SALIDA**	Número de fases:			3						
CALIBRE CONDUCTORES (AWG o KCMIL)	**Fases**	1/0 AWG	**Neutro**	1/0 AWG	**Tierra**	6 AWG	**CALIBRE CONDUCTORES (AWG o KCMIL)**		**Fases**	1/0 AWG	**Neutro**	1/0 AWG	**Tierra**	6 AWG		
COLOR DE MARQUILLADO DE LOS CONDUCTORES DE FASE:	**Ø A**	ROJO	**Ø B**	CAFÉ	**Ø C**	AMARILLO	**COLOR DE MARQUILLADO DE LOS CONDUCTORES DE FASE:**		**Ø A**	ROJO	**Ø B**	CAFÉ	**Ø C**	AMARILLO		
CANALIZACION Y DIMENSIONES	NINGUNA			**LONGITUD**	3 Mts.		**CANALIZACION Y DIMENSIONES**	NINGUNA			**LONGITUD**	3 Mts.				
OBSERVACIONES CONDUCTORES DE EQUIPOS:	CONDICIONES NORMALES															

5. INDIQUE CON UNA (X) QUE ALIMENTA LA UPS

PDU		**TABLERO REGULADO**		X		**MULTITOMA**			**RACK DIRECTAMENTE**		**OTRO**			**CUAL**					

6. TABLERO DE ENTRADA A LA UPS

BREAKER ENTRADA UPS	**SI**	**NO**	SI	**MONOFÁSICO, BIFÁSICO, TRIFÁSICO**		TRIFASICO	**MARCA:**	SCHNEIDER ELECTRIC	**CAPACIDAD (A):**			400	**CAPACIDAD DE CORTO CIRCUITO (KA):**				70		
DPS ENTRADA	**SI**	**NO**	NO	**MARCA**		N/A			**REFERENCIA**			N/A							

7. TABLERO DE SALIDA A LA UPS

BREAKER SALIDA UPS	**SI**	**NO**	SI	**MONOFÁSICO, BIFÁSICO, TRIFÁSICO**		TRIFASICO	**MARCA:**	SCHNEIDER ELECTRIC	**CAPACIDAD (A):**			400	**CAPACIDAD DE CORTO CIRCUITO (KA):**				70		
DPS SALIDA	**SI**	**NO**	NO	**MARCA**		N/A			**REFERENCIA**			N/A							

8. ESPACIOS REQUERIDOS PARA LA UPS

Distancia libre al lado izquierdo igual o mayor a 75 cm:		**SI**		**NO**	X	**Distancia libre al lado derecho igual o mayor a 75 cm:**			**SI**		**NO**	X							
Distancia libre al frente igual o mayor a 90 cm:		**SI**	X	**NO**		**La puerta del tablero abre a 90°:**			**SI**	X	**NO**								
OBSERVACIONES DE LAS DISTANCIAS Y ESPACIOS																			
TARJETA SNMP	NO	**MARCA**		N/A		**NUMERO DE SERIE SNMP**			N/A										

9. PARAMETROS DE ENTRADA

Tensión de Entrada F-F (VAC):	**Ø A-B:**	405.3	**Ø B-C:**	403.6	**Ø A-C:**	406.3	**MEDIDA DE CORRIENTE ENTRADA (AAC)**	**FASE A:**	18.0	**FASE B:**	18.3	**FASE C:**	18.3	**NEUTRO:**	3.2	**TIERRA:**	0.0		
Tensión de Entrada F-N (VAC):	**Ø A-N:**	234.7	**Ø B-N:**	233.2	**Ø C-N:**	233.2	**MEDIDA DE CORRIENTE SALIDA (AAC)**	**FASE A:**	1.0	**FASE B:**	2.1	**FASE C:**	1.2	**NEUTRO:**	0.0	**TIERRA:**	1.0		
Tensión entre Neutro y Tierra Entrada (V):	0.0																		

10. PARAMETROS DE SALIDA

Tensión de Salida F-F (VAC):	**Ø A-B:**	400.2	**Ø B-C:**	400.3	**Ø A-C:**	399.9	**Tensión entre Neutro y Tierra Salida (VAC):**			0.0									
Tensión de Salida F-N (VAC):	**Ø A-N:**	230.8	**Ø B-N:**	230.9	**Ø C-N:**	230.9	**¿Las lecturas corresponden con la del panel?**			**SI**		X		**NO**					

10. PRUEBAS EN SITIO UPS

1. CON EL UPS ENCENDIDO Y LA CARGA DESCONECTADA:

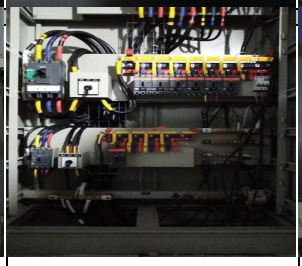
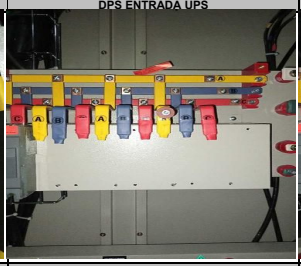
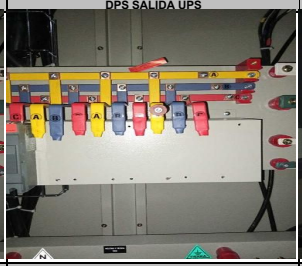
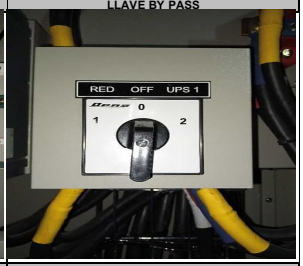
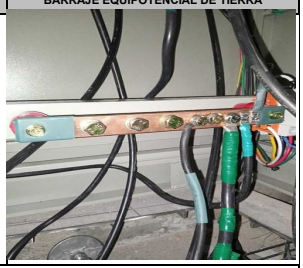
Tensión de Salida F-F (VAC):	**Ø A-B**	400.2	**Ø B-C**	400.3	**Ø A-C**	399.9	**CONDICION**	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
Tensión de Salida F-N (VAC):	**Ø A-N**	230.9	**Ø B-N:**	230.9	**Ø C-N:**	230.9	**Funcionamiento Normal**	X		LA UPS FUNCIONA NORMAL, NO HAY CARGA DISPONIBLE PARA REALIZAR PRUEBAS
Tensión de Neutro a Tierra (VAC):	0.0						**Apagado**	X		
¿Corresponde la lectura al panel?	**SI**		**NO**				**Encendido**	X		

2. TENSIÓN TOTAL EN BANCO INTERNO DE BATERIAS		**3. TENSIÓN TOTAL EN BANCO EXTERNO DE BATERIAS**	**787 VDC**
OBSERVACIONES:			

DATOS DEL TÉCNICO

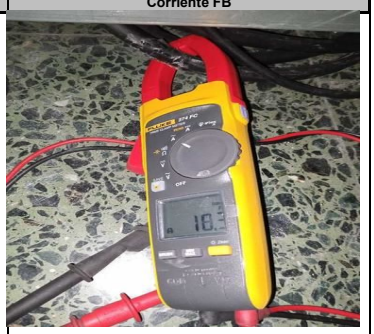
Nombre	Nelson Alexander Olaya Rivera
Cédula	11347655 de Zipaquirá
Celular	3046092186

REGISTRO FOTOGRÁFICO UPS

FOTO PANORAMICA DEL CUARTO DONDE ESTA UBICADA LA UPS	FOTO FRONTAL DE LA UPS	FOTO POSTERIOR	FOTO SUPERIOR
			
FOTO COSTADO IZQUIERDO	**FOTO COSTADO DERECHO**	**FOTO NUMERO SERIE UPS**	**FOTO AIRE ACONDICIONADO**
			
			
BREAKER SALIDA UPS	**DPS ENTRADA UPS**	**DPS SALIDA UPS**	**LLAVE BY PASS**
			
CANALIZACIÓN ENTRADA	**CANALIZACIÓN SALIDA**	**DIAGRAMA UNIFILAR**	**BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE TIERRA**
		**N/D**	

Observaciones:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MEDICIONES ENTRADA UPS

TIPO DE ALIMENTACIÓN	TRIFÁSICA	
FA-N	FB-N	FC-N
		
FA-FB	FB-FC	FC-FA
		
N-T	Corriente FA	Corriente FB
		
Corriente FC	Corriente N	Corriente T
		

MEDIDAS ELÉCTRICAS

TIPO DE ALIMENTACIÓN		TRIFÁSICA			
MEDICIONES DE TENSIÓN		MEDICIONES DE CORRIENTE		CALIBRE DE ACOMETIDAS	
FASE A - NEUTRO (VAC)	234.7	FASE A (AAC)	18.0	CALIBRE FASE A	1/0 AWG
FASE B - NEUTRO (VAC)	233.2	FASE B (AAC)	18.3	CALIBRE FASE B	1/0 AWG
FASE C - NEUTRO (VAC)	233.2	FASE C (AAC)	18.3	CALIBRE FASE C	1/0 AWG
FASE A - FASE B (VAC)	405.3	NEUTRO (AAC)	3.2	CALIBRE NEUTRO	1/0 AWG
FASE B - FASE C (VAC)	403.6	TIERRA (AAC)	0.0	CALIBRE TIERRA	6 AWG
FASE A - FASE C (VAC)	406.3	FRECUENCIA (Hz)	60		
NEUTRO - TIERRA (VAC)	0.0				

Observaciones:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MEDICIONES SALIDA Y AUTONOMÍA DE UPS

TIPO DE ALIMENTACION	TRIFÁSICA	
FA-N	FB-N	FC-N
		
FA-FB	FB-FC	FC-FA
		
N-T	Corriente FA	Corriente FB
		
Corriente FC	Corriente N	Corriente T
		
TENSIÓN TOTAL EN BANCO INTERNO DE BATERIAS	TENSIÓN TOTAL EN BANCO EXTERNO DE BATERIAS	
	NO APLICA	NO APLICA

MEDIDAS ELÉCTRICAS

TIPO DE ALIMENTACION		TRIFÁSICA			
MEDICIONES DE TENSIÓN		MEDICIONES DE CORRIENTE		CALIBRE DE ACOMETIDAS	
FASE A - NEUTRO (VAC)	230.8	FASE A (AAC)	1.0	CALIBRE FASE A	1/0 AWG
FASE B - NEUTRO (VAC)	230.9	FASE B (AAC)	2.1	CALIBRE FASE B	1/0 AWG
FASE C - NEUTRO (VAC)	230.9	FASE C (AAC)	1.2	CALIBRE FASE C	1/0 AWG
FASE A - FASE B (VAC)	400.2	NEUTRO (AAC)	0.0	CALIBRE NEUTRO	1/0 AWG
FASE B - FASE C (VAC)	400.3	TIERRA (AAC)	1.0	CALIBRE TIERRA	6 AWG
FASE A - FASE C (VAC)	399.9	FRECUENCIA (Hz)	60		
NEUTRO - TIERRA (VAC)	0.0				

Observaciones:
