DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA
Asesoría integral en confort

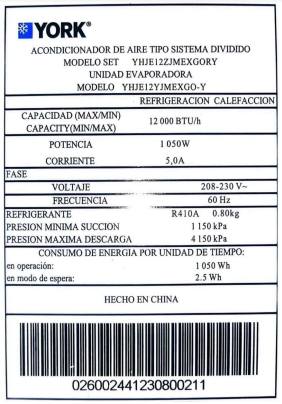
COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	20/3/2024	**CIUDAD**	**ZIPAQUIRA**
SECCIONAL	**CUNDINAMARCA**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN X**	**DESINTALACIÓN**	**MANTENIMIENTO**

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. -se instala la conexiones de las tuberias. --se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA		Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.	
	BTU	12000 X	18000 24000
	SERIE CONDENSADORA	026002441230800211	
	SERIE MANEJADORA	026001441230800089	

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO		Minutos		INDICADOR MANOMETRO			PSI		
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**			N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**			N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	**Bien**			N/A

TECNICO	Diego Avila	ENCARGADO	Jaime

		
IMAGEN 1. Zipaquirá	IMAGEN 2.Zipaquirá	IMAGEN 3. Zipaquirá
		
IMAGEN 4. Zipaquirá		
