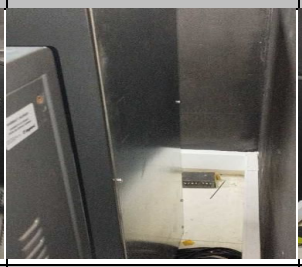
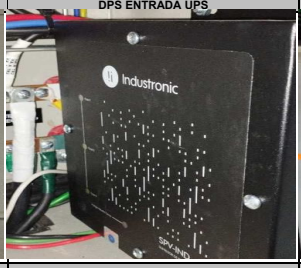
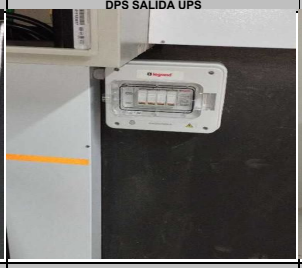
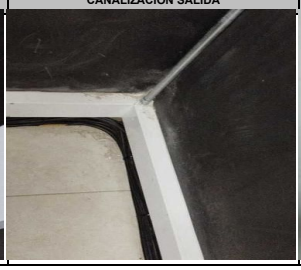
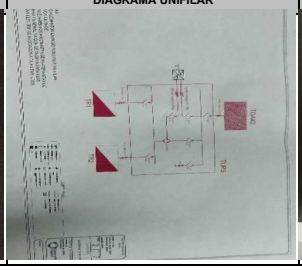
FORMATO INSTALACIÓN EQUIPO - UPS BIFÁSICA Y TRIFÁSICA





OFICINA	**Tumaco**							**TIPO DE EQUIPO:**	**UPS**	**FORTE 33050 50 KVA**				**UBICACIÓN:**	**Primer Piso**								
FECHA:	26-jul.-24									**DIRECTOR**	Jimmy Tovar												
CIUDAD	Tumaco																						
DEPARTAMENTO	Nariño																						
DIRECCIÓN	Palacio de Justicia Calle Mosquera																						
2. DATOS EQUIPO UPS INSTALADO																							
MARCA	**LEGRAND**		**MODELO**		**FORTE 33050**		**CAPACIDAD (KVA)**	**50**	**NÚMERO DE FASES**	3		**SERIE**	**2402W0051001**		**AIRE ACONDICIONADO**	SI		**TEMPERATURA AMBIENTE (°C)**	22				
ÁREA DE UBICACION DEL EQUIPO EN LA SEDE:																							
3.ESTADO DE CONEXIONES UPS (Check List)																							
ITEM	**SI**	**NO**	**ITEM**	**SI**	**NO**	**ITEM**	**SI**	**NO**															
El equipo esta en un cuarto tecnico	X		Conexiones de entrada firmes	X		Conexiones de baterias firmes	X																
Accesibilidad al equipo buena	X		Conexiones de salida firmes	X		conexión de tierra	X																
Estado de la carcasa bueno	X		Equipo en gestión		X	Conexión del patch cord		X															
Alarmas activas		X	Conductores en buen estado	X		Cantidad bancos de baterias externas	1																
4. INSPECCION DE LAS INSTALACIONES																							
1. CONDUCTORES DE ENTRADA	Número de fases:	3	**2. CONDUCTORES DE SALIDA**	Número de fases:	3																		
CALIBRE CONDUCTORES (AWG o KCMIL)	**Fases**	1/0	**Neutro**	1/0	**Tierra**	4	**CALIBRE CONDUCTORES (AWG o KCMIL)**	**Fases**	1/0	**Neutro**	1/0	**Tierra**	4										
COLOR DE MARQUILLADO DE LOS CONDUCTORES DE FASE:	**Ø A**	AMARILLO	**Ø B**	AZUL	**Ø C**	ROJO	**COLOR DE MARQUILLADO DE LOS CONDUCTORES DE FASE:**	**Ø A**	AMARILLO	**Ø B**	AZUL	**Ø C**	ROJO										
CANALIZACION Y DIMENSIONES	CANALETA METÁLICA		**LONGITUD**	8 Mts.			**CANALIZACION Y DIMENSIONES**	CANALETA METÁLICA		**LONGITUD**	8 Mts.												
OBSERVACIONES CONDUCTORES DE EQUIPOS:																							
5. INDIQUE CON UNA (X) QUE ALIMENTA LA UPS																							
PDU		**TABLERO REGULADO**	X	**MULTITOMA**			**RACK DIRECTAMENTE**		**OTRO**		**CUAL**												
6. TABLERO DE ENTRADA A LA UPS																							
BREAKER ENTRADA UPS	**SI**	**NO**	SI	**MONOFÁSICO, BIFÁSICO, TRIFÁSICO**	TRIFASICO	**MARCA:**	METASOL	**CAPACIDAD (A):**	150	**CAPACIDAD DE CORTO CIRCUITO (KA):**	10												
DPS ENTRADA	**SI**	**NO**	SI	**MARCA**	INDUSTRONIC			**REFERENCIA**	SPV IND														
7. TABLERO DE SALIDA A LA UPS																							
BREAKER SALIDA UPS	**SI**	**NO**	SI	**MONOFÁSICO, BIFÁSICO, TRIFÁSICO**	TRIFASICO	**MARCA:**	METASOL	**CAPACIDAD (A):**	150	**CAPACIDAD DE CORTO CIRCUITO (KA):**	10												
DPS SALIDA	**SI**	**NO**	SI	**MARCA**	LEGRAND			**REFERENCIA**	PA120Y90KA														
8. ESPACIOS REQUERIDOS PARA LA UPS																							
Distancia libre al lado izquierdo igual o mayor a 75 cm:	**SI**	X	**NO**		**Distancia libre al lado derecho igual o mayor a 75 cm:**		**SI**	X	**NO**														
Distancia libre al frente igual o mayor a 90 cm:	**SI**	X	**NO**		**La puerta del tablero abre a 90°:**		**SI**	X	**NO**														
OBSERVACIONES DE LAS DISTANCIAS Y ESPACIOS																							
TARJETA SNMP	NO	**MARCA**	N/A			**NUMERO DE SERIE SNMP**	N/A																
9. PARAMETROS DE ENTRADA																							
Tensión de Entrada F-F (VAC):	**Ø A-B:**	220.6	**Ø B-C:**	221.2	**Ø A-C:**	226.3	**MEDIDA DE CORRIENTE ENTRADA (AAC)**	**FASE A:**	009.5	**FASE B:**	009.5	**FASE C:**	009.0	**NEUTRO:**	016.5	**TIERRA:**	00.00						
Tensión de Entrada F-N (VAC):	**Ø A-N:**	126.0	**Ø B-N:**	129.2	**Ø C-N:**	130.1	**MEDIDA DE CORRIENTE SALIDA (AAC)**	**FASE A:**	05.08	**FASE B:**	02.40	**FASE C:**	01.81	**NEUTRO:**	03.16	**TIERRA:**	00.00						
Tensión entre Neutro y Tierra Entrada (V):	0.291																						
10. PARAMETROS DE SALIDA																							
Tensión de Salida F-F (VAC):	**Ø A-B:**	220.8	**Ø B-C:**	220.5	**Ø A-C:**	220.9	**Tensión entre Neutro y Tierra Salida (VAC):**	0.156															
Tensión de Salida F-N (VAC):	**Ø A-N:**	127.3	**Ø B-N:**	127.5	**Ø C-N:**	127.4	**¿Las lecturas corresponden con la del panel?**	**SI**	X	**NO**													
10. PRUEBAS EN SITIO UPS																							
1. CON EL UPS ENCENDIDO Y LA CARGA DESCONECTADA:																							
Tensión de Salida F-F (VAC):	**Ø A-B**	220.8	**Ø B-C**	220.5	**Ø A-C**	220.9	**CONDICION**	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**													
Tensión de Salida F-N (VAC):	**Ø A-N**	127.3	**Ø B-N:**	127.5	**Ø C-N:**	127.4	**Funcionamiento Normal**	X															
Tensión de Neutro a Tierra (VAC):	0.156						**Apagado**	X															
¿Corresponde la lectura al panel?	**SI**	X	**NO**				**Encendido**	X															
2. TENSIÓN TOTAL EN BANCO INTERNO DE BATERIAS				**466 VDC**			**3. TENSIÓN TOTAL EN BANCO EXTERNO DE BATERIAS**																
OBSERVACIONES:																							
DATOS DEL TÉCNICO																							
Nombre	Elkin Harold Yance Guerra																						
Cédula	72138657 de Barranquilla																						
Celular	3168896602																						

REGISTRO FOTOGRÁFICO UPS

FOTO PANORAMICA DEL CUARTO DONDE ESTA UBICADA LA UPS	FOTO FRONTAL DE LA UPS	FOTO POSTERIOR	FOTO SUPERIOR
			
FOTO COSTADO IZQUIERDO	**FOTO COSTADO DERECHO**	**FOTO NUMERO SERIE UPS**	**FOTO AIRE ACONDICIONADO**
			
			
BREAKER SALIDA UPS	**DPS ENTRADA UPS**	**DPS SALIDA UPS**	**LLAVE BY PASS**
			
CANALIZACIÓN ENTRADA	**CANALIZACIÓN SALIDA**	**DIAGRAMA UNIFILAR**	**BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE TIERRA**
			

Observaciones:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MEDICIONES ENTRADA UPS

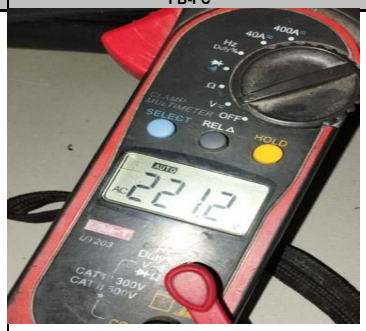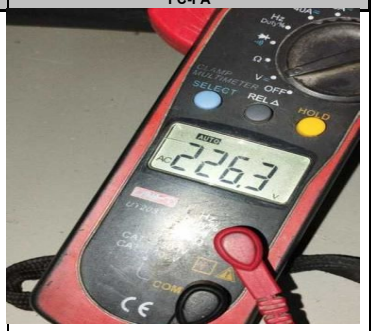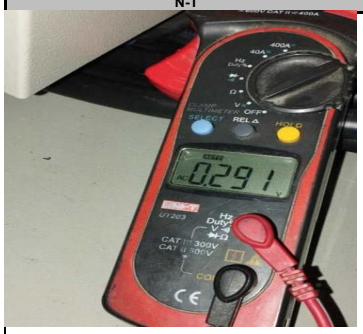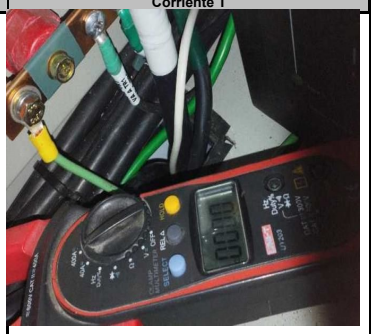TIPO DE ALIMENTACIÓN	TRIFÁSICA	
FA-N	FB-N	FC-N
		
FA-FB	FB-FC	FC-FA
		
N-T	Corriente FA	Corriente FB
		
Corriente FC	Corriente N	Corriente T
		

MEDIDAS ELÉCTRICAS


TIPO DE ALIMENTACIÓN		TRIFÁSICA			
MEDICIONES DE TENSIÓN		MEDICIONES DE CORRIENTE		CALIBRE DE ACOMETIDAS	
FASE A - NEUTRO (VAC)	126.0	FASE A (AAC)	009.5	CALIBRE FASE A	1/0
FASE B - NEUTRO (VAC)	129.2	FASE B (AAC)	009.5	CALIBRE FASE B	1/0
FASE C - NEUTRO (VAC)	130.1	FASE C (AAC)	009.0	CALIBRE FASE C	1/0
FASE A - FASE B (VAC)	220.6	NEUTRO (AAC)	016.5	CALIBRE NEUTRO	1/0
FASE B - FASE C (VAC)	221.2	TIERRA (AAC)	00.00	CALIBRE TIERRA	4
FASE A - FASE C (VAC)	226.3	FRECUENCIA (Hz)	60		
NEUTRO - TIERRA (VAC)	0.291				

Observaciones:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MEDICIONES SALIDA Y AUTONOMÍA DE UPS

TIPO DE ALIMENTACION | **TRIFÁSICA**

FA-N

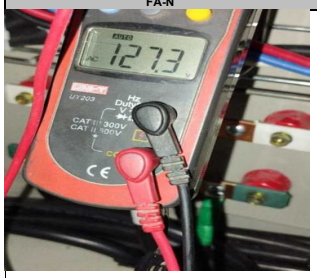

FB-N




FC-N



FA-FB



FB-FC

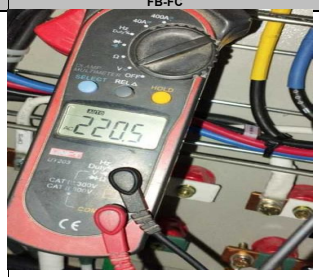


FC-FA



N-T



Corriente FA

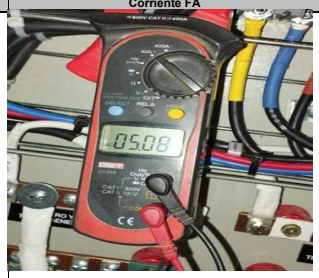

Corriente FB



Corriente FC




Corriente N



Corriente T



TENSIÓN TOTAL EN BANCO INTERNO DE BATERIAS

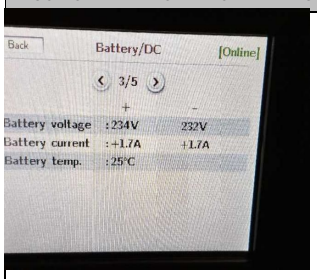

TENSIÓN TOTAL EN BANCO EXTERNO DE BATERIAS

NO APLICA

NO APLICA

MEDIDAS ELÉCTRICAS

TIPO DE ALIMENTACION		TRIFÁSICA			
MEDICIONES DE TENSIÓN		MEDICIONES DE CORRIENTE		CALIBRE DE ACOMETIDAS	
FASE A - NEUTRO (VAC)	127.3	FASE A (AAC)	05.08	CALIBRE FASE A	1/0
FASE B - NEUTRO (VAC)	127.5	FASE B (AAC)	02.40	CALIBRE FASE B	1/0
FASE C - NEUTRO (VAC)	127.4	FASE C (AAC)	01.81	CALIBRE FASE C	1/0
FASE A - FASE B (VAC)	220.8	NEUTRO (AAC)	03.16	CALIBRE NEUTRO	1/0
FASE B - FASE C (VAC)	220.5	TIERRA (AAC)	00.00	CALIBRE TIERRA	4
FASE A - FASE C (VAC)	220.9	FRECUENCIA (Hz)	60		
NEUTRO - TIERRA (VAC)	0.156				

Observaciones:
