ORION
901503188-3

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
CRA 83 B # 15-98 CALI E-mail mabelchud@yahoo.com

Cali, 30 de junio de 2024

Señores,
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Director territorial Invias Caqueta

REFERENCIA: CONTRATO No. 4647 de 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO: Acta de costos No.5 mes de junio

De manera atenta me permito enviar el acta de costos No 5 correspondiente al periodo 1 al 30 de junio de 2024 por un valor Diez y siete millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos veintitrés pesos con veinte centavos. m/cte. ($ 17.934.823,20).

Anexo a la presente los siguientes documentos para su revisión:

- Acta de costos No.5
- Informe mensual de interventoría
- Copia de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar correspondientes al periodo de pago del acta.
- Soportes

Atentamente,

Razón Social: **PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.**
Representante legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
C.C 31.577.305 DE CALI
Dirección: CRA 83 B # 15-98 CALI
Teléfono: 3224097491
E-mail mabelchud@yahoo.com
Ciudad: CALI

Mabel Perez

(Firma del proponente o de su representante legal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA
VALOR BASICO ACTA DE COSTOS: $ 15.071.280,00
PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE JUNIO

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	30-jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JUAN CARLOS SANABRIA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4647-2023 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS **NIT.** 901503188-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS - DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 17.934.823,20 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: Diez y siete millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos veintitres pesos con veinte centavos.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 30 DE JUNIO (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 52202-46096
Fecha firma: 31-01-2024
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula profesional No.52202-46096
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 31/01/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: N/A
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula Profesional No.: 52202-46096
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 31-01-2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO REGIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CODIGO	REFUNVIAS.FR.1
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA:	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — ACTA No. 5 ACTA FINAL — VALOR BÁSICO ACTA: $ 15.071.260 — PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4647-2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA,JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS,JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA, JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — Acta de inicio del No. 3979-2023,3674-2023,4440-2023,3716-2023

PLAZO INICIAL: 0.6 meses (En meses y/o fecha de terminación inicial) — PLAZO ACUMULADO: (En meses con las adiciones y/o suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/6/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo de acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: 19/03/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 109.303.594,71 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 109.303.594,71

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Horas/mes)	Valor Total	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Costo Mensual	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Prima Regional	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _1_ de fecha 31/12/2023 Total Dedicación Recurso	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _1_ de fecha 31/12/2023 VALOR	ABRIL DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	ABRIL VALOR	MAYO DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	MAYO VALOR	JUNIO DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	JUNIO VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VALOR
		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*																
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
	1	Director de Interventoria	$ 5.000.000		1,50	$ 7.500.000	$ -		1,50	$ 7.500.000,00	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,75	$ 3.750.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.000.000		4,00	$ 19.445.503	$ -		4,87	$ 19.415.593,08	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	3,00	$ 12.000.000
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,70	$ 1.120.000	$ -		0,60	$ 1.120.000,00					0,20	$ 560.000	0,20	$ 560.000
	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,70	$ 560.000	$ -		0,60	$ 1.680.000,00			0,40	$ 1.120.000		$ -	0,40	$ 1.120.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00				$ 3.000.000,00								
		Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 3.000.000															
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 3.000.000															
		Especialista en Estructuras	$ 3.000.000															
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 3.000.000															
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 3.000.000															
	1	Inspector	$ 1.200.000		4,00	$ 1.200.000			1,00	$ 1.200.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Inspector SST	$ 1.200.000		0,48	$ 576.000			0,48	$ 576.000,00			0,00	$ -	0,24	$ 288.000	0,24	$ 288.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 34.551.593,20	$ -	$ -		$ 34.551.593,08		$ 5.250.000		$ 6.370.000		$ 6.098.000		$ 17.718.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,26				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 81.541.760,00	$ -	$ -		$ 81.541.759,67		$ 12.390.000		$ 15.033.200		$ 14.391.280		$ 41.814.480

No.	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Costos	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Unidad	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _1_ de fecha 31/12/2023 Total Dedicación Recurso	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _1_ de fecha 31/12/2023 VALOR	ABRIL DEDICACIÓN RECUR SO	ABRIL VALOR	MAYO DEDICACIÓN RECUR SO	MAYO VALOR	JUNIO DEDICACIÓN RECUR SO	JUNIO VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VALOR
		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*																
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
		VIATICOS																
1	1	Ingenieros especialistas y director	$ 110.000	Dia	$ 4,00	$ 440.000			4,00	$ 440.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																
2	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 300.000	Mes	$ 8,00	$ 2.400.000			8,00	$ 2.400.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	2,00	$ 600.000,00	4,00	$ 1.200.000,00
3	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 2.800.000	Según comprobante por mes	$ 2,00	$ 5.600.000			2,00	$ 5.600.000,00	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
4	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Según comprobante por mes	$ 4,00	$ 1.200.000			4,00	$ 1.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ -	Según comprobante por mes	$ -	$ -			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 175.000,00	Según comprobante por mes	$ 2,00	$ 350.000			2,00	$ 350.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS																
6	1	Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias	$ 80.000,00	Según comprobante por mes	$ -	$ -				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
7	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	$ 80.000,00	Según comprobante por mes	$ 4,00	$ 320.000			4,00	$ 320.000,00	1,00	$ 80.000,00	1,00	$ 80.000,00	1,00	$ 80.000,00	3,00	$ 240.000,00
8	1	Veeduria Técnica Comunitaria - estudios especiales	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	$ -	$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación																
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 10.310.000,00				$ 10.310.000		$ 380.000		$ 380.000		$ 680.000		$ 1.440.000
		* **SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				$ 91.851.760,00				$ 91.851.760		$ 12.770.000		$ 15.413.200		$ 15.071.280		$ 43.254.480
		* **RESERVA PARA AJUSTES Y ACTIVIDADES ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS = (D)**				$ -				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		* **SUBTOTAL COSTOS BASICOS INCLUIDO PROVISION SEGUNDO FRENTE y/o AJUSTES = (C) + (D) = (E)**				$ 91.851.760,00				$ 91.851.760		$ 12.770.000		$ 15.413.200		$ 15.071.280		$ 43.254.480
		* **IVA * 19% * (E) = (F)**			0,19	$ 17.451.834,52				$ 17.451.834		$ 2.426.300		$ 2.928.508		$ 2.863.543		$ 8.218.352
		* **COSTO TOTAL = (E) + (F)**				$ 109.303.594,71				$ 109.303.594		$ 15.196.300		$ 18.341.708		$ 17.934.823		$ 51.472.832

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificación contractual.

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Historia Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 15.071.260
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 15.071.260

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada sin incluir Ajustes

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 14.391.260,00	$ 2.734.343,20	$ 17.125.623,20
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 680.000,00	$ 129.200,00	$ 809.200,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 15.071.260,00	$ 2.863.543,20	$ 17.934.823,20

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 17.934.823,20 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) — **VALOR EN LETRAS:** Diez y siete millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos veintitres pesos con veinte centavos.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que aplique.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: LEYDI MABEL PEREZ CHILO
Representante Legal
Interventoria
Matricula Profesional No.: N/A

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Fecha: 2024.07.01 08:43:40

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula Profesional No.

Original: Anexo cara al pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora Interventoría y Dirección Territorial.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f4685d9e11f8b201fc56085b09f4e8a9ee40f19ba57ef2eb3a5b6126b3c7c5325b06b2749527fa8b9ee2d33b03cf7d1b

Número de Factura: ORI1-1023
Fecha de Emisión: 26/07/2024
Fecha de Vencimiento: 25/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: CONTRATO 4647
Fecha de orden de pedido: 30/06/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.
Nombre Comercial: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.
Nit del Emisor: 901503188
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 83 B 15 98
Teléfono / Móvil: 3224097491
Correo: solidosltda@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 25 73 90
Teléfono / Móvil: 13770600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	1045	"Acta de Costos No 5 del contrato 4647-2023 Periodo 1 de junio al 30 de junio cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS	94	1,00	$ 15.071.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.863.543,20	19.00			$ 15.071.280,00

Notas Finales

#$24-02-00;4647-2023;jburbano@invias.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-26 11:53:27
Documento generado el: 2024-07-26 11:53:27
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			15.071.280,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			15.071.280,00
IVA			2.863.543,20
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.863.543,20
Total neto factura (=)			17.934.823,20
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	17.934.823,20

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065274228 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2025-02-09

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14933214143

(415)7707212489984(8020) 000001493321414 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 3 1 8 8	3	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 83 B 15 98

42. Correo electrónico financiera.cubiko@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 4 0 9 7 4 9 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 2 1 0 6 1 6	7 1 1 2	2 0 2 1 0 6 1 6	7 1 1 1		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 31 / 16 : 08: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ CHUD LEYDI MABEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933214143

(415)7707212489984(8020) **000001493321414 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 3 1 8 8	3	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 6 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 7 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 1 2 2 5 8 6	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 6 1 5
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 6 1 6		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933214143

(415)7707212489984(8020) **000001493321414 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 3 1 8 8	3	Impuestos de Cali	5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 1 5 7 7 3 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	CHUD	LEYDI	MABEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4647-2023

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐ ___	ACTA DE INTERVENTORIA	X	CINCO (5)	DEL 01 AL 30 DE JUNIO
DESEMBOLSO	☐ ___	ACTA DE AJUSTE	☐		
		PRESTACION DE	☐		
		OTRO	☐		
		CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1315123**	RUBRO No. **C-2402-0600-14-0-2402041-02**	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$	17.934.823,20
					TOTAL	$	17.934.823,20

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
T.P 52202-46096
SUPERVISOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 4647-2023 Contratista: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

Objeto del Contrato: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Acta No. 5 Valor basico: $ **15.071.280** Período: DEL 01 AL 30 JUNIO

Valor Incluido IVA: $ **17.934.823**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido sin IVA (Mantenimiento y Rehabilitacion)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y Rehabilitacion)	Subtotal
1						$ -
2		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 15.071.280,00		$ 17.934.823,20	$ 15.071.280,00
		TOTALES	**$ 0,00**			$ 0,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 : CAQUETA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 : MAGDALENA		**$ -**	**$ 0,00**
NIT	**DEPARTAMENTO 2 : CAQUETA**		**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 2	VEREDA LAS DELICIAS	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2 : CAQUETA		**$ -**	**$ 0,00**
NIT	**DEPARTAMENTO 3 : CAQUETA**		**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 3	VEREDA LA FLORIDA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3 : CAQUETA		**$ -**	**$ 0,00**
NIT	**DEPARTAMENTO 4 : CAQUETA**		**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 4	VEREDA LAS IGLESIAS	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 4 : CAQUETA		**$ -**	**$ 0,00**
	VALOR TOTAL BASICO			**$ 15.071.280,00**

Mabel Perez

LEYDI MABEL PEREZ CHUD
R. L. PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
C.C. 31.577.305

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoria
DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA
Matrícula Profesional No.: 52202-46096

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

MES INFORME MENSUAL: jun-24

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1315123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 109.303.594,00	$ 57.830.763
							$ -
			TOTAL			$ 109.303.594,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 109.303.594

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	abr-24	$ 12.770.000,00	$ 2.426.300,00	$ 15.196.300,00	$ -	$ 15.196.300,00	$ -		$ 109.303.594,00	$ 94.107.294,00		PENDIENTE POR RADICAR
2	may-24	$ 15.413.200,00	$ 2.928.508,00	$ 18.341.708,00	$ -	$ 18.341.708,00	$ -		$ 94.107.294,00	$ 75.765.586,00		PENDIENTE POR RADICAR
3	jun-24	$ 15.071.280,00	$ 2.863.543,20	$ 17.934.823,20	$ -	$ 17.934.823,20	$ -		$ 75.765.586,00	$ 57.830.762,80		PENDIENTE POR RADICAR
TOTALES		$ 43.254.480,00	$ 8.218.351,20	$ 51.472.831,20								

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 43.254.480,00	$ -	$ 43.254.480,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -	$ -	$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -	$ 8.218.351,20	$ 8.218.351,20
VALOR TOTAL	$ 43.254.480,00	$ 8.218.351,20	$ 51.472.831,20

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:52202-46096

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACION DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, LEYDI MABEL PEREZ CHUD, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 31.577.305, en mi condición de Representante Legal de PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORION S.A.S, identificada con NIT 901503188 -3, certifico el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y de mis obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con la vinculación, al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la normativa vigente, correspondientes al periodo de 1 de junio al 30 de junio de 2024.

Mabel Perez

LEIDY MABEL PEREZ CHUD
Representante legal de PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORION S.A.S.
NIT. 901503188 CRA 83 B # 15-98 CALI
E-mail mabelchud@yahoo.com Cel: 3113235685.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: junio 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

CONTRATO DE OBRA No.: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** COFEM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JUAN CARLOS SANABRIA	79.267.382	Director	$ 1.250.000	X		X		X		X		X		X		X		x														0.25	ORION SAS	1.250.000	$ 90.500	V	Compensar	77798808	$ 52.000	Porvenir	77798808	$ 208.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2	FABIO JESUS MEJIA MEDINA	3.102.749	Residente	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.00	ORION SAS	4.000.000	$ 278.400	V	Nueva EPS	77798808	$ 160.000	Colfondos	77798808	$ 640.000	N/A	N/A	N/A	N/A
3	DIANA PAOLA CADENA RAMOS	1.018.451.763	Ambiental	$ 560.000	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					0.20	ORION SAS	560.000	$ 90.500	V	Nueva EPS	77798808	$ 52.000		77798808	$ 208.000	N/A	N/A	N/A	N/A
4	ADRIANA ISABEL CARDENAS	39.813.196	Inspector SST	$ 280.000	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					0.24	ORION SAS	280.000	$ 90.500	V	Nueva EPS	77798808	$ 52.000		77798808	$ 208.000	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 6.090.000																																								

El Interventor adiunta la certificación de fecha 30 de junio 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre. el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ING. JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901503188-3	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS		CR 83 B 15 98	3224097491	orionsas22@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INVIAS MAG	4571	VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	12/07/2024	77864217	$3.249.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	264.000	0		0		0	0	0	0	264.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.264.000	0	0	0	0	0	0		1.264.000	4
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	730.900				730.900	0	0	730.900			7.309	730.900	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	418.600	0	0	418.600	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	420.000	420.000
Pensión	3	1.680.000	1.680.000
Riesgos Laborales	1	730.900	730.900
CCF	1	418.600	418.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.249.500	3.249.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901503188-3	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS		CR 83 B 15 98	3224097491	orionsas22@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INVIAS MAG	4571	VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	12/07/2024	77864217	$3.249.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiando	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	39813196	CARDENAS ADRIANA ISABEL	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF33	280.000	23.000	0	0	0	0	0
2	CC	79267382	SANABRIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0
3	CC	1018451763	CADENA RAMOS DIANA PAOLA	1	0			S	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF33	560.000	89.600	0	0	0	0	0
4	CC	3102749	MEJIA MEDINA FABIO JESUS	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF33	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
5	CC	1093912277	GUERRERO BARBOSA YEFERSON	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
6	CC	12197190	ORTIZ SÁNCHEZ JHON JAIRO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360	8	11	2023	28	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720	8	11	2023	7	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360	8	11	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28 de noviembre de 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360	24	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720	24	11	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360	24	11	2023	31	10	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15 de abril de 2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25222-37430 CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°03

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4647-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:
3979 de 2023

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Elaboró:	***Revisó:***	***Aprobó:***
Ing. FABIO JESUS MEJIA *Mat: 2520256474 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*	Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS *Ing. José Ricardo Burbano*
CARGO: *Residente de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*	***CARGO:*** *Supervisor del contrato*
Fecha: *30 de JUNIO de 2024*	***Fecha:*** *30 de JUNIO de 2024*	***Fecha:***

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3979 de 2023 **Contratista:** VEREDA ARENOSA, ASOJUNTAS

Contrato de Interventoría No. 4647 de 2023 **Interventoría:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** JUNIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		6-7
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		8
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9-11
2.4	Características técnicas del proyecto		11-13
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		13-
3.1	Información general del contrato		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		14
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		14
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		15
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		15
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	15-19
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	19-20
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	20-24
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	25
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	26
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	26-27
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	27-38
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	38-40
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		41-
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	41
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	42
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	42-46
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	48
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	50
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	51-52
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	53
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	54
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		54-
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	55
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	55
7	**Conclusiones y recomendaciones**		55
8	**Anexos**		55
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		55
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		55-56
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		55
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		57-66

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma: _____

Nombre:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se relaciona adjunto el formato diligenciado del resumen del estado general del proyecto, se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto, en el cual se evidencia que la vereda el ARENOSA ya tienen un avance físico y financiero del 8% de obra.

PROCESO MI — INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE / INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA: | FECHA: 31/06/2024 (día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA | PERIODO MES: JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3979 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OBJETO:

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 29/12/2023
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 199.398.806,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/10/2024
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS ALBANIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4647 de 2023 | INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Leidy Carolina Bermeo Castro

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	PLACA HUELLAS	ML	177
	Construcción		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	
PLACA HUELLAS	Construcción	ML	2	4%	
	Construcción				
	Rehabilitación				
Estructuras	Túneles				
	Puentes				
	Pontones				
Mantenimiento					
Otros (Especificar cuales)					

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	150.409.446,00	28.577.794,74	178.987.240,74
COSTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA. PREDIAL Y DE			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			178.987.240,74

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	15.944.000,00	3.029.360,00	18.973.360,00	18.973.360,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL				
GESTIÓN SOCIAL				
GESTIÓN PREDIAL				
GESTIÓN SOSTENIBILIDAD				
VALOR EJECUTADO				18.973.360,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 11.050.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 15.944.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 8%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



COMPACTACION DE LA VIA

Foto 2



INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

después de realizar el comité operativo para aprobacion de precios, presentaron plan de inversion, presupuesto y programacion de obra, para poder dar inicio a las actividades

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del MVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

2.1. LOCALIZACIÓN 7

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 8

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023 11

3.1INFORMACION DEL PROYECTO

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 12

3.3SEGUIMIENTO ITEN NO PREVISTO

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12

4.1. INFORME SEMANAL 12

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 15

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 15

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 18

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 19

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 20

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 20

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 27

4.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 27

4.10. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 28

4.11. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 29

4.12. ACTAS DE REUNIÓN 31

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA……21

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO……21

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ELINTERVENTOR……21

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA22

6.1 EQUIPOS Y VEHICULOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA……22

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……22

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……22

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL……22

6.5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS……22

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……..23

8. ANEXOS……24

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO……24

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS……24

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS……..24

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE……24

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidario.

En este informe se presenta a consideración del INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.03 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**"." hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas del siguiente convenio:

Convenio No. 3979 de 2023, con número de proceso SPSC-CD-CS-612-2023-2023y que tiene por objeto "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**

ANTECEDENTES

La economía del municipio está basada en la agricultura, complementada con la ganadería, la coca y aprovechamientos forestales

A el municipio de San José del Fragua, Curilllo y Albania se accede por la ruta troncal del Llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por la empresa Coomotor Por vía terrestre, además de su vecina, se accede por Villavicencio en el vecino departamento del Meta en el norte, Mitú (Vaupés) al este y Leticia (Amazonas) en el sur.
La vía San José del Guaviare – Calamar hace parte de la tan soñada ruta nacional 75. Es una carretera que busca atravesar la amazonia y unir los municipios de Puerto Leguizamón (Putumayo) y Puerto Gaitán (Meta), la idea de dicho proyecto surgió a mediados del siglo XX con la idea de conectar los llanos orientales con la amazonia.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente, proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

San José del Fragua, Currillo y Albania son municipios del departamento del Caquetá, en Colombia localizado en la Zona sur del país, en la región Amazonia. Con 88 965 km² es el tercer departamento más extenso —por detrás de Amazonas y Vichada

Los puntos a intervenir en la vereda arenosa se localizan en las siguientes coordenadas:
Punto 1 (PLACA HUELLA): 1°57'17,6752"N 72°37'32,3680"W

FUENTE DE MATERIALES:

LA RAYA municipio del Albania “contrato de concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de materiales de construcción, según contrato de concesión No. IJH-10531, ubicado en la vereda de morelia

ÁREA TOTAL: 8 HECTÁREAS Y 4395 MT2

MINERALES: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

PLANCHA IGAC: 350

ALINDERACIÓN FUENTE DE MATERIALES

COORDENADA NORTE	*COORDENADA ESTE*
671727,0000	*1255870,0000*
671727,0000	*1255870,0000*

671727,0000	*1255870,0000*
781500,0000	*1166150,0000*

Tabla 1. alinderación fuente de materiales

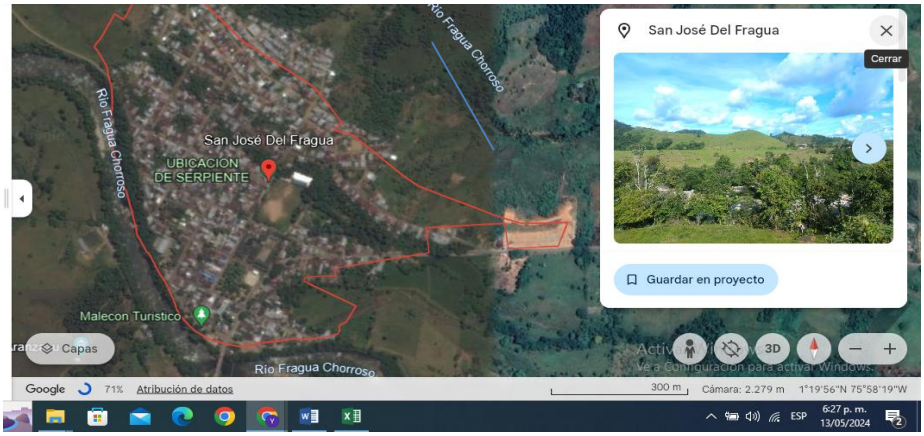


Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en la vereda arenosa
Fuente: FICHA VISITA TÉCNICA DIAGNOSTICO DE VÍAS - INVIAS

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a la asociación de junta de Albania (la arenosa), vereda las delicias, florida del municipio de Currillo y la vereda iglesias del municipio de San José del Fragua, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos.

Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

.

CONVENIO 3979 – 2023:

OBJETO **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL**

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

La vereda arenosa del Municipio de Albania está ubicada aproximadamente a 5 kilómetros del casco urbano y limita con las veredas san isidro la samaria y alto castañal, dicha vereda posee una vía terciaria con una extensión aproximada de 20 km.

El tramo a intervenir está ubicado cerca a la escuela la arenosa el estado general de la superficie o rodadura presenta hundimientos puntuales a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias los cuales impiden la transitabilidad de cualquier tipo de vehículo en época de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es de 6 m aproximadamente. No cuenta con cunetas, carece de obras hidráulicas y falta realizar mantenimiento a las existentes, se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

Esta vía cuenta con una alcantarilla de 36 “.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	
ALCANCE DEL PROYECTO	*LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS", PARA LO CUAL SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA VISITA TÉCNICA REALIZADA POR LOS PROFESIONALES DESIGNADOS POR EL INVIAS, EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL - OAC, EN DONDE SE REALIZÓ UNA CONCERTACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR, UTILIZANDO LOS DISEÑOS TIPO ESTABLECIDOS EN LA CARTILLA DE OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURALES VIALES, NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONVENIO Y PARA*

	GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DEL SECTOR A INTERVENIR.
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CONVENIO 3979 – 2023	*CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA 177 ML. LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES PRESENTADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES.* *LA ALCANTARILLA CIRCULAR, COMO ELEMENTO DE DRENAJE TRANSVERSAL SE TRABAJARÁ CON TUBOS DE 24" DE CONFIGURACIÓN TIPO POCETA-ALETA LA CUAL ES APTA PARA RECOLECTAR Y EVACUAR A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA DE VÍA, LA ESCORRENTÍA DE ORIGEN SUPERFICIAL Y SUBSUPERFICIAL, APORTANTE POR LAS CUNETAS Y/O FILTROS.* ***ESPECIFICACIONES DE DISEÑO:*** ***-CONCRETO: F'C 21MPA*** ***-ACERO CORRUGADO: FY 420MPA***

Tabla 2. Características técnicas del proyecto

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VEREDA ARENOSA

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023

TIPO DE PROCESO	*CONTRATACIÓN DIRECTA*
NÚMERO DE PROCESO	*SPSC-CD-CS-612-2023*
CONVENIO NO.	*3979 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS*
OBJETO	***AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”***
CONTRATISTA	*JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASOJUNTAS, ALBANIA*
NIT	*NIT. 900.468.237-2.*
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – PGN	*$ 199.398.806*
APORTE EN ESPECIE OAC	*$1.000.000*
VALOR TOTAL	*$ 199.398.806*
ADICIONES	*$ 0.00*
FECHA DE INICIO	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*31 DE DICIEMBRE DE 2023*

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 01	*30 DE ABRIL DE 2024*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 02	*16 DE OCTUBRE DE 2024*

Tabla 3. Información general convenio 3979 de 2023

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2024

- **EXCAVACIONES EN SECO:** Se ejecutaron actividades de remoción de tierra para los anchos de vías según especificaciones técnicas de inivias 5 mts

- **FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO Fy 4200MPA:** Se realizo corte y doblado de barras corrugadas permitiendo obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño de las huellas

- **CONCRETO 21 MPA:** Vaciado de concreto para las huellas de las vias

Durante el mes de junio se ejecutaron actividades como excavación para perfiles laterales de las vías quedando estas de 5 m de ancho. Se figuró y cortó el hierro y se instalaron en la vía para las huellas longitudinal y transversal de las vías, posterior se vacío un concreto de 3000 psi y se le aplicó ascelerantes para ayudarle a fraguar. El porcentaje de obra ejecutado a la fecha es del 11% correspondiente a un valor de $21.000.000

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han presentado ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- ✓ Realizar visitas periódicas para seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando medidas y que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto

3. REPORTES EJECUCIÓN SEMANAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Informe semana 10 - junio del 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 1 | FECHA 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA | SEMANA No.: 10 del ######## al 27/06/2024 Último Informe Semanal SI (*) (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 177 ML DE PLACA HUELLA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA	INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.	
		INTEGRANTES:	UNICO	
CONVENIO No.	3979 de 2023	VALOR INICIAL: $ 199.398.806,00	CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 199.398.806,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.398.806	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A)	$ 199.398.806,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.050.000,00	6%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 7.972.000,00	4%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.078.000,00)	-2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.050.000,00	6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15.944.000,00	8%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.894.000,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.050.000,00	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.944.000,00	8%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.500.000,00	7%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 6% | Meta Física Ejecutada % 4% | Avance o Atraso Físico % 2%

Meta Física (Programa de Obra)			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Contrato
1	PLACA HUELLA	ML	177
2			
3			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
1	Prog.	6%			$ 11.050.000,00	6,0%
	Ejec.	4%			$ 7.972.000,00	
2	Prog.					
	Ejec.					
3	Prog.					
	Ejec.					

(El interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás previsiones contempladas contractualmente y el avance físico trimestral acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	1
PALMETA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: FLORENCIA, CAQUETA	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN: MAEXCA SAS	PERMISO MINERO: SI X NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___	

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO ___	N/A ___	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO X	N/A ___	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X	NO ___	N/A ___	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A X	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A X	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A X	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZO POR EL PMA

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 30 DE ABRIL

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14 | CAMPAMENTO VEREDA LA ARENOSA

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE INICIO CON LA CONFORMACION DE LA BANCA A 5 MTS, E INSTALACION DE MATERIAL SUB-BASE POR TRAMOS CORTOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE PROYECTA INICIAR CON EL CORTE Y FIGURADO DEL REFUERZO PARA LAS HUELLAS

0+00 | 0+177
PROGRAMADO
EJECUTADO
MNV: MANTENIMIENTO | CONSTRUCCION | MEJORAMIENTO | SEÑALIZACION
El orgánico gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada a meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


ANCHO DE VIA


INSTALACION DE SUB-BASE


COMPACTACION DE LA SUB-BASE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio, realizar visitas periodicas con el fin de que cumpla con las especificaciones tecnicas del proyecto

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Mat./Cula Profesional No.: 3520259-47CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Subdirección de Normatividad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.

Informe semana 11 - junio del 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

Edición: 1 | Versión: | Página: 1 | FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA | SEMANA No.: 11 del ######## al 4/07/2024 Ultimo Informe Semanal SI (*) (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 177 ML DE PLACA HUELLA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM.CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA	INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.		
		INTEGRANTES:	UNICO		
CONVENIO No.	1979 de 2023	VALOR INICIAL: $ 199.398.806,00	CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 199.398.806,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.398.806	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.398.806,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 13.500.000,00	7%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 10.500.000,00	5%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.000.000,00)	-2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13.500.000,00	7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.000.000,00	11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 7.500.000,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.500.000,00	7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.000.000,00	11%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.500.000,00	10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7% | Avance o Atraso Físico % 2%
Meta Física Ejecutada % 5%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PLACA HUELLA	ML	177

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	7%				$ 13.500.000,00	11%
Ejec	5%				$ 10.500.000,00	
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						

El interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluido la ejecución de las actividades y diseños y demás previsiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector)

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: FLORENCIA, CAQUETA	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN: MAEXICA SAS	PERMISO MINERO: SI X NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___	

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO ___	N/A ___	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO ___	N/A ___	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO X	N/A ___	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO ___	N/A ___	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A X	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A X	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A X	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZO POR EL PMA

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

CAMPAMENTO VEREDA LA ARENOSA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE CONTINUA INSTALANDO SUB-BASE DEBIDAMENTE COMPACTADA, Y SE SIGUE VACIANDO CONCRETO DE 3000 PSI CON SU REFUERZO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE CONTINUA CORTANDO Y FIGURANDO ACERO

0+00 | 0+177

PROGRAMADO
EJECUTADO

MN: MANTENIMIENTO | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO | GENERALIZACIÓN

El siguiente gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada el meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMPACTACION DE LA SUB-BASE



CORTE Y FIGURADO DEL REFUERZO



CAJONES PARA EL VACIADO DEL CONCRETO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecutar el proyecto en los dias pequentos por el convenio, realizar visitas periodicas con el fin de que cumpla con las especificaciones tecnicas del proyecto

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25202594-DTACND

Digital Informe mensual de interventoría. Instituto de Gestión del IDU-2015
Página: Gestión Técnica - Subdirección de Responsabilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se relacionó la maquinaria y los equipos que estuvieron activos, inactivos en el periodo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3979-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS ALBANIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 de 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VIBRO COMPACTADOR	CAT-420 D	2896 KG	ARENOSA																		I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I
PAJARITA	CAT-420 D	1875 KG	ARENOSA																		A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TROMPO MEZCLADOR	BAUKER	1 BULTO	ARENOSA																		I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A
GENERADOR ELECTRICO	BAUKER	110V/220V	ARENOSA																		I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	A	I	I
PUILIDORA ELECTRICA	DRIWALL	6500 RPM	ARENOSA																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOBOMBA	HUMBOLT	1 HP	ARENOSA																		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																					2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	4	3	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																					4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	2	3	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	33	33%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	51	51%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA MAQUINARIA QUE SE REPORTA EN EL CUADRO COMO INACTIVA, SE ENCUENTRAN EN BUES ESTADO, SOLO QUE NO SE REQUIERE UTILIZAR TODOS LOS DIAS

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JHON JAIRO GARCIA CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-119996 CND

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional N 2520256474 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Se relaciona el personal que laboro para la obra durante el periodo de JUNIO de 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSION:	1
PAGINA	
FECHA:	10/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3979-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS DE ALBANIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30/06/2024 — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

NOMBRE ARL: POSITIVA ARL — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	RAMON ANTURY	97.357.389	MAESTRO DE OBRA	$ 2.320.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NSOJUNTAS-ALBANIA	$ 1.082.667	$ 75.400	V	NUEVA EPS	30325495	$ 135.400	COLFONDOS	30325495	$ 173.300	$ 43.400	$ 21.700	$ 32.500	
2	DAVID YAGUE URQUINA	96.357.369	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NSOJUNTAS-ALBANIA	$ 606.667	$ 42.300	V	ASMET-SALUD	30325495	$ 75.900	PROTECCION	30325495	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
3	GEOVANI ARCILA JARAMILLO	15.987.076	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NSOJUNTAS-ALBANIA	$ 606.667	$ 42.300	V	ASMET-SALUD	30325495	$ 75.900	COLPENSIONES	30325495	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
4	JHON FABER ALVARADO CAMBRANO	1.117.541.171	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NSOJUNTAS-ALBANIA	$ 606.667	$ 42.300	V	ASMET-SALUD	30325495	$ 75.900	PORVENIR	30325495	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
5	JUAN CARLOS ZAMBRANO	1.117.785.696	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NSOJUNTAS-ALBANIA	$ 606.667	$ 42.300	V	ASMET-SALUD	30325495	$ 75.900	PROTECCION	30325495	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
6	NELSON GALLEGO	96.357.807	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NSOJUNTAS-ALBANIA	$ 606.667	$ 42.300	V	NUEVA EPS	30325495	$ 75.900	PROTECCION	30325495	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
7	RAMON ANTONIO DE HOYOS	96.357.465	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NSOJUNTAS-ALBANIA	$ 606.667	$ 42.300	V	NUEVA EPS	30325495	$ 75.900	COLPENSIONES	30325495	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 10/07/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: JHON JAIRO GARCIA CALDERON
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: No. 25202 - 119996 CND

Firma:
Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Certificación del pago seguridad social mes de JUNIO de 2024

ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS
DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA
PERSONARÍA JURÍDICA N° 421 DE 31 DE DICIEMBRE DE 1990
NIT. 900.468.237-2

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, SIXTO JAVIER PARRA RAMIEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.785.524 de Albania-Caquetá -Caquetá, en mi condición de Representante Legal DE LA SOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que **ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA**, con identificación tributaria NIT. 900.468.237-2, durante el periodo comprendido del 17 al 30 del mes de JUNIO de 2024, realizo el pago de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior dando cumplimiento a la ejecución del CONVENIO 3979 DE 2023.

Según la planilla de pago No. 30119699 en estado pagada a traves del operador ASOPAGOS S.A.


Dada en San José del Fragua Caquetá, a los diez (10) días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ
C.C. 1.117.785.524 de Albania-Caqueta
Representante Legal ASOJUNTAS

Página 1 | 1

Planilla pagada mes de JUNIO JAC arenosa

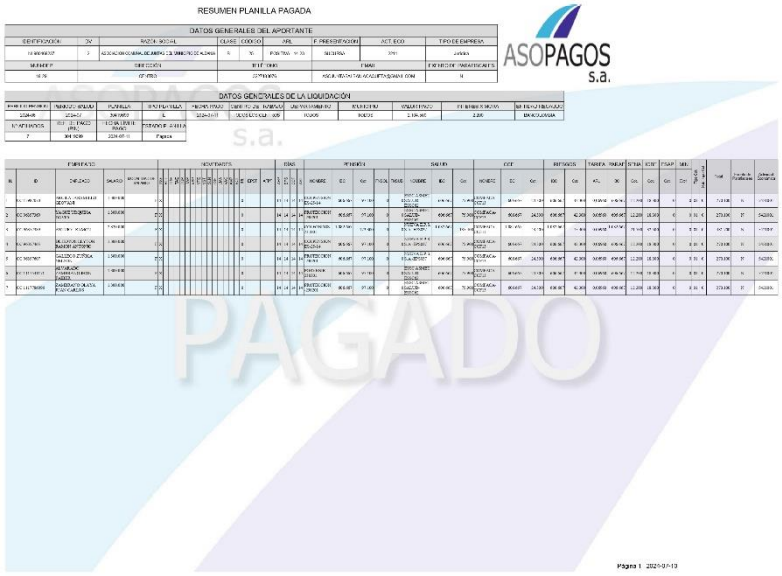

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900466237	2	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA	D	25	POSITIVA 14 23	SUCURSAL	2211	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
16-29	CENTRO		3227483076		ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN								
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30419699	E	2024-07-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.104.500	2.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (FIU)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	30419699	2024-07-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.722.669	4.722.669	4.722.669	4.722.669	4.722.669

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				7	755.900	0	800	0	756.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	173.300	0	200	0	173.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	97.100	0	100	0	97.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	194.200	0	200	0	194.400
PROTECCION	230201	800229739	0	3	291.300	0	300	0	291.600
EPS(Administradoras: 2)				7	590.800	0	600	0	591.400
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	4	303.600	0	300	0	303.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	287.200	0	300	0	287.500
ARP(Administradoras: 1)				7	329.200	0	300	0	329.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	329.200	0	300	0	329.500
CCF(Administradoras: 1)				7	189.200	0	200	0	189.400
COMFACA	CCF13	891190047	2	7	189.200	0	200	0	189.400
SENA(Administradoras: 1)				7	94.900	0	100	0	95.000
SENA	PASENA	899999034	1	7	94.900	0	100	0	95.000
ICBF(Administradoras: 1)				7	142.300	0	200	0	142.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	142.300	0	200	0	142.500
Gran Total					2.102.300	0	2.200	0	2.104.500

Página 2 2024-07-10

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se anexo formato del avance financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 397-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS ALBANIA

MES INFORME MENSUAL: 3 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.398.806,00	N/A
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.398.806,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BASICO DEL CONVENIO	$ 121.328.888,21	$ 28.459.863	**$ 149.788.751**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.950.500,00	$ 2.099.500	**$ 11.050.000,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6.457.320,00	$ 1.514.680	**$ 7.972.000,00**
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.493.180,00	$ 584.820	**$ 3.078.000,00**
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.950.500,00	$ 2.099.500	**$ 11.050.000,00**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12.914.640,00	$ 3.029.360	**$ 15.944.000,00**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.440.218,40	$ 2.453.782	**$ 4.894.000,00**
-			**$ -**
VALOR TOTAL			**$ 22.100.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
residente de Obra Jhon Jairo Garcia Calderon
Matrícula Profesior25202-119996 CND

Firma
Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional Nº 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En el transcurso del mes de junio en la vereda hizo buen tiempo, no se presentaron lluvias y se cumplió con la programación de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3979 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			112
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
EN EL TRANSCURSO DEL MES SE PRESENTÓ BUEN CLIMA EN LOS PUNTOS DE INTERVENCION

Firma
Nombre: Jhon Jairo Garcia Calderon
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0553973 CND

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Registro pluviométrico del IDEAM

CodigoEstac	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperat	Departamen	Municipio	FechaInstalacion	FechaSusp	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobac
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/01/2024 0:00	11	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/01/2024 0:00	1	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operat	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/01/2024 0:00	3	50		900

4.6. **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**

En el periodo correspondiente al mes de junio no hubo necesidad de realizar ensayos de laboratorio, se tomaron muestras de concreto y se tiene en el sitio de los trabajos esperando a que fragüen y poder llevarlos a su ruptura

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el transcurso del mes no fue necesario solicitar más póliza, debido a que estamos en los tiempos establecidos por el convenio y no se le va a dar trámite a ningún adicional en recursos, Se anexan pólizas del convenio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 3979-2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 26/12/2023
PLAZO INICIAL: 3 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/10/2024 (Incluye prorrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 199.398.806,00
VALOR ACUMULADO: $ 199.398.806,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.499.400,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.499.400,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.879.761,00	18	10	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	31/12/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.969.940,00	18	10	2023	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.819.642,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3765008.2
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	18	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0934431-1 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: NA
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 Y 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1 Y 2 **SUSPENSIÓN No.:** 1 Y 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.909.750,60	5	10	2023	30/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.977.438,65	5	10	2023	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.864.631,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100289628
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1Y 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1Y 2 **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	18	10	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0934431-1 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: AUN SE ENCUENTRAN EN ESTADO PENDIENTE EN SECOP

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo pólizas

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 24 DE OCTUBRE DE 2023	3765008-2	15357042
Intermediario: PORVENIR ASESORES	Código: 54327 / Oficina: 2514	Referencia de Pago: 01215357042

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos	Dirección	Ciudad	Teléfono
9004682372	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA	CR 3A # 6 - 17 VILLA AMAZONICO	ALBANIA	

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9004682372	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8002158072	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-OCT-2023	31-OCT-2024	39.879.761,00	124.228,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31-DIC-2023	31-DIC-2028	59.819.642,00	896.238,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-OCT-2023	31-DIC-2026	9.969.948,00	95.875,00

VIGENCIA DEL SEGURO Desde	Hasta	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO Días	Desde	Hasta	VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
18-OCT-2023	31-DIC-2028	1901	18-OCT-2023	31-DIC-2028	$1.118.381	$212.492	$1.330.873

VALOR A PAGAR EN LETRAS
UN MIL LON TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/I

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
POLIZA NUEVA	$109.669.343	$329.308	$109.669.343,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº 009961

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2514	CUM001	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	1.118.381

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	5/09/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/04/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-081

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Convenio
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALEN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 7760193795

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. – CLIENTE – www.suramericana.com Página 1

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	3765008-2	15763421
Intermediario: PORVENIR ASESORES	Código: 54327 / Oficina: 2514	Referencia de Pago: 01215763421

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos	Dirección	Ciudad	Teléfono
9004682372	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA	CR 3 A # 6 17 VILLA AMAZONICO	ALBANIA	

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9004682372	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8002158072	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-OCT-2023	28-ABR-2025	39.879.761,00	19.339,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-JUN-2024	30-JUN-2029	59.819.641,80	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-OCT-2023	30-JUN-2029	9.969.948,00	4.999,00

VIGENCIA DEL SEGURO Desde	Hasta	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO Días	Desde	Hasta	VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
18-OCT-2023	30-JUN-2029	1050	06-JUN-2024	30-JUN-2029	$24.338	$4.624	$28.962

VALOR A PAGAR EN LETRAS
VEINTI OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$329.008	$109.669.343,30

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº 009961

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2514	91975	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	24.338

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	5/09/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/04/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-081

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Convenio
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALEN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES.
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 7760193795

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. – CLIENTE – www.suramericana.com Página 1

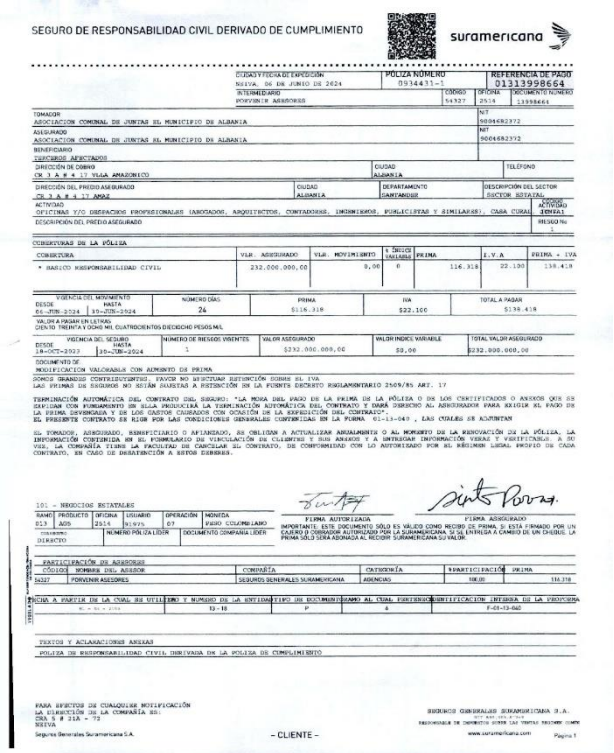

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	0934431-1	01313998664

INTERMEDIARIO: POSVENIR ASESORES — CÓDIGO: 54327 — OFICINA: 2514 — DOCUMENTO NÚMERO: 13998664

TOMADOR: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT: 9004682372

ASEGURADO: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT: 9004682372

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 A # 4 17 VILLA AMAZONICO	ALBANIA	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 3 A # 4 17 ARAZ	ALBANIA	SANTANDER	SECTOR ESTATAL

ACTIVIDAD: OFICINAS Y/O DEDICACION PROFESIONALES (ASOCIADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES), CASA CURAL — CÓDIGO ACTIVIDAD: 109641

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO — RIESGO No: 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	0,00	0	116.318	22.100	138.418

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
06-JUN-2024	30-JUN-2024	24	$116.318	$22.100	$138.418

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR ÍNDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
19-OCT-2023	30-JUN-2024	1	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE: MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA.
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 91-13-647 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
813	A09	2514	91975	07	PESO COLOMBIANO

NÚMERO PÓLIZA LÍDER — DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA Y SI SU ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECOBR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	POSVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	116.318

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZÓ	NÚMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROFORMA
[illegible]	13-16	P	4	F-01-13-640


TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

– CLIENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Seguros Generales Suramericana S.A. — www.suramericana.com — Página 1

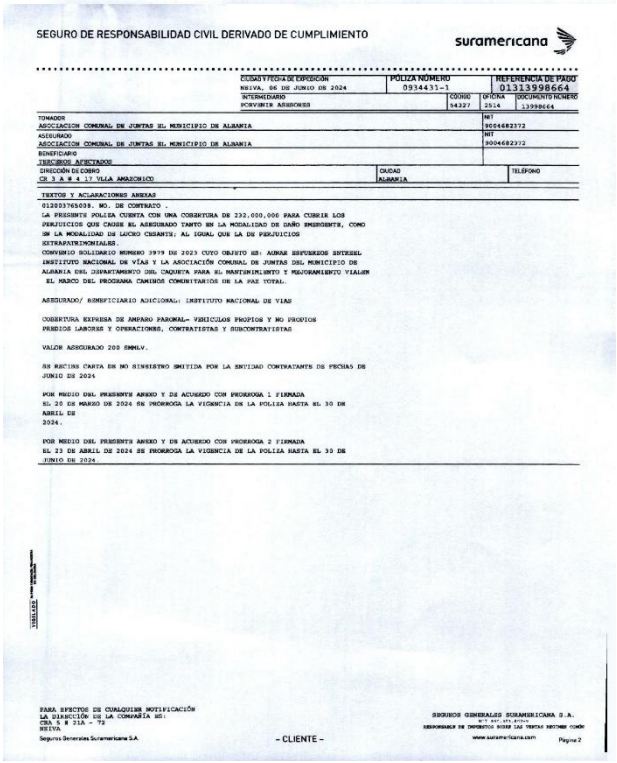

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	0934431-1	01313998664

INTERMEDIARIO: POSVENIR ASESORES — CÓDIGO: 54327 — OFICINA: 2514 — DOCUMENTO NÚMERO: 13998664

TOMADOR: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT: 9004682372

ASEGURADO: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT: 9004682372

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 A # 4 17 VILLA AMAZONICO	ALBANIA	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
012203765038. NO. DE CONTRATO .
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232.000.000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
CONTRATO SOLIDARIO NUMERO 3979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRESL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALIEN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL- VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
PERDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

VALOR ASEGURADO 200 SMMLV.

SE RECIBE CARTA DE NO SINIESTRO EMITIDA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE DE FECHAS DE JUNIO DE 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON PRORROGA 1 FIRMADA EL 20 DE MARZO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.


POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON PRORROGA 2 FIRMADA EL 23 DE ABRIL DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

– CLIENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Seguros Generales Suramericana S.A. — www.suramericana.com — Página 2

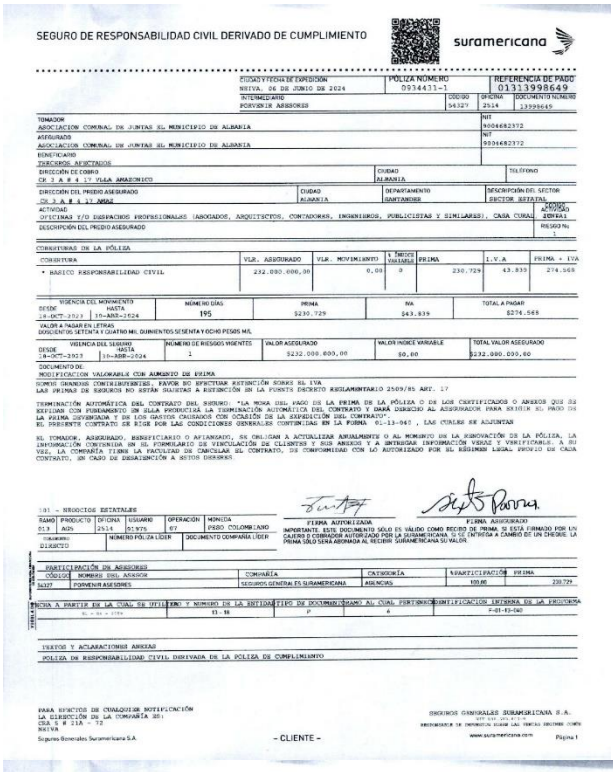

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	0934431-1	03313998649

INTERMEDIARIO: FORVENIR ASESORES — CODIGO 54327 — OFICINA 2514 — DOCUMENTO NUMERO 13998649

TOMADOR: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

ASEGURADO: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO: CR 3 A # 4 17 VILLA AMAZONICO — CIUDAD: ALBANIA — TELÉFONO

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO: CR 3 A # 4 17 AREA2 — CIUDAD: ALBANIA — DEPARTAMENTO: SANTANDER — DESCRIPCIÓN DEL SECTOR: SECTOR ESTATAL — CODIGO ACTIVIDAD: 2599A1

ACTIVIDAD: OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES); CASA CUNA

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO — RIESGO No: 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
• BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	0,00	0	230.729	43.839	274.568

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
19-OCT-2023	19-ABR-2024	195	$230.729	$43.839	$274.568

VALOR A PAGAR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
19-OCT-2023	19-ABR-2024	1	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE: MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA.
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-940 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL. ENVIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESAFILIACIÓN A ESTOS DESCANSOS.

191 - NEGOCIOS ESTATALES

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA O SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AGS	2514	91975	67	PESO COLOMBIANO

NÚMERO PÓLIZA LÍDER — DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	FORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	230,729

FECHA A PARTIR EN LA CUAL SE UTILIZARÁ Y NÚMERO DE LA ENTIDAD — TIPO DE DOCUMENTO — NÚMERO AL CUAL PERTENECE — IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROFORMA

01-11 — P — 6 — F-01-13-940

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS


POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA
Seguros Generales Suramericana S.A.

– CLIENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

www.suramericana.com — Página 1

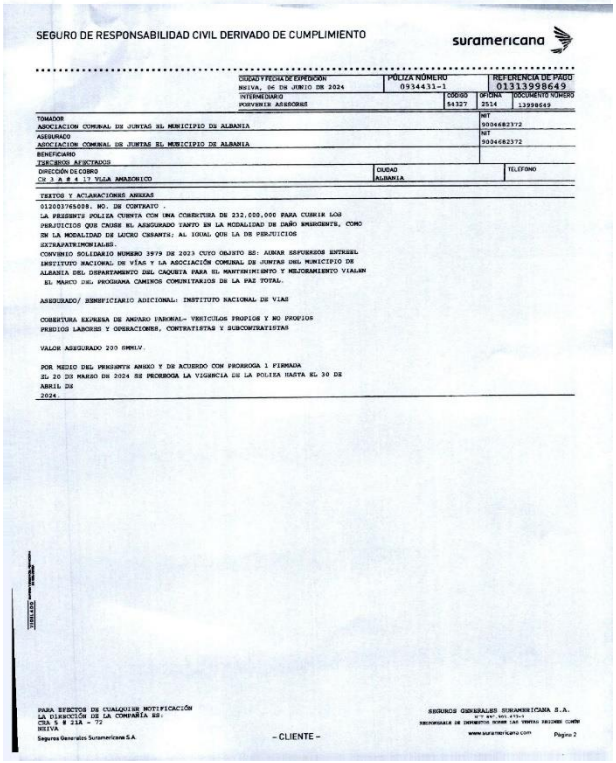

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	0934431-1	03313998649

INTERMEDIARIO: FORVENIR ASESORES — CODIGO 54327 — OFICINA 2514 — DOCUMENTO NUMERO 13998649

TOMADOR: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

ASEGURADO: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO: CR 3 A # 4 17 VILLA AMAZONICO — CIUDAD: ALBANIA — TELÉFONO

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

012003765008. NO. DE CONTRATO .
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRESL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALAN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL- VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

VALOR ASEGURADO 200 SMMLV.


POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON PRORROGA 1 FIRMADA EL 20 DE MARZO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA
Seguros Generales Suramericana S.A.

– CLIENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

www.suramericana.com — Página 2

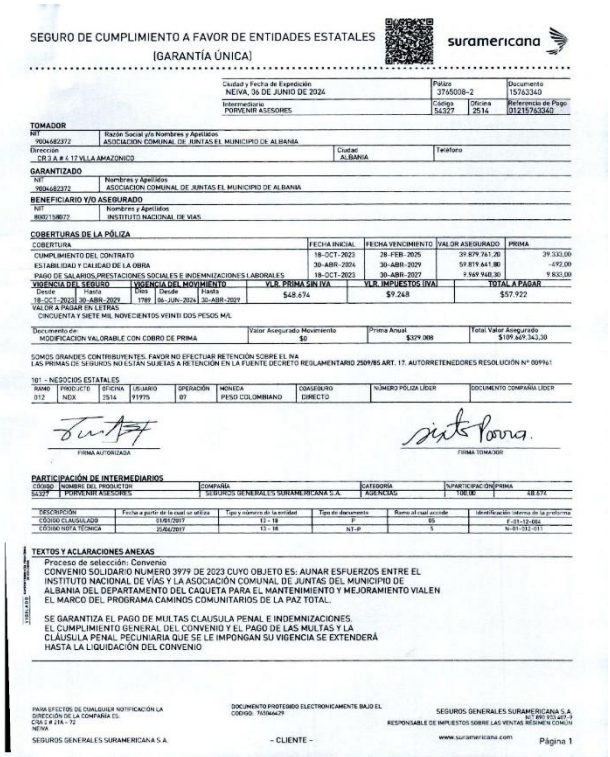

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	3765008-2	15763340

Intermediario	Código	Oficina	Referencia de Pago
PORVENIR ASESORES	54327	2514	01215763340

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos	Ciudad	Teléfono
9004682372	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA		
Dirección: CR 3 A # 4 17 VLLA AMAZONICO		ALBANIA	

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9004682372	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8001158072	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-OCT-2023	28-FEB-2025	$9 879 761,20	29 330,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-ABR-2024	30-ABR-2029	$9 819 441,80	492,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-OCT-2023	30-ABR-2027	$ 969 948,30	9 830,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde / Hasta			
18-OCT-2023	30-ABR-2029	1769	06-JUN-2024 / 30-ABR-2029	$48.674	$9.248	$57.922

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTI DOS PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$329.008	$109.669.343,30

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 00961

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2514	91975	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	48.674

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la preforma
CÓDIGO CLAUSULADO	19/01/2017	13 - 18	F	55	F-01-12-054
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/04/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-151-017

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Convenio
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALEN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES. EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA


SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 765344429

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-3
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com

Página 1

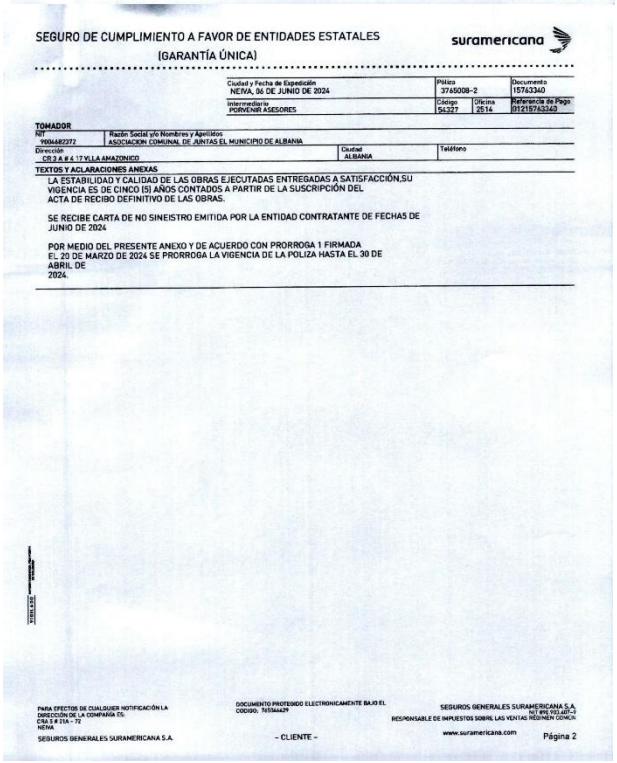

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	3765008-2	15763340

Intermediario	Código	Oficina	Referencia de Pago
PORVENIR ASESORES	54327	2514	01215763340

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos	Ciudad	Teléfono
9004682372	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA		
Dirección: CR 3 A # 4 17 VLLA AMAZONICO		ALBANIA	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN,SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

SE RECIBE CARTA DE NO SINEISTRO EMITIDA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE DE FECHAS DE JUNIO DE 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON PRORROGA 1 FIRMADA EL 20 DE MARZO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA


SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 765344429

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-3
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com

Página 2

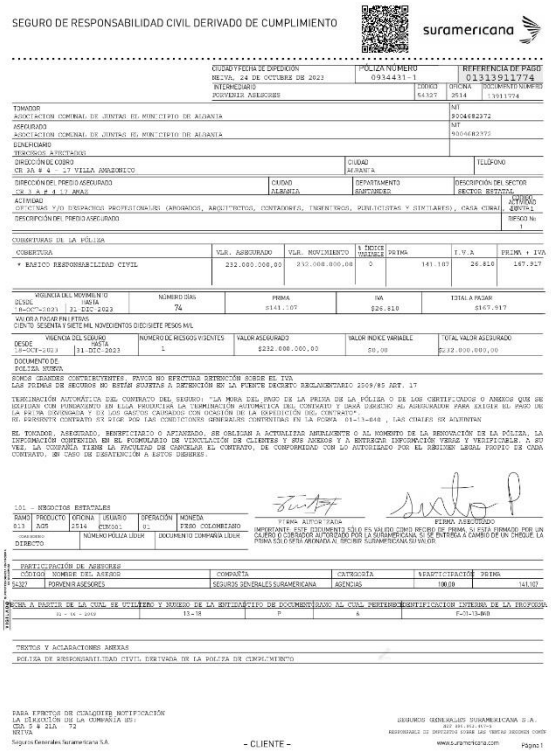

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD/FECHA DE EXPEDICION: NEIVA, 24 DE OCTUBRE DE 2023 | POLIZA NUMERO: 0934431-1 | REFERENCIA DE PAGO: 013139117774

INTERMEDIARIO: 64327 PROVEEDS ASESORES | CODIGO: 64327 | OFICINA: 3514 | DOCUMENTO NUMERO: 13911774

TOMADOR: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANTA | NIT: 9004682372

ASEGURADO: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANTA | NIT: 9004682372

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

DIRECCION DE COBRO: CR 3A # 4 - 17 VILLA AMAZONICO | CIUDAD: ALBANTA | TELEFONO:

DIRECCION DEL PREDIO ASEGURADO: CR 3A # 4 - 17 ANAS | CUPAO: ALBANTA | DEPARTAMENTO: CAQUETA | DESCRIPCION DEL SECTOR: SECTOR ESTATAL | CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA: 9

ACTIVIDAD: OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, SICOLOGOS Y SIMILARES), CASA CIRAL

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO | RIESGO No: 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	232.000.000,00	0	141.107	26.810	167.917

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NUMERO DIAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
18-OCT-2023	31-DIC-2023	74	$141.107	$26.810	$167.917

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NUMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
18-OCT-2023	31-DIC-2023	1	$232.000.000,00	00,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE: POLIZA NUEVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES , POR LO NO EFECTUAS RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2009/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y UNAS DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-1-648 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL REGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO. EN CASO DE ABSTENCIÓN A ESTOS DEBERES.

FIRMA AUTORIZADA | FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VALIDO COMO RECIBO DE PRIMA SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA O SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE LA PRIMA SOLO ESTÁ GARANTIZADA AL RECIBO SURAMERICANA SU VALOR.

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	ESTADO	OPERACIÓN	MONEDA
813	A05	3514	EMISO:	01:	PESO COLOMBIANO

CANALIZADO DIRECTO	NUMERO POLIZA LIDER	DOCUMENTO COMPAÑIA LIDER

PARTICIPACIÓN DE ASEGURADORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
64327	PROVEEDS ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	141.107

PODRÁ A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZARÁ Y MODELO DE LA ENTIDAD/TIPO DE DOCUMENTO/NOMBRE AL CUAL PERTENECE/IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROPUESTA

31 - 10 - 2023	15:38	P	A	P-20-13-849

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA
Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com

Página 1



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD/FECHA DE EXPEDICION: NEIVA, 24 DE OCTUBRE DE 2023 | POLIZA NUMERO: 0934431-1 | REFERENCIA DE PAGO: 013139117774

INTERMEDIARIO: 64327 PROVEEDS ASESORES | CODIGO: 64327 | OFICINA: 3514 | DOCUMENTO NUMERO: 13911774

TOMADOR: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANTA | NIT: 9004682372

ASEGURADO: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANTA | NIT: 9004682372

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

DIRECCION DE COBRO: CR 3A # 4 - 17 VILLA AMAZONICO | CIUDAD: ALBANTA | TELEFONO:

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
0120017568000, NO. DE CONTRATO
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE $30,000,000 PARA CUBRIR LOS
PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO
EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE, AL TENER QUE LA DE EXACTICOS
EXTRAPATRIMONIALES.
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 1979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE
ALBANTA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALES
EL KASCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA
Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com

Página 2

4..8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, sin embargo, junto con la interventoría se adoptarán las siguientes medidas, con el fin de garantizar la calidad y correcta ejecución de las obras suscritas al convenio anteriormente mencionado.

- Se solicitó un estudio de suelos con el fin de saber cuál fue la capacidad portante por medio del CBR
- Se solicitó un estudio de topografía con el fin de localizar y replantear lo niveles de la vía.
- Se solicitó realizar los cilindros de concreto, con el fin de llevarlos al laboratorio y saber cuál es la resistencia a la comprensión.

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL

4.9.1 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO

JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA

PRESUPUESTO DE OBRA | **CRONOGRAMA DE OBRA**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (ML)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN	UBICACIÓN: KILOMETRO 2 VIA ALBANIA - CURILLO, 3 KILOMETROS DEL KILOMETRO 2 HASTA LA ESCUELA LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
CAQUETA	ALBANIA	ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA	158,00	CAQUETÁ	15/05/2024	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 198.509,00	$ 198.509,00
							SUB-TOTAL	$ 198.509,00
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	308,88	$ 52.100,00	$ 16.092.422,00
3	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	132,96	$ 105.392,00	$ 14.012.604,00
4	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	89,56	$ 871.159,00	$ 78.017.515,00
5	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	40,49	$ 346.742,00	$ 14.040.971,00
6	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.272,23	$ 6.321,00	$ 27.004.761,00
7		1.978,00		Desmonte e instalacion de cercos paralelos a la placa huella	MI	150,00	$ 6.951,09	$ 1.042.664,00
							SUB-TOTAL	$ 150.210.937,00
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 150.409.446,00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) PLAN DE INVERSION SOCIAL	$ 2.200.000,00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.789.360,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 198.398.806,00

EL ALCANCE DEL PRESENTE PROYECTO EQUIVALE A 158 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA.

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 25202- 119996 CND

Revisó: Firma PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula Profesional: 2520256474CND

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

JUNIO DE 2024				JUKIO DE 2024					AGOSTO DE 2024			
DEL 01 AL 09	DEL 10 AL 16	DEL 17 AL 23	DEL 24 AL 30	DEL 01 AL 07	DEL 08 AL 14	DEL 15 AL 21	DEL 22 AL 28	DEL 29 AL 04	DEL 05 AL 11	DEL 12 AL 18	DEL 19 AL 25	DEL 26 AL 01
198.509												
5.364.143	5.364.143	5.364.143										
	4.670.868	4.670.868	4.670.868									
		7.092.503	7.092.503	7.092.503	7.092.503	7.092.503	7.092.503	7.092.503	7.092.503	7.092.503	7.092.503	7.092.503
				2.340.162	2.340.162	2.340.162	2.340.162	2.340.162	2.340.162			
		2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978
521.332	521.332,00											
6.093.982	10.556.341	19.582.488	14.218.349	11.887.841	11.887.841	11.887.841	11.887.841	11.887.841	11.887.841	9.547.480	9.547.480	9.547.480
4%	7%	13%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	6%	6%	6%

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 25202- 119996 CND

Revisó: Firma PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
Nombre: FABINombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula Profesional: 2520256474CND

4.9.2. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 10/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3979-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	$ 23.800.000,00	$ 23.800.000,00	$ 23.800.000,00		$ 71.400.000,00	35,99%
2	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00		$ 9.000.000,00	4,54%
3	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 2.266.648,00	$ 2.266.648,00	$ 2.266.648,00		$ 6.799.944,00	3,43%
4	TRANSPORTE	$ 4.450.000,00	$ 4.450.000,00	$ 4.450.000,00		$ 13.350.000,00	6,73%
5	COSTO DE PERSONAL	$ 17.353.167,33	$ 17.353.167,33	$ 17.353.167,33		$ 52.059.502,00	26,24%
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 15.263.120,00	$ 15.263.120,00	$ 15.263.120,00		$ 45.789.360,00	23,08%
N							%
TOTAL						$ 198.398.806,00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: **SIXTO JAVIER PARRA RAMIEZ**
Representante Legal o su Apoderado
ASOJUNTAS
C.C 1.117.785.524

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
DIRECTOR DE ITERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Firma:
Nombre: **Jhon Jairo Garcia Calderon**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **25202-119996 CND**

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Se anexa el acta de comité operativo

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No:	Dirección Territorial INVIAS: CAQUETÁ	Fecha: 06-05-2024

Vereda – Municipio - Departamento: ASOJUNTAS – ALBANIA CAQUETA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3979-2023
Ejecutor(es): MUNICIPIO DE ALBANIA

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JUAN CARLOS SANABRIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FABIO JESÚS MEJIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
SIXTO JAVEIR PARRA RAMIREZ	ASOJUNTAS	PRESIDENTE
ING JHON JAIRO GARCIA	ASOJUNTAS	INGENIERO RESIDENTE
EUCARIS PENNA CEBALLOS	ASOJUNTAS	CONTADOR
ALBA ADIELA ZAMBRANO	ASOJUNTAS	VEEDURIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros participantes del comité operativo.
2. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
3. Análisis de cotizaciones presentadas
4. Elección de proveedores.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*


1- Análisis de precios .
2- Elección de proveedores.
3- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
4- Elección de uniformes.
5- Proposiciones y Varios

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen

1

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

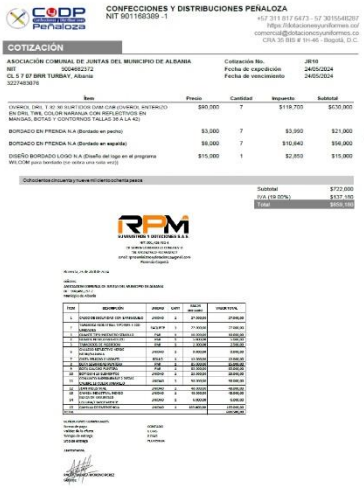1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los cuatro (4) miembros principales, el presidente, el ingeniero residente, contador y un representante de la veeduría.
2.	Presentación de cotizaciones: MATERIALES EPP: En consigna quedo que los uniformes y el botiquín se compraran a CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONES PEÑALOZA y el restante de la dotación con la empresa RPM . 

CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONES PEÑALOZA
NIT 901168389 -1

COTIZACIÓN

ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT 900469272
CL 5 7 67 BRR TURBAY, Albania
3227483676

Cotización No. JR10
Fecha de expedición 24/05/2024
Fecha de vencimiento 24/05/2024

Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Subtotal
CHAQUETA, CAMISA, T. 30-36 SUBTICOS DUAL CAMUFLAJE VERDE/AZUL ENTERIZO EN DRIL TWIL COLOR NARANJA CON REFLECTIVOS EN MANGAS, BOTAS Y CONTORNOS TALLAS 28 A LA 42)	$80.000	7	$119.700	$630.000
BORDADO EN PRENDA N.A (Bordado en pecho)	$3.000	7	$3.990	$21.000
BORDADO EN PRENDA N.A (Bordado en espalda)	$9.000	7	$10.640	$56.000
DISEÑO BORDADO LOGO N.A (Diseño del logo en el programa WILCOM (para bordado (no vale la pena hacerlo por menos de 10 unidades))	$15.000	1	$2.850	$15.000

Cotizaciones cincuenta y nueve mil ciento ochenta pesos

Subtotal	$722.000
IVA (19.00%)	$137.180
Total	$859.180

RPM

2

INVIAS CAMINOS

Se determinó elaborar la topografía con el señor LUIS ALBERTO NAVARRO DIAZ, el cual ofertó su servicios por valor de $ 900.000

COTIZACION TOPOGRAFICA

3

Se determinó seleccionar la empresa GI GLOCON INGENIERIA para la elaboración de laboratorios.

4

Se aprobó adquirir la madera a la empresa MADERAS Y MACHIMBRES de San José del Fragua, quienes cuentan con la certificación y salvoconducto respectivo.

5

3

INVIAS CAMINOS

MADERAS Y MACHIMBRES

LAY

CLARET FERNANDO POLANCO COLLAZOS

FACTURA DE VENTA Nº 255

Señor: Glocon

Dirección: Vía Albania Caquetá

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
5	Doc Teddy 2X15	1'800.000	1'800.000
3	Doc Jardín 5X5	740.000	2'220.000
2	Doc Cuenton 5X10	1'260.000	2'520.000

TOTAL $ 6'540.000

Se Realizó la consulta con la ferretería de la ciudad de Florencia FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S y el precio incluye transporte hasta el sitio de la obra. Por lo tanto, se toma la decisión de adquirir los materiales a FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S.

FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S

NIT 901429482-0

FERRE CERAMICAS

Florencia Caquetá

COTIZACIÓN	00003476
Fecha Exp: 25 Abril 2024	
Vendedor: TADEA MURCIA CRUZ	
Validez de la oferta: 29 de 2024	

Cant	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Vlr Unidad	Subtotal	Iva	Valor Iva	Valor Total
413.00	CEMENTO GRIS X 50 KG ALBATA GRIS 50KG	8706	1UN	34.000	12.551.724,13		4.549.137	17.456.862
400.00	VARILLA CORRUGADA 3/8"X6M LIBRA 1/2	10687	1UN	25.000	8.620.689,66		1.379.310	11.380.000
760.00	VARILLA CORRUGADA 1/2"X6M LIBRA	9705	1UN	16.495	10.502.400,00		2.002.956	12.505.356
50.00	ALAMBRE NEGRO # 18 X 1KG	48707	1UN	7.400	327.586,21		43.965	370.345
25.00	PORTICA CON CARGA 2.7 X 60 CM PUNTA 9370022482			418	64.224,13		10.082	77.206

6

INVIAS CAMINOS

En el proceso de cotización de materiales pétreos se recaudó dos cotizaciones: playa la raya del municipio de Albania y la trituradora de Morelia, se tomo la decisión de comprar el material a la playa la raya debido a que está ubicada en el Municipio de Albania y el trayecto de transporte es menor.

MAEXCA S.A.S

Materiales y Excavaciones del Caquetá

Florencia 24 de abril de 2024

SEÑORES

ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

NIT: 901.488.177-2

ALBANIA CAQUETA

Ref: COTIZACION DE MATERIALES PETREOS

Cordial saludo.

Consolidando sus pretensiones, expedir cotización de materiales dirigido para la vereda las delicias del municipio de Albania Caquetá.

LA GRAVILLA $ 70 000 EL METRO MAS IVA

LA ARENA $80 000 METRO MAS IVA

PEDRA $90 000 METRO MAS IVA

7

De las cotizaciones presentadas para el alquiler de maquinaria se escogió la que tenia los precios mas favorables para la junta.

COTIZACION

SAN JOSE DEL FRAGUA, 24 DE ABRIL DE 2024

SEÑORES

ASOCIACION ALBANIA

NIT. 901.488.177-2

ALBANIA CAQUETA

ITEM	TIEMPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	1.00 MES	RANA COMPACTADORA DE ARTIGAS	UN-D	2	$ 896.000	$ 832.202
2	1.00 MES	NIVELADORA CAT CONDUCTOR DE ELL	UN-D	1	$ 1.650.000	$ 1.650.000
3	1.00 MES	RETROEXCAVADORA	UN-D	1	$ 1.900.000	$ 1.900.000
4	1.00 MES	VOLQUETA DE 6 METROS	UN-D	1	$ 1.900.000	$ 1.900.000

CARLOS ALBERTO FERNANDEZ VARGAS

C.C. 11.826.777 de Neiva Huila

8

5

INVIAS CAMINOS

Cotización de exámenes pre-ocupacionales se recibieron dos cotizaciones: CLIP SALUD Y LA DOCTORA MARTHA LUZ ALTAMAR , después de realizada el análisis de precios, se toma la decisión de realizarlos

PRECIOS 2024 _Juntas de acción comunal

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	VALOR UNITARIO
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular de ingreso Egreso, Periódicos- (realizados en jornada de salud, en las instalaciones de la empresa)	$ 50.000
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular de ingreso Egreso, Periódicos-(TELEMEDICINA)	$ 40.000
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular (Ingreso, periódicos, egresos) Realizados en Florencia	$ 25.000

Martha Luz Altamar de los Reyes

Médico especialista SST. Lic. 0245

9

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se analizaron cada una de las cotizaciones y se tomó la decisión de elegir los proveedores que realizaran los suministros de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____

6

INVIAS

3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI____ NO ___X_	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI____ NO _X___	No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
REMITIR LAS ACTAS DEL COMITÉ OPERATIVO	CONTADOR / INGENIERO	10-05-2024
ELABORAR EL PLAN DE INVERSION	CONTADOR / INGENIERO	10-05-2024
PRESENTAR LOS CONTRATOS DE LOS PROFESIONALES	CONTADOR	10-05-2024
ENVIAR EXAMENES LABORALES DE INGRESO.	CONTADOR	10 05 2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Cargo: Director de interventoría

Nombre: SIXTO JAVIER PARRA
Cargo: Presidente OAC

Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Cargo: Residente de interventoría


Nombre: ALBA ADIELA ZAMBRANO
Cargo: VEEDURIA

7


4.12. ACTAS DE REUNIÓN

Se anexa el acta de socialización



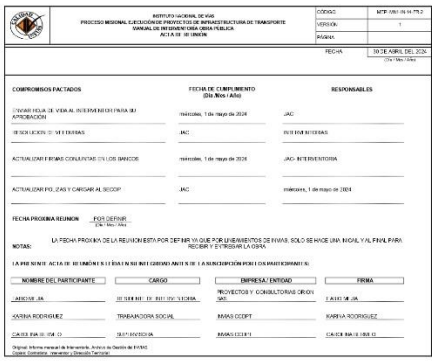

Anexo listado de asistencia

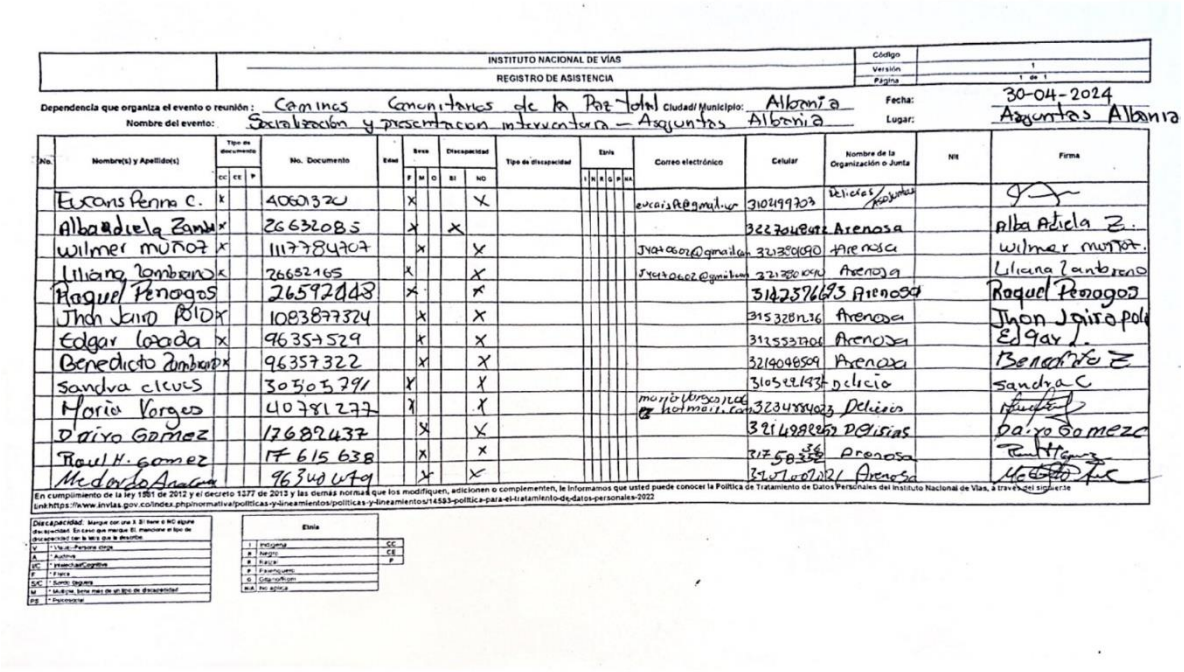

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
REGISTRO DE ASISTENCIA

Dependencia que organiza el evento o reunión: Caminos Comunitarios de la Paz Total Ciudad/ Municipio: Albania Fecha: 30-04-2024
Nombre del evento: Socialización y presentacion interventoria – Asquntas Albania Lugar: Asquntas Albania

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	G	P	RA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	NIt	Firma
	Elcans Penna C.	X			4060320		X				X								3102199703	Delicias/Asquntas		
	Albadiela Zamb	X			26632085		X			X									3227048982	Arenosa		Alba Adiela Z.
	wilmer muñoz	X			1117784707			X			X							JVAT0602@gmail.com	3213901090	Arenosa		wilmer muñoz.
	Liliana Zambrano	X			26652165		X				X							Jvat0602@gmail.com	3213801090	Arenosa		Liliana Zambrano
	Raquel Penagos				26592048		X				X								3142576693	Arenosa		Raquel Penagos
	Jhon Jairo Polo	X			1083877324			X			X								3153281736	Arenosa		Jhon Jairo Polo
	Edgar Lozada	X			96354529			X			X								3115537706	Arenosa		Edgar
	Benedicto Zambra	X			96357322			X			X								3214048589	Arenosa		Benedicto Z
	sandra cleves				30505791		X				X								3105421937	Delicia		Sandra C
	Maria Vargas				40781277		X				X							mariavargas1cc@hotmail.com	3234880403	Delicias		
	Daiva Gomez				17689437			X			X								3214882652	Delicias		Daiva Gomez
	Raul H. gomez				TI 615 638			X			X								3175835[illegible]	Arenosa		
	Medardo Arenas				96340479			X			X								3147407021	Arenosa		

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14583-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, marcone el tipo de discapacidad con la letra que le describe
V. - Visual - Persona ciega
A. - Auditiva
DC. - Intelectual/Cognitiva
F. - Física
SC. - Sordo- Ciega
M. - Multiple, tiene mas de un tipo de discapacidad
PS. - Psicosocial

Etnia

1	Indígena	CC
2	Negro	CE
3	Raizal	P
4	Palenquero	
5	Gitano/Rom	
N.A.	No aplica	

Powered by CamScanner

1. **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

1.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA *No. 4647 de 2023*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	*4647 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS*
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*

CONTRATISTA	*PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS*
VALOR TOTAL	*$ 109.303.594*
VALOR ACUMULADO	*$ 109.303.594*
PLAZO INICIAL	*6 MESES*
PLAZO PRORROGA No. 1	6 MESES
PLAZO ACUMULADO	9 MESES Y 16 DIAS
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	9 MESES Y 16 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1	*30 DE JUNIO DE 2024*
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2	*16 DE OCTUBRE DE 2024*

*Tabla **2**. Información general contrato 4647 de 2023*

1.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

- Durante este periodo la interventoría realizo visitas a campo y realizo seguimiento desde la oficina central.

El porcentaje de avance físico y financiero de interventoría es de 7% correspondiente a $7.500.000

2. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato donde hace referencia el vehículo utilizado por el residente

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31/JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3979de 2023, 3714 de 2023, 4440 de 2023, 3674 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DIAMANTE

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	MOTOCICLETA																	**A**	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

NUMERO DE PLACA:FIF85G MARCA: BENELLI CILINDRAJE 500CC MODELO:2023

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: LOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INTERVENTORIA SE LES REALIZARÁ MANTENIIENTO PREVENTIVO TODO LOS 5 DE CADA MES QUE ESTE EN EJECUCION DEL PROYECTO

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo el personal que laboró para PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

Anexos planilla paga del mes de junio de 2024

Anexo certificación del pago de seguridad social del mes de JUNIO de 2024



ORION
901503188-3

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
CRA 83 B # 15-98 CALI E-mail mabelchud@yahoo.com

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

CERTIFICA

Que para la ejecución del contrato de interventoria 4647 de 2023 firmado entre el **INVIAS**, y **PROYECTO Y CONSULTORIAS ORION SAS** se realizaron los respectivos pagos de seguridad social (**SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA**) durante el periodo de JUNIO de 2024, estando a paz y salvo en este periodo.

Para constancia de lo anterior se firma en Cali, Valle del Cauca a los 30 días del mes de JUNIO del 2024

Razón Social: **PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.**
Representante legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
C.C 31.577.305 DE CALI
Dirección: CRA 83 B # 15-98 CALI
Teléfono: 3224097491
E-mail mabelchud@yahoo.com
Ciudad: CALI

2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo el avance financiero y presupuestal de interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

MES INFORME MENSUAL: jun-24 — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIOS: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1315123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00
				TOTAL		$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 109.303.594,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	abr-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2023	$ 109.303.594,00	$ 98.803.594,00		
2	may-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2024	$ 109.303.594,00	$ 88.303.594,00		
3	jun-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2025	$ 109.303.594,00	$ 77.803.594,00		
TOTALES		$ 25.515.000,00	$ 5.985.000,00	$ 31.500.000,00	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 25.515.000,00	$ -	$ 25.515.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -	$ -	$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -	$ 5.985.000,00	$ 5.985.000,00
VALOR TOTAL	$ 25.515.000,00	$ 5.985.000,00	**$ 31.500.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. :

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial

2.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato de garantías

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 1: 30/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 2: 16/10/2024

VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.


2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo pólizas

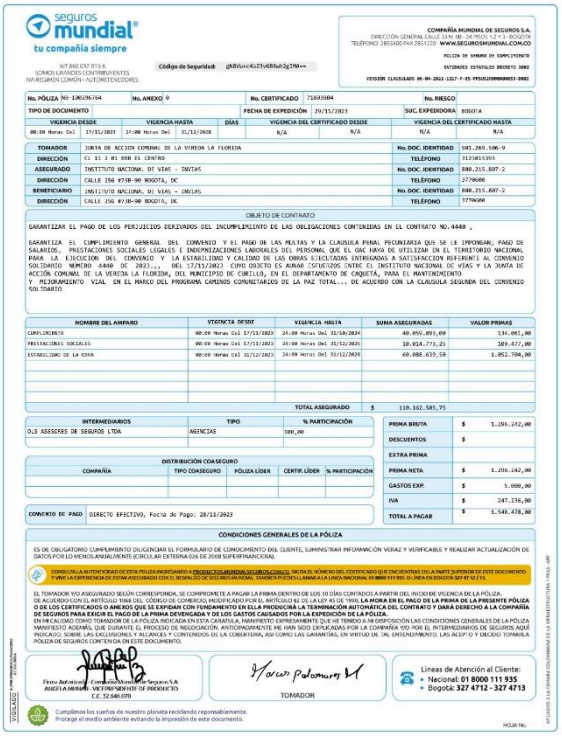

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855500 FAX: 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100296764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 3 A1 #3A ESTE CENTRO	TELÉFONO	3123853593
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4440 ,

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023,,, DEL 17/11/2023 COMO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURTILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.095.893,60	134.061,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2025	10.014.772,25	189.477,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2029	60.060.839,50	1.052.704,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.162.505,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.295.242,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.295.242,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	247.236,00
TOTAL A PAGAR	$	1.548.478,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PROTECTOSAMUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERÁS LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O, DESDE EN BOGOTÁ, 327 47 12 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE LAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRIAM VICTORIA GERENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855500 FAX: 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100296764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


. TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.

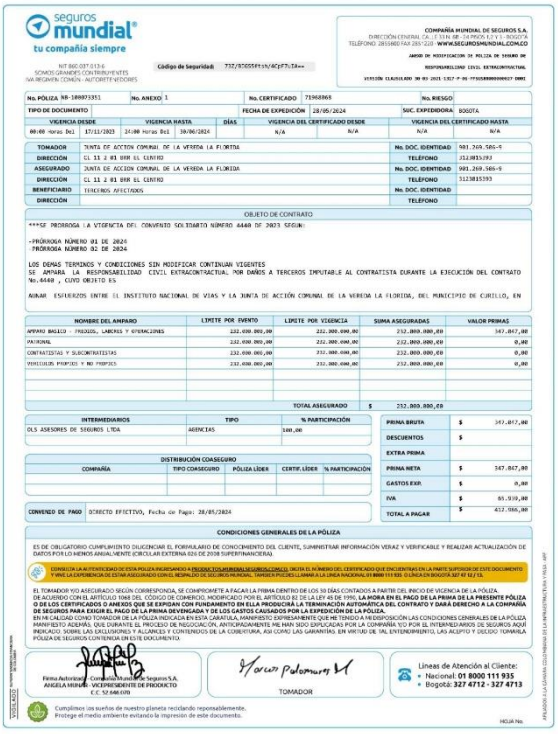

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL. 7 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2853120 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71968868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123835393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123835393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.047,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.047,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.047,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.939,00
TOTAL A PAGAR	$	412.986,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMARNOS A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2853120 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71968868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. , TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA POLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. ,- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

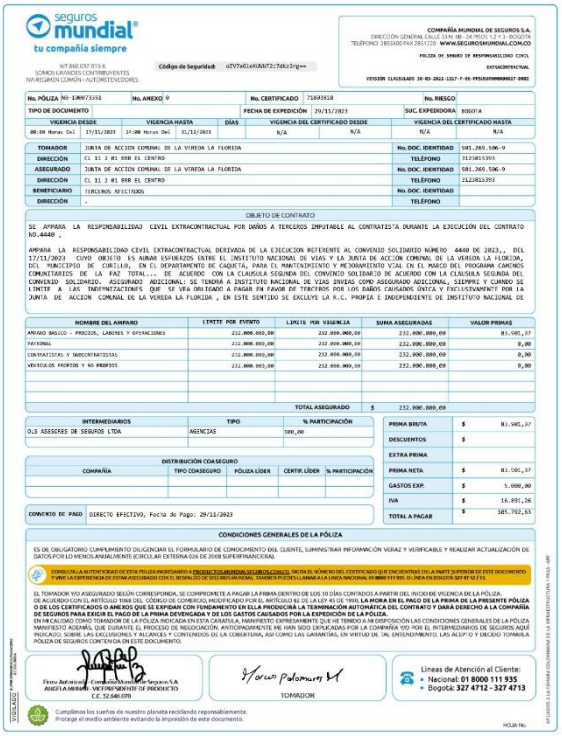

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71803818	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VIREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.596-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 RRR EL CENTRO	TELÉFONO	2128813393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VIREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.596-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 RRR EL CENTRO	TELÉFONO	2128813393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4440 ,

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CUBILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.,, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	83.505,37
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	83.505,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	83.505,37
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	16.891,26
TOTAL A PAGAR	$	105.702,63

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PROTECTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERÁS LA INFORMACIÓN TOMADA ESTRICTAMENTE DE LOS REGISTROS DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O, SI ERES EN BOGOTÁ, 327 47 12 (7 13).

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÉ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE LAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRANDA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71803818	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.596-9. TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS. NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4460 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

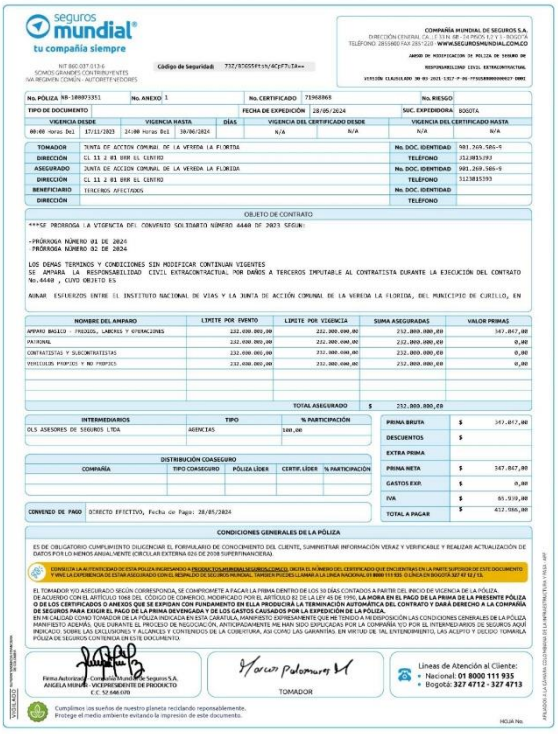

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 732/BTOOSFtih/4CpF7rIA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL. 7 13 N. 08 - 24 PISOS 1 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2851600 FAX 285 1220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUSR000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORITA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3128853393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	5123835393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURITI, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.047,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.047,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.047,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.939,00
TOTAL A PAGAR	$	412.986,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMARNOS A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR SU INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRUS - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 13 N.58 - 24 PISOS 1 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUSR000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 - Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9. - TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.1. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. - - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"


Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

2.5 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

2.5.1 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Anexo plan de cargas

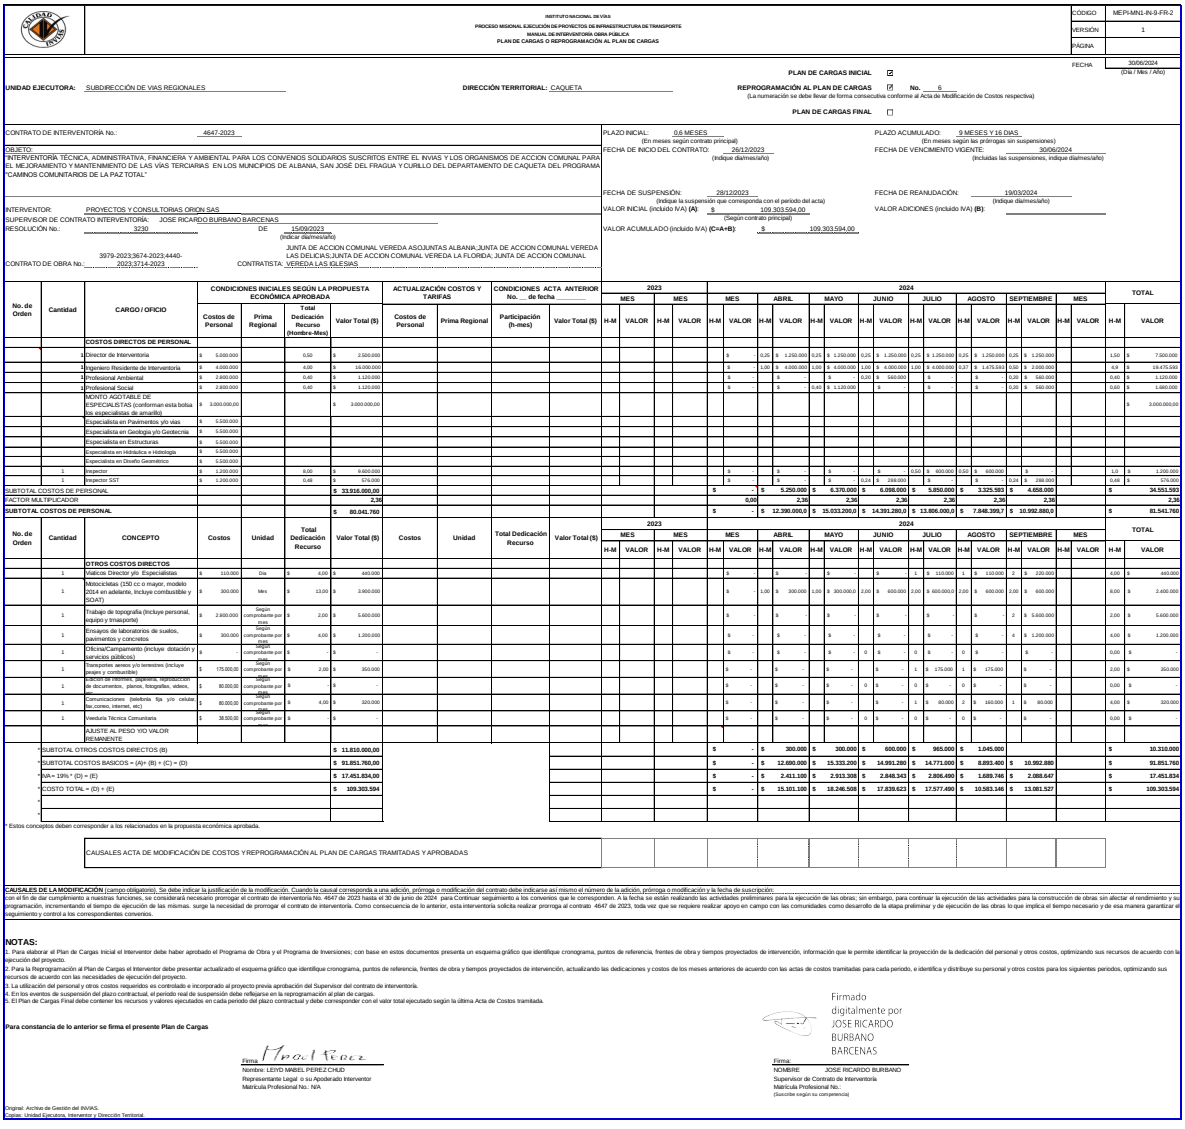

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-3-FR-2 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA | FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑ — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ No. 6 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva) — PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

PLAZO INICIAL: 0,6 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 16 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: 19/03/2024 (Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 3230 DE 15/09/2023 (Indicar día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 109.303.594,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): —

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 109.303.594,00

CONTRATO DE OBRA No.: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA: Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costos de Personal	Prima Regional	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha ____: Participación (h-mes)	Valor Total ($)	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	MES H-M	MES VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																
	1	Director de Interventoria	$ 5.000.000		0,50	$ 2.500.000											$ 0,25	$ 1.250.000	$ 0,25	$ 1.250.000	$ 0,25	$ 1.250.000	$ 0,25	$ 1.250.000	$ 0,25	$ 1.250.000			1,50	$ 7.500.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.000.000		4,00	$ 16.000.000											$ 1,00	$ 4.000.000	$ 1,00	$ 4.000.000	$ 1,00	$ 4.000.000	$ 0,37	$ 1.475.593	$ 0,00	$ 0,00	4,37	$ 13.475.593
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000											$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,20	$ 560.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,20	$ 560.000			0,60	$ 1.120.000
	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000											$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,40	$ 1.120.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,40	$ 560.000			0,80	$ 1.680.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00																												$ 3.000.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.500.000																															
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.500.000																															
		Especialista en Estructuras	$ 5.500.000																															
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 5.500.000																															
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.500.000																															
	1	Inspector	$ 1.200.000		0,00	$ 0.600.000											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,50	$ 600.000	$ 0,50	$ 600.000	$ -	$ -			1,00	$ 1.200.000
	1	Inspector SST	$ 1.200.000		0,48	$ 576.000											$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,24	$ 288.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,24	$ 288.000			0,48	$ 576.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 33.916.000,00											$ -	$ 5.250.000	$ 6.370.000	$ 6.098.000	$ 5.850.000	$ 3.325.593	$ 4.658.000										$ 34.551.593
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36											0,00	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36										2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 80.041.760											$ -	$ 12.390.000,0	$ 15.033.200,0	$ 14.391.280,0	$ 13.806.000,0	$ 7.848.399,7	$ 10.992.880,0										$ 81.541.760

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	MES H-M	MES VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 110.000	Dia	$ 4,00	$ 440.000											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 110.000	$ 1	$ 110.000	$ 2	$ 220.000			4,00	$ 440.000
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 300.002	Mes	$ 13,00	$ 3.900.000											$ -	$ -	$ 1,00	$ 300.000	$ 1,00	$ 300.000,0	$ 2,00	$ 600.000	$ 2,00	$ 600.000,0	$ 2,00	$ 600.000			8,00	$ 2.400.000
	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.800.000	Según comprobante por mes	$ 2,00	$ 5.600.000											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2	$ 5.600.000	2,00	$ 5.600.000
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Según comprobante por dias	$ 4,00	$ 1.200.000											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	4	$ 1.200.000	4,00	$ 1.200.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios publicos)	$ -	Según comprobante por	$ -	$ -											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 175.000,00	Según comprobante por	$ 2,00	$ 350.000											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 175.000	$ 1	$ 175.000	$ -	$ -			2,00	$ 350.000
	1	Copias de planos, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos,	$ 80.000,00	Según comprobante por	$ -	$ -											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 80.000,00	Según comprobante por	$ 4,00	$ 320.000											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 80.000	$ 2	$ 160.000	$ 1	$ 80.000			4,00	$ 320.000
	1	Vivienda Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por	$ -	$ -											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														
		*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 11.810.000,00											$ -	$ 300.000	$ 300.000	$ 600.000	$ 965.000	$ 1.045.000										$ 10.310.000
		*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+ (B) + (C) = (D)				$ 91.851.760,00											$ -	$ 12.690.000	$ 15.333.200	$ 14.991.280	$ 14.771.000	$ 8.893.400	$ 10.992.880										$ 91.851.760
		*IVA= 19% * (D) = (E)				$ 17.451.834,00											$ -	$ 2.411.100	$ 2.913.308	$ 2.848.343	$ 2.806.490	$ 1.689.746	$ 2.088.647										$ 17.451.834
		*COSTO TOTAL = (D) + (E)				$ 109.303.594											$ -	$ 15.101.100	$ 18.246.508	$ 17.839.623	$ 17.577.490	$ 10.583.146	$ 13.081.527										$ 109.303.594
		*																														
		*																														

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS YREPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción: con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones, se consideraró necesario prorrogar el contrato de interventoría No. 4647 de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 para Continuar seguimiento a los convenios que le corresponden. A la fecha se están realizando las actividades preliminares para la ejecución de las obras; sin embargo, para continuar la ejecución de las actividades para la construcción de obras sin afectar el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas. surge la necesidad de prorrogar el contrato de interventoria. Como consecuencia de lo anterior, esta interventoria solicita realizar prorroga al contrato 4647 de 2023, toda vez que se requiere realizar apoyo en campo con las comunidades como desarrollo de la etapa preliminar y de ejecución de las obras lo que implica el tiempo necesario y de esa manera garantizar el seguimiento y control a los correspondientes convenios.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma: Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Nombre: LEIVD MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
NOMBRE: JOSÉ RICARDO BURBANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.


3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ la vereda arenosa, desarrolla las actividades programadas a la fecha, sin presentar atrasos en las obras contratadas.

3.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

En el mes de junio no se generó correspondencia

3.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

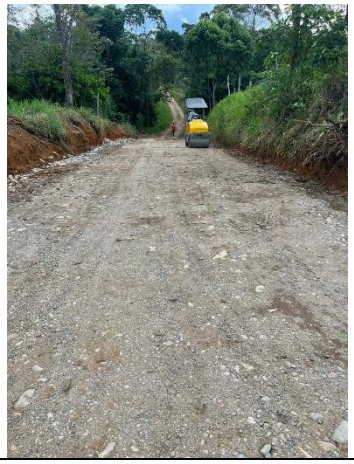	
CONFORMACION ANCHO DE LA BANCA	**INSTALACION DE VALLA Y SEÑALIZACION**
	
INSTALACION DE LA SUB-BASE	**COMPACTACION DE LA SUB-BASE**
	


INSTALACION DEL ACERO DE REFUERZO	**CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO**


3.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

Se anexa fotos de la socialización

	
SOCIALIZACION ARENOSA, ASOJUNTAS 29-04-2024	SOCIALIZACION ARENOSA, ASOJUNTAS 29-04-2024

3.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

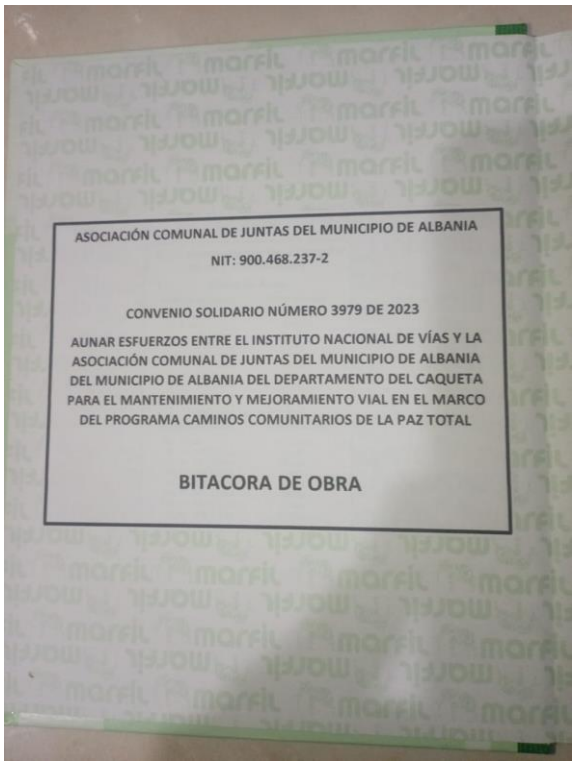

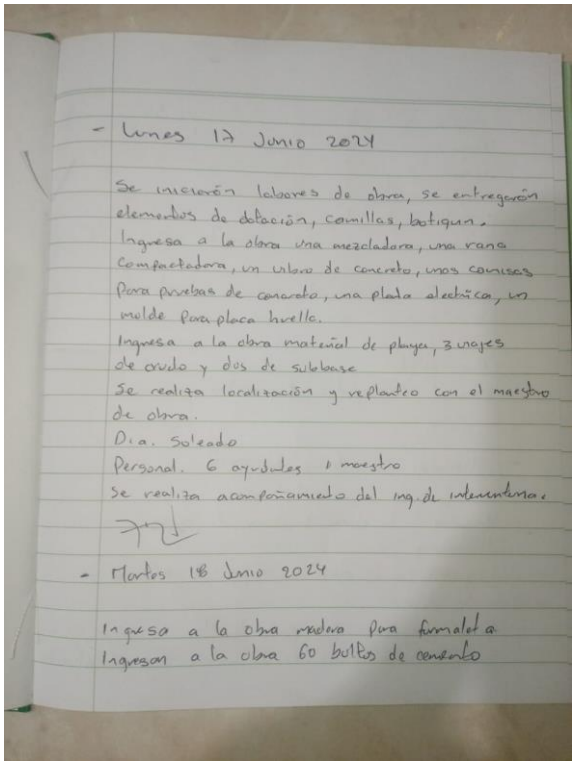


- Lunes 17 Junio 2024

Se inician labores de obra, se entregan elementos de dotación, camillas, botiquin.
Ingresa a la obra una mezcladora, una rana compactadora, un tobo de concreto, unos conos Para pruebas de concreto, una planta electrica, un molde Para placa huella.
Ingresa a la obra material de playa, 3 viajes de cribo y dos de subbase
Se realiza localización y replanteo con el maestro de obra.
Dia. Soleado
Personal. 6 ayudantes 1 maestro
Se realiza acompañamiento del ing. de interventoria.

- Martes 18 Junio 2024

Ingresa a la obra madera Para formaleta
Ingresan a la obra 60 bultos de cemento

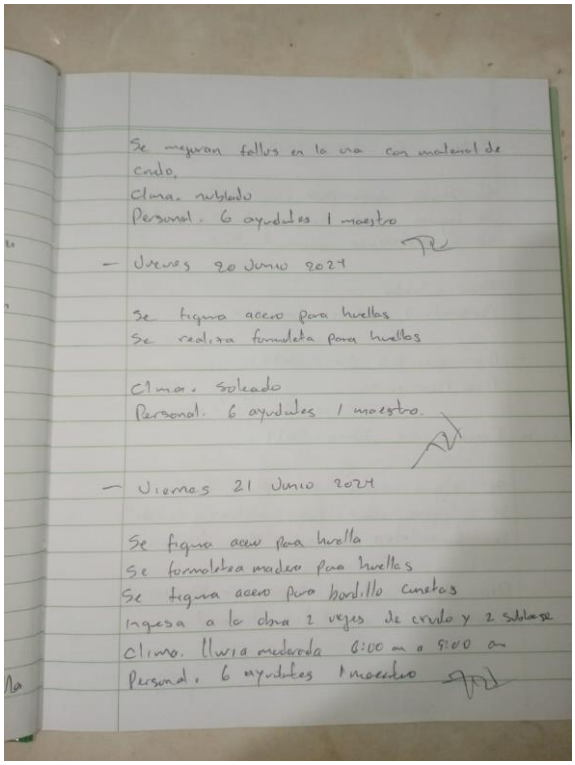

Se mejoran fallas en la via con material de cribo.
Clima. nublado
Personal. 6 ayudantes 1 maestro


- Jueves 20 Junio 2024

Se figura acero Para huellas
Se realiza formaleta Para huellas

Clima. Soleado
Personal. 6 ayudantes 1 maestro.

- Viernes 21 Junio 2024

Se figura acero Para huella
Se formaleta madera Para huellas
Se figura acero Para bordillo cunetas
Ingresa a la obra 2 viajes de cribo y 2 subbase
Clima. lluvia moderada 6:00 am a 9:00 am
Personal. 6 ayudantes 1 maestro

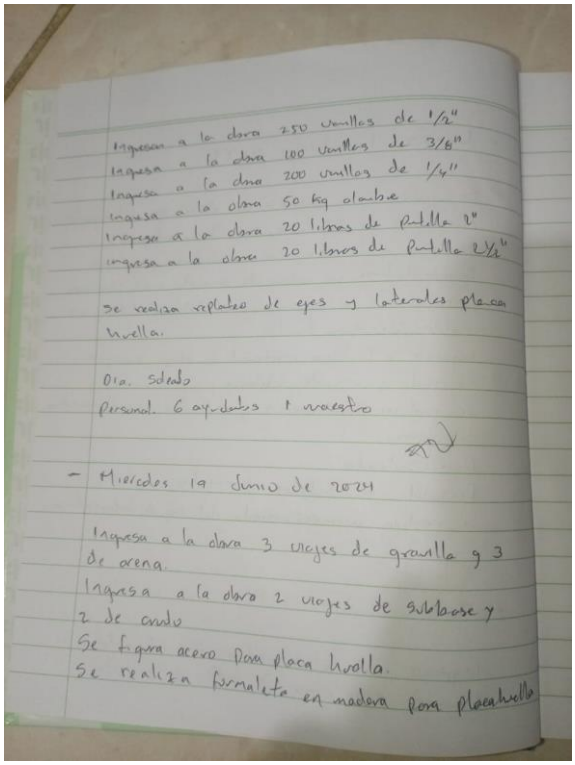


Ingresan a la obra 250 varillas de 1/2"
Ingresa a la obra 100 varillas de 3/8"
Ingresa a la obra 200 varillas de 1/4"
Ingresa a la obra 50 kg alambre
Ingresa a la obra 20 libras de Pintilla 2"
Ingresa a la obra 20 libras de Pintilla 2 1/2"

Se realiza replateo de ejes y laterales placa huella.

Dia. Sabado
Personal. 6 ayudantes 1 maestro

- Miercoles 19 Junio de 2024

Ingresa a la obra 3 viajes de gravilla y 3 de arena.
Ingresa a la obra 2 viajes de subbase y 2 de cauda
Se figura acero para placa huella.
Se realiza formaleta en madera para placahuella

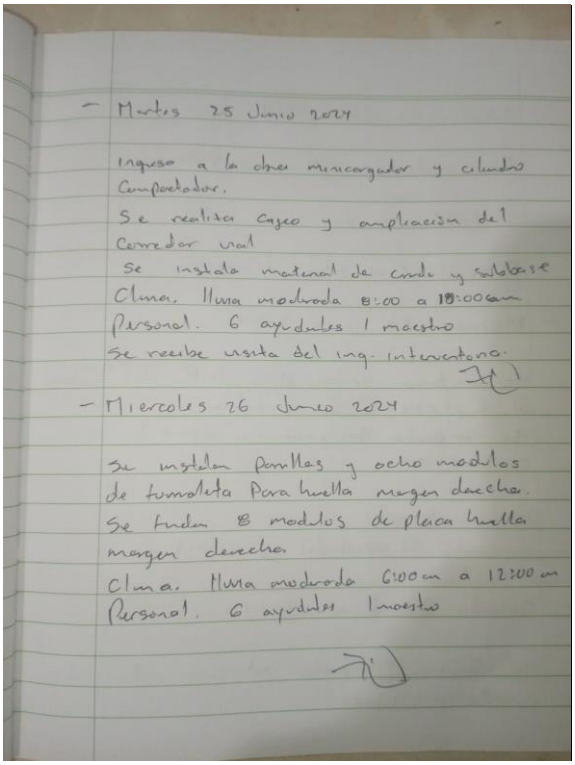


- Martes 25 Junio 2024

Ingresa a la obra mini cargador y cilindro Compactador.
Se realiza cajeo y ampliacion del Corredor vial
Se instala material de cruda y subbase
Clima. lluvia moderada 8:00 a 19:00 pm
Personal. 6 ayudantes 1 maestro
Se recibe visita del ing. interventoria.

- Miercoles 26 Junio 2024

Se instalan pantallas y ocho modulos de formaleta para huella margen derecha.
Se funden 8 modulos de placa huella margen derecha.
Clima. lluvia moderada 6:00 am a 12:00 m
Personal. 6 ayudantes 1 maestro

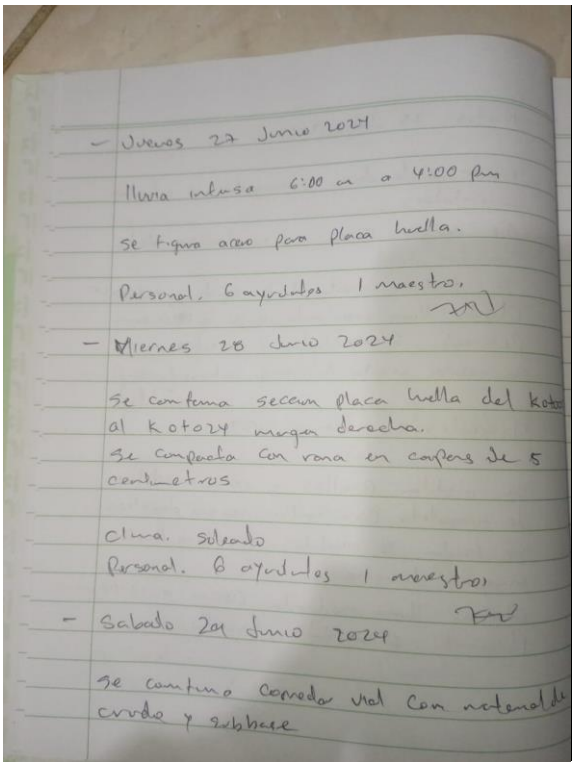

- Jueves 27 Junio 2024

lluvia intensa 6:00 am a 4:00 pm
se figura acero para placa huella.
Personal. 6 ayudantes 1 maestro.


- Viernes 28 Junio 2024


Se continua secado placa huella del km 0+020 al km 0+024 margen derecha.
Se compacta con rana en capas de 5 centimetros


Clima. soleado
Personal. 6 ayudantes 1 maestro.

- Sabado 29 Junio 2024

Se continua corredor vial con material de cruda y subbase

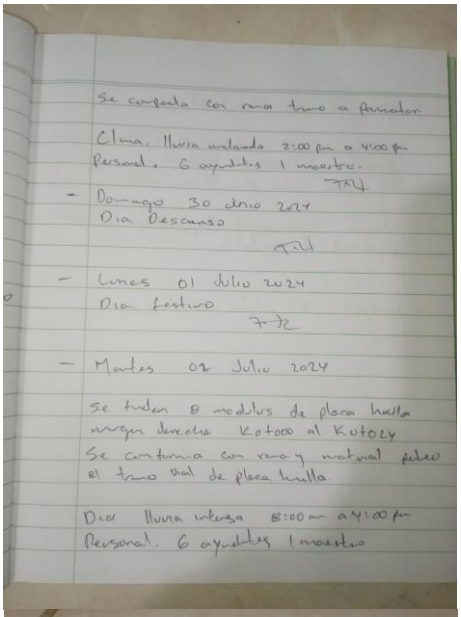
Se conforma con rana tuvo a fundon
Clima. lluvia moderada 2:00 pm a 4:00 pm
Personal. 6 ayudtes 1 maestro.
- Domingo 30 dmio 2024
Dia Descanso
- Lunes 01 Julio 2024
Dia festivo
- Martes 02 Julio 2024
Se fundon 8 modulos de placa huella margen derecho Km000 al Km024
Se conforma con rana y material peteo el tuvo tual de placa huella
Dia. lluvia intensa 8:00 am a 4:00 pm
Personal. 6 ayudtes 1 maestro

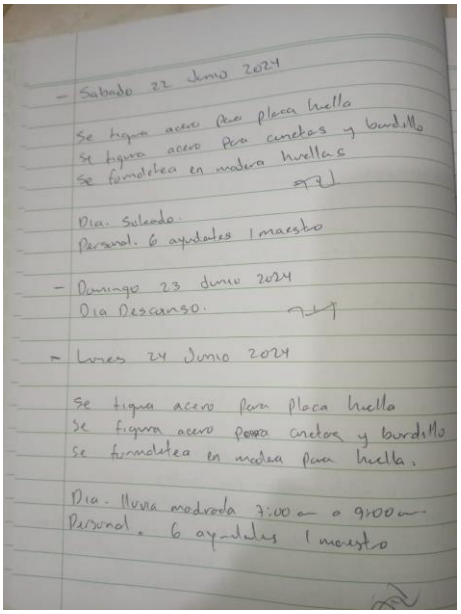
- Sabado 22 Junio 2024
Se figura acero Para placa huella
Se figura acero Para cunetas y bordillo
Se formaleta en madera huellas
Dia. Sabado
Personal. 6 ayudtes 1 maestro
- Domingo 23 dmio 2024
Dia Descanso.
- Lunes 24 Junio 2024
Se figura acero Para placa huella
Se figura acero Para cunetas y bordillo
Se formaleta en madera Para huella.
Dia. lluvia moderada 7:00 am a 9:00 am
Personal. 6 ayudtes 1 maestro

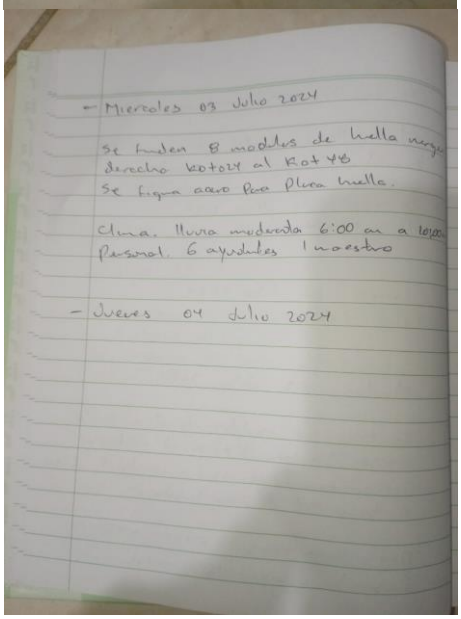
- Miercoles 03 Julio 2024
Se fundon 8 modulos de huella margen derecho Km024 al Km 48
Se figura acero Para placa huella.
Clima. lluvia moderada 6:00 am a 10:00
Personal. 6 ayudtes 1 maestro
- Jueves 04 Julio 2024

Firma:_
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S
Matricula No. 2520237430CND

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°03

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4647-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:
3674 de 2023

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Elaboró:	***Revisó:***	***Aprobó:***
Ing. FABIO JESUS MEJIA *Mat: 2520256474 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*	Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS *Ing. Jose Ricardo burbano*
CARGO: *Residente de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*	***CARGO:*** *Supervisor del contrato*
Fecha: *30 de JUNIO de 2024*	***Fecha:*** *30 de JUNIO de 2024*	***Fecha:***

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3674 de 2023 **Contratista:** JAC VEREDA DELICIAS

Contrato de Interventoría No. 4647 de 2023 **Interventoría:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** JUNIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	69
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	70
1	**INTRODUCCIÓN**		73
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		73-75
2.1	Localización		75
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		76
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		76-77
2.4	Características técnicas del proyecto		78-79
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		80
3.1	Información general del contrato		80
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		81
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		81
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		81
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		82
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	82-85
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	86
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	86
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	86
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	86
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	86-88
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	88-89
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		90
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	90
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	90
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	90
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		90
5.1	Información general del contrato		90-91
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		91
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	91
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	91
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	91
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	91-92
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		92
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	92
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		92
8	**Anexos**		93
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		93
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		93
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		93
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		93

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ **de fecha** _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se relaciona adjunto el formato diligenciado del resumen del estado general del proyecto, se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto, en el cual se evidencia que el contratista ya inicio obra. Y presenta un avance físico y financiero del 13%

NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3674- 2023

OBJETO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DAMAS

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/04/2024
PLAZO DE VENCIMIENTO ACTUAL 16/10/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.548.773,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): 0
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 0
ANTICIPO CONCEDIDO: 0
ANTICIPO AMORTIZADO: 0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** . Leidy Carolina Bermeo Castro

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	PLACA HUELLA	ML	161
	ALCANTARILLA DE 36"	UNIDAD	1
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	PLACA HUELLA	ML	3	
	ALCANTARILLA	UND	1	$ 9.950.000,00
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 121.420.500,03	28.481.562,97	$ 149.902.063,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOST			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 9.950.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 25.950.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	13,00%

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 21.019.500,00	4.930.500,00	$ 25.950.000,00	
AJUSTES				$ 9.950.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SE				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				$ 25.950.000,00

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1
CORTE DE LA BANCA 5 M



Foto 2
MATERIAL DE SUB- BASE INSTALADO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-37430

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. LOCALIZACIÓN 7
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 8
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 3674 de 2023 11
3.1INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 12
3.3SEGUIMIENTO ITEN NO PREVISTO
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12
4.1. INFORME SEMANAL 12
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 15
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 15
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 18
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 19
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 20
4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 20
4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 27
4.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 27
4.10. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 28
4.11. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 29
4.12. ACTAS DE REUNIÓN 31
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA……21
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO……21

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR……21

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA22

6.1 EQUIPOS Y VEHICULOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA……22

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……22

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL……22

6.5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS……22

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……..23

8. ANEXOS……24

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO……24

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS……24

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS……..24

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE……24

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidario.

En este informe se presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.03** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024** el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

.1.2 hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los siguientes convenios:

- ✓ **Convenio No. 3674 con número de proceso SPSC-CD-CS-419-2023, ID de contrato y que tiene por objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ANTECEDENTES

La economía del municipio está basada en la agricultura, complementada con la ganadería, la coca y aprovechamientos forestales

A el municipio de San José del Fragua, Currillo y Albania se accede por la ruta troncal del Llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por la empresa Coomotor Por vía terrestre, además de su vecina, se accede por Villavicencio en el vecino departamento del Meta en el norte, Mitú (Vaupés) al este y Leticia (Amazonas) en el sur.
.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente, proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

San José del Fragua, Currillo y Albania son municipios del departamento del Caquetá, en Colombia localizado en la Zona sur del país, en la región Amazonia. Con 88 965 km² es el tercer departamento más extenso —por detrás de Amazonas y Vichada

Los puntos a intervenir en la vereda DELICIAS se localizan en las siguientes coordenadas:

PUNTO 1 ALCANTARILLA (ANTIGUA ESCUELA): 2° 04' 40,3168" N 72° 43' 05,7711" W

PUNTO 2 PLACA HUELLA (ANTIGUA ESCUELA): 2° 04' 02,9242" N 72° 42' 07,1726" W

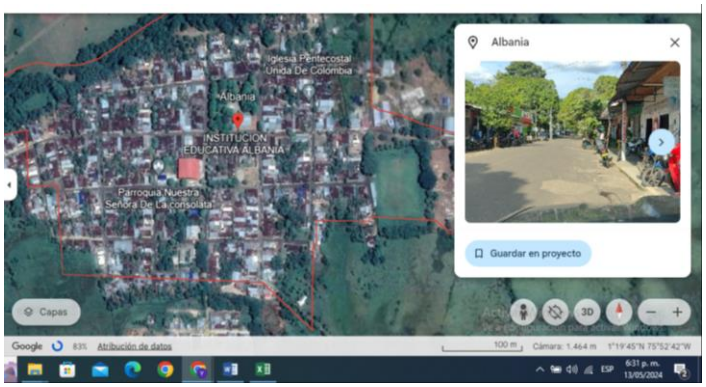


Ilustración 4 - Localización del tramo a intervenir en la vereda Las Damas
Fuente: FICHA VISITA TÉCNICA DIAGNOSTICO DE VÍAS - INVIAS

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a la asociación de junta de Albania (la arenosa), **vereda las delicias**, florida del municipio de Currillo y la vereda iglesias del municipio de San José del Fragua, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos.

Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

CONVENIO 3674 – 2023:

OBJETO "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

La vereda Delicias del Municipio de Albania está ubicada aproximadamente a 8 kilómetros del casco urbano y limita con las veredas la unión, Berlín y la 76, dicha vereda posee una vía terciaria con una extensión aproximada de 13 km.

El tramo a intervenir está ubicado cerca al puente quebrada grande el estado general de la superficie o rodadura presenta hundimientos puntuales a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias los cuales impiden la transitabilidad de cualquier tipo de vehículo en época de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es de 6 m aproximadamente. No cuenta con cunetas, carece de obras hidráulicas y falta realizar mantenimiento a las existentes, se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

En la vía no hay obras de arte

Ilustración 5 – Inventario y estado inicial de la vía
Fuente: FICHA VISITA TÉCNICA DIAGNOSTICO DE VÍAS – INVIAS

3.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	
ALCANCE DEL PROYECTO	*LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS", PARA LO CUAL SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA VISITA TÉCNICA REALIZADA POR LOS PROFESIONALES DESIGNADOS POR EL INVIAS, EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL - OAC, EN DONDE SE REALIZÓ UNA CONCERTACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR, UTILIZANDO LOS DISEÑOS TIPO ESTABLECIDOS EN LA CARTILLA DE OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURALES VIALES, NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONVENIO Y PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DEL SECTOR A INTERVENIR.*
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CONVENIO 3674 – 2023	*CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLAS DE 36".Y 161 ML DE PLACA HUELLA LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES PRESENTADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES.* *LA ALCANTARILLA CIRCULAR, COMO ELEMENTO DE DRENAJE TRANSVERSAL SE TRABAJARÁ CON*

	TUBOS DE 36" DE CONFIGURACIÓN TIPO ALETA-ALETA LA CUAL PERMITE, ADEMÁS DE RECIBIR Y EVACUAR LA ESCORRENTÍA APORTANTE POR LAS CUNETAS Y FILTROS, DAR CONTINUIDAD A CAUCES CON FLUJOS INTERMITENTES O EFÍMEROS.

Tabla 4. Características técnicas del proyecto

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 3674 de 2023

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VEREDA LAS DELICIAS

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA No. 3674 de 2023

TIPO DE PROCESO	*CONTRATACIÓN DIRECTA*
NÚMERO DE PROCESO	*SPSC-CD-CS-419-2023*
CONVENIO NO.	*3674 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS*
OBJETO	*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*
CONTRATISTA	*JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS*
NIT	*901.648.219-6.*
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – PGN	*$198.548.773*
APORTE EN ESPECIE OAC	*$1.000.000*
VALOR TOTAL	*$ 199.548.773*
ADICIONES	*$ 0.00*

FECHA DE INICIO	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*31 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 01	*30 DE ABRIL DE 2024*
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 2	*16 DE OCTUBRE DEL 2024*

Tabla 5. Información general convenio 3674 de 2023

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- **EXCAVACIONES EN SECO:** Se ejecutaron actividades de remoción de tierra para los anchos de vías según especificaciones técnicas de INIVIAS 5 mts **y** adicional se adecuo el terreno para la instalación de los anillos

- **FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO Fy 4200MPA:** Se realizó corte y doblado de barras corrugadas permitiendo obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño de las huellas

- **CONCRETO 21 MPA:** Vaciado de concreto para las huellas de las vias

Durante el mes de junio se ejecutaron actividades como excavación para perfiles laterales de las vías quedando estas de 5 m de ancho. Se figuró y cortó el hierro y se instalaron en la vía para las huellas longitudinal y transversal de las vías, posterior se vacío un concreto de 3000 psi y se le aplicó ascelerantes para ayudarle a fraguar. Se instalaron los anillos de 36” se instaló el refuerzo para las aletas de la alcantarilla. El porcentaje de obra ejecutado a la fecha es del 15% correspondiente a un valor de $29.000.000

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han presentado ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Realizar visitas periódicas para seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando medidas y que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Semana 10 Delicias

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA: 1
FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 10 del 21/06/2024 al 27/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 181 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 36", CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS; DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE F'Y=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS

CONVENIO No.	3674 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.548.773,00
FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.548.773,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.548.773	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.398.606,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.950.000,00	5%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.000.000,00	4%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 17.950.000,00	9%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9.950.000,00	5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25.950.000,00	13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 16.000.000,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.950.000,00	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.950.000,00	13%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.500.000,00	7%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 5% — Avance o Atraso Físico %: 1%
Meta Física Ejecutada %: 4%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
alcantarillas 36"	Unidad	1
PLACA HUELLA	ML	181

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Obra	Tramo p/a sector 1	Tramo p/a sector 2	Tramo p/a sector (N)	Total	%
Prog	5%			$ 9.950.000,00	13,0%
Ejec	4%			$ 8.000.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física ajustada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás proyecciones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAVIMTA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DELICIAS — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FÍSICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN: MAEICA SAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PASA SE REEMPLAZO POR EL PMA

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

CAMPAMENTO VEREDA DELICIAS

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 30 DE ABRIL
SE INSTALO LA CAJA DE PQRS EN EL CAMPAMENTO DE LAS DELICIAS

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE INICIÓ CON LA CONFORMACION DE LA BANCA A 5 MTS, E INSTALACION DE MATERIAL SUB-BASE POR TRAMOS CORTOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE PROYECTA INICIAR CON EL CORTE Y FIGURADO DEL REFUERZO PARA LAS HUELLAS

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE MET AS FÍSICAS PROGRAMADAS VS MET AS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO:
EJECUTADO:
MANTENIMIENTO — CONSTRUCCION — MEJORAMIENTO — SEÑALIZACION

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONFORMACION DE LA BANCA


ACOPIO DE MATERIAL PETREO


INSTALACION DE SUB- BASE

NOT A: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecutar el proyecto en los días propuestos por el convenio. Realizar visitas periódicas al sitio de la obra, con el fin de verificar que se cumpla con las especificaciones tecnicas del proyecto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: PABLO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25202-194740

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contables, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO | DIVISIÓN | PÁGINA 1 | FECHA 08/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 11 del 28/06/2024 al 4/07/2024 Último Informe Semanal SI [*] (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 163 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 36", CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS; DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE F'Y=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACION PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISION E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS	INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.		
		INTEGRANTES:	UNICO		
CONVENIO No.	3674 de 2023	VALOR INICIAL: $ 199.548.773,00	CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES: -	FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES: -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 199.548.773,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.548.773	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.398.606,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.950.000,00	5%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.000.000,00	4%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 17.950.000,00	9%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseño, gestión social, ambiental, costos indirectos)		100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.000.000,00	6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 29.000.000,00	15%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 17.000.000,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.000.000,00	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.000.000,00	15%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.500.000,00	10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 5% — Avance o Atraso Físico %: 1%
Meta Física Ejecutada %: 4%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
1	alcantarillas 36"	Unidad	1
2	PLACA HUELLA	ML	163
3			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
1	Prog	5%			$ 9.950.000,00	15%
	Ejec	4%			$ 8.000.000,00	
2	Prog					
	Ejec					
3	Prog					
	Ejec					

(* El interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	0
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DELICIAS — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FÍSICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN: MAECHICA SAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PASA SE REEMPLAZÓ POR EL PMA

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

CAMPAMENTO VEREDA DELICIAS

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 30 DE ABRIL
SE INSTALO LA OLLA DE POZO EN EL CAMPAMENTO DE LAS DELICIAS

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE CONTINUA INSTALANDO SUB-BASE DEBIDAMENTE COMPACTADA, Y SE SIGUE VACIANDO CONCRETO DE 3000 PSI CON SU REFUERZO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE CONTINUA CORTANDO Y FIGURANDO ACERO

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE MET AS FÍSICAS PROGRAMADAS VS MET AS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO:
EJECUTADO:

MANTENIMIENTO | CONSTRUCCION | MEJORAMIENTO | SEÑALIZACION

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI



COMPACTACION DE LA BANCA



COMPACTACION DE LA BANCA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecutar el proyecto en los días propuestos por el convenio. Realizar visitas periódicas al sitio de la obra, con el fin de verificar que se cumpla con las especificaciones tecnicas del proyecto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 3120278CND

Original: Informe mensual de interventoría. Duplicado: Dirección de Gestión del SECOP.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Anexo formato

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-4 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3674-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 de 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VIBRO COMPACTADOR	CAT-420 D	2896 KG	ARENOSA																	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I
PAJARITA	CAT-420 D	1875 KG	ARENOSA																	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TROMPO MEZCLADOR	BAUKER	1 BULTO	ARENOSA																	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A
GENERADOR ELECTRICO	BAUKER	110V/220V	ARENOSA																	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	A	I	I
PUILIDORA ELECTRICA	DRIWALL	6500 RPM	ARENOSA																	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOBOMBA	HUMBOLT	1 HP	ARENOSA																	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																				2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	4	3	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																				4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	2	3	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	33	33%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	51	51%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA MAQUINARIA QUE SE REPORTA EN EL CUADRO COMO INACTIVA, SE ENCUENTRAN EN BUES ESTADO, SOLO QUE NO SE REQUIERE UTILIZAR TODOS LOS DIAS

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Intenentor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoria" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JHON JAIRO GARCIA CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-119996 CND

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional N 2520256474 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato de la nómina mes de junio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MEPIMIN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	10/07/2024 (DIA/MES/AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3674 -2023
MES Y AÑO DEL INFORME MENS: jun-24
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 DE 2023
NOMBRE ARL: POSITIVA ARL
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION VEREDA LAS DELICIAS
PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACION DEL CAQUETA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	AURO LUNA DIAZ	17.691.950	MAESTRO DE CONSTRUCCION	$ 2.320.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 1.082.667	$ 75.400	V	ASMETSALUD	30325671	$ 135.400	PORVENIR	30325671	$ 173.300	$ 43.400	$ 21.700	$ 32.500	
2	DANIEL LUNA GUALTERO	1.006.507.315	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 606.667	$ 42.300	V	NUEVA EPS	30325671	$ 75.900	PORVENIR	30325671	$ 97.100	$ 17.000	$ 8.500	$ 12.800	
3	SERGIO PARRA STERLING	17.676.089	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 606.667	$ 42.300	V	ASMETSALUD	30325671	$ 75.900	PROTECCION	30325671	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
4	ARNOL FABIAN BERNAL LUNA	1.118.470.844	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 606.667	$ 42.300	V	NUEVA EPS	30325671	$ 75.900	PROTECCION	30325671	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
5	ERMINSON VARGAS RUIZ	17.616.170	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 606.667	$ 42.300	V	ASMETSALUD	30325671	$ 75.900	PORVENIR	30325671	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
6	JAUN PABLO LEON	1.006.549.106	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 606.667	$ 42.300	V	ASMETSALUD	30325671	$ 75.900	PORVENIR	30325671	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
7	MANUEL ANTONIO PINEDA VE	1.118.470.308	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 606.667	$ 42.300	V	ASMETSALUD	30325671	$ 75.900	PORVENIR	30325671	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 10/07/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.


NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JAICO JAIRO GARCI CALDERON
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: No. 25202 - 119996 CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo planilla pagada mes de junio de 2024

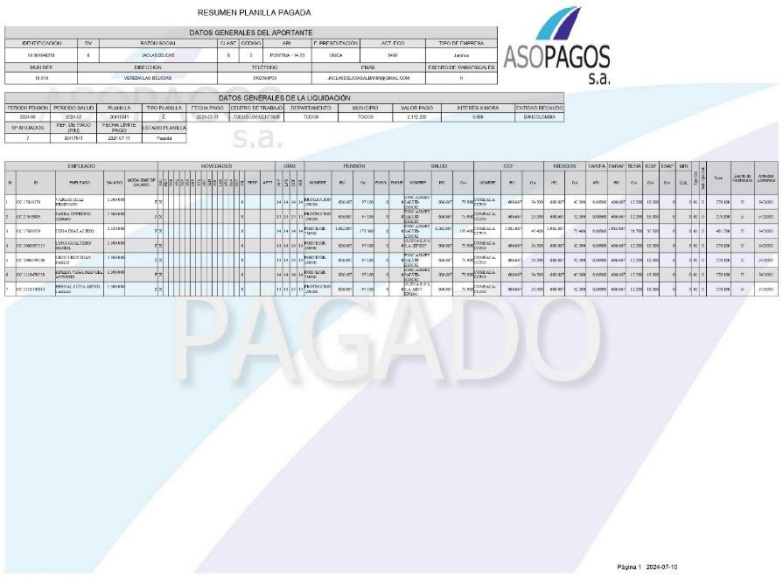
RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	8	JACLASDELICIAS	N	3	POSITIVA - N-03	UNICA	5420	Juridica
MUN DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		ESCRITO DE PARAFISCALES	
18 010	VEREDA LAS DELICIAS		3162969910		JACLASDELICIASALBANIA@GMAIL.COM		N	

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30417241	E	2024-07-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1'112.200	0.000	EFECTIVO/EFT
N° PLANILLA ASOCIADA		FECHA LIMITE PAGO		ESTADO PLANILLA						
2	30417515	2024-07-10		Pagada						

N	ID	EMPLEADO	No. DIAS	NOVEDADES	DIAS	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	Tarifa	Cuota de Fomento	Cotizante Exonerado
1	CC 1[illegible]79	[illegible]	1.300.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	CC 1[illegible]89	[illegible]	1.300.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	CC 1[illegible]15	[illegible]	2.120.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	CC 1[illegible]27	[illegible]	1.300.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	CC 1[illegible]16	[illegible]	1.300.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	CC 1[illegible]49	[illegible]	1.300.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	CC 1[illegible]08	[illegible]	1.300.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGADO

Página 1 2024-07-10

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Ni 901648219	6	JACLAS DELICIAS	0	0	POSITIVA 14 23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-910	VEREDA LAS DELICIAS		3102169703		JACLASDELICIASALBANIA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30417541	E	2024-07-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.112.200	9.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (FSU)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
7	30417541	2024-07-11	Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.722.666	4.722.666	4.722.666	4.722.666	4.722.666

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	755.900	0	3.500	0	759.400
PROTECCION	230201	800229739	0	3	291.300	0	1.400	0	292.700
PORVENIR	230301	800224808	8	4	464.600	0	2.100	0	466.700
EPS(Administradoras: 3)				7	590.800	0	2.800	0	593.600
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	5	439.000	0	2.000	0	441.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	75.900	0	400	0	76.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	75.900	0	400	0	76.300
ARP(Administradoras: 1)				7	329.200	0	1.500	0	330.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	329.200	0	1.500	0	330.700
CCF(Administradoras: 1)				7	189.200	0	900	0	190.100
COMFACA	CCF13	891190047	2	7	189.200	0	900	0	190.100
SENA(Administradoras: 1)				7	94.900	0	500	0	95.400
SENA	PASENA	899999034	1	7	94.900	0	500	0	95.400
ICBF(Administradoras: 1)				7	142.300	0	700	0	143.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	142.300	0	700	0	143.000
Gran Total					2.102.300	0	9.900	0	2.112.200

Página 2 2024-07-10

Anexo certificación JAC vereda delicias

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA LAS DELICIAS
PERSONERIA JURIDICA No. 035 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002
NIT: 901.648.219-6

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, DAIRO GOMEZ CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 17.682.437 de Belén de los Andaquies Caquetá, en mi condición de Representante Legal de LA JAC DE LA VEREDA LAS DELICIAS DE ALBANIA Caquetá, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

CERTIFICO

Que **LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA**, con identificación tributaria NIT. 901.648.219-6, durante el periodo comprendido del 17 al 30 del mes de JUNIO de 2024, realizo el pago de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior dando cumplimiento a la ejecución del CONVENIO 3674 DE 2023.

Según la planilla de pago No. 30417541 en estado pagada a traves del operador ASOPAGOS S.A.

Dada en San José del Fragua Caquetá, a los diez (10) días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

Dairo Gomez

DAIRO GOMEZ CARDENAS
C.C. No. 17.682.437 de Belén de los Andaquies
REPRESENTANTE LEGAL
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS

Email: jaclasdeliciasalbania@gmail.com
Cel: 3214282252

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3674-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS DELICIAS

MES INFORME MENSUAL: 1 — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647 de 2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 198.548.773,00	N/A
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.548.773,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BASICO DEL CONVENIO	$ 121.420.671,00	$ 28.481.391,97	**$ 149.902.063**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.059.500,00	$ 1.890.500	**$ 9.950.000,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6.480.000,00	$ 1.520.000	**$ 8.000.000,00**
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.279.395,00	$ 300.105	**$ 1.279.395,00**
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9.720.000,00	$ 2.280.000	**$ 12.000.000,00**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.490.000,00	$ 5.510.000	**$ 29.000.000,00**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 13.770.000,00	$ 3.230.000	**$ 17.000.000,00**
-			$ -
VALOR TOTAL			**$ 29.000.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
residente de Obra Jhon Jairo Garcia Calderon
Matrícula Profesior25202-119996 CND

Firma
Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N: 25202-37430

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la zona se presentan lluvias leves, pero esto impide el cese de actividades, y por ende no se altera la programación de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3674-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DELICIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		112
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
EN EL TRANSCURSO DEL MES SE PRESENTÓ BUEN CLIMA EN LOS PUNTOS DE INTERVENCION

Firma
Nombre: Jhon Jairo Garcia Calderon
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0553973 CND

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En el sitio de la obra se tomaron muestras de concretos y se elaboraron los cilindros, se espera a que cumpla los días para el fraguado y así poderlos llevar al laboratorio para saber su resistencia a la comprensión.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: JAC VEREDA DELICIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 3674 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 26/12/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO 30/06/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUAL 16/10/2024

VALOR INICIAL: $ 198.548.773,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.548.773,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.499.400,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.499.400,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.909.750,60	5	10	2023	31/12/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	31/12/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.977.438,65	5	10	2023	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.864.631,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100289628

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 15/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100070966 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: NA

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 15/11/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 Y 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1 Y 2 **SUSPENSIÓN No.:** 1 Y 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.909.750,60	5	10	2023	30/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.977.438,65	5	10	2023	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.864.631,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100289628

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100070966 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SRGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: AUN SE ENCUENTRAN EN ESTADO PENDIENTE EN SECOP

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma


Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Se anexan pólizas del convenio.

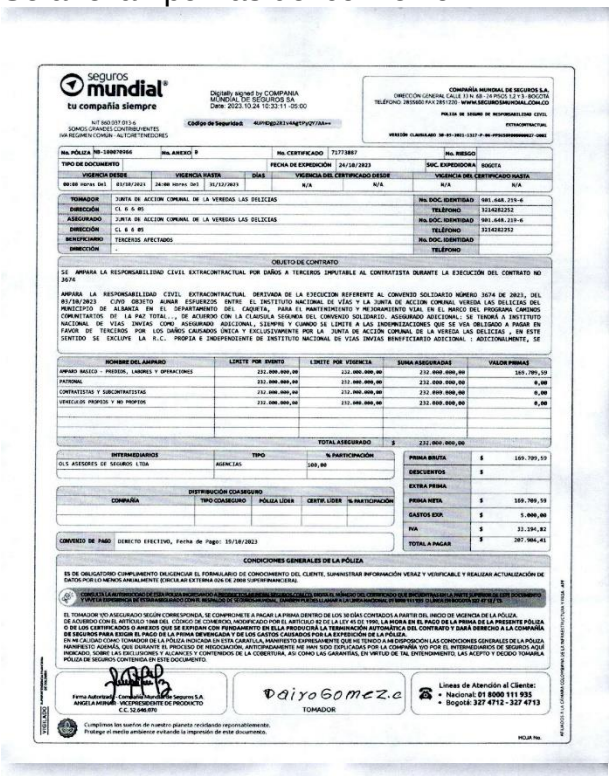

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.10.24 10:33:11 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSUISER0000000027-D001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 4UrtEqpJ2l1+AgQYyQ7/AA==

No. PÓLIZA	98-100070966	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71773887	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/10/2021	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.719-6
DIRECCIÓN	CL 6 6 05	TELÉFONO	3214282252
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	CL 6 6 05	TELÉFONO	3214282252
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 3674

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023, DEL 03/10/2023 . CUYO OBJETO ALNAR ESFUERZOS ENTRE: EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	169.709,59
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	169.709,59
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	169.709,59
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	32.294,82
TOTAL A PAGAR	$	207.004,41

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014 SUPERFINANCIERA).

CONOCE EN LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO, SELECCIONE EL MENÚ DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD E INGRESE EL NÚMERO DE CERTIFICADO O DE ENCUESTA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVA LA EXPERIENCIA DE ESTAR RESPALDADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. CUALQUIER DUDA NOS PUEDE LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 933 O LÍNEAS EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON POSTERIORIDAD EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA DURANTE EL TIEMPO QUE HAYA ESTADO EN VIGOR EL RIESGO.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA MANIFIESTO EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE RECIBIDO A MI SATISFACCIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA. ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRANDA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.040.070

DairoGomez.c
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 933
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

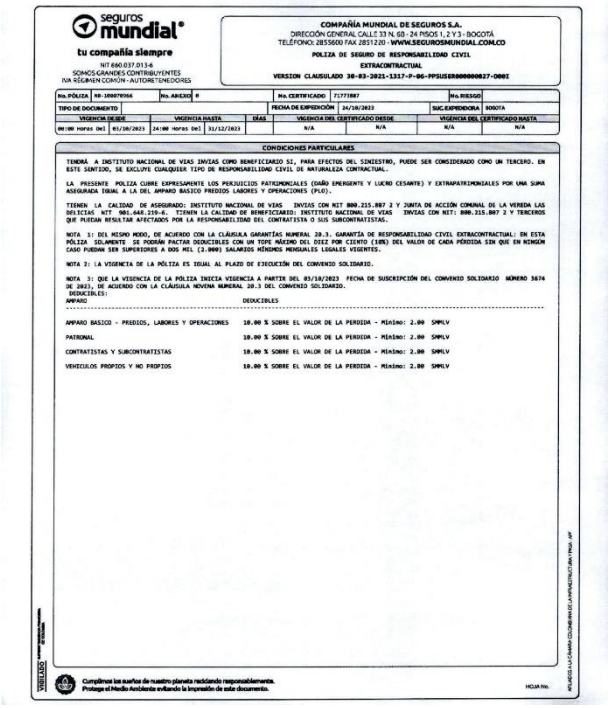

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSUISER0000000027-D001

No. PÓLIZA	98-100070966	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71773887	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/10/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS NIT 901.648.219-6. TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS.

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA ÚNICAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.


NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

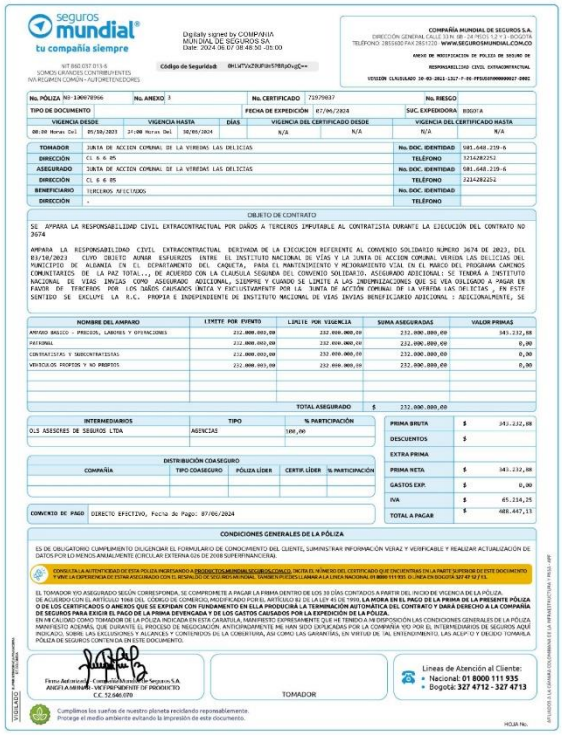

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VIA REGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.07 08:48:50 -05:00

Código de Seguridad: 8H1xTVxZRUFbH5TBRJoUgC==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855500 FAX: 2551230 **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100070966	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71070037		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/06/2024		SUC. EXPEDIDORA	00078
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/10/2023	24:00 Horas Del	30/09/2024	N/A		N/A	N/A	

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	Cl 6 6 85	TELÉFONO	3214282252
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	Cl 6 6 85	TELÉFONO	3214282252
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 3674

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023, DEL 03/10/2023 CUYO OBJETO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.,, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	343.232,88
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OJS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	343.232,88
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	343.232,88
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.214,25
TOTAL A PAGAR	$	408.447,13

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2018 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y ENVÍE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O...NEA EN BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA [illegible] VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.640.070

TOMADOR


Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.

APLICADO A LA CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - PAGO APP

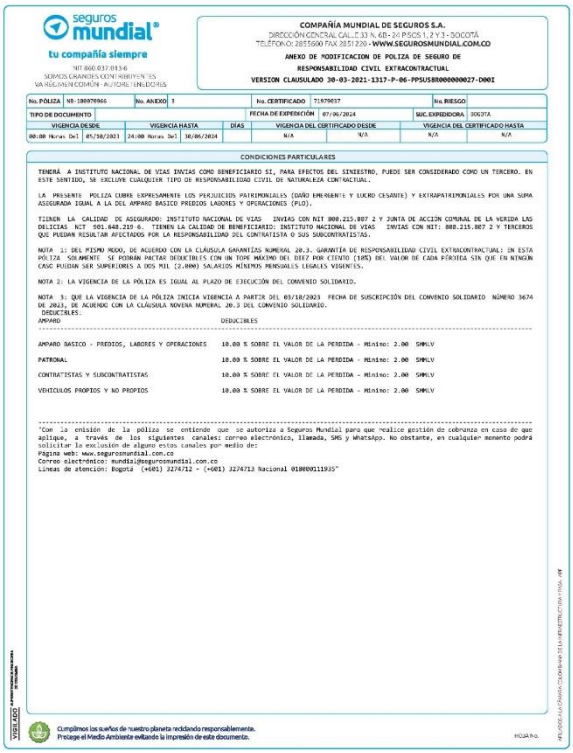

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VIA REGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855500 FAX: 2551230 **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100070966	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71070037		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/06/2024		SUC. EXPEDIDORA	00078
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/10/2023	24:00 Horas Del	30/09/2024	N/A		N/A	N/A	

CONDICIONES PARTICULARES

TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDO SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS NIT 901.648.219-6. TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS.

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV


"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 2274712 - (+601) 2274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

APLICADO A LA CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - PAGO APP

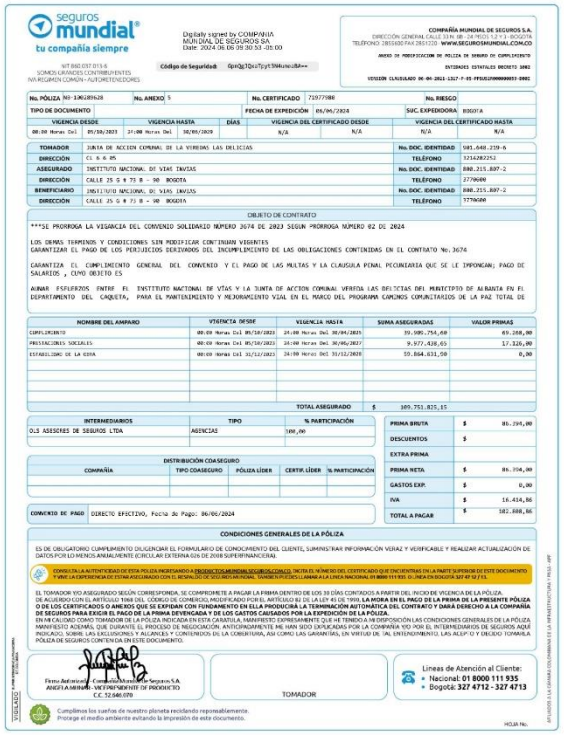

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.06 09:30:53 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2857220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100189628	5	71977988	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	05/06/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 30/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	Cl 5 A # 05	TELÉFONO	3214282252
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	2770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	2770600

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGANCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023 SEGUN PRORROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.3674

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 30/04/2025	39.500.754,60	69.288,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 30/06/2027	9.977.428,65	17.326,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 30/12/2028	10.864.631,90	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 360.751.825,15	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OJS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	86.294,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	86.294,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	16.414,86
TOTAL A PAGAR	$	102.888,86

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2018 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO. INGRESA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O...NEA EN BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA [illegible]
VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.440.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALL.E 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2857220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100189628	5	71977988	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	05/06/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 30/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ACUERDO CON LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

. TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS NIT. 901.648.219-6.

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.

NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.


NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/0/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 202, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.

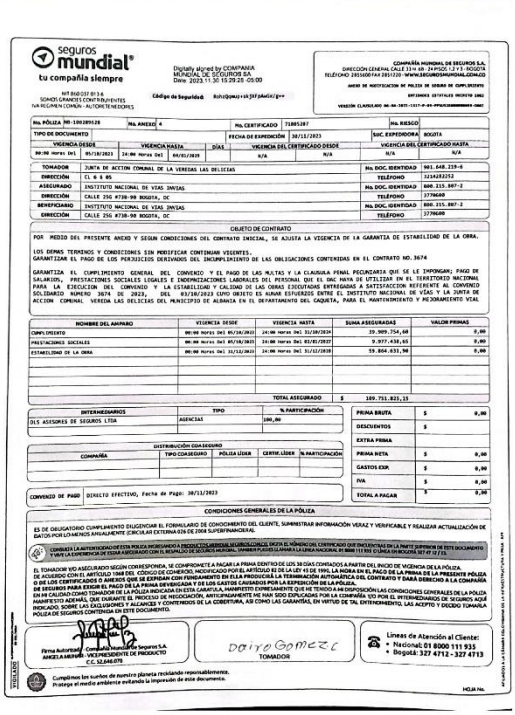

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 3082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSU5280000059-0001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
10-1002095128	4	71895207	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	30/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 04/01/2028		N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	Cl 6 6 05	TELÉFONO	3214282252
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #738-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	3776600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #738-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	3776600

CONDICIONES PARTICULARES

EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

- TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS NIT. 901.648.219-6.

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.

NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/8/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

Powered by CamScanner

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, sin embargo, junto con la interventoría se adoptarán las siguientes medidas, con el fin de garantizar la calidad y correcta ejecución de las obras suscritas al convenio anteriormente mencionado.

- Se solicitó un estudio de suelos con el fin de saber cuál fue la capacidad portante por medio del CBR
- Se solicitó un estudio de topografía con el fin de localizar y replantear lo niveles de la vía.
- Se solicitó realizar los cilindros de concreto, con el fin de llevarlos al laboratorio y saber cuál es la resistencia a la comprensión.

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL

4.9.1 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Anexo programación de obra y presupuesto

JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS DELICIAS MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

CRONOGRAMA DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (ML)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN	UBICACIÓN: KILOMETRO 2 VIA ALBANIA - CURILLO, 15 KILOMETROS DEL KILOMETRO 2 HASTA LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
CAQUETA	ALBANIA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DELICIAS	150,00	CAQUETÁ	15/05/2024	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	JUNIO DE 2024 DEL 03 AL 09	JUNIO DE 2024 DEL 10 AL 16	JUNIO DE 2024 DEL 17 AL 23	JUNIO DE 2024 DEL 24 AL 30	JULIO DE 2024 DEL 01 AL 07	JULIO DE 2024 DEL 08 AL 14	JULIO DE 2024 DEL 15 AL 21	JULIO DE 2024 DEL 22 AL 28	JULIO DE 2024 DEL 29 AL 04	AGOSTO DE 2024 DEL 05 AL 11	AGOSTO DE 2024 DEL 12 AL 18	AGOSTO DE 2024 DEL 19 AL 25	AGOSTO DE 2024 DEL 26 AL 01
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																					
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 184.533,00	$ 184.533,00	184.533												
							SUB-TOTAL	$ 184.533,00													
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																					
2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	270,06	$ 33.932,00	$ 9.163.772,00	3.054.591	3.054.591	3.054.590										
3	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	126,23	$ 87.254,00	$ 11.013.636,00		3.671.212	3.671.212	3.671.212									
4	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	85,86	$ 852.216,00	$ 73.174.505,00			6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228
5	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	38,84	$ 329.746,00	$ 12.807.862,00					2.134.644	2.134.644	2.134.644	2.134.644	2.134.644	2.134.644			
6	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.079,86	$ 6.311,00	$ 25.747.979,00			2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725
		1.978,00		Desmonte e instalacion de cercos paralelos a la placa huella	Ml	140,00	$ 6.951,29	$ 973.153,00	486.577	486.576,99											
							SUB-TOTAL	$ 132.880.907,00													
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																					
7	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46,50	$ 25.757,00	$ 1.197.701,00	598.851	598.851											
8	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	8,20	$ 66.207,00	$ 542.897,00		542.897											
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50	$ 464.689,06	$ 232.345,00		232.345											
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,60	$ 852.216,42	$ 8.181.297,00			4.090.649	4.090.648									
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578,90	$ 6.311,12	$ 3.653.509,00			1.826.755	1.826.755									
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25,40	$ 47.013,89	$ 1.194.153,00				1.194.153									
14	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00	$ 509.134,38	$ 3.054.806,00				3.054.806									
							SUB-TOTAL	$ 18.056.708,00													
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 151.122.148,00	4.324.551	8.586.472	21.636.159	22.830.527	11.127.597	11.127.597	11.127.597	11.127.597	11.127.597	11.127.597	8.992.953	8.992.953	8.992.953
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) PLAN DE INVERSION SOCIAL	$ 2.200.000,00	3%	6%	14%	15%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.226.624,41													
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 198.548.773													

EL ALCANCE DEL PRESENTE PROYECTO EQUIVALE A 150 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA.

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 25202-119996 CND

Revisó: Firma PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA
Matricula Profesional: 2520256474CND

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 25202- 119996 CND

Revisó: Firma PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula Profesional: 2520256474CND

4.9.2. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Anexo plan de inversión

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 10/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3674 - 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	$ 28.943.000,00	$ 28.943.000,00	$ 28.943.000,00		$ 86.829.000,00	43,73%
2	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00		$ 9.000.000,00	4,53%
3	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 6.000.000,00	3,02%
4	TRANSPORTE	$ 4.307.963,00	$ 4.307.962,00	$ 4.307.962,00		$ 12.923.887,00	6,51%
5	COSTO DE PERSONAL	$ 12.856.420,67	$ 12.856.420,67	$ 12.856.420,67		$ 38.569.262,00	19,43%
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 15.075.541,33	$ 15.075.541,33	$ 15.075.541,33		$ 45.226.624,00	22,78%
N							%
TOTAL						$ 198.548.773,00	100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Dairo Gomez.c
Firma:
Nombre: **Dairo Garcia Cardenas**
Representante Legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal
C.C 17,682,437

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND


Firma:
Nombre: **Jhon Jairo Garcia Calderon**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **25202-119996 CND**

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA
Anexo comité operativo

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No:	Dirección Territorial INVIAS: CAQUETA	Fecha: 06-05-2024

Vereda – Municipio - Departamento: VEREDA LAS DELICIAS – ALBANIA CAQUETA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3674-2023
Ejecutor(es): VEREDA LAS DELICIAS – ALBANIA

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JUAN CARLOS SANABRIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FABIO JESÚS MEJIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
DAIRO GARCIA CARDENAS	DELICIAS	PRESIDENTE
ING JHON JAIRO GARCIA	DELCIAS	INGENIERO RESIDENTE
EUCARIS PENNA CEBALLOS	DELICIAS	CONTADOR
OLGA MACIAS FIERRO	DELCIAS	VEEDURIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros participantes del comité operativo.
2. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
3. Análisis de cotizaciones presentadas
4. Elección de proveedores.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Análisis de precios .
2- Elección de proveedores.
3- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
4- Elección de uniformes.
5- Proposiciones y Varios

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los cuatro (4) miembros principales, el presidente, el ingeniero residente, contador y un representante de la veeduría.
2.	Presentación de cotizaciones: MATERIALES EPP: En consigna quedo que los uniformes y el botiquín se comprarán a AMAZONIAN ZAFETY y el restante de la dotación con la empresa EXTINTORES Y DOTACIONES CAQUETA. **AMAZONIAN SAFETY** NIT. NON PREGUNTO PRIORAR EXTINTORES Y DOTACIONES CAQUETA
3.	Se determinó elaborar la topografía con el señor LUIS ALBERTO NAVARRO DIAZ, el cual oforto su servicios por valor de $ 900.000 **COTIZACION TOPOGRAFICA**

4.	Se determinó seleccionar la empresa GEOCON INGENIERIA para la elaboración de laboratorios. 
5.	Se aprobó adquirir la madera a la empresa MADERAS Y MACHIMBRES de San José del Fragua, quienes cuentan con la certificación y salvoconducto respectivo. 

3

6.	Se Realizó la consulta con la ferretería de la ciudad de Florencia FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S y el precio incluye transporte hasta el sitio de la obra. Por lo tanto, se toma la decisión de adquirir los materiales a FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S. 
7.	En el proceso de cotización de materiales pétreos se recaudó dos cotizaciones: playa la raya del municipio de Albania y la trituradora de Morelia, se tomo la decisión de comprar el material a la playa la raya debido a que está ubicada en el Municipio de Albania y el trayecto de transporte es menor.

4

	 Florencia 24 de abril de 2024 Señores JUNTAS DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS Ref: COTIZACION DE MATERIALES PETREO. Cordial saludo Cordialmente nos permitimos rugedir cotización de materiales dirigida para la vereda las delicias del municipio de Albania Caquetá LA GRAVILLA $ 70.000CL METRO MAS IVA LA ARENA $60.000 METRO MAS IVA PIEDRA $60.000 METRO MÁS IVA Atentamente, YENNIS GAMEZ POLANCO Administradora
8.	De las cotizaciones presentadas para el alquiler de maquinaria se escogió la que tenia los precios mas favorables para la junta. 
9.	Cotización de exámenes pre-ocupacionales se recibieron dos cotizaciones: CLIP SALUD Y LA DOCTORA MARTHA LUZ ALTAMAR , después de realizada el análisis de precios, se toma la decisión de realizarlos

5

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PRECIOS 2024_Juntas de acción comunal

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	VALOR UNITARIO
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular de ingreso Egreso, Periódicos- (realizados en jornada de salud, en las instalaciones de la empresa)	$ 50.000
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular de ingreso Egreso, Periódicos-(TELEMEDICINA)	$ 40.000
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular (Ingreso, periódicos, egresos) Realizados en Florencia	$ 25.000

Martha Luz Altamar de los Reyes
Médico especialista SST. Lic. 0245

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se analizaron cada una de las cotizaciones y se tomó la decisión de elegir los proveedores que realizaran los suministros de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos			
1.	Informe Técnico de Avance:	SI ____	NO __X__	No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera:	SI ____	NO ___X_	No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO __X__	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI ____	NO _X___	No. Folios: _____

6

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
REMITIR LAS ACTAS DEL COMITÉ OPERATIVO	CONTADOR / INGENIERO	10-05-2024
ELABORAR EL PLAN DE INVERSION	CONTADOR / INGENIERO	10-05-2024
PRESENTAR LOS CONTRATOS DE LOS PROFESIONALES	CONTADOR	10-05-2024
ENVIAR EXAMENES LABORALES DE INGRESO.	CONTADOR	10-05-2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N/A		

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Cargo: Director de interventoría

Dairo Gomez.c
Nombre: DAIRO GOMEZ C.
Cargo: Presidente OAC

Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Cargo: Residente de interventoría

NO SABE FIRMAR

Nombre: OLGA LUCIAS FIERRO

Cargo: veedora ciudadana

7

4.9.4. ACTAS DE REUNIÓN

Anexo acta de socialización



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP-MNY-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30 DE ABRIL DEL 2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNION No. 1 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DELICIAS — DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 3674 del 2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS. ALBANIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 4647 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS RL LEIDY MABEL PEREZ

OBJETIVOS DE LA REUNION
SOCIALIZACION DEL CONVENIO Y PRESENTACION DE LA INTERVENTORIA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
PRESENTACION DEL PERSONAL TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
INDICACIONES TECNICAS
INQUIETUDES
COMPROMISOS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1 SIENDO LAS 12: 00 AM SE DA INICIO A LA REUNION DE SOCIALIZACION, PRESENTACION DE DEL INTERVENTOR RESIDENTE FABIO MEJIA DE PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS Y LA DE LEYDI KARINA RODRIGUEZ DEL PCDT. PARA INICIA EXPLICANDO EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL SE DA CLARIDAD DEL EQUIPO QUE ACOMPAÑARA EL PROCESO EN LA DIRECCION TERRITORIAL - CAQUETÁ, ESTO CON EL FIN DE QUE NO FACILITEN INFORMACIÓN A TERCERAS PERSONAS AJENAS AL PROGRAMA QUE TENGA UNAS INTENCIONES CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL.
2. SE SOCIALIZA LA LEY 850 DE VEEDURIAS Y SE AVISA A LA COMUNIDAD DE CONFORMAR EL COMITÉ DE VEEDURIAS CON EL FIN DE QUE ACOMPAÑEN, VIGILEN LA EJECUCION DE ESTAS OBRAS DE MENOR DIMENAJE (PLACA HUELLAS- ALCANTARILLAS)
3 LA SUPERVISORA ING CAROLINA BERMEO EXPONE LA PARTE TECNICA DEL CONVENIO.
CONTRATOS Y ACTUACIÓN DEL PERSONAL
MIS TROS LINEALES A INTERVENIR Y SOLICITAN BALACE ACTUALIZADO CON PRECIOS DEL AÑO 2024
ACTUALIZACION DE POLIZAS — ENTRE
OTRAS ESPECIFICACIONES — 4. INCIA EL ING.
FABIO MEJIA RESIDENTE DE INTERVENTORIA EL CUAL MANIFIESTA A LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL TODA SU DISPOSICION PARA APOYARLAS Y ORIENTARLES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS — 5 POR OTRA PARTE
LA PROFESIONAL SOCIAL DE INVIAS KARINA RODRIGUEZ RECUERDA A LA COMUNIDAD QUE SE VAN A CONTAR CON UNOS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, COMO LO SERIAN EL BUZON DE SUGERENCIAS, LA VEREDUNAS Y UN CORREO ELECTRONICO PARA LAS PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS. A CONTINUACIÓN SE LEVANTA EL ACTA DE CONFORMACION DE VEEDURIAS Y SE ENCARGA A LA PRESIDENTA DE RADICAR EL ACTA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DONDE TENGA JURISDICCION LA VEREDA, ANEXA LAS CEDULAS DE CIUDADANIA DE LAS 3 PERSONAS QUE ESCOGIO LA COMNIDAD PARA ESTA LABOR. — 6. POR ULTIMO SE COMPARTE UN REFRIGERIO QUE ENVIA LA TERRITORIAL INVIAS Y SE ATIENDEN, SE RESUELVEN DUDAS QUE TENGA LA COMUNIDAD .

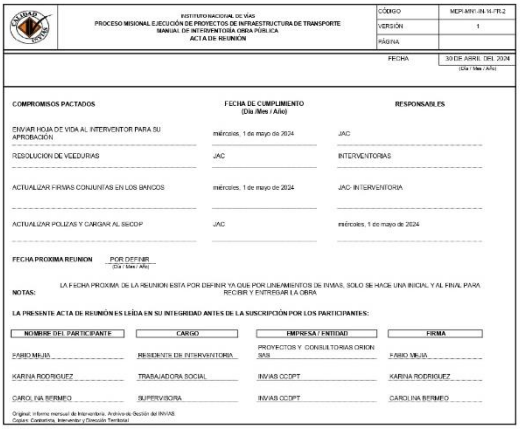

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP-MNY-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30 DE ABRIL DEL 2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENVIAR HOJA DE VIDA AL INTERVENTOR PARA SU APROBACION	miércoles, 1 de mayo de 2024	JAC
RESOLUCION DE VEEDURIAS	JAC	INTERVENTORIAS
ACTUALIZAR FIRMAS CONJUNTAS EN LOS BANCOS	miércoles, 1 de mayo de 2024	JAC- INTERVENTORIA
ACTUALIZAR POLIZAS Y CARGAR AL SICOP	JAC	miércoles, 1 de mayo de 2024

FECHA PROXIMA REUNION: POR DEFINIR (Día / Mes / Año)


NOTAS: LA FECHA PROXIMA DE LA REUNION ESTA POR DEFINIR YA QUE POR LINEAMIENTOS DE INVIAS, SOLO SE HACE UNA INICIAL Y AL FINAL PARA RECIBIR Y ENTREGAR LA OBRA

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
FABIO MEJIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	FABIO MEJIA
KARINA RODRIGUEZ	TRABAJADORA SOCIAL	INVIAS CCDT	KARINA RODRIGUEZ
CAROLINA BERMEO	SUPERVISORA	INVIAS CCDT	CAROLINA BERMEO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivado Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Listado de asistencia

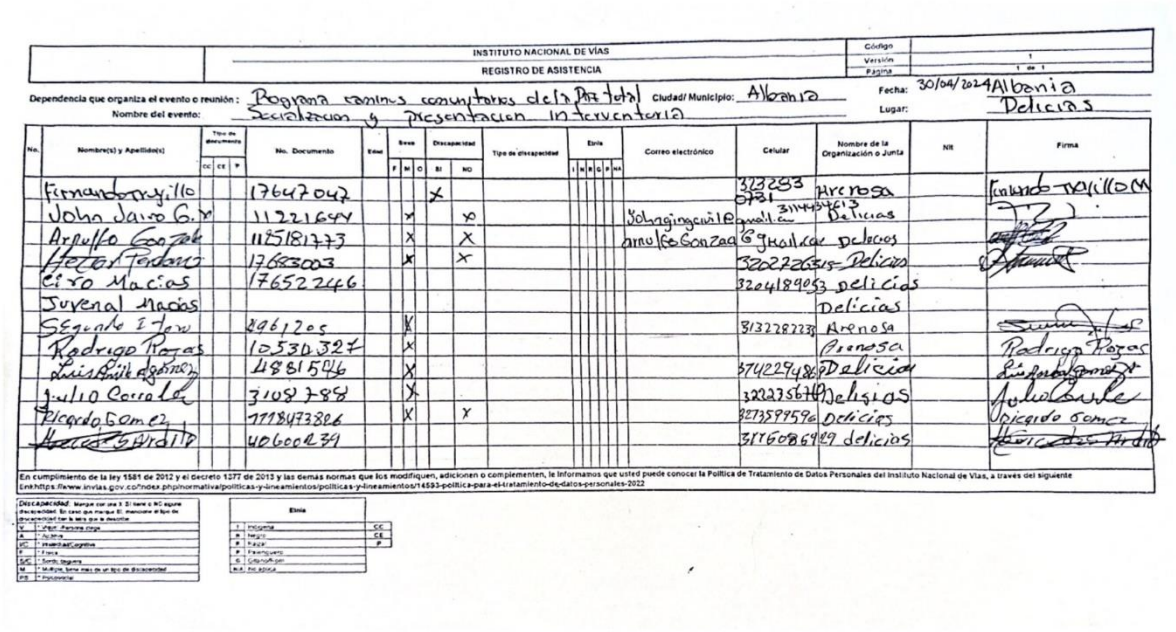

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
REGISTRO DE ASISTENCIA

Código
Versión
Página 1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Programa caminos comunitarios de la Paz total
Nombre del evento: Socialización y presentación Interventoría
Ciudad/ Municipio: Albania
Fecha: 30/04/2024
Lugar: Albania Delicias

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	TI	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	G	P	MA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	NIt	Firma
	Fernando Trujillo				17647042					X									3123283	Arenosa		
	John Jairo G.				11221644			X			X							Johngingeniero	3114857613	Delicias		
	Arnulfo Gonzalez				11851773			X			X							arnulfoGonzaq	Gmail.com	Delicias		
	Hector Tenorio				17683003			X			X								3202226515	Delicias		
	Ciro Macias				17652246														3204189053	delicias		
	Juvenal Macias																			Delicias		
	Segundo Tafur				896205			X											3132287238	Arenosa		
	Rodrigo Rojas				10530327			X												Arenosa		
	Luis Avila Gomez				4881546			X											3142294880	Delicias		
	Julio Corrales				3105788			X											3202356470	Delicias		
	Ricardo Gomez				1118473886			X			X								3173589596	Delicias		
	Hector Tirado				40660239														3176086989	delicias		

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente Link https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO sufre discapacidad. En caso que marque SI, marcar el tipo de discapacidad con la letra que la describe
V: Visual Persona ciega
A: Auditiva
PC: Mental/Cognitiva
F: Física
SC: Sordo, Seguera
M: Más de un tipo de discapacidad
PS: Psicosocial

Etnia
1: Indígena — CC
2: Negra — CE
3: Raizal — P
4: Palenquero
5: Gitano/Rom
6.1: No aplica

Powered by CamScanner

5. **INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA *No. 4647 de 2023*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	*4647 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS*
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*

CONTRATISTA	*PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS*
VALOR TOTAL	*$ 109.303.594*
VALOR ACUMULADO	*$ 109.303.594*
PLAZO INICIAL	*6 MESES*
PLAZO PRORROGA No. 1	6 MESES
PLAZO ACUMULADO	9 MESES Y 16 DIAS
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	9 MESES Y 16 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1	*30 DE JUNIO DE 2024*
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2	*16 DE OCTUBRE DE 2024*

*Tabla **2**. Información general contrato 4647 de 2023*

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

- Durante este periodo la interventoría realizo visitas a campo y realizo seguimiento desde la oficina central.

El porcentaje de avance físico y financiero de interventoría es de 7% correspondiente a $7.500.000

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato relación de vehículos

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 30-jun-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3979de 2023, 3714 de 2023, 4440 de 2023, 3674 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DIAMANTE

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	MOTOCICLETA																	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

NUMERO DE PLACA:FIF85G MARCA: BENELLI CILINDRAJE 500CC MODELO:2023

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: LOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INTERVENTORIA SE LES REALIZARÁ MANTENIENTO PREVENTIVO TODO LOS 5 DE CADA MES QUE ESTE EN EJECUCION DEL PROYECTO

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa el personal que labora para PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
Se anexa planilla pagada mes de junio de 2024
Se anexa certificación pago de seguridad social

ORION
901503188-3

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
CRA 83 B # 15-98 CALI E-mail mabelchud@yahoo.com

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

CERTIFICA

Que para la ejecución del contrato de interventoria 4647 de 2023 firmado entre el **INVIAS**, y **PROYECTO Y CONSULTORIAS ORION SAS** se realizaron los respectivos pagos de seguridad social (**SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA**) durante el periodo de JUNIO de 2024, estando a paz y salvo en este periodo.

Para constancia de lo anterior se firma en Cali, Valle del Cauca a los 30 días del mes de JUNIO del 2024

Razón Social: **PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.**
Representante legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
C.C 31.577.305 DE CALI
Dirección: CRA 83 B # 15-98 CALI
Telefono: 3224097491
E-mail mabelchud@yahoo.com
Ciudad: CALI

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato financiero

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-9 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

MES INFORME MENSUAL: jun-24 — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIOS: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1315123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00
				TOTAL		$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 109.303.594,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	abr-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2023	$ 109.303.594,00	$ 98.803.594,00		
2	may-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2024	$ 109.303.594,00	$ 88.303.594,00		
3	jun-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2025	$ 109.303.594,00	$ 77.803.594,00		
TOTALES		**$ 25.515.000,00**	**$ 5.985.000,00**	**$ 31.500.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 25.515.000,00	$ -	$ 25.515.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -	$ -	$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -	$ 5.985.000,00	$ 5.985.000,00
VALOR TOTAL	$ 25.515.000,00	$ 5.985.000,00	**$ 31.500.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No. :

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato de garantías

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 26/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 1: 30/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 2: 16/10/2024
VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.


2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexos pólizas

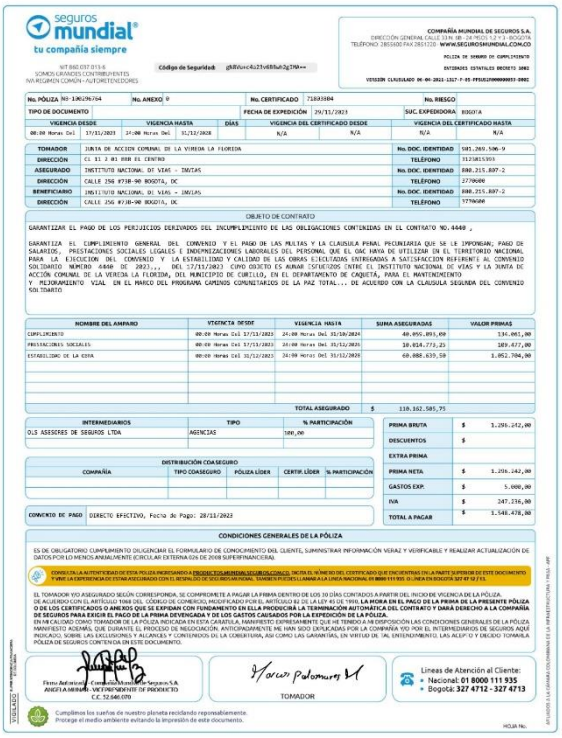

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100296764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71883884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No.DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770000

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4440 ,

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023,,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	44.995.895,00	134.987,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2025	10.814.773,25	189.477,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.888.639,50	1.052.704,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 116.162.585,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023	PRIMA BRUTA	$ 1.296.142,00
		DESCUENTOS	$
		EXTRA PRIMA	
		PRIMA NETA	$ 1.296.142,00
		GASTOS EXP.	$ 5.000,00
		IVA	$ 247.336,00
		TOTAL A PAGAR	$ 1.548.478,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROSEGUR.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCONTRARÁS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O, DESDE EN BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE RECLAMAR EJECUTIVAMENTE EL PAGO DE LA PRIMA ADEUDADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN NEGOCIADO COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE LAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y EXIGIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.660.070

Marcos Palomares M
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VIA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100296764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71883884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A


CONDICIONES PARTICULARES

. TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

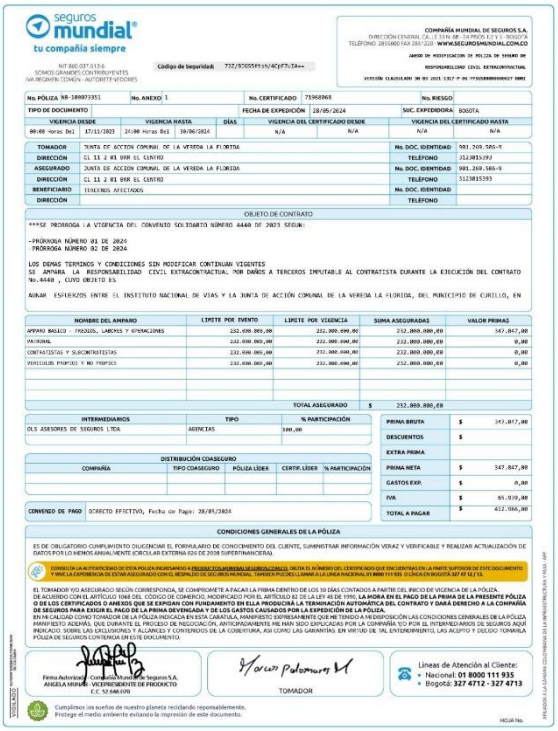

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 737/8C055Ff1h/4CpT7cIA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2853120 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3128835393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3128835393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRÓRROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CUBILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	347.847,00
PATRONAL	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 252.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.847,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.847,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.919,00
TOTAL A PAGAR	$	412.966,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PÁGINA TOTALMENTE SEGUROS CLICK1 DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA CIENTO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENGO A DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada: Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA HIRUM - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.

AFILIADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PINSA - AIP



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2853120 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. . TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES).
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. . - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) . BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV


"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.

AFILIADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PINSA - AIP

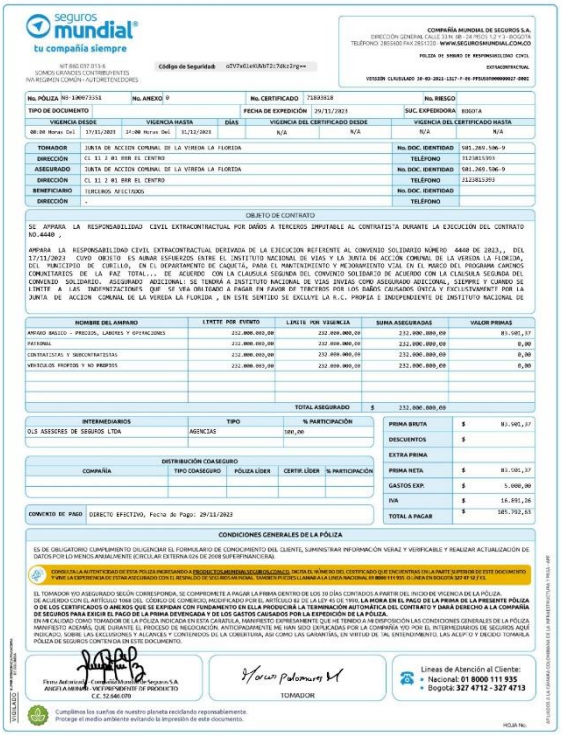

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71883818	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VIREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.596-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VIREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.596-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4640 ,

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4640 DE 2023,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CUBILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	83.501,37
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	83.501,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	83.501,37
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	16.891,26
TOTAL A PAGAR	$	105.392,63

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM/CO, DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y ENVIE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMARNOS A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 Y 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA VIETO INDEPENDIENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.666.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO

CONDICIONES PARTICULARES

VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.596-9 , , TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4640 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.


DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO

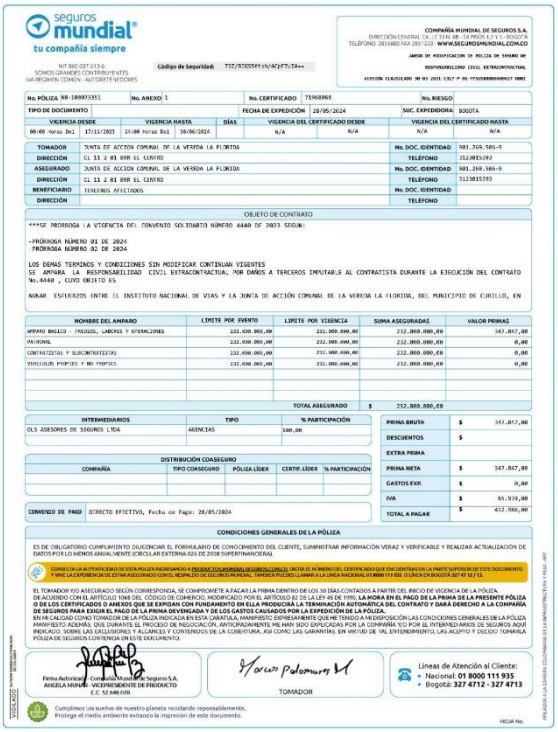

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL. 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUSU0000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	1	71960868	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	28/05/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	2124815192
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815193
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	N/A

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.047,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.047,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.047,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.919,00
TOTAL A PAGAR	$	412.966,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2016 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROVEEDOR.MUNDIALSEGUROS.COM/CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARA LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENDIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.680.039

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL: CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUSU0000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	1	71960868	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	28/05/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. . TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INDICA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. , – ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Anexo formato plan de cargas

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ No. 6 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 3230 DE 15/09/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS

PLAZO INICIAL: 0,6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 109.303.594,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 109.303.594,00

PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 16 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 19/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2023				2024												TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)			MES		MES		MES		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		MES			
													H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																
	1	Director de Interventoria	$ 5.000.000		0,50	$ 2.500.000											$ -	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000			1,50	$ 7.500.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000		4,00	$ 16.000.000											$ -	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	0,37	$ 1.475.593	0,00	$ 2.000.000	4,9	$ 19.475.593
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000											$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,20	$ 560.000	0,60	$ 1.120.000
	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000											$ -		$ -	0,40	$ 1.120.000		$ -		$ -		$ -	0,20	$ 560.000	0,60	$ 1.680.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 3.000.000,00			0	3.000.000,00																									$ 3.000.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000																													
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000																													
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000																													
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 5.000.000																													
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.000.000																													
	1	Inspector	$ 1.200.000		8,00	$ 9.600.000											$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ 800.000	0,00	$ 600.000		$ -	1,0	$ 1.200.000
	1	Inspector SST	$ 1.200.000		0,48	$ 576.000											$ -		$ -	0,24	$ 288.000		$ -		$ -		$ -	0,24	$ 288.000	0,48	$ 576.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 33.916.000,00											$ -		$ 5.250.000		$ 6.370.000		$ 6.098.000		$ 5.850.000		$ 3.325.593		$ 4.668.000		$ 34.551.593		
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36											0,00		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 80.041.760											$ -		$ 12.390.000,0		$ 15.033.200,0		$ 14.391.280,0		$ 13.806.000,0		$ 7.848.399,7		$ 10.992.880,0		$ 81.541.760		

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 MES		2023 MES		2024 MES		2024 ABRIL		2024 MAYO		2024 JUNIO		2024 JULIO		2024 AGOSTO		2024 SEPTIEMBRE		2024 MES		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
	1	Vehículo Director y/o Especialistas	$ 110.000	Día	4,00	$ 440.000											$ -		$ -						$ 110.000	1	$ 110.000	2	$ 220.000			4,00	$ 440.000
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 300.000	Mes	$ 13,00	$ 3.900.000											$ -	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000			8,00	$ 2.400.000
	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y trnsaporte)	$ 2.800.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 5.600.000											$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 5.600.000			2,00	$ 5.600.000
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000											$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4	$ 1.200.000			4,00	$ 1.200.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ -	Según comprobante por mes	$ -	$ -											$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -		$ -			0,00	$ -
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 175.000,00	Según comprobante por viaje	2,00	$ 350.000											$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 175.000	1	$ 175.000		$ -			2,00	$ 350.000
	1	Fotocopias, impresiones, papeleria, reproduccion de documentos , planos, fotografias, videos, etc	$ 80.000,00	Según comprobante por mes	$ -	$ -											$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -		$ -			0,00	$ -
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 80.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 320.000											$ -		$ -		$ -	1	$ 80.000	2	$ 160.000	1	$ 80.000					4,00	$ 320.000
	1	Vestuaria Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	$ -	$ -											$ -		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -		$ -			0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														
		*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 11.810.000,00											$ -		$ 300.000		$ 300.000		$ 600.000		$ 965.000		$ 1.045.000				$ 10.310.000	
		*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+ (B) + (C) + (D)				$ 91.851.760,00											$ -		$ 12.690.000		$ 15.333.200		$ 14.991.280		$ 14.771.000		$ 8.893.400		$ 10.992.880		$ 91.851.760	
		*IVA = 19% * (D) = (E)				$ 17.451.834,00											$ -		$ 2.411.100		$ 2.913.308		$ 2.848.343		$ 2.806.490		$ 1.689.746		$ 2.088.647		$ 17.451.834	
		*COSTO TOTAL = (D) + (E)				$ 109.303.594											$ -		$ 15.101.100		$ 18.246.508		$ 17.839.623		$ 17.577.490		$ 10.583.146		$ 13.081.527		$ 109.303.594	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones, se consideraró necesario prorrogar el contrato de interventoría No. 4647 de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 para Continuar seguimiento a los convenios que le corresponden. A la fecha se están realizando las actividades preliminares para la ejecución de las obras, sin embargo, para continuar la ejecución de las actividades para la construcción de obras sin afectar el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas, surge la necesidad de prorrogar el contrato de interventoría. Como consecuencia de lo anterior, esta interventoría solicita realizar prorroga al contrato 4647 de 2023, toda vez que se requiere realizar apoyo en campo con las comunidades como desarrollo de la etapa preliminar y de ejecución de las obras lo que implica el tiempo necesario y de esa manera garantizar el seguimiento y control a los correspondientes convenios.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la ultima Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: LEIYD MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:
NOMBRE: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La vereda delicias, desarrolla las actividades programadas a la fecha, sin presentar atrasos en las obras contratadas.

8. ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

A la fecha no se ha remitido correspondencia

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

	
INSTALACION DE VALLA	INSTALACION DE SEÑALIZACION
	
CORTE LATERAL DE LA VIA	CORTE LATERAL DE LA VIA
	
MATERIAL ACOPIADO EN OBRAS	CORTE LATERAL DE LA VIA

	
COMPACTACION DE SUB-BASE	VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLAS REFORZADO


8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

Anexo fotos de la socialización

	
SOCIALIZACION VEREDA DELICIAS, 29-04-2024	**SOCIALIZACION VEREDA DELICIAS, 29-04-2024**

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Anexo bitácora del mes de junio

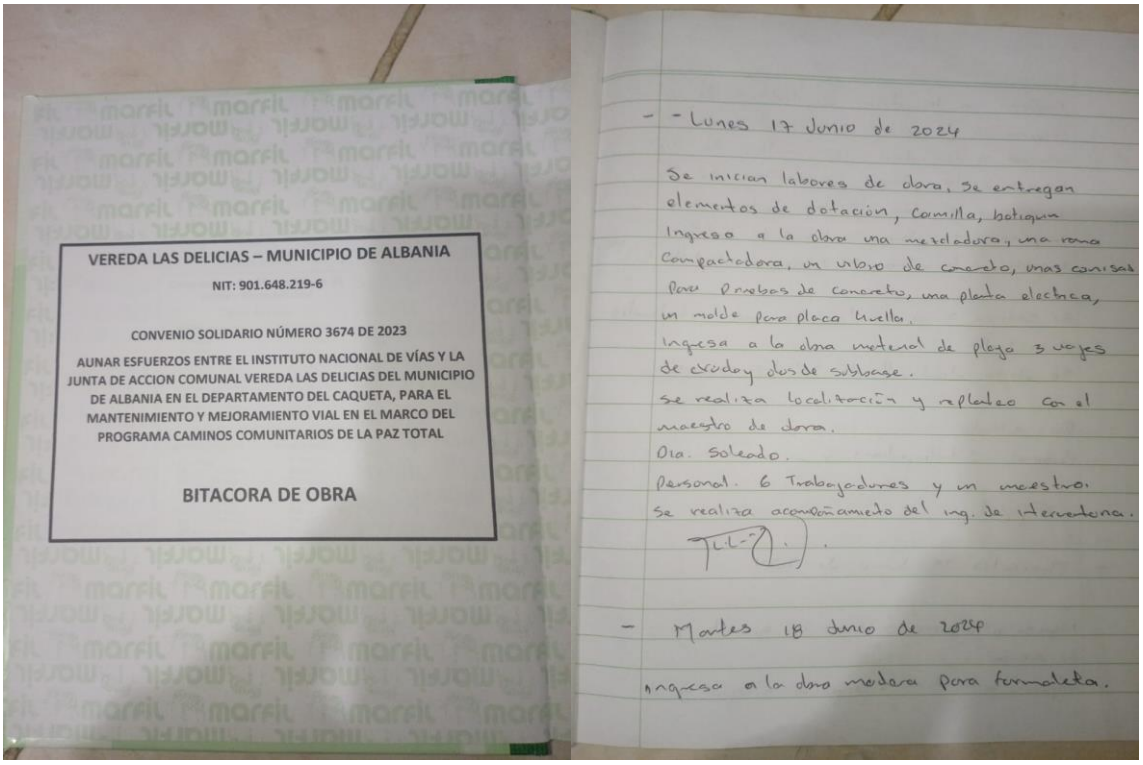

VEREDA LAS DELICIAS – MUNICIPIO DE ALBANIA

NIT: 901.648.219-6

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


BITACORA DE OBRA

- Lunes 17 Junio de 2024

Se inician labores de obra, se entregan elementos de dotación, camilla, botiquin
Ingresa a la obra una mezcladora, una rana compactadora, un vibro de concreto, unas carretas
Para Pruebas de concreto, una planta electrica, un molde para placa huellas.
Ingresa a la obra material de playa 3 viajes de cascajo y dos de subbase.
se realiza localizacion y replanteo con el maestro de obra.
Dia. Soleado.
Personal. 6 Trabajadores y un maestro.
Se realiza acompañamiento del ing. de interventoria.

- Martes 18 Junio de 2024

Ingresa a la obra madera para formaleta.

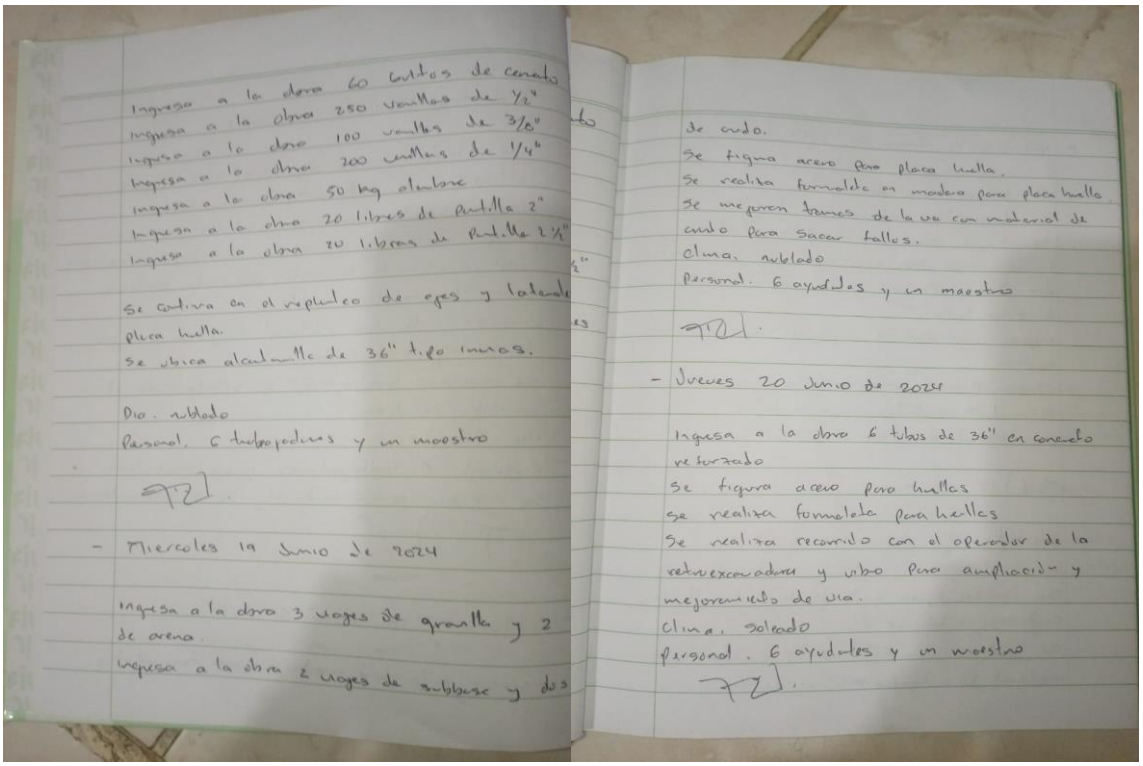

Ingresa a la obra 60 bultos de cemento
Ingresa a la obra 250 varillas de 1/2"
Ingresa a la obra 100 varillas de 3/8"
Ingresa a la obra 200 varillas de 1/4"
Ingresa a la obra 50 kg alambre
Ingresa a la obra 20 libras de Puntilla 2"
Ingresa a la obra 20 libras de Puntilla 2 1/2"

Se continua en el replanteo de ejes y laterales placa huella.
Se ubica alcantarille de 36" tipo imvias.


Dia. nublado
Personal. 6 trabajadores y un maestro

- Miercoles 19 Junio de 2024

Ingresa a la obra 3 viajes de gravilla y 2 de arena.
Ingresa a la obra 2 viajes de subbase y dos de cascajo.
Se figura acero para placa huella.
Se realiza formaleta en madera para placa huella
Se mejoran tramos de la via con material de cascajo para sacar fallos.
Clima. nublado
Personal. 6 ayudantes y un maestro

- Jueves 20 Junio de 2024

Ingresa a la obra 6 tubos de 36" en concreto reforzado
Se figura acero para huellas
se realiza formaleta para huellas
Se realiza recorrido con el operador de la retroexcavadora y vibro para ampliacion y mejoramiento de via.
Clima. Soleado
Personal. 6 ayudantes y un maestro

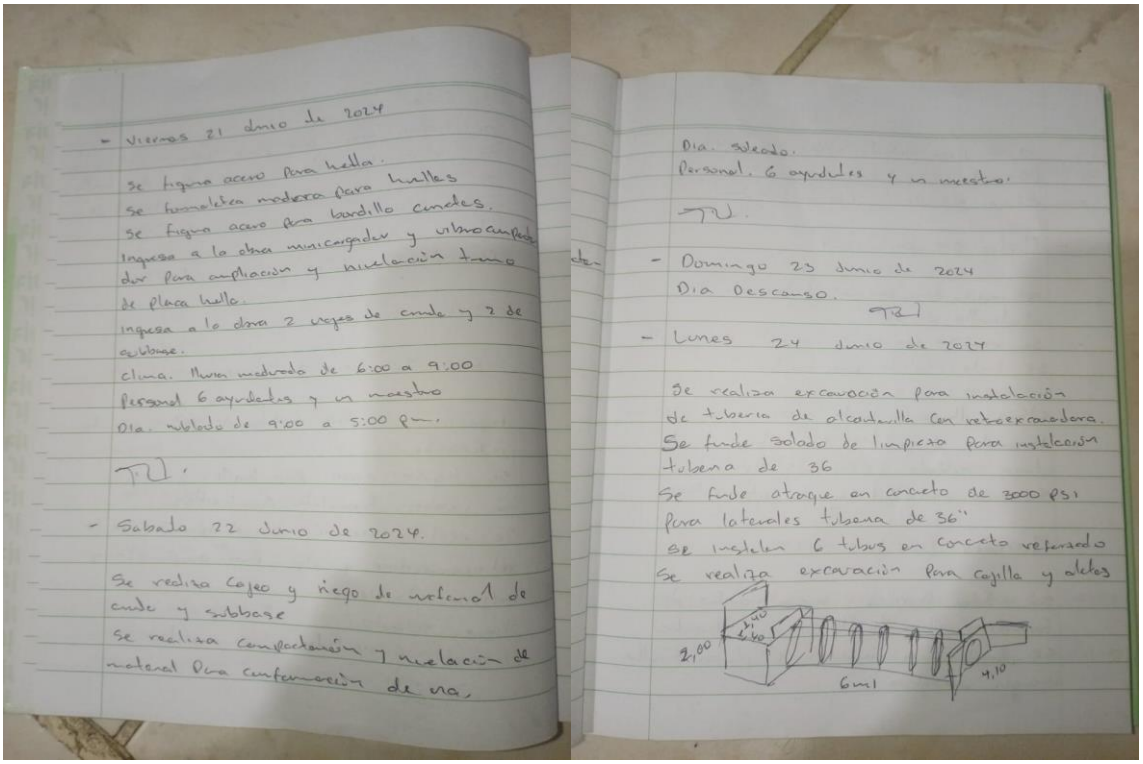

- Viernes 21 dunio de 2024

Se figura acero Para huella.
se formaleta madera para huellas
se figura acero Para bordillo cunetas.
Ingresa a la obra mixicargador y vibroapisonador Para ampliación y nivelación tramo de placa huella.
ingresa a la obra 2 viajes de cunte y 2 de subbase.
clima. lluvia moderada de 6:00 a 9:00
Personal 6 ayudantes y un maestro
Dia. nublado de 9:00 a 5:00 pm.

TJ.

- Sabado 22 Junio de 2024.

Se realiza Cajeo y riego de material de cunte y subbase
Se realiza compactación y nivelación de material Para conformación de via.

Dia. soleado.
Personal. 6 ayudantes y un maestro.


TJ.

- Domingo 23 Junio de 2024
Dia Descanso.

TJ

- Lunes 24 dunio de 2024

Se realiza excavación Para instalación de tuberia de alcantarilla con retroexcavadora.
Se funde solado de limpieza Para instalación tubena de 36
Se funde atraque en concreto de 3000 PSI Para laterales tubena de 36"
Se instalan 6 tubos en concreto reforzado
Se realiza excavación Para cajilla y aletas

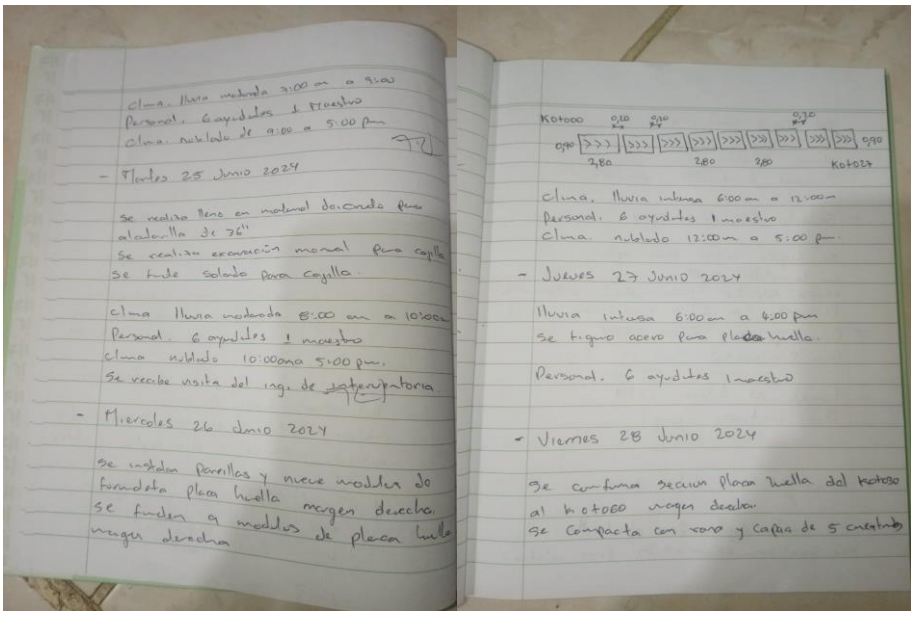

clima. lluvia moderada 8:00 am a 10:00am
Personal. 6 ayudantes 1 maestro
clima nublado 10:00ama 5:00 pm.
Se recibe visita del ingi. de interventoria.

- Miercoles 26 dunio 2024

Se instalan Parrillas y nueve modulos de formaleta Placa huella margen derecha.
se funden 9 modulos de placa huella margen derecha

Kot000 0,20 0,90 0,70
0,90 2,80 2,80 2,80 Kot027 0,90

clima. lluvia intensa 6:00 am a 12:00 pm
Personal. 6 ayudantes 1 maestro
clima. nublado 12:00 m a 5:00 pm.


- Jueves 27 Junio 2024

lluvia intensa 6:00 am a 4:00 pm
se figuro acero Para placa huella.

Personal. 6 ayudantes 1 maestro

- Viernes 28 Junio 2024

Se conforma sección Placa huella del kot000 al kot060 margen derecha
Se Compacta con rana y capas de 5 centimetros

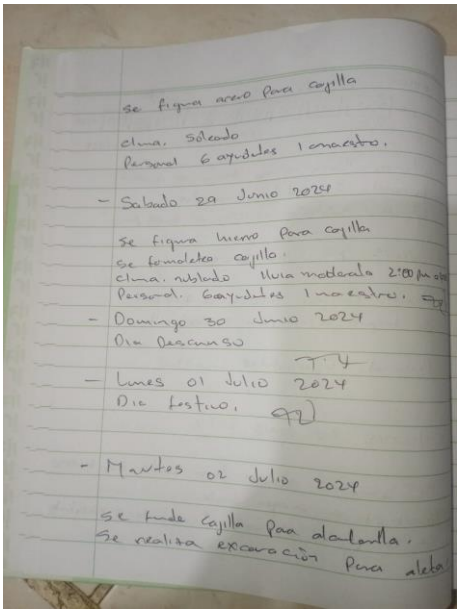

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S
Matricula No. 2520237430CND

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°03

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4647-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:
4440 de 2023

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Elaboró:	***Revisó:***	***Aprobó:***
Ing. FABIO JESUS MEJIA *Mat: 2520256474 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*	Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS *Ing. Jose Ricardo burbano*
CARGO: *Residente de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*	***CARGO:*** *Supervisor del contrato*
Fecha: *30 de JUNIO de 2024*	***Fecha:*** *30 de JUNIO de 2024*	***Fecha:***

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4440 de 2023 **Contratista:** JAC VEREDA FLORIDA

Contrato de Interventoría No. 4647 de 2023 **Interventoría:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORIN SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** JUNIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	95
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	96
1	**INTRODUCCIÓN**		99-100
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		100-101
2.1	Localización		100-101
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		101-103
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		103-106
2.4	Características técnicas del proyecto		107
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		107
3.1	Información general del contrato		108
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		108
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		108
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		108
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		108
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	108-112
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	113
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	113
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	114
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	115
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	115
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	16-122
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	121
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		122
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		123
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	124
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	125
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	126-128
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	129-134
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		135
5.1	Información general del contrato		135
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		136
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		136
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	136
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	136
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	137
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	137
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	137-138
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		138
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	139
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	139
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	139
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		139
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		139-141
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		141
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		141
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		142

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma: _____

Nombre:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se relaciona adjunto el formato diligenciado del resumen del estado general del proyecto, se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto, en el cual se evidencia que el contratista de obra ya inicio obra, presentando un avance físico y financiero del 5%

NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

UNIDAD EJECUTORA: | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA | **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 4440 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
PLAZO DE VENCIMIENTO PRORROGA 1 30/04/2024
PLAZO DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/10/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.295.465,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): 0
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.295.465,00
ANTICIPO CONCEDIDO: 0
ANTICIPO AMORTIZADO: 0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** . Leidy Carolina Bermeo Castro

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	PLACA HUELLA	ML	177
	ALCANTARILLA DE 36"	UNIDAD	2
	Rehabilitación		
	Túneles		
	Puentes		
Estructuras	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	PLACA HUELLA	ML	1	
	ALCANTARILLA			$ 10.000.000,00
	Rehabilitación			
	Túneles			
	Puentes			
Estructuras	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 161.429.326,65	37.866.138,35	$ 199.295.465,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS AD			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENI			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):		$ 11.000.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		$ 10.000.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		5%

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 8.100.000,00	1.900.000,00	$ 10.000.000,00	
AJUSTES				$ 10.000.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SE				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				$ 10.000.000,00

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1
CORTE DE LA BANCA 5 M





Foto 2
MATERIAL DE SUB- BASE INSTALADO Y COMPACTADO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. LOCALIZACIÓN 7
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 8
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4440 de 2023 11
3.1INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 12
3.3SEGUIMIENTO ITEN NO PREVISTO
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12
4.1. INFORME SEMANAL 12
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 15
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 15
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 18
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 19
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 20
4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 20
4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 27
4.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 27
4.10. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 28
4.11. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 29
4.12. ACTAS DE REUNIÓN 31
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA……21
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO……21

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR……21

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA22

6.1 EQUIPOS Y VEHICULOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA……22

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……22

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL……22

6.5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS……22

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……..23

8. ANEXOS……24

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO……24

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS……24

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS……..24

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE……24

2. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidario.

En este informe se presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.03** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024** el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**. Hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los siguientes convenios:

- ✓ **Convenio No. 4440 de 2023 con número de proceso SPSC-CD-CS-886-2023, y que tiene por objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**.

ANTECEDENTES

La economía del municipio está basada en la agricultura, complementada con la ganadería, la coca y aprovechamientos forestales

A el municipio de San José del Fragua, Currillo y Albania se accede por la ruta troncal del Llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por la empresa Coomotor Por vía terrestre, además de su vecina, se accede por Villavicencio en el vecino departamento del Meta en el norte, Mitú (Vaupés) al este y Leticia (Amazonas) en el sur.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente,

proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

San José del Fragua, Currillo y Albania son municipios del departamento del Caquetá, en Colombia localizado en la Zona sur del país, en la región Amazonia. Con 88 965 km² es el tercer departamento más extenso —por detrás de Amazonas y Vichada

Los puntos a intervenir en la florida se localizan en las siguientes coordenadas:

PLACA HUELLA PUNTO INICIAL 1° 5'26.50"N, 76° N 2'51.68"O
PLACA HUELLA PUNTO FINAL 1° 5'28.60"N, 76°2'48.32"O



Figura 2-2 Ubicación del tramo a mejorar en la vereda La Florida.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a la asociación de junta de Albania (la arenosa), vereda las delicias, florida del municipio de Currillo y la vereda iglesias del municipio de San José del Fragua, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos.

Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.
.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

CONVENIO 4440 – 2023:

OBJETO "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**."

La vereda florida del Municipio de currillo está ubicada aproximadamente a 45 kilómetros del casco urbano y limita con las veredas cerrito, vergel y palizada, dicha vereda posee una vía terciaria con una extensión aproximada de 50 km.

El tramo a intervenir lleva por nombre subida de la laguna de la florida" y subida la camangucha, el estado general de la superficie o rodadura presenta hundimientos puntuales a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias los cuales impiden la transitabilidad de cualquier tipo de vehículo en época de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es de 6 m aproximadamente. No cuenta con cunetas, carece de obras hidráulicas y falta realizar mantenimiento a las existentes, se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

Estas vías no cuentan con obras de artes.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	
ALCANCE DEL PROYECTO	*LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS", PARA LO CUAL SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA VISITA TÉCNICA REALIZADA POR LOS PROFESIONALES DESIGNADOS POR EL INVIAS, EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL - OAC, EN DONDE SE REALIZÓ UNA CONCERTACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR, UTILIZANDO LOS DISEÑOS TIPO ESTABLECIDOS EN LA CARTILLA DE OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURALES VIALES, NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONVENIO Y PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DEL SECTOR A INTERVENIR.*
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CONVENIO 4440 – 2023	*CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA DE 117 ML Y LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES PRESENTADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES.* *LA ALCANTARILLA CIRCULAR, COMO ELEMENTO DE DRENAJE TRANSVERSAL SE TRABAJARÁ CON TUBOS DE 36" DE CONFIGURACIÓN TIPO ALETA-ALETA LA CUAL PERMITE, ADEMÁS DE RECIBIR Y EVACUAR LA ESCORRENTÍA APORTANTE POR LAS*

	CUNETAS Y FILTROS, DAR CONTINUIDAD A CAUCES CON FLUJOS INTERMITENTES O EFÍMEROS. *ESPECIFICACIONES DE DISEÑO:* *-CONCRETO: F'C 21MPA* *-ACERO CORRUGADO: FY 420MPA*

Tabla 6. Características técnicas del proyecto

3. NFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4440 de 2023

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VEREDA FLORIDA

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA No. 4440 de 2023

TIPO DE PROCESO	*CONTRATACIÓN DIRECTA*
NÚMERO DE PROCESO	*SPSC-CD-CS-886-2023*
CONVENIO NO.	*4440 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS*
OBJETO	*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..*
CONTRATISTA	*JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA*
NIT	*:901.269.506- 9*
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – PGN	*$199.295.465*
RECURSOS PROPIOS	*$1.000.000*
VALOR TOTAL	*$ 200.295.465*

ADICIONES	*$ 0.00*
FECHA DE INICIO	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*31 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 01	*30 DE ABRIL DE 2024*
FECHA DE TERMINACION ATUALIZADA	*16 DE OCTUBRE DE 2024*

Tabla 7. Información general convenio 4440 de 2023

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- **EXCAVACIONES EN SECO:** Se ejecutaron actividades de remoción de tierra para los anchos de vías según especificaciones técnicas de INIVIAS 5 mts

- **FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO Fy 4200MPA:** Se realizó corte y doblado de barras corrugadas permitiendo obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño de las huellas

Durante el mes de junio se ejecutaron actividades como excavación para perfiles laterales de las vías quedando estas de 5 m de ancho. El porcentaje de obra ejecutado a la fecha es del 5% correspondiente a un valor de $10.000.000

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han presentado ítems no previstos.


3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Realizar visitas periódicas para seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando medidas y que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Semana 11 vereda florida

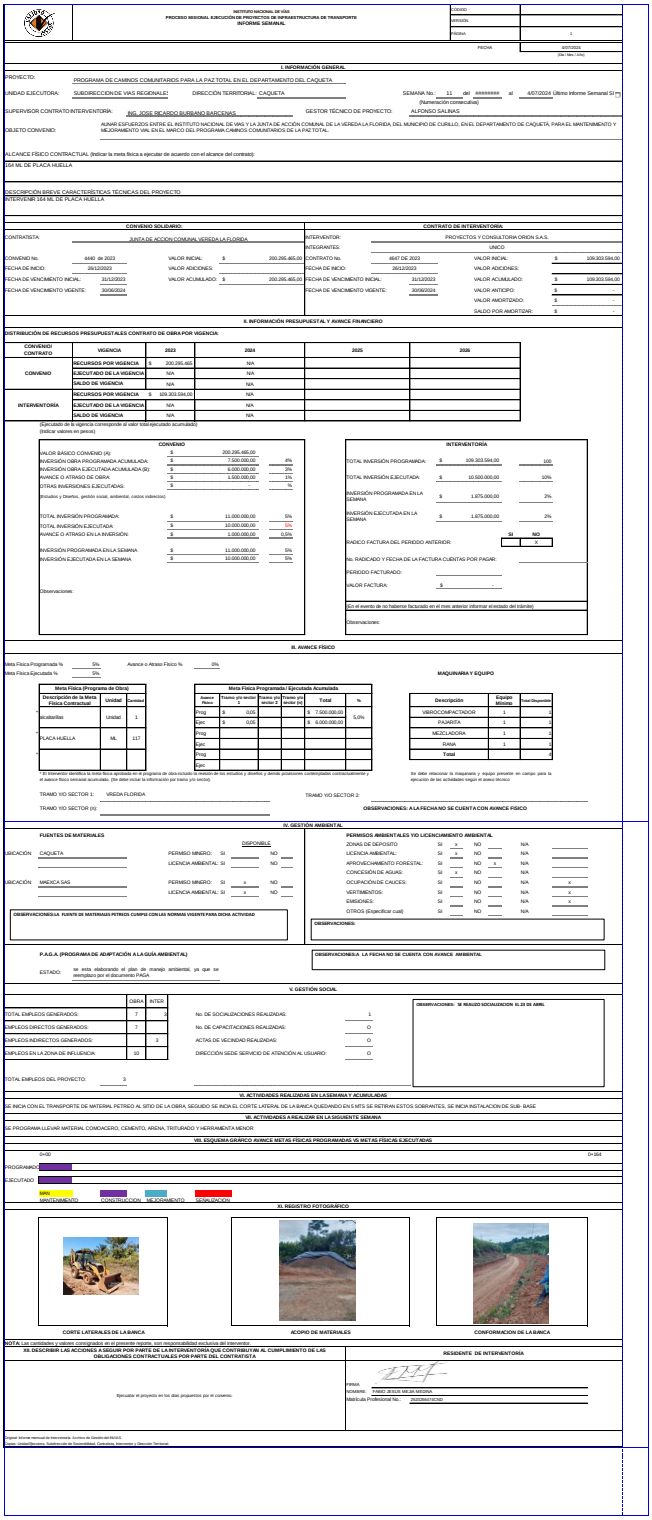

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA 1
FECHA 30/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 11 del ######## al 4/07/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
1164 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
INTERVENIR 1164 ML DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO:
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA
CONVENIO No.: 4440 de 2023
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024
VALOR INICAL: $ 200.295.465,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 200.295.465,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO
CONTRATO No.: 4647 DE 2023
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024
VALOR INICAL: $ 109.303.594,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.295.465	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A)	$ 200.295.465,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.500.000,00	4%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6.000.000,00	3%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.500.000,00	1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.000.000,00	5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.000.000,00	5%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.000.000,00	0,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.000.000,00	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.000.000,00	5%

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.500.000,00	10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 5% Avance o Atraso Físico %: 0%
Meta Física Ejecutada %: 5%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Alcantarillas	Unidad	1
PLACA HUELLA	ML	117

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 0,00			$ 7.500.000,00	5,0%
Ejec	$ 0,00			$ 6.000.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

"El interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluido lo relativo en los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCOMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIBEDA FLORIDA
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:
OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN: MIENCA SAS	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPSI CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI x	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI x	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.G.A.S. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: se esta elaborando el plan de manejo ambiental, ya que se reemplazo por el documento PAGA

OBSERVACIONES:LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTDA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0

OBSERVACIONES: SI REALIZO SOCIALIZACION EL 23 DE ABRIL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE INICIA CON EL TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO AL SITIO DE LA OBRA, SEGUIDO SE INICIA EL CORTE LATERAL DE LA BANCA QUEDANDO EN 6 MTS SE RETIRAN ESTOS SOBRANTES, SE INICIA INSTALACION DE SUB- BASE

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE PROGRAMA LLEVAR MATERIAL COMDACASRO, CEMENTO, ARENA, TRITURADO Y HERRAMIENTA MENOR

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE META'S FÍSICAS PROGRAMADAS VS META'S FÍSICAS EJECUTADAS

0+00 0+424
PROGRAMADO
EJECUTADO
MNN MANTENIMIENTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SEÑALIZACION

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CORTE LATERALES DE LA BANCA

ACOPIO DE MATERIALES

CONFORMACION DE LA BANCA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el contenido.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MADRID
Matrícula Profesional No.: 25252-94274CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del Proyecto.
Copia: Gobernación, Subdirección de Sostenibilidad, Gestambral, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Anexo formato de la maquinaria y equipos utilizados.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 3/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATO No. 4440 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA FLORIDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETRO PAJARITA	CAT	3 TONELADAS	FLORIDA-CURILLO																									A	A	A	A	A	A	
VIBRO COMPACTADOR	CAT	7 TONELADAS	FLORIDA- CURILLO																									I	I	A	A	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2																							1	1	2	2	2	2	
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																												1	1					

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	10	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	2	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA INACTIVA NO SE USA ES PORQUE NO SE NECESITA POR LO TANTO QUEDA EN ESTAMBAY

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA MAQUINARIA SE ENCUENTRA EN BUES ESTADO

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.


Firma
Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0593412 TLM

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato donde se relaciona todo el personal

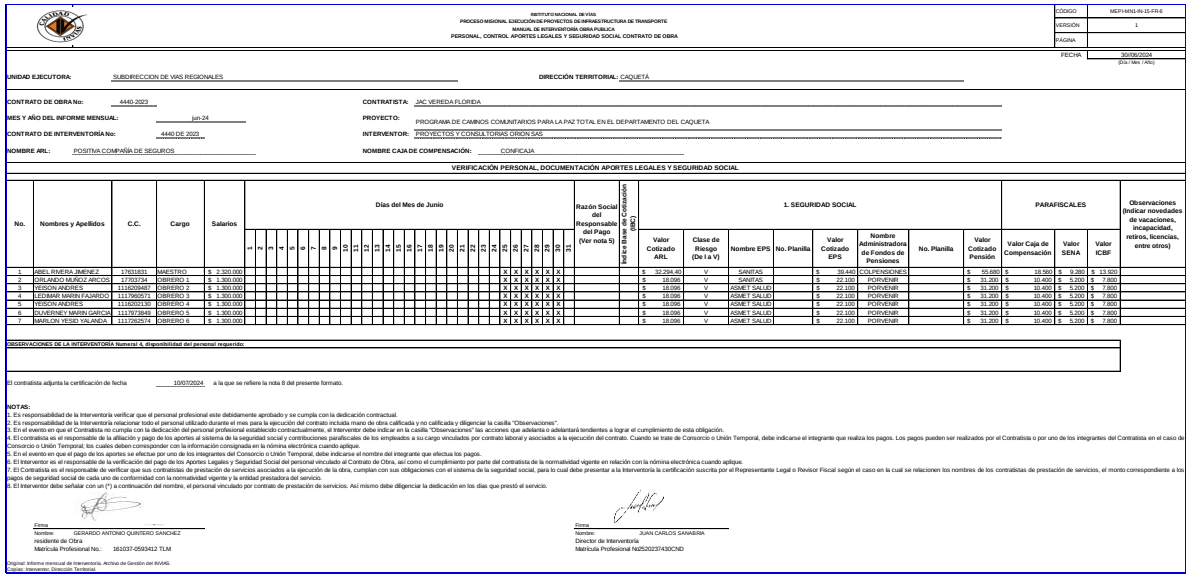

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEP-I-MN1-IN-15-FR-6
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 4440-2023 — **CONTRATISTA:** JAC VEREDA FLORIDA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 — **PROYECTO:** PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4440 DE 2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFICAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes de Junio																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ind Ice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ABEL RIVERA JIMENEZ	17631831	MAESTRO	$ 2.320.000																						X	X	X	X	X	X			$ 32.294,40	V	SANITAS		$ 39.440	COLPENSIONES		$ 55.680	$ 18.560	$ 9.280	$ 13.920	
2	ORLANDO MUÑOZ ARCOS	17703734	OBRERO 1	$ 1.300.000																						X	X	X	X	X	X			$ 18.096	V	SANITAS		$ 22.100	PORVENIR		$ 31.200	$ 10.400	$ 5.200	$ 7.800	
3	YEISON ANDRES	1116209497	OBRERO 2	$ 1.300.000																						X	X	X	X	X	X			$ 18.096	V	ASMET SALUD		$ 22.100	PORVENIR		$ 31.200	$ 10.400	$ 5.200	$ 7.800	
4	LEDIMAR MARIN FAJARDO	1117985571	OBRERO 3	$ 1.300.000																						X	X	X	X	X	X			$ 18.096	V	ASMET SALUD		$ 22.100	PORVENIR		$ 31.200	$ 10.400	$ 5.200	$ 7.800	
5	YEISON ANDRES	1116202130	OBRERO 4	$ 1.300.000																						X	X	X	X	X	X			$ 18.096	V	ASMET SALUD		$ 22.100	PORVENIR		$ 31.200	$ 10.400	$ 5.200	$ 7.800	
6	RUVERNEY MARIN GARCIA	1117973849	OBRERO 5	$ 1.300.000																						X	X	X	X	X	X			$ 18.096	V	ASMET SALUD		$ 22.100	PORVENIR		$ 31.200	$ 10.400	$ 5.200	$ 7.800	
7	MARLON YESID YALANDA	1117262574	OBRERO 6	$ 1.300.000																						X	X	X	X	X	X			$ 18.096	V	ASMET SALUD		$ 22.100	PORVENIR		$ 31.200	$ 10.400	$ 5.200	$ 7.800	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 10/07/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0593412 TLM

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No25202374300ND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo certificación del pago de seguridad social



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORIDA
PERSONARÍA JURÍDICA No 0015 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1988
NIT. 901.269.506-8

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.705.058 de Curillo Caquetá, en mi condición de **Representante Legal** de **LA JAC DE LA VEREDA LA FLORIDA** de Curillo Caquetá, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que **LA JAC DE LA VEREDA LA FLORIDA** de Curillo Caquetá, con identificación tributaria NIT.**901.269.506-9**, durante el periodo comprendido del 25 al 30 del mes de JUNIO de 2024, realizo el pago de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior dando cumplimiento a la ejecución del **CONVENIO 4440 DE 2023.**

Según las planillas de pago verificadas. 30363024 - 30413086 del operador Asopagos S.A.

Dada en Curillo Caquetá, a los diez (10) días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY
C.C. 17.705.058 de Curillo Caquetá
Representante Legal JAC La Florida Curillo Caquetá

Dirección: VEREDA LA FLORIDA
Celular: 3208612572

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Anexo planilla paga del mes de junio

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901269506 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-06	230301	800224808	PORVENIR	1	7	41.600	300	41.900
Periodo salud:	2024-07	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	7	32.500	200	32.700
Planilla Nro.:	30413086 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	7	18.100	100	18.200
Clase de aportante:	B	CCF13	891190047	COMFACA	1	7	10.400	100	10.500
Fecha transacción:	2024-07-10	PASENA	899999034	SENA	1	7	5.200	100	5.300
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	1	7	7.800	100	7.900
Transacción:	766594159	PAESAP	899999054	ESAP	0	7	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	7	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 116.500

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-06	230301	800224808	PORVENIR	5	5	208.000	800	208.800
Periodo salud:	2024-07	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	4	5	130.000	500	130.500
Planilla Nro.:	30363024 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	2	5	90.500	400	90.900
Clase de aportante:	B	14-23	860011153	POSITIVA	6	5	122.800	500	123.300
Fecha transacción:	2024-07-06	CCF13	891190047	COMFACA	6	5	70.600	300	70.900
Banco:	BANCOLOMBIA	PASENA	899999034	SENA	6	5	35.300	200	35.500
Transacción:	757815315	PAICBF	899999239	ICBF	6	5	53.000	200	53.200
		PAESAP	899999054	ESAP	0	5	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	5	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 713.100

PAGADO

Página 1 Fecha: 2024-07-10 09:26:58

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-901269506
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-10
FECHA DE PAGO:	2024-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30413086
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30413086
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 32.500	$ 32.700
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 32.500	$ 32.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 41.600	$ 41.900
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 41.600	$ 41.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 18.100	$ 18.200
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 18.100	$ 18.200
CCF13	891190047	COMFACA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 10.400	$ 10.500
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 10.400	$ 10.500
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 5.200	$ 5.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.800	$ 7.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 900	$ 115.600	$ 116.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/08/2024

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 4440-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LA FLORIDA

MES INFORME MENSUAL: 1 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.295.465,00	N/A
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.295.465,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BASICO DEL CONVENIO	$ 122.462.973,36	$ 28.725.882,64	**$ 151.188.856**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6.075.000,00	$ 1.425.000	**$ 7.500.000,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 4.860.000,00	$ 1.140.000	**$ 6.000.000,00**
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.215.000,00	$ 285.000	**$ 1.500.000,00**
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.910.000,00	$ 2.090.000	**$ 11.000.000,00**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.100.000,00	$ 1.900.000	**$ 10.000.000,00**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 810.000,00	$ 190.000	**$ 1.000.000,00**
-			$ -
VALOR TOTAL			**$ 10.000.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
residente de Obra GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Matrícula Profesior161037-0593412 TLM

Firma
Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N: 25202-37430

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Anexo estado general del tiempo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 4440 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION LA FLORIDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																									24	24	24	24	8			104
Lluvias moderadas																													16			16
Lluvias intensas																																
Total horas																									24	24	24	24	24			

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
EN LA ZONA SE PRESENTARON ALGUNAS VARIACIONES EN EL CLIMA, MAS SIN EMBARGO ESTO NO AFECTÓ EL CESE DE ACTIVIDADES

Firma
Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0593412 TLM

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En el periodo correspondiente al mes de JUNIO no se requirieron ensayos de laboratorio.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se anexan pólizas del convenio.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 4440-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LA FLORIDA

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 23/09/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.295.465,00
VALOR ACUMULADO: $ - (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 3.300.000,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 40.059.093,00	17	11	2023	31	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 10.014.773,23	17	11	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 60.088.639,50	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100296764
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000,00	17	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100073351 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 40.059.093,00	17	11	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 10.014.773,23	17	11	2023	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 60.088.639,50	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100296764
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000,00	17	11	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100073351 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:


OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo pólizas del convenio

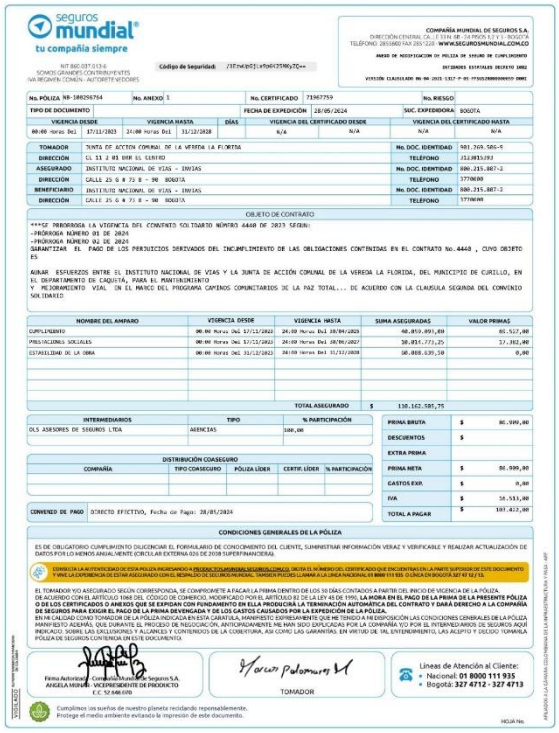

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL. 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU52000000059-D001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: /IEnwip0]:xfoH!25NKyZC++

No. PÓLIZA	98-100256764	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71967759	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 1 03 VER EL CENTRO	TELÉFONO	3128915193
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	3770000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	3770000

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGUN:
-PRORROGA NUMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NUMERO 02 DE 2024
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVINIO SOLIDARIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 28/04/2025	40.859.895,00	65.527,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 28/09/2027	30.014.771,25	17.362,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.008.639,50	0,00
			TOTAL ASEGURADO	$ 130.162.585,75

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	80.909,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	80.909,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	16.533,00
TOTAL A PAGAR	$	107.422,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2016 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROTEGE.SEGUROSMUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRANDA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.040.039

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO *** SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APLICADO A LA CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2016 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - APP



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU52000000059-D001

No. PÓLIZA	98-100256764	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71967759	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

. TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 28.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

.


"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO *** SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APLICADO A LA CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2016 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - APP

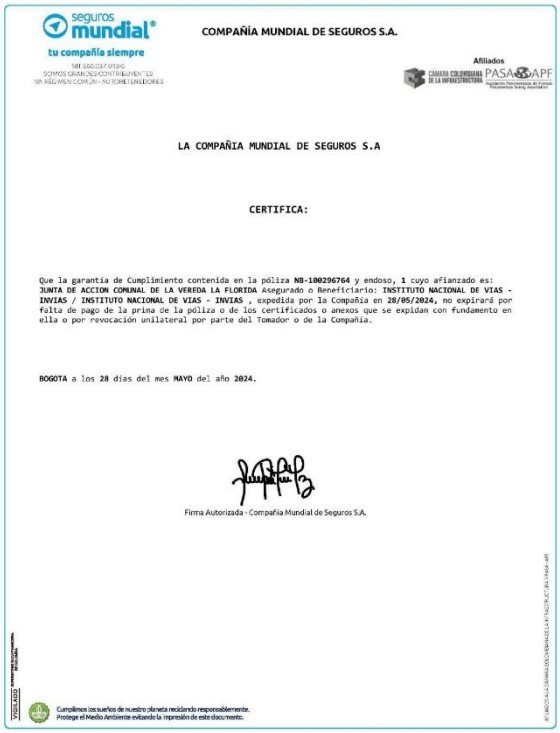

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100296764** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **28/05/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **28** días del mes **MAYO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE -

Referencia de Pago No. 71967759

Fecha de Facturación	28/05/2024	Fecha Límite de Pago	27/06/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA L
CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	901269506
Intermediario	OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 71967759

Fecha de Facturación	28/05/2024	Fecha Límite de Pago	27/06/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente


Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA L
CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	901269506
Intermediario	OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2

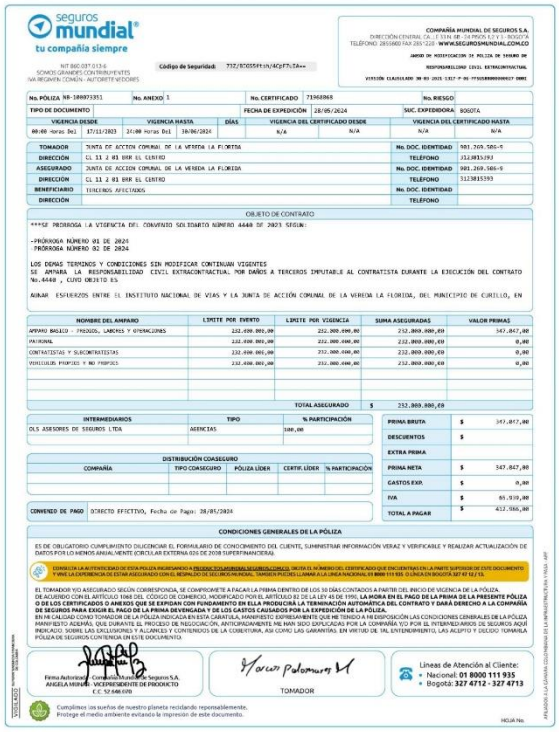

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 7JZ/8C0S5Ft1h/4CpF7cIA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL. 33 N. 6B - 24 PISOS 1 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
90-100073351	1	71960868	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	28/05/2024	90607A

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 03 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123835393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 03 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123835393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023 SIGUN:

-PRORROGA NÚMERO UNO DE 2024
-PRORROGA NÚMERO DOS DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.869.000,69	347.847,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.869.000,69	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.869.000,69	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.869.000,69	0,00
			TOTAL ASEGURADO	$ 232.869.000,69

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.847,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.847,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.919,00
TOTAL A PAGAR	$	412.966,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROVEEDOR TECNOLÓGICO DE SEGUROS.COM/CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERÁS LA INFORMACIÓN DE ESTAS ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada: Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA HOYOS - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.666.070


TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO

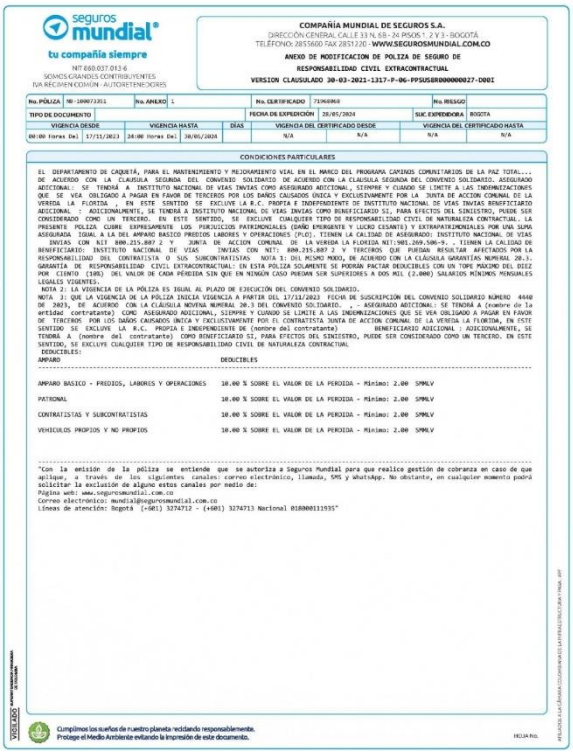

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
90-100073351	1	71960868	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	28/05/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 30/05/2024		N/A N/A	N/A N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA . EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTO SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. . TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.). GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA POLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 30.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO

|1



Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No. 71968068

Fecha de Facturación	28/05/2024	Fecha Limite de Pago	27/06/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA
CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	901269506
Intermediario	OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

B.a.n.c.o	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 71968068

Fecha de Facturación	28/05/2024	Fecha Limite de Pago	27/06/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA
CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	901269506
Intermediario	OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

B.a.n.c.o	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33A NO. 14-95/97 L.7 Y L-BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2831720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

Código de Seguridad: aTV7w5leKbAVT2c7dkz3rg==

No. PÓLIZA	360-1000731551	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71883918	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4440 , ,

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO, ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	83.501,37
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
			TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

PRIMA BRUTA	$ 83.501,37
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 83.501,37
GASTOS EXP.	$ 5.000,00
IVA	$ 16.891,26
TOTAL A PAGAR	$ 105.392,63

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2018 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO. INGRESA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O...NEA EN BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA [illegible]
VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.540.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

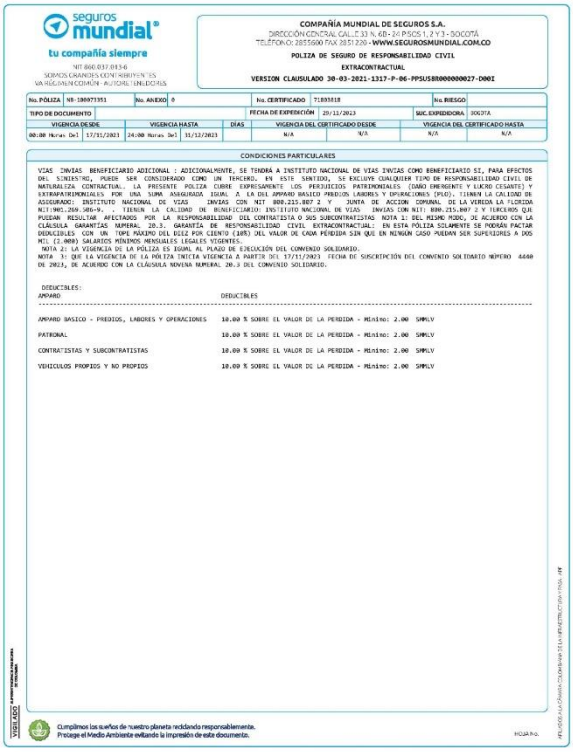

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALL.7 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893818	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT. 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS. NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:


AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APLICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PARA - APP

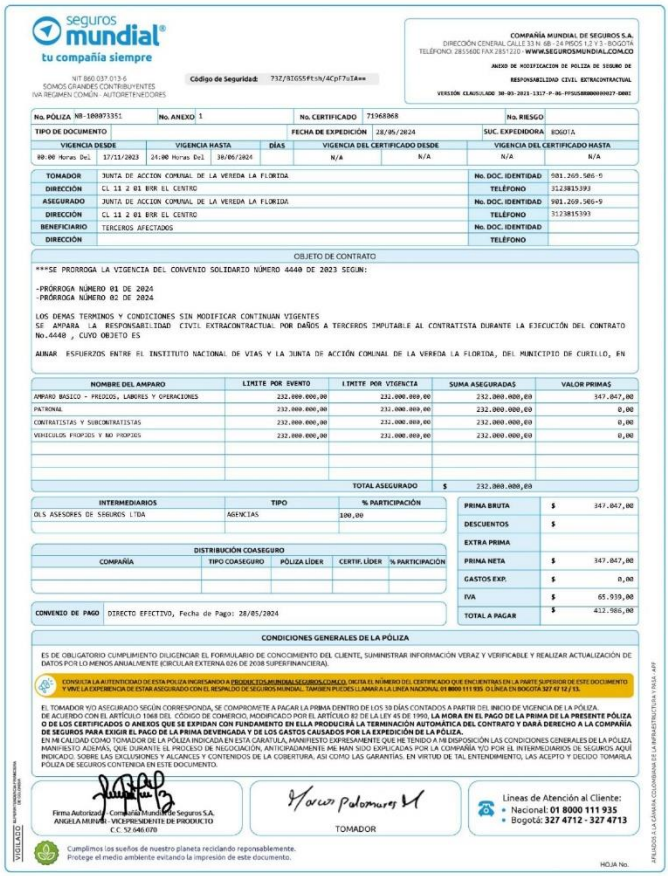

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 73Z/BIG55FtsN/4CpF7oI4==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71968868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	**TELÉFONO**	3123815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	**TELÉFONO**	3123815393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRÓRROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.847,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	347.847,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.847,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.939,00
TOTAL A PAGAR	$	412.986,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2038 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO. SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA. ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNERA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APLICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PARA - APP



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 660.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2831220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960068	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. . TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:


AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111035"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

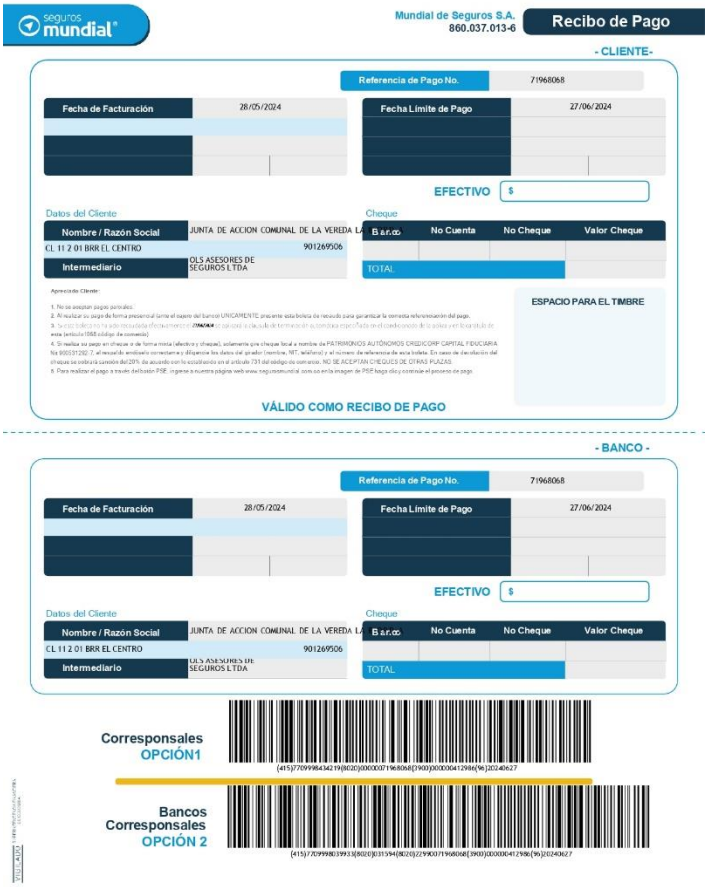

4.8SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA


Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, sin embargo, junto con la interventoría se adoptarán las siguientes medidas, con el fin de garantizar la calidad y correcta ejecución de las obras suscritas al convenio anteriormente mencionado.

- Para los estudios topográficos se exigió a la JAC, los certificados de calibración de los equipos con los cuales se realizaron los levantamientos topográficos. Se ANEXA certificado de mantenimiento y calibración de los equipos usados en el levantamiento topográfico.

4.9 **OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL**

4.9.1 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Se anexa programación de obra

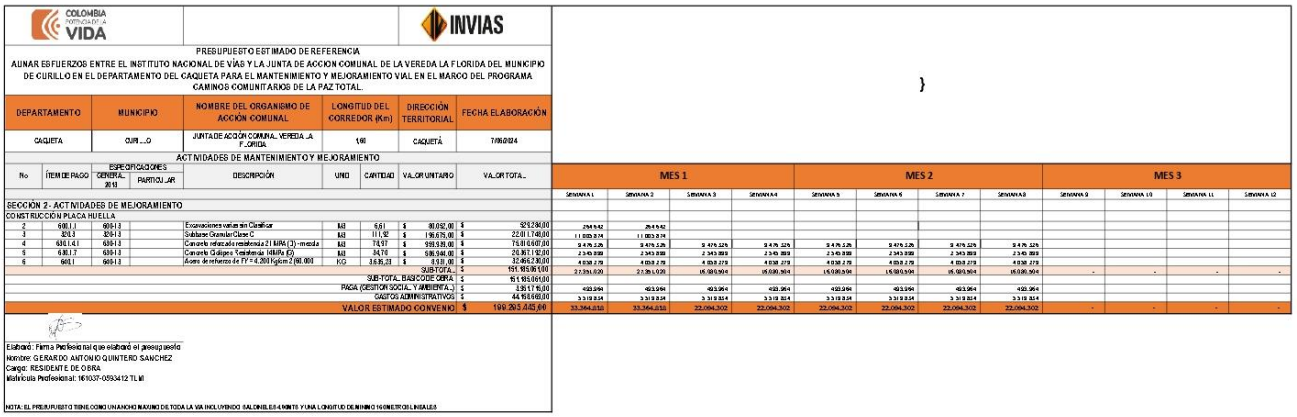

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — INVIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CURILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	CURI ...O	JUNTA DE ACCIÓN COMUNA.. VEREDA ..A F..ORIDA	1+00	CAQUETÁ	7/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VA..OR UNITARIO	VA..OR TOTA..	MES 1				MES 2				MES 3			
									SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																				
CONSTRUCCION PLACA HUELLA																				
2	600.1	600-1.3		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,61	$ 80.092,00	$ 921.230,00	294.942	294.942										
3	330.3	330-1.3		Sobrebase Granular Clase C	M3	111,92	$ 198.675,00	$ 22.011.749,00	11.005.874	11.005.874										
4	630.1.4.1	630-1.3		Concreto reforzado residencial 21 MPA (3) - mezcla	M3	74,97	$ 999.535,00	$ 74.951.660,00	9.475.225	9.475.225	9.475.225	9.475.225	9.475.225	9.475.225	9.475.225	9.475.225				
5	630.1.7	630-1.3		Concreto Ciclopeo Residencial 14MPa (2)	M3	84,70	$ 398.946,00	$ 26.867.182,00	2.345.888	2.345.888	2.345.888	2.345.888	2.345.888	2.345.888	2.345.888	2.345.888				
6	660.1	660-1.3		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000	KG	3.636,33	$ 9,00	$ 32.466.230,00	4.638.279	4.638.279	4.638.279	4.638.279	4.638.279	4.638.279	4.638.279	4.638.279				
							SUBTOTAL	$ 191.165.961,00	27.304.020	27.304.020	16.559.392	16.559.392	16.559.392	16.559.392	16.559.392	16.559.392	-	-	-	-
							SUB-TOTAL, BASICO DE OBRA	$ 191.165.961,00												
							PACA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTA..)	$ 1.951.714,00	488.964	488.964	488.964	488.964	488.964	488.964	488.964	488.964				
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.928.000,00	5.518.824	5.518.824	5.518.824	5.518.824	5.518.824	5.518.824	5.518.824	5.518.824				
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 198.265.675,00	33.364.808	33.364.808	22.064.302	22.064.302	22.064.302	22.064.302	22.064.302	22.064.302	-	-	-	-

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matrícula Profesional: 161037-0393412 TLMI

NOTA: EL PRESUPUESTO TIENE COMO UN ANCHO MAXIMO DE TODA LA VIA INCLUYENDO SALONELES 4 METR Y UNA LONGITUD DE MINIMO 1 KILOMETROS LINEALES

Se anexa presupuesto actualizado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — INVIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA DEL

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	CURILLO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORIDA	1,60	CAQUETÁ	7/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6,61	$ 80.052,00	$ 529.284,00
3	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	111,92	$ 196.675,00	$ 22.011.748,00
4	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla	M3	78,97	$ 959.939,00	$ 75.810.607,00
5	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	34,70	$ 586.944,00	$ 20.367.192,00
6	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000	KG	3.635,23	$ 8.931,00	$ 32.466.230,00
							SUB-TOTAL	**$ 151.185.061,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 151.185.061,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 3.951.715,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.158.669,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 199.295.445,00**

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matrícula Profesional: 161037-0593412 TLM

Revisó: Firma Líder Zona Programa
Nombre: MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY
Cargo: PRESIDENTE JAC LA FLORIDA
C.C : 51.975.533

NOTA: EL PRESUPUESTO TIENE COMO UN ANCHO MAXIMO DE TODA LA VIA INCLUYENDO SALDINELES 5 MTS Y UNA LONGITUD DE MINIMO 137 METROS LINEALES

4.9.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se anexa plan de inversión



4.9.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Anexo actas comité operativo

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 1	Dirección Territorial INVIAS: CAQUETÁ	Fecha: 07-06-2024

Vereda LA FLORIDA – Municipio DE CURILLO - Departamento: CAQUETÁ
No. Convenio(s) Solidario(s): CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023
Ejecutor(es): MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JUAN CARLOS SANABRIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FABIO JESÚS MEJIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MARCO PALOMARES MUTUMBOY	JAC LA FLORIDA	PRESIDENTE
GERARDO ANTONIO QUINTERO	JAC LA FLORIDA	INGENIERO RESIDENTE
JADER ACOSTA IMBACHI	JAC LA FLORIDA	CONTADOR
RAUL VELANDIA CRISTANCHO	JAC LA FLORIDA	VEEDOR

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros participantes del comité operativo.
2. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
3. Análisis de cotizaciones presentadas
4. Elección de proveedores.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Análisis de precios.
2- Elección de proveedores.
3- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
4- Elección de uniformes.
5- Proposiciones y Varios

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen

1

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los cuatro (4) miembros principales, el presidente, el ingeniero residente, contador y un representante de la veeduría.
2.	**Socialización de formatos a utilizar:** Se socializa a los participantes del comité operativo el formato a usar con referencia al análisis de los proveedores oferentes en términos de precio, disponibilidad de materiales, tiempo de entrega, facilidades de entrega, transporte en materiales, entre otros aspectos importantes para el suministro de los bienes y servicios requeridos para la placa huella-
3	**Presentación de cotizaciones:** A continuación se detallarán las cotizaciones de los proveedores seleccionados
3.1	MATERIALES EPP: Se consigna que la dotación se comprara con la empresa **RPM,** ya que la empresa nos ofrece los artículos requeridos dando cumplimiento a las necesidades establecidas por INVIAS. El pago se realiza pagando el 100% al proveedor.

RPM SUMINISTROS Y DOTACIONES S.A.S.
NIT. 901.426.432-6
CR 14 #20-14 BARRIO LA CONCILIATA
TEL 3160527622-3115538527
email: rpmsuministrosydotaciones@gmail.com
Florencia Caquetá

Florencia, 10 de mayo de 2024

señores:
VEREDA LA FLORIDA
CRISTIAN VARGAS
Municipio de curillo

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO CERTIFICADO	UNIDAD	7	27.000,00	189.000,00
2	BOTA CAUCHO PUNTERA	PAR	7	88.000,00	616.000,00
3	GAFA SEGURIDAD	UNIDAD	7	6.000,00	42.000,00
4	GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO	PAR	14	10.000,00	140.000,00
5	GUANTE ANC VAQUETA REFORZADO	PAR	14	11.000,00	154.000,00
6	PETO DELANTAL EN CARNAZA 60X10	UNIDAD	5	25.000,00	125.000,00
7	CARETA PARA GUADAÑAR	UNIDAD	2	38.000,00	76.000,00
8	TAPAOIDOS DE INSERCION	UNIDAD	14	2.500,00	35.000,00
9	BOTIQUIN TIPO A	UNIDAD	1	130.000,00	130.000,00
10	OVEROL EN DRIL CON CINTA REFLECTIVA EN PECHO - PIERNAS - BRAZOS Y ESPALDAS CON BORDADO EN EL PECHO DE INVIAS	UNIDAD	8	97.000,00	776.000,00
11	TELA PARA CERRAMIENTO POR METRO COLOR VERDE	METRO	50	3.000,00	90.000,00
12	PLASTICO NEGRO CAL 6 X 4 MTS DE ANCHO	METRO	40	7.000,00	280.000,00
13	CINTA PELIGRO X 500 MTS	ROLLO	2	30.000,00	60.000,00
14	CONO SEÑALIZACION 70 CMS	UNIDAD	2	45.000,00	90.000,00
15	PALETA PARE SIGA	UNIDAD	2	16.000,00	32.000,00
16	CANECA PLASTICA X 55GLS	UNIDAD	1	150.000,00	150.000,00
TOTAL					3.235.000,00

CONDICIONES COMERCIALES:
Forma de pago: CONTADO
Validez de la oferta: 8 DIAS
Tiempo de entrega: 8 DIAS
Sitio de entrega: FLORENCIA

Atentamente,

PAOLA ANDREA MORENO PEREZ
GERENTE

2

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

3.2	**Topografía:** Para la topografía se recibieron varias cotizaciones de las cuales, la única persona que quiso continuar y sostener su oferta es el Sr Daniel Arias, estas cancelaciones de las ofertas se debe por las situaciones de conflicto que vive la zona a realizar el trabajo topográfico. Es así, como el comité determinó elaborar la topografía con el señor Daniel Felipe Arias Gonzales, el cual oferto sus servicios por valor de $ 1´600.000 y fue el único que estaba de disponible para ingresar a la zona del servicio. El servicio se debe cancelar 50% inicial para el acceso a la zona y el saldo 50% se paga a la entrega del informe en transferencia directa al proveedor. Por otra parte, se indica que el pago inicial se realiza en efectivo mediante dinero prestado al presidente de la junta.

DANIEL FELIPE ARIAS GONZALEZ
TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA

Florencia,07 de junio de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA LA FLORIDA
Nit. 901269506-9
Jacvereda.laflorida0@gmail.com
Florencia, Caqueta.

Asunto: propuesta de trabajo levantamiento topográfico tramo vial 150 m lineales aprox.

Respetuosamente me permito presentar propuesta formal para llevar a cabo el levantamiento topográfico de 150 m lineales aproximadamente de un tramo vial sobre vía terciarias con fines de proyección de plata huella, donde se desarrollarán las siguientes actividades

- Levantamiento topográfico con sistema GNSS (RTK).
- Levantamiento topográfico del inventario físico de cercas, postes, construcciones existentes en todo lo relacionado para inveliucrar y sustanciar expediente técnico físico.
- Nivelaciones curvas de nivel cada 50 cm
- Localización general, ciudad, vereda, sector

Tiempo: el tiempo estimado del trabajo de campo, procesamiento de la información y entrega de productos es de 20 días calendario

Equipos: La comisión de topografía cuenta con GNSS RTK I50

Valor: El valor de los servicios profesionales ofrecidos es de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS (1.600.000) MCTE, los cuales se cancelarán en un 50% para inicios de la actividad y un 50 % cuando se entreguen los productos.

Cordialmente.

DANIEL FELIPE ARIAS GONZALEZ
C.C 1113831674 DE SEVILLA VALLE
Tecnólogo en topografía

3

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

3.3	**Estudio de suelos:** Para el estudio de suelos, se recibieron varias cotizaciones de las cuales, la única empresa que quiso continuar y sostener su oferta fue Ingesuelos para la elaboración de estudios de laboratorio, estas cancelaciones de las ofertas se deben por las situaciones de conflicto que vive la zona a realizar el trabajo. Es así, como el comité determinó elaborar el estudio de suelos con Ingesuelos, el cual oferto sus servicios por valor de $ 1´700.000 más IVA, para un total de $2.100.000; fue el único que estaba de disponible para ingresar a la zona a prestar el servicio. El servicio se debe cancelar 50% inicial para el acceso a la zona y el saldo 50% se paga a la entrega del informe en transferencia directa al proveedor. Por otra parte, se indica que el pago inicial se realiza en efectivo mediante dinero prestado al presidente de la junta.

INGSUELOS
www.ingsuelos.com.co

CL-B-01-2024-v0

Florencia, Caquetá
29/04/2024

VEREDA LA FLORIDA. ZONA RURAL DE CURILLO.

Asunto: Propuesta económica –estudio de suelos mediante apiques y CBR sobre muestra inalterada.

Respetados,

A continuación, se presenta la propuesta económica.

ITEM	Parámetro o Ensayo	Unidad	VR PARCIAL
1	Apique hasta 1.50m con toma de muestras para ensayos de clasificación y CBR inalterado. (Incluye ensayo de cono dinámico)	Global	$1.700.000
	TOTAL ANTES DE IMPUESTOS		$1.700.000

NOTAS
- Los precios para estudio de suelos mediante apiques incluyen viáticos y transporte de personal, muestras y equipos.
- Los precios son antes de IVA del 19%.

FORMA DE PAGO
- 50% anticipo.
- 50% contra entrega del informe de resultados.

TIEMPOS DE ENTREGA
- 10 días hábiles o a definir con el cliente según requerimientos.

DATOS PARA CONSIGNACIONES
Tipo de Cuenta: Ahorros
Entidad: Bancolombia
No.: 466-125542-69
Nombre: INGSUELOS S.A.S.
NIT: 900.648.551-3

Cordial Saludo,

GERMÁN GARCÍA DÍAZ
GERENTE
Ing. Civil, M. Sc. Geotecnia.

4

INVIAS CAMINOS

3.4

Materiales de Ferretería:
Se Realizo la cotizacion en tres ferreterias y con la ferreteria de la ciudad de Florencia, ALMACENES CORAL ofertó los precios más bajos que en belén de los Andaquies y San Jose de Fragua. Por lo tanto, se toma la decisión de adquirir los materiales en ALMACENES CORAL. Se pagará 50% inicial por transferencia al ferretero y el saldo en un segundo pago para la entrega final de materiales, transferencia directa al proveedor.

CORAL
WILMER MONTAÑA LONDOÑO
COTIZACION N° 4406

Item	Codigo	Descripción	unidad	Cantidad	V/Unitario	Valor Total
1	10000000	CEMENTO CEMEX GRIS 1/10 BULTO		600	25.900	$ 15.540.000
2	10000337	VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.5ML)		750	21.900	$ 11.505.000
3	10000131	ALAMBRE NEGRO # 8 KILO		182	5.000	$ 1.095.000
4	10000000	PUNTILLAS CON CABEZA 2 1/2 " PUNA		10	3.000	$ 36.000
5	10000000	CARRETILLA METAREDONDO PLASTICA BELLOTA		3	105.000	$ 680.000
6	10000000	BARRA PODADORA DE 1.80MTS		2	94.900	$ 189.800
7	10000000	PALA ADOCENA NO.2		6	18.000	$ 108.000
8	10000000	PALIN HEVIDEME CAL 16 HERRADURO		3	47.057	$ 51.172
9	10000000	CARO PALA		6	9.000	$ 72.000
10	10000000	ALMADANA HERRADURO CON CARO Y MACETA GRANDE DE LIBRAS		1	105.000	$ 105.000
11	10000000	CUCHILLA PROFESIONAL CORNETA 100		1	199.000	$ 199.000
12	10000000	SILLAR PARA CONSTRUCCION		24	5.750	$ 138.000
13	10000000	SERRUCHO EN METAL MADERA 20" UDUKE		2	35.000	$ 50.000
14	10000000	PANTALLA PULIDO 25 MM		3	16.750	$ 67.000
15	10000000	PALUSTRE PL PLASTICO CORNETA #5		2	8.000	$ 16.000
16	10000000	PALUSTRE PL PLASTICO CORNETA #5		1	7.000	$ 7.000
17	10000000	PLASTICO NEGRO 3006 4MLS 1PTS		100	5.000	$ 500.000
18	10000000	...DUDE 3N 5 0.20 X 5.00 EN 1/8		1.000	1.000	$ 1.000.000
19	10000000	...DUDE METAREDLAM 100 BAR 3N 1/8		500	3.000	$ 1.515.000
20	10000000	TELA PP 2* 100M DOBLADA (VERDE SOLIDA)		30	2.000	$ 60.000
21	10000000	CINTA PEGADO ROLLO X 50 MT		2	30.000	$ 50.000
22	10000000	...CAMPEX PLASTICO 50 GL		3	128.000	$ 384.000

Nota:
Forma de Pago: EFECTIVO
Validez oferta: 30 DIAS
Garantia:
Tiempo de entrega: 1 DIAS
Lugar de entrega: EN PANGUITA, LIBRE DE DESCARGUE Y ENTREGAS PARC

CUENTAS A CONSIGNAR
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE: 64765500642 A NOMBRE DE Wilmer montaña Londoño. 901.137.804-978

Digitalizo:

Subtotal	$ 30.990.500,00
Descto	$ 0,00
Gravado 19%	$ 30.990.500,00
Iva 19%	$ 5.888.195,00
Sub 10%	$ 5.982.249,00
Sub 5%	$ 310.525,00
Total	$ 43,972,172.00

Página 1 de 1 Nota Digitalizo: 1-08-2024

5

INVIAS CAMINOS

3.5

Materiales Pétreo:
En el proceso de cotización de materiales pétreos se recaudó dos cotizaciones: playa la raya del municipio de Albania y la trituradora de Morelia, se tomará la decisión de comprar el material pétreo con Multimezclas y agregados ubicada en el Municipio de Morelia, quien oferta todo el material requerido y al mejor precio. Por las condiciones de pagos se decide pagar el 50% anticipado inicial en efectivo y el saldo 50% se paga a la entrega final de los materiales en transferencia directa al proveedor. Por otra parte, se indica que el pago inicial se realizara en efectivo mediante dinero prestado al presidente de la junta.

MULTIMEZCLAS & AGREGADOS
VENTA DE MATERIALES
CALIDAD, PROFESIONALISMO Y CUMPLIMIENTO

Fecha	Mayo 2024
Empresa	VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CURILLO
Nit	901265506-9
Contacto	3208412572
Celular	
Ubicación	Morelia

Material	Precio/m3 antes de IVA	Cantidad Requerida	Total
Gravilla 1/2"- 1 viaje de 6m3	$ 83.333	6	$ 500.000
Gravilla 3/4"- 1 viaje de 6m3	$ 83.333	6	$ 500.000
Base Granular"-1 viaje de 6m3	$ 60.000	6	$ 360.000
Arena triturada 1/2"-1 viaje de 6m3	$ 58.333	6	$ 350.000
Arena triturada3/8"-1 viaje de 6m3	$ 30.000	6	$ 180.000
		SUBTOTAL	
		IVA	$
		TOTAL	
Nota	*Material cargado en planta **Material cargado en playa		

Cordialmente: Daniel Alberto Corrales arcil.

Para consignaciones o transferencias bancarias

Banco	Cuenta	No. cuenta
Banco Bogota	Ahorros	244-074-878
Bancolombia	Corriente	465-30500-787

6

INVIAS CAMINOS

3.6

Materiales Pétreo:
De las cotizaciones presentadas para el alquiler de maquinaria se escogió la que tenía los precios más favorables para la junta, el menor tiempo de Standby y que ofrece las facilidades de pago. Se paga 50% inicial y 50% al final del servicio con transferencia directa al proveedor.

ALQUILER DE MAQUINARIA
ZM

Belén de los Andaquíes, 22 de mayo de 2024

Cotización: **BA-0015-2024**

Señores:
Junta de Acción Comunal de la Vereda la Florida

Asunto: **Cotización Alquiler de equipos para IAC del municipio de Curillo Caquetá**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, se realiza la cotización de las maquinarias relacionadas en la solicitud.

Términos de cotización:

- Precios sin IVA.
- Precios fijos (no incluye transporte).
- Los días de trabajo son de Lunes a Sábado.
- Standby de 3 horas para los días que no se trabaje.
- Se relaciona precio del transporte de la maquinaria
- Se incluye servicio de viáticos para el transporte de materiales.

Item	Equipo / Maquinaria	Unidad	Cantidad	Standby	V/ Unitario	V/ Total
1	Retroexcavadora	Hora	30	3	$170.000	$ 5.100.000
2	Motoniveladora	Hora	30	3	$200.000	$ 6.000.000
3	Vibro Compactador	Hora	30	3	$160.000	$ 4.800.000
4	Transporte de Maquinaria	Servicio	3		$1.600.000	$ 4.800.000
						$ 21.300.000

Item	Equipo / Maquinaria	Unidad	Cantidad	Standby	V/ Unitario	V/ Total
5	Volqueta	Trayecto	1		$1.000.000	$ 1.000.000

Forma de pago: 50% anticipado – 30% parcial – 20% al finalizar.

Sin otro particular,

CARLOS ZAMBRANO
CARLOS ZAMBRANO CORTES
CC. 1.080.362.496
Belén de los Andaquíes

7

INVIAS CAMINOS

3.7

Examen médico ocupacional:
Después del análisis de las cotizaciones se eligió en comité que LABOREMOS SAS, sea el que realice los respectivos exámenes de pre ingreso ya que nos ofrece el servicio de examen médico ocupacional virtual y con buen precio. Se decide realizar este pago en efectivo para adelantar los procesos ya que tuvimos retrasos al inicio de estos procesos.

Laboremos
Seguridad, Salud y Ambiente
Medicina Laboral y Salud Ocupacional

Florencia, 07 de mayo de 2024

Señores: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA**
NIT: 901265506 - 9
Ciudad

Asunto: Cotización Examenes Médicos Ocupacionales.

Cordialmente me permito presentar el listado de servicios y precios de los Valoraciones Ocupacionales que ofrecemos a ustedes, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos dictados y exigidos en nuestra empresa **LABOREMOS** para la prestación de los servicios.

A continuación, relacionos los exámenes con su respectivo valor.

Tarifas para toma de exámenes en IPS laboremos Florencia

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	VALOR UNITARIO Type I
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular (ingreso, periódico, retiro por temporada)	$ 60.000

* Se prorata día y se cobra acompañamiento desde el área de medicina laboral.

Atentamente,

JORGE ANDRES BOLIVAR GOMEZ
Representante Legal
C.C 79.987.207
Cel: 3118881843 - 3053828732

8

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

3.8 Examen médico ocupacional:

De las cotizaciones presentadas para el alquiler de maquinaria de equipos menores y se escogió la que tenía los precios más favorables para la junta, el cual se pagará 50% inicial y 50% al finalizar el servicio, con transferencia directa al proveedor.

H&D CONSTRUEQUIPOS
Herramientas Y Diseño
Nit. 17.689.556-2

Florencia 07 JUNIO 2024

Señores: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA**
NIT: 901260506-5
Ciudad

Asunto: Cotización Alquiler Herramientas.

Cordial saludo

En atención a la invitación de cotizar, me permito relacionar a continuación detalles:

OBJETO	VR ALQUILER MES
VIBRO DE CONCRETO ELECTRICO 0.9 GASOLINA	1550.000
MEZCLADORA DIESEL 1 SLATO	$800.000
PLANTA ELECTRICA 8500W DIESEL	$1.000.000
MOTOGUADAÑA GASOLINA 7" CON GUIOS	$600.000

La anterior cotización no incluye IVA. Detalles y cantidades se especifican en el momento de la entrega, el pago se realiza por anticipado.

Agradezco su amable atención a la presente cotización esperando una positiva respuesta.

CORDIAL SALUDO

LUIS EDWIN CARDOSO CAICEDO
NIT.17.689.556-2
Cra 30 # 24-93 ciudadela habitacional
Tel. 3123042267

9

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

3.9 Transporte Material Ferretería:

De las cotizaciones presentadas para transporte de materiales de ferretería se escogió la que tenía los precios más favorables para la junta y el que nos realiza la entrega en la obra.

Florencia, junio 06 de 2024

Señores
Junta de Acción Comunal Vereda La Florida
Curillo - Caquetá

En respuesta a su solicitud de cotización nos permitimos ofrecerle el siguiente servicio:

	Descripción del Producto	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	TRANSPORTE MATERIALES DE FERRETERIA FLORENCIA – VEREDA LA FLORIDA OBRA	5	$1.000.000	$5.000.000
	TOTAL			**$ 5.000.000**

Condiciones:

Validez de la oferta: 15 días calendario.
Forma de pago: 50% anticipo y el otro 50% al finalizar los viajes de transporte.
Lugar de entrega: Vereda La Novia Curillo Caquetá

Dado en Florencia, Caquetá a los 06 días del mes de junio 2024.

Sin otro particular, me suscribo

Camila Andrea Álvarez Arrigui
Representante Legal

10

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

3.10 Maderas:

Después del análisis de las cotizaciones se eligió en comité que: Edgar Aldana es la persona seleccionada para suministrar la madera. El pago se realiza el 100% en transferencia al tercero.



11

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se analizaron cada una de las cotizaciones y se tomó la decisión de elegir a los proveedores que realizaran los suministros de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto y por ende se eligieron a las siguientes empresas: ✓ Cotización Para Dotación: RPM SUMINISTROS Y DOTACIONES - VALOR $ **3.225.000 +IVA.** **SELECCIONADA** ✓ Topografía: DANIEL FELIPE ARIAS GONZALEZ VALOR $ **1.600.000** **SELECCIONADA** ✓ Laboratorio: ING. SUELOS VALOR $ **1.700.000 MAS IVA** **SELECCIONADA** ✓ Materiales de ferretería: ALMACENES CORAL FERRETERIA **SELECCIONADA** ✓ Material Pétreo: MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS, **según los metros requeridos** **SELECCIONADA** ✓ Maquinaria Amarilla Alquiler: CARLOS ZAMBRANO CORTEZ **SELECCIONADA** ✓ Transporte de Material Pétreo: CARLOS ZAMBRANO CORTEZ **SELECCIONADA** ✓ Exámenes Médicos: LABOREMOS VALOR **30.000** **SELECCIONADA** ✓ Alquiler Equipos Menores: H&D CONSTRUEQUIPOS **SELECCIONADA** ✓ Transporte de materiales de ferretería: Camila Andrea Álvarez Arrigui **SELECCIONADA** ✓ Madera: **Edgar Aldana** **SELECCIONADA**

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos			
1.	Informe Técnico de Avance:	SI ____	NO __X__	No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera:	SI	NO X	No. Folios:
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO ___X__	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI	NO X	No. Folios:

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(Se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

12

INVIAS CAMINOS

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
REMITIR LAS ACTAS DEL COMITÉ OPERATIVO	CONTADOR / INGENIERO	08-06-2024
ELABORAR EL PLAN DE INVERSION	CONTADOR / INGENIERO	08-06-2024
PRESENTAR LOS CONTRATOS DE LOS PROFESIONALES	CONTADOR	08-06-2024
ENVIAR EXAMENES LABORALES DE INGRESO.	CONTADOR	08-06-2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Cargo: Director Interventoría

Nombre: MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY
Cargo: Presidente OAC La Florida

Nombre: FABIO JESÚS MEJIA
Cargo: Residente Interventor

Nombre: JADER ACOSTA IMBACHI
Cargo: Contador OAC La Florida

Nombre: RAUL VELANDIA CRISTANCHO
Cargo: presidente Veeduría Ciudadana

Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO S.
Cargo: Residente de Obra.


<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

13

4.9.4. ACTAS DE REUNIÓN

Se anexa acta de socialización



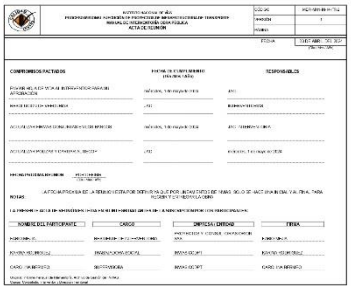

1. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1 Información general del contrato

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA *No. 4647 de 2023*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	*4647 DE 2023*

CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS*
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*
CONTRATISTA	*PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS*
VALOR TOTAL	*$ 109.303.594*
VALOR ACUMULADO	*$ 109.303.594*
PLAZO INICIAL	*6 MESES*
PLAZO PRORROGA No. 1	6 MESES 9 MESES Y 16 DIAS
PLAZO ACUMULADO	9 MESES Y 16 DIAS
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1	*30 DE JUNIO DE 2024*
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2	*16 DE OCTUBRE DE 2024*

*Tabla **2**. Información general contrato 4647 de 2023*

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante este periodo se realizó el seguimiento desde la oficina central apoyando a la junta y revisando la documentación necesaria para dar inicio a las obras.

Se hizo control de calidad en los materiales utilizados y se verificó que estos cumplan con las especificaciones técnicas

2. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31/JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3979de 2023, 3714 de 2023, 4440 de 2023, 3674 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DIAMANTE

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	MOTOCICLETA																	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

NUMERO DE PLACA:FIF85G MARCA: BENELLI CILINDRAJE 500CC MODELO:2023

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: LOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INTERVENTORIA SE LES REALIZARÁ MANTENIENTO PREVENTIVO TODO LOS 5 DE CADA MES QUE ESTE EN EJECUCION DEL PROYECTO

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato relación de empleado
Anexo planialla pagada del mes de junio
Anexo certificación del pago de seguridad social

ORION
901503188-3

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
CRA 83 B # 15-98 CALI E-mail mabelchud@yahoo.com

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

CERTIFICA

Que para la ejecución del contrato de interventoria 4647 de 2023 firmado entre el **INVIAS**, y **PROYECTO Y CONSULTORIAS ORION SAS** se realizaron los respectivos pagos de seguridad social (**SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA**) durante el periodo de JUNIO de 2024, estando a paz y salvo en este periodo.

Para constancia de lo anterior se firma en Cali, Valle del Cauca a los 30 días del mes de JUNIO del 2024

Razón Social: **PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.**
Representante legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
C.C 31.577.305 DE CALI
Dirección: CRA 83 B # 15-98 CALI
Telefono: 3224097491
E-mail mabelchud@yahoo.com
Ciudad: CALI

2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

MES INFORME MENSUAL: jun-24 — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIOS: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1315123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00
				TOTAL		$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 109.303.594,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	abr-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2023	$ 109.303.594,00	$ 98.803.594,00		
2	may-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2024	$ 109.303.594,00	$ 88.303.594,00		
3	jun-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2025	$ 109.303.594,00	$ 77.803.594,00		
TOTALES		$ 25.515.000,00	$ 5.985.000,00	$ 31.500.000,00	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 25.515.000,00	$ -	$ 25.515.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -	$ -	$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -	$ 5.985.000,00	$ 5.985.000,00
VALOR TOTAL	$ 25.515.000,00	$ 5.985.000,00	**$ 31.500.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. :

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

2.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 1: 30/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 2: 16/10/2024

VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND


Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo polizas de interventoria

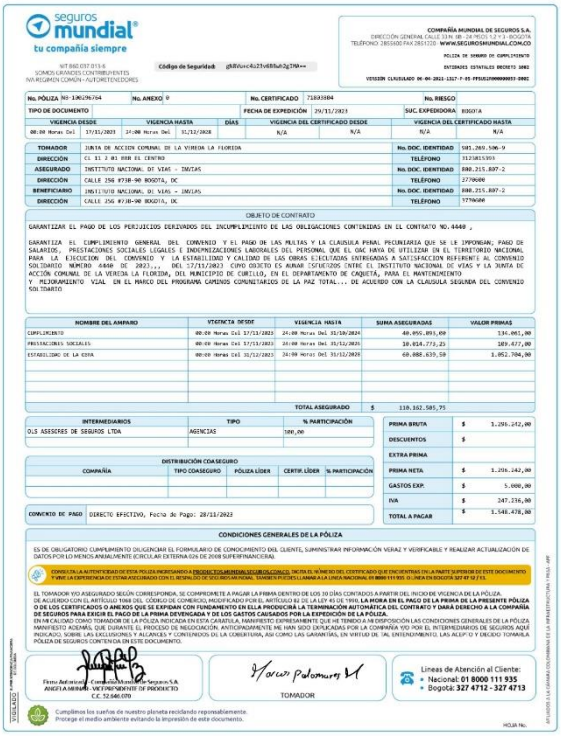

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851230 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100296764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023		SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028	N/A		N/A	N/A	

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No.DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 000 EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMINTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4440 ,

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRETORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023,... DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	44.095.093,69	134.063,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	10.014.773,25	189.677,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.088.639,50	1.052.704,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.162.505,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.296.142,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.296.142,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	247.236,00
TOTAL A PAGAR	$	1.548.478,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MORAN - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.685.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851230 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100296764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023		SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028	N/A		N/A	N/A	

CONDICIONES PARTICULARES


. TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.

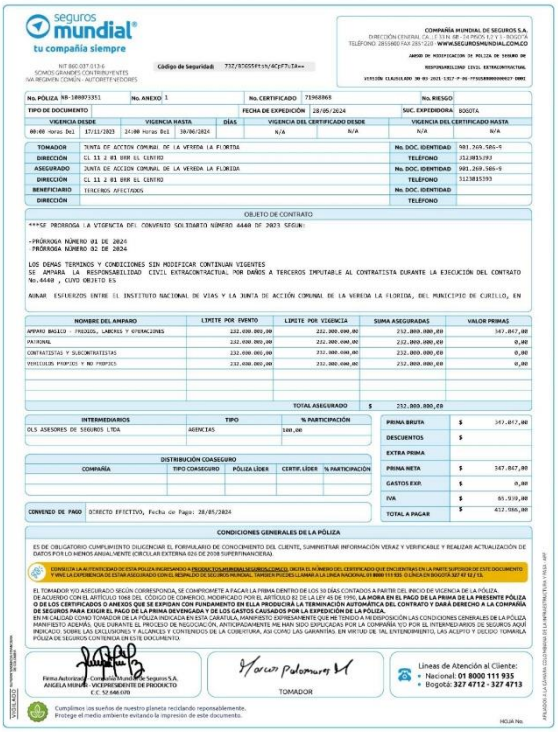

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL. 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2853720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	1	71960868	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	28/05/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 OFF EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 OFF EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.047,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.047,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.047,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.919,00
TOTAL A PAGAR	$	412.966,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935, CLÍNICAS EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENDIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRAN - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.046.070

TOMADOR


Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.

APLICADO A LA CLÁUSULA COLOMBIANA DE LA IMPRESIÓN DE LA PÓLIZA - APP

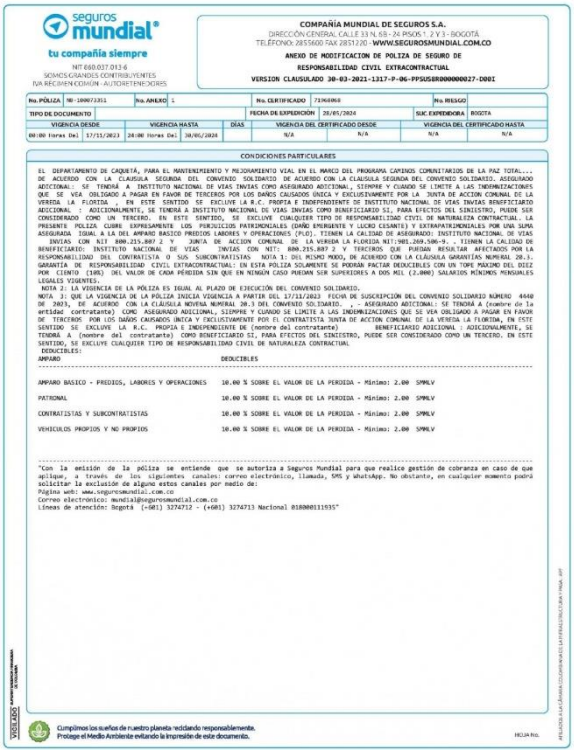

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL. 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2853720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	1	71960868	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	28/05/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA . EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9 . TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS. NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. — ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV


"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electronico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.

APLICADO A LA CLÁUSULA COLOMBIANA DE LA IMPRESIÓN DE LA PÓLIZA - APP

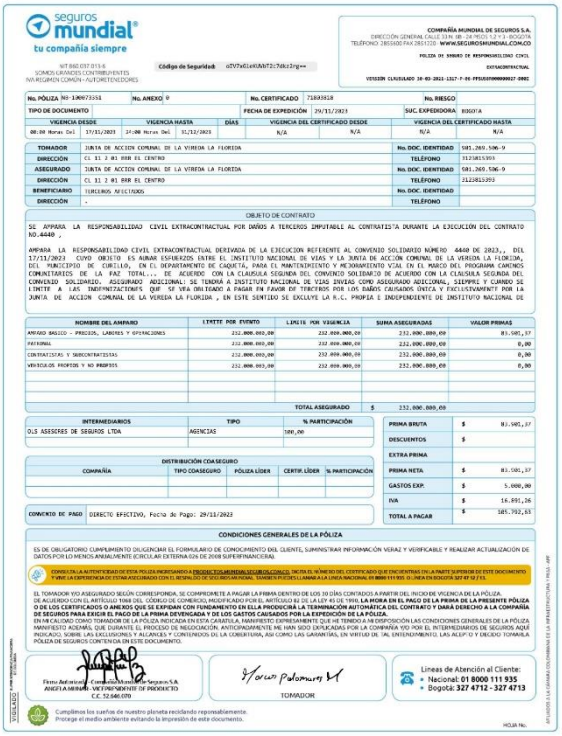

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851200 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	0	71880818	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	29/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.596-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 RRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.596-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 RRR EL CENTRO	TELÉFONO	2123815393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4648 ,

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4660 DE 2023,,: DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.,, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	83.505,37
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	83.505,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	83.505,37
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	16.891,26
TOTAL A PAGAR	$	105.792,63

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROACTIVA.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, INGRESA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCONTRARÁS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERIFICA LA EXISTENCIA DE ESTAS ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE LAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRANDA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.660.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851200 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	0	71880818	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	29/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TENDRÁ LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:NRC.260.000-9. , TENDRÁ LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4660 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.


DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.

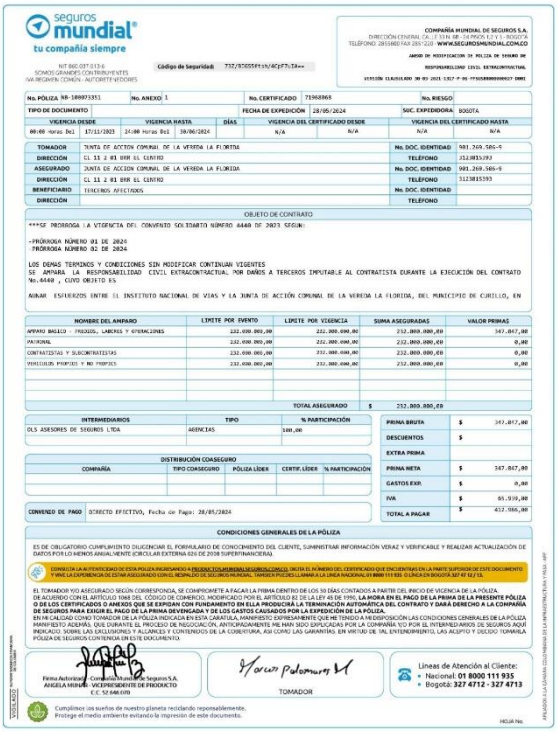

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 7JZ/BC65Ftsh/4CpF7cIA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL. 33 N.6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUSU0000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	1	71960868	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	28/05/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3124835192
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123835193
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	N/A

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.047,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.047,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.047,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.919,00
TOTAL A PAGAR	$	412.966,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2016 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROVEEDOR.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARA LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENDIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE, ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.680.039

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO



seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL: CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUSU0000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	1	71960868	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	28/05/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. . TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INDICA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. , – ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Anexo formato plan de cargas

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ No. 6 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 3230 DE 15/09/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

PLAZO INICIAL: 0,6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 109.303.594,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 109.303.594,00

PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 16 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 19/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2023				2024														TOTAL	
													MES		MES		MES		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		MES			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
	1	Director de Interventoria	$ 5.000.000		0,00	$ 2.000.000											$ -	0,05	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000			1,00	$ 7.500.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000		4,00	$ 16.000.000											$ -	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	0,27	$ 1.475.594	0,00	$ 2.000.000			4,9	$ 19.475.594
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000											$ -		$ -		$ -	0,20	$ 560.000		$ -		$ -	0,20	$ 560.000			0,40	$ 1.120.000
	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000											$ -		$ -	0,40	$ 1.120.000		$ -		$ -		$ -	0,20	$ 560.000			0,60	$ 1.680.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00																										$ 3.000.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000																													
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000																													
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000																													
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 5.000.000																													
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.000.000																													
	1	Inspector	$ 1.200.000		8,00	$ 9.600.000											$ -		$ -		$ -		$ -	0,60	$ 600.000	0,60	$ 600.000		$ -			1,20	$ 1.200.000
	1	Inspector SST	$ 1.200.000		0,48	$ 576.000											$ -		$ -		$ -	0,24	$ 288.000		$ -		$ -	0,24	$ 288.000			0,48	$ 576.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 33.916.000,00											$ -		$ 5.250.000		$ 6.370.000		$ 6.098.000		$ 5.850.000		$ 3.325.593		$ 4.658.000				$ 34.551.593
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36											0,00		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36				2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 80.041.760											$ -		$ 12.390.000,0		$ 15.033.200,0		$ 14.391.280,0		$ 13.806.000,0		$ 7.848.399,7		$ 10.992.880,0				$ 81.541.760

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 110.000	Dia	$ 4,00	$ 440.000											$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 110.000	1	$ 110.000	2	$ 220.000			4,00	$ 440.000
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 300.000	Mes	$ 13,00	$ 3.900.000											$ -	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000			8,00	$ 2.400.000
	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y Vmaquinita)	$ 2.800.000	Según comprobante por mes	$ 2,00	$ 5.600.000											$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 5.600.000			2,00	$ 5.600.000
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Según comprobante por mes	$ 4,00	$ 1.200.000											$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4	$ 1.200.000			4,00	$ 1.200.000
	1	Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios públicos)	$ -	Según comprobante por mes	$ -	$ -											$ -		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 175.000,00	Según comprobante por mes	$ 2,00	$ 350.000											$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 175.000	1	$ 175.000		$ -			2,00	$ 350.000
	1	Gastos de reuniones, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias, videos, etc	$ 80.000,00	Según comprobante por mes	$ -	$ -											$ -		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax correo, internet, etc)	$ 80.000,00	Según comprobante por mes	$ 4,00	$ 320.000											$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 80.000	2	$ 160.000	1	$ 80.000			4,00	$ 320.000
	1	Vivienda Técnica Comunitaria	$ 38.000,00	Según comprobante por mes	$ -	$ -											$ -		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														
		*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 11.810.000,00											$ -		$ 300.000		$ 300.000		$ 600.000		$ 965.000		$ 1.045.000						$ 10.310.000
		*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+ (B) + (C) + (D)				$ 91.851.760,00											$ -		$ 12.690.000		$ 15.333.200		$ 14.991.280		$ 14.771.000		$ 8.893.400		$ 10.992.880				$ 91.851.760
		*IVA= 19% * (D) + (E)				$ 17.451.834,00											$ -		$ 2.411.100		$ 2.913.308		$ 2.848.343		$ 2.806.490		$ 1.689.746		$ 2.088.647				$ 17.451.834
		*COSTO TOTAL = (D) + (E)				$ 109.303.594											$ -		$ 15.101.100		$ 18.246.508		$ 17.839.623		$ 17.577.490		$ 10.583.146		$ 13.081.527				$ 109.303.594
		*																														
		*																														

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.
Con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones, se consideró necesario prorrogar el contrato de interventoría No. 4647 de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 para Continuar seguimiento a los convenios que le corresponden. A la fecha se están realizando las actividades preliminares para la ejecución de las obras, sin embargo, para continuar la ejecución de las actividades para la construcción de obras sin afectar el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas. surge la necesidad de prorrogar el contrato de interventoría. Como consecuencia de lo anterior, esta interventoría solicita realizar prorroga al contrato 4647 de 2023, toda vez que se requiere realizar apoyo en campo con las comunidades como desarrollo de la etapa preliminar y de ejecución de las obras lo que implica el tiempo necesario y de esa manera garantizar el seguimiento y control a los correspondientes convenios.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: LEIVO MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:
NOMBRE: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se le recomienda al contratista utilizar materiales de buena calidad pétreos y de ferreterías que cumpla con las especificaciones técnicas

8. ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

A la fecha no se ha recibido correspondencia

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO</td><td>LECTURA DE PLANOS DISEÑO INVIAS</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Maquinaria amariila para corte de via</td><td>Corte de via laterales a= 5m</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Corte de via laterales a= 5m</td><td>Corte de via laterales a= 5m</td></tr>
</table>

	
Compactacion de la sub-base	Nivelacion del terreno
	
Material en acopio	Vaciado de concreto ciclopedo

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

Se anexan foto de la socialización

	
Socialización vereda florida acompañamiento INVIAS	**Socialización vereda florida acompañamiento INVIAS**

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

3

25 Junio 2024 Martes.

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra: Retro: 5 horas.

Actividades realizadas:
- Se socializa el proyecto ante el reedor, ayudantes y maestro, se entregan planos y se explican. Se solucionan dudas y explica el cronograma de obra.
- Se organiza el cambuche y almacen.
- Se inicia a cortar talud y ampliar terreno.
- Se reeplantea obra

4

Miercoles 26 Junio 2024

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes

Equipo en obra: Retro: 3 horas

Actividades realizadas:
- Se inicia a armar parrillas de viga riostra.
- Se recibe materia en la obra.
- Se extienden 7 viajes de material de río sobre el tramo a intervenir.
- Se organiza Stop de material.
- Se daña un puente de madera sobre la ría impidiendo acceso a las volquetas. Se propone solución para el día siguiente.
- Se extiende y ubica la valla informativa.

5

Jueves 27 Junio 2024

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra: Retro: 6,2 horas
Vibro: 3 horas.

Actividades realizadas:
- Se continua con el amarre de parrillas de acero para viga riostra.
- Se perfila manualmente las cunetas.
- Se inicia a compactar el tramo a intervenir.
- Se extienden 5 viajes mas de material de río pa terminar de darle estabilidad al terreno ya que en los estudios de suelos este terreno no tenia buenas condiciones.
- Se arregla el puente habilitando el paso a volqu tas.

Viernes 28 Junio 2024

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Ing Residente, Maestra, 6 Ayudantes

Equipo en obra: Retro: 3 horas.
Vibro: 6,7 horas

Actividades realizadas:
- Se continua la figuración y amarre del acero para las vigas riostra.
- Se continua la perfilación manual del terreno.
- Se continua con el compactado del tramo a intervenir
- Se habilita paso para motos por un costado de la obra para motos.
- Se realiza la respectiva señalización a la obra y se tapa con plastico, material para Fundir.

Sábado 29 Junio 2024

Estado del tiempo: Mañana: soleado
Tarde : Llovizna.

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, 6 Ayudantes

Equipo en obra: Retro: 5,7 horas
Vidro: 3 horas.

Actividades realizadas:
- Se continua con la figuración y amarre del acero para vigas riostras.
- Se realizan descoles y escurrideros. Sobre la obra para evacuar aguas
- se llera de nuevo personal para arreglar un pun dañado. y habilitar paso para las volquetas.

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S
Matricula No. 2520237430CND

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°03

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4647-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:
3714 de 2023

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Elaboró:	***Revisó:***	***Aprobó:***
Ing. FABIO JESUS MEJIA *Mat: 2520256474 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*	Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS *Ing José Ricardo Burbano*
CARGO: *Residente de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*	***CARGO:*** *Supervisor del contrato*
Fecha: *30 de JUNIO de 2024*	***Fecha:*** *30 de JUNIO de 2024*	***Fecha:***

El convenio 3714 de 2023 a la fecha 30 de junio de 22024 no presenta ningún avance físico y financiero, por ende no ha iniciado obra. Mas sin embargo se han a adelantado trámites administrativos como: cotizaciones de material pétreo, ferretería, exámenes de ingreso, elementos de protección personal.
Para control de calidad por parte de la interventoría les exigió estudios de suelos y topografías. Igual cabe resaltar que esta vereda no ha iniciado obra porque la entidad bancaria AV VILLAS no ha realizado los desembolsos.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4580-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: junio 2024 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"."

CONTRATO DE OBRA No.: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** COFEM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																											% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JUAN CARLOS SANABRIA	79.267.382	Director	$ 1.250.000	X		X		X		X		X		X		X		x														0,25	ORION SAS	1.250.000	$ 90.500	V	Compensar	77798808	$ 52.000	Porvenir	77798808	$ 208.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2	FABIO JESUS MEJIA MEDINA	3.102.749	Residente	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	ORION SAS	4.000.000	$ 278.400	V	Nueva EPS	77798808	$ 160.000	Colfondos	77798808	$ 640.000	N/A	N/A	N/A	N/A
3	DIANA PAOLA CADENA RAMOS	1.018.451.763	Ambiental	$ 560.000	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				0,20	ORION SAS	560.000	$ 90.500	V	Nueva EPS	77798808	$ 52.000		77798808	$ 208.000	N/A	N/A	N/A	N/A
4	ADRIANA ISABEL CARDENAS	39.813.196	Inspector SST	$ 280.000	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				0,24	ORION SAS	280.000	$ 90.500	V	Nueva EPS	77798808	$ 52.000		77798808	$ 208.000	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 6.090.000																																						

El Interventor adiunta la certificación de fecha 30 de junio 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre. el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ING. JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: CAROLINA BERMEO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACION DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, LEYDI MABEL PEREZ CHUD, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 31.577.305, en mi condición de Representante Legal de PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORION S.A.S, identificada con NIT 901503188 -3, certifico el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y de mis obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con la vinculación, al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la normativa vigente, correspondientes al periodo de 1 de junio al 30 de junio de 2024.

Mabel Perez

LEIDY MABEL PEREZ CHUD
Representante legal de PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORION S.A.S.
NIT. 901503188 CRA 83 B # 15-98 CALI
E-mail mabelchud@yahoo.com Cel: 3113235685.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901503188-3	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS		CR 83 B 15 98	3224097491	orionsas22@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INVIAS MAG	4571	VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	12/07/2024	77864217	$3.249.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	264.000	0		0		0	0	0	0	264.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.264.000	0	0	0	0	0	0		1.264.000	4
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	730.900				730.900	0	0	730.900			7.309	730.900	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	418.600	0	0	418.600	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	420.000	420.000
Pensión	3	1.680.000	1.680.000
Riesgos Laborales	1	730.900	730.900
CCF	1	418.600	418.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.249.500	3.249.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901503188-3	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS		CR 83 B 15 98	3224097491	orionsas22@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INVIAS MAG	4571	VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	12/07/2024	77864217	$3.249.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiando	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	39813196	CARDENAS ADRIANA ISABEL	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF33	280.000	23.000	0	0	0	0	0
2	CC	79267382	SANABRIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0
3	CC	1018451763	CADENA RAMOS DIANA PAOLA	1	0			S	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF33	560.000	89.600	0	0	0	0	0
4	CC	3102749	MEJIA MEDINA FABIO JESUS	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF33	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
5	CC	1093912277	GUERRERO BARBOSA YEFERSON	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
6	CC	12197190	ORTIZ SÁNCHEZ JHON JAIRO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 8 del 6/06/2024 al ######## Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

158 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PLACA HUELLA, INTERVENIR 158 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

CONVENIO No. 3714 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 198.908.738,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 198.908.738,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4647 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.908.738	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	198.908.738,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	109.303.594,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	2
*	box culvert	Unidad	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	O
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 29 DE ABRIL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE EFECTUO TRAMITE PARA DESEMBOLSO.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE INICIARA OBRA EL LUNES 17 DE JUNIO DE 2024

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 8 del 6/06/2024 al ######## Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

161 ML DE PLACA HUELLA, ALCANTARILLA DE 36

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PLACA HUELLA, INTERVENIR 161 ML DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLA DE 36

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS

CONVENIO No. 3674 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.548.773,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.548.773,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4647 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.548.773	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.398.806,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	2
*	box culvert	Unidad	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	O
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 30 DE ABRIL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LOS RESIDENTES ENVIARON LA PROGRAMACION DE OBRA Y LOS PRESUPUESTOS PARA REVISION Y APROBACION DE ACUERDO A LAS CORRECCIONES. SE EFECTUO EL DESEMBOLSO.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE INICIARA OBRA EL LUNES 17 DE JUNIODE 2024.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESTUDIOS Y DISEÑOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS


ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 8 del 6/06/2024 al ######## Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

164 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR 164 ML DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA		
CONVENIO No.	4440 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.295.465,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.295.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.		
INTEGRANTES:	UNICO		
CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.295.465	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.295.465,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	2
*	box culvert	Unidad	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	O
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 23 DE ABRIL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZA TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TRAMITE PARA DESEMBOLSO.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 8 del 6/06/2024 al ######## Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

177 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PLACA HUELLA, INTERVENIR 117 ML DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

CONVENIO No. 3979 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.398.806,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.398.806,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4647 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.398.806	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.398.806,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	2
*	box culvert	Unidad	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	O
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 30 DE ABRIL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REVISARON PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA DEACUERDO A LAS CORRECCIONES. SE EFECTUA TRAMITE PARA DESEMBOLSO.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE INICIARA OBRA EL LUNES 17 DE JUNIO DE 2024.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 9 del 13/06/2024 al ######## Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

158 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PLACA HUELLA, INTERVENIR 158 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

CONVENIO No. 3714 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 198.908.738,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 198.908.738,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4647 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.908.738	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	198.908.738,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	109.303.594,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	2
*	box culvert	Unidad	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	O
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 29 DE ABRIL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE APROBO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS , SE EFECTUO EL DESEMBOLSO.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE INICIARA OBRA LA PROXIMA SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 9 del 13/06/2024 al ######## Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

161 ML DE PLACA HUELLA, ALCANTARILLA DE 36

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PLACA HUELLA, INTERVENIR 161 ML DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLA DE 36

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS

CONVENIO No. 3674 de 2023 VALOR INICIAL: $ 199.548.773,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 199.548.773,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4647 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.548.773	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.398.806,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		###
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	13%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 3% Avance o Atraso Físico % 3%

Meta Física Ejecutada % 3%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	2
*	box culvert	Unidad	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	O
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 30 DE ABRIL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE APROBO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE INICIO OBRA CON UN AVANCE DEL 3%

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE CONTINUA CON EL AVANCE DE OBRA.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 9 del 13/06/2024 al ######## Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

164 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR 164 ML DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA

CONVENIO No. 4440 de 2023 VALOR INICIAL: $ 200.295.465,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 200.295.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO
CONTRATO No. 4647 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.295.465	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.295.465,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	2
*	box culvert	Unidad	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	O
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 23 DE ABRIL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE APROBO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE INICIARA OBRA LA PROXIMA SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 9 del 13/06/2024 al ######## Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

177 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PLACA HUELLA, INTERVENIR 117 ML DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

CONVENIO No. 3979 de 2023 VALOR INICIAL: $ 199.398.806,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 199.398.806,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4647 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.398.806	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.398.806,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		###
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 3% Avance o Atraso Físico % 3%

Meta Física Ejecutada % 3%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	2
*	box culvert	Unidad	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	O
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 30 DE ABRIL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE APROBO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE INICIO OBRA CON UN AVANCE DEL 3%

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE CONTINUA CON EL AVANCE DE OBRA.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 10 del 21/06/2024 al 27/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

158 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PLACA HUELLA, INTERVENIR 158 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

CONVENIO No. 3714 de 2023 VALOR INICIAL: $ 198.908.738,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 198.908.738,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4647 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.908.738	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.908.738,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	158
*	ALCANTARILLA 36"	UND	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	O
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 29 DE ABRIL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE APROBO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS , SE EFECTUO EL DESEMBOLSO.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE INICIARA OBRA LA PROXIMA SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 10 del 21/06/2024 al 27/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 161 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 36", CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS

CONVENIO No. 3674 de 2023 VALOR INICIAL: $ 199.548.773,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 199.548.773,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4647 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.548.773	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.398.806,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.950.000,00	5%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.000.000,00	4%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 17.950.000,00	9%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9.950.000,00	5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25.950.000,00	13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 16.000.000,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.950.000,00	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.950.000,00	13%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.500.000,00	7%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 5% Avance o Atraso Físico % 1%
Meta Física Ejecutada % 4%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas 36"	Unidad	1
*	PLACA HUELLA	ML	161
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	5%			$ 9.950.000,00	13,0%
Ejec	4%			$ 8.000.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DELICIAS TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZÓ POR EL PMA

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

CAMPAMENTO VEREDA DELICIAS

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 30 DE ABRIL
SE INSTALÓ LA CAJA DE PQRS EN EL CAMPAMENTO DE LAS DELICIAS


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE INICIÓ CON LA CONFORMACION DE LA BANCA A 5 MTS, E INSTALACION DE MATERIAL SUB-BASE POR TRAMOS CORTOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE PROYECTA INICIAR CON EL CORTE Y FIGURADO DEL REFUERZO PARA LAS HUELLAS

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONFORMACION DE LA BANCA



ACOPIO DE MATERIAL PETREO



INSTALACION DE SUB- BASE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio. Realizar visiras periodicas al sitio de la obra, con el fin de verificar que se cumpla con las especificaciones tecnicas del proyecto	FIRMA NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 10 del 21/06/2024 al 27/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

164 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR 164 ML DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA

CONVENIO No. 4440 de 2023 VALOR INICIAL: $ 200.295.465,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 200.295.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4647 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.295.465	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.295.465,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	1
*	PLACA HUELLA	ML	117
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	O
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 23 DE ABRIL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE APROBO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE INICIARA OBRA LA PROXIMA SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 10 del 20/06/2024 al 27/06/2024 Último Informe : (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 177 ML DE PLACA HUELLA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARRO APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

CONVENIO No. 3979 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.398.806,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.398.806,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4647 DE 2023 — VALOR INICIAL: $

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $

VALOR AMORTIZADO: $

SALDO POR AMORTIZAR: $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.398.806	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.398.806,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.050.000,00	6%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 7.972.000,00	4%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.078.000,00)	-2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.050.000,00	6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15.944.000,00	8%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.894.000,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.050.000,00	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.944.000,00	8%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.500.000,00	7%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 6% — Avance o Atraso Físico %: 2%

Meta Física Ejecutada %: 4%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	177
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	6%			$ 11.050.000,00	8,0%
Ejec	4%			$ 7.972.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LA ARENOSA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	FLORENCIA, CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZÓ POR EL PMA

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

CAMPAMENTO VEREDA LA ARENOSA

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 30 DE ABRIL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE INICIÓ CON LA CONFORMACION DE LA BANCA A 5 MTS, E INSTALACION DE MATERIAL SUB-BASE POR TRAMOS CORTOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE PROYECTA INICIAR CON EL CORTE Y FIGURADO DEL REFUERZO PARA LAS HUELLAS

0+00

PROGRAMADO

EJECUTADO

MAN MANTENIMIENTO | CONSTRUCCION | MEJORAMIENTO | SEÑALIZACION

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANCHO DE VIA



INSTALACION DE SUB-BASE



COMPACTACION DE LA SUB-BASE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio, realizar visitas periodicas con el fin de que cumpla con las especificaciones tecnicas del poyecto

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 11 del 28/06/2024 al 4/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

158 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PLACA HUELLA, INTERVENIR 158 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

CONVENIO No. 3714 de 2023 VALOR INICIAL: $ 198.908.738,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 198.908.738,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4647 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.908.738	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.908.738,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	158
*	ALCANTARILLA 36"	UND	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	O
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 29 DE ABRIL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE APROBO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS , SE EFECTUO EL DESEMBOLSO.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE INICIARA OBRA LA PROXIMA SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 11 del 28/06/2024 al 4/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 161 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 36", CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS

CONVENIO No. 3674 de 2023 VALOR INICIAL: $ 199.548.773,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 199.548.773,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4647 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/10/2024 VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.548.773	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.398.806,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.950.000,00	5%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.000.000,00	4%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 17.950.000,00	9%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.000.000,00	6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 29.000.000,00	15%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 17.000.000,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.000.000,00	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.000.000,00	15%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.500.000,00	10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 5% Avance o Atraso Físico % 1%

Meta Física Ejecutada % 4%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas 36"	Unidad	1
*	PLACA HUELLA	ML	161
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	5%			$ 9.950.000,00	15%
Ejec	4%			$ 8.000.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DELICIAS

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZÓ POR EL PMA

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

CAMPAMENTO VEREDA DELICIAS

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 30 DE ABRIL
SE INSTALÓ LA CAJA DE PQRS EN EL CAMPAMENTO DE LAS DELICIAS

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE CONTINUA INSTALANDO SUB-BASE DEBIDAMENTE COMPACTADA, Y SE SIGUE VACIANDO CONCRETO DE 3000 PSI CON SU REFUERZO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE CONTINUA CORTANDO Y FIGURANDO ACERO

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI



COMPACTACION DE LA BANCA



COMPACTACION DE LA BANCA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio. Realizar visiras periodicas al sitio de la obra, con el fin de verificar que se cumpla con las especificaciones tecnicas del proyecto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 11 del 25/06/2024 al 4/07/2024 Último Informe S
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

164 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR 164 ML DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA

CONVENIO No. 4440 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.295.465,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.295.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 1: 30/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 2: 16/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4647 DE 2023 — VALOR INICIAL: $
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $
FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 1: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $
FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 2: 16/10/2024 — VALOR AMORTIZADO: $
SALDO POR AMORTIZAR: $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.295.465	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.295.465,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.500.000,00	4%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6.000.000,00	3%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.500.000,00	1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.000.000,00	5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.000.000,00	5%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.000.000,00	0,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.000.000,00	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.000.000,00	5%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.500.000,00	10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 5% — Avance o Atraso Físico %: 0%
Meta Física Ejecutada %: 5%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	1
*	PLACA HUELLA	ML	117
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 0,05			$ 7.500.000,00	5,0%
Ejec	$ 0,05			$ 6.000.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCOMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VREDA FLORIDA — TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: se esta elaborando el plan de manejo ambiental, ya que se reemplazo por el documento PAGA

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	O
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 23 DE ABRIL


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE INICIA CON EL TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO AL SITIO DE LA OBRA, SEGUIDO SE INCIA EL CORTE LATERAL DE LA BANCA QUEDANDO EN 5 MTS SE RETIRAN ESTOS SOBRANTES, SE INICIA INSTALACION DE SUB- BASE

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE PROGRAMA LLEVAR MATERIAL COMOACERO, CEMENTO, ARENA, TRITURADO Y HERRAMIENTA MENOR

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORTE LATERALES DE LA BANCA



ACOPIO DE MATERIALES



CONFORMACION DE LA BANCA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 11 del 28/06/2024 al 4/07/2024 Último Informe : (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 177 ML DE PLACA HUELLA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARRO APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

CONVENIO No. 3979 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.398.806,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.398.806,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4647 DE 2023 — VALOR INICIAL: $

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/10/2024 — VALOR ANTICIPO: $

VALOR AMORTIZADO: $

SALDO POR AMORTIZAR: $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.398.806	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.398.806,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 13.500.000,00	7%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 10.500.000,00	5%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.000.000,00)	-2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13.500.000,00	7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.000.000,00	11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 7.500.000,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.500.000,00	7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.000.000,00	11%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.500.000,00	10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.875.000,00	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 7% — Avance o Atraso Físico %: 2%

Meta Física Ejecutada %: 5%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	177
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	7%			$ 13.500.000,00	11%
Ejec	5%			$ 10.500.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LA ARENOSA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	FLORENCIA, CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZÓ POR EL PMA

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	O

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

CAMPAMENTO VEREDA LA ARENOSA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE CONTINUA INSTALANDO SUB-BASE DEBIDAMENTE COMPACTADA, Y SE SIGUE VACIANDO CONCRETO DE 3000 PSI CON SU REFUERZO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE CONTINUA CORTANDO Y FIGURANDO ACERO

0+00

PROGRAMADO

EJECUTADO

MAN MANTENIMIENTO | CONSTRUCCION | MEJORAMIENTO | SEÑALIZACION

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMPACTACION DE LA SUB-BASE



CORTE Y FIGURADO DEL REFUERZO



CAJONES PARA EL VACIADO DEL CONCRETO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio, realizar visitas periodicas con el fin de que cumpla con las especificaciones tecnicas del poyecto

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA


Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

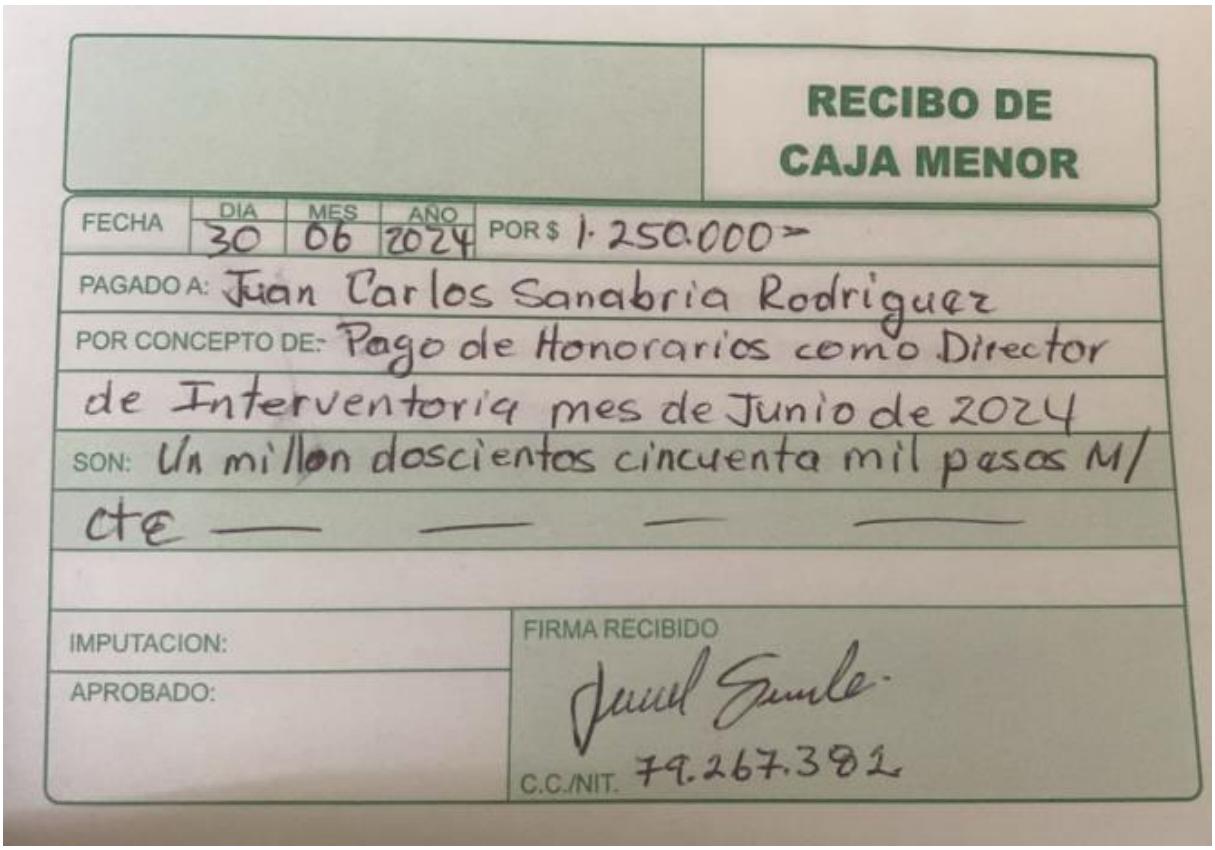

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: DÍA 30 | MES 06 | AÑO 2024 — POR $ 1.250.000=

PAGADO A: Juan Carlos Sanabria Rodriguez

POR CONCEPTO DE: Pago de Honorarios como Director de Interventoria mes de Junio de 2024

SON: Un millon doscientos cincuenta mil pesos M/cte

IMPUTACION:


APROBADO:

FIRMA RECIBIDO

C.C./NIT. 79.267.382

RESIDENTE DE

INTERVENTORÍA

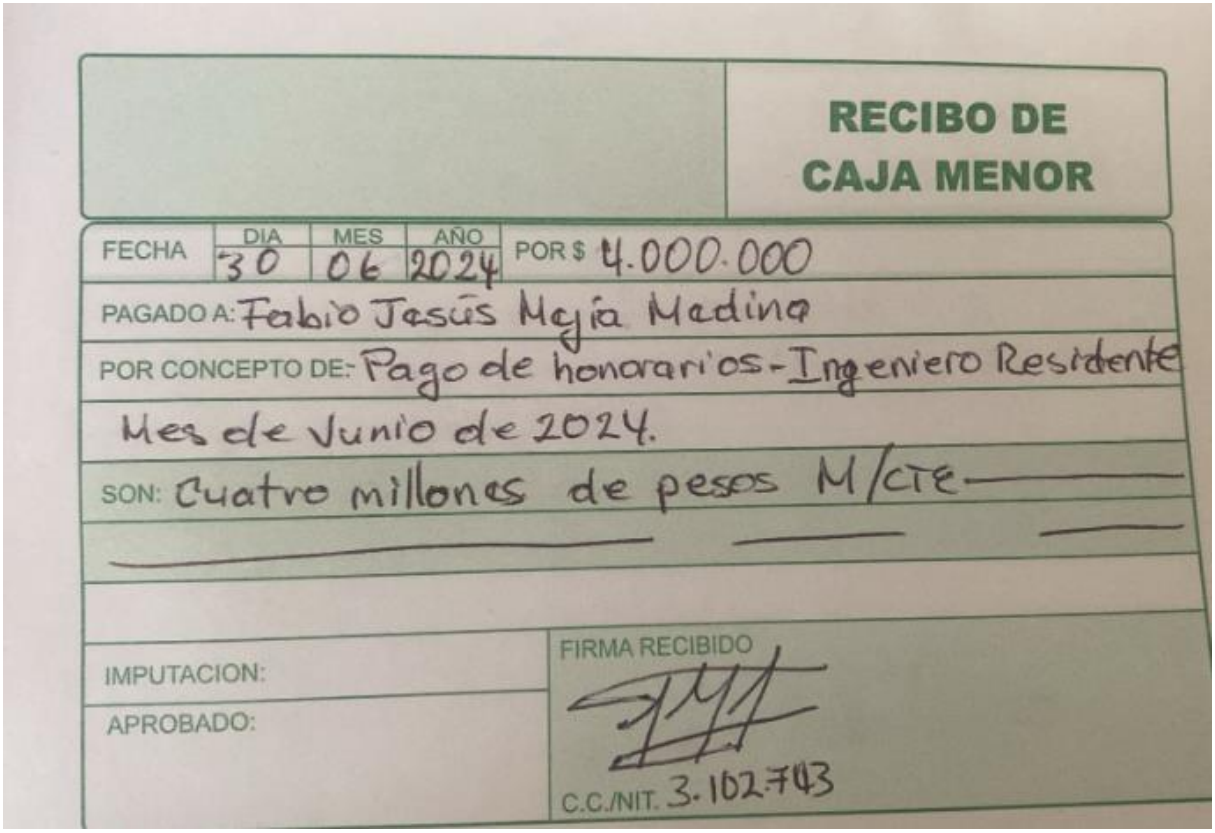

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA — DIA: 30 — MES: 06 — AÑO: 2024 — POR $ 4.000.000

PAGADO A: Fabio Jesús Mejía Medina

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios - Ingeniero Residente Mes de Junio de 2024.

SON: Cuatro millones de pesos M/CTE

IMPUTACION:


APROBADO:

FIRMA RECIBIDO

C.C./NIT. 3.102.743

INGENIERA

AMBIENTAL

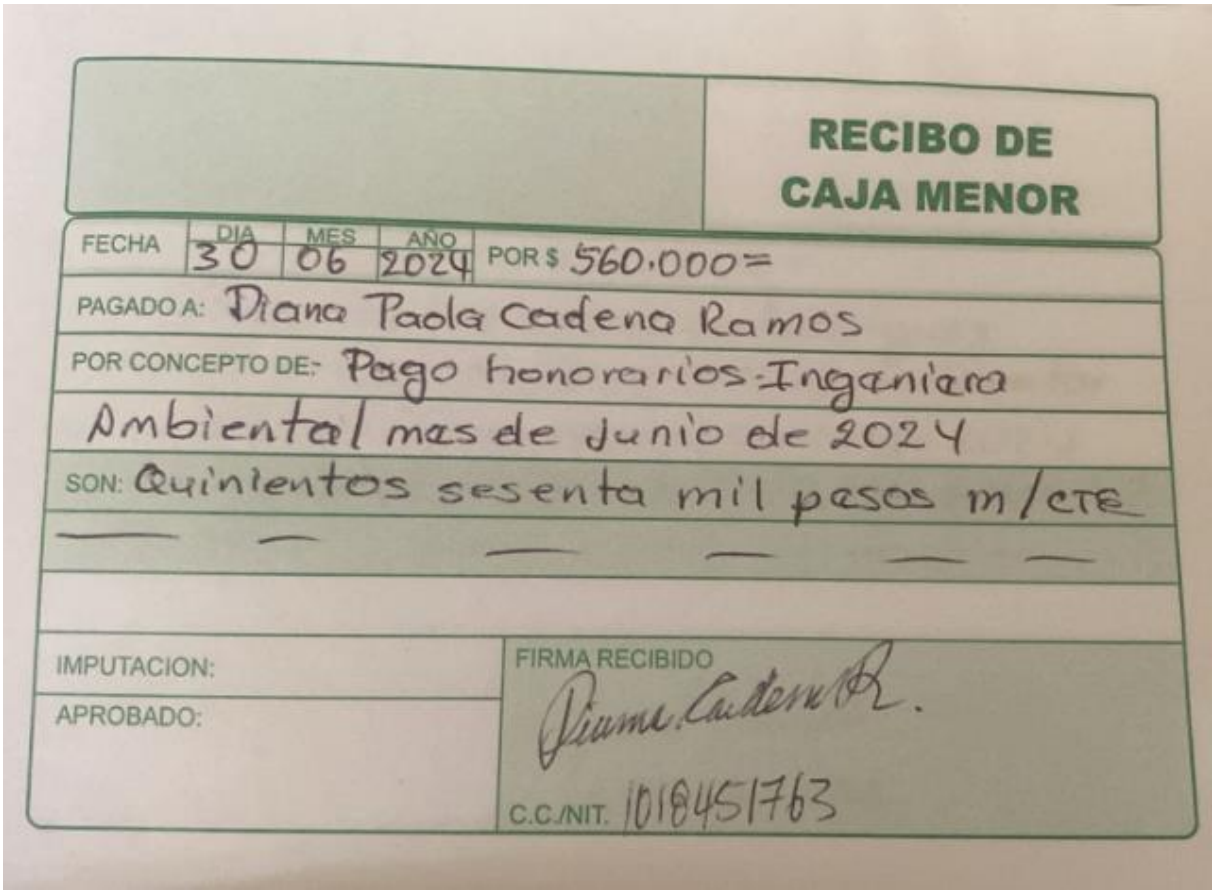

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA — DIA: 30 — MES: 06 — AÑO: 2024 — POR $ 560.000=

PAGADO A: Diana Paola Cadena Ramos

POR CONCEPTO DE: Pago honorarios-Ingeniera Ambiental mes de Junio de 2024

SON: Quinientos sesenta mil pesos m/cte

IMPUTACION:


APROBADO:

FIRMA RECIBIDO

Diana. Cadena R.

C.C./NIT. 1018451763

INSPECTOR SST

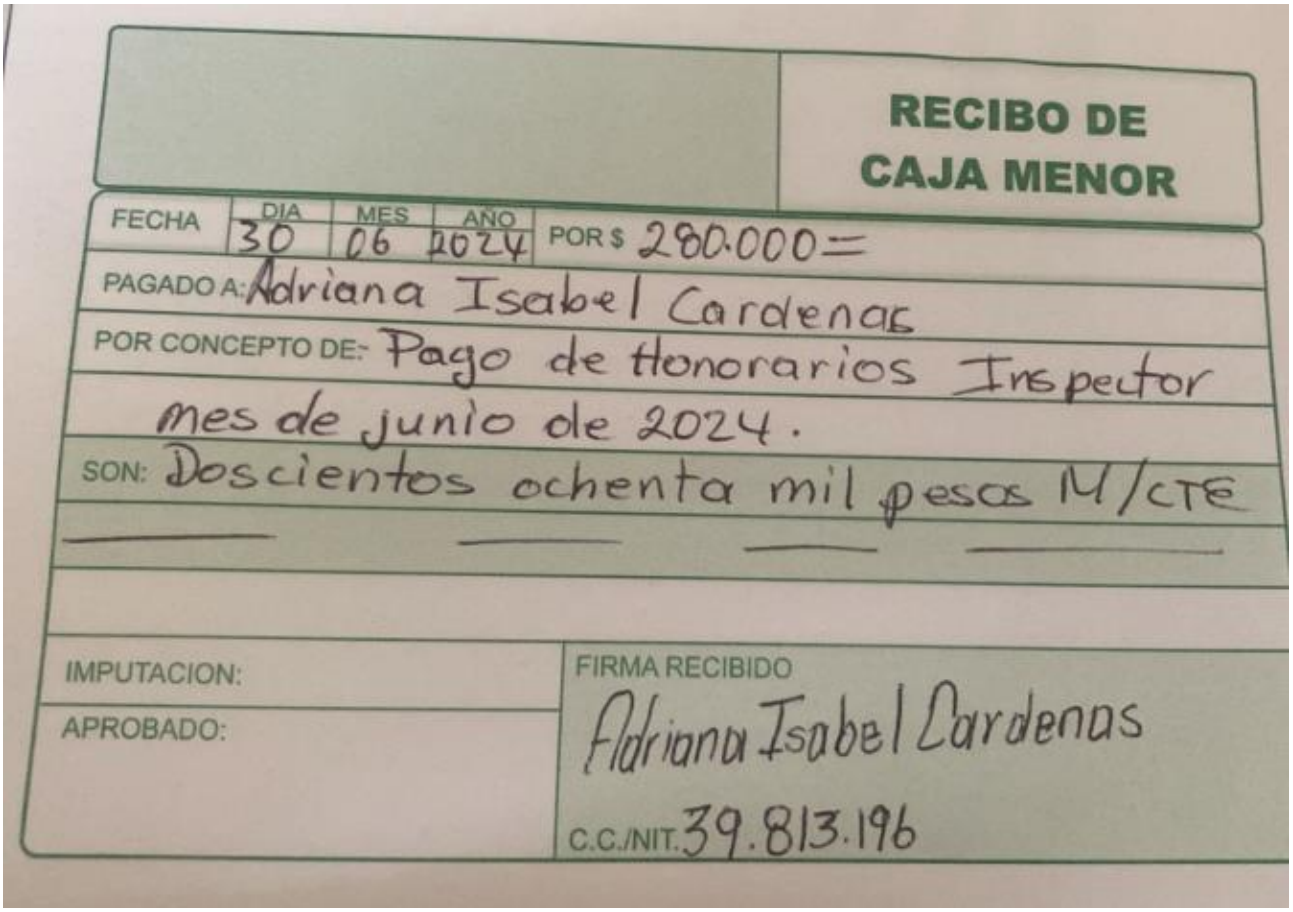

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA | DIA: 30 | MES: 06 | AÑO: 2024 | POR $ 280.000=

PAGADO A: Adriana Isabel Cardenas

POR CONCEPTO DE: Pago de Honorarios Inspector mes de junio de 2024.

SON: Doscientos ochenta mil pesos M/CTE

IMPUTACION:

APROBADO:

FIRMA RECIBIDO

Adriana Isabel Cardenas

C.C./NIT. 39.813.196

Motocicleta (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)

CUENTA DE COBRO

PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

DEBE A:

Nicolas Sanabria Nieto

La suma de $ 300.000 (Trecientos Mil pesos colombianos) correspondientes al alquiler de la Motocicleta KTM de Placas FIF85G Modelo 2023, del mes de junio de 2024.



Nicolas Sanabria Nieto
C.C. 1.000.588.068 de Bogotá



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031544392

PLACA: FIF85G

MARCA: BENELLI

LÍNEA: TRK 502X

MODELO: 2023

CILINDRADA CC: 500

COLOR: AZUL

SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO: MOTOCICLETA

TIPO CARROCERÍA: SIN CARROCERIA

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PSJ: 2

NÚMERO DE MOTOR: BJ269MRA11852387

REG: N

VIN: 9GFP16013PFC00361

NÚMERO DE SERIE: 9GFP16013PFC00361

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9GFP16013PFC00361

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): SANABRIA NIETO NICOLAS

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1000588068

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
33540815	02/05/2024	03/05/2024	02/05/2025	130	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 166530260

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA UNIMILENIO

NIT: 900225056

No. de Certificado de Acreditación: 11-OIN-039-001

Fecha de expedición: 2023/06/17

Fecha de vencimiento: 2024/06/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	FIF85G	**CLASE:**	MOTOCICLETA
MARCA:	**BENELLI**	**MODELO:**	2023
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	**500**	**NRO. MOTOR:**	**BJ269MRA11852387**
NRO. CHASIS:	9FLA36FY0LDF37672	**VIN:**	**9GFP16013PFC00361**
LÍNEA:	**TRI 502X**		
COLOR:	**AZUL**		

NOMBRE PROPIETARIO: **SANABRIA NIETO NICOLAS**

FIRMA DEL RESPONSABLE

NUNO ANDRE PINTO HENRIQUES

CUENTA DE COBRO

PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

DEBE A:

Iván Arturo Benítez Pérez

La suma de $ 300.000 (trescientos Mil pesos colombianos) correspondientes al alquiler de la Motocicleta Suzuki de Placas EZQ15F Modelo 2021, en el mes de junio del 2024..



Iván Arturo Benítez Pérez
C.C. 16. 054.512 de Manizales



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021360122

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EZQ15F	SUZUKI	DR150	2021

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
149	NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR: 157FMJ-3*G2U07439*

REG: N

VIN: LC6JCK4P4M0002575

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: LC6JCK4P4M0002575

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BENITEZ PEREZ IVAN ARTURO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 16054512



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 12

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352020000297261

I/E: I

FECHA IMPORT.: 27/08/2020

PUERTAS: 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - CENTRAL HIDROELECTRICA DE

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
15/10/2020	15/10/2020	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO MCPAL MANIZALES

LT06003147970



SOAT

PREVISORA

2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-10-02

43080044818117000 | EZQ15F | MOTOS | PARTICULAR | 149 | 2021

2 | DR150 | SIN CARROCERIA

157FMJ3G2J07428 | LC6JCK4P4M0002575 | LC6JCK4P4M0002575 | 0.00

BENITEZ PEREZ, IVAN ARTURO | 3206907343 | CC | 16054512 | SALAMINA

AT1324 | 43 | 899913588 | 0 | BOGOTA D.C.

120 | $ 181700 | $ 94400 | $ 2100

$ 278200

263,13 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)

701,68 $

8,77

180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

750

(Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022.

COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC)

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

José Alberto Buitrago
DIRECCIÓN: CLL 7 N O 29E-15
RIT CAQUETA
ESTRATO: 3
B-M2
Micro: nCiv968515TVC - nCiv968515

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: MAY 29/24

REFERENCIA DE PAGO: 72463488

TOTAL A PAGAR: $ 80.121

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store · Google Play · AppGallery

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS
Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ -301.053	**$0**
Pagos efectuados	$ -301.053	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
PROPORCIONAL TELEVISION	23-Abr-24	23-May-24	30	$ -23.764	**$0**
IVA				$-4.516	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
PROPORCIONAL INTERNET	23-Abr-24	23-May-24	30	$ -23.009	**$ 60.100**
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
PROPORCIONAL TELEFONIA	23-Abr-24	23-May-24	30	$ -1.222	**$20.021**
TELEFONIA*	23-Abr-24	23-May-24	30	$ -14.111	
IVA				$-1.310	

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

JOSE ALBERTO BUITRAGO

(415)7709998002319(8020)1045109438000072463488(3900)00233121(96)202

REFERENCIA DE PAGO:	72463488
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 1024477198
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1045109438
FECHA DE FACTURA:	Jun 22/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	May 23/24 - Jun 23/24
PAGAR ANTES DE:	**JUNIO 29/24**

FORMA DE PAGO Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque No.

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764015289457 1 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses
Código único factura electrónica: 928befa6a4dea0554d09d5d38bc1f223886ad2353d4b455b7a0d42fe6ce1aff5b679d485bab07c30d402236e5cfe43

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

Claro
COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

OTROS SERVICIOS


Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	**$ 0**
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 80.121**

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional $300. Mayor información Claro.com.co

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogota Santafe
Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022

Cav Bogota Toberin
Av Carrera 45 (Auto Norte) No. 166-68

CAV Bogota Lago
Calle 72 No. 13-71

Cav Bogota Calle 94
Cra. 15 No. 94-38

Cav Bogota Unicentro
Carrera 15 # 124-30 Local 2-054 CC Unicentro

Cav Bogota Centro Mayor
Av Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200

CAV Bogota Mall Plaza NQS
Carrera 30 con Avenida 19- Local B1 al B19 Centro Comercial Mall Plaza NQS

CAV Bogota CRA 8
Cra.8 No 19 - 41

Cav Bogota Calle 140
Cll 140 N 18-40

Cav Bogota Plaza Claro
Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1

Cav Bogota Fontibon
Carrera 100 No. 19-57/65

Cav Bogota La Felicidad
Av. Boyaca # 17a-23 local C-118 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión:
Fecha y Hora de Aprobación:

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
***611**

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 0000**

Claro
COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

Más información:

Conoce tus consumos en app Mi claro

Mi Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

Claro PBY | App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos | pse | Paga Todo Para Todo! | Bancolombia | SuperGIROS

Importante: Para llamar a #LDI: Marcar al Código 00456 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

*El Cargo Fijo del servicio de Telefonía incluye el valor del PLAN ILIMITADO de TBCL más el valor de los Servicios Suplementarios cuyo valor es de $10000 más IVA. Si su servicio fue instalado antes de la fecha del período facturado que se indica en este documento, su factura incluirá también el valor proporcional a los días que disfrutó del servicio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)"

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4647 DE 2023

CERTIFICA:

Que **PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.**, identificado con el NIT. No. 901.503.188 ha cumplido con el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales el que incluye Salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a la Caja de Compensación Familiar del Contrato No. 4647 de 2023 correspondientes al Periodo: JUNIO DE 2024, considerando que el pago de los aportes de seguridad social se realizan mes vencido.

Para el mes de **JUNIO DE 2024** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. presenta certificado de cumplimiento de pago de seguridad del personal vinculado y certificado de verificación de sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de interventoría
Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Caquetá (e)
