INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°06

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4647-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:
3979 de 2023

PERIODO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Elaboró:	***Revisó:***	***Aprobó:***
Ing. FABIO JESUS MEJIA *Mat: 2520256474 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*
CARGO: *Residente de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*
Fecha: *31 de AGOSTO de2024*	***Fecha:*** *31 de AGOSTO de2024*	***Fecha:*** *31 de AGOSTO de2024*

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3979 de 2023 **Contratista:** VEREDA ARENOSA, ASOJUNTAS

Contrato de Interventoría No. 4647 de 2023 **Interventoría:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** SEPTIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		6-7
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		8
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9-11
2.4	Características técnicas del proyecto		11-13
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		13-
3.1	Información general del contrato		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		14
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		14
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		15
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		15
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	15-19
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	19-20
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	20-24
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	25
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	26
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	26-27
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	27-38
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	38-40
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		41-
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	41
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	42
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	42-46
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	48
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	50
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	51-52
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	53
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	54
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		54-
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	55
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	55
7	**Conclusiones y recomendaciones**		55
8	**Anexos**		55
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		55
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		55-56
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		55
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		57-66

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma: _____

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se relaciona adjunto el formato diligenciado del resumen del estado general del proyecto, se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto, en el cual se evidencia que la vereda el ARENOSA ya tienen un avance físico y financiero de 100%.

ROCESO MI: NACIONAL DE VIAS / RECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE / IVENTORÍA OBRA PÚBLICA / TADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO: MEPUMN-NI 16-FR-7 | VERSION: 1 | PAGINA | FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA | PERIODO MES: SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 3979 DE 2023 | PLAZO INICIAL: 3 MESES | FECHA DE INICIO: 29/12/2023 | VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 199.398.806,00

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | FECHA DE SUSPENSIÓN: | FECHA DE REANUDACIÓN: | VALOR ADICIONALES (incluido IVA): | VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS ALBANIA | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/06/2024 | PLAZO DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 | ANTICIPO CONCEDIDO: $ - | ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4647 de 2023 | INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	PLACA HUELLAS	ML	161
	Construcción		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuáles)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
PLACA HUELLAS	Construcción	ML	$ 149.788.751,00	$ 199.398.806,00
	Construcción			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuáles)				

ANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	149.788.751,00	28.459.862,69	178.248.613,69
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			178.248.613,69

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	149.788.751,00	28.459.862,69	178.248.613,69	178.248.613,69
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				178.248.613,69

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 149.788.751,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 199.398.806,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,0%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



PLACA HUELLA AL 100 %:E=0,15M A= 5ML

Foto 2



PLACA HUELLA AL 100 %:E=0,15M A= 5ML

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25222374360ND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

2.1. LOCALIZACIÓN 7

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 8

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023 11

3.1INFORMACION DEL PROYECTO

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES . 12

3.3SEGUIMIENTO ITEN NO PREVISTO

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12

4.1. INFORME SEMANAL 12

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 15

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 18

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 20

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 20

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 21

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA . 23

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 30

4.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 30

4.10. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 31

4.11. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 32

4.12. ACTAS DE REUNIÓN 34

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 21

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 21

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ELINTERVENTOR……21

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA22

6.1 EQUIPOS Y VEHICULOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA……22

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……22

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL……22

6.5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS……22

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……..23

8. ANEXOS……24

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO……24

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS……24

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS……..24

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE……24

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidario.

En este informe se presenta a consideración del INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.06 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**"." hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas del siguiente convenio:

Convenio No. 3979 de 2023, con número de proceso SPSC-CD-CS-612-2023-2023y que tiene por objeto "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**

ANTECEDENTES

La economía del municipio está basada en la agricultura, complementada con la ganadería, la coca y aprovechamientos forestales

A el municipio de San José del Fragua, Curilllo y Albania se accede por la ruta troncal del Llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por la empresa Coomotor Por vía terrestre, además de su vecina, se accede por Villavicencio en el vecino departamento del Meta en el norte, Mitú (Vaupés) al este y Leticia (Amazonas) en el sur.
La vía San José del Guaviare – Calamar hace parte de la tan soñada ruta nacional 75. Es una carretera que busca atravesar la amazonia y unir los municipios de Puerto Leguizamón (Putumayo) y Puerto Gaitán (Meta), la idea de dicho proyecto surgió a mediados del siglo XX con la idea de conectar los llanos orientales con la amazonia.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente, proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

San José del Fragua, Currillo y Albania son municipios del departamento del Caquetá, en Colombia localizado en la Zona sur del país, en la región Amazonia. Con 88 965 km² es el tercer departamento más extenso —por detrás de Amazonas y Vichada

Los puntos a intervenir en la vereda arenosa se localizan en las siguientes coordenadas:
Punto 1 (PLACA HUELLA): 1°57'17,6752"N 72°37'32,3680"W

FUENTE DE MATERIALES:

LA RAYA municipio del Albania “contrato de concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de materiales de construcción, según contrato de concesión No. IJH-10531, ubicado en la vereda de morelia

ÁREA TOTAL: 8 HECTÁREAS Y 4395 MT2

MINERALES: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

PLANCHA IGAC: 350

ALINDERACIÓN FUENTE DE MATERIALES

COORDENADA NORTE	*COORDENADA ESTE*
671727,0000	*1255870,0000*
671727,0000	*1255870,0000*

671727,0000	*1255870,0000*
781500,0000	*1166150,0000*

Tabla 1. alinderación fuente de materiales

Figura 2-2 Ubicación del tramo a mejorar en la vereda La arenosa.



Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en la vereda arenosa
Fuente: TOPOGRAFIA REALIZADA POR ASOJUNTAS, ALBANIA

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a la asociación de junta de Albania (la arenosa), vereda las delicias, florida del municipio de Currillo y la vereda iglesias del municipio de San José del Fragua, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos.

Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

.

CONVENIO 3979 – 2023:

OBJETO **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”**

La vereda arenosa del Municipio de Albania está ubicada aproximadamente a 5 kilómetros del casco urbano y limita con las veredas san isidro la samaria y alto castañal, dicha vereda posee una vía terciaria con una extensión aproximada de 20 km.

El tramo a intervenir está ubicado cerca a la escuela la arenosa el estado general de la superficie o rodadura presenta hundimientos puntuales a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias los cuales impiden la transitabilidad de cualquier tipo de vehículo en época de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es de 6 m aproximadamente. No cuenta con cunetas, carece de obras hidráulicas y falta realizar mantenimiento a las existentes, se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

Esta vía cuenta con una alcantarilla de 36 “.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	
ALCANCE DEL PROYECTO	*LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS", PARA LO CUAL SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA VISITA TÉCNICA REALIZADA POR LOS PROFESIONALES DESIGNADOS POR EL INVIAS, EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL - OAC, EN DONDE SE REALIZÓ UNA CONCERTACIÓN DE LAS OBRAS A*

	EJECUTAR, UTILIZANDO LOS DISEÑOS TIPO ESTABLECIDOS EN LA CARTILLA DE OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURALES VIALES, NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONVENIO Y PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DEL SECTOR A INTERVENIR.
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CONVENIO 3979 – 2023	*CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA 161 INCLUIDOS 3 METROS LINEALES DE TRANSICION PARA UN TOTAL DE 161 ML DE PLACA HUELLA. LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES PRESENTADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES. LA ALCANTARILLA CIRCULAR, COMO ELEMENTO DE DRENAJE TRANSVERSAL SE TRABAJARÁ CON TUBOS DE 24" DE CONFIGURACIÓN TIPO POCETA-ALETA LA CUAL ES APTA PARA RECOLECTAR Y EVACUAR A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA DE VÍA, LA ESCORRENTÍA DE ORIGEN SUPERFICIAL Y SUBSUPERFICIAL, APORTANTE POR LAS CUNETAS Y/O FILTROS.* ***ESPECIFICACIONES DE DISEÑO:*** ***-CONCRETO: F'C 21MPA*** ***-ACERO CORRUGADO: FY 420MPA***

Tabla 2. Características técnicas del proyecto

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VEREDA ARENOSA

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023

TIPO DE PROCESO	*CONTRATACIÓN DIRECTA*
NÚMERO DE PROCESO	*SPSC-CD-CS-612-2023*
CONVENIO NO.	*3979 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS*
OBJETO	***AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”***
CONTRATISTA	*JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASOJUNTAS, ALBANIA*
NIT	*NIT. 900.468.237-2.*
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – PGN	*$ 199.398.806*
APORTE EN ESPECIE OAC	*$1.000.000*
VALOR TOTAL	*$ 199.398.806*
ADICIONES	*$ 0.00*
FECHA DE INICIO	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*31 DE DICIEMBRE DE 2023*

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 01	*30 DE ABRIL DE 2024*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 02	*30 DE JUNIO DE 2024*
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	*30 DE SEPTIEMBRE DE 2024*

Tabla 3. Información general convenio 3979 de 2023

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024

- **FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO Fy 4200MPA:** Se realizó corte y doblado de barras corrugadas permitiendo obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño de las huellas, bordillos y cunetas.

- **CONCRETO 21 MPA:** Vaciado de concreto para las cunetas y bordillos

Se figuró y cortó el hierro de los bordillos y cunetas, se fundieron los ciclopedo de 90 cm y 45 cm y se armaron los cajones para los bordillos. El porcentaje de obra ejecutado a la fecha es del 100% correspondiente a un valor de $199.398.806,00

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han presentado ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- ✓ Realizar visitas periódicas para seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando medidas y que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto

3. REPORTES EJECUCIÓN SEMANAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

SEPTIEMBRE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1
FECHA	7/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 20 del 1/09/2024 al 7/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal no ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 177 ML DE PLACA HUELLA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

CONVENIO No.	3979 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.398.806,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.398.806,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.398.806			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 173.500.000		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 25.898.806		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 91.559.531		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 17.744.063		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.590.242,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 174.500.000,00	88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 173.500.000,00	87,0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.000.000,00	0,5%
ADMINISTRACIÓN		
PAGA		
APORTES JAC		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 174.500.000,00	87,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 173.500.000,00	87,0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.000.000,00	1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.500.000,00	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.500.000,00	4,3%

Observaciones: la obra presenta un avance del 87 % se instalaron los aceros para los bordillos y cunetas, se vaciaron en concreto. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 14,8%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a dispones para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 91.559.531,00	83,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 88% — Avance o Atraso Físico %: 1%
Meta Física Ejecutada %: 87%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
1	PLACA HUELLA	ML	177
2			
3			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 8.500.000,00			$ 130.126.705,70	87,0%
Ejec	$ 6.500.000,00			$ 128.126.705,70	85,7%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás previsiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: punto inicial N 1° 18'3" W 75° 53'39" — punto final N 1° 18'5" W 75° 53'39"
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR		
PAJARITA		
MEZCLADORA	1	1
PLANTA ELECTRICAA	1	1
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: FLORENCIA, CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN: MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZÓ POR EL PMA

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
CAMPAMENTO VEREDA LA ARENOSA

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 16 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con la instalacion de acero y vaciado de concreto para cunetas y bordillos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa el corte y figurado del acero para las bordillos y cunetas



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


instalación de acero de bordillos y cunetas


adecuación del terreno para bordillos y cunetas


adecuación del terreno para bordillos y cunetas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25202/84 HCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEPTIEMBRE 2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1
FECHA	14/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 21 del 8/09/2024 al 14/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal no

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 177 ML DE PLACA HUELLA; CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI) total obra ejecutada 159 ml de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

CONVENIO No.	3979 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.398.806,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.398.806,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.398.806			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 185.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 14.398.806		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 91.559.531		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 17.744.063		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.590.242,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 187.000.000,00	94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 185.000.000,00	92,8%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.000.000,00	1,0%
ADMINISTRACIÓN		
PASA		
APORTES JAC		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 187.000.000,00	93,8%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 185.000.000,00	92,8%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.000.000,00	1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.500.000,00	7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.000.000,00	6,0%

Observaciones: la obra presenta un avance del 92,8 % se instalaron los aceros para los bordillos y cunetas, se vaciaron en concreto. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 14,8%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	91.559.531,00	83,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	2.625.000,00	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 9,4% — Avance o Atraso Físico %: 1%
Meta Física Ejecutada %: 9,3%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	177
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 10.500.000,00			$ 142.626.705,70	95,3%
Ejec	$ 9.000.000,00			$ 139.626.705,70	93,3%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR		
PAJARITA		
MEZCLADORA	1	1
PLANTA ELECTRICAA	1	1
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: punto inicial N 1° 18´3" W 75° 53´39" — punto final N 1° 18´5" W 75° 53´39"
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: FLORENCIA, CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN: MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZO POR EL PMA

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
CAMPAMENTO VEREDA LA ARENOSA

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 16 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con la instalacion de acero y vaciado de concreto para cunetas y bordillos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa el corte y figurado del acero para las borrdillos y cunetas


MAN: MANTENIMIENTO — CONSTRUCCION — MEJORAMIENTO — SEÑALIZACION

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



instalación de acero de bordillos y cunetas y vaciado deconcreto de 3000 psi



instalación de acero de bordillos y cunetas y vaciado deconcreto de 3000 psi



instalación de acero de bordillos y cunetas y vaciado deconcreto de 3000 psi

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25202984174CND

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEPTIEMBRE 3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 1 | FECHA 21/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA | SEMANA No.: 22 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal no ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 177 ML DE PLACA HUELLA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI) total obra ejecutada 159 ml de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

CONVENIO No.	3979 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.398.806,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.398.806,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	20/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.398.806			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 193.937.946		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 4.460.860		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 96.809.531		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 12.494.063		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.788.751,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149.788.751,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 149.788.751,00	100,0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
ADMINISTRACION	$ 44.149.195,00	22,1%
PAGA		
APORTES JAC		100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 193.937.946,00	97,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 193.937.946,00	97,3%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.500.000,00	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.500.000,00	4,3%

Observaciones: la obra presenta un avance del 100 % se instalaron los aceros para los bordillos y cunetas, se vaciaron en concreto. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 22,1%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 96.809.531,00	88,6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 97,3% | Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 97,3%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	177
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 8.500.000,00			$ 149.788.751,00	100,0%
Ejec	$ 6.500.000,00			$ 149.788.751,00	100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR		
PAJARITA		
MEZCLADORA	1	1
PLANTA ELECTRICAA	1	1
Total		2

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: punto inicial N 1° 18'3" W 75° 53'39" | punto final N 1° 18'5" W 75° 53'39"
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: FLORENCIA, CAQUETA	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN: MAEXCA SAS	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZÓ POR EL PMA

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
CAMPAMENTO VEREDA LA ARENOSA

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 16 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con la instalacion de acero y vaciado de concreto para bordillos, se realiza un aseo general y se llevan los sobrante a sitios autorizados.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



instalación de acero para bordillos y cunetas y vaciado deconcreto de 3000 psi



instalación de acero para bordillos y cunetas y vaciado deconcreto de 3000 psi



instalación de acero para bordillos y cunetas y vaciado deconcreto de 3000 psi

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 3520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Gerentes, Interventor y Dirección Territorial.

SEPTIEMBRE 4

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 23 del 22/09/2024 al 30/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI (X)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 177 ML DE PLACA HUELLA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI) total obra ejecutada 159 ml de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

CONVENIO No.	3979 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.398.806,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.398.806,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.398.806			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 199.398.806		
	SALDO DE VIGENCIA		$ (1.000.000)		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 96.809.531		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 12.494.063		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.788.751,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149.788.751,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 149.788.751,00	100,0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN	$ 44.149.195,00	22,1%
FASA	$ 4.460.860,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.398.806,00	100,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.398.806,00	100,0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones: la obra presenta un avance del 100 % se vaciaron en concreto. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 22,1%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 96.809.531,00	88,6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:la interventoria sigue realizando acompamiento administrativo con el fin de que estos convenios sean liquidados

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,0% — Avance o Atraso Físico % —
Meta Física Ejecutada % 100,0%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
1	PLACA HUELLA	ML	177
2			
3			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 8.500.000,00			$ 149.788.751,00	100,0%
Ejec	$ 6.500.000,00			$ 149.788.751,00	100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la relación de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: punto inicial N 1° 18'3" W 75° 53'39" — punto final N 1° 18'5" W 75° 53'36"
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR		
PAJARITA		
MEZCLADORA		
PLANTA ELECTRICAA		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: FLORENCIA, CAQUETA	PERMISO MINERO: SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN: MAEXCA SAS	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		NA	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		NA	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	NA	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		NA	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		NA	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		NA	X
EMISIONES:	SI		NO		NA	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		NA	

OBSERVACIONES:SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZÓ POR EL PMA

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS, SE ESTAN LLENANDO LOS FORMATOS DE ENTREGA FINAL AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CAMPAMENTO VEREDA LA ARENOSA

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 15 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO, A LA ESPERA DE QUE DEN CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE SOSTENIBILIDA Y ASI PODER REALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A LA JAC, LA INTERVENTORIA LES GIRO LOS RECURSOS DEL PAGA, ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE DEN VIABILIDAD Y ASI PODER EJCUTAR EL CIERRE DEL CONVENIO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

0+00 — 0+177
PROGRAMADO 100,0%
EJECUTADO 100,0%

MAN MANTENIMIENTO — CONSTRUCCION — MEJORAMIENTO — SEÑALIZACION
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


PLACA HUELA AL 100% A= 5M E= 15 CM


PLACA HUELA AL 100% A= 5M E= 15 CM


PLACA HUELA AL 100% A= 5M E= 15 CM

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por inviás, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25205547-CND

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se relacionó la maquinaria y los equipos que estuvieron activos, inactivos en el periodo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3674-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 de 2023 — **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VIBRO COMPACTADOR	CAT-420 D	2896 KG	ARENOSA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PAJARITA	CAT-420 D	1875 KG	ARENOSA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TROMPO MEZCLADOR	BAUKER	1 BULTO	ARENOSA	A	I	I	I	I	A	I	A	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A
GENERADOR ELECTRICO	BAUKER	110V/220V	ARENOSA	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	A	I	I
PUILDORA ELECTRICA	DRIWALL	6500 RPM	ARENOSA	A	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOBOMBA	HUMBOLT	1 HP	ARENOSA	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO				6			1	2	2	2	2				1						2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	4	3	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO					6	6	5	4	4	4	4	6	6	6	5	6	6	6	6	6	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	2	3	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	33	33%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	51	51%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA MAQUINARIA QUE SE REPORTA EN EL CUADRO COMO INACTIVA, SE ENCUENTRAN EN BUES ESTADO, SOLO QUE NO SE REQUIERE UTILIZAR TODOS LOS DIAS

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JHON JAIRO GARCIA CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-119996 CND

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional №2520256474 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Se relaciona el personal que laboro para la obra durante el periodo de SEPTIEMBRE de 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNU-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3979-2023 — CONTRATISTA: ASOJUNTAS DE ALBANIA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 — PROYECTO: AUNCAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 — INTERVENTOR: ORIPROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S
NOMBRE ARL: POSITIVA ARL — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ind ice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	RAMON ANTURY	97.357.388	MAESTRO DE OBRA	$ 2.320.000	X X X X X X X X X X X X X X X	ASOJUNTAS-ALBANIA	$ 2.320.000	$ 161.500	V	NUEVA EPS	30838035	$ 290.000	COLFONDOS	30838035	$ 371.200	$ 92.800	$ 46.400	$ 69.600	
2	DAVID YAGUE URQUINA	96.357.388	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X	ASOJUNTAS-ALBANIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMET-SALUD	30838035	$ 162.500	PROTECCION	30838035	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	GEOVANI ARCILA JARAMILLO	15.987.070	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X	ASOJUNTAS-ALBANIA	$ 1.300.000	$ 42.300	V	ASMET-SALUD	30838035	$ 75.900	COLPENSIONES	30838035	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	RETIRO
4	FERNANDO RAMIREZ	96.357.607	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X	ASOJUNTAS-ALBANIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	30838035	$ 162.500	COLPENSIONES	30838035	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	JUAN CARLOS ZAMBRANO	1.117.786.090	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X	ASOJUNTAS-ALBANIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMET-SALUD	30838035	$ 162.500	PROTECCION	30838035	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
6	NELSON GALLEGO	96.357.607	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X	ASOJUNTAS-ALBANIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	30838035	$ 162.500	PROTECCION	30838035	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
7	RAMON ANTONO DE HOYOS	96.357.485	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X	ASOJUNTAS-ALBANIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	30838035	$ 162.500	COLPENSIONES	30838035	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 2/09/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JHON JAIRO GARCIA CALDERON
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: No. 25202 - 119996 CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 252227340CND

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Certificación del pago seguridad social mes de SEPTIEMBRE de 2024

ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS
DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA
PERSONARÍA JURÍDICA N° 421 DE 31 DE DICIEMBRE DE 1990
NIT. 900.468.237-2

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, SIXTO JAVIER PARRA RAMIEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.785.524 de Albania-Caquetá -Caquetá, en mi condición de Representante Legal DE LA SOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que **ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA**, con identificación tributaria NIT. 900.468.237-2, durante el periodo comprendido del 01 al 31 del mes de AGOSTO de 2024, realizo el pago de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior dando cumplimiento a la ejecución del CONVENIO 3979 DE 2023.

Según la planilla de pago No. 30838035 en estado pagada a través del operador ASOPAGOS S.A.

Dada en San José del Fragua Caquetá, a los CUATRO (04) días del mes de SEPTIEMBRE de 2024.

Cordialmente,

SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ
C.C. 1.117.785.524 de Albania-Caqueta
Representante Legal ASOJUNTAS

Planilla pagada mes de SEPTIEMBRE JAC arenosa

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se anexo formato del avance financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3979-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS ALBANIA
MES INFORME MENSUAL: 3 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.398.806,00	N/A
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.398.806,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BASICO DEL CONVENIO	$ 121.328.888,21	$ 28.459.863	$ **149.788.751**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 116.235.000,00	$ 27.265.000	$ **143.500.000,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 113.805.000,00	$ 26.695.000	$ **140.500.000,00**
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.430.000,00	$ 570.000	$ **3.000.000,00**
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 140.075.565,29	$ 32.857.231	$ **172.932.796,66**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 137.645.565,29	$ 32.287.231	$ **169.932.796,66**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.430.000,00	$ 570.000	$ **3.000.000,00**
			$ -
VALOR TOTAL			$ **169.932.796,66**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
residente de Obra Jhon Jairo Garcia Calderon
Matrícula Profesio 25202-119996 CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N.252223743OCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En el transcurso del mes de AGOSTO en la vereda hizo buen tiempo, no se presentaron lluvias y se cumplió con la programación de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3979 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		240
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
EN EL TRANSCURSO DEL MES SE PRESENTÓ BUEN CLIMA EN LOS PUNTOS DE INTERVENCION

Firma
Nombre: Jhon Jairo Garcia Calderon
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0553973 CND

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.


Registro pluviométrico del IDEAM

CodigoEstac	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperat	Departamen	Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspe	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAproba
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/01/2024 0:00	15	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/01/2024 0:00	1	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/01/2024 0:00	3	50		900

4.6. **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**

En el transcurso del mes de agosto se tomaron muestras de concreto en cilindros, después de que cumplieron los 28 días de fraguado se llevaron a laboratorio para

practicar la resistencia a la comprensión. El formato presentado evidencia que el concreto utilizado obtuvo los PSI requeridos por el proyecto para la construcción de las obras

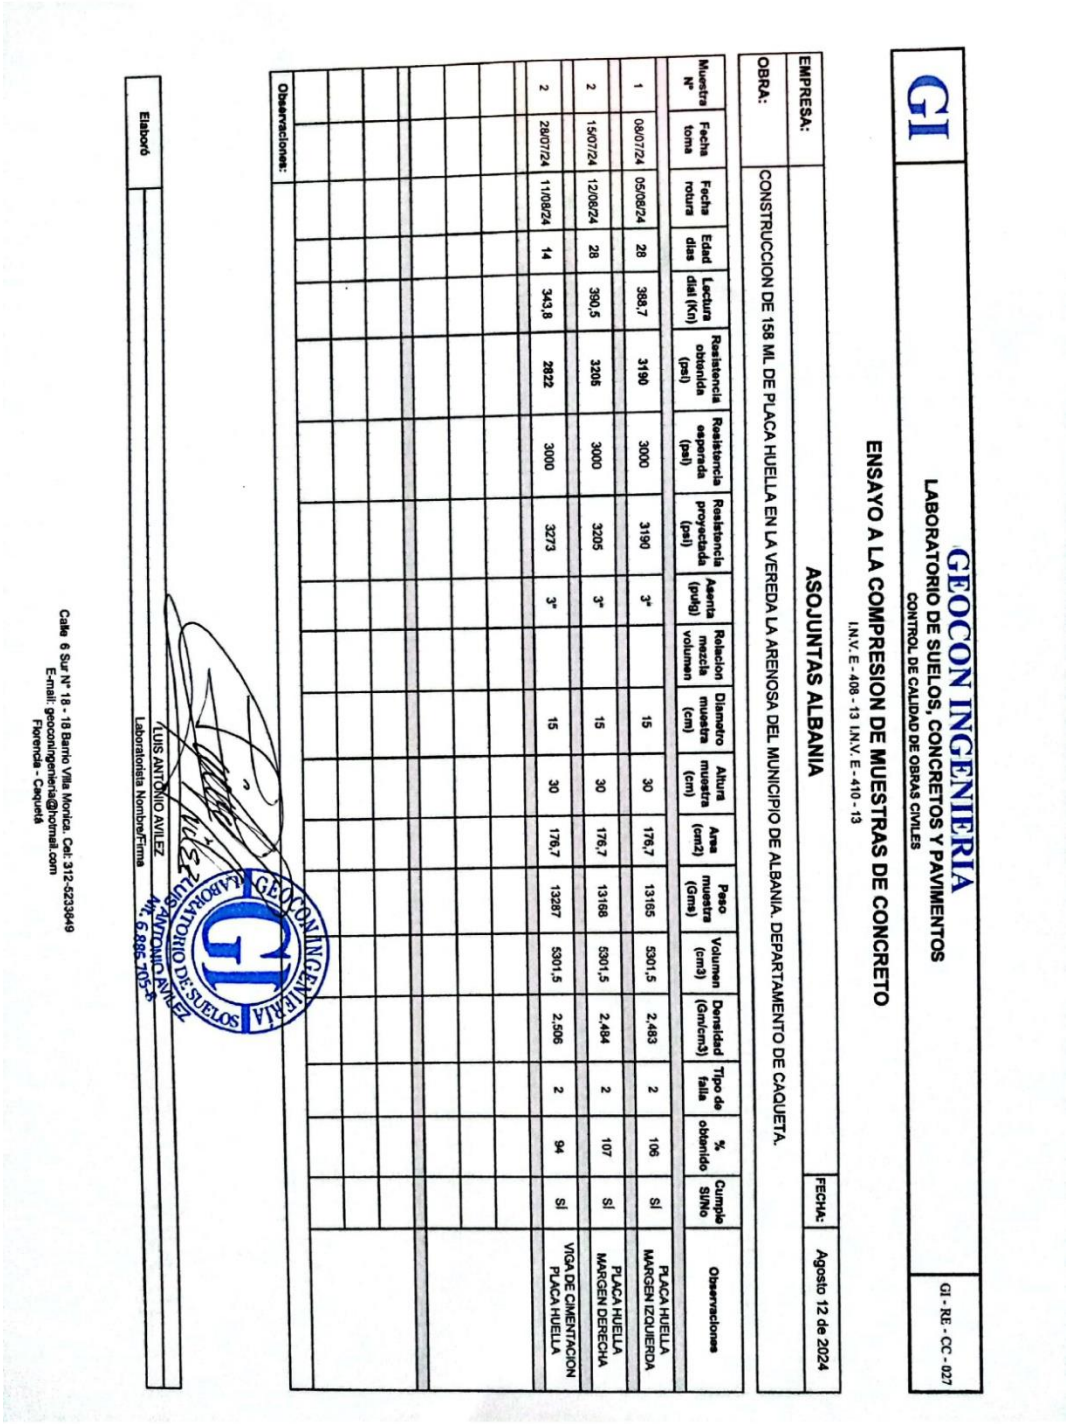

GI

GEOCON INGENIERIA
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES

GI - RE - CC - 027

ENSAYO A LA COMPRESION DE MUESTRAS DE CONCRETO
I.N.V. E - 408 - 13 I.N.V. E - 410 - 13

EMPRESA: ASOJUNTAS ALBANIA FECHA: Agosto 12 de 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE 158 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA. DEPARTAMENTO DE CAQUETA.

Muestra Nº	Fecha toma	Fecha rotura	Edad dias	Lectura diat (Kn)	Resistencia obtenida (psi)	Resistencia esperada (psi)	Resistencia proyectada (psi)	Asenta (pulg)	Relacion mezcla voluman	Diametro muestra (cm)	Altura muestra (cm)	Area (cm2)	Peso muestra (Gms)	Volumen (cm3)	Densidad (Gm/cm3)	Tipo de falla	% obtenido	Cumple SI/No	Observaciones
1	08/07/24	05/08/24	28	388,7	3190	3000	3190	3"		15	30	176,7	13165	5301,5	2,483	2	106	SI	PLACA HUELLA MARGEN IZQUIERDA
2	15/07/24	12/08/24	28	390,5	3206	3000	3205	3"		15	30	176,7	13168	5301,5	2,484	2	107	SI	PLACA HUELLA MARGEN DERECHA
2	26/07/24	11/08/24	14	343,8	2822	3000	3273	3"		15	30	176,7	13287	5301,5	2,506	2	94	SI	VIGA DE CIMENTACION PLACA HUELLA

Observaciones:

Elaboró

LUIS ANTONIO AVILEZ
Laboratorista Nombre/Firma

GEOCON INGENIERIA
LABORATORIO DE SUELOS
LUIS ANTONIO AVILEZ
MP. 6.886.705

Calle 6 Sur Nº 18 - 19 Barrio Villa Monica. Cel: 312-5233649
E-mail: geoconingenieria@hotmail.com
Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el transcurso del mes no fue necesario solicitar más póliza, debido a que estamos en los tiempos establecidos por el convenio y no se le va a dar trámite a ningún adicional en recursos, Se anexan pólizas del convenio.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 3979-2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 26/12/2023
PLAZO INICIAL: 3 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 199.398.806,00
VALOR ACUMULADO: $ 199.398.806,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.499.400,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.499.400,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.879.761,00	18	10	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	31/12/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.969.940,00	18	10	2023	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.819.642,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3765008-2
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	18	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0934431-1 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: NA
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 Y 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1 Y 2 **SUSPENSIÓN No.:** 1 Y 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.909.750,60	5	10	2023	30/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.977.438,65	5	10	2023	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.864.631,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100289628
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1Y 2 ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1Y 2 ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	18	10	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0934431-1 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: AUN SE ENCUENTRAN EN ESTADO PENDIENTE EN SECOP

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo pólizas

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 24 DE OCTUBRE DE 2023	3765008-2	15357042
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
PORVENIR ASESORES	54327	2514	01215357042

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos	Dirección	Ciudad	Teléfono
900468272	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA	CR 3A # A - 17 VILLA AMAZONICO	ALBANIA	

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
900468272	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-OCT-2023	31-OCT-2024	39.879.761,00	124.228,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31-DIC-2023	31-DIC-2028	59.819.642,00	898.278,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-OCT-2023	31-DIC-2026	9.969.940,00	85.875,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
18-OCT-2023	31-DIC-2028	1901	18-OCT-2023	31-DIC-2028	$1.118.381	$212.492	$1.330.873

VALOR A PAGAR EN LETRAS
UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
POLIZA NUEVA	$109.669.363	$329.008	$109.669.363,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTAN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

101 – NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2514	CUM001	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	1.118.381

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/09/2017	13 - 18	P	05	P-05-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/04/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Convenio
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALEN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCION DE LA COMPAÑIA ES: CRA 5 # 21A - 12 NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 778519991

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS: REGIMEN COMUN

www.suramericana.com

Página 1

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	3765008-2	15763421
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
PORVENIR ASESORES	54327	2514	01215763421

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos	Dirección	Ciudad	Teléfono
900468272	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA	CR 3 A # 4 17 VILLA AMAZONICO	ALBANIA	

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
900468272	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-OCT-2023	28-ABR-2025	39.879.761,00	19.339,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-JUN-2024	30-JUN-2029	59.819.641,80	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-OCT-2023	30-JUN-2027	9.969.940,30	4.999,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
18-OCT-2023	30-JUN-2029	1950	06-JUN-2024	30-JUN-2029	$24.338	$4.624	$28.962

VALOR A PAGAR EN LETRAS
VEINTI OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$329.008	$109.669.363,30

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTAN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

101 – NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2514	91975	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	24.338

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/09/2017	13 - 18	P	05	P-05-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/04/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Convenio
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALEN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES.
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCION DE LA COMPAÑIA ES: CRA 5 # 21A - 12 NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.


DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 778519991

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS: REGIMEN COMUN

www.suramericana.com

Página 1

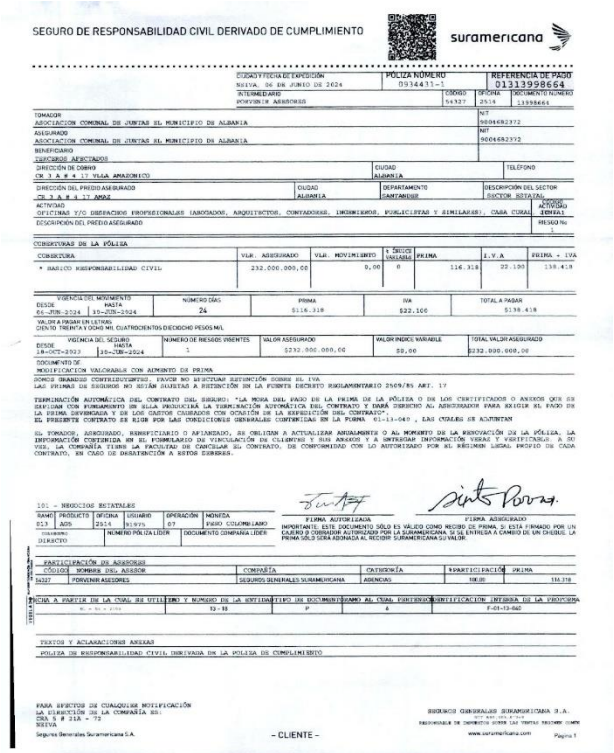

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	0934431-1	01313998664

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
PORVENIR ASESORES	54327	2514	13998664

TOMADOR
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

ASEGURADO
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 A # 4 17 VIA AMAZONICO	ALBANIA	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 3 A # 4 17 AMAZ	ALBANIA	SANTANDER	SECTOR ESTATAL

ACTIVIDAD: OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES); CASA CURAL — CÓDIGO ACTIVIDAD 100041

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO — RIESGO No. 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	0,00	0	116.318	22.100	138.418

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
06-JUN-2024	30-JUN-2024	24	$116.318	$22.100	$138.418

VALOR A PAGAR EN LETRAS:
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR ÍNDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
19-OCT-2023	30-JUN-2024	1	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE
MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA.
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PRIMA 61-11-047 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGA A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESISTENCIA A ESTOS SUMINOS.

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
813	A05	2514	81995	07	PESO COLOMBIANO

NUMERO DIRECTO — NUMERO PÓLIZA LÍDER — DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	116.318

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZARÁ Y NÚMERO DE LA ENTIDAD TIPO DE DOCUMENTO ANEXO AL CUAL PERTENECE — IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROFORMA


	93-55	P	4	F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA
Seguros Generales Suramericana S.A.

– CLIENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.476-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com
Página 1

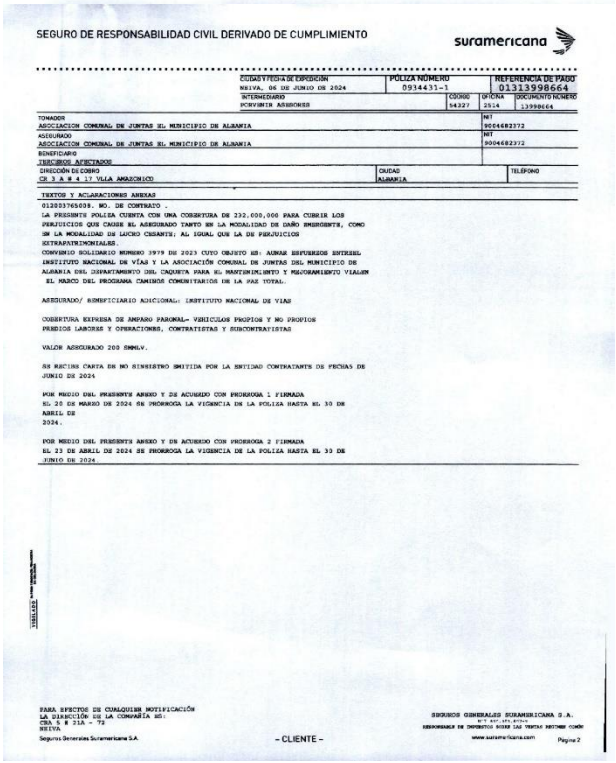

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	0934431-1	01313998664

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
PORVENIR ASESORES	54327	2514	13998664

TOMADOR
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

ASEGURADO
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 A # 4 17 VIA AMAZONICO	ALBANIA	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
012033765038. NO. DE CONTRATO .
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232.000.000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRESL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALSIN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL- VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS PERDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

VALOR ASEGURADO 200 SMMLV.

SE RECIBE CARTA DE NO SINIESTRO EMITIDA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE DE FECHAS DE JUNIO DE 2024


POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON PRORROGA 1 FIRMADA EL 20 DE MARZO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON PRORROGA 2 FIRMADA EL 23 DE ABRIL DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA
Seguros Generales Suramericana S.A.

– CLIENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.476-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com
Página 2

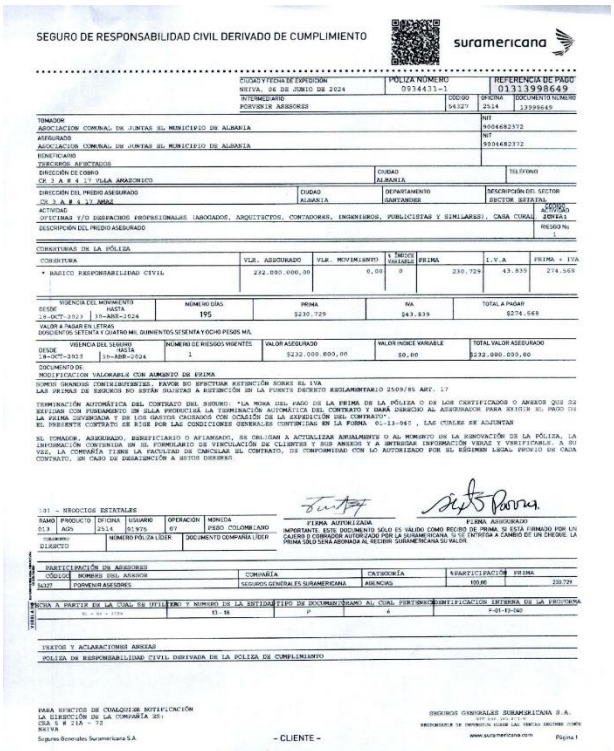

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	0934431-1	013139986649

INTERMEDIARIO	CODIGO	OFICINA	DOCUMENTO NUMERO
FORVENIR ASESORES	54327	2514	13998649

TOMADOR
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

ASEGURADO
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO: CR 3 A # 4 17 VILLA AMAZONICO — CIUDAD: ALBANIA — TELÉFONO:

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO: CR 3 A # 4 17 ANAZ — CIUDAD: ALBANIA — DEPARTAMENTO: SANTANDER — DESCRIPCIÓN DEL SECTOR: SECTOR ESTATAL

ACTIVIDAD: OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES); CASA CURAL — CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA: 6399A1

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO — RIESGO No: 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
• BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	0,00	0	230.729	43.839	274.568

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
16-OCT-2023	30-ABR-2024	195	$230.729	$43.839	$274.568

VALOR A PAGAR EN LETRAS
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
16-OCT-2023	30-ABR-2024	1	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORANEX CON AUMENTO DE PRIMA

NOMBRE GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-967 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, ES OBLIGADO A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

191 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AGS	2514	91975	07	PESO COLOMBIANO

NÚMERO PÓLIZA LÍDER — DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA, SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	FORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	230.729

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZÓ	NÚMERO DE LA IMPRESIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ANEXO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PRODUCCIÓN
01-16	P	A		F-01-83-040


TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA
Seguros Generales Suramericana S.A.

– CLIENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com

Página 1

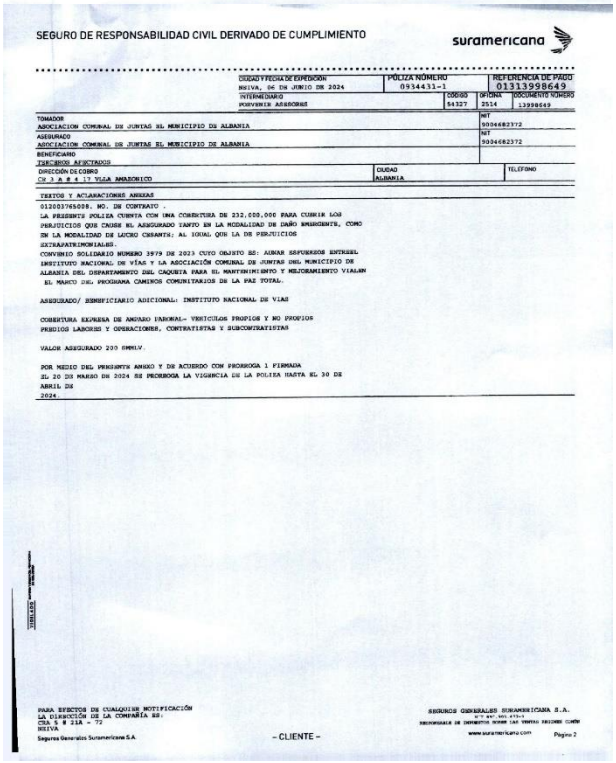

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	0934431-1	013139986649

INTERMEDIARIO	CODIGO	OFICINA	DOCUMENTO NUMERO
FORVENIR ASESORES	54327	2514	13998649

TOMADOR
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

ASEGURADO
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO: CR 3 A # 4 17 VILLA AMAZONICO — CIUDAD: ALBANIA — TELÉFONO:

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
012003765008. NO. DE CONTRATO .
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRESEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALAN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURA EXPRESA DE AMPARO LABORAL- VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

VALOR ASEGURADO 200 SMMLV.


POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON PRORROGA 1 FIRMADA EL 20 DE MARZO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA
Seguros Generales Suramericana S.A.

– CLIENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com

Página 2

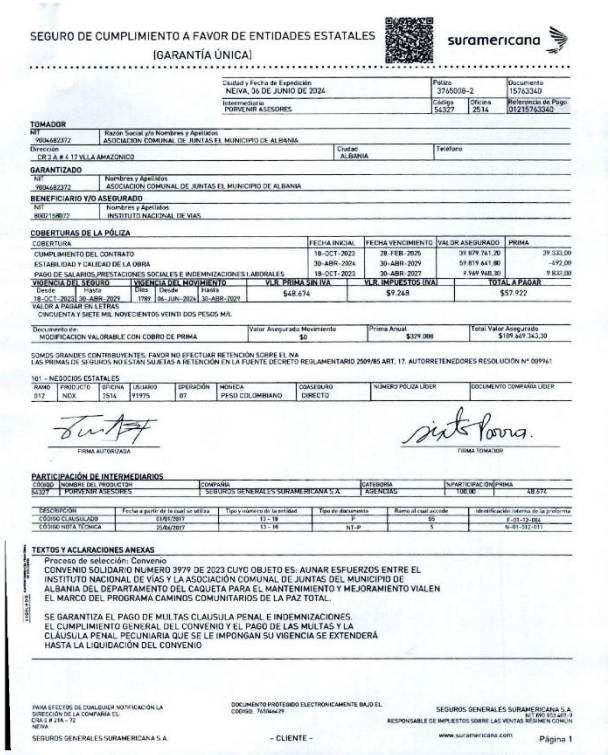

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	3765008-2	15763340
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
PORVENIR ASESORES	54327	2514	01215763340

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos	Ciudad	Teléfono
900468272	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA	ALBANIA	
Dirección: CR 3 A # 4 17 VLLA AMAZONICO			

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
900468272	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-OCT-2023	28-FEB-2025	39.879.761,70	29.330,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-ABR-2024	30-ABR-2029	59.819.641,80	492,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-OCT-2023	30-ABR-2027	9.969.940,30	9.930,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
18-OCT-2023	30-ABR-2029	1789	06-JUN-2024	30-ABR-2029	$48.674	$9.248	$57.922

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTI DOS PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$329.008	$109.669.343,30

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA.
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 00961

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2514	91975	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	48.674

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza
CÓDIGO CLAUSULADO	01/07/2017	13 - 18	F	65	F-07-12-066
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-01-017

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Convenio
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALEN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES. EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑIA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA


DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 765344429

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-3
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

- CLIENTE -

Página 1

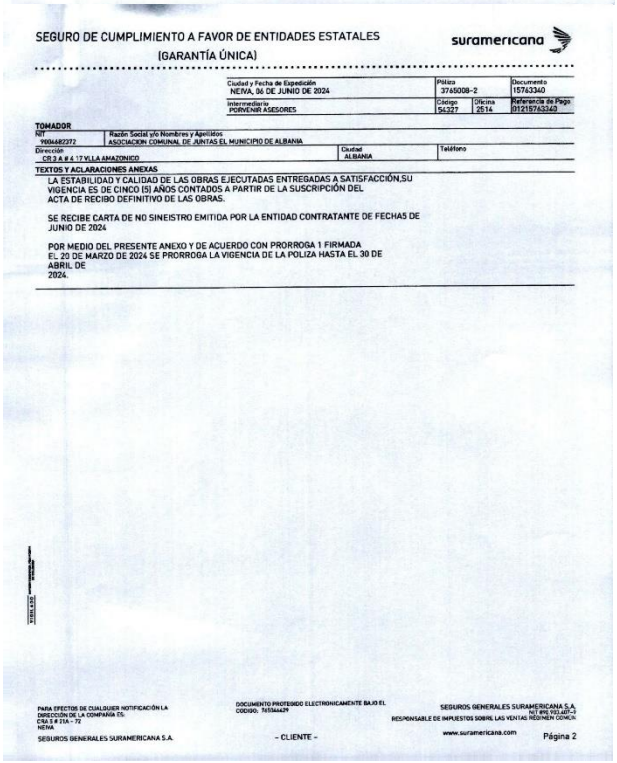

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	3765008-2	15763340
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
PORVENIR ASESORES	54327	2514	01215763340

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos	Ciudad	Teléfono
900468272	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA	ALBANIA	
Dirección: CR 3 A # 4 17 VLLA AMAZONICO			

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN,SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

SE RECIBE CARTA DE NO SINEISTRO EMITIDA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE DE FECHAS DE JUNIO DE 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON PRORROGA 1 FIRMADA EL 20 DE MARZO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑIA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 765344429

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-3
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

- CLIENTE -

Página 2



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD/FECHA DE EXPEDICION: NEIVA, 24 DE OCTUBRE DE 2023 | POLIZA NUMERO: 0934431-1 | REFERENCIA DE PAGO: 013139117774

INTERMEDIARIO: 64327 POSVENTA ASESORES | CODIGO: 64327 | OFICINA: 2514 | DOCUMENTO NUMERO: 139117774

TOMADOR: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALGARRA | NIT: 9004682372

ASEGURADO: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALGARRA | NIT: 9004682372

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

DIRECCION DE COBRO: CR 3A # 4 - 17 VILLA AMAZONICO | CIUDAD: ALGARRA | TELEFONO:

DIRECCION DEL RIESGO ASEGURADO: CR 3A # 4 - 17 AMAZ | CIUDAD: ALGARRA | DEPARTAMENTO: AMAZONAS | DESCRIPCION DEL SECTOR: SECTOR: ESTATAL

ACTIVIDAD: OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES), CASA CIRAL | ACTIVIDAD ASEGURA: 1

DESCRIPCION DEL RIESGO ASEGURADO: | RIESGO No: 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	232.000.000,00	0	141.107	26.810	167.917

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NUMERO DIAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
18-OCT-2023	31-DIC-2023	74	$141.107	$26.810	$167.917

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NUMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
18-OCT-2023	31-DIC-2023	1	$232.000.000,00	00,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE: POLIZA NUEVA

SUJETA GRAVAMES CONTRACTUALES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA.
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y CESARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA: 01-1-648 , LAS CUALES SE ADJUNTAN.

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL REGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO. EN CASO DE ABSTENCIÓN A ESTOS DEBERES.

FIRMA AUTORIZADA | FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VALIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI FUE FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA, O SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE LA PRIMA ESTÁ SUJETA GIRADO A FAVOR SURAMERICANA S.A.Y.M.DE.

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	DUEÑO	OPERACIÓN	MONEDA
013	A05	2514	CIM301	01	PESO COLOMBIANO

CANALIZADO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

PERFILACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPARTA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
64327	POSVENTA ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	141,107

NOTA: A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZARÁ Y NUMERO DE LA ENTIDAD TIPO DE DOCUMENTO BAJO EL CUAL PREFIERE IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROPUESTA

31 - 10 - 2023	15:38	P	A	P-01-13-849

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA
Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com

Página 1

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD/FECHA DE EXPEDICION: NEIVA, 24 DE OCTUBRE DE 2023 | POLIZA NUMERO: 0934431-1 | REFERENCIA DE PAGO: 013139117774

INTERMEDIARIO: 64327 POSVENTA ASESORES | CODIGO: 64327 | OFICINA: 2514 | DOCUMENTO NUMERO: 139117774

TOMADOR: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALGARRA | NIT: 9004682372

ASEGURADO: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALGARRA | NIT: 9004682372

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

DIRECCION DE COBRO: CR 3A # 4 - 17 VILLA AMAZONICO | CIUDAD: ALGARRA | TELEFONO:

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

0120017658000, NO. DE CONTRATO :
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE $30,000,000 PARA CUBRIR LOS
PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO
EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE, AL TENER QUE LA DE PERJUICIOS
EXTRAPATRIMONIALES.
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 1979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE
ALGARRA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALES
EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA
Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com

Página 2

4..8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, sin embargo, junto con la interventoría se adoptarán las siguientes medidas, con el fin de garantizar la calidad y correcta ejecución de las obras suscritas al convenio anteriormente mencionado.

- Se solicitó un estudio de suelos con el fin de saber cuál fue la capacidad portante por medio del CBR
- Se solicitó un estudio de topografía con el fin de localizar y replantear lo niveles de la vía.
- Se solicitó realizar los cilindros de concreto, con el fin de llevarlos al laboratorio y saber cuál es la resistencia a la comprensión.

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL

4.9.1 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO

JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA

PRESUPUESTO DE OBRA | **CRONOGRAMA DE OBRA**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (ML)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN	UBICACIÓN: KILOMETRO 2 VIA ALBANIA - CURILLO, 3 KILOMETROS DEL KILOMETRO 2 HASTA LA ESCUELA LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
CAQUETA	ALBANIA	ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA	198,00	CAQUETÁ	15/05/2024	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO | **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	JUNIO DE 2024 DEL 02 AL 08	JUNIO DE 2024 DEL 09 AL 15	JUNIO DE 2024 DEL 17 AL 23	JUNIO DE 2024 DEL 24 AL 30	JULIO DE 2024 DEL 01 AL 07	JULIO DE 2024 DEL 08 AL 14	JULIO DE 2024 DEL 15 AL 21	JULIO DE 2024 DEL 22 AL 28	JULIO DE 2024 DEL 29 AL 04	AGOSTO DE 2024 DEL 05 AL 11	AGOSTO DE 2024 DEL 12 AL 18	AGOSTO DE 2024 DEL 19 AL 25	AGOSTO DE 2024 DEL 26 AL 01
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																					
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 198.509,00	$ 198.509,00	198.509												
							SUB-TOTAL	$ 198.509,00													
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																					
2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	308,88	$ 52.100,00	$ 16.092.422,00	5.364.140	5.364.140	5.364.140										
3	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	132,96	$ 105.392,00	$ 14.012.604,00		4.670.868	4.670.868	4.670.868									
4	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	89,56	$ 871.159,00	$ 78.017.515,00			7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501
5	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	40,49	$ 346.742,00	$ 14.040.971,00					2.340.162	2.340.162	2.340.162	2.340.162	2.340.162	2.340.162			
6	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.272,23	$ 6.321,00	$ 27.004.761,00			2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978
7		1.978,00		Desmonte e instalacion de cercos paralelos a la placa huella	MI	150,00	$ 6.951,09	$ 1.042.664,00	521.332	521.332,00											
							SUB-TOTAL	$ 150.210.937,00													
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 150.409.446,00	6.093.392	10.556.341	19.582.489	14.216.349	11.887.641	11.887.641	11.887.641	11.887.641	11.887.641	11.887.641	9.547.480	9.547.480	9.547.480
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) PLAN DE INVERSION SOCIAL	$ 2.200.000,00	4%	7%	13%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	6%	6%	6%
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.789.360,00													
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 198.398.806,00													

EL ALCANCE DEL PRESENTE PROYECTO EQUIVALE A 198 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA.

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 25202- 119996 CND

Revisó: Firma PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula Profesional: 2520256474CND

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 25202- 119996 CND

Revisó: Firma PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
Nombre: FAB Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula Profesional: 2520256474CND

4.9.2. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA 10/04/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3979-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	$ 23.800.000,00	$ 23.800.000,00	$ 23.800.000,00		$ 71.400.000,00	35,99%
2	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00		$ 9.000.000,00	4,54%
3	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 2.266.648,00	$ 2.266.648,00	$ 2.266.648,00		$ 6.799.944,00	3,43%
4	TRANSPORTE	$ 4.450.000,00	$ 4.450.000,00	$ 4.450.000,00		$ 13.350.000,00	6,73%
5	COSTO DE PERSONAL	$ 17.353.167,33	$ 17.353.167,33	$ 17.353.167,33		$ 52.059.502,00	26,24%
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 15.263.120,00	$ 15.263.120,00	$ 15.263.120,00		$ 45.789.360,00	23,08%
N							%
TOTAL						$ 198.398.806,00	100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: **SIXTO JAVIER PARRA RAMIEZ**
Representante Legal o su Apoderado
ASOJUNTAS
C.C 1.117.785.524

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
DIRECTOR DE ITERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Firma:
Nombre: **Jhon Jairo Garcia Calderon**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **25202-119996 CND**

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Se anexa el acta de comité operativo

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No:	Dirección Territorial INVIAS: CAQUETÁ	Fecha: 06-05-2024

Vereda – Municipio - Departamento: ASOJUNTAS – ALBANIA CAQUETA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3979-2023
Ejecutor(es): MUNICIPIO DE ALBANIA

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JUAN CARLOS SANABRIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FABIO JESÚS MEJIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
SIXTO JAVEIR PARRA RAMIREZ	ASOJUNTAS	PRESIDENTE
ING JHON JAIRO GARCIA	ASOJUNTAS	INGENIERO RESIDENTE
EUCARIS PENNA CEBALLOS	ASOJUNTAS	CONTADOR
ALBA ADIELA ZAMBRANO	ASOJUNTAS	VEEDURIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros participantes del comité operativo.
2. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
3. Análisis de cotizaciones presentadas
4. Elección de proveedores.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Análisis de precios .
2- Elección de proveedores.
3- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
4- Elección de uniformes.
5- Proposiciones y Varios


RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen

1

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los cuatro (4) miembros principales, el presidente, el ingeniero residente, contador y un representante de la veeduría.
2.	Presentación de cotizaciones: MATERIALES EPP: En consigna quedo que los uniformes y el botiquín se compraran a CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONES PEÑALOZA y el restante de la dotación con la empresa RPM .

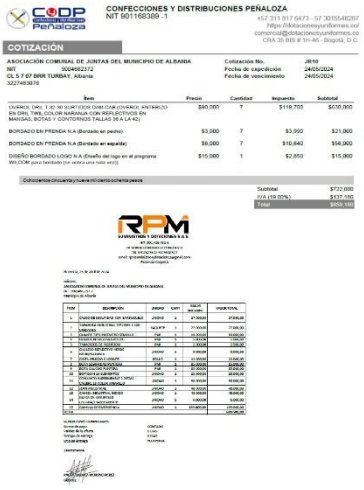
CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONES PEÑALOZA
NIT 901168389 -1
COTIZACIÓN
ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT 900469272
CL 5 7 67 BRR TURBAY, Albania
3227483676
Cotización No. JR10
Fecha de expedición 24/05/2024
Fecha de vencimiento 24/05/2024
Ítem | Precio | Cantidad | Impuesto | Subtotal
CHAQUETA, CAMISA Y PANTALÓN DRIL CON CHAQUETA REFLECTIVA EN DRIL TIPO, COLOR NARANJA CON REFLECTIVOS EN MANGAS, BOTAS Y CONTORNOS TALLAS 28 A LA 42 | $80.000 | 7 | $119.700 | $630.000
BORDADO EN PRENDA N.A (Bordado en pecho) | $3.000 | 7 | $3.990 | $21.000
BORDADO EN PRENDA N.A (Bordado en espalda) | $9.000 | 7 | $10.640 | $56.000
DISEÑO BORDADO LOGO N.A (Diseño del logo en el programa WILCOM (para bordado (no vale) a una sola vez)) | $15.000 | 1 | $2.850 | $15.000
Cotizaciones cincuenta y nueve mil ciento ochenta pesos
Subtotal $722.000
IVA (19.00%) $137.180
Total $859.180

RPM
SUMINISTROS INTEGRALES S.A.S.

2

3.	Se determinó elaborar la topografía con el señor LUIS ALBERTO NAVARRO DIAZ, el cual ofertó su servicios por valor de $ 900.000 **COTIZACION TOPOGRAFICA** San José de Fragua, 25 de abril de 2024 SEÑORES ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA NIT. 900.488.437-4 Albania Caquetá TOPOGRAFIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VALOR $ 900.000 Tiempo estimado, 5 días Forma de pago: 100 posterior a avalúo y proyecto LUIS ALBERTO NAVARRO DIAZ C.C. No 12.xxx.xxx L.P. No 02-xxxx
4.	Se determino seleccionar la empresa GI GLOCON INGENIERIA para la elaboración de laboratorios. GI GLOCON INGENIERIA ENSAYOS DE LABORATORIO ITEMS ITEM / DESCRIPCION / UNIDAD / CANTIDAD / VLR UNIT / VLR TOTAL 001 / 1 / $ 150.000 / $ 150.000 002 / 1 / $ 150.000 / $ 150.000 TOTAL $ 300.000
5.	Se aprobó adquirir la madera a la empresa MADERAS Y MACHIMBRES de San José del Fragua, quienes cuentan con la certificación y salvoconducto respectivo.

3

6.	 MADERAS Y MACHIMBRES L A Y FACTURA DE VENTA N° 250 DETALLE / V. UNIT. / V. TOTAL 5 tablas 2X15 $ 800.000 $ 4.000.000 3 tablas 5X5 $ 350.000 $ 1.050.000 2 tablas 5X10 $ 700.000 $ 1.400.000 TOTAL $ 6.450.000 Se Realizó la consulta con la ferretería de la ciudad de Florencia FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S y el precio incluye transporte hasta el sitio de la obra. Por lo tanto, se toma la decisión de adquirir los materiales a FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S. FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S NIT 901429402-0 FERRE CERAMICAS COTIZACIÓN 00003476 Cliente: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA Vendedor: FABIAN MURCIA CRUZ Cant / Descripcion de Producto / Referencia / Und / Val Unidad / Subtotal / Iva / Valor Iva / Valor Total

4

7.	En el proceso de cotización de materiales pétreos se recaudó dos cotizaciones: playa la raya del municipio de Albania y la trituradora de Morelia, se tomo la decisión de comprar el material a la playa la raya debido a que está ubicada en el Municipio de Albania y el trayecto de transporte es menor. MAEXCA S.A.S Materiales y Excavaciones del Caquetá Florencia 24 de abril de 2024 SEÑORES ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA NIT 900.488.437-4 ALBANIA CAQUETA Ref: COTIZACION DE SUMINISTROS PETREOS Cordial saludo. Cumpliendo con su petición, expedir cotización de materiales dirigido para la vereda las delicias del municipio de Albania Caquetá. LA GRAVILLA $ 70.000 EL METRO MAS IVA LA ARENA SAN EDUARDO MAS IVA PEDRA SUCIA METRO MAS IVA Atentamente,
8.	De las cotizaciones presentadas para el alquiler de maquinaria se escogió la que tenia los precios mas favorables para la junta. **COTIZACION** SAN JOSE DEL FRAGUA, 24 DE ABRIL DE 2024 SEÑORES ASOCIACION ALBANIA NIT. 900.488.437-4 ALBANIA CAQUETA CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VARGAS C.C. 12.345.xxx ITEM / TIEMPO / DESCRIPCION / UNIDAD / CANTIDAD / VR. UNITARIO / VR TOTAL 1 / 1.00 MES / RANA COMPACTADORA DE ANTIGUEDAD / UN-D / 2 / $ 896.000 / $ 892.000 2 / 1.00 MES / EXCAVADORA (R) KOMATSU PC 35 R-3 MEDIA / UN-D / 1 / $ 1.650.000 / $ 1.650.000 3 / 1.00 MES / RETROEXCAVADORA MIXTA / UN-D / 1 / $ 1.900.000 / $ 1.900.000 4 / 1.00 MES / VOLQUETA DOBLETROQUE / UN-D / 1 / $ 2.900.000 / $ 2.900.000

5

9.	Cotización de exámenes pre-ocupacionales se recibieron dos cotizaciones: CLIP SALUD Y LA DOCTORA MARTHA LUZ ALTAMAR , después de realizada el análisis de precios, se toma la decisión de realizarlos **PRECIOS 2024 _Juntas de acción comunal** EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES / VALOR UNITARIO Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular de ingreso Egreso, Periódicos- (realizados en jornada de salud, en las instalaciones de la empresa) / $ 50.000 Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular de ingreso Egreso, Periódicos-(TELEMEDICINA) / $ 40.000 Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular (Ingreso, periódicos, egreso) Realizados en Florencia / $ 25.000 Martha Luz Altamar de los Reyes Médico especialista SST. Lic. 0245

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se analizaron cada una de las cotizaciones y se tomó la decisión de elegir los proveedores que realizaran los suministros de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnica y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____

6

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI____ NO ___X_	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI____ NO _X___	No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
REMITIR LAS ACTAS DEL COMITÉ OPERATIVO	CONTADOR / INGENIERO	10-05-2024
ELABORAR EL PLAN DE INVERSION	CONTADOR / INGENIERO	10-05-2024
PRESENTAR LOS CONTRATOS DE LOS PROFESIONALES	CONTADOR	10-05-2024
ENVIAR EXAMENES LABORALES DE INGRESO.	CONTADOR	10 05 2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Cargo: Director de interventoría

Nombre: SIXTO JAVIER PARRA
Cargo: Presidente OAC

Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Cargo: Residente de interventoría


Nombre: ALBA ADIELA ZAMBRANO
Cargo: VEEDURIA

7


4.12. ACTAS DE REUNIÓN

Se anexa el acta de socialización



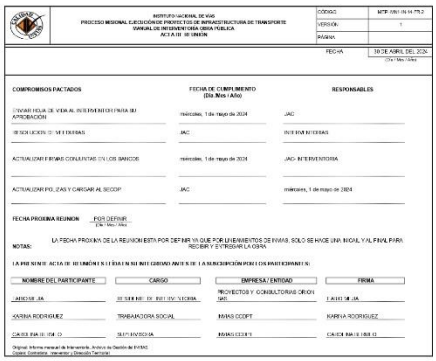

Anexo listado de asistencia

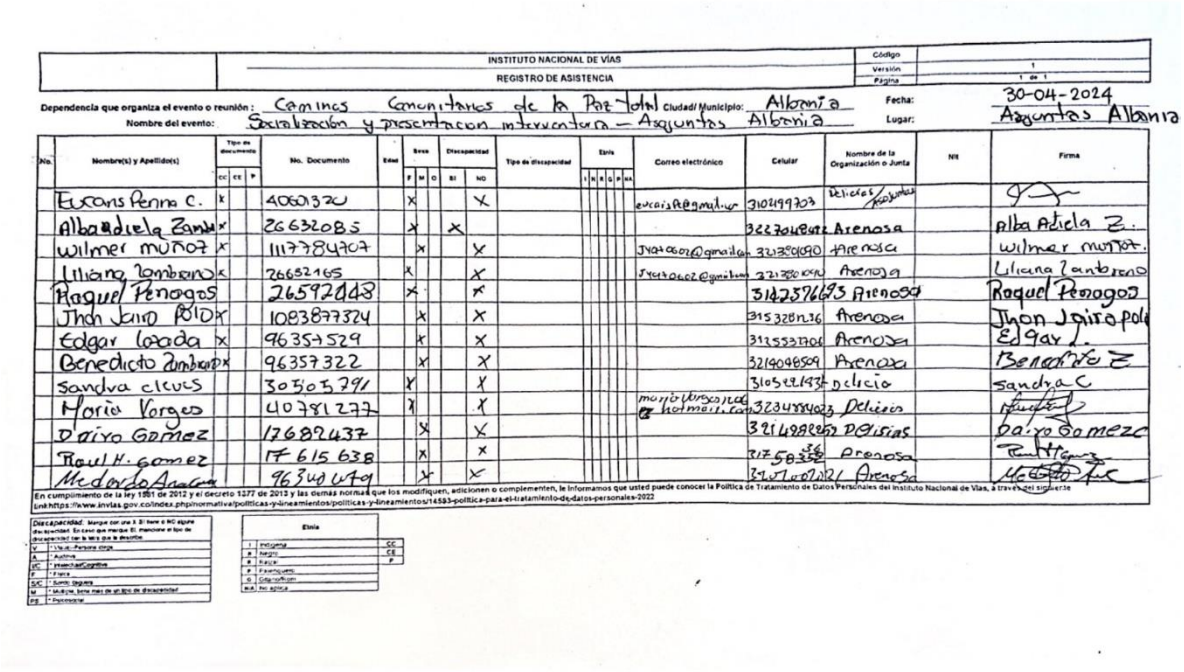

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
REGISTRO DE ASISTENCIA

Dependencia que organiza el evento o reunión: Caminos Comunitarios de la Paz Total Ciudad/ Municipio: Albania Fecha: 30-04-2024
Nombre del evento: Socialización y presentacion interventoria – Asquntos Albania Lugar: Asquntos Albania

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	G	P	RA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	NIt	Firma
1	Elcans Penna C.	X			4060320		X				X								310299703	Delicias/Asquntos		
2	Albadiela Zamb	X			26632085		X			X									3227048982	Arenosa		Alba Adiela Z.
3	Wilmer muñoz	X			1117784707		X				X							JVatacoz@gmail.com	3213901090	Arenosa		Wilmer muñoz.
4	Liliana Zambrano	X			26652165		X				X							Jvatacoz@gmail.com	3213801090	Arenosa		Liliana Zambrano
5	Raquel Penagos				26592048		X				X								3142576693	Arenosa		Raquel Penagos
6	Jhon Jairo Polo	X			1083877324			X			X								3153281736	Arenosa		Jhon Jairo Polo
7	Edgar Lozada	X			96354529			X			X								3115537706	Arenosa		Edgar
8	Benedicto Zambrano	X			96357322			X			X								3214048589	Arenosa		Benedicto Z
9	Sandra Cleves				30505791		X				X								3105421937	Delicia		Sandra C
10	Maria Vargas				40781277		X				X							mariavargas1cc@hotmail.com	3234884023	Delicias		Maria
11	Daiva Gomez				17689437			X			X								3214882652	Delicias		Daiva Gomez
12	Raul H. Gomez				TI 615 638			X			X								3175835[illegible]	Arenosa		Raul
13	Medardo Acosta				96340479			X			X								3147607021	Arenosa		Medardo

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14583-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X. Si tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad tan la ley o por la diagnóstico
V. • Visual - Persona ciega
A. • Auditiva
DC • Mental/Cognitiva
F. • Física
SC • Sordo - Muda
M. • Multiple, tiene más de un tipo de discapacidad
PS • Psicosocial

Etnia	
1	Indígena CC
2	Negro CE
3	Raizal P
4	Palenquero
5	Gitano/Rom
6	Ninguna

Powered by CamScanner

1. **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

1.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA *No. 4647 de 2023*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	*4647 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS*
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*

CONTRATISTA	*PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS*
VALOR TOTAL	*$ 109.303.594*
VALOR ACUMULADO	*$ 109.303.594*
PLAZO INICIAL	*6 MESES*
PLAZO PRORROGA No. 1	6 MESES
PLAZO ACUMULADO	9 MESES Y 16 DIAS
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	9 MESES Y 16 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1	*30 DE ABRIL DE 2024*
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2	*30 DE JUNIO DE 2024*
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3	*30 DE SEPTIEMBRE DE 2024*

*Tabla **2**. Información general contrato 4647 de 2023*

1.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

- Durante este periodo la interventoría realizo visitas a campo y realizo seguimiento desde la oficina central.
- Se realizó control de calidad a los materiales y agregados para las mezclas de concreto
- Se hizo seguimiento a los desembolsos hechos por las JAC

El porcentaje de avance físico y financiero de interventoría es de 88,6% correspondiente a $96.809.531,00

2. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato donde hace referencia el vehículo utilizado por el residente

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 30/SEPTIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023, 3714 de 2023, 4440 de 2023, 3674 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS-FLORIDA-DELCIAS-ASOJUNTAS ALBANIA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	MOTOCICLETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

NUMERO DE PLACA:FIF85G MARCA: BENELLI CILINDRAJE 500CC MODELO:2023

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: LOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INTERVENTORIA SE LES REALIZARÁ MANTENIIENTO PREVENTIVO TODO LOS 5 DE CADA MES QUE ESTE EN EJECUCION DEL PROYECTO

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firma
Nombre: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo el personal que laboró para PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

Anexos planilla paga del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Anexo certificación del pago de seguridad social del mes de SEPTIEMBRE de 2024

ORION
901503188-3

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
CRA 83 B # 15-98 CALI E-mail mabelchud@yahoo.com

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

CERTIFICA

Que para la ejecución del contrato de interventoría 4647 de 2023 firmado entre el I**NVIAS**, y **PROYECTO Y CONSULTORIAS ORION SAS** se realizaron los respectivos pagos de seguridad social (**SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA**) durante el periodo de SEPTIEMBRE de 2024, estando a paz y salvo en este periodo.


Para constancia de lo anterior se firma en Cali, Valle del Cauca a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE del 2024

Mabel Perez

Razón Social: **PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.**
Representante legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
C.C 31.577.305 DE CALI
Dirección: CRA 83 B # 15-98 CALI
Teléfono: 3224097491
E-mail mabelchud@yahoo.com
Ciudad: CALI

2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo el avance financiero y presupuestal de interventoría

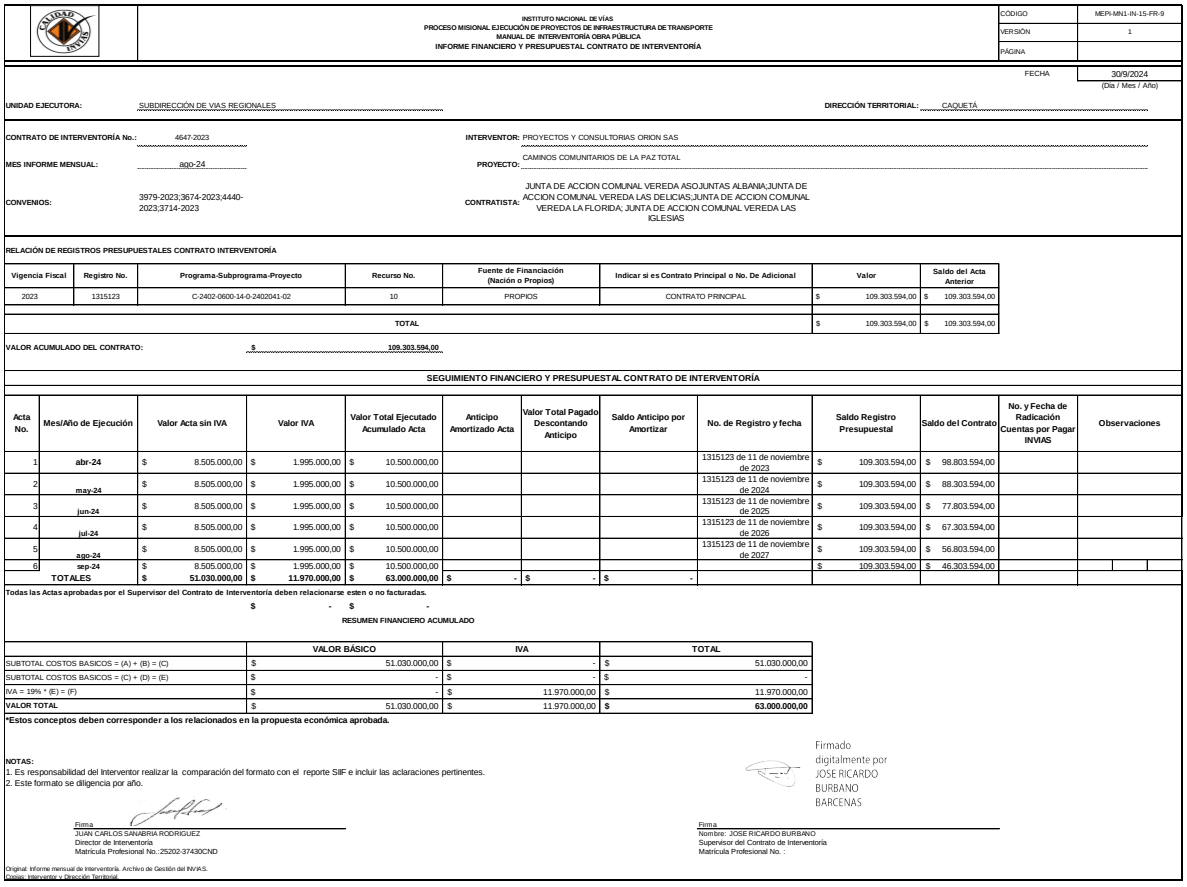

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 — INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

MES INFORME MENSUAL: ago-24 — PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIOS: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1315123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00
				TOTAL		$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 109.303.594,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	abr-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2023	$ 109.303.594,00	$ 98.803.594,00		
2	may-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2024	$ 109.303.594,00	$ 88.303.594,00		
3	jun-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2025	$ 109.303.594,00	$ 77.803.594,00		
4	jul-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2026	$ 109.303.594,00	$ 67.303.594,00		
5	ago-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2027	$ 109.303.594,00	$ 56.803.594,00		
6	sep-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00					$ 109.303.594,00	$ 46.303.594,00		
	TOTALES	$ 51.030.000,00	$ 11.970.000,00	$ 63.000.000,00	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 51.030.000,00	$ -	$ 51.030.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -	$ -	$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -	$ 11.970.000,00	$ 11.970.000,00
VALOR TOTAL	$ 51.030.000,00	$ 11.970.000,00	$ 63.000.000,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No. :

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Interventor y Dirección Territorial

2.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato de garantías

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 1: 30/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 2: 16/10/2024

VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.


2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo pólizas

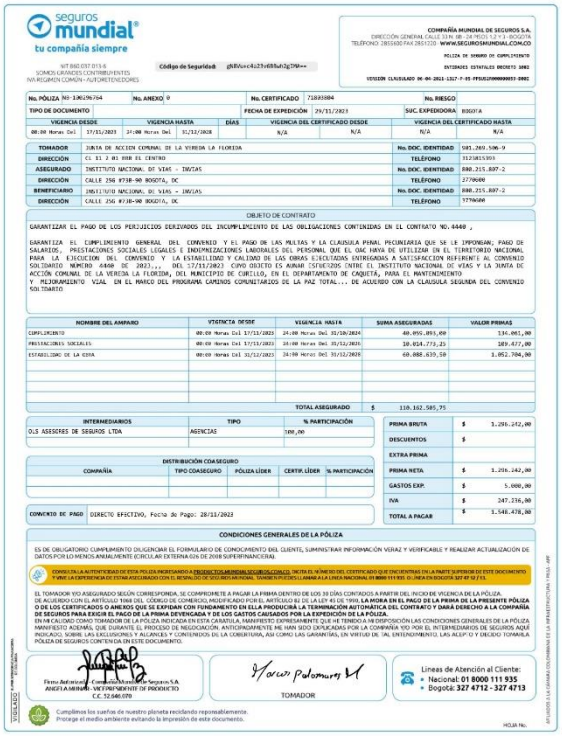

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU520000000059-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100196764	0	71893884	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	29/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815303
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770400
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770400

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 4440 ,

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023... DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.095.093,450	134.061,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.014.773,25	189.477,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2025	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.088.639,50	1.052.704,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.162.505,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.296.242,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.296.242,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	247.236,00
TOTAL A PAGAR	$	1.548.478,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O. EN BOGOTÁ 327 47 12 Y 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada / Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.046.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALL. 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - SOCOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU520000000059-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100196764	0	71893884	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	29/11/2023	30637A

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


. TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506 0

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.

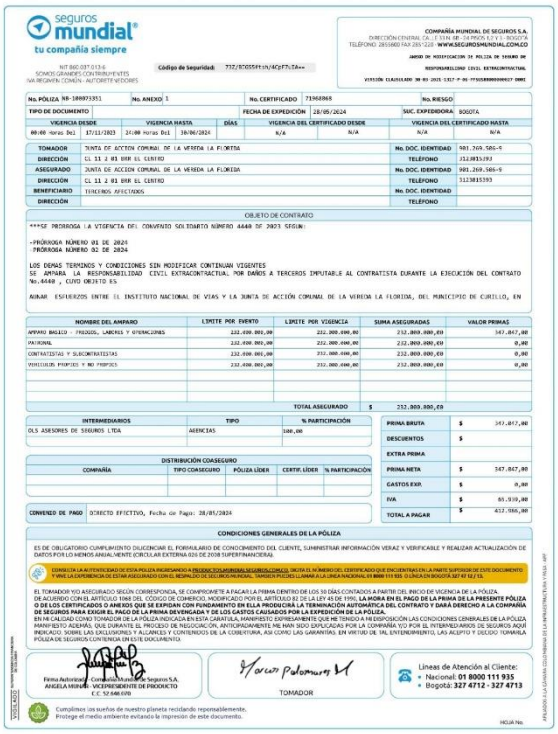

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL 7 10A-48 - 14 PISOS 1 Y 5 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000027-D001

Código de Seguridad: 7J2/BCOS5Ft1h/4CpE7LTA==

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3124831392
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CIRILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.847,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

PRIMA BRUTA	$ 347.847,00
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 347.847,00
GASTOS EXP.	$ 0,00
IVA	$ 65.930,00
TOTAL A PAGAR	$ 412.986,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

TENGA EN LA ACTUALIDAD SI ESTA PÓLIZA INCORPORA O PRODUCTOS ASOCIADOS, INCLUYA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR LA PRIMA ESTIPULADA PARA LOS RIESGOS CORRIDOS Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MENCIONADO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.660.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APLICADO A LA CARÁTULA COLOMBIANA DE LA APROBACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N.6A-24 PISOS 1 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9. TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.1. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV


"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APLICADO A LA CARÁTULA COLOMBIANA DE LA APROBACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

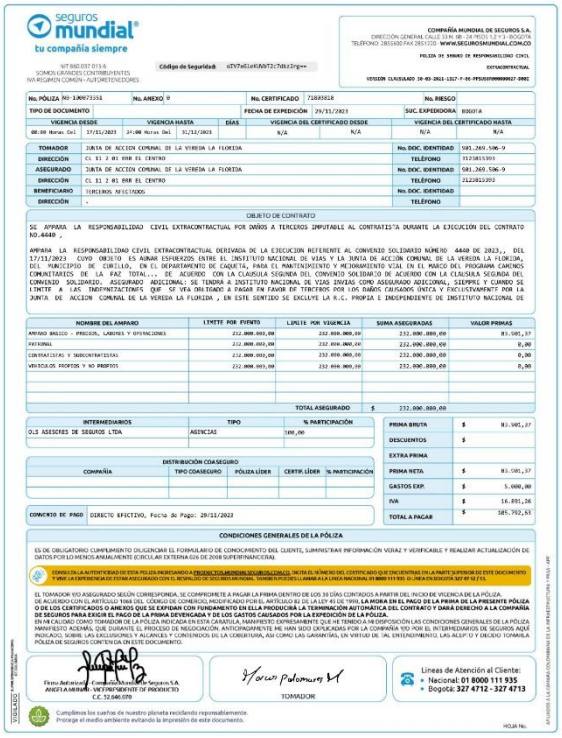

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B-24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	0	71893518	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	29/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3124813903
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3124813903
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4640 ,

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4640 DE 2023,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL,.. DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	83.501,37
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
O.J ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFICTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

PRIMA BRUTA	$	83.501,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	83.501,37
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	16.891,26
TOTAL A PAGAR	$	105.392,63

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PROYECTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O. ÁREA EN BOGOTÁ 327 47 12 Y 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MORALES - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.040.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CAL. 33 N. 6B-24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	0	71893518	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	29/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. . TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4640 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.


DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.

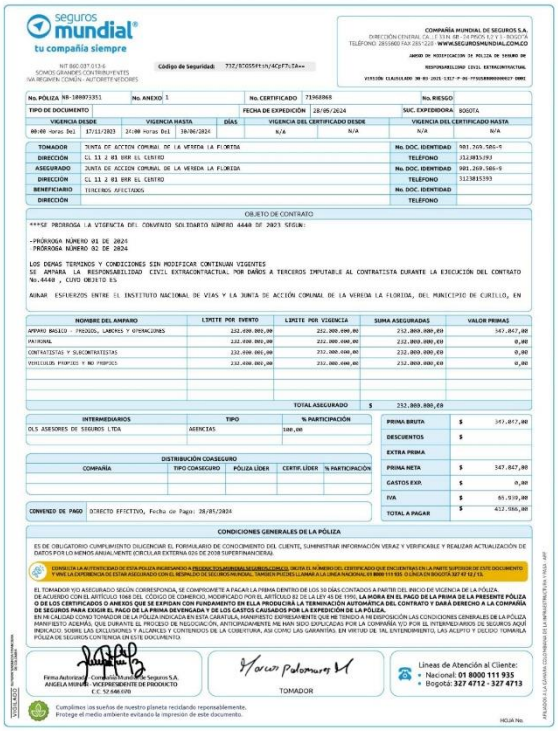

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 7J2/BCOS5Ft1h/4CpF7LTA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL 33 N. 68 - 24 PISOS 1 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSU0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960860			No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024			SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A		N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3124835193
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123835193
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2023
-PRÓRROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.047,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.047,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.047,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.919,00
TOTAL A PAGAR	$	412.966,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2016 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROTECTOR.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE, ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRAN - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.000.000

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APLICADO A LA CIRCULAR EXTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA



seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSU0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960860			No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024			SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A		N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. , TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 28.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APLICADO A LA CIRCULAR EXTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

2.5 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

2.5.1 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Anexo plan de cargas

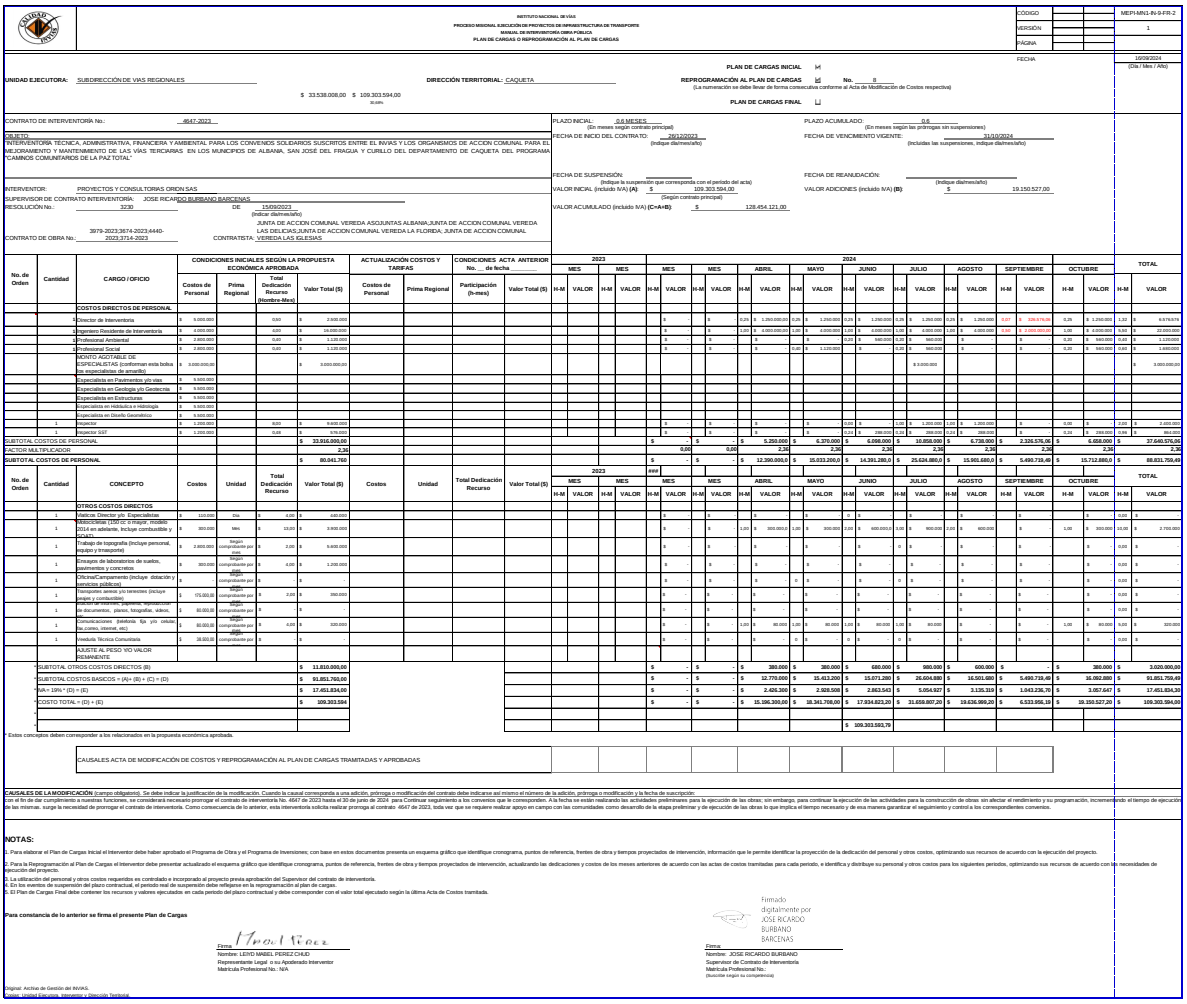

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO: MEPI-MN1-Pr-5-FR-2
VERSIÓN: 1
Página:
FECHA: 16/09/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL: X
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS: X No. 8 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA
$ 33.538.008,00 $ 109.303.594,00 30,69%

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 3230 DE 15/09/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

PLAZO INICIAL: 0,6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 109.303.594,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 128.454.121,00

PLAZO ACUMULADO: 0,6 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 19.150.527,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA: Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costos de Personal	Prima Regional	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha _____: Participación (h-mes)	Valor Total ($)	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																
	1	Director de Interventoria	$ 9.000.000		0,60	$ 2.600.000																												
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.000.000		4,80	$ 14.000.000																												
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000																												
	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000																												
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conformar esta bolsa las especialidas de amarillo)	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00																				$ 3.000.000						$ 3.000.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 9.000.000																														
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 9.000.000																														
		Especialista en Estructuras	$ 9.000.000																														
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 9.000.000																														
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 9.000.000																														
	1	Topografo	$ 1.200.000		8,00	$ 9.600.000																												
	1	Inspector SST	$ 1.200.000		0,60	$ 576.000																												
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 33.016.000,00							$ -	$ -	$ -	$ 5.250.000	$ -	$ 6.370.000	$ -	$ 6.096.000	$ -	$ 10.858.000	$ -	$ 6.738.000	$ -	$ 2.326.576,00	$ -	$ 6.658.000	$ -	$ 37.640.576,00		
FACTOR MULTIPLICADOR						2,30							0,00	0,00	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30		
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 80.041.760							$ -	$ -	$ -	$ 12.360.000,0	$ -	$ 15.033.200,0	$ -	$ 14.391.388,0	$ -	$ 25.624.880,0	$ -	$ 15.901.680,0	$ -	$ 5.490.739,48	$ -	$ 15.712.880,0	$ -	$ 88.831.759,48		

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
	1	Asesor Director y/o Especialistas Adicionales (1500 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT).	$ 110.000	Dia	4,00	$ 440.000																												
	1		$ 300.000	Mes	13,00	$ 3.900.000																												
	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 2.600.000	Integro Comprometido por mes	3,00	$ 9.600.000																												
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Integro Comprometido por mes	4,00	$ 1.200.000																												
	1	Oficina/Campamento (incluye dotacion y servicios publicos)	$ -	Integro Comprometido por mes	-	$ -																												
	1	Tiquetes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 175.000,00	Integro Comprometido por mes	2,00	$ 350.000																												
	1	Papeleria en general, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias, videos, etc.	$ 80.000,00	Integro Comprometido por mes	-	$ -																												
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 80.000,00	Integro Comprometido por mes	4,00	$ 320.000																												
	1	Vivienda Tecnico Comunitaria	$ 34.000,00	Integro Comprometido por mes	-	$ -																												
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																																
		*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 11.810.000,00							$ -	$ -	$ -	$ 380.000	$ -	$ 380.000	$ -	$ 680.000	$ -	$ 980.000	$ -	$ 600.000	$ -	$ -	$ -	$ 380.000	$ -	$ 3.020.000,00		
		*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+ (B) + (C) + (D)				$ 91.851.760,00							$ -	$ -	$ -	$ 12.770.000	$ -	$ 15.413.200	$ -	$ 15.071.280	$ -	$ 26.604.880	$ -	$ 16.501.680	$ -	$ 5.490.739,48	$ -	$ 16.092.880	$ -	$ 91.851.759,48		
		*IVA= 19% * (D) = (E)				$ 17.451.834,00							$ -	$ -	$ -	$ 2.426.300	$ -	$ 2.928.508	$ -	$ 2.863.543	$ -	$ 5.054.927	$ -	$ 3.135.319	$ -	$ 1.043.236,70	$ -	$ 3.057.647	$ -	$ 17.451.834,30		
		*COSTO TOTAL = (D) + (E)				$ 109.303.594							$ -	$ -	$ -	$ 15.196.300,00	$ -	$ 18.341.708,00	$ -	$ 17.934.823,20	$ -	$ 31.659.807,20	$ -	$ 19.636.999,20	$ -	$ 6.533.956,19	$ -	$ 19.150.527,20	$ -	$ 109.303.594,00		
		-																																
		-																																
																														$ 109.303.593,79			

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones, se consideraró necesario prorrogar el contrato de interventoria No. 4647 de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 para Continuar seguimiento a los convenios que le corresponden. A la fecha se están realizando las actividades preliminares para la ejecución de las obras; sin embargo, para continuar la ejecución de las actividades para la construcción de obras sin afectar el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas, surge la necesidad de prorrogar el contrato de interventoria. Como consecuencia de lo anterior, esta interventoria solicita realizar prorroga al contrato 4647 de 2023, toda vez que se requiere realizar apoyo en campo con las comunidades como desarrollo de la etapa preliminar y de ejecución de las obras lo que implica el tiempo necesario y de esa manera garantizar el seguimiento y control a los correspondientes convenios.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: LEIDI MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(favor/citar según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ la vereda arenosa, termino obra el 14 de septiembre.

3.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

En el mes de agosto no se generó correspondencia

3.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS


	
Vaciado de concreto reforzado	**Vaciado de concreto reforzado**
	
Vaciado de concreto reforzado	**Vaciado de concreto reforzado**


3.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

A la fecha no se han presentado actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad

3.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Anexo bitácora del mes de septiembre de 2024

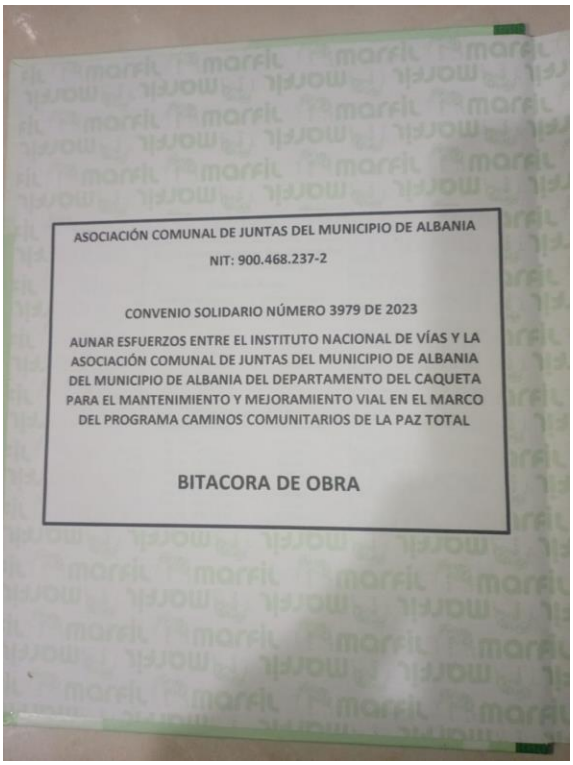


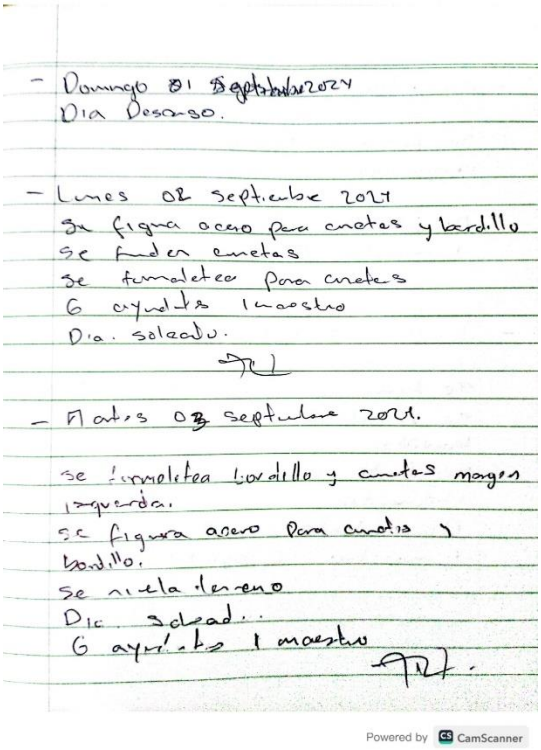
- Domingo 01 de septiembre 2024
Dia Descanso.

- Lunes 02 septiembre 2024
Se figura acero para cunetas y bordillo
Se funden cunetas
Se formaleteo para cunetas
6 ayudas 1 maestro
Dia. soleado.

- Martes 03 septiembre 2024.
Se formaleteo bordillo y cunetas margen izquierda.
Se figura acero para cunetas y bordillo.
Se nivela terreno
Dia soleado.
6 ayudas 1 maestro

Powered by CamScanner

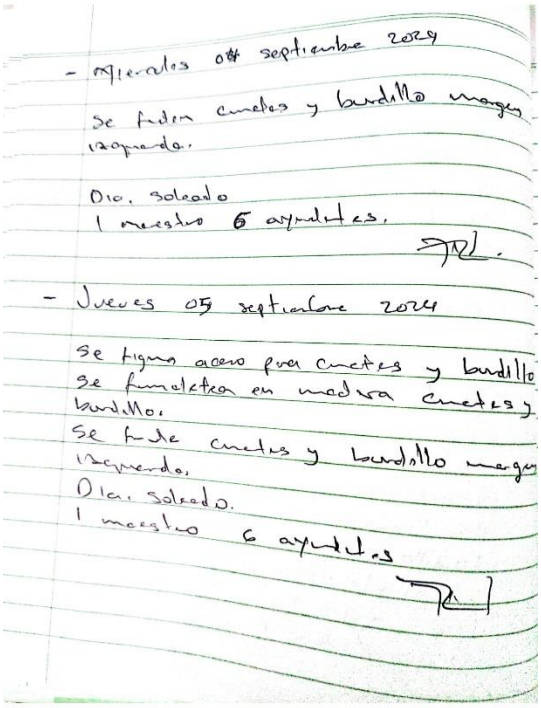

- Miercoles 04 septiembre 2024


Se fundan cunetas y bordillo margen izquierda.

Dia. Soleado
1 maestro 6 ayudantes.

- Jueves 05 septiembre 2024

Se figura acero para cunetas y bordillo
Se fundieron en madera cunetas y bordillo.
Se funde cunetas y bordillo margen izquierdo.
Dia. Soleado.
1 maestro 6 ayudantes

Powered by CamScanner

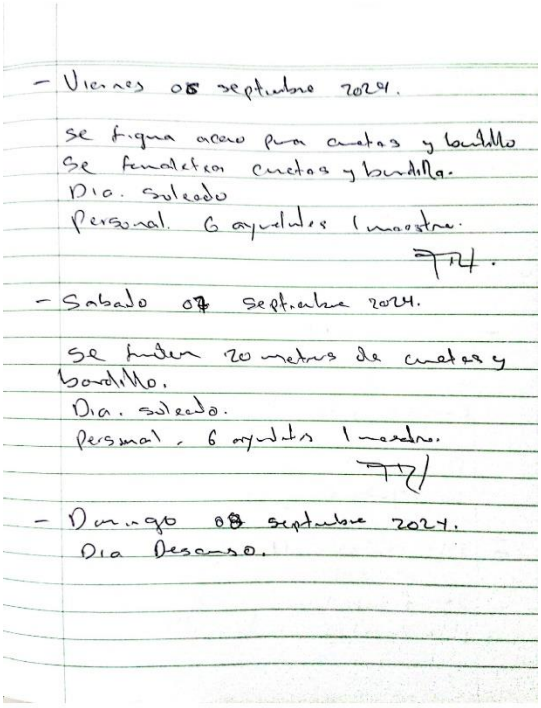

- Viernes 06 septiembre 2024.


se figura acero para cunetas y bordillo
Se fundieron cunetas y bordilla.
Dia. Soleado
Personal 6 ayudantes 1 maestro.

- Sabado 07 septiembre 2024.

Se funden 20 metros de cunetas y bordillo.
Dia. soleado.
Personal - 6 ayudantes 1 maestro.

- Domingo 08 septiembre 2024.
Dia Descanso.

Powered by CamScanner

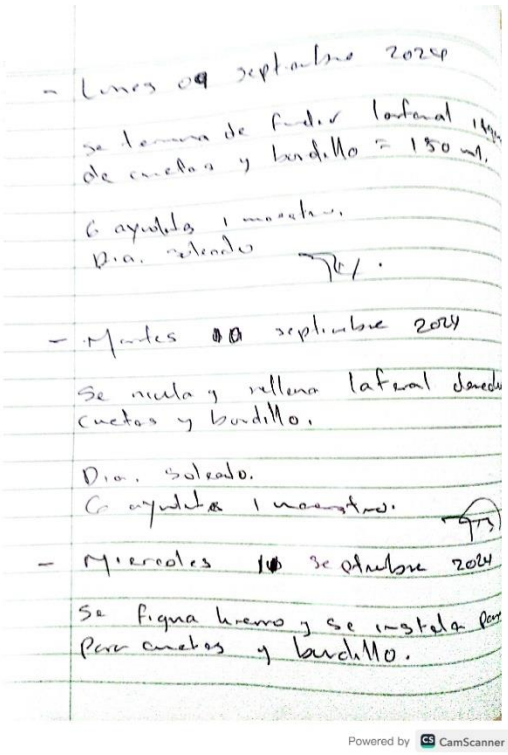

- Lunes 09 septiembre 2024

se terminan de fundir lateral izq. de cuetas y bordillo = 150 ml.

6 ayudtes 1 maestro.
Dia. soleado

- Martes 10 septiembre 2024


Se nivela y rellena lateral derecho cuetas y bordillo.

Dia. Soleado.
6 ayudtes 1 maestro.

- Miercoles 11 de septiembre 2024

Se figura hierro y se instala para cuetas y bordillo.

Powered by CamScanner

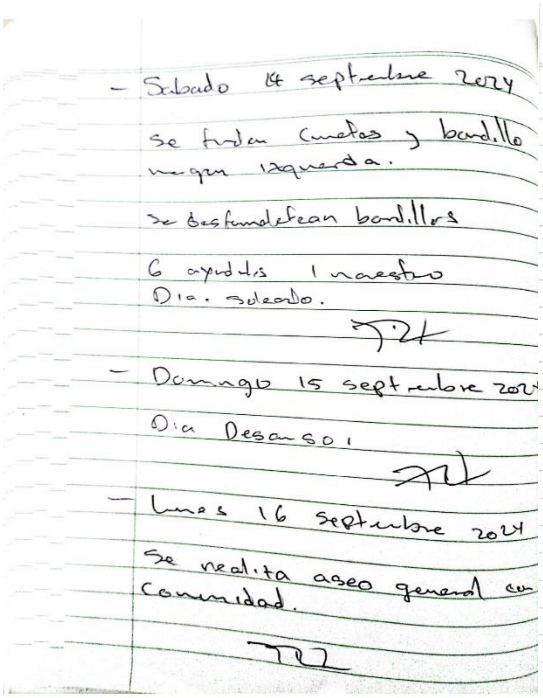

- Sabado 14 septiembre 2024

se funden cuetas y bordillo margen izquierda.

se desformaletean bordillos

6 ayudtes 1 maestro
Dia. soleado.


- Domingo 15 septiembre 2024

Dia Descanso.

- Lunes 16 septiembre 2024

Se realiza aseo general en comunidad.

Powered by CamScanner

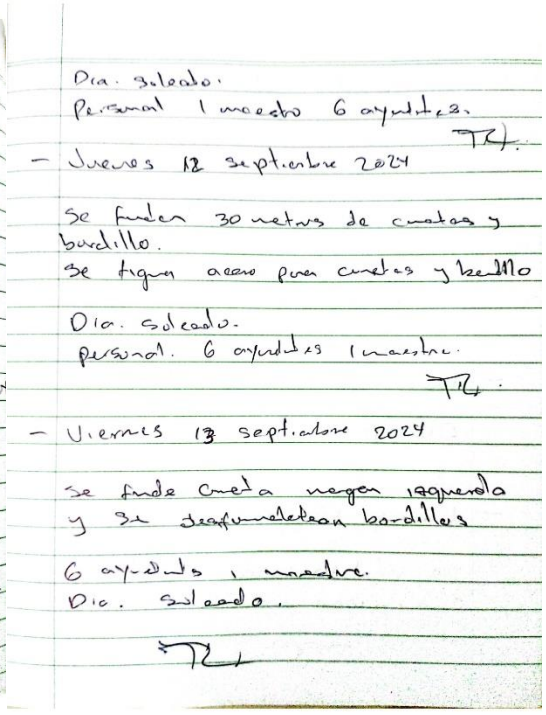

Dia. Soleado.
Personal 1 maestro 6 ayudtes.

- Jueves 12 septiembre 2024

Se funden 30 metros de cuetas y bordillo.
se figura acero para cuetas y bordillo


Dia. Soleado.
personal. 6 ayudtes 1 maestro.

- Viernes 13 septiembre 2024

se funde cueta margen izquierda y se desformaletean bordillos

6 ayudtes 1 maestro.
Dia. Soleado.

Powered by CamScanner

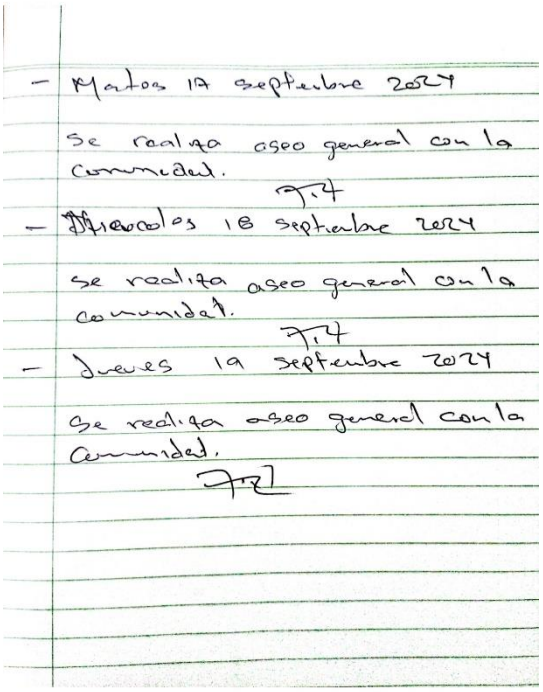



Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S
Matricula No. 2520237430CND

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°06

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4647-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:
3674 de 2023

PERIODO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Elaboró:	***Revisó:***	***Aprobó:***
Ing. FABIO JESUS MEJIA *Mat: 2520256474 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*
CARGO: *Residente de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*	***CARGO:*** *Supervisor del contrato*
Fecha: *30 de SEPTIEMBRE de*	***Fecha:*** *31 de SEPTIEMBRE*	***Fecha:*** *31 de SEPTIEMBRE*

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3674 de 2023 **Contratista:** JAC VEREDA DELICIAS

Contrato de Interventoría No. 4647 de 2023 **Interventoría:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** SEPTIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	69
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	70
1	**INTRODUCCIÓN**		73
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		73-75
2.1	Localización		75
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		76
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		76-77
2.4	Características técnicas del proyecto		78-79
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		80
3.1	Información general del contrato		80
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		81
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		81
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		81
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		82
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	82-85
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	86
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	86
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	86
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	86
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	86-88
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	88-89
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		90
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	90
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	90
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	90
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		90
5.1	Información general del contrato		90-91
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		91
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	91
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	91
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	91
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	91-92
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		92
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	92
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		92
8	**Anexos**		93
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		93
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		93
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		93
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		93

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:
ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se relaciona adjunto el formato diligenciado del resumen del estado general del proyecto, se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto, en el cual se evidencia que el contratista ya termino obras. Y presenta un avance físico y financiero del 100%

NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 3674- 2023

OBJETO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/04/2024
PLAZO DE VENCIMIENTO ACTUAL	30/09/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.548.773,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	0
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	0
ANTICIPO CONCEDIDO:	0
ANTICIPO AMORTIZADO:	0

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Paimentación	PLACA HUELLA	ML	150
	ALCANTARILLA DE 36"	UNIDAD	1
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Paimentación	PLACA HUELLA	ML	$ 19.468.964,34	$ 149.902.063,00
	ALCANTARILLA	UND	$ 18.056.708,00	$ 149.902.063,00
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 121.420.500,03	28.481.562,97	$ 149.902.063,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALE			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEM			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):		$ 123.433.098,66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		$ 120.433.098,66
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		80,34%

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 91.530.000,00	21.470.000,00	$ 113.000.000,00	
AJUSTES				$ 149.902.063,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SE				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				$ 113.000.000,00

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO





Foto 2
VACIADO DE CONCRETO REFORZADO Y ADECUACION DE BORDILLOS Y CUNETA



PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No:252223430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. LOCALIZACIÓN 7
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 8
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 3674 de 2023 11
3.1INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES .12
3.3SEGUIMIENTO ITEN NO PREVISTO
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12
4.1. INFORME SEMANAL 12
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 15
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 18
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 20
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 20
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 21
4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA .23
4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 30
4.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 30
4.10. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 31
4.11. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 32
4.12. ACTAS DE REUNIÓN 34
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 21
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 21

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR……21

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA22

6.1 EQUIPOS Y VEHICULOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA……22

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……22

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL……22

6.5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS……22

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……..23

8. ANEXOS……24

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO……24

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS……24

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS……..24

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE……24

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidario.

En este informe se presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.06** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024** el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

2.1.2 hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los siguientes convenios:

- ✓ **Convenio No. 3674 con número de proceso SPSC-CD-CS-419-2023, ID de contrato y que tiene por objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ANTECEDENTES

La economía del municipio está basada en la agricultura, complementada con la ganadería, la coca y aprovechamientos forestales

A el municipio de San José del Fragua, Currillo y Albania se accede por la ruta troncal del Llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por la empresa Coomotor Por vía terrestre, además de su vecina, se accede por Villavicencio en el vecino departamento del Meta en el norte, Mitú (Vaupés) al este y Leticia (Amazonas) en el sur.
.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente, proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

San José del Fragua, Currillo y Albania son municipios del departamento del Caquetá, en Colombia localizado en la Zona sur del país, en la región Amazonia. Con 88 965 km² es el tercer departamento más extenso —por detrás de Amazonas y Vichada

Los puntos a intervenir en la vereda DELICIAS se localizan en las siguientes coordenadas:

PUNTO 1 ALCANTARILLA (ANTIGUA ESCUELA): 2° 04' 40,3168" N 72° 43' 05,7711" W

PUNTO 2 PLACA HUELLA (ANTIGUA ESCUELA): 2° 04' 02,9242" N 72° 42' 07,1726" W



Figura 2-2 Ubicación del tramo a mejorar en la vereda Las delicias.

Ilustración 4 - Localización del tramo a intervenir en la vereda Delicias
Fuente: TOPOGRAFIA VEREDA DELCIAS

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a la asociación de junta de Albania (la arenosa), **vereda las delicias**, florida del municipio de Currillo y la vereda iglesias del municipio de San José del Fragua, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos.

Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

CONVENIO 3674 – 2023:

OBJETO "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

La vereda Delicias del Municipio de Albania está ubicada aproximadamente a 8 kilómetros del casco urbano y limita con las veredas la unión, Berlín y la 76, dicha vereda posee una vía terciaria con una extensión aproximada de 13 km.

El tramo a intervenir está ubicado cerca al puente quebrada grande el estado general de la superficie o rodadura presenta hundimientos puntuales a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias los cuales impiden la transitabilidad de cualquier tipo de vehículo en época de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es de 6 m aproximadamente. No cuenta con cunetas, carece de obras hidráulicas y falta realizar mantenimiento a las existentes, se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

En la vía no hay obras de arte

Ilustración 5 – Inventario y estado inicial de la vía
Fuente: FICHA VISITA TÉCNICA DIAGNOSTICO DE VÍAS – INVIAS

3.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	
ALCANCE DEL PROYECTO	*LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS", PARA LO CUAL SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA VISITA TÉCNICA REALIZADA POR LOS PROFESIONALES DESIGNADOS POR EL INVIAS, EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL - OAC, EN DONDE SE REALIZÓ UNA CONCERTACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR, UTILIZANDO LOS DISEÑOS TIPO ESTABLECIDOS EN LA CARTILLA DE OBRAS DE*

	DRENAJE Y ESTRUCTURALES VIALES, NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONVENIO Y PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DEL SECTOR A INTERVENIR.
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CONVENIO 3674 – 2023	*CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLAS DE 36".Y 150 ML DE PLACA HUELLA LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES PRESENTADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES.* *LA ALCANTARILLA CIRCULAR, COMO ELEMENTO DE DRENAJE TRANSVERSAL SE TRABAJARÁ CON TUBOS DE 36" DE CONFIGURACIÓN TIPO ALETA-ALETA LA CUAL PERMITE, ADEMÁS DE RECIBIR Y EVACUAR LA ESCORRENTÍA APORTANTE POR LAS CUNETAS Y FILTROS, DAR CONTINUIDAD A CAUCES CON FLUJOS INTERMITENTES O EFÍMEROS.*

Tabla 4. Características técnicas del proyecto

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 3674 de 2023

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VEREDA LAS DELICIAS

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA No. 3674 de 2023

TIPO DE PROCESO	*CONTRATACIÓN DIRECTA*
NÚMERO DE PROCESO	*SPSC-CD-CS-419-2023*
CONVENIO NO.	*3674 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS*
OBJETO	*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO*

	DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	*JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS*
NIT	*901.648.219-6.*
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – PGN	*$198.548.773*
APORTE EN ESPECIE OAC	*$1.000.000*
VALOR TOTAL	*$ 199.548.773*
ADICIONES	*$ 0.00*
FECHA DE INICIO	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*31 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 01 ***FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2***	*30 DE ABRIL DE 2024*
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 3	*30 DE JUNIO DEL 2024* *30 DE SEPTIEMBRE DE 2024*

Tabla 5. Información general convenio 3674 de 2023

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- **FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO Fy 4200MPA:** Se realizó corte y doblado de barras corrugadas permitiendo obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño de las huellas

- **CONCRETO 21 MPA:** Vaciado de concreto para las cunetas y bordillos

En el transcurso del mes se vaciaron concreto para las cunetasy bordillo reforzado El porcentaje de obra ejecutado a la fecha es del 100 %correspondiente a un valor de $199.548.773

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han presentado ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Realizar visitas periódicas para seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando medidas y que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto

Control de calidad en los materiales y agregados para las mezclas de concreto

Toma de muestras de concretos para los cilindros

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Semana 1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1
FECHA	7/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA | SEMANA No.: 20 del 1/09/2024 al 7/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 161 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 36", CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS		
CONVENIO No.	3674 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.548.773,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.548.773,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S		
INTEGRANTES:	UNICO		
CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.548.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 123.433.099		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 76.115.674		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 42.000.000	$ 88.934.531		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.303.594	$ 20.369.063		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.902.063,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 94.500.000,00	47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 94.000.000,00	47%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 500.000,00	0%
ADMINISTRACIÓN	$ 29.433.098,66	14,7%
PAGA		
APORTES JAC		100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 123.933.098,66	82,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 123.433.098,66	82,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 500.000,00	0,3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.500.000,00	8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.000.000,00	10,0%

Observaciones: la obra presenta un avance del 82,34% se esta ejecutando el vaciado de concreto ciclopeo. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 14,7%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a dispones para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 91.559.531,00	83,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 74% | Avance o Atraso Físico %: -1,7%

Meta Física Ejecutada %: 75,8%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
1	alcatarillas 36"	Unidad	1
2	PLACA HUELLA	ML	161
3			
4			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog		$ 18.056.708,00		$ 18.056.708,00	12,0%
Ejec		$ 18.056.708,00		$ 18.056.708,00	12,0%
Prog	$ 12.500.000,00			$ 93.016.634,90	62,1%
Ejec	$ 15.000.000,00			$ 95.516.634,90	63,7%
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás prosiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA		
VIBRO COMPACTADOR		
MEZCLADORA	1	1
PLANTA ELECTRICA	1	1
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: N 1° 19'1" W 75° 58'17" — N 1° 18'1" W 75° 56'57"

TRAMO Y/O SECTOR 2: N 1° 18'1" W 75° 57'8" — alcantarilla de 36"

TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES: SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZO POR EL PGA

OBSERVACIONES: : EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO VEREDA DELICIAS

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 16 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza replanteo para bordillos y cunetas , se instala acero y se encofra con madera, posterior se realiza el vaciado de concreto

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa el corte y figurado del acero para las bordillos y cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE BORDILLOS Y CUNETAS



REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE BORDILLOS Y CUNETAS



LOSA DE LA PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 25205194174CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO | VERSION | PÁGINA 1 | FECHA 14/09/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA | SEMANA No.: 21 del 8/09/2024 al 14/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal no

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCIÓN DE 161 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 36", CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS. DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI) total placa huella construida 150 ml y una alcantarilla de 36"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS
CONVENIO No.: 3674 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.548.773,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 | VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.548.773,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S
INTEGRANTES: UNICO
CONTRATO No.: 4647 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 | VALOR ADICIONES: -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.548.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 130.433.099		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 69.115.674		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 42.000.000	$ 88.934.531		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.303.594	$ 20.369.063		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.902.063,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 102.000.000,00	51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 101.000.000,00	51%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.000.000,00	1%
ADMINISTRACIÓN	$ 29.433.098,66	14,7%
PAGA:		
APORTES JAC		100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 131.433.098,66	87,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 130.433.098,66	87,01%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.000.000,00	0,7%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.000.000,00	6,7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.000.000,00	7,3%

Observaciones: la obra presenta un avance del 87,7% se esta ejecutando el vaciado de concreto para cunetas y bordillos. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 14,7%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 94.184.531,00	86,2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 72% | Avance o Atraso Físico %: -0,7%
Meta Física Ejecutada %: 73,1%

Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
alcatarillas 36"	Unidad	1	Prog		$ 18.056.708,00		$ 18.056.708,00	12,0%
			Ejec		$ 18.056.708,00		$ 18.056.708,00	12,0%
PLACA HUELLA	ML	161	Prog	$ 10.000.000,00			$ 90.516.634,90	60,4%
			Ejec	$ 11.000.000,00			$ 91.516.634,90	61,1%
			Prog					
			Ejec					

* El interventor identifica la meta física apoderada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA		
VIBRO COMPACTADOR		
MEZCLADORA	1	1
PLANTA ELECTRICA	1	1
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: N 1° 19' 1" W 75° 58' 17" — N 1° 18' 1" W 75° 56' 57"
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: N 1° 18' 1" W 75° 57' 8" — alcantarilla de 36"

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: CAQUETA	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN: MAEXCA SAS	PERMISO MINERO: SI X NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ____	

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:
SE INSTALO EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZO POR EL PGA

OBSERVACIONES: : EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14 — CAMPAMENTO VEREDA DELICIAS

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 16 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS LOCALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza replanteo para bordillos y cunetas, se instala acero y se encofra con madera, posterior se realiza el vaciado de concreto

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa el corte y figurado del acero para las bordillos y cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE BORDILLOS Y CUNETAS


REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE BORDILLOS Y CUNETAS


LOSA DE LA PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25202564772CND

Original: informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 3

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 1 | FECHA 21/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA | SEMANA No.: 22 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal no ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 161 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 36", CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI) total placa huella construida 150 ml y una alcantarilla de 36"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICION DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS		INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.	
			INTEGRANTES:	UNICO	
CONVENIO No.	3674 de 2023	VALOR INICIAL: $ 199.548.773,00	CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 199.548.773,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.548.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 194.051.711		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 4.497.062		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 42.000.000	$ 88.934.531		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.303.594	$ 20.369.063		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.902.063,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149.902.063,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 149.902.063,00	100%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN	$ 44.149.648,00	22,1%
PAGA		
APORTES JAC		100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 194.051.711,00	97,25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 194.051.711,00	97,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.468.964,34	12,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.468.964,34	13,0%

Observaciones: la obra presenta un avance del 100% se esta ejecutando el vaciado de concreto para cunetas y bordillos. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 22,1%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a dispones para obra social o integración por parte de la comunidad ya se radico al correo de invias la solicitud para la inversión de los recurso para compra de dotacion del salon comunal, estamos a la espera de estos recursos sean aprobados

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 96.809.531,00	88,6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 98,7% | Avance o Atraso Físico %: 1,3%
Meta Física Ejecutada %: 100,0%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
1	alcantarillas 36"	Unidad	1
2	PLACA HUELLA	ML	161
3			
4			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
1	Prog		$ 18.056.708,00		$ 18.056.708,00	12,0%
	Ejec		$ 18.056.708,00		$ 18.056.708,00	12,0%
2	Prog	$ 18.468.964,34			$ 129.845.354,98	86,6%
	Ejec	$ 19.468.964,34			$ 131.845.354,98	88,0%
3	Prog					
	Ejec					
4	Prog					
	Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA		
VIBRO COMPACTADOR		
MEZCLADORA	1	1
PLANTA ELECTRICA	1	1
Total		2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: N 1° 19' 1" W 75° 58' 17" — N 1° 18' 1" W 75° 56' 57"
TRAMO Y/O SECTOR 2: N 1° 18' 1" W 75° 57' 8" — alcantarilla de 36"
TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:
SE INSTALO EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZO POR EL PGA

OBSERVACIONES: : EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO VEREDA DELICIAS

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 16 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO CUANDO POR PARTE DEL INVIAS DEN APROBACION A LOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE DOTACION E INTEGRACION DEL CIERRE

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con el vaciado de concreto para bordillos y cuneta y la placa huella queda al 100%,se realiza un aseo general y se llevan los sobrante a sitios autorizados

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE BORDILLOS Y CUNETAS



REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE BORDILLOS Y CUNETAS



LOSA DE LA PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25252647-ICND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Responsabilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 4

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES; DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA; SEMANA No.: 23 del 22/09/2024 al 30/09/2024 (Numeración consecutiva); Ultimo Informe Semanal si ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS; GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 161 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 36", CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI) total placa huella construida 150 ml y una alcantarilla de 36"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS		
CONVENIO No.	3674 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.548.773,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.548.773,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.		
INTEGRANTES:	UNICO		
CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.548.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 199.548.773		
	SALDO DE VIGENCIA		$ (1.000.000)		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 42.000.000	$ 88.934.531		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.303.594	$ 20.369.063		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.902.063,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149.902.063,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 149.902.063,00	100%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN	$ 44.149.548,00	22,1%
PAGA	$ 4.497.062,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.548.773,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.548.773,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones: la obra presenta un avance del 100% . De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 22,1%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad ya se radico al correo de invias la solicitud para la inversión de los recurso para compra de dotacion del salon comunal, estos recursos ya fueron girados a la cuenta de la junta de accion comual y estamos a la espera de que sostenibilidad de la aprobación de los recursos

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 99.434.531,00	91,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 6.533.956,19

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: la interventoria sigue realizando acompanimiento administrativo con el fin de que estos convenios sean liquidados

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 98,7%; Avance o Atraso Físico %: 1,3%
Meta Física Ejecutada %: 100,0%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcatarillas 36"	Unidad	1
*	PLACA HUELLA	ML	161
-			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico		Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
*	Prog		$ 18.056.708,00		$ 18.056.708,00	12,0%
	Ejec		$ 18.056.708,00		$ 18.056.708,00	12,0%
*	Prog	$ 18.468.964,34			$ 129.845.354,98	86,6%
	Ejec	$ 19.468.964,34			$ 131.845.354,98	88,0%
-	Prog					
	Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA		
VIBRO COMPACTADOR		
MEZCLADORA		
PLANTA ELECTRICA		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: N 1° 19' 1" W 75° 58' 17" — N 1° 18' 1" W 75° 56' 57"
TRAMO Y/O SECTOR 2: N 1° 18' 1" W 75° 57' 8" — alcantarilla de 36"
TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN: MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:
SE INSTALO EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FECHA PAGA SE REEMPLAZO POR EL PGA

OBSERVACIONES: : EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO VEREDA DELICIAS

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 16 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PROGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO CUANDO POR PARTE DEL INVIAS DEN APROBACION A LOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE DOTACION E INTEGRACION DEL CIERRE

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

el recurso del PAGA fue consignado a la cuenta de la JAC, y estamos a la espera de que sostenibilidad de el concepto favorable

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA HUELLA A= 5M E= 15 CM




PLACA HUELLA A= 5M E= 15 CM



PLACA HUELLA A= 5M E= 15 CM

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 252025647CND

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Anexo formato

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3674-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 de 2023 — **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VIBRO COMPACTADOR	CAT-420 D	2896 KG	ARENOSA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																	
PAJARITA	CAT-420 D	1875 KG	ARENOSA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																	
TROMPO MEZCLADOR	BAUKER	1 BULTO	ARENOSA	A	I	I	I	I	A	I	A	I	I	I	A	I	I																	
GENERADOR ELECTRICO	BAUKER	110V/220V	ARENOSA	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																	
PUILDORA ELECTRICA	DRIWALL	6500 RPM	ARENOSA	A	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I																	
MOTOBOMBA	HUMBOLT	1 HP	ARENOSA	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO				6			1	2	2	2	2				1																			
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO					6	6	5	4	4	4	4	6	6	6	5	6	6																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	33	33%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	51	51%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA MAQUINARIA QUE SE REPORTA EN EL CUADRO COMO INACTIVA, SE ENCUENTRAN EN BUES ESTADO, SOLO QUE NO SE REQUIERE UTILIZAR TODOS LOS DIAS

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JHON JAIRO GARCIA CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-119996 CND

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional N 2520256474 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato de la nómina mes de SEPTIEMBRE de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-PI-31-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3674 -2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION VEREDA LAS DELICIAS
ALIANZA ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL

MES Y AÑO DEL INFORME MEN: 31 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 — **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 — **INTERVENTOR:** POYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

NOMBRE ARL: POSITIVA ARL — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION DEL CAQUETA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL — Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES — Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ALIRIO LUNA DIAZ	17.681.950	MAESTRO DE CONSTRUCCION	$ 2.320.000	x x x x x x x x x x x x x x	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 2.320.000	$ 161.500	V	ASMETSALUD	30837692	$ 290.000	PORVENIR	30837692	$ 371.200	$ 92.800	$ 46.400	$ 69.600	
2	DANIEL LUNA GUALTERO	1.006.507.310	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x X	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	30837692	$ 162.500	PORVENIR	30837692	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	SERGIO PARRA STERLING	17.676.088	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMETSALUD	30837692	$ 162.500	PROTECCION	30837692	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	ARNOL FABIAN BERNAL LUNA	1.118.470.844	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	30837692	$ 162.500	PROTECCION	30837692	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	ERMINSON VARGAS RUIZ	17.616.170	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMETSALUD	30837692	$ 162.500	PORVENIR	30837692	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
6	JAUN PABLO LEON	1.006.549.106	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMETSALUD	30837692	$ 162.500	PORVENIR	30837692	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
7	MANUEL ANTONIO PINEDA VEL	1.118.470.339	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMETSALUD	30837692	$ 162.500	PORVENIR	30837692	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 30/09/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JHON JAIRO GARCI CALDERON
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: No. 25202 - 119996 CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 252237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

Anexo planilla pagada mes de SEPTIEMBRE de 2024

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901648219	6	JACLAS DELICIAS	N	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-810	VEREDA LAS DELICIAS		3102193703		JACLASDELICIASALBANIA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31000985	E	2024-09-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.044.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	31000985	2024-10-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	EDM	RPST	APFT	AFP	ECM	CAJA	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 17614170	VARGAS RUIZ ERMINSON	1.300.000	F	X																0		14	14	14	PROTECCION 236201	606.667	97.100	0		ESSC ASMET SALUD ESSOC	606.667	71.900	COMFACA-CCF13	606.667	24.300	606.667	42.300	0,00960	606.667	12.200	18.300	0	0	01	0			270.100	N	5411001
2	CC 1 49 18089	PARRA STERLING SERGIO	1.300.000	F	X																0		11	11	11	PROTECCION 236201	606.667	97.100	0		ESSC ASMET SALUD ESSOC	606.667	71.900	COMFACA-CCF13	606.667	24.300	606.667	42.300	0,00960	606.667	12.200	18.300	0	0	01	0			270.100	N	5411001
3	CC 17681950	LUNA DIAZ ALIRIO	2.320.000	F	X																0		14	14	14	PORVENIR 236301	1.082.667	173.300	0		ESSC ASMET SALUD ESSOC	1.082.667	161.400	COMFACA-CCF13	1.082.667	45.400	1.082.667	75.400	0,00960	1.082.667	21.700	32.500	0	0	01	0			481.700	N	5411001
4	CC 1006507315	LUNA GUALTERO DANIEL	1.300.000	F	X																0		14	14	14	PORVENIR 236301	606.667	97.100	0		NUEVA EPS NUEVA EPS	606.667	71.900	COMFACA-CCF13	606.667	24.300	606.667	42.300	0,00960	606.667	12.200	18.300	0	0	01	0			270.100	N	5411001
5	CC 1006549106	LEON CRUZ JUAN PABLO	1.300.000	F	X																0		14	14	14	PORVENIR 236301	606.667	97.100	0		ESSC ASMET SALUD ESSOC	606.667	71.900	COMFACA-CCF13	606.667	24.300	606.667	42.300	0,00960	606.667	12.200	18.300	0	0	01	0			270.100	N	5411001
6	CC 1118470838	PINEDA VEGA MANUEL ANTONIO	1.300.000	F	X																0		14	14	14	PORVENIR 236301	606.667	97.100	0		ESSC ASMET SALUD ESSOC	606.667	71.900	COMFACA-CCF13	606.667	24.300	606.667	42.300	0,00960	606.667	12.200	18.300	0	0	01	0			270.100	N	5411001
7	CC 1118470844	BERNAL LUNA ARNOL FABIAN	1.300.000	F	X																0		11	11	11	PROTECCION 236201	476.667	76.200	0		NUEVA EPS NUEVA EPS	476.667	56.600	COMFACA-CCF13	476.667	19.100	476.667	33.200	0,00960	476.667	9.600	14.400	0	0	01	0			212.200	N	5411001

PAGADO

Página 1 2024-09-24

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901616219	6	JACASOFICASAS	D	0	POSITIVA 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-610	VEREDA LAS CHICAS		3107769103		JACASOFICASAS.RAMA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31006985	E	2024-09-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.044.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (FPI)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
7	31006985	2024-10-04	Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.592.669	4.592.669	4.592.669	4.592.669	4.592.669

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	735.100	0	0	0	735.100
PORVENIR	230301	800224808	8	4	464.600	0	0	0	464.600
PROTECCION	230201	800229739	0	3	270.500	0	0	0	270.500
EPS(Administradoras: 3)				7	574.500	0	0	0	574.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	59.600	0	0	0	59.600
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	5	439.000	0	0	0	439.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	75.900	0	0	0	75.900
ARP(Administradoras: 1)				7	320.100	0	0	0	320.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	320.100	0	0	0	320.100
CCF(Administradoras: 1)				7	184.000	0	0	0	184.000
COMFACA	CCF13	891190047	2	7	184.000	0	0	0	184.000
SENA(Administradoras: 1)				7	92.300	0	0	0	92.300
SENA	PASENA	899999034	1	7	92.300	0	0	0	92.300
ICBF(Administradoras: 1)				7	138.400	0	0	0	138.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	138.400	0	0	0	138.400
Gran Total					2.044.400	0	0	0	2.044.400

Página 2 2024-09-24

Anexo certificación JAC vereda delicias

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA LAS DELICIAS
PERSONERIA JURIDICA No. 035 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002
NIT: 901.648.219-6

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, DAIRO GOMEZ CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 17.682.437 de Belén de los Andaquies Caquetá, en mi condición de Representante Legal de LA JAC DE LA VEREDA LAS DELICIAS DE ALBANIA Caquetá, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que **LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA**, con identificación tributaria NIT. 901.648.219-6, durante el periodo comprendido del 01 al 14 del mes de SEPTIEMBRE de 2024, realizo el pago de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior dando cumplimiento a la ejecución del CONVENIO 3674 DE 2023.

Según la planilla de pago No. 31006985 en estado pagada a través del operador ASOPAGOS S.A. CON NOVEDAD DE RETIRO FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Dada en San José del Fragua Caquetá, a los dos (24) días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

Dairo Gomez.C

DAIRO GOMEZ CARDENAS
C.C. No. 17.682.437 de Belén de los Andaquies
REPRESENTANTE LEGAL
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS

Email: jaclasdeliciasalbania@gmail.com
Cel: 3214282252

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato financiero

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3674-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS DELICIAS

MES INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 198.548.773,00	N/A
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.548.773,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BASICO DEL CONVENIO	$ 121.420.671,00	$ 28.481.391,97	**$ 149.902.063**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 121.420.671,03	$ 28.481.392	**$ 149.902.063,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 121.420.671,03	$ 28.481.392	**$ 149.902.063,00**
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	$ -	**$ -**
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 161.634.506,13	$ 37.914.267	**$ 199.548.773,00**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 161.634.506,13	$ 37.914.267	**$ 199.548.773,00**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	$ -	**$ -**
-			**$ -**
VALOR TOTAL			**$ 199.548.773,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

residente de Obra Jhon Jairo Garcia Calderon
Matrícula Profesio 25202-119996 CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N 2522237430CND

Copias: Interventor y Dirección Territorial

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la zona se presentan lluvias leves, pero esto impide el cese de actividades, y por ende no se altera la programación de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3674 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DELICIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																		240
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24																		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
EN EL TRANSCURSO DEL MES SE PRESENTÓ BUEN CLIMA EN LOS PUNTOS DE INTERVENCION

Firma
Nombre: Jhon Jairo Garcia Calderon
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0553973 CND

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se anexan los resultados de laboratorio donde se evidencia los resultados de los concretos de 3000 psi



GI

GEOCON INGENIERIA

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES

GI - RE - CC - 027

ENSAYO A LA COMPRESION DE MUESTRAS DE CONCRETO

INV. E - 406 - 13 INV. E - 410 - 13

FECHA: Agosto 13 de 2024

EMPRESA: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS**

OBRA: CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA DE 150 ML Y UNA ALCANTARILLA DE 36" TIPO INVIAS, EN LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE CAQUETA.

Muestra Nº	Fecha toma	Fecha rotura	Edad días	Lectura dial (Kn)	Resistencia obtenida (psi)	Resistencia esperada (psi)	Resistencia proyectada (psi)	Asenta miento (pulg)	Relacion mezcla volumen	Diametro muestra (cm)	Altura muestra (cm)	Area (cm2)	Peso muestra (Grms)	Volumen (cm3)	Densidad (Grs/cm3)	Tipo de falla	% obtenido	Cumple SI/NO	Observaciones
1	23/06/24	21/07/24	28	385.7	3166	3000	3166	3"		15	30	176.7	12978	5301.5	2.448	2	106	SI	CAJILLA DE ALCANTARILLA
2	03/07/24	31/07/24	28	385.7	3166	3000	3166	3"		15	30	176.7	12978	5301.5	2.448	2	106	SI	PLACA HUELLA MARGEN DERECHA
3	10/07/24	07/08/24	28	388.8	3191	3000	3191	3"		15	30	176.7	12988	5301.5	2.450	2	106	SI	PLACA HUELLA MARGEN IZQUIERDA
4	30/07/24	13/08/24	14	342.8	2813	3000	3264	3"		15	30	176.7	12976	5301.5	2.448	2	94	SI	VIGAS DE CIMENTACION DE PLACA HUELLA

Observaciones:

Elaboró

LUIS ANTONIO AVILEZ

Laboratorista NombreFirma

LUIS ANTONIO AVILEZ
M°. 6.886.705-8

LABORATORIO DE SUELOS GEOCON INGENIERIA GI

Calle 6 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica. Cel: 312-5233649
E-mail: geocomingeniente@hotmail.com
Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se anexan pólizas del convenio.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: JAC VEREDA DELICIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 3674 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 26/12/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO 30/06/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUAL 16/10/2024

VALOR INICIAL: $ 198.548.773,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.548.773,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.499.400,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.499.400,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.909.750,60	5	10	2023	31/12/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	31/12/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.977.438,65	5	10	2023	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.864.631,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100289628

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 15/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100070966 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: NA

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 15/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 Y 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1 Y 2 **SUSPENSIÓN No.:** 1 Y 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.909.750,60	5	10	2023	30/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.977.438,65	5	10	2023	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.864.631,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100289628

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100070966 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SRGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: AUN SE ENCUENTRAN EN ESTADO PENDIENTE EN SECOP

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.10.24 10:33:11 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSIR000000827-D001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
90-100070966	0	71773867	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	24/10/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 01/10/2023	24:00 Horas Del 31/12/2023		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	CL 6 6 05	TELÉFONO	3214282252
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	CL 6 6 05	TELÉFONO	3214282252
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 3674

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023, DEL 03/10/2023 CUYO OBJETO ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	169.709,59
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	169.709,59
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	169.709,59
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	32.394,82
TOTAL A PAGAR	$	207.104,41

CONVENIO DE PAGO: DERECHO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONOCE LA AUTORIZACIÓN DE ESTA PÓLIZA INCORPORADO A [illegible] MANIFIESTA QUE LO ANTERIOR, MEDIANTE DOS COMPROBADO QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y MEDIANTE EXPERIENCIA DE TELEMARKETING CON EL NÚMERO DE TELEMARKETING NACIONAL, GARANTIZA PLENO ALCANCE A LA APROBACIÓN DE ESTA PÓLIZA DE SEGUROS [illegible]

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON POSTERIORIDAD EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA. ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRANDA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.040.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

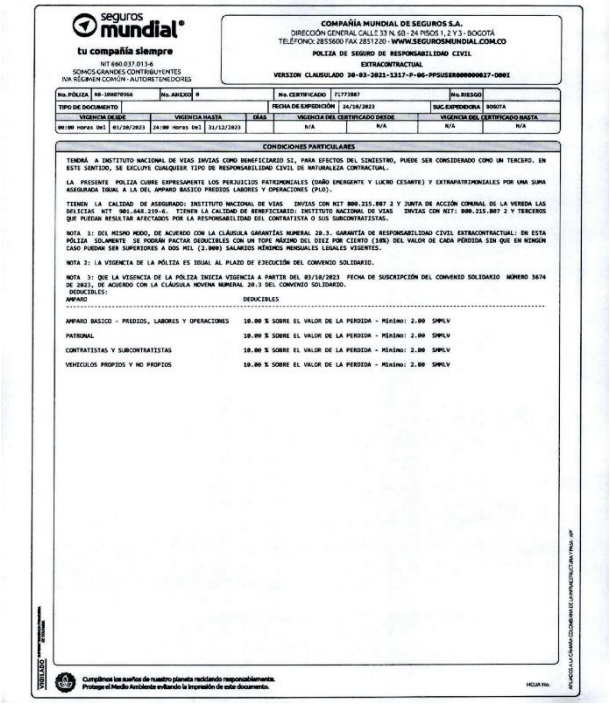

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSIR000000827-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
90-100070966	0	71773867	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	24/10/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 01/10/2023	24:00 Horas Del 31/12/2023		N/A N/A	N/A N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS NIT 901.648.219-6. TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS.

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.


NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

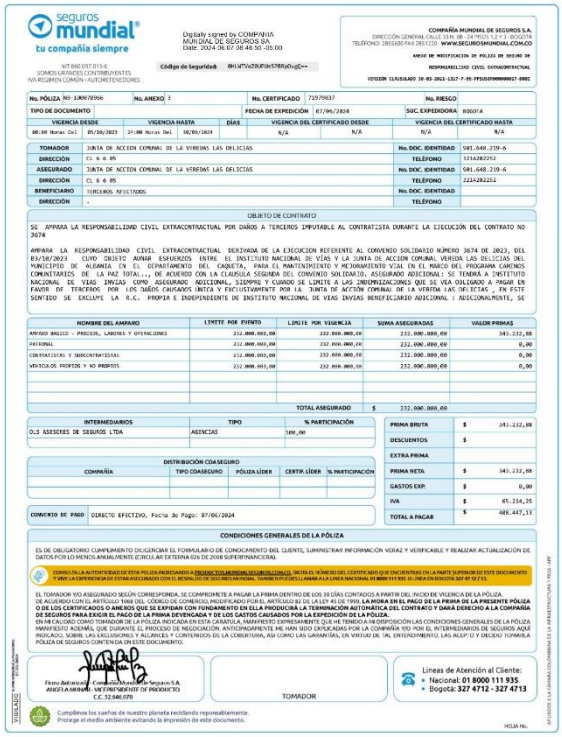

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2024.06.07 08:48:50 -05:00

Código de Seguridad: 8H1xTVxZRUFUbVTRRyOuQC==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2551230 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100070966	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71579037	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 30/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	Cl 6 6 05	TELÉFONO	3214282252
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	Cl 6 6 05	TELÉFONO	3214282252
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 3674

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023, DEL 03/10/2023 CUYO OBJETO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	343.232,88
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$ 343.232,88
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 343.232,88
GASTOS EXP.	$ 0,00
IVA	$ 65.214,25
TOTAL A PAGAR	$ 408.447,13

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROTECTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O...LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS, AQUÉ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA VASQUEZ
VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.540.070


TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.

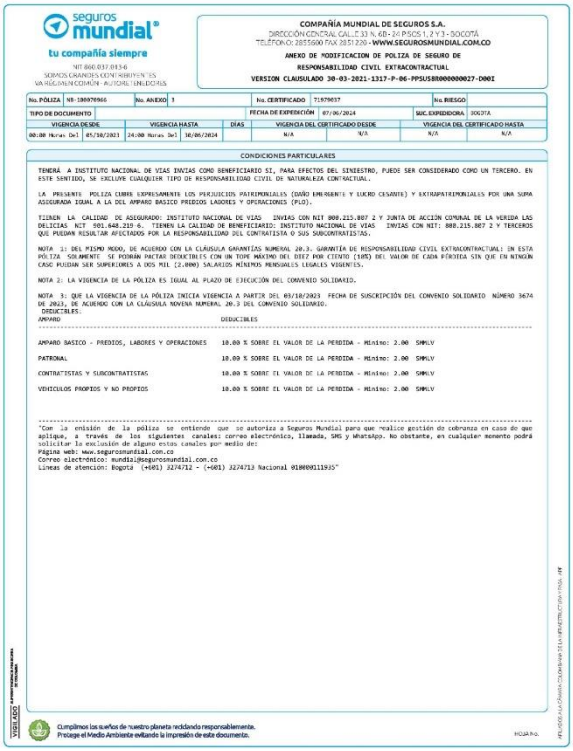

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CAL..E 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2551230 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100070966	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71579037	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 30/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS NIT 901.648.219-6. TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS.

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:


AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 2274712 - (+601) 2274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.

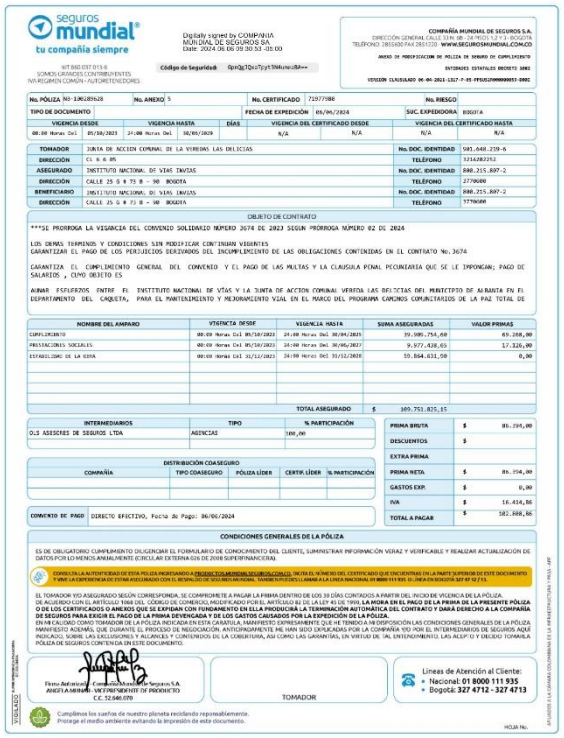

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.06 09:30:53 -05:00

Código de Seguridad: QprQgTQnk7yyt3WkuncuBA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2551220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100189628	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71977988	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 30/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	Cl 6 A 85	TELÉFONO	3214282252
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G A 95 B - 00 BOGOTA	TELÉFONO	2770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G A 95 B - 00 BOGOTA	TELÉFONO	2770600

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGANCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023 SEGUN PRORROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.3674

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 30/04/2025	99.500.754,60	69.288,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 30/06/2027	9.977.428,65	17.326,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	10.864.631,90	0,00
			TOTAL ASEGURADO	$ 109.751.815,15

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OJS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	86.294,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	86.294,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	16.414,86
TOTAL A PAGAR	$	102.888,86

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2018 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROTECTOR.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O...ÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA ARANGO - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.640.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CAL..E 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2551220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100189628	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71977988	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 30/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ACUERDO CON LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

. TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS NIT. 901.648.219-6.

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.

NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.


NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/0/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 202, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.

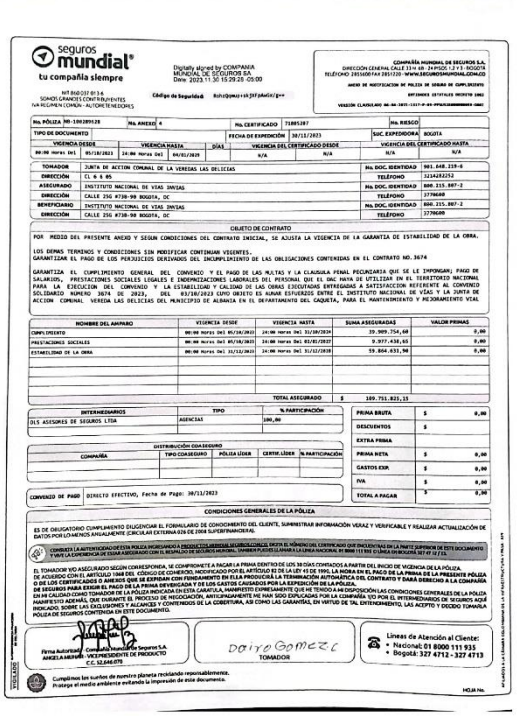

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2023.11.30 15:29:28 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 # 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855000 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 3082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU5280000059-0002

No. PÓLIZA	NB-100209928	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71895207	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/10/2023	24:00 Horas Del	04/01/2029	N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	Cl 6 6 05	TELÉFONO	3214282252
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 26G #738-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	3778600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 26G #738-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	3778600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 3674

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL GNC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3674 DE 2023, DEL 03/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 31/10/2029	39.909.754,60	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 03/01/2027	9.977.438,65	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.864.631,90	0,00
			TOTAL ASEGURADO	$ 109.751.825,15

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COA-SEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$ 0,00
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 0,00
GASTOS EXP.	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 0,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS ASEGURADOS, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERÁS LA CONFIANZA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARLA A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 936 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTE DOCUMENTO, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada: Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA: VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.046.075

Dairo Gomez C
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 936
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

Powered by CamScanner

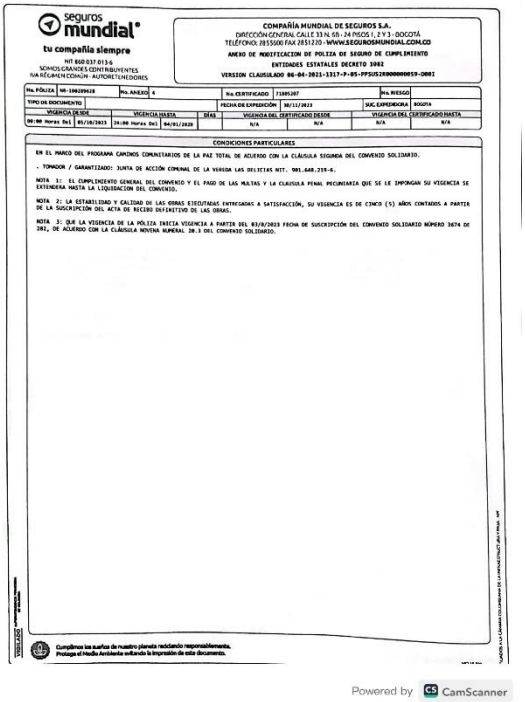

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONOS: 2855500 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 3082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU5280000059-0002

No. PÓLIZA	NB-100209928	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71895207	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/10/2023	24:00 Horas Del	04/01/2029	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

- TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS NIT. 901.648.219-6.

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.

NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/0/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 202, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

Powered by CamScanner

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, sin embargo, junto con la interventoría se adoptarán las siguientes medidas, con el fin de garantizar la calidad y correcta ejecución de las obras suscritas al convenio anteriormente mencionado.

- Se solicitó un estudio de suelos con el fin de saber cuál fue la capacidad portante por medio del CBR
- Se solicitó un estudio de topografía con el fin de localizar y replantear lo niveles de la vía.
- Se solicitó realizar los cilindros de concreto, con el fin de llevarlos al laboratorio y saber cuál es la resistencia a la comprensión.

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL

4.9.1 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Anexo programación de obra y presupuesto

JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS DELICIAS MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

CRONOGRAMA DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (ML)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN	UBICACIÓN: KILOMETRO 2 VIA ALBANIA - CURILLO, 15 KILOMETROS DEL KILOMETRO 2 HASTA LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
CAQUETA	ALBANIA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DELICIAS	150,00	CAQUETÁ	15/05/2024	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	JUNIO DE 2024				JULIO DE 2024					AGOSTO DE 2024			
									DEL 03 AL 09	DEL 10 AL 16	DEL 17 AL 23	DEL 24 AL 30	DEL 01 AL 07	DEL 08 AL 14	DEL 15 AL 21	DEL 22 AL 28	DEL 29 AL 04	DEL 05 AL 11	DEL 12 AL 18	DEL 19 AL 25	DEL 26 AL 01
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																					
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 184.533,00	$ 184.533,00	184.533												
							SUB-TOTAL	$ 184.533,00													
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																					
2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	270,06	$ 33.932,00	$ 9.163.772,00	3.054.591	3.054.591	3.054.591										
3	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	126,23	$ 87.254,00	$ 11.013.636,00		3.671.212	3.671.212	3.671.212									
4	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	85,86	$ 852.218,00	$ 73.174.505,00			6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228
5	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	38,84	$ 329.746,00	$ 12.807.862,00					2.134.644	2.134.644	2.134.644	2.134.644	2.134.644	2.134.644			
6	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.079,86	$ 6.311,00	$ 25.747.979,00			2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725
		1.978,00		Desmonte e instalacion de cercos paralelos a la placa huella	MI	140,00	$ 6.951,09	$ 973.153,00	486.577	486.576,90											
							SUB-TOTAL	$ 132.880.907,00													
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																					
7	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46,50	$ 25.757,00	$ 1.197.701,00	598.851	598.851											
8	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	8,20	$ 66.207,00	$ 542.897,00		542.897											
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50	$ 464.689,06	$ 232.345,00		232.345											
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,60	$ 852.218,42	$ 8.181.297,00			4.090.649	4.090.648									
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578,90	$ 6.311,12	$ 3.653.509,00			1.826.755	1.826.755									
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25,40	$ 47.013,89	$ 1.194.153,00				1.194.153									
14	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00	$ 509.134,38	$ 3.054.806,00				3.054.806									
							SUB-TOTAL	$ 18.056.708,00													
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 151.122.148,00	4.324.551	8.586.472	21.636.159	22.830.527	11.127.597	11.127.597	11.127.597	11.127.597	11.127.597	11.127.597	8.992.953	8.992.953	8.992.953
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) PLAN DE INVERSION SOCIAL	$ 2.200.000,00	3%	6%	14%	15%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.226.624,41													
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 198.548.773													

EL ALCANCE DEL PRESENTE PROYECTO EQUIVALE A 150 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA.

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 25202-119996 CND

Revisó: Firma PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA
Matricula Profesional: 2520256474CND

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 25202- 119996 CND

Revisó: Firma PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula Profesional: 2520256474CND

4.9.2. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Anexo plan de inversión

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 10/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3674 - 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	$ 28.943.000,00	$ 28.943.000,00	$ 28.943.000,00		$ 86.829.000,00	43,73%
2	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00		$ 9.000.000,00	4,53%
3	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 6.000.000,00	3,02%
4	TRANSPORTE	$ 4.307.963,00	$ 4.307.962,00	$ 4.307.962,00		$ 12.923.887,00	6,51%
5	COSTO DE PERSONAL	$ 12.856.420,67	$ 12.856.420,67	$ 12.856.420,67		$ 38.569.262,00	19,43%
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 15.075.541,33	$ 15.075.541,33	$ 15.075.541,33		$ 45.226.624,00	22,78%
N							%
TOTAL						$ 198.548.773,00	100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Dairo Gomez.c
Nombre: **Dairo Garcia Cardenas**
Representante Legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal
C.C 17,682,437

Firma:
Nombre: **Jhon Jairo Garcia Calderon**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **25202-119996 CND**

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Anexo comité operativo

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No:	Dirección Territorial INVIAS: CAQUETA	Fecha: 06-05-2024

Vereda – Municipio - Departamento: VEREDA LAS DELICIAS – ALBANIA CAQUETA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3674-2023
Ejecutor(es): VEREDA LAS DELICIAS – ALBANIA

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JUAN CARLOS SANABRIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FABIO JESÚS MEJIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
DAIRO GARCIA CARDENAS	DELICIAS	PRESIDENTE
ING JHON JAIRO GARCIA	DELCIAS	INGENIERO RESIDENTE
EUCARIS PENNA CEBALLOS	DELICIAS	CONTADOR
OLGA MACIAS FIERRO	DELCIAS	VEEDURIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros participantes del comité operativo.
2. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
3. Análisis de cotizaciones presentadas
4. Elección de proveedores.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Análisis de precios .
2- Elección de proveedores.
3- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
4- Elección de uniformes.
5- Proposiciones y Varios

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los cuatro (4) miembros principales, el presidente, el ingeniero residente, contador y un representante de la veeduría.
2.	Presentación de cotizaciones: MATERIALES EPP: En consigna quedo que los uniformes y el botiquín se compraran a AMAZONIAN ZAFETY y el restante de la dotación con la empresa EXTINTORES Y DOTACIONES CAQUETA. **AMAZONIAN SAFETY** NIT: XXXX PRESUPUESTO **EXTINTORES Y DOTACIONES CAQUETA**
3.	Se determinó elaborar la topografía con el señor LUIS ALBERTO NAVARRO DIAZ, el cual oforto su servicios por valor de $ 900.000 **COTIZACION TOPOGRAFICA**

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

4.	Se determinó seleccionar la empresa GEOCON INGENIERIA para la elaboración de laboratorios.  GEOCON INGENIERIA COTIZACION ESTUDIO DE SUELOS PARA UNA VIVIENDA DE 2 PISOS APIQUES DESCRIPCION / UNIDAD / CANTIDAD / VR. UNIT / VR. TOTAL APIQUES UND 2 $ 450.000 $ 900.000 MUESTREO Y TRANSPORTE MATERIAL DE SUELOS UND 1 $ 500.000 $ 500.000 IVA 19% $ 228.400 TRANSPORTE Y MOVILIZACION EQUIPOS DE SUELOS GLOBAL 1 $ 300.000 $ 300.000 TOTAL $ 1.928.400 Son: Un millon novecientos veinte y nueve mil cuatrocientos pesos. NOTA 1: Forma de pago: 50% para iniciar labores, el saldo con la entrega de los resultados. NOTA 2: Tiempo para la entrega de los informe 10 días hábiles.
5.	Se aprobó adquirir la madera a la empresa MADERAS Y MACHIMBRES de San José del Fragua, quienes cuentan con la certificación y salvoconducto respectivo.  MADERAS Y MACHIMBRES LA Y CLARET FERNANDA POLANCO COLLAZOS NIT. 1053.816.373-1 No RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LA VIA PRINCIPAL SAN JOSE DEL FRAGUA, CAQUETÁ FACTURA DE VENTA N° 255 Día 24 Mes 4 Año 2024 Señor(a) Fragua NIT

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

6.	Se Realizó la consulta con la ferretería de la ciudad de Florencia FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S y el precio incluye transporte hasta el sitio de la obra. Por lo tanto, se toma la decisión de adquirir los materiales a FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S.  FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S N.I.T 901429462-0 FERRE CERÁMICAS Dirección: Carrera 16 N 15 48 Barrio Centro Teléfonos: 3114693948 Florencia-Caquetá Venta de materiales obra negra blanca (Comer los Argos, Sika, Termium, Corona, Multicentro) Cliente: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS NIT: 901548219 5 Dirección: CL 6 6 65 ALBANIA CAQUETA Teléfonos: 3214282252 COTIZACIÓN 00003539 Fecha Doc: 7 Mayo 2024 Vendedor: FABIAN MURCIA CRUZ Fecha de vencimiento: 07 May 2024 Cant / Descripcion de Producto / Referencia / Red / Vlr Unidad / Subtotal / Iva / Valor Iva / Valor Total 10.00 A_ANGEL NILGHO X KG (ANG17) ANG17 5.PC 6,498 227,430 19 43,182 270,598 912.00 CEMENTO GRIS X 50 KG ALCON UC (0015) 0015 5.PC 24,999 23,011,142 19 4,543,117 28,444,259 600.00 VARILLA CORRUGADA 1/2" X 6 MTS (4 KG) (0017) 0017 5.PC 15,499 9,124,560 19 1,936,126 11,344,726 260.00 VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6 MTS (1 KG) 1053 5.PC 10,399 2,192,305 19 432,605 12,509,909 20.00 PUNTILLA CON CABEZA 3" X 4 LBS GR PUMA (0019002068043) 0019002068043 1.PRINCIPAL 4,000 68,025 19 13,905 99,930
7.	En el proceso de cotización de materiales pétreos se recaudó dos cotizaciones: playa la raya del municipio de Albania y la trituradora de Morelia, se tomo la decisión de comprar el material a la playa la raya debido a que está ubicada en el Municipio de Albania y el trayecto de transporte es menor.

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	 MAEXCA S.A.S Materiales y Excavaciones del Caquetá Explotación – Excavación – Transporte Florencia 24 de abril de 2024 Señores JUNTAS DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS Ref: COTIZACION DE MATERIALES PETREO. Cordial saludo Comedidamente nos permitimos rupedir cotización de materiales dirigido para la vereda las delicias del municipio de Albania Caquetá LA GRAVILLA $ 70.000CL METRO MAS IVA LA ARENA $60.000 METRO MAS IVA PIEDRA $60.000 METRO MÁS IVA Atentamente, YESSICA PAOLA POLANCO Administradora
8.	De las cotizaciones presentadas para el alquiler de maquinaria se escogió la que tenia los precios mas favorables para la junta.  COTIZACION SAN JOSE DEL FRAGUA, 24 DE ABRIL DE 2024 SEÑORES JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS NIT: 901548219-5 ALBANIA CAQUETA CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VARGAS NIT: 1.125.2677-4 ITEM / TIEMPO / DESCRIPCION / UNIDAD / CANTIDAD / VR UNITARIO / VR TOTAL 1 / 1,00 MES / RANA COMPACTADORA 10 HP, GASOL / UNO / 1 / $ 5.600.000 / $ 5.600.000 2 / 1,00 MES / MEZCLADORA EN CONCRETO DE 1,5 PIE / UNO / 1 / $ 1.000.000 / $ 1.000.000 4 / 1,00 MES / PIN TROBOLAMPORA CALIBRITA / UNO / 1 / $ 260.000 / $ 260.000 5 / 1,00 MES / VIBRO DE CONCRETO / UNO / 1 / $ 500.000 / $ 500.000 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VARGAS CC 1.125.2677 de Florencia
9.	Cotización de exámenes pre-ocupacionales se recibieron dos cotizaciones: CLIP SALUD Y LA DOCTORA MARTHA LUZ ALTAMAR , después de realizada el análisis de precios, se toma la decisión de realizarlos

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PRECIOS 2024_Juntas de acción comunal

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	VALOR UNITARIO
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular de ingreso Egreso, Periódicos- (realizados en jornada de salud, en las instalaciones de la empresa)	$ 50.000
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular de ingreso Egreso, Periódicos-(TELEMEDICINA)	$ 40.000
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular (Ingreso, periódicos, egresos) Realizados en Florencia	$ 25.000

Martha Luz Altamar de los Reyes
Médico especialista SST. Lic. 0245

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se analizaron cada una de las cotizaciones y se tomó la decisión de elegir los proveedores que realizaran los suministros de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos			
1.	Informe Técnico de Avance:	SI ____	NO __X__	No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera:	SI ____	NO ___X_	No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO __X__	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI ____	NO _X___	No. Folios: _____

6

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
REMITIR LAS ACTAS DEL COMITÉ OPERATIVO	CONTADOR / INGENIERO	10-05-2024
ELABORAR EL PLAN DE INVERSION	CONTADOR / INGENIERO	10-05-2024
PRESENTAR LOS CONTRATOS DE LOS PROFESIONALES	CONTADOR	10-05-2024
ENVIAR EXAMENES LABORALES DE INGRESO.	CONTADOR	10-05-2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N/A		

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Cargo: Director de interventoría

Dairo Gomez.c
Nombre: DAIRO GOMEZ C.
Cargo: Presidente OAC

Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Cargo: Residente de interventoría

NO SABE FIRMAR

Nombre: OLGA LUCIAS FIERRO

Cargo: veedora ciudadana

7

4.9.4. ACTAS DE REUNIÓN

Anexo acta de socialización



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP-MNV-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30 DE ABRIL DEL 2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNION No. 1 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DELICIAS — DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 3674 del 2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS. ALBANIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 4647 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS RL LEIDY MABEL PEREZ

OBJETIVOS DE LA REUNION
SOCIALIZACION DEL CONVENIO Y PRESENTACION DE LA INTERVENTORIA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
PRESENTACION DEL PERSONAL TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
INDICACIONES TECNICAS
INQUIETUDES
COMPROMISOS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1 SIENDO LAS 12: 00 AM SE DA INICIO A LA REUNION DE SOCIALIZACION, PRESENTACION DE DEL INTERVENTOR RESIDENTE FABIO MEJIA DE PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS Y LA DE LEYDI KARINA RODRIGUEZ DEL PCCDT- INVIAS INICIA EXPLICANDO EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL SE DA CLARIDAD DEL EQUIPO QUE ACOMPAÑARA EL PROCESO EN LA DIRECCION TERRITORIAL- CAQUETÁ. ESTO CON EL FIN DE QUE NO FACILITEN INFORMACIÓN A TERCERAS PERSONAS AJENAS AL PROGRASA QUE TENGA UNAS INTENCIONES CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL.
2. SE SOCIALIZA LA LEY 850 DE VEEDURIAS Y SE AVISA A LA COMUNIDAD DE CONFORMAR EL COMITÉ DE VEEDURIAS CON EL FIN DE QUE ACOMPAÑEN, VIGILEN LA EJECUCION DE ESTAS OBRAS DE MENOR DIMENAJE (PLACA HUELLAS- ALCANTARILLAS)
3 LA SUPERVISORA ING CAROLINA BERMEO EXPONE LA PARTE TECNICA DEL CONVENIO.
CONTRATOS Y ACTUACIÓN DEL PERSONAL
MIS TROS LINEALES A INTERVENIR Y SOLICITAN BALACE ACTUALIZADO CON PRECIOS DEL AÑO 2024
ACTUALIZACION DE POLIZAS — ENTRE
OTRAS ESPECIFICACIONES — 4. INCIA R. ING
FABIO MEJIA RESIDENTE DE INTERVENTORIA EL CUAL MANIFIESTA A LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL TODA SU DISPOSICION PARA APOYARLAS Y ORIENTARLES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS — 5 POR OTRA PARTE
LA PROFESIONAL SOCIAL DE INVIAS KARINA RODRIGUEZ RECUERDA A LA COMUNIDAD QUE SE VAN A CONTAR CON UNOS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, COMO LO SERIAN R. BUZON DE SUGERENCIAS, LA VIRTUALIDAD Y UN CORREO ELECTRONICO PARA LAS PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS. A CONTINUACIÓN SE LEVANTA EL ACTA DE CONFORMACION DE VEEDURIAS Y SE ENCARGA A LA PRESIDENTA DE RADICAR EL ACTA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DONDE TENGA JURISDICCIÓN LA VEREDA, ANEXA LAS CEDULAS DE CIUDADANIA DE LAS 3 PERSONAS QUE ESCOGIO LA COMNIDAD PARA ESTA LABOR. — 6. POR ULTIMO SE COMPARTE UN REFRIGERIO QUE ENVIA LA TERRITORIAL INVIAS Y SE ATIENDEN, SE RESUELVEN DUDAS QUE TENGA LA COMUNIDAD .

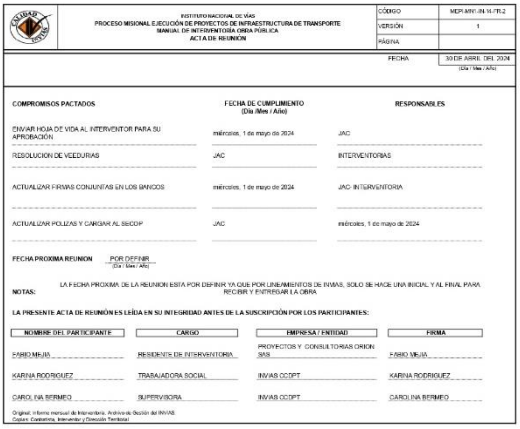

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP-MNV-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30 DE ABRIL DEL 2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENVIAR HOJA DE VIDA AL INTERVENTOR PARA SU APROBACIÓN	miércoles, 1 de mayo de 2024	JAC
RESOLUCION DE VEEDURIAS	JAC	INTERVENTORIAS
ACTUALIZAR FIRMAS CONJUNTAS EN LOS BANCOS	miércoles, 1 de mayo de 2024	JAC- INTERVENTORIA
ACTUALIZAR POLIZAS Y CARGAR AL SECOP	JAC	miércoles, 1 de mayo de 2024

FECHA PROXIMA REUNION: POR DEFINIR (Día / Mes / Año)


NOTAS: LA FECHA PROXIMA DE LA REUNION ESTA POR DEFINIR YA QUE POR LINEAMIENTOS DE INVIAS, SOLO SE HACE UNA INICIAL Y AL FINAL PARA RECIBIR Y ENTREGAR LA OBRA

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
FABIO MEJIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	FABIO MEJIA
KARINA RODRIGUEZ	TRABAJADORA SOCIAL	INVIAS CCDPT	KARINA RODRIGUEZ
CAROLINA BERMEO	SUPERVISORA	INVIAS CCDPT	CAROLINA BERMEO

Original: informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Listado de asistencia

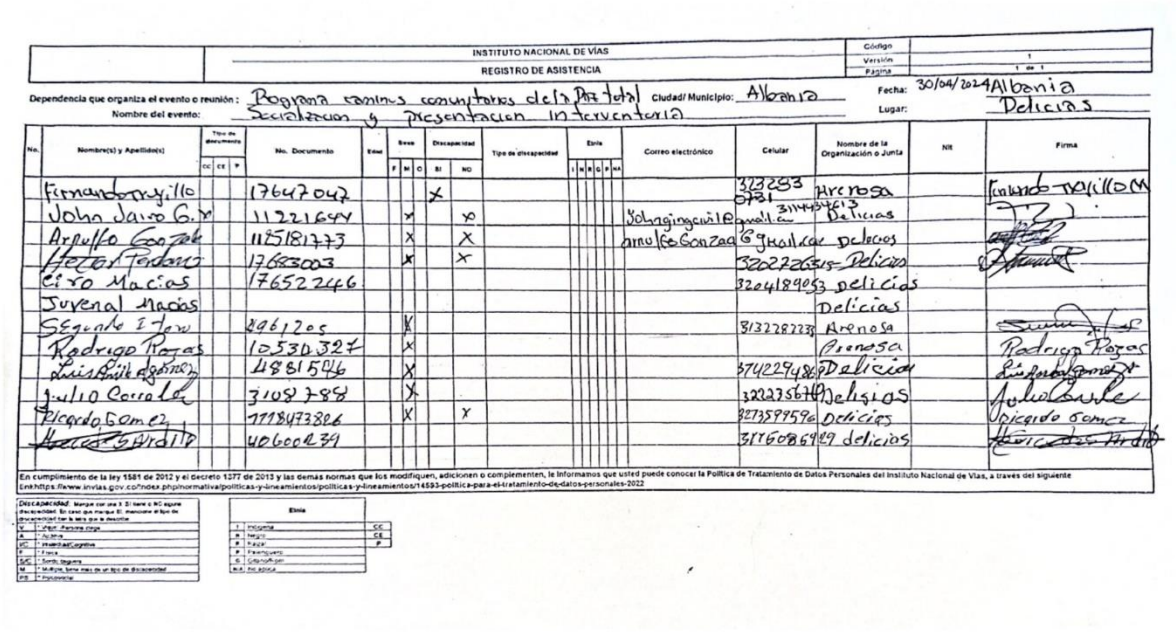

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
REGISTRO DE ASISTENCIA

Dependencia que organiza el evento o reunión: Programa caminos comunitarios de la Paz total
Nombre del evento: Socialización y presentación interventoría
Ciudad/ Municipio: Albania
Fecha: 30/04/2024
Lugar: Albania Delicias

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento	No. Documento	Edad	Sexo	Discapacidad	Tipo de discapacidad	Etnia	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	NIt	Firma
	Fernando Trujillo		17647042			X				3232293	Arenosa		
	John Jairo G.		11221644		X		X		Johngingeniero	3114857613	Delicias		
	Arnulfo Gonzalez		11518177 3		X		X		arnulfoGonzaq	Gmail.com	Delicias		
	Hector Tenorio		17683003		X		X			3202226515	Delicias		
	Ciro Macias		17652246							3204189053	Delicias		
	Juvenal Macias										Delicias		
	Segundo Tafur		896120 5		X					3132287238	Arenosa		
	Rodrigo Rojas		10530327		X						Arenosa		
	Luis Avila Gomez		4881546		X					3142294869	Delicias		
	Julio Corrales		3108788		X					3202356449	Delicios		
	Ricardo Gomez		1118473896		X		X			3273589596	Delicios		
	Hector Giraldo		40660239							3176086949	delicios		

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente Link https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X Si tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad tal y como se describe
V: Visual
A: Auditiva
PC: Mental/Cognitiva
F: Física
SC: Sordo, Sigueira
M: Más de una, Tiene más de un tipo de discapacidad
PD: Psicosocial

Etnia
1: Indígena — CC
2: Negro — CE
3: Raizal — P
4: Palenquero
5: Gitano/Rom
6.1: No aplica

Powered by CamScanner

5. **INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA *No. 4647 de 2023*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	*4647 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS*
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*

CONTRATISTA	*PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS*
VALOR TOTAL	*$ 109.303.594*
VALOR ACUMULADO	*$ 109.303.594*
PLAZO INICIAL	*6 MESES*
PLAZO PRORROGA No. 1	6 MESES
PLAZO ACUMULADO	9 MESES Y 16 DIAS
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	9 MESES Y 16 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1	*30 DE ABIL DE 2024*
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2	*30 DE JUNIO DE 2024*
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3	*30 DE SEPTIEMBRE 2024*

*Tabla **2**. Información general contrato 4647 de 2023*

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

- Durante este periodo la interventoría realizo visitas a campo y realizo seguimiento desde la oficina central.

El porcentaje de avance físico y financiero de interventoría es de 100% correspondiente a $99.434.531

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato relación de vehículos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-5 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31/AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023, 3714 de 2023, 4440 de 2023, 3674 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS-FLORIDA-DELCIAS-ASOJUNTAS ALBANIA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	MOTOCICLETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

NUMERO DE PLACA:FIF85G MARCA: BENELLI CILINDRAJE 500CC MODELO:2023

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: LOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INTERVENTORIA SE LES REALIZARÁ MANTENIENTO PREVENTIVO TODO LOS 5 DE CADA MES QUE ESTE EN EJECUCION DEL PROYECTO

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Firma
Nombre: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa el personal que labora para PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
Se anexa planilla pagada mes de septiembre de 2024
Se anexa certificación pago de seguridad social

ORION
901503188-3

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
CRA 83 B # 15-98 CALI E-mail mabelchud@yahoo.com

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

CERTIFICA

Que para la ejecución del contrato de interventoría 4647 de 2023 firmado entre el I**NVIAS**, y **PROYECTO Y CONSULTORIAS ORION SAS** se realizaron los respectivos pagos de seguridad social (**SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA**) durante el periodo de SEPTIEMBRE de 2024, estando a paz y salvo en este periodo.

Para constancia de lo anterior se firma en Cali, Valle del Cauca a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE del 2024

Mabel Perez

Razón Social: **PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.**
Representante legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
C.C 31.577.305 DE CALI
Dirección: CRA 83 B # 15-98 CALI
Teléfono: 3224097491
E-mail mabelchud@yahoo.com
Ciudad: CALI

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

MES INFORME MENSUAL: ago-24 — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIOS: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1315123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00
				TOTAL		$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 109.303.594,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	abr-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2023	$ 109.303.594,00	$ 98.803.594,00		
2	may-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2024	$ 109.303.594,00	$ 88.303.594,00		
3	jun-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2025	$ 109.303.594,00	$ 77.803.594,00		
4	jul-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2026	$ 109.303.594,00	$ 67.303.594,00		
5	ago-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2027	$ 109.303.594,00	$ 56.803.594,00		
6	sep-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00					$ 109.303.594,00	$ 46.303.594,00		
TOTALES		$ 51.030.000,00	$ 11.970.000,00	$ 63.000.000,00	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 51.030.000,00	$ -	$ 51.030.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -	$ -	$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -	$ 11.970.000,00	$ 11.970.000,00
VALOR TOTAL	$ 51.030.000,00	$ 11.970.000,00	**$ 63.000.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. :

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato de garantías

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 1: 30/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 2: 16/10/2024

VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND


Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexos pólizas

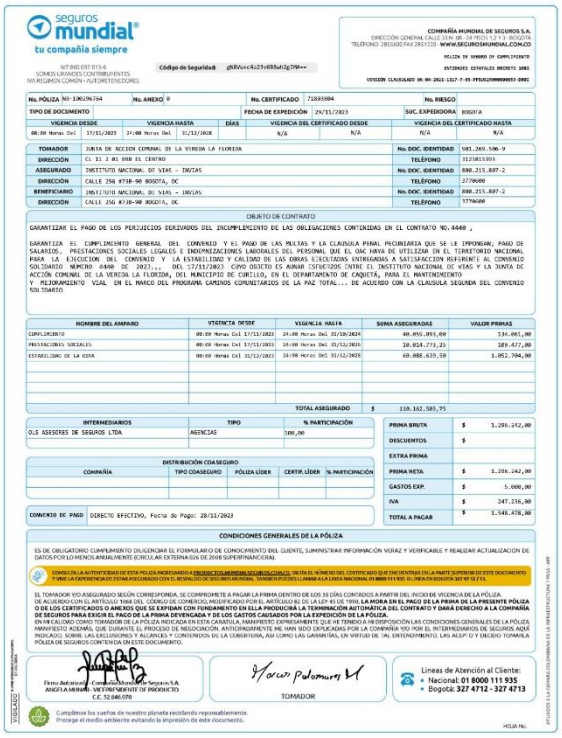

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 72 N. 6B - 30 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855500 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU520000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100196764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815303
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770000

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4440 ,

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023,,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.050.053,00	134.063,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2025	10.814.771,25	189.477,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.888.839,50	1.052.704,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.102.585,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO					
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACION	

PRIMA BRUTA	$	1.286.242,00	
DESCUENTOS	$		
EXTRA PRIMA			
PRIMA NETA	$	1.286.242,00	
GASTOS EXP.	$	5.000,00	
IVA	$	247.236,00	
TOTAL A PAGAR	$	1.548.478,00	

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCONTRARÁS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERIFICA LA VIGENCIA DE ESTAS ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 Y 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE LAS CUALES EL ENTENDIMIENTO LAS ALCEP Y Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.660.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 72 N. 6B - 30 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855500 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU520000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100196764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


. TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.

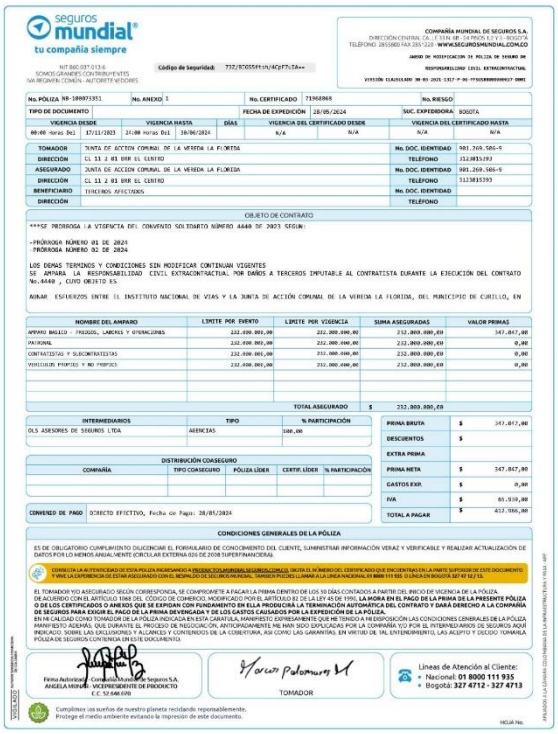

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 737/8C055Ft:n/4CpF7:EA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2859600 FAX 2857220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123835393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123835393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRÓRROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.847,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$ 347.847,00
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 347.847,00
GASTOS EXP.	$ 0,00
IVA	$ 65.939,00
TOTAL A PAGAR	$ 412.986,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VINCULA LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. También puedes llamarnos a la línea nacional 01 8000 111 935. Línea en Bogotá 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENDIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA HIGUERA- VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.020

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2859600 FAX 2857220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO); TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. , TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.1. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN FACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

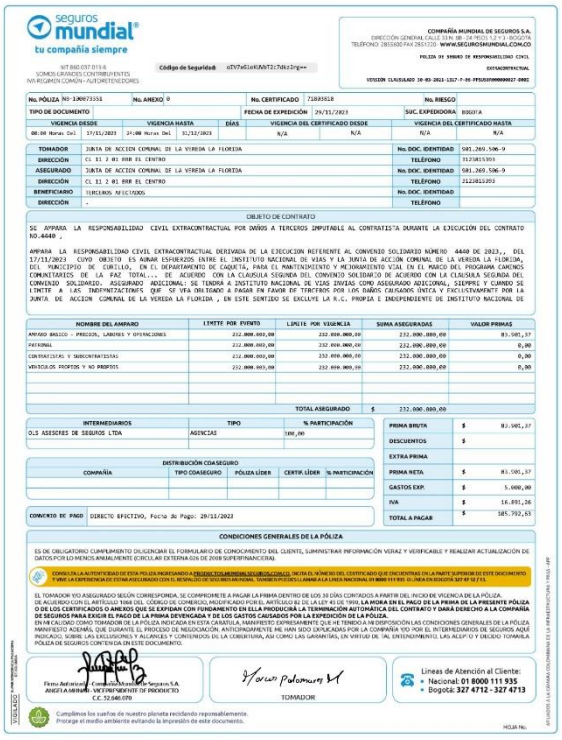

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855500 FAX 2857220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU5R0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893818		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023		SUC. EXPEDIDORA	30070
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A


CONDICIONES PARTICULARES

VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES : (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. , TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN FACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4460 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

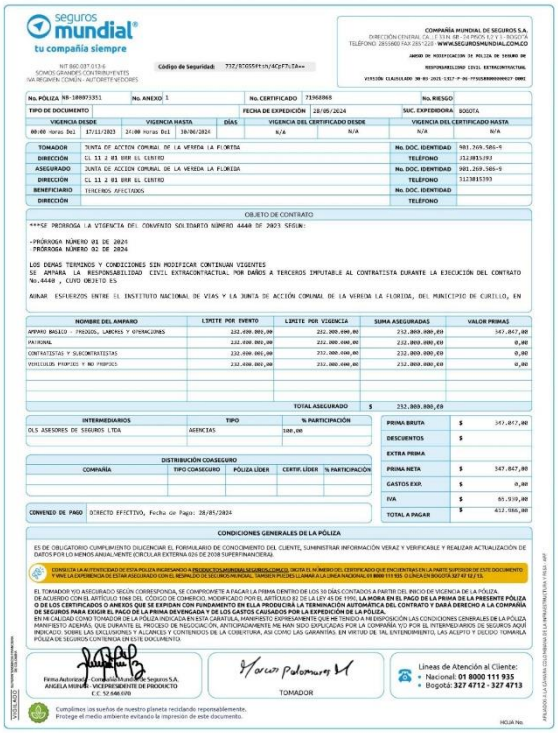

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2831220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
98-100073351	1	71960868	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	28/05/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 30/05/2024		N/A N/A	N/A N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9 , TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. _ - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Anexo formato plan de cargas

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ No. 7 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

PLAZO INICIAL: 0,6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2023 (Indique día/mes/año)
PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 16 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 19/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 109.303.594,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 109.303.594,00

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 3230 DE 15/09/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA: Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costos de Personal	Prima Regional	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.__ de fecha _____: Participación (h-mes)	Valor Total ($)	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	MES H-M	MES VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																
	1	Director de Interventoria	$ 5.000.000		0,60	$ 2.500.000											0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000					1,60	$ 7.500.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.000.000		4,00	$ 16.000.000											1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	0,37	$ 1.475.594					4,4	$ 18.475.594
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000																	0,20	$ 560.000							0,40	$ 1.120.000
	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000													0,40	$ 1.120.000									0,20	$ 560.000	0,60	$ 1.680.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00																										$ 3.000.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000																													
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000																													
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000																													
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 5.000.000																													
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.000.000																													
	1	Inspector	$ 1.200.000		8,00	$ 9.600.000																									1,0	$ 1.200.000
	1	Inspector SST	$ 1.200.000		0,48	$ 576.000																									0,48	$ 576.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 33.916.000,00										$ -		$ 5.250.000		$ 6.370.000		$ 8.088.000		$ 5.850.000		$ 3.325.593		$ 4.698.000		$ 34.581.593
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36										0,00		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 80.041.760										$ -		$ 12.390.000,0		$ 15.033.200,0		$ 14.391.280,0		$ 13.806.000,0		$ 7.848.399,7		$ 10.992.880,0		$ 81.541.760

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	MES H-M	MES VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
	1	Matricula Director y/o Especialistas	$ 110.000	Dia	4,00	$ 440.000																									4,00	$ 440.000
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 300.000	Mes	13,00	$ 3.900.000													1,00	$ 300.000,0	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000,0	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000			8,00	$ 2.400.000
	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.800.000	Según composicion por mes	2,00	$ 5.600.000																							2	$ 5.600.000	2,00	$ 5.600.000
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Según composicion por mes	4,00	$ 1.200.000																							4	$ 1.200.000	4,00	$ 1.200.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ -	Según composicion por mes	$ -	$ -																									0,00	$ -
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 175.000,00	Según composicion por mes	2,00	$ 350.000																									2,00	$ 350.000
	1	Copias de informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias, videos, etc	$ 80.000,00	Según composicion por mes	$ -	$ -																									0,00	$ -
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 80.000,00	Según composicion por mes	4,00	$ 320.000																									4,00	$ 320.000
	1	Vreeduria Tecnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según composicion por mes	$ -	$ -																									0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 11.810.000,00										$ -		$ 300.000		$ 300.000		$ 600.000		$ 985.000		$ 1.045.000				$ 10.310.000
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+ (B) + (C) + (D)				$ 91.851.760,00										$ -		$ 12.690.000		$ 15.333.200		$ 14.991.280		$ 14.771.000		$ 8.893.400		$ 10.992.880		$ 91.851.760
	*	IVA = 19% * (D) + (E)				$ 17.451.834,00										$ -		$ 2.411.100		$ 2.913.308		$ 2.848.343		$ 2.806.490		$ 1.689.746		$ 2.088.647		$ 17.451.834
	*	COSTO TOTAL = (D) + (E)				$ 109.303.594										$ -		$ 15.101.100		$ 18.246.508		$ 17.839.623		$ 17.577.490		$ 10.583.146		$ 13.081.527		$ 109.303.594

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS																																

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones, se consideraría necesario prorrogar el contrato de interventoría No. 4647 de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 para Continuar seguimiento a los convenios que le corresponden. A la fecha se están realizando las actividades preliminares para la ejecución de las obras; sin embargo, para continuar la ejecución de las actividades para la construcción de obras sin afectar el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas. surge la necesidad de prorrogar el contrato de interventoría. Como consecuencia de lo anterior, esta interventoría solicita realizar prorroga al contrato 4647 de 2023, toda vez que se requiere realizar apoyo en campo con las comunidades como desarrollo de la etapa preliminar y de ejecución de las obras lo que implica el tiempo necesario y de esa manera garantizar el seguimiento y control a los correspondientes convenios.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: LEIYD MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:
NOMBRE: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La vereda delicias, terminó obra el 14 de septiembre de 2024

8. ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

A la fecha no se ha remitido correspondencia

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

	
Placa huella al 100% A= 5M	**Placa huella al 100% A= 5M**
	
Placa huella al 100% A= 5M	**Placa huella al 100% A= 5M**


8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS


Anexo fotos de la socialización

	
SOCIALIZACION VEREDA DELICIAS, 29-04-2024	**SOCIALIZACION VEREDA DELICIAS, 29-04-2024**

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Anexo bitácora del mes de septiembre

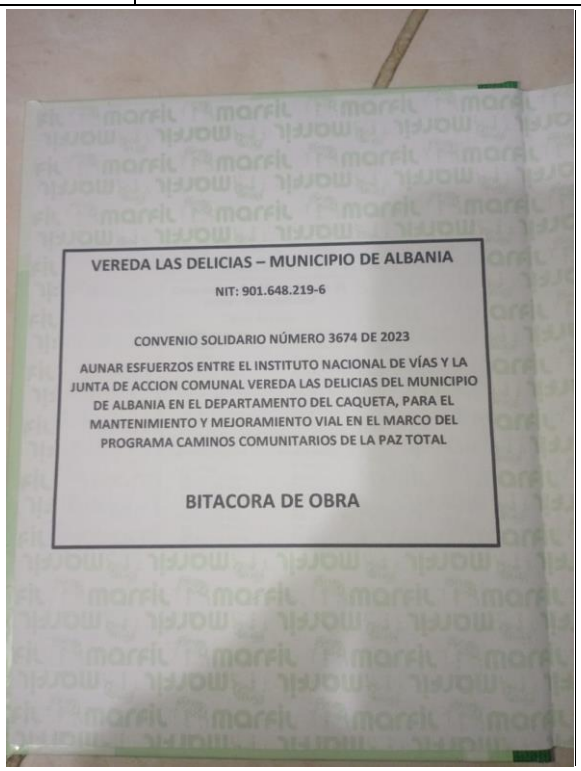


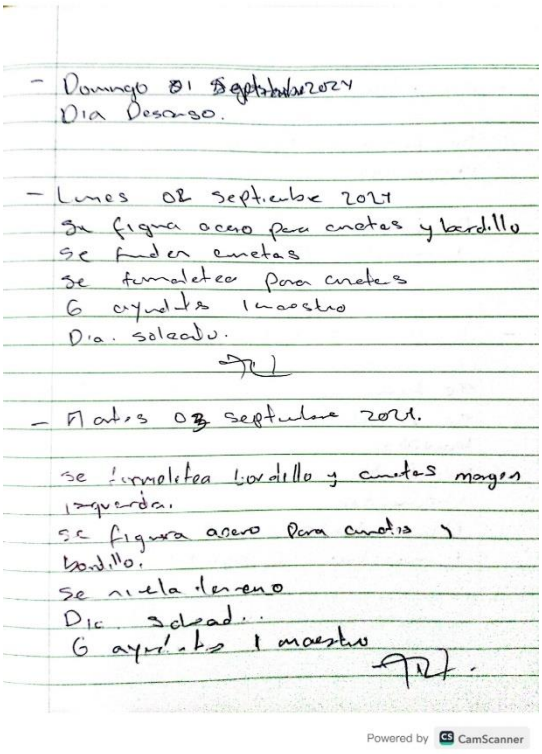
- Domingo 01 Septiembre 2024
Dia Descanso.

- Lunes 02 Septiembre 2024
Se figura acero para cunetas y bordillo
Se funden cunetas
Se formaleteo para cunetas
6 ayudas 1 maestro
Dia. soleado.

- Martes 03 Septiembre 2024.
Se formaleteo bordillo y cunetas margen izquierda.
Se figura acero para cunetas y bordillo.
Se nivela terreno
Dia soleado.
6 ayudas 1 maestro

Powered by CamScanner

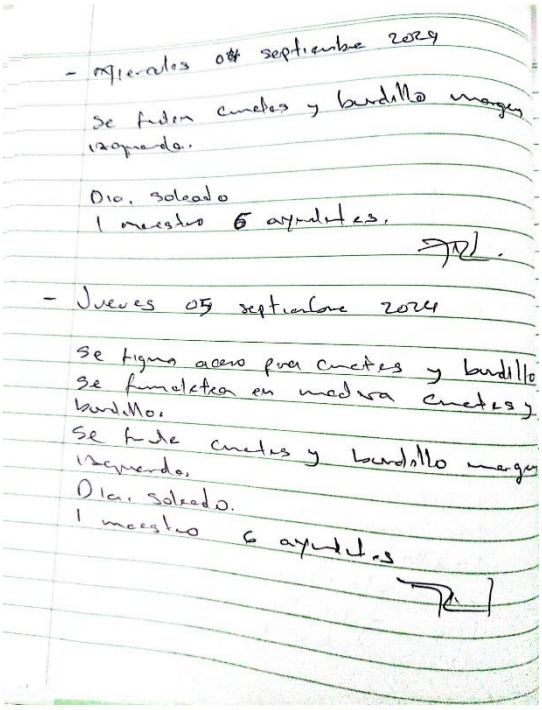

- Miercoles 04 septiembre 2024


Se fiden cuetes y bordillo mayor izquierdo.

Dia. Soleado
1 maestro 6 ayudantes.

- Jueves 05 septiembre 2024

Se figura acero para cuetes y bordillo
Se fundieron en madera cuetes y bordillo.
Se fundio cuetes y bordillo mayor izquierdo.
Dia. Soleado.
1 maestro 6 ayudantes

Powered by CamScanner

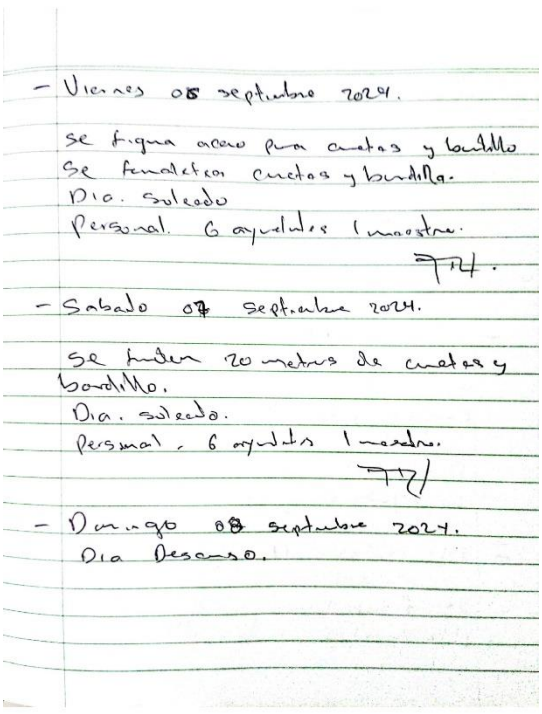

- Viernes 06 septiembre 2024.


Se figura acero para cuetes y bordillo
Se fundieron cuetes y bordilla.
Dia. Soleado
Personal. 6 ayudantes 1 maestro.

- Sabado 07 septiembre 2024.

Se fundieron 20 metros de cuetes y bordillo.
Dia. soleado.
Personal. 6 ayudantes 1 maestro.

- Domingo 08 septiembre 2024.
Dia Descanso.

Powered by CamScanner

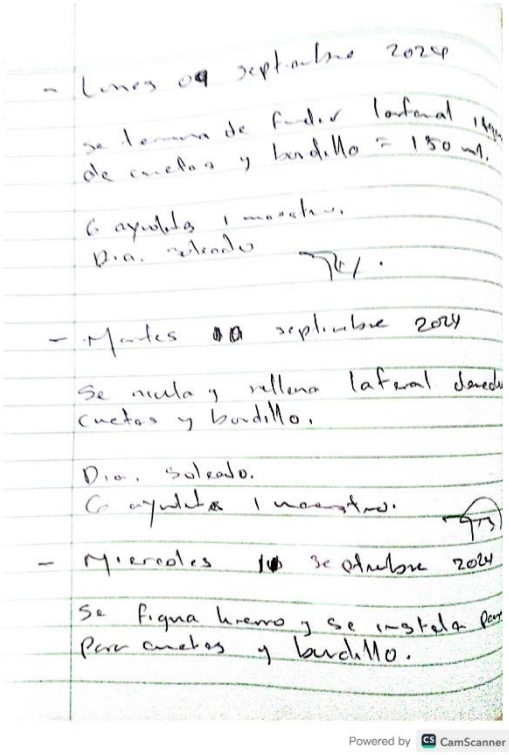
- Lunes 09 septiembre 2024

Se termina de fundir lateral 1 de cuetas y bordillo = 150 ml.

6 ayudas 1 maestro.
Dia. soleado

- Martes 10 septiembre 2024


Se resana y rellena lateral donde cuetas y bordillo.

Dia. soleado.
6 ayudas 1 maestro.

- Miercoles 11 de septiembre 2024

Se figura hierro y se instala para cuetas y bordillo.

Powered by CamScanner

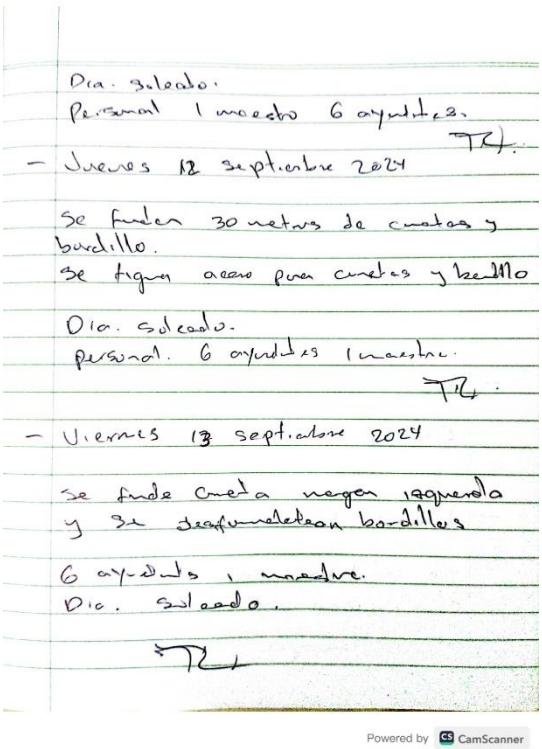
Dia. soleado.
Personal 1 maestro 6 ayudantes.

- Jueves 12 septiembre 2024

Se funden 30 metros de cuetas y bordillo.
Se figura acero para cuetas y bordillo


Dia. soleado.
personal. 6 ayudantes 1 maestro.


- Viernes 13 septiembre 2024

Se funde cueta negra izquierda y se desformaletean bordillos

6 ayudas 1 maestro.
Dia. soleado.

Powered by CamScanner

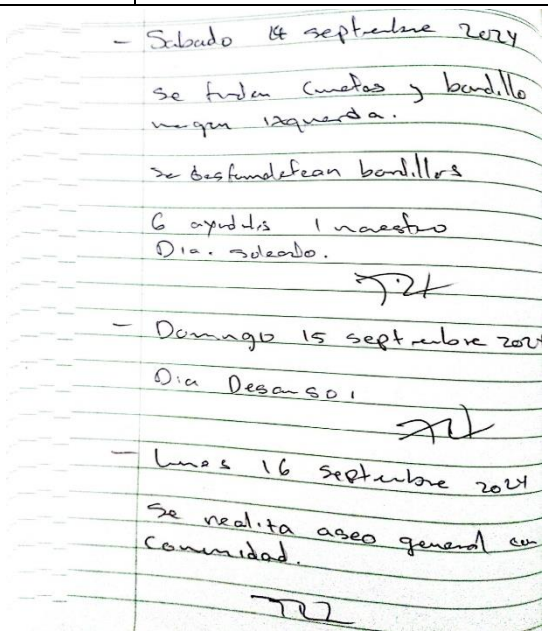
- Sabado 14 septiembre 2024
se fueron cuentos y bandillo negro izquierda.
se desfundefean banderillos
6 ayudas 1 maestro
Dia. sabado.
- Domingo 15 septiembre 2024
Dia Descanso.
- Lunes 16 septiembre 2024
Se realiza aseo general con comunidad.

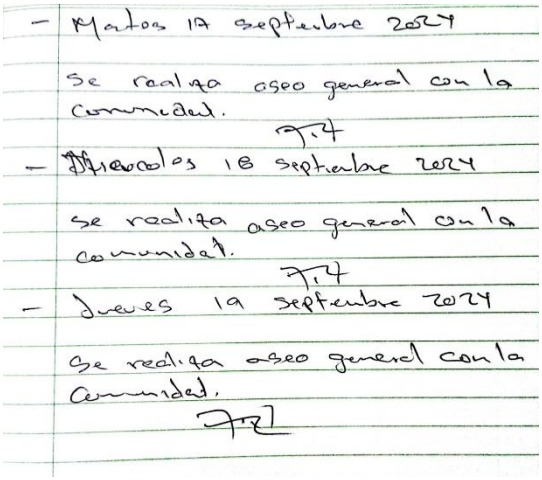
- Martes 17 septiembre 2024
Se realiza aseo general con la comunidad.
- Miercoles 18 septiembre 2024
se realiza aseo general con la comunidad.
- Jueves 19 septiembre 2024
Se realiza aseo general con la comunidad.

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S
Matricula No. 2520237430CND

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°06

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4647-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:4440 de 2023

PERIODO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTEIMBRE DEL 2024

Elaboró:	***Revisó:***	***Aprobó:***
Ing. FABIO JESUS MEJIA *Mat: 2520256474 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*	*Ing. Juan Carlos anabria* *Mat: 2520237430 CND*
CARGO: *Residente de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*	***CARGO:*** *Supervisor del contrato*

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4440 de 2023 **Contratista:** JAC VEREDA FLORIDA

Contrato de Interventoría No. 4647 de 2023 **Interventoría:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORIN SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** SEPTIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	95
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	96
1	**INTRODUCCIÓN**		99-100
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		100-101
2.1	Localización		100-101
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		101-103
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		103-106
2.4	Características técnicas del proyecto		107
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		107
3.1	Información general del contrato		108
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		108
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		108
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		108
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		108
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	108-112
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	113
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	113
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	114
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	115
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	115
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	16-122
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	121
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		122
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		123
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	124 125
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	126-128
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	129-134
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		135
5.1	Información general del contrato		135
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		136
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		136
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	136
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	136
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	137
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	137
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	137-138
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		138
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	 139
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	139
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	139
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		139
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		139-141
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		141
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		141
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		142

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:
ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se relaciona adjunto el formato diligenciado del resumen del estado general del proyecto, se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto, en el cual se evidencia que el contratista de obra ya terminó obra, presentando un avance físico y financiero del 100%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — PERIODO MES: SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 4440 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE L

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4647 de 2023 — INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S — SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

PLAZO INICIAL:	3 MESES	
FECHA DE INICIO:	45286	VALOR INICIAL (incluido IVA) : 199295465
FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): 0
FECHA DE REANUDACIÓN:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.295.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	45657	ANTICIPO CONCEDIDO: 0
PLAZO DE VENCIMIENTO PRORROGA 1	45412	ANTICIPO AMORTIZADO: 0
PLAZO DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/10/2024	

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	PLACA HUELLA	ML	161
	ALCANTARILLA DE 36"	UNIDAD	1
	Rehabilitación		
	Túneles		
Estructuras	Puentes		
Mantenimiento	Pontones		
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	PLACA HUELLA	ML	$ 8.000.000,00	$ 200.295.465,00
	ALCANTARILLA	UND	0%	
	Rehabilitación			
	Túneles			
Estructuras	Puentes			
Mantenimiento	Pontones			
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 122.462.973,36	$ 28.725.882,64	$ 151.188.856,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 35.765.383,95	$ 8.389.411,05	$ 44.154.795,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 3.200.969,34	$ 750.844,66	$ 3.951.814,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 199.295.465,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 8.000.000,00	1.520.000,00	$ 9.520.000,00	
AJUSTES				$ 199.295.465,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SE				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				$ 199.295.465,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 148.000.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141.000.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	$ 7.000.000,00

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 1

ELLA AL 100% A= 5 M Y E= 0,15 M




Foto 2

PLACA HUELLA AL 100% A= 5 M Y E= 0,15 M

Firma

Nombre JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. LOCALIZACIÓN 7
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 8
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4440 de 2023 11
3.1INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES .12
3.3SEGUIMIENTO ITEN NO PREVISTO
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12
4.1. INFORME SEMANAL 12
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 15
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 18
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 20
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 20
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 21
4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA .23
4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 30
4.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 30
4.10. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 31
4.11. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 32
4.12. ACTAS DE REUNIÓN 34
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 21
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 21

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR……21

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA22

6.1 EQUIPOS Y VEHICULOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA……22

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……22

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL……22

6.5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS……22

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……..23

8. ANEXOS……24

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO……24

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS……24

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS……..24

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE……24

2. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidario.

En este informe se presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.06** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024** el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**. Hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los siguientes convenios:

- ✓ **Convenio No. 4440 de 2023 con número de proceso SPSC-CD-CS-886-2023, y que tiene por objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**.

ANTECEDENTES

La economía del municipio está basada en la agricultura, complementada con la ganadería, la coca y aprovechamientos forestales

A el municipio de San José del Fragua, Currillo y Albania se accede por la ruta troncal del Llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por la empresa Coomotor Por vía terrestre, además de su vecina, se accede por Villavicencio en el vecino departamento del Meta en el norte, Mitú (Vaupés) al este y Leticia (Amazonas) en el sur.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente,

proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

San José del Fragua, Currillo y Albania son municipios del departamento del Caquetá, en Colombia localizado en la Zona sur del país, en la región Amazonia. Con 88 965 km² es el tercer departamento más extenso —por detrás de Amazonas y Vichada

Los puntos a intervenir en la florida se localizan en las siguientes coordenadas:

PLACA HUELLA PUNTO INICIAL 1° 5'26.50"N, 76° N 2'51.68"O
PLACA HUELLA PUNTO FINAL 1° 5'28.60"N, 76°2'48.32"O



Figura 2-2 Ubicación del tramo a mejorar en la vereda La Florida.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a la asociación de junta de Albania (la arenosa), vereda las delicias, florida del municipio de Currillo y la vereda iglesias del municipio de San José del Fragua, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos.

Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.
.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

CONVENIO 4440 – 2023:

OBJETO "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**."

La vereda florida del Municipio de currillo está ubicada aproximadamente a 45 kilómetros del casco urbano y limita con las veredas cerrito, vergel y palizada, dicha vereda posee una vía terciaria con una extensión aproximada de 50 km.

El tramo a intervenir lleva por nombre subida de la laguna de la florida" y subida la camangucha, el estado general de la superficie o rodadura presenta hundimientos puntuales a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias los cuales impiden la transitabilidad de cualquier tipo de vehículo en época de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es de 6 m aproximadamente. No cuenta con cunetas, carece de obras hidráulicas y falta realizar mantenimiento a las existentes, se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

Estas vías no cuentan con obras de artes.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	
ALCANCE DEL PROYECTO	*LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS", PARA LO CUAL SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA VISITA TÉCNICA REALIZADA POR LOS PROFESIONALES DESIGNADOS POR EL INVIAS, EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL - OAC, EN DONDE SE REALIZÓ UNA CONCERTACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR, UTILIZANDO LOS DISEÑOS TIPO ESTABLECIDOS EN LA CARTILLA DE OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURALES VIALES, NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONVENIO Y PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DEL SECTOR A INTERVENIR.*
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CONVENIO 4440 – 2023	*CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA DE 120 ML Y LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES PRESENTADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES.* *LA ALCANTARILLA CIRCULAR, COMO ELEMENTO DE DRENAJE TRANSVERSAL SE TRABAJARÁ CON TUBOS DE 36" DE CONFIGURACIÓN TIPO ALETA-ALETA LA CUAL PERMITE, ADEMÁS DE RECIBIR Y EVACUAR LA ESCORRENTÍA APORTANTE POR LAS*

	CUNETAS Y FILTROS, DAR CONTINUIDAD A CAUCES CON FLUJOS INTERMITENTES O EFÍMEROS. *ESPECIFICACIONES DE DISEÑO:* *-CONCRETO: F'C 21MPA* *-ACERO CORRUGADO: FY 420MPA*

Tabla 6. Características técnicas del proyecto

3. NFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4440 de 2023

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VEREDA FLORIDA

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA No. 4440 de 2023

TIPO DE PROCESO	*CONTRATACIÓN DIRECTA*
NÚMERO DE PROCESO	*SPSC-CD-CS-886-2023*
CONVENIO NO.	*4440 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS*
OBJETO	*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..*
CONTRATISTA	*JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA*
NIT	*:901.269.506- 9*
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – PGN	*$199.295.465*
RECURSOS PROPIOS	*$1.000.000*
VALOR TOTAL	*$ 200.295.465*

ADICIONES	*$ 0.00*
FECHA DE INICIO	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*31 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 01	*30 DE ABRIL DE 2024*
FECHA DE TERMINACION No. 2	*30 DE JUNIO DE 2024*
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA No. 3	*30 de SEPTIEMBRE DEL 2024*

Tabla 7. Información general convenio 4440 de 2023

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- **FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO Fy 4200MPA:** Se realizó corte y doblado de barras corrugadas permitiendo obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño de las huellas

En el transcurso del mes se realizaron actividades como: instalación de acero de refuerzo para las cunetas y bordillos. Se vaciaron concretos de 3000 psi. El porcentaje de obra ejecutado a la fecha es del 100% correspondiente a un valor de $ 199.295.465

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han presentado ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Realizar visitas periódicas para seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando medidas y que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto

Se le hizo control de calidad a los materiales y agregados utilizados para las mezclas

Se tomaron muestras de mezclas para los cilindros

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL, septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 1 | FECHA 7/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALE! | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA | SEMANA No.: 20 del 1/09/2024 al 7/09/2024 Ultimo Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JNG. JOSE RICARDO BUITRAGO BARCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
117 ML DE PLACA HUELLA MAS DOS ALCANTARILLA DE 36 NUEVO ALCANCE DE PLACHA HUELLA 120 ML INCLUYENDO TRANSICIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA	INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.		
		INTEGRANTES:	UNICO		
CONVENIO No.	4440 de 2023	CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR INICIAL:	$ 200.295.465,00			VALOR AMORTIZADO:	$ -
VALOR ADICIONES:				SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200.295.465,00				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.295.465			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 175.436.530		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 24.858.935		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 91.559.531		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 17.744.063		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 151.188.856,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149.000.000,00	74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 146.000.000,00	73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 3.000.000,00	1%
ADMINISTRACIÓN	$ 29.436.530,00	14,7%
PAGA		
APORTES JAC		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 178.436.530,00	89,1%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 175.436.530,00	87,6%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 3.000.000,00	1,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.000.000,00	9,6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.000.000,00	5,3%

Observaciones: la obra presenta un avance del 87,6 % se instalo refuerzo para cuneta y bordillos y posterios se hizo el vaciado de las cunetas. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 14,7%, el aporte de la jac esta al 103% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 91.559.531,00	83,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIÓDICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 85% | Avance o Atraso Físico % 3,3%
Meta Física Ejecutada % 81,69%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
1	placa huella	ml	117
2	alcantarilla	und	2
3			
4			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Física	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 13.000.000,00			$ 128.510.527,60	85,0%
Ejec	$ 8.000.000,00			$ 123.510.527,60	81,7%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCOMPACTADOR		
PAJARITA		
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: 1° 5'26.50"N, 76° 2'51.68"O punto final 1° 5'28.60"N, 76°2'48.32"O
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO: SI	x	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	x	NO

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A x
EMISIONES:	SI		NO		N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTE PROYECTO ES DE COMPLEGIDAD AMBIENTAL BAJA, POR ENDE SE REMPLAZO POR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 31 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PROGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con la instalacion del refuerzo cunetas y bordillos y posterior se esta vaciando concreto de 3000 psi

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa corte, figurado y armado de las parrillas para las cunetasy bordillos

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


vaciado de concreto para huellas reforzada


instalacion de acero y vaciado de cuneta


losa de transición

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 252251947-ICND

Semana 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | EDICIÓN | PÁGINA 1 | FECHA 14/09/2024 (día / mes / año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALE: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 21 del 8/09/2024 al 14/09/2024 Último Informe Semanal NO(*)
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
117 ML DE PLACA HUELLA MAS DOS ALCANTARILLA DE 36 NUEVO ALCANCE DE PLACHA HUELLA 120 ML INCLUYENDO TRANSICIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA

CONVENIO No. 4440 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 200.295.465,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 200.295.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO
CONTRATO No. 4647 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 | VALOR ADICIONES: -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.295.465			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 181.436.530		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 18.858.935		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 94.184.531		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 15.119.063		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A)	$ 151.188.856,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 150.000.000,00	78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 152.000.000,00	76%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4.000.000,00	2%
ADMINISTRACIÓN	$ 29.436.530,00	14,7%
PAGA		
APORTES JAC		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 185.436.530,00	92,6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 181.436.530,00	90,6%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.000.000,00	2,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.000.000,00	6,6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.000.000,00	4,6%

Observaciones: la obra presenta un avance del 90,6% se instalo refuerzo para cuneta y bordillos y posterior se hizo el vaciado de las cunetas. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 14,7%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 94.184.531,00	86,2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 90% | Avance o Atraso Físico %: 4,0%
Meta Física Ejecutada %: 85,69%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
placa huella	ml	117
alcantarilla	und	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 10.000.000,00			$ 135.510.527,60	89,6%
Ejec	$ 7.000.000,00			$ 129.510.527,60	85,7%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCOMPACTADOR		
PAJARITA		
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

* El interventor identifica la meta física ajustada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás proexiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el avance técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: 1° 5'26.587"N, 76° 2'51.68"O punto final 1° 5'28.687"N, 76°2'48.32"O
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: CAQUETA	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN: MADICA SAS	PERMISO MINERO: SI	x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	x	NO

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI x	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI x	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:SE INSTALO EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL):

ESTADO: ESTE PROYECTO ES DE COMPLEGIDAD AMBIENTAL BAJA, POR ENDE SE REMPLAZO POR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIDADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0

OBSERVACIONES: SE ESTIMA INTREGAR OBRA EL 15 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PROGRAMADO CON EL INVIAS SOCALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con la instalacion del refuerzo cunetas y bordillos y posterior se esta vaciando concreto de 3000 psi

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa corte, figurado y armado de las parrillas para las cunetasy bordillos

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO


vaciado de concreto para cunetas


instalacion de acero y vaciado de cuneta


instalacion de acero

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por viales, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: PABO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 2620256477CND

Semana 3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | EDICIÓN | PÁGINA 1 | FECHA 21/09/2024 (día / mes / año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALE: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 22 del ######## al 21/09/2024 Último Informe Semanal Nº(*)
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
117 ML DE PLACA HUELLA MAS DOS ALCANTARILLA DE 36 NUEVO ALCANCE DE PLACHA HUELLA 120 ML INCLUYENDO TRANSICIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA

CONVENIO No. 4440 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 200.295.465,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 200.295.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO
CONTRATO No. 4647 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 | VALOR ADICIONES: -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.295.465			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 195.343.651		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 3.951.814		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 96.809.531		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 12.494.063		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A)	$ 151.188.856,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 151.188.856,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 151.188.856,00	100%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-
ADMINISTRACIÓN	$ 44.154.795,00	22,0%
PAGA		
APORTES JAC		100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 195.343.651,00	97,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 195.343.651,00	97,5%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.000.000,00	6,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.000.000,00	5,3%

Observaciones: la obra presenta un avance del 100% se instalo refuerzo para cuneta y bordillos y posteriors se hizo el vaciado de las cunetas. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 23%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 96.809.531,00	88,6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100% | Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: 100,00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
placa huella	ml	117
alcantarilla	und	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 9.000.000,00			$ 151.188.856,00	100,0%
Ejec	$ 8.000.000,00			$ 151.188.856,00	100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física ajustada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás proexiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sectors)

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCOMPACTADOR		
PAJARITA		
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el avance técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: 1° 5'26.597"N, 76° 2'51.68"O punto final 1° 5'28.687"N, 76°2'48.32"O
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN: MADICA SAS	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A x
EMISIONES:	SI		NO		N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:SE INSTALO EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL):
ESTADO: ESTE PROYECTO ES DE COMPLEGIDAD AMBIENTAL BAJA, POR ENDE SE REMPLAZO POR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIDADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 15 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PROGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO A LA ESPERA DE QUE INVIAS APRUEBE LOS RECURSO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO Y EL MEJORAMIENTO DEL PUENTE

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se termina de vaciar concretos para bordillos y la construccion de la placa huella que al 100%, se realiza un aseo general y se llevan los sobrante a sitios autorizados

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa fecha de cierre del proyecto

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


vaciado de concreto para cunetas y bordillos


vaciado de concreto para cunetas y bordillos


vaciado de concreto para cunetas y bordillos

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusivas del interventor.

IX. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por insias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: PABO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 3500594676CND

Semana 4

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 1 | FECHA 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALE: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 23 del ######## al 30/09/2024 Último Informe Semanal SI [X] (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
117 ML DE PLACA HUELLA MAS DOS ALCANTARILLA DE 36 NUEVO ALCANCE DE PLACHA HUELLA 120 ML INCLUYENDO TRANSICIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA		INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.	
			INTEGRANTES:	UNICO	
CONVENIO No.	4440 de 2023	VALOR INICIAL: $ 200.295.465,00	CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 200.295.465,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.295.465			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 195.343.651		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 3.951.814		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 99.434.531		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 9.869.063		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 151.188.856,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 151.188.856,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 151.188.856,00	100%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	
ADMINISTRACIÓN:	$ 44.154.795,00	22,0%
PAGA		
APORTES JAC		100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 195.343.651,00	97,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 195.343.651,00	97,5%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones: la obra presenta un avance del 100% se instalo refuerzo para cuneta y bordillos y posteriors se hizo el vaciado de las cunetas. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 22%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 99.434.531,00	91,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 6.533.956,19

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: la interventoria sigue realizando acompañamiento administrativo con el fin de que estos convenios sean liquidados

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100% Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: 100,00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
placa huella	ml	117
alcantarilla	und	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 9.000.000,00			$ 151.188.856,00	100,0%
Ejec	$ 9.000.000,00			$ 151.188.856,00	100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor científica la meta física ejecutada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás previsiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCOMPACTADOR		
PAJARITA		
MEZCLADORA		
RANA		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: 1° 5'26.597"N, 75° 2'51.618"O punto final 1° 5'28.687"N, 75°2'48.32"O
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: CAQUETA	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN: MAEXICA SAS	PERMISO MINERO: SI	x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	x	NO

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI x	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI x	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTE PROYECTO ES DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL BAJA, POR ENDE SE REMPLAZO POR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 31 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PROGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO A LA ESPERA DE QUE INVIAS APRUEBE LOS RECURSO PARA LA INTEGRACION SOCIAL DEL PROYECTO Y EL MEJORAMIENTO DEL PUENTE

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Estamos a la espera de que el presidente de la JAC pase la carta para girar el recurso del PAGA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS META FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


vaciado de concreto para cunetas y bordillos


vaciado de concreto para cunetas y bordillos


vaciado de concreto para cunetas y bordillos

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por ensias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MOLINA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25202587-ACND

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Anexo formato de la maquinaria y equipos utilizados.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION LA FLORIDA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: septiembre **PROYECTO:** PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATO No. 4440-2023 **CONTRATISTA:** JAC LA FLORIDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTOIRIAS ORION SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA	MASTER	1 BULTO	CURILLO	A	A	I	I	I																										
VIBROCONCRETO	MASTER		CURILLO	I	I	I	I	I																										
RANA				I	I	I	I	I																										
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				3	3	3	3	3																										
TOTAL ACTIVO				1	1	3																												
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO				2	2																													

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	133%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	12	4

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.


Firma
Nombre: Gerardo Quintero
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0593412 TLM

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de interventoria
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato donde se relaciona todo el personal

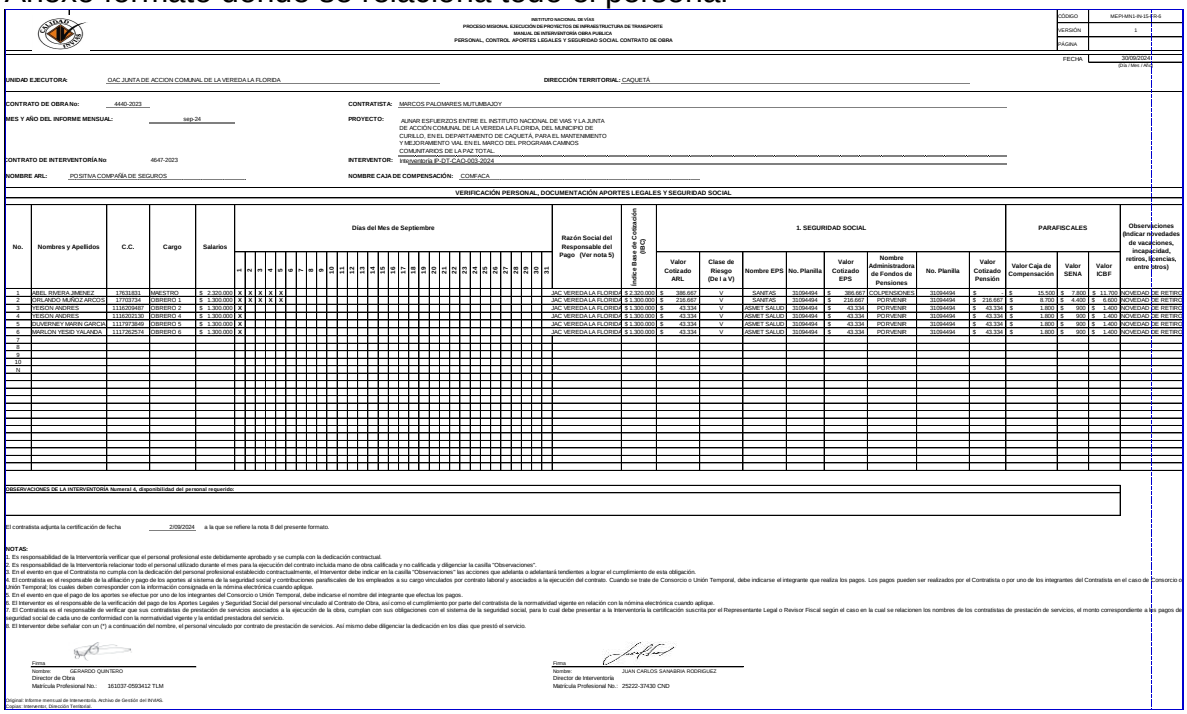

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO: MEPI-MN1-Pr-15-Ff-6
VERSIÓN: 1
PÁGINA:
FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: OAC JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 4440-2023
CONTRATISTA: MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24
PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647-2023
INTERVENTOR: Interventoria IP-DT-CAQ-003-2024
NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes de Septiembre (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ABEL RIVERA JIMENEZ	17631831	MAESTRO	$ 2.320.000	X X X X X	JAC VEREDA LA FLORIDA	$ 2.320.000	$ 386.667	V	SANITAS	31094494	$ 386.667	COLPENSIONES	31094494	$	$ 15.500	$ 7.800	$ 11.700	NOVEDAD DE RETIRO
2	ORLANDO MUÑOZ ARCOS	17703734	OBRERO 1	$ 1.300.000	X X X X X	JAC VEREDA LA FLORIDA	$ 1.300.000	$ 216.667	V	SANITAS	31094494	$ 216.667	PORVENIR	31094494	$ 216.667	$ 8.700	$ 4.400	$ 6.600	NOVEDAD DE RETIRO
3	YEISON ANDRES	1116209487	OBRERO 2	$ 1.300.000	X	JAC VEREDA LA FLORIDA	$ 1.300.000	$ 43.334	V	ASMET SALUD	31094494	$ 43.334	PORVENIR	31094494	$ 43.334	$ 1.800	$ 900	$ 1.400	NOVEDAD DE RETIRO
4	YEISON ANDRES	1116202130	OBRERO 4	$ 1.300.000	X	JAC VEREDA LA FLORIDA	$ 1.300.000	$ 43.334	V	ASMET SALUD	31094494	$ 43.334	PORVENIR	31094494	$ 43.334	$ 1.800	$ 900	$ 1.400	NOVEDAD DE RETIRO
5	OLIVERNEY MARIN GARCIA	1117973549	OBRERO 5	$ 1.300.000	X	JAC VEREDA LA FLORIDA	$ 1.300.000	$ 43.334	V	ASMET SALUD	31094494	$ 43.334	PORVENIR	31094494	$ 43.334	$ 1.800	$ 900	$ 1.400	NOVEDAD DE RETIRO
6	MARLON YESID YALANDA	1117262574	OBRERO 6	$ 1.300.000	X	JAC VEREDA LA FLORIDA	$ 1.300.000	$ 43.334	V	ASMET SALUD	31094494	$ 43.334	PORVENIR	31094494	$ 43.334	$ 1.800	$ 900	$ 1.400	NOVEDAD DE RETIRO
7																			
8																			
9																			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 2/09/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: GERARDO QUINTERO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0593412 TLM

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25222-37430 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo certificación del pago de seguridad social

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORIDA
PERSONARÍA JURÍDICA No 0015 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1988
NIT. 901.269.506-9

Curillo, Caquetá septiembre 25 de 2024

Señores:
INVIAS

PAZ Y SALVO CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR

Respetados Señores.

Por medio de la presente los abajo firmantes, identificados con las cédulas de ciudadanía que aparecen al pie de nuestras firmas, certificamos que estuvimos vinculados mediante Contrato de obra y labor suscritas con la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Florida identificado con Nit. 901.269.506-9 el cual tuvo su origen en el convenio número 4440-2023 cuyo objeto correspondió a "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, en nuestra calidad de AYUDANTES DE CONSTRUCCION Y MAESTRO DE OBRA, entre el **01 al 05 de septiembre de 2024,** me permito certificar que la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Florida, identificado con Nit. 901.269.506-9 está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo declaramos que hemos sido notificados acerca del derecho de practicarnos el examen médico de egreso en los términos establecidos en las resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que la modifique o sustituya.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORIDA
PERSONARÍA JURÍDICA No 0015 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1988
NIT. 901.269.506-9

El presente PAZ y SALVO se firma en curillo a los 25 días del mes de septiembre del año 2024 por los siguientes trabajadores:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	FIRMA
ABEL RIVERA JIMENEZ	17.631.831	
ORLANDO MUÑOZ ARCOS	17.703.734	
YEISON ANDRES PALOMARES MONSALVE	1.116.209.487	
YEISON ANDRES CARVAJAL HUACA	1.116.202.130	
DUVERNEY MARIN GARCIA	1.117.973.849	
MARLON YESID YALANDA BETANCOUR	1.117.262.574	

Nota: Los trabajadores **YEISON ANDRES PALOMARES MONSALVE,** identificado con cedula de ciudadanía No.1.116.209.487**, YEISON ANDRES CARVAJAL HUACA,** identificado con cedula de ciudadanía No.1.116.202.130, **DUVERNEY MARIN GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No.1.117.973.849 y **MARLON YESID YALANDA BETANCOUR,** identificado con cedula de ciudadanía No.1.117.262.574, con novedad de retiro en la fecha 01 de septiembre de 2024.

El maestro **ABEL RIVERA JIMENEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 17.631.831 y trabajador **ORLANDO MUÑOZ ARCOS,** identificado con cedula de ciudadanía No. 17.703.734, con novedad de retiro en la fecha 05 de septiembre de 2024.

MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY
C.C. 17.705.058 de Curillo-Caquetá
Representante Legal JAC La Florida Curillo Caquetá

Anexo planilla paga del mes de septiembre

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901306588	9	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	N	0	POSITIVA - 14-73	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-205	VD LA FLORIDA		3206412572		JACVEREDALAFLORIDA08@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31994494	E	2024-09-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	286.800	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
6	31994494	2024-10-07	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRL	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	VST	SLP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	RPST	AFP	AFS	LNS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FSOL	FMUR	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ATEL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Tarifa	Licencia de Maternidad/o	Actividad Económica
1	CC 17681881	RIVERA JIMENEZ ABEL	2.220.000	F	X																0	0	5	5	1	RENAP ESAPY	0	0	0	0	CAPITAS EPS001	384.667	48.400	COMFACA-CCF13	384.667	15.500	384.667	37.000	0.00960	384.667	7.800	11.700	0	0	01	0	5	110.400	N	5479001
2	CC 17703734	BRIÑEZ ARCOS ORLANDO	1.300.000	F	X																0	5	5	5	1	POBVENDR-230101	216.667	54.700	0	0	CAPITAS-EPS001	216.667	27.100	COMFACA-CCF13	216.667	8.700	216.667	15.100	0.00960	216.667	4.400	6.600	0	0	01	0	5	96.600	N	5479001
3	CC 1116702178	CASTAÑAL IDIACA YEISON ANDRES	1.300.000	F	X																0	1	1	1	1	POBVENDR-230101	43.334	7.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESS065	43.334	5.500	COMFACA-CCF13	43.334	1.800	43.334	3.100	0.00960	43.334	900	1.400	0	0	01	0	1	19.700	N	5479001
4	CC 1116209817	SICO MARTE MORALES YEISON ANDRES	1.300.000	F	X																0	1	1	1	1	POBVENDR-230101	43.334	7.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESS065	43.334	5.500	COMFACA-CCF13	43.334	1.800	43.334	3.100	0.00960	43.334	900	1.400	0	0	01	0	1	19.700	N	5479001
5	CC 1117695174	YALANDA ESTANCOURT MARTIN YESID	1.300.000	F	X																0	1	1	1	1	POBVENDR-230101	43.334	7.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESS065	43.334	5.500	COMFACA-CCF13	43.334	1.800	43.334	3.100	0.00960	43.334	900	1.400	0	0	01	0	1	19.700	N	5479001
6	CC 1117970849	MARIN GARCIA DOBERNEY	1.300.000	F	X																0	1	1	1	1	POBVENDR-230101	43.334	7.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESS065	43.334	5.500	COMFACA-CCF13	43.334	1.800	43.334	3.100	0.00960	43.334	900	1.400	0	0	01	0	1	19.700	N	5479001

PAGADO

Página 1 2024-09-25

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901286606	9	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ORDA	D	0	POSITIVA 14 23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-705	VEREDA LA ORDA		3208417572		JACVEREDALAORDA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31094494	E	2024-09-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	285.800	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PILA)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	31094494	2024-10-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
390.003	776.670	776.670	776.670	776.670

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				5	62.700	0	0	0	62.700
PORVENIR	230301	800224808	8	5	62.700	0	0	0	62.700
EPS(Administradoras: 2)				6	97.500	0	0	0	97.500
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	4	22.000	0	0	0	22.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	75.500	0	0	0	75.500
ARP(Administradoras: 1)				6	54.500	0	0	0	54.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	54.500	0	0	0	54.500
CCF(Administradoras: 1)				6	31.400	0	0	0	31.400
COMFACA	CCF13	891190047	2	6	31.400	0	0	0	31.400
SENA(Administradoras: 1)				6	15.800	0	0	0	15.800
SENA	PASENA	899999034	1	6	15.800	0	0	0	15.800
ICBF(Administradoras: 1)				6	23.900	0	0	0	23.900
ICBF	PAICBF	899999239	2	6	23.900	0	0	0	23.900
Gran Total					285.800	0	0	0	285.800

Página 2 2024-09-25

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 4440-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LA FLORIDA

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.295.465,00	N/A
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.295.465,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BASICO DEL CONVENIO	$ 122.462.973,36	$ 28.725.882,64	**$ 151.188.856**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 122.462.973,36	$ 28.725.883	**$ 151.188.856,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 122.462.973,36	$ 28.725.883	**$ 151.188.856,00**
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	$ -	**$ -**
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 158.228.357,31	$ 37.115.294	**$ 195.343.651,00**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 158.228.357,31	$ 37.115.294	**$ 195.343.651,00**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	$ -	**$ -**
-			**$ -**
VALOR TOTAL			**$ 195.343.651,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
residente de Obra GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Matrícula Profesio 161037-0593412 TLM

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N:2522237430CND

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Anexo estado general del tiempo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 4440 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION LA FLORIDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DEL 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	8	8	8																													24
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas					8																											8
Total horas	8	8	8	0	8																											

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:161037-0593412 TLM

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de interventoria
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 4440 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION LA FLORIDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: agosto de 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	8	8	8			8	8	8	8			8	8	8	4	8	8			8	8	8	8			8	8	8	8		8	172
Lluvias moderadas										8					4																	12
Lluvias intensas					8														8											8		24
Total horas	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	8	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:161037-0593412 TLM

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de interventoria
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se anexan formato presentado por el laboratorio INGSUELOS, los concretos cumplieron con los 3000 psi obtenidos por medio de la resistencia a la comprensión.

INGSUELOS
INGENIERÍA GEOTÉCNICA

CODIGO	ING - SU - 019
VERSIÓN	02
FECHA	1-mar -2018
PAGINA	1 DE 1

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E-410-13 - ASTM C 39/C 39M – 01

CLIENTE : JAC LA FLORIDA **FECHA:** 7/09/2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CURILLO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Muestra N°	Fecha toma	Fecha rotura	Edad dias	Localizacion en obra	Descripción elemento	Lectura dial [kN]	Resistencia obtenida individual [psi]	Resistencia esperada [psi]	Asent. [pulg]	Diametro muestra [cm]	Altura muestra [cm]	Area [cm2]	Masa muestra [g]	Volumen [cm3]	Densidad [g/cm3]	Tipo de falla	Factor de resistencia obtenido (%)	Cumple Si/No	Observaciones
C-11	10/08/2024	7/09/2024	28	Cuneta	Cuneta	392.0	**3217**	3000	N/D	15.00	30.20	176.7	13740	5336.8	2.575	5	107		N/D: No Disponible
C-2	10/08/2024	7/09/2024	28	Cuneta	Cuneta	406.2	**3247**	3000	N/D	15.20	30.20	181.5	13650	5480.1	2.491	5	108		N/D: No Disponible
C-3	10/08/2024	7/09/2024	28	Cuneta	Cuneta	409.1	**3313**	3000	N/D	15.10	30.00	179.1	13400	5372.4	2.494	5	110		N/D: No Disponible
C-4	10/08/2024	7/09/2024	28	Huella	Huella	370.1	**3038**	3000	N/D	15.00	30.10	176.7	13292	5319.1	2.499	5	101		N/D: No Disponible
C-5	10/08/2024	5/10/2024	56	Huella	Huella	404.3	**3318**	3000	N/D	15.00	30.10	176.7	13350	5319.1	2.510	5	111		N/D: No Disponible
C-6	10/08/2024	7/09/2024	28	Huella	Huella	391.0	**3209**	3000	N/D	15.00	30.20	176.7	13601	5336.8	2.549	5	107		N/D: No Disponible

Observaciones:

I.N.V. E -410 FIGURA 410 - 3. ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TIPICOS



Nota: Porcentaje de resistencia esperada a cada edad

3 Días, 40% a 50%
7 Días, 65% a 70%
14 Días, 80% a 85%
28 Días, 100%, como mínimo

Ejecuto
Laboratorista Nombre/Firma

Aprobó
Ingeniero control de calidad Nombre/Firma

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se anexan pólizas del convenio.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 4440-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LA FLORIDA

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 23/09/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.295.465,00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 3.300.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 40.059.093,00	17	11	2023	31	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 10.014.773,23	17	11	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 60.088.639,50	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100296764

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000,00	17	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100073351 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 40.059.093,00	17	11	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 10.014.773,23	17	11	2023	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 60.088.639,50	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100296764
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000,00	17	11	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100073351 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:


OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo pólizas del convenio

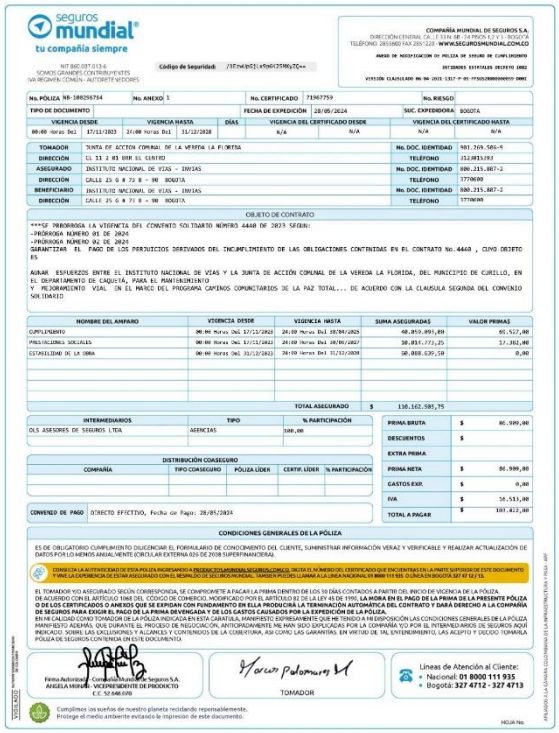

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ

TELÉFONO: 2851600 FAX 2851720 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

Código de Seguridad: /IErwUpDjxfOdC25NKyZC==

No. PÓLIZA	NB-100296764	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71967759	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 J 03 BRR EL CURITO	TELÉFONO	3128853393
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGUN:
-PRORROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NÚMERO 02 DE 2024
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 28/04/2025	40.859.091,89	65.527,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 28/06/2027	38.814.772,25	17.382,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2029	50.888.630,50	0,00
			TOTAL ASEGURADO	$ 130.162.585,75

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	80.999,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	80.999,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	20.533,00
TOTAL A PAGAR	$	101.422,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 47 / 51.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MORENO - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

IMPRIMIR EN LA GRANDE COLORIMAGEN S.A. NIT 830.042.049-7 - 1 FOLIO - 1 TINTA - 1 CARA - 1 HOJA - 60 GRS



seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ

TELÉFONO: 2851600 FAX 2851720 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100296764	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71967759	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

. TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 28.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.


"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

IMPRIMIR EN LA GRANDE COLORIMAGEN S.A. NIT 830.042.049-7 - 1 FOLIO - 1 TINTA - 1 CARA - 1 HOJA - 60 GRS

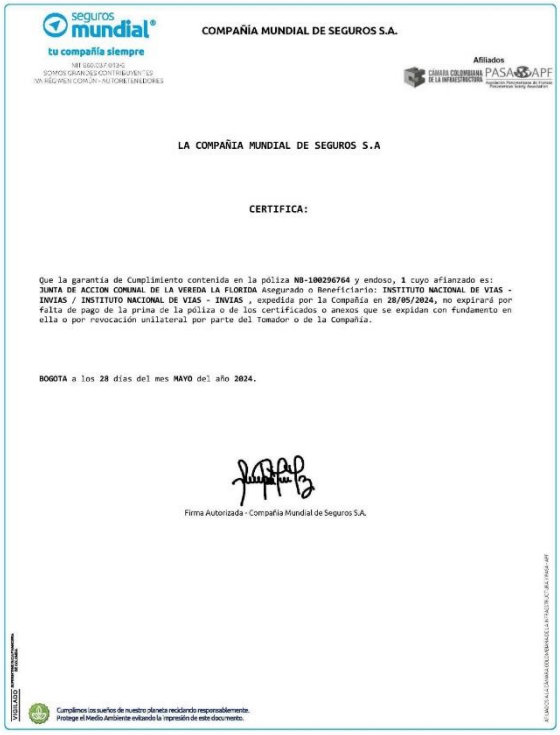

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A


CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100296764** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **28/05/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **28** días del mes **MAYO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

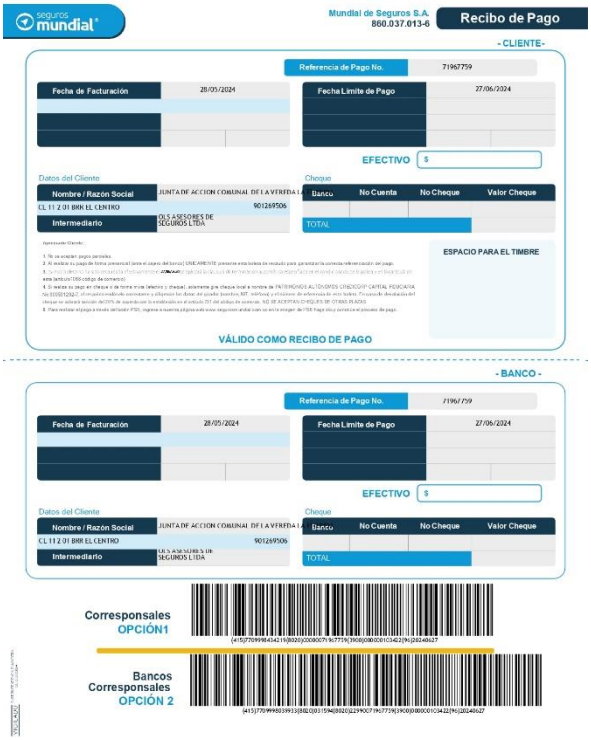

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.	71967759
Fecha de Facturación	28/05/2024
Fecha Límite de Pago	27/06/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA L
CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	901269506
Intermediario	OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71967759
Fecha de Facturación	28/05/2024
Fecha Límite de Pago	27/06/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente


Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA L
CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	901269506
Intermediario	OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2

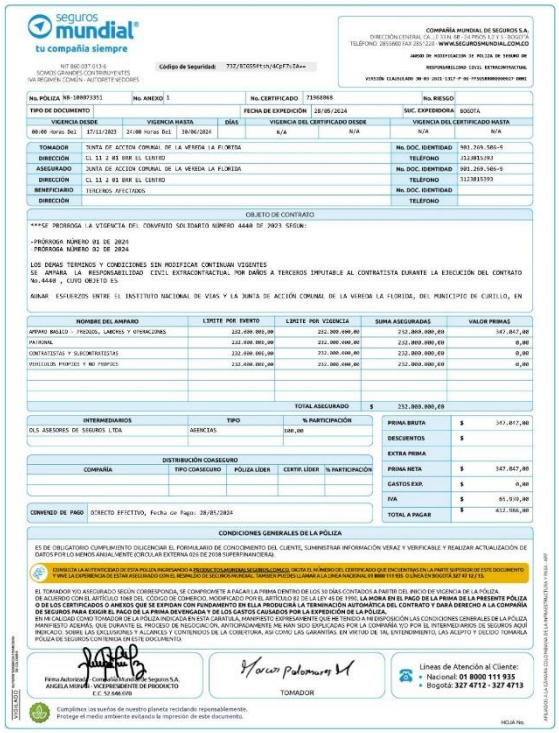

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 7J2/8C0S5Ft1h/4CpF7cIA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL. 7 STN DE - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2856660 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960960	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023 24:00 Horas Del	30/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 03 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3128835393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 03 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3128835393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRORROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.869.000,69	347.847,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.869.000,69	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.869.000,69	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.869.000,69	0,00
			TOTAL ASEGURADO	$ 232.869.000,69

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.847,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.847,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.919,00
TOTAL A PAGAR	$	413.766,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSAUTORIZADOS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VINE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 47 / 51.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DA A LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada: Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MORA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR


Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

APLICADO A LA CARÁTULA CLAUSULADO DE LA PÓLIZA CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014 - SFC

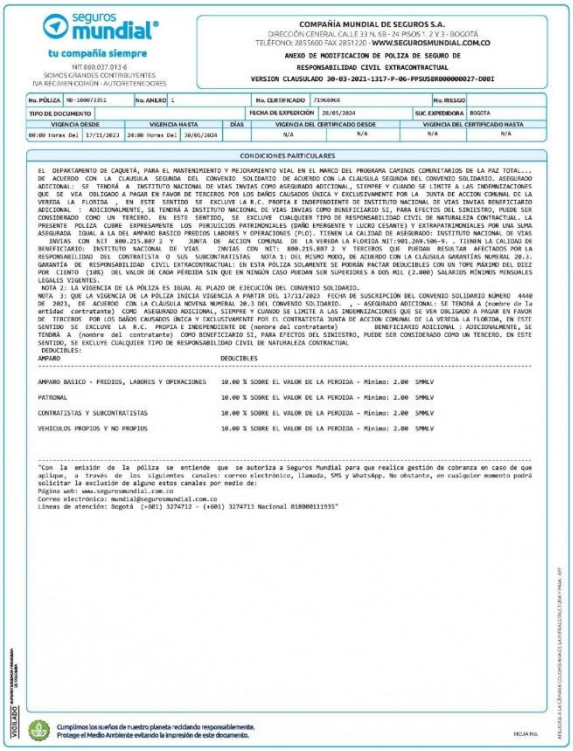

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2856660 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960960	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023 24:00 Horas Del	30/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (P.O). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. , TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA POLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 30.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"


Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

APLICADO A LA CARÁTULA CLAUSULADO DE LA PÓLIZA CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014 - SFC

|1

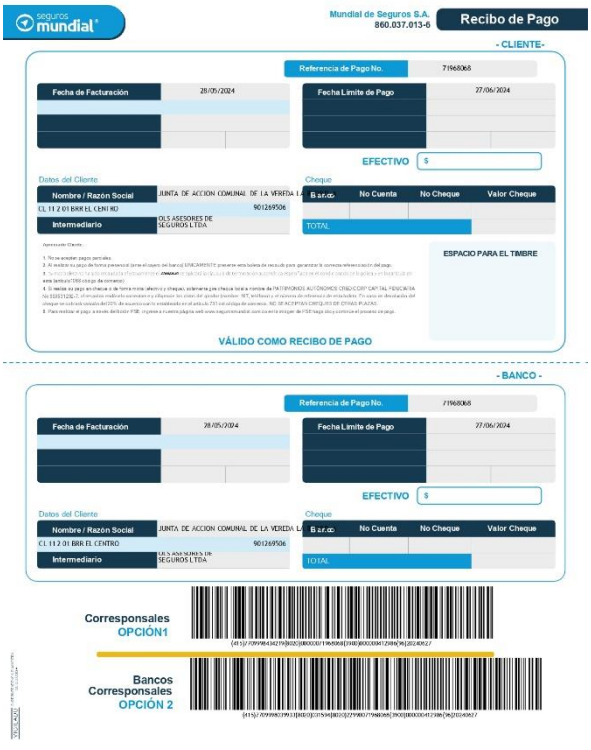

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE -

Referencia de Pago No. 71968068

Fecha de Facturación	Fecha Limite de Pago
28/05/2024	27/06/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA
CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	901269506
Intermediario	OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

B.a.r.o.c	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 71968068

Fecha de Facturación	Fecha Limite de Pago
28/05/2024	27/06/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente


Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA
CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	901269506
Intermediario	OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

B.a.r.o.c	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2

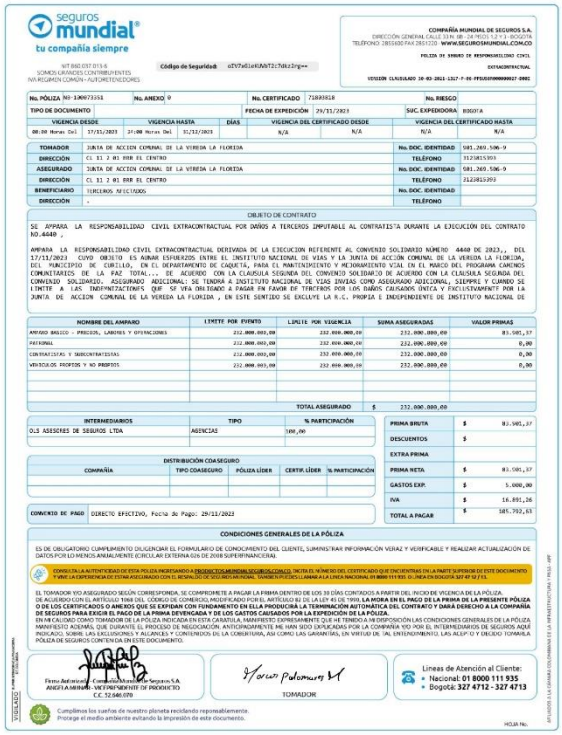

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

Código de Seguridad: dTV7w8leKUA9T2c7dkz3rg==

No. PÓLIZA	360-1300771551	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893918	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
08:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3128815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3128815393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4640 ,

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4640 DE 2023,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL,,, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL; SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	83.501,37
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
			TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	83.501,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	83.501,37
GASTOS EXP.	$	1.000,00
IVA	$	16.891,26
TOTAL A PAGAR	$	101.392,63

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2018 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO. INGRESA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935. O...NEA EN BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA [illegible]
C.C. 52.540.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B-24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2855220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71693818	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A


CONDICIONES PARTICULARES

VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT-901.269.506-9. TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, SE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL RIESGO POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA POLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
HOJA No.
APLICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

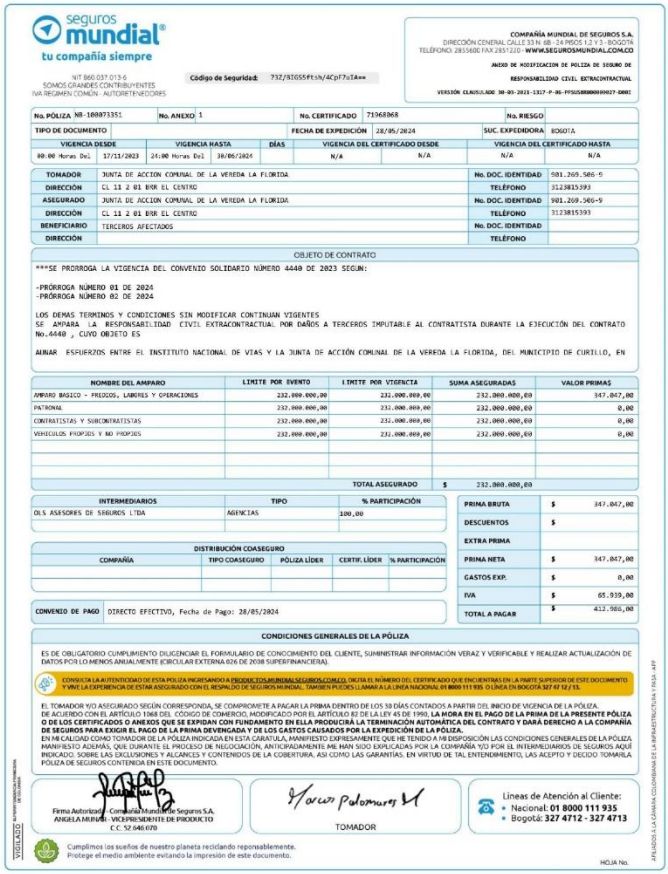

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 73Z/RIG55FtsN/4CpF7uIA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1 2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO: 2855600 FAX 2855220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71968868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRÓRROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.847,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	347.847,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.847,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.939,00
TOTAL A PAGAR	$	412.986,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO. SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA. ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MENDIETA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.
HOJA No.
APLICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP



seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960068	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CIALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. . TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:


AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

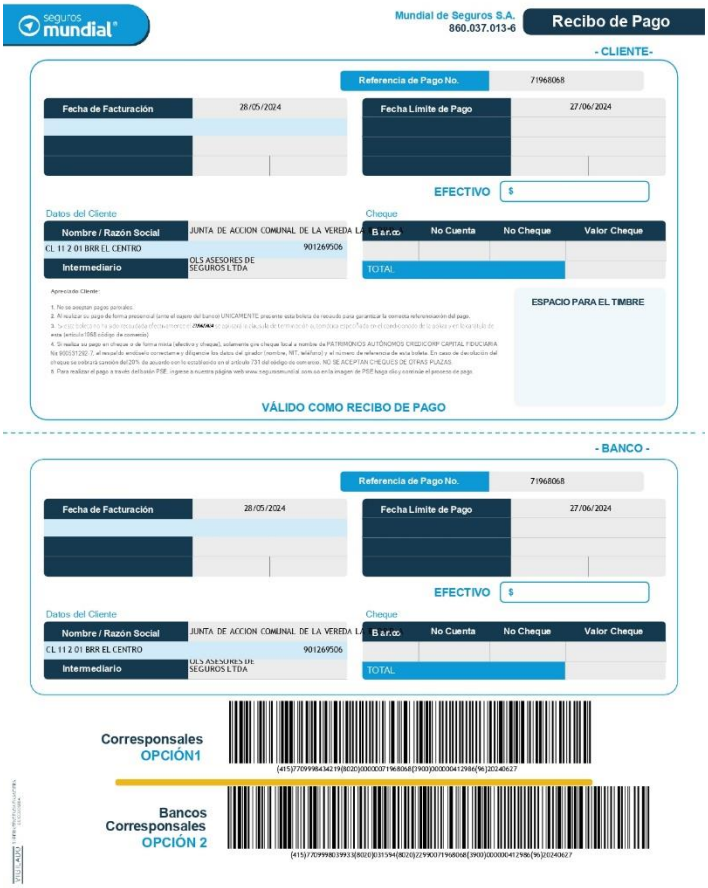

4.8SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA


Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, sin embargo, junto con la interventoría se adoptarán las siguientes medidas, con el fin de garantizar la calidad y correcta ejecución de las obras suscritas al convenio anteriormente mencionado.

- Para los estudios topográficos se exigió a la JAC, los certificados de calibración de los equipos con los cuales se realizaron los levantamientos topográficos. Se ANEXA certificado de mantenimiento y calibración de los equipos usados en el levantamiento topográfico.
- Ficha técnica de los materiales utilizados

4.9 **OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL**

4.9.1 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Se anexa programación de obra

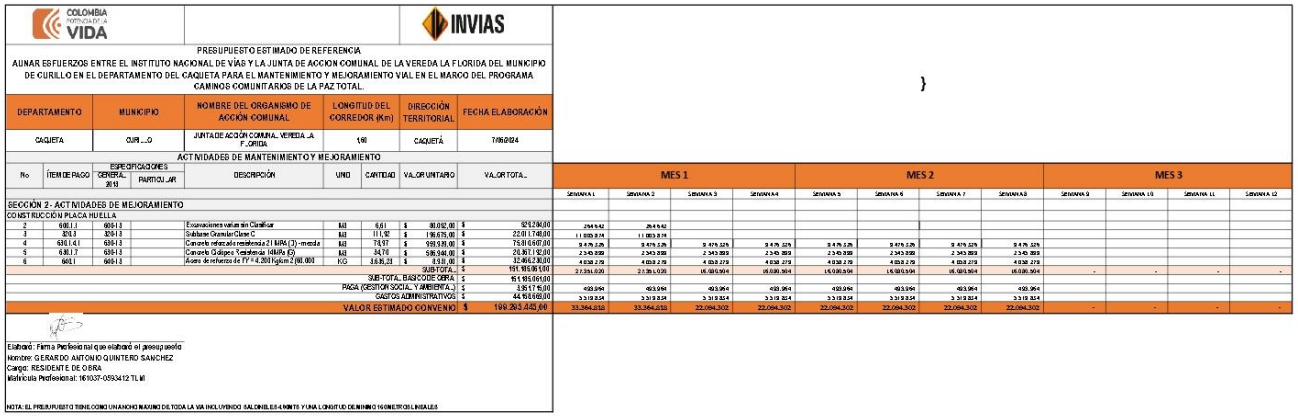

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — INVIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CURILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	CURI ...O	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL. VEREDA LA F...ORIDA	1,60	CAQUETÁ	7/06/024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO


No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTA...
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
2	600.1.1	600-1.3		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6,61	$ 80.052,00	$ 529.284,00
3	320.3	320-1.3		Subbase Granular Clase C	M3	111,92	$ 196.675,00	$ 22.011.748,00
4	630.1.4.1	630-1.3		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla	M3	78,97	$ 959.939,00	$ 75.810.607,00
5	630.1.7	630-1.3		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	34,70	$ 586.944,00	$ 20.367.192,00
6	640.1	640-1.3		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000	KG	3.635,23	$ 8.931,00	$ 32.466.230,00
							SUB-TOTAL	$ 151.185.061,00
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 151.185.061,00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.951.715,00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.158.669,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 199.295.445,00

MES 1				MES 2				MES 3			
SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
264.942	264.942										
11.003.874	11.003.874										
3.479.325	3.479.325	3.479.325	3.479.325	3.479.325	3.479.325	3.479.325	3.479.325				
2.343.888	2.343.888	2.343.888	2.343.889	2.343.888	2.343.888	2.343.888	2.343.889				
4.038.278	4.038.278	4.038.278	4.038.278	4.038.278	4.038.278	4.038.278	4.038.278				
21.330.307	21.330.307	10.189.904	10.189.904	10.189.904	10.189.904	10.189.904	10.189.904	-	-	-	-
33.364.512	33.364.512	22.094.302	22.094.302	22.094.302	22.094.302	22.094.302	22.094.302	-	-	-	-

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 161037-0593412 TLM

NOTA: EL PRESUPUESTO TIENE COMO UN ANCHO MAXIMO DE TODA LA VIA INCLUYENDO SALDINELES 4 MTS Y UNA LONGITUD DE MINIMO 16 METROS LINEALES

Se anexa presupuesto actualizado

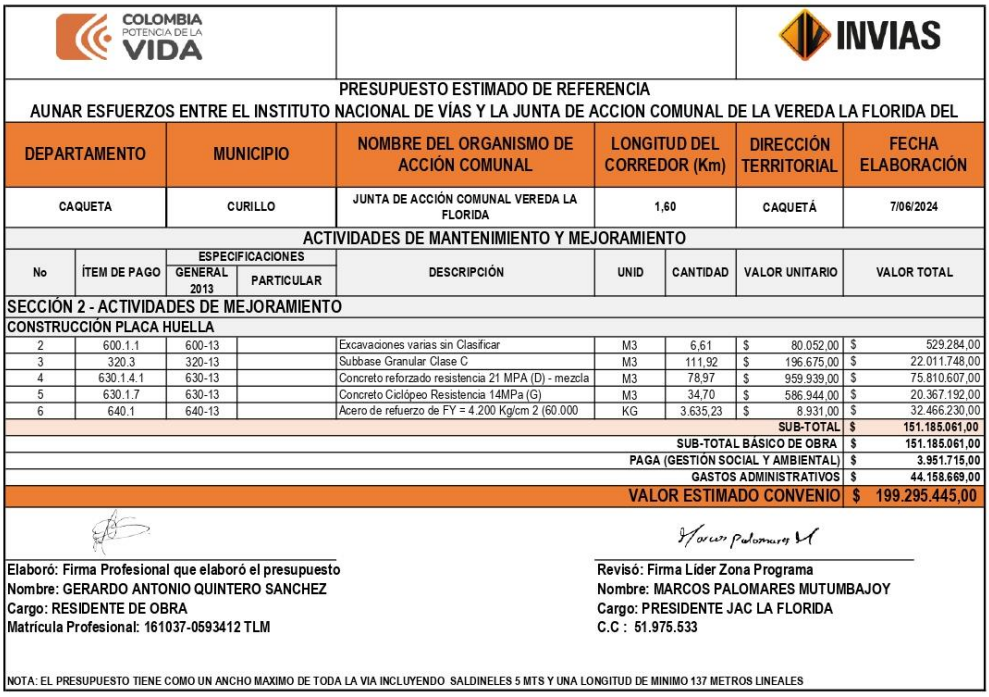

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — INVIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA DEL

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	CURILLO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORIDA	1,60	CAQUETÁ	7/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6,61	$ 80.052,00	$ 529.284,00
3	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	111,92	$ 196.675,00	$ 22.011.748,00
4	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla	M3	78,97	$ 959.939,00	$ 75.810.607,00
5	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	34,70	$ 586.944,00	$ 20.367.192,00
6	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000	KG	3.635,23	$ 8.931,00	$ 32.466.230,00
							SUB-TOTAL	$ 151.185.061,00
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 151.185.061,00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.951.715,00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.158.669,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 199.295.445,00

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 161037-0593412 TLM

Revisó: Firma Líder Zona Programa
Nombre: MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY
Cargo: PRESIDENTE JAC LA FLORIDA
C.C : 51.975.533

NOTA: EL PRESUPUESTO TIENE COMO UN ANCHO MAXIMO DE TODA LA VIA INCLUYENDO SALDINELES 5 MTS Y UNA LONGITUD DE MINIMO 137 METROS LINEALES

4.9.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se anexa plan de inversión



4.9.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Anexo actas comité operativo

INVIAS CAMINOS

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 1	Dirección Territorial INVIAS: CAQUETÁ	Fecha: 07-06-2024

Vereda LA FLORIDA – Municipio DE CURILLO - Departamento: CAQUETÁ
No. Convenio(s) Solidario(s): CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023
Ejecutor(es): MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JUAN CARLOS SANABRIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FABIO JESÚS MEJIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MARCO PALOMARES MUTUMBOY	JAC LA FLORIDA	PRESIDENTE
GERARDO ANTONIO QUINTERO	JAC LA FLORIDA	INGENIERO RESIDENTE
JADER ACOSTA IMBACHI	JAC LA FLORIDA	CONTADOR
RAUL VELANDIA CRISTANCHO	JAC LA FLORIDA	VEEDOR

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros participantes del comité operativo.
2. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
3. Análisis de cotizaciones presentadas
4. Elección de proveedores.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1-Análisis de precios.
2- Elección de proveedores.
3- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
4- Elección de uniformes.
5- Proposiciones y Varios

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen

1

INVIAS CAMINOS

1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los cuatro (4) miembros principales, el presidente, el ingeniero residente, contador y un representante de la veeduría.
2.	**Socialización de formatos a utilizar:** Se socializa a los participantes del comité operativo el formato a usar con referencia al análisis de los proveedores oferentes en términos de precio, disponibilidad de materiales, tiempo de entrega, facilidades de entrega, transporte en materiales, entre otros aspectos importantes para el suministro de los bienes y servicios requeridos para la placa huella-
3	**Presentación de cotizaciones:** A continuación se detallarán las cotizaciones de los proveedores seleccionados.
3.1	MATERIALES EPP: Se consigna que la dotación se comprara con la empresa **RPM**, ya que la empresa nos ofrece los artículos requeridos dando cumplimiento a las necesidades establecidas por INVIAS. El pago se realiza pagando el 100% al proveedor.

RPM SUMINISTROS Y DOTACIONES S.A.S.
NIT: 901.426.453-6
CR 14 #20-14 BARRIO LA CONSOLATA
TEL: 3202627622-3115538327
email: rpmsuministros.globalcomex@gmail.com
Florencia Caquetá

Florencia, 30 de mayo de 2024

señores:
VEREDA LA FLORIDA
CRISTIAN VARGAS
Municipio de curillo

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO CERTIFICADO	UNIDAD	7	27.000,00	189.000,00
7	BOTA CAUCHO PUNTERA	PAR	7	88.000,00	616.000,00
9	GAFA SEGURIDAD	UNIDAD	7	6.000,00	42.000,00
4	GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO	PAR	14	10.000,00	140.000,00
5	GUANTE ANTI VINQUETA REFORZADO	PAR	14	11.000,00	154.000,00
6	PETO DELANTAL EN CARNAZA SENCILLO	UNIDAD	5	25.000,00	125.000,00
7	CANETA PARA GUARDAR	UNIDAD	2	38.000,00	76.000,00
8	TAPAOIDOS DE INSERCION	UNIDAD	14	2.500,00	35.000,00
9	BOTIQUIN TIPO A	UNIDAD	1	130.000,00	130.000,00
10	OVEROL EN DRIL CON CINTA REFLECTIVA EN PECHO - PIERNAS - BRAZOS Y ESPALDAS CON BORDADO EN EL PECHO DE INVIAS	UNIDAD	9	97.000,00	776.000,00
11	TELA PARA CERRAMIENTO POR METRO COLOR VERDE	METRO	30	3.000,00	90.000,00
12	PLASTICO NEGRO CAL 6 X 4 MTS DE ANCHO	METRO	40	7.000,00	280.000,00
13	CINTA PELIGRO X 500 MTS.	ROLLO	2	80.000,00	60.000,00
14	CONO SEÑALIZACION 70 CMS	UNIDAD	2	45.000,00	90.000,00
15	PALETA PARE SIGA	UNIDAD	2	16.000,00	32.000,00
16	CAMISA PLASTICA X 100UL	UNIDAD	1	150.000,00	150.000,00
TOTAL					$ 2.216.000,00

CONDICIONES COMERCIALES:
Forma de pago: CONTADO
Validez de la oferta: 8 DIAS
Tiempo de entrega: 8 DIAS
Sitio de entrega: FLORENCIA

Atentamente,

PALOMARES MORENO PEREZ
GERENTE

2

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

3.2	**Topografía:** Para la topografía se recibieron varias cotizaciones de las cuales, la única persona que quiso continuar y sostener su oferta es el Sr Daniel Arias, estas cancelaciones de las ofertas se debe por las situaciones de conflicto que vive la zona a realizar el trabajo topográfico. Es así, como el comité determinó elaborar la topografía con el señor Daniel Felipe Arias Gonzales, el cual oferto sus servicios por valor de $ 1´600.000 y fue el único que estaba de disponible para ingresar a la zona del servicio. El servicio se debe cancelar 50% inicial para el acceso a la zona y el saldo 50% se paga a la entrega del informe en transferencia directa al proveedor. Por otra parte, se indica que el pago inicial se realiza en efectivo mediante dinero prestado al presidente de la junta. DANIEL FELIPE ARIAS GONZALEZ TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA Florencia,07 de junio de 2024 Señores JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA LA FLORIDA Nit. 901269506-9 Jacveredalaflorida08@gmail.com Florencia, Caquetá. Asunto: propuesta de trabajo levantamiento topográfico tramo vial 150 m lineales aprox. Respetuosamente me permito presentar propuesta formal para llevar a cabo el levantamiento topográfico de 150 m lineales aproximadamente de un tramo vial sobre vía terciarias con fines de proyección de plata huella, donde se desarrollarán las siguientes actividades - Levantamiento topográfico con sistema GNSS (RTK). - Levantamiento topográfico del inventario físico de cercas, postes, construcciones existentes en todo lo relacionado para involucrar y sustanciar expediente técnico físico. - Nivelaciones curvas de nivel cada 50 cm - Localización general, ciudad, vereda, sector Tiempo: el tiempo estimado del trabajo de campo, procesamiento de la información y entrega de productos es de 20 días calendario Equipos: La comisión de topografía cuenta con GNSS RTK I50 Valor: El valor de los servicios profesionales ofrecidos es de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS (1.600.000) MCTE, los cuales se cancelarán en un 50% para inicios de la actividad y un 50 % cuando se entreguen los productos. Cordialmente. DANIEL FELIPE ARIAS GONZALEZ C.C 1113310674 DE SEVILLA VALLE Tecnólogo en topografía

3

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

3.3	**Estudio de suelos:** Para el estudio de suelos, se recibieron varias cotizaciones de las cuales, la única empresa que quiso continuar y sostener su oferta fue Ingesuelos para la elaboración de estudios de laboratorio, estas cancelaciones de las ofertas se deben por las situaciones de conflicto que vive la zona a realizar el trabajo. Es así, como el comité determinó elaborar el estudio de suelos con Ingesuelos, el cual oferto sus servicios por valor de $ 1´700.000 más IVA, para un total de $2.100.000; fue el único que estaba de disponible para ingresar a la zona a prestar el servicio. El servicio se debe cancelar 50% inicial para el acceso a la zona y el saldo 50% se paga a la entrega del informe en transferencia directa al proveedor. Por otra parte, se indica que el pago inicial se realiza en efectivo mediante dinero prestado al presidente de la junta. INGSUELOS www.ingsuelos.com.co CL-B-01-2024-v0 Florencia, Caquetá 29/04/2024 **VEREDA LA FLORIDA. ZONA RURAL DE CURILLO.** **Asunto:** Propuesta económica –estudio de suelos mediante apiques y CBR sobre muestra inalterada. Respetados, A continuación, se presenta la propuesta económica. **ITEM** | **Parámetro o Ensayo** | **Unidad** | **VR PARCIAL** 1 | Apique hasta 1.50m con toma de muestras para ensayos de clasificación y CBR inalterado. (Incluye ensayo de cono dinámico) | Global | $1.700.000 **TOTAL ANTES DE IMPUESTOS** | **$1.700.000** **NOTAS** - Los precios para estudio de suelos mediante apiques incluyen viáticos y transporte de personal, muestras y equipos. - Los precios son antes de IVA del 19%. **FORMA DE PAGO** - 50% anticipo. - 50% contra entrega del informe de resultados. **TIEMPOS DE ENTREGA** - 10 días hábiles o a definir con el cliente según requerimientos. **DATOS PARA CONSIGNACIONES** Tipo de Cuenta: Ahorros Entidad: Bancolombia No.: 466-125542-69 Nombre: INGSUELOS S.A.S. NIT: 900.648.551-3 Cordial Saludo, **GERMAN GARCIA DIAZ** **GERENTE** Ing. Civil, M. Sc. Geotecnia. [redacted]

4

INVIAS CAMINOS COMPLEMENTARIOS DE LA GENTE

3.4

Materiales de Ferreteria:
Se Realiza la cotización en tres ferreterias y con la ferreteria de la ciudad de Florencia, ALMACENES CORAL ofertó los precios más bajos que en belén de los Andaquies y San Jose de Fragua. Por lo tanto, se toma la decisión de adquirir los materiales en ALMACENES CORAL. Se pagará 50% inicial por transferencia al tercero y el saldo en un segundo pago para la entrega final de materiales, transferencia directa al proveedor.

CORAL
WILMER MONTAÑA LONDOÑO
Cotización
Nº 4406

Item	Código	Descripción	unidad	Cantidad	V/Unitario	Valor Total
1	10000006	CEMENTO CEMEX GRIS X 50 KILOS	UND	10,000	$ 25,000	$ 25,000,000
2	10000107	VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.5MM.)	UND	750	$ 15,000	$ 11,500,000
3	10000155	ALAMBRE NEGRO # 18/LB	UND	182	$ 5,000	$ 1,000,000
4	10000400	PUNTILLAS CON CABEZA 2 1/2 " PUNA	UND	10	$ 600	$ 36,000
5	10000398	CHEMITILLA ANTIDERRAMES PLASTICA BELLOTA	UND	3	$ 20,300	$ 660,000
6	10000020	BARRA FORJADA DE 1/8 LIBRAS	UND	2	$ 34,500	$ 285,000
7	10000076	PALA REDONDA NO 2	UND	6	$ 18,000	$ 108,000
8	10000015	PALIN INTENSIVE CAL. 16 HERRAJADO	UND	3	$ 17,057	$ 51,172
9	10000387	CARO PALA	UND	9	$ 8,000	$ 72,000
10	10000380	ALMADANA HERRADO CON CARO (PARCITA GRANDE 16 LIBRAS)	UND	1	$ 85,000	$ 105,000
11	10000031	CUCHILLA PROFESIONAL CORNETA 10"	UND	1	$ 98,000	$ 98,000
12	10000029	MALLAS PARA CONSTRUCCION	UND	24	$ 5,750	$ 138,000
13	10000246	SEMILLERO EN METAL MADERA 30" LEVANT	UND	2	$ 16,000	$ 32,000
14	10000430	PANTALLA POLIDO 25 MM	UND	3	$ 10,750	$ 37,000
15	10000233	PALLETTE PL. PLASTICO CORNETA #5	UND	3	$ 5,000	$ 15,000
16	10000231	PALLETTE PL. PLASTICO CORNETA #3	UND	1	$ 7,000	$ 7,000
17	10000381	PLASTICO NEGRO 800 MAS 4 MTS	UND	100	$ 600	$ 180,000
18	10000074	...ELDE 3N 5 CLIB X 0.08 EN 1/8	UND	1,000	$ 1,000	$ 1,000,000
19	10000079	...ELDE METANSULAR 100 MM EN 1/8	UND	500	$ 2,400	$ 1,225,000
20	10000240	TELA PP 2" 100M DOBLADA (VERDE RALADA	UND	30	$ 2,000	$ 84,000
21	10000081	CINTA PELIGRO ROLLO X 500 MT	UND	2	$ 30,000	$ 50,000
22	10000079	...CANECA PLASTICA 55 GL	UND	3	$ 128,000	$ 384,000

Subtotal $ 38,998,335.00
Descuento $ 0.00
Iva 19% $ 10,000,000.00
Descuento 5% $ 592,334.00
Iva 19% $ 9,992,840.00
Iva 5% $ 14,0.0.00
Total $ 43,972,172.00

Forma de Pago: EFECTIVO
Validez oferta: 30 DIAS
Garantia:
Tiempo de entrega: 1 DIAS
Lugar de entrega: EN PRADUSTA, LIBRE DE DESCARGUE Y ENTREGAS PARC

CUENTAS A CONSIGNAR
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE: 84700000041 A NOMBRE DE Wilmer montaña Londoño. NIT: 1.117.804.578

Digitador:

5

INVIAS CAMINOS COMPLEMENTARIOS DE LA GENTE

3.5

Materiales Pétreo:
En el proceso de cotización de materiales pétreos se recaudó dos cotizaciones: playa la raya del municipio de Albania y la trituradora de Morelia, se tomó la decisión de comprar el material pétreo con Multimezclas y agregados ubicada en el Municipio de Morelia, quien oferta todo el material requerido y al mejor precio. Por las condiciones de pagos se decide pagar el 50% anticipado inicial en efectivo y el saldo 50% se paga a la entrega final de los materiales en transferencia directa al proveedor. Por otra parte, se indica que el pago inicial se realiza en efectivo mediante dinero prestado al presidente de la junta.

MULTIMEZCLAS & AGREGADOS
VENTA DE MATERIALES
CALIDAD, PROFESIONALISMO Y CUMPLIMIENTO

Fecha	Mayo 2024
Empresa	VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CURILLO
Nit	901269506-9
Contacto	3208413717
Celular	
Cotización	Morelia

Material	Precio/m3 antes de IVA	Cantidad Raquerida	Total
Gravilla 1/2"- 1 viaje de 6m3	$ 83.333	6	$ 500.000
Gravilla 3/4"- 1 viaje de 6m3	$ 83.333	6	$ 500.000
Base Granular"-1 viaje de 6m3	$ 60.000	6	$ 360.000
Arena triturado 1/2"-1 viaje de 6m3	$ 58.333	6	$ 350.000
Arena triturada3/8"-1 viaje de 6m3	$ 30.000	6	$ 180.000
		SUBTOTAL	
		IVA| 5	
		TOTAL	
Nota	*Material cargado en playeta		
	**Material cargado en playa		

Cordialmente: Daniel Alberto Gonzalez arcil

Para consignaciones o transferencias bancarias

Banco	Cuenta	No. cuenta
Banco Bogotá	Ahorros	244-074-878
Bancolombia	Corriente	481-30500-787

6

INVIAS CAMINOS COMPLEMENTARIOS DE LA GENTE

3.6

Materiales Pétreo:
De las cotizaciones presentadas para el alquiler de maquinaria se escogió la que tenía los precios más favorables para la junta, el menor tiempo de Standby y que ofrece las facilidades de pago. Se paga 50% inicial y 50% al final del servicio con transferencia directa al proveedor.

ALQUILER DE MAQUINARIA
ZM

Belén de los Andaquíes, 22 de mayo de 2024

Cotización: **BA-0015-2024**

Señores
Junta de Acción Comunal de la Vereda la Florida

Asunto: **Cotización Alquiler de equipos para JAC del municipio de Curillo Caquetá**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, se realiza la cotización de las maquinarias relacionadas en la solicitud.

Términos de cotización:

- Precios sin IVA.
- Precios fijos (no incluye transporte).
- Los días de trabajo son de Lunes a Sábado.
- Standby de 3 horas para los días que no se trabaje.
- Se relaciona precio del transporte de la maquinaria
- Se incluye servicio de volqueta para el transporte de materiales.

Item	Equipo / Maquinaria	Unidad	Cantidad	Standby	V/ Unitario	V/ Total
1	Retroexcavadora	Hora	50	3	$170.000	$ 8.500.000
2	Motoniveladora	Hora	80	3	$200.000	$ 16.000.000
3	Vibro Compactador	Hora	50	3	$160.000	$ 8.000.000
4	Transporte de Maquinaria	Servicio	3		$1.600.000	$ 4.800.000
						$ 31.300.000

Item	Equipo / Maquinaria	Unidad	Cantidad	Standby	V/ Unitaria	V/ Total
5	Volqueta	Trayecto	1		$1.000.000	$ 1.000.000

Forma de pago: 50% anticipado – 30% parcial – 20% al finalizar.

Sin otro particular,

CARLOS ZAMBRANO
CARLOS ZAMBRANO CORTES
CC. 1.081.362.496
Belén de los Andaquíes

7

INVIAS CAMINOS COMPLEMENTARIOS DE LA GENTE

3.7

Examen médico ocupacional:
Después del análisis de las cotizaciones se eligió en comité que LABOREMOS SAS, sea el que realice los respectivos exámenes de pre ingreso ya que nos ofrece el servicio de examen médico ocupacional virtual y con buen precio. Se decide realizar este pago en efectivo para adelantar los procesos ya que tuvimos retrasos al inicio de estos procesos.

Laboremos
Seguridad, Salud y Ambiente
Medicina Laboral y Salud Ocupacional

Florencia, 07 de mayo de 2024

Señores: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA**
NIT: 901269506 - 9
Ciudad

Asunto: Cotización Examenes Médicos Ocupacionales.

Cordialmente me permito presentar el listado de servicios y precios de los Valoraciones Ocupacionales que ofrecemos en nuestra IPS, con el fin de satisfacer dichas necesidades de nuestra empresa **LABOREMOS** para la prestación de los servicios

A continuación, relacionos los exámenes con su respectivo valor.

Tarifas para toma de exámenes en IPS laboremos Florencia

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	VALOR UNITARIO Type I
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular (ingreso, periódico, retiro por telemovilidad)	$ 60.000

* Se prorata día y se cobra acompañamiento desde el área de medicina laboral.

Atentamente,

JORGE ANDRES BOLIVAR GOMEZ
Representante Legal
C.C 79.987.207
Cel: 3118881843 - 3053626732

8

INVIAS CAMINOS

3.8

Examen médico ocupacional:
De las cotizaciones presentadas para el alcuiler de maquinaria de equipos menores y se escogió la que tenía los precios más favorables para la junta, el cual se pagará 50% inicial y 50% al finalizar el servicio, con transferencia directa al proveedor.

H&D CONSTRUEQUIPOS
Herramientas Y Diseño
Nit. 17.689.556-2

Florencia 07 JUNIO 2024

Señores: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA**
NIT: 901269506-9
Ciudad

Asunto: Cotización Alquiler Herramientas.

Cordial saludo

En atención a la invitación de cotizar, me permito relacionar a continuación detalles:

OBJETO	VR ALQUILER MES
VIBRO DE CONCRETO ELECTRICO O A GASOLINA	$350.000
MEZCLADORA DIESEL 1 BULTO	$800.000
PLANTA ELECTRICA 8500W DIESEL	$1.000.000
MOTOGUADAÑA A GASOLINA 3" CON GUIDS	$400.000

La anterior cotización no incluye IVA. Detalles y cantidades se especifican en el momento de la entrega, el pago se realiza por anticipado.

Agradezco su amable atención a la presente cotización esperando una positiva respuesta.

CORDIAL SALUDO

LUIS EDWIN CARDOSO CAICEDO
NIT.17.689.556-2
Cra 30 # 24-91 ciudadela habitacional
Tel. 3123042267

9

INVIAS CAMINOS

3.9

Transporte Material Ferretería:
De las cotizaciones presentadas para transporte de materiales de ferretería se escogió la que tenía los precios más favorables para la junta y el que nos realiza la entrega en la obra.

Florencia, junio 06 de 2024

Señores
Junta de Acción Comunal Vereda La Florida
Curillo - Caquetá

En respuesta a su solicitud de cotización nos permitimos ofrecerle el siguiente servicio:

	Descripción del Producto	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	TRANSPORTE MATERIALES DE FERRETERIA FLORENCIA – VEREDA LA FLORIDA OBRA	5	$1.000.000	$5.000.000
	TOTAL			**$ 5.000.000**

Condiciones:

Validez de la oferta: 15 días calendario.
Forma de pago: 50% anticipo y el otro 50% al finalizar los viajes de transporte.
Lugar de entrega: Vereda La Novia Curillo Caquetá

Dado en Florencia, Caquetá a los 06 días del mes de junio 2024.

Sin otro particular, me suscribo


Camila Andrea Alvarez Arrigui
Representante Legal

10

INVIAS CAMINOS

3.10

Maderas:
Después del análisis de las cotizaciones se eligió en comité que: Edgar Aldana es la persona seleccionada para suministrar la madera. El pago se realiza el 100% en transferencia al tercero.

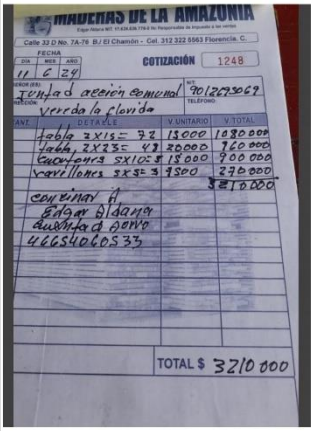

11

INVIAS CAMINOS

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1	Se analizaron cada una de las cotizaciones y se tomó la decisión de elegir a los proveedores que realizaran los suministros de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto y por ende se eligieron a las siguientes empresas: ✓ Cotización Para Dotación: RPM SUMINISTROS Y DOTACIONES - VALOR $ **3.225.000 +IVA.** **SELECCIONADA** ✓ Topografía: DANIEL FELIPE ARIAS GONZALEZ VALOR $ **1.600.000** **SELECCIONADA** ✓ Laboratorio: ING. SUELOS VALOR $ **1.700.000 MAS IVA** **SELECCIONADA** ✓ Materiales de ferretería: ALMACEN S CORALITHRA **SELECCIONADA** ✓ Material Pétreo: MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS, **según los metros requeridos** **SELECCIONADA** ✓ Maquinaria Amarilla Alquiler: CARLOS ZAMBRANO CORTEZ **SELECCIONADA** ✓ Transporte de Material Pétreo: CARLOS ZAMBRANO CORTEZ **SELECCIONADA** ✓ Exámenes Médicos: LABOREMOS VALOR **30.000** **SELECCIONADA** ✓ Alquiler Equipos Menores : H&D CONSTRUEQUIPOS **SELECCIONADA** ✓ Transporte de materiales de ferretería: Camila Andrea Álvarez Arrigui **SELECCIONADA** ✓ Madera: **Edgar Aldana** **SELECCIONADA**

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos			
1	Informe Técnico de Avance:	SI ____	NO __X__	No. Folios: _____
2	Informe Ejecución Financiera:	SI	NO X	No. Folios:
3	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO ___X_	No. Folios: _____
4	Informe Medidas Ambientales:	SI	NO X	No. Folios:

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(Se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

12

INVIAS CAMINOS

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
REMITIR LAS ACTAS DEL COMITÉ OPERATIVO	CONTADOR / INGENIERO	08-06-2024
ELABORAR EL PLAN DE INVERSION	CONTADOR / INGENIERO	08-06-2024
PRESENTAR LOS CONTRATOS DE LOS PROFESIONALES	CONTADOR	08-06-2024
ENVIAR EXAMENES LABORALES DE INGRESO.	CONTADOR	08-06-2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Cargo: Director Interventoria

Nombre: MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY
Cargo: Presidente OAC La Florida

Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Cargo: Residente Interventor

Nombre: JADER ACOSTA IMBACHI
Cargo: Contador OAC La Florida

Nombre: RAÚL VELANDIA CRISTANCHO
Cargo: presidente Veeduría Ciudadana

Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO S.
Cargo: Residente de Obra.


<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

13

4.9.4. ACTAS DE REUNIÓN

Se anexa acta de socialización



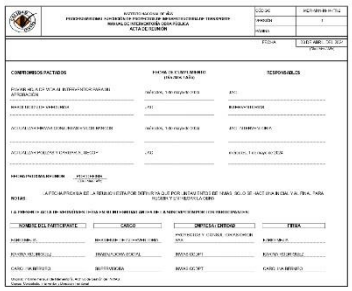

1. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1 Información general del contrato

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA *No. 4647 de 2023*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	*4647 DE 2023*

CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS*
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*
CONTRATISTA	*PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS*
VALOR TOTAL	*$ 109.303.594*
VALOR ACUMULADO	*$ 109.303.594*
PLAZO INICIAL	*6 MESES*
PLAZO PRORROGA No. 1	6 MESES 9 MESES Y 16 DIAS
PLAZO ACUMULADO	9 MESES Y 16 DIAS
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1	*30 DE ABRIL DE 2024*
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2	*30 DE JUNIO DE 2024*
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3	*30 DE SEPTIEMBRE DE 2024*

*Tabla **2**. Información general contrato 4647 de 2023*

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Se hizo control de calidad en los materiales utilizados y se verificó que estos cumplan con las especificaciones técnicas

Se hizo seguimiento a las obras por medio de visitas periódicas al sitio, donde se verificó que se utilizaron los diseños requeridos por el Invias

Se le hizo seguimientos a los desembolsos realizadas para la ejecución de las obras

2. **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

2.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31/AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023, 3714 de 2023, 4440 de 2023, 3674 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS-FLORIDA-DELCIAS-ASOJUNTAS ALBANIA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	MOTOCICLETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

NUMERO DE PLACA:FIF85G MARCA: BENELLI CILINDRAJE: 500CC MODELO:2023

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: LOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INTERVENTORIA SE LES REALIZARÁ MANTENIIENTO PREVENTIVO TODO LOS 5 DE CADA MES QUE ESTE EN EJECUCION DEL PROYECTO

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato relación de empleado
Anexo planilla pagada del mes de septiembre
Anexo certificación del pago de seguridad social

ORION
901503188-3

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
CRA 83 B # 15-98 CALI E-mail mabelchud@yahoo.com

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

CERTIFICA

Que para la ejecución del contrato de interventoría 4647 de 2023 firmado entre el I**NVIAS**, y **PROYECTO Y CONSULTORIAS ORION SAS** se realizaron los respectivos pagos de seguridad social (**SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA**) durante el periodo de SEPTIEMBRE de 2024, estando a paz y salvo en este periodo.

Para constancia de lo anterior se firma en Cali, Valle del Cauca a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE del 2024

Mabel Perez

Razón Social: **PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.**
Representante legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
C.C 31.577.305 DE CALI
Dirección: CRA 83 B # 15-98 CALI
Teléfono: 3224097491
E-mail mabelchud@yahoo.com
Ciudad: CALI

2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

MES INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIOS: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1315123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00
				TOTAL		$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 109.303.594,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	abr-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2023	$ 109.303.594,00	$ 98.803.594,00		
2	may-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2024	$ 109.303.594,00	$ 88.303.594,00		
3	jun-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2025	$ 109.303.594,00	$ 77.803.594,00		
4	jul-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2026	$ 109.303.594,00	$ 67.303.594,00		
5	ago-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2027	$ 109.303.594,00	$ 56.803.594,00		
6	sep-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00					$ 109.303.594,00	$ 46.303.594,00		
TOTALES		**$ 51.030.000,00**	**$ 11.970.000,00**	**$ 63.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 51.030.000,00	$ -	$ 51.030.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -	$ -	$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -	$ 11.970.000,00	$ 11.970.000,00
VALOR TOTAL	$ 51.030.000,00	$ 11.970.000,00	**$ 63.000.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-37430CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. :

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

2.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 1: 30/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 2: 16/10/2024

VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND


Firma

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo polizas de interventoria

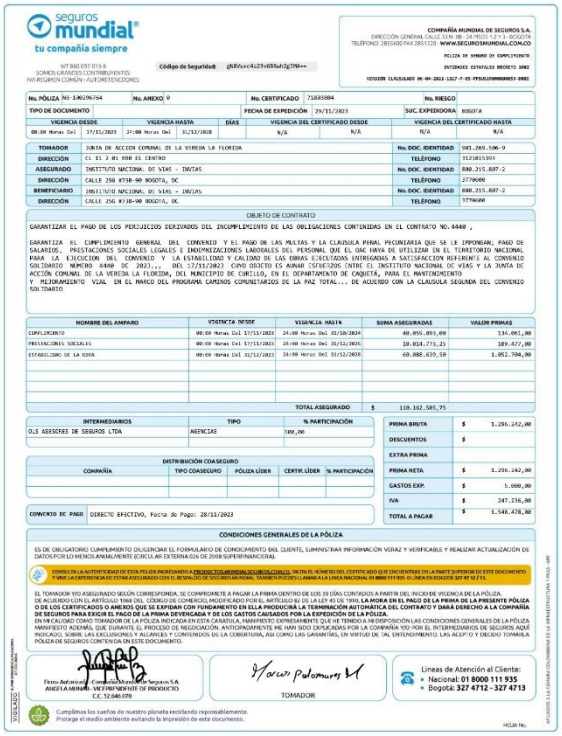

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855500 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

No. PÓLIZA	NB-100196764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	30037A

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4440 ,

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023,., DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.095.095,00	136.083,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	10.014.773,25	189.477,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.088.630,50	1.052.704,00
			TOTAL ASEGURADO	$ 110.162.505,75

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.206.242,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.206.242,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	247.236,00
TOTAL A PAGAR	$	1.548.478,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2018 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MURIEL - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.045.070

Marco Palomares M
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855500 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU520000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100196764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	30037A

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


- TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506 9

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.

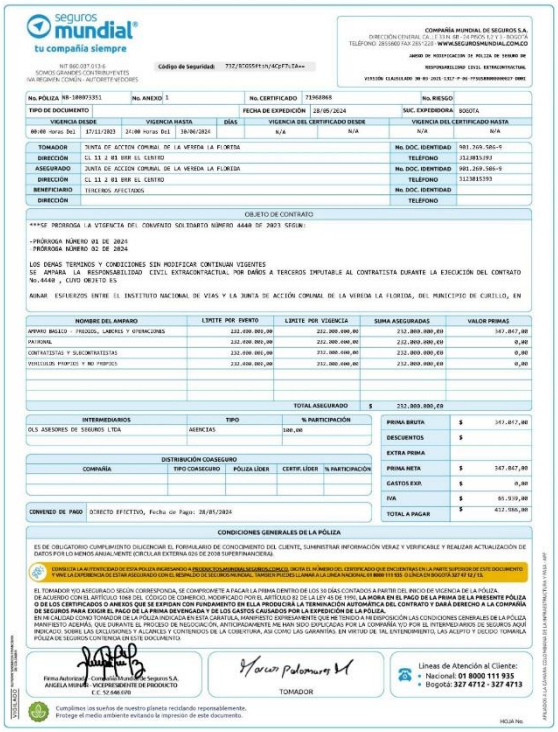

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 732/8C055F11V/4CgF7tIA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL. 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2853720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71968068	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3138815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3138815393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4648 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRÓRROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4648 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.847,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.847,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.847,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	69.939,00
TOTAL A PAGAR	$	417.986,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935, CLÍNICA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA ADELANTE, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENGO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MORENO - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.690

TOMADOR


Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE LA IMPRESIÓN DE LA PÓLIZA - APP

HOJA No.

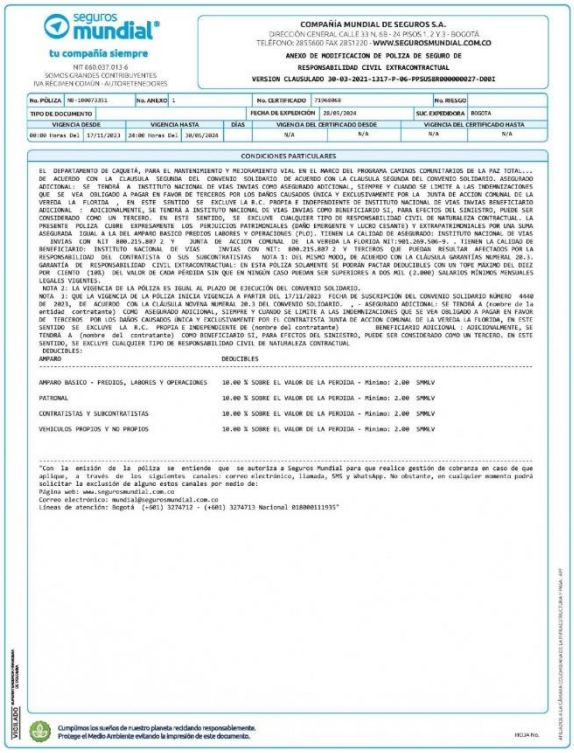

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 660.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2853720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71968068	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9 . TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4648 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. _ - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV


"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electronico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE LA IMPRESIÓN DE LA PÓLIZA - APP

HOJA No.

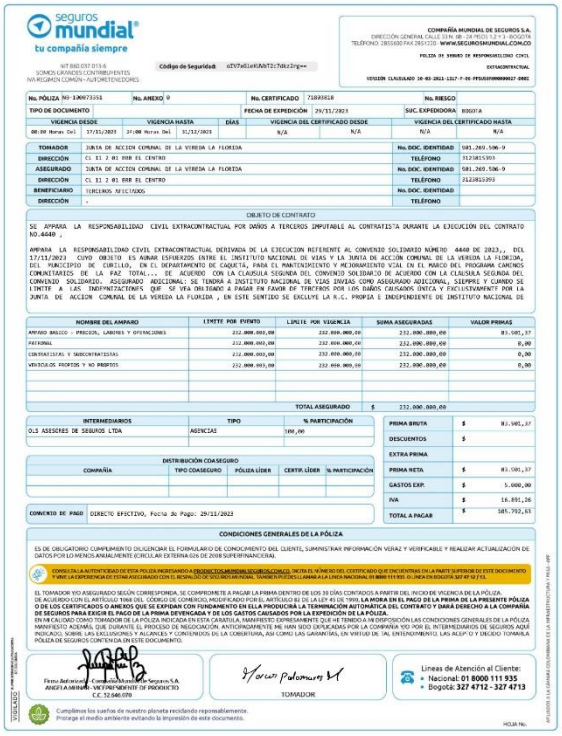

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	0	71893818	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	29/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 RRR EL CENTRO	TELÉFONO	3125815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 RRR EL CENTRO	TELÉFONO	2120810393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4640 ,

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4640 DE 2023,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	83.501,37
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COA SEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	83.501,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	83.501,37
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	16.891,26
TOTAL A PAGAR	$	105.392,63

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARA LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O, DESDE BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE, ME HAN SIDO ENTREGADOS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.686.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALL.E 33 N. 6B-24 PISOS 1, 2 Y 3 - SOCOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	0	71893818	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	29/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENDA LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. TIENDA LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4640 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.


DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.

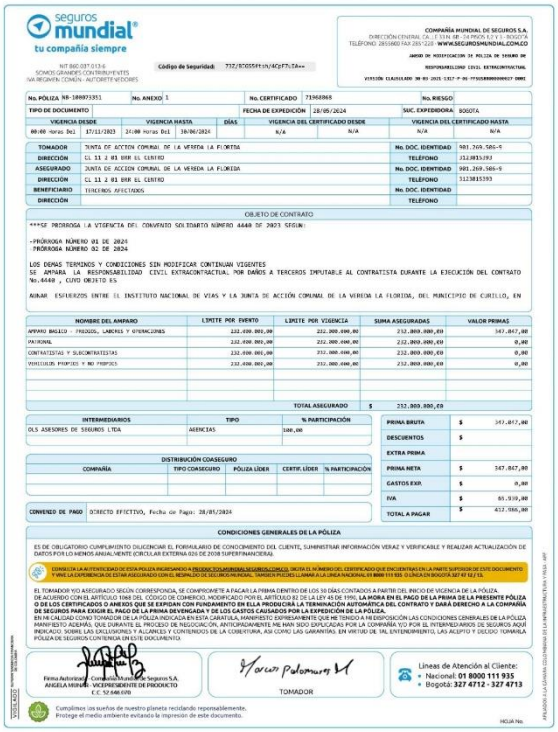

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 732/8C055fttjA/4CpF7cTA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CRA. 7 133A-08 - 14 PISOS 1 Y 5 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUSU0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3124835192
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815193
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	N/A

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRÓRROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.847,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$	232.000.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.847,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.847,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	66.519,00
TOTAL A PAGAR	$	432.366,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE, ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.660.659

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUSU0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL; SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA ; EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO); TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9. ; TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Anexo formato plan de cargas

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ No. 7 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

PLAZO INICIAL: 0,6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2023 (Indique día/mes/año)
PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 16 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 19/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 109.303.594,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 109.303.594,00

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 3230 DE: 15/09/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA: Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costos de Personal	Prima Regional	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.___ de fecha _____: Participación (h-mes)	Valor Total ($)	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	MES H-M	MES VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																															
	1	Director de Interventoria	$ 5.000.000		0,60	$ 2.300.000											$ -	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000			1,50	$ 7.500.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.000.000		4,00	$ 16.000.000											$ -	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	0,37	$ 1.479.999			4,9	$ 19.479.999
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000											$ -		$ -		$ -	0,20	$ 560.000		$ -		$ -	0,20	$ 560.000			0,40	$ 1.120.000
	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,60	$ 1.120.000											$ -		$ -		$ -	0,60	$ 1.120.000		$ -		$ -	0,20	$ 560.000			0,80	$ 1.680.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00																										$ 3.000.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000																													
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000																													
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000																													
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 5.000.000																													
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.000.000																													
	1	Inspector	$ 1.200.000		9,00	$ 9.600.000											$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 600.000	0,50	$ 600.000		$ -			1,0	$ 1.200.000
	1	Inspector SST	$ 1.200.000		0,48	$ 576.000											$ -		$ -		$ -	0,24	$ 288.000		$ -		$ -	0,24	$ 288.000			0,48	$ 576.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 33.916.000,00											$ -		$ 5.250.000		$ 6.370.000		$ 6.098.000		$ 5.850.000		$ 3.325.593		$ 4.658.000			$ 34.551.593	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36											0,00		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36			2,36	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 80.041.760											$ -		$ 12.390.000,0		$ 15.033.200,0		$ 14.391.280,0		$ 13.806.000,0		$ 7.848.399,7		$ 10.992.880,0			$ 81.541.760	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	MES H-M	MES VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 110.000	Dia	$ 4,00	$ 440.000											$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 110.000	1	$ 110.000	2	$ 220.000			4,00	$ 440.000
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 300.000	Mes	$ 13,00	$ 3.900.000											$ -	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000,0	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000,0	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000			8,00	$ 2.400.000
	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trasporte)	$ 2.800.000	Según corresponda por cada	$ 2,00	$ 5.600.000											$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 5.600.000			2,00	$ 5.600.000
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Según corresponda por cada	$ 4,00	$ 1.200.000											$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4	$ 1.200.000			4,00	$ 1.200.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ -	Según corresponda por cada	$ -	$ -											$ -		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 175.000,00	Según corresponda por cada	$ 2,00	$ 350.000											$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 175.000	1	$ 175.000		$ -			2,00	$ 350.000
	1	Papeleria, papeleria higienica, reproduccion de documentos, planos, fotografias, videos, etc	$ 80.000,00	Según corresponda por cada	$ -	$ -											$ -		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 80.000,00	Según corresponda por cada	$ 4,00	$ 320.000											$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 80.000	2	$ 160.000	1	$ 80.000			4,00	$ 320.000
	1	Vivienda Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según corresponda por cada	$ -	$ -											$ -		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 11.810.000,00											$ -		$ 300.000		$ 300.000		$ 600.000		$ 965.000		$ 1.045.000					$ 10.330.000	
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+ (B) + (C) + (D)				$ 91.851.760,00											$ -		$ 12.690.000		$ 15.333.200		$ 14.991.280		$ 14.771.000		$ 8.893.400		$ 10.992.880			$ 91.851.760	
		IVA = 19% * (D) + (E)				$ 17.451.834,00											$ -		$ 2.411.100		$ 2.913.308		$ 2.848.343		$ 2.806.490		$ 1.689.746		$ 2.088.647			$ 17.451.834	
		COSTO TOTAL = (D) + (E)				$ 109.303.594											$ -		$ 15.101.100		$ 18.246.508		$ 17.839.623		$ 17.577.490		$ 10.583.146		$ 13.081.527			$ 109.303.594	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones, se considera necesario prorrogar el contrato de Interventoria No. 4647 de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 para Continuar seguimiento a los convenios que le corresponden. A la fecha se están realizando las actividades preliminares para la ejecución de las obras, sin embargo, para continuar la ejecución de las actividades para la construcción de obras sin afectar el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas. surge la necesidad de prorrogar el contrato de interventoria. Como consecuencia de lo anterior, esta interventoría solicita realizar prorroga al contrato 4647 de 2023, toda vez que se requiere realizar apoyo en campo con las comunidades como desarrollo de la etapa preliminar y de ejecución de las obras lo que implica el tiempo necesario y de esa manera garantizar el seguimiento y control a los correspondientes convenios.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: LEIYO MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:
NOMBRE: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se le recomienda al contratista utilizar materiales de buena calidad pétreos y de ferreterías que cumpla con las especificaciones técnicas

8. ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

A la fecha no se ha recibido correspondencia

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

	
PLACA HUELLA 100% A=5 M E=15 CM	PLACA HUELLA 100% A=5 M E=15 CM
	
PLACA HUELLA 100% A=5 M E=15 CM	PLACA HUELLA 100% A=5 M E=15 CM

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

Se anexan foto de la socialización

	
Socialización vereda florida acompañamiento INVIAS	**Socialización vereda florida acompañamiento INVIAS**

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

60

Lunes 2 Septiembre 2024

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes

Equipo en obra: Mezcladora: 6 horas
Vibroconcreto: 6 horas

Actividades realizadas:
- Dos miembros de la comunidad deciden ayudar est día ya que sera de Fundición.
- Se Funde cuneta costado derecho en su totalidad
- Se trabaja hasta las 6 Pm.

Scanned with CamScanner

61

Martes 3 Septiembre 2024.

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes

Equipo en obra: Mezcladora: 4 horas
Vibroconcreto: 4 horas.

Actividades realizadas:
- Se encofra el bordillo Izq en su gran totalidad
- Se funden 100 metros de bordillo Izq con ayuda en la tarde de 2 miembros de la comunidad.

Scanned with CamScanner

62

Miercoles 4 Septiembre 2024.

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudante

Equipo en obra: Mezcladora: 4 horas
Vibroconcreto: 4 horas.

Actividades realizadas:
- Se termina de encofrar el bordillo Izq y se Funde.
- Se encofra todo el bordillo derecho.
- Se realiza limpieza de la placa huella.
- Se funde el bordillo derecho con ayuda de dos miembros de la comunidad.

Scanned with CamScanner

63

Jueves 5 septiembre 2024.

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra:

Actividades realizadas:
- Se desencofra la fundido, se retira toda la madera de la obra, se recoge basura, Se lava la placa huella, Se recoge y entrega al presidente y la comunidad los elementos sobrantes de obra.
- Se entrega la obra por parte del ing y el maestro al presidente y la JAC. Tal y como esta en la cartilla de caminos rurales de invías.

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S
Matricula No. 2520237430CND

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°06

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4647-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:
3714 de 2023

PERIODO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Elaboró:	***Revisó:***	***Aprobó:***
Ing. FABIO JESUS MEJIA *Mat: 2520256474 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*
CARGO: *Residente de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*
Fecha: *30 de SEPTIEMBRE de 2024*	***Fecha:*** *30 de SEPTIEMBRE de 2024*	***Fecha:*** *30 de SEPTIEMBRE de 2024*

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3714 de 2023 **Contratista:** JAC VEREDA LAS IGLESIAS

Contrato de Interventoría No. 4647 de 2023 **Interventoría:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORIN SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** SEPTIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	141-142
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	143
1	**INTRODUCCIÓN**		144
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		145
2.1	Localización		146
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		147
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		148-151
2.4	Características técnicas del proyecto		152-155
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		156
3.1	Información general del contrato		157-160
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		161
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		162-166
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		167
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		168
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	169-177
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	178
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	179
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	180
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	181
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	182
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	183
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	184
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		185
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	186
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	187
	• Seguimiento Programa de Obra		188
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	189
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	190-195
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	196
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	197-200
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		201
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		202
5.3	Informes especialistas y profesionales		203-210
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		211
5.5	Informe matriz de riesgos.		212
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		213
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	214
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	214-220
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	221
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	222
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	223
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	224
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	225
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	226
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	227
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		228
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		2229
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		230
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		231
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		231-233

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:
ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se relaciona adjunto el formato diligenciado del resumen del estado general del proyecto, se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto, en el cual se evidencia que el contratista de obra ya inicio obra, presentando un avance físico y financiero del 56,85%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 3714. de 2023

OBJETO: ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 45286
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 45657
PLAZO DE VENCIMIENTO PRORROGA 1 45412
PLAZO DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : 198908738
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): 0
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
ANTICIPO CONCEDIDO: 0
ANTICIPO AMORTIZADO: 0

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	PLACA HUELLA	ML	158
	ALCANTARILLA DE 36"	UNIDAD	1
	Rehabilitación		
	Túneles		
	Puentes		
Estructuras	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	PLACA HUELLA	ML	$ 10.500.000,00	$ 113.071.572,00
	ALCANTARILLA	UND	$ 43.110.094,73	$ 4.311.009,73
	Rehabilitación			
	Túneles			
	Puentes			
Estructuras	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 120.919.289,94	28.363.784,06	$ 149.283.074,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 149.283.074,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 58.494.736,44	13.720.987,56	$ 72.215.724,00	$ 72.215.724,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SE				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				$ 72.215.724,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 95.000.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 87.000.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	$ 8.000.000,00

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1
vaciado de concreto para huella reforzado





Foto 2
vaciado de concreto para huella reforzado

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. LOCALIZACIÓN 7
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 8
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 3714 de 2023 11
3.1INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES .12
3.3SEGUIMIENTO ITEN NO PREVISTO
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12
4.1. INFORME SEMANAL 12
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 15
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 18
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 20
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 20
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 21
4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA .23
4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 30
4.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 30
4.10. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 31
4.11. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 32
4.12. ACTAS DE REUNIÓN 34
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 21
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 21

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR……21

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA22

6.1 EQUIPOS Y VEHICULOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA……22

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……22

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL……22

6.5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS……22

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……..23

8. ANEXOS……24

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO……24

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS……24

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS……..24

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE……24

4. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidario.

En este informe se presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.06** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTEIEMBRE DE 2024** el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**. Hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los siguientes convenios:

- ✓ **Convenio No. 4440 de 2023 con número de proceso SPSC-CD-CS-886-2023, y que tiene por objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS IGLESIAS, DEL MUNICIPIO DESAN JOSE DEL FRAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**.

ANTECEDENTES

La economía del municipio está basada en la agricultura, complementada con la ganadería, la coca y aprovechamientos forestales

A el municipio de San José del Fragua, Curillo y Albania se accede por la ruta troncal del Llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por la empresa Coomotor Por vía terrestre, además de su vecina, se accede por Villavicencio en el vecino departamento del Meta en el norte, Mitú (Vaupés) al este y Leticia (Amazonas) en el sur.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente,

proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

San José del Fragua, Currillo y Albania son municipios del departamento del Caquetá, en Colombia localizado en la Zona sur del país, en la región Amazonia. Con 88 965 km² es el tercer departamento más extenso —por detrás de Amazonas y Vichada

Los puntos a intervenir en las iglesias se localizan en las siguientes coordenadas:

Sector Tramo de vìa 1 01°21’ 43.96” N - 075° 56’ 0.70” W 1.50 m 2 01°21’ 36.01” N - 075° 55’ 58.40” W 1.50 m
Alcantarilla S1 01°21’ 36.71” N - 075° 55’ 58.92” W 3.00 m



2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a la asociación de junta de Albania (la arenosa), vereda las delicias, florida del municipio de Currillo y la **VEREDA IGLESIAS** del municipio de San José del Fragua, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos.

Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.
.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

CONVENIO 3714 – 2023:

OBJETO "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS IGLESIAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**."

La vereda Iglesias del Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA está ubicada aproximadamente a 10 kilómetros del casco urbano y limita con las veredas los guacharos, , dicha vereda posee una vía terciaria con una extensión aproximada de 40 km.

El tramo a intervenir lleva por nombre subida la cueva de los guacharos" , el estado general de la superficie o rodadura presenta hundimientos puntuales a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias los cuales impiden la transitabilidad de cualquier tipo de vehículo en época de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es de 6 m aproximadamente. No cuenta con cunetas, carece de obras hidráulicas y falta realizar mantenimiento a las existentes, se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

Estas vías no cuentan con obras de artes.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	
ALCANCE DEL PROYECTO	*LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS", PARA LO CUAL SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA VISITA TÉCNICA REALIZADA POR LOS PROFESIONALES DESIGNADOS POR EL INVIAS, EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL - OAC, EN DONDE SE REALIZÓ UNA CONCERTACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR, UTILIZANDO LOS DISEÑOS TIPO ESTABLECIDOS EN LA CARTILLA DE OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURALES VIALES, NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONVENIO Y PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DEL SECTOR A INTERVENIR.*
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CONVENIO 3714 – 2023	*CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA DE 158 ML Y LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES PRESENTADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES.* *UNA ALCANTARILLA CIRCULAR, COMO ELEMENTO DE DRENAJE TRANSVERSAL SE TRABAJARÁ CON TUBOS DE 36" DE CONFIGURACIÓN TIPO ALETA-ALETA LA CUAL PERMITE, ADEMÁS DE RECIBIR Y EVACUAR LA ESCORRENTÍA APORTANTE POR LAS*

	CUNETAS Y FILTROS, DAR CONTINUIDAD A CAUCES CON FLUJOS INTERMITENTES O EFÍMEROS. *ESPECIFICACIONES DE DISEÑO:* *-CONCRETO: F'C 21MPA* *-ACERO CORRUGADO: FY 420MPA*

Tabla 8. Características técnicas del proyecto

5. NFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No.3714 de 2023

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VEREDA IGLESIAS

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA No. 3714 de 2023

TIPO DE PROCESO	*CONTRATACIÓN DIRECTA*
NÚMERO DE PROCESO	*SPCS-CD-CS-438-2023*
CONVENIO NO.	*3714 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS*
OBJETO	*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA IGLESIA, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..*
CONTRATISTA	*JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA IGLESIA*
NIT	*: 8280016751.*
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – PGN	*$197.908.738,00*
RECURSOS PROPIOS	*$1.000.000*
VALOR TOTAL	*$198.908.738,00*
ADICIONES	*$ 0.00*

FECHA DE INICIO	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*31 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 01	*30 DE ABRIL DE 2024*
FECHA PRORROGA NO.2.	*30 DE JUNIO DE 2024*
FECHA PRORROGA No. 3	*30 DE SEPTIEMBRE DE 2024*
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 4	*30 de SEPTIEMBRE DE 2024*

Tabla 9. Información general convenio 3714 de 2023

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- **FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO Fy 4200MPA:** Se realizó corte y doblado de barras corrugadas permitiendo obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño de las huellas, cunetas y bordillos

En el transcurso del mes se hicieron actividades como vaciado de concreto y vibrado huella reforzada, concreto ciclópeo. El porcentaje de obra ejecutado a la fecha es del 56,85% correspondiente a un valor de $113.071.572

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han presentado ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Realizar visitas periódicas para seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando medidas y que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto

Se le hizo control de calidad a los materiales y agregados utilizados para las mezclas

Se tomaron muestras de mezclas para los cilindros

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Semana 1 septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA: 1 | FECHA: 10/09/2024 (dia/ Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA | SEMANA No.: 20 del 1/09/2024 al 7/09/2024 | Último Informe Semanal N°: 7 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS ELESGAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato)

158 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA DE 36" , NUEVO ALCANCE 130 ML Y UNA PLACA HUELLA DOBLE DE 36"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS ELESAS	INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
		INTEGRANTES:	UNICO
CONVENIO No.	3714 de 2023	CONTRATO No.	4647 DE 2023
FECHA DE INICIO:	29/12/2023	FECHA DE INICIO:	29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/06/2024	FECHA DE VENCIMIENTO:	30/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024
VALOR INICIAL:	$ 198.908.736,00	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
VALOR ADICIONES:	-	VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO	$ 198.908.736,00	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.908.736	$ -			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 74.715.724			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 124.193.014			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 91.559.531			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 17.744.063			$ 5.914.688

(Ejecutado de la vigencia correspondiente al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.283.074,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 62.000.000,00	42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 59.000.000,00	39,5%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 3.000.000,00	2,0%
ADMINISTRACIÓN	$ 15.715.724,00	8%
PAGA	$ -	
APORTES JAC	$ -	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 77.715.724,00	39,1%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 74.715.724,00	37,6%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 3.000.000,00	2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.500.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.000.000,00	2%

Observaciones: la obra presenta un avance del 37,6 % Se vacio concreto de 3000 psi para las una cara de la alcantarilla. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 33%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 91.559.531,00	83,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 21,5% | Avance o Atraso Físico %: 0,0%
Meta Física Ejecutada %: 21,5%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PLACA HUELLA	ML	130
ALCANTARILLA 36" DOBLE	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.					
Ejec.					
Prog.		$ 3.000.000,00		$ 32.110.064,73	21,5%
Ejec.		$ 3.000.000,00		$ 32.110.064,73	21,5%
Prog.					
Ejec.					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR		
PAJARITA		
MEZCLADORA	1	1
BANIA	1	1
Total		0

* El interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (De debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: 01°21' 43.98" N -075° 56' 0.70" W PLACA HUELLA
TRAMO Y/O SECTOR 2: 01°21' 36.71" N -075° 55' 58.92" W ALCANTARILLA DE 36"
TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:En la obra se estan presentado fuertes lluvias y no se a podido avanzar como se tiene programado.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	MACACA SAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO ____
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO ____

OBSERVACIONE:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI X	NO ____	N/A ____	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO ____	N/A ____	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO X	N/A ____	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO ____	N/A ____	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A X	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A X	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A X	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A X	

OBSERVACIONES EN EL SITIO SI DISPUSO DE ZONAS PARA DEPOSITOS

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTE DOCUMENTO SE REEMPLAZO POR EL PGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 31 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PROGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se realizó encofrado de muros, instalacion de barra No. 3 en muros de encole y amarre de acero para placa huella, cuneta y bordillos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa iniciar con la placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO
EJECUTADO

MAN. MANTENIMIENTO | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO | SEÑALIZACION

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



refuerzo para aletas de alcantarilla y encofrado



refuerzo para aletas de alcantarilla



vaciado de concreto de 3000 psi

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: YAIMO JESUS MEJIA MADERA
Matrícula Profesional No.: 25202561726CND

NOT A: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

Copia: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratistas, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | EDICIÓN | PÁGINA 1 | FECHA 14/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA | SEMANA No.: 21 del 8/09/2024 al 14/09/2024 Último Informe Semanal no (*): (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CON ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA DE 36" - NUEVO ALCANCE 130 ML Y UNA PLACA HUELLA DOBLE DE 16"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARA DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS
CONVENIO No.: 3714 de 2023 | FECHA DE INICIO: 26/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/12/2024
VALOR INICIAL: $ 198.908.738,00 | VALOR ADICIONES: | VALOR ACUMULADO: $ 198.908.738,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO
CONTRATO No.: 4647 DE 2023 | FECHA DE INICIO: 26/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024
VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00 | VALOR ADICIONES: | VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00 | VALOR ANTICIPO: $ - | VALOR AMORTIZADO: $ - | SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.908.738	$		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 79.715.724		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 119.193.014		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 94.184.531		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 15.119.063		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.393.074,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 68.000.000,00	46%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 64.000.000,00	42,9%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4.000.000,00	2,7%
ADMINISTRACIÓN	$ 15.715.724,00	8%
PAGA	$ -	
APORTES JAC	$ -	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 83.715.724,00	42,09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 79.715.724,00	40,09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.000.000,00	2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.500.000,00	4,35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.500.000,00	3,68%

Observaciones: la obra presenta un avance del 40,09 % la alcantarilla doble de 36% quedó en el 100%. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 8%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 94.184.531,00	86,2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI | NO (X)
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 30,2% | Avance o Atraso Físico %: 8,7%
Meta Física Ejecutada %: 21,5%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PLACA HUELLA	ML	130
ALCANTARILLA 36" DOBLE	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog		$ 6.500.000,00		$ 45.110.084,73	30,2%
Ejec		$ 5.500.000,00		$ 43.110.084,73	21,5%
Prog					
Ejec					

(* El interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el avance físico

TRAMO Y/O SECTOR 1: 0°1'21.43.96" N -075° 58' 0.70" W PLACA HUELLA
TRAMO Y/O SECTOR 2: 0°1'21' 36.71" N - 075° 55' 58.92" W ALCANTARILLA DE 36"
TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:con la obra se estan presentado fuertes lluvias y no se a podido avanzar como se tiene programado.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN: MINEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

OBSERVACIONES EN EL SITIO SI DISPUSO DE ZONAS PARA DEPOSITOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: ESTE DOCUMENTO SE REEMPLAZO POR EL PGA

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTERV
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	-
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIDADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIDADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	-

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 16 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PROGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se desencofró totalmente la alcantarilla de 36" y se le hizo su curado, tambien ingresó la maquinaria amarilla para la nivelacion de la rasante

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa encofrado y vaciado de huellas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO: 30,2%
EJECUTADO: 21,5%

NPN: MANTENIMIENTO | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO | SEÑALIZACIÓN

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



muestras de cilindros y encofrado de las aletas | vaciado de concreto de 30 psi con acero de refuerzo | vaciado de concreto de 30 psi con acero de refuerzo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresio

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 3500254175CND

Semana 3

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1
FECHA	21/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 22 del ######## al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal no **)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

158 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA DE 36" - NUEVO ALCANCE 130 ML Y UNA PLACA HUELLA DOBLE DE 36"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS		
CONVENIO No.	3714 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.908.738,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.908.738,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT	30/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.		
INTEGRANTES:	UNICO		
CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.584,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.584,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.908.738	$		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 99.571.572		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 99.337.166		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.584,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 96.809.531		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 12.494.053		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.293.074,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 82.000.000,00	55%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 76.500.000,00	51,2%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 5.500.000,00	3,7%
ADMINISTRACIÓN	$ 23.071.572,00	12%
PASA	$ -	
APORTES JAC	$ -	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 105.071.572,00	52,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 88.571.572,00	50,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5.500.000,00	3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.000.000,00	9,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.500.000,00	8,37%

Observaciones: la obra presenta un avance del 50,06 % la alcantarilla doble de 36% quedó en el 100%. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 12%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para otra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.584,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 96.809.531,00	88,6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 39,6% — Avance o Atraso Físico %: 21,4%
Meta Física Ejecutada %: 60,6%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	130
*	ALCANTARILLA 36" DOBLE	UND	1
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 14.000.000,00			$ 14.000.000,00	9,4%
Ejec	$ 12.500.000,00			$ 12.500.000,00	8,4%
Prog		$ 6.500.000,00		$ 45.110.094,73	30,2%
Ejec		$ 5.500.000,00		$ 43.110.094,73	52,8%
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluida la medición de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el avance técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: 01°2'1" 43.96" N - 075° 58' 0.70" W PLACA HUELLA

TRAMO Y/O SECTOR 2: 01°2'1" 36.7" N - 075° 55' 58.92" W ALCANTARILLA DE 36"

TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:en la obra se estan presentado fuertes lluvias y no se a podido avanzar como se tiene programado.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	MAEKCA SAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIÓN:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

OBSERVACIONES EN EL SITIO SI DISPUSO DE ZONAS PARA DEPOSITOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTE DOCUMENTO SE REEMPLAZO POR EL PGA

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 31 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PROGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se instaló y se compactó la sub-base para la placa huella, se vaciaron concretos para las huellas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa encofrado y vaciado de huellas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



instalacion y compactacion de sub-base



instalacion de formaletas metalicas y acero de refuerzo



vaciado de concreto de 3000psi para huellas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por ingias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE E DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520259027-BOYA

* Fuente: Unidad Ejecutora, Subdirección de Conectividad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 4

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 1 | FECHA 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 23 del ######## al 30/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

038 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA DE 36" - NUEVO ALCANCE 60 ML Y UNA PLACA HUELLA DOBLE DE 36"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARA DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS	INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.	
		INTEGRANTES:	UNICO	
CONVENIO No.	3714 de 2023	VALOR INICIAL: $ 198.908.738,00	CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 109.393.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198.908.738,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 109.393.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/06/2024		FECHA DE VENCIMIENTO:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA:	$ 198.908.738	$ -		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 113.071.570		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 85.837.168		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.393.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 99.434.531		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 9.959.063		

(Ejecutado de la vigencia correspondiente al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.293.074,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 95.000.000,00	64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 87.000.000,00	58,3%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 8.000.000,00	5,4%
ADMINISTRACIÓN:	$ 26.071.572,00	13%
PASA	$ -	
APORTES JAC	$ -	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 121.071.572,00	60,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 113.071.572,00	56,85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 8.000.000,00	4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.000.000,00	6,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.500.000,00	7,03%

Observaciones: la obra presenta un avance acumulado del 58,3 % la alcantarilla doble de 36% quedó en el 100%. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 26%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.393.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 99.434.531,00	91,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 6.533.956,19

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 48,3% — Avance o Atraso Físico %: 12,5%
Meta Física Ejecutada %: 60,8%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PLACA HUELLA	ML	130
ALCANTARILLA 36" DOBLE	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 13.000.000,00			$ 27.000.000,00	18,1%
Ejec	$ 10.500.000,00			$ 23.000.000,00	15,4%
Prog		$ 6.500.000,00		$ 45.110.094,73	30,2%
Ejec		$ 5.500.000,00		$ 43.110.094,73	45,4%
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR		
PAJARITA		
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total	2	2

se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el avance técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: 01°2'1" 43.66" N - 075° 56' 0.75" W PLACA HUELLA

TRAMO Y/O SECTOR 2: 01°2'1" 36.7" N - 075° 55' 58.92" W ALCANTARILLA DE 36"

TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:en la obra se estan presentado fuertes lluvias y no se a podido avanzar como se tiene programado.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: CAQUETA	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN: MAEKCA SAS	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES EN EL SITIO SE DISPUSO DE ZONAS PARA DEPOSITOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTE DOCUMENTO SE REEMPLAZÓ POR EL PGA

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS, ESTAMOS EN LA RECOLECCION DE LOS FORMATOS AMBIENTALES FINALES Y PODER CERRAR EL COMPONENTE

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 15 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO, MAS SIN EMBARGO ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE LAVEREDA IGLESIAS SE REUNANY DEFINAN LA INVERSION SOCIAL


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua vaciando concretos de 3000 psi para las huellas con su debido refuerzo

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa encofrado y vaciado de huellas, corte y figurado de acero de refuerzo

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE META/S FÍSICAS PROGRAMADAS VS META/S FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


instalacion de formaleta metalica


instalacion de formaleta metalica


proteccion de la huella con neopreno, con el fin de quelas condiciones climaticas no afectenla superficie de la losa

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: PABLO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25200447ACAD

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Anexo formato de la maquinaria y equipos utilizados.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

CONTRATO No. 3714 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS IGLESIAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 — **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORION SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S
RETROCARGADOR	CASE		Vereda las Iglesias	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROCARGADOR	JCB-214S	680 KG	Vereda las Iglesias	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA CONCRETO DIESEL 3600 RPM	KAMA/2020	2 BLT/390LT	Vereda las Iglesias	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	I
PLANTA ELÉCTRICA	DIESEL TOYAMA/DTG 7000	N/A	Vereda las Iglesias	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VIBRO ELÉCTRICO	BOSCH GVC 22 EX		Vereda las Iglesias	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TRONZADORA	MAKITA		Vereda las Iglesias	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2 PLG			Vereda las Iglesias	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
MOTOBOMBA DE 2 PLG			Vereda las Iglesias	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I
PULIDORA	MAKITA		Vereda las Iglesias	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
			TOTAL ACTIVO	3	3	2	0	2	2	2	2	3	2	0	3	4	5	6	6	6	0	6	6	5	6	6	5	0	5	5	4	5	5	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	6	6	7	9	7	7	7	7	6	7	9	6	5	4	3	3	3	9	3	3	4	3	3	4	9	4	4	5	4	4	9

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	109	8,26%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	170	5,29%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma:
Nombre: EINER DUVAN ERASO BUSTOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0619316 CND

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato donde se relaciona todo el personal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3714-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023

NOMBRE ARL: SURA ARL

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
							Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	DIEGO FERNANDO BUSTOS	9.728.085	Maestro de Obra	$ 2.320.000	OAC LAS IGLESIAS	$ 2.320.000	$ 161.500	V	ASMET SALUD	80632992	$ 92.800	PORVENIR	80632992	$ 371.200	$ 92.800	$ -	$ -	NA
2	DAVID MAURICIO BUSTOS	1.193.135.090	Ayudante de obra	$ 1.300.000	OAC LAS IGLESIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	80632992	$ 52.000	PORVENIR	80632992	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	NA
3	WILLIAM CASTRO RAMIREZ	16.189.696	Ayudante de obra	$ 1.300.000	OAC LAS IGLESIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMET SALUD	80632992	$ 52.000	COLPENSIONES	80632992	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	NA
4	JORGE EDUARDO STERLING VILLA	1.006.501.034	Ayudante de obra	$ 1.300.000	OAC LAS IGLESIAS	$ 86.667	$ 3.100	V	ASMET SALUD	80632992	$ 3.500	COLPENSIONES	80632992	$ 13.900	$ 3.500	$ -	$ -	NOVEDAD DE RETIRO
5	JORGE YIRMAR MORA GUERRERO	1.005.045.024	Ayudante de obra	$ 1.300.000	OAC LAS IGLESIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	80632992	$ 52.000	PORVENIR	80632992	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	NA
6	GERARDO ORJUELA YAGUE	1.118.472.916	Ayudante de obra	$ 1.300.000	OAC LAS IGLESIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	80632992	$ 52.000	COLFONDOS	80632992	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	NA
7	DIEGO ALEJANDRO BUSTOS	1.118.474.671	Ayudante de obra	$ 1.300.000	OAC LAS IGLESIAS	$ 520.000	$ 36.200	V	NUEVA EPS	80632992	$ 20.800	PORVENIR	80632992	$ 83.200	$ 20.800	$ -	$ -	NOVEDAD DE INGRES
8	OSORIO BETANCUR JUAN SEBASTIAN	1.043.115.378	Ayudante de obra	$ 1.300.000	OAC LAS IGLESIAS	$ 303.334	$ 21.200	V	NUEVA EPS	80632992	$ 12.200	COLPENSIONES	80632992	$ 48.600	$ 12.200	$ -	$ -	NOVEDAD DE INGRES

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 30/09/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EINER DUVAN ERASO BUSTOS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 91037-0619316 No R2022018372

Firma
Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo certificación del pago de seguridad social

ORDEN DE COMPRA
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS
personería jurídica N.º 360 DE 14-12-73
NIT. 828.001.675-1

San José Del Fragua 01 De octubre del 2024

Señores
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
LEYDI MABEL PEREZ CHUD

ASUNTO: CERTIFICADO SSSI Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE

Cordial saludo,

La suscrita DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ identificada con cédula de ciudadanía número . 26.630.390 representante legal, de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS IGLESIAS** del municipio De San José del fragua Caquetá identificado con NIT 828.001.675-1, ha cumplido y se encuentra al día con las cotizaciones correspondientes a los subsistemas de salud, pensiones y riesgos laborales del Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI); así como con sus obligaciones fiscales, cuando a ellas ha habido lugar, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a las Cajas de Compensación Familiar (CCF) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Lo anterior, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 23 de la Ley 1150 de 2007, 26 de la Ley 1393 de 2010 y demás normas concordantes, y bajo la gravedad de juramento.

Atentamente,

JULIO CESAR INFANTE GUZMÁN
CC. 1.117.532.760 De Florencia
Contador

DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ
Representante legal J.A.C Vereda LAS IGLESIAS
C.C. 26.630.390

OAC Vereda las Iglesias, Teléfono: 314 3529204 Municipio de San José Del fragua – Departamento del Caquetá

Anexo planilla paga del mes de SEPTIEMBBRE de 2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	828001675-1	OAC LAS IGLESIAS	VEREDA LAS IGLESIAS	3223819	empresa095@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		CAQUETÁ	SAN JOSÉ DEL FRAGUA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	02/09/2024	79917941	$1,933,600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	138,800	0		0		0	0	0	0	138,800	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	8,700	0		0		0	0	0	0	8,700	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	102,500	0		0		0	0	0	0	102,500	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	721,300	0	0	0	0	0	0		721,300	8
231001	Colfondos	800227940-4	69,400	0	0	0	0	0	0		69,400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	208,100	0	0	0	0	0	0		208,100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	434,800				434,800	0	0	434,800			4,348	434,800	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF13	Comfaca	891190047-2	250,000	0	0	250,000	10

TOTALES PARAFISCALES


Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	250,000	250,000
Pensión	3	998,800	998,800
Riesgos Laborales	1	434,800	434,800
CCF	1	250,000	250,000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1,933,600	1,933,600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

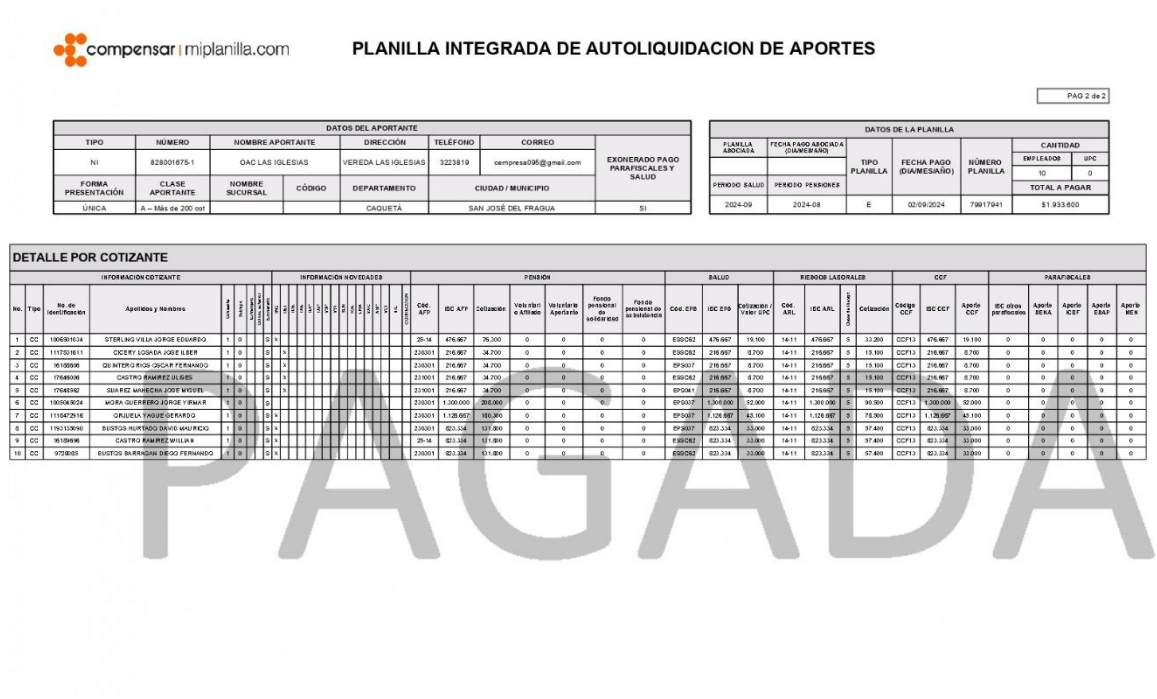

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	828001675-1	OAC LAS IGLESIAS	VEREDA LAS IGLESIAS	3223819	compresa095@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CAQUETÁ	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 10 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E	02/09/2024	79917941	$1.933.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ubicación	Salario Integral	Tipo de Cotizante	Extranjero no obligado a cotizar a pensión	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC - LR	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor Ind. Afiliado	Valor Ind. Aportante	Fondo Pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006391634	STERLING VILLA JORGE EDUARDO	1	0		S	X																25-14	476.667	76.300	0	0	0	0	ESSC62	476.667	19.100	14-11	476.667	5	33.369	CCF13	476.667	19.100	0	0	0	0	0
2	CC	1117516511	OCEPY LOSADA JOSE ELBER	1	0		S	X																230301	216.667	34.700	0	0	0	0	ESSC62	216.667	8.700	14-11	216667	5	15.169	CCF13	216.667	8.700	0	0	0	0	0
3	CC	16188596	QUINTERO RIOS OSCAR FERNANDO	1	0		S	X																230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS037	216.667	8.700	14-11	216667	5	15.169	CCF13	216.667	8.700	0	0	0	0	0
4	CC	17648096	CASTRO RAMIREZ ULISES	1	0		S	X																230301	216.667	34.700	0	0	0	0	ESSC62	216.667	8.700	14-11	216667	5	15.169	CCF13	216.667	8.700	0	0	0	0	0
5	CC	17648582	SUAREZ MANRECHA JOSE MIGUEL	1	0		S	X																230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPSM01	216.667	8.700	14-11	216667	5	15.169	CCF13	216.667	8.700	0	0	0	0	0
6	CC	1005082824	MORA GUERRERO JORGE YIRMAR	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.300	CCF13	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1116472516	GRIJUELA YAGUE GERARDO	1	0		S	X																230301	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS037	1.126.667	45.100	14-11	1.126.667	5	78.300	CCF13	1.126.667	45.100	0	0	0	0	0
8	CC	1193130696	BUSTOS HURTADO DAVID MAURICIO	1	0		S	X																230301	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS037	823.334	33.000	14-11	823.334	5	57.400	CCF13	823.334	33.000	0	0	0	0	0
9	CC	16188596	CASTRO RAMIREZ WILLIAM	1	0		S	X																25-14	823.334	131.800	0	0	0	0	ESSC62	823.334	33.000	14-11	823.334	5	57.400	CCF13	823.334	33.000	0	0	0	0	0
10	CC	9728805	BUSTOS BARRAGAN DIEGO FERNANDO	1	0		S	X																230301	823.334	131.800	0	0	0	0	ESSC62	823.334	33.000	14-11	823.334	5	57.400	CCF13	823.334	33.000	0	0	0	0	0

PAGADA

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3714 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 198.908.738,00	N/A
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 198.908.738,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BASICO DEL CONVENIO	$ 76.950.000,00	$ 18.050.000,00	$ **95.000.000**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 70.470.000,00	$ 16.530.000,00	$ **87.000.000,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6.480.000,00	$ 1.520.000,00	$ **8.000.000,00**
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	$ -	$ -
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 98.067.973,32	$ 23.003.598,68	$ **121.071.572,00**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 91.587.973,32	$ 21.483.598,68	$ **113.071.572,00**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 6.480.000,00	$ 1.520.000,00	$ **8.000.000,00**
*			$ -
VALOR TOTAL			$ **113.071.572,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
residente de Obra Einer Duvan Eraso Bustos
Matrícula Profesio 091037-0619316 CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N 252223743OCND

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Anexo estado general del tiempo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3714 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		240
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas								2			2					2			2									2	2			
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
EN EL TRANSCURSO DEL MES SE PRESENTÓ BUEN CLIMA EN LOS PUNTOS DE INTERVENCION

Firma
Nombre: Einer Duvan Eraso Bustos
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0619316 CND

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se tomarán muestras de concreto en cilindros, que serán llevados para ser analizados mediante resistencia a la comprensión.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se anexan formato de garantías

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 3714 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTAS DE ACCION COMUNAL VEREDA IGLESIAS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/12/2024

PLAZO INICIAL: 3 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 197.908.738

VALOR ACUMULADO: $ 197.908.738
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.344.900,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.344.900,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.781.748,00	16	10	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Dia	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.945.437,00	6	10	2023	6	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.672.621,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3762504-0

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	6	10	2023	6	1	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0933945-9 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: NA

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/10/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 Y 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1 Y 2 **SUSPENSIÓN No.:** 1 Y 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.781.748,00	6	10	2023	30/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Dia	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.945.437,00	6	10	2023	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.672.621,00	30	6	2024	30	6	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3762504-0

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: POR ACEPTAR

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1Y 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1Y 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	6	10	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0933945-9 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: POR ACEPTAR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** 1 Y 2 **SUSPENSIÓN No.:** 1 Y 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.781.748,00	6	10	2023	30	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Dia	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	5	$ 9.945.437,00	6	10	2023	30	9	2029
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.672.621,00	30	9	2024	30	6	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3762504-0

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: POR ACEPTAR

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** 1Y 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	26	10	2023	30	9	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0933945-9 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: POR ACEPTAR

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo pólizas del convenio




SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana




SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

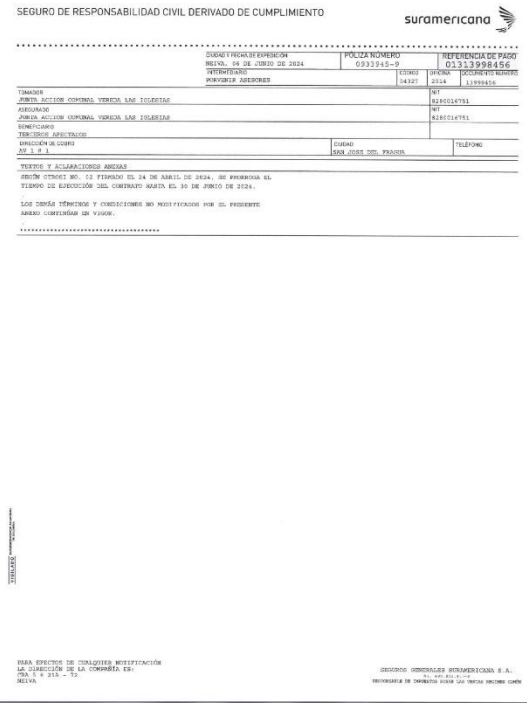

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

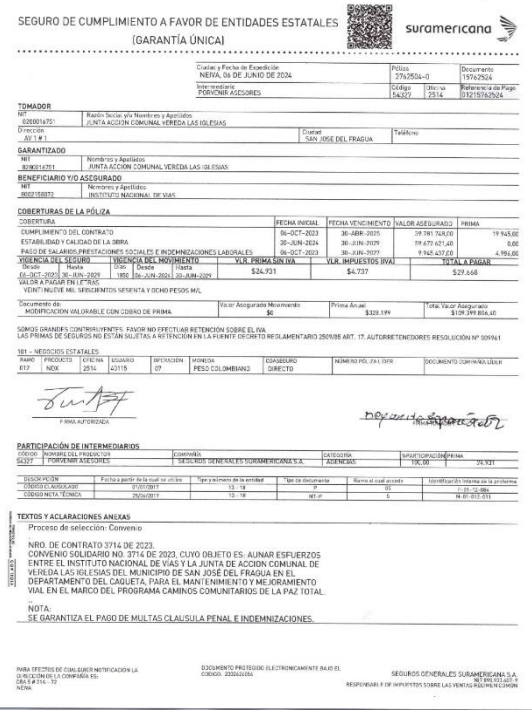

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN: NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024 | POLIZA NÚMERO: 0933945-9 | REFERENCIA DE PAGO: 01313998468

INTERMEDIARIO: PORVENIR ASESORES | CÓDIGO: 54327 | OFICINA: 2514 | DOCUMENTO NÚMERO: 13998468

TOMADOR: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 8280167751

ASEGURADO: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 8280167751

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO: AV 1 # 1 | CIUDAD: SAN JOSE DEL FRAGUA | TELEFONO

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE EXTIENDE | NÚMERO DE LA ENTIDAD | TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO AL CUAL PERTENECE | IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROFORMA

11 - 06 - 2024 | 13 - 18 | P | 4 | F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
8120037625O4. NO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

NRO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
CONVENIO SOLIDARIO NO. 3714 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA:
SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES.

LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

MEDIANTE ANEXO TEXTOS ACLARATORIOS:
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

MEDIANTE ANEXO TEXTOS ACLARATORIOS:
INDICAN QUE LA PÓLIZA TIENE COBERTURA EN TODOS LOS AMPAROS DEL DECRETO 1082, CON COBERTURA DE 200 SMMLV
DISPONIBLES. TOPE MÁXIMO EL 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, NO PUDIENDO SUPERAR EN NINGÚN CASO LOS 2.000 SMMLV

SEGÚN OTROSI NO. 1 FIRMADO EL 20 DE MARZO DE 2024, SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.


LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN EN VIGOR.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA

Seguros Generales Suramericana S.A.

– CLIENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

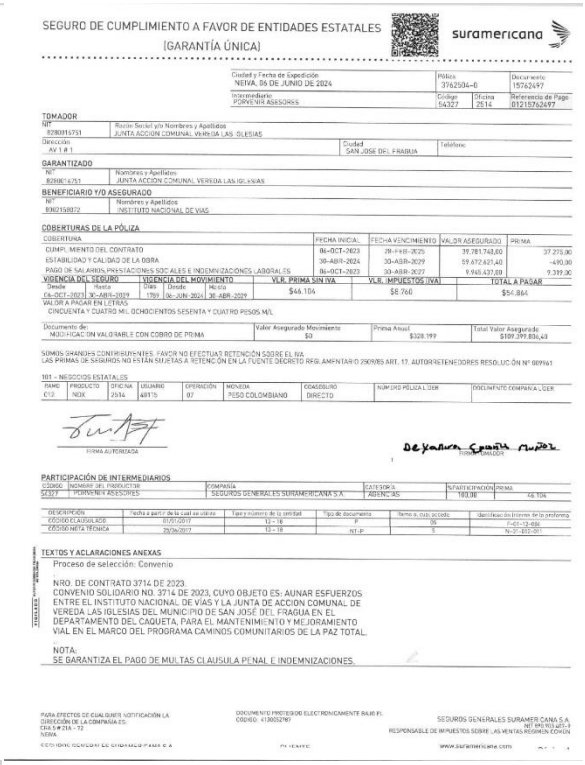

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición: NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024 | Póliza: 3762504-6 | Documento: 15762497

Intermediario: PORVENIR ASESORES | Código: 54327 | Oficina: 2514 | Referencia de Pago: 01215762497

TOMADOR

NIT: 8280316751 | Razón Social y/o Nombres y Apellidos: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

Dirección: AV 1 # 1 | Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA | Teléfono:

GARANTIZADO

NIT: 828016751 | Nombres y Apellidos: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT: 899999092 | Nombres y Apellidos: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-OCT-2023	28-FEB-2025	39.781.743,00	37.275,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-ABR-2024	30-ABR-2029	59.672.614,50	490,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06-OCT-2023	30-ABR-2027	9.945.437,00	9.319,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
06-OCT-2023	30-ABR-2029	1789	06-JUN-2024	30-ABR-2029	$46.104	$8.760	$54.864

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$328.199	$109.399.806,43

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº 000961

101 – NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NUM DE PÓLIZA CEDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA CEDER
012	NGX	2514	48115	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	46.704

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se cobra	Tipo y número de la unidad	Tipo de documento	Nemo a cuyo acceda	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	06	F-01-13-040
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	29/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-3°-013-001

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Convenio

NRO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
CONVENIO SOLIDARIO NO. 3714 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


NOTA:
SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CÓDIGO: 413003787

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

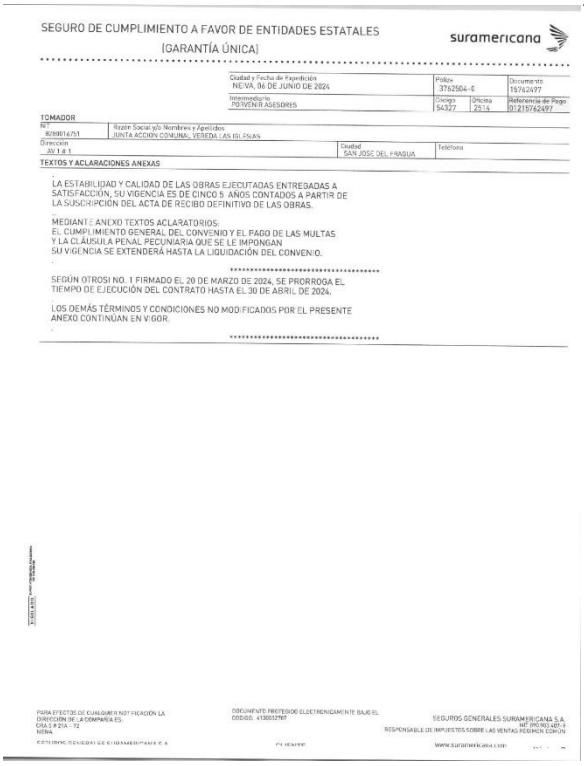

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición: NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024 | Póliza: 3762504-6 | Documento: 15762497

Intermediario: PORVENIR ASESORES | Código: 54327 | Oficina: 2514 | Referencia de Pago: 01215762497

TOMADOR

NIT: 8280167751 | Razón Social y/o Nombres y Apellidos: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

Dirección: AV 1 # 1 | Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA | Teléfono:

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

MEDIANTE ANEXO TEXTOS ACLARATORIOS:
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

SEGÚN OTROSI NO. 1 FIRMADO EL 20 DE MARZO DE 2024, SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.


PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CÓDIGO: 413003787

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Polizas 2

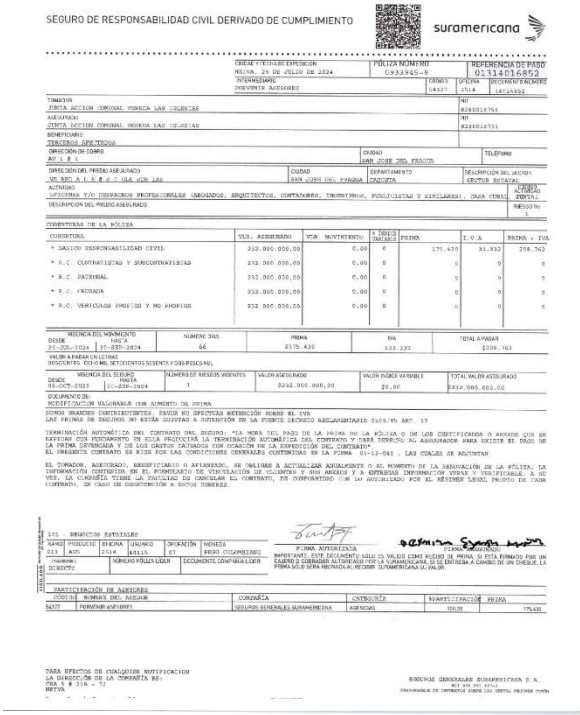

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN		POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 29 DE JULIO DE 2024		0533945-9	0131401685 2
INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NUMERO
SURAMERICANA ASESORES	54327	2514	14014952

TOMADOR
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016795

ASEGURADO
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016795

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO
AV 1 # 1 — CIUDAD SAN JOSE DEL FRAGUA — TELÉFONO

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO
VR RES A 1 A # C 1 OLE GUA LES — CIUDAD SAN JOSE DEL FRAGUA — DEPARTAMENTO CAQUETA — DESCRIPCIÓN DEL SECTOR / SECTOR RURAL

ACTIVIDAD
OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES). CASA CUNA — ACTIVIDAD ESPECIAL

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO — RIESGO No 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% TARIFA	PRIMA	I.V.A.	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	0,00	0	175.430	33.332	208.762
* R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	0,00	0	0	0	0
* R.C. PATRONAL	232.000.000,00	0,00	0	0	0	0
* R.C. CRUZADA	232.000.000,00	0,00	0	0	0	0
* R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	0,00	0	0	0	0

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NUMERO DIAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
30-JUL-2024	30-SEP-2024	66	$175.430	$33.332	$208.762

VALOR A PAGAR EN LETRAS
DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NUMERO DE MESES VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
01-OCT-2023	30-SEP-2024	1	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2365/95 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO"
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FIRMA 01-13-040 . LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGA A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA POR EL REGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DISCREPANCIA A ESTOS DISMERSOS.

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	SUCURSAL	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
023	A95	2514	40115	07	PESO COLOMBIANO

COASEGURO: DIRECTO — NÚMERO PÓLIZA LÍDER — DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VALIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE LA FIRMA SOLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA EL VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	ENTIDAD	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	175.430

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN		POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 29 DE JULIO DE 2024		0533945-9	0131401685 2
INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NUMERO
SURAMERICANA ASESORES	54327	2514	14014952

TOMADOR
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016795

ASEGURADO
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016795

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO
AV 1 # 1 — CIUDAD SAN JOSE DEL FRAGUA — TELÉFONO

PRIMA A PARTIR DE LA CUAL SE EMITIRÁN Y NÚMERO DE LA SUCURSAL/PUNTO DE DOCUMENTO — ASESOR AL CUAL PERTENECE — IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROFORMA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
8130775036. NO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

NRO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
CONVENIO SOLIDARIO NO. 3714 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA:
SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES.

LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ESTRUCTURAS ESTUDIADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

MEDIANTE ANEXO TEXTOS ACLARATORIOS
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE ES LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

NOTA:
ASEGURADO/ BENEFICIARIO ADICIONAL:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800215807-2


MEDIANTE ANEXO TEXTOS ACLARATORIOS
TENIDAS QUE LA PÓLIZA TIENE CONSTANCIA
EN TODOS LOS AMPAROS DEL DEUDOR 1043,
CON COBERTURA DE 200 SMMLV
DEDUCIBLES. TOPE MÁXIMO EL 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA,
NO PUDIENDO SUPERAR EN NINGÚN CASO LOS 2.000 SMMLV

SESIÓN ORDSG1 NO. 1 FIRMADO EL 30 DE MARZO DE 2024, SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN EN VIGOR.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

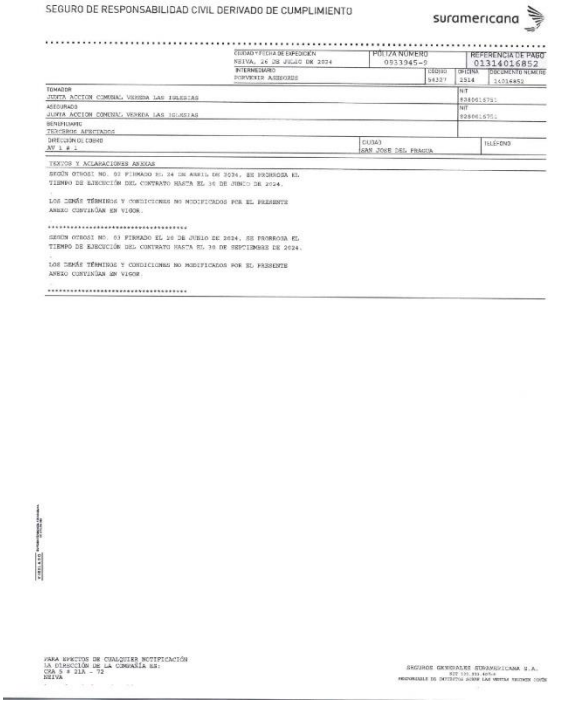

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN		POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 29 DE JULIO DE 2024		0533945-9	0131401685 2
INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NUMERO
SURAMERICANA ASESORES	54327	2514	14014952

TOMADOR
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016795

ASEGURADO
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016795

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO
AV 1 # 1 — CIUDAD SAN JOSE DEL FRAGUA — TELÉFONO

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
SESIÓN ORDSG1 NO. 02 FIRMADO EL 26 DE ABRIL DE 2024, SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.


LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN EN VIGOR.

SESION ORDSG1 NO. 03 FIRMADO EL 26 DE JULIO DE 2024, SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN EN VIGOR.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

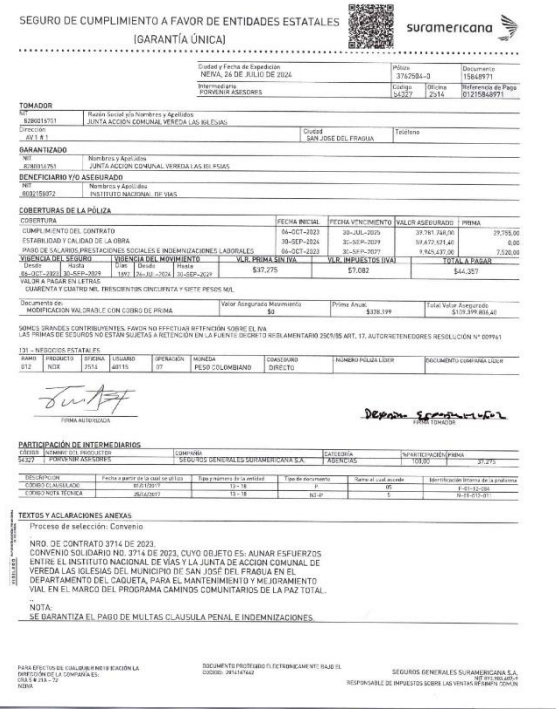

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedicion		Póliza	Documento
NEIVA, 26 DE JULIO DE 2024		3762584-0	15848971
Intermediario	Codigo	Oficina	Referencia de Pago
PORVENIR ASESORES	54327	2514	0121584971

TOMADOR
NIT 828016751 — Nombre Social y/o Nombres y Apellidos: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS
Direccion: AV 1 # 1 — Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA — Telefono

GARANTIZADO
NIT 828016751 — Nombres y Apellidos: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO
NIT 800215807 — Nombres y Apellidos: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-OCT-2023	28-JUL-2025	39.781.748,00	39.755,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-SEP-2024	30-SEP-2029	59.672.621,40	0,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06-OCT-2023	30-SEP-2027	9.945.437,00	7.520,00

VIGENCIA DEL SEGURO Desde	Hasta	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO Dias	Desde	Hasta	VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
06-OCT-2023	30-SEP-2029	1892	26-JUL-2024	30-SEP-2029	$37.275	$7.082	$44.357

VALOR A PAGAR EN LETRAS:
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$328.199	$109.399.808,40

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTAN SUJETAS A RETENCION EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2365/95 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

131 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	SUCURSAL	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NUMERO POLIZA LIDER	DOCUMENTO COMPAÑIA LIDER
012	NGE	2514	40115	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑIA	CATEGORIA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	37.275

DESCRIPCION	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo numero de la entidad	Tipo de documento	Name al cual accede	Identificación interna de la proforma
CODIGO CLAUSULADO	01/10/2017	13 - 18	60	1	1-01-10-08
CODIGO NOTA TECNICA	26/10/2017	13 - 18	NIT	1	1-01-10-01

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
Proceso de selección: Convenio


NRO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
CONVENIO SOLIDARIO NO. 3714 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA:
SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 2814747442

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

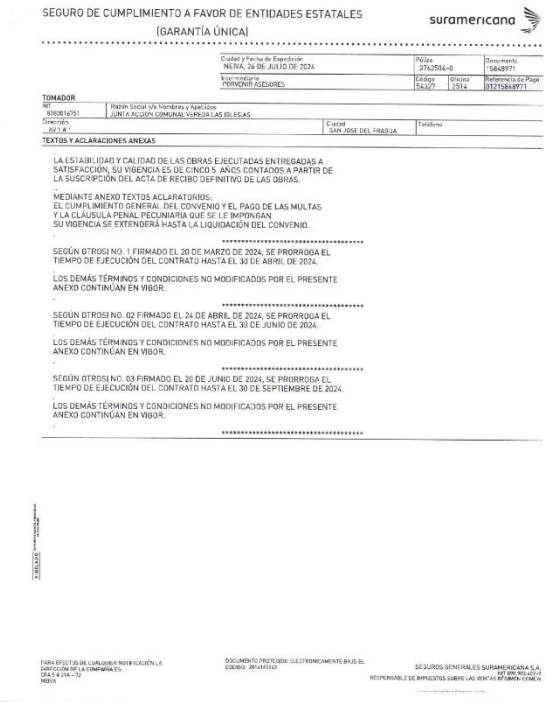

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 26 DE JULIO DE 2024	3762504-0	15848971
Intermediario	Código	Oficina	Referencia de Pago
PORVENIR ASESORES	54327	2514	01215849771

TOMADOR
NIT 8280016751 — Razón Social y/o Nombres y Apellidos: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS
Dirección: AVE 1 #1 — Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA — Teléfono:

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

MEDIANTE ANEXO TEXTOS ACLARATORIOS:
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

SEGÚN OTROSI NO. 1 FIRMADO EL 20 DE MARZO DE 2024, SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

SEGÚN OTROSI NO. 02 FIRMADO EL 24 DE ABRIL DE 2024, SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.


SEGÚN OTROSI NO. 03 FIRMADO EL 20 DE JUNIO DE 2024, SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A – 72 NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 2811457422

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

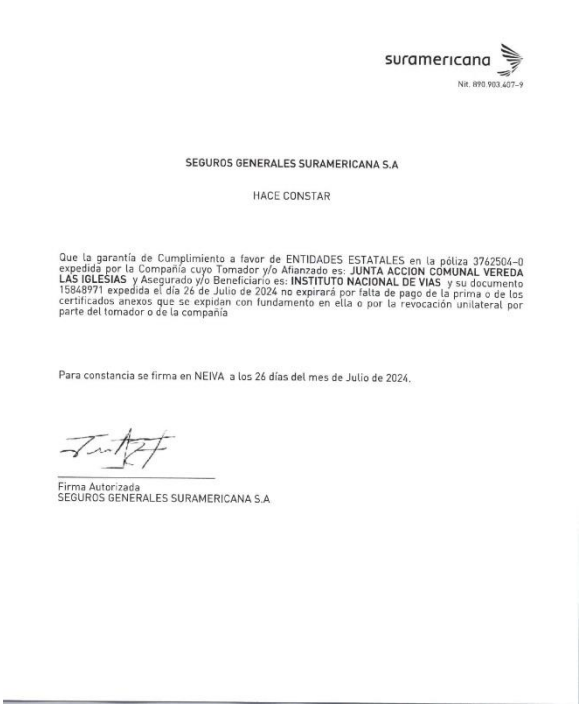

suramericana
Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A


HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3762504-0 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS** y Asegurado y/o Beneficiario es: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** y su documento 15848971 expedida el día 26 de Julio de 2024 no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en NEIVA a los 26 días del mes de Julio de 2024.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

Póliza 3

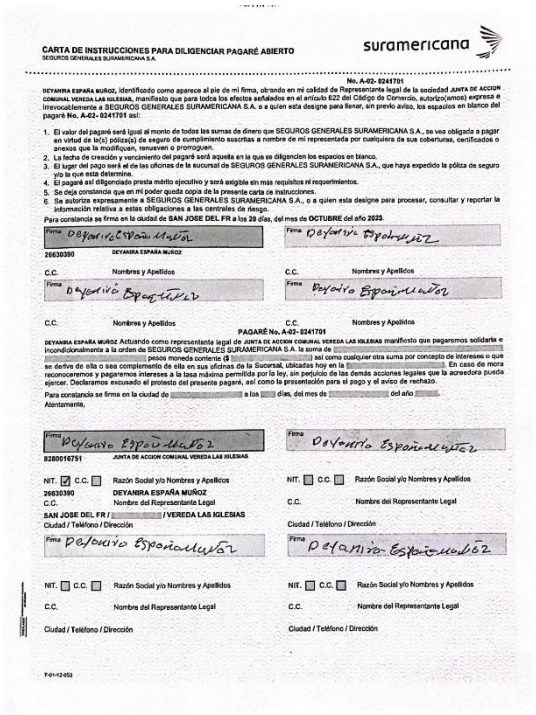

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR PAGARÉ ABIERTO
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

suramericana

No. A-02- 0241701

DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de Representante legal de la sociedad **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS**, manifiesto que para todos los efectos señalados en el artículo 622 del Código de Comercio, autorizo(amos) expresa e irrevocablemente a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. o a quien esta designe para llenar, sin previo aviso, los espacios en blanco del pagaré **No. A-02- 0241701** así:

1. El valor del pagaré será igual al monto de todas las sumas de dinero que SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., se vea obligada a pagar en virtud de la(s) póliza(s) de seguro de cumplimiento suscritas a nombre de mi representada por cualquiera de sus coberturas, certificados o anexos que la modifiquen, renueven o prorroguen.
2. La fecha de creación y vencimiento del pagaré será aquella en la que se diligencien los espacios en blanco.
3. El lugar del pago será el de las oficinas de la sucursal de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., que haya expedido la póliza de seguro y/o la que esta determine.
4. El pagaré así diligenciado presta mérito ejecutivo y será exigible sin mas requisitos ni requerimientos.
5. Se deja constancia que en mi poder queda copia de la presente carta de instrucciones.
6. Se autoriza expresamente a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., o a quien esta designe para procesar, consultar y reportar la información relativa a estas obligaciones a las centrales de riesgo.

Para constancia se firma en la ciudad de **SAN JOSE DEL FR** a los **29** días, del mes de **OCTUBRE** del año **2023.**

Firma — 26630390 — DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ
C.C. — Nombres y Apellidos
Firma — C.C. — Nombres y Apellidos
C.C. — Nombres y Apellidos
C.C. — Nombres y Apellidos

PAGARÉ No. A-02- 0241701

DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ Actuando como representante legal de **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS** manifiesto que pagaremos solidaria e incondicionalmente a la orden de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. la suma de [ ] pesos moneda corriente ($ [ ]) así como cualquier otra suma por concepto de intereses o que se derive de ella o sea complemento de ella en sus oficinas de la Sucursal, ubicadas hoy en la [ ]. En caso de mora reconoceremos y pagaremos intereses a la tasa máxima permitida por la ley, sin perjuicio de las demás acciones legales que la acreedora pueda ejercer. Declaramos excusado el protesto del presente pagaré, así como la presentación para el pago y el aviso de rechazo.


Para constancia se firma en la ciudad de [ ] a los [ ] días, del mes de [ ] del año [ ].
Atentamente,

Firma — 8280016751 — JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS
NIT. ☑ C.C. ☐ — Razón Social y/o Nombres y Apellidos
26630390 — DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ
C.C. — Nombre del Representante Legal
SAN JOSE DEL FR / [ ] / VEREDA LAS IGLESIAS
Ciudad / Teléfono / Dirección
Firma
NIT. ☐ C.C. ☐ — Razón Social y/o Nombres y Apellidos
C.C. — Nombre del Representante Legal
Ciudad / Teléfono / Dirección

NIT. ☐ C.C. ☐ — Razón Social y/o Nombres y Apellidos
C.C. — Nombre del Representante Legal
Ciudad / Teléfono / Dirección
Firma
NIT. ☐ C.C. ☐ — Razón Social y/o Nombres y Apellidos
C.C. — Nombre del Representante Legal
Ciudad / Teléfono / Dirección

F-01-12453

Powered by CamScanner

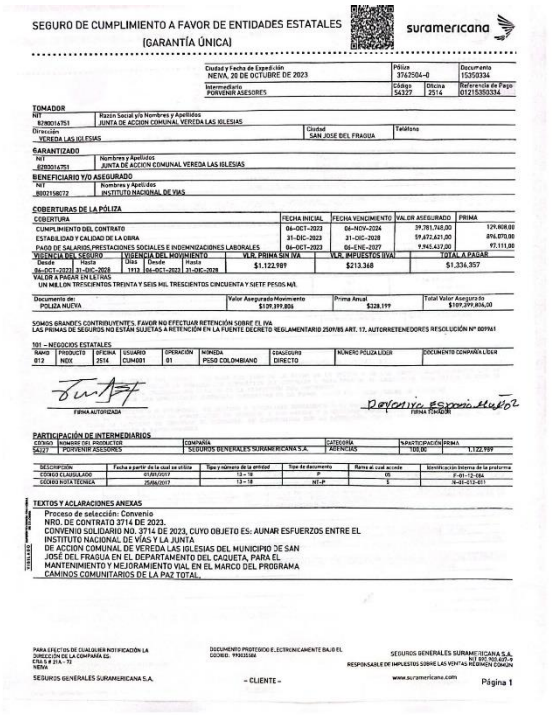

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 26 DE OCTUBRE DE 2023	3762504-0	15359334
Intermediario	Código	Oficina	Referencia de Pago
PORVENIR ASESORES	54327	2514	01215359334

TOMADOR
NIT 8280016751 — Razón Social y/o Nombres y Apellidos: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS
Dirección: VEREDA LAS IGLESIAS — Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA — Teléfono:

GARANTIZADO
NIT 8280016751 — Nombres y Apellidos: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO
NIT 8907158072 — Nombres y Apellidos: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-OCT-2023	06-NOV-2024	39.781.768,00	124.808,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31-DIC-2023	31-DIC-2028	59.672.651,00	896.870,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06-OCT-2023	06-ENE-2027	9.945.437,00	97.111,00

VIGENCIA DEL SEGURO Desde	Hasta	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO Días	Desde	Hasta	VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS IVA	TOTAL A PAGAR
06-OCT-2023	31-DIC-2028	1113	06-OCT-2023	31-DIC-2028	$1.122.987	$213.368	$1.336.357

VALOR A PAGAR EN LETRAS
UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
POLIZA NUEVA	$109.399.806	$328.199	$109.399.806,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº 009961

101 – NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NUMERO POLIZA LIDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LIDER
012	NIDX	2514	CUM001	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	1.122.999

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CODIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 – 18	P	05	F-01-12-084
CODIGO NOTA TECNICA	25/08/2017	13 – 18	NT-P	5	N-01-11-01

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
Proceso de selección: Convenio
NRO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
CONVENIO SOLIDARIO NO. 3714 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A – 72 NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 990035584

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.


– CLIENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 1

Powered by CamScanner

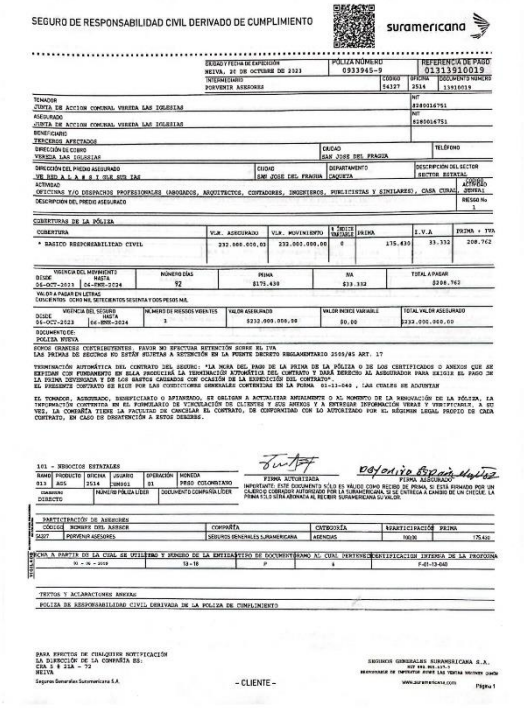

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

EXPEDIDO EN	FECHA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA,	20 DE OCTUBRE DE 2023	0933945-9	0333391001 9

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
PORVENIR ASESORES	54327	2514	13910019

TOMADOR
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 8280016751

ASEGURADO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 8280016751

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO
VEREDA LAS IGLESIAS — CIUDAD SAN JOSE DEL FRAGUA — TELÉFONO

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO
VE RED A L A P E I GLE SUR IAS — CÓDIGO CAQUETA — DEPARTAMENTO — DESCRIPCIÓN DEL SECTOR ECTOR ESTATAL

ACTIVIDAD
OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES), CASA CURAL, JUNTA — CÓDIGO ACTIVIDAD 0

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO — RIESGO No 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	232.000.000,00	0	175.430	33.332	208.762

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
06-OCT-2023	04-ENE-2024	92	$175.430	$33.332	$208.762

VALOR A PAGAR EN LETRAS
DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VLR DE ASEGURADO
06-OCT-2023	04-ENE-2024	3	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE:
POLIZA NUEVA

SOBRE GRAVEN CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA.
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: *LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA O DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO*.
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PRIMA. 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE OBSERVACIÓN A ESTOS DEBERES.

101 – NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	CANAL	OPERACIÓN	MONEDA
033	AGS	2514	380001	01	PESO COLOMBIANO

CANAL	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CLERICO COMISIONADO AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA, SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA NO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	175.430

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZARÁ Y NÚMERO DE LA ENTIDAD — DEPTO DE DOCUMENTO — BRANCH N. CUAL PERTENECE — CERTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROFORMA
N – N – 2018 — 13 - 16 — P — 4 — F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXOS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A – 72
NEIVA


SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS ANTE LAS ENTIDADES QUE LOS VIGILAN SEGÚN CORRESPONDA
www.suramericana.com

Seguros Generales Suramericana S.A.

– CLIENTE –

Página 1

Powered by CamScanner

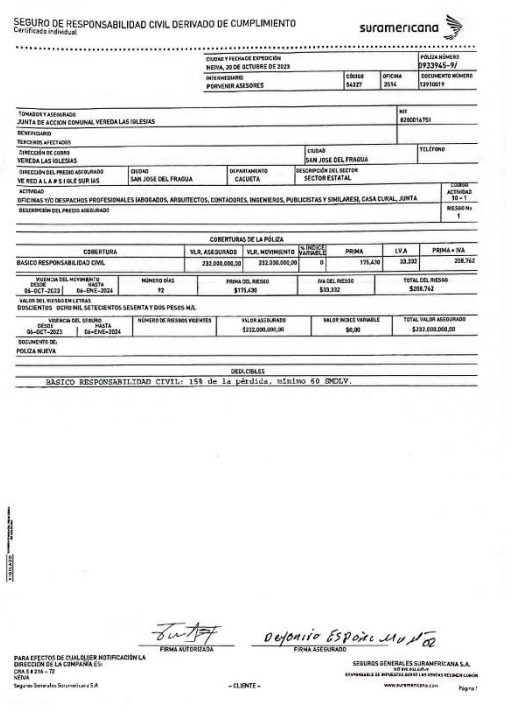

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO
Certificado individual

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN		POLIZA NÚMERO
NEIVA, 20 DE OCTUBRE DE 2023		0933945-9/
INTERMEDIARIO	CÓDIGO / OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
PORVENIR ASESORES	54327 / 2514	13910019

TOMADOR Y ASEGURADO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 8280016751

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO
VEREDA LAS IGLESIAS — CIUDAD SAN JOSE DEL FRAGUA — TELÉFONO

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO
VE RED A L A P E I GLE SUR IAS — CÓDIGO CAQUETA — DEPARTAMENTO — DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SECTOR ESTATAL

ACTIVIDAD
OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES), CASA CURAL, JUNTA — CÓDIGO ACTIVIDAD 10 – 1

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO — RIESGO No 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	232.000.000,00	0	175.430	33.332	208.762

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA DEL RIESGO	IVA DEL RIESGO	TOTAL DEL RIESGO
06-OCT-2023	04-ENE-2024	92	$175.430	$33.332	$208.762

VALOR DEL RIESGO EN LETRAS
DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
06-OCT-2023	04-ENE-2024		$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE:
POLIZA NUEVA

DEDUCIBLES
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL: 15% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA ASEGURADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A – 72
NEIVA


SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS ANTE LAS ENTIDADES QUE LOS VIGILAN SEGÚN CORRESPONDA
www.suramericana.com

Seguros Generales Suramericana S.A.

– CLIENTE –

Página 1

Powered by CamScanner

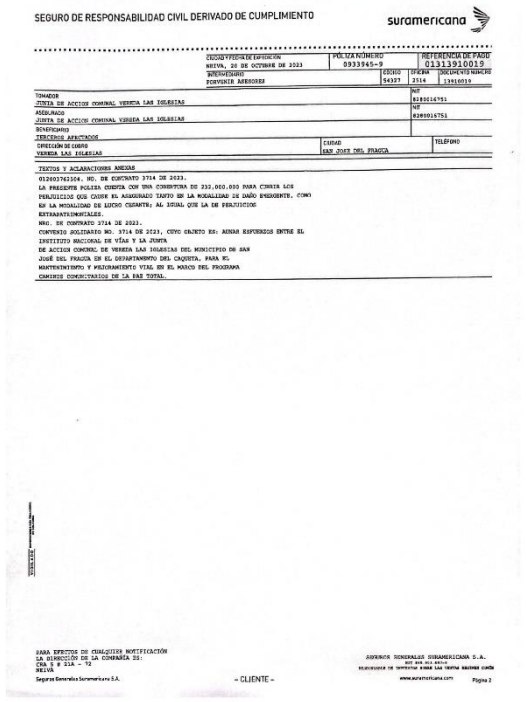

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

EXPEDIDO EN	FECHA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA,	20 DE OCTUBRE DE 2023	0933945-9	0333391001 9

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
PORVENIR ASESORES	54327	2514	13910019

TOMADOR
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 8280016751

ASEGURADO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 8280016751

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO
VEREDA LAS IGLESIAS — CIUDAD SAN JOSE DEL FRAGUA — TELÉFONO

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXOS
012003792264. NO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232,000.000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
NRO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
CONTENTO SOLICITADO NO. 3714 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A – 72
NEIVA


SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS ANTE LAS ENTIDADES QUE LOS VIGILAN SEGÚN CORRESPONDA
www.suramericana.com

Seguros Generales Suramericana S.A.

– CLIENTE –

Página 2

Powered by CamScanner

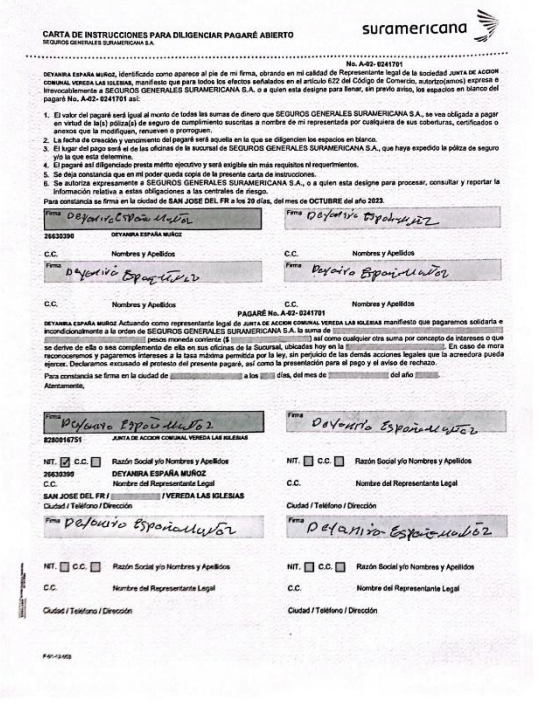

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR PAGARÉ ABIERTO
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

suramericana

No. A-02- 0241701

DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de Representante legal de la sociedad JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS, manifiesto que para todos los efectos señalados en el artículo 622 del Código de Comercio, autorización(es) expresa e irrevocablemente a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. o a quien esta designe para llenar, sin previo aviso, los espacios en blanco del pagaré No. A-02- 0241701 así:

1. El valor del pagaré será igual al monto de todas las sumas de dinero que SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., se vea obligada a pagar en virtud de la(s) póliza(s) de seguro de cumplimiento suscritas a nombre de mi representada por cualquiera de sus coberturas, certificados o anexos que la modifiquen, renueven o prorroguen.
2. La fecha de creación y vencimiento del pagaré será aquella en la que se diligencien los espacios en blanco.
3. El lugar del pago será el de las oficinas de la sucursal de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., que haya expedido la póliza de seguro y/o la que esta determine.
4. El pagaré así diligenciado presta mérito ejecutivo y será exigible sin más requisitos ni requerimientos.
5. Se deja constancia que en mi poder queda copia de la presente carta de instrucciones.
6. Se autoriza expresamente a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., o a quien esta designe para procesar, consultar y reportar la información relativa a estas obligaciones a las centrales de riesgo.

Para constancia se firma en la ciudad de SAN JOSE DEL FR a los 20 días, del mes de OCTUBRE del año 2023.

Firma — 26630390 — DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ

C.C. Nombres y Apellidos

Firma — C.C. Nombres y Apellidos

Firma — C.C. Nombres y Apellidos

Firma — C.C. Nombres y Apellidos

PAGARÉ No. A-02- 0241701

DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ Actuando como representante legal de JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS manifiesto que pagaremos solidaria e incondicionalmente a la orden de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. la suma de [ ] pesos moneda corriente ($ [ ]) así como cualquier otra suma por concepto de intereses o que se deriven de ella o sea complemento de ella en sus oficinas de la Sucursal, ubicadas hoy en la [ ]. En caso de mora reconoceremos y pagaremos intereses a la tasa máxima permitida por la ley, sin perjuicio de las demás acciones legales que la acreedora pueda ejercer. Declaramos excusado el protesto del presente pagaré, así como la presentación para el pago y el aviso de rechazo.

Para constancia se firma en la ciudad de [ ] a los [ ] días, del mes de [ ] del año [ ].

Atentamente,

Firma — 8280016751 — JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

NIT. ☑ C.C. ☐ Razón Social y/o Nombres y Apellidos
26630390 DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ
C.C. Nombre del Representante Legal
SAN JOSE DEL FR / VEREDA LAS IGLESIAS
Ciudad / Teléfono / Dirección

Firma

NIT. ☐ C.C. ☐ Razón Social y/o Nombres y Apellidos
C.C. Nombre del Representante Legal
Ciudad / Teléfono / Dirección

Firma

NIT. ☐ C.C. ☐ Razón Social y/o Nombres y Apellidos
C.C. Nombre del Representante Legal
Ciudad / Teléfono / Dirección

Firma

NIT. ☐ C.C. ☐ Razón Social y/o Nombres y Apellidos
C.C. Nombre del Representante Legal
Ciudad / Teléfono / Dirección

F-01-13-053

Powered by CamScanner

4.8SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA


Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, sin embargo, junto con la interventoría se adoptarán las siguientes medidas, con el fin de garantizar la calidad y correcta ejecución de las obras suscritas al convenio anteriormente mencionado.

- Para los estudios topográficos se exigió a la JAC, los certificados de calibración de los equipos con los cuales se realizaron los levantamientos topográficos. Se ANEXA certificado de mantenimiento y calibración de los equipos usados en el levantamiento topográfico.
- Ficha técnica de los materiales utilizados

4.9 **OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL**

4.9.1 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Se anexa programación de obra

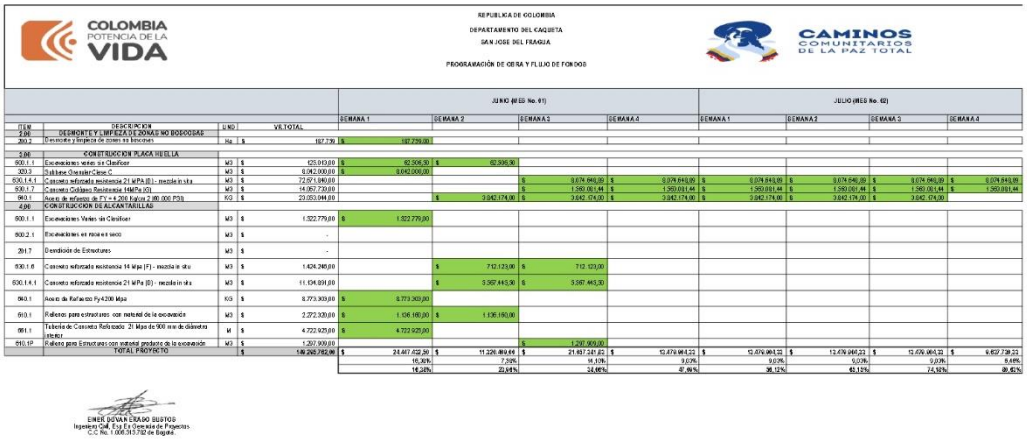

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
SAN JOSE DEL FRAGUA
PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE FONDOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	VR TOTAL	JUNIO (MES No. 01)				JULIO (MES No. 02)			
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
2.06	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS DE BOSQUES										
201.1	Desmonte y limpieza de zonas en bosques	Ha	$ 187.729	$ 187.729,00							
3.06	CONSTRUCCION PLACA HUELLA										
600.1.1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	$ 125.010,00	$ 62.505,00	$ 62.505,00						
303.3	Subbase Granular Clase C	M3	$ 6.042.000,00	$ 6.042.000,00							
630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (R) - mezcla in situ	M3	$ 72.67.1.980,00			$ 3.074.846,00	$ 3.074.846,00	$ 3.074.846,00	$ 3.074.846,00	$ 3.074.846,00	$ 3.074.846,00
630.1.7	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (CI)	M3	$ 14.082.720,00			$ 1.560.061,44	$ 1.560.061,44	$ 1.560.061,44	$ 1.560.061,44	$ 1.560.061,44	$ 1.560.061,44
960.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	$ 23.053.044,00		$ 3.842.174,00	$ 3.842.174,00	$ 3.842.174,00	$ 3.842.174,00	$ 3.842.174,00	$ 3.842.174,00	
4.06	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS										
600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	$ 1.522.779,00	$ 1.522.779,00							
600.2.1	Excavaciones en roca en seco	M3	$ -								
201.7	Demolición de Estructuras	M3	$ -								
630.1.8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	$ 1.424.240,00		$ 712.120,00	$ 712.120,00					
630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (R) - mezcla in situ	M3	$ 11.104.891,00		$ 3.367.445,50	$ 3.367.445,50					
960.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	$ 8.773.303,00	$ 8.773.303,00							
610.1	Rellenos para estructuras con material de la excavación	M3	$ 2.272.320,00	$ 1.136.160,00	$ 1.136.160,00						
661.1	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interno	M	$ 4.722.925,00	$ 4.722.925,00							
610.12	Rellenos para Estructuras con material producto de la excavación	M3	$ 1.207.909,00			$ 1.207.909,00					
	TOTAL PROYECTO		$ 86.268.752,00	$ 24.487.422,50	$ 11.226.469,44	$ 21.657.281,82	$ 13.874.944,22	$ 12.476.968,22	$ 12.476.968,22	$ 12.476.968,22	$ 6.657.739,22
				16,30%	7,50%	14,10%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	6,66%
				16,30%	23,81%	38,06%	47,99%	56,12%	65,12%	74,19%	80,62%

EINER DORAN ERAZO BUSTOS
Ingeniero Civil, Esp. En Gerencia de Proyectos
C.C. No. 1.006.313.732 de Bogotá.

Se anexa presupuesto actualizado

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				
1,00	**ITEM**	**UND**	**CANT.**	**VR UNITA**	**V. TOTAL**
2,00	**DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS**				
200.2	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 187.759,00	$ 187.759,00
	SUBTOTAL LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS				**$ 187.759,00**
3,00	**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**				
600.1.1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,10	$ 38.125,00	$ 194.437,50
320.3	Subbase Granular Clase C	M3	132,96	$ 91.440,00	$ 12.157.588,08
630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	89,56	$ 821.914,00	$ 73.607.330,18
630.1.7	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	40,49	$ 337.882,00	$ 13.682.193,71
640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4272,23	$ 7.008,00	$ 29.939.782,23
	SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA				**$ 129.581.331,71**
4,00	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**				
600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46,50	$ 38.124,67	$ 1.772.796,96
600.2.1	Excavaciones en roca en seco	M3	8,20	$ 68.733,43	$ 563.614,11
201.7	Demolición de Estructuras	M3	0,00	$ 232.220,00	$ -
630.1.6	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50	$ 483.427,66	$ 241.713,83
630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,60	$ 821.913,67	$ 7.890.371,23
640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578,90	$ 7.007,68	$ 4.056.747,05
610.1	Rellenos para estructuras con material de la excavación	M3	25,40	$ 22.400,71	$ 568.977,98
661.1	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00	$ 736.626,94	$ 4.419.761,67
610.1P	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	24,00	$ 22.400,71	$ 537.616,99
	SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA				**$ 19.513.982,83**
	VALOR TOTAL				**$ 149.283.073,53**
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)			**3,00%**	$ 4.478.492,21
	GASTOS ADMINISTRATIVOS				$ 44.147.172,00
	VALOR A PAGAR				**$ 198.908.738**

RESUMEN DEL CONTRATO No…	
VALOR INCIAL DEL CONTRATO =	**$ 198.908.737,74**
VALOR MAYORES CANTIDADES =	
VALOR MENORES CANTIDADES =	
VALOR OBRA ADICIONAL=	**$ 198.908.737,74**
NUEVO VALOR EJECUTADO EN EL ACTA PARCIAL No. 01	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN ARPO 01	**0,00%**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	**$ -**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	**0,00%**

ELABORÓ: ING EINER DUVAN ERASO BUSTOS
MP: 091037-0619316 CND
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

4.9.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se anexa plan de inversión

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 12/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3714 - 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** PROYECTOSY CONSULTORIAS ORION SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 14.382.390,67	$ 14.382.390,67	$ 14.382.390,67		$ 43.147.172,01	22%
2	COSTO DE PERSONAL	$ 17.761.605,24	$ 17.761.605,24	$ 17.761.605,24		$ 53.284.815,73	27%
3	MATERIALES	16.054.360	16.054.360	16.054.360		$ 48.163.080,27	24%
4	ALQUILER DE MAQUINARIA / FORMALETA METALICA	$ 9.520.000,00				$ 9.520.000,00	5%
5	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00		$ 6.600.000,00	3%
6	MATERIALES PÉTREOS	$ 5.684.440,00	$ 5.684.440,00	$ 5.684.440,00		$ 17.053.320,00	9%
7	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 6.713.450,00	$ 6.713.450,00	$ 6.713.450,00		$ 20.140.350,00	10%
	TOTAL	**$ 72.316.246,00**	**$ 62.796.246,00**	**$ 62.796.246,00**	**$ -**	**$ 197.908.738,00**	**100%**

NOTAS: $ 197.908.738,00

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: **Deyanira Muñoz España**
Representante Legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal
C.C 26.630.390

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Interventor
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Firma:
Nombre: **Einer Duvan Eraso Bustos**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **091037-0619316 CND**

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Anexo actas comité operativo

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 01	Dirección Territorial INVIAS: CAQUETA	Fecha: 4 DE MAYO DEL 2024

Vereda – Municipio - Departamento: JAC LAS IGLESIAS-SAN JOSÉ DEL FRAGUA-CAQUETÁ
No. Convenio(s) Solidario(s): CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3714 DE 2023
Ejecutor(es): JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JUAN CARLOS SANABRIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FABIO JESÚS MEJIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
JULIO CESAR INFANTE GUZMAN	JAC IGLESIAS	CONTADOR
ANDRI YESENIA PERILLA	JAC IGLESIAS	VEEDORA
JEYSONN ANDRES MORA	JAC IGLESIAS	VEEDOR
EDGAR ROJAS	JAC IGLESIAS	MIEMBRO DE LA JAC
EINER DUVAN ERASO BUSTOS	JAC IGLESIAS	INGENIERO RESIDENTE
DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ	JAC IGLESIAS	PRESIDENTA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Presentación de cada uno de los integrantes
2. Socializar Cotizaciones de Dotación, topografía y estudios de suelos.
3. Presentar oportunidades de mejora para la ejecución del convenio mediante actualización de cantidades y presupuesto de obra.

AGENDA DEL COMITE: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Presentar cotizaciones para realizar elecciones
3- Proposiciones y Varios

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los seis (6) miembros contadores, ingeniero, veeduría y comunidad.
2.	Presentar cotizaciones para realizar elecciones: • **Cotización Para Dotación**: de acuerdo a las invitaciones realizadas vía WhatsApp/ presencial y telefónicamente se presentaron tres cotizaciones para la compra de dotación y elementos de protección personal 1. NEFIN SAS VALOR $ 3.108.005 2. FERRECERAMICAS $ 4.374.800 3. AMAZONIA SAFETY $ 2.802.000 la empresa AMAZONIA SAFETY queda seleccionada por ser la oferta más económica y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados por el proyecto. entroga los elementos en Florencia y la forma de pago un 100% CONTRAENTREGA 5 DIAS HABILES las otras ofertas son más costosas. • **Cotización Para Estudio De Suelos**: de acuerdo a las invitaciones realizadas vía WhatsApp/ presencial y telefónicamente Se presento un único oferente para la realización de los estudios de suelos ya que en el departamento hay pocos que los realizan: 1. GEOCON INGENERIA VALOR $ 2.334.900 la empresa GEOCON INGENERIA queda seleccionada por ser la oferta más económica y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados por el proyecto. • **Cotización Para Exámenes Laborales:** de acuerdo a las invitaciones realizadas vía WhatsApp/ presencial y telefónicamente se presenta un único oferente para la realización de exámenes laborales. 1. MARTHA LUZ ALTAMAR VALOR $ 40.000 Por persona. la Sra. MARTHA LUZ ALTAMAR queda seleccionada por ser la oferta más económica y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados por el proyecto. • **Cotización Para TOPOGRAFIA**: de acuerdo con las invitaciones realizadas vía WhatsApp/ presencial y telefónicamente Se presenta un único oferente para la realización de topografía: 1. GUSTAVO NARNAVAEZ VALOR $ 1.300.000 El señor GUSTAVO HERNANDEZ queda seleccionado por ser la oferta más económica y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados por el proyecto. • **Cotizaciones Para Materiales Pétreos:** de acuerdo con las invitaciones realizadas vía WhatsApp/ presencial y telefónicamente Se presenta un único oferente para la realización de topografía:

1 2

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

3.	1. **MAEXCA SAS** 2. **MULTIAGREGADOS SAS** Las empresas MAEXCA SAS Con ubicación vía Municipio de Albania y MULTIAGRADADOS SAS con ubicación municipio de Morelia quedan los DOS seleccionados por ser Las ofertas que ofrecen los materiales certificados, con licencia ambiental y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados por el proyecto. De igual forma se manifiesta que los dos fueron seleccionados ya que se requiere que tengan en acopio los materiales. La empresa Multigrados cotiza por cantidades sin embargo se analiza solo valores unitarios, ya que se espera tener el resultado de los estudios de suelos para determinar cantidades de algunos materiales. **Orientaciones técnicas:** • Teniendo en cuenta el presente comité, se tienen en cuenta los diseños los cuales se llevarán a cabo para la ejecución del proyecto teniendo en cuenta la ***"cartilla de obras de drenaje del INVIAS"*** la cual cuenta con un ancho de vía de 5,0M, un espesor de subbase de 0,15m y espesor de concreto de 0,15M, de igual forma, se dio claridad a cerca de las obras de drenaje las cuales son en base a los diseños de la anterior cartilla o manual del INVIAS. NOTA: Se anexa foto de guia a utilizar: • Se oriento a cerca de las actividades en cuanto a los laboratorios de suelo los cuales son importantes para dotorminar el CBR del suelo existente, por otra parte, se llevaron a cabo apiques

TIPO DE MATERIAL	UNIDAD	VALOR
SUMINISTRO DE GRAVILLA	M3	$75.000
SUMINISTRO DE ARENA TRITURADA	M3	$90.000
SUMINISTRO DE PIEDRA CICLOPEO	M3	$70.000
SUMINISTRO DE PIEDRA PARA GAVIONES	M3	$85.000
SUMINISTRO DE CRUDO DE RIO	M3	$40.000
SUMINISTRO DE ATRIADO	M3	$85.000
SUMINISTRO SUBBASE	M3	$75.000

COTIZACIÓN JUNTA DE ACCION LAS IGLESIAS				
	BASE GRANULAR	10	$ 66.300	$ 1.000.000,00
	Arena 3/8	70	$ 36.300	$ 2.100.000,00
	Gravilla 1/2	107	$ 83.533	$ 8.914.686,67
	VALOR BRUTO			$ 14.014.686,67
	Iva	19%		$ 2.663.186,67
	Retefuente	2,50%		$ 350.413,67
	TOTAL A PAGAR			$ 17.030.256,00



3

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	para determinar el perfil estratigráfico de la obra de drenaje y así de esta manera determinar la profundidad y los procesos constructivos al momento de realizar la obra.
4.	• **Programación Inicial de Obras:** Para el inicio de las actividades de obra, se inicio con el estudio de suelos realizando dos apiques a una profundidad de 1.5 metros con la finalidad de que estas muestras fuesen llevadas a laboratorio para ser estudiadas y así determinar el CBR o la capacidad portante del suelo, por otra parte se llevó a cabo el levantamiento topográfico en búsqueda de la localización inicial y así tener el alineamiento en el cual se construirá la placa huella al igual que los niveles por medio de cotas para garantizar los espesores requeridos en cuanto a la conformación de la subbase si esta es requerida.
5.	
6.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Decisión
1.	**Contratación:** Se toman las siguientes decisiones realizar las compras a las siguientes empresas: 1. AMAZONIA SAFETY – COMPRA DE DOTACIÓN 2. GEOCON INGENIERÍA- ESTUDIOS DE SUELOS 3. MARTHA LUZ ALTAMAR – EXÁMENES LABORALES 4. GUSTAVO NARVÁEZ - TOPOGRAFÍA 5. MAEXCA SAS - MATERIALES PETREO 6. MULTIAGREGADOS SAS – MATERIALES PÉTREO

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos			
1.	Informe Técnico de Avance:	SI ____	NO __X__	No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera:	SI ____	NO _X___	No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO _X___	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI ____	NO __X__	No. Folios: _____

4

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Solicitar a los proveedores Disponibilidad para la compra de los mariales y solicitar documentación requerida	CONTADOR/ PRESIDENTA	10/5/2024
Informar a la comunidad sobre las decisiones tomadas en el comité.	PRESIDENTA /VEEDURIA	8/5/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
NA		

FIRMAS DE ASISTENTES:

Jelson A Mora L.
Nombre: ANDRES MORA LOSADA
Cargo: Representante de veeduría

Deyanira España
Nombre: DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ
Cargo: presidente OAC


Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Cargo: Director de interventoría

Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Cargo: Residente de interventoría

5

6.9.4. ACTAS DE REUNIÓN

Se anexa acta de socialización

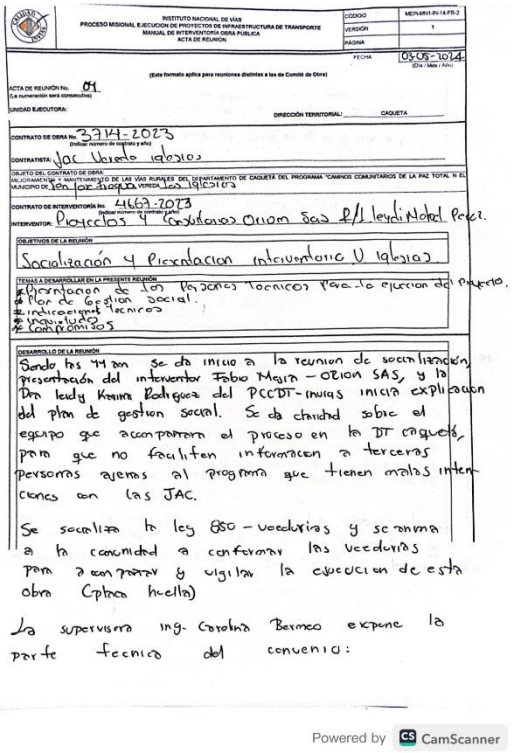

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNION

CÓDIGO: MEPLAR11-PI-14-FR-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

FECHA: 03-05-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.: 01 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No.: 3214-2023 (Incluir número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC Vereda Iglesias

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" EN EL MUNICIPIO DE San Jose del Fragua VEREDA Las Iglesias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 (Incluir número de contrato y año)

INTERVENTOR: Proyectos y Consultorias Orion Sas R/L Leydi Nohel Perez.


OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Socialización y Presentacion Interventoria V Iglesias

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
* Presentacion de los Perfiles Tecnicos Para la ejecucion del Proyecto.
* Plan de Gestion Social.
* Interventoria Tecnica
* Imprevistos
* Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Siendo las 4 pm se da inicio a la reunion de socializacion, presentación del interventor Fabio Mejia – ORION SAS, y la Dra Leidy Karina Rodriguez del PCCDT-invias inicia explicacion del plan de gestion social. Se da claridad sobre el equipo que acompañara el proceso en la DT caqueta, para que no faciliten informacion a terceras personas ajenas al programa que tienen malas intenciones con las JAC.

Se socializa la ley 850 – veedurias y se convoca a la comunidad a conformar las veedurias para acompañar y vigilar la ejecucion de esta obra (Optica huella)

La supervisora Ing. Carolina Bermeo expone la parte tecnica del convenio:

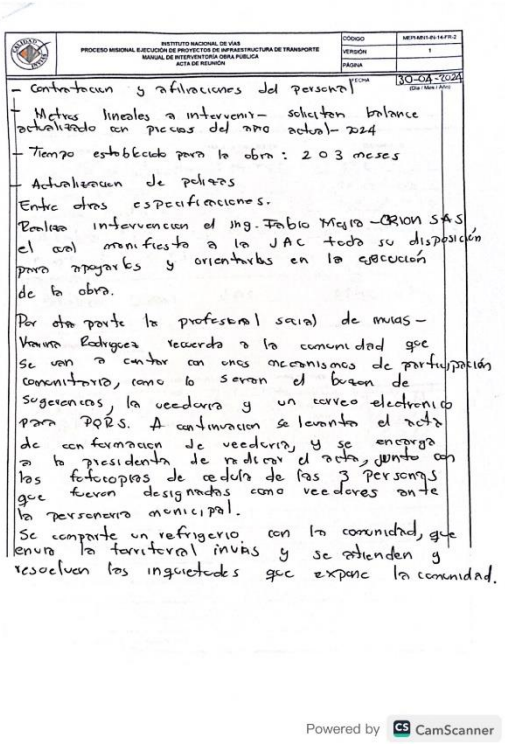

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNION

CÓDIGO: MEPLAR11-PI-14-FR-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

FECHA: 30-04-2024 (Día / Mes / Año)

- Contratacion y afiliaciones del personal
- Metros lineales a intervenir – solicitan balance actualizado con precios del año actual – 2024
- Tiempo estableciido para la obra: 203 meses
- Actualizacion de precios

Entre otras especificaciones.


Realizan intervencion el Ing. Fabio Mejia – ORION SAS el cual manifiesta a la JAC toda su disposición para apoyarlos y orientarlos en la ejecución de la obra.

Por otra parte la profesional social de invias – Yamira Rodriguez recuerda a la comunidad que se van a contar con unos mecanismos de participación comunitaria, como lo seran el buzon de sugerencias, la veeduria y un correo electronico para PQRS. A continuacion se levanta el acta de conformacion de veeduria, y se encarga a la presidenta de radicar el acta, junto con las fotocopias de cedula de las 3 personas que fueron designadas como veedores ante la personeria municipal.

Se comparte un refrigerio con la comunidad, que envia la territorial INVIAS y se atienden y resuelven las inquietudes que expone la comunidad.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

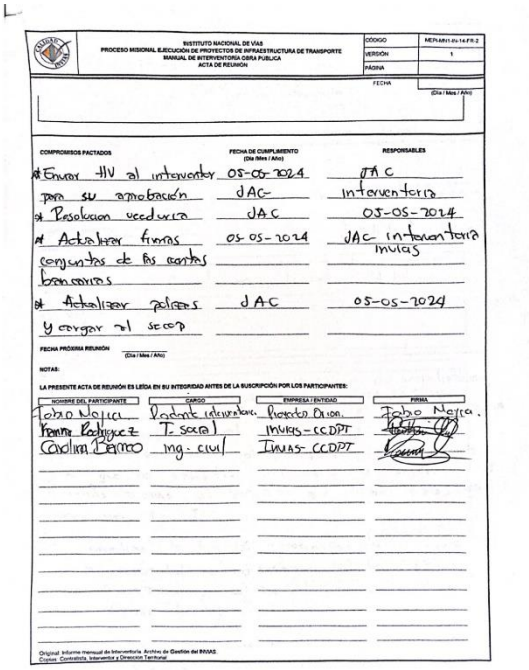

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: MEP-AR1-IN-14-FR-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA:
FECHA: (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día Mes / Año)	RESPONSABLES
* Enviar HV al interventor para su aprobación	05-05-2024 JAC	JAC Interventoria
* Posesion vocal vieja	JAC	05-05-2024
* Actualizar firmas consentas de las cartas bancarias	05-05-2024 JAC	JAC interventoria invias
* Actualizar polizas y cargar al secop	JAC	05-05-2024

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN (Día / Mes / Año)


NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jobo Nañez	Profesional Interventoria	Proyecto Orion	Jobo Nañez.
Yenny Rodriguez	T. social	INVIAS-CCDPT	
Carolina Barrero	Ing. civil	INVIAS-CCDPT	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del PAAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

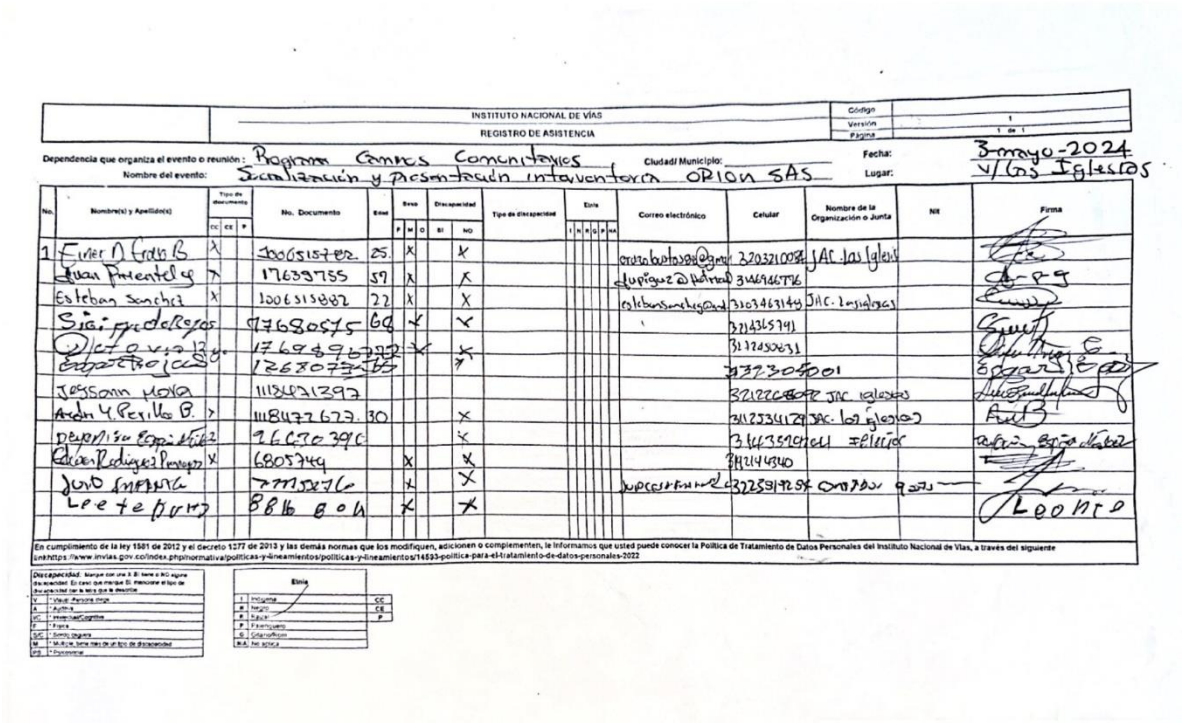

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:
Versión: 1
Página: 1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Programa Caminos Comunitarios — Ciudad/ Municipio: — Fecha: 3 mayo-2024
Nombre del evento: Socialización y presentación interventoría ORION SAS — Lugar: V/los Iglesias

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento: CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo: F	M	O	Discapacidad: SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia: I	N	R	Q	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	NIT	Firma
1	Eimer N Tapias B	X			1006515782	25		X			X												
2	Juan Pimentel G	X			176397755	59		X			X												
3	Esteban Sanchez	X			1006515882	22		X			X												
4	Sigifredo Rojas				17680575	66		X			X												
5	Oliver Arias B.				176496967			X			X												
6	Edgar Tapias				1268073																		
7	Jessenia Mora				1118421397																		
8	Andrea Perilla B.	X			1118472677	30					X												
9	Deyanira Espitia				1067903910						X												
10	Edwin Rodriguez Pantoja	X			6805744			X			X												
11	Juan Sanabria				7715276			X			X												
12	Leeteptuny				8816 804			X			X												

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO sigma de discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad (ver la tabla que le describe	
V	Visual - Persona ciega
A	Auditiva
I/C	Intelectual/Cognitiva
F	Física
S/C	Sordo ceguera
M	Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
Psi	Psicosocial

Etnia		
1	Indígena	CC
2	Negro	CE
3	Raizal	P
4	Palenquero	
5	Gitano/Rrom	
N/A	No aplica	

Powered by CamScanner

INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.5 Información general del contrato

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA *No. 4647 de 2023*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	*4647 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS*
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*
CONTRATISTA	*PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS*
VALOR TOTAL	*$ 109.303.594*
VALOR ACUMULADO	*$ 109.303.594*
PLAZO INICIAL	*6 MESES*
PLAZO PRORROGA No. 1	6 MESES 9 MESES Y 16 DIAS
PLAZO ACUMULADO	9 MESES Y 16 DIAS
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE PRORROGA 1	*30 DE ABRIL DE 2024*
FECHA DE PRORROGA 2	*30 DE JUNIO DE 2024*
FECHA PRORROGA 3	*30 DE SEPTEMBRE DE 2024*
SOLICITU EN TRAMITE PRORROGA No. 4	*30 DE OBTUBRE DE 2024*

Tabla ***2****. Información general contrato 4647 de 2023*

2.6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Se hizo control de calidad en los materiales utilizados y se verificó que estos cumplan con las especificaciones técnicas

Se hizo seguimiento a las obras por medio de visitas periódicas al sitio, donde se verificó que se utilizaron los diseños requeridos por el Invias

Se le hizo seguimientos a los desembolsos realizadas para la ejecución de las obras

3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31/AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023, 3714 de 2023, 4440 de 2023, 3674 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS-FLORIDA-DELCIAS-ASOJUNTAS ALBANIA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	MOTOCICLETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

NUMERO DE PLACA:FIF85G MARCA: BENELLI CILINDRAJE 500CC MODELO:2023

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: LOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INTERVENTORIA SE LES REALIZARÁ MANTENIIENTO PREVENTIVO TODO LOS 5 DE CADA MES QUE ESTE EN EJECUCION DEL PROYECTO

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firma
Nombre: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

3.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato relación de empleado
Anexo planilla pagada del mes de agosto
Anexo certificación del pago de seguridad social

ORION
901503188-3

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
CRA 83 B # 15-98 CALI E-mail mabelchud@yahoo.com

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

CERTIFICA

Que para la ejecución del contrato de interventoría 4647 de 2023 firmado entre el I**NVIAS**, y **PROYECTO Y CONSULTORIAS ORION SAS** se realizaron los respectivos pagos de seguridad social (**SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA**) durante el periodo de SEPTIEMBRE de 2024, estando a paz y salvo en este periodo.

Para constancia de lo anterior se firma en Cali, Valle del Cauca a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE del 2024

Mabel Perez

Razón Social: **PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.**
Representante legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
C.C 31.577.305 DE CALI
Dirección: CRA 83 B # 15-98 CALI
Teléfono: 3224097491
E-mail mabelchud@yahoo.com
Ciudad: CALI

3.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

MES INFORME MENSUAL: ago-24 — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIOS: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1315123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00
				TOTAL		$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 109.303.594,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	abr-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2023	$ 109.303.594,00	$ 98.803.594,00		
2	may-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2024	$ 109.303.594,00	$ 88.303.594,00		
3	jun-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2025	$ 109.303.594,00	$ 77.803.594,00		
4	jul-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2026	$ 109.303.594,00	$ 67.303.594,00		
5	ago-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2027	$ 109.303.594,00	$ 56.803.594,00		
6	sep-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00					$ 109.303.594,00	$ 46.303.594,00		
	TOTALES	$ 51.030.000,00	$ 11.970.000,00	$ 63.000.000,00	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 51.030.000,00	$ -	$ 51.030.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -	$ -	$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -	$ 11.970.000,00	$ 11.970.000,00
VALOR TOTAL	$ 51.030.000,00	$ 11.970.000,00	**$ 63.000.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. :

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

3.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 26/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 1: 30/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 2: 16/10/2024
VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.


2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo polizas de interventoria

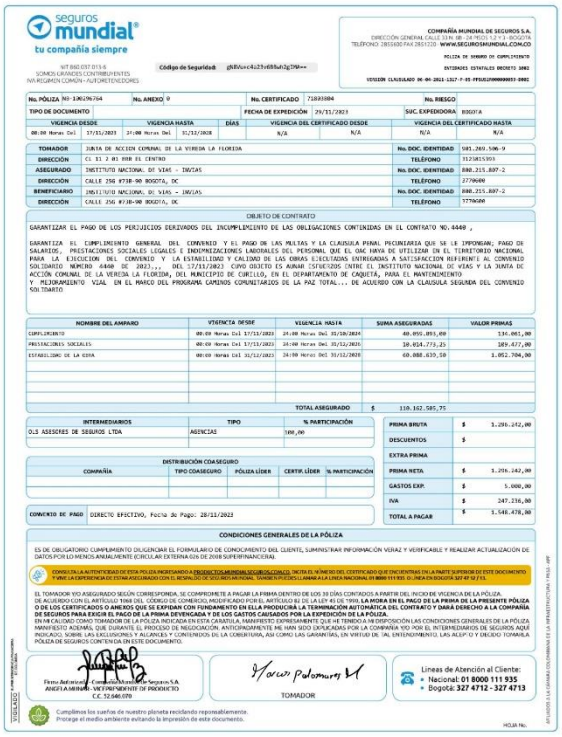

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855500 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU520000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100296764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815503
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4440 ,

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023,,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL,,, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.090.093,00	136.063,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2025	10.014.779,25	189.477,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.088.619,50	1.052.704,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.162.585,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.286.242,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.286.242,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	247.236,00
TOTAL A PAGAR	$	1.548.478,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERIFICA LA EXISTENCIA DE ESTAS ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. UNIBETE TU TECLA LLAMA A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935. EL LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS EN LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE, EL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTOS
C.C. 52.660.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855500 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU520000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100296764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A


CONDICIONES PARTICULARES

. TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

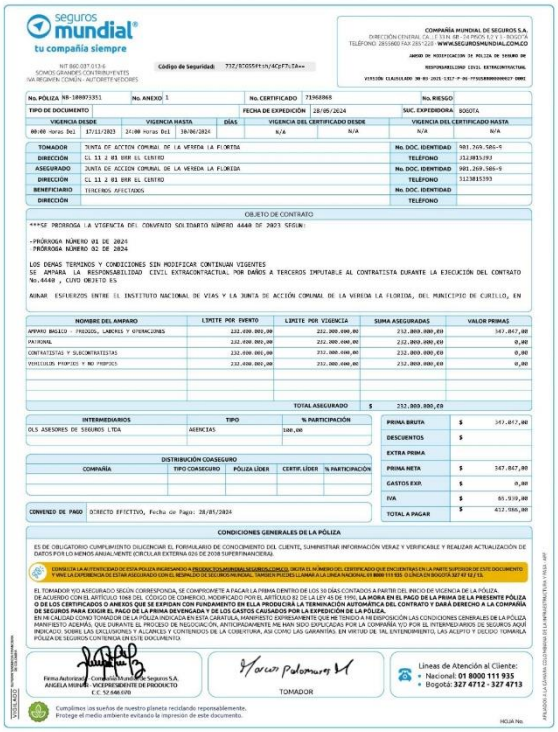

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 737/8C055Ft1h/4CpF7cIA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CL 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960865	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 03 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3138835393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 03 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3138835393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4648 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO UN DE 2024
PRORROGA NÚMERO DI DE 2024

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4648 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CUBILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.847,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
			TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.847,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.847,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.939,00
TOTAL A PAGAR	$	412.986,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODOC.TOLMUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENDIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MURIEL- VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.020

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960865	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL. SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO); TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9. , TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 28.). GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4648 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 28.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:
AMPARO

DEDUCIBLES


AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

HOJA No.

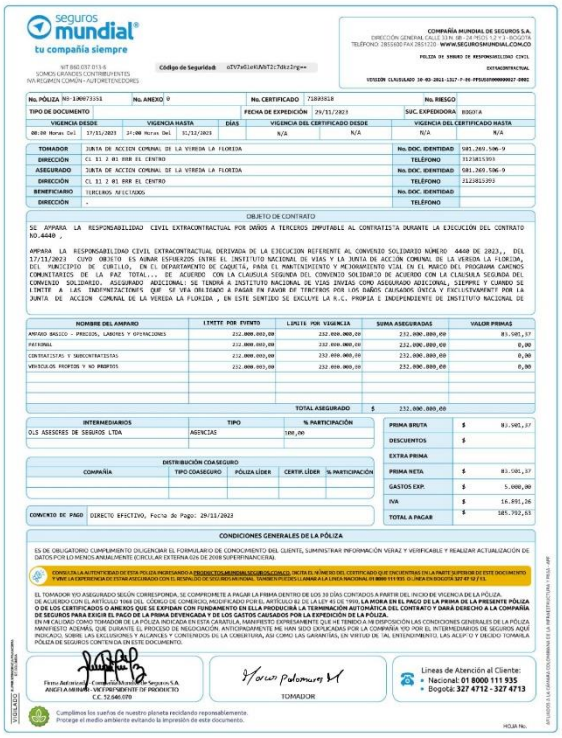

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSB00000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	0	71833818	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	29/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.596-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.596-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4440 ,

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4460 DE 2023,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL,,, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	83.501,37
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	83.501,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	83.501,37
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	16.891,26
TOTAL A PAGAR	$	105.392,63

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCONTRARAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERIFICA LA VIGENCIA DE ESTAS ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 EL LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.660.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851 220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSB00000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	0	71833818	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	29/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.596-9. , TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA POLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4460 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.


DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

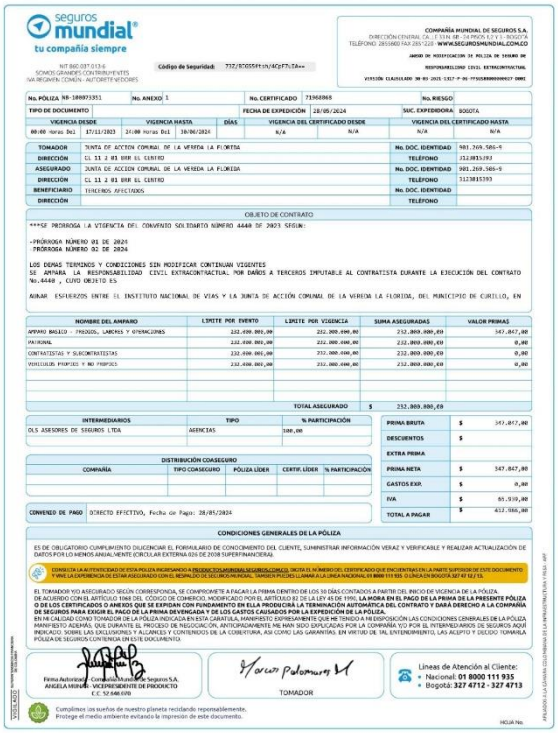

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2831220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	1	71968068	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	28/05/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 30/05/2024		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3128835393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3128835393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4448 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRÓRROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4448 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.047,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.047,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.047,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.919,00
TOTAL A PAGAR	$	412.966,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR YO ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MURILLO - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.690

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO APLICADO A LA CIRCULAR 029 DE 2014 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2831220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	1	71968068	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	28/05/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 30/05/2024		N/A N/A	N/A N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9 , TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4448 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. _ - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO APLICADO A LA CIRCULAR 029 DE 2014 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Anexo formato plan de cargas

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ No. 7 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 3230 DE 15/09/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

PLAZO INICIAL: 0,6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 109.303.594,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 109.303.594,00
PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 16 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 19/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS				2023				2024														TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	MES H-M	MES VALOR	MES H-M	MES VALOR	MES H-M	MES VALOR	ABRIL H-M	ABRIL VALOR	MAYO H-M	MAYO VALOR	JUNIO H-M	JUNIO VALOR	JULIO H-M	JULIO VALOR	AGOSTO H-M	AGOSTO VALOR	SEPTIEMBRE H-M	SEPTIEMBRE VALOR	MES H-M	MES VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
	1	Director de Interventoria	$ 5.000.000		0,50	$ 2.500.000									$ -	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000			1,50	$ 7.500.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000		4,00	$ 16.000.000									$ -	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	0,37	$ 1.475.849	0,00	$ 2.000.000			4,9	$ 19.475.849
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000									$ -		$ -		$ -	0,20	$ 560.000		$ -		$ -	0,20	$ 560.000			0,40	$ 1.120.000
	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000									$ -		$ -	0,40	$ 1.120.000		$ -		$ -		$ -	0,20	$ 560.000			0,60	$ 1.680.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conformam esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00																								$ 3.000.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000																											
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000																											
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000																											
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 5.000.000																											
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.000.000																											
	1	Inspector	$ 1.200.000		8,00	$ 9.600.000									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ 600.000	0,00	$ 600.000		$ -			1,0	$ 1.200.000
	1	Inspector SST	$ 1.200.000		0,48	$ 576.000									$ -		$ -		$ -		$ 288.000		$ -		$ -		$ -			0,48	$ 576.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 33.916.000,00									$ -		$ 5.250.000		$ 6.370.000		$ 6.098.000		$ 5.850.000		$ 3.325.593		$ 4.658.000				$ 34.551.593
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36									0,00		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36				2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 80.041.792									$ -		$ 12.390.000,0		$ 15.033.200,0		$ 14.391.280,0		$ 13.806.000,0		$ 7.848.399,7		$ 10.992.880,0				$ 81.541.760

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	MES H-M	MES VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 110.000	Dia	$ 4,00	$ 440.000									$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 110.000	1	$ 110.000	2	$ 220.000			4,00	$ 440.000
	1	Motocicletas (350 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 300.000	Mes	$ 13,00	$ 3.900.000									$ -	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000,0	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000,0	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000			8,00	$ 2.400.000
	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 2.800.000	Según composicion por item	$ 2,00	$ 5.600.000									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 5.600.000			2,00	$ 5.600.000
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Según composicion por item	$ 4,00	$ 1.200.000									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4	$ 1.200.000			4,00	$ 1.200.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ -	Según composicion por item	$ -	$ -									$ -		$ -		$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 175.000,00	Según composicion por item	$ 2,00	$ 350.000									$ -		$ -		$ -	1	$ 175.000		$ -	1	$ 175.000		$ -			2,00	$ 350.000
	1	Fotocopias de materiales, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc	$ 80.000,00	Según composicion por item	$ -	$ -									$ -		$ -		$ -	0	$ -		$ -	0	$ -		$ -			0,00	$ -
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 80.000,00	Según composicion por item	$ 4,00	$ 320.000									$ -		$ -		$ -	1	$ 80.000	2	$ 160.000	1	$ 80.000		$ -			4,00	$ 320.000
	1	Vivienda Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según composicion por item	$ -	$ -									$ -		$ -		$ -	0	$ -		$ -	0	$ -		$ -			0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														
		*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 11.810.000,00									$ -		$ 300.000		$ 300.000		$ 600.000		$ 985.000		$ 1.045.000				$ 10.330.000
		*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+ (B) + (C) + (D)				$ 91.851.760,00									$ -		$ 12.690.000		$ 15.333.200		$ 14.991.280		$ 14.771.000		$ 8.893.400		$ 10.992.880				$ 91.851.760
		*IVA = 19% * (D) + (E)				$ 17.451.834,00									$ -		$ 2.411.100		$ 2.913.308		$ 2.848.343		$ 2.806.490		$ 1.689.746		$ 2.088.647				$ 17.451.834
		*COSTO TOTAL = (D) + (E)				$ 109.303.594									$ -		$ 15.101.100		$ 18.246.508		$ 17.839.623		$ 17.577.490		$ 10.583.146		$ 13.081.527				$ 109.303.594

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones, se considerará necesario prorrogar el contrato de interventoría No. 4647 de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 para Continuar seguimiento a los convenios que le corresponden. A la fecha se están realizando las actividades preliminares para la ejecución de las obras; sin embargo, para continuar la ejecución de las actividades para la construcción de obras sin afectar el rendimiento y se programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas. surge la necesidad de prorrogar el contrato de interventoría. Como consecuencia de lo anterior, esta interventoría solicita realizar prorroga al contrato 4647 de 2023, toda vez que se requiere realizar apoyo en campo con las comunidades como desarrollo de la etapa preliminar y de ejecución de las obras lo que implica el tiempo necesario y de esa manera garantizar el seguimiento y control a los correspondientes convenios.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: LEIYD MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firma:
NOMBRE: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se le recomienda al contratista utilizar materiales de buena calidad pétreos y de ferreterías que cumpla con las especificaciones técnicas

Se le recomienda al contratista de obra terminar en los plazos previsto en la prorroga NO. 4 los cuales van hasta el 30 de octubre de 2024

8. ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

A la fecha no se ha recibido correspondencia

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

	
Vaciado de huella reforzada	**Vaciado de huella reforzada**
	
Vaciado de huella reforzada	**Vaciado de huella reforzada**


	
Alcantarilla de concreto de 36”	**Alcantarilla de concreto de 36”**

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

Se anexan foto de la socialización

	
Socialización vereda IGLESIAS acompañamiento INVIAS	**Socialización vereda IGLESIAS acompañamiento INVIAS**

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

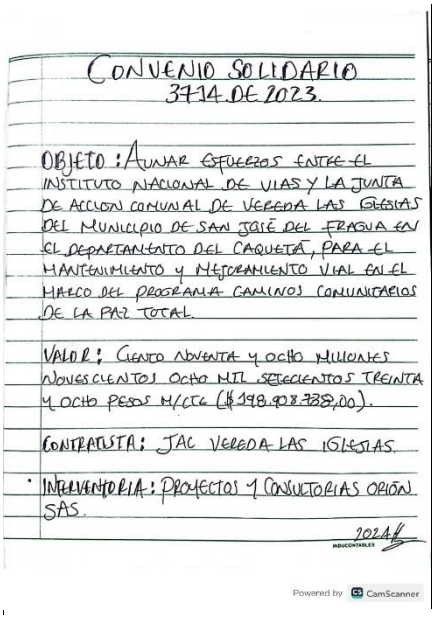

CONVENIO SOLIDARIO
3714 DE 2023.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VALOR: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($198.908.738,00).

CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS IGLESIAS.

INTERVENTORIA: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORIÓN SAS.

2024

Powered by CamScanner

Fecha 01/sep/2024 clima: soleado.

Actividades Realizadas:
No hubo desarrollo de actividades debido a dia dominical.

Firma Ing Residente de obra. Firma Ing Residente interventoria.

Fecha 02/sep/2024 clima: Soleado


personal de obra:
Ing Residente de obra (1)
Oficial de obra (1)
Ayudante de obra (5)

Actividades Realizadas:
Se desencofro la aleta izquierda, se pule y se deja organizada.

Firma Ing residente de obra Firma Ing residente interventoria

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

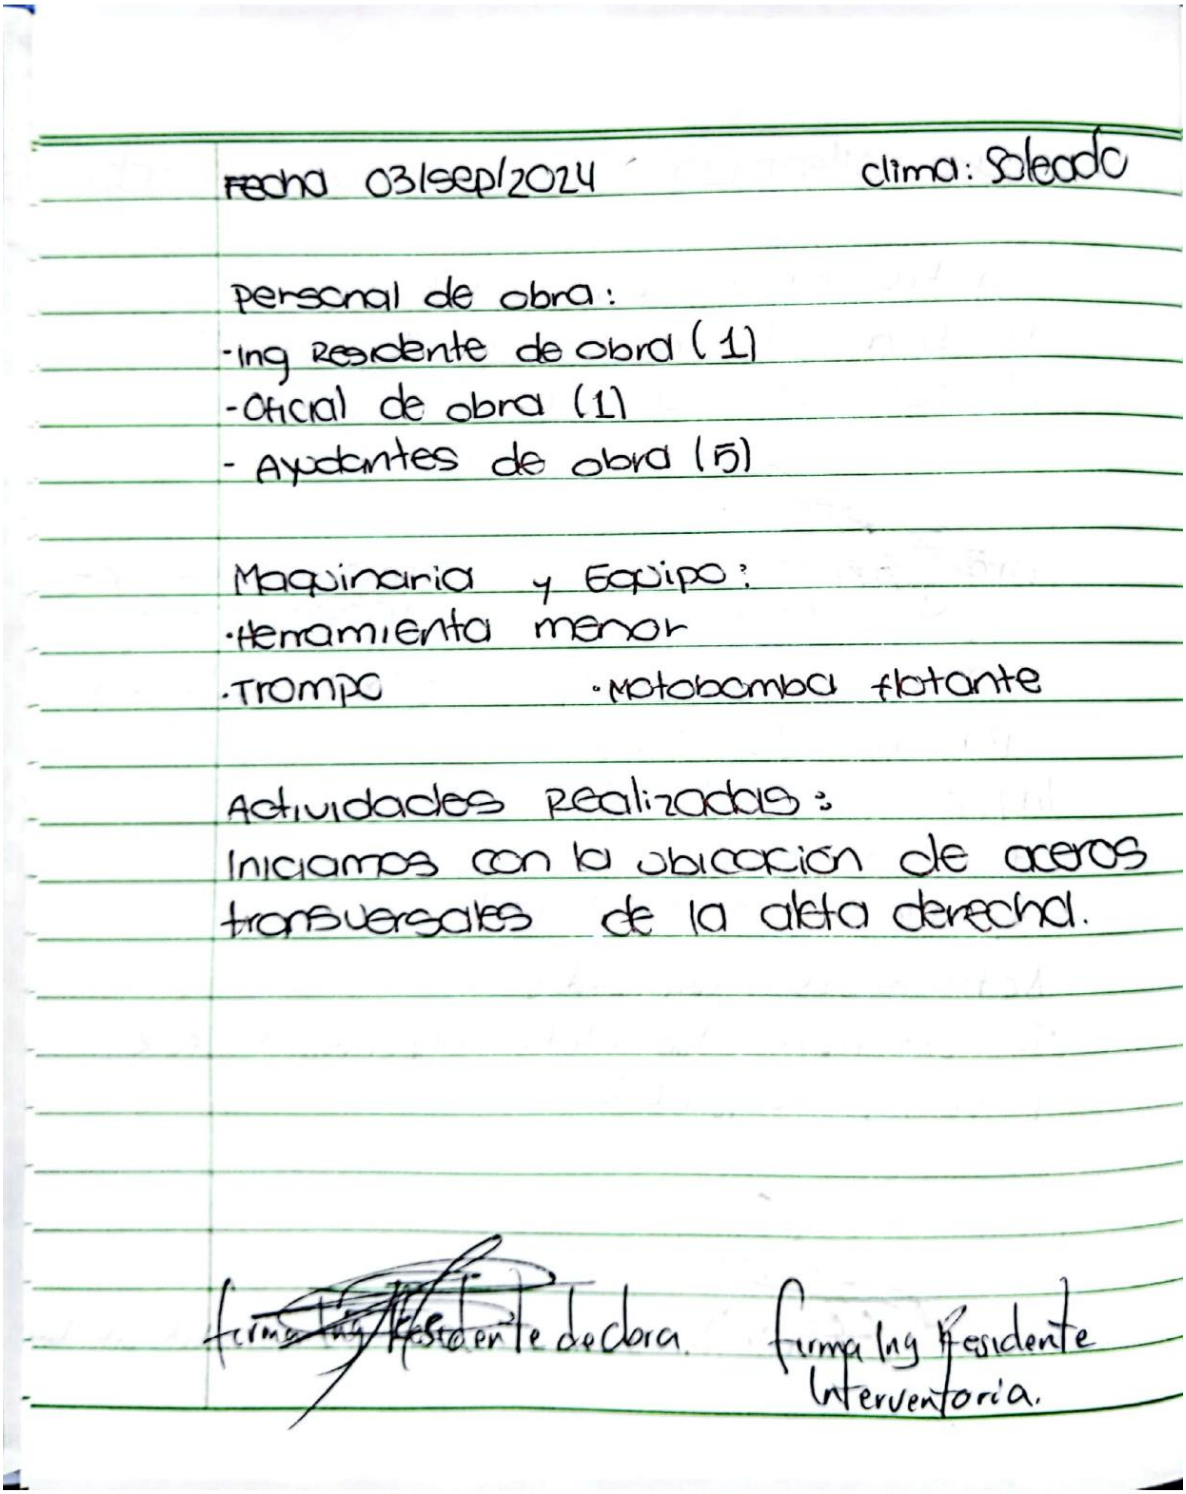

Fecha 03/sep/2024 clima: Soleado

Personal de obra:
- Ing Residente de obra (1)
- Oficial de obra (1)
- Ayudantes de obra (5)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor
- Trompo
- Motobomba flotante

Actividades Realizadas:
Iniciamos con la ubicación de aceros transversales de la alta derecha.

Firma Ing Residente de obra.

Firma Ing Residente Interventoria.

Powered by CamScanner


Fecha 05/sep/2024 Clima: lluvia.

Actividades Realizadas:
se suspenden actividades por motivos de lluvia, hasta nueva orden.

firma Ing Residente

Fecha 06/sep/2024 clima: soleado
personal de obra:
- Ing Residente de obra (1)
- Oficial de obra (1)
- Ayudante de obra (5)
Maquinaria y Equipo: - Mezcladora.
Actividades Realizadas:
Fundicion total de la aleta derecha.

Ing Residente de obra. Ing Residente de Interventoria.

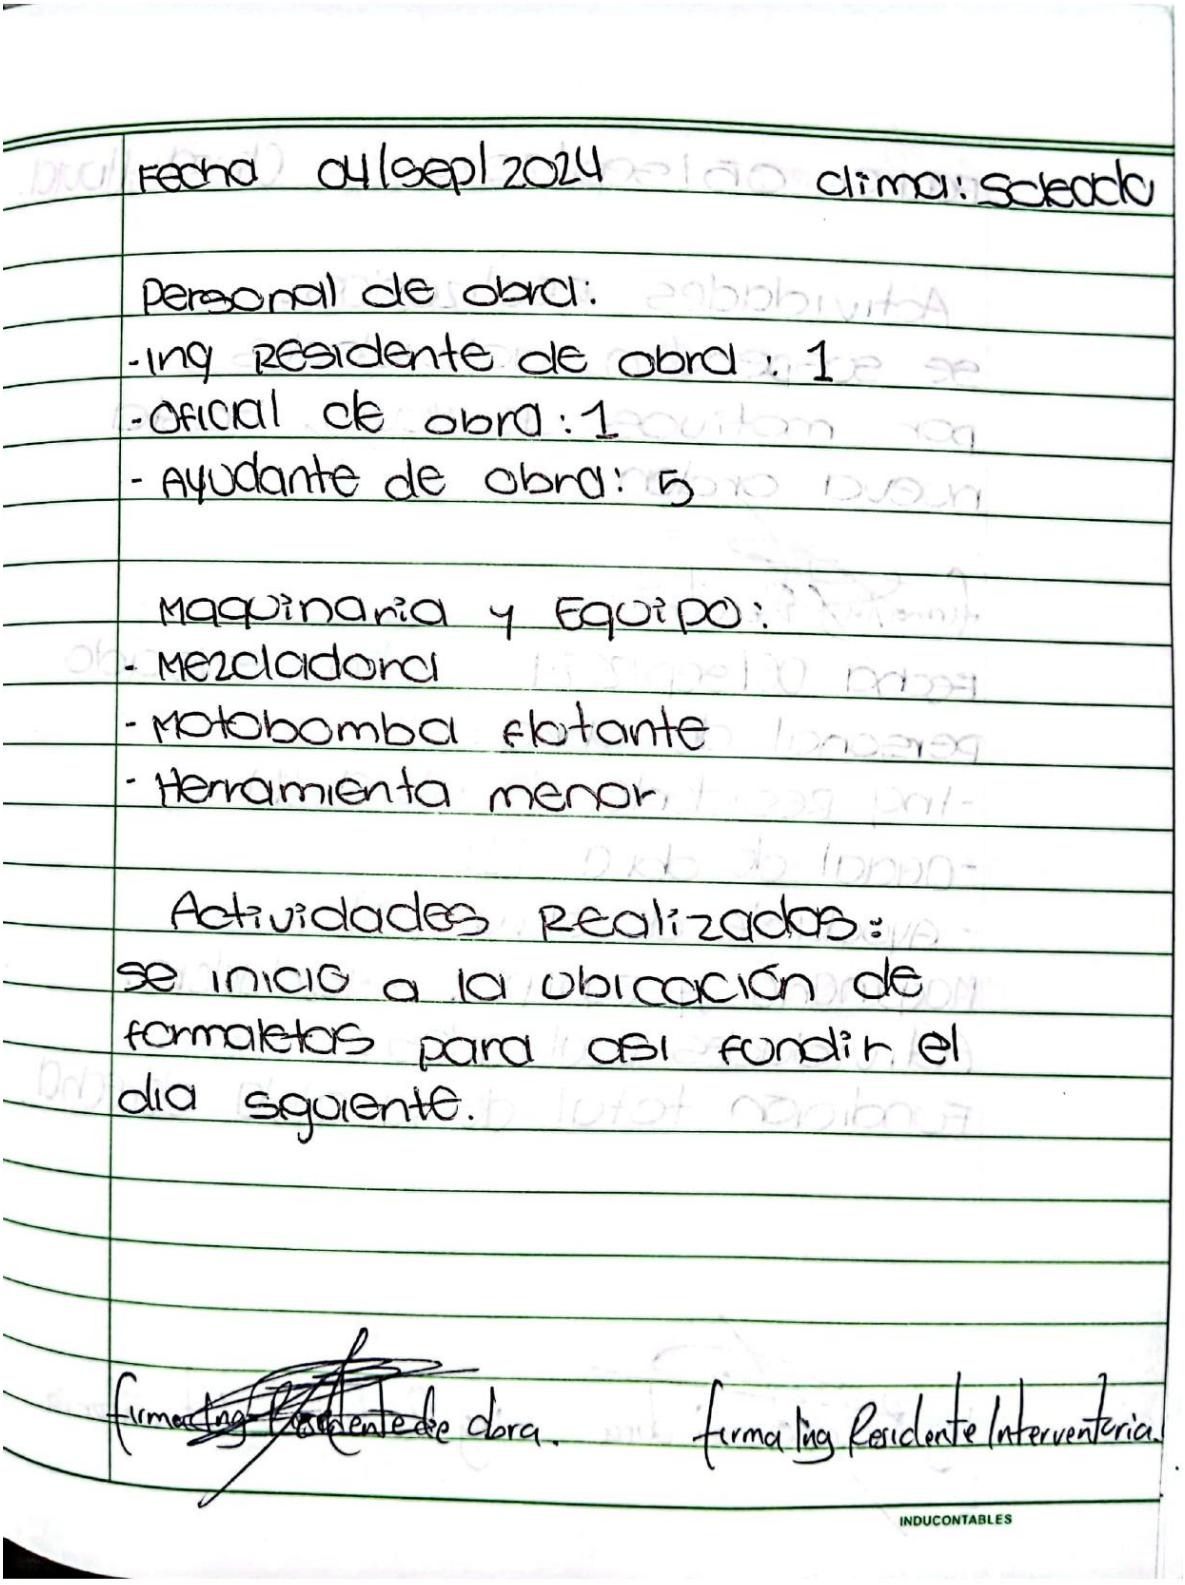

Fecha 04/sept/2024 clima: soleado

Personal de obra:
- Ing residente de obra: 1
- Oficial de obra: 1
- Ayudante de obra: 5


Maquinaria y Equipo:
- Mezcladora
- Motobomba flotante
- Herramienta menor

Actividades Realizadas:
se inicio a la ubicación de formaletas para asi fundir el dia siguiente.

firma Ing residente de obra. firma Ing Residente Interventoria.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

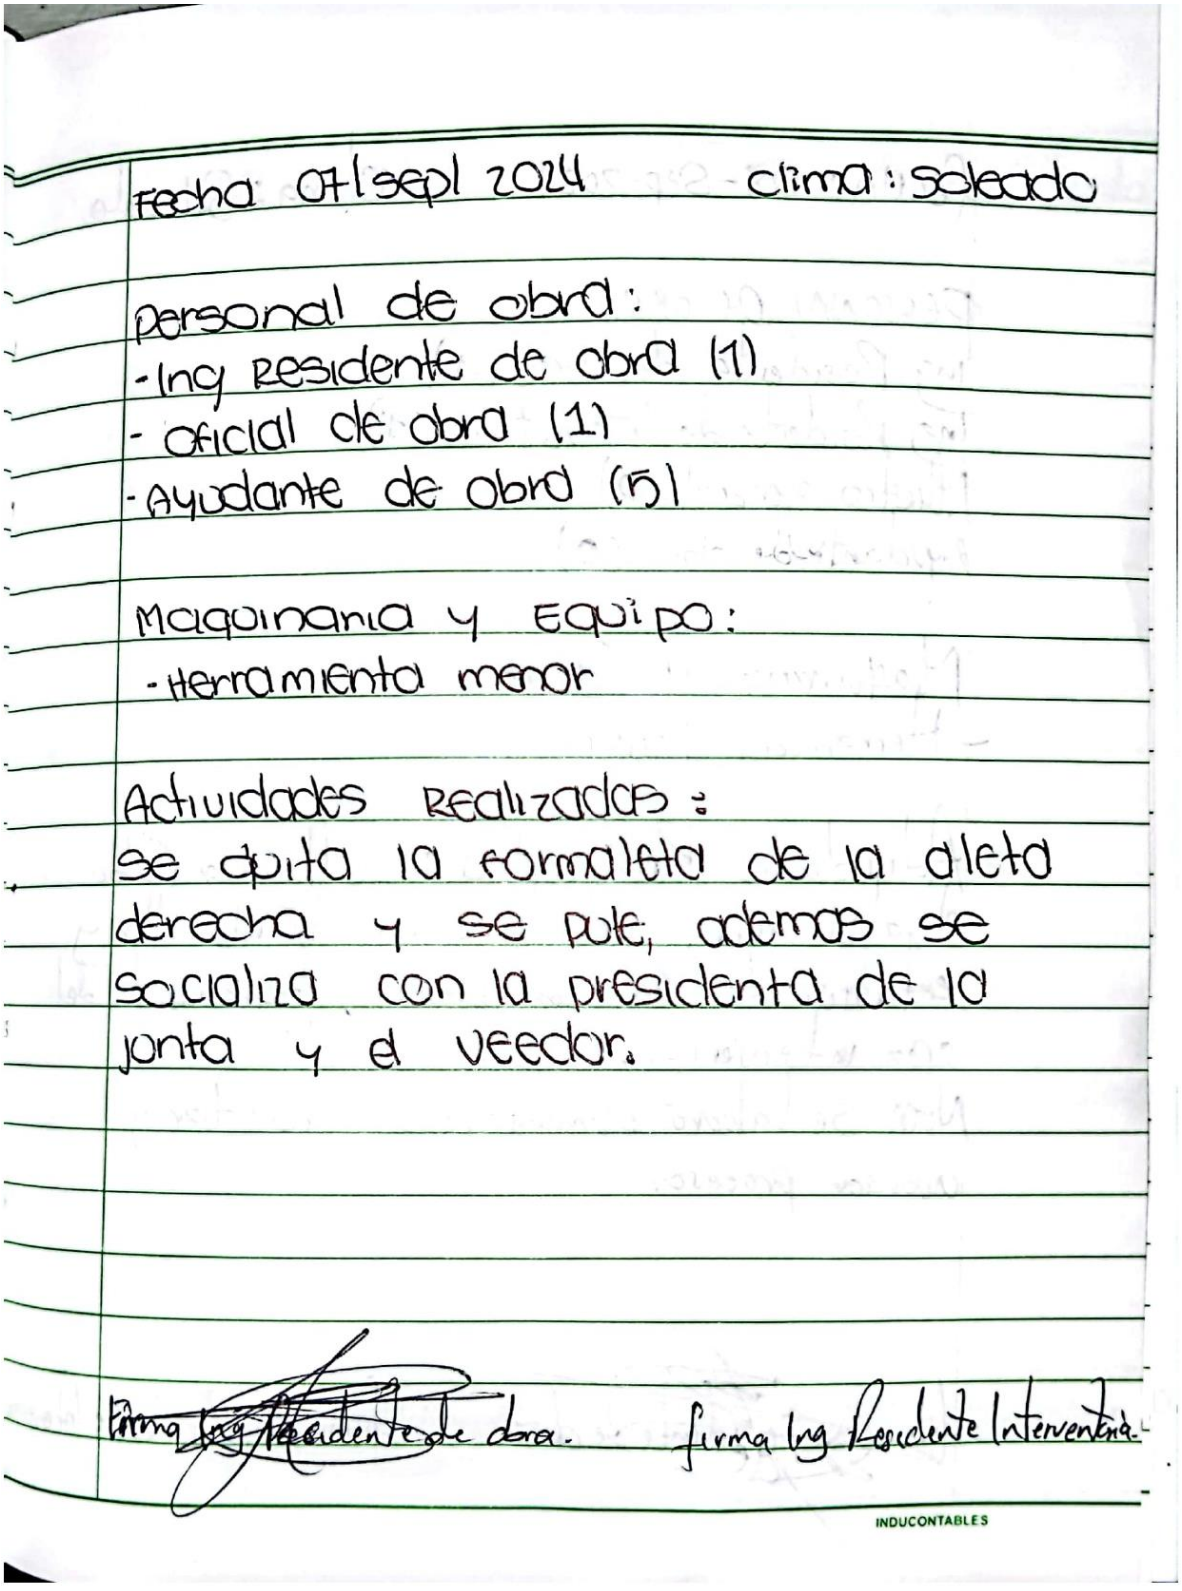

Fecha 07/sept 2024 clima: soleado

personal de obra:
- Ing Residente de obra (1)
- oficial de obra (1)
- Ayudante de obra (5)


Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor

Actividades Realizadas:
se quita la formaleta de la aleta derecha y se pote, ademas se socializa con la presidenta de la junta y el veedor.

Firma Ing Residente de obra. Firma Ing Residente Interventoría.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

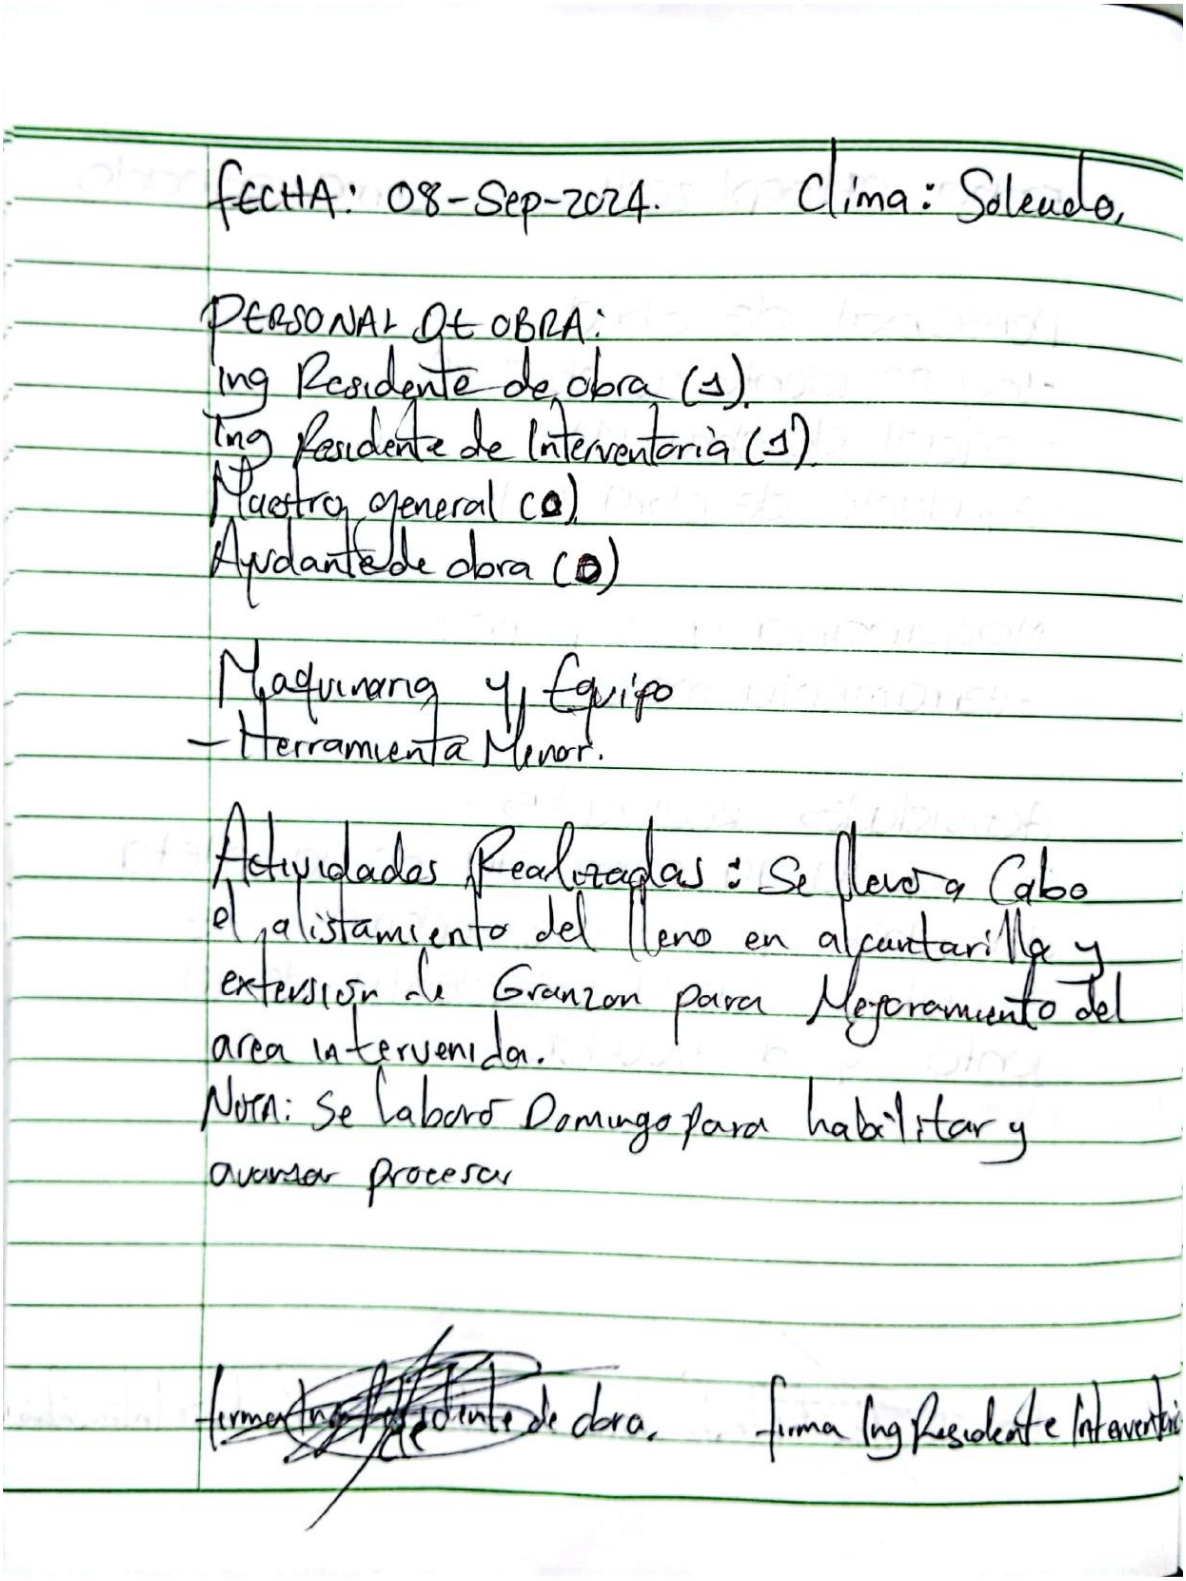

FECHA: 08-Sep-2024. Clima: Soleado,

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1).
Ing Residente de Interventoria (1).
Maestro general (0)
Ayudante de obra (0)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta Menor.

Actividades Realizadas: Se llevo a Cabo el alistamiento del lleno en alcantarilla y extension de Granzon para Mejoramiento del area intervenida.
Nota: Se laboro Domingo para habilitar y avanzar procesos

firma Ingeniero Residente de obra. firma Ing Residente Interventoría

Powered by CamScanner

FECHA: 09-SEP-2024. Clima: Soleado.

PERSONAL DE OBRA.
- Ing Residente de obra (1).
- Ing Residente de Interventoria (1).
Maestro general (1)
Ayudante de obra (4)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta Menor.
- Motodadora 2 Sacos.

Actividades Realizadas:
-Se llevo a Cabo amarre de acero para placa y Cunetas en Barra de Acero No. 3, Por otro lado Se llevo a Cabo el distamperto de la formaleta metalica para Vaciado de Concreto de la placa Huella.

firma Ing Residente de obra. firma Ing Residente de Interventoria.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

FECHA: 10-Sep-2024. Clima: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de Interventoria (1).
Ing Residente de obra (1).
Maestro general (1)
Ayudante de obra (4). (4)

Maquinaria y Equipo.
-Herramienta Menor. -Estacionaria
-Mezcladora -planta electrica.

Actividades Realizadas:
-Se Continúa Con el traslado de Materiales al punto de Inicio en Construcción de la placa Huella, por otra parte se lleva a Cabo el replanteo Manual teniendo en Cuenta la topografía existente en obra para de esta Manera armar las Secciones de las losas cuya longitud Corresponde a 3,0m/1.

Firma Ing Residente de obra. Firma Ing Residente Interventoria

Powered by CamScanner

FECHA: 11-Sep-2024. Clima: Dia Soleado.

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1).
Ing Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Ayudante de obra (5).

Maquinaria y Equipo
- Herramienta Menor. - Estacionaria
- Mezcladora - planta Electrica

Actividades Realizadas:
- Se llevo a Cabo el alistamiento de formaleta Metalica y de Madera para Construcción de placa Huella.
- Se llevo a Cabo el Corte de Acero, amarre y traslado al sitio de obra.

firma Ing Residente de obra.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

FECHA: 12-Sep-2024. Clima: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1)
Ing Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Ayudante de obra (5)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta Menor. - Mezcladora

Actividades Realizadas: Se llevo a Cabo la ampliacion del descole en alcantarilla y a adecuacion del encole en la misma.
- La retroexcavadora llevo a Cabo el alistamiento en lo que Corresponde a la extension de Granzon y Cortes laterales para adecuacion de via donde se llevara a Cabo la Construccion de la placa Huella.

firma Ing Residente de obra. firma Ing Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

FECHA: 13-Sep-2024. Clima: Soleado.

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1).
Ing Residente de Interventoría (1)
Maestro de obra (1).
Ayudante de obra (5).


Maquinaria y Equipo
- Herramienta Menor - Maquinaria amarilla (retro).
- Vibrocompactador.

Actividades Realizadas: Durante la jornada de hoy se llevo a cabo el Suministro, extension y Compactacion de Subbase Granular Con Vibrocompactador de doble rodilla, Se llevo a cabo la excavacion Manual para Desvio de agua borde de talud y asi evitar que esta agua perjudicara la subbase instalada y Compactada.

firma Ing Residente de obra firma Ing Residente Interventoria.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

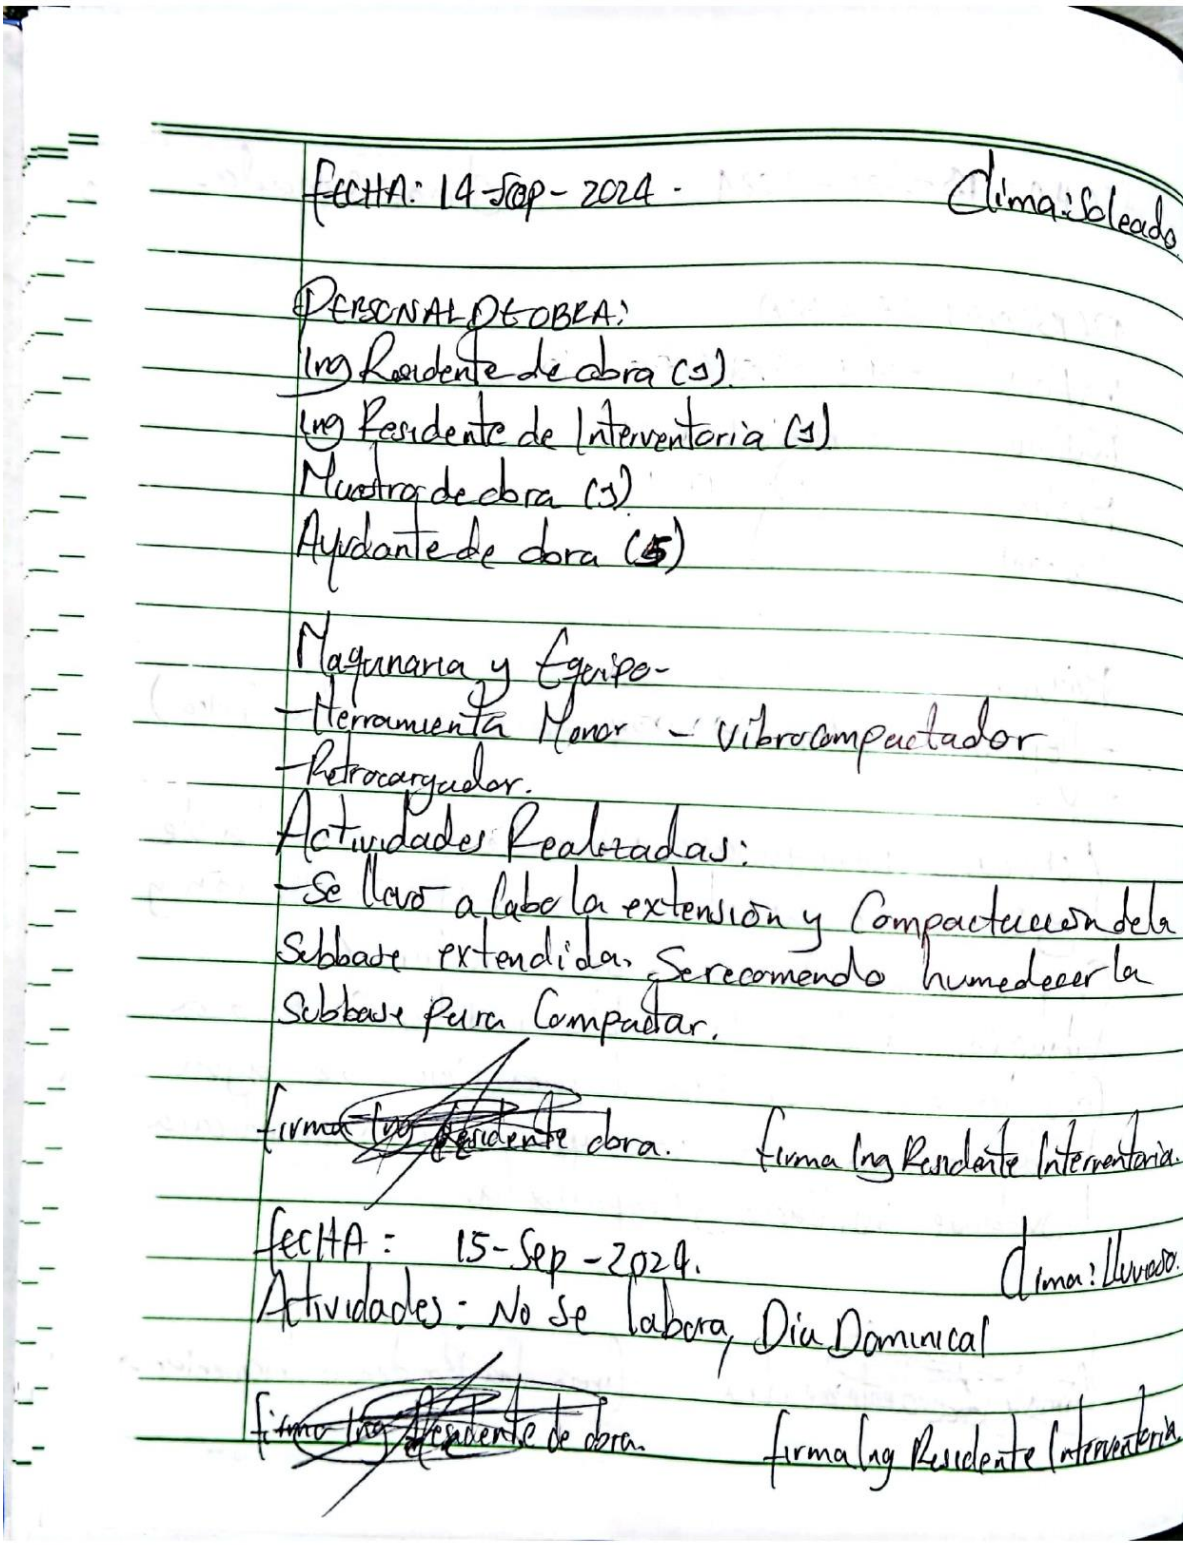

FECHA: 14-Sep-2024. Clima: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1).
Ing Residente de Interventoria (1)
Muestra de obra (1)
Ayudante de obra (5)

Maquinaria y Equipo-
-Herramienta Menor - Vibrocompactador
-Retrocargador.


Actividades Realizadas:
-Se llevo a cabo la extension y Compactacion de la Subbase extendida. Se recomendo humedecer la Subbase para Compactar.

Firma Ing Residente obra. Firma Ing Residente Interventoria.

FECHA: 15-Sep-2024. Clima: Lluvioso.
Actividades: No se labora, Dia Dominical

Firma Ing Residente de obra. Firma Ing Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

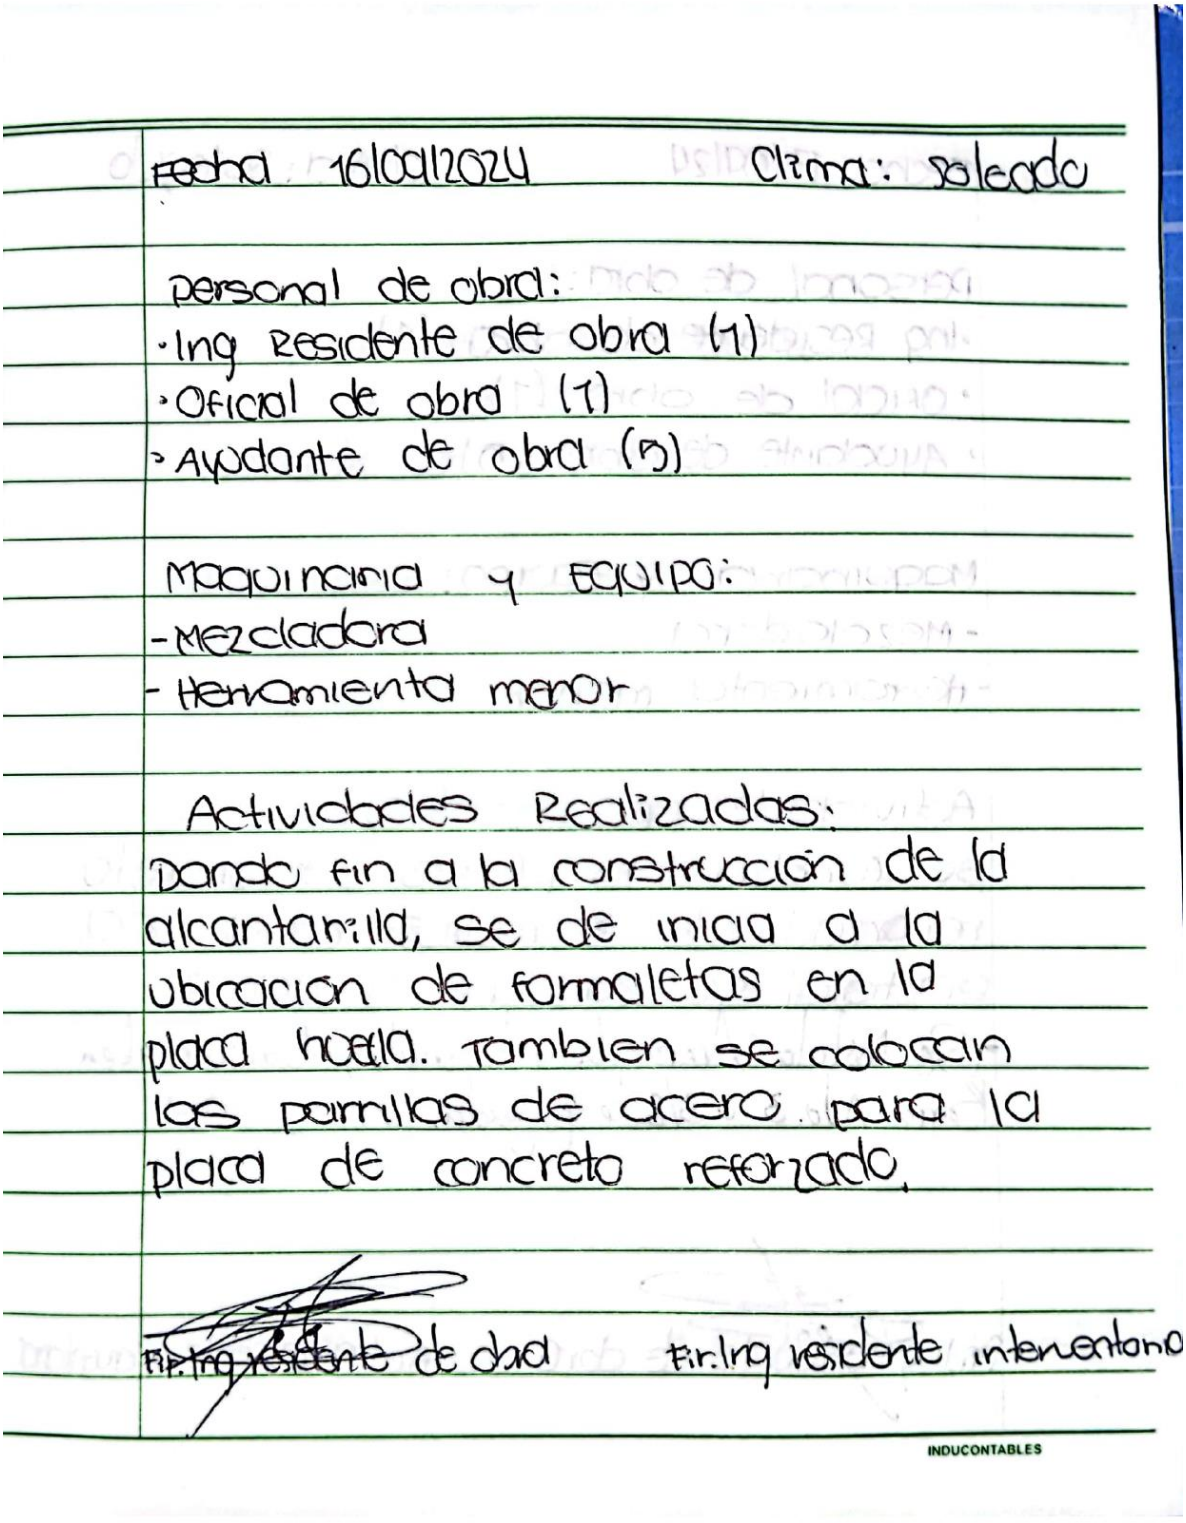

Fecha 16/09/2024 Clima: Soleado

Personal de obra:
- Ing Residente de obra (1)
- Oficial de obra (1)
- Ayudante de obra (3)


Maquinaria y Equipo:
- Mezcladora
- Herramienta menor

Actividades Realizadas:
Dando fin a la construcción de la alcantarilla, se de inicia a la ubicacion de formaletas en la placa huella. Tambien se colocan las parrillas de acero para la placa de concreto reforzado.

Fir. Ing residente de obra Fir. Ing residente interventoria

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

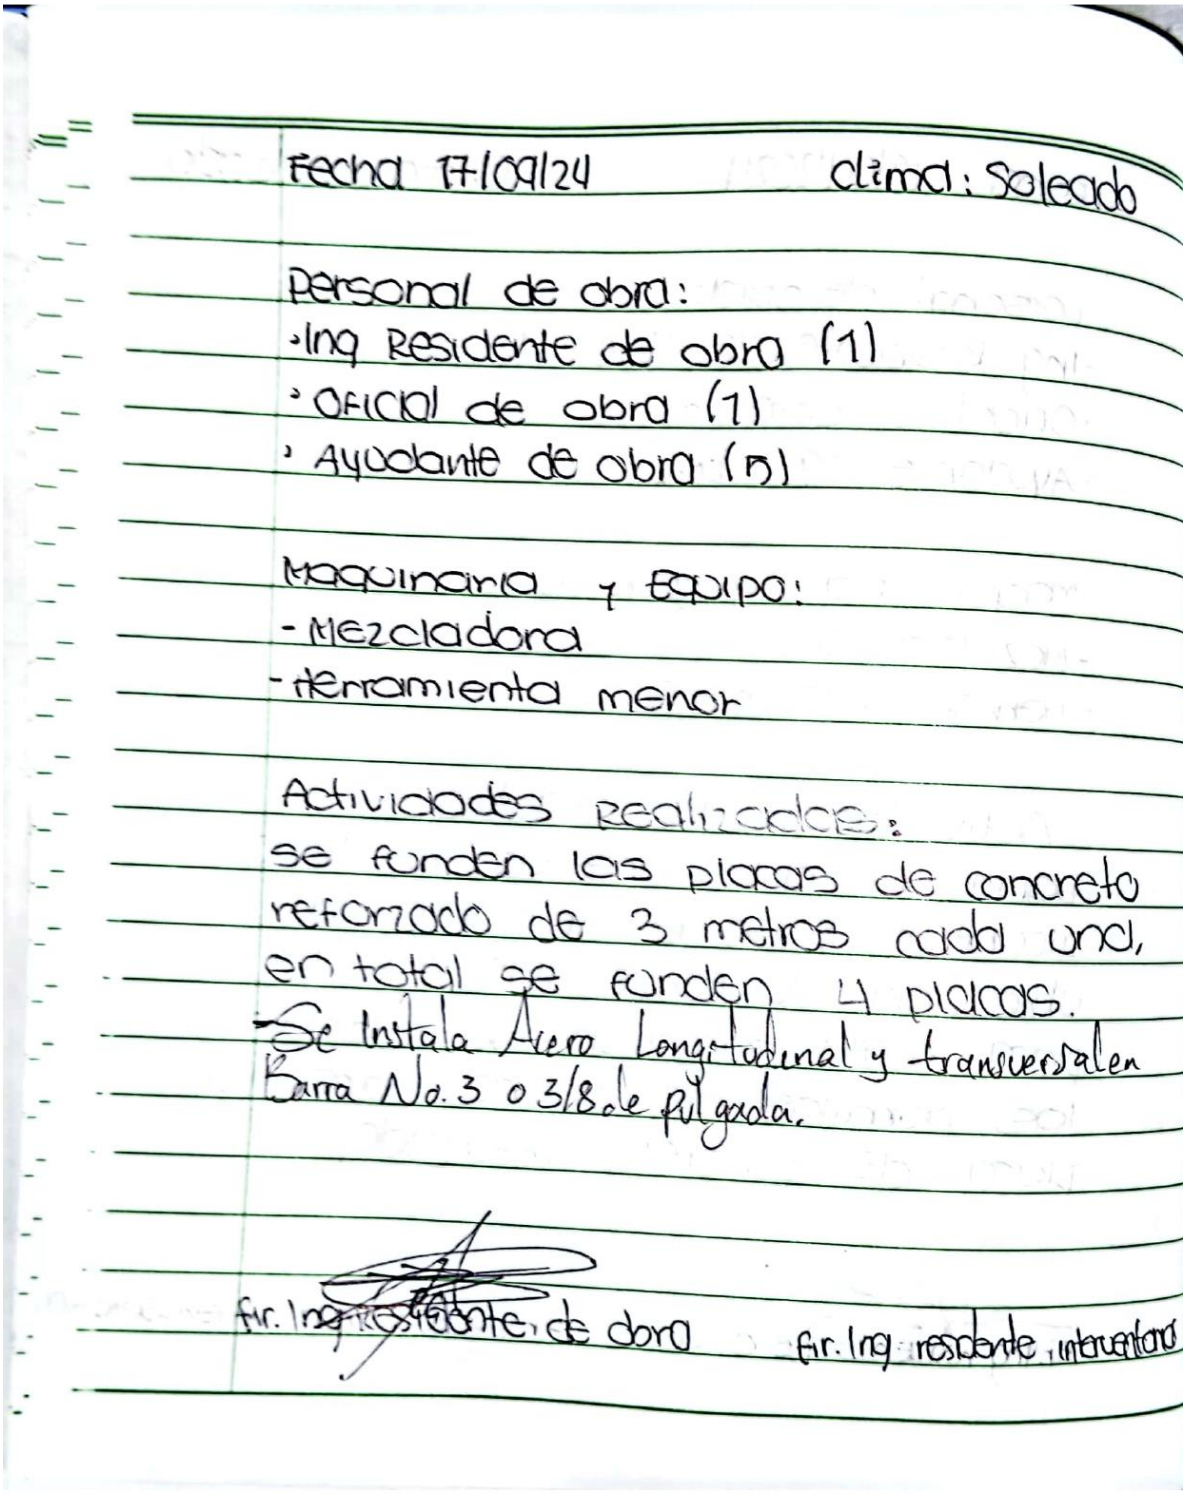

Fecha 17/09/24 clima: Soleado

Personal de obra:
- Ing Residente de obra (1)
- Oficial de obra (1)
- Ayudante de obra (5)

Maquinaria y Equipo:
- Mezcladora
- Herramienta menor

Actividades Realizadas:
Se funden las placas de concreto reforzado de 3 metros cada una, en total se funden 4 placas.
Se instala Acero Longitudinal y transversal en Barra No. 3 o 3/8 de pulgada.

fir. Ingeniero residente de obra fir. Ing. residente interventoria

Powered by CamScanner

Fecha 18/09/24 Clima: Soleado

personal de obra:
- Ing Residente de obra (1)
- oficial de obra (1)
- Ayudante de obra (5)


Maquinaria y EQUIPO:
- Mezcladora
- Herramienta menor.

Actividades Realizadas:
Se desencofra la formaleta y se le da continuidad lleal mente para asi fundir al dia siguiente. y se toman muestras para fallo compresión.

fir. Ing residente de obra fir. Ing residente interventoria

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

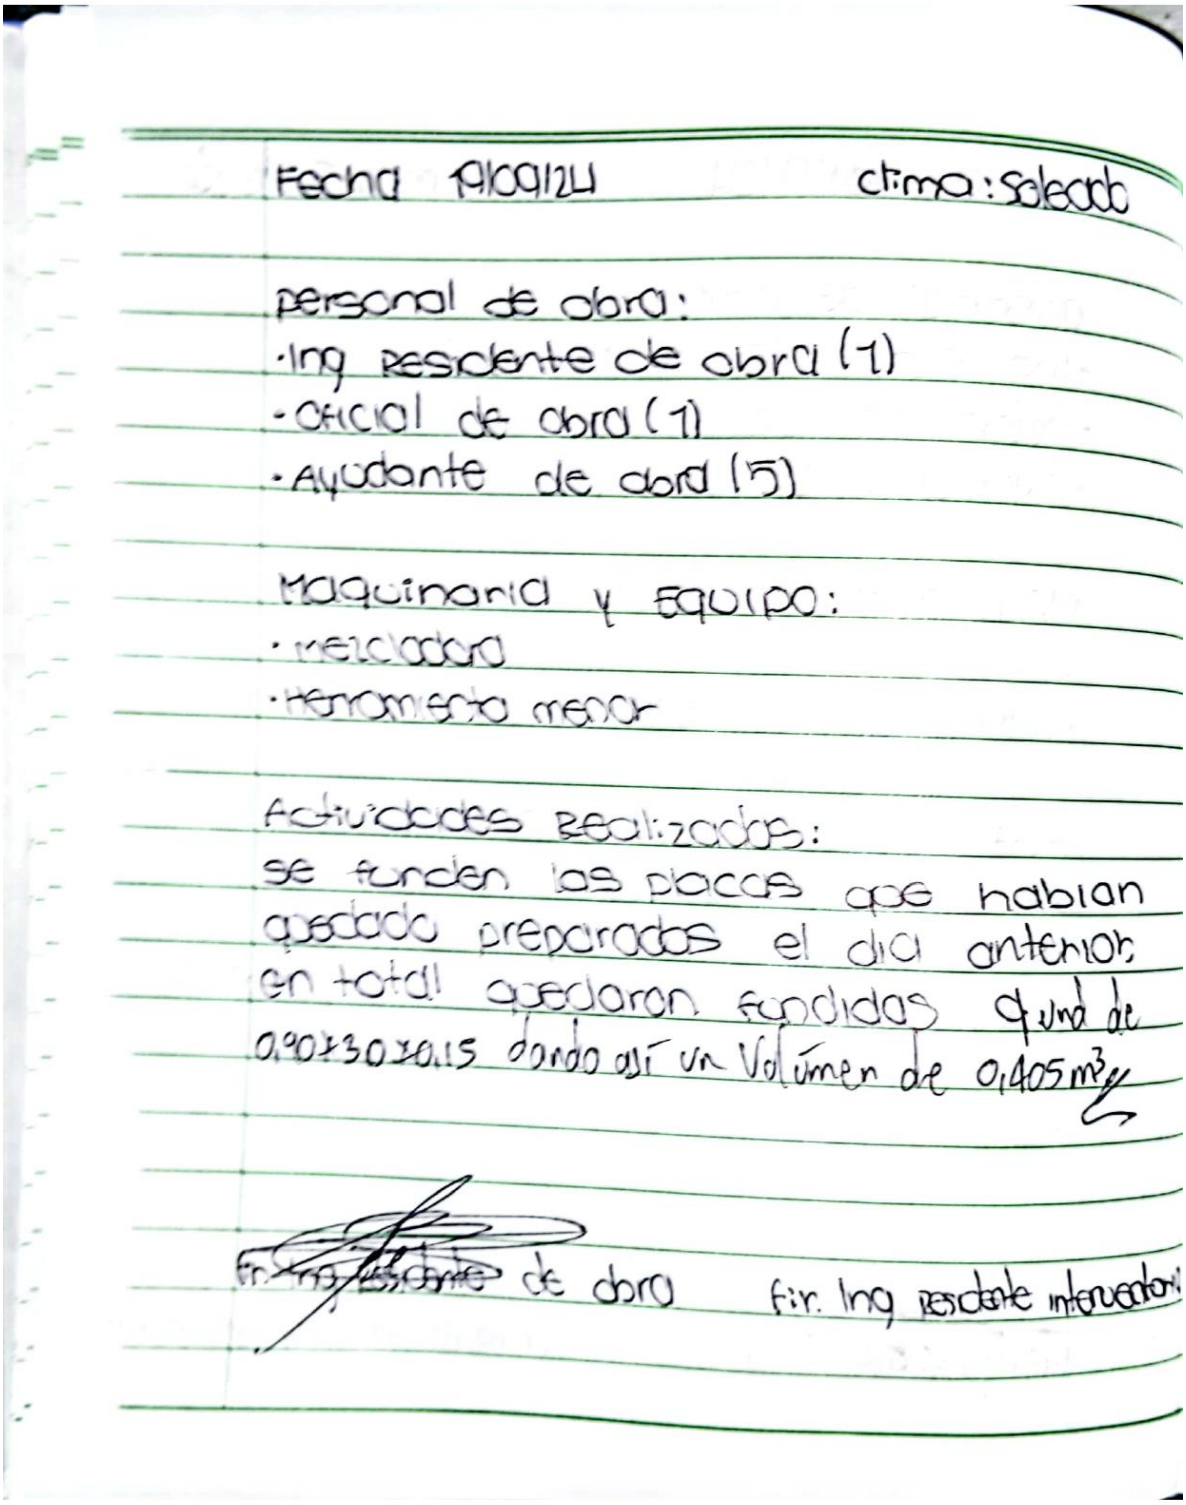

Fecha 19/09/24 clima: Soleado


Personal de obra:
- Ing Residente de obra (1)
- Oficial de obra (1)
- Ayudante de obra (5)

Maquinaria y Equipo:
- mezcladora
- Herramienta menor

Actividades Realizadas:
se fundieron las placas que habian quedado preparadas el dia anterior en total quedaron fundidas 4 und de 0.90x30x0.15 dando así un Volúmen de 0,405 m³

Fir. Residente de obra Fir. Ing Residente interventoría

Powered by CamScanner

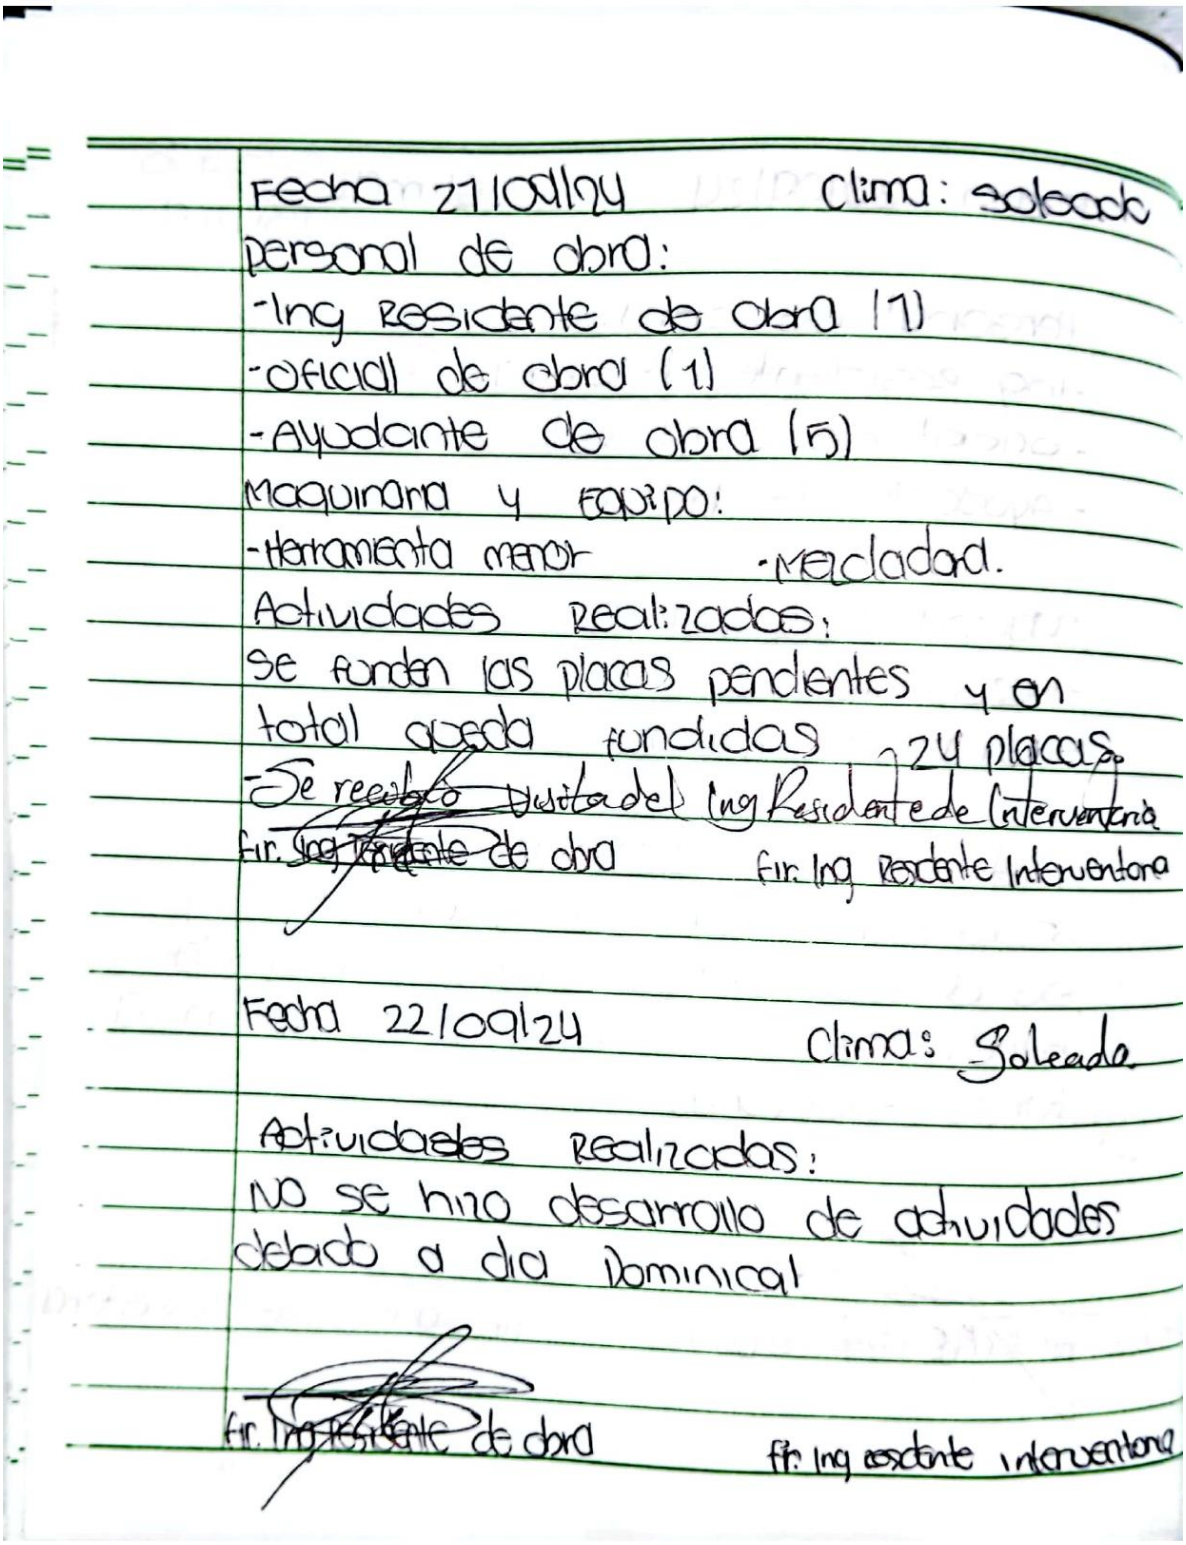

Fecha 21/09/24 Clima: soleado
personal de obra:
-Ing Residente de obra (1)
-oficial de obra (1)
-Ayudante de obra (5)
Maquinaria y Equipo:
-Herramienta menor -Mezcladora.
Actividades Realizadas:
Se funden las placas pendientes y en total queda fundidas 24 placas.
-Se recibió visita del Ing Residente de Interventoría
Fir. Ing Residente de obra Fir. Ing Residente Interventoría

Fecha 22/09/24 Clima: Soleado

Actividades Realizadas:
NO se hizo desarrollo de actividades debido a día Dominical

Fir. Ing Residente de obra Fir. Ing residente interventoría

Powered by CamScanner

FECHA: 23-Sep-2024 Clima: Soleada.


PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1).
Ing Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Ayudante de obra (5).

Herramienta y Equipo:
- Herramienta Menor

Actividades Realizadas:
- Durante la jornada se llevó a Cabo la extension de formaleta Metálica para encofrado y posterior a esto el Vaciado de la losa de 0,90*3,0*0,15m en la Margen Izquierda.
- Se cubren losas fundidas con Costales negro para evitar fragvado acelerado de las mismas.
- Se Inspecciona por parte del Ing Residente los niveles para Verificacion de Bombeo en tangente.

Firma Ing Residente de obra. Firma Ing Interventoria

INDUCONTABLES
Powered by CamScanner

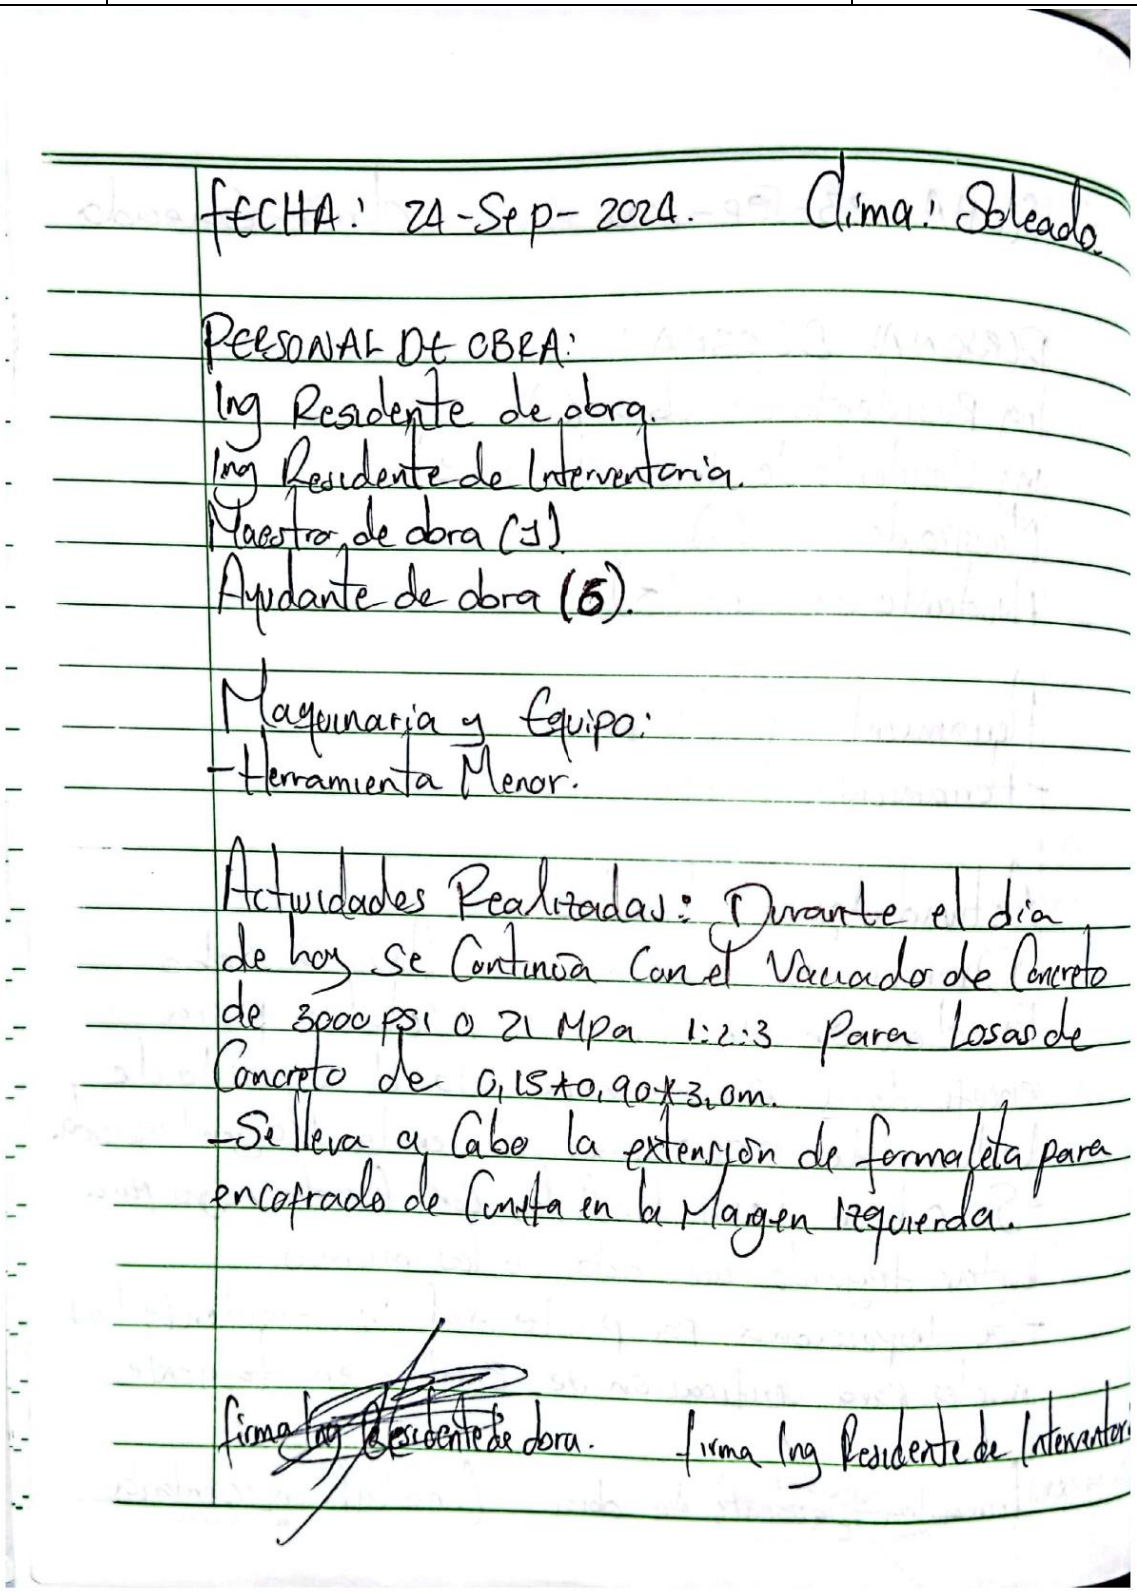

FECHA: 24-Sep-2024. Clima: Soleado.

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra.
Ing Residente de Interventoría.
Maestro de obra (1)
Ayudante de obra (6).

Maquinaria y Equipo:
-Herramienta Menor.

Actividades Realizadas: Durante el día de hoy se Continúa Con el Vaciado de Concreto de 3000 PSI o 21 MPa 1:2:3 Para Losas de Concreto de 0,15*0,90*3,0m.
-Se lleva a Cabo la extensión de formaleta para encofrado de Cuneta en la Margen Izquierda.

Firma Ing Residente de obra. Firma Ing Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

FECHA: 25-Sep-2024. Clima: Soleado


PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1).
Ing Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Ayudante de obra (6).

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta Menor.

Actividades Realizadas: Se llevó a Cabo el encofrado de Cuneta y placas para abrir pista y al dia siguiente llevar a Cabo el Vaciado de Concreto para las mismas.
- Es Importante Resaltar que Se Colocan Paletas ó Separadores de Mortero para Separar el acero de la Superficie de la Subbase.

firma Ing Residente de obra. firma Ing Residente de Interventoria.

Powered by CamScanner

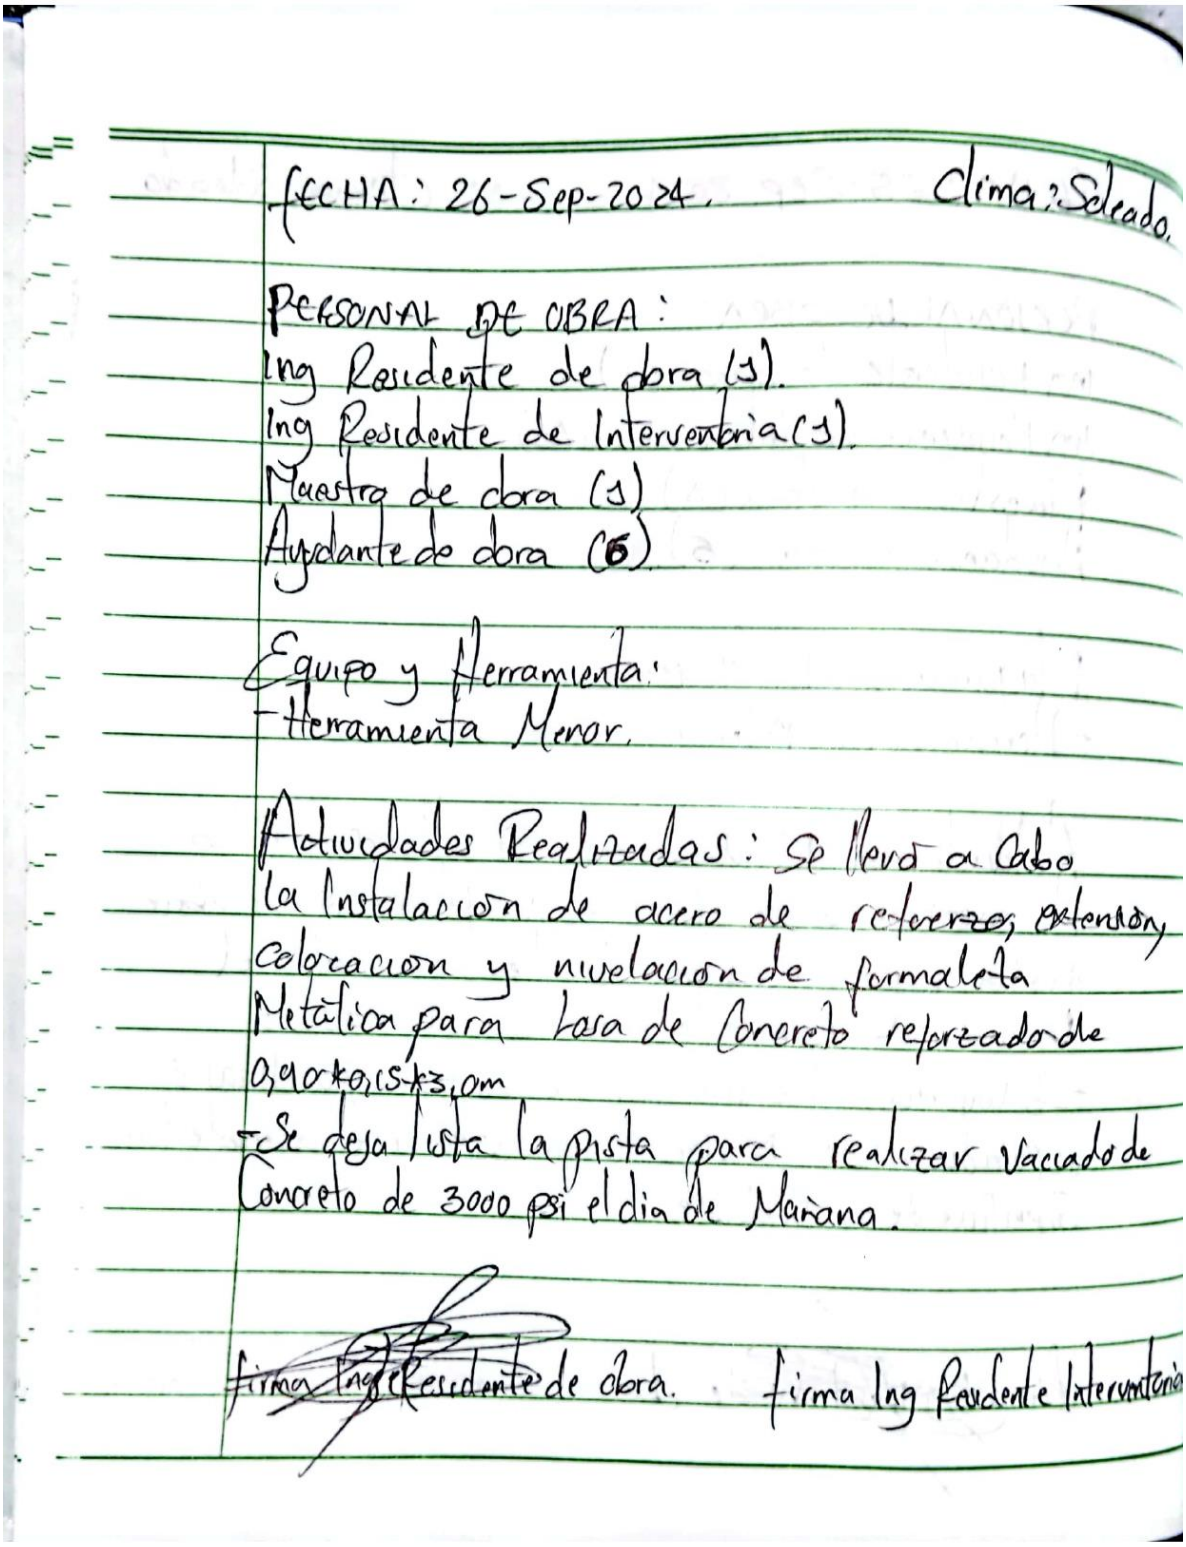

FECHA: 26-Sep-2024. Clima: Soleado.

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1).
Ing Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Ayudante de obra (6).

Equipo y Herramienta:
-Herramienta Menor.

Actividades Realizadas: Se llevo a Cabo la Instalacion de acero de refuerzo, extension, colocacion y nivelacion de formaleta Metalica para Losa de Concreto reforzado de 0,90x0,15+3,0m
-Se deja lista la pista para realizar Vaciado de Concreto de 3000 psi el dia de Mañana.

Firma Ing Residente de obra. Firma Ing Residente Interventoria


Powered by CamScanner

FECHA: 27-Sep-2024 Clima: Soleado.

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1).
Ing Residente de Interventoría (1).
Maestra de obra (1)
Ayudantes de obra (6)

Equipo y Herramienta.
-Herramienta Menor

Actividades Realizadas: Se llevó a Cabo el vaciado de Cuneta para placa Huella y el encofrado y alistamiento de Pista para Continuar con las actividades en obra el día de Mariana.
-Se realizó toma de Muestras de Concreto en Cilindros para ensayo de laboratorio en Compresión.



Detalle Cuneta

firma ~~Ing~~ Residente de Obra. firma Ing R. Interventoría.

Powered by CamScanner

FECHA: 28-Sep-2024. Clima: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1).
Ing Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1).
Ayudantes de obra (6).

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta Menor.


Actividades Realizadas: Se llevo el vaciado de Concreto para Cuneta.
- Se laboro hasta el Medio dia.
- Se dejo pista para el lunes.

firma Ing. Residente de obra. firma Ing. R. Interventoria.

FECHA: 29-Sep-2024. Clima: Soleado.

Actividades Realizadas: No se ejecutan act., Dia Dominical.

Powered by CamScanner

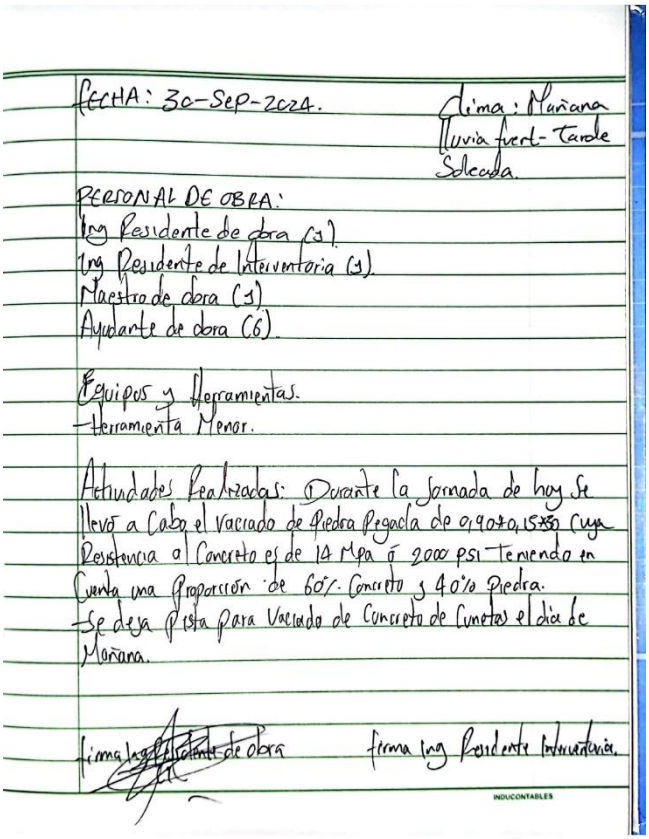

FECHA: 30-SEP-2024. Clima: Mañana lluvia fuert- Tarde Soleada.

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1)
Ing Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Ayudante de obra (6)

Equipos y Herramientas.
-Herramienta Menor.

Actividades Realizadas: Durante la Jornada de hoy se llevó a Cabo el vaciado de Piedra Pegada de 0,40 a 0,45 Cuya Resistencia a Concreto es de 14 Mpa ó 2000 psi Teniendo en Cuenta una Proporción de 60% Concreto y 40% Piedra.
-Se deja Pista para Vaciado de Concreto de Cunetas el dia de Mañana.

firma Ingeniero de obra — firma Ing Residente Interventoria.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

9. ACTAS DE RECIBO FINAL Y ENTREGA DE LOS CONVENIOS VEREDA ASOJUNTAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONVENIO No. 3979 DE 2023 (Indicar número y año del convenio)

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA	SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ
NOMBRE DEL CORREDOR	ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
FECHA DE INICIO	18/10/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO (INCLUYE PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	16/10/2024
INTERVENTOR	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4647 DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 198.398.806,00
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 0,00
VALOR ADICIONAL No. 2	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 198.398.806,00
APORTE CONTRATISTA	$ 1.000.000,00

CONVENIO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONVENIO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
3979 DE 2023	26/12/2023	9 meses	$ 198.398.806,00	$ 198.398.806,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
suspension NO. 1		**28/12/2023**	28/12/2023	17/01/2024	
	ampliacion No. 1 a la suspension No. 1	**17/01/2024**	17/01/2024	15/02/2024	
suspension NO. 2		**16/02/2024**	16/02/2024	1/04/2024	
reinicio No. 1		**1/04/2024**			**1/04/2024**
prorroga No.1		**1/04/2024**	1/04/2024	30/04/2024	
prorroga No. 2		**30/04/2024**	30/04/2024	30/05/2024	
prorroga No. 3		**30/06/2024**	30/06/2024	30/09/2024	

APORTE EFECTUADO POR EL CONTRATISTA

Consecutivo	Aporte Herramienta menor (GMC) /Conocimiento Ancestral (Comunidades Indígenas)	Descripción / Objeto	Valor Aporte
1	herramienta menor	carretillas, palines, cizalla,picas, garlanchas con cabo, flexometro 6m y termo para hidratacion	$ 1.000.000,00

VALOR TOTAL EJECUTADO

DOCUMENTO SOPORTE	RECURSOS EJECUTADOS DISCRIMINADOS POR APORTES DE LAS PARTES		VALOR TOTAL EJECUTADO
	INVIAS	CONTRATISTA	
ACTAS PARCIALES DE OBRA No. 3979 DE 2023	$ 198.398.806,00	$ 1.000.000,00	$ 199.398.806,00
	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 198.398.806,00**	**$ 1.000.000,00**	**$ 199.398.806,00**

DESEMBOLSO

Valor total concedido:	$	198.398.806,00
Valor Ejecutado:	$	199.398.806,00
Saldo sin ejecutar:	$	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

METAS FISICAS EJECUTADAS RECIBIDAS POR LA INTERVENTORIA

1. MANTENIMIENTO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
ROCERÍA				
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS				

1. MEJORAMIENTO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
PLACA HUELLA	ML	159	$ 198.398.806,00	$ 198.398.806,00
ALCANTARILLA DIAMETRO 90 CMS				

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo del Convenio se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el convenio y contrato de interventoría; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVIAS exigirá al contratista, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Convenio quienes en ella intervienen.

Firma:
Nombre: SIXTO JAVIER PARRA RAMIEZ
Representante Legal ASOJUNTAS ALBANIA
Contratista C.C 1.117.785.524

Firma:
Nombre: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal
Matrícula Profesional N N/A
cedula de ciudadanía: 31.577.305 de Cali

Nombre: Jhon Jairo García Calderon
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No. 25202-119996 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VEREDA DELICIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONVENIO No. 3674 de 2023 (Indicar número y año del convenio)

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA	DAIRO GOMEZ CARDENAS
NOMBRE DEL CORREDOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS
FECHA DE INICIO	18/10/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO (INCLUYE PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	16/10/2024
INTERVENTOR	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4647 DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 198.548.773,00
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 0,00
VALOR ADICIONAL No. 2	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 198.548.773,00
APORTE CONTRATISTA	$ 1.000.000,00

CONVENIO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONVENIO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
3674 de 2023	26/12/2023	9 meses	$ 198.548.773,00	$ 198.548.773,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
suspension NO. 1		**28/12/2023**	28/12/2023	17/01/2024	
	ampliacion No. 1 a la suspension No. 1	**17/01/2024**	17/01/2024	15/02/2024	
suspension NO. 2		**15/02/2024**	16/02/2024	1/04/2024	
reinicio No. 1		**1/04/2024**			**1/04/2024**
prorroga No. 1		**1/04/2024**	1/04/2024	30/04/2024	
prorroga No. 2		**30/04/2024**	30/04/2024	30/05/2024	
prorroga No. 3		**30/05/2024**	30/06/2024	30/09/2024	

APORTE EFECTUADO POR EL CONTRATISTA

Consecutivo	Aporte Herramienta menor (OAC) /Conocimiento Ancestral (Comunidades Indígenas)	Descripción / Objeto	Valor Aporte
1	herramienta menor	carretillas, palines, cizalla,picas, garlanchas con cabo, flexometro 6m y termo para hidratacion	$ 1.000.000,00

VALOR TOTAL EJECUTADO

DOCUMENTO SOPORTE	RECURSOS EJECUTADOS DISCRIMINADOS POR APORTES DE LAS PARTES		VALOR TOTAL EJECUTADO
	INVIAS	CONTRATISTA	
ACTAS PARCIALES DE OBRA No. 3674 DE 2023	$ 198.548.773,00	$ 1.000.000,00	$ 199.548.773,00
	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 198.548.773,00**	**$ 1.000.000,00**	**$ 199.548.773,00**

DESEMBOLSO

Valor total concedido:	$ 198.548.773,00
Valor Ejecutado:	$ 199.548.773,00
Saldo sin ejecutar:	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

METAS FISICAS EJECUTADAS RECIBIDAS POR LA INTERVENTORIA

1. MANTENIMIENTO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
ROCERÍA				
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS				

1. MEJORAMIENTO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
PLACA HUELLA	ML	150	$ 198.548.773,00	$ 198.548.773,00
ALCANTARILLA DIAMETRO 900 CMS 36"	UND	1		

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo del Convenio se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el convenio y contrato de interventoría; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVIAS exigirá al contratista, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Convenio quienes en ella intervienen.

Dairo Gomez.c

Firma:
Nombre: Dairo Garcia Cardenas
Representante Legal VEREDA DELICIAS
Contratista C.C 17,682,437

Firma:
Nombre: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal
Matrícula Profesional P. N/A
cedula de ciudadanía: 31.577.305 de Cali

Nombre: Jhon Jairo Garcia Calderon
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Etnica
Matrícula Profesional No. 25202-119996 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VEREDA FLORIDA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO	CODIGO	
	VERSIÓN	
	PAGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONVENIO No. 4440 DE 2023. (indicar número y año del convenio)

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA	MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY
NOMBRE DEL CORREDOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA
FECHA DE INICIO	18/10/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO (INCLUYE PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	16/10/2024
INTERVENTOR	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4647 DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 199.295.465,00
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 0,00
VALOR ADICIONAL No. 2	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199.295.465,00
APORTE CONTRATISTA	$ 1.000.000,00

CONVENIO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONVENIO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
4440 DE 2023.	28/12/2023	9 meses	$ 199.295.465,00	$ 199.295.465,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
suspension NO. 1		28/12/2023	28/12/2023	17/01/2024	
	ampliacion No. 1 a la suspension No. 1	17/01/2024	17/01/2024	15/02/2024	
suspension NO. 2		15/02/2024	15/02/2024	1/03/2024	1/03/2024
reinicio No. 1		1/03/2024			
prorroga No. 1		1/04/2024	1/04/2024	30/04/2024	
prorroga No. 2		30/04/2024	30/04/2024	30/06/2024	
prorroga No. 3		30/06/2024	30/06/2024	30/09/2024	

APORTE EFECTUADO POR EL CONTRATISTA

Consecutivo	Aporte Herramienta menor (SAO) /Compensación social (Comunidades Indígenas)	Descripción / Objeto	Valor Aporte
1	herramienta menor	carretillas, palines, cizalla,picas, garlanchas con cabo, flexometro 6m y termo para hidratacion	$ 1.000.000,00

VALOR TOTAL EJECUTADO

DOCUMENTO SOPORTE	RECURSOS EJECUTADOS DISCRIMINADOS POR APORTES DE LAS PARTES		VALOR TOTAL EJECUTADO
	INVIAS	CONTRATISTA	
ACTAS PARCIALES DE OBRA No. 4440 DE 2023	$ 199.295.465,00	$ 1.000.000,00	$ 200.295.465,00
	$	$	$
TOTAL	**$ 199.295.465,00**	**$ 1.000.000,00**	**$ 200.295.465,00**

DESEMBOLSO

Valor total concedido:	$ 199.295.465,00
Valor Ejecutado:	$ 200.295.465,00
Saldo sin ejecutar:	$

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO	CODIGO	
	VERSIÓN	
	PAGINA	

METAS FISICAS EJECUTADAS RECIBIDAS POR LA INTERVENTORIA

1. MANTENIMIENTO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
ROCERÍA				
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS				

1. MEJORAMIENTO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
PLACA HUELLA	ML	120	$ 199.295.465,00	$ 199.295.465,00
ALCANTARILLA DIAMETRO 900 CMS 36"				

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo del Convenio se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el convenio y contrato de interventoría, al interior del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVIAS exigirá al contratista, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondientes.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Convenio quienes en ella intervienen.

Firma:
Nombre: MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY
Representante Legal VEREDA FLORIDA
Contratista C.C 1.049.619.218

Firma:
Nombre: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal
Matricula Profesional N. N/A
cedula de ciudadanía: 31.577.305 de Cali

Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matricula Profesional No. 161037-0593412 TLM

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S
Matricula No. 2520237430CND
