INFORME EJECUTIVO VISITA DE OBRA

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA

Se inicia la visita con un recorrido por los diferentes puntos de intervención los cuales al día de esta visita son 3, el primero se encuentra en la carrera 2 entre calles 17 y 18, el segundo en la carrera 1 con calle 11 y el tercer punto es en la carrera 2 con calle 9.

CARRERA 2 ENTRE CALLES 16 Y 17.








Scanned with CamScanner

En este punto de intervención de la carrera 2 entre calle 16 y 17 se encuentran instalando hierro y formaleta para fundir una sección de aproximadamente de 2.10 m x 2.10 m x 0.30 m para caja colectora (cámara colectora de aguas), en este punto se encontraba el maestro Carlos Edgar García el cual nos ilustro la actividad en la cual estaban trabajando.

CARRERA 2 CON CALLE 9 SECTOR DE CAR WASH

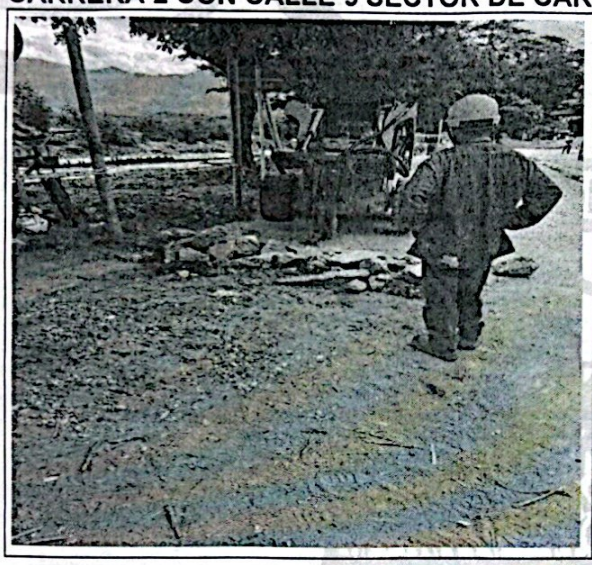

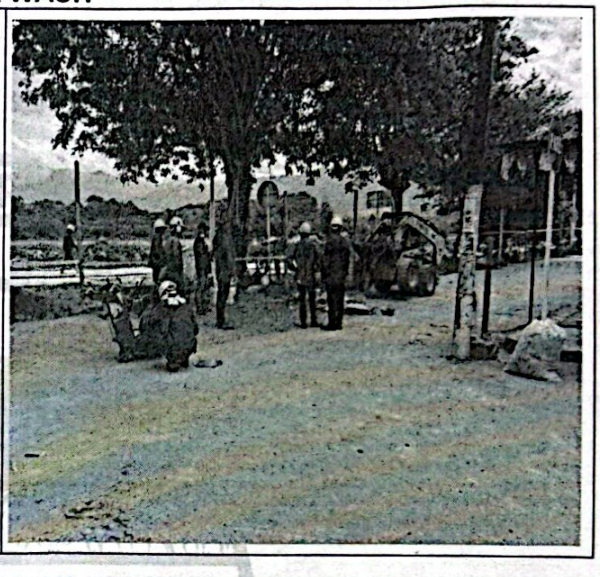


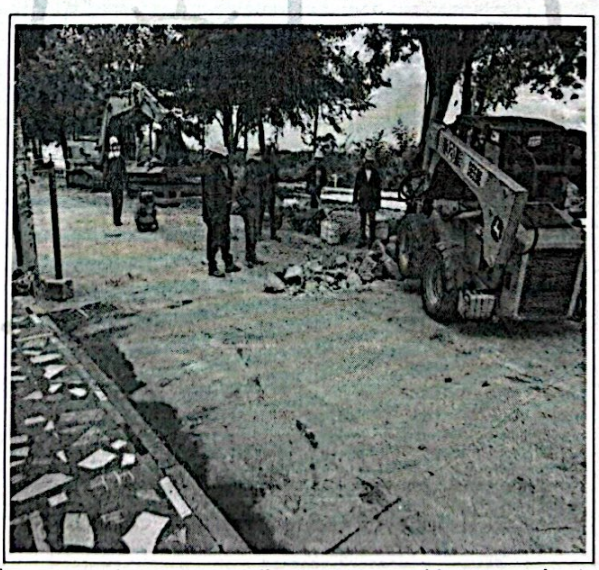


Demolición de placa de concreto para realizar excavación para instalas tubería de 45", se encontraba personal pero al preguntar si se encontraba alguien encargado de la actividad el personal manifestó que no se encontraba en el punto.

Scanned with CamScanner

CARRERA 1 CON CALLE 11

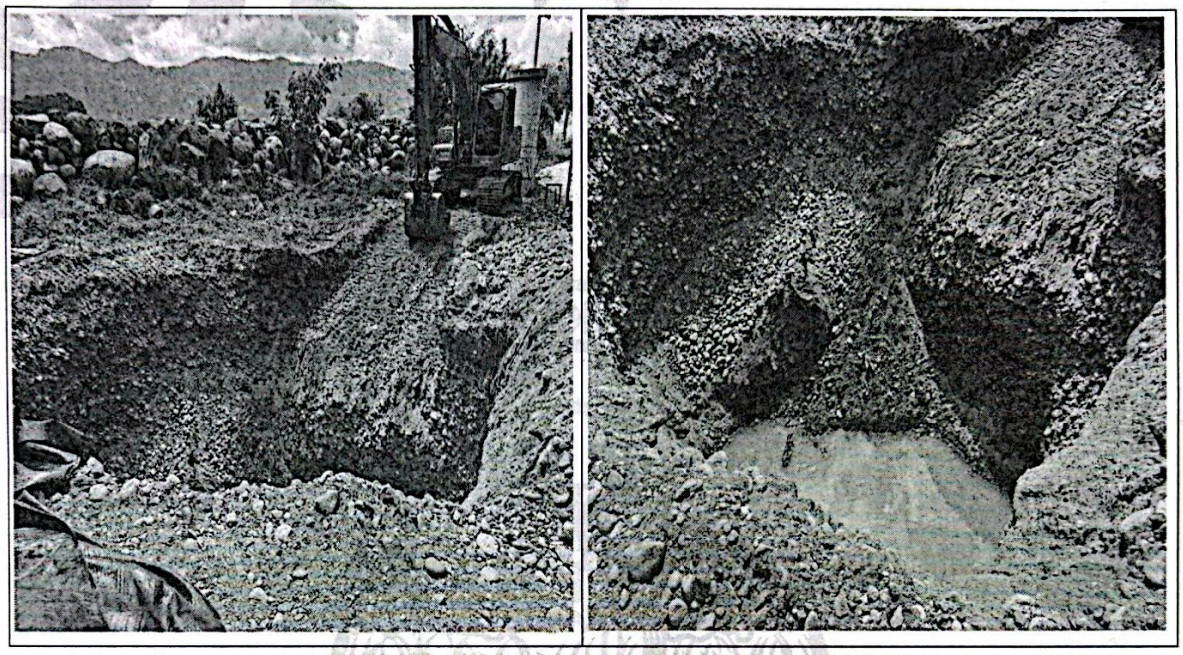

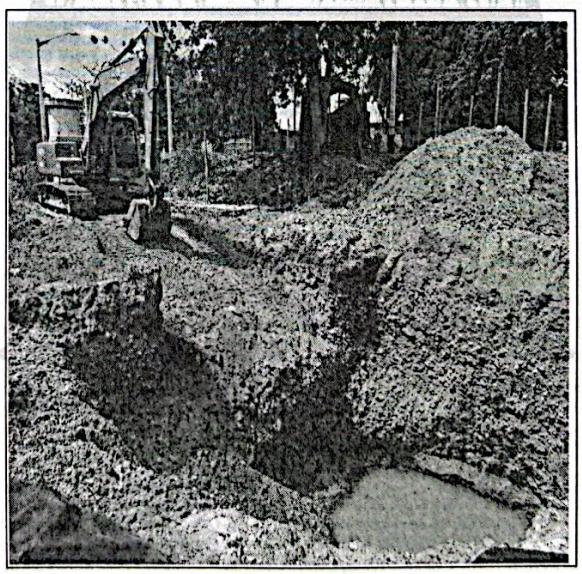

Excavación para realizar estación de bombeo. No se encontraba alguien encargado de la actividad.

Scanned with CamScanner

Durante el recorrido en el punto de la carrera 2 con calle 9 se le pregunta al personal que donde se puede encontrar al ingeniero residente de la obra ellos informan que en las oficinas de la obra las cuales están ubicadas en la **Escuela francisco José de Caldas,** en la oficina se dialoga con el ingeniero Oscar García residente de la obra el cual me informa la actividad que están desarrollando en cada punto de intervención de la obra.

Juan Sebastian Millan Mariño
Ingeniero civil
Contratista alcaldía de La Dorada, Caldas.

Scanned with CamScanner
