BITÁCORA DE OBRA

NO. CONTRATO DE OBRA.	NO. 2023- 04-0011
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO VALLEDUPAR 2023
DIRECTOR DE OBRA.	BARROS PIMIENTA CHESMAN HOBBET
RESIDENTE DE OBRA	CARLOS MARIO SANCHEZ
NO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	NO 2023- 05- 0011
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RÍO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	GRUPO CONSULTORES E INGENIEROS "GRUCOING S.A.S"
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ALVARO SOLANO AGUILAR
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	LUZ ANGELA JARAMILLO
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA:	GIOVANNY ALFONSO GARCÍA JACOME
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR
PLAZO DE EJECUCIÓN:	08 MESES 00 DÍAS
FECHA DE INICIO:	10 DE JULIO 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARZO 2023

líder

Powered by CamScanner


Fecha 09-04-2024
Personal en obra por parte del contratista
No se registra asistencia del personal tanto administrativo como operativo en obra, debido al cese de actividades por parte del contratista
Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Estado del tiempo
Mañana soleado MEDIA soleado TARDE soleado

SISOMA
No se registran actividades ni asistencia de personal en obra, debido a cese de actividades por parte del contratista.

ACTIVIDADES.
Hoy, 09 de abril de 2024, una vez mas, el personal de obra no se presentó para llevar a cabo las actividades programadas en el SI. Hasta el momento, persiste la falta de comunicación por parte del contratista respecto a motivos y causas que llevaron a esta decisión unilateral de cesar las actividades en la obra



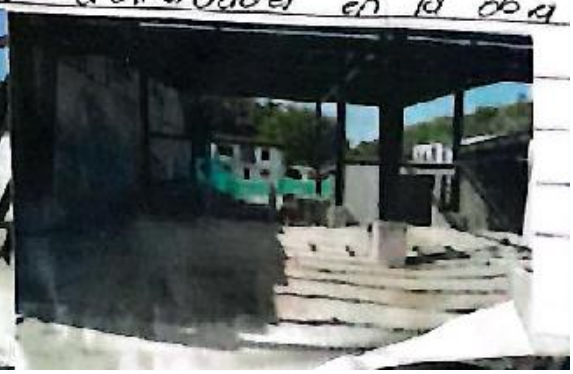

líderes

Powered by CamScanner

Fecha 09-04-2024

Personal en obra por parte del contratista

No se registra asistencia del personal tanto administrativo como operativo en obra, debido al cese de actividades por parte del contratista

Personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE

Estado del tiempo

Mañana soleado MEDIA soleado TARDE soleado

SISOMA

No se registran actividades ni asistencia de personal en obra, debido a cese de actividades por parte del contratista.


ACTIVIDADES.

Hoy, 09 de abril de 2024, una vez mas el personal de obra no se presentó para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. Hasta el momento, persiste la falta de comunicación por parte del contratista respecto a los motivos y causas que llevaron a esta decisión unilateral de cesar las actividades en la obra





Powered by CamScanner



Fecha 10-04-2024.
personal en obra por parte del contratista no se realizan actividades ni se registra asistencia del personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista

personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil- residente de interventoría
1 profesional HSE

Estado del Tiempo
Mañana soleado Media. soleado tarde. soleado

SISOMA.
De nuevo no se registran actividades ni asistencia de personal en obra, debido al cese de actividades por parte del contratista.

ACTIVIDADES
Hoy, 10 de abril de 2024. una vez mas, el personal vinculado de obra denominada centro de acopio minorista y mayorista, no se presentó para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. Hasta el momento, persiste la falta de comunicación por parte del contratista puesto que se desconocen los motivos y causales que llevaron a esta decisión unilateral de detener las actividades en obra





Fecha 11-04-2024
Personal en obra por parte del contratista
No se registra asistencia de personal tanto administrativo como operativo en obra, debido al cese de actividades por parte del contratista

Personal en obra por parte de interventoria.
1 ingeniero civil - residente de interventoria
1 profesional HSE.

Estado del Tiempo
Mañana soleado TARDE soleado Tarde soleado

SISOMA
No se registran labores ni asistencia de personal en obra debido al cese de actividades por parte del contratista
ACTIVIDADES.
Hoy, 11 de abril de 2024, nuevamente el personal

líderes

de obra no se ha presentado para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. Hasta ahora, el contratista no ha proporcionado ninguna comunicación sobre las razones que motivaron esta decisión unilateral de detener las actividades en obra





Fecha 12 - 04 - 2024

Personal en obra por parte del contratista
No se registra asistencia de personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Estado del tiempo
Mañana soleado M. día soleado Tarde soleado

SISOMA
No se registran labores ni asistencia de personal en obra debido al cese de actividades por parte del contratista

líderes

ACTIVIDADES

Hoy, 12 de abril de 2024, una vez más, el personal de obra no se ha presentado para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. Hasta el momento, el contratista no ha proporcionado ninguna comunicación sobre las razones que motivan esta decisión unilateral de detener las actividades en obra.





Fecha 13-04-2024

Personal en obra por parte del contratista
No se registra asistencia de personal tanto administrativo como operativo en obra, debido al cese de actividades por parte del contratista.

Personal en obra por parte de interventoría
Ingeniero civil- residente de interventoría
Profesional HSE


Powered by CamScanner


Estado del Tiempo
Mañana soleado M.Día soleado Tarde soleado

SIDOMA
Hoy 13 de abril de 2024 tampoco se registra labores ni asistencia de personal en obra debido al cese de actividades por parte del contratista.

ACTIVIDADES
Hoy, 13 de abril de 2024, nuevamente el personal de obra no se ha presentado para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio.
Hasta ahora el contratista no ha proporcionado ninguna comunicación sobre las razones que motivaron esta decisión unilateral de detener las actividades en la obra, es de aclarar que nuevamente se le reiteró mediante correspondencia formal, con asunto "Ausencia de labores en obra" la solicitud de los razones que llevaron a tomar dicha decisión sobre el cese de actividades unilateral.







Fecha 15 - 04 - 2024

personal en obra por parte de contratista
No se registra asistencia de personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista.

personal en obra por parte de interventoria
1 ingeniero civil - residente de interventoria
1 profesional HSE

Estado del tiempo
Mañana soleado MEDIA soleado Tarde soleado

SISOMA.
No se registran labores ni asistencia de personal en obra debido al cese de actividades por parte del contratista.

ACTIVIDADES
Hoy, 15 de abril de 2024 nuevamente el personal de obra no se ha presentado para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. Hasta ahora, el contratista no ha proporcionado ninguna comunicación sobre los motivos que motivaron esta decisión unilateral de detener las actividades en la obra.

Powered by CamScanner





Fecha 16-04-2024
personal en obra por parte del contratista
No se registra asistencia de personal tanto administrativo como operativo en obra, debido al cese de actividades por parte del contratista

personal en obra por parte de interventoría.
1 ingeniero civil - residente de interventoría.
1 profesional HSE

Estado del tiempo
Mañana soleado M. Día soleado Tarde soleado

SISOMA
No se registran labores ni asistencia de personal en obra debido al cese de actividades por parte del contratista.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES

Hoy 16 de abril de 2024, nuevamente el personal de obra no se ha presentado para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. Hasta el momento, el contratista no ha proporcionado ninguna comunicación sobre las razones que motivaron esta decisión unilateral de detener las actividades en obra. Es importante destacar que la supervisión de obra estaba programada para reunirse con las partes involucradas en la ejecución del proyecto durante la tarde, con el propósito de informar sobre los aspectos que llevaron a esta determinación unilateral por parte del contratista. En esta reunión, el contratista explicó que la interrupción de las actividades se debió a la falta de suministro de la cubierta tipo sandwich. Sin embargo, se comprometió a reanudar las actividades de instalación de cubierta y reiniciar las obras civiles en el proyecto el próximo martes 23 de abril del año en curso.



líder=

echa 17-04-2024

Personal en obra por parte del contratista el dia de hoy, no se registra asistencia de personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista.

Personal en obra por parte de interventoria ingeniero civil - residente de interventoría profesional HSE.

Estado del tiempo
Mañana Nublado MEDIA Nublado tarde Nublado

SISOMA.
No se registraron labores ni asistencia de personal en obra debido al cese de actividades por parte del contratista.

ACTIVIDADES.
Hoy, 17 de abril de 2024, una vez más el personal de obra no se ha presentado para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. Es importante destacar que el contratista a través del comité de obra en las instalaciones de la Gobernación del cesar, se comprometió a la reanudación de todas las actividades el próximo martes 23 de abril del presente año, y así poder dar culminación a la construcción del centro de acopio.



fecha 18-04-2024

personal en obra por parte de contratista
el día de hoy no se registró asistencia de
personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista

personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil-residente de interventoría
1 profesional HSE

estado del tiempo
Mañana lluvia Mitad Nublado Tarde Nublado

SISOMA
No se registran labores ni asistencia de personal a la obra debido al cese de actividades por parte del contratista.

ACTIVIDADES
Hoy, 18 de abril de 2024, una vez más, el personal de obra no se ha presentado para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. Es importante destacar que el contratista, a través del comité de obra en las instalaciones de la gobernación del Cesar, se comprometió a la reanudación de todas las actividades el próximo martes 23 de abril del presente año y así poder dar culminación a la construcción del canto de cancha

Powered by CamScanner



Fecha 19-04-2024

Personal en obra por parte de contratista
El día de hoy, no se registró asistencia de personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista.

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Estado del tiempo
Mañana Nublado M.DIA lluvia Tarde Nublado

SISOMA
No se registran labores, ni asistencia de personal a la obra debido al cese de actividades por parte del contratista

Actividades

líder=

Hoy 19 de abril de 2024, nuevamente el personal de obra no se ha presentado para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. es crucial resaltar que el contratista, a través del comité de obra en las instalaciones de la Gobernación del Cesar con las partes involucradas en la ejecución del proyecto como lo son entidad contratante, contratista e interventoría, se comprometió a la reanudación de todas las actividades el próximo martes 23 de abril del presente año. este compromiso es fundamental para avanzar hacia la culminación exitosa de la construcción del centro de Acopio.



Fecha 20 - 04 - 2024

Personal en obra por parte del contratista

El día de hoy no se registra asistencia de personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Estado del tiempo.
Mañana Nublado Mañana Nublado Tarde Nublado

ACTIVIDADES.
Hoy, 20 de abril de 2024, una vez más el personal de obra no se ha presentado para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. Es crucial resaltar que el contratista, en una reunión con el comité de obra en las instalaciones de la Gobernación del Cesar, en presencia de las partes involucradas en la ejecución del proyecto, tales como la entidad contratante, el contratista y la interventoría, se comprometió a reanudar todas las actividades el próximo martes 23 de abril del presente año. Este compromiso es fundamental para avanzar hacia la culminación exitosa de la construcción del Centro de Acopio.





líder=

22-04-2024 - Fecha.

Personal en obra por parte del contratista el dia de hoy aun no se registra asistencia de personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista.

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Estado del Tiempo.
Mañana Nobado Media Nobado Tarde Nubad

SI SOMA
NO se registran labores ni asistencia de personal a la obra debido al cese de actividades por parte del contratista

ACTIVIDADES
Hoy, 22 de abril de 2024 nuevamente el personal de obra no se ha presentado para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. Es crucial resaltar que el contratista, durante una reunion con el comité de obra en las instalaciones de la Gobernación del Cesar, en presencia de las partes involucradas en la ejecución del proyecto, como la entidad contratante, el contratista y la interventoría. se comprometió a reanudar todas las actividades el proximo martes 23 de abril del presente año. Este compromiso es funda

der

mental para avanzar hacia la culminación exitosa de la construcción, estamos a la espera de que mañana se reinicien las actividades ya que fué un compromiso acordado en el comité del 16 de abril del presente año.



fecha 23-04-2024

personal en obra por parte de contratista
Hasta la fecha no se registra personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista

personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Estado del tiempo
Mañana Nublado Tarde Nublado

líder=

sistema
No se registran labores, ni asistencia de personal a la obra debido al incumplimiento de actividades por parte del contratista

ACTIVIDAD
Hoy, 23 de abril, nuevamente el personal de obra no se ha presentado para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. es crucial resaltar que el contratista se comprometió a reiniciar labores el día de hoy martes 23 de abril, como consta en el acta del comité del 16 de abril del presente año. Según lo acordado se esperaba la participación de 2 cuadrillas: una encargada de instalar la cubierta de techo tipo sandwich, conforme a los diseños y especificaciones técnicas, y otra encargada de avanzar en las obras civiles restantes, que incluyen la finalización de diversas actividades como instalaciones en las redes hidráulicas, contra incendios y eléctricas, así como la continuación de la conformación de la placa de contrapiso, entre otras tareas. Lamentablemente, el contratista ha incumplido dicho compromiso, y hasta el momento no se ha realizado ninguna actividad en el lugar. Ante esta situación, la interventoría ha emitido un oficio con el propósito de indagar las razones detrás de la falta de ejecución de actividades acordadas, especialmente considerando que estas estaban

Powered by CamScanner

estipuladas en el acta del comité del 16 de abril y dicho cese unilateral afecta el avance y los tiempos de entrega del proyecto.



Fecha 24-04-2024

Personal en obra por parte del contratista

No se registra asistencia de personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista

personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil- residente de interventoría

1 profesional HSE

Estado del tiempo

Mañana Nublado Media Nublado tarde lloviznando

DIZOMA

No se registran labores ni asistencia de

líder

personal a la obra debido al cese de actividades por parte del contratista.

Actividades.
Hoy 24 de abril de 2024, nuevamente el personal de obra no se ha presentado para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. Hasta ahora, el contratista no ha proporcionado ninguna comunicación sobre las razones que motivaron el retiro de actividades como había sido acordado en comité de obra.





Fecha 25-04-2024
Personal en obra por parte del contratista
Hasta la fecha no se registra asistencia de personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista.

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil- residente de interventoría

1 profesional HSE

Estado del tiempo
Mañana soleado Medio soleado Tarde Nubado-lluvia.
SISOMA
No se registran labores ni asistencia de personal a la obra debido al cese de actividades por parte del contratista

ACTIVIDADES
Hoy 25 de abril de 2024 el personal de obra ha vuelto a ausentarse, dejando sin realizar las actividades programadas en el sitio. Hasta el momento el contratista no ha ofrecido ninguna explicación sobre los motivos que llevaron a esta falta de reinicio de actividades, a pesar de que había sido acordado en el comité de obra.





Fecha 16-04-2024.
Personal en obra por parte de contratista
No se registra asistencia de personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista.

personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil- residente de interventoría
1 profesional HSE

estado del tiempo.
Mañana soleado MEDIA soleado Tarde soleado


SISOMA.
No se registran labores ni asistencia de personal a la obra debido al cese de actividades por parte del contratista


ACTIVIDADES
Hoy, 16 de abril de 2024, nuevamente el personal de obra no se ha presentado para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. Hasta el momento no hemos recibido ninguna explicación por parte del contratista sobre los motivos que ocasionan esta interrupción en el reinicio de las actividades, a pesar de que dicho reinicio había sido acordado durante el comité de obra celebrado el 16 de abril del presente año.





Powered by CamScanner





Fecha 27-04-2024.
personal en obra por parte del contratista
NO se registra asistencia de personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista

Personal en obra por parte de interventoría
1 profesional HSE
1 ingeniero civil - residente de interventoría.


Estado del tiempo
Mañana soleado MDIA soleado Tarde soleado

SISOMA
NO se registran labores ni asistencia de personal a la obra, debido al cese de actividades por parte del contratista

ACTIVIDADES.
Hoy, 27 de abril de 2024, lamentablemente nos encontramos nuevamente con la ausencia del personal de obra, lo que ha impedido el inicio de las actividades programadas en el sitio. A pesar de los acuerdos establecidos en el comité de obra del 16 de abril del presente año, en el que se había pactado el reinicio de labores, el contratista no ha ofrecido ninguna explicación sobre los motivos que han

Powered by CamScanner

llevado a esta nueva interrupción, esta falta de comunicación por parte del contratista nos preocupa, ya que obstaculiza el avance del proyecto y genera retrasos significativos en la ejecución de las actividades.

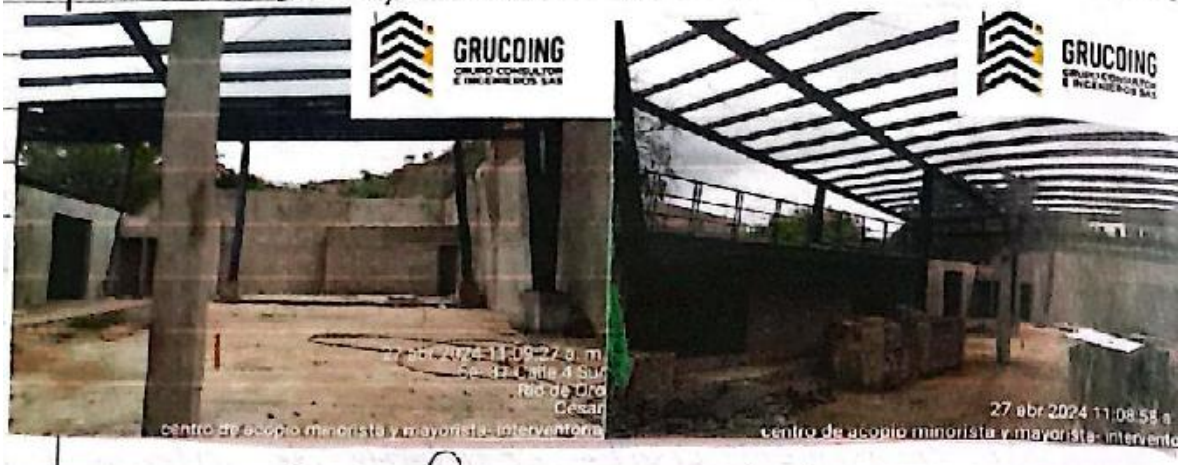

Fecha 29-04-2024

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada . Per. Arlecketo
1 Arquitecto residente - 1 supervisor SST AC
1 ingeniero civil - residente de obra - 2 Ayudantes
1 profesional HSE - residente SST - 3 Ayudantes
1 profesional social
Mano de obra no calificada.
1 maestro de obra
3 oficiales
2 Ayudantes
2 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría.

Powered by CamScanner

1 ingeniero civil - residente de interventoria
1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra
4 - Andel
4 - taladros inalambricos
2 - lineas de vida
2 pulidoras
1 sierra
1 Mezcladora
- Estado del Tiempo
Mañana Soleado MEDIA Soleado TARDE Nublado

SISOMA.
- Se recepciona toda la documentación de la empresa Arteckto encargada de la instalación de la cubierta del proyecto para su adecuado ingreso. y se identifica el adecuado cumplimiento en cuanto a la documentación requerida. (planilla de seguridad social Cert. Alturas)
- Se realiza y verifica el ingreso de personal
- Se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP.
- Se realiza charla de inicio de turno a personal en obra
- Se realiza inspección de equipos y herramientas
- Se verifica que las actividades en obra se realicen de manera adecuada y segura
- Se hacen recomendaciones en materia de SST
- Se realiza una adecuada disposición de residuos y desechos de obra.

líder=

ACTIVIDAD 1.

Hoy, se ha reanudado la actividad en el proyecto de obra, en la llegada del material de cubierta tipo Sandwich, se implementó el plan de manejo de tráfico para facilitar la entrada del tractocamión y la descarga del material en el sitio. Durante la jornada, el personal se organizó en tres cuadrillas para abordar diversas tareas.

La cuadrilla N° 1 se encargó de retomar los trabajos de acabamiento con pañete impermeabilizado en la mampostería levantada, así como en los pañetes lineales de vanos y puertas de los baños.

La cuadrilla N° 2 se dedicó a la adecuación de la placa cubierta de la bodega general, instalando la malla electrosoldada como refuerzo estructural. Esto permitirá avanzar en la ejecución de estas actividades clave.

La cuadrilla N° 3 se enfocó en la instalación de la cubierta tipo sandwich en el área del cuarto de máquinas y parte de la bodega general. Esta distribución de trabajo nos permitió maximizar la eficiencia y avanzar significativamente en la ejecución de actividades programadas para el día de hoy.





Powered by CamScanner

Firma Jesi Carolina Sierra

~~Cargo~~ Cargo

Fecha 30-04-2024
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra Calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil- residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no Calificada
1 maestro de obra
1 Ayudante
4 obreros de oficios varios.
4 oficiales

Personal en obra por parte de Arteck-b
1 supervisor SST AC
2 Oficiales de instalación
3 Ayudantes de instalación

Personal en obra por parte de interventoria
1 ingeniero civil- residente de interventoria
1 profesional HSE

Maquinaria - equipos en obra
4. Andes 1 Mezcladora
4- taladros inalambricos
2- lineas de vida
1 Sierra.

líderes

Powered by CamScanner

Estado del tiempo
Mañana Nublado Media Nublado Tarde lluvioso

SISOMA.
Se registra el ingreso de personal a obra
Se realizan pausas activas al personal en obra junto con las respectivas charlas de inicio de turno
Se verifica porte y uso adecuado de dotación y EPP
Se verifica que las actividades de altura se realicen de manera adecuada y segura portando los equipos anticaidas
Se realizan recomendaciones en materia de seguridad
Se realiza inspección de equipos y herramientas

ACTIVIDADES.
Durante la jornada diana, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 se asignó un equipo especial para la instalación de la cubierta tipo sandwich en el area contigua donde se encuentran ubicadas las zonas de descarga y manipulación de cargas. Dado que esta area es considerablemente amplia y demanda una cobertura extensa, se procedió la instalación de las láminas de manera estratégica para avanzar en esta area crucial del proyecto.
La cuadrilla N°2 destinó tiempo y recursos para llevar a cabo la adecuación de la placa

cubierta de la bodega general, lo cual implico la instalación mecánica de la malla electro soldada como refuerzo estructural. es importante destacar que esta instalación se realizo siguiendo los espaciamientos precisos indicados en las especificaciones técnicas y los diseños estructurales correspondientes. este proceso se llevó a cabo con el propósito de que en el día siguiente se pueda proceder con contratiempos el suministro de concreto para la placa cubierta de la bodega general, avanzando así en la ejecución de esta fase del proyecto

La cuadrilla N°3 se encargo de dar finalidad a los trabajos de revestimiento de pañete impermeabilizado en la mampostería levantada, así como en los pañetes lineales de vanos y puertas de los baños.

Nota. por motivos de fuertes lluvias con alta intensidad, se ha decidido suspender temporalmente las actividades de instalación de la cubierta en lámina tipo sandwich. esta medida se toma en cumplimiento de los parámetros de seguridad y salud en el trabajo SST. con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los trabajadores y preservar las condiciones optimas de trabajo. la instalación se reanudará en el proximo día, una vez que las condiciones climáticas lo permitan y que se garantice un entorno seguro para continuar con las labores





Powered by CamScanner

Concepto

Fecha 07-05-2024

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil- residente de obra

1 profesional HSE- residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

1 Ayudante

4 obreros de apoyo varios

4 oficiales

Personal en obra por parte de Arquitecto

1 supervisor SST AC

2 oficiales de instalación

3 Ayudantes de instalación

Personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil- residente de interventoría

1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra

4 Andamios

4 taladros inalambricos

2 lineas de vida

1 sierra

1 Mezcladora

ESTADO DEL TIEMPO.
Mañana soleado Día soleado Tarde Nublado

SISOMA.
se registra el ingreso de personal
se realizan charlas de inicio de turno
se realizan pausas activas al interior de la obra
se identifica parte y uso adecuado de dotación y EPP.
se realiza inspección de herramientas y equipos
se hacen recorridos en obra para verificar que las actividades se realicen de forma segura.

ACTIVIDADES
Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 continua con la instalación de la cubierta tipo sandwich en el area contigua donde se encuentran ubicadas las zonas de descarga y manipulación de carga. Dado que esta area es considerablemente amplia y demanda una cobertura extensa, se priorizó la instalación de las láminas de manera estratégica para avanzar en esta area crucial del proyecto.
La cuadrilla N°2 Después de haber completado la instalación y anclaje previos de la malla al metaldeck, así como de haber

Powered by CamScanner

instalados los desagues necesarios para la evacuación eficiente de las aguas pluviales, se da inicio al proceso de elaboración y suministro del concreto. Este concreto está diseñado para alcanzar una resistencia de 3000 PSI a los 28 días, según lo especificado en las directrices técnicas del proyecto. Este paso es fundamental para asegurar la solidez y durabilidad de la placa cubierta de la bodega general, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos para la obra.

La cuadrilla N°3 se llevó a cabo el replanteo del área destinada al contrapiso de la bodega general. Considerando los niveles previos del piso terminado. Este proceso fue fundamental para garantizar la correcta nivelación y alineación de la superficie, preparándola para la posterior fundición de la placa de contrapiso conforme a las especificaciones técnicas establecidas.



camp

líder=

Fecha 02-05-2024
Personal en obra por parte de Contratista
Mano de obra Calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada
1 maestro (de oficios varios)
1 Ayudante
4 obreros de oficios varios
4 oficiales

Personal en obra por parte de Arquitecto
1 supervisor SST A.C
2 oficiales de instalación
3 Ayudantes de instalación.

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - equipos en obra
4 Andes
4 taladros inalambricos
2 lineas de vida
1 Mezcladora

Estado del tiempo
Mañana lluvia M.dia Nublado tarde Nublado

lider

Powered by CamScanner

SISOMA

- Se verifica el ingreso de personal
- Se realiza entrega de dotación y EPP. a los colaboradores vinculados al proyecto
- Se identifica y verifica afiliación de seguridad social de nuevos trabajadores.
- Se realiza inducción al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST
- Se realizan charlas de inicio de turno a los colaboradores
- Se hacen recorridos en obra para verificar que las actividades se realicen de forma segura
- Se realizan inspecciones de equipos y herramientas en obra

ACTIVIDADES.

Durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N° 1 procedió al retiro de las guarderas previamente fundidas en la placa, siguiendo el proceso de curado con el objetivo de alcanzar una resistencia de F'c 3000 PSI a los 28 días. de manera simultanea, se llevó a cabo la finalidad de los remates de los muros con la estructura metálica definitiva, con el propósito de sellar la construcción y prevenir la entrada de plagas u otros agentes externos.

La cuadrilla N° 2 continua con la instalación de la cubierta tipo sandwich en el area adyacente que alberga la zona de descarga y manipulación de cargas. Dada la amplitud de esta zona

lider

y la necesidad de una cobertura extensiva, hemos iniciado la aplicación del sellante adhesivo en los paneles de fachada para mejorar tanto el aspecto estético como técnico, asegurando así una mayor durabilidad de la cubierta.

Los perfiles ubicados en la viga canal se mantuvieron en su posición de estambay, considerando que su instalación es la última etapa del proceso constructivo. Esto se debe a que los perfiles son fácilmente removibles en caso de impacto accidental o tropiezo. por esta razón su instalación se lleva a cabo al final del proceso, garantizando así su integridad durante la ejecución de otras tareas en la obra.

La cuadrilla N°3 prosiguió con el replanteo del área designada para el contrapiso de la bodega general, asegurándose de considerar con precisión los niveles del piso terminado. posteriormente, se llevó a cabo la compactación del material en esta área con el objetivo de preparala como superficie de trabajo para la construcción de la placa de contrapiso. este proceso garantiza una base sólida y nivelada que facilita la ejecución adecuada de la siguiente fase de la obra.

Nota. En la instalación de la última lámina la cual presenta un voladizo en el eje 2 y debido a la inclinación de la cubierta, se detectó una posible invasión aérea al predio contiguo. En respuesta, se llevó a cabo una ventilación exhaustiva que incluyó la instalación de un plomo para determinar el grado de invasión del espacio aéreo

Powered by CamScanner

de la vivienda veana. Esta medida se adopt para evaluar con precaución la situación y tom las decisiones más adecuadas para todas las parte involucradas.
Por otra parte por motivos de lluvias fuerte se decide suspender temporalmente la instala ción de la cubierta en lámina tipo Sandwich Esta medida se toma en cumplimiento de los parámetros de seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los trabajadores y preser var las condiciones óptimas de trabajo, la instalación se reanudará una vez que las condiciones climáticas lo permitan y que se garantice un entorno seguro para continuar con las labores. Luego se procedió a colocar e instalar los remates especiales en el área fron tal y posterior de la cubierta del proyecto.





Victor campo

líder

Fecha 03-05-2024
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
4 oficiales
1 Ayudante
4 oficial varios - obreros

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - equipos en obra
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto
1 tronzadora
1 Mezcladora

Estado del Tiempo
Mañana Nublado MEDIA Nublado Tarde Nublado

SISOMA.
se identifica y registra el ingreso de personal
se identifica charlas de inicio de turno y pausas activas
se hacen recorrido en obra y se verifica

líderes

Powered by CamScanner


que las actividades se realicen de forma adecuada y segura
se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP.

ACTIVIDADES.
Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 se llevó a cabo la irrigación de la placa de concreto recien fundida con el propósito de curar el material y lograr la resistencia deseada de 3000 PSI a los 28 días.
La cuadrilla N°2. continuó con el replanteo del area destinada al contrapiso de la bodega general, asegurandonos de nivelar con precisión los niveles del piso terminado. Luego se procedió a irrigar y compactar el material extendido en esta area con el fin de preparala como superficie de trabajo para la construcción de la placa de contrapiso.
La cuadrilla N°3. se continuó con el levantamiento de la mampostería faltante asegurandonos de rematarla a los niveles de la estructura metálica instalada. Esto se hizo con el objetivo de hermetizar la estructura y protegerla de agentes externos.



GRUCOING
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

Powered by CamScanner



04-05-2024 - Fecha
Personal en obra por parte del contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 Ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
4 oficiales
1 Ayudante
4 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría
1 Ingeniero civil - residente de interventoría
1 Profesional HSE

Maquinaria - equipo en obra
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto
1 Mezcladora
1 Formaleta

Estado del Tiempo
Mañana lluvia M. día nublado Tarde nublado

SISOMA
se registran el ingreso de personal a la obra

Powered by CamScanner

se identifican pausas activas para el descanso de los colaboradores
se identifica disposición adecuada de desechos y residuos en obra.
se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP.
se verifica que las actividades se realicen de forma adecuada.

ACTIVIDADES
Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las labores de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 se procedió a la vaciado de la placa de concreto recien fundida con el fin de iniciar el proceso de curado y asegurar que alcance la resistencia deseada de 3000 PSI a los 28 días.
La cuadrilla N°2 prosiguió con el levantamiento de la mampostería restante, asegurandose de ajustarla a los niveles de la estructura metálica ya instalada. Esta acción se llevó a cabo con el fin de sellar adecuadamente la estructura y protegerla contra los agentes externos.





Fecha 06-05-2024
Personal en obra por parte del contratista
Mano de obra calificada
1 (maestro de obra) Arquitecto residente
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
4 oficiales
1 Ayudante
4 obreros de oficios varios.

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - Equipo en obra
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto
1 Mezcladora
1 Tronzadora

Estado del Tiempo
Mañana Nublado Mitad Nublado Tarde Nublado

SISOMA
Se registra el ingreso de personal en obra

líder


Powered by CamScanner

Se realiza charla de inicio de turno
Se registra una actividad de induccion reinduccion y evaluacion de medidas de gestion ambiental.
Se identifica charla y pausas activas para el descanso de los trabajadores
Se identifica porte y uso adecuado de dotacion y EPP.
Se Verifica que las actividades se realicen de forma adecuada y segura.

Actividades
Durante la jornada diana, se coordina con las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las actividades de la siguiente manera.
La cuadrilla Nº 1 continuo con el replanteo del area destinada al contrapiso de la bodega general, asegurandonos de considerar con precision los niveles del piso terminado. Luego se procedió a irrigar y compactar el material extendido en esta área. con el fin de preparacla como superficie de trabajo para la construcción de la placa de contrapiso.
La cuadrilla Nº 2 se prosiguió con el levantamiento de la mamposteria restante, asegurandonos de ajustarla a los niveles de la estructura metalica ya instalada. Esta accion se llevó a cabo con el fin de sellar adecuadamente la estructura y protegerla contra los agentes externos.

Powered by CamScanner

La cuadrilla No 3 se dedico al corte figuración e instalación del acero de refuerzo de las vigas y las columnetas de la mampostería levantada este proceso fue fundamental para confinar de manera adecuada la mampostería, siguiendo meticulosamente los diseños y especificaciones técnicas establecidas para garantizar la seguridad y estabilidad estructural del proyecto.

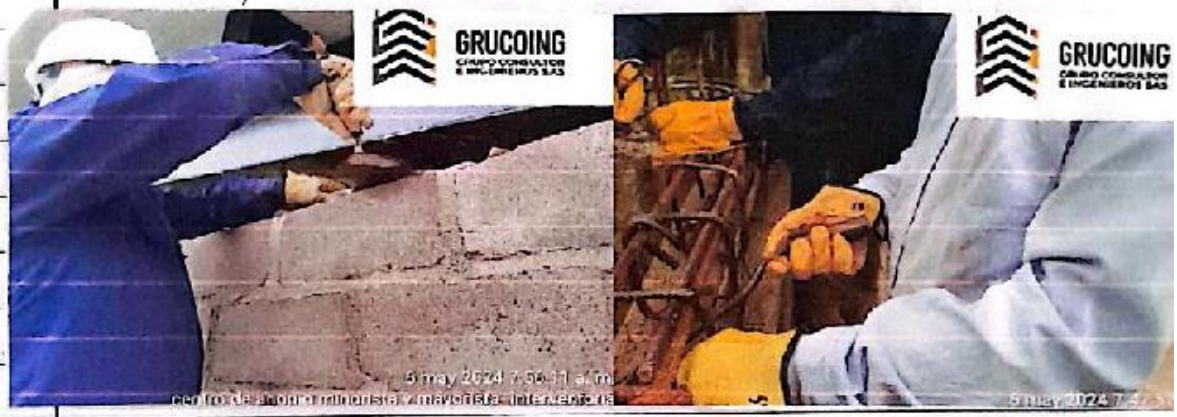

Fecha - 07 - 05 - 2024

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada.

1 Arquitecto residente

1 Ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

Powered by CamScanner

4 oficiales
1 Ayudante
4 obreros de oficial varios

personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE.

Maquinaria - equipos en obra
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto
1 Mezcladora
1 Tronzadora

Estado del Tiempo
Mañana Nublado Media Nublado Tarde lluvioso

SISOMA.
Se verifica el ingreso de personal a obra
se registran charlas de inicio de turno
se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP.
se hacen recorridos en obra y se verifica que las actividades se realicen de forma adecuada y segura.

ACTIVIDADES.
Durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N° 1, una vez completado el replanteo y compactación del terreno, avanzan

con la siguiente etapa: la instalación de la malla electrosoldada, la cual actuará como refuerzo estructural para las placas de contrapiso y entrepiso.
Este proceso es crucial para garantizar la integridad y resistencia de la estructura. posteriormente se procederá a la fundición de concreto, siguiendo estrictamente las especificaciones técnicas que requieren una resistencia de 3000 PSI a los 28 días. Este enfoque meticuloso garantiza que las obras cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos para el proyecto.
La cuadrilla N°2 se prosiguió con el levantamiento de la mampostería restante, asegurándose de ajustarla a los niveles de la estructura metálica ya instalada. Esta acción se llevó a cabo con el fin de sellar adecuadamente la estructura y protegerla contra los agentes externos.
La cuadrilla N°3. Se llevó a cabo la instalación del metaldeck en la placa de la viga canal, la cual desempeñará un papel crucial como elemento aligerante de la estructura. esta viga canal está diseñada para soportar las cargas del vaciado y las cargas externas definidas en el diseño estructural. la instalación precisa del metaldeck asegurando la integridad y la capacidad de carga de la estructura, cumpliendo con los estándares de seguridad y rendimiento requeridos para el proyecto.
La cuadrilla N°4 procedió con la instalación de los puntos de desagüe de aguas lluvia

líder

antes de la fundición de la placa.
Esta etapa incluye la instalación del sistema de ramal y la conexión de las bajantes correspondientes, asegurando así la integración adecuada con el sistema de red pluvial del proyecto. Este enfoque previo a la fundición garantiza un drenaje efectivo y adecuado del agua lluvia, contribuyendo a la durabilidad y funcionalidad de la estructura.





Fecha 08-05-2024.
Personal en obra por parte del contratista
1 Arquitecto residente - mano de obra calificada
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
4 oficiales

lider=

1 Ayudante
4 Obreros de oficial varios

personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto
1 Mezcladora
1 Trompadora

Estado del Tiempo
Mañana Nublado M. DIA Nublado tarde lluvia

SISOMA.
Se registra asistencia de personal en obra
Se realiza charla de inicio de turno y pausas activas
Se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP.
Se verifica que las actividades se realicen de forma adecuada y segura
Se identifica adecuada disposición de residuos y desechos de obra

ACTIVIDADES.
Durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo la tarea de la siguiente manera.

líder=

Powered by CamScanner

La cuadrilla N° 1 se llevo a cabo la instalación de la malla electrosoldada en la viga canal, seguida por el suministro de concreto con resistencia a la compresión de 3000 PSI a los 28 días conforme a las especificaciones técnicas del diseño.
La cuadrilla N° 2 se prosiguió con el levantamiento de levantamiento de la mampostería restante, asegurandonos de ajustarla a los niveles de la estructura metálica ya instalada. Esta acción se llevó a cabo con el fin de sellar adecuadamente la estructura y protegerla contra los agentes externos.
La cuadrilla N°3 se llevó a cabo la limpieza y replanteo de la zona de manipulación de carga para iniciar la recompactación del material esparcido con el objetivo de alcanzar los niveles de piso terminado, en preparación para la ampliación del area de trabajo destinada a la conformación de la placa de contrapiso.





Powered by CamScanner

Fecha 09-05-2024

Personal en obra por parte contratista
ingeniero civil- residente de obra
1 Arquitecto residente
1 profesional HSE- residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
4 oficiales
1 Ayudante
4 obreros de oficios varios.

Personal en obra por parte de interventoría.
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - Equipo en obra
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto
1 Mezcladora
1 Formaleta

Estado del tiempo.
Mañana Nublado Media lluvia Tarde Nublado

SISOMA
Se registra el ingreso de personal
Se identifican charlas de inicio de turno
se realizan pausas activas para el descanso de los colaboradores.
Se realiza inspección de equipos y herramientas

líder=

Powered by CamScanner

se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP
se verifica que las actividades se realicen de forma adecuada y segura.
se realiza entrega de certificado al empleado del me


ACTIVIDADES

Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1 se continuo con el levantamiento de la mampostería restante, asegurando de ajustarlas a los niveles de la estructura metálica ya instalada. Esta acción se llevó a cabo con el fin de sellar adecuadamente la estructura y protegerla contra los agentes externos.

La cuadrilla N°2. se prosiguió con la nivelación de las áreas siguientes para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará con la loza de contrapiso, con el objetivo de avanzar en esta tarea.

La cuadrilla N°3 se dedicó al corte, figuración e instalación del acero de refuerzo de las vigas y las columnetas de la mampostería levantada. Este proceso fue fundamental para conferir de manera adecuada la mampostería siguiendo meticulosamente los diseños y especificaciones técnicas establecidas para garantizar la seguridad y estabilidad estructural del proyecto.



Powered by CamScanner

Fecha 10-05-2024
personal en obra por parte de contratista
1 Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
4 oficiales
1 Ayudante
4 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - Equipo en obra
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto
1 Mezcladora
1 Tronzadora

Estado del tiempo
Mañana Nublado M.DIA Nublado Tarde lluvioso

SISOMA
Se verifica el ingreso de personal
Se realiza charla de inicio de turno

líder=

y pausas activas al personal de obra
Se verifica porte y uso adecuado de dotación y EPP.
se realiza adecuada disposición de residuos y desechos de obra
Se realiza inspección de herramientas y equipos se hacen recorridos en obra para verificar que las actividades se realicen de forma segura

ACTIVIDADES
Durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1, continuo con el levantamiento de la mampostería restante, asegurándose de ajustarla a los niveles de la estructura metálica ya instalada. Esta acción se llevó a cabo con el fin de sellar adecuadamente la estructura y protegerla contra los agentes externos.
La cuadrilla N°2 se prosiguió con la recuperación de las áreas siguientes para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se (compactará) mejorará con la loza de contrapiso, con el objetivo de avanzar en esta tarea la cuadrilla N°3 dio inicio al replanteo de las labores de construcción del muro en el predio vecino, el cual había sido afectado en las actividades de demolición de la estructura existente. este trabajo fue comprometido por el contratista a través de un acta. se iniciaron las actividades con la toma de niveles y el acarreo de materiales

necesarios para comenzar la construcción.



Fecha 11-05-2024

Personal en obra por parte de contratista:

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra
1 Ayudante
4 oficiales
4 obreros de oficios varios.

Personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE.

Maquinaria - equipos en obra

líder=

Powered by CamScanner
