FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 2

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVIL**			**FECHA:**	10/08/2024
Semana No	**9**	**Del :**	4/08/2024	AL:	10/08/2024
Plazo Total		558	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		66	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		11,83%			
Nombre del Supervisor :		Gisell Sanchez Pastrana			

OBJETO DEL CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPUERTARIOS DEL AEROPUERTO TOLÚ.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,88%**	**11,65%**	**(%) Ejecutado**	**0,43%**	**4,36%**
Valor programado ($)	**$ 17.629.095,57**	**$ 232.661.356,57**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 8.514.865,00**	**$ 87.087.678,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**-7,29%**
				Valor Adelanto	**-$ 145.573.678,57**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	ABILE SAS	**Contratista:**	CONSORCIO SERVINC-BETMAF 2024
Contrato No:	23001186 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001301 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 1.996.500.065	**Valor Inicial:**	$ 1.117.574.559
Valor Actualizado al modificatorio :	NA	**Valor Actualizado al modificatorio :**	NA
Valor actualizado 2:	NA	**Valor actualizado 2:**	NA
Plazo inicial:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	**Plazo inicial:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo actualizado:	NA	**Plazo actualizado:**	NA
Fecha de iniciación:	5-jun-24	**Fecha de iniciación:**	5-jun-24
Fecha de vencimiento:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	**Fecha de vencimiento:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Modificatorio No. Prórroga No.	NA	**Modificatorio No. Prórroga No.**	NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	NA	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	NA
Suspensión No.	NA	**Suspensión No.**	NA
Periodo de Suspensión No.	NA	**Periodo de Suspensión No.**	NA
Levantamiento de la suspensión No.	NA	**Levantamiento de la suspensión No.**	NA
Nueva fecha de terminación	NA	**Nueva fecha de terminación**	NA
Valor total actual del contrato	$ 1.996.500.065	**Valor total actual del contrato**	$ 1.117.574.559

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza comité virtual en compañía de supervisión, interventoría y obra, se presenta avance y se aclaran puntos de documentos pendientes.
Se encuentra en trámite de ajuste el acta parcial No. 01 por parte del contratista de obra.
Se emiten observaciones al PMA mediante comunicado CO-TOLU-0058-2024-VT

OBRAS LADO TIERRA

- Aplicación de Pintura para exterior en paredes. (71,94 m2)
- Aplicación de Pintura vinilo en paredes. (310,31 m2)
- Se realizan actividades de mantenimiento en puertas (2 Und)
- Se realizan actividades de desmonte y suministro de cerraduras (1 Und)

AVANCE DE OBRA: Se presenta un avance acumulado de 4,36% en las siguientes actividades.
Retiro de canoa de aguas lluvias en zona de salida a plataforma.
Aplicación de Pintura vinilo en paredes sala de juntas, zona de baños, sala de llegadas y sala de abordaje.
Mantenimiento de zonas verdes.
Limpieza de cubierta.
Reparación de algunas puesta y enchapes.


FINANCIERO:
Se encuentra en trámite de radiación el acta parcial de obra No. 01 con ajustes por parte del contratista de obra.
El anticipo se encuentra en trámite de parte de la Aerocivil.

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas: Se realiza el adecuado acopio de residuos de construcción.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Se realiza seguimiento al cumplimiento de entregas de EPP, trabajos en alturas.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**4**
Personal del Contratista	**9**
Total Personal en Obra	**13**

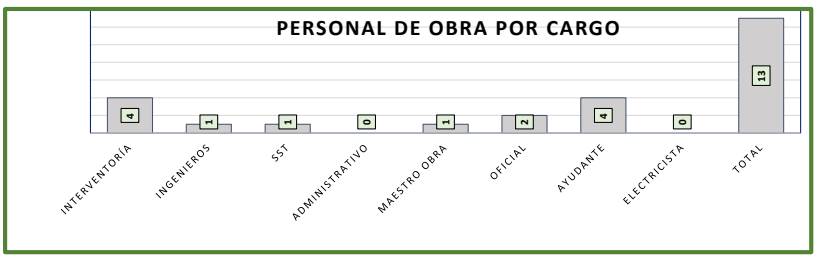

En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 2



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
GUADAÑADORA		1	
ESCALERA		1	
ANDAMIOS		3	
HIDROLAVADORA		1	
Total Maquinaría		6	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 1.996.500.065,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		

Valor Total Contrato interventoría
$ 1.117.574.559,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES

Se reajusta la programación de obra en consideración de la aprobación parcial del plan de trabajo, siendo que la programación preliminar con la que se estaba evaluando iba hasta el mes de septiembre de 2024
Se programa visita el 15 de agosto de 2024 en aeropuerto Golfo de Morrosquillo en Tolú, se requiere presencia de dirección de obra y de interventoría.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ISMAEL MAFIOLY RODRIGUEZ
