MINISTERIO DEL TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

PLANTA CENTRAL – TERRITORIAL NARIÑO

INFORME DE INTERVENTORÍA N° 7

1 a 31 DE JULIO DE 2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.

CONSORCIO MASO 10

CONTRATO 5065 DE 2023

JULIO DE 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 3089 DE 2023 / 3119 DE 2023 / 3121 DE 2023 / 3122 DE 2023 / 3153 DE 2023 / 3157 DE 2023 / 3281 DE 2023

Contratista: JAC DE LA VEREDA LLANO GRANDE - JAC VEREDA EL PELIGRO - JAC VEREDA SAUCE - JAC DE QUIROZ ALTO - JAC QUIROZ - JAC VEREDA OLIVOS - JAC VEREDA NUEVA FLORIDA DE LA UNION Y SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Contrato de Interventoría No. 5065 de 2023

Interventoría: CONSORCIO MASO 10

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO,LLANO GRANDE,EL SAUCE,QUIROS ALTO,QUIROZ BAJO,OLIVOS DEL MUNICIPIO Y NUEVA FLORIDA EN LOS MUNICIPOS DE LA UNIÓN Y SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** JULIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
4	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		20
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		22
2.1	Localización		23
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		24
2,3	beneficios de la obra		24
2,4	Inventario y estado inicial de la vía		24
2,5	Características técnicas del proyecto		30
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		35
3.1	Información general del contrato		35
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		42
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		79
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		79
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		86
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	86
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	114
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	121
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	129
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	135
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	142
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	150
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	160
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		168
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	168
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	168
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	186
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	186
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	194
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	NA
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		202
5.1	Información general del contrato		202
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		203
5.3	Informes especialistas y profesionales		203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		NA
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		204
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	204
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	206
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	207
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	208
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	209
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	210
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	212
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	212
7	**Conclusiones y recomendaciones**		213
8	**Anexos**		214
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia,		214
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		217
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		229
	Informe mensual de seguridad social		275
	Gestión social mes de julio de 2024		1237

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO MINFRA-MN1-IN-15-FR-2

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

- **VEREDA LLANO GRANDE LA UNION (N)**
- **VERDA QUIROZ BAJO LA UNION (N)**
- **VEREDA QUIROZ ALTO LA UNION (N)**
- **VEREDA OLIVOS LA UNION (N)**
- **VEREDA EL PELIGRO LA UNION (N)**
- **VEREDA EL SAUCE LA UNION (N)**
- **VEREDA NUEVA FLORIDA SAN PABLO (N)**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	2

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3119 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 2
FECHA DE INICIO: 12/30/23
FECHA DE SUSPENSIÓN: 12/30/23
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/22/24
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6.2

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200,741,050
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200,741,050
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5065 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	144
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	und	1
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	FILTRO		130

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	0	0
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	alcantaril	und	1	1
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	FILTRO	ML	130	130

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS		$ 150,233,906.00	150,233,906.00
JAC		$ 1,000,000.00	1,000,000.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN		$ 45,000,972.00	45,000,972.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD		$ 4,506,993.00	4,506,993.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200,741,871.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			$ 105,332,461.00	105,332,461.00
AJUSTES			0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			0.00	0.00
VALOR EJECUTADO			0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 105,332,461.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 105,332,461.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	52.47%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	2

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3122 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL:	2
FECHA DE INICIO:	12/30/23
FECHA DE SUSPENSIÓN:	12/30/23
FECHA DE REANUDACIÓN:	1/22/24
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/08/2024
PLAZO ACUMULADO:	6.2

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199,318,829
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199,318,829
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5065 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	94.04
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	UND	1
Otros (Especificar cuales)	FILTRO	ML	95

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	47.2	0
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Otros (Especificar	FILTRO	ML	95	95
Otros (Especificar cuales)	ALCANTARILLA	UND	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			150,695,153.00
ADMINISTRTATIVOS			43,102,821.00
JAC			1,000,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			4,520,855.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199,318,829.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			66,489,802.00	66,489,802.00
AJUSTES			0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS		0.19	$ 8,924,711.00	8,924,711.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			0.00	0.00
VALOR EJECUTADO			0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	66,489,802.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	66,489,802.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		33.36%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12

REGISTRO FOTOGRÁFICO







SOCIALIZACION

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	2

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3157 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 2
FECHA DE INICIO: 12/30/23
FECHA DE SUSPENSIÓN: 12/30/23
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/22/24
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6.2

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201,402,474.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201,402,474.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5065 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	144
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	54	0
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS		150,988,815.00	150,988,815.00
JAC		1,000,000.00	1,000,000.00
ADMINISTRATIVOS		44,833,995.00	44,833,995.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD		4,529,664.00	4,529,664.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			201,402,474.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			66,489,602.00	66,489,602.00
AJUSTES			0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS			0.00	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			0.00	0.00
VALOR EJECUTADO			0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	66,489,602.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	66,489,602.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	33.01%	

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3

REGISTRO FOTOGRÁFICO











PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	2

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3121 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 2
FECHA DE INICIO: 12/30/23
FECHA DE SUSPENSIÓN: 12/30/23
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/22/24
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6.2

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200,048,634.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200,048,634.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5065 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	145
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	0	0
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151,400,952.00
ADMINISTRATIVOS			43,105,653.00
JAC			1,000,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			4,542,029.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200,048,634.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			69,243,883.00	69,243,883.00
AJUSTES			0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS		19.00	$ 9,041,884.00	9,041,884.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			0.00	0.00
VALOR EJECUTADO			0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	69,243,883.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	69,243,883.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		34.61%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO











PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	2

FECHA: 31/07/2024 (Da / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3153 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL:	2	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 202,406,606.00
FECHA DE INICIO:	12/30/23	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN:	12/30/23	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 202,406,606.00
FECHA DE REANUDACIÓN:	1/22/24	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/08/2024	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	6.2		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5065 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	154
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	77	0
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			153,681,398.00
JAC			1,000,000.00
ADMINISTRATIVOS			43,114,766.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			4,610,442.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			202,406,606.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			69,243,883.00	69,243,883.00
AJUSTES			0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			0.00	0.00
VALOR EJECUTADO			0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	69,243,883.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	69,243,883.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		34.21%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8

REGISTRO FOTOGRÁFICO











PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	2

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3281 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL:	2	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 200,698,283
FECHA DE INICIO:	12/30/23	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN:	12/30/23	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 200,698,283
FECHA DE REANUDACIÓN:	1/22/24	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/08/2024	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	6.2		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5065 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	180
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	FILTRO	ML	180

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	0	0
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Otros (Especifica	FILTRO	ML	180	180
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ 8,919,165.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 200,698,283

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			95,642,784.00	95,642,784.00
AJUSTES			0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			0.00	0.00
VALOR EJECUTADO			0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	95,642,784.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	95,642,784.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	48%	

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SOCIALIZACION





COMITÉ OPERATIVO 1

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	2

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3089 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL:	2
FECHA DE INICIO:	12/30/23
FECHA DE SUSPENSIÓN:	12/30/23
FECHA DE REANUDACIÓN:	1/22/24
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/08/2024
PLAZO ACUMULADO:	6.2

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201,005,912
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201,005,912
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5065 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	120
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	FILTRO	ML	100

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	60	60
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	FILTRO	ML	100	100

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS		154,161,286.00	154,161,286.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		41,216,697.00	41,216,697.00
JAC		1,000,000.00	1,000,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD		4,624,929.00	4,624,929.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			201,002,912.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			74,366,323.00	74,366,323.00
AJUSTES			0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS			1.00	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			0.00	0.00
VALOR EJECUTADO			0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	74,366,323.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	74,366,323.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	37%	

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7

REGISTRO FOTOGRÁFICO











PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	2

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO — **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3153 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 2
FECHA DE INICIO: 12/30/23
FECHA DE SUSPENSIÓN: 12/30/23
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/22/24
FECHA DE VENCIMIENTO: 7/30/24
PLAZO ACUMULADO: 6.2

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 202,406,606.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 202,406,606.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5065 de 2023 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10 — **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	154
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	77	0
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			153,681,398.00
JAC			1,000,000.00
ADMINISTRATIVOS			43,114,766.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			4,610,442.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			202,406,606.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			69,243,883.00	69,243,883.00
AJUSTES			0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			0.00	0.00
VALOR EJECUTADO			0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	69,243,883.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	69,243,883.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		34.21%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8

REGISTRO FOTOGRÁFICO









PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5065 DE 2023

CONSORCIO MASO 10

"Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2"

CONVENIOS DE OBRA (3119-3089-3122-3181- 3157-3153-3121) DE 2023





INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10











INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10




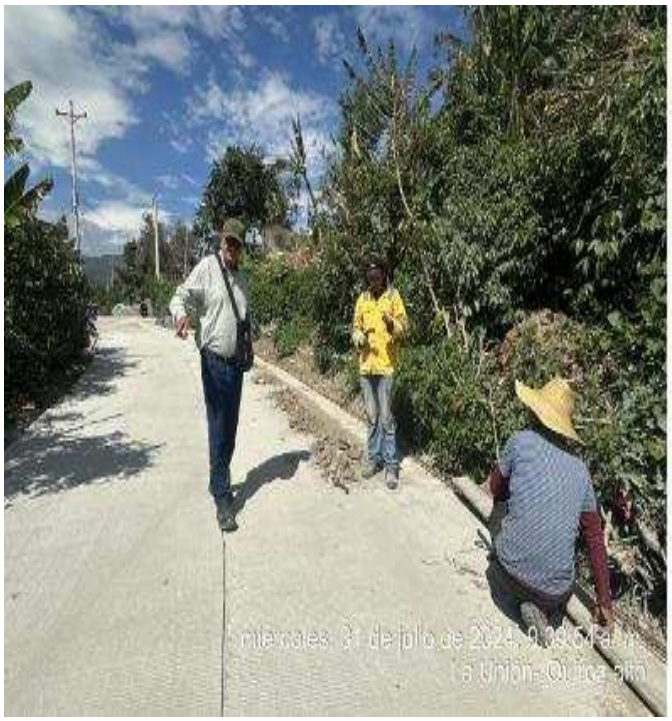

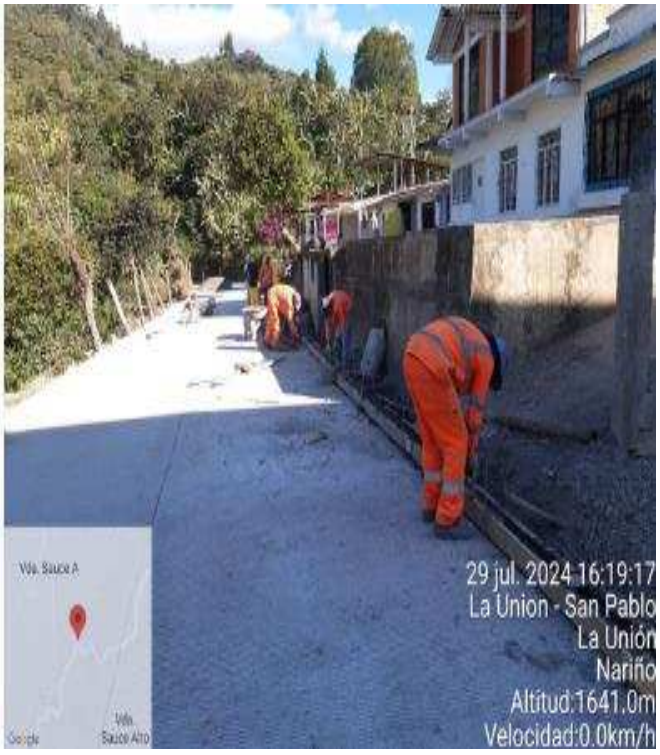



INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

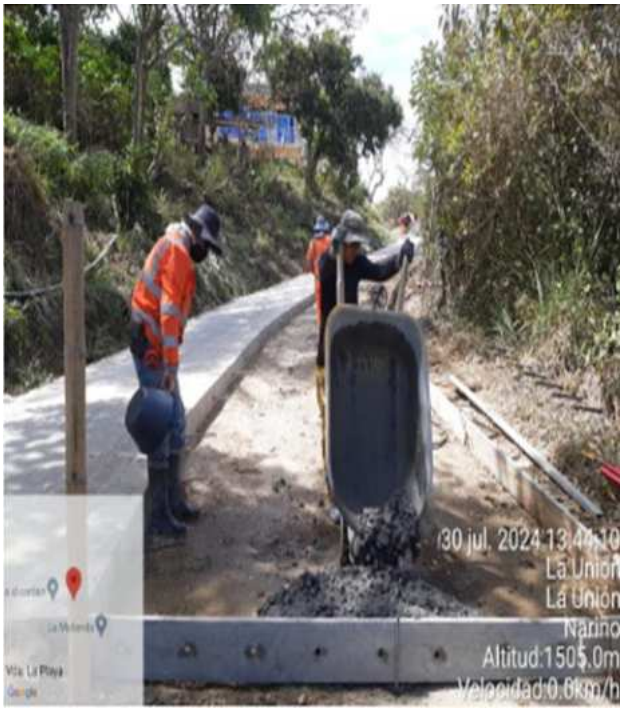







INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 14

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 16

2.1 Localización 17

2.2 Municipios en zona de influencia 18

2.3 Inventario y Estado inicial de la vía 18

2.4 Características técnicas del proyecto 27

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA 28

3.1 Información general de los convenios de obra 28

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 35

3.3 Seguimiento ítems no previstos 37

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 37

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 38

4.1 Informe Semanal: se adjunta copia en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 de los Informes semanales realizados para los siete convenios. ver en el anexo No 1 38

4.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra: El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 …… 38

4.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra: no Se adjunta diligenciado para ninguno de los convenios, porque aún no se REALIZAN DESEMBOLSOS en el formato MEPI- MN1-IN-15-FR-8 38

4.4 Resumen Ensayos de Laboratorio: MEPI-MN1-IN 15-FR-11 se presentaron ensayos en el presente periodo 38

4.5 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra: no Se adjunta diligenciado para ninguno de los convenios el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 38

4.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra: no Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14. para ninguno de los convenios 38

4.7 Otros documentos seguimiento mensual 38

4.7.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo: No Aplica el formato MEPI-MN-IN-2-FR-2 38

4.7.2 Programa de Inversiones o Reprogramación al Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-1. Seguimiento Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-2. No Aplica el formato para los convenios 38

4.7.3 Actas de comité de obra: no se adjunta copia de los comités semanales

realizados con los convenios en el formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 38

4.7.4 Actas de reunión: se adjunta copia de REUNION realizado con en el formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 anexo No 3 38

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 39

5.1 Información general del contrato 39

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor 40

5.3 Informes de especialistas 40

5.4 Información otros programas y aplicativos 40

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 41

6.1 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 41

6.2 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 41

6.3 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPIMN1- IN-15-FR-13 41

6.4 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 41

6.5 Seguimiento a la inversión del Anticipo: no aplica en el formato MEPI-MN-IN-3-FR-2 41

6.6 Seguimiento al Plan de Cargas: Se adjunta el seguimiento mensual en el formato MEPI-MNIN-9-FR-2 41

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 47

8. ANEXOS 48

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista, interventoría 48

8.2 Registro fotográfico 51

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional pretende intervenir 33.102 km de vías regionales y caminos ancestrales con recursos destinados a mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación. El programa "Caminos comunitarios de la Paz total" es un vehículo para activar la participación de la comunidad en todo el territorio nacional y así poder mejorar la transitabilidad en caminos vecinales y vías terciarias, este programa es ejecutado a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS, involucrando a las Juntas de Acción Comunal (JAC).

El programa caminos comunitarios de la paz total, contempla el mejoramiento y mantenimiento de siete (7) Caminos vecinales y vías regionales, en los municipios de: La Unión y San pablo (Departamento de Nariño). A partir de la información entregada por el INVIAS, de la "implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías," del INVIAS, los Contratistas, bajo la supervisión de la Interventoría, ajustaron los estudios y diseños para cada sitio de implantación.

El INVIAS, a través el Proceso de convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales de las veredas Llano Grande, El Peligro, Sauce, Quiroz Alto, Quiroz, Olivos, La Florida, en los municipios de La Unión y San Pablo del Departamento de Nariño fueron seleccionadas para construir las obras y a través del proceso de, CMA-DEO-SVR-119-2023 escogió a un solo Interventor para supervisar los siete contratos. En desarrollo del contrato N.°5065 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS y el CONSORCIO MASO 10**,** cuyo objeto es la realización de la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2 a cargo del invias se presenta este informe de interventoría N.°7, correspondiente a las labores ejecutadas durante el periodo 1 al 31 del mes de julio de 2024 del seguimiento a los contratos de construcción caminos comunitarios de la paz total:

Convenio 3089-2023 aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal Llano Grande del municipio de la Unión, departamento de Nariño para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total
convenio 3157-2023 aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal los Olivos del municipio de la Unión, departamento de Nariño para el mejoramientovial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total
convenio 3119-2023 aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda El Peligro del municipio de la Unión, departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total
Convenio 3121-2023 aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda el Sauce del municipio de la Unión, departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total
Convenio 3122-2023 aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Quiroz Alto del municipio de la Unión, departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total
Convenio 3153-2023 aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción

comunal de la vereda Quiroz del municipio de la Unión, departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

Convenio 3281-2023 aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Nueva Florida del municipio de San Pablo, departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total .Los proyectos iniciaron el 30 de diciembre de 2023 con plazo inicial de ejecución hasta el 23 de marzo de 2023, en la fecha de 30 de diciembre hubo suspensión de todos los convenios, prorrogados inicialmente hasta enero 22 de 2024

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los proyecto en desarrollo se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Unión, y San Pablo en el Departamento de Nariño, en la vereda El Peligro ,Sauce, Los olivos, Llano Grande, Quiroz, Quiroz alto y Nueva florida en San Pablo El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales yambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente. Las obras quese van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

Los contratos de obra contemplaron dos etapas; la primera que se encuentra en ejecución para seleccionar el sitio de implantación y completar y ajustar los estudios y diseños acorde a las características propias y condiciones técnicas particulares encontradas de cada lugar, y una segunda etapa en ejecución correspondiente a su construcción, utilizando los diseños de la cartilla del invias. Para la etapa de estudios y diseños se contempló un plazo de 45 días a partir del inicio de los contratos.

2.1 Localización

En la figura 1 se muestra la localización de los sitios de ubicación de los siete convenios con referencia al departamento de Nariño.

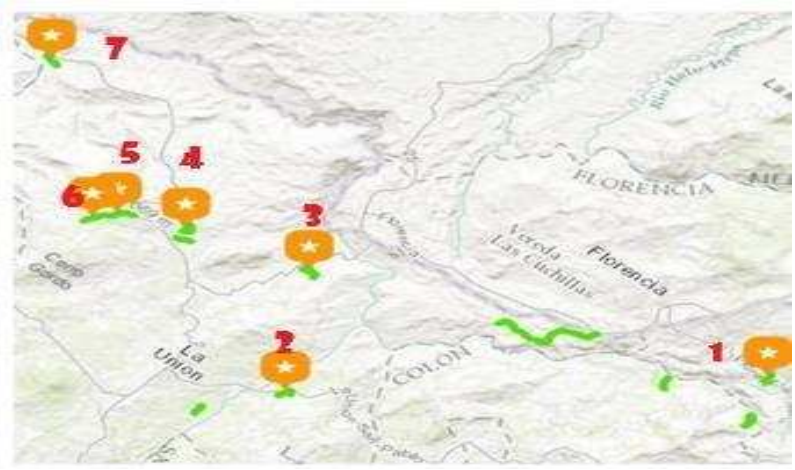


Ilustración 1 localización general de placas huellas – imagen tomada de Field maps.

A la Nueva Florida # 1 se puede acceder desde San Juan de Pasto la capital del departamento de Nariño, por vía terrestre hasta la vereda nueva florida en recorrido de 123 km También desde La Unión puede acceder y este recorrido es de 32 km.

A Sauce # 2 se llega partiendo desde San Juan de Pasto la capital del departamento de Nariño, por vía terrestre hasta la vereda el sauce en recorrido de 100 km También desde la Unión puede acceder y este recorrido es de 7 km

A Peligro # 3 desde San Juan de Pasto la capital del departamento de Nariño, por vía terrestre hasta la vereda El Peligro en recorrido de 110 km También desde la unión puede acceder y este recorrido es de 10 km

A Llano Grande # 4 desde San Juan de Pasto la capital del departamento de Nariño, por vía terrestre hasta la vereda Llano Grande en recorrido de 106 km También desde la unión puede acceder y este recorrido es de 6 km,

A Quiroz bajo # 5 desde San Juan de Pasto la capital del departamento de Nariño, por vía terrestre hasta la vereda Quiroz Bajo en recorrido de 110 km También desde la unión puede acceder y este recorrido es de 10 km, para llegar a esta vereda se pasa por la vereda Llano Grande.

A Quiroz Alto # 6 desde San Juan de Pasto la capital del departamento de Nariño, por vía terrestre hasta la vereda Quiroz alto en recorrido de 115 km También desde la unión puede acceder y este recorrido es de 15 km, para llegar a esta vereda se pasa por la vereda Quiroz Bajo.

A Olivos # 7 se puede acceder desde San Juan de Pasto la capital del departamento de Nariño, por vía terrestre hasta la vereda Los Olivos en recorrido de 111 km También desde La Unión pueden acceder y éste recorrido es de 15 km, vía que comunica a la vereda de Olivos desde la vereda de la Playa del municipio de La Unión se encuentra en muy malas condiciones.

2.2 Municipios en zona de influencia

En el municipio de La Unión y San Pablo en el departamento de Nariño sus veredas como lo son Olivos, Llano Grande, Quiroz Bajo, Quiroz alto, El Peligro, El Sauce y Nueva Florida son sus zonas dispersas y alejadas del casco urbano de estos dos municipios se definió la construcción de placas huellas, solicitado por la comunidad sentada en estos lugares ya que son zonas rurales de difícil acceso, en las que se dan cultivos de café y limón principalmente entre otros productos , por las vías que se encuentran en mal estado es difícil el acceso a estos lugares y por tal motivo se convierte en una dificultad para la comercialización de sus productos.

2.3 Beneficios de la obra

La comunidad de los municipios de influencia se beneficia en primer lugar por el mejoramiento que tiene la comunidad tanto la que vive en el sector como la que usan estos corredores viales para realizar sus diferentes actividades económicas, en segundo lugar, la comunidad se beneficia ya que se generan empleos por estar cerca de la zona del proyecto, en tercer lugar, por la compra de materiales necesarios para la construcción de la obra.

2.4 Inventario y Estado inicial de la vía

El proyecto se encuentra ubicado en el norte del departamento de Nariño en los municipios de La Unión con los convenios de las siguientes juntas de acción comunal: Los Olivos, Sauce, El peligro, Llano Grande, Quiroz Bajo, Quiroz Alto y en el municipio de San Pablo el convenio de Nueva Florida, en total con siete convenios entre los dos municipios, a continuación, se indican unas fotografías del estado actual de los tramos que se van a intervenir en los diferentes convenios.

EL PELIGRO convenio 3119-2023 es un tramo de vía con un pendiente que supera 7%, en algunos de sus tramos no se encuentra cuneta, no tiene 5 metros de calzada, el tramo de calzada tiene curvas consecutivas, de igual manera se tiene una placa huella existente que se va a demoler por las condiciones en las que se encuentra, tiene una alcantarilla existente y que se encuentran en funcionamiento y otra la cual fue suspendida por un habitante de esta localidad, a continuación se presenta el registro fotográfico de este convenio.





LLANO GRANDE Convenio 3089-2023 este tramo de vía se encuentra con una pendiente de más del 4 %, tiene curvas sucesivas tiene una alcantarilla, se evidencia que las aguas provenientes de algunas de las viviendas desembocan en las cunetas de la vía, también se observa que la calzada no cumple con los 5 metros establecidos, a continuación se presenta el registro fotográfico de este tramo de vía.



OLIVOS convenio 3157-2023 Este tramo de vía es recto en un 80 % tiene una alcantarilla que se encuentra en buen estado, se necesita realizarle limpieza, se tiene un inconveniente con el agua proveniente del acueducto de la vereda que al rebosar el tanque de almacenamiento de esta llega a la cuneta de la vía y estas aguas recorren un tramo de vía de aproximadamente 120m, el tramo de vía es completamente plano en un 90% y tiene una pendiente al inicio de la vía de un 3% aproximadamente. A continuación, se presenta la evidencia fotográfica.



EL SAUCE Convenio 3121-2023 en el tramo de vía a intervenir se encuentra que en un 90% es plano, la zona a intervenir se encuentra el colegio la concentración continuación se presenta la evidencia fotográfica.



QUIROZ ALTO Convenio 3122-2023 el tramo de vía a intervenir no cuenta con los 5 metros de calzada establecidos, se tienen dos alcantarillas, de igual manera a las cunetas de esta vía llegan aguas negras provenientes de las viviendas de este sector, se cuentas con dos viviendas que tiene afectaciones (grietas pronunciadas) en sus interiores, tiene curvas sucesivas y tiene pendientes del 7% de igual manera cuenta con una alcantarilla, y un filtro. a continuación, se indica la evidencia fotográfica.



QUIROZ BAJO Convenio 3153-2023 este tramo de vía a intervenir no cuenta con alcantarillas, en algunos puntos no cuenta con los 5 metros de calzada, tiene pendientes de 3% aproximadamente.



NUEVA FLORIDA Convenio 3281-2023 este tramo a intervenir se encuentra en el municipio de San Pablo, cuenta con una pendiente aproximada del 7% tiene obras de drenaje y curvas sucesivas en este tramo de vía no se cuenta con viviendas, solamente con fincas cafeteras y árboles nativos del lugar, también tiene un filtro.



2.5 Características técnicas del convenio

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Unión y San Pablo del departamento de Nariño, en las veredas El Peligro, Llano grande, Quiroz alto, Quiroz bajo, El sauce, Los Olivos, y Nueva florida, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto final en el PR0+200 en todos los convenios. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías-Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente. Que dentro de las funciones del INVIAS se encuentra la de brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.


- ✓ **Vereda el Peligro**

  143 m.l. de placa huella

  1 alcantarilla

  130 ml de filtro

Construcción de Placa Huella: Se establece la construcción de un tramo de placa huella de 140 m.l. y 3 m.l. de placas de transición en cada extremo de la vía, con pendiente superior al 5%, espesor de 15 cm y un ancho de 5 m.l. y acero de refuerzo.

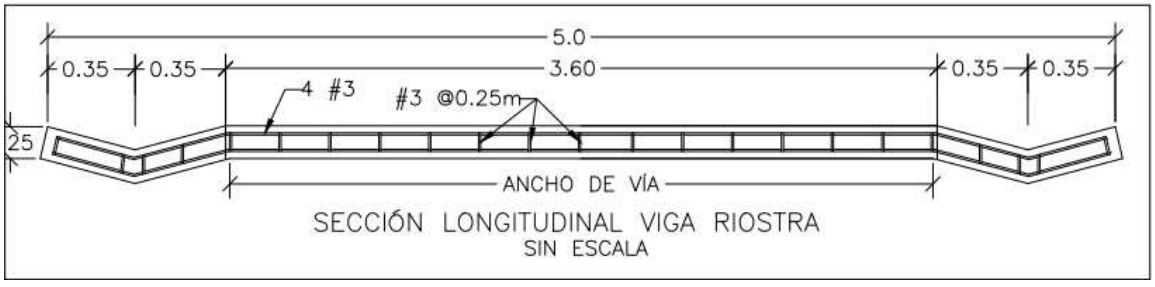


Actividades de mejoramiento construcción alcantarillas: En la zona existe una alcantarilla con ausencia de mantenimiento tanto en la entrada como en la salida por lo cual se plantea realizar el mantenimiento adecuado.

Desmonte y limpieza de zonas no boscosas: Se realizará rocería en la zona por ambos lados de la vía a partir de la mitad de la misma aproximadamente 0.4 Ha.

Construcción de filtro: en este tramo de vía se realizará un filtro de acuerdo a la cartilla del invias.


- ✓ **Vereda el Sauce**

Construcción de pavimento rígido: Se plantea la construcción de un tramo en pavimento rígido de 126 ml, la cual presenta pendientes del 3 % con espesor de 20 cm con un ancho promedio de 5m.l.

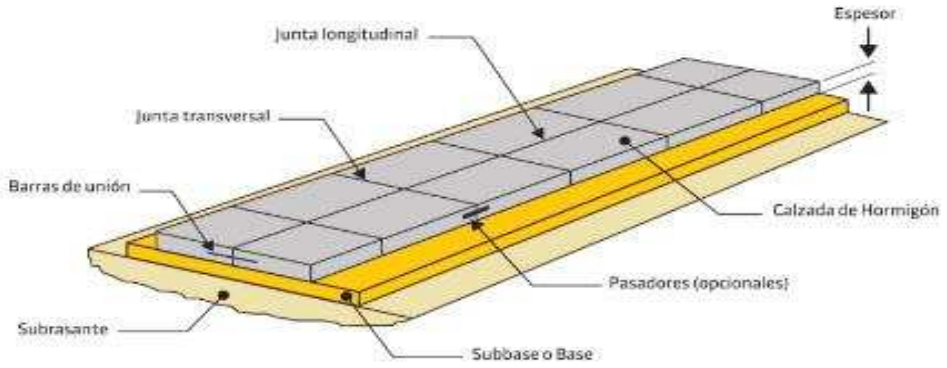

- ✓ **Vereda Olivos**

Construcción de Placa Huella: Se establece la construcción de un tramo de placa huella de 144 m y 3 ml de placas de transición en cada extremo de la vía, con pendiente superior al 5%, espesor de 15 cm y un ancho de 5 m.l. con transición al final de las vías y acero de refuerzo.

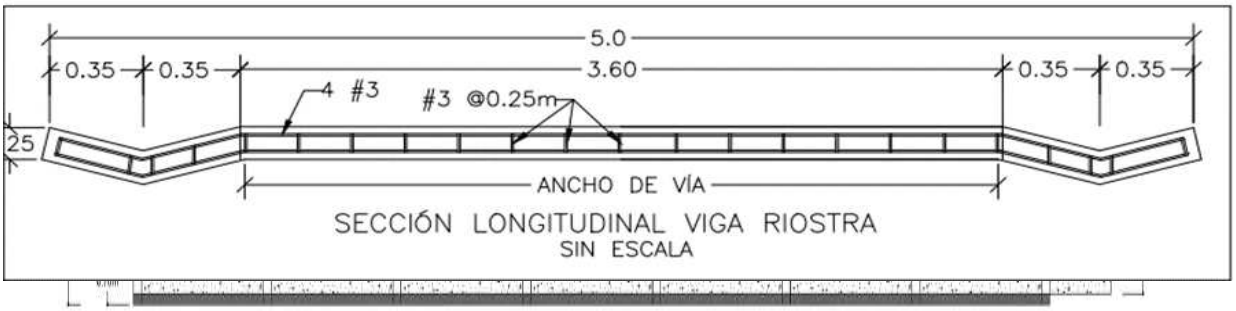

Actividades de mejoramiento construcción alcantarillas: En la zona existe una alcantarilla con ausencia de mantenimiento tanto en la entrada como en la salida por lo cual se plantea realizar el mantenimiento adecuado.

Desmonte y limpieza de zonas no boscosas: Se realizará rocería en la zona por ambos lados de la vía a partir de la mitad de la misma aproximadamente 0.4 Ha.

Construcción de filtro: en este tramo de vía se realizará un filtro de acuerdo a la catilla del invias.


- ✓ **Vereda Quiroz Alto**

Construcción de pavimento rígido: Se plantea la construcción de un tramo en pavimento rígido de 94.4 m.l., la cual presenta pendientes del 3 % con espesor de 20 cm con un ancho promedio de 5 m.l. una alcantarilla, filtro de 95 m.l.


Actividades de mejoramiento construcción alcantarillas: En la zona existe una alcantarilla con ausencia de mantenimiento tanto en la entrada como en la salida por lo cual se plantea realizar el mantenimiento adecuado. Actividades de mejoramiento construcción alcantarillas: Se plantea el mejoramiento y limpieza de la alcantarilla existente de 12 m.l.

Desmonte y limpieza de zonas no boscosas: Se realizará rocería en la zona por ambos lados de la vía a partir de la mitad de la misma aproximadamente 0.4 Ha.

Construcción de filtro: en este tramo de vía se realizará un filtro de acuerdo a la cartilla del invias.

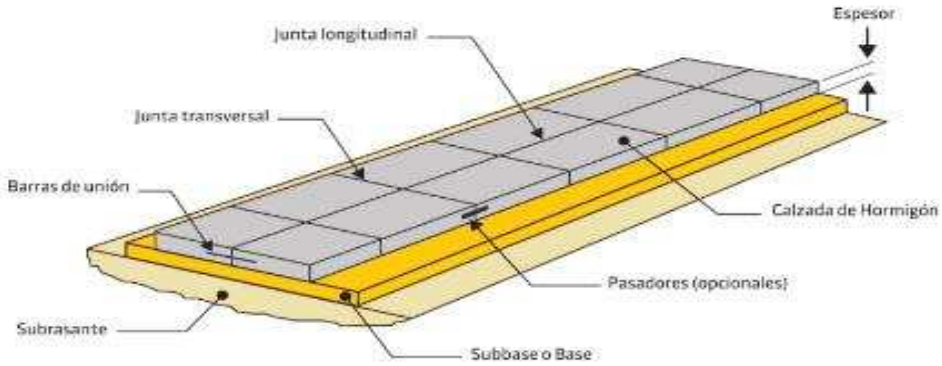


- ✓ **Vereda Quiroz Bajo**
- ✓ **Construcción de pavimento rígido:** Se plantea la construcción de un tramo en pavimento rígido de 154 ml, la cual presenta pendientes del 3 % con espesor de 20 cm con un ancho promedio de 5 m.l.

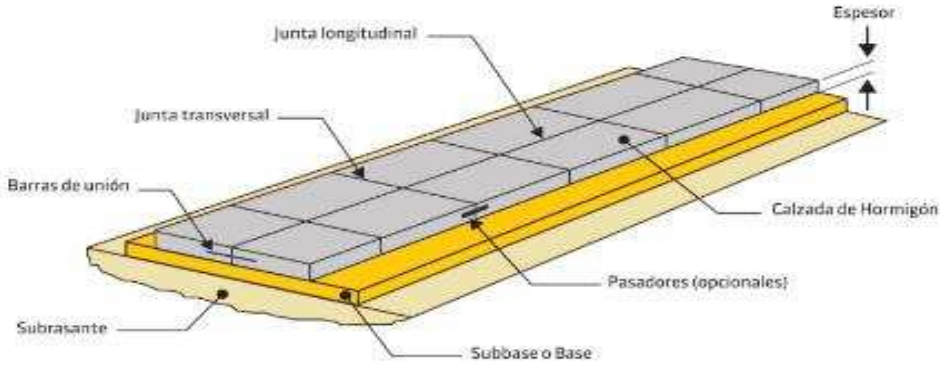


- ✓ **Vereda Llano Grande**

Construcción de pavimento rígido: Se plantea la construcción de un tramo en pavimento rígido de 120 m.l., la cual presenta pendientes del 3 % con espesor de 20 cm con un ancho promedio de 5 m.l., filtro de 100 m.l.

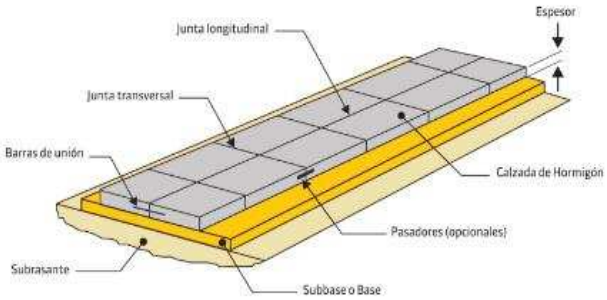

- ✓ **Vereda Nueva Florida**

Construcción de Placa Huella: Se establece la construcción de un tramo de placa huella de 180m y 3 ml de placas de transición en cada extremo de la vía, con pendiente superior al 5%, espesor de 15 cm y un ancho de 5 m l, y acero de refuerzo de refuerzo y filtro de 180 m.l.

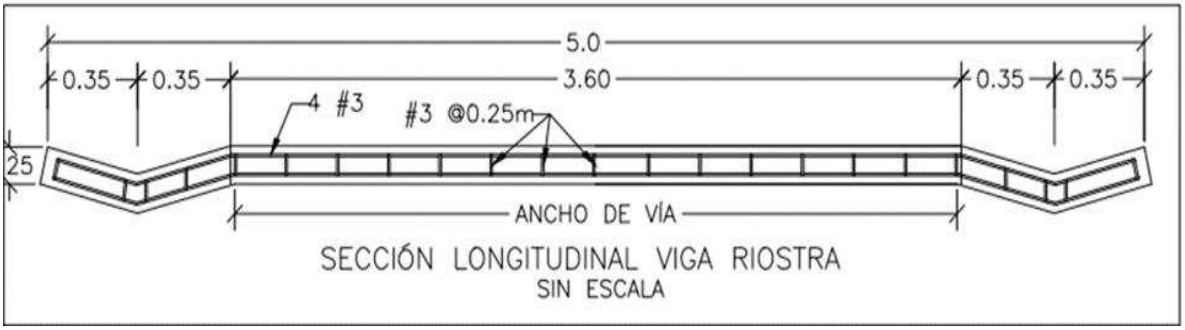

SECCIÓN LONGITUDINAL VIGA RIOSTRA
SIN ESCALA

Desmonte y limpieza de zonas no boscosas: Se realizará rocería en la zona por ambos lados de la vía a partir de la mitad de la misma aproximadamente 0.4 Ha.

Construcción de filtro: en este tramo de vía se realizará un filtro de acuerdo a la cartilla del invias.

3. INFORMACIÓN CONVENIOS DE OBRA

3.1 Información general de los convenios de obra

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3089 DE 2023	
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATO	3089 DE 2023
CONTRATISTA	JAC LLANO GRANDE
REPRESENTANTE LEGAL	ONEY VALDEZ
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE E INSTITUTO NACIONAL DE VÍASY LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 201,005,912
ANTICIPO	-
FECHA DE INICIACION	14/12/24
PLAZO DE EJECUCION	4.53 MESES
GESTOR AMBIENTAL	N/A
PRORROGA No 4 (PLAZO DEL CONTRATO)	15 DE AGOSTO DE 2024
SUPERVISOR DE CONTRATOS	UVEIMAR LAGOS VEGA
GESTOR TECNICO	HERNRY LEANDRO PAZMIÑO MORA
DIRECTOR DE OBRA	N/A

ANTICIPO	N/A
FECHA DE INICIACION	14/12/23
PLAZO DE EJECUCION	4.53 MESES
GESTOR AMBIENTAL	N/A
GESTOR SOCIAL	N/A
SUPERVISOR DE CONTRATOS	UVEIMAN LAGOS
GESTOR TECNICO	HERNRY LEANDRO PAZMIÑO MORA
DIRECTOR DE OBRA	N/A

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3157 DE 2023	
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATO	3157 DE 2023
CONTRATISTA	JAC LOS OLIVOS
REPRESENTANTE LEGAL	ELIZABETH TORO CHALA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 201,402,474

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

ANTICIPO	-
FECHA DE INICIACION	14/12/24
PRORROGA No 3 (PLAZO DEL CONTRATO)	158 DE AGOSTO DE 2024
GESTOR AMBIENTAL	N/A
GESTOR SOCIAL	N/A
SUPERVISOR DE CONTRATOS	UVEIMAN LAGOS
GESTOR TECNICO	HERNRY LEANDRO PAZMIÑO MORA
DIRECTOR DE OBRA	N/A

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3121 DE 2023	
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATO	3121 DE 2023
CONTRATISTA	JAC EL SAUCE
REPRESENTANTE LEGAL	RAUL URBANO LUNA

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAJUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA ELMANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 200,048,634
ANTICIPO	-
FECHA DE INICIACION	14/12/24
PRORROGA No 3 (PLAZO DEL CONTRATO)	15 DE AGOSTO DE 2024
GESTOR AMBIENTAL	N/A
GESTOR SOCIAL	N/A
SUPERVISOR DE CONTRATOS	UVEIMAN LAGOS
GESTOR TECNICO	HERNRY LEANDRO PAZMIÑO MORA
DIRECTOR DE OBRA	N/A

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3122 DE 2023	
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATO	3122 DE 2023
CONTRATISTA	JAC QUIROZ ALTO
REPRESENTANTE LEGAL	YONIER DEMETRIO TUQUERRES
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS

VALOR DEL CONTRATO	$ 199,318,829
ANTICIPO	-
FECHA DE INICIACION	14/12/24
PRORROGA No 3 (PLAZO DEL CONTRATO)	15 DE AGOSTO DE 2024
GESTOR AMBIENTAL	N/A
GESTOR SOCIAL	N/A
SUPERVISOR DE CONTRATOS	UVEIMAN LAGOS
GESTOR TECNICO	HERNRY LEANDRO PAZMIÑO MORA
DIRECTOR DE OBRA	N/A

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3153 DE 2023	
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATO	3153 DE 2023
CONTRATISTA	JAC QUIROZ BAJO
REPRESENTANTE LEGAL	ROBINSON VALDES MARTINEZ
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCODEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 202,406,606
ANTICIPO	-
FECHA DE INICIACION	14/12/24

PRORROGA No 3 (PLAZO DEL CONTRATO)	15 DE AGOSTO DE 2024
GESTOR AMBIENTAL	N/A
GESTOR SOCIAL	N/A
SUPERVISOR DE CONTRATOS	UVEIMAN LAGOS
GESTOR TECNICO	HERNRY LEANDRO PAZMIÑO MORA
DIRECTOR DE OBRA	N/A

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3281 DE 2023	
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATO	3281 DE 2023
CONTRATISTA	JAC NUEVA FLORIDA
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER FERNEY RAMOS PALADINES
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 200,698,283
ANTICIPO	-
FECHA DE INICIACION	14/12/24

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

PRORROGA No 3 (PLAZO DEL CONTRATO)	15 DE AGOSTO DE 2024
GESTOR AMBIENTAL	N/A

GESTOR SOCIAL	N/A
SUPERVISOR DE CONTRATOS	UVEIMAN LAGOS
GESTOR TECNICO	HERNRY LEANDRO PAZMIÑO MORA
DIRECTOR DE OBRA	N/A

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Los contratistas ante la suspensión de fin del año 2.023 reanudaron sus actividades en el mes de enero del presente año 2.024 se comunicó con los representantes legales de cada convenio para dar inicio a las diferentes actividades para logra el desarrollo de los convenios. Actualmente se dio una prórroga hasta el día 31 de julio de 2024.

Respecto al **contrato 3089 de 2.023 correspondiente** a la vereda **Llano Grande** en el municipio de La Unión en el departamento de Nariño según lo previsto anteriormente este convenio realizo las siguientes actividades:

- el día 16 de julio se realizó el 4to comité operativo.



- El día 18 de julio se realizó una reunión con la comunidad y la social de la interventoría.



- El día 19 de julio se recibió visita del invias territorial Nariño para ver el avance de la obra.



- El día 30 de julio se inicia con la fundición del segundo carril de pavimento rígido.











Respecto al **contrato 3157 de 2.023 correspondiente** a la vereda Olivos en el municipio de la unión en el departamento de Nariño según lo previsto anteriormente este convenio entrego los estudios y diseños estos fueron revisados y aprobados por interventoría.

- Se continúa con acopio de material al tramo que se va a intervenir.



- Se realiza el encofrado para la placa huella.




- El día 4 de julio se inicia con la fundición del concreto ciclópeo.



- Se realiza el vibrado del concreto de acuerdo a la norma.





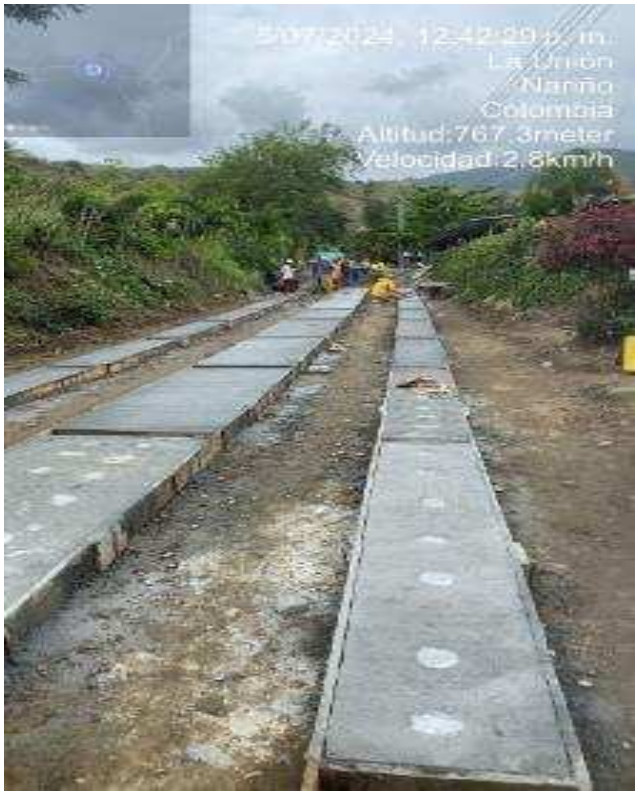




- Se realiza el texturizado del concreto por cada uno de los paños.




La Unión
Nariño
Colombia


miércoles, 10 de julio de 2024
La Unión
Nariño

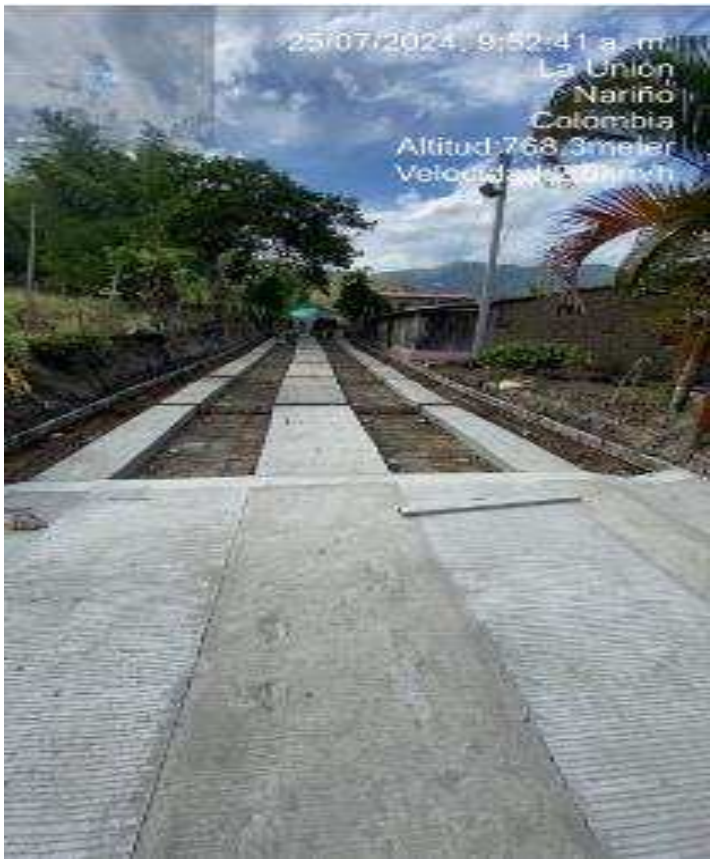


La Unión
Nariño
Colombia

- Por parte de la social de interventoría y SST, realizaron una jordana de hidratación a los trabajadores.



- El día 12 de julio se realizó el 4to comité operativo.



Respecto al **contrato 3119 de 2.023 correspondiente** a la vereda el **Peligro**. En el mes de julio se realizan las siguientes actividades, seda apertura al segundo comité operativo, en conjunto con la vedaría, residente de obra, y director de interventoría.

- El día 8 de julio se toman las densidades en este convenio.





- El día 8 de julio se realizó una reunión con la comunidad para dar respuesta a varias inquietudes.



- Por parte de la interventoría no se aprueba un tramo, en el cual la subbase no se encuentra en óptimas condiciones, el material esta saturado y presenta plasticidad.









- Por parte de interventoría el día 11 de julio se rectifica la topografía.





- Se realiza acopio de materiales pétreos.





- El día 16 de julio se realiza el 4to comité operativo en el cual se aprueban pagos de nómina, materiales de ferretería, pólizas entre otros.



- El día 18 de julio se inicia con la actividad de encofrado de la placa huella.









- Se inicia con la fundición de concreto ciclópeo, en total se encofraron 28ml, más la losa de transición.







- El día 19 de julio se recibió visita por parte del invias territorial Nariño.



- Se realiza el vibrado del concreto.











INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

- se realiza toma de cilindros.







- se termina 28ml de placa huella y la losa de transición, se realiza el encofrado de 40ml de placa huella.





- se l funden 40ml de concreto ciclópeo.





Respecto al **contrato 3121 de 2.023 correspondiente** a la vereda el Sauce en el municipio de la unión en el departamento de Nariño.

- El día 18 de julio se inicia con las actividades de fundición de segundo tramo







- Se hace el vibrado del concreto como lo indica la norma



- Se realiza la aplicación de ANTISOL, para el correcto fraguado del concreto.





- Se hace el texturizado del pavimento rígido.





- **Bordillo** se realiza la formaleta para la fundición del bordillo y dar por terminado el tramo completo de la vía.





- Construcción de bordillo.









- Se hace el corte de junta y sello de estas.







INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

En la vereda el Sauce se termina en un 100% el tramo intervenido con su bordillo, corte y sello de juntas el día 29 de julio del 2024, se logra la meta física de 126.7 ml de pavimento rígido.

Respecto al **contrato 3122 de 2.023 correspondiente** a la vereda Quiroz Alto en el municipio de la unión en el departamento de Nariño, se realiza las siguientes actividades:

- El día 11 de julio se da inicio con la fundición del segundo carril de pavimento rígido y el mismo día se realiza el 4to comité operativo.





- Se realiza la fundición de pavimento rígido



- Se toma muestras de vigas del concreto.



texturizado de pavimento rígido: se realiza el texturizado por cada uno de los paños



- El día 17 de julio se termina la fundición del pavimento rígido en un 100%.



- Se continúa con la fundición del bordillo.



contrato 3153 de 2.023 correspondiente a la vereda Quiroz Bajo en el municipio de la unión en el departamento de Nariño. Se realizaron las siguientes actividades.

- **Instalación de formaleta:** el día dos de julio del año en curso se instala la formaleta para dar inicio a la fundición del carril derecho.





- **Fundición de pavimento rígido.** el día 3 de julio del presente año, se da inicio con la actividad de fundición de pavimento rígido





- Se realiza el vibrado del concreto de manera adecuada en cada uno de los paños



- En conjunto con la interventoría se hace la prueba del Slump.







- La cuadrilla de corte y figuración de acero continúa con esta actividad.



- Se continúa con la fundición del primer carril.









Comité de obra: el día 17 de julio se realizó el 4to comité de obra donde se trataron temas como la compra de materiales de ferretería, pago de nómina, pago de maquinaria entre otros.



- Por parte de la profesional social de interventoría se realiza visitas de seguimiento comunitario a la comunidad.



- se recibe visita por parte personal del invias territorial Nariño.



Respecto al **contrato 3281 de 2.023 correspondiente** a la vereda Nueva Florida en el municipio de San Pablo en el departamento de Nariño, en esta vereda se realizan las siguientes actividades.

Durante el mes de julio se han realizado las siguientes actividades:

- **subbase:** en este convenio las densidades no fueron optimas. Por tal razón se realizó nuevamente la escarificación y compactación de la subbase hasta obtener el resultado de acuerdo a la norma









- se recibe visita por parte de personal del invias territorial Nariño



- Desde el día 29 de julio se inicia con el encofrado de la placa huella y amado de acero de las huellas.



- El día 30 de julio se inicia con la fundición de las huellas







INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

3.3 Seguimiento ítems no previstos


No aplica para este periodo.

3.4 Estado de avance

- **Vereda el peligro**

A continuación, se presenta las actividades programadas para este mes y su estado de porcentaje programado vs el ejecutado, en general se puede concluir que este mes en la vereda el Peligro tubo retrasos en la ejecución de actividades.


VEREDA EL PELIGRO MUNICIPO DE LA UNION NARIÑO		
ACTIVIDAD	%PROGRAMADO	% EJECUTADO
subbase	100%	100%
corte y figuracion de acero	100%	100%
concreto	100%	20%

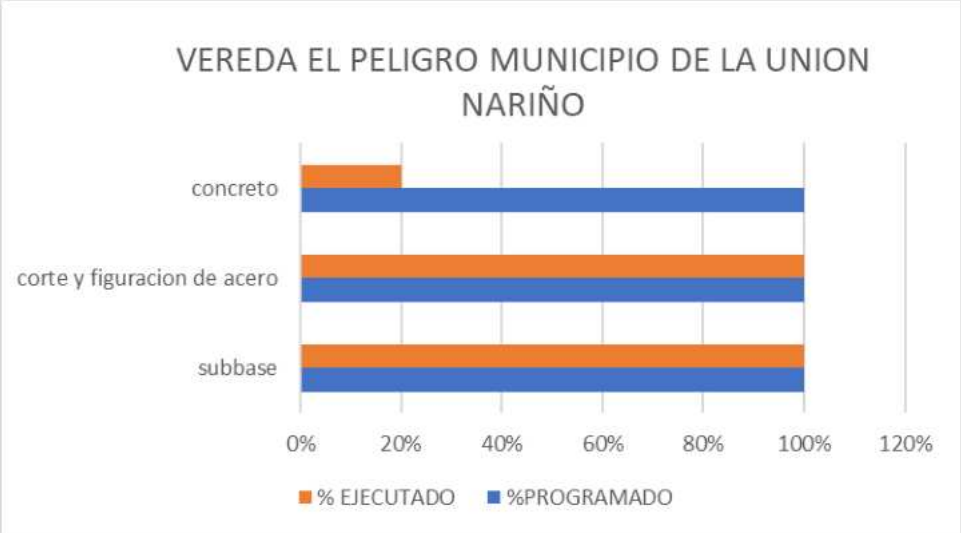

- **Vereda llano grande**

A continuación, se presenta las actividades programadas para este mes y su estado de porcentaje programado vs el ejecutado, en general se puede concluir que este mes en la vereda Llano Grande tubo retrasos en la ejecución de actividades.


VEREDA LLANO GRANDE MUNICIPO DE LA UNION NARIÑO		
ACTIVIDAD	%PROGRAMADO	% EJECUTADO
subbase	100%	100%
corte y figuracion de acero	100%	100%
pavimento rigido (concreto)	100%	60%
bordillo	100%	0%

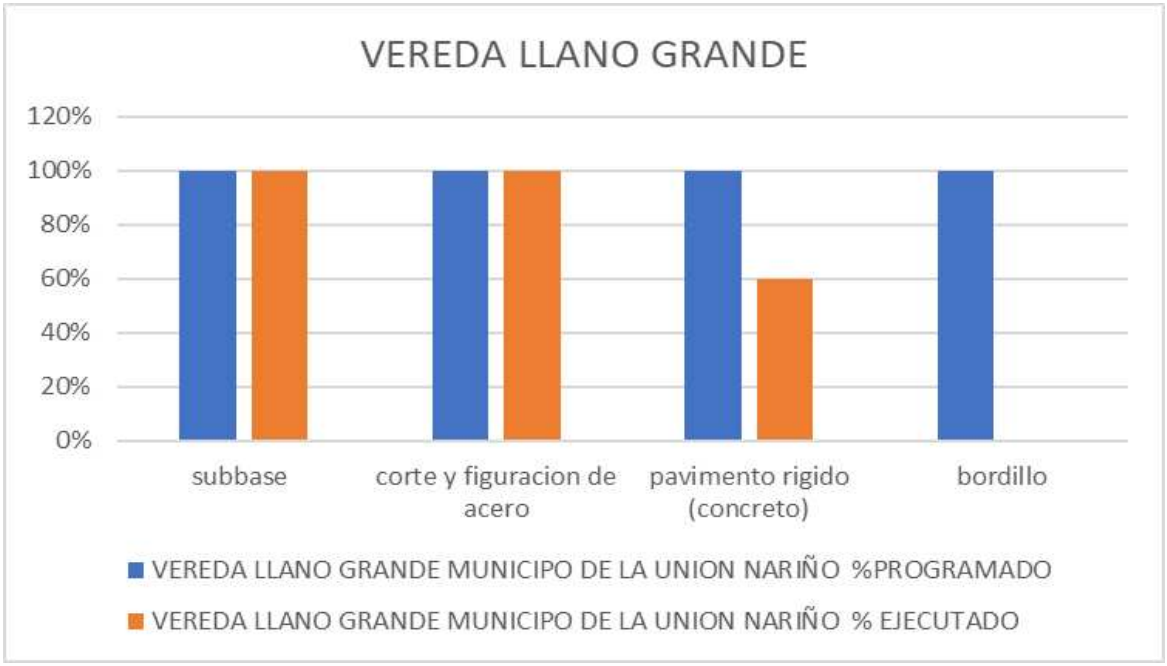

- VEREDA NUEVA FLORIDA

A continuación, se presenta las actividades programadas para este mes y su estado de porcentaje programado vs el ejecutado, en general se puede concluir que este mes en la vereda nueva Florida presenta retrasos en la ejecución de actividades.


VEREDA NUEVA FLORIDA MUNICIPO DE SAN PABLO NARIÑO		
ACTIVIDAD	%PROGRAMADO	% EJECUTADO
conformacion de la subbase	100%	90%
corte y figuracion de acero	100%	100%
placa huella (concreto 3000psi y concreto ciclopeo)	100%	25%

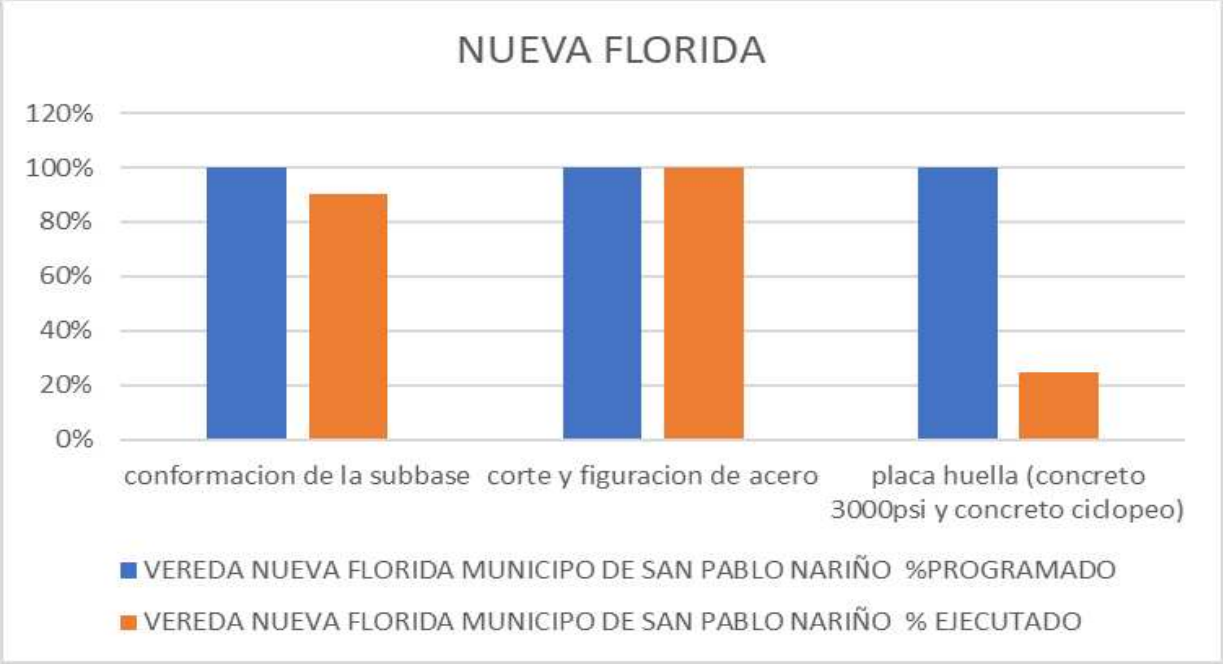

- **Quiroz alto**

A continuación, se presenta las actividades programadas para este mes y su estado de porcentaje programado vs el ejecutado, en general se puede concluir que este mes en la vereda Quiroz Alto presenta retraso de ejecución de actividades.


VEREDAQUIROZ ALTO MUNICIPO DE LA UNION NARIÑO		
ACTIVIDAD	%PROGRAMADO	% EJECUTADO
corte y figuracion de acero	100%	100%
pavimento rigido (concreto)	100%	100%
bordillo	100%	90%

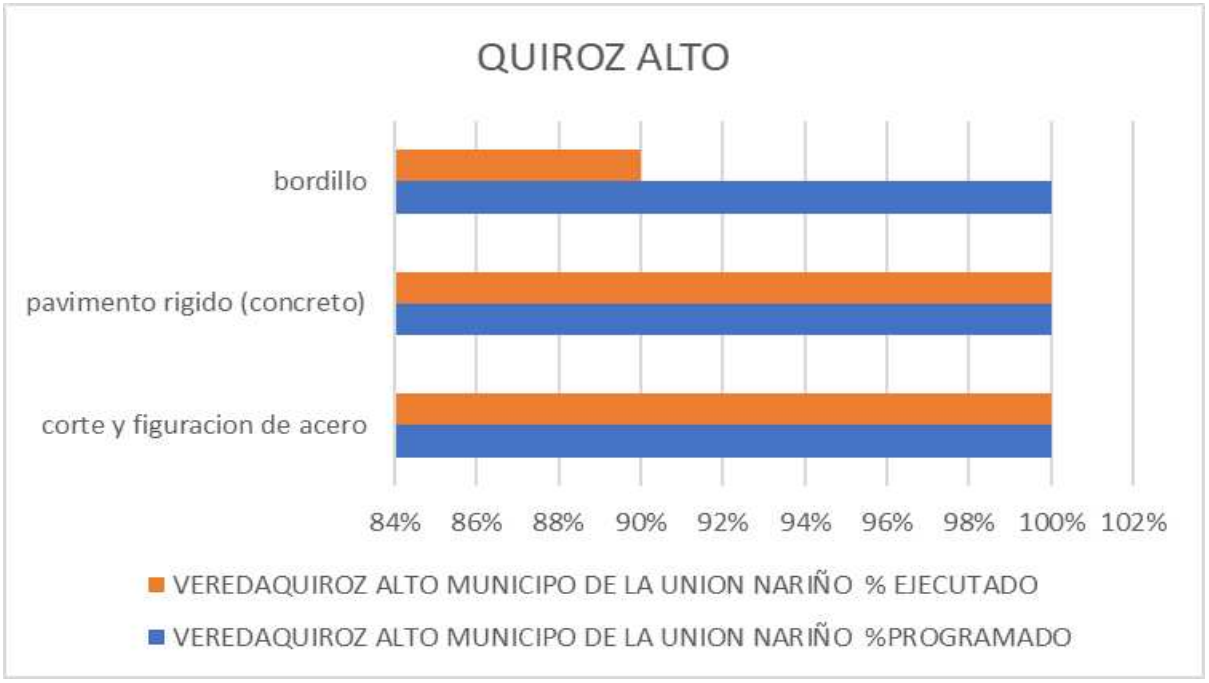

- **Quiroz bajo**

A continuación, se presenta las actividades programadas para este mes y su estado de porcentaje programado vs el ejecutado, en general se puede concluir que este mes en la vereda Quiroz bajo presenta retraso en la ejecución de actividades.


VEREDA QUIROZ BAJO MUNICIPO DE LA UNION NARIÑO		
ACTIVIDAD	%PROGRAMADO	% EJECUTADO
corte y figuracion de acero	100%	100%
pavimento rigido (concreto)	100%	50%
bordillo	100%	0%

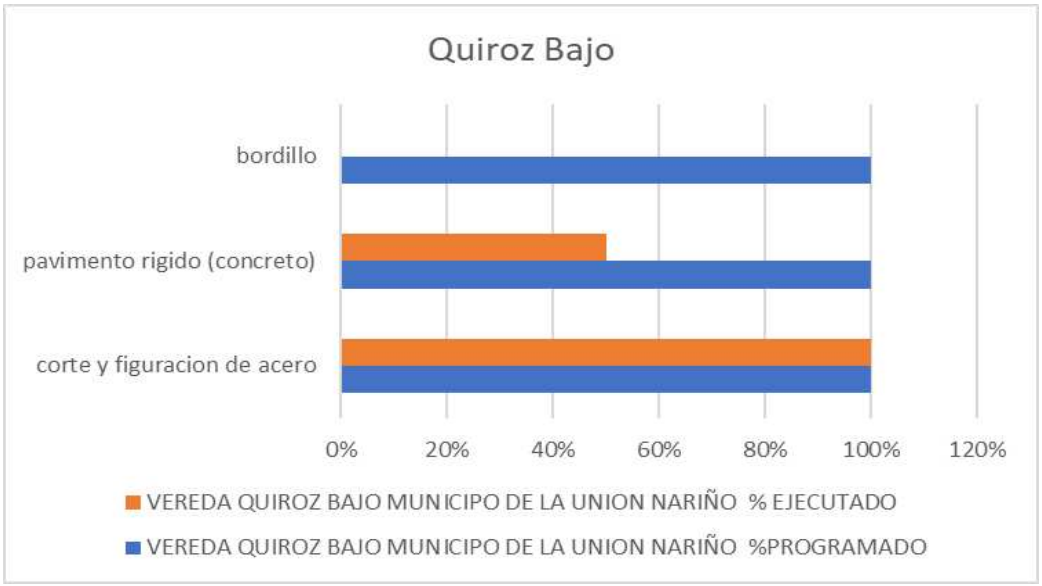

- Olivos

A continuación, se presenta las actividades programadas para este mes y su estado de porcentaje programado vs el ejecutado, en general se puede concluir que este mes en la vereda Olivos presenta retraso en la ejecución de actividades.


VEREDA OLIVOS MUNICIPO DE LA UNION NARIÑO		
ACTIVIDAD	%PROGRAMADO	% EJECUTADO
conformacion de la subbase	100%	100%
corte y figuracion de acero	100%	100%
concreto	100%	95%

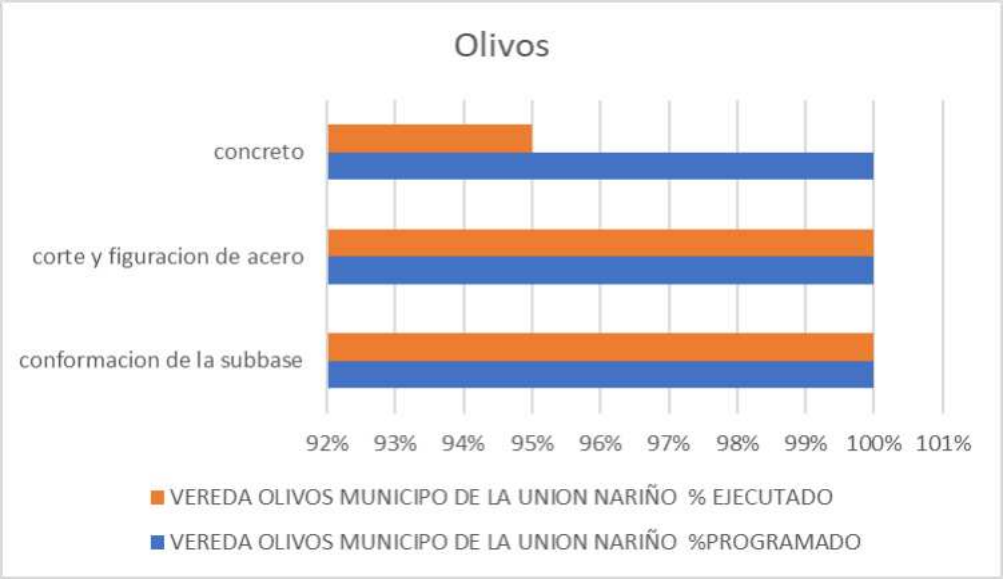

- **El sauce**


A continuación, se presenta las actividades programadas para este mes y su estado de porcentaje programado vs el ejecutado, en general se puede concluir que este mes en la vereda Olivos presenta retraso en la ejecución de actividades.

VEREDA EL SAUCE MUNICIPO DE LA UNION NARIÑO		
ACTIVIDAD	%PROGRAMADO	% EJECUTADO
corte figuracion de acero	100%	100%
pavimento rigido (concreto)	100%	100%
bordillo	100%	100%

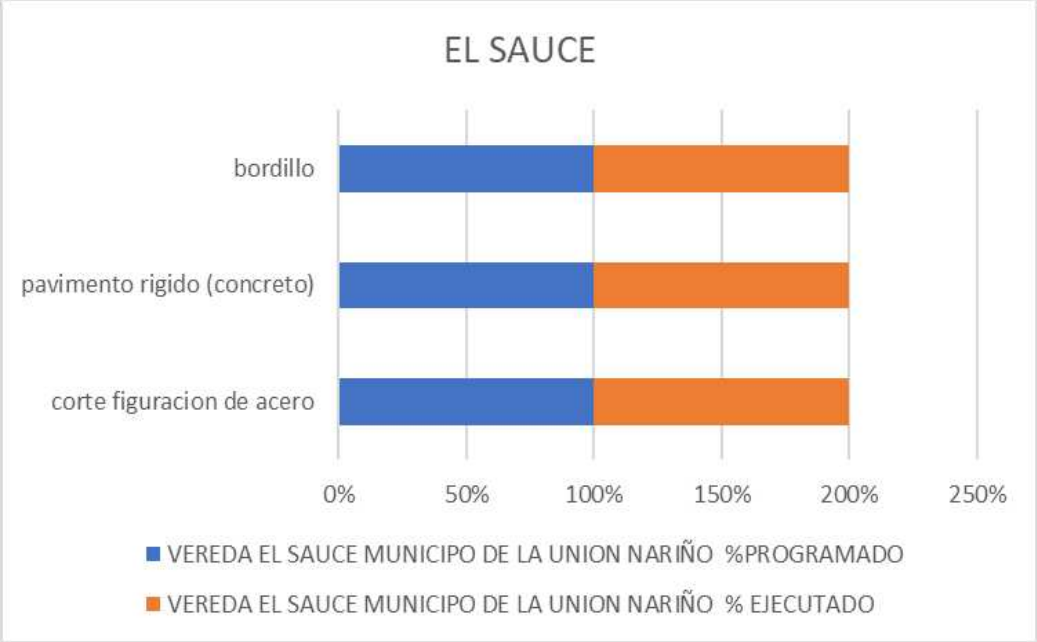

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal: se adjunta copia en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 de los Informes semanales realizados para los siete convenios.

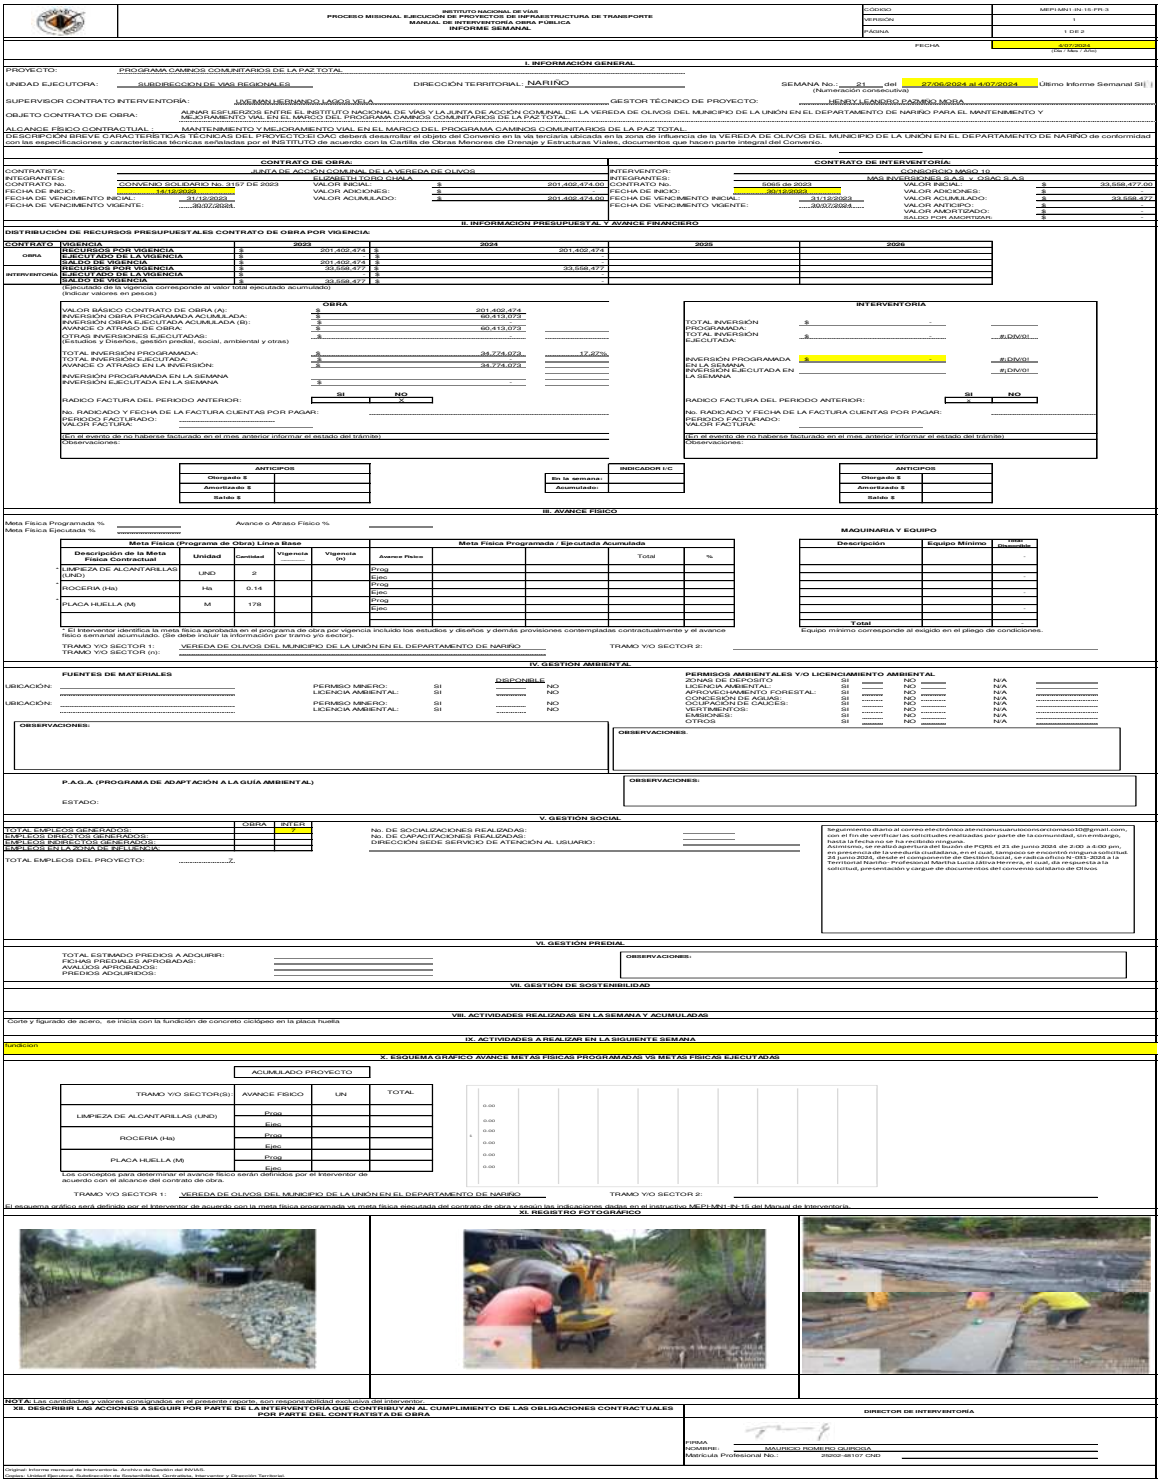

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA: 1 DE 2 | FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 21 (Numeración consecutiva) del 27/06/2024 al 4/07/2024 — Ultimo Informe Semanal SI[ ]
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS
INTEGRANTES: ELIZABETH TOTO CHALA
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 3167 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 201,402,474.00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 201,402,474.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES: MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S
CONTRATO No.: 5065 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,402,474	$ 201,402,474		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	$		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,402,474	$		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	$		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$		

(ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	201,402,474
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	60,413,073
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	60,413,073
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	34,774,073 — 17.27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$	34,774,073
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI / NO (X)
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	- #¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	- #¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI (X) / NO
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (año)	Vigencia (n)	Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Total	%
LIMPEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	2			Prog					
					Ejec					
ROCERIA (Ha)	Ha	0.14			Prog					
					Ejec					
PLACA HUELLA (M)	M	178			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI / NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI / NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI / NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI / NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI / NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL	SI / NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI / NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI / NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI / NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI / NO	N/A	
EMISIONES:	SI / NO	N/A	
OTROS	SI / NO	N/A	

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES.
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:
OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL.

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....7.....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Se recibió una solicitud mediante radicado de PQRS el 21 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la vereduria ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud. 24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N° 033- 2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucia Idrica Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Olivos

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:
OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Corte y figurado de acero, se inicia con la fundición de concreto ciclópeo en la placa huella

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundicion

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO — AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog.		
	Ejec.		
ROCERIA (Ha)	Prog.		
	Ejec.		
PLACA HUELLA (M)	Prog.		
	Ejec.		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-86107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Responsabilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 21 del 27/06/2024 al 4/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la VÍA TERCIARIA UBICADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ		
INTEGRANTES:	ROBINSON VALDES MARTINEZ		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3153 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 202.406.606,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 202.406.606,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5965 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33.558.477,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33.558.477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 202.406.606	$ 202.406.606		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.406.606	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33.558.477	$ 33.558.477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33.558.477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ -	202.406.606
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	29.805.450
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	29.805.450
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	29.805.450 — 14,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	29.805.450
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:		#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (Año)	Vigencia (M)
* LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1		
* ROCERIA (Ha)	Ha	0.34		
* PLACA HUELLA (M)	M	170		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico			Total	%
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariosconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
El 24 de junio 2024, mediante oficio de gestión social, se radicó oficio N. 031-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucia Ibtiva Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Olivos.
25 de junio 2024, la profesional social realiza visita de seguimiento, haciendo un recorrido comunitario, con el fin de indagar diferentes aspectos relacionados al componente social, que se hayan desencadenado a partir de la ejecución de la obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se inicia con el vertido de concreto para pavimento rígido, se realiza prueba de Slump, se toman especímenes para ensayo a flexión.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundicion

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	ACUMULADO PROYECTO TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



corte y figuracion de aceroo



corte y figuracion de aceroo



toma de densidades por parte de interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 2
FECHA	4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 21 del 27/06/2024 al 4/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [ ]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANO GRANDE		
INTEGRANTES:	ONEY VALDES		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3089 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,005,912.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,005,912.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,005,912	$ 201,005,912		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,005,912	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,005,912	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 37,882,878	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 37,882,878	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 37,882,878	18.85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 37,882,878	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
PLACA HUELLA (M)	M	173			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@hotmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N -031-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucia Játiva Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Llano Grande.
25 de junio 2024, la profesional social realiza visita de seguimiento, haciendo un recorrido comunitario, con el fin de indagar diferentes aspectos relacionados al componente social, que se hayan desencadenado a partir de la ejecución de la obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

fundicion de pavimento rigido

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundicion de pavimento rigido

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



fundicion de pavimento



fundicion de pavimento



fundicion de pavimento

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matricula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSION	1
PAGINA	1 DE 2
FECHA	4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 21 del 27/06/2024 al 4/07/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO			INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	YONIER DEMETRIO TUQUERRES ERASO			INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3122 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,318,829.00	CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,318,829.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,318,829	$ 199,318,829		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,318,829	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	199,318,829
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	32,173,811
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	32,173,811
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	32,173,811 — 16.14%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$	-
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	32,173,811
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (%)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.2			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	183			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
TRAMO Y/O SECTOR (n): — TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: SAN PABLO NARIÑO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionalusuario@consorciomaso10@hotmail.com con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.

Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la vendurla ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.

24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N-031-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucia Jativa Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Olivos.

25 de junio 2024, la profesional social realiza visita de seguimiento, haciendo un recorrido comunitario, con el fin de indagar diferentes aspectos relacionados al componente social, que se hayan desencadenado a partir de la ejecución de la obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No hay actividad en la presente semana, se está a la espera de que el último paño fundido cumpla con los 28 días de fraguado, se enviaron especimenes de concreto para ser ensayados.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

bordillo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

carril derecho terminado la fundicion	toma de densidades por parte de interventoria	carril derecho terminado la fundicion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	4/07/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 21 del 27/06/2024 al 4/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE
INTEGRANTES: RAUL URBANO LUNA
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 3121 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.048.634,00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.048.634,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES: MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S
CONTRATO No.: 5065 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 33.558.477,00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 33.558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.048.634	$ 200.048.634		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.048.634	$		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33.558.477	$ 33.558.477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33.558.477	$		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.048.634	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 41.417.868	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41.417.868	20,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 41.417.868	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	$ 41,417,868.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.22			Prog				
					Ejec				
PAVIMENTO R(M)	M	145			Prog				
					Ejec				
ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y por vigencia)

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO — DISPONIBLE
UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A			
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A			
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A			
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A			
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A			
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A			
EMISIONES:	SI	NO	N/A			
OTROS	SI	NO	N/A			

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@hotmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la vereduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N-031-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucia Ibtiva Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario del Sauce.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se está a la espera de que el tramo de pavimento terminado llegue al tiempo de fraguado de 28 días para habilitar el carril y continuar con el otro lado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

lundion seguindo tramo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		
ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Gerentes, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 21 del 27/06/2024 al 4/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC debera desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA INTEGRANTES: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO — LILIANA VALENCIA MUÑOZ

CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3119 DE	VALOR INICIAL:	$ 200,741,050.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,741,050.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR INTEGRANTES: CONSORCIO MASO 10 — MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S

CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,741,050	$ 200,741,050		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,741,050	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,741,050	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 37,724,080	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 37,724,080	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 37,724,080	18.79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 37,724,080	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ..... Avance o Atraso Físico %: .....
Meta Física Ejecutada %: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (n)	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.2536			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	207			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	
EMISIONES:	SI NO	N/A	
OTROS	SI NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la comunidad, sin embargo, no se recibió ninguna solicitud.
21 de junio 2024, la profesional social realiza visita de seguimiento, llevando un recorrido comunitario, con el fin de indagar diferentes aspectos relacionados al componente social, que se hayan desencadenado a partir de la ejecución de la obra.
24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N-031-2024 a la Territorial Nariño Profesional Martha Lucia Ibtiva Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Olivos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

en esta semana no se pudieron adelantar trabajos por las fuertes lluvias presentadas,de igual manera no se pudo por parte de los convenios tomar las densidades porque se presente un paro en el departamento que inpidio el paso del laboratoio hasta el lugar

toma de densidades,inciar con la fundicion de la placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



trabajos suspendidos por lluvias y por el paro del departamento o se pudo tomar las densidades



conformacion subbase



conformacion subbase

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 21 del 27/06/2024 al 4/07/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:EL OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA NUEVA FLORIDA DEL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA
INTEGRANTES: WILDER FERNEY RAMOS PALADINES
CONTRATO No: CONVENIO SOLIDARIO No. 3261 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.698.283,00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.698.283,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES: MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S
CONTRATO No. 5065 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 33.558.477,00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 33.558.477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.698.283	$ 200.698.283		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.698.283	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33.558.477	$ 33.558.477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33.558.477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.698.283	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.919.165	4,44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 8.919.165	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	-	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI — NO X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI — NO X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ..... — Avance o Atraso Físico %: .....
Meta Física Ejecutada %: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0,22			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	207			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariosvianarcomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 14 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N -031-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucía Ibtiva Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Olivos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Los resultados de densidades no cumplen con lo exigido están alrededor de 83%, no pudo ingresar el laboratorista con su equipo por que en la zona se presenta paro camionero; se presenta paro camionero a nivel departamental, lo que dificulta la movilidad de insumos y sobre todo escacés de combustibles afectando el rendimiento de las obras en ejecución.corte i figuracion de acero

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundicion de placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE META FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO: AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

corte y figuracion de acero	corte y figuracion de acero	corte y figuracion de acero

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSION	1
PAGINA	1 DE 2
FECHA	11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 22 (Numeración consecutiva) del 4/07/2024 al 11/07/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA NUEVA FLORIDA DEL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA			INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	WILDER FERNEY RAMOS PALADINES			INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No:	CONVENIO SOLIDARIO No. 3261 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,698,283.00	CONTRATO No:	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,698,283.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,698,283	$ 200,698,283		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,698,283	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,698,283	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8,919,165	4.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 8,919,165	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.22			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	207			Prog				
					Ejec				

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n): VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com; con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 14 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduria ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N-091-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucía Ibarra Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Olivos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

NO SE ENCUENTRA MAQUINARIA AMARILLA EN LA ZONA NO SE PUEDE ESCLARIFICAR Y COMPACTAR LA SUBBASE PARA QUE DEN LAS DENSIDADES

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TENER LISTA LA SUBBASE Y TOMA DE DENSIDADES

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

		ACUMULADO PROYECTO	
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



tramo a intervenir



tramo a intervenir



tramo a intervenir

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 2

FECHA: 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 22 (Numeración consecutiva) del 4/06/2024 al 11/07/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO
INTEGRANTES: YONIER DEMETRIO TUQUERRES ERASO
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 3192 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199,318,829.00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199,318,829.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES: MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S
CONTRATO No.: 5065 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,318,829	$ 199,318,829		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,318,829	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	199,318,829
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	32,173,811
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	32,173,811
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	32,173,811 — 16.14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	32,173,811
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI — NO X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI x — NO
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
1 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
2 ROCERIA (Ha)	Ha	0.2			Prog				
					Ejec				
3 PLACA HUELLA (M)	M	183			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: SAN PABLO NARIÑO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS	SI ____	NO ____	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico alexcarlosjurado@consorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.

Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.

24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N-031-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucia Jálliva Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Olivos.

25 de junio 2024, la profesional social realiza visita de seguimiento, haciendo un recorrido comunitario, con el fin de indagar diferentes aspectos relacionados al componente social, que se hayan desencadenado a partir de la ejecución de la obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE INICIO CON EL SEGUNDO CARRIL A FUNDIR EL DIA 10 DE JULIO DE 2024 SE ESPERA TERMINAR EN LA PROXIMA SEMANA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FUNDICION

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION DE SEGUNDO TRAMO | FUNDICION DE SEGUNDO TRAMO | FUNDICION DE SEGUNDO TRAMO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	7/07/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 22 del 4/07/2024 al 11/07/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO		
INTEGRANTES:	LILIANA VALENCIA MUÑOZ		
CONTRATO No.	42ND SOLIDARIO No. 3119 DE	VALOR INICIAL:	$ 200,741,050.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,741,050.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,741,050	$ 200,741,050		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,741,050	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,741,050	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 37,724,080	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 37,724,080	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 37,724,080	18.79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 37,724,080	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPEZA DE ALCANTARILLAS	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.2536			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	207			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A
OTROS	SI ____	NO ____	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionalusuario@consorciomaso10.com, con el fin de verificar peticiones, quejas o sugerencias realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la vereduria ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
21 de junio 2024, la profesional social realiza visita de seguimiento, haciendo un recorrido comunitario, con el fin de indagar diferentes aspectos relacionados al componente social, que se hayan desencadenado a partir de la ejecución de la obra.
24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N-031-2024 a la Territorial Nariño Profesional Martha Lucia Jativa Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio sol.Idario de Olivos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE TOMARON DENSIDADES, SE ESPERAR REPARAR UN TRAMO DE PLACA HUELLA DAÑADO POR LAS LLUVIAS,LA MINA NO ESTA SUMINISTRANDO MATERIAL PETREO POR FALLAS EN SU TRITURADORA Y RETRAZA LOS TRABAJOS ,POR PARTE DE INTERVENTORIA SE RECTIFICA LA TOPOGRAFIA

Iniciar con la fundicion de la placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RECTIFICACION DETOPOGRAFIA POR INTERVENTORIA



TOMA DE DENSIDADES



REUNION POR LA COMUNIDAD

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matricula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 22 del 4/07/2024 al 11/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [ ]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANO GRANDE
INTEGRANTES: ONEY VALDES
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 3089 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 201,005,912.00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 201,005,912.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES: MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S.
CONTRATO No.: 5065 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,005,912	$ 201,005,912		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,005,912	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	201,005,912
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	37,882,878
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	37,882,878
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	37,882,878 — 18.85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	37,882,878
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$	-
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$	-
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
PLACA HUELLA (M)	M	173			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuario@consorciomaso10@hotmail.com con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asi mismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduria ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
24 junio 2024, de sde el componente de Gestión Social, se radica oficio N -031-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucia Ativa Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Llano Grande.
25 de junio 2024, la profesional social realiza visita de seguimiento, haciendo un recorrido comunitario, con el fin de indagar diferentes aspectos relacionados al componente social, que se hayan desencadenado a partir de la ejecución de la obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FUNDICION DEL CARRIL DERECHO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE META S FÍSICAS PROGRAMADAS VS META S FÍSICAS EJECUTADAS

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	7/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 22 del 4/07/2024 al 11/07/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTOEl OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS
INTEGRANTES: ELIZABETH TORO CHALA
CONTRATO No. CONVENIO SOLIDARIO No. 3157 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 201.402.474,00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 201.402.474,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES: MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S
CONTRATO No. 5065 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 33.558.477,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 33.558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.402.474	$ 201.402.474		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.402.474	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33.558.477	$ 33.558.477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33.558.477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.402.474	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 60.413.073	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 60.413.073	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34.774.073	17,27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 34.774.073	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	2			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.14			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	178			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Se informa que, de acuerdo al componente de Gestión Social, se radicó el No 035-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucia Idrobo Hoyos, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Olivos

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE ADELANTARON 27ML DE FUNDICON DE LA PLACA HUELLA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundicion

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


FUNDICION


FUNDICION


FUNDICION


FUNDICION


FUNDICION

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 22 del 4/07/2024 al 11/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO:El OAC debera desarrollar el objeto del Convenio en la VÍA TERCIARIA UBICADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ
INTEGRANTES: ROBINSON VALDES MARTINEZ
CONTRATO No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 3153 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 202,406,606.00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 202,406,606.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES: MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S
CONTRATO No.: 5065 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 33,558,477
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 202,406,606	$ 202,406,606		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202,406,606	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	202,406,606
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	29,805,450
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	29,805,450
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	29,805,450 — 14.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	29,805,450
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI — NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI x — NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.34			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	170			Prog				
					Ejec				

El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — DISPONIBLE — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI ____	NO ____	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A
OTROS	SI ____	NO ____	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento en el correo electrónico pqrsd.consorciomaso@hotmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21 de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la vereduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
24 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N-091-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucia Ibieva Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario de Olivos.
25 de junio 2024, la profesional social realiza visita de seguimiento, haciendo un recorrido comunitario, con el fin de indagar diferentes aspectos relacionados al componente social ,que se hayan desencadenado a partir de la ejecución de la obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE TERMINA FUNDICION DEL CARRIL DERECHO,POR DAÑOS EN LA TRUTURADORA DE DONDE SE SURTE EL MATERIAL PETREO NO SE PUEDE ACOPIAR.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


ACOPIO DE MATERIAL

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION



FUNDICION



FUNDICION

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25252-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEP1-MN1-IN-15-FR-3
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 22 del 4/07/2024 al 11/07/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL:

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE				
INTEGRANTES:	RAUL URBANO LUNA				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3121 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	200,048,634.00	
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	200,048,634.00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10				
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S				
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$	33,558,477.00	
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	33,558,477	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
		VALOR AMORTIZADO:	$	-	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,048,634	$ 200,048,634		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,048,634	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,048,634	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 41,417,868	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41,417,868	20.70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 41,417,868	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	$ 41,417,868.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ____ Avance o Atraso Físico %: ____
Meta Física Ejecutada %: ____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (a)	Vigencia (a)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.22			Prog				
					Ejec				
PAVIMENTO R(M)	M	145			Prog				
					Ejec				
ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Ejecutado
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ____

Seguimiento diario al correo electrónico atencionalusuario@consorciomaso.com, con el fin de atender las inquietudes presentadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 21de junio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la vereda ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
26 junio 2024, desde el componente de Gestión Social, se radica oficio N -031-2024 a la Territorial Nariño- Profesional Martha Lucía Ibtiva Herrera, el cual, da respuesta a la solicitud, presentación y cargue de documentos del convenio solidario del Sauce.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ____
AVALÚOS APROBADOS: ____
PREDIOS ADQUIRIDOS: ____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES ,SE HIZO EL TERCER COMITÉ OPERATIVO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

lunción segundo tramo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		
ROCERIA (Ha)	Prog		
	Ejec		
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		
ALCANTARILLAS (UND)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP1-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ OPERATIVO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: ____
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-PR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 23 del 11/07/2024 al 17/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE		
INTEGRANTES:	RAUL URBANO LUNA		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3121 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,048,634.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,048,634.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 5,570,571
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 43,129,048
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,048,634	$ 200,048,634		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,048,634	$		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,048,634	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 69,243,883	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 69,243,883	34.61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 69,243,883	34.61%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43,129,048	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 83,878,340.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____
Meta Física Ejecutada % 34.61%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (N)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.22			Prog				
					Ejec				
PAVIMENTO R(M)	M	126.7			Prog				
					Ejec				
BORDILLO	ML	126.7			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 12 de julio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
11 julio 2024 a las 5:30 pm, participación virtual de la capacitación de inclusión social, realizada por el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES .SE HIZO EL TERCER COMITÉ OPERATIVO


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

funcion segundo tramo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog	0.22	0.22
	Ejec	0.22	0.22
PAVIMENTO RIGIDO	Prog	126	126.00
	Ejec	126.00	126.00
BORDILLO	Prog	126	126.00
	Ejec		
	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







COMITÉ OPERATIVO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

estamos a la espera de los resultados de laboratorio de las vigas, para dar continuidad al segundo tramo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-68107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 2
	FECHA	18/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 23 del 11/07/2024 al 18/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANO GRANDE			INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	ONEY VALDES			INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3089 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,005,912.00	CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 9,570,571
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,005,912.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 43,129,048
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,005,912	$ 201,005,912		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,005,912	$ 201,005,912		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,005,912	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 71,301,450	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 71,301,450	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 71,301,450	35.47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 71,301,450	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43,129,048	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 83,878,340.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
PLACA HUELLA (M)	M	173			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	ARENAS DEL MAYO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI		NO	N/A
OTROS	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariosconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 12 de julio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
11 julio 2024 a las 4:00 pm reunión con la J.A.C. y la Veeduría Ciudadana con el fin de revisar actividades de Gestión Social, incluyendo la actividad de inauguración, para lo cual, fue necesario programar una segunda reunión con la participación de toda la comunidad para el 18 julio a las 5:00 pm y de esta manera, definir finalmente la actividad de inauguración.
11 julio 2024 a las 5:30 pm, participación virtual de la capacitación de inclusión social, realizada por el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FUNDICIÓN DEL CARRIL DERECHO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
PAV RIGISO	Prog	120	120.00
	Ejec	60.00	60.00



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



TRAMO INTERVENIDO,SINAVANCE DE ACTIVIDADES ESTA SEMANA



TRAMO INTERVENIDO,SINAVANCE DE ACTIVIDADES ESTA SEMANA



TRAMO INTERVENIDO,SINAVANCE DE ACTIVIDADES ESTA SEMANA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

se espera que el pavimento rígido fragüe los 28 días también estamos a la espera de los resultados de laboratorio de las vigas, para dar continuidad al segundo tramo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUEVEDA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 23 del 11/07/2024 al 17/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO: El OAZ debera desarrollar el objeto del Convenio en la via terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO		
INTEGRANTES:	YONIER DEMETRIO TUQUERRES ERASO		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3122 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,318,829.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,318,829.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 9,570,671
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 43,129,048
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,318,829	$ 199,318,829		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,318,829	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,318,829	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66,489,802	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 66,489,802	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109,337,481	54.86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 170,000,000	85.29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (60,662,519)	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43,129,048	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 83,678,340.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %: 85.29%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.2			Prog				
					Ejec				
PAVIMENTO RIGIDO	M	95.00			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: SAN PABLO NARIÑO — PERMISO MINERO: SI — LICENCIA AMBIENTAL: SI — DISPONIBLE: X SI / X NO
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 12 de julio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
11 julio 2024 a las 5:30 pm, participación virtual de la capacitación de inclusión social, realizada por el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.
17 julio 2024 a las 4:00 pm se realizó visita al municipio de Policarpa, con el fin de hacer seguimiento a las materiales entregados el 10 julio 2024 para la elaboración del muro de mampostería, así mismo, verificar el avance de la construcción del muro en mención

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

FUNDICION DE SEGUNDO TRAMO,SE REALIZO COMITÉ OPERATIVO


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FUNDICION DE BORDILLO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
E ALCANTARILLAS (UND)	Prog	1	1.00
	Ejec	1.00	1.00
ROCERIA (Ha)	Prog	0.2	0.20
	Ejec	0.20	0.20
PAVIMENTO RIGIDO M	Prog	95	95.00
	Ejec	95.00	95.00



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION DE SEGUNDO TRAMO



FUNDICION DE SEGUNDO TRAMO



FUNDICION DE SEGUNDO TRAMO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

se espera resultado de lass vigas, y construccion del bordillo,para ser entregada la obra a la comunidad

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-68107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 2
FECHA	18/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 23 del 11/07/2024 al 18/07/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:EI OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS		
INTEGRANTES:	ELIZABETH TORO CHALA		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3157 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,402,474.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,402,474.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 9,570,571
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 43,129,048
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,402,474	$ 201,402,474		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,402,474	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,402,474	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 86,052,073	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 86,052,073	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	30.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 86,052,073	42.73%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 86,052,073	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43,129,048	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 83,878,340.00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 42.73%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	2			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.14			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	144			Prog				
					Ejec				

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	ARENAS DEL MAYO	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	ARENAS DEL MAYO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariocomsoc1maso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna. Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 12 de julio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la comunidad, donde no se encontró ninguna solicitud.
11 julio 2024 a las 5:30 pm, participación virtual de la capacitación de inclusión social, realizada por el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.
12 julio 2024 desde las 10:00 am a 4:00 pm integración social a través de un compartir de refrigerio con los trabajadores de la obra, J.A.C. y veeduría ciudadana, con el fin, de fortalecer relaciones interpersonales y fomentar el trabajo en equipo. Asimismo, revisar el tema comunitario relacionado con el cierre de la vía, el cual, no se ha tenido complicaciones hasta el momento

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

FORMALETEO,ARMADO DE ACERO,FUNDICION DE PLACA HUELLA,4 comité operativo,


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundicion

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog	1	1.00
	Ejec	1.00	1.00
ROCERIA (Ha)	Prog	0.14	0.14
	Ejec	0.14	0.14
PLACA HUELLA (M)	Prog	144	144.00
	Ejec	52.00	52.00



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION



FUNDICION



FUNDICION

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTINACION DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA FUNDICION DE PLACA HUELLA,INSTALACION DE ACERO Y FIGURACION .

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matricula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSION	1
PAGINA	1 DE 2
FECHA	18/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 23 del 11/07/2024 al 18/07/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:EL OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA NUEVA FLORIDA DEL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA		
INTEGRANTES:	WILDER FERNEY RAMOS PALADINES		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3281 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,698,283.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,698,283.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 9,570,571
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 43,129,048
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,698,283	$ 200,698,283		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 95,642,784		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,698,283	$ 105,055,499		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	200,698,283	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	95,642,784	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	95,642,784	47.66%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	95,642,784	47.66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	95,642,784	47.66%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43,129,048	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 83,878,340.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %: 47.66%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (#)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND				Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.22			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	180			Prog				
					Ejec				
FILTRO	M	180							

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: ARENAS DEL MAYO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 12 de julio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
11 julio 2024 a las 5:30 pm, participación virtual de la capacitación de inclusión social, realizada por el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.
15 julio 2024, elaboración y envió de oficio N-NF-015-2024, solicitando nuevamente el diseño de la valla informativa y las actas de vecindad.
16 julio 2024, elaboración y envió de oficio N-NF-017-2024, realizando las observaciones de las 3 actas de vecindad recibidas el 16 julio 2024 por correo electrónico.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ESCLARIFICACION DE LA SUBBASE,TOMA DE DENSIDADES,ACOPIO DE MATERIAL

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


INICIO DE FUNDICION D EPLACA HUELLA,CON LOS RESULTADOS OPTIMOS DE DENSIDADES

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA ALCANTARILLA	1	1	1
FILTRO	Prog	180	180.00
	Ejec	180.00	180.00
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



tramo a intervenir



tramo a intervenir



tramo a intervenir

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se ara el debido seguimiento necesario a los materiales pétreos, cemento, cantidad de agua y el buen manejo de los recursos para este tramo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratistas, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	18/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 23 del: 11/07/2024 al 18/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la VÍA TERCIARIA UBICADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ			INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	ROBINSON VALDES MARTINEZ			INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3193 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 202,406,606.00	CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 9,570,571.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 202,406,606.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 43,129,048
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 202,406,606	$ 202,406,606		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 69,243,883		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202,406,606	$ 133,162,723		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 202,406,606		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 69,243,883.00		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 69,243,883	34.21%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (69,243,883)		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 69,243,883	34.21%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (69,243,883)		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43,129,048	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 83,878,340.00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 34.21%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
* LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
* ROCERIA (Ha)	Ha	0.34			Prog				
					Ejec				
* PAVIMENTO RIGIDO	M	154			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MAQUINRIA AMARILLA	SI	2.00
HERRAMIENTA MENOR	SI	GLB
VIBRADOR		-
EQUIPO DE ACABADOS DE PAVIMENTO	SI	GLB
VOLQUETAS	SI	4
		-
		-
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: ARENAS DEL N MAYO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 12 de julio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
11 julio 2024 a las 5:30 pm, participación virtual de la capacitad de inclusión social, realizada por parte de la interventoría Consorcio Maso 10.
17 julio 2024 a las 5:00 pm reunión con la J.A.C. y Veeduría Ciudadana, con el fin de avanzar en actividades de Gestión Social y definir actividad de inauguración, la cual, se decidió realizar campeonato deportivo con entrega de elementos como balón de futbol y petos para equipos deportivos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZO COMITÉ OPERATIVO,NO HAY ACTIVIDADES DE OBRA,SE ESTA A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO,SE ADJUNTAS FOTOGRAFIAS DEL TRAMO DE OBRA SIN AVANCE ALGUNO EN ESTA SEMANA


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FUNDICION

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog	1	1.00
	Ejec	1.00	1.00
ROCERIA (Ha)	Prog	0.34	0.34
	Ejec	0.34	0.34
PAVIMENTO RIGIDO	Prog	154	154.00
	Ejec	77.00	77.00



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

se espera que el pavimento rígido fragüe los 28 días también estamos a la espera de los resultados de laboratorio de las vigas, para dar continuidad al segundo tramo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 2
FECHA	18/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 23 del 11/07/2024 al 18/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO		INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10	
INTEGRANTES:	LILIANA VALENCIA MUÑOZ		INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S	
CONTRATO No:	4ENO SOLIDARIO No. 3119 DE	VALOR INICIAL: $ 200.741.050,00	CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL: $ 33.558.477,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ 9.570.571
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 200.741.050,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 43.129.048
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,741,050	$ 200,741,050		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 105,332,461	$ 105,332,461		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 95,408,589	$ 95,408,589		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 95,408,589	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 105,332,461	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 105,332,461	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 105,332,461	110.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 105,332,461	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 43,129,048	100%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 43,129,048	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 83.878.340,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I-C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
CONSTRUCCION DE ALCANT.	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.2536			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	140			Prog				
					Ejec				
FILTRO	ML	130							

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: ARENAS DEL MAYO — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariosconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 12 de julio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
11 julio 2024 a las 5:30 pm, participación virtual de la capacitación de inclusión social, realizada por el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.
16 julio 2024 a las 5:00 pm reunión con la J.A.C. y Veeduría Ciudadana con el fin de revisar actividades de Gestión Social incluyendo la actividad de inauguración, en la cual, se definió realizar Eucaristía de agradecimiento y placa conmemorativa

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


SE TOMARON DENSIDADES, SE ESPERAR REPARAR UN TRAMO DE SUBBASE POR LAS LLUVIAS,LA MINA NO ESTA SUMINISTRANDO MATERIAL PETREO POR FALLAS EN SU TRITURADORA Y RETRAZA LOS TRABAJOS .POR PARTE DE INTERVENTORIA SE RECTIFICA LA TOPOGRAFIA,SE INICIA CN FORMALETEO DE PLACA HUELLA

Iniciar con la fundicion de la placa huella,si los resultyados de densidades son los adecuados.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
CONSTRUCCION ALCANTARILLAS (UND)	Prog	1	1.00
	Ejec	1.00	1.00
FILTRO	Prog	130	130.00
	Ejec	130.00	130.00
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



fomaleteo



fomaleteo



REUNION POR LA COMUNIDAD

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se ara el debido seguimiento necesario a los materiales pétreos, cemento, cantidad de agua y el buen manejo de los recursos para este tramo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 95202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	26/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 24 del 17/07/2024 al 24/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO	INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES:	YONIER DIMETRIO TUQUERRES ERASO	INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3122 DE 2023	CONTRATO No.	5065 de 2023
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024
VALOR INICIAL:	$ 199,318,829.00	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ 9,570,571
VALOR ACUMULADO:	$ 199,318,829.00	VALOR ACUMULADO:	$ 43,129,048
		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,318,829	$ 199,318,829		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,318,829	$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,318,829	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66,489,802	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 66,489,802	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109,337,481	54.86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 170,000,000	85.29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (60,662,519)	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43,129,048	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 83,878,340.00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %: 85.29%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1		
ROCERIA (Ha)	Ha	0.2		
PAVIMENTO RIGIDO	M	95.00		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico			Total	%
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE NARIÑO,
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	SAN PABLO NARIÑO	PERMISO MINERO:	SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, durante la semana no se presentaron.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 19 de julio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Diligenciamiento de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2- Balance del estado social del proyecto.
19 julio 2024, acompañamiento de visita programada por INVIAS – Territorial Nariño, para verificar el avance de la obra en ejecución.
Diligenciamiento de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 – Plan de inversión social – versión 2. Actualizado hasta la fecha.
23 julio 2024, elaboración y envió de oficio N-038-2024 a la Subdirección de Sostenibilidad, con el fin de solicitar la no objeción a la actividad de inauguración elegida por la comunidad. Adjunto al correo, se envió el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 plan de inversión social – versión 2 para describir a detalle la actividad mencionada.
24 julio 2024, elaboración y envió de oficio de socialización de empresa social (Anexo 4) con el fin, de entregarlos a la comunidad en la socialización de cierre y de esta manera retroalimentar la ejecución del Convenio Solidario.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

FUNDICION DE SEGUNDO TRAMO,SE REALIZO COMITÉ OPERATIVO


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FUNDICION DE BORDILLO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	ACUMULADO PROYECTO TOTAL
E ALCANTARILLAS (UND)	Prog	1	1.00
	Ejec	1.00	1.00
ROCERIA (Ha)	Prog	0.2	0.20
	Ejec	0.20	0.20
PAVIMENTO RIGIDO M	Prog	95	95.00
	Ejec	95.00	95.00

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE NARIÑO,
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vista del invias



TRAMO INTERVENIDO



TRAMO INTERVENIDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

se espera resultado de las vigas, y construccion del bordillo,para ser entregada la obra a la comunidad

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 2
	FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 24 del 18/07/2024 al 25/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANO GRANDE		
INTEGRANTES:	ONEY VALDES		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3089 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,005,912.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,005,912.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 9,570,571
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 43,129,048
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,005,912	$ 201,005,912		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,005,912	$		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,005,912	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 71,301,450	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 71,301,450	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 71,301,450	35.47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 71,301,450	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43,129,048	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 83,878,340.00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
PLACA HUELLA (M)	M	173			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: ARENAS DEL MAYO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariocconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 19 de julio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
18 julio 2024 a las 5:00 pm reunión comunitaria, con el fin de definir actividad de inauguración.
Diligenciamiento de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2- Balance del estado social del proyecto.
19 julio 2024, acompañamiento de visita programada por INVIAS – Territorial Nariño, para verificar el avance de la obra en ejecución.
Diligenciamiento de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 – Plan de Inversión social – versión 2. Actualizado hasta la fecha.
23 julio 2024, elaboración y envió de oficio N-038-2024 a la Subdirección de Sostenibilidad, con el fin de solicitar la no objeción a la actividad de inauguración elegida por la comunidad. Adjunto al correo, se envió el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 plan de inversión social –versión 2 para describir a detalle la actividad mencionada.
Organización del formato: Encuesta satisfacción e impacto social (anexo 4) con el fin, de entregarlos a la comunidad en la socialización de cierre y de esta manera retroalimentar la ejecución del Convenio Solidario.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES,SE RESIBE VISTA POR PARTE DEL INVIAS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


FUNDICON DEL CARRIL DERECHO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
PAV RIGIDO	Prog	120	120.00
	Ejec	60.00	60.00

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vista del invias





NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE RECOMINEDA AL RESIDENTE INICIAR CON LA ACTIVIDAD DE FUNDICION DEL CARRIL FALTANTE,SE SOLICITA QUE EL DIA LUNES 29 DE JULIO INICIE CON ESTA ACTIVIDAD

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15 FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 2
	FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 24 del 17/07/2024 al 25/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUVEMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE			INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	RAUL URBANO LUNA			INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S. y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3121 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,048,634.00	CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	14/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 9,570,571
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,048,634.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 43,129,048
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,048,634	$ 200,048,634		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,048,634	$		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200,048,634	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 69,243,883	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 69,243,883	34.61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 69,243,883	34.61%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43,129,048	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 83,878,340.00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 34.61%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (Año)	Vigencia (N)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.22			Prog				
					Ejec				
PAVIMENTO R(M)	M	126.7			Prog				
					Ejec				
BORDILLO	ML	126.7			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 19 de julio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Diligenciamiento de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2- Balance del estado social del proyecto. 19 julio 2024, acompañamiento de visita programada por INVIAS – Territorial Nariño, para verificar el avance de la obra en ejecución.
Diligenciamiento de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 – Plan de inversión social – versión 2. Actualizado hasta la fecha.
23 julio 2024, elaboración y envió de oficio N- 038-2024 a la Subdirección de Sostenibilidad, con el fin de solicitar la no objeción a la actividad de inauguración elegida por la comunidad. Adjunto al correo, se envió el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5-plan de inversión social – versión 2 para describir a detalle la actividad mencionada.
Organización del formato: Encuesta satisfacción e impacto social (anexo 4) con el fin, de entregarlos a la comunidad en la socialización de cierre y de esta manera retroalimentar la ejecución del Convenio Solidario.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRI:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


NO SE REALIZARON ACTIVIDADES ,SE HIZO EL TERCER COMITÉ OPERATIVO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundicon segundo tramo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

		ACUMULADO PROYECTO	
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog	0.22	0.22
	Ejec	0.22	0.22
PAVIMENTO RIGDO	Prog	126	126.00
	Ejec	126.00	126.00
BORDILLO	Prog	126	126.00
	Ejec		
	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



visita del ivias



fundicon segundo tramo



fundicon segundo tramo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

estamos a la espera de los resultados de laboratorio de las vigas, para dar continuidad al segundo tramo

DIRECTOR DE INTERVENTORA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-68107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 2
	FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 25 del 18/07/2024 al 25/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:EN CAC debera desarrollar el objeto del Convenio en la VÍA TERCIARIA UBICADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ		INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10	
INTEGRANTES:	ROBINSON VALDES MARTINEZ		INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S	
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3153 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 202,406,606.00	CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL: $ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ 9,570,571.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 202,406,606.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 43,129,048
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 202,406,606	$ 202,406,606		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 69,243,883		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202,406,606	$ 133,162,723		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	$ 202,406,606	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	$ 69,243,883.00	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	$ 69,243,883	34.21%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	$ (69,243,883)	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	$ 69,243,883	34.21%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	$ (69,243,883)	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43,129,048	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 83,878,340.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 34.21%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.34			Prog				
					Ejec				
PAVIMENTO RIGIDO	M	154			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Requerido
MAQUINRIA AMARILLA	SI	2.00
HERRAMIENTA MENOR	SI	GLB
VIBRADOR		-
EQUIPO DE ACABADOS DE PAVIMENTO	SI	GLB
VOLQUETAS	SI	4
		-
		-
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: ARENAS DEL N MAYO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariosconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 19 de julio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Diligenciamiento de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2- Balance del estado social del proyecto.
19 julio 2024, acompañamiento de visita programada por INVIAS – Territorial Nariño, para verificar el avance de la obra en ejecución.
Diligenciamiento de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 – Plan de Inversión social – versión 2. Actualizado hasta la fecha.
23 julio 2024, elaboración y envió de oficio N -038-2024 a la Subdirección de Sostenibilidad, con el fin de informar el objetivo a la actividad de inauguración elegida por la comunidad. Adjunto al correo, se envió el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 plan de inversión social – versión 2 para describir a detalle la actividad mencionada.
Organización del formato: Encuesta satisfacción e impacto social (anexo 4) con el fin, de entregarlos a la comunidad en la socialización de cierre y de esta manera retroalimentar la ejecución del Convenio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


SE HACE ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA DEL INVIAS,NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FUNDICION DEL SEGUNDO TRAMO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

		ACUMULADO PROYECTO	
TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog	1	1.00
	Ejec	1.00	1.00
ROCERIA (Ha)	Prog	0.34	0.34
	Ejec	0.34	0.34
PAVIMENTO RIGIDO	Prog	154	154.00
	Ejec	77.00	77.00



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA QUIROZ DEL MUNICPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

se espera que el pavimento rígido fragüe los 28 días también estamos a la espera de los resultados de laboratorio de las vigas, para dar continuidad al segundo tramo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 2
FECHA	26/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 24 del 18/07/2024 al 25/07/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS		
INTEGRANTES:	ELIZABETH TORO CHALA		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 3157 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,402,474.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,402,474.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 9,570,571
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 43,129,048
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,402,474	$ 201,402,474		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,402,474	$ 201,402,474		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	201,402,474
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	86,052,073
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	86,052,073
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	30.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	86,052,073 42.73%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	86,052,073
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 43,129,048	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 83.878.340,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 42.73%
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND	2			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.14			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	144			Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n): — TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: ARENAS DEL MAYO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
ARENAS DEL MAYO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LAVADEROS ARENAS	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso30@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna. Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 19 de julio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Diligenciamiento de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2- Balance del estado social del proyecto.
19 julio 2024, acompañamiento de visita programada por INVIAS – Territorial Nariño, para verificar el avance de la obra en ejecución.
Diligenciamiento de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 – Plan de inversión social – versión 2. Actualizado hasta la fecha.
23 julio 2024, elaboración y envió de oficio N-088-2024 a la Subdirección de Sostenibilidad, con el fin de solicitar la no objeción a la actividad de inauguración elegida por la comunidad. Adjunto al correo, se envió el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 plan de inversión social – versión 2 para describir a detalle la actividad mencionada.
Organización del formato: Encuesta satisfacción e impacto social (anexo 4) con el fin, de entregarlos a la comunidad en la socialización de cierre y de esta manera retroalimentar la ejecución del Convenio Solidario.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE HACE ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA DEL INVIAS, SE CONTINUA CON LA FUNDICON D ELA PLACA HUELLA


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundicion

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	Prog	1	1.00
	Ejec	1.00	1.00
ROCERIA (Ha)	Prog	0.14	0.14
	Ejec	0.14	0.14
PLACA HUELLA (M)	Prog	144	144.00
	Ejec	74.00	74.00



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNT-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



visita del invias



fundicion de placa huella



fundicion de placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTINACION DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA FUNDICION DE PLACA HUELLA,INSTALACION DE ACERO Y FIGURACION .

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAURICIO ROMERO OSPINOSA
Matrícula Profesional No.: 25252-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 2
FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 24 del 18/07/2024 al 25/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA NUEVA FLORIDA DEL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA		
INTEGRANTES:	WILDER FERNEY RAMOS PALADINES		
CONTRATO No:	CONVENIO SOLIDARIO No. 3281 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,698,283.00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,698,283.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MASO 10		
INTEGRANTES:	MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S		
CONTRATO No.	5065 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 9,570,571
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 43,129,048
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,698,283	$ 200,698,283		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 95,642,784		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,698,283	$ 105,055,499		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	200,698,283	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	95,642,784	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	95,642,784	47.66%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	95,642,784	47.66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	95,642,784	47.66%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	43,129,048	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 83.878.340,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 47.66%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (año)	Vigencia (n)	Avance Físico			Total	%
* LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	UND				Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.22			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	180			Prog				
					Ejec				
FILTRO	M	180							

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARENAS DEL MAYO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 19 de julio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la vereduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Diligenciamiento de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2- Balance del estado social del proyecto.
19 julio 2024, acompañamiento de visita programada por INVIAS – Territorial Nariño, para verificar el avance de la obra en ejecución.
Diligenciamiento de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 – Plan de inversión social – versión 2. Actualizado hasta la fecha.
23 julio 2024, elaboración y envió de oficio N-038-2024 a la Subdirección de Sostenibilidad, con el fin de solicitar la no objeción a la actividad de inauguración elegida por la comunidad. Adjunto al correo, se envió el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 plan de inversión social – versión 2 para describir a detalle la actividad mencionada.
Organización del formato: Encuesta satisfacción e impacto social (anexo 4) con el fin, de entregarlos a la comunidad en la socialización de cierre y de esta manera retroalimentar la ejecución del Convenio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DE MATERIAL,ACOMPANAMIENTO A LA VISITA DEL INVIAS,ENTREGA DE DENSIDADES POR PARTE DE LA JAC


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

INICIO DE FUNDICION D EPLACA HUELLA,CON LOS RESULTADOS OPTIMOS DE DENSIDADES

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
LIMPIEZA ALCANTARILLA	1	1	1
FILTRO	Prog	180	180.00
	Ejec	180.00	180.00
PLACA HUELLA (M)	Prog		
	Ejec		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



visita de nueva florida

visita de nueva florida

visita de nueva florida

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE SOLICITA DAR INICIO A LA OBRA DE IMEDIATO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del PAVAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

CONSORCIO MASO 10	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en elmarco del programa caminos comunitarios de la paz total-lote2**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 24 del 18/07/2024 al 25/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO
INTEGRANTES: LILIANA VALENCIA MUÑOZ
CONTRATO No.: JENO SOLIDARIO No. 3119 DE — VALOR INICIAL: $ 200,741,050.00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200,741,050.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10
INTEGRANTES: MAS INVERSIONES S.A.S y OSAC S.A.S
CONTRATO No.: 5065 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 33,558,477.00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 9,570,571
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 43,129,048
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/08/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,741,050	$ 200,741,050		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 105,332,461	$ 105,332,461		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 95,408,589	$ 95,408,589		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 33,558,477	$ 33,558,477		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33,558,477	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 95,408,589	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 105,332,461	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 105,332,461	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 105,332,461	110.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 105,332,461	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43,129,048	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 43,129,048	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 83,878,340.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En la semana:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (a)	Avance Físico			Total	%
CONSTRUCCION DE ALCANT.	UND	1			Prog				
					Ejec				
ROCERIA (Ha)	Ha	0.2536			Prog				
					Ejec				
PLACA HUELLA (M)	M	140			Prog				
					Ejec				
FILTRO	ML	130							

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: ARENAS DEL MAYO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Están entregados a la SS los formatos de radicación y el PAGA que fueron incluidos en el Volumen X de los Estudios y Diseños que se ejecutaron y fueron aprobados.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuariosconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.
Asimismo, se realizó apertura del buzón de PQRS el 19 de julio 2024 de 2:00 a 4:00 pm, en presencia de la veeduría ciudadana, en el cual, tampoco se encontró ninguna solicitud.
Diligenciamiento de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2- Balance del estado social del proyecto.
19 julio 2024, acompañamiento de visita programada por INVIAS – Territorial Nariño, para verificar el avance de la obra en ejecución.
Diligenciamiento de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 – Plan de inversión social – versión 2. Actualizado hasta la fecha.
23 julio 2024, elaboración y envió de oficio N-038-2024 a la Subdirección de Sostenibilidad, con el fin de solicitar la no objeción a la actividad de inauguración elegida por la comunidad. Adjunto al correo, se envió el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 plan de inversión social – versión 2 para describir adetalle la actividad mencionada.
Organización del formato: Encuesta satisfacción e impacto social (anexo 4) con el fin, de entregarlos a la comunidad en la socialización de cierre y de esta manera retroalimentar la ejecución del Convenio Solidario.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


SE INICIO CON LA FUNDICION DE LA PLACA HUILA CON 8.1 MDE CONCRETO CICLOPEO HASTA LA FECHA , SE HACE ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA DEL INVAS

CONTINUAR CON LA FUNDICION D ELA PLACA HUELLA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	AVANCE FISICO	UN	TOTAL
CONSTRUCCION ALCANTARILLAS (UND)	Prog	1	1.00
	Ejec	1.00	1.00
FILTRO	Prog	130	130.00
	Ejec	130.00	130.00
PLACA HUELLA (M)	Prog	140	140.00
	Ejec	10.00	10.00



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



visita del invias



instalacion de acero



instalacion de acero

instalacion de acero

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE HACE LA OBSERVACION DE AUMENTAR EL RENDIMIENTO SEMANAL,PARA CUMPLIR CON EL PLAZO DE LA PRORROGA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

4.2 Maquinaria y equipo convenio de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3119 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 — **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO MASO 10

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
herramienta menor			el peligro																															A
motoniveladora	caterpilar		el peligro																															
vibro-compactador			el peligro																															
mezcladora			el peligro																				A		A					A			A	A
vibrador de aguja de concreto			el peligro																				A		A	A				A			A	A
volqueta			el peligro															A	A	A	A													
retrocargador			el peligro																															
Herramienta de pilir el co			el peligro															A	A	A	A	A	A		A	A				A			A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1		1	1	1	1		1		1	1	1	1		3	2	3	3	2	3		4	2	1	1	1	4		1	4	4
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	48	80.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: I.ALVEIRO AROCA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ALVARO AGUIRRE MAYA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220274760NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	53

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3089 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 — **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO MASO 10

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
herramienta menor			LLANO GRANDE																														A	A
mezcladora			LLANO GRANDE																														A	A
vibrador de aguja de concreto			LLANO GRANDE																														A	A
volqueta			LLANO GRANDE																															
retrocargador			LLANO GRANDE																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																3	3
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	6	10.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones [illegible] a y equipos.

Firma: Juan G. Martinez
Nombre: JUAN MARTINEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: ALVARO AGUIRRE MAYA
Residente de Interventoría 5202027478DNPÑ
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSION	
PAGINA	53

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 3122 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 — **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO MASO 10

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Herramienta menor			QUIROZ ALTO	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A										
Vibrocompactadora			QUIROZ ALTO											A	A	A		A	A	A												
Vibrador de aguja de concreto			QUIROZ ALTO											A	A	A		A	A	A												
Volqueta			QUIROZ ALTO																														
Retrocargador			QUIROZ ALTO																														
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	1	1	1	1	1	1		1	1	1	3	3	3		3	3	3	1	1	1										1
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	31	51.67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JEFFERSON CARDENAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ALVARO AGUIRRE MAYA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 522027478 DNÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	53

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3381 DE 2023 — **CONTRATISTA:**

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5365 DE 2023 — **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO MASO 10

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
herramienta menor			NUEVA FLORIDA																						A		A	A	A	A		A		
motoniveladora	caterpilar / 1988		NUEVA FLORIDA																															
vibro-compactador			NUEVA FLORIDA																															
mezcladora			NUEVA FLORIDA																															
vibrador de aguja de concreto			NUEVA FLORIDA																															
volqueta			NUEVA FLORIDA																															
retrocargador			NUEVA FLORIDA																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																								1	1	1	1	1	1		1	1	1
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	9	15,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoria realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma	Firma
Nombre: OBER ABREDO	Nombre: ALVARO AGUIRRE MAYA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 522027476NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	53

FECHA: 31/07/2024 (Da / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLMOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 2157 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLMOS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5565 DE 2022 — **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO MASO 10

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
herramienta menor			OLMOS	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A		A		A	A	A	A		A		A	A	A	A		A	A	A
mezcladora			OLMOS				A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			
volqueta			OLMOS																A	A	A													
Vibrador de aguja			OLMOS				A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			
Herramienta de pilir el concreto			OLMOS				A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A				A			
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	1			1	4	4	4		4	4	4	4	4	4		5	5	5	4	4	4		3	3	3	3	3	4		1	1	1
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	77	128,33%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactiva" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requerido, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma: Carmen Emilia S
Nombre: CARMEN EMILIA SOLARTE
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: ALVARO AGUIRRE MAYA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220027476NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	53

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO — PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No.: 0133 DE 2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 — INTERVENTORÍA: CONSORCIO MASO 10

MAQUINARIA Y EQUIPO				DIAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
herramienta menor			QUIROZ BAJO	A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A																		
mezcladora			QUIROZ BAJO		A	A	A	A	A		A	A	A																					
vibrador de aguja de concreto			QUIROZ BAJO		A	A	A	A	A		A	A	A																					
volqueta			QUIROZ BAJO																															
retrocargador			QUIROZ BAJO																															
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	1	3	3	3	3	3		3	3	3		1	1																		
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	27	45.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoria realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoria" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoria" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ORALANDO RANGUEL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ALVARO AGUIRRE MAYA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202074769NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	53

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3121 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 — **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO MASO 10

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
herramienta menor			SAUCE															A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		
mezcladora																					A	A	A		A	A	A	A	A	A				
vibrador de aguja de concreto			SAUCE																		A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		
volqueta			SAUCE																											A		A		
retrocargador			SAUCE																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																				1	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	31	51.67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma	Firma
Nombre: L IZETH URBANO	Nombre: ALVARO AGUIRRE
Residente de Obra	Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 522027479 DNÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra: El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3089-2023 **CONTRATISTA:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5064-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

NOMBRE ARL: POSITIVA - SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LISSETTE VIVIANA DIAZ URBANO		ING RESIDENTE	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				V	NUEVA EPS	9471102691	$ 162.500	COLPENSIONES	9471102691	$ 208.000				La OAC aún no ha realizado el pago de la ARL de la Ing residente.
2	LUIS HUMBERTO CARVAJAL	12996523	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 90.500	V	ASMET SALUD	9470365084	$ 52.000	PORVENIR	9470365084	$ 208.000	$ 52.000			
3	LUIS OJEDA	15817113	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 90.500	V	ASMET SALUD	9470365084	$ 52.000	PORVENIR	9470365084	$ 208.000	$ 52.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3181-2023 **CONTRATISTA:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC NUEVA FLORIIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARI

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5064-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	OBER HERNANDO AGREDO BOLAÑOS	10549293	INGENIERO RESIDENTE	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 7.400	I	SANITAS	9471041767	$ 175.000	PORVENIR	9471041767	$ 224.000				La OAC no pago el riesgo V del Ing residente ante ARL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El maestro Victor Davila de la OAC El Peligro fue el unico que presento seguridad social correspondinete al mes de mayo, los otros maestros de los convenios no presentaron seguridad social correspondiente al mes de mayo de 2024 ya que han tenido inconvenientes con la afiliación ante las entidades correspondinetes.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3157-2023 **CONTRATISTA:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5064-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

NOMBRE ARL: POSITIVA - SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARMEN EMILIA SOLARTE	59788832	INGENIERA RESIDENTE	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				V	NUEVA EPS	7933575084	$ 162.500	PORVENIR	7933575084	$ 208.000				La OAC no ha pagado el nivel de riesgo V del Ingeniero Residente.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El maestro Victor Davila de la OAC El Peligro fue el unico que presento seguridad social correspondinete al mes de mayo, los otros maestros de los convenios no presentaron seguridad social correspondiente al mes de mayo de 2024 ya que han tenido inconvenientes con la afiliación ante las entidades correspondinetes.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3119-2023 **CONTRATISTA:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS CO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5064-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

NOMBRE ARL: POSITIVA - SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDGAR ALVEIRO AROCA	15816461	ING RESIDENTE	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 6.800	I	SANITAS	30457364	$ 162.500	COLPENCIONES	30457364	$ 208.000				La OAC no ha pagado el nivel de riesgo V del Ingeniero residente.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3122-2023 **CONTRATISTA:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5064-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

NOMBRE ARL: POSITIVA - SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JEFERSON ESTIBEN CARDENAS ERAZO	1094950740	ING RESIDENTE QUIROZ ALTO	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 6.800	I	NUEVA EPS	9470397214	$ 162.500	PORVENIR	9470397214	$ 208.000				La OAC no realizó el pago del riesgo V del Ing residente ante ARL Positiva

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3153-2023 **CONTRATISTA:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC DE LA VEREDA EL PELIGRO,JAC VEREDA LLANO GRNADE,JAC QUIROZ ALTO,JAC NUEVA FLORIIDA,JAC OLIVOS,JAC QUIROZ,JAC EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN Y SAN PABLO EN EL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5064-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ORLANDO ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ	1081592267	ING RESIDENTE	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				V	ASMET SALUD	30662957	$ 162.500	PORVENIR	30662957	$ 208.000				La OAC no ha pagado ante ARL el nivel de riesgo V del Ingeniero
2	YORDAN ESTVEN ERASO ORTEGA	1089478755	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 6.800	I	NUEVA EPS	9469145850	$ 52.000	PORVENIR	9469145850	$ 208.000	$ 52.000			La OAC liquidó mal el nivel de riesgo de la seguridad social y pagaron riesgo I y no riesgo V ante ARL Positiva.
3	ESNEIDER SANTIAGO MARTINEZ	1004255408	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 6.800	I	ASMET SALUD	9469145850	$ 52.000	PORVENIR	9469145850	$ 208.000	$ 52.000			
4	JUAN CARLOS MORENO	15817516	MAESTRO DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 297.400	V	NUEVA EPS	7937319041	$ 683.600	PORVENIR	7937319041	$ 534.000				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3121-2023 **CONTRATISTA:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5064-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LIZETH DIAZ URBANO	1032497441	INGENIERA RESIDENTE	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 81.300	V	NUEVA EPS	827846267	$ 162.000	COLPENSIONES	9471102691	$ 208.000				
2	NELSON URRESTY	15812457	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								$ 75.500	V	NUEVA EPS	9470446785	$ 135.500	PORVENIR	9470446785	$ 173.400				
3	JESÚS EVER VALDES	15813917	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								$ 75.500	V	EMSSANAR	9470446785	$ 135.500	PORVENIR	9470446785	$ 173.400				
4	JUAN CARLOS MORENO	15817516	MAESTRO DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 297.400	V	NUEVA EPS	7937319041	$ 683.600	PORVENIR	7937319041	$ 534.000				
5	FABIAN GOMEZ	1089478458	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				$ 36.200	V	EMSSANAR	9471160577	$ 65.000	PORVENIR	9471160577	$ 135.200	$ 20.800	$ 10.400	$ 15.600		
6	JEREMY SNEIDER ORTEGA MORENO	1004675311	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				$ 36.200	V	MALLAMAS	9471160577	$ 65.000	PORVENIR	9471160577	$ 135.200	$ 20.800	$ 10.400	$ 15.600		
7	MAURICIO PINTA ROMERO	1084222199	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				$ 36.200	V	NUEVA EPS	9471160577	$ 65.000	PROTECIÓN	9471160577	$ 135.200	$ 20.800	$ 10.400	$ 15.600		
8	SANTIAGO ESPAÑA MORENO	1004675595	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				$ 36.200	V	ASMET SALUD	9471160577	$ 65.000	PORVENIR	9471160577	$ 135.200	$ 20.800	$ 10.400	$ 15.600		
9	JOSE ALVARO SOLARTE	15812366	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				$ 36.200	V	ASMET SALUD	9471160577	$ 65.000	PORVENIR	9471160577	$ 135.200	$ 20.800	$ 10.400	$ 15.600		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra: el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	67

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3119 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAEL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL

MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: N/A
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	67

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3089 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDALLANOGRANDE

MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CLAUDIALLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizad	Valor Total	Saldo Anticipo	No. de Registro y	Saldo Registro	Saldo del Contrato	No. y Fecha de	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	67

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3281 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA

MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DESAN PABLO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizad	Valor Total	Saldo Anticipo	No. de Registro y	Saldo Registro	Saldo del Contrato	No. y Fecha de	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	67

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3157 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CLAUDIA

MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizad	Valor Total	Saldo Anticipo	No. de Registro y	Saldo Registro	Saldo del Contrato	No. y Fecha de	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: N/A
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	67

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3153 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ

MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAQUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizad	Valor Total	Saldo Anticipo	No. de Registro y	Saldo Registro	Saldo del Contrato	No. y Fecha de	Indicar pago según		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	67

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3614 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE

MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCEDEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3121 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizad	Valor Total	Saldo Anticipo	No. de Registro y	Saldo Registro	Saldo del Contrato	No. y Fecha de	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma	Firma
Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Director de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 Estado General del Tiempo. MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	65

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3089 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JUAN MARTINEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ALVARO AGUIRRE MAYA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220274760NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	65

FECHA: 31/07/2024
(Da / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3119-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ALVERO AROCA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ALVARO AGUIRRE MAYA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 522027470NRN

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	65

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3121 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** ALIANZA ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma	
Nombre:	LIZETH DIAZ URBANO
Residente de Obra	
Matrícula Profesional No.:	

Firma	
Nombre:	ALVARO AGUIRRE MAYA
Residente de Interventoría	
Matrícula Profesional No.:	5220217439NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CODIGO VERSIÓN PAGINA 65

FECHA 31/07/2024
(Dia/ Mes/ Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3157 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARMEN EMILIA SOLARTE
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ALVARO AGUIRRE MAYA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 3220274760NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CODIGO	
	VERSIÓN	
	PAGINA	65

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3153 DE 2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO — PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5185 DE 2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JEFFERSON CARDENAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ALVARO AGUIRRE MAYA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202074781NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	65

FECHA: 31/07/2024
(Da / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3122 DE 2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO
PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023
INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: ORLANDO RANGEL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: ALVARO AGUIRRE MAYA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 522027-TRUJEÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	65

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No: 3281 DE 2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO — PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5305 DE 2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: OBER AGREDO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ALVARO AGUIRRE MAYA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 522027-NARIÑO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio: MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No.: 3119-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PELIGRO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	scripción/Ens	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	o. De Muestra	Rango Cumplimiento del Ensayo		Resultado del Ensayo		Cumple SI o NO	Observación / Acciones	
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA												
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
1			INV-414-13	TRAMO DEL PELIGRO	1							
2			INV-414-14	TRAMO DEL PELIGRO	1							
3			INV-414-15	TRAMO DEL PELIGRO	1							

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No.: 3089-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LLANO GRANDE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSU jun-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 5065-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	scripción/Ens	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	o. De Muestra	Rango Cumplimiento del Ensayo		Resultado del Ensayo		Cumple SI o NO	Observación / Acciones	
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA												
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
1	25/06/2024		INV-414-13	AMO DEL LLANO GRAN	1					SI		
2	26/06/2024		INV-414-14	AMO DEL LLANO GRAN	1					SI		
3	26/06/2024		INV-414-15	AMO DEL LLANO GRAN	1					SI		

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma



Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No.: 3157-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA OLIVOS

MES Y AÑO DEL INFORME M jun-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTO 5065-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	scripción/Ens	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	o. De Muestra	Rango Cumplimiento del Ensayo		Resultado del Ensayo		Cumple SI o NO	Observación / Acciones	
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA												
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
1	16/07/2024		INV-414-13	TRAMO DEL OLIVOS	1					SI		
2	16/07/2024		INV-414-14	TRAMO DEL OLIVOS	1					SI		
3	16/07/2024		INV-414-15	TRAMO DEL OLIVOS	1					SI		

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de



Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No.: 3122-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA QUIROZ A

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUA jun-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 5065-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	cripción/Ens	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	o. De Muestra	Rango Cumplimiento del Ensayo		Resultado del Ensayo		Cumple SI o NO	Observación / Acciones	
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA												
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
1	18/06/2024		INV-414-13	TRAMO DE QUIROZ A	1					SI		
2	18/06/2024		INV-414-13	TRAMO DE QUIROZ A	1					SI		
3	18/06/2024		INV-414-13	TRAMO DE QUIROZ A	1					SI		
4	16/07/2024		INV-414-13	TRAMO DE QUIROZ A	1					SI		
5	16/07/2024		INV-414-13	TRAMO DE QUIROZ A	1					SI		
6	16/07/2024		INV-414-13	TRAMO DE QUIROZ A	1					SI		

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No.: 3153-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA QUIROZ B

MES Y AÑO DEL INFORME M jun-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTC 5065-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

97

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	scripción/Ens	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	o. De Muestra	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
01/01/1900	06/07/2024		INV-414-13	TRAMO QB				SI	
2	06/07/2024		INV-414-13	TRAMO QB				SI	
3	06/07/2024		INV-414-13	TRAMO QB				SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada,

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No.: 3121-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAUCE

MES Y AÑO DEL INFORME MENS jun-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5065-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	scripción/Ens	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	o. De Muestra	Rango Cumplimiento del Ensayo		Resultado del Ensayo		Cumple SI o NO	Observación / Acciones	
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA												
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
1	14/06/2024		INV-414-13	TRAMO DEL SAUCE	1					SI		
2	14/06/2024		INV-414-13	TRAMO DEL SAUCE	1					SI		
3	14/06/2024		INV-414-13	TRAMO DEL SAUCE	1					SI		
4	15/06/2024		INV-414-13	TRAMO DEL SAUCE	1					SI		
5	15/06/2024		INV-414-13	TRAMO DEL SAUCE	1					SI		
6	15/06/2024		INV-414-13	TRAMO DEL SAUCE	1					SI		

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada,

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No.: 3281-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA NUEVA FLORIDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065-2023 **INTERVENTOR:** MASO 10

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra: Se adjunta diligenciado para los convenios el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 7 (Mes) / 24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3119-2023 **CONTRATISTA:** JAC EL PELIGRO

OBJETO DEL CONTRATO:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200,741,050
VALOR ACUMULADO: $ 200,741,050.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40,148,210.00	27	7	24	15/06/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,037,052.00	27	7	24	15	8	27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,222,315.00	15	8	24	15	8	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100280842
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% SOBRE EL VALOR DD ELA PERDIDA	MIN 2SMMLV	1	9	23	15	8	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100068309 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
ESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 7 (Mes) / 24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3089-2023 **CONTRATISTA:** JAC LLANO GRANDE

OBJETO DEL CONTRATO:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 201,005,912
VALOR ACUMULADO: $ 201,005,912.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40,201,182,400.0	27	7	24	15/06/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,050,295,600.00	27	7	24	15	8	27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,301,773,600.00	15	8	24	15	8	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100282344
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% SOBRE EL VALOR DD ELA PERDIDA	MIN 2SMMLV	1	9	23	15	8	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100078731 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 7 (Mes) / 24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3157-2023 **CONTRATISTA:** JAC LOS OLIVOS

OBJETO DEL CONTRATO:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 201,402,474
VALOR ACUMULADO: $ 201,402,474.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40,280,494,800.00	29	4	24	1/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,070,123,700.00	29	4	24	30	6	27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,420,742,200.00	29	7	24	15	8	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100281558
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% SOBRE EL VALOR DD ELA PERDIDA	MIN 2SMMLV	8	9	23	30	6	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100068510 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			27	7	24	15/06/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			27	7	24	15	8	27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			15	8	24	15	8	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	15	8	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3121-2023 **CONTRATISTA:** JAC EL SAUCE

OBJETO DEL CONTRATO:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200,048,634
VALOR ACUMULADO: $ 200,048,634.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			27	7	24	15/06/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			27	7	24	15	8	27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			15	8	24	15	8	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100068309
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% SOBRE EL VALOR DD ELA PERDIDA	MIN 2SMMLV	8	9	23	15	8	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

	FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3122-2023 **CONTRATISTA:** JAC QUIROZ ALTO

OBJETO DEL CONTRATO:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 199,318,829
VALOR ACUMULADO: $ 199,318,829.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 39,863,765,800.00	27	7	24	15/06/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9,965,941,450.00	27	7	24	15	8	27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59,795,648,700.00	15	8	24	15	8	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100280830
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% SOBRE EL VALOR DD ELA PERDIDA	MIN 2SMMLV	6	9	23	30	6	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100068303 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	15	8	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 7 (Mes) / 24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3153 **CONTRATISTA:** JAC QUIROZ BAJO

OBJETO DEL CONTRATO:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 202,406,606
VALOR ACUMULADO: $ 202,406,606.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento		$ 40,481,321,200.00	27 / 7 / 24	15/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,120,330,300.00	27 / 7 / 24	15 / 8 / 27
Calidad de Estudios y Diseños			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,721,988,000.00	15 / 8 / 24	15 / 8 / 29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100281097
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% SOBRE EL VALOR DD ELA PERDIDA	MIN 2SMMLV	6 / 9 / 23	15 / 8 / 24
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100068374 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3281 **CONTRATISTA:** JAC NUEVA FLORIDA

OBJETO DEL CONTRATO:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200,698,283
VALOR ACUMULADO: $ 200,698,283.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			27	7	24	15/06/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			27	7	24	15	8	27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			15	8	24	15	8	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100068309
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% SOBRE EL VALOR DD ELA PERDIDA	MIN 2SMMLV	6	9	23	15	8	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra: no Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14. Para ninguno de los convenios

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	78-79

FECHA 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No. 3119 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PELIGRO

FECHA DE INICIO: 20/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6.2 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ----- NO ----- APROBADO: SI ----- N ----- VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ----- NO ----- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ----- NO ----- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ----- NO ----- APROBADO: SI ----- NO ----- FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ----- NO -----

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma N/A
Nombre: N/A Director de la Obra Matrícula Profesional No.:	Nombre: N/A Profesional en Calidad Contrato de Obra Matrícula Profesional No.:	Nombre: MAURICIO ROMERO Q Director de la Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND	Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	78-79

FECHA 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No. 3089 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATIS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

FECHA DE INICIO: 20/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6.2 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI ____ N ____ PROBADO: SI ____ N ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTA SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
PRESENTO INFORME DE AUDITORI SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO SI ____ N ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL S.S: ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contr** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrat ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contr** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión	Valor del IG m	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma N/A
Nombre: N/A	Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202-48107 C	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	78-79

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No. 3122 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATIS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ

FECHA DE INICIO: 20/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6.2 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI ____ N ____ APROBADO: SI ____ N ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTA SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
PRESENTO INFORME DE AUDITORI SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO SI ____ N ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL S ____ ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contra** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrat **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contra** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

itulo indicador de Gestió	**lor del IG m**	**Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)**
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento o Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma N/A
Nombre: N/A	Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202-48107 C	Matrícula Profesional No.:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	78-79

31/07/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No. 3281 DE 2023
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATIS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA

FECHA DE INICIO: 20/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6.2 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI ____ N PROBADO: SI ____ N ____ VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTA S: N
No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍ S: N
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO SI ____ N APROBADO: SI ____ NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL S:

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:**
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato**
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contr**
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrat **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contr**

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión	**Valor del IG m**	**Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)**
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	**Tipo de Equipo**	**Marca**	**Serie**	**Fecha de Calibración**	**No. y Fecha Certificado de Calibración**	**Fecha de Vencimiento Calibración**	**Comentarios**

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma N/A
Nombre: N/A	Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202-48107 C	Matrícula Profesional No.:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	78-79

FECHA 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No. 3157 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS

FECHA DE INICIO: 20/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6.2 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI ____ N ____ APROBADO: SI ____ N ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTA SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍ SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO SI ____ N ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS TOTALMENTE: ____ No. DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión	Valor del IG m	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Indice de gestión 1 =		
IG2: Indice de gestión 2 =		
IG3: Indice de gestión 3 =		
IG4: Indice de gestión 4 =		
IG5: Indice de gestión 5 =		
IGn: Indice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma N/A
Nombre: N/A	Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202-48107 C	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	78-79

FECHA 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No. 3153 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATIS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE

FECHA DE INICIO: 20/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6.2 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI ____ N ____ APROBADO: SI ____ N ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTA SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍ SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO SI ____ N ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL SI: ____ ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contra:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrat **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contra:** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión	Valor del IG m	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma N/A
Nombre: N/A	Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202-48107 C	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO DE OBRA No. 3121-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE

FECHA DE INICIO: 20/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6.2 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5065-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI ____ N ____ PROBADO: SI ____ N ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTA SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
PRESENTO INFORME DE AUDITORI SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO SI ____ N ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión	Valor del IG m	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Indice de gestión 1 =		
IG2: Indice de gestión 2 =		
IG3: Indice de gestión 3 =		
IG4: Indice de gestión 4 =		
IG5: Indice de gestión 5 =		
IGn: Indice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma N/A
Nombre: N/A	Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO ROMERO Q	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202-48107 C	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual.

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo: No Aplica el formato MEPI-MN-IN-2-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO DE OBRA No. 3119-2023 3089-2023 3122-2023 3281-2023 3157-2023 3153-2023 3121-2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PELIGRO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OLIVOS UNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SAUCE UNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA QUIROZ ALTO J UNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA QUIROZ BAJO UNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVA FLORIDA

OBJETO DEL CONVENIO:

1. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
2. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO EL LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
3. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
4. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
5. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
6. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
7. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra especifico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	63

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. .....
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3119 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Liliana Valencia M.
Nombre: LILIANA VALENCIA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	63

FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.

(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3089 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRN

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRNADE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTOR 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el

Firma:
Nombre: ONEY VALDEZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Contratista

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	63

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3122 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTOR 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el

Firma:
Nombre: YONIER TUQUERREZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	63

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3281 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLO

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DESAN PABLO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTOR 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el

Firma: Wilder Ferney Ramos
Nombre: WILDER RAMOS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA 63

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3157 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTOR 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el

Firma: Elizabeth Toro
Nombre: ELIZABETH TORO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** junio **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3121 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200,048,634.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma:
Nombre: RAUL LUNA
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	63

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.

(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3153 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTOR 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el

Firma: robinson valdes H.
Nombre: ROBINSON VALDEZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Contratista

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA 63

FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3121 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTOR 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como,
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el

Firma:
Nombre: RAUL URBANO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ **MES:** julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONVENIO DE OBRA No. 3119 DE 2023, 3089 DE 2023, 3122 DE 2023, 3281 DE 2023, 3157 DE 2023, 3153 DE 2023, 3121 DE 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ **DE** _____ ENTIDAD FINANCIERA: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: _____ %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAOLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE LA SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE, JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PELEGRO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAUCE, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUIROZ BAJO, JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA QUIROZ ALTO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OLIVOS, J UNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OLIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	60

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. _____ **MES:** julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3119 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: _____ %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200,741,050.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAEL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: _____
Nombre: LILIANA VALENCIA
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma: _____
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma: _____
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** julio **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3089 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 201,005,912.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Accion Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma:
Nombre: ONEY VALDEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** julio **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3122 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 199,318,829.00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligacion a cargo del Organismo de Accion Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma:
Nombre: YONIER TUQUERRES
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** julio **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3281 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.698.283.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Accion Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma: Wilder Forney Ramos
Nombre: WILDER RAMOS
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** julio **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3157 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 201,402,474.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma: Elizabeth Toro
Nombre: ELIZABETH TORO
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** julio **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3153 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 202,406,606.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista /Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma: robinson valdes M
Nombre: ROBINSON MARTINEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** julio **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3121 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 200,048,634.00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**


Firma:
Nombre: RAUL LUNA
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.2 Programa de Inversiones o Reprogramación al Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-1. Seguimiento Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-2. No Aplica el formato para los convenios

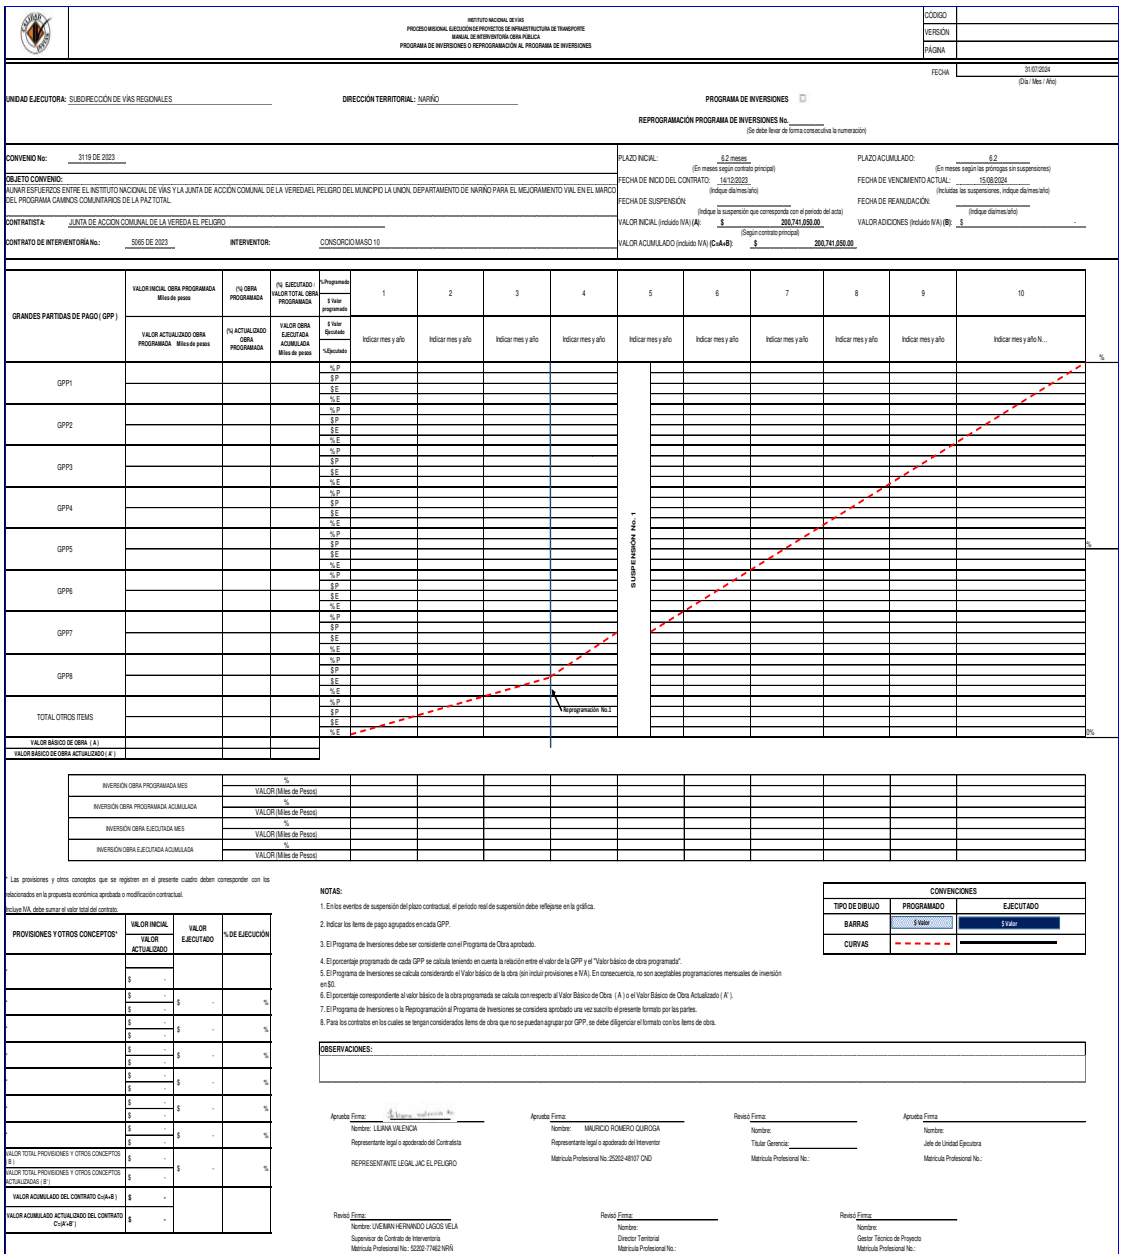

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENIO No: 3119 DE 2023

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAEL PELIGRO DEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 6.2 meses (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 200,741,050.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 200,741,050.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				%P / $P / $E / %E										
GPP2				%P / $P / $E / %E										
GPP3				%P / $P / $E / %E										
GPP4				%P / $P / $E / %E										
GPP5				%P / $P / $E / %E										
GPP6				%P / $P / $E / %E										
GPP7				%P / $P / $E / %E										
GPP8				%P / $P / $E / %E										
TOTAL OTROS ITEMS				%P / $P / $E / %E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSION No. 1

Reprogramación No.2

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	% / VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	% / VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	% / VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% / VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -		
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: — Nombre: LILIANA VALENCIA — Representante legal o apoderado del Contratista — REPRESENTANTE LEGAL JAC EL PELIGRO

Aprueba Firma: — Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA — Representante legal o apoderado del Interventor — Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND

Revisó Firma: — Nombre: — Titular Gerencia: — Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: — Nombre: — Jefe de Unidad Ejecutora — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: — Nombre: LIVEMAN HERNANDO LAGOS VELA — Supervisor de Contrato de Interventoría — Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ

Revisó Firma: — Nombre: — Director Territorial — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: — Nombre: — Gestor Técnico de Proyecto — Matrícula Profesional No.:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 87 | FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENI 3089 DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 6.2 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRA: 14/12/2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO AC: 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 201,005,912.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (Incluido IV $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 201,005,912.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	% Programado $ Valor programado % Ejecutado $ Valor Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (A)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C=(A+B))	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: | Nombre: ONEY VALDEZ | Representante legal o apoderado del Contratista | REPRESENTANTE LEGAL JAC LLANO GRANDE
Aprueba Firma: | Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA | Representante legal o apoderado del Interventor | Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND
Revisó Firma: | Nombre: | Titular Gerencia: | Matrícula Profesional No.:
Aprueba Firma | Nombre: | Jefe de Unidad Ejecutora | Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: | Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA | Supervisor de Contrato de Interventoría | Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ
Revisó Firma: | Nombre: | Director Territorial | Matrícula Profesional No.:
Revisó Firma: | Nombre: | Gestor Técnico de Proyecto | Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 87

FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENIO No: 3122 DE 2023

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTODEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 6.2 meses (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRA ######## (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 199,318,829.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B** $ 199,318,829.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	% Programado $ Valor programado % Ejecutado $ Valor Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
GPP1				% P											%
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP4				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP5				% P											
				$ P											%
				$ E											
				% E											
GPP6				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')															

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPT	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de


CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:	Aprueba Firma:	Revisó Firma:	Aprueba Firma
Nombre: YONIER TUQUERREZ	Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA	Nombre:	Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor	Titular Gerencia:	Jefe de Unidad Ejecutora
REPRESENTANTE LEGAL JAC QUIROZ ALTO	Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:	Revisó Firma:	Revisó Firma:
Nombre: LIVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA	Nombre:	Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría	Director Territorial	Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

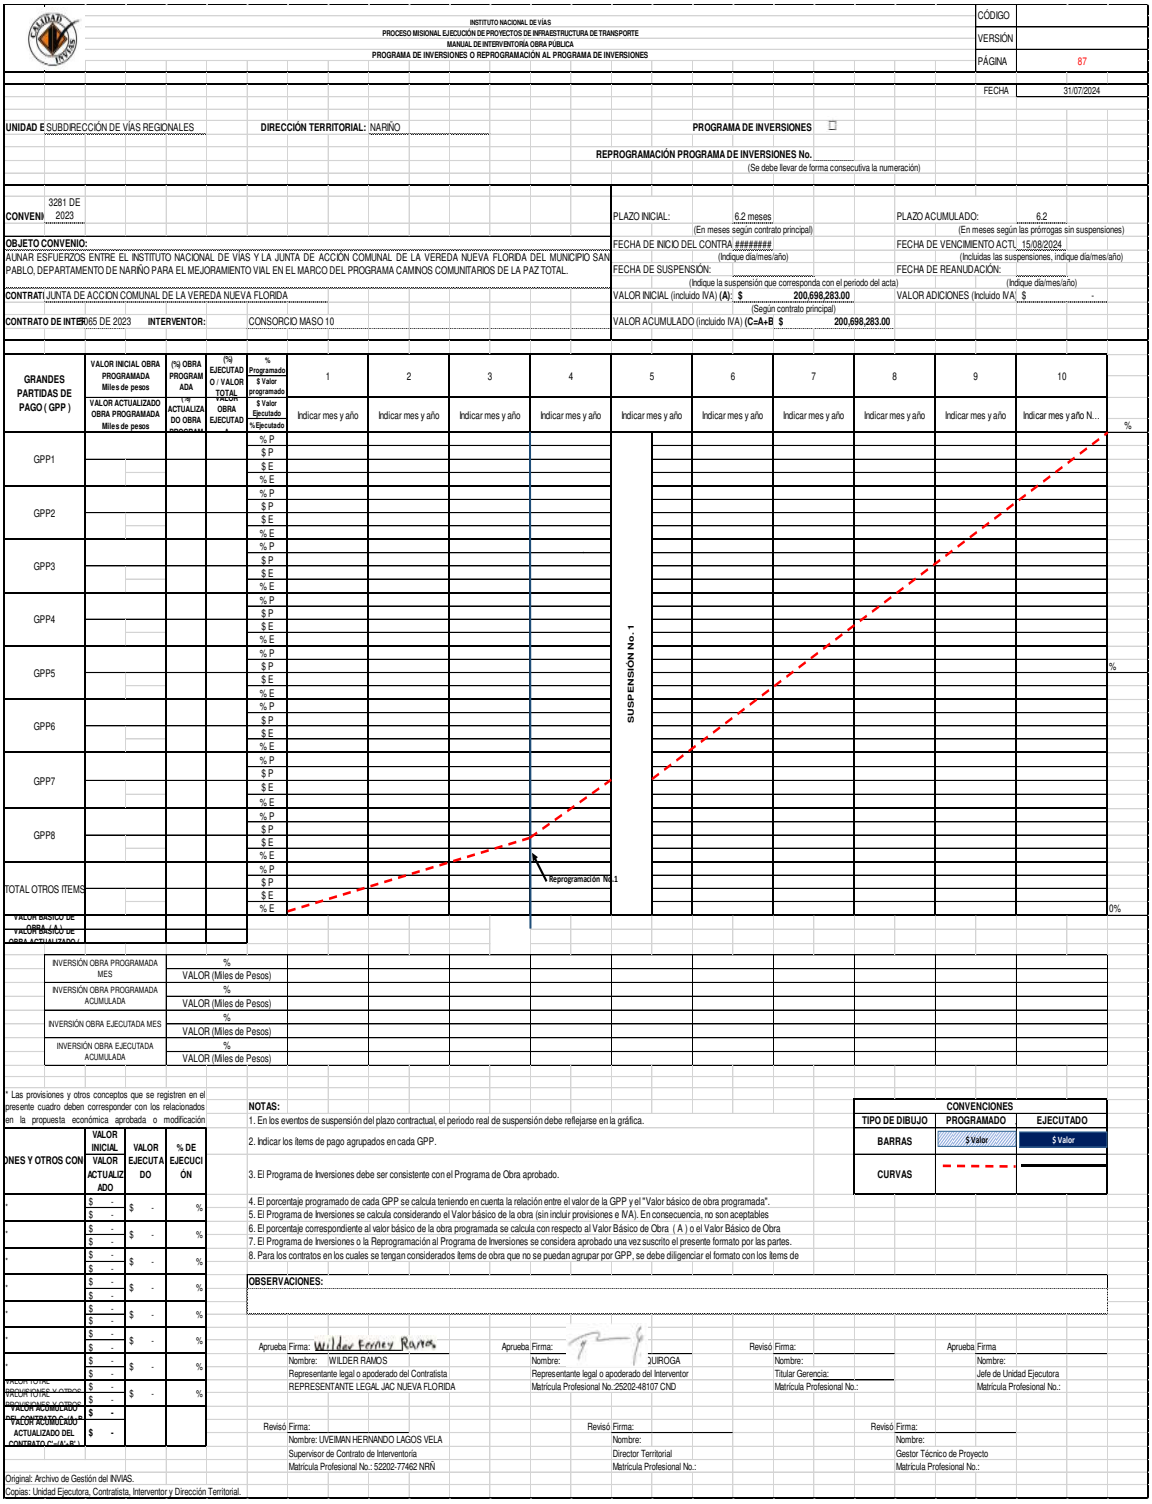

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 87 | FECHA 31/07/2024

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENI 3281 DE 2023

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA

CONTRATO DE INTE 065 DE 2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 6.2 meses (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRA ######## (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 200,698,283.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B $ 200,698,283.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / % ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
GPP1				% P / $ P / $ E / % E										
GPP2				% P / $ P / $ E / % E										
GPP3				% P / $ P / $ E / % E										
GPP4				% P / $ P / $ E / % E										
GPP5				% P / $ P / $ E / % E										
GPP6				% P / $ P / $ E / % E										
GPP7				% P / $ P / $ E / % E										
GPP8				% P / $ P / $ E / % E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P / $ P / $ E / % E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=A+B	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Wilder Forney Ramos — Nombre: WILDER RAMOS — Representante legal o apoderado del Contratista — REPRESENTANTE LEGAL JAC NUEVA FLORIDA

Aprueba Firma: — Nombre: JUROGA — Representante legal o apoderado del Interventor — Matrícula Profesional No.25202-48107 CND

Revisó Firma: — Nombre: — Titular Gerencia: — Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma — Nombre: — Jefe de Unidad Ejecutora — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: — Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — Supervisor de Contrato de Interventoría — Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ

Revisó Firma: — Nombre: — Director Territorial — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: — Nombre: — Gestor Técnico de Proyecto — Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	89

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUT: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** **DE** (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No.
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENIO No: 3119 DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONVEN: ######## (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 200,741,050.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B** $ 200,741,050.00

PLAZO ACUMULADO: 5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 30/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de	(% OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAM	% Programado $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	VALOR OBRA EJECUTADA	$ Valor Ejecutado % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...	%
GPP1				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP4				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP5				% P											
				$ P											%
				$ E											
				% E											
GPP6				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra pro
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														0.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS (DIFERENCIA ENTRE A Y B)	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realid

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LILIANA VALENCIA
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA EL PELIGRO

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.25202-48107 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	87

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENI 3157 DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 6. 2.MESES (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRA 14/12/2023 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTU** 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: ____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** ____ (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 201,402,474.00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (Incluido IVA** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 201,402,474.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL EJECUTADO / (%) OBRA EJECUTADA	% Programado $ Valor programado % Ejecutado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
GPP1				% P / $ P / $ E / % E										
GPP2				% P / $ P / $ E / % E										
GPP3				% P / $ P / $ E / % E										
GPP4				% P / $ P / $ E / % E										
GPP5				% P / $ P / $ E / % E										
GPP6				% P / $ P / $ E / % E										
GPP7				% P / $ P / $ E / % E										
GPP8				% P / $ P / $ E / % E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P / $ P / $ E / % E										
VALOR BASICO DE OBRA (A)														
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

% … 0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO OTROS	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=A+B	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:	Aprueba Firma:	Revisó Firma:	Aprueba Firma
Nombre: ELIZABETH TORO	Nombre: OUROGA	Nombre:	Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor	Titular Gerencia:	Jefe de Unidad Ejecutora
REPRESENTANTE LEGAL JAC OLIVOS	Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:	Revisó Firma:	Revisó Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA	Nombre:	Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría	Director Territorial	Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 87

FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENI 3153 DE 2023

PLAZO INICIAL: 6.2 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO DEL CONTRA 14/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 202,406,606.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (Incluido IVA $ -

CONTRATO DE INTER 165 DE 2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 202,406,606.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL	% Programado $ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	VALOR OBRA EJECUTADA	$ Valor Ejecutado % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

100%

0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (A+B+C)	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:	Aprueba Firma:	Revisó Firma:	Aprueba Firma
Nombre: ROBINSON VALDEZ	Nombre: ZUIROGA	Nombre:	Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor	Titular Gerencia:	Jefe de Unidad Ejecutora
REPRESENTANTE LEGAL JAC QUIROZ BAJO	Matrícula Profesional No.:25202-46107 CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:	Revisó Firma:	Revisó Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA	Nombre:	Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría	Director Territorial	Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO | VERSIÓN | PÁGINA

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENI: 3121 DE 2023

PLAZO INICIAL: 6.2 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO DEL CONTRA: 14/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATI: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 200,048,634.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (Incluido IVA): $ -

CONTRATO DE INTER: 065 DE 2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 200,048,634.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADO	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										%
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										%
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B)	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba	Aprueba	Revisó	Aprueba
Firma:	Firma:	Firma:	Firma
Nombre: RAUL LUNA	Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA	Nombre:	Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor	Titular Gerencia:	Jefe de Unidad Ejecutora
REPRESENTANTE LEGAL JAC SAUCE	Matrícula Profesional No.25202-48107 CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Revisó	Revisó	Revisó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA	Nombre:	Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría	Director Territorial	Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

4.9.3 Actas de comité de obra: no se adjunta copia de los comités semanales realizados con los convenios en el formato MEPI-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	12/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3089-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se lee los compromisos adquiridos en el comité #3 y se da a conocer las decisiones tomadas en este. De igual manera se da a conocer los pagos que se realizaron anteriormente, y de igualmente el avance de la obra hasta la fecha.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades de obra
4-pagos de personal de nomina,ing residente y maestro por contrato, contadora
5-pagos de papeleria,polizas
6-pagos de fletes,pago de materiales de ferreteria



DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades aproximadas de obra
4-aprobacion de pagos
5-Proposiciones y varios

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
La JAC se compromete a enviar los soportes para los respectivos	lunes, 15 de julio de 2024	JAC
interventoría se compromete a revisar las cuentas de cobro enviada	miércoles, 17 de julio de 2024	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ONEY VALDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	JAC	
LEYDI BENITES	PRESIDENTA VEEDURIA	JAC	
YERALDIN BURBANO	CONTADORA	JAC	
MAURICIO ROMERO	DIRECTOR	INTERVNETORIA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	13/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3153-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se lee los compromisos adquiridos en el comité #3 y se da a conocer las decisiones tomadas en este. De igual manera se da a conocer los pagos que se realizaron anteriormente, y de igualmente el avance de la obra hasta la fecha.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades de obra
4-pagos de personal de nomina,ing residente y maestro por contrato, contadora
5-pagos de papeleria,polizas
6-pagos de fletes,pago de materiales de ferreteria

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades aproximadas de obra
4-aprobacion de pagos
5-Proposiciones y varios

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
La JAC se compromete a enviar los soportes para los respectivos	lunes, 15 de julio de 2024	JAC
Interventoría se compromete a revisar las cuentas de cobro enviada	viernes, 19 de julio de 2024	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ROBINSON VALDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	JAC	
YERALDIN BURBANO	CONTADORA	JAC	
EDWIN MARTINEZ	PRESIDENTE VEEDURIA	JAC	
MAURICIO ROMERO	DIRECTOR	INTERVENTORIA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3157-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se lee los compromisos adquiridos en el comité #3 y se da a conocer las decisiones tomadas en este. De igual manera se da a conocer los pagos que se realizaron anteriormente, y de igualmente el avance de la obra hasta la fecha.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades de obra
4-pagos de personal de nomina,ing residente y maestro por contrato, contadora
5-pagos de papeleria,polizas
6-pagos de fletes,pago de materiales de ferreteria

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades aproximadas de obra
4-aprobacion de pagos
5-Proposiciones y varios

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
La JAC se compromete a enviar los soportes para los respectivos	lunes, 15 de julio de 2024	JAC
interventoria se compromete a revisar las cuentas de cobro enviada	jueves, 18 de julio de 2024	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ELIZABETH TORO	REPRESENTANTE LEGAL	JAC	
MAURICIO ROMERO	DIRECTOR	INTERVENTORIA	
YERALDIN BURBANO	CONTADORA	JAC	
MILLER ORTEGA	PRESIDENTE VEEDURIA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 16/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3119-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se lee los compromisos adquiridos en el comité #2 y se da a conocer las decisiones tomadas en este. De igual manera se da a conocer los pagos que se realizaron anteriormente, y de igualmente el avance de la obra hasta la fecha.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades de obra
4-pago de señalizacio y ensayos de laboratorio
5-pagos de personal de nomina,ing residente y maestro por contrato, contadora
6-pagos de papeleria,polizas
7-pagos de recebo,subbase,arena y triturado
8-pagos de fletes,pago de materiales de ferreteria

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades aproximadas de obra
4-aprobacion de pagos
5-Proposiciones y varios

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	10/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3122-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se lee los compromisos adquiridos en el comité #2 y se da a conocer las decisiones tomadas en este. De igual manera se da a conocer los pagos que se realizaron anteriormente, y de igualmente el avance de la obra hasta la fecha.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades de obra
4-pagos de personal de nomina,ing residente y maestro por contrato, contadora
5-pagos de papeleria,polizas
6-pagos de fletes,pago de materiales de ferreteria

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades aproximadas de obra
4-aprobacion de pagos
5-Proposiciones y varios

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
La JAC se compromete a enviar los soportes para los respectivos	viernes, 12 de julio de 2024	JAC
interventoria se compromete a revisar las cuentas de cobro enviada	lunes, 15 de julio de 2024	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MAURICIO ROMERO	DIRECTOR	INTERVENTORIA	
DEYANIRA ORTEGA	CONTADORA	JAC	
YONIER TUQUERRREZ	REPRESENTANTE	JAC	
WILSON INGA	PRESIDENTE VEEDURIA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	9/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3121-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS N/A
Se lee los compromisos adquiridos en el comité #2 y se da a conocer las decisiones tomadas en este. De igual manera se da a conocer los pagos que se realizaron anteriormente, y de igualmente el avance de la obra hasta la fecha.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades de obra
4-pagos de personal de nomina,ing residente y maestro por contrato, contadora
5-pagos de papeleria,polizas
6-pagos de fletes,pago de materiales de ferreteria

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1- Se realiza la presentación de los participantes y llamado de asistencia.
2-Informe de actividades ejecutadas hasta la fecha
3-Lectura de cantidades aproximadas de obra
4-aprobacion de pagos
5-Proposiciones y varios

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
La JAC se compromete a enviar los soportes para los respectivos	viernes, 12 de julio de 2024	JAC
interventoría se compromete a revisar las cuentas de cobro enviada	lunes, 15 de julio de 2024	INTERVENTORIA

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZEETH DIAZ	ING RESIDENTE	JAC SAUCE	
RAUL URBANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAÑ	
MONICA VALDEZ	PRESIDENTA VEDURIA	JAC SAUCE	
MAURICIO ROMERO	DIRECTOR	INTERVENTORIA	
YUDY SOARTE	CONTADORA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

4.9.4 Actas de reunión: NO se adjunta copia de REUNION en el formato MEPI-MN-IN-14-FR-2

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE SELECCIÓN	CONCURSO DE MERITO ABIERTO
CONTRATO	5065 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO MASO 10
CONSORCIO CONFORMADO POR	CMA-DEO-SVR-119-2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL-LOTE2
REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE SARRIA
SISTEMA	
VALOR DEL CONTRATO	$ 235.028.339
ANTICIPO	0
FECHA DE INICIACIÓN	30/12/23
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	UVEIMAN LAGOS
GESTOR TÉCNICO	DIEGO PABON
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	MAURICIO ROMERO

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

Durante este periodo del mes de julio, la interventoría realizó el acompañamiento y verificación de ejecución de las siguientes actividades:

Durante el mes de julio de 2024, se llevaron a cabo una serie de actividades y gestiones importantes relacionadas con la ejecución de proyectos en la Dirección Territorial de Nariño. Se destacan la presentación del equipo de trabajo de la Interventoría en dicha dirección, así como las reuniones de seguimiento técnico y administrativo entre la Interventoría y la supervisión por parte del INVIAS en los primeros días del mes. Además, se realizaron acciones clave como la revisión y solicitud de ampliación de prórroga del convenio, la radicación de cuentas de cobro y la revisión de documentos relacionados con el reembolso de pagos de pólizas a los presidentes de las Juntas.

- Se realizaron comités de obra con el objetivo de tratar temas de inicio de obra en las veredas LLANO GRANDE, QUIROZ ALTO, QUIROZ BAJO, SAUCE, LOS OLIVOS, EL PELIGRO.
- Se realizaron planes de compras para pagos de proveedores.
- Corte y figuración de acero en todos los convenios esta actividad se terminó en un 100%.
- En la vereda el SAUCE, se dio por terminado a las actividades de fundición de concreto de M.R. 3.8, la interventoría realizo acompañamiento.
- Acompañamiento a la comunidad en cuanto a la parte social de interventoría realizando vistas a cada uno de los convenios.
- Se inicio con la construcción de las placas huellas de OLIVOS, EL PELIGRO en el municipio de LA UNION y en la NUEVA FLORIDA en EL municipio de SAN PABLO
- En la placa huella de olivos va un avance de 95% en su ejecución.

5.3 Informes de especialistas

En el presente mes de julio la profesional Social y ambiental efectuaron el seguimiento a las actividades sociales realizadas por los contratistas y la revisión y presentación de las observaciones correspondientes a los diferentes documentos sociales y ambientales que entregaron los contratistas en el presente mes para revisión de la Interventoría.

5.4 Información otros programas y aplicativos.

En el presente mes de julio no se desarrollaron otros programas

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VEHICULOS DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: julio **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5065 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO MASO 10

CONTRATO DE OBRA No. 3089 DE 2023 / 3119 DE 2023 / 3121 DE 2023 / 3122 DE 2023 / 3153 DE 2023 / 3157 DE 2023 / 3281 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC DE LA VEREDA LLANO GRANDE - JAC VEREDA EL PELIGRO - JAC VEREDA SAUCE - JAC DE QUIROZ ALTO - JAC QUIROZ - JAC VEREDA OLIVOS - JAC VEREDA NUEVA FLORIDA DE LA UNION Y SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOCICLETA	PLACA NSA-13G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA JPE-59E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA EXU-62G			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA JCV-106						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA INU-90D						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA ZEA-97G						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA BVZ-63E																							X	X	X	X	X	X	X	X	X

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.


NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma	Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA	Nombre: UVEIMAN LAGOS
Director de Interventoría	Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND	Matrícula Profesional No.:52202-77462

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.1 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-15

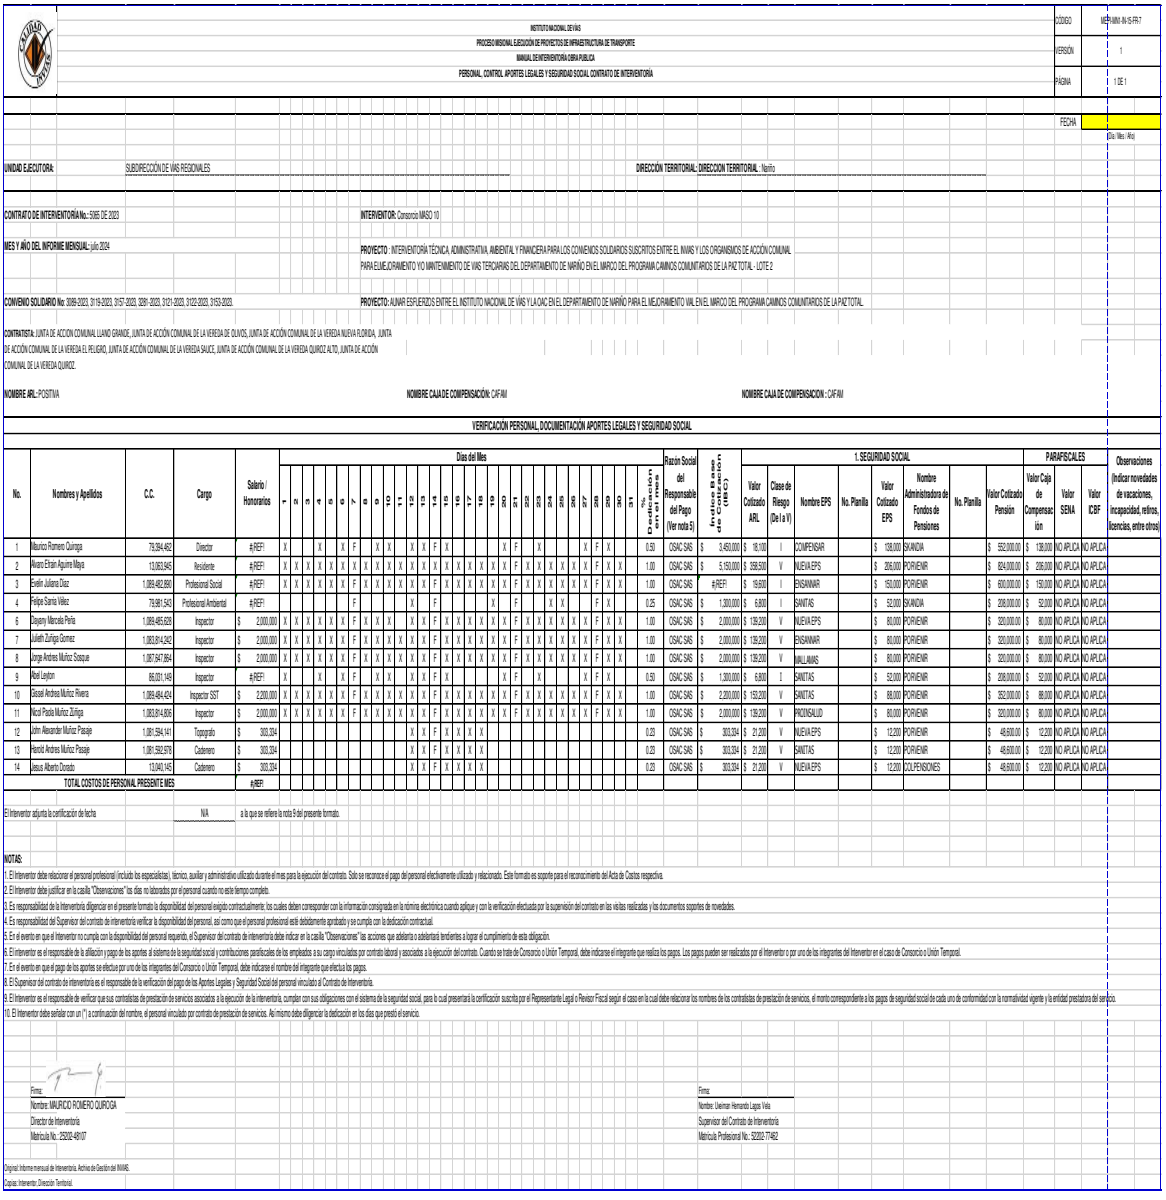

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: (Día/ Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCION TERRITORIAL - Nariño

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5365 DE 2023 — INTERVENTOR: Consorcio MASO 10

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: julio 2024 — PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

CONVENIO SOLIDARIO No: 3099-2023, 3119-2023, 3157-2023, 3281-2023, 3121-2023, 3122-2023, 3153-2023. — PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA OAC EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANO GRANDE, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA RONDA, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ.

NOMBRE ARL: POSITIVA — NOMBRE CAJA DE COMPENSIÓN: CAFAM — NOMBRE CAJA DE COMPENSACION: CAFAM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación Mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensacion	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Mauricio Romero Quiroga	79.394.492	Director	#¡REF!	X X X F X X X F X X X F X	0.50	OSAC SAS	$ 3.450.000	$ 18.100	I	COMPENSAR		$ 138.000	SAINOVA		$ 552.000,00	$ 138.000	NO APLICA	NO APLICA	
2	Alvaro Efrain Aguirre Moya	13.063.945	Residente	#¡REF!	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X F X X X X X X F X X	1.00	OSAC SAS	$ 5.150.000	$ 338.500	V	NUEVA EPS		$ 206.000	PORVENIR		$ 824.000,00	$ 206.000	NO APLICA	NO APLICA	
3	Evelin Juliana Diaz	1.069.482.890	Profesional Social	#¡REF!	X X X X X X F X X X X X F X X X X X F X X X X X F X X	1.00	OSAC SAS	#¡REF!	$ 19.600	I	ENSAMMR		$ 150.000	PORVENIR		$ 600.000,00	$ 150.000	NO APLICA	NO APLICA	
4	Felipe Sarria Vélez	79.981.543	Profesional Ambiental	#¡REF!	F X F X X F X X	0.25	OSAC SAS	$ 1.300.000	$ 8.800	I	SANITAS		$ 52.000	SAINOVA		$ 208.000,00	$ 52.000	NO APLICA	NO APLICA	
5	Eliberto Marcelo Peña	1.069.485.828	Inspector	$ 2.000.000	X X X X X F X X X X F X X X X X F X X X X X F X X	1.00	OSAC SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	NUEVA EPS		$ 80.000	PORVENIR		$ 320.000,00	$ 80.000	NO APLICA	NO APLICA	
7	Julieth Zúñiga Gomez	1.003.814.243	Inspector	$ 2.000.000	X X X X X F X X X X F X X X X X F X X X X X F X X	1.00	OSAC SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	ENSAMMR		$ 80.000	PORVENIR		$ 320.000,00	$ 80.000	NO APLICA	NO APLICA	
8	Jorge Andres Muñoz Soaque	1.087.947.864	Inspector	$ 2.000.000	X X X X X F X X X X F X X X X X F X X X X X F X X	1.00	OSAC SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	ARLLAMAS		$ 80.000	PORVENIR		$ 320.000,00	$ 80.000	NO APLICA	NO APLICA	
9	Abel Leyton	86.031.149	Inspector	#¡REF!	X X F X X F X X X F X	0.50	OSAC SAS	$ 1.300.000	$ 8.800	I	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR		$ 208.000,00	$ 52.000	NO APLICA	NO APLICA	
10	Eiseell Andres Muñoz Rivera	1.069.484.424	Inspector SST	$ 2.200.000	X X X X X F X X X X F X X X X X F X X X X X F X X	1.00	OSAC SAS	$ 2.200.000	$ 153.200	V	SANITAS		$ 88.000	PORVENIR		$ 352.000,00	$ 88.000	NO APLICA	NO APLICA	
11	Nicol Paola Muñoz Zúñiga	1.003.814.806	Inspector	$ 2.000.000	X X X X X F X X X X F X X X X X F X X X X X F X X	1.00	OSAC SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	PROINSALUD		$ 80.000	PORVENIR		$ 320.000,00	$ 80.000	NO APLICA	NO APLICA	
12	John Alexander Muñoz Pasaje	1.061.594.141	Topografo	$ 303.334	X X F X X X	0.23	OSAC SAS	$ 303.334	$ 21.200	V	NUEVA EPS		$ 12.200	PORVENIR		$ 48.800,00	$ 12.200	NO APLICA	NO APLICA	
13	Henrid Andres Muñoz Pasaje	1.061.592.978	Cadenero	$ 303.334	X X F X X X	0.23	OSAC SAS	$ 303.334	$ 21.200	V	SANITAS		$ 12.200	PORVENIR		$ 48.800,00	$ 12.200	NO APLICA	NO APLICA	
14	Jesus Alberto Dorado	13.040.145	Cadenero	$ 303.334	X X F X X X	0.23	OSAC SAS	$ 303.334	$ 21.200	V	NUEVA EPS		$ 12.200	COLPENSIONES		$ 48.800,00	$ 12.200	NO APLICA	NO APLICA	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				#¡REF!																

El Interventor adjunta la certificación de leche — NA — a lo que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Sólo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantara o adelantadas tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal segun el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Ademismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-49107

Firma:
Nombre: Ulelmar Hernando Lagos Vela
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77482

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

MES INFORME MENSUAL: 1 a 31 de julio de 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3089-2023, 3119-2023, 3157-2023, 3281-2023, 3121-2023, 3122-2023, 3153-2023.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE / JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PELIGRO / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS / JUNTA DE ACCIONCOMUNAL DE LA VEREDA NUEVA / FLORIDA / JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAUCE / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIROZ ALTO / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIROZ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1446523	C-2402-0600-14-0-2402041- 02	10	Nación	Principal	$ 230,211,152.22	
2023	1446523	C-2402-0600-14-0- 2402112-02	10	Nación	Principal	$ 4,698,186.78	
2024	535624	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	Nación	Adicional No 1	$ 66,994,000.00	
2024	535624	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	Nación	Adicional No 2	$ 94,269,628.00	
				TOTAL		$ 396,172,967.00	$ 51,960,427.60

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 396,172,967

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
anticipo							$ -					
1	22 a 31 de enero de 2024	$ 2,781,440.00	$ 528,473.60	$ 3,309,913.60	$ -	$ 3,309,913.60	$ -	1446523 - 2023/12/29	$ 231,599,425.40	$ 231,599,425.40		
2	feb-24	$ 17,450,000.00	$ 3,315,500.00	$ 24,075,413.60	$ -	$ 20,765,500.00	$ -	1446523 - 2023/12/29	$ 210,833,925.40	$ 210,833,925.40		
3	mar-24	$ 24,517,400.00	$ 4,658,306.00	$ 53,251,119.60	$ -	$ 29,175,706.00	$ -	1446523 - 2023/12/29	$ 181,658,219.40	$ 181,658,219.40		
4	abr-24	$ 36,776,500.00	$ 6,987,535.00	$ 97,015,154.60	$ -	$ 43,764,035.00	$ -	1446523 - 2023/12/29	$ 137,894,184.40	$ 137,894,184.40		
5	may-24	$ 58,024,720.00	$ 11,024,696.80	$ 166,064,571.40	$ -	$ 69,049,416.80	$ -	1446523 - 2023/12/29	$ 68,844,767.60	$ 68,844,767.60		
6	jun-24	$ 70,486,000.00	$ 13,392,340.00	$ 249,942,911.40	$ -	$ 83,878,340.00	$ -	1446523 - 2023/12/29 535624 - 2024/06/13	$ 51,960,427.60	$ 51,960,427.60		
7	jul-24	$ 64,486,000.00	$ 12,252,340.00	$ 326,681,251.40	$ -	$ 76,738,340.00	$ -	535624 - 2024/06/13 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	$ 69,491,715.60	$ 69,491,715.60		
TOTALES		**$ 274,522,060.00**	**$ 52,159,191.40**		**$ 0.00**	**$ 326,681,251.40**						

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 240,976,060.00	$ 45,785,451.40	$ 286,761,511.40
*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 33,546,000.00	$ 6,373,740.00	$ 39,919,740.00
*			
VALOR TOTAL	$ 274,522,060.00	$ 52,159,191.40	$ 326,681,251.40

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-48107

Firma
Nombre: Uveiman Hernando Lagos Vela
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 52202-77462

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.3 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el

INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

formato MEPIMN1- IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDURECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS,SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

FECHA DE INICIO: 22/01/2024
PLAZO INICIAL: 30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 234,909,339.00
VALOR ACUMULADO: $ 234,909,339.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: UVEIMAN LAGOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 23,490,933.90	26	12	23	7/12/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 39,480,561,200	26	12	23	7/12/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 46,981,867,800	26	12	23	7	6	27
Calidad del servicio		$ 70,472,801,700	2	1	24	2	1	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433305
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma
Nombre: UVEIMAN LAGOS V
Supervisor Contrato de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	139-140

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS,SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

INTERVENTOR: MASO 10

FECHA DE INICIO: 21/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONVENIO DE OBRA No: 3119-2023, 3089-2023, 3122-2023, 3281-2023, 3157-2023, 3153-2023, 3121-2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: JAC VEREDA EL SAUCE,JAC VEREDA EL RELIGRO,JAC VEREDA LLANO GRANDE,JAC VEREDA QUIROZ ALTO, JAC VEREDA QUIROZ BAJO,JAC VEREDAQ OLIVOS,JAC VEREDA NUEVA FLORIDA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ N ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ----- NO ----------. No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ----- NO ----------. No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ..... **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ..... **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ..... **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma
Nombre: N/A
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: UVEIMAN LAGOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77462

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.5 Seguimiento a la inversión del Anticipo: no aplica en el formato MEPI-MN-IN-3-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS,SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....

ANTICIPO OTORGADO: ..... %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ - (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS,SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre MAURICIO ROMERO Q
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profes 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6 Seguimiento al Plan de Cargas: Se adjunta el seguimiento mensual en el formato MEPI-MNIN-9-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-9-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/06/2024 (Dia / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL X

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** **No.** _____
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **5065/2023**

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VE

RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar dia/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 3089-2023, 3119-2023, 3157-2023, 3281-2023, 3121-2023, 3122-2023, 3153-2023. CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE / JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PELIGRO / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS / JUNTA DE ACCIONCOMUNAL DE LA VEREDA NUEVA / FLORIDA / JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAUCE / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIROZ ALTO / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIROZ

PLAZO INICIAL: 2 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 234,909,339.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 234,909,339.00

PLAZO ACUMULADO: 6.3 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: _____ (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 22/01/2024 (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		AÑO 2024 MES 1		AÑO 2024 MES 2		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR		
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	Director de Interventoría	$ 6,900,000.00		1.0	$ 6,900,000.00					0.4	$ 2,760,000.00	0.6	$ 4,140,000.00	1.0	$ 6,900,000.00		
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5,150,000.00		2.0	$ 10,300,000.00					1.0	$ 5,150,000.00	1.0	$ 5,150,000.00	2.0	$ 10,300,000.00		
3	1	Profesional Social	$ 3,750,000.00		2.0	$ 7,500,000.00					1.0	$ 3,750,000.00	1.0	$ 3,750,000.00	2.0	$ 7,500,000.00		
4	1	Profesional Ambiental	$ 3,750,000.00		2.0	$ 7,500,000.00					1.0	$ 3,750,000.00	1.0	$ 3,750,000.00	2.0	$ 7,500,000.00		
5	1	**MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS**	$ 7,580,850.00			$ 7,580,850.00					0.5	$ 3,790,425.00	0.5	$ 3,790,425.00	1.0	$ 7,580,850.00		
6	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 6,100,000.00									$ -		$ -	0.0	$ -		
7	1	Especialista en Estructuras	$ 6,100,000.00									$ -		$ -	0.0	$ -		
8	1	Especialista en Geología y Geotecnia	$ 6,100,000.00									$ -		$ -	0.0	$ -		
9	1	Especialista Ambiental	$ 6,100,000.00									$ -		$ -	0.0	$ -		
10	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,100,000.00									$ -		$ -	0.0	$ -		
11	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,100,000.00									$ -		$ -	0.0	$ -		
		PERSONAL TÉCNICO																
12	5	Inspector	$ 2,000,000.00		2.0	$ 20,000,000.00					1.0	$ 10,000,000.00	1.0	$ 10,000,000.00	2.0	$ 20,000,000.00		
13	1	Inspector SST	$ 2,200,000.00		2.0	$ 4,400,000.00					1.0	$ 2,200,000.00	1.0	$ 2,200,000.00	2.0	$ 4,400,000.00		
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																
14	1	Técnico administrativo	$ 1,300,000.00		2.0	$ 2,600,000.00					1.0	$ 1,300,000.00	1.0	$ 1,300,000.00	2.0	$ 2,600,000.00		
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 66,780,850.00**						**$ 32,700,425.00**		**$ 34,080,425.00**		**$ 66,780,850.00**		
FACTOR MULTIPLICADOR						**2.36**						**2.36**		**2.36**		**2.36**		
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 157,602,806.00**						**$ 77,173,003.00**		**$ 80,429,803.00**		**$ 157,602,806.00**		

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2024 MES 1 H-M	AÑO 2024 MES 1 VALOR	AÑO 2024 MES 2 H-M	AÑO 2024 MES 2 VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS														
		VIÁTICOS														
15	5.00	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 210,000.00	Dia	10.00	$ 2,100,000					3.00	$ 630,000	7.00	$ 1,470,000	10.00	$ 2,100,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA														
16	1.00	Vehículo tipo camper ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5,500,000.00	Mes	2.00	$ 11,000,000					1.00	$ 5,500,000	1.00	$ 5,500,000	2.00	$ 11,000,000.00
17	6.00	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 650,000.00	Mes	12.00	$ 7,800,000					6.00	$ 3,900,000	6.00	$ 3,900,000	12.00	$ 7,800,000.00
18	1.00	Trabajo de topografia (Incluya personal, equipo y transporte)	$ 6,000,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 12,000,000					1.00	$ 6,000,000	1.00	$ 6,000,000	2.00	$ 12,000,000.00
19	1.00	Ensayos de laboratorios.	$ 600,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 1,200,000					1.00	$ 600,000	1.00	$ 600,000	2.00	$ 1,200,000.00
20	1.00	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 1,600,000					1.00	$ 800,000	1.00	$ 800,000	2.00	$ 1,600,000.00
		OTROS COSTOS														
21	1.00	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1,300,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 2,600,000					1.00	$ 1,300,000	1.00	$ 1,300,000	2.00	$ 2,600,000.00
22	1.00	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 300,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 600,000					1.00	$ 300,000	1.00	$ 300,000	2.00	$ 600,000.00
23	1.00	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 600,000					1.00	$ 300,000	1.00	$ 300,000	2.00	$ 600,000.00
24	1.00	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 300,000					1.00	$ 150,000	1.00	$ 150,000	2.00	$ 300,000.00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE														
		*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 39,800,000.00**						**$ 19,480,000.00**		**$ 20,320,000.00**		**$ 39,800,000.00**
		*Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 197,402,806.00**						**$ 96,653,003.00**		**$ 100,749,803.00**		**$ 197,402,806.00**
		*Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -						$ -		$ -		$ -
		*Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 197,402,806.00**						**$ 96,653,003.00**		**$ 100,749,803.00**		**$ 197,402,806.00**
		*IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 37,506,533.00**						**$ 18,364,071.00**		**$ 19,142,463.00**		**$ 37,506,534.00**
		*Costo Total = (E) + (F)				**$ 234,909,339.00**						**$ 115,017,074.00**		**$ 119,892,266.00**		**$ 234,909,339.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
La presente reprogramación se realiza en correspondencia a la prórroga No 1 del contrato 5065 de 2023 para atender los contratos de obra No 3089-2023, 3119-2023, 3157-2023, 3281-2023, 3121-2023, 3122-2023, 3153-2023.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.
Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: Arturo Sarria Ruiz
Representante Legal Interventor
Matrícula Profesional No.: 25000-08029

Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77462
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Revisión de materiales que cumplan con las normas técnicas exigidas por el INVIAS; en los siete convenios cumple con lo reglamentario.

- Los profesionales que acompañan el desarrollo del objeto de los convenios deben tener apego tanto a la calidad del trabajo realizado como al correcto gasto de los recursos entregados para su manejo.

- La comunidad en general está agradecida por recibir estas obras que benefician de gran manera a los habitantes de la zona y a los de zonas aledañas, se recomienda que cuiden la obra y realicen el mantenimiento necesario.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista, interventoría

correspondencia cursada entre la JAC LLANO GRANDE CONVENIO 3089 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
2/07/2024	N-GR-016-2024	SOLICITUD RESULTADOS DE LABORATORIO	X	
15/07/2024	N-GR-018-2024	SOLICITUD DE SOPORTES SEGURIDAD SOCIAL	X	
10/07/2024		SOLICITUD DE PRORROGA		X
18/07/2024		comite		x

correspondencia cursada entre la JAC LOS OLIVOS CONVENIO 3157 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
5/07/2024	N-OL-015-2024	ENVIO PLAN DE GESTION AMBIENTAL	X	
15/07/2024	N-OL-017-2024	SOLICITUD DE SOPORTES SEGURIDAD SOCIAL	X	
10/07/2024		SOLICITUD DE PRORROGA		X

correspondencia cursada entre la JAC EL PELIGRO CONVENIO 3119 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
3/07/2024	N-PE-015-2024	CITACION A REUNION COMUNITARIA	X	
4/07/2024	N-PE-015-2024	ENVIO PLAN DE GESTION AMBIENTAL	X	
15/07/2024	N-PE-017-2024	SOLICITUD DE SOPORTES SEGURIDAD SOCIAL	X	
10/07/2024		SOLICITUD DE PRORROGA		X
31/07/2024		comite operativo		x

correspondencia cursada entre la JAC EL SAUCE CONVENIO 3121 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
2/07/2024	N-SA-015-2024	SOLICITUD RESULTADOS DE LABORATORIO	X	
15/07/2024	N-SA-017-2024	SOLICITUD DE SOPORTES SEGURIDAD SOCIAL	X	
17/07/2024		COMITE #4		X
10/07/2024		SOLICITUD DE PRORROGA		X

correspondencia cursada entre la JAC EL QUIROZ ALTO CONVENIO 3122 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
2/07/2024	N-QA-019-2024	SOLICITUD RESULTADOS DE LABORATORIO	X	
15/07/2024	N-QA-021-2024	SOLICITUD DE SOPORTES SEGURIDAD SOCIAL	X	
10/07/2024		SOLICITUD DE PRORROGA		X
22/07/2024		comite		x
26/07/2024		carta en blanco comite		x

correspondencia cursada entre la JAC QUIROZ BAJO CONVENIO 3153 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
15/07/2024	N-QB-015-2024	SOLICITUD DE SOPORTES SEGURIDAD SOCIAL	X	
10/07/2024		SOLICITUD DE PRORROGA		X


correspondencia cursada entre la JAC NUEVA FLORIDA CONVENIO 3281 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
5/07/2024	N-NF-014-2024	ENVIO PLAN DE GESTION AMBIENTAL	X	
15/07/2024	N-NF-016-2024	SOLICITUD DE SOPORTES SEGURIDAD SOCIAL	X	
15/07/2024	N-NF-015-2024	SOLICITUD DE VALLA INFORMATIVA Y ACTAS DE VECINDAD	X	
16/07/2024		ACTAS DE VECINDAD		X
16/07/2024	N-NF-017-2024	OBSERVACIONES ACTAS DE VECINDAD	X	
10/07/2024		SOLICITUD DE PRORROGA		X


8.2 Registro fotográfico

EL SAUCE





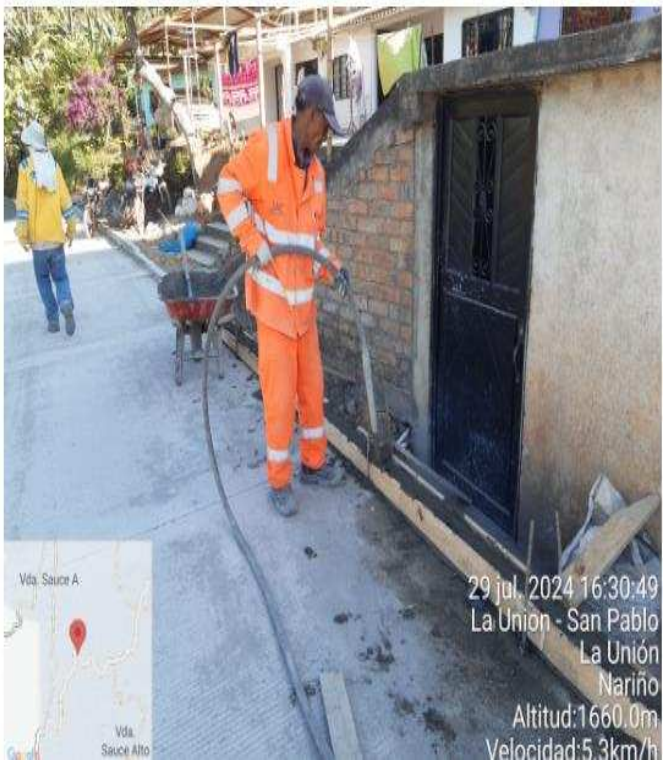

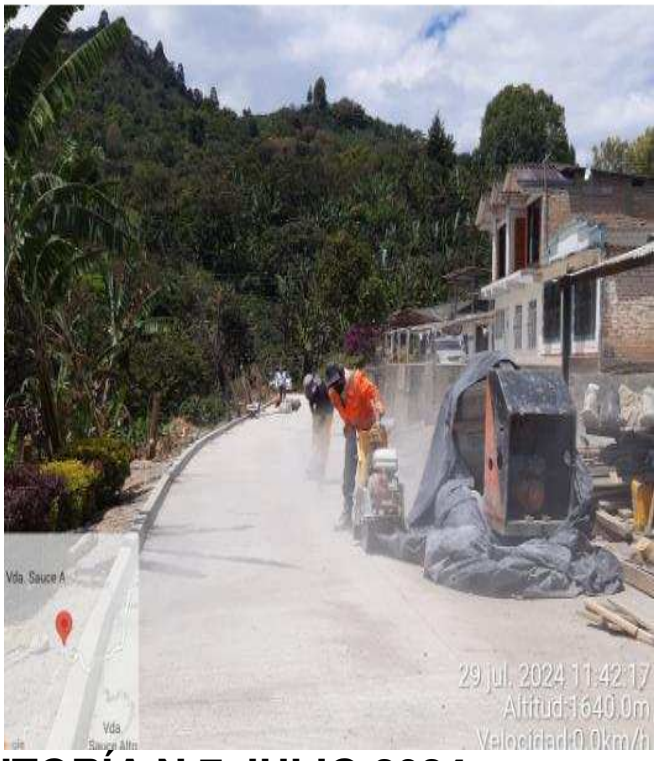


Vda. Sauce A
29 jul. 2024 16:19:17
La Union - San Pablo
La Unión
Nariño
Altitud:1641.0m


Vda. Sauce A
29 jul. 2024 10:46.2
La Union - San Pabl
La Unió
Nariñ
Altitud:1651.0m


Vda. Sauce A
25 jul. 2024 17:16:29
La Union - San Pablo
La Unión
Nariño
Altitud:1640.0m
Velocidad:0.0km/h

OLIVOS


jueves, 4 de julio de 2024
La Union
La Unión
Nariño


jueves, 4 de julio de 2024
La Union
La Unión
Nariño


La Union
Narino
Colombia






miércoles, 10 de julio de 2024
1°39'27.4968"N -77°12'48.27593"W
La Union
La Unión
Nariño







INFORME DE INTERVENTORÍA N.7 JULIO 2024
CONSORCIO MASO 10

NUEVA FLORIDA









EL PELIGRO





















QUIROZ BAJO


jueves, 4 de julio de 2024, 11:51:54 a. m.
La Unión-Quiroz bajo


jueves, 4 de julio de 2024, 11:51:49 a. m.
La Unión-Quiroz bajo


jueves, 4 de julio de 2024, 11:53:26 a. m.
La Unión-Quiroz bajo


jueves, 4 de julio de 2024, 11:53:25 a. m.
La Unión-Quiroz bajo


BELLOTA
jueves, 4 de julio de 2024, 10:57:07 a. m.
La Unión-Quiroz bajo


sábado, 6 de julio de 2024, 9:32:23 a. m.
La Unión-Quiroz bajo


sábado, 6 de julio de 2024, 9:34:54 a. m.
La Unión-Quiroz bajo


lunes, 8 de julio de 2024, 11:23:17 a. m.
La Unión-Quiroz bajo


lunes, 8 de julio de 2024, 11:24:36 a. m.
La Unión-Quiroz bajo


lunes, 8 de julio de 2024, 11:25:13 a. m.
La Unión-Quiroz bajo

QUIROZ ALTO




miércoles, 31 de julio de 2024, 9:39:34 a. m.
La Unión- Quiroz alto


miércoles, 31 de julio de 2024, 9:39:44 a. m.
La Unión- Quiroz alto


miércoles, 31 de julio de 2024, 9:48:21 a. m.
La Unión- Quiroz alto


miércoles, 31 de julio de 2024, 9:56:46 a. m.
La Unión- Quiroz alto

LLANO GRANDE






30 jul. 2024 14:42:33
Altitud:1530.0m
Velocidad:0.0km/h
La Molienda
Vda. La Playa


30 jul. 2024 13:44:10
La Unión
La Unión
Nariño
Altitud:1505.0m
La Molienda
Vda. La Playa


30 jul. 2024 13:37:15
Vía sin nombre
La Unión
Nariño
Altitud:1527.0m
La Molienda
Vda. La Playa

COPIA DE BITÁCORA MES DE JULIO DE 2024

EL PELIGRO

29-6-24 Clima: Soleado - Lluvioso.

Personal de obra: Maestro 3 Obreros. Ins. de interv equipo

Pa los condiciones climaticas que estan presentandose en el tramo a intervenir no se puede continuar con las actividades debido a que el material suministrado se encuentra saturado. y en malas ~~Cons~~ condiciones.

1-7-24 clima: Soleado - lluvioso.

Personal de obra: Maestro, 3 obreros, Ins Interv equipo.

Pa las condiciones climaticas no se logra la compactacion al 100% de la subbase.

2-7-24 clima: Soleado.

Personal de obra: Maestro, Inspector Int. 3 Ob equipo.

Se realiza la compactacion de la subbase. se espera que el laboratorista llege a la obra a la toma de densidades, Por el paro presentado en el departamento se le dificulta desplazarse.

Powered by CamScanner

COPIA DE BITÁCORA MES DE JULIO DE 2024

NUEVA FLORIDA

1/07/2024 Lunes

No hay actividades en obra debido a la falta de maquinaria; la maquinaria anteriormente contratada por Personal de la junta, se encuentra averiada según reporte el ingeniero residente, se esta a la espera de la contratación de una maquinaria diferente.

Resp. Contratista

Andrés Sosaé
Intementoría

2/07/2024 Martes

Clima: Seco.

Aún no hay reporte de la contratación de maquinaria para actividades de recompactación, la maquinaria que elaboro las actividades de riego y compactación en anteriores fechas aún se encuentra averiada.

Resp. Contratista

Andrés Sosaé
Intementoría.

3/07/2024 Miercoles

Clima: Seco

Se comunicó el Ingeniero Residente con el personal contratista de maquinaria pero nos informa que la maquinaria aún se encuentra averiada, que posiblemente en estos días nos dan una solución. así que se pide buscar una maquinaria diferente.

Resp. Contratista

Andrés Sosaé
Intementoría.

04/07/2024 Clima: Seco
Jueves Personal en Obra: Ing. Residente

No se ha recibido visto bueno por parte del dueño de la máquinaria y al ser la única cerca a la zona debemos esperar.

Resp. Contratista

Andrés Sosué
Interventoría

05/07/2024 Clima: Seco
Viernes Personal en Obra: Residente junta.

Sin actividades, aún no se ha logrado conseguir maquinaria por parte de la junta y la utilizada en tareas anteriores aún se encuentra averiada.

Resp. Contratista

Andrés Sosué
Interventoría

06/07/2024 Clima: Seco
Sábado No se laboró, por ser día de mercado.

08/07/2024 Clima: Seco
Lunes Personal en Obra: Residente junta.

Sin novedad, se ha insistido sobre la contratación de maquinaria pero aún no hay respuesta por parte de la Junta.

Resp. Contratista

Andrés Sosué
Interventoría.

09/07/2024 Clima: Seco
Martes Personal en Obra: Residente junta.

Sin novedad, se retoma el tema de la instalación de valla y de los avisos.

Resp. Contratista

Andrés Sosué
Interventoría.

10/07/2024 Clima: Seco
Miercoles Personal en Obra: Residente junta

Sin novedad, se nos informa que ya se esta en la busqueda de maquinaria distinta y que de igual manera se esta a la espera de la valla.

Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoría

11/07/2024 Clima: Seco
Jueves Personal en Obra: Residente junta.

Aún no se nos ha confirmado la contratación de maquinaria amarilla ni la llegada de la valla y overoles para el personal.

Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoría

12/07/2024 Clima: Seco
Viernes Personal en Obra: Residente junta.

Nuevamente se le ha insistido al residente de la junta la busqueda de maquinaria amarilla pero aún no se ha recibido una respuesta positiva, se nos comenta que esta a la espera y disposición de maquinaria amarilla de un municipio cercano a la zona.

Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoría

13/07/2024 Clima: Seco
Sabado Personal en Obra: Residente junta

Se hace un nuevo llamado sobre los temas de la instalación de valla, la llegada de los overoles para el personal y la contratación de maquinaria

Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoría

15/07/2024 Lunes
Clima: Seco
Personal en Obra: Residente junta

Se logra confirmar por parte del residente de la junta la contratación de maquinaria amarillo para corregir la compactación de la subbase, se recomienda de igual manera humedecer el material; la valla informativa y el equipo de dotación para el personal ya esta en camino.

Resp. Contratista

Andrés Sosaya
Interventoría

16/07/2024 Martes
Clima: Seco
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int

Se establece como fecha de llegada de la maquinaria el día de mañana 17 de julio en horas de la mañana.

Resp. Contratista

Andrés Sosaya
Interventoría

17/07/2024 Miercoles
Clima: Seco
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int. Maestro

El día de hoy no llego la maquinaria.
Se nota el material seco, por lo cual si es necesaria una humectación.

Resp. Contratista

Andrés Sosaya
Interventoría

18/07/2024 Jueves
Clima: Seco
Personal en Obra: Residente junta, Maestro, Obreros
Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Carrotanque

Compactación de subbase, se humedece el material para alcanzar los valores de compactación esperados.

Resp. Contratista

Andrés Sosaya
Interventoría

19/07/2024 Viernes
Clima Seco
Personal en Obra: Residente junta, Residente Int, Inspectos Int, Representante INVIAS territorial Nariño, Maestro

Visita de Representante de INVIAS Territorial Nariño, sin avance en obra a la espera de la toma de densidades

Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoría

20/07/2024 Sábado
Clima: Seco
No se laboró, se hapechdo al residente laborar los sábados pero no ha sido posible.

22/07/2024 Lunes
Clima. Seco
Personal en Obra: Residente junta, Maestro, Obreros, Inspectos Int

Toma de densidades

Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoría

23/07/2024 Martes
Clima. Seco
Personal en Obra: Residente junta, Maestro

Se esta a la espera de la llegada de los resultados de densidades de subbase se pide al residente ir solicitando todo el material necesario para iniciar labores de formaletos y posterior fundición.

Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoría

24/07/2024 Miercoles
Clima. Seco
Personal en Obra: Residente junta, Maestro

Sin novedades, ya se encuentra en obra la malla y los overoles

Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoría

25/07/2024 Clima: Seco
Jueves Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int

Sin novedades a la espera del envío de los resultados de densidades.
→ Se recibe respuesta positiva en cuanto a las densidades, cumplen los valores de /

Resp. Contratista

Andrés Sosaé
Interventoría

26/07/2024 Clima: Seco
Viernes Personal en Obra: Residente junta, Maestro, Obreros, Inspector Int.

Acopio de material, llegada de material pedrino, arena y subbase.
Llegada de cemento.

Resp. Contratista

Andrés Sosaé
Interventoría

27/07/2024 Clima. Seco
Sábado No se labora, el residente informa que por ser día de mercado. Llegada de mat. pétreo.

29/07/2024 Clima. Seco Equipo: Mezcladora, Vibrador, Herramienta menor, Restrillo
Lunes Personal en Obra: Residente junta, Maestro, Obreros

Formaleteo y amarre de acero para iniciar actividades de fundición de concreto reforzado, se utilizaron algunas platinas metálicas para la dilatación de las placas. losas de 1m de ancho con varilla #3/8" @ 20 cm en ambas direcciones.

Resp. Contratista

Andrés Sosaé
Interventoría

30/07/2024 Clima: Seco Equipo: Mezcladora, Vibrador, Herramienta menor, Restrillo
Martes Personal en Obra: Residente junta, SISO int, Inspector Int, Maestro, Obreros

Fundición de losas de concreto reforzado con un ancho de 1m, con un alcance de 15 paños, las viguetas van con varilla y flejes de 3/8" al igual que las placas

Resp. Contratista

Andrés Sosaé
Interventoría.

31/07/2024
Miercoles

Clima: Seco
Personal en Obra: Residente yunto, Maestro, Obreros
Equipo: Mezcladora, Vibrador, Herramienta menor. Rastrillo

Fundación de cato reforzado, losas de 1m de ancho x 0.15 de espesor; varilla 3/8" cada 20 en ambas direcciones, vigas de varilla de 3/8"

Resp. Contratista

Andrés Rosario
Interventoría

3-7-24 No se realizan actividades.

4-7-24 No se realizn actividades

5-7-24 No se realizan actividads

6-7-24 No se realizn actividads.

8-7-24 Toma de densidades Por Parte de la JAC el Peligro. en horas de la tarde 4PM se Programo una reunion con la comunidad Para despejar algunas dudas que ellos tienen frente a los trabajos que se estan adelantando en la obra.

9-7-24 clima soleado

Personal en obra: Nacho, ing residente 2 oficiales, ing inspectro. equipo. Herramienta Menor, Maquina

Por solicitud de la comunidad (Presidenta JAC) se realiza una prueba al Filtro construido. Cabe resaltar que este Filtro esta construido en una Pendiente que supera el 7%. esta actividad se la hace con una maquina que conduce agua asta la Kot095 y dejando caer el agua a este lugar.

10-7-24 clima soleado

Personal. Nacho, ing residente, 2 ayudantes, ing inspectro. equipo.

se Puede demostrar que el Filtro esta Funcionando a la Perfeccion, Por Parte de interventoria se solicita el cambio de Material desde la Kot095 hasta la Kot130 debido a que en este tramo se encuentra el material Plastico y Saturado lo cual no deja (su lo) que se Pueda realizar. las actividad de liberacion de este tramo se recomienda acoplar Material Petreo. Pero Por datos en la mina que suministra este material No se Puede llevar a acabo esta actividad. la interventoria Solicita el cambio de material en los abscisados Mencionados anteriormente.

11-7-24 clima: soleado.

Personal ing residente, 2 ayudante, ing inspecto, comun telegu equipo.

Por Parte de interventoria se hace el replanteo del tramo se va a intervenir de igual manera con las

el cual da la recomendacion de acopio de material petreo y arena, para el daño en la mina que provee estos materiales. no hace posible esta actividad. la subbase tampoco puede ser remolazada por q en la mina no hay material. se espera que el dia lunes se pueda continuar con esta actividad

12-7-24 clima Soleado.
Personal: ing residente, ing inspetra 2 oficiales.
equipo
por parte del residente acopio arena, y realiza la distribucion de los puntos y el eje de la via.
con ayuda de los oficiales.

13-7-24. Clima: Soleado.
Personal: Ing. residente, Ing. Inspector, 2 oficiales
No se realizan actividades en obra.

15-7-24. Clima. Soleado.
Personal: Ing. residente. Ing. Inspector, 2 oficiales se realiza el acopio de triturado y de piedra mejor para el concreto ciclopeo.

16-7-24. Clima. Soleado
Personal: Ing. residente. Ing. Inspector, 2 oficiales se realiza el acopio de Arena, se recibe manguera 100 m, un rollo, y claves. se procede hacer la conexion de agua de un arrollo. para almacenar. debido a la escases de agua. en el peligro se dificulta mucho almacenar agua. se esta recolectando agua en timbos o canecas de 50 galones

17-7-24. Clima. Soleado.
Personal: Ing. residente: Ing. Inspector: 3 oficiales.
se realiza. Corte de tablas para el formaleteo del Concreto ciclopeo.

18-7-24 Clima Soleado
Personal: Ing. residente: Ing. Inspector: 4 oficiales. Maestro. Ing. residente Interventoria.
se realiza el formaleteo y se comienzan a. rellenar con piedra para fundir el concreto ciclopeo.

Powered by CamScanner

Se recibe una carreta de Antisol, una escoba. Se realiza la entrega de guantes de dotacion por parte del Inspector de SST. Se recibe viaje de Piedra. 6 mt.

19-7-24. Clima. Soleado.
Personal: Ing. residente: Ing Ins. Interventoria, maestro y oficiales, Presidente junta. Ing. residente de Interventoria Se recibio la visita. por parte del Personal de Inuvus. la cual nos dan algunas recomendaciones. y nos informan hacerca de la fecha de entrega. En obra se realiza el terminado del formaleteo y la distribucion de piedra.

Ing. Residente

20-7-24. Clima Soleado.
Personal en obra: Ing residente, Ing. Ins. Interventoria Maestro, 5 oficiales.
Se realizó la conformacion de 9 modulos de 3 mt de concreto ciclopeo. se aplica antisol para el respectivo curado del concreto

Ing. resid

22-7-24. Clima Soleado.
Personal en Obra: Ing. residente: Ins. Interventoria Maestro, 6 oficiales.
Se realizo el acopio de Piedra y se conformo el concreto ciclopeo de los laterales dimensiones 0,45 m x 0,9 m x 3 m de largo. Se conformaron 18 modulos de 3 m en total.

Ing residente

23-7-24. Clima. Soleado.
Personal en Obra: Ing. residente. Ing Ins. Interventoria Maestro, ~~7~~ Oficiales.
Se realiza el acopio de material triturado, se procede a desencofrar el con Concreto ciclopeo y se realiza la empezar la actividad de excavación de vigas.

Ing. residente

24-7-24. Clima. Soleado.
Personal de Obra: Ing. residente. Ing. Ins. interventoria. Maestro, 7 Oficiales:
Se termina de realizar la excavación de vigas y se

comienza a extender y amarrar hierro de las losas. Ing residente

25-7-24 Clima Soleado

Personal en Obra Ing residente. Ing Ins de interventoria. Maestro, 9 Oficiales.

Se continua con el amarrado de hierro, de las losas, tambien se realiza el amarrado en las cunetas. y se hace una excavacion en la Cuneta para dark el espesor requerido a la Cuneta. tenemos un percance con el tramgo, la cual se procedio a remplazarlo por otro. Ing. residente

26-7-24 Clima Soleado

Personal en Obra: 9 Oficiales., el maestro, Ing residente, Ing, Ins Interventoria,

Se realizó la fundición del Concreto reforzado tanto para las losas como para las Cunetas

27-7-24 Clima. Soleado Ing residente.

Personal en Obra: 9 Oficiales, el maestro Ing. residente. Ing. Interventoria.

Se Continua con la fundición de Concreto reforzado. Ing residente

29-7-24 Clima soleado:

Personal en Obra: 9 Oficiales, Maestro, Ing residente, Ing, Ins. Interventoria.

Se continua Con la fundición del Concreto reforzado Se aplica antisol para un concreto fraguado del Concreto. tambien Se toman muestras para la resistensia del Concreto, Se toman 4 cilindros en la del Concreto de la losa izquierda, del Km. 000+005, a las 2:30 pm. Ing residente

30-7-24 Clima Soleado

Personal en Obra: 9 Oficiales, Maestro, Ing. residente, Ing. Ins. Interventoria.

Se realiza el acopio de Arena, tambien Se realiza el encofrado para la fundición del Concreto ciclopeo, Se tuvo un inconveniente

Con el trompo. y se procedio a Cambiarlo por otro, y se fundio la losa de transicion del K000-001. Ing residente.

31-7-24. Clima Soleado.
Personal en Obra: 9 Oficiales. Maestro, Ing. residente, Ing Ins Interventoria.
Personal por Parte de la junta. Para la Conformacion de Sub base.
Se llevo a cabo la conformación de la Sub base que estaba pendiente en el tramo. Km. 000+095 a la Km 000+130. este se llevo a cabo por personal calificado que lo envio la junta. realizaron una estabilización de la sub base existente con cemento, Primero Escarificaron con maquinaria motoniveladora, y aplicaron cemento y Compactaron con rana. en esta actividad el ingeniero residente no esta al frente.
Se realizo el acopio de un viaje de Arena. Como tambien se Conformo 9 modulos de Concreto ciclopeo, Se recibio 400 Varillas de 3/8 para el Concreto reforzado. Ing residente

1-8-24. Clima Soleado.
Personal en Obra: 9. Oficiales., Maestro, Ing. residente, Ing. Ins. Interventoria, Presidenta. Junta Comunal.
Se llevo a Cabo la Conformacion del Concreto ciclopeo. laterales. 9 modulos de 3 metros de largo. Se aplico antisol para un mejor Curado del Concreto. Como tambien se recibio 240 bultos de Cemento la Señora presidente estubo Presente. Ing residente.

2-8-24. Clima. Soleado.
Personal en Obra: 9 Oficiales, Maestro, Ing. residente, Ing. Ins. Interventoria.
Se llevo a Cabo el desencofrado del concreto ciclopeo, y se llevo a Cabo el amarre del

COPIA DE BITÁCORA MES DE JULIO DE 2024

EL SAUCE

01/07/2024	√No hay novedades
Lunes	Julieth Zúniga Gómez.
02/07/2024	√No hay novedades
Martes	Julieth Zúniga Gómez
03/07/2024	√No hay novedades
Miércoles	Julieth Zúniga Gómez.
04/07/2024	No hay novedades Julieth Zúniga Gomez.
Jueves	
05/07/2024	√No hay Novedades
Viernes	Julieth Zúniga Gómez.
06/07/2024	√No hay Novedades
Sábado	Julieth Zúniga Gomez.
08/07/2024	√No hay Novedades
Lunes	Julieth Zúniga Gomez
09/07/2024	√Clima: Seco.
Martes	√Equipo: No se utilizo.
	√Personal en obra: Ing. residente de obra, ing residente de interventoría y virtual Ing. Mauricio Quiroga de interventoría, presidente de la JAC, profesional social, Contadora, veeduría, tesorero, comunidad.
	√ Se realiza comité N°4 donde se socializa con todos los presentes asuntos relacionados con la obra y la parte contable, todo marcha bien y no se presentan novedades.
	Julieth Zúniga Gómez.
10/07/2024	√No hay novedades
Miércoles	Julieth Zúniga Gómez.
11/07/2024	√ No hay novedades
Jueves	Julieth Zúniga Gómez.
12/07/2024	√No hay novedades
Viernes	Julieth Zúniga Gómez.
13/07/2024	√ No hay novedades
Sábado.	Julieth Zúniga Gómez.
15/07/2024	√No hay novedades
Lunes	Julieth Zúniga Gómez.

16/07/2024 Martes
✓No hay novedades
Julieth Zúñiga Gómez

17/07/2024 Miércoles
✓ Clima : Seco
✓ Personal en obra : (2) Ayudantes.
✓ Herra : No se utiliza.
✓ Se realiza descargue de 150 bultos de cemento y 3 viajes de arena.
Julieth Zúñiga Gómez.

18/07/2024 Jueves.
✓ Clima : Seco
✓ Equipo : herramienta menor, trompo, vibrador, equipo necesario para realizar pavimento rígido, pajarita.
✓ Personal en obra : (1) maestro, (7) ayudantes, ing. residente de obra, ing. inspectora de interventoría, contadora, operario de pajarita presencia SST
✓ Se inicia con formaleteo y fundición de pavimento del carril derecho vía Sauce-la Unión ; con un rendimiento de 6 paños (3.50 x 2.60)m y 73 bultos utilizados.
✓ Acopio de material con pajarita (Arena y triturado)
Julieth Zúñiga Gómez.

19/07/2024 Viernes
✓ Clima : Seco
✓ Equipo : herramienta menor, trompo, vibrador, cortadora, elementos necesarios para realizar pav. rígido.
✓ Personal en obra : (1) Maestro (7) Ayudantes, Ing. residente de obra, Ing. inspectora de interventoría, contadora, presencia SST, presidente de la JAC, profesional social, presidenta asociaciones de la JAC, visita INVIAS Territorial Nariño.
✓ Se continua con fundición de formaleteo del carril derecho vía Sauce-la Unión. con un rendimiento de 6 paños (3.50 x 2.60)m y 60 bultos utilizados
✓ Se realiza corte de juntas de fundición del día anterior.
Julieth Zúñiga Gómez.

20/07/2024 Sábado
✓ Clima : Seco
✓ Equipo : herramienta menor, vibrador de concreto, trompo, cortadora, elementos necesarios para la fundición de pav. rígido.
✓ Personal en obra : (1) Maestro, (7) Ayudantes, Ing. residente de obra, Ing. inspectora de interventoría, contadora, presencia del Presidente de la JAC.
✓ Se continúa con formaleteo y fundición del carril derecho vía Sauce-la Unión, con un rendimiento de 3 paños (3.50 x 2.60)m
✓ Se realiza corte de juntas del día anterior
✓ Se realiza formaleteo y fundicion de 35 m de bordillo.
Julieth Zúñiga Gómez.

22/07/2024 Lunes

✓ Clima: Seco

✓ Equipo: Herramienta menor, vibrador de concreto, trompo, cortadora, elementos necesarios para realizar pav. rígido

✓ Personal en obra: (1) Maestro, (6) Ayudantes, Ing residente de obra, Ing. inspector de interventoría, contadora, presencia del presidente de la JAC

✓ Se continúa con fundición y formaleteo del carril derecho vía Sauce - la unión, con un rendimiento de 5 placas (3.50 x 2.60)m y 68 bultos utilizados

Julieth Zúñiga Gómez

23/07/2024 Miércoles

✓ Clima: Seco

✓ Equipo: herramienta menor, vibrador de concreto, trompo, cortadora, elementos necesarios para fundición de pav. rígido.

✓ Personal en obra: (1) Maestro (8) Ayudantes, Ing. residente de obra, Ing. inspector de interventoría, contadora, presencia presidente de la JAC

✓ Se continúa con formaleteo y fundición del carril derecho vía Sauce-la Unión con un rendimiento de 6 placas (3.50 x 2.60)m y 75 bultos utilizados.

✓ Se descarga 100 bultos de cemento cemex

✓ Se recibe 2 viajes de arena

✓ Se resibe bulguen para sello de juntas

✓ En el transporte de arena y su debida descarga una de las volquetas le ocacionó una fisura al terminar la última placa del carril izquierdo vía Sauce - la Unión, este ya se encontraba terminado y con más de 28 días de fraguado, también cabe mencionar que en esa misma placa un día desconocido un automovil desconocido le realizo otra fisura al la mismo placa en la esquina derecha vía sauce-la Unión

✓ Se realiza corte de juntas de la fundición del día anterior.

Julieth Zúñiga Gomez.

23/07/2024 Martes.

✓ Clima: Seco

✓ Equipo: Herramienta menor, trompo, cortadora, vibrador de concreto, elementos necesarios para la pavimentación.

✓ Personal en obra: (1) Maestro (8) Ayudantes, Ing. residente de obra, Ing. inspectora de interventoría, contadora, presencia, presidente de la JAC.

✓ Se continúa con formaleteo y fundición del carril derecho vía Sauce - la unión, con un rendimiento de 5 placas.

✓ Terminan de fundir a las 2:50 pm, ya que, se terminó el cemento y este llegó tarde debido a que la vía por donde se transporta de manera habitual se encontraba cerrada

✓ Se realizan actividades de formaleteo para el día siguiente
✓ Se descarga 100 bultos de cemento cemex
✓ Se realizan actividades de formaleteo para bordillo carril derecho vía Sauce - La Unión.

Julieth Zúñiga Gómez.

25/07/2024 Jueves

✓ Clima: Seco
✓ Equipo: herramienta menor, vibrador de concreto, trompo, cortadora, pajarita, elementos necesarios para la fundición de pav. rígido
✓ Personal en obra: (1) Maestro, (8) Ayudantes, operario de pajarita, Ing. residente de obra, Ing. inspectora de interventoría, contadora, presencia de la SST
✓ Se continúa y finaliza con formaleteo y fundición del carril derecho vía Sauce - la Unión, con un rendimiento de 6 placas (3.5 * 2.60 y 4.4 X 2.60) m y 83 bultos
✓ Se realiza corte de juntas de la fundición del día anterior
✓ Se acopia material con pajarita (arena y triturado).
✓ Se recibe un viaje de recebo
✓ Se realiza fundición de bordillo con un rendimiento de 38.5 ml

Julieth Zúñiga Gómez.

26/07/2024 Viernes

✓ Clima: Seco
✓ Equipo: herramienta menor, vibrador de concreto, trompo, cortadora de concreto, elementos necesarios para la fundición de pav.
✓ Personal en obra: (1) Maestro, (8) Ayudantes, ing. residente de obra, ing. inspectora de interventoría, contadora, presencia SST, presidente de la JAC.
✓ Se continúa con formaleteo y fundición del tramo del carril izquierdo vía Sauce - la Unión que había quedado pendiente, ya que ese tramo era utilizado para transportar material (triturado) que se encontraba acopiado cerca de allí, rendimiento 3 placas (3.50 x 2.60) m
✓ Se realiza corte de juntas de la fundición del día anterior.
✓ Se continúa con formaleteo y fundición de bordillo con un rendimiento de 42 ml
✓ Se realiza formaleteo y fundición del lado izquierdo de la rampa de acceso al colegio IDR (Instituto y desarrollo rural)
✓ Se utilizaron 54 bultos de cemento en las fundiciones.

Julieth Zúñiga Gómez.

27/07/2024 Sábado	✓Clima: Seco ✓Equipo: herramienta menor, vibrador de concreto, trompo, cortadora, elementos necesarios para la fundición de concreto ✓Personal en obra: (1) Maestro (8) Ayudantes, Ing. residente de obra, Ing. inspectora de interventoría, contadora, presencia del presidente de la JAC ✓ Se realiza corte de juntas de la fundición del día anterior ✓ Se continúa con formaleteo y fundición de bordillo ✓ Se continúa y finaliza fundición de rampa de acceso al colegio IDR ✓ Se realiza sello de juntas con un rendimiento de 113.2m Julieth Zuñiga.
29/07/2024 Lunes	✓Clima: Seco ✓ Equipo: herramienta menor, vibrador de concreto, trompo, cortadora de concreto, elementos necesarios para la fundición de pav. ✓Personal en obra: (1) Maestro (4) Ayudantes, Ing. residente de obra, Ing. inspectora de interventoría, contadora, presencia del presidente de la JAC, veeduría. ✓ Se realiza corte de juntas de la fundición del día anterior. ✓ Se continúa y finaliza con formaleteo y fundición de bordillo. ✓ Se realiza demolición del tramo de placa huella C que había sido dañado, ya que la máquina en la nivelación del terreno partió un tubo de agua que pasaba debajo del concreto) posterior a eso se realiza su debida reparación. Julieth Zuñiga ✓ Se realiza sello de juntas con un rendimiento de 61.7m
30/07/2024 Martes	✓ Clima: Seco ✓ Equipo: No se utiliza. ✓ Personal en obra: (1) Maestro, Ayudantes ✓ Se realiza el cargue y retiro del equipo y herramienta menor para la vereda Llano Grande. Julieth Zuñiga.
31/07/2024. Miércoles	✓Clima: Seco ✓ Personal Asistente presencial y virtual: Ing. residente de obra, contadora, presidente de la JAC, Profesional social, director de interventoría, Ing. residente de interventoría, Ing. inspectora de interventoría ✓ Se realizo el comité # 5 y se finalizo con satisfacción, sin ninguna novedad. Julieth Zuñiga Gómez.

COPIA DE BITÁCORA MES DE JULIO DE 2024

LLANO GRANDE

01/07/2024 - Clima: Seco
Lunes - Personal en obra: (1) Maestro (8) Ayudantes, ing. residente de obra, ing. inspectorde de interventoría.
- Equipo: herramienta menor, hompo, vibrador de concreto, formaletes, elementos necesarios para la fundición de pav. rígido, cortadora de pav.
- Se continúa y finaliza con formaleteo y fundición de pav del carril derecho vía Llano G- La unión, con un rendimiento de 8 paños de (3.50m x 2.50m) y corte de juntas de fundición del día anterior.
Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

02/07/2024 - Clima: Seco.
Martes - Personal en obra: (1) Maestro, (1) Ayudante, ing. residente de obra. ing. inspectora de interventoría.
- Equipo: cortadora de pavimento
- Corte de juntas de la fundición del día anterior.
Julieth Zúñiga Gómez. Juan G Martinez

03/07/2024 - No hay novedades
Miercoles Julieth Zúñiga G. Juan G martinez

04/07/2024 - No hay novedades
Jueves Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

05/07/2024 - No hay novedades
Viernes Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

06/07/2024 - No hay novedades
Sábado Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

08/07/2024 - No hay novedades
Lunes Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

09/07/2024 - No hay novedades
Martes Julieth Zúñiga G. Juan G martinez

10/07/2024 - No hay novedades
Miercoles Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

11/07/2024 - No hay novedades
Jueves Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez

12/07/2024 - No hay novedades
Viernes Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez.

13/07/2024 - No hay novedades
Sábado Julieth Zúñiga G. Juan G martinez

15/07/2024 - Noday novedades
Lunes Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez.

16/07/2024 Martes	- No hay novedades Julieth Zúñiga G. Juan G Martinez.
17/07/2024 Miércoles	- No hay novedades Julieth Zúñiga G. Juan G martinez.
18/07/2024 Jueves	- Clima: Seco. - Se informa el cambio de Ing. residente de obra desde el 13/07/2024 por causas aceptadas por parte de interventoría en este caso el Ing. residente Juan Guillermo Martinez es reemplazado por la Ing. Residente de Obra Lissete Diaz.
19/07/2024 Viernes	- No hay novedades Julieth Zúñiga Gomez.
20/07/2024 Sábado	- No hay novedades Julieth Zúñiga Gomez.
22/07/2024 Lunes	- No hay novedades Julieth Zúñiga Gomez.
11/07/2024 Jueves Observación y continuación de acontecimiento.	- Clima: Seco Se Realiza comite N° 4 donde finalizo de manera satisfactoria. y no se presenta ninguna novedad. -Personal presente presencial y virtual: Ing. residente de obra. Ing. Inspectora de interventoría, contadora, veeduría, representante legal, ing. residente de interventoría.
23/07/2024 Martes	- No hay novedades Julieth Zúñiga Gómez.
24/07/2024 Miércoles	- No hay Novedades Julieth Zúñiga Gómez.
25/07/2024 Jueves	- No hay Novedades Julieth Zúñiga Gómez.
26/07/2024 Viernes	- No hay Novedades Julieth Zúñiga Gómez.
27/07/2024 Sábado	- No hay Novedades Julieth Zúñiga Gomez.
29/07/2024 Lunes	- No hay Novedades Julieth Zúñiga Gomez.
30/07/2024 Martes.	- Clima: Seco - Equipo: Herramienta menor, trompo, vibrador de concreto, cortadora de concreto, elementos necesarios para la fundición de pav. rígido.

Personal en obra: (1) Maestro (7) Ayudantes, Ing. Residente de obra Ing. inspectora de interventoría presencia de SST, Ing. residente de interventoría.

- Se realiza recibimiento y descarga del equipo necesario para la fundición, desde la vereda el salce
- Se inicia formaleteo y fundición de pavimento del carril izquierdo vía Llano Grande - la Unión con un rendimiento de 2 placas (3.5 x 280)m y 26 bultos utilizados.
- Se recibe un viaje de arena.

*Andrés Sosa

31/04/2024 Miercoles

- Clima: Seco
- Equipo: Herramienta menor, trompo, vibrador de concreto, cortadora de concreto, elementos necesarios para la pav.
- Personal en obra: (1) Maestro (7) Ayudantes, Ing residente de obra, Ing. inspectora interventoría.
- Se continúa con la fundición y formaleteo del carril izquierdo vía Llano Grande - la Unión con un rendimiento de 6 placas (3.50 x 2.50)m.

*Andrés Sosa

COPIA DE BITÁCORA MES DE JULIO DE 2024

OLIVOS

1/07/2024 Clima: Seco Equipo: Herramienta menor
Lunes Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros
Se recibe 1 viaje de Arena, sin mayor avance en obra

Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Interventoría

2/07/2024 Clima: Seco Equipo: Herramienta menor
Martes Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros
Sin avance en obra, acopio de cemento para un total en Obra de 707 bultos.

Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Interventoría

3/07/2024 Clima: Seco
Miércoles Equipo: Herramienta menor, mezcladora de concreto, vibrador
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros.

Actividades de formaleteo para proceder con la fundición del concreto ciclopeo.
Llegada de vibrador, mezcladora. Se reciben 2 viajes de triturado.

Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Interventoría

04/07/2024 Clima: Seco
Jueves Equipo: Herramienta menor, mezcladora, vibrador
Personal en Obra: Residente junta, Maestro, Obreros, Inspector Int.

Se procede a terminar unos detalles de formaletas, humedecer la estructura, acopio de piedra rajón junto y a lo largo de la zona a fundir.
Inicio de fundición, losas de concreto ciclopeo de 0.9 y 0.45m.
2pm, se paran actividades por fallas en la mezcladora y presencia de lluvias.

Carmen Emilia S.
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Interventoría

05/07/2024 Clima: Seco
Viernes Equipo: Herramienta menor, mezcladora, vibrador.
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros.

El día de ayer 04/Julio despues de parar las actividades por algunos inconvenientes con la mezcladora, la residente procedió a buscar otra, la cual llego el día de ayer, se ensayo y se procedera a darle uso el día de hoy.
Se continuara con la fundición del cto ciclopeo, paños de 0.9mx2.8m y 0.45x2.8m con espesores de 0.15m.,

*Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Fosaé
Interventoría

06/07/2024 Clima: Seco
Sábado Equipo: Mezcladora, Vibrador, Herramienta menor, Rastrillo
Personal en Obra: Residente junta. Maestro, Obreros

Se procederá con actividades de instalación de acero de refuerzo para huellas, cunetas e instalación de vigas; así también se desformaleteará el cto ciclopeo terminado de fundir el día de ayer.

*Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Fosaé
Interventoría.

08/07/2024 Clima: Seco
Lunes Equipo: Mezcladora, Vibrador, Herramienta menor, Rastrillo
Personal en Obra: Residente junta, Maestro, Obreros, Inspector Int.

Se continúa con la terminación del armado de acero y formaleteo.
1pm, inician las labores de fundición de huellas, cunetas y vigas.
Quedan pendientes por fundir 12m. de los 27m inicialmente formaleteados

*Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Fosaé
Interventoría

09/07/2024 Clima: Seco
Martes Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros

Se continuaron con las actividades de fundición del ccto reforzado para poder culminar los metros inicialmente formaleteados.
Toma de testigos, 3 cilindros. Se completa un total de 27m de plena huella.

*Carmen Emilia S
Resp. contratista

Andrés Sosa
Interventoría

10/07/2024 Clima: Seco
Miércoles Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros

Actividades de desencofrado y formaleteo para fundición de concreto ciclópeo.
Se inician las fundiciones de ccto ciclopeo. respetando la proporción 60, 40.

*Carmen Emilia S
Resp. contratista

Andrés Sosa
Interventoría.

11/07/2024 Clima: Seco
Jueves Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros.

Fundición de ccto ciclopeo; actividades de formaleteo y amarre de acero para ccto reforzado

*Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Interventoría

12/07/2024 Clima: Seco Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor.
Viernes Personal en Obra: Residente junta, SISO int, Social Int, Inspector Int, Maestro, Obreros

Fundición de ccto reforzado; se procederá a la presentación del cómite #4.

*Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Interventoría

13/07/2024 Clima: Seco
Sábado. Equipo: Vibrador, Mezcladora, Rastrillo, Herramienta menor
Personal en Obra: Residente jonta, Inspector Int, Maestro, Obreros

Se continuará con actividades de fundición de ecto reforzado, espesor e=0,5m

*Carmen Emilia S
Resp. contratista

Andrés Sosaé
Interventoría

15/07/2024 Clima: Seco
Lunes Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente jonta, Maestro, Obreros, Inspectos Int.

Fundición de cunetas ecto reforzado, simultaneamente se procede con actividades de formaleteo para ecto ciclopeo; se alcanza a culminar 30m más de ecto reforzado.

*Carmen Emilia S
Resp. contratista

Andrés Sosaé
Interventoría

16/07/2024 Clima: Seco
Martes Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente jonta, Inspector Int, Maestro, Obreros.

Se terminaran las actividades de formaleteo las tablas para formaleteo no presenta torceduras ni fisuras; fundición de ecto ciclopeo.

*Carmen Emilia S
Resp. contratista

Andrés Sosaé
Interventoría

17/07/2024 Clima: Seco Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor.
Miercoles Personal en Obra: Residente jonta, Inspector Int, Maestro, Obreros

Fundición de ecto ciclopeo, se esta respetando la proporción 60/40, se ha estado aplicando antisol a todas las tapas y vigas ya fundidas.

*Carmen Emilia S
Resp. contratista

Andrés Sosaé

18/09/2024 Clima: Seco
Jueves Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros.

Actividades de formaleteo y amarre de acero para ccto reforzado

*Carmen Emilia S
Resp. contratista

Andrés Sosa
Interventoría

19/09/2024 Clima: Seco
Viernes Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor
Personal en Obra: Residente junta, Residente Int Social Int, Inspector Int, Maestro, Obreros, Representante Territorial Nariño INVIAS.

Fundición de ccto reforzado, a la espera de la visita del ente representante de lo Territorial INVIAS Nariño. Visita del Ing. Milton Jesús Bolaños. Toma de testigos.

*Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Interventoría

20/09/2024 Clima: Seco
Sábado Equipo: Mezcladora, Vibradors, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Maestro, Inspector Int, Obreros

Fundición de losas de ccto reforzado; se culminan un total de 87m de placa huella.

*Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Interventoría

22/09/2024 Clima: Seco Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor.
Lunes Personal en Obra: Residente junta, Maestro, Obreros, Inspector Int.

Actividades de formaleteo para fundición de losas de ccto ciclopeo, se verifica que la tabla este en buen estado y sin orgueos.

*Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Interventoría

23/07/2024 Martes
Clima: Seco
Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor
Personal en Obra: Residente junta, SISO Int, Inspector Int, Maestro, Obreros

Se procederá con fundición de losas de ccto ciclopeo, el día de ayer 22 de Julio se lograron formaletear 30m respetando los anchos de la placa.

*Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Interventoría

24/07/2024 Miercoles
Clima: Seco
Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros

Formaleteo y ubicación de castillos, se procederá al amarre de aceros para ccto reforzado, varillas de 3/8" espaciadas cada 20 cm. en ambas sentidos

*Carmen Emilia S
Resp. contratista

Andrés Sosa
Interventoría

25/07/2024 Jueves
Clima: Seco
Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor
Personal en Obra: Residente junta, Maestro, Obreros, Inspector Int.

Amarre de aceros y fundición de ccto reforzado, sin mayor novedad.

*Carmen Emilia S
Resp. contratista

Andrés Sosa
Interventoría

26/07/2024 Viernes
Clima: Seco Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros

Se continuo con las actividades de fundición de ccto reforzado, se tomaron 3 testigos para romper, hasta la fecha quedan en obra 136 bultos de cemento.

*Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa

27/07/2024 Sin personal en obra.
Sabado

29/07/2024 Clima: Seco
Lunes Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta Menor
Personal en Obra: Presidente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros

Actividades de formaleteo para concreto ciclópeo, acopio de material. Inician las tareas de fundición de ciclopeo. 9m formaleteados. Se recibe un viaje de arena 6m³.

* Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Intewentoría.

30/07/2024 Clima: Seco
Martes Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta Menor.
Personal en Obra: Presidente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros

Se continuará con actividades de fundición de las losas de ciclopeo. a la espera de poder culminar con los metros formaleteados el día de ayer.

* Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Intewentoría.

31/07/2024 Clima: Seco
Miercoles Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta Menor.
Personal en Obra: Presidente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros.

Desformaleteo, conformación de suelo para ubicación de vigas, danaire de acero; Socalización de lista de costos y desembolsos aprobados hasta la fecha junto a la residente y la presidente de la junta, actualizando la meta física pasando así de 156m de placa huella a 159m

* Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Intewentoría.

COPIA DE BITÁCORA MES DE JULIO DE 2024

QUIROZ ALTO

-olqueta para el vertido del material.

Nicol Paola Munar

01/07/24 Lunes	• clima: seco • personal en obra: Residente, Inspector, operario volqueta, Maestro de obra, 2 obreros • Equipo: volqueta, Rana - compactadora, Hl menor • llego tres viajes de recebo para conformar la parte lateral de donde se saco el material de sub-base, y con la rana se procede a compactar, se termina de compactar todo el lado lateral del canal derecho.
2/07/24	Sin actividades
3/07/24	Sin actividades
4/07/24	Sin actividades
5/07/24	Sin Actividades
8/07/24	Sin Actividades
9/07/24	Sin Actividades
10/07/24	Sin Actividades
11/07/24	Sin Actividades
12/07/24	Sin Actividades

Nicol Paola Munar

Powered by CamScanner

11/07/24 Jueves
- clima: Seco
- personal en obra: Residente, Inspector de obra, Maestro de obra 8 obreros
- Equipo: Mezcladora, Vibro de concreto, H. menor
- se empieza con la instalación de formaleta desde la abscisa
- se hacen actividades de fundición de concreto rigido para el carril derecho.
- Se funden 4 losas en total de concreto rigido.
- se toma prueba de slump con el cono de Abrams.

Nicol Paola Huron

12/07/24 Viernes
- clima: Seco
- personal en obra: Residente de obra, Inspector inter, Maestro de ob 8 obreros
- Equipo: Mezcladora, vibro de concreto, cortadora, H. menor
- se continua con actividades de fundición, anterior a esto se arma la formaleta.
- al finalizar la fundición se hacen los cortes transversales para la dilatación de las losas fundidas el anterior dia
- para el dia de hoy se funden 7 losas en total de concreto.

Nicol Paola Huron

13/07/24 Sábado
- clima: Seco
- personal en obra: Residente de obra, Inspector Inter. Maestro de 8 obreros
- Equipo: Mezcladora, vibro de concreto, cortadora, H. menor
- se arma formaleta para la fundición de tres losas de concreto, y termina la fundición sin más novedades.
- se hacen cortes transversales a las losas fundidas anteriormente.

Nicol Paola Huron

15/07/24 Lunes
- clima: Seco
- personal en obra: Residente de obra, Inspector, Maestro, 8 obreros
- Equipo: Mezcladora, Vibro Concreto, Cortadora, H. menor
- se arma formaleta para fundir
- se continúan fundiendo las losas de concreto
- En total se funden 4 losas
- se hacen cortes transversales en las losas fundidas anteriormen

Powered by CamScanner

16/07/24 Martes
- Clima: Seco
- personal en obra: Residente de obra, Inspector inter. Maestro de obra, 8 obreros.
- Equipo: Mezcladora, vibro (compactador) concreto, cortadora, H. menor
- Se continuan actividades de fundición de concreto rigido
- Se hacen cortes transversales sobre las losas fundidas el dia anterior
- se funden 6 losas en total.
- se toman muestras para ensayos
- se hace acopio de las bolsas de cemento en estopas y se almacenan en la bodega.

Nicol Paola Muñoz

17/07/24 Miércoles
- Clima: seco
- personal en obra: Residente, Inspector inter. Maestro de obra, 10 obreros
- Equipo: Mezcladora, vibro concreto, cortadora, H. menor
- Se instala formaleta para continuar con la fundicion
- se continua fundiendo las últimas 4 losas del carril derecho
- se hacen cortes transversales a las losas fundidas el dia anterior
- tambien se funden una losa del carril izquierdo al lado de la alcantarilla en la abs Km 90,9 hasta la Km 94,4

Nicol Paola Muñoz

18/07/24 Jueves — Sin actividades

19/07/24 Viernes
- Clima: Seco
- personal en obra: Residente obra, Residente interventoria, Ingeniero representante INVIAS territorial Nariño, Inspector, profesional Social, presidente de la Junta.
- Se hizo acompañamiento a la visita del ingeniero Hilton delegado del INVIAS territorial Nariño.

20/07/24 Sábado — Sin Actividades

22/07/24 Lunes

- clima: seco
- personal en obra: Residente, Inspector, 1 obrero
- Se le hace entrega al señor Lionso propietario de la vivienda que sufrió afectación en el talud de:

	Unidad
✓ Bloque en concreto	200
✓ varilla #12	40
✓ arena	2 m^3
✓ triturado	3 m^3
✓ varilla #11	8
✓ alambre	15 kg
✓ caja de clavos 2½"	5 (cajas)
✓ chipa 1lu	70 kg
✓ 1 viaje de gravilla	6 m^3
✓ tabla	20 tablas
✓ cemento	

- El obrero continua con el amarre de varilla para bordillo-cuneta izq

23/07/24 Martes

- Clima: seco
- personal en obra: Residente, Inspector, 1 obrero
- Equipo: herramienta menor.
- Continúan con el amarre de hierro para bordillo
- Se hace visita de seguimiento a la vivienda de la señora Gladis,
- No se reporta ninguna novedad, ni afectaciones mayores en la vivienda

24/07/24 Miércoles — Sin Actividades

25/07/24 Jueves — Sin Actividades

6/07/24 Viernes — Sin Actividades

7/07/24 — Sin Actividades

Powered by CamScanner

29/07/24 Lunes
- Clima: Seco
- personal en obra: Residente, Inspector, obrero
- Equipo: herramienta menor
- Se instala formaleta para bordillo
- Se funden de bordillo - carril izquierdo

30/07/24 Martes
- Clima: Seco
- personal en obra: Residente, Inspector, 2 obreros
- Equipo: herramienta menor
- Se descubre bordillo fundido el anterior dia
- Se instala formaleta para bordillo
- Se funden de bordillo - carril izquierdo.

31-7-24 Clima seco
No se realizaron actividades en obra,

Powered by CamScanner

carril derecho y se hace el retiro de [illegible]
lo retroexcavadora y una volqueta para el desalojo del mismo.

Nicol Paola Muñoz

07/24 • clima: seco
• personal en obra: Residente, Inspector, operario volqueta, Maestro de obra, 2 obreros.
• Equipo: volqueta, Rana - compactadora, H. menor
• llego tres viajes de recebo para conformar la parte lateral de donde se saco el material de sub-base, y con la rana se procede a compactar,
• se termina de compactar todo el lado lateral del carril derecho.

Nicol Paola Muñoz

/07/24 Sin actividades
/07/24 Sin actividades
/07/24 Sin actividades
/07/24 Sin Actividades
07/24 Sin Actividades
/07/24 Sin Actividades
/07/24 Sin Actividades
/07/24 Sin Actividades

Powered by CamScanner

COPIA DE BITÁCORA MES DE JULIO DE 2024

QUIROZ BAJO

- Se realizan actividades de corte y soldadura de canastillas

- clima: seco
- personal en obra: Residente, Inspector, 1 obrero (soldador)
- Equipo: cortadora de acero, soldadora, herramienta menor.
- Se continúa realizando actividades de corte y soldadura de canastillas

- clima: seco
- personal en obra: Residente, Inspector, 1 obrero (soldador)
- Equipo: cortadora de acero, soldadora, H. menor.
- Continuan trabajos de corte y soldadura de canastillas

Powered by CamScanner

02/07/24 Martes
- clima: seco
- Equipo en obra: pajarita, Mezcladora, vibro de cemento, Soldadora, H. menor
- personal en obra: residente, inspector, operario pajarita, soldador, 7 obreros y 1 Maestro de obra.
- Se llevan a cabo trabajos de limpieza de la sub-base para hacer la instalación de la formaleta para posteriormente fundir.
- continúan con actividades de soldadura de canastillas

03/07/24 Miércoles
- clima: húmedo
- Equipo en obra: Mezcladora, vibro de concreto, cortadora de concreto, H. me
- personal en obra: residente, inspector, Maestro de obra, 8 obreros
- Comienzan actividades de fundición de concreto rigido
- continúan actividades de Soldadura de canastillas
- Se funden en total 7 losas de 3,50 m.l.

04/07/24 Jueves
- clima: seco
- Equipo en obra: Mezcladora, vibro de concreto, cortadora de concreto, Soldadora, H. menor
- personal en obra: residente, Inspector, Maestro de obra, 8 obreros, Soldado
- Continúan actividades de soldadura de canastillas
- Continuan con las actividades de fundición
- Se funden 5 losas de concreto. en total, y se realiza corte transversa de las losas de concreto

05/07/24 Viernes
- clima: húmedo
- Equipo en obra: Mezcladora, vibro de concreto, cortadora de concreto. Soldadora, H. menor.
- personal en obra: Residente, inspector, Maestro de obra, 8 obreros, Soldado
- se realizan actividades de soldadura de canastillas
- continuan trabajos de fundición de concreto rigido
- Se funden 6 losas en total y se analiza con el corte transversal de las losas de concreto.

:/07/24 Sabado
- clima: húmedo
- personal en obra: Residente, inspector, Maestro de obra, 7 obreros, Soldador
- Equipo: Mezcladora, vibro de concreto, cortadora de concreto, Soldadora, H. menor

Powered by CamScanner

. continúan trabajos de soldadora de conastillas, y fundición de las losas de concreto, en total se funden 3 losas de concreto.

1/07/24 . clima: seco
unes . personal en obra: Residente, Inspector, profesional SST, Maestro de obra, 7 obreros
. Equipo: Mezcladora, vibro concreto, cortadora de concreto, H. menor
. se instala formaleta y se continúo con trabajos de fundración
. y se termina con corte de losas transversalmente.

2/07/24
artes . clima: seco
. personal en obra: Residente, Inspector, Maestro de obra, 7 obreros
. Equipo: Mezcladora, vibro concreto, cortadora, H. menor, Pajarita.
. se instala formaleta, y se continúa con la fundición del concreto rigido
. con la ayuda de la pajarita se mueve un material petreo que estaba mal ubicado y retrasaba los trabajos de fundición
. al finalizar la fundición se hacen cortes transversales en las losas fundidas el día anterior.
. se ucopian los bolsos de cemento en estopas y se almacenan en la bodega.

3/07/24 . clima: seco
iércoles . personal en obra: Residente, Inspector, Maestro de obra, 7 obreros
. Equipo: Mezcladora, vibro concreto, Cortadora, H. menor
. se instala formaleta, y luego se continúa con la fundición de concreto rigido
. se hacen corte transversales en las losas fundidas el día anterior
. se toma muestra de slump y se toman muestras de vigas.
.

11/07/24 Jueves
- clima: seco
- personal en obra: Residente de obra, Inspectoo, maestro
- Equipo:
- No pudieron continuar con los trabajos de fundición debido a la falta de material pétreo (triturados), la mina encargada de suministrar este material manifiesta que tuvo un daño en la trituradora.

12/07/24 Viernes
Sin actividades

13/07/24 Sábado
Sin actividades

15/07/24 Lunes
Sin actividades

16/07/24 Martes
Sin actividades

17/07/24 Miércoles
- Clima: seco
- personal en obra: Residente, Inspector, profesional social, presidente de la junta, representantes de la veeduría
- Se llevo acabo el Cómite operativo # 4 a las 5:00 de la tarde en la casa del presidente de la junta en la vereda Quiroz bajo.

18/07/24 Jueves
Sin actividades

19/07/24 Viernes
- Clima: seco
- Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, Inspector, Profesional Social, presidente de la junta, Ingeniero representante INVIAS
- Se hizo acompañamiento a la visita del ingeniero Milton, delegado del INVIAS territorial Nariño.

Powered by CamScanner

20-7-24 No se realizan actividades
22-7-24 No se realizaron actividades
23-7-24 No se realizaron actividades
24-7-24 No se realizaron actividades
25-7-24 No se realizaron actividades
26-7-24 No se realizaron actividades
27-7-24 No se realizaron actividades
29-7-24 No se realizaron actividades
30-7-24 No se realizaron actividades
31-7-24 No se realizaron actividades

Powered by CamScanner

SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO DE 2024

INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10

CONTRATO No. 5065 - 2023

Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y los organismos de Acción Comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total Lote -2

Veredas:

El Sauce, El Peligro, Quiroz Alto, Quiroz, Llano Grande y Olivos de Municipio de La Unión
Nueva Florida del Municipio de San Pablo

INFORME NÚMERO 01 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Versión 1

La Unión Nariño, (31 de julio de 2024)

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, está enmarcado en el contexto del Contrato No.5065 de 2023 y resume los aspectos contractuales del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, derivados de la ejecución de OBJETO DEL CONTRATO, Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y los organismos de Acción Comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total Lote -2.

LA INTERVENTORÍA CONSORCIO MASO 10, efectúo todas las actividades para dar cumplimiento al Manual de Interventoría y el Anexo Técnico, conforme a las necesidades requeridas en el objeto del contrato, para el informe número 03, durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio del 2024.

2. OBJETIVOS

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades de CONSORCIO MASO 10, a través de actividades de promoción y protección en salud y de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos ocupacionales, que contribuyan al bienestar físico, mental y social de los colaboradores, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

2.1 Objetivo General

Garantizar un entorno laboral seguro y saludable durante la ejecución de la obra, mediante la evaluación y supervisión de las condiciones de trabajo, el cumplimiento de las normativas de seguridad y la promoción de prácticas adecuadas que prevengan accidentes y enfermedades laborales.

2.2 Objetivos Específicos

- Cumplir con los requerimientos necesarios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Garantizar al máximo unas condiciones laborales excelentes para sus trabajadores.
- Verificar los pagos de salarios, honorarios y afiliación al sistema general de seguridad social del personal vinculado a la interventoría CONSORCIO MASO 10.
- Velar por el cumplimiento del cronograma de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo propuesto.

3. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	TIPO DE CONTRATACIÒN
MAURICIO ROMERO QUIROGA	79394462	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	DEPENDIENTE
EVELYN JULIANA DIAZ GOMEZ	1089482890	PROFESIONAL SOCIAL	DEPENDIENTE
DAYANY MARCELA PEÑA BASTIDAS	1089485628	INSPECTORA	DEPENDIENTE
NICOL MUÑOZ ZUÑIGA	1083814806	INSPECTORA	DEPENDIENTE
JULIETH ZUÑIGA GOMEZ	1083814242	INSPECTORA	DEPENDIENTE
JORGE ANDRES MUÑOZ SOSCUE	1087647864	INSPECTOR	DEPENDIENTE
GISSEL ANDREA MUÑOZ RIVERA	1089484424	INSPECTORA SST	DEPENDIENTE
ALVARO AGUIRRE MAYA	13063945	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DEPENDIENTE

4. PERSONAL DE LA JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

4.1 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÒN NARIÑO CONVENIO 3121-2023

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	NUMERO DE IDENTIFICACIÒN	CARGO	TIPO DE CONTRACIÒN
LISSETTE VIVIANA DIAZ URBANO	1032497441	RESIDENTE DE OBRA	INDEPENDIENTE
JESUS EVER VALDES	15813917	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
NELSON URRESTY	15812457	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
JUAN CARLOS MORENO	15817516	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
JOSE ALVARO SOLARTE VELASCO	15812366	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
FABIAN RICADO GOMEZ MARTINEZ	1089478	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
MAURICIO HERNANDO PINTA	1084222199	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
JEREMY SNEIDER ORTEGA MORENO	1004675311	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
SANTIAGO ALEXANDER ESPAÑA MORENO	1004675595	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE

4.2 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÒN NARIÑO CONVENIO 3119-2023

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	NUMERO DE IDENTIFICACIÒN	CARGO	TIPO DE CONTRATACIÒN
EDGAR ALVEIRO AROCA GAVIRIA	15816461	RESIDENTE DE OBRA	INDEPENDIENTE
VICTOR JESÙS DAVILA	4948861	MAESTRO DE OBRA	INDEPENDIENTE
SEGUNDO MACARIO MUÑOZ MENESES	15811494	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
HECTOR VALENCIA LUNA	15814401	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
CARLOS ALIRIO VILLAMUEZ	15813513	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
CARLOS DORADO	98196240	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
ROBERTO MUÑOZ MUÑOZ	1089483789	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
JESUS DAVID USUGA	79856679	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
DANIEL OSVALDO AROCA	1089078268	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
EDISON ARLEY BOLAÑOS	1004743349	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE

4.3 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÒN NARIÑO CONVENIO 3089-2023

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	NUMERO DE IDENTIFICACIÒN	CARGO	TIPO DE CONTRATACIÒN
LISSETTE VIVIANA DIAZ URBANO	1032497441	RESIDENTE DE OBRA	INDEPENDIENTE
ARLEY FAVIAN MUÑOZ ERAZO	13075571	MAESTRO DE OBRA	INDEPENDIENTE
LUIS HUMBERTO CARVAJAL OSPINA	12990523	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
LUIS OJEDA MENESES	15817113	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
JOSE ALVARO SOLARTE VELASCO	15812366	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
FABIAN RICADO GOMEZ MARTINEZ	1089478	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
MAURICIO HERNANDO PINTA	1084222199	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
JEREMY SNEIDER ORTEGA MORENO	1004675311	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
SANTIAGO ALEXANDER ESPAÑA MORENO	1004675595	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE

4.4 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÒN NARIÑO CONVENIO 3153-2023

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	TIPO DE CONTRATACIÒN
ORLANDO ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ	1081592267	RESIDENTE DE OBRA	INDEPENDIENTE
JUAN CARLOS MORENO	15817516	MAESTRO DE OBRA	INDEPENDIENTE
ESNEIDER SANTIAGO MARTINEZ MATABAJOY	1004255408	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE

YORDAN ESTIVEN ERASO ORTEGA	1089478755	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
JOSE ALVARO SOLARTE VELASCO	15812366	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
FABIAN RICADO GOMEZ MARTINEZ	1089478	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
MAURICIO HERNANDO PINTA	1084222199	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
JEREMY SNEIDER ORTEGA MORENO	1004675311	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
SANTIAGO ALEXANDER ESPAÑA MORENO	1004675595	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE

4.5 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÒN NARIÑO CONVENIO 3122-2023

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	TIPO DE CONTRATACIÒN
JEFERSON ESTIBEN CARDENAS ERASO	1094950740	RESIDENTE DE OBRA	INDEPENDIENTE
ARLEY FABIAN MUÑOZ ERAZO	13075571	MAESTRO DE OBRA	INDEPENDIENTE
ALBERTH TUQUERRES ERASO	1089483126	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
KEVIN ANDRES RODIRGUEZ	1004675102	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
JOSÈ ALVARO SOLARTE VELASCO	15812366	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
FABIAN RICADO GOMEZ MARTINEZ	1089478	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
MAURICIO HERNANDO PINTA	1084222199	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
JEREMY SNEIDER ORTEGA MORENO	1004675311	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
SANTIAGO ALEXANDER ESPAÑA MORENO	1004675595	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE

4.6 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÒN NARIÑO CONVENIO 3157-2023

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	TIPO DE CONTRATACIÒN
CARMEN EMILIA SOLARTE	59788832	RESIDENTE DE OBRA	INDEPENDIENTE
AFRANIO ESPADA ESTRELLA	5217490	MAESTRO DE OBRA	INDEPENDIENTE
LEONEL BENAVIDES TENORIO	87026655	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
SAMIER ERASO TORO	1007164064	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
ARNOLDO NIÑO MELO	87240016	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
EDER YARLEY NIÑO CADENA	1088157457	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
DAMIR RENDON BOTINA	94427884	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
YEVIN ANTONIO ESTRELLA ERAZO	15813509	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
LUIS FELIPE VIVAS MORENO	1004675108	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE

4.7 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO CONVENIO 3281-2023

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	TIPO DE CONTRATACIÒN
OBER HERNANDO AGREDO BOLAÑOS	10549293	RESIDENTE DE OBRA	INDEPENDIENTE
JOSE ANTONIO URBANO	98323455	MAESTRO DE OBRA	INDEPENDIENTE
JAIDER YOBANI BOLAÑOS MONCAYO	1089348032	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
YONIER URBANO ROSERO	1089348032	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
LUIS CARLOS VALDEZ CERON	98339230	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
CRISTIAN FERNEY MUTIZ MUÑOZ	1089349048	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
JOSÈ ALEXANDER CALPA MARTINEZ	1061687181	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
JON ADREICER ORTEGA MUÑOZ	1085660372	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
ORLANDO ORTEGA GUERRERO	9732448	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE

5. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

5.1 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA SAUCE CONVENIO 3121-2023

Durante el período comprendido desde 01 de julio al 31 de julio de 2024, la Junta de Acción Comunal vereda Sauce realizó las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso del personal nuevo (*ver anexo 01).*

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	FECHA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
LISSETTE VIVIANA DIAZ	1/04/2024
NELSON URRESTY	11/05/2024
JESÚS EVER VALDES	18/05/2024
JUAN CARLOS MORENO	3/05/2024
JOSE ALVARO SOLARTE VELASCO	29/05/2024
FABIAN RICADO GOMEZ MARTINEZ	3/06/2024
MAURICIO HERNANDO PINTA	3/06/2024
JEREMY SNEIDER ORTEGA MORENO	21/06/2024
SANTIAGO ESPAÑA MORENO	21/06/2024

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período; se adjunta cedulas de ciudadanía, certificados de afiliación a ARL, Fondo de pensión, afiliación a EPS y Caja de Compensación *(ver anexo 02).*

- Soportes de reinducciones del personal.

  La Ingeniera Residente Lissette Diaz de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Sauce realizó la reinducción de peligros y riesgos a los trabajadores *(anexo 03)*.

- Soportes de evaluación.

  La Ingeniera residente Lissette Diaz posteriormente a la reinducción de peligros y riesgos, realizó una evaluación de reinducción al personal nuevo *(ver anexo 04).*

- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal

  El presidente de la OAC Junta de Acción Comunal Vereda Sauce Raúl Urbano realizó la entrega de Elementos de Protección Personal cascos dieléctricos amarillos, guantes de carnaza, guantes anti corte, gafas de seguridad y calzado de seguridad punta de acero (*ver anexo 05).*

- Notificación examen médico laboral de egreso

  Se adjunta notificación de examen medico laboral de egreso tanto como del personal dependiente como independiente *(ver anexo 06).*

- Listado de maquinaria y equipos de obra *(ver anexo 07).*

CLASE DE VEHÍCULO	PLACA Y/O NÙMERO DE REGISTRO	MARCA	MODELO	COLOR	FECHA DE REVISÓN TECNOMECANICA	VIGENCIA SOAT
VOLQUETA	TDM033	DINA	1994	BLANCO	8/09/2023	11/08/2023 - 10/08/2024
VOLQUETA	LUB487	INTERNACIONAL	1995	VINO TINTO	30/09/2023	2/02/2024 - 1/02/2025
VOLQUETA	OFJ726	INTERNACIONAL	1996	VINO TINTO	9/10/2023	28/06/2023 - 27/06/2024
MOTONIVELADORA	MC049662	CATERPILLAR	1988	AMARILLO	N/A	N/A
VINRO COMPACTADOR	882011000018326-1	N/A	N/A	AMARILLO	N/A	N/A

RETROEXCAVADORA	MC061125	JCB	2011	VERDE	N/A	N/A

- Reporte de Accidentes de Trabajo: En el mes de julio de 2024 no se presentó ningún accidente de trabajo.

5.2 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA EL PELIGRO CONVENIO 3119-2023

Durante el período comprendido desde 01 de julio al 31 de julio de 2024, la Junta de Acción Comunal vereda El Peligro realizó las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso del personal (*ver anexo 08*).

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	FECHA DE EXAMEN MEDICO
EDGAR ALVEIRO AROCA GAVIRIA	17/04/2024
VICTOR JESÙS DAVILA	17/04/2024
SEGUNDO MACARIO MUÑOZ MENESES	21/04/2024
HECTOR VALENCIA LUNA	27/04/2024
DANIEL OSVALDO AROCA ORDOÑEZ	10/07/2024
JESÙS DAVID USUGA	10/07/2024
ROBERTO MUÑOZ MUÑOZ	10/07/2024
EDISON ARLEY BOLAÑOS DELGADO	17/07/2024
CARLOS DORADO	17/07/2024
CARLOS ALIRIO VILLAMUEZ DORADO	17/07/2024

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período:

  Se adjunta cedulas de ciudadanía, certificados de afiliación a ARL, Fondo de pensión, certificado de afiliación a EPS correspondiente y certificado caja de compensación *(anexo 09).*

- Soportes de inducciones y reinducciones del personal.

  El ingeniero residente Edgar Aroca de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda El Peligro realizó la inducción de peligros y riesgos a los trabajadores nuevos y la reinducción a los trabajadores antiguos (*ver anexo 10*).

- Soporte de evaluación de la reinducción.

La Ingeniero residente Edgar Aroca de la OAC Junta de Acción Comunal Vereda El Peligro posteriormente a la inducción y reinducción de peligros y riesgos, realizó una evaluación al personal (*ver anexo 11*).

- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal.

  La presidenta de la OAC Junta de Acción Comunal Vereda El Peligro Liliana Valencia realizó la entrega de Elementos de Protección Personal, guantes de carnaza, guantes anti corte, gafas de seguridad, tapa oídos, calzado de seguridad (*ver anexo 12*).

- Notificación examen médico de retiro (*ver anexo 13).*

- Listado de maquinaria y equipos de obra (*ver anexo 14).*

CLASE DE VEHÍCULO	PLACA Y/O NÙMERO DE REGISTRO	MARCA	MODELO	COLOR	FECHA DE REVISÓN TECNOMECANICA	VIGENCIA SOAT
VOLQUETA	OTJ321	NISSAN	1983	VERDE	5/05/2024	16/05/2024-15/05/2025
VOLQUETA	LUB487	INTERNACIONAL	1995	VINO TINTO	30/09/2023	2/02/2024 - 1/02/2025
VOLQUETA	OFJ726	INTERNACIONAL	1996	VINO TINTO	9/10/2023	28/06/2023 - 27/06/2024
MOTONIVELADORA	MC049662	CATERPILLAR	1988	AMARILLO	N/A	N/A
VINRO COMPACTADOR	882011000018326-1	N/A	N/A	AMARILLO	N/A	N/A
RETROEXCAVADORA	MC061125	JCB	2011	VERDE	N/A	N/A

- Reporte de Accidentes de Trabajo: En el mes de julio de 2024 no se presentó ningún accidente de trabajo.

5.3 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE CONVENIO 3089-2023

Durante el período comprendido desde 01 de julio al 30 de julio de 2024, la Junta de Acción Comunal vereda Llano Grande realizó las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso del personal (*anexo 15).*

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	FECHA DE EXAMEN MEDICO
LISSETTE VIVIANA DIAZ URBANO	1/04/2024
ARLEY FABIAN MUÑOZ ERAZO	29/05/2024
LUIS HUMBERTO CARVAJAL OSPINA	21/04/2024
LUIS OJEDA MENESES	21/04/2024
JOSE ALVARO SOLARTE VELASCO	29/05/2024
FABIAN RICADO GOMEZ MARTINEZ	3/06/2024
MAURICIO HERNANDO PINTA	3/06/2024
JEREMY SNEIDER ORTEGA MORENO	21/06/2024
SANTIAGO ALEXANDER ESPAÑA MORENO	21/06/2024

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período:

  Se adjunta cedulas de ciudadanía, certificados de afiliación a ARL, Fondo de pensión y certificado de afiliación a EPS correspondiente (*ver anexo 16).*

- Soportes de inducciones y reinducciones del personal.

  La ingeniera residente Lissette Viviana Diaz de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Llano Grande realizó la inducción de peligros y riesgos a los trabajadores nuevos y la reinducción de los trabajadores antiguos (*ver anexo 17*).

- Soporte de evaluación de la inducción y reinducción.

La Ingeniero residente Juan Martínez de la OAC Junta de Acción Comunal Vereda Llano Grande posteriormente a la inducción y reinducción de peligros y riesgos, realizó una evaluación del tema mencionado al personal (*ver anexo 18*).

- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal.

El presidente de la OAC Junta de Acción Comunal Vereda Llano Grande Oney Valdés realizó la entrega de dotación uniforme tipo INVIAS al personal nuevo conjuntamente con la entrega de Elementos de Protección Personal cascos dieléctricos amarillos, guantes de carnaza, guantes anti corte y calzado de seguridad punta de acero (*ver anexo 19*).

- Notificación examen médico de retiro (*ver anexo 20*).

- Listado de maquinaria y equipos de obra, se anexa el formato (*ver anexo 07*).

CLASE DE VEHÍCULO	PLACA Y/O NÙMERO DE REGISTRO	MARCA	MODELO	COLOR	FECHA DE REVISÓN TECNOMECANICA	VIGENCIA SOAT
VOLQUETA	TDM033	DINA	1994	BLANCO	8/09/2023	11/08/2023 - 10/08/2024
VOLQUETA	LUB487	INTERNACIONAL	1995	VINO TINTO	30/09/2023	2/02/2024 - 1/02/2025
VOLQUETA	OFJ726	INTERNACIONAL	1996	VINO TINTO	9/10/2023	28/06/2023 - 27/06/2024
MOTONIVELADORA	MC049662	CATERPILLAR	1988	AMARILLO	N/A	N/A
VINRO COMPACTADOR	882011000018326-1	N/A	N/A	AMARILLO	N/A	N/A
RETROEXCAVADORA	MC061125	JCB	2011	VERDE	N/A	N/A

- Reporte de Accidentes de Trabajo: En el mes de julio de 2024 no se presentó ningún accidente de trabajo.

5.4 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ CONVENIO 3153-2023

Durante el período comprendido desde 01 de julio al 31 de julio de 2024, la Junta de Acción Comunal de la vereda Quiroz realizó las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso del personal (*ver anexo 21*).

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	FECHA DE EXAMENES MEDICO
ORLANDO ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ	15/05/2024
JUAN CARLOS MORENO	3/05/2024
ESNEIDER SANTIAGO MARTINEZ MATABAJOY	24/05/2024
YORDAN ESTIVEN ERASO ORTEGA	23/05/2024
JOSE ALVARO SOLARTE VELASCO	29/05/2024
FABIAN RICADO GOMEZ MARTINEZ	3/06/2024

MAURICIO HERNANDO PINTA	3/06/2024
JEREMY SNEIDER ORTEGA MORENO	21/06/2024
SANTIAGO ESPAÑA MORENO	21/06/2024

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período:

  Se adjunta cedulas de ciudadanía, certificados de afiliación a ARL y Fondo de pensión *(ver anexo 22).*

- Soportes de inducciones del personal nuevo:

  El ingeniero residente Orlando Rangel de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz realizó la inducción de peligros y riesgos a personal nuevo y reinducción a personal antiguo *(ver anexo 23).*

- Soporte de evaluación de la inducción:

La Ingeniero residente Orlando Rangel de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz posteriormente a la inducción y reinducción de peligros y riesgos, realizó una evaluación del tema mencionado anteriormente *(ver anexo 24).*

- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal:

  El presidente de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz Robinson Valdés, realiza entrega de dotación y EPP tanto a personal nuevo como antiguo (*ver anexo 25).*

- Listado de maquinaria y equipos de obra, se anexa el formato *(ver anexo 07).*

CLASE DE VEHÍCULO	PLACA Y/O NÙMERO DE REGISTRO	MARCA	MODELO	COLOR	FECHA DE REVISÓN TECNOMECANICA	VIGENCIA SOAT
VOLQUETA	TDM033	DINA	1994	BLANCO	8/09/2023	11/08/2023 - 10/08/2024
VOLQUETA	LUB487	INTERNACIONAL	1995	VINO TINTO	30/09/2023	2/02/2024 - 1/02/2025
VOLQUETA	OFJ726	INTERNACIONAL	1996	VINO TINTO	9/10/2023	28/06/2023 - 27/06/2024
MOTONIVELADORA	MC049662	CATERPILLAR	1988	AMARILLO	N/A	N/A

VINRO COMPACTADOR	882011000018326-1	N/A	N/A	AMARILLO	N/A	N/A
RETROEXCAVADORA	MC061125	JCB	2011	VERDE	N/A	N/A

- Reporte de Accidentes de Trabajo: En el mes de julio de 2024 no se presentó ningún accidente de trabajo.

5.5 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO CONVENIO 3122-2023

Durante el período comprendido desde 01 de julio al 31 de julio de 2024, la Junta de Acción Comunal de la vereda Quiroz Alto realizó las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso del personal (*ver anexo 26*).

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	FECHA DE EXÀMEN MEDICO
JEFERSON ESTIBEN CARDENAS ERASO	13/05/2024
ARLEY FABIAN MUÑOZ ERAZO	29/05/2024
ALBERTH TUQUERRES ERASO	1/04/2024
JOSÈ ALVARO SOLARTE VELASCO	29/05/2024
KEVIN ANDRES RODRIGUEZ REALPE	21/04/2024
KEVIN ANDRES RODRIGUEZ REALPE	21/04/2024
FABIAN RICADO GOMEZ MARTINEZ	3/06/2024
MAURICIO HERNANDO PINTA	3/06/2024
JEREMY SNEIDER ORTEGA MORENO	21/06/2024
SANTIAGO ALEXANDER ESPAÑA MORENO	21/06/2024

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período:

  Se adjunta cedulas de ciudadanía, certificados de afiliación a ARL y Fondo de pensión *(ver anexo 27).*

- Soportes de inducciones del personal nuevo:

  El ingeniero residente Jefferson Cárdenas de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz Alto realizó la inducción y reinducción de peligros y riesgos a los trabajadores nuevos y antiguos *(ver anexo 28).*

- Soporte de evaluación de la inducción:

La Ingeniero residente Jefferson Cárdenas de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz Alto posteriormente a la inducción y reinducción de peligros y riesgos, realizó una evaluación respectiva al personal *(ver anexo 29).*

- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal:

  El presidente de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz Alto Yonier Tuquerres, realizó entrega de dotación, *EPP* cascos dieléctricos amarillos, guantes de carnaza, gafas protectoras, guantes anti corte, tapabocas y calzado de seguridad punta de acero *(ver anexo 30).*

- Soporte de notificación al examen de retiro (*ver anexo 31*).

- Listado de maquinaria y equipos de obra *(ver anexo 07).*

CLASE DE VEHÍCULO	PLACA Y/O NÙMERO DE REGISTRO	MARCA	MODELO	COLOR	FECHA DE REVISÓN TECNOMECANICA	VIGENCIA SOAT
VOLQUETA	TDM033	DINA	1994	BLANCO	8/09/2023	11/08/2023 - 10/08/2024
VOLQUETA	LUB487	INTERNACIONAL	1995	VINO TINTO	30/09/2023	2/02/2024 - 1/02/2025
VOLQUETA	OFJ726	INTERNACIONAL	1996	VINO TINTO	9/10/2023	28/06/2023 - 27/06/2024
MOTONIVELADORA	MC049662	CATERPILLAR	1988	AMARILLO	N/A	N/A
VINRO COMPACTADOR	882011000018326-1	N/A	N/A	AMARILLO	N/A	N/A
RETROEXCAVADORA	MC061125	JCB	2011	VERDE	N/A	N/A

- Reporte de Accidentes de Trabajo: En el mes de julio de 2024 no se presentó ningún accidente de trabajo.

5.6 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS CONVENIO 3157-2023

Durante el período comprendido desde 01 de julio al 31 de julio de 2024, la Junta de Acción Comunal de la vereda Olivos realizó las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso del personal nuevo *(ver anexo 32).*

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	FECHA DE EXÀMEN MEDICO
CARMEN EMILIA SOLARTE	24/05/2024
AFRANIO ESPADA ESTRELLA	22/05/2024
LEONEL BENAVIDES TENORIO	22/04/2024
SAMIER ERASO TORO	3/07/2024
ARNOLDO NIÑO MELO	5/07/2024
EDER YARLEY NIÑO CADENA	5/07/2024
LUIS FELIPE VIVAS MORENO	5/07/2024
DAMIR RENDON BOTINA	8/07/2024
YEVIN ANTONIO ESTRELLA ERAZO	8/07/2024

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período:

  Se adjunta cedulas de ciudadanía, certificados de afiliación a ARL y Fondo de pensión *(ver anexo 33).*

- Soportes de inducciones del personal nuevo.

  La Ingeniera residente Carmen Emilia Solarte de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Olivos, realizó la inducción y reinducción de peligros y riesgos al personal nuevo como antiguo *(ver anexo 34).*

- Soporte de evaluación de la inducción.

  La Ingeniera residente Carmen Emilia Solarte de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Olivos, realizó evaluación de la inducción y reinducción al personal nuevo y antiguo *(ver anexo 35).*

- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal.

  La presidenta de la OAC Junta de Acción Comunal de la vereda Olivos Elizabeth Toro, realizó entrega de dotación y EPP como casco dieléctrico amarillo, guantes de carnaza, guantes anti corte, gafas protectoras, tapa oídos y calzado de seguridad (*ver anexo 36*).

- Notificación examen médico laboral de retiro (*ver anexo 37*).

- Listado de maquinaria y equipos de obra (*ver anexo 07*).

CLASE DE VEHÍCULO	PLACA Y/O NÙMERO DE REGISTRO	MARCA	MODELO	COLOR	FECHA DE REVISÓN TECNOMECANICA	VIGENCIA SOAT
VOLQUETA	TDM033	DINA	1994	BLANCO	8/09/2023	11/08/2023 - 10/08/2024
VOLQUETA	LUB487	INTERNACIONAL	1995	VINO TINTO	30/09/2023	2/02/2024 - 1/02/2025
VOLQUETA	OFJ726	INTERNACIONAL	1996	VINO TINTO	9/10/2023	28/06/2023 - 27/06/2024
MOTONIVELADORA	MC049662	CATERPILLAR	1988	AMARILLO	N/A	N/A
VINRO COMPACTADOR	882011000018326-1	N/A	N/A	AMARILLO	N/A	N/A
RETROEXCAVADORA	MC061125	JCB	2011	VERDE	N/A	N/A

- Reporte de Accidentes de Trabajo: En el mes de julio de 2024 no ocurrió ningún accidente de trabajo.

5.7 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA CONVENIO 3281-2023

Durante el período comprendido desde 01 de julio al 31 de julio de 2024, la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva Florida realizó las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso del personal nuevo *(ver anexo 38).*

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	FECHA DE EXAMEN MEDICO
OBER HERNANDO AGREDO BOLAÑOS	17/05/2024
JOSE ANTONIO URBANO	29/05/2024
JAIDER YOBANI BOLAÑOS MONCAYO	30/05/2024
YONIER URBANO ROSERO	30/05/2024
LUIS CARLOS VALDEZ CERON	25/06/2024
CRISTIAN FERNEY MUTIZ MUÑOZ	25/06/2024
JOSÉ ALEXANDER CALPA MARTINEZ	25/06/2024

JON ADREICER ORTEGA MUÑOZ	12/07/2024
ORLANDO ORTEGA GUERRERO	12/07/2024

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período:

  Se adjunta cedulas de ciudadanía y certificados de afiliación a ARL *(anexo 39).*

- Soportes de inducciones y reinducciones del personal.

  El ingeniero residente Ober Agredo de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Nueva Florida realizó la inducción y reinducción de peligros y riesgos a los trabajadores nuevos y antiguos *(anexo 40).*

- Soporte de evaluación de la inducción y reinducción.

La Ingeniero residente Ober Agredo de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Nueva Florida posteriormente a la inducción y reinducción de peligros y riesgos, realizó una evaluación al personal *(anexo 41).*

- Listado de maquinaria y equipos de obra *(anexo 42).*

  La OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Nueva Florida, no entrego mas información de la maquinaría utilizada en la obra ya que utilizaron la de la alcaldía del Municipio de Florencia Departamento del Cauca y esta a su vez no les entrego la documentación correspondiente.; por consiguiente, se anexa únicamente la información descrita a continuación.

CLASE DE VEHÍCULO	PLACA Y/O NÙMERO DE REGISTRO	MARCA	MODELO	COLOR	FECHA DE REVISÓN TECNOMECANICA	VIGENCIA SOAT
RETROESCAVADORA	MC484904	CASE	2010	AMARILLO	N/A	N/A
VOLQUETA	GUC413	INTERNATIONAL	1952	ROJO	15/05/2024	11/05/2024-10/05/2025

- Reporte de Accidentes de Trabajo: En el mes de julio de 2024 no se presentó ningún accidente de trabajo.

6. CAPITULO 4 ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA

Durante el período comprendido desde 01 de julio al 31 de julio de 2024, la Interventoría CONSORCIO MASO 10 realizó las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso al personal (ver anexo 43).

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	FECHA DE EXAMEN MEDICO
MAURICIO ROMERO QUIROGA	11/04/2024
EVELYN JULIANA DIAZ GOMEZ	10/04/2024
DAYANY MARCELA PEÑA BASTIDAS	5/04/2024
NICOL MUÑOZ ZUÑIGA	8/04/2024
JULIETH ZUÑIGA GOMEZ	8/05/2024
JORGE ANDRES MUÑOZ SOSCUE	15/05/2024
GISSEL ANDREA MUÑOZ RIVERA	8/05/2024
ALVARO AGUIRRE MAYA	16/05/2024

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período *(anexo 44).*

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	EPS (Empresa Promotora de Salud)	ARL (Aseguradora de Riesgos Laborales)	AFP (Fondo de Pensiones)
MAURICIO ROMERO QUIROGA	COMPENSAR	POSITIVA	SKANDIA
EVELYN JULIANA DIAZ GOMEZ	NUEVA EPS	POSITIVA	COLFONDOS
DAYANY MARCELA PEÑA BASTIDAS	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR
NICOL MUÑOZ ZUÑIGA	GOMAG	POSITIVA	PORVENIR
JULIETH ZUÑIGA GOMEZ	EMSSANAR	POSITIVA	PORVENIR
JORGE ANDRES MUÑOZ SOSCUE	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR
GISSEL ANDREA MUÑOZ RIVERA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR
ALVARO AGUIRRE MAYA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR

- Elaboración procedimiento para programa promoción y prevención.

  La Inspectora en SST Gissel Andrea Muñoz Rivera elabora procedimiento para programa de promoción y prevención de Interventoría Consorcio MASO 10*(ver anexo 45).*

- Socialización procedimiento promoción y prevención Interventoría CONSORCIO MASO 10 *(ver anexo 46).*

- Elaboración programa de estilos de vida saludable

  La Inspectora en SST Gissel Andrea Muñoz Rivera elabora el programa de estilos de vida saludable de Interventoría Consorcio MASO 10 (*ver anexo 47).*

- Socialización programa de estilos de vida saludable Interventoría CONSORCIO MASO 10 *(ver anexo 48)*.

- Capacitación en pausas activas, acoso laboral y riesgo psicosocial *(ver anexo 49)*.

- Elaboración procedimiento IPEVR Laborales y establecimiento de controles Interventoría CONSORCIO MASO 10 *(ver anexo 50)*.

- Capacitación Riesgo Publico Interventoría CONSORCIO MASO 10*(ver anexo 51).*

- Listado de equipos y vehículos de interventoría *(ver anexo 52)*.

DOCUMENTACIÓN VEHICULOS INTERVENTORIA						
CLASE DE VEHÍCULO	**PLACA**	**MARCA**	**MODELO**	**COLOR**	**FECHA DE REVISÓN TECNOMECANICA**	**VIGENCIA SOAT**
MOTOCICLETA	JCV20G	YAMAHA	2023	MULTICOLOR	N/A	28/09/2023 - 27/09/2024
MOTOCICLETA	NSA13G	HONDA	2023	ROJO BLANCO	N/A	11/08/2023 - 10/08/2024
MOTOCICLETA	EXU62G	YAMAHA	2023	AZUL NEGRO	N/A	23/03/2024 - 22/03/2025
MOTOCICLETA	INU90D	YAMAHA	2015	AZUL GRIS	22/07/2023	16/08/2023 - 15/08/2024
MOTOCICLETA	JPE59E	HONDA	2019	BLANCO ROJO	21/12/2023	20702/2024 - 19/02/2024
MOTOCICLETA	ZEA97G	BAJAJ	2024	NEGRO INFINITO	N/A	9/02/2024 - 8/02/2025
MOTOCICLETA	BVZ63E	BAJAJ	2016	ROJO ECLIPSE NEGRO MATE	8/08/2023	28/12/2023-27/12/2024

- Reportes de Accidente de Trabajo.

  En el mes de julio de 2024 no se presentaron incidentes y/o accidentes de trabajo.

- Otras actividades realizadas en cuanto al SG-SST.

  a) Inspecciones en apoyo a OAC vereda El Sauce *(ver anexo 53).*

  b) Capacitaciones en apoyo OAC vereda El Sauce *(ver anexo 54).*

  c) Inspecciones en apoyo OAC vereda El Peligro (*ver anexo 55).*

  d) Capacitaciones en apoyo OAC vereda El Peligro (*ver anexo 56).*

  e) Inspecciones en apoyo OAC vereda Quiroz Alto (*ver anexo 57).*

  f) Capacitaciones en apoyo a OAC vereda Quiroz Alto *(ver anexo 58).*

  g) Inspecciones en apoyo a OAC vereda Quiroz *(ver anexo 59).*

  h) Capacitaciones en apoyo a OAC vereda Quiroz *(ver anexo 60).*

  i) Inspecciones en apoyo a OAC vereda Llano Grande *(ver anexo 61).*

  j) Capacitaciones en apoyo a OAC vereda Llano Grande *(ver anexo 62).*

  k) Inspecciones en apoyo a OAC vereda Olivos *(ver anexo 63).*

  l) Capacitaciones en apoyo a OAC vereda Olivos *(ver anexo 64).*

  m) Inspecciones en apoyo a OAC vereda Nueva Florida *(ver anexo 65).*

  n) Capacitaciones en apoyo a OAC vereda Nueva Florida *(ver anexo 66).*

  NOTA: Como las OAC no cuentan con profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría ha apoyado a las mismas con algunas capacitaciones con el fin de evitar la ocurrencia de incidentes y/o accidentes de trabajo que pueden ser graves y/o mortales.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10

Socialización procedimiento de promoción y prevención Interventoría Consorcio MASO 10, La Uniòn Nariño 3 de julio de 2024.



Socialización Programa de estilos de vida saludable Interventoría Consorcio MASO 10, La Unión Nariño 11 y 12 de julio de 2024.





Capacitación Pausas activas, acoso laboral y riesgo psicosocial Interventoría CONSORCIO MASO 10. La Unión Nariño 19 de julio de 2024.



Capacitación Riesgo público (atracos, hurtos y asonadas) Interventoría Consorcio MASO 10, La Unión Nariño 30 de julio de 2024.





Inspección de uso de EPP personal Junta de Acción Comunal Vereda Sauce en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10, Vereda Sauce La Unión Nariño 18 de julio de 2024.







Capacitación peligros y riesgos, Riesgo ergonómico y manipulación de herramientas personal Junta de Acción Comunal Vereda Sauce en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10, Vereda Sauce La Unión Nariño 18 de julio de 2024.







Inspección de obra e inspección de uso de EPP a personal Junta de Acción Comunal Vereda Sauce en apoyo de interventoría Consorcio MASO 10, Vereda Sauce La Unión Nariño 19 de julio de 2024.







