	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. ____ **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONVENIO DE OBRA No. 3119 DE 2023, 3089 DE 2023, 3122 DE 2023, 3281 DE 2023, 3157 DE 2023, 3153 DE 2023, 3121 DE 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. ____ **DE** ____ ENTIDAD FINANCIERA: ____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. ____ **BANCO** ____ SUCURSAL: ____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: ____ %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAOLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE LA SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PELEGRO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAUCE; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUIROZ BAJO; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA QUIROZ ALTO; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA OLIVOS; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OLIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma: _____
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma: _____
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.8 AGOSTO 2024
CONSORCIO MASO 10

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. ____ **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3119 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: ____ %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200,741,050.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAEL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Liliana Valencia M.
Nombre: LILIANA VALENCIA
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** AGOSTO **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3089 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 201,005,912.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma:
Nombre: ONEY VALDEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** AGOSTO **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3122 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 199,318,829.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligacion a cargo del Organismo de Accion Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma:
Nombre: YONIER TUQUERRES
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** AGOSTO **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3281 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200,698,283.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ( ) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma: Wilder Ferney Ramos
Nombre: WILDER RAMOS
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.8 AGOSTO 2024
CONSORCIO MASO 10

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** AGOSTO **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3157 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 201,402,474.00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma:
Nombre: ELIZABETH TORO
Representante Legal o Delegado Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3153 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 202,406,606.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

robinson valdes M

Firma:
Nombre: ROBINSON MARTINEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** AGOSTO **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3121 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200,048,634.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**


Firma:
Nombre: RAUL LUNA
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.2 Programa de Inversiones o Reprogramación al Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-1. Seguimiento Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-2. No Aplica el formato para los convenios

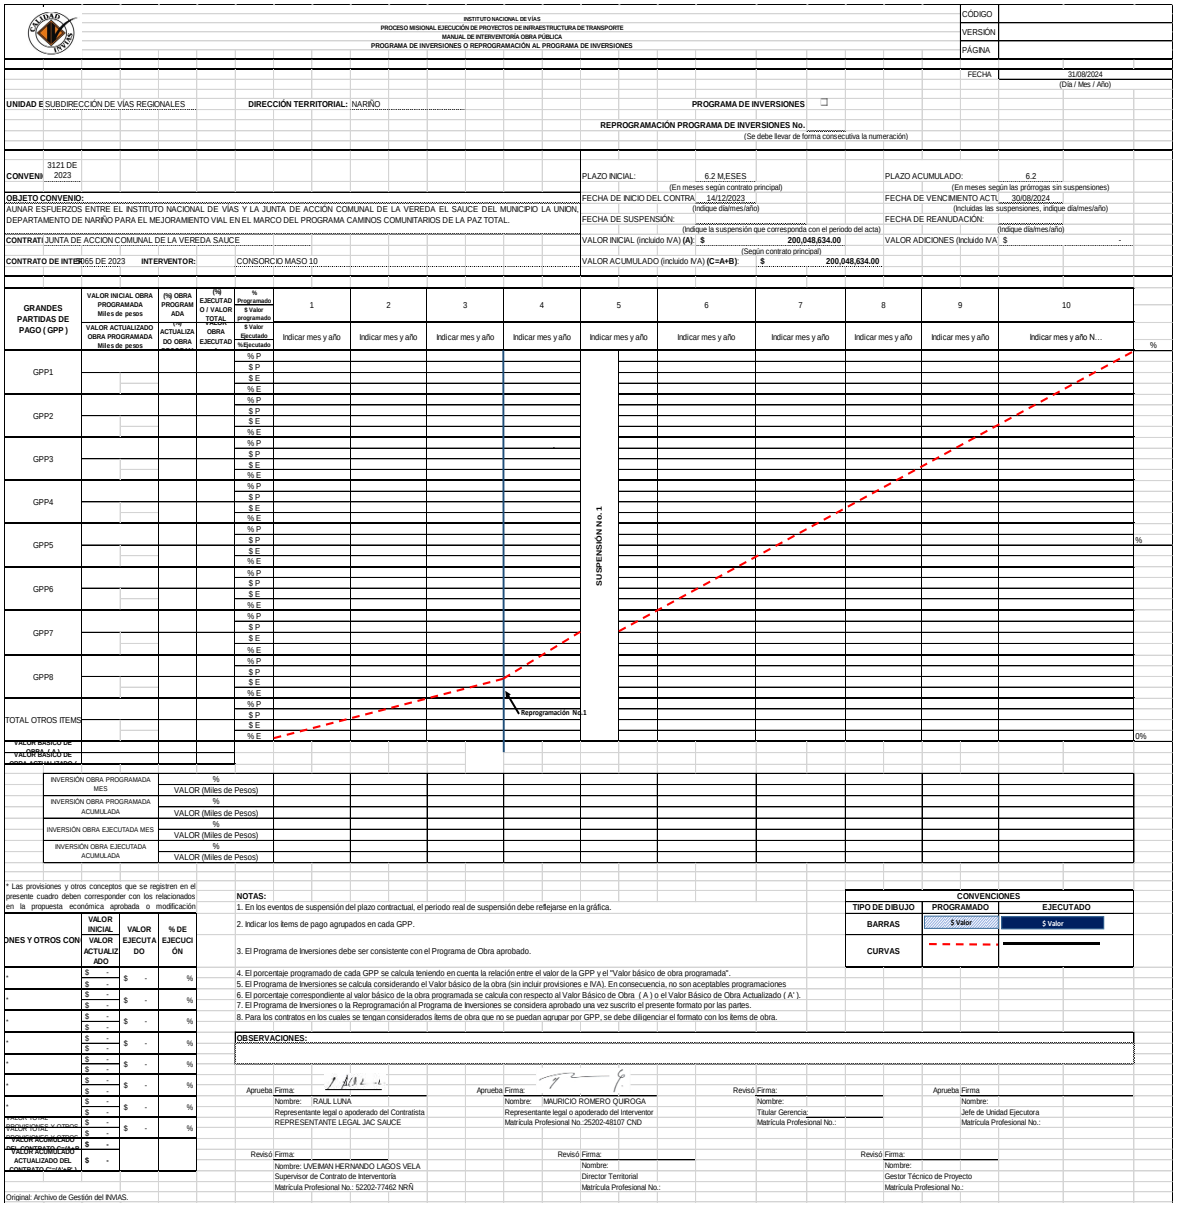

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — PROGRAMA DE INVERSIONES ☐
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ... (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENIO: 3121 DE 2023
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNTARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATI: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE
CONTRATO DE INTER: 065 DE 2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 6.2 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRA: 14/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 30/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 200,048,634.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (Incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 200,048,634.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / % ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	% Programado $ Valor programado / $ Valor Ejecutado %Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1 — Reprogramación No.1 — % — 0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	$ -	$ -	%
VALOR REGISTRADO EN EL CONTRATO	$ -		
VALOR ACTUALIZADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (A+A')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Aprueba Firma: — Nombre: RAUL LUNA — Representante legal o apoderado del Contratista — REPRESENTANTE LEGAL JAC SAUCE
Aprueba Firma: — Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA — Representante legal o apoderado del Interventor — Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND
Revisó Firma: — Nombre: — Titular Gerencia — Matrícula Profesional No.:
Aprueba Firma — Nombre: — Jefe de Unidad Ejecutora — Matrícula Profesional No.:
Revisó Firma: — Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — Supervisor de Contrato de Interventoría — Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ
Revisó Firma: — Nombre: — Director Territorial — Matrícula Profesional No.:
Revisó Firma: — Nombre: — Gestor Técnico de Proyecto — Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. ..... **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3119 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: ..... **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 200,741,050.00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAEL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Liliana Valencia M.
Nombre: LILIANA VALENCIA
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** AGOSTO **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3089 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 201,005,912.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma:
Nombre: ONEY VALDEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.8 AGOSTO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	60

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** AGOSTO **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3122 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 199,318,829.00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Accion Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma: Yonier Tuquerres

Nombre: YONIER TUQUERRES
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:

Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:

Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** AGOSTO **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3281 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 200,698,283.00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma: Wilder Forney Ramos
Nombre: WILDER RAMOS
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** AGOSTO **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3157 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 201,402,474.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Accion Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma:
Nombre: ELIZABETH TORO
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** AGOSTO **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3153 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 202,406,606.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma: Robinson Valdes M.
Nombre: ROBINSON MARTINEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/08/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** AGOSTO **NFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3121 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200,048,634.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULAD $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Accion Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad**

Firma:
Nombre: RAUL LUNA
Representante Legal o Delegado
Contratista
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma:
Nombre: N/A
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENIO No: 3119 DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAEL PELIGRO DEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 6,2 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 200,741,050.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 200,741,050.00

PLAZO ACUMULADO: 6,2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	%Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSION No. 1

Reprogramación No.1

100%

0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: LILIANA VALENCIA
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC EL PELIGRO

Aprueba Firma: _____
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No: 25202-48107 CND

Revisó Firma: _____
Nombre:
Titular Gerencia: _____
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma _____
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ

Revisó Firma: _____
Nombre:
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 87 | FECHA 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENI 3089 DE 2023

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 6.2 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRA 14/12/2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO AC 30/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 201,005,912.00 | VALOR ADICIONES (Incluido IV $ -

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 201,005,912.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL VALOR OBRA EJECUTAD	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
GPP1				% P / $ P / $ E / % E										
GPP2				% P / $ P / $ E / % E										
GPP3				% P / $ P / $ E / % E										
GPP4				% P / $ P / $ E / % E										
GPP5				% P / $ P / $ E / % E										
GPP6				% P / $ P / $ E / % E										
GPP7				% P / $ P / $ E / % E										
GPP8				% P / $ P / $ E / % E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P / $ P / $ E / % E										
VALOR BASICO DE OBRA (A)														
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

100% | 0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS ACUMULADO	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba	Aprueba	Revisó	Aprueba
Firma:	Firma:	Firma:	Firma
Nombre: ONEY VALDEZ	Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA	Nombre:	Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor	Titular Gerencia:	Jefe de Unidad Ejecutora
REPRESENTANTE LEGAL JAC LLANO GRANDE	Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Revisó	Revisó	Revisó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA	Nombre:	Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría	Director Territorial	Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	87
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENIO No: 3122 DE 2023

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTODEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL:	6.2 meses (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRA	######## (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTU	30/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**	$ 199,318,829.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (Incluido IVA)	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B**	$ 199,318,829.00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / % ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A)														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

% … 0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

VISIONES Y OTROS CONCEPT	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACUMULADAS	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba	Aprueba	Revisó	Aprueba
Firma:	Firma:	Firma:	Firma
Nombre: YONIER TUQUERREZ	Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA	Nombre:	Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor	Titular Gerencia:	Jefe de Unidad Ejecutora
REPRESENTANTE LEGAL JAC QUIROZ ALTO	Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Revisó	Revisó	Revisó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA	Nombre:	Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría	Director Territorial	Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 87 | FECHA 31/08/2024

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENI 3281 DE 2023

PLAZO INICIAL: 6.2 meses (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO DEL CONTRA 14/12/2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 30/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRAT JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 200,698,283.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ -

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 200,698,283.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL VALOR OBRA EJECUTAD	% Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

% … 0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C=A+B)	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Aprueba	Aprueba	Revisó	Aprueba
Firma: Wilder Ramos	Firma:	Firma:	Firma
Nombre: WILDER RAMOS	Nombre: QUIROGA	Nombre:	Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor	Titular Gerencia:	Jefe de Unidad Ejecutora
REPRESENTANTE LEGAL JAC NUEVA FLORIDA	Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Revisó	Revisó	Revisó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA	Nombre:	Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría	Director Territorial	Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.8 AGOSTO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	87
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENI 3157 DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 6.2 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRA 14/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 30/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 201,402,474.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 201,402,474.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / % ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA *	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (A+B+C)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C=A+B+	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Aprueba	Aprueba	Revisó	Aprueba
Firma:	Firma:	Firma:	Firma
Nombre: ELIZABETH TORO	Nombre: QUIROGA	Nombre:	Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor	Titular Gerencia:	Jefe de Unidad Ejecutora
REPRESENTANTE LEGAL JAC OLIVOS	Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Revisó	Revisó	Revisó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA	Nombre:	Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría	Director Territorial	Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORÍA N.8 AGOSTO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	87

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENI 3153 DE 2023

PLAZO INICIAL: 6.2 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO LA UNION. DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO DEL CONTRA: 14/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 30/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRAT JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 202,406,606.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ -

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 202,406,606.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA *	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
GPP1				% P / $ P / $ E / % E										
GPP2				% P / $ P / $ E / % E										
GPP3				% P / $ P / $ E / % E										
GPP4				% P / $ P / $ E / % E										
GPP5				% P / $ P / $ E / % E										
GPP6				% P / $ P / $ E / % E										
GPP7				% P / $ P / $ E / % E										
GPP8				% P / $ P / $ E / % E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P / $ P / $ E / % E										
VALOR BASICO DE OBRA (SIN I														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO INICIAL	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO INICIAL	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de


CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba	Firma:	Nombre:	Aprueba	Firma:	Nombre:	Revisó	Firma:	Nombre:	Aprueba	Firma	Nombre:
		ROBINSON VALDEZ			QUIROGA						
		Representante legal o apoderado del Contratista			Representante legal o apoderado del Interventor			Titular Gerencia:			Jefe de Unidad Ejecutora
		REPRESENTANTE LEGAL JAC QUIROZ BAJO			Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND			Matrícula Profesional No.:			Matrícula Profesional No.:

Revisó	Firma:	Nombre:	Revisó	Firma:	Nombre:	Revisó	Firma:	Nombre:
		UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA						
		Supervisor de Contrato de Interventoría			Director Territorial			Gestor Técnico de Proyecto
		Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ			Matrícula Profesional No.:			Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

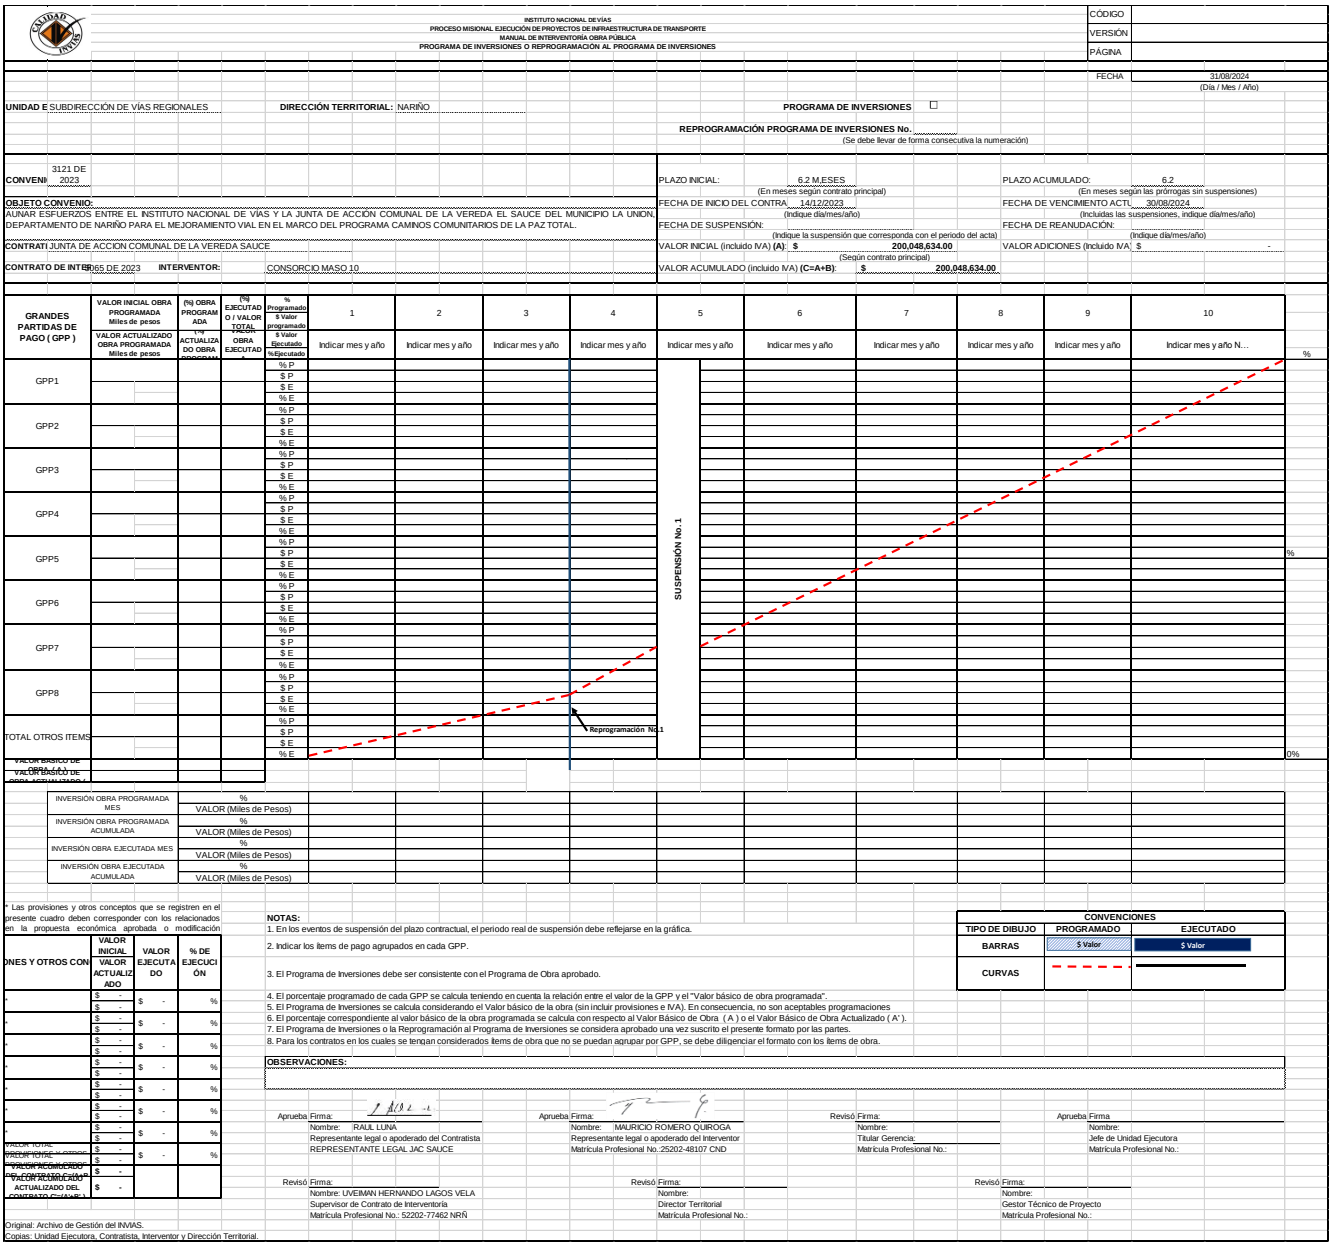

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONVENIO: 3121 DE 2023

OBJETO CONVENIO: ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATI: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE

CONTRATO DE INTER: 3065 DE 2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 6,2 M.ESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 6,2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRA: 14/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 30/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 200,048,634.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 200,048,634.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA Y/O ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E.										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E.										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E.										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E.										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E.										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E.										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E.										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E.										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E.										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

100% / %

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	$ -		
* VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO CAMPO 5	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO CAMPO 4	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: — Nombre: RAUL LUNA — Representante legal o apoderado del Contratista — REPRESENTANTE LEGAL JAC SAUCE

Aprueba Firma: — Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA — Representante legal o apoderado del Interventor — Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND

Revisó Firma: — Nombre: — Titular Gerencia: — Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma — Nombre: — Jefe de Unidad Ejecutora — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: — Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA — Supervisor de Contrato de Interventoría — Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ

Revisó Firma: — Nombre: — Director Territorial — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: — Nombre: — Gestor Técnico de Proyecto — Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	89

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUT: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** **DE** (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENIO No: 3119 DE 2023

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: (En meses según contrato principal)	6.2	PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	6.2
FECHA DE INICIO DEL CONVEN. (Indique día/mes/año)	########	FECHA DE VENCIMIENTO ACTL (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	31/08/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** (Según contrato principal)	$ 200,741,050.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B**	$ 200,741,050.00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	((%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAM VALOR OBRA EJECUTADA	% Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…	
GPP1				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP4				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP5				% P											
				$ P											%
				$ E											
				% E											
GPP6				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ÍTEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra pro
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										0.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	VALOR INICIAL * VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realic

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LILIANA VALENCIA
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA EL PELIGRO

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENIO No: 3089 DE 2023


OBJETO CONVENIO: ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL:	4.2 (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:	20/12/2023 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 201,005,912.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 201,005,912.00	

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
GPP2				% E										
				% P										
				$ P										
GPP3				$ E										
				% E										
				% P										
GPP4				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
GPP6				% E										
				% P										
				$ P										
GPP7				$ E										
				% E										
				% P										
GPP8				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

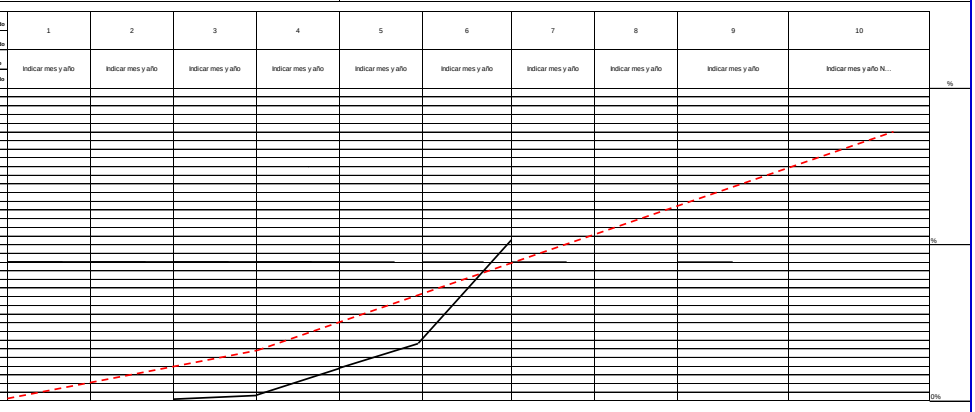

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registran en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: ONEY VALDEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA LLANO GRANDE

Aprueba Firma: _____
Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula Profesional No. 25202-48107 CND

INFORME DE INTERVENTORÍA N.8 AGOSTO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ ____

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENIO No: 3089 DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO GRANDE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 20/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 201,005,912.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 201,005,912.00

PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(V.VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

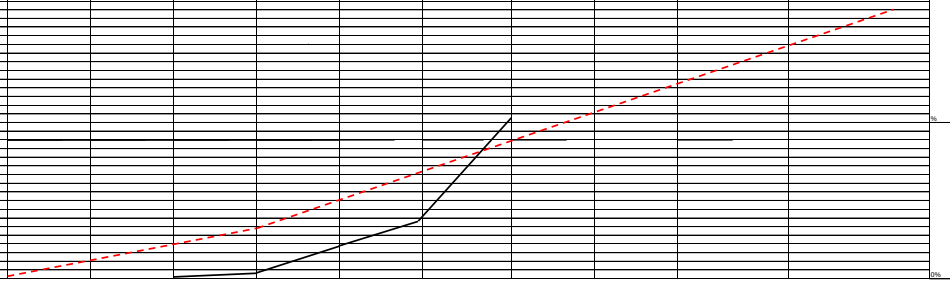

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ONEY VALDEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA LLANO GRANDE

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO Q.
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	89

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENI DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONVEN ######## (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 31/08/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 199,318,829.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B** $ 199,318,829.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAM / VALOR OBRA EJECUTADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 / Indicar mes y año	2 / Indicar mes y año	3 / Indicar mes y año	4 / Indicar mes y año	5 / Indicar mes y año	6 / Indicar mes y año	7 / Indicar mes y año	8 / Indicar mes y año	9 / Indicar mes y año	10 / Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (														

100%
0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra pro
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
RSIÓN OBRA EJECUTADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												

0.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS DEL CONTRATO CALLE	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: ____
Nombre: YONIER TUQUERRES
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA QUIROZ ATO

Aprueba Firma: ____
Nombre: M
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No. 25202-48107 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	89

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** **DE** (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No.
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENI DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA


CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONVEN ######## (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 200,698,283.00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B** **$ 200,698,283.00**

PLAZO ACUMULADO: 5.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 31/08/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAM / VALOR OBRA EJECUTADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (														

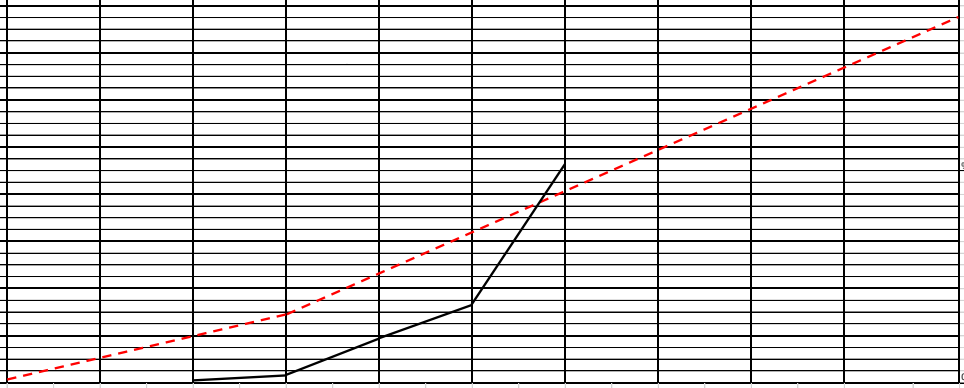

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra pro
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%												0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)												
RSIÓN OBRA EJECUTADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL	$ -		
* VALOR INCLUIDO EN EL CONTRATO C/A/A	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Wilder Ferney Ramos
Nombre: WILDER RAMOS
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA NUEVA FLORIDA

Aprueba Firma:
Nombre: N
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	89

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** **DE** (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No.
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENI DE 2023

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONVEN 20/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 201,402,474.00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 201,402,474.00**

PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 31/08/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	((%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAM VALOR OBRA EJECUTADA	% Programado $ Valor Programado % Ejecutado $ Valor Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (…														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (														

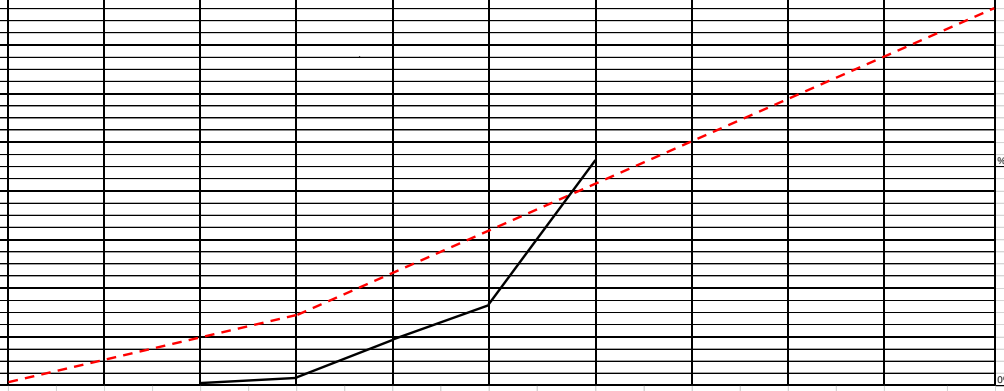

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra progra
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
RSIÓN OBRA EJECUTADA	%										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)										

0.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados


ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO DE IN	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la n

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ELIZABETH TORO
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA OLIVOS

Aprueba Firma:
Nombre: N
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND

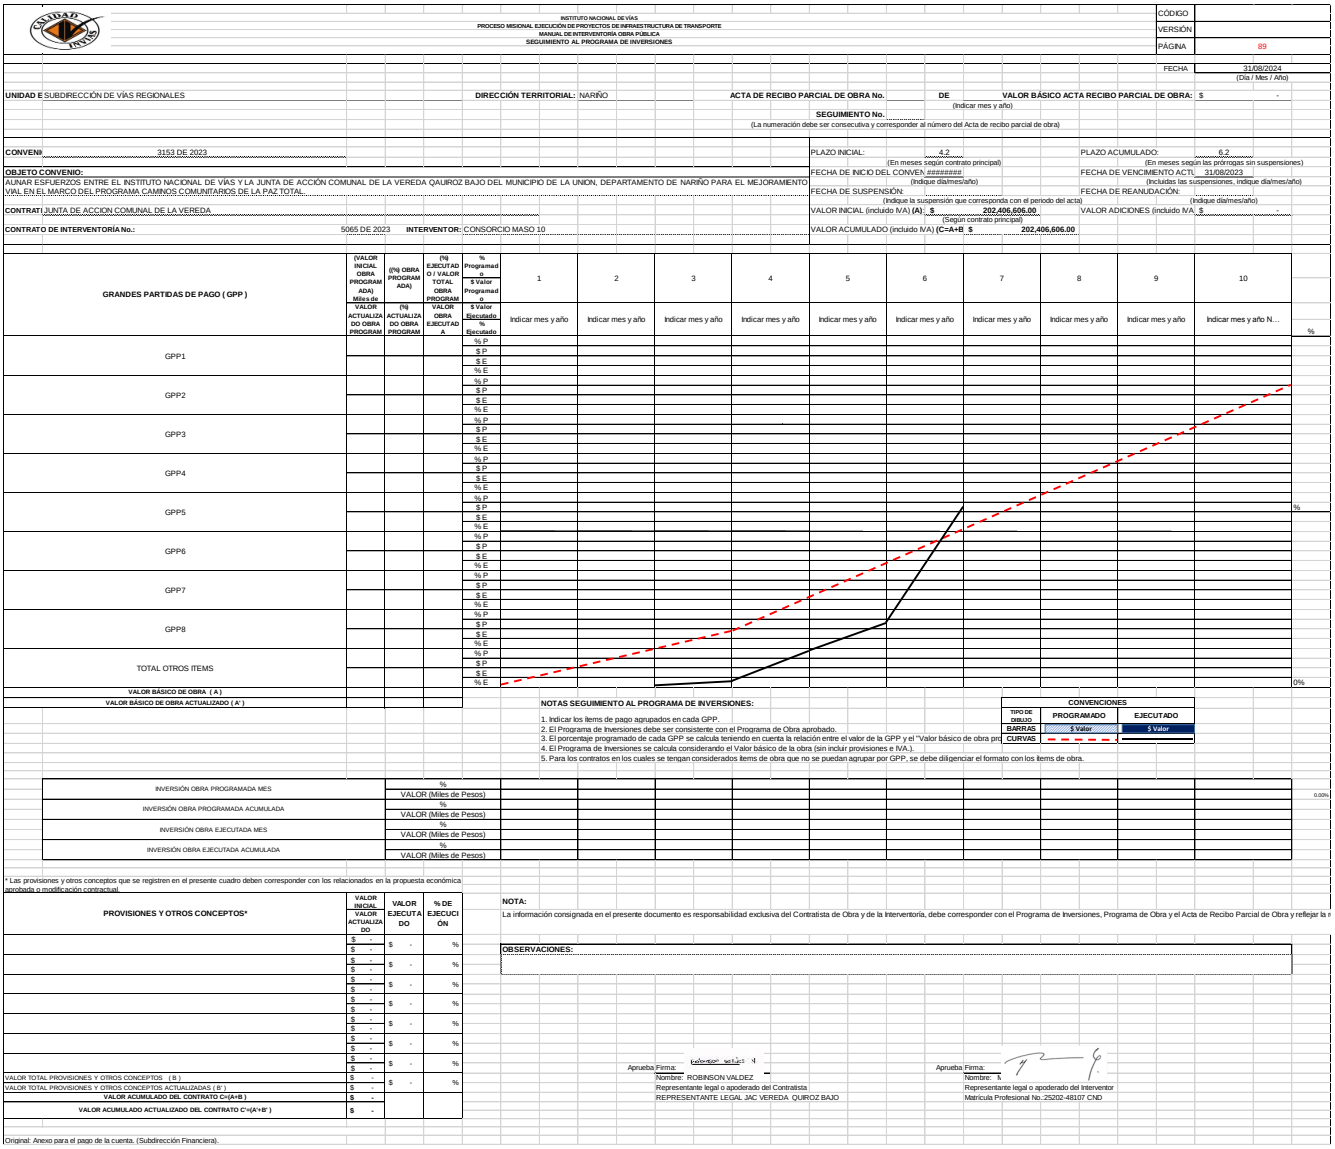

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 89

FECHA 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. — DE — (Indicar mes y año) — VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENIO: 3153 DE 2023 — PLAZO INICIAL: 4.2 (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QAUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. — FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: ######## (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA — FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10 — VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 202,406,606.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B: $ 202,406,606.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAM VALOR OBRA EJECUTADA	% Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra pro
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la r

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: — Nombre: ROBINSON VALDEZ — Representante legal o apoderado del Contratista — REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA QUIROZ BAJO

Aprueba Firma: — Nombre: N — Representante legal o apoderado del Interventor — Matrícula Profesional No.:2S202-48107 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

INFORME DE INTERVENTORÍA N.8 AGOSTO 2024
CONSORCIO MASO 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA 89

FECHA 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO | **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** | **DE** (Indicar mes y año) | **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENI DE 2023


OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATI JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

CONTRATO DE INTER 065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

PLAZO INICIAL: 4.2 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 6.2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONVEN 20/12/2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 31/08/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 200,048,634.00** (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 200,048,634.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	((%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAM VALOR OBRA EJECUTADA	% Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
GPP1				% P / $ P / $ E / % E										
GPP2				% P / $ P / $ E / % E										
GPP3				% P / $ P / $ E / % E										
GPP4				% P / $ P / $ E / % E										
GPP5				% P / $ P / $ E / % E										
GPP6				% P / $ P / $ E / % E										
GPP7				% P / $ P / $ E / % E										
GPP8				% P / $ P / $ E / % E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P / $ P / $ E / % E										
VALOR BÁSICO DE OBRA $ / %														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (														

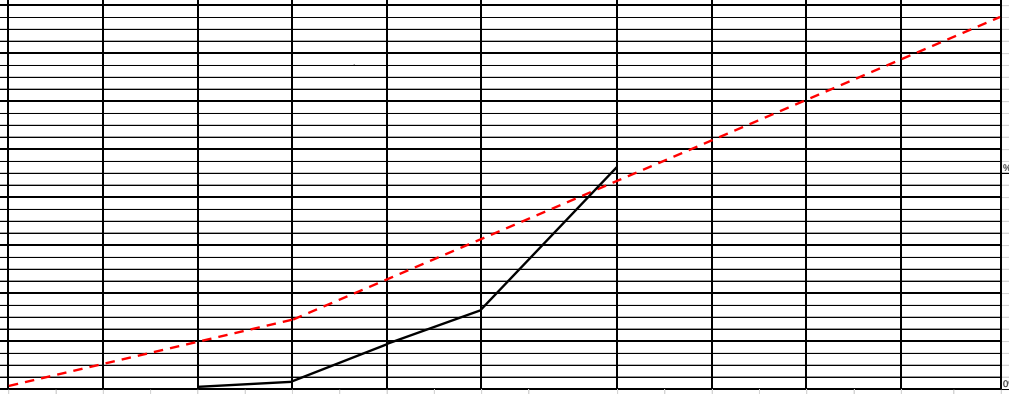

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada"
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
RSIÓN OBRA EJECUTADA	%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)											
	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

0.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados

ONES Y OTROS CON	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO EN LA	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: RAULURBANO
Representante legal o apoderado del Contratista
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA SAUCE3

Aprueba Firma:
Nombre: N
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-48107 CND

4.9.3 Actas de comité de obra: no se adjunta copia de los comités semanales realizados con los convenios en el formato MEPI-MN-IN-14-FR-1

4.9.4 Actas de reunión: NO se adjunta copia de REUNION en el formato MEPI-MN-IN-14-FR-2

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE SELECCIÓN	CONCURSO DE MERITO ABIERTO
CONTRATO	5065 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO MASO 10
CONSORCIO CONFORMADO POR	CMA-DEO-SVR-119-2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL-LOTE2
REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE SARRIA
SISTEMA	
VALOR DEL CONTRATO	$ 235.028.339
ANTICIPO	0
FECHA DE INICIACIÓN	30/12/23
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	UVEIMAN LAGOS
GESTOR TÉCNICO	DIEGO PABON
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	MAURICIO ROMERO

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

Durante este periodo del mes de agosto, la interventoría realizó el acompañamiento y verificación de ejecución de las siguientes actividades:

Durante el mes de agosto de 2024, se llevaron a cabo una serie de actividades y gestiones importantes relacionadas con la ejecución de proyectos en la Dirección Territorial de Nariño. Se destacan las reuniones de seguimiento técnico y administrativo entre la Interventoría y la supervisión por parte del INVIAS en los primeros días del mes.

- Se finalizaron las actividades de obra en los seis convenios faltantes
- Se realizaron la entrega de la obra a las diferentes JAC con su respectivo programa social
- Se solicita a las JAC la entrega de documentos para la liquidación de cada uno de los convenios
- Se solicita al invias aclarar el presupuesto del PAGA para poder cerrar las cuentas y dar cierre al informe financiero de cada uno de los convenios.

5.3 Informes de especialistas

En el presente mes de agosto la profesional Social y ambiental efectuaron el seguimiento a las actividadessociales realizadas por los contratistas y la revisión y presentación de las observaciones correspondientes a los diferentes documentos sociales y ambientales que entregaron los contratistas en el presente mes para revisión de la Interventoría.

5.4 Información otros programas y aplicativos.

En el presente mes de agosto no se desarrollaron otros programas

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VEHICULOS DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: agosto **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5065 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO MASO 10

CONTRATO DE OBRA No. 3089 DE 2023 / 3119 DE 2023 / 3121 DE 2023 / 3122 DE 2023 / 3153 DE 2023 / 3157 DE 2023 / 3281 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC DE LA VEREDA LLANO GRANDE - JAC VEREDA EL PELIGRO - JAC VEREDA SAUCE - JAC DE QUIROZ ALTO - JAC QUIROZ - JAC VEREDA OLIVOS - JAC VEREDA NUEVA FLORIDA DE LA UNION Y SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOCICLETA	PLACA NSA-13G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA JPE-59E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA JCV-106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA ZEA-97G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	PLACA BVZ-63E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.


NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma	Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA	Nombre: UVEIMAN LAGOS
Director de Interventoría	Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND	Matrícula Profesional No.:52202-77462

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.1 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

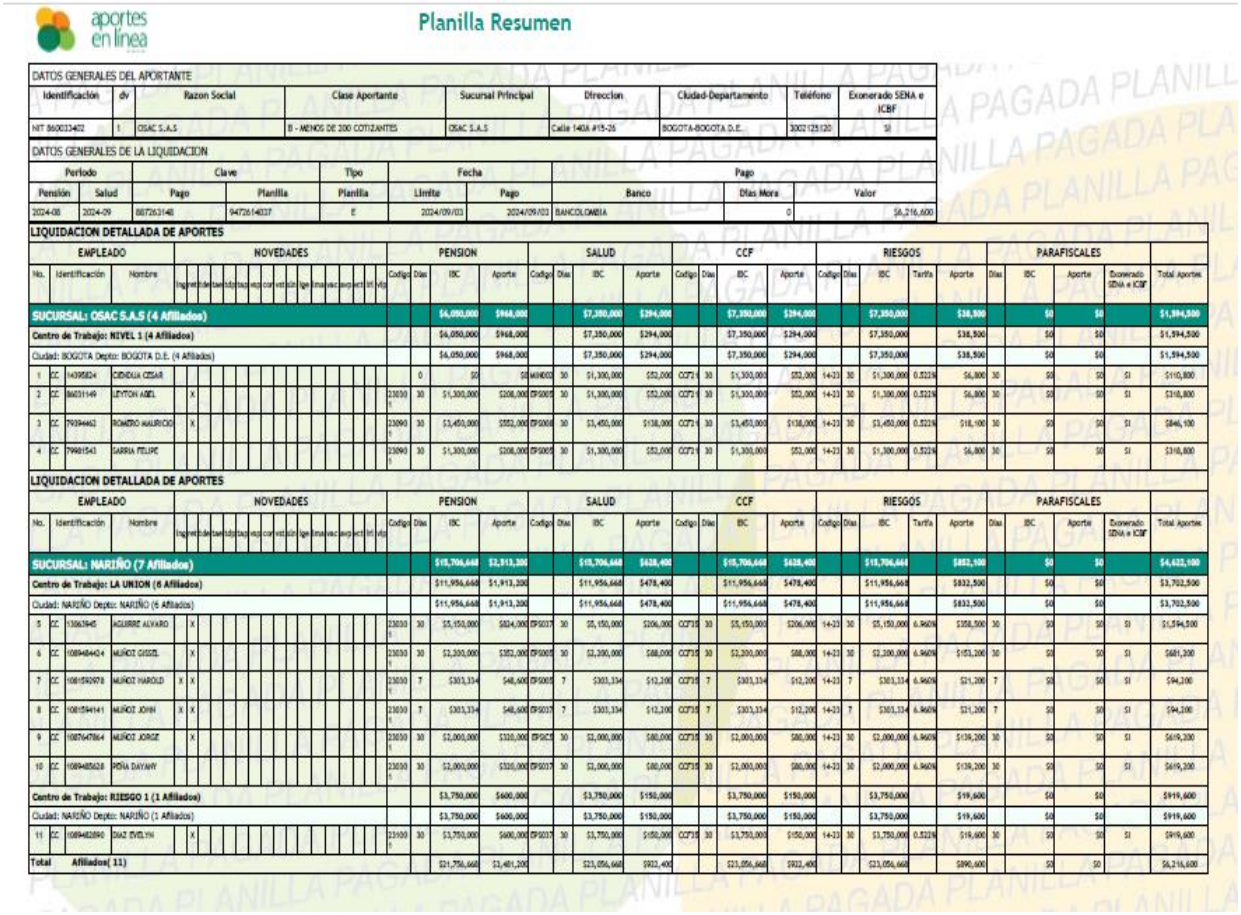

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860033402	1	OSAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OSAC S.A.S	Calle 140A #15-26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002125120	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	887263148	9472614037	E	2024/09/03	2024/09/03	BANCOLOMBIA	0	$6,216,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OSAC S.A.S (4 Afiliados)						$6,050,000	$968,000			$7,350,000	$294,000			$7,350,000	$294,000			$7,350,000		$38,500		$0	$0		$1,594,500
Centro de Trabajo: NIVEL 1 (4 Afiliados)						$6,050,000	$968,000			$7,350,000	$294,000			$7,350,000	$294,000			$7,350,000		$38,500		$0	$0		$1,594,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$6,050,000	$968,000			$7,350,000	$294,000			$7,350,000	$294,000			$7,350,000		$38,500		$0	$0		$1,594,500
1	CC	1439824	CENDUA CESAR		0	$0	$0	46N003	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$110,800
2	CC	86031149	LEYTON ADEL	X	23030	30	$1,300,000	$208,000	EP9005	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
3	CC	79394462	ROMERO MAURICIO	X	23090	30	$3,450,000	$552,000	EP9008	30	$3,450,000	$138,000	CCF1	30	$3,450,000	$138,000	14-23	30	$3,450,000	0.522%	$18,100	30	$0	$0	SI	$846,100
4	CC	79981541	SARRIA FELIPE		23090	30	$1,300,000	$208,000	EP9005	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NARIÑO (7 Afiliados)						$11,706,668	$2,313,200			$11,706,668	$438,400			$11,706,668	$438,400			$11,706,668		$882,100		$0	$0		$4,432,100
Centro de Trabajo: LA UNION (6 Afiliados)						$11,956,668	$1,913,200			$11,956,668	$478,400			$11,956,668	$478,400			$11,956,668		$832,500		$0	$0		$3,702,500
Ciudad: NARIÑO Depto: NARIÑO (6 Afiliados)						$11,956,668	$1,913,200			$11,956,668	$478,400			$11,956,668	$478,400			$11,956,668		$832,500		$0	$0		$3,702,500
5	CC	13063845	AGUIRRE ALVARO	X	23030	30	$5,150,000	$824,000	EP9017	30	$5,150,000	$206,000	CCF15	30	$5,150,000	$206,000	14-23	30	$5,150,000	6.960%	$358,500	30	$0	$0	SI	$1,594,500
6	CC	1089484414	MUÑOZ GISSEL	X	23030	30	$2,200,000	$352,000	EP9005	30	$2,200,000	$88,000	CCF15	30	$2,200,000	$88,000	14-23	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	SI	$681,200
7	CC	1081592978	MUÑOZ HAROLD	X X	23030	7	$303,334	$48,600	EP9005	7	$303,334	$12,200	CCF15	7	$303,334	$12,200	14-23	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	SI	$94,200
8	CC	1081594141	MUÑOZ JOHN	X X	23030	7	$303,334	$48,600	EP9017	7	$303,334	$12,200	CCF15	7	$303,334	$12,200	14-23	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	SI	$94,200
9	CC	1087647864	MUÑOZ JORGE	X	23030	30	$2,000,000	$320,000	EP9017	30	$2,000,000	$80,000	CCF15	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
10	CC	1089485628	PEÑA DAYANY		23030	30	$2,000,000	$320,000	EP9017	30	$2,000,000	$80,000	CCF15	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$3,750,000	$600,000			$3,750,000	$150,000			$3,750,000	$150,000			$3,750,000		$19,600		$0	$0		$919,600
Ciudad: NARIÑO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)						$3,750,000	$600,000			$3,750,000	$150,000			$3,750,000	$150,000			$3,750,000		$19,600		$0	$0		$919,600
11	CC	1089482890	DIAZ EVELYN	X	23100	30	$3,750,000	$600,000	EP9017	30	$3,750,000	$150,000	CCF15	30	$3,750,000	$150,000	14-23	30	$3,750,000	0.522%	$19,600	30	$0	$0	SI	$919,600
Total Afiliados(11)						$21,756,668	$3,481,200			$23,056,668	$922,400			$23,056,668	$922,400			$23,056,668		$890,600		$0	$0		$6,216,600

6.2 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 6/09/24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCION TERRITORIAL - Nariño

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023

INTERVENTOR: Consorcio MASO 10

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: agosto 2024

PROYECTO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA ELMEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

CONVENIO SOLIDARIO No: 3089-2023, 3119-2023, 3157-2023, 3281-2023, 3121-2023, 3122-2023, 3153-2023.

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA OAC EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANO GRANDE, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ.

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAFAM

NOMBRE CAJA DE COMPENSACION : CAFAM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Maurico Romero Quiroga	79.394.462	Director	$ 6.900.000	X			X		X	F		X	X		X	X	F	X					X	F		X				X	F	X		X	0,50	OSAC SAS	$ 3.450.000	$ 18.100	I	COMPENSAR	9472614037	$ 138.000	SKANDIA	9472614037	$ 552.000,00	$ 138.000	NO APLICA	NO APLICA	
2	Alvaro Efrain Aguirre Maya	13.063.945	Residente	$ 5.150.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	F	X	X	X	1,00	OSAC SAS	$ 5.150.000	$ 358.500	V	NUEVA EPS	9472614037	$ 206.000	PORVENIR	9472614037	$ 824.000,00	$ 206.000	NO APLICA	NO APLICA	
3	Evelin Juliana Diaz	1.089.482.890	Profesional Social	$ 3.750.000	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	F	X	X	X	1,00	OSAC SAS	$ 3.750.000	$ 19.600	I	ENSANNAR	9472614037	$ 150.000	PORVENIR	9472614037	$ 600.000,00	$ 150.000	NO APLICA	NO APLICA	
4	Felipe Sarria Vélez	79.981.543	Profesional Ambiental	$ 3.750.000							F					X		F					X		F				X	X		F	X		X	0,25	OSAC SAS	$ 1.300.000	$ 6.800	I	SANITAS	9472614037	$ 52.000	SKANDIA	9472614037	$ 208.000,00	$ 52.000	NO APLICA	NO APLICA	
6	Dayany Marcela Peña	1.089.485.628	Inspector	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X		X	X	F	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	F	X	X	X	1,00	OSAC SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	NUEVA EPS	9472614037	$ 80.000	PORVENIR	9472614037	$ 320.000,00	$ 80.000	NO APLICA	NO APLICA	
8	Jorge Andres Muñoz Sosque	1.087.647.864	Inspector	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	F	X	X	X	1,00	OSAC SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	MALLAMAS	9472614037	$ 80.000	PORVENIR	9472614037	$ 320.000,00	$ 80.000	NO APLICA	NO APLICA	
9	Abel Leyton	86.031.149	Inspector	$ 2.000.000	X			X		X	F		X	X		X	X	F	X					X	F		X				X	F	X		X	0,50	OSAC SAS	$ 1.300.000	$ 6.800	I	SANITAS	9472614037	$ 52.000	PORVENIR	9472614037	$ 208.000,00	$ 52.000	NO APLICA	NO APLICA	
10	Gissel Andrea Muñoz Rivera	1.089.484.424	Inspector SST	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	F	X	X	X	1,00	OSAC SAS	$ 2.200.000	$ 153.200	V	SANITAS	9472614037	$ 88.000	PORVENIR	9472614037	$ 352.000,00	$ 88.000	NO APLICA	NO APLICA	
12	John Alexander Muñoz Pasaje	1.081.594.141	Topografo	$ 303.334												X	X	F	X	X	X	X														0,23	OSAC SAS	$ 303.334	$ 21.200	V	NUEVA EPS	9472614037	$ 12.200	PORVENIR	9472614037	$ 48.600,00	$ 12.200	NO APLICA	NO APLICA	
13	Harold Andres Muñoz Pasaje	1.081.592.978	Cadenero	$ 303.334												X	X	F	X	X	X	X														0,23	OSAC SAS	$ 303.334	$ 21.200	V	SANITAS	9472614037	$ 12.200	PORVENIR	9472614037	$ 48.600,00	$ 12.200	NO APLICA	NO APLICA	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 28.396.668**																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha ..... N/A ..... a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-48107

Firma:
Nombre: Uveiman Hernando Lagos Vela
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77462

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3119-2023,3089-2023.3122-2023.3181-2023.3157-2023,3153-2023.3121-2023 **CONTRATISTA:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC DE LA VEREDA EL PELIGRO,JAC VEREDA LLANO GRNADE,JAC QUIROZ ALTO.JAC NUEVA FLORIIDA,JAC OLIVOS,JAC QUIROZ.JAC EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN Y SAN PABLO EN EL DEPARTAMENT

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5064-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MAURICIO ROMERO	79394462	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 3.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 18.100	I	COMPENSAR	9472614037	$ 138.000	SKANDIA	9472614037	$ 552.000	$ 138.000			
2	EVELYN JULIANA DIAZ	1089482890	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 19.600	I	NUEVA EPS	9472614037	$ 150.000	COLFONDOS	9472614037	$ 600.000	$ 150.000			
3	DAYANY MARCELA PEÑA	1089485628	INSPECTORA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 139.200	V	NUEVA EPS	9472614037	$ 80.000	PORVENIR	9472614037	$ 320.000	$ 80.000			
4	GISSEL ANDREA MUÑOZ	1089484424	INSPECTORA SST	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 153.200	V	SANITAS	9472614037	$ 88.000	PORVENIR	9472614037	$ 352.000	$ 88.000			
5	JORGE ANDRES MUÑOZ	1087647864	INSPECTOR	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 139.200	V	MALLAMAS	9472614037	$ 80.000	PORVENIR	9472614037	$ 320.000	$ 80.000			
6	ALVARO AGUIRRE	13063945	RESIDENTE INTERVENTORIA	$ 5.150.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 358.500	V	NUEVA EPS	9472614037	$ 206.000	PORVENIR	9472614037	$ 824.000	$ 206.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 6/09/24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

MES INFORME MENSUAL: 1 a 31 de agosto de 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3089-2023, 3119-2023, 3157-2023, 3281-2023, 3121-2023, 3122-2023, 3153-2023.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE / JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PELIGRO / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS / JUNTA DE ACCIONCOMUNAL DE LA VEREDA NUEVA / FLORIDA / JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAUCE / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIROZ ALTO / JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIROZ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1446523	C-2402-0600-14-0-2402041- 02	10	Nación	Principal	$ 230.211.152,22	
2023	1446523	C-2402-0600-14-0- 2402112-02	10	Nación	Principal	$ 4.698.186,78	
2024	535624	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	Nación	Adicional No 1	$ 66.994.000,00	
2024	733424	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	10	Nación	Adicional No 2	$ 19.166.700,00	
2024	733424	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	Nación	Adicional No 2	$ 75.102.928,00	
			TOTAL			$ 396.172.967,00	$ 69.327.495,60

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 396.172.967

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
anticipo							$ -					
1	22 a 31 de enero de 2024	$ 2.781.440,00	$ 528.473,60	$ 3.309.913,60	$ -	$ 3.309.913,60	$ -	1446523 - 2023/12/29	$ 231.599.425,40	$ 231.599.425,40		
2	feb-24	$ 17.450.000,00	$ 3.315.500,00	$ 24.075.413,60	$ -	$ 20.765.500,00	$ -	1446523 - 2023/12/29	$ 210.833.925,40	$ 210.833.925,40		
3	mar-24	$ 24.517.400,00	$ 4.658.306,00	$ 53.251.119,60	$ -	$ 29.175.706,00	$ -	1446523 - 2023/12/29	$ 181.658.219,40	$ 181.658.219,40		
4	abr-24	$ 36.776.500,00	$ 6.987.535,00	$ 97.015.154,60	$ -	$ 43.764.035,00	$ -	1446523 - 2023/12/29	$ 137.894.184,40	$ 137.894.184,40		
5	may-24	$ 58.024.720,00	$ 11.024.696,80	$ 166.064.571,40	$ -	$ 69.049.416,80	$ -	1446523 - 2023/12/29	$ 68.844.767,60	$ 68.844.767,60		
6	jun-24	$ 70.486.000,00	$ 13.392.340,00	$ 249.942.911,40	$ -	$ 83.878.340,00	$ -	1446523 - 2023/12/29 535624 - 2024/06/13	$ 51.960.427,60	$ 51.960.427,60		
7	jul-24	$ 64.624.000,00	$ 12.278.560,00	$ 326.845.471,40	$ -	$ 76.902.560,00	$ -	535624 - 2024/06/13 733424 - 2024/08/09	$ 69.327.495,60	$ 69.327.495,60		
8	ago-24	$ 58.257.000,00	$ 11.068.830,00	$ 396.171.301,40	$ -	$ 69.325.830,00	$ -	733424 - 2024/08/09	$ 1.665,60	$ 1.665,60		
TOTALES		**$ 332.917.060,00**	**$ 63.254.241,40**		**$ 0,00**	**$ 396.171.301,40**						

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 287.114.060,00	$ 54.551.671,40	$ 341.665.731,40
*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 45.803.000,00	$ 8.702.570,00	$ 54.505.570,00
*			
VALOR TOTAL	$ 332.917.060,00	$ 63.254.241,40	$ 396.171.301,40

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO QUIROGA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-48107

Firma
Nombre: Uveiman Hernando Lagos Vela
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 52202-77462

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.3 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPIMN1- IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDURECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO MASO 10

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS,SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

FECHA DE INICIO: 22/01/2024

PLAZO INICIAL: 30/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 234.909.339,00

VALOR ACUMULADO: $ 234.909.339,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: UVEIMAN LAGOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 23.490.933,90	26	12	23	07/12/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 39.480.561.200	26	12	23	07/12/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 46.981.867.800	26	12	23	7	6	27
Calidad del servicio		$ 70.472.801.700	2	1	24	2	1	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433305

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48107 CND

Firma
Nombre: UVEIMAN LAGOS V
Supervisor Contrato de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría: Se adjunta diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15

6.5 Seguimiento a la inversión del Anticipo: no aplica en el formato MEPI-MN-IN-3-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 6/09/24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No. 8** **ACTA FINAL X** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 58.257.000 **PERIODO:** 1 a 31 de agosto de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5065 DE 2023

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO MASO 10

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANO GRANDE — CONVENIO SOLIDARIO No.:3089-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO — CONVENIO SOLIDARIO No.: 3119-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS — CONVENIO SOLIDARIO No.:3157-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA — CONVENIO SOLIDARIO No.:3281-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE — CONVENIO SOLIDARIO No.:3121-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO — CONVENIO SOLIDARIO No.:3122-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ — CONVENIO SOLIDARIO No.: 3153-2023.

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 8,27 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 22/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 234.909.339 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 161.263.628

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 396.172.967

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 8 de fecha 09/08/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de Interventoría	$ 6.900.000,00		1,00	$ 6.900.000	$ -		3,86	$ 26.634.000	0,50	$ 3.450.000,00	3,86	$ 26.634.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.150.000,00		2,00	$ 10.300.000	$ -		3,27	$ 16.840.500	1,00	$ 5.150.000,00	3,27	$ 16.840.500,00
3	1	Profesional Social	$ 3.750.000,00		2,00	$ 7.500.000	$ -		6,00	$ 22.500.000	1,00	$ 3.750.000,00	6,00	$ 22.500.000,00
4	1	Profesional Ambiental	$ 3.750.000,00		2,00	$ 7.500.000	$ -		1,00	$ 3.750.000	0,00	$ -	1,00	$ 3.750.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 7.580.850								
5	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 6.100.000,00			$ -	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
6	1	Especialista en Estructuras	$ 6.100.000,00			$ -	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
7	1	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 6.100.000,00			$ -	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
8	1	Especialista Ambiental	$ 6.100.000,00			$ -	$ -		0,2	$ 1.220.000		$ -	0,20	$ 1.220.000,00
9	1	Especialista Hidráulica y/o Hidrologia	$ 6.100.000,00			$ -	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.100.000,00			$ -	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO												
11	1	Inspector	$ 2.000.000,00		10,00	$ 20.000.000	$ -		21,10	$ 42.200.000	2,50	$ 5.000.000,00	21,10	$ 42.200.000,00
12	1	Inspector SST	$ 2.200.000,00		2,00	$ 4.400.000	$ -		3,87	$ 8.514.000	1,00	$ 2.200.000,00	3,87	$ 8.514.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
13	1	Técnico administrativo	$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 66.780.850				$ 121.658.500		$ 19.550.000,00		$ 121.658.500,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 157.602.806**				**$ 287.114.060**		**$ 46.138.000,00**		**$ 287.114.060,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 8 de fecha 09/08/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
14	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 210.000,00	Día	10,00	$ 2.100.000	$ -		8,00	$ 1.680.000	4,00	$ 840.000	8,00	$ 1.680.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
15	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.500.000,00	Mes	2,00	$ 11.000.000	$ -		0,32	$ 1.760.000	0,15	$ 825.000	0,32	$ 1.760.000,00
16	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	Mes	12,00	$ 7.800.000	$ -		30,74	$ 19.981.000	5,00	$ 3.250.000	30,74	$ 19.981.000,00
17	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 12.000.000	$ -		1,88	$ 11.280.000	0,88	$ 5.280.000	1,88	$ 11.280.000,00
18	1	Ensayos de laboratorios.	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.200.000	$ -		2,46	$ 1.476.000	0,48	$ 288.000	2,46	$ 1.476.000,00
19	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.600.000	$ -		7,16	$ 5.728.000	1,00	$ 800.000	7,16	$ 5.728.000,00
		OTROS COSTOS												
20	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.600.000	$ -		1,18	$ 1.534.000	0,56	$ 728.000	1,18	$ 1.534.000,00
21	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000	$ -		1,64	$ 492.000	0,00	$ -	1,73	$ 519.000,00
22	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000	$ -		5,75	$ 1.725.000	0,29	$ 87.000	5,75	$ 1.725.000,00
23	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 300.000	$ -		1,00	$ 150.000	0,14	$ 21.000	0,80	$ 120.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								-$ 1.600				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 39.800.000**				**$ 45.804.400**		**$ 12.119.000,00**		**$ 45.803.000,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 197.402.806,00				$ 332.918.460	Valor total básico	$ 58.257.000,00		$ 332.917.060,00
		IVA (D) = (C) * (% IVA)				$ 37.506.533,14				$ 63.254.507	IVA	$ 11.068.830,00		$ 63.254.241,40
		Costo Total = (C) + (D)				**$ 234.909.339**				**$ 396.172.967**	Valor total	**$ 69.325.830,00**		**$ 396.171.301,40**

Valor Anticipo Otorgado	$ -	0%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 58.257.000,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 58.257.000,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	46.138.000	$ 8.766.220,00	$ 54.904.220,00
*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	12.119.000	$ 2.302.610,00	$ 14.421.610,00
*			
-			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	58.257.000	$ 11.068.830,00	$ 69.325.830,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 69.325.830,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Sesenta y nueve millones trescientos veinticinco mil ochocientos treinta pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: Filipe Sarria Vélez
Representante Legal
Interventoría
Matrícula No.: 5260-123850 CND

Firma
Nombre: Uveiman Hernando Lagos Vela
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 52202-77462

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6 Seguimiento al Plan de Cargas: Se adjunta el seguimiento mensual en el formato MEPI-MNIN-9-FR-2

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Revisión de materiales pétreos que cumplan, en los siete convenios cumple con lo reglamentario.

- Se logra el objetivo planteado en los convenios solidarios, con obras de calidad y acorde a sondeos realizados por la profesional social la comunidad se encuentra satisfecha con los pavimentos, los que cumplen con las expectativas iniciales teniendo entre otras mayor comodidad en el transporte de sus productos minimizando el polvo y las fallas en la vía en época invernal, se observa gratitud en las comunidades beneficiadas.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista, interventoría

correspondencia cursada entre la JAC LLANO GRANDE CONVENIO 3089 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
2/08/2024	N-GR-019-2024	SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO	X	
12/08/2024	N-GR-020-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE	X	
23/08/2024	N-GR-021-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE	X	
31/08/2024	N-GR-022-2024	SOLICITUD DE INFORMACION PARA LIQUIDACION	X	

correspondencia cursada entre la JAC LOS OLIVOS CONVENIO 3157 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
1/08/2024	N-OL-018-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE	X	
2/08/2024	N-OL-019-2024	SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO	X	
15/08/2024	N-OL-020-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE	X	
23/08/2024	N-OL-021-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE	X	
31/08/2024	N-OL-022-2024	SOLICITUD DE INFORMACION PARA LIQUIDACION		

correspondencia cursada entre la JAC EL PELIGRO CONVENIO 3119 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
2/08/2024	N-PE-018-2024	SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO	X	
12/08/2024	N-PE-019-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD CIERRE	X	
23/08/2024	N-PE-020-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD CIERRE	X	
29/08/2024		ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE		X
26/08/2024	N-PE-019-2024	SOLICITUD DE NO INTERVENIR EL TRAMO		X

correspondencia cursada entre la JAC EL SAUCE CONVENIO 3121 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
1/08/2024	N-SA-018-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD CIERRE	X	
2/08/2024	N-SA-019-2024	SOCIALIZACIÓN DE CIERRE DEL CONVENIO	X	
15/08/2024	N-SA-020-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD CIERRE	X	
23/08/2024	N-SA-021-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD CIERRE	X	
26/08/2024		ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE		X
31/08/2024	N-SA-022-2024	SOLICITUD DE INFORMACION PARA LIQUIDACION	X	

correspondencia cursada entre la JAC EL QUIROZ ALTO CONVENIO 3122 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
1/08/2024	N-QA-022-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD CIERRE	X	
2/08/2024	N-QA-023-2024	SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO	X	
15/08/2024	N-QA-024-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD CIERRE	X	
23/08/2024	N-QA-025-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD CIERRE	X	
28/08/2024		ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE		X
31/08/2024	N-QA-026-2024	SOLICITUD DE INFORMACION PARA LIQUIDACION	X	

correspondencia cursada entre la JAC QUIROZ BAJO CONVENIO 3153 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
2/08/2024	N-QB-016-2024	SOCIALIZACION DE CIERRE CONVENIO	X	
12/08/2024	N-QB-017-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE	X	
23/08/2024	N-QB-018-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE	X	
31/08/2024	N-QB-019-2024	SOLICITUD DE INFORMACION PARA LIQUIDACION	X	

correspondencia cursada entre la JAC NUEVA FLORIDA CONVENIO 3281 DE 2023 INTERVENTORIA MASO 10				
FECHA	**REFERENCIA**	**ASUNTO**	**ENVIADA**	**RECIBIDA**
2/08/2024	N-NF-018-2024	SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO	X	
12/08/2024	N-NF-019-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE	X	
12/08/2024		ACTAS DE VECINDAD DE INICIO CORREJIDAS		x
23/08/2024	N-NF-020-2024	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE	X	
29/08/2024		ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE		X
30/08/2024	N-NF-021-2024	SOLICITUD DE INFORMACION PARA LIQUIDACION	X	

8.2 Registro fotográfico

EL SAUCE





OLIVOS





NUEVA FLORIDA





EL PELIGRO


jueves, 22 de agosto de 2024
La Union
La Unión
Nariño


21 ago. 2024 10:02:36 a. m.

QUIROZ BAJO





INFORME DE INTERVENTORÍA N.8 AGOSTO 2024
CONSORCIO MASO 10

QUIROZ ALTO


NoteCam Pro
Latitud: 1.622162
Longitud: -77.169919
Elevación: 1631.13±70.55 m
Precisión: 1387.76 m
Tiempo: 24-08-2024 17:08:58
Nota: Quiroz Alto



LLANO GRANDE





INFORME DE INTERVENTORÍA N.8 AGOSTO 2024
CONSORCIO MASO 10

COPIAS DE BITACORAS MES DE AGOSTO

LLANO GRANDE

1/08/2024 Clima: Seco

Jueves Equipo: Herramienta menor, trompo, vibrador, cortadora

Personal en Obra: 1 Maestro, 7 Obreros, Ing. residente junta, Inspector Int.

Se continúa con la fundición y formaleteo del carril izquierdo vía Llano grande - La unión con un alcance de 6 placas de 3.50m x 2.50m, se realiza corte de juntas de la fundición del día de ayer.

Andrés Sosa

2/08/2024 Clima: Seco

Viernes Equipo: Herramienta menor, trompo, vibrador, cortadora

Personal en Obra: 1 Maestro, Obreros, Residente junta, Ing. Inspector Interventoría

Se continúa con la fundición y formaleteo del carril izquierdo vía Llano Grande - La unión con un alcance de 6 placas de 3.50m x 2.50m, a la espera de cemento para poder continuar el día de mañana puesto que en obra quedan solo 76 bultos, se realiza corte de juntas de la fundición del día de ayer.

Andrés Sosa

3/08/2024 Clima: Seco
Sábado Equipo: Trompo, Vibrador, Cortadora de cto, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Maestro, 7 Obreros, Residente Int, Inspector

Se estuvo a la espera de la llegada de cemento pero no fue posible, el equipo del maestro logra fundir 2 placas de (3.5 x 2.5) m y no habiendo mas material se culminan las actividades del día de hoy.

Andrés Sosaé

5/08/2024 Clima: Seco
Lunes Equipo: Trompo, Vibrador de cto, Cortadora de cto, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Maestro, 7 Obreros, Residente Int, Inspector Social Int

Se continua con actividades de fundición y formaleteo del carril izquierdo vía Llano Grande - La Unión con un alcance de 7 placas fundidas con dimensiones de 2.5 m de ancho, se realiza corte de juntas de las fundiciones anteriores. Presencia de lluvias, se abren las losas. Llegada de concreto

Andrés Sosaé

6/08/2024 Clima: Seco
Martes Equipo: Trompo, Vibrador de cto, Cortadora, Herramienta menor
Personal en Obra: Residente junta, Maestro, Obreros, Inspector Intervento ría.

Actividades de fundición y formaleteo del carril izquierdo vía Llano Grande - La Unión con un alcance de 7 placas fundidas con dimensiones de 2.5 m de ancho, se realiza cortes de juntas de las placas fundidas el día de ayer. Llegada de concreto.

Andrés Sosaé

7/08/2024 Clima: Seco
Miercoles Equipo: Trompo, Vibrador de cto, Cortadora de cto, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, 1 Maestro, Obreros.

Se continua con actividades de fundición y formaleteo del carril izq. vía Llano - Grande - La Unión con un alcance de placas fundidas y una meta física de 130 m aprox.

Andrés Sosaé

8/08/2024 Clima: Seco
Jueves Equipo: Herramienta menor, trompo, vibrador de ecto, cortadora
Personal en Obra: Presidente junta, Director Interventoría, Residente Interventoría, SISO Interventoría, Social Interventoría, Inspectores Interventoría

Actividades de formaleteo y fundición de bordillo, alcanzando una meta de 55 metros lineales de bordillo fundido el día de hoy, se utilizo acero #3/8" para el bordillo, 2 varillas longitudinales

Andrés Sosa

9/08/2024 Clima: Seco
Viernes Equipo: Trompo, Vibrador, Herramienta menor
Personal en Obra: Presidente junta, SISO Int, Maestro, 7 Ayudantes

Famaleteo y fundición de bordillo, amarre de acero de 3/8" para bordillo, 2 varillas ubicadas longitudinalmente por entre ganchos de 3/8", se funden 101m de bordillo

Andrés Sosa

10/08/2024 Clima: Seco
Sabado Equipo: Trompo, Vibrador de ecto, Herramienta menor
Personal en Obra:

Formaleteo y fundición de bordillo, con acero de 3/8", 2 varillas longitudinales.
Se alcanzan a fundir 48 metros de bordillo vibrado y con enrasado superior.

Andrés Sosa

12/08/2024 Clima: Seco
Lunes Equipo: Trompo, Vibrador de ecto, Herramienta menor
Personal en Obra:

Amarre de acero de 3/8" y formaleteo para fundición de bordillo.
Se logran fundir 43,5 metros de bordillo, dejando en obra un total de 247m de bordillo.

13/08/2024 Clima: Seco Personal en Obra: Maestro, 7 Obreros, Insp. Andrés Sosa
Martes Equipo: Trompo, Vibradores de ecto, Herramienta menor Interventoría
Pers

Fundición de 4 losas más, dos a cada lado y 6m de bordillo (6,05m), puesto que se realizo un balance general y se pudieron aumentar estas cantidades. Se termina obra

OLIVOS

01/08/2024 Clima: Seco
Jueves Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Cortadora de ccto. Herramienta menor
Personal en obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros

Actividades de formaleteo y amarre de acero para ccto reforzado, para un total de 30 m formaleteados y amarrados, varilla 3/8" espaciada c/20 cm en ambos sentidos, (4 varillas de 3/8" longitudinalmente), e=0,15 m.

Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Interventoría.

02/08/2024 Clima: Seco
Viernes. Equipo: Mezcladora, Vibrador para ccto, Rastrillo, Cortadora de ccto, Herramienta menor
Personal en Obra: Residente junta, Residente int, Inspector Int, Maestro, Obreros

Actividades de fundición de ccto reforzado, losas de 0,9m y cunetas de 0,7m. e=0,15m. Se realizan 30 m³ de concreto

Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Interventoría

03/08/2024 Clima: Seco
Sábado Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obrero

Formaleteo y fundición de ccto ciclopeo, e=0,15, 3 placas de 0,9x2,8, 6 placas de 0,15

Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Sosa
Interventoría.

05/08/2024 Clima: Seco
Lunes Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros

Actividades de armarre de acero para proceder con la fundición

de las ultimas losas de concreto reforzado.
Se esta a la espera de terminar actividades de fundición el día miércoles

Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoría

06/08/2024 Clima: Seco
Martes Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros

Fundición de losas y cunetas en concreto reforzado con varilla de 3/8", así también se procedio a fundir dos losas de 0,45m de ciclopeo y una losa de 0,90m.

Carmen Emilia S
Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoría.

07/08/2024 Clima: Seco
Miercoles Equipo: Mezcladora, Vibrador, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Residente int, Inspector Int, Social Int, Director Int, SISO Int.

Fundición de 3 metros de ciclo reforzado con varilla de 3/8, placas de 0.9m y cuneta de 0,7m, alcanzando una meta física de 159 m de placa huella para dar por terminadas las labores de fundición.

Carmen Emilia S.
Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoría

08/08/2024 Clima: Seco
Jueves Equipo: Herramienta menor, Cordon Bulkon
Personal en Obra: Inspector Int, Maestro, 1 Ayudante.

Sellado de juntas

Andrés Soscué
Interventoría

09/08/2024 Clima: Seco

Personal en Obra: Maestro, Ayudante, Equipo topografía Interventoría.

Equipo: Herramienta menor.

Sello de juntas: Se finalizan las labores en este convenio.

Levantamiento topografía por parte de Interventoría.

Andrés Sosa
Interventoría.

NUEVA FLORIDA

1/08/2024 Clima: Seco

Viernes Personal en Obra: Inspector Int, Residente junta, Residente Int, Maestro, Obreros

Equipo: Mezcladora, Vibrador de ccto, Rastrillo, Herramienta menor.

Actividades de fundición de losas de ccto ciclopeo, con anchos de 1m y espesor de 0,15m. Llego cemento, 150 bultos, llegada de mat. pétreo.

Resp. Contratista

Andrés Fosaé
Interventoría

2/08/2024 Clima: Seco

Viernes Personal en Obra: Residente junta, Maestro, Obreros, Inspector Int.

Equipo: Mezcladora, Vibrador, Herramienta menor.

Fundición de cunetas en ccto reforzado con varilla de 3/8" c/20cm y Fundición de losas de ccto reforzado ancho 1m

Resp. Contratista.

Andrés Fosaé
Interventoría

3/08/2024 Clima: Seco

Sábado Personal en Obra: Residente junta, Maestro, Obreros

Formaleteo y amarre de acero de 3/8", instalación de 5 varillas por placa de ancho 1m, longitudinalmente. Fundición de cunetas; se logra una meta física de 48m hasta hoy

Resp. Contratista

Andrés Fosaé
Interventoría

5/08/2024 Lunes
Clima: Seco
Equipo: Mezcladora, Vibrador, Herramienta menor
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros

Actividades de fundición de ccto reforzado, con 5 varillas de 3/8" longitudinales y transversalmente varillas de 3/8 c/20 cm, Llegada de cemento 200 bultos, se reciben viajes de tiburado y arena (6 viajes).

Resp Contratista

Andrés Sosa
Interventoría

6/08/2024 Martes
Clima: Seco
Equipo: Mezcladora, Vibrador, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, SISO Int, Inspector Int, Maestro, Obreros

Fundición de ccto ciclopeo, se respetan las proporciones 60/40.
Formaleteo y amarre de acero de 3/8" para cuneta. c/20 cm

Resp. Contratista.

Andrés Sosa
Interventoría

7/08/2024 Miércoles
Clima: Seco
Equipo: Mezcladora, Vibrador de ccto, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Residente Int, Inspector Int, Maestro,

Actividades de formaleteo, amarre de acero de 3/8" para placas y cuneta en ccto reforzado.

Resp. Contratista

Andrés Sosa
Interventoría.

8/08/2024 Jueves
Clima: Seco
Equipo: Mezcladora, Vibrador de ccto, Plastillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros.

Formaleteo, amarre de acero y fundición de ccto reforzado. e=0,15m.

Resp. Contratista

Andrés Sosa
Interventoría.

09/08/2024
Viernes

Clima: Seco
Equipo: Mezcladora, Vibrador de ccto, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, SISO Int, Inspector Int, Maestro, Obreros.

Fundición de losas de ccto ciclopeo. Espesor de losa 15 cm ✓
Se recibieron 11 viajes de arena y 11 viajes de triturado.

Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoría.

10/08/2024
Sábado

Clima: Seco
Equipo: Mezcladora, Vibrador de ccto, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Maestro, Obreros

Amarre de acero para fundición de ccto ciclopeo y conjuntamente se desarrollan actividades de fundición de cunetas, acero de 3/8 c/20 cm.

Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoría.

12/08/2024
Lunes

Clima: Seco
Equipo: Mezcladora, Vibrador de ccto, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros

Actividades de fundición de ccto reforzado, placas de 1m de ancho con varilla de 3/8"
Igualmente se procederá con amarre de acero de 3/8" para cunetas.

Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoría.

13/08/2024
Martes

Clima: Seco
Equipo: Mezcladora, Vibrador de ccto, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros.

Fundición de ccto ciclopeo losas de 1m de ancho, el día de ayer se completaron 100ml de placa.

Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoría.

14/08/2024 Clima: Seco
Miercoles Equipo: Vibrador de ecto, Mezcladora, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Residente Interventoría, Inspector Int, Maestro Obreros.

Actividades de funchcion, placas de ecto ciclopeo ancho 1m, espesores de 0,15m; fundición de cunetas. Se logra una meta de 30ml de ecto ciclopeo al dia de hoy.

Resp. Contratista

Andrés M. Soscué
Interventoría.

15/08/2024 Clima: Seco
Jueves Equipo: Mezcladora, Vibrador de ecto, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, SISO Int, Inspector Int, Maestro, Obreros.

Actividades de formaleteo y amarre de acero, varillas de 3/8" ubicados en ambos sentidos, para las placas de ancho 1m se estan ubicando 5 varillas longitudinalmente. Se reciben 50 bultos de cemento marca Cemex.

Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoria.

16/08/2024 Clima: Seco
Viernes Equipo: Mezcladora, Vibrador de ecto, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Maestro, Obreros

Fundición de losas de ecto reforzado e=0,15m, concreto ciclopeo.
- ✓ Toma de cilindros.
- ✓ Fundición de cunetas.

Resp. Contratista

Andrés Soscué
Interventoria.

17/08/2024 Clima: Seco
Sabado Equipo: Mezcladora, Vibrador de ecto, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Maestro, Obreros.

Relleno de laterales.

Actividades de conformación de suelo, para instalación de vigas riostras.

Resp. Contratista

Andrés Sosaré
Interventoría

19/08/2024
lunes

Clima: Seco
Equipo: Vibrador de ccto, Mezcladora, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros.

Fundición de ccto ciclopeo, espesor de 0,15m relación 60/40.
Formaleteo y amarre de acero para ccto reforzado con varilla de 3/8"

Resp. Contratista

Andrés Sosaré
Interventoría

20/08/2024
Martes

Clima: Seco
Equipo: Mezcladora, Vibrador de ccto, Rastrillo, Herramienta menor.
Personal en Obra: Residente junta, SISO Int, Inspector Int, Maestro, Obreros

Actividades de fundición de ccto reforzado, espesor 0,15m ancho 1m
Conformación del suelo para ubicación de vigas riostras, se esta a la espera de poder columnar la placa el día 22 de agosto.

Resp. Contratista

Andrés Sosaré
Interventoría

21/08/2024
Miercoles

Clima: Seco
Equipo: Mezcladora, Vibrador de ccto, Rastrillo, Herramienta menor
Personal en Obra: Residente junta, Inspector Int, Maestro, Obreros. SISO Int.

Actividades de formaleteo y fundición de ccto ciclopeo, losas con ancho de 1m.
✓ Formaleteo y amarre de acero para fundición de ccto reforzado, losas de 1m con varilla de 3/8", 5 varillas longitudinales y transversales c/20cm.

Resp. Contratista

Andrés Sosaré
Interventoría

22/08/2024
Jueves

Clima: Seco
Equipo: Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor
Personal en Obra: Residente junta, Residente Interventoría, Inspector Int, Maestro, Obreros

Actividades de fundición de cunetas; logrando culminar con total satisfacción la meta física total de la placa huella, dejando así una placa huella de 180ml

Resp. Contratista

Andrés Sosaué.
Interventoría.

EL PELIGRO

con el trompo y se procedio a cambiarlo por otro, y se fundio la losa de transicion del K000-001. Ing residente

31-7-24. Clima. Soleado.
Personal en Obra: 9 Oficiales. Maestro, Ing. residente, Ing. Ins Interventoria.
Personal por Parte de la junta. Para la, Conformacion de Sub base.
Se llevo a cabo la conformación de la Sub-base que estaba pendiente en el tramo. Km. 000+095 a la Km 000+130. este se llevo a cabo por personal calificado que lo envio la junta. realizaron una estabilización de la sub base existente con cemento, Primero escarificaron con maquinaria motoniveladora y aplicaron cemento y Compactaron con rana. en esta actividad el ingeniero residente no esta al frente.
Se realizo el acopio de un viaje de Arena. Como tambien se conformo 9 modulos de concreto ciclopeo, Se recibio 400 Varillas de 3/8 para el Concreto reforzado. Ing residente

1-8-24. Clima Soleado.
Personal en Obra: 9. Oficiales, Maestro, Ing. residente, Ing. Ins. Interventoria, Presidenta. Junta Comunal.
Se llevo a Cabo la Conformacion del Concreto ciclopeo laterales. 9 modulos de 3 metros de largo. Se aplico antisol para un mejor Curado del Concreto. como tambien se recibio 240 bultos de Cemento la Señora presidenta estubo presente. Ing residente

2-8-24. Clima. Soleado.
Personal en Obra: 9 oficiales, Maestro, Ing. residente, Ing. Ins. Interventoria.
Se llevo a cabo el desencofrado del concreto ciclopeo, y se llevo a Cabo el amarre del

Powered by CamScanner

acero para el concreto reforzado, Colocacion de Vigas en acero y amarre. tambien se lleva a cabo el formaleteo de las cunetas para fundir.

Ing residente

5-8-24. Clima Soleado

Personal en obra: Ing residente, Ins de interventoria, Maestro, 4 oficiales.

Se lleva a cabo la fundicion de concreto reforzado Se fundieron 21 bultos desde el K00+075 hasta el K00+068, se aplico antisol para un mejor fraguado del Concreto, Como tambien se recibio un viaje de arena.

Ing residente

5-8-24. Clima. Soleado.

Personal: Ing residente; Ing. inspector Interventoria, Maestro, 8 oficiales.

Se continua con la fundicion de concreto reforzado desde el K00+068 hasta el K00+058, se aplico antisol Como tambien se recibieron 2 Viajes de triturado.

Ing residente

6-8-24. Clima soleado.

Personal. Ing. residente; Ing Ins. interventoria. Presidente junta, 4 oficiales, Maestro.

Se recibio 1 Viaje de triturado y 2 viajes de arena Como tambien se fundio Concreto reforzado con 37 bultos.

Ing residente

7-8-24. Clima soleado.

Se trabajo festivo. se formaleteo 15 m de Concreto ciclopeo. se relleno con piedra.

Personal en obra. Ing residente, Ing ins. Interventoria, 9 oficiales, Maestro

Ing residente

3-8-24. Clima soleado.

Personal: Ing. residente, Ing Interventoria, Presidente junta, Maestro, 4 oficiales.

Se fundio Concreto ciclopeo 15 m. dode el K00+058 hasta el K00+038.

Ing. residente

9-8-24. Clima. Soleado.
Personal. Ing residente, Ing ins. Interventoria, presidente junta, Maestro, 9 oficiales.
Se conformo ~~el~~ o se coloco hierro de losa y vigas como tambien se fundieron 23 bultos de Concreto reforzado.
Ing residente.

10-8-24. Clima. Soleado.
Personal: Ing residente, Ing ins. Interventoria, Presidente junta, Maestro, 9 oficiales.
Se funde Concreto reforzado 30,5 bultos, se doto de guantes a los trabajadores.
Ing residente.

12-8-24.
Clima Soleado.
Personal: Ing. residente, Ing ins interventoria, Presidente junta, Maestro, 9 oficiales.
Se formaleteo 30 m de Concreto ciclopeo y se relleno con piedra, como tambien se recibieron 120 bultos de cemento.
Ing residente.

13-8-24. Clima Soleado.
Personal: Ing residente, Ing ins interventoria, presidente junta, Maestro, 9 oficiales.
Se fundieron 114 bultos de Concreto ciclopeo se aplico antisol, llego nuevo bogui.
Ing residente.

14-8-24.
Clima Soleado.
Personal: en Obra: Ing residente, Ing ins. interventoria, presidente ~~(interventoria)~~ junta, Maestro, 9 oficiales.
Se amarro hierro de losa, se instalan el acero de las vigas y se instalo el acero de las cunetas. 30 m de hierro. este dia tambien la interventoria trajo el técnico para tomar las muestras de densidad del terreno en las abisas Km+128 y la abisa Km+095.
Ing residente.

3

15-8-24. Clima. Soleado.
Personal en Obra: Ing residente, Ing ins interventoria, 9 oficiales, Maestro.
Se fundieron 37 bultos de Concreto reforzado entre losas, vigas, y cunetas, como tambien se aplico antisol
Ing residente

16-8-24.
Clima Soleado
Personal en Obra: Ing residente, Ing ins interventoria, 9 Oficiales, Maestro, Presidente junta.
Se fundieron 24 bultos de cemento para Concreto reforzado. de Cunetas, losas y vigas, se aplica, antisol, Como tambien llegaron 50 bultos de Cemento se conformo formaleta. de para. Concreto ciclopeo y se realizo el traslado de material que estorba. para. formaletear.
Se tuvo la visita del personal de. Ing residente
17-8-24. Social. para tratar temas de Vecindad.
17-8-24. Clima. Soleado
Personal en Obra: Ing residente; Ing. ins Interventoria, Maestro, 9 Oficiales, Presidente junta.
Se fundieron. 25 bultos en Concreto ciclopeo y se continuo con el traslado de material.
Ing residente

19-8-24. Clima Soleado.
Personal en Obra: Ing. residente, Ing ins. de interventoria, Maestro, 9 Oficiales, Presidente. junta.
Este lunes se llevo a cabo la actividad del amarre de hierro de losas, Cunetas y vigas, tambien realizamos la firma de las actas de vecindad. de don Simon.
Ing residente

20-8-24. Clima. Soleado.
Personal en Obra: ing residente, Ing ins de Interventoria, Maestro, 9 oficiales, Presidente junta.
Este martes se llevo a cabo la Conformacion del concreto reforzado, entre losas, Vigas, y Cunetas, se fundieron 52 bultos.
Ing. residente

21-8-24 Clima Soleado.
Personal en Obra: Ing residente, ing ins de interventoria, Maestro, 9 oficiales, Presidente junta.
Se termino de Conformar con 23 bultos concreto reforzado y se formaleteo un restante de 9 m de Concreto ciclopeo y se procedio a fundir este ciclopeo.
Ing residente

22-8-24 Clima Soleado.
Personal en Obra: Ing residente, Ing ins de interventoria, Maestro, 9 Oficiales, Presidente junta.
Este jueves 22 se llevo a cabo la fundicion de Concreto reforzado con 32 bultos, Como tambien se hizo la excavacion en la abscisa 129 en la Construccion de un muro en la Cuneta para reforzarla y que no se socabonce por debajo debido al agua de gotera de la casa de don Simon.
Ing residente.

23-8-24.
Clima Soleado.
Personal en Obra: Ing residente, Ing ins de interventoria, Maestro, 9 oficiales, presidente junta.
Este viernes se fundio 32 bultos en Concreto reforzado entre losas, vigas, y cunetas.
Ing residente

24-8-24. Dia Sabado. Soleado.
No se trabajo debido a que el maestro tenia una Cita médica y algunos trabajadores pidieron permiso.
Ing residente

26-8-24. Dia Soleado. Bonos.
Personal en Obra: Ing. residente, Ing. ins de Interventoria, Maestro, 9 Oficiales, Presidente junta.
Se llevo a Cabo el formaleteo. de 3 m de Concreto ciclopeo. Se fundieron 11 bultos para concreto ciclopeo. y se amarro hierro para losa de transición y cunetas y losa.

Ing. residente:

27-8-24. Dia Martes Soleado.
Personal en Obra: Ing. residente, Ing. ins de interventoria, Maestro, 9. Oficiales.
Se llevo a Cabo la terminación de la fundición de Concreto reforzado de las losas y vigas y Cunetas ademas de la fundición de la losa de transicion. Se fundieron 16 bultos. ademas de que la junta autorizó la Construcción de una entrada a la Casa de don Simon en concreto ciclopeo.

Ing residente.

Powered by CamScanner

QUIROZ BAJO

1 Maestro, oficiales.

8-8-24 clima seco

No se realizaron actividades.

9-8-24 clima seco.

No se realizaron actividades.

10-8-24 clima seco.

No se realizaron actividades.

12-8-24 Clima seco, Personal en Obra: Ing. Residente junto, Inspector Int

No se realizaron actividades. Se recibe un viajes de pavento c/u de 6m³ y 4 viajes de triturado c/u de 6m³ y 180 bolsas de cemento

13-8-24

Clima: Seco Personal en Obra: 2 Obreros, Residente junto, Inspector Int, Armme de acero de 3/8" para bordillo, 2 varillas longitudinales

14-8-24 Clima: Seco Personal en Obra: Residente junto, Maestro, Obreros, Inspector Int. Inician las actividades de formaleteo para fundición de losas e=0,20 m

15-8-24 Clima: Seco Personal en Obra: Residente junto, Maestro 7 Obreros, Inspector Int. Fundición de losas de acto e=0,20 cm, Fundición de bordillo. Toma de vigas (3und

16-8-24 Clima Seco Personal en Obra: Residente junto, Maestro, 7 Obreros, Inspector Int Formaleteo y fundición de losas, corte de juntas.

17-8-24 Clima Seco Personal en Obra: Residente junto, Maestro, 7 Obreros, Inspector Int. Formaleteo y fundición de placas 25m ancho, corte de juntas

19-8-24 Clima: Seco Personal en Obra: Maestro, 7 Obreros, Inspector Int. Formaleteo y fundición de placas e=0,20m, corte de juntas de la

20-8-24 Clima: Seco Personal en Obra: Residente junto, Maestro, 5 Obreros, Inspector Int. Fundición de losas de acto e=0,20m, corte de juntas.

21-8-24 Clima: Seco Personal en Obra: Residente junto, Maestro, 7 Obreros, Inspector Int Fundición de placas e=0,20m, corte de juntas; amarre de acero para bordillo.

22-8-24 Clima: Seco Personal en Obra: Residente junto, Maestro, 7 Obreros, Inspector Int. Fundición de placas e=0,20m, corte de juntas, fundición de bordillo. Se recibe 190 bolsas de cemento

23-8-24 Clima: Seco Personal en Obra: Residente junto, Maestro, 7 Obreros, Inspector Int. Fundición de placas e=0,20m, corte de juntas, amarre de acero para bordillo.

24-8-24 Clima: Seco Personal en Obra: Residente junto, Maestro, 7 Obreros, Inspector Int. Fundición de placas e=0,20m, corte de juntas, amarre de acero y fundición de bordi. Hasta el día de ayer 23 de Agosto tenía contrato el Ingeniero Residente, hoy esta haciendo acompañamiento y dando unas recomendaciones al maestro para que continue

26-08-24 Clima: Seco Personal en Obra: Residente junto, Maestro, 7 Obreros, Inspector Int Herramienta en Obra: Trompo, Vibrador, Puestillo, Cortadora de acto. Fundición de placas espesor de 0,20m, corte de juntas de la fundición del día sábado.

27-08-24 Clima: Seco Personal en Obra: Residente Int. Maestro, 7 Obreros, Inspector Int. Herramienta en Obra: Trompo, Vibrador, Puestillo, Cortadora de acto. Se realizó fundición de losas pendientes vía Quiroz Bajo - Quiroz Alto, corte de juntas, formaleteo y fundición de bordillo. Se terminan las labores de pavimento

28-08-24 Clima, Seco Personal en Obra: Maestro 7 Obreros Inspector Int. Herramienta en Obra: Trompo, Vibrador, Puestillo, Cortadora de acto Perdón y Pulir Fundición de bordillo. Sello de juntas

6-9-24 clima seco: No se realizan actos de obra, se envia un oficio al Representante legal del Convenio y al Ing Residente

de obra en el cual se solicita las correcciones tecnicas ~~de~~ al Pavimento rigido, se solicita Presentar una Propuesta tecnica Para arreglar el Paño de Pavimento afectada y esta sera evaluada por la interventoria Para evaluar su ejecucion.

Scanned with CamScanner

GESTION SOCIAL AGOSTO

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL COMPONENTE DE GESTION Y CONTROL SOCIAL

Título de la oferta: MASO 10_SVR 119 Lote 1 y 2

Actividades de la semana: 08 al 15 de agosto 2024

Objetivos

- ✓ Describir las actividades ejecutadas desde el componente de Control y Gestión Social del 08 al 15 de agosto del 2024.
- ✓ Soportar a través de evidencias fotográficas, el cumplimiento de las actividades descritas.

Descripción de actividades

El componente de Control y Gestión Social, tiene como objetivo primordial fortalecer aspectos de trasparencia, gestión, control y participación ciudadana, a partir de la construcción del tejido social. En este sentido, las actividades descritas a continuación, corresponden a la fase denominada: **Cierre del convenio.**

Convenio solidario 3119-2023 - Olivos

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuaruioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.

Considerando que: el 07 de agosto 2024, se realizó la socialización de cierre y actividad de inauguración: “Abriendo Caminos de la Paz Total” a través de la participación de una olla comunitaria (sancocho). La Interventoría procede a organizar la documentación correspondiente al cierre del convenio: tales como cargue de las 10 encuestas de satisfacción aplicadas en la comunidad a la Matriz de consolidación de Datos Impacto social del programa https://forms.office.com/r/D3n2t2jh0r

Asimismo, organización de documentos de socialización de cierre: acta de reunión, listado de asistencia y evidencias fotográficas. De la misma manera, diligenciamiento de formatos: MASPS-MN1-IN-3-FR-2 balance del estado social del proyecto, MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de inversión social – versión 3 (cierre), MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta mensual de inversión social.

Cierre total del buzón de sugerencia, ubicado en el tramo de intervención, en el cual, no se encontró ningún PQRS tanto en la etapa de inicio, ejecución y cierre del convenio.

Convenio solidario 3089-2023 - Llano Grande

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.

08 agosto 2024, 4:30 pm – Reunión presencial con la J.A.C. Veeduría Ciudadana y comunidad en general, con el fin de socializar la ejecución del convenio y avanzar en la etapa de cierre. Reunión en acompañamiento del Ing. Mauricio Romero – Director de Interventoría.

08 agosto 2024, se solicito por la comunidad realizar actividad de inauguración para el 18 de agosto 2024 (domingo) para que pueda participar toda la comunidad.

08 agosto 2024, aplicación de encuestas de satisfacción.

12 agosto 2024, Elaboración y envío de oficio N-GR-020-2024 solicitando actas de vecindad de cierre.

13 agosto 2024, Elaboración y envío a la presidente de la Veeduría Ciudadana la invitación a la actividad de inauguración programada para el 18 agosto 2024 a las 11:30 am, en el tramo de intervención.

13 agosto 2024, Elaboración del orden del día, de la actividad de inauguración mencionada.

13 agosto 2024, Elaboración y envió oficio N-043-2024 a la subdirección de sostenibilidad con copia a la territorial Nariño informando la programación de la actividad de inauguración del convenio.

Convenio solidario 3121- 2023 – Sauce

09 agosto 2024, preparación logística para la actividad de inauguración “Abriendo Caminos de la Paz Total” tales como: compra de flores para los arreglos del Altar de la Eucaristía de agradecimiento, compra de insumos para la preparación de la avena, compra de bombas, cinta de corte, impresiones de listado de asistencia y orden del dia, entre otros.

10 agosto 2024, cierre total del buzón de sugerencia, ubicado en el tramo de intervención, en el cual, no se encontró ningún PQRS.

10 agosto 2024 – Actividad de inauguración

- 8:00 am – organización logística de la actividad de inauguración, arreglo de bombas, arreglo de flores, ubicación de sillas, sonito etc.
- 1:00 pm – Eucaristía de agradecimiento
- 2:30 pm inicio de protocolo de actividad de inauguración con la entonación del Himno Nacional, Municipal y a la Acción Comunal.

- Se dio continuidad con palabras de agradecimiento, corte de la cinta en el tramo de intervención, rifa de obsequios para la comunidad y compartir de refrigerio (avena con peras dulces).
- Palabras de despedida y marcha final.

Convenio Solidario 3119-2023 - El Peligro

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuaruioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.

09 agosto 2024, 04:00 pm – apertura buzón de sugerencia, ubicado en el tramo de intervención, en el cual, no se encontró ningún PQRS.

12 agosto 2024, elaboración y envío de oficio N-PE-019-2024, recomendando al ingeniero residente de obra que en el momento del 90% de ejecución de la obra, inicie con las actas de vecindad de cierre.

Convenio Solidario 3122-2023 - Quiroz Alto

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuaruioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.

08 agosto 2024, 2:30 pm – Reunión presencial con la J.A.C. Veeduría Ciudadana y comunidad en general, con el fin de socializar la etapa de cierre del convenio. Reunión en acompañamiento del Ing. Mauricio Romero – Director de Interventoría. Se aclara que la actividad de inauguración por petición de la comunidad se llevará a cabo el 24 de agosto 2024.

08 agosto 2024, cierre total del buzón de sugerencia, ubicado en el tramo de intervención.

08 agosto 2024, aplicación de encuestas de satisfacción

Convenio Solidario 3153 – 2023 - Quiroz Bajo

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuaruioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.

08 agosto 2024, 2:30 pm – Reunión presencial con la J.A.C. Veeduría Ciudadana y comunidad en general, con el fin de socializar la etapa de ejecución del convenio. Reunión en acompañamiento del Ing. Mauricio Romero – Director de Interventoría.

09 agosto 2024, 04:00 pm – apertura buzón de sugerencia, ubicado en el tramo de intervención, en el cual, no se encontró ningún PQRS.

12 agosto 2024, elaboración y envío de oficio N-QB-016-2024, recomendando al ingeniero residente de obra que en el momento que la obra se encuentre en un 90% de ejecución, iniciar con la elaboración de actas de vecindad de cierre.

Convenio Solidario 3281- 2023 - Nueva Florida

Seguimiento diario al correo electrónico atencionusuarioconsorciomaso10@gmail.com, con el fin de verificar las solicitudes realizadas por parte de la comunidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna.

09 agosto 2024, 04:00 pm – apertura buzón de sugerencia, ubicado en el tramo de intervención, en el cual, no se encontró ningún PQRS.

12 agosto 2024, elaboración y envío de oficio N-NF-019-2024, recomendando al ingeniero residente de obra que en el momento que la obra se encuentre en un 90% de ejecución, iniciar con la elaboración de actas de vecindad de cierre.

Evidencias fotográficas

OLIVOS



Evidencia fotográfica: socialización de cierre



Evidencia fotográfica: socialización de cierre- Gestión Social – Interventoría.



Evidencia fotográfica: socialización de cierre- Ing. Mauricio Romero – Director de Interventoría.



Evidencia fotográfica: corte de la cinta por la presidente JAC – Olivos.




Evidencia fotográfica: compartir de olla comunitaria.

LLANO GRANDE



Evidencia fotográfica: invitación actividad de inauguración.

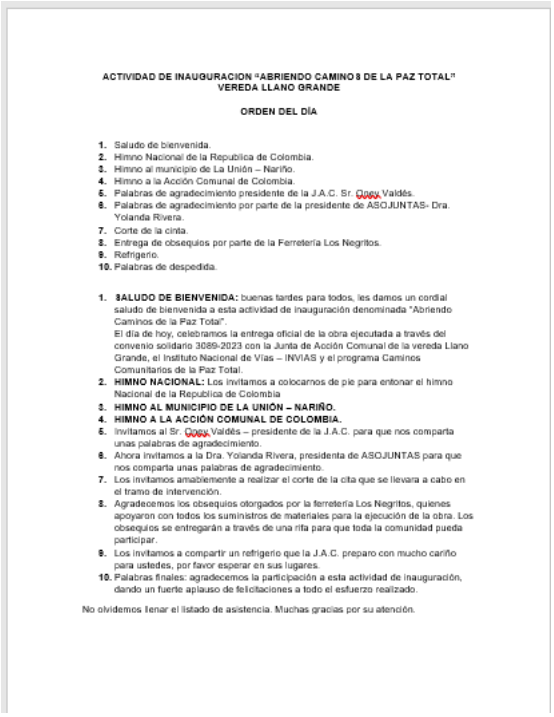

ACTIVIDAD DE INAUGURACION "ABRIENDO CAMINOS DE LA PAZ TOTAL"
VEREDA LLANO GRANDE

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de bienvenida.
2. Himno Nacional de la Republica de Colombia.
3. Himno al municipio de La Unión – Nariño.
4. Himno a la Acción Comunal de Colombia.
5. Palabras de agradecimiento presidente de la J.A.C. Sr. Oney Valdés.
6. Palabras de agradecimiento por parte de la presidente de ASOJUNTAS- Dra. Yolanda Rivera.
7. Corte de la cinta.
8. Entrega de obsequios por parte de la Ferretería Los Negritos.
9. Refrigerio.
10. Palabras de despedida.

1. **SALUDO DE BIENVENIDA:** buenas tardes para todos, les damos un cordial saludo de bienvenida a esta actividad de inauguración denominada "Abriendo Caminos de la Paz Total".
   El día de hoy, celebramos la entrega oficial de la obra ejecutada a través del convenio solidario 3089-2023 con la Junta de Acción Comunal de la vereda Llano Grande, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.
2. **HIMNO NACIONAL:** Los invitamos a colocarnos de pie para entonar el himno Nacional de la Republica de Colombia
3. **HIMNO AL MUNICIPIO DE LA UNIÓN – NARIÑO.**
4. **HIMNO A LA ACCIÓN COMUNAL DE COLOMBIA.**
5. Invitamos al Sr. Oney Valdés – presidente de la J.A.C. para que nos comparta unas palabras de agradecimiento.
6. Ahora invitamos a la Dra. Yolanda Rivera, presidenta de ASOJUNTAS para que nos comparta unas palabras de agradecimiento.
7. Los invitamos amablemente a realizar el corte de la cita que se llevara a cabo en el tramo de intervención.
8. Agradecemos los obsequios otorgados por la ferretería Los Negritos, quienes apoyaron con todos los suministros de materiales para la ejecución de la obra. Los obsequios se entregarán a través de una rifa para que toda la comunidad pueda participar.
9. Los invitamos a compartir un refrigerio que la J.A.C. preparo con mucho cariño para ustedes, por favor esperar en sus lugares.
10. Palabras finales: agradecemos la participación a esta actividad de inauguración, dando un fuerte aplauso de felicitaciones a todo el esfuerzo realizado.

No olvidemos llenar el listado de asistencia. Muchas gracias por su atención.

Evidencia fotográfica de organización orden del día – actividad de inauguración.

SAUCE



Evidencia fotográfica: organización logística – actividad de inauguración.



Evidencia fotográfica: Eucaristía de agradecimiento.



Evidencia fotográfica: inicio de actividad de inauguración.



Evidencia fotográfica: palabras de agradecimiento.



Evidencia fotográfica: corte de la cinta por el presidente de la JAC.



Evidencia fotográfica: compartir de refrigerio



Evidencia fotográfica: rifa de obsequios para la comunidad.

EL PELIGRO

CONSORCIO MASO 10

N-PE-019-2024

Bogotá D.C. 18 agosto de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PELIGRO
Municipio de La Unión - Nariño
Ingeniero Residente de Obra
Att. Edgar Aroca
alveiroarocai@gmail.com
jacelpeligro@gmail.com

REF: Convenio 3119-2023 Vereda El Peligro
Municipio La Unión – Solicitud actas de vecindad de cierre.

Respetados señores:

Considerando que, para el normal desarrollo del convenio de referencia, se hace necesario atender los compromisos adquiridos con la suscripción de los mismos y también con las obligaciones que derivan de los documentos que los complementan. Por lo cual, esta Interventoría solicita actas de vecindad de cierre formato **MASPS-MN1-IN-3-FR-4 *ACTA DE VECINDAD*** de cada una de las viviendas ubicadas en el tramo de intervención, en el momento que la obra se encuentra en un 90 % de ejecución.

Se recomienda considerar las observaciones realizadas en las actas de vecindad de inicio para complementar la información y de esta manera escanear y enviar las actas de vecindad de cierre solicitadas, al correo de interventoría: osac2017@yahoo.com y entregar de manera físicas al Ing. Residente de interventoría, con el fin de obtener el concepto de aprobación y no objeción de las mismas.

Cordialmente.

CONSORCIO MASO 10

Álvaro Aguirre Maya
Residente de Interventoría

CONSORCIO MASO 10

Evelyn Juliana Díaz Gómez
Profesional Social de Interventoría

CC/
Liliana Valencia
Presidenta
Junta de Acción Comunal El Peligro

Oficina -- Calle 140A No 15-26 (204). Bogotá.
Contacto: 3136418242 / 3106085775. Correo electrónico: osac2017@yahoo.com

Evidencia fotográfica: oficio N_PE-019-2024.

QUIROZ ALTO



Evidencia fotográfica: socialización de cierre.



Evidencia fotográfica: socialización de cierre.

QUIROZ BAJO



Evidencia fotográfica: socialización de ejecución obra.



Evidencia fotográfica: socialización de ejecución obra.

NUEVA FLORIDA

CONSORCIO MASO 10

N-NF-019-2024

Bogotá D.C. 12 de agosto de 2024

Señores
JUNTA DE ACCIONCOMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA
Municipio de San Pablo - Nariño
Ingeniero Residente de Obra
Att. Ober Agredo Bolaños
oberagredo@gmail.com
veredanuevaflorida@gmail.com

REF: Convenio 3281-2023 Vereda Nueva Florida Municipio San Pablo – Solicitud actas de vecindad cierre.

Respetados señores:

Considerando que, para el normal desarrollo del convenio de referencia, se hace necesario atender los compromisos adquiridos con la suscripción de los mismos y también con las obligaciones que derivan de los documentos que los complementan. Por lo cual, esta Interventoría solicita actas de vecindad de cierre formato **MASPS-MN1-IN-3-FR-4 *ACTA DE VECINDAD*** de cada una de las viviendas ubicadas en el tramo de intervención, en el momento que la obra se encuentra en un 90 % de ejecución.

Se recomienda considerar las observaciones realizadas en las actas de vecindad de inicio para complementar la información y de esta manera escanear y enviar las actas de vecindad de cierre solicitadas, al correo de interventoría: osac2017@yahoo.com y entregar de manera físicas al Ing. Residente de interventoría, con el fin de obtener el concepto de aprobación y no objeción de las mismas.

Cordialmente.

CONSORCIO MASO 10

Álvaro Aguirre Maya
Residente de Interventoría

CONSORCIO MASO 10

Evelyn Juliana Díaz Gómez
Profesional Social de Interventoría

CC/
Wilder Ferney Ramos
Presidente
Junta de Acción Comunal Nueva Florida

INFORME SST AGOSTO

INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10

CONTRATO No. 5065 - 2023

Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y los organismos de Acción Comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total Lote -2

Veredas:

El Sauce, Quiroz Alto, El Peligro, Quiroz, Llano Grande y Olivos de Municipio de La Unión
Nueva Florida del Municipio de San Pablo

INFORME NÚMERO 04 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Versión 1

La Unión Nariño, (31 de agosto de 2024)

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, está enmarcado en el contexto del Contrato No.5065 de 2023 y resume los aspectos contractuales del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, derivados de la ejecución de OBJETO DEL CONTRATO, Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y los organismos de Acción Comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Nariño en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total Lote -2.

LA INTERVENTORÍA CONSORCIO MASO 10, efectúo todas las actividades para dar cumplimiento al Manual de Interventoría y el Anexo Técnico, conforme a las necesidades requeridas en el objeto del contrato, para el informe número 04, durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto del 2024.

2. OBJETIVOS

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades de CONSORCIO MASO 10, a través de actividades de promoción y protección en salud y de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos ocupacionales, que contribuyan al bienestar físico, mental y social de los colaboradores, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

2.1 Objetivo General

Garantizar un entorno laboral seguro y saludable durante la ejecución de la obra, mediante la evaluación y supervisión de las condiciones de trabajo, el cumplimiento de las normativas de seguridad y la promoción de prácticas adecuadas que prevengan accidentes y enfermedades laborales.

2.2 Objetivos Específicos

- Cumplir con los requerimientos necesarios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Garantizar al máximo unas condiciones laborales excelentes para sus trabajadores.
- Verificar los pagos de salarios, honorarios y afiliación al sistema general de seguridad social del personal vinculado a la interventoría CONSORCIO MASO 10.
- Velar por el cumplimiento del cronograma de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo propuesto.

3. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	TIPO DE CONTRATACIÒN
MAURICIO ROMERO QUIROGA	79394462	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	DEPENDIENTE
EVELYN JULIANA DIAZ GOMEZ	1089482890	PROFESIONAL SOCIAL	DEPENDIENTE
DAYANY MARCELA PEÑA BASTIDAS	1089485628	INSPECTORA	DEPENDIENTE
JORGE ANDRES MUÑOZ SOSCUE	1087647864	INSPECTOR	DEPENDIENTE
GISSEL ANDREA MUÑOZ RIVERA	1089484424	INSPECTORA SST	DEPENDIENTE
ALVARO AGUIRRE MAYA	13063945	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DEPENDIENTE

4. PERSONAL DE LA JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

4.1 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÒN NARIÑO CONVENIO 3119-2023

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	NUMERO DE IDENTIFICACIÒN	CARGO	TIPO DE CONTRATACIÒN
EDGAR ALVEIRO AROCA GAVIRIA	15816461	RESIDENTE DE OBRA	INDEPENDIENTE
VICTOR JESÙS DAVILA	4948861	MAESTRO DE OBRA	INDEPENDIENTE
SEGUNDO MACARIO MUÑOZ MENESES	15811494	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
HECTOR VALENCIA LUNA	15814401	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
CARLOS ALIRIO VILLAMUEZ	15813513	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
CARLOS DORADO	98196240	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
ROBERTO MUÑOZ MUÑOZ	1089483789	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
JESUS DAVID USUGA	79856679	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
DANIEL OSVALDO AROCA	1089078268	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
EDISON ARLEY BOLAÑOS	1004743349	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE

4.2 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÒN NARIÑO CONVENIO 3089-2023

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	NUMERO DE IDENTIFICACIÒN	CARGO	TIPO DE CONTRATACIÒN
LISSETTE VIVIANA DIAZ URBANO	1032497441	RESIDENTE DE OBRA	INDEPENDIENTE
ARLEY FAVIAN MUÑOZ ERAZO	13075571	MAESTRO DE OBRA	INDEPENDIENTE
JOSE ALVARO SOLARTE VELASCO	15812366	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
FABIAN RICADO GOMEZ MARTINEZ	1089478	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
MAURICIO HERNANDO PINTA	1084222199	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
JEREMY SNEIDER ORTEGA MORENO	1004675311	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
SANTIAGO ALEXANDER ESPAÑA MORENO	1004675595	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE

4.3 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÒN NARIÑO CONVENIO 3153-2023

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	TIPO DE CONTRATACIÒN
ORLANDO ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ	1081592267	RESIDENTE DE OBRA	INDEPENDIENTE
JUAN CARLOS MORENO	15817516	MAESTRO DE OBRA	INDEPENDIENTE
ESNEIDER SANTIAGO MARTINEZ MATABAJOY	1004255408	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
YORDAN ESTIVEN ERASO ORTEGA	1089478755	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
JOSE ALVARO SOLARTE VELASCO	15812366	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
FABIAN RICADO GOMEZ MARTINEZ	1089478	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
MAURICIO HERNANDO PINTA	1084222199	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
JEREMY SNEIDER ORTEGA MORENO	1004675311	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
SANTIAGO ALEXANDER ESPAÑA MORENO	1004675595	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE

4.4 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÒN NARIÑO CONVENIO 3157-2023

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	TIPO DE CONTRATACIÒN
CARMEN EMILIA SOLARTE	59788832	RESIDENTE DE OBRA	INDEPENDIENTE
AFRANIO ESPADA ESTRELLA	5217490	MAESTRO DE OBRA	INDEPENDIENTE
LEONEL BENAVIDES TENORIO	87026655	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
SAMIER ERASO TORO	1007164064	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
EDER YARLEY NIÑO CADENA	1088157457	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
LUIS FELIPE VIVAS MORENO	1004675108	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE

4.5 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO CONVENIO 3281-2023

NOMBRE COMPLETO (Nombres y Apellidos)	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	TIPO DE CONTRATACIÒN
OBER HERNANDO AGREDO BOLAÑOS	10549293	RESIDENTE DE OBRA	INDEPENDIENTE
JOSE ANTONIO URBANO	98323455	MAESTRO DE OBRA	INDEPENDIENTE
JAIDER YOBANI BOLAÑOS MONCAYO	1089348032	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
JUAN CARLOS RAMOS VALDEZ	1.085.663.861	AUXILIAR DE OBRA	DEPENDIENTE
LUIS CARLOS VALDEZ CERON	98339230	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
CRISTIAN FERNEY MUTIZ MUÑOZ	1089349048	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
JOSÈ ALEXANDER CALPA MARTINEZ	1061687181	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
JON ADREICER ORTEGA MUÑOZ	1085660372	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE
ORLANDO ORTEGA GUERRERO	9732448	AUXILIAR DE OBRA	INDEPENDIENTE

5. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

5.1 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA EL SAUCE CONVENIO 3121-2023

Durante el período comprendido desde 01 de agosto al 31 de agosto de 2024, la Junta de Acción Comunal vereda El Sauce realizó las siguientes actividades:

- Cedulas de ciudadanía del personal que laboro en el convenio (ver anexo 01).

- Exámenes medico laborales de egreso tanto de personal dependiente como independiente (ver anexo 02).

- Certificado de pago se aportes de seguridad social y aportes legales Articulo 50 Ley 789 de 2002.

  La Junta de acción Comunal vereda El Sauce bajo NIT: 901031819-6 realizó la certificación de pagos de seguridad y aportes legales del personal que tuvo a cargo durante la ejecución del convenio 3121-2023 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS *(ver anexo 03).*

- Soportes de paz y salvo firmado por los trabadores que estuvieron vinculados durante la ejecución del convenio 3121-2023 de la Junta de Acción Comunal Vereda El Sauce y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS; queda pendiente

la paz y salvo del maestro de obra, el Ingeniero Residente, Ingeniero ambiental y contador ya que la OAC aún tiene unos saldos pendientes con los mismos ya que se encuentran en trámites (*ver anexo 04).*

- Certificado de accidentalidad ARL

Se adjunta certificado de accidentalidad de La Junta Acción Comunal de la Vereda Sauce del periodo y certificado de accidentalidad del contratista *(ver anexo 05).*

5.2 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA EL PELIGRO CONVENIO 3119-2023

Durante el período comprendido desde 01 de agosto al 31 de agosto de 2024, la Junta de Acción Comunal vereda El Peligro realizó las siguientes actividades:

- Cedulas de ciudadanía de personal que laboro en el convenio 3119-2023 *(ver anexo 06).*

- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal*.*

  La presidenta de la OAC Junta de Acción Comunal Vereda El Peligro Liliana Valencia realizó la entrega de Elementos de Protección Personal, guantes de carnaza, guantes anti corte, gafas de seguridad, tapa oídos, calzado de seguridad (*ver anexo 07*).

- Notificación examen médico laboral de egreso (*ver anexo 08).*

- Exámenes medico laborales de egreso *(ver anexo 09).*

- Certificado de pago se aportes de seguridad social y aportes legales Articulo 50 Ley 789 de 2002.

La Junta de acción Comunal vereda El Peligro bajo NIT: 901124176-9 realizó la certificación de pagos de seguridad y aportes legales del personal que tuvo a cargo durante la ejecución del convenio 3119-2023 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS *(ver anexo 10).*

- Soportes de paz y salvo firmado por los trabajadores que estuvieron vinculados durante la ejecución del convenio 3119-2023 de la Junta de Acción Comunal Vereda El Peligro y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS; queda pendiente los paz y salvo del maestro de obra, el Ingeniero Residente, Ingeniero ambiental y contador ya que la OAC aún tiene unos saldos pendientes con los mismos ya que se encuentran en trámites *(ver anexo 11).*

- Certificado de accidentalidad ARL

Se adjunta certificado de accidentalidad de La Junta Acción Comunal de la Vereda El Peligro y certificado de accidentalidad del contratista del periodo que se ejecutó la obra *(ver anexo 12).*

- Reporte de Accidentes de Trabajo: En el mes de agosto de 2024 no se presentó ningún accidente de trabajo.

5.3 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE CONVENIO 3089-2023

Durante el período comprendido desde 01 de agosto al 31 de agosto de 2024, la Junta de Acción Comunal vereda Llano Grande realizó las siguientes actividades:

- Cedulas de ciudadanía de personal que laboro en el convenio 3089-2023 (*ver anexo 13).*

- Notificación exámenes médico laborales de egreso (*ver anexo 14*).

- Exámenes medico laborales de egreso *(ver anexo 15).*

- Certificado de pago se aportes de seguridad social y aportes legales Articulo 50 Ley 789 de 2002.

La Junta de acción Comunal de la vereda Llano Grande bajo NIT: 901032218-4 realizó la certificación de pagos de seguridad y aportes legales del personal que tuvo a cargo durante la ejecución del convenio 3089-2023 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS *(ver anexo 16).*

- Soportes de paz y salvo firmado por los contratistas que estuvieron vinculados durante la ejecución del convenio 3089-2023 de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Llano Grande y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, queda pendiente paz y salvo de personal de nómina ya que falta liquidación de los mismos, maestro de obra, Ingeniero residente, Ingeniero ambiental y contador (*ver anexo 17).*

- Certificado de accidentalidad ARL

  Se adjunta certificado de accidentalidad ARL POSITIVA de Junta de Acción Comunal Vereda Llano Grande y certificado de accidentalidad ARL SURA de contratista que ejecuto el convenio (ver anexo 18).

- Reporte de Accidentes de Trabajo: En el mes de agosto de 2024 no se presentó ningún accidente de trabajo.

5.4 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ CONVENIO 3153-2023

Durante el período comprendido desde 01 de agosto al 31 de agosto de 2024, la Junta de Acción Comunal de la vereda Quiroz realizó las siguientes actividades:

- Cedulas de ciudadanía de personal que laboro en el convenio 3153-2023 (*ver anexo 19).*

- Soportes de Reinducciones del personal:

  El ingeniero residente Orlando Rangel de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz realizó la Reinducción de peligros y riesgos a personal *(ver anexo20).*

- Soporte de evaluación de la inducción:

La Ingeniero residente Orlando Rangel de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz posteriormente a la reinducción de peligros y riesgos, realizó una evaluación del tema mencionado anteriormente *(ver anexo 21).*

- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal:

  El presidente de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz Robinson Valdés, realiza entrega de EPP (*ver anexo 22).*

- Notificación exámenes médico laborales de egreso (*ver anexo 23).*

- Exámenes medico laborales de egreso (*ver anexo 24).*

- Certificado de pago se aportes de seguridad social y aportes legales Articulo 50 Ley 789 de 2002.

La Junta de acción Comunal de la vereda Quiroz NIT: 901031117-4 realizó la certificación de pagos de seguridad y aportes legales del personal que tuvo a cargo durante la ejecución del convenio 3153-2023 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS *(ver anexo 25).*

- Soportes de paz y salvo firmado por los trabajadores de nómina que estuvieron vinculados durante la ejecución del convenio 3153-2023 de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, queda pendiente paz y salvo de residente y maestro de obra ya que la OAC aún tiene

unos saldos pendientes con los mismos ya que se encuentran en trámites *(ver anexo 26).*

- Certificado de accidentalidad ARL

La Junta de acción Comunal de la Vereda Quiroz realizó la solicitud ante ARL POSITIVA mediante un PQR de la emisión del certificado de accidentalidad durante la ejecución del convenio, puesto que dicha entidad emite el certificado por medio del portal de ALISSTA, pero la junta al tener una condición especial no permite la activación del portal, por tal motivo se lo solicito mediante un PQR siguiendo las directrices de la ARL POSITIVA pero hasta la fecha no se ha tenido una respuesta por parte de la entidad mencionada anteriormente; se adjunta PQR de solicitud *(ver anexo 27).*

- Reporte de Accidentes de Trabajo: En el mes de agosto de 2024 no se presentó ningún accidente de trabajo.

5.5 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO CONVENIO 3122-2023

Durante el período comprendido desde 01 de agosto al 31 de agosto de 2024, la Junta de Acción Comunal de la vereda Quiroz Alto realizó las siguientes actividades:

- Cedulas de ciudadanía de personal que laboro en el convenio *(ver anexo 28)*
  .
- Exámenes medico laborales de egreso

Se adjuntan exámenes medico laborales de egreso del personal que laboro hasta el mes de julio del 2024 en el convenio 3122-2023 celebrado entre Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz Alto y el Instituto Nacional de vías – INVIAS *(ver anexo 29).*

- Certificado de pago se aportes de seguridad social y aportes legales Articulo 50 Ley 789 de 2002.

La Junta de acción Comunal de la vereda Quiroz Alto NIT: 901021948-5 realizó la certificación de pagos de seguridad y aportes legales del personal que tuvo a cargo durante la ejecución del convenio 3122-2023 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS *(ver anexo 30).*

- Soportes de paz y salvo firmado por los trabajadores que estuvieron vinculados durante la ejecución del convenio 3122-2023 de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz Alto y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS *(ver anexo 31).*

- Certificado de accidentalidad ARL

La Junta de acción Comunal de la Vereda Quiroz Alto realizó la solicitud ante ARL POSITIVA mediante un PQR de la emisión del certificado de accidentalidad durante la ejecución del convenio, puesto que dicha entidad emite el certificado por medio del portal de ALISSTA, pero la junta al tener una condición especial no permite la activación del portal, por tal motivo se lo solicito mediante un PQR siguiendo las directrices de la ARL POSITIVA pero hasta la fecha no se ha tenido una respuesta por parte de la entidad mencionada anteriormente; se adjunta PQR de solicitud *(ver anexo 32).*

- Reporte de Accidentes de Trabajo: En el mes de agosto de 2024 no se presentó ningún accidente de trabajo.

5.6 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS CONVENIO 3157-2023

Durante el período comprendido desde 01 de agosto al 31 de agosto de 2024, la Junta de Acción Comunal de la vereda Olivos realizó las siguientes actividades:

- Cedulas de ciudadanía de personal que laboro en el convenio *(ver anexo 33).*

- Notificación exámenes médico laborales de Egreso (*ver anexo 34*).

- Exámenes medico laborales de egreso *(ver anexo 35).*

- Certificado de pago se aportes de seguridad social y aportes legales Articulo 50 Ley 789 de 2002.

La Junta de acción Comunal de la vereda Olivos NIT: 901032379-1 realizó la certificación de pagos de seguridad y aportes legales del personal que tuvo a cargo durante la ejecución del convenio 3157-2023 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS *(ver anexo 36).*

- Soportes de paz y salvo firmado por los trabajadores que estuvieron vinculados durante la ejecución del convenio 3122-2023 de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Olivos y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, queda pendiente paz y salvo de: maestro de obra, Ingeniero ambiental y contador ya que la OAC aún tiene unos saldos pendientes con los mismos ya que se encuentran en trámites *(ver anexo 37).*

- Certificado de accidentalidad ARL

Se adjunta certificado de accidentalidad del tiempo que duro a la ejecución del convenio tanto de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Olivos como certificado de accidentalidad del Contratista (ver anexo 38).

- Reporte de Accidentes de Trabajo: En el mes de agosto de 2024 no ocurrió ningún accidente de trabajo.

5.7 JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA CONVENIO 3281-2023

Durante el período comprendido desde 01 de agosto al 31 de agosto de 2024, la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva Florida realizó las siguientes actividades:

- Cedulas de ciudadanía personal que laboro en el convenio *(ver anexo 39).*
- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal:

  El presidente de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Wilder Ferney Ramos, realiza entrega de EPP (*ver anexo 40).*
- Inducción personal nuevo (ver anexo 41).
- Reinducción de personal nuevo (ver anexo 42).
- Examen médico ocupacional de ingreso personal nuevo *(ver anexo 43).*
- Notificación exámenes médico laborales de Egreso (*ver anexo 44*).
- Exámenes medico laborales de egreso *(ver anexo 45).*
- Certificado de pago se aportes de seguridad social y aportes legales Articulo 50 Ley 789 de 2002.

La Junta de acción Comunal de la vereda Nueva Florida NIT: 901032218-0 realizó la certificación de pagos de seguridad y aportes legales del personal que tuvo a cargo durante la ejecución del convenio 3281-2023 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS *(ver anexo 46).*

- Soportes de paz y salvo firmado por los trabajadores que estuvieron vinculados durante la ejecución del convenio 3281-2023 de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Nueva Florida y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS queda pendiente

paz y salvo de maestro de obra, Ingeniero Residente, Ingeniero Ambiental y contador*(ver anexo 47).*

- Certificado de accidentalidad ARL

  Se adjunta certificado de accidentalidad del tiempo que duro a la ejecución del convenio tanto de la OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Nueva Florida como del Contratista (ver anexo 48).

- Reporte de Accidentes de Trabajo: En el mes de agosto de 2024 no se presentó ningún accidente de trabajo.

6. CAPITULO 4 ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA

Durante el período comprendido desde 01 de agosto al 31 de agosto de 2024, la Interventoría CONSORCIO MASO 10 realizó las siguientes actividades:

- Elaboración programa de rehabilitación y reincorporación laboral

  La Inspectora en SST Gissel Andrea Muñoz Rivera elabora programa de rehabilitación y reincorporación laboral de Interventoría Consorcio MASO 10*(ver anexo 49).*

- Listado de equipos y vehículos de interventoría *(ver anexo 50)*.

DOCUMENTACIÓN VEHICULOS INTERVENTORIA						
CLASE DE VEHÍCULO	**PLACA**	**MARCA**	**MODELO**	**COLOR**	**FECHA DE REVISÓN TECNOMECANICA**	**VIGENCIA SOAT**
MOTOCICLETA	JCV20G	YAMAHA	2023	MULTICOLOR	N/A	28/09/2023 - 27/09/2024
MOTOCICLETA	NSA13G	HONDA	2023	ROJO BLANCO	N/A	11/08/2023 - 10/08/2024
MOTOCICLETA	JPE59E	HONDA	2019	BLANCO ROJO	21/12/2023	20702/2024 - 19/02/2024
MOTOCICLETA	ZEA97G	BAJAJ	2024	NEGRO INFINITO	N/A	9/02/2024 - 8/02/2025
MOTOCICLETA	BVZ63E	BAJAJ	2016	ROJO ECLIPSE NEGRO MATE	8/08/2023	28/12/2023-27/12/2024

- Reportes de Accidente de Trabajo.

  En el mes de agosto de 2024 no se presentaron incidentes y/o accidentes de trabajo.

- Otras actividades realizadas en cuanto al SG-SST.

  a) Inspecciones en apoyo OAC vereda El Peligro (*ver anexo 51).*

  b) Capacitaciones en apoyo OAC vereda El Peligro (*ver anexo 52).*

  c) Inspecciones en apoyo a OAC vereda Quiroz *(ver anexo 53).*

d) Capacitaciones en apoyo a OAC vereda Quiroz *(ver anexo 54).*

e) Inspecciones en apoyo a OAC vereda Llano Grande *(ver anexo 55).*

f) Capacitaciones en apoyo a OAC vereda Llano Grande *(ver anexo 56).*

g) Inspecciones en apoyo a OAC vereda Olivos *(ver anexo 57).*

h) Capacitaciones en apoyo a OAC vereda Olivos *(ver anexo 58).*

i) Inspecciones en apoyo a OAC vereda Nueva Florida *(ver anexo 59).*

j) Capacitaciones en apoyo a OAC vereda Nueva Florida *(ver anexo 60).*

- Notificación examen médico laboral de retiro (*ver anexo 61*).
- Exámenes ocupacionales de egreso Interventoría Consorcio MASO 10 *(ver anexo 62).*
- Soportes de Paz y salvo Interventoría Consorcio MASO 10 (ver anexo 63).

NOTA: Como las OAC no cuentan con profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría ha apoyado a las mismas con algunas capacitaciones con el fin de evitar la ocurrencia de incidentes y/o accidentes de trabajo que pueden ser graves y/o mortales.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10

Capacitación Manipulación de herramientas y manipulación de cargas manuales; inspección de botiquín de primeros auxilios de OAC Junta de Acción Comunal vereda El Peligro La Unión Nariño 2 de agosto 2024, en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10.







Inspección de uso de EPP personal OAC Junta de Acción Comunal Vereda El Peligro 7 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10.









Capacitación Pausas activas, lesione osteomusculares y medidas preventivas personal OAC Junta de Acción Comunal vereda El Peligro La Unión Nariño 9 de agosto 2024, en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10.







Inspección de uso de EPP personal e inspección de obra OAC Junta de Acción Comunal Vereda El Peligro 9 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10.









Capacitación Riesgo mecánico, efectos sobre la salud y medidas preventivas personal OAC Junta de Acción Comunal vereda El Peligro La Unión Nariño 12 de agosto 2024, en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10.







Inspección de uso de EPP personal OAC Junta de Acción Comunal Vereda El Peligro 12 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10.







Capacitación accidentes e incidentes de trabajo, importancia del uso de EPP personal OAC Junta de Acción Comunal vereda El Peligro La Unión Nariño 14 de agosto 2024, en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10.





Inspección de uso de EPP personal OAC Junta de Acción Comunal Vereda El Peligro 21 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10.









Capacitación Orden y aseo en obra, Riesgo locativo personal OAC Junta de Acción Comunal Vereda El Peligro 21 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10.





Inspección de obra y EPP a colaboradores OAC Junta de Acción Comunal Vereda Llano Grande La Uniòn Nariño 2 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10.









Capacitaciòn manipulación de herramientas y manipulación manual de cargas a personal OAC Junta de Acciòn Comunal Vereda Llano Grande La Uniòn Nariño 2 de agosto de 2024, en apoyo de Interventorìa Consorcio MASO 10.

.





Capacitación pausas activas, lesiones osteomusculares y medidas preventivas a personal OAC Junta de Acción Comunal Vereda Llano Grande La Unión Nariño 8 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10.





Inspección de obra y EPP a colaboradores, Inspección de obra e inspección de botiquín de primeros auxilios OAC Junta de Acción Comunal Vereda Llano Grande La Unión Nariño 8 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10.







Inspecciòn de obra y EPP a colaboradores OAC Junta de Acción Comunal Vereda Llano Grande La Uniòn Nariño 9 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10.





Capacitación Riesgo mecánico, efectos sobre la salud a personal OAC Junta de Acción Comunal Vereda Llano Grande La Unión Nariño 9 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10.







Capacitación cortes con objetos y herramientas a personal OAC Junta de Acción Comunal Vereda Llano Grande La Unión Nariño 13 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10.







Capacitación Peligros y Riesgos, Manipulación de herramientas y Riesgo Mecánico personal Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10, Vereda Quiroz La Unión Nariño 2 de julio de 2024.







Inspección de EPP personal Junta de Acción Comunal de la vereda Quiroz en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10 La Unión Nariño 15 de julio de 2024.









Inspección de Botiquín de primeros auxilios Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10, 15 de agosto de 2024.





Inspecciòn de EPP e inspección de obra personal Junta de Acción Comunal de la vereda Quiroz en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10 La Uniòn Nariño 20 de agosto de 2024.











Capacitación pausas activas, lesiones osteomusculares y medidas preventivas personal Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10, Vereda Quiroz La Unión Nariño 20 de agosto de 2024.







Inspección de EPP personal Junta de Acción Comunal de la vereda Quiroz en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10 La Unión Nariño 23 de agosto de 2024.









Capacitación Riesgo mecánico, efectos sobre la salud y medidas preventivas personal Junta de Acción Comunal de la Vereda Quiroz en apoyo de Interventoría Consorcio MASO 10, Vereda Quiroz La Unión Nariño 23 de agosto de 2024







Inspección de botiquin de primeros auxilios tipo A OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Olivos La Unión Nariño 2 de agosto de 2024, apoyo Interventoria Consorcio MASO 10.





Capacitación Riesgo mecanico, efectos sobre la salud y medida preventiva a personal OAC Junta de Acción Comunal de la Vereda Olivos La Unión Nariño 2 de agosto de 2024, apoyo Interventoria Consorcio MASO 10.







Inspecciòn de obra e Inspección uso de EPP trabajadores OAC Junta de Acción Comunal de la vereda Olivos La Unión Nariño 2 de agosto de 2024, apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.









Inpsecciòn uso de EPP OAC Junta de Acciòn Comunal de la Vereda Nueva Florida - San Pablo Nariño 6 de agosto de 2024, apoyo de Interventorìa Consorcio MASO 10.







.





Capacitación Pausas activas, leisones osteomusculares y medidas preventivas OAC Junta de Acción Comunal De la Vereda Nueva Florida - San Pablo Nariño 6 de agosto de 2024, en poyo de Interventoria Consrocio MASO 10.







Inpsecciòn uso de EPP OAC Junta de Acciòn Comunal de la Vereda Nueva Florida - San Pablo Nariño 7 de agosto de 2024, apoyo de Interventorìa Consorcio MASO 10.











Inpsecciòn uso de EPP OAC Junta de Acciòn Comunal de la Vereda Nueva Florida - San Pablo Nariño 14 de agosto de 2024, apoyo de Interventorìa Consorcio MASO 10.







Capacitación Riesgo mecanico, efectos sobre la salud, medidas preventivas OAC Junta de Acción Comunal De la Vereda Nueva Florida - San Pablo Nariño 14 de agosto de 2024, en poyo de Interventoria Consrocio MASO 10.







Inspecciòn uso de EPP OAC Junta de Acciòn Comunal de la Vereda Nueva Florida - San Pablo Nariño 21 de agosto de 2024, apoyo de Interventorìa Consorcio MASO 10.









Capacitación Riesgo Locativo, orden y aseo en obra OAC Junta de Acción Comunal De la Vereda Nueva Florida - San Pablo Nariño 21 de agosto de 2024, en poyo de Interventoria Consrocio MASO 10.





NOTA: Las Juntas de Acción Comunal de: Sauce, El peligro, Llano Grande, Quiroz Alto y Olivos del Municipio de La Unión Nariño; al igual que la Junta de Acción Comunal de la Vereda Nueva Florida del Municipio de San Pablo del departamento de Nariño, no entregaron evidencia fotográfica de actividades realizadas por las mismas en cuanto a seguridad y salud en el trabajo correspondiente al mes de agosto del 2024, ya que no cuentan con profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Elaboro:



GISSEL ANDREA MUÑOZ RIVERA
C.C. 1.089.484.424 de La Unión (N)
Licencia 3889 de 20 de diciembre de 2022 IDSN
Inspectora SST

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DEL PROGRAMA CAMINOS CO TOTAL

NÚMERO DE CONTRATO:	**5065-2023**	**MUNICIPIO:**	**LA UNIÓN**	**DEPARTAMENTO:**	**NARIÑO**	**PROYECTO:**	PROGRAMA CAMINOS CO
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO MASO 10**	**ZONA:**		**TERRITORIAL:**	**NARIÑO**	**VEREDA:**	EL F
RESPONSABLE SST, NÚMERO LICENCIA, AÑO EXPEDICIÓN Y ENTIDAD EMISORA	**GISSEL ANDREA MUÑOZ RIVERA /LICENCIA 3889/ EXPEDIDA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO**			**PERÍODO DEL INFORME:**	**MES DE AGOSTO**	**FECHA ELABORACIÓN:**	31

1. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

RELACIÓN PERSONAL			HORAS HOMBRE TRABAJADAS			No. DE ACCIDENTES		No. DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR AT		No. DE DÍAS CARGADOS POR AT		FRECUENCIA DE LA ACCIDENTALIDAD
MUJERES	HOMBRES	TOTAL	MES			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES
			MUJER	HOMBRE	TOTAL							
3	12	15	240	240	480	0	0	0	0	0	0	0,00

2. PERSONAL DEL OAC Y/O INTERVENTORIA

EMPRESA Y/O OAC	PERSONAL ANTIGUO	PERSONAL NUEVO	PERSONAL RETIRADO	FECHA DE EXAMEN MEDICO	APTO	RESTRICCIONES	FECHA DE AFILIACIÓN ARL	FECHA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO	EDGAR ALVEIRO AROCA GAVIRIA (INDEPENDIENTE)			17/04/2024	Con defecto fisico o enfermedad que interfiere su capacidad laboral para la labor asignada.	Puede realizar actividades evitando la manipulaciò de cargas superiores con ambas manos y cerca del tronco, se sugiere evitar actividades como halar, empujar, traccionar. Permitir realizaciòn de terapias y citas medicas. Se recomienda realizar pausas activas de 10 minutos por cada 2 horas de trabajo continuo.	20/05/2024	21/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO	VICTOR JESÙS DAVILA (INDEPENDIENTE)			17/04/2024	Con defecto fisico o enfermedad que interfiere su capacidad laboral para la labor asignada.	Puede realizar actividades evitando la manipulaciò de cargas superiores con ambas manos y cerca del tronco, se sugiere evitar actividades como halar, empujar, traccionar. Permitir realizaciòn de terapias y citas medicas. Se recomienda realizar pausas activas de 10 minutos por cada 2 horas de trabajo continuo.	16/06/2024	26/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO	SEGUNDO MACARIO MUÑOZ MENESES (DEPENDIENTE)			21/04/2024	Apto para el cargo	N/A	9/05/2024	23/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO	HECTOR VALENCIA LUNA (INDEPENDIENTE)			27/04/2024	Apto para el cargo	N/A	16/06/2024	23/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO			CARLOS MAURICIO LOPEZ VILLAMUEZ (DEPENDIENTE)	21/04/2024	Apto para el cargo	N/A	9/05/2024	RETIRADO
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO	DANIEL OSVALDO AROCA ORDOÑEZ			10/07/2024	Apto para el cargo	N/A	3/08/2024	26/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO	JESUS DAVID USUGA			10/07/2024	Apto para el cargo	N/A	3/08/2024	26/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO	ROBERTO MUÑOZ MUÑOZ			10/07/2024	Apto para el cargo	N/A	3/08/2024	26/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO	EDISON ARLEY BOLAÑOS DELGADO			17/07/2024	Apto para el cargo	N/A	3/08/2024	26/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO	CARLOS DORADO			17/07/2024	Apto para el cargo	N/A	3/08/2024	26/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO	CARLOS ALIRIO VILLAMUEZ LUNA			17/07/2024	Apto para el cargo	N/A	3/08/2024	26/08/2024

EMPRESA Y/O OAC	PERSONAL ANTIGUO	PERSONAL NUEVO	PERSONAL RETIRADO	FECHA DE EXAMEN MEDICO	APTO	RESTRICCIONES	FECHA DE AFILIACIÓN ARL	FECHA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO MASO 10	MAURICIO ROMERO QUIROGA (DEPENDIENTE)			11/04/2024	SIN RESTRICCIONES	N/A	1/02/2024	3/09/2024
CONSORCIO MASO 10	EVELYN DIAZ (DEPENDIENTE)			10/04/2024	SIN RESTRICCIONES	N/A	27/03/2024	3/09/2024
CONSORCIO MASO 10	DAYANY MARCELA PEÑA BASTIDAS (DEPENDIENTE)			5/04/2024	SIN RESTRICCIONES	N/A	8/02/2024	3/09/2024
CONSORCIO MASO 10			NICOL MUÑOZ ZUÑIGA (DEPENDIENTE)	8/04/2024	SIN RESTRICCIONES	N/A	2/04/2024	RETIRADA
CONSORCIO MASO 10			JULIETH ZUÑIGA GOMEZ (DEPENDIENTE)	8/05/2024	SIN RESTRICCIONES	N/A	2/05/2024	RETIRADA
CONSORCIO MASO 10	JORGE ANDRES MUÑOZ SOSCUE (DEPENDIENTE)			15/05/2024	SIN RESTRICCIONES	N/A	2/05/2024	3/09/2024
CONSORCIO MASO 10	GISSEL ANDREA MUÑOZ RIVERA (DEPENDIENTE)			8/05/20244	SIN RESTRICCIONES	N/A	3/0572024	3/09/2024

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DEL PROGRAMA CAMINOS CO TOTAL

CONSORCIO MASO 10	ALVARO EFRAÌN AGUIRRE MAYA (DEPENDIENTE)			16/05/2024	SIN RESTRICCIONES	N/A	15/05/2024	3/09/2024

3. AUSENTISMOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDAD LABORAL O COMUN

NOMBRE	CEDULA	NOMBRE EMPRESA	INCAPACIDAD INICIAL		PRORROGA		
			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CÓDIGO CIE - 10
N/A							
N/A							

NOTA: EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 NO SE PRESENTO AUSENTISMO POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y/0 ENFERMEDAD COMÙN.

4. PROGRAMA DE INDUCCIÓN

FECHA	TEMA	NOMBRE EMPRESA	DURACION	NÚMERO DE ASISTENTES	FECHA	TEMA	NOMBR
N/A							

JORNADAS DE INDUCCIÓN		TRABAJADORES QUE INGRESARON	No. TRABAJADORES QUE RECIBIERON INDUCCIÓN	
MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO
0	0	O	0	0

NOTA: EN EL MES DE AGOSTO NO SE REALIZARON JORNADAS DE INDUCCIÓN.

5. PROGRAMA DE INSPECCIONES

FECHA	INSPECCIÓN REALIZADA	INSPECCIÓN PLANEADA	INSPECCIÓN NO PLANEADA	TIEMPO DE LA INSPECIÓN	PLAN DE ACCIÓN
2/08/2024	Inspecciòn de botiquin de primeros auxilios Tipo A (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST)	X		1 Hora	N/A
7/08/2024	Inspección de Elementos de Protecciòn Personal (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST)	X		1 Hora	N/A
9/08/2024	Inpsecciòn de obra (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST)	X		1 Hora	N/A
9/08/2024	Inspección de Elementos de Protecciòn Personal (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST)	X		1 Hora	Los trabajadores de la obra tanto dependientes como independientes no utilizan el casco de seguridad, concie del mismo.
12/08/2024	Inspección de Elementos de Protecciòn Personal (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST)	X		1 Hora	Los trabajadores de la OAC tanto dependientes como independientes no estan utilizando los EPP como lo son seguridad y tapabocas, concientizar de la importancia del uso de los mismos.
21/08/2024	Inspección de Elementos de Protecciòn Personal (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST)	X		1 Hora	Los trabajadores independientes, no utilizan el casco de seguridad por tal motivo cincientizar a los mismos de

6. PROGRAMA DE CAPACITACIONES SST

FECHA	TEMA	NOMBRE EMPRESA	DURACIÓN (Horas)
viernes, 02 de agosto de 2024	Manipulación de herramientas y manpulación de cargas manuales.	Junta de Acciòn Comunal Vereda El Peligro en apoyo de Consorcio MASO 10	1 Hora
viernes, 09 de agosto de 2024	Pausas Activas, lesione sosteomusculares y medidas preventivas.	Junta de Acciòn Comunal Vereda El Peligro en apoyo de Consorcio MASO 10	1 Hora
lunes, 12 de agosto de 2024	Riesgo mecanico, efectos sobre la salud y medidas preventias.	Junta de Acciòn Comunal Vereda El Peligro en apoyo de Consorcio MASO 10	1 Hora
miércoles, 14 de agosto de 2024	Accidentes e incidentes de trabajo, Importancia de uso de EPP.	Junta de Acciòn Comunal Vereda El Peligro en apoyo de Consorcio MASO 10	1 Hora
miércoles, 21 de agosto de 2024	Orden y aseo en obra, Riesgo locativo.	Junta de Acciòn Comunal Vereda El Peligro en apoyo de Consorcio MASO 10	1 Hora

No. CAPACITACIONES REALIZADAS		PROMEDIO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL MES	HORAS DE CAPACITACIÓN	
MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO
5	5	10	10	10

7. ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NÚMERO DE TRABAJADORES QUE INGRESARON EL PERIODO	TRABAJADORES QUE RECIBIERON DOTACIÓN	
	NÚMERO DE TRABAJADORES NUEVOS QUE RECIBIERON DOTACIÓN	NÚMERO DE TRABAJADORES QUE RECIBIERON EPP
6	6	10

8. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL SG-SST

FECHA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NOMBRE EMPRESA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% CUMPLIMIENTO
2/08/2024	INSPECCIÒN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS A OAC	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1	1	100%
7/08/2024	INSPECCIÒN DE EPP A OAC	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1	1	100%
9/08/2024	INSPECCIÒN DE OBRA	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1	1	100%
10/08/2024	PROGRAMA DE REHABILITACIÒN Y REINCORPORACIÒN LABORAL	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1	1	100%
12/08/2024	INSPECCIÒN DE EPP A OAC	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1	1	100%
21/08/2024	INSPECCIÒN DE EPP A OAC	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1	1	100%

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DEL PROGRAMA CAMINOS CO TOTAL

NOTA: LA OAC JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA EL PELIGRO, NO CUENTA CON UN PLAN ANUAL DE SG-SST YA QUE NO TIENE UN SST.

9. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIÓNES INSEGURAS

FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE REPORTA	DESCRIPCIÓN DEL REPORTE	NOTA: Describa con una X si es acto inseguro ó condición insegura.		EMPRESA	CAUSAS DEL ACTO Ó CONDICIÓN INSEGURA
			ACTO INSEGURO	CONDICIÓN INSEGURA		
N/A						
N/A						

EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 NO SE REALIZARÒN REPORTES DE ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS TANDO POR OAC COMO POR INTERVENTORIA.

10. DESCRIPCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

FECHA	HORA	LUGAR	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	EMPRESA	NOMBRE DEL AFECTADO	CARGO	DESCRIP
N/A							
				TOTAL ACCIDENTES E INCIDENTES EN EL MES			

NOTA: EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 NO OCURRIERON ACCIDENTES NI INCIDENTES DE TRABAJO TANTO EN OAC COMO EN INTERVENTORIA.

11. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRANSITO DE VEHICULOS PROPIOS Y ALQUILADOS

FECHA	HORA	LUGAR	EMPRESA	AFECTADO	CARGO	

NOTA: EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 NO SE PRESENTARON ACCIDENTES DE TRANSITO DE VEHÌCULOS PROPIOS Y/O ALQUILADOS.

12. PLAN DE EMERGENCIAS

NOMBRE DE LOS COLABORADORES FORMADOS O CAPACITADOS	FORMACIÓN RECIBIDA	CANTIDAD DE EQUIPOS DE EMERGENCIA DISPONIBLES	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	UBICACIÓN	SIMULACRO REALIZAD
GISSEL ANDREA MUÑOZ RIVERA - CONSORCIO MASO 10	PRIMEROS AUXILIOS BASICOS	1	Botiquín de primeros auxilios Tipo A (Gasas paquete x 20 unidades, esparadrapo de tela rollo de 4", bajalenguas paquete por 20 unidades, caja de guantes de latex, vendas elasticas de 2x5 - 3x5 - 5x5 yardas, venda de algodón de 3x5 y 5x5 yardas, yodopovidona x120 ml, solución salina por 250 cc, termometro digital, alcohol antiseptico x 270 ml y algodón).	Casa alquiler de la obra	0

NOTA: SE ADJUNTA PLAN DE EMERGENCIA DE INTERVENTORÌA CONSORCIO MASO 10, LA OAC JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA EL PELIGRO NO TIENE PLAN DE EMERGENCIAS.

13. OBSERVACIONES GENERALES

ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PERÍODO	FECHA PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD	MOTIVO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA NO REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	FEHCA DE LA REPROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD	TOTAL DE ACTIVIDADE PROGRAMADAS EN EL PERÍODO
N/A				
N/A				

DOCUMENTACIÓN VEHICULOS INTERVENTORIA

CLASE DE VEHÍCULO	PLACA	MARCA	LINEA	CILINDRAJE CC	MODELO	COLOR	FECHA DE REVISÓN TECNOMECANICA
MOTOCICLETA	JCV20G	YAMAHA	FZN-250A	249	2023	MULTICOLOR	N/A
MOTOCICLETA	NSA13G	HONDA	XTR 150LE3	149	2023	ROJO BLANCO	N/A
MOTOCICLETA	JPE59E	HONDA	XR150L	149	2019	BLANCO ROJO	21/12/2023
MOTOCICLETA	ZEA97G	BAJAJ	DISCOVERY 125 ST	125	2024	NEGRO INFINITO	N/A
MOTOCICLETA	BVZ63E	BAJAJ	PULSAR 200 NS PRO	199	2016	ROJO ECLIPSE NEGRO MATE	8/08/2023

14. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA







Capacitación Manipulación de herramientas y manipulación de cargas manuales; inepcción de botiquín de primeros auxilios de OAC Junta de Acción Comunal vereda El Peligro La Unión Nariño 2 de agosto 2024, en apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.







Inspección de uso de EPP personal OAC Junta de Acción Comunal Vereda El Peligro 7 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.













Capacitación Pausas activas, lesione sosteomusculares y medidas preventivasa personal OAC Junta de Acción Comunal vereda El Peligro La Unión Nariño 9 de agosto 2024, en apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.

Inspección de uso de EPP personal e inspección de obra OAC Junta de Acción Comunal Vereda El Peligro 9 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoria Consorc















Capacitación Riesgo mecanico, efectos sobre la salud y medidas preventivas personal OAC Junta de Acción Comunal vereda El Peligro La Unión Nariño 12 de agosto 2024, en apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.

Inspección de uso de EPP personal OAC Junta de Acción Comunal Vereda El Peligro 12 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoria Consrocio MASO 10.

Capacitación accidentes e













Inspección de uso de EPP personal OAC Junta de Acción Comunal Vereda El Peligro 21 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoria Consrocio MASO 10.

Capacitación Orden y aseo en obra, Riesgo locativo personal OAC Junta de Acción Comunal Vereda El Peligro 21 de agos

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL OAC

NOTA: LA OAC JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO COMO NO TIENE SST NO REPORT REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DEL SG-SST EN EL MES DE AGOSTO DE 2024.

OMUNITARIOS DE LA PAZ		**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**
		CÓDIGO: PCCPT-SST-F-02
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 25-04-2024
MUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**OAC**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO
PELIGRO	**N° DE CONVENIO**	3119-2023
8	2024	

SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	**AUSENTISMO POR INCAPACIDAD LABORAL O COMUN**		**AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA (ACM)**
MES	**DÍAS PERDIDOS**	**No. DÍAS DE TRABAJO PROGRAMADOS**	
	MES	**MES**	**MES**
0,00	0	30	0

INFORMACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ARL	**EPS**	**AFP**	**CCF**
POSITIVA	SANITAS EPS	COLPENSIONES	N/A
SURA	ASMET SALUD	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO
POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO
SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO
POSITIVA	SANITAS EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO
SURA	ASMET SALUD	PORVENIR	
SURA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	
SURA	EMSSANAR EPS	PORVENIR	
SURA	MALLAMAS EPS	PORVENIR	
SURA	SANITAS EPS	PORVENIR	
SURA	EMSSANAR EPS	PORVENIR	

INFORMACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ARL	**EPS**	**AFP**	**CCF**
POSITIVA	COMPENSAR	SKANDIA	CAFAM
POSITIVA	COLFONDOS	NUEVA EPS	COMFAMILIAR DE NARIÑO
POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO
POSITIVA	FOSYGA	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO
POSITIVA	EMSSANAR EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO
POSITIVA	MALLAMAS	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO
POSITIVA	SANITAS EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO

ÓMUNITARIOS DE LA PAZ		CÓDIGO: PCCPT-SST-F-02	
		VERSIÓN: 02	
		FECHA: 25-04-2024	
POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO

MOTIVO	TIEMPO	
TIPO DE AUSENTISMO	DÍAS DE AUSENCIA	HORAS DE AUSENCIA
TOTAL:	0	0

E EMPRESA	DURACION	NÚMERO DE ASISTENTES

COBERTURA DE INDUCCIÓN	
PERSONA NUEVAS QUE INGRESARON AL PROYECTO:	0
PERSONAS QUE RECIBIERON INDUCCION:	0
% COBERTURA	#¡DIV/0!

	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
ntizar la importancia del uso	12/08/2024	Liliana Valencia - Presidenta Junta de Acciòn Comunal Vereda El Peligro
casco dialectrico, lentes de	16/08/2024	Liliana Valencia - Presidenta Junta de Acciòn Comunal Vereda El Peligro
la importancia del uso de EPP.	23/08/2024	Liliana Valencia - Presidenta Junta de Acciòn Comunal Vereda El Peligro

	COBERTURTA DE INSPECCIONES	
	INSPECCIONES PROGRAMADAS EN EL PERIODO	5
	INSPECCIONES REALIZAS ENTRE PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS	5
		100%

ASISTENTES
10
10
11
11
10

COBERTURA DE CAPACITACIÓN	
PROMEDIO DE TRABAJADORES:	10
PROMEDIO PERSONAS CAPACITADAS EN EL MES:	10
% COBERTURA	100%

COBERTURA
100%

OBSERVACIONES
TOTAL: 6 6

CIERRE DEL HALLAZGO (medidas de control adoptadas o implementadas)	Detalle el soporte que se deja (registro fotografico, registro de asistencia, acta, informe etc.)

CIÓN DEL EVENTO	SEVERIDAD DEL AT	DÍAS PERDIDOS
	TOTAL DÍAS PERDIDOS	0

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	DÍAS PERDIDOS
	1

DO	FECHA DEL ULTIMO SIMULACRO	TOTAL DE SIMULACROS REALIZADOS
	N/A	0

TOTAL DE ACTIVIDADES REPROGRAMADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

VIGENCIA SOAT
28/09/2023 - 27/09/2024
11/08/2023 - 10/08/2024
20702/2024 - 19/02/2024
9/02/2024 - 8/02/2025
28/12/2023-27/12/2024









:io MASO 10.





incidentes de trabajo, importancia del uso de EPP personal OAC Junta de Acción Comunal vereda El Peligro La Unión Nariño 14 de agosto 2024, en apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.



to de 2024, en apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DEL PROGRAMA CAMI LA PAZ TOTAL

NÚMERO DE CONTRATO:	5065-2023	MUNICIPIO:	LA UNIÓN	DEPARTAMENTO:	NARIÑO	PROYECTO:	PROGRAMA CAMINOS CO
INTERVENTORIA:	CONSORCIO MASO 10	ZONA:		TERRITORIAL:	NARIÑO	VEREDA:	LLANO
RESPONSABLE SST, NÚMERO LICENCIA, AÑO EXPEDICIÓN Y ENTIDAD EMISORA	GISSEL ANDREA MUÑOZ RIVERA /LICENCIA 3889/ EXPEDIDA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO			PERÍODO DEL INFORME:	MES DE AGOSTO	FECHA ELABORACIÓN:	31

1. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

RELACIÓN PERSONAL			HORAS HOMBRE TRABAJADAS			No. DE ACCIDENTES		No. DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR AT		No. DE DÍAS CARGADOS POR AT		FRECUENCIA DE LA ACCIDENTALIDAD
MUJERES	HOMBRES	TOTAL	MES			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES
			MUJER	HOMBRE	TOTAL							
4	9	13	80	80	160	0	0	0	0	0	0	0,00

2. PERSONAL DEL OAC Y/O INTERVENTORIA

EMPRESA Y/O OAC	PERSONAL ANTIGUO	PERSONAL NUEVO	PERSONAL RETIRADO	FECHA DE EXAMEN MEDICO	APTO	RESTRICCIONES		
							FECHA DE AFILIACIÓN ARL	FECHA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL VEREDA LLANO GRANDE			JUAN GUILLERMO MARTINEZ ERASO (INDEPENDIENTE)	13/05/2024	Apto para el cargo	N/A	19/05/2024	RETIRAD0
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL VEREDA LLANO GRANDE	LISSETTE VIVIANA DIAZ URBANO (INDEPENDIENTE)			1/04/2024	Apta para el cargo	N/A	16/05/2024	4/09/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL VEREDA LLANO GRANDE			JESÚS ALVEIRO ORDOÑEZ (INDEPENDIENTE)	7/05/2024	Apto para el cargo	N/A	24/05/2024	RETIRADO
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL VEREDA LLANO GRANDE	ARLEY FABIAN MUÑOZ (INDEPENDIENTE)			29/05/2024	Apto para el Cargo	N/A	21/06/2024	15/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL VEREDA LLANO GRANDE			LUIS HUMBERTO CARVAJAL OSPINA (DEPENDIENTE)	21/04/2024	Apto para el cargo	N/A	9/05/2024	RETIRADO
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL VEREDA LLANO GRANDE			LUIS OJEDA MENESES (DEPENDIENTE)	21/04/2024	Apto para el cargo	N/A	9/05/2024	RETIRADO
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL VEREDA LLANO GRANDE			KEVIN ANDRES RODRIGUEZ REALPE (INDEPENDIENTE)	21/04/2024	Apto para el cargo	N/A	25/05/2024	RETIRADO
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL VEREDA LLANO GRANDE	FABIAN RICARDO GOMEZ MARTINEZ (INDEPENDIENTE)			15/06/2024	Apto para el cargo	N/A	19/06/2024	15/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL VEREDA LLANO GRANDE	MAURICIO HERNANDO PINTA ROMERO (INDEPENDIENTE)			15/06/2024	Apto para el cargo	N/A	20/06/2024	15/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL VEREDA LLANO GRANDE	SANTIAGO ALEXANDER ESPAÑA MORENO (INDEPENDIENTE)			21/06/2024	Apto para el cargo	N/A	20/06/2024	15/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL VEREDA LLANO GRANDE	JEREMY SNEIDER ORTEGA MORENO (INDEPENDIENTE)			21/06/2024	Requiere nueva valoraciòn	Se solicita ecografia de tejidos blandos de la pared abdominal y nueva valoraciòn por medicina laboral con resultado.	19/06/2024	15/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL VEREDA LLANO GRANDE	JOSÈ ALVARO SOLARTE VELASCO (INDEPENDIENTE)			29/05/2024	Apto para el cargo	N/A	21/06/2024	15/08/2024

EMPRESA Y/O OAC	PERSONAL ANTIGUO	PERSONAL NUEVO	PERSONAL RETIRADO	FECHA DE EXAMEN MEDICO	APTO	RESTRICCIONES		
							FECHA DE AFILIACIÓN ARL	FECHA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	MAURICIO ROMERO QUIROGA (DEPENDIENTE)			11/04/2024	Apto para el cargo	N/A	1/02/2024	3/09/2024
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	EVELYN JULIANA DIAZ GOMEZ (DEPENDIENTE)			10/04/2024	Apta para el cargo	N/A	27/03/2024	3/09/2024
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	DAYANY MARCELA PEÑA BASTIDAS (DEPENDIENTE)			5/04/2024	Apta para el cargo	N/A	8/02/2024	3/09/2024
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10			NICOL MUÑOZ ZUÑIGA (DEPENDIENTE)	8/04/2024	Apta para el cargo	N/A	2/04/2024	RETIRADA
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10			JULIETH ZUÑIGA GOMEZ (DEPENDIENTE)	8/05/2024	Apta para el cargo	N/A	2/05/2024	RETIRADA
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	JORGE ANDRES MUÑOZ SOSCUE (DEPENDIENTE)			15/05/2024	Apto para el cargo	N/A	2/05/2024	3/09/2024
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	GISSEL ANDREA MUÑOZ RIVERA (DEPENDIENTE)			8/05/20244	Apta para el cargo	N/A	3/0572024	3/09/2024
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	ALVARO EFRAÌN AGUIRRE MAYA (DEPENDIENTE)			16/05/2024	Apto para el cargo	N/A	15/05/2024	3/09/2024

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DEL PROGRAMA CAMI LA PAZ TOTAL

3. AUSENTISMOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDAD LABORAL O COMUN

NOMBRE	CEDULA	NOMBRE EMPRESA	INCAPACIDAD INICIAL		PRORROGA		
			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CÓDIGO CIE - 10

NOTA: EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 NO SE PRESENTO AUSENTISMO POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD COMÙN.

4. PROGRAMA DE INDUCCIÓN

FECHA	TEMA	NOMBRE EMPRESA	DURACION	NÚMERO DE ASISTENTES	FECHA	TEMA	NOMBR
N/A							

JORNADAS DE INDUCCIÓN		TRABAJADORES QUE INGRESARON	No. TRABAJADORES QUE RECIBIERON INDUCCIÓN	
MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO

NOTA: EN EL MES D EAGOSTO NO SE REALIZARON INDUCCIONES NI REINDUCCIONES DEL PERSONAL.

5. PROGRAMA DE INSPECCIONES

FECHA	INSPECCIÓN REALIZADA	INSPECCIÓN PLANEADA	INSPECCIÓN NO PLANEADA	TIEMPO DE LA INSPECIÓN	PLAN DE ACCIÓN
2/08/2024	Inspección de Elementos de Protecciòn Personal (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST)	X		1 Hora	N/A
8/08/2024	Inspección de Obra (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST)	X		1 Hora	N/A
8/08/2024	Inspección de Elementos de Protecciòn Personal (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST)	X		1 Hora	Realizar seguimiento del uso de EPP tanto de trabajadores dependientes como independientes.
8/08/2024	Inspecciòn Botiquin de priumeros auxilios de acuerdo a la Resoluciòn 705 de 2007 (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST)	X		1 Hora	N/A
9/08/2024	Inspección de Elementos de Protecciòn Personal (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST)		X	1 Hora	N/A

6. PROGRAMA DE CAPACITACIONES SST

FECHA	TEMA	NOMBRE EMPRESA	DURACIÓN (Horas)
viernes, 02 de agosto de 2024	Manipulación de herramientas y manipulación manual de cargas.	JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE APOYO DE INTERVENTORIA CONSORCIO MAS 10	1 Hora
jueves, 08 de agosto de 2024	Pausas activas, lesiones osteomusculares y medidas preventivas.	JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE APOYO DE INTERVENTORIA CONSORCIO MAS 10	1 Hora
viernes, 09 de agosto de 2024	Riesgo mecanico, efectos sobre la salud.	JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE APOYO DE INTERVENTORIA CONSORCIO MAS 10	1 Hora
martes, 13 de agosto de 2024	Cortes con objetos y herramientas.	JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE APOYO DE INTERVENTORIA CONSORCIO MAS 10	1 Hora

No. CAPACITACIONES REALIZADAS		PROMEDIO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL MES	HORAS DE CAPACITACIÓN	
MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO
4	4	9	4	4

7. ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NÚMERO DE TRABAJADORES QUE INGRESARON EL PERIODO	TRABAJADORES QUE RECIBIERON DOTACIÓN	
	NÚMERO DE TRABAJADORES NUEVOS QUE RECIBIERON DOTACIÓN	NÚMERO DE TRABAJADORES QUE RECIBIERON EPP
	2	2

8. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL SG-SST

FECHA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NOMBRE EMPRESA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% CUMPLIMIENTO
2/08/2024	INSPECCIÒN DE EPP A OAC	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1	1	100%
8/08/2024	INSPECCIÒN DE OBRA	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1	1	100%
8/08/2024	INSPECCIÒN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS A OAC	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1	1	100%
9/08/2024	INSPECCIÒN DE EPP A OAC	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1	1	100%
10/08/2024	PROGRAMA DE REHABILITACIÒN Y REINCORPORACIÒN LABORAL	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1	1	100%

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DEL PROGRAMA CAMI LA PAZ TOTAL

9. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIÓNES INSEGURAS

FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE REPORTA	DESCRIPCIÓN DEL REPORTE	NOTA: Describa con una X si es acto inseguro ó condición insegura.		EMPRESA	CAUSAS DEL ACTO Ó CONDICIÓN INSEGURA
			ACTO INSEGURO	CONDICIÓN INSEGURA		
N/A						

NOTA: EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 NO SE REALIZARÒN REPORTES DE ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS TANDO POR OAC COMO POR INTERVENTORIA.

10. DESCRIPCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

FECHA	HORA	LUGAR	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	EMPRESA	NOMBRE DEL AFECTADO	CARGO	DESCRIP
N/A							
				TOTAL ACCIDENTES E INCIDENTES EN EL MES			

NOTA: EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 NO OCURRIERON ACCIDENTES NI INCIDENTES DE TRABAJO TANTO EN OAC COMO EN INTERVENTORIA.

11. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRANSITO DE VEHICULOS PROPIOS Y ALQUILADOS

FECHA	HORA	LUGAR	EMPRESA	AFECTADO	CARGO	
N/A						

NOTA: EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 NO SE PRESENTARON ACCIDENTES DE TRANSITO DE VEHÌCULOS PROPIOS Y/O ALQUILADOS.

12. PLAN DE EMERGENCIAS

NOMBRE DE LOS COLABORADORES FORMADOS O CAPACITADOS	FORMACIÓN RECIBIDA	CANTIDAD DE EQUIPOS DE EMERGENCIA DISPONIBLES	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	UBICACIÓN	SIMULACRO REALIZAD
GISSEL ANDREA MUÑOZ RIVERA - CONSORCIO MASO 10	PRIMEROS AUXILIOS BASICOS	1	Botiquín de primeros auxilios Tipo A (Gasas paquete x 20 unidades, esparadrapo de tela rollo de 4", bajalenguas paquete por 20 unidades, caja de guantes de latex, vendas elasticas de 2x5 - 3x5 - 5x5 yardas, venda de algodón de 3x5 y 5x5 yardas, yodopovidona x120 ml, solución salina por 250 cc, termometro digital, alcohol antiseptico x 270 ml y algodón).	Casa alquiler de obra	0

NOTA: SE ADJUNTA PLAN DE EMERGENCIA DE INTERVENTORÌA CONSORCIO MASO 10, LA OAC JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE NO TIENE PLAN DE EMERGENCIAS.

13. OBSERVACIONES GENERALES

ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PERÍODO	FECHA PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD	MOTIVO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA NO REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	FEHCA DE LA REPROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD	TOTAL DE ACTIVIDADE PROGRAMADAS EN EL PERÍODO
N/A				
N/A				

DOCUMENTACIÓN VEHICULOS INTERVENTORIA

CLASE DE VEHÍCULO	PLACA	MARCA	LINEA	CILINDRAJE CC	MODELO	COLOR	FECHA DE REVISÓN TECNOMECANICA
MOTOCICLETA	JCV20G	YAMAHA	FZN-250A	249	2023	MULTICOLOR	N/A
MOTOCICLETA	NSA13G	HONDA	XTR 150LE3	149	2023	ROJO BLANCO	N/A
MOTOCICLETA	JPE59E	HONDA	XR150L	149	2019	BLANCO ROJO	21/12/2023
MOTOCICLETA	ZEA97G	BAJAJ	DISCOVERY 125 ST	125	2024	NEGRO INFINITO	N/A
MOTOCICLETA	BVZ63E	BAJAJ	PULSAR 200 NS PRO	199	2016	ROJO ECLIPSE NEGRO MATE	8/08/2023

14. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA















Inspecciòn de obra y EPP a colaboradores OAC Junta de Acciòn Comunal Vereda Llano Grande La Unión Nariño 2 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.

Capacitación manipulación de herramientas y manipulación manual de cargas a personal OAC Junta de Acciòn Comunal Vereda Llano Grande La Unión Nariño 2 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.

Capacitación pausas activas, lesiones osteomusculare Vereda Llano Grande La Unión Nariño 8 de agos

							
Inspecciòn de obra y EPP a colaboradores, Inpección de obra e inspección de botiquin de primeros auxilios OAC Junta de Acciòn Comunal Vereda Llano Grande La Uniòn Nariño 8 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.		Inspecciòn de obra y EPP a colaboradores OAC Junta de Acciòn Comunal Vereda Llano Grande La Uniòn Nariño 9 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.		Capacitaciòn Riesgo mecanico, efectos sobre la salud a personal OAC Junta de Acciòn Comunal Vereda Llano Grande La Uniòn Nariño 9 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.			
							
Capacitaciòn cortes con objetos y herramientas a personal OAC Junta de Acciòn Comunal Vereda Llano Grande La Uniòn Nariño 13 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.							

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL OAC

NOTA: NOTA: LA OAC JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE NO CUENTA CON UN SST Y NO REPORTO MAS EVIDENCIA FOTOGRAFÍA DE ACCIONES REALIZADAS EN EL SG-SST CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

INOS COMUNITARIOS DE		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
		CÓDIGO: PCCPT-SST-F-02
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 25-04-2024
VIUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO GRANDE
O GRANDE	N° DE CONVENIO	3089-2023
8	2024	

SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	AUSENTISMO POR INCAPACIDAD LABORAL O COMUN		AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA (ACM)
MES	DÍAS PERDIDOS	No. DÍAS DE TRABAJO PROGRAMADOS	
	MES	MES	MES
0,00	0	10	0

INFORMACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
ARL	EPS	AFP	CCF
POSITIVA	S.O.S EPS	PORVENIR	
POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	
POSITIVA	ASMET SALUD	PORVENIR	
POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	
POSITIVA	ASMET SALUD	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO
POSITIVA	ASMET SALUD	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO
POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	N/A
POSITIVA	EMSSANAR EPS	PORVENIR	N/A
POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	N/A
SURA	ASMET SALUD	PORVENIR	N/A
POSITIVA	MALLASMAS EPS	PORVENIR	N/A
SURA	ASMET SALUD	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO

INFORMACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
ARL	EPS	AFP	CCF
POSITIVA	COMPENSAR	SKANDIA	CAFAM
POSITIVA	NUEVA EPS	COLFONDOS	COMFAMILIAR DE NARIÑO
POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO
POSITIVA	FOSYGA	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO
POSITIVA	EMSSANAR EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO
POSITIVA	MALLAMAS	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO
POSITIVA	SANITAS EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO
POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR DE NARIÑO

INOS COMUNITARIOS DE	CÓDIGO: PCCPT-SST-F-02
	VERSIÓN: 02
	FECHA: 25-04-2024

MOTIVO	TIEMPO	
TIPO DE AUSENTISMO	DÍAS DE AUSENCIA	HORAS DE AUSENCIA
TOTAL:	0	0

E EMPRESA	DURACION	NÚMERO DE ASISTENTES

COBERTURA DE INDUCCIÓN	
PERSONA NUEVAS QUE INGRESARON AL PROYECTO:	
PERSONAS QUE RECIBIERON INDUCCION:	
% COBERTURA	#¡DIV/0!

	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	9/08/2024	Lissette Vivian Diaz Residente de obra Junta de Acciòn Comunal Vereda Llano Grande
	N/A	N/A
	N/A	N/A

	INSPECCIONES PROGRAMADAS EN EL PERIODO	5
	INSPECCIONES REALIZAS ENTRE PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS	5
		100%

ASISTENTES
9
8
6
4

COBERTURA DE CAPACITACIÓN	
PROMEDIO DE TRABAJADORES:	9
PROMEDIO PERSONAS CAPACITADAS EN EL MES:	9
% COBERTURA	100%

COBERTURA
#¡DIV/0!

OBSERVACIONES		
TOTAL:	5	5

INOS COMUNITARIOS DE	CÓDIGO: PCCPT-SST-F-02
	VERSIÓN: 02
	FECHA: 25-04-2024

CIERRE DEL HALLAZGO (medidas de control adoptadas o implementadas)	Detalle el soporte que se deja (registro fotografico, registro de asistencia, acta, informe etc.)

CIÓN DEL EVENTO	SEVERIDAD DEL AT	DÍAS PERDIDOS
	TOTAL DÍAS PERDIDOS	0

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	DÍAS PERDIDOS

DO	FECHA DEL ULTIMO SIMULACRO	TOTAL DE SIMULACROS REALIZADOS
	N/A	0

TOTAL DE ACTIVIDADES REPROGRAMADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

VIGENCIA SOAT
28/09/2023 - 27/09/2024
11/08/2023 - 10/08/2024
20702/2024 - 19/02/2024
9/02/2024 - 8/02/2025
28/12/2023-27/12/2024

	
s y medidas preventivas a personal OAC Junta de Acciòn Comunal to de 2024, en apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.	Inspecciòn de obra y EPP a colaboradores, Inpecciòn de obra e inspecciòn de botiquin de primeros auxilios OAC Junta de Acciòn Comunal Vereda Llano Grande La Unión Nariño 8 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.

INOS COMUNITARIOS DE	CÓDIGO: PCCPT-SST-F-02
	VERSIÓN: 02
	FECHA: 25-04-2024





Capacitaciòn cortes con objetos y herramientas a personal OAC Junta de Acciòn Comunal Vereda Llano Grande La Uniòn Nariño 13 de agosto de 2024, en apoyo de Interventoria Consorcio MASO 10.

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DEL PROGRAMA CAM PAZ TOTAL

NÚMERO DE CONTRATO:	**5065-2023**	**MUNICIPIO:**	**SAN PABLO**	**DEPARTAMENTO:**	**NARIÑO**	**PROYECTO:**	PROGRAMA CAMINOS
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO MASO 10**	**ZONA:**		**TERRITORIAL:**	**NARIÑO**	**VEREDA:**	
RESPONSABLE SST, NÚMERO LICENCIA, AÑO EXPEDICIÓN Y ENTIDAD EMISORA	**GISSEL ANDREA MUÑOZ RIVERA /LICENCIA 3889/ EXPEDIDA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO**			**PERÍODO DEL INFORME:**	**MES DE AGOSTO**	**FECHA ELABORACIÓN:**	**31**

1. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

RELACIÓN PERSONAL			HORAS HOMBRE TRABAJADAS			No. DE ACCIDENTES		No. DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR AT		No. DE DÍAS CARGADOS POR AT		FRECUENCIA DE LA ACCIDENTALIDAD
MUJERES	HOMBRES	TOTAL	MES			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES
			MUJER	HOMBRE	TOTAL							
3	12	15	120	120	240	0	0	0	0	0	0	0,00

2. PERSONAL DEL OAC Y/O INTERVENTORIA

EMPRESA Y/O OAC	PERSONAL ANTIGUO	PERSONAL NUEVO	PERSONAL RETIRADO	FECHA DE EXAMEN MEDICO	APTO	RESTRICCIONES	FECHA DE AFILIACIÓN ARL	FECHA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA	OBER HERNANDO AGREDO BOLAÑOS (INDEPENDIENTE)			17/05/2024	Apto para el cargo	N/A	25/05/2024	21/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA	JOSE ANTONIO URBANO (INDEPENDIENTE)			29/05/2024	Apto para el cargo	N/A	25/04/2024	4/09/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA	JAIDER YOBANI BOLAÑOS MONCAYO (DEPENDIENTE)			30/05/2024	Apto para el cargo	N/A	31/05/2024	26/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA		JUAN CARLOS RAMOS (DEPENIENTE)		27/07/2024	Apto para el cargo	N/A	1/08/2024	26/08/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA			YONIER URBANO ROSERO	30/05/2024	Apto para el cargo	N/A	31/05/2024	RETIRADO
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA	LUIS CARLOS VALDEZ CERON (INDEPENDIENTE)			25/06/2024	Apto para el cargo	N/A	4/08/2024	4/09/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA	CRISTIAN FERNEY MUTIZ MUÑOZ (INDEPENDIENTE)			25/06/2024	Apto para el cargo	N/A	4/08/2024	4/09/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA	JOSÉ LEXANDER CALPA MARTINEZ (INDEPENDIENTE)			25/06/2024	Apto para el cargo	N/A	4/08/2024	4/09/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA	YON ADREICER ORTEGA MUÑOZ (INDEPENDIENTE)			12/07/2024	Apto para el cargo	N/A	4/08/2024	4/09/2024
JUNTA DE ACCIÒN COMUNUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA	ORLANDO ORTEGA GUERRERO (INDEPENDIENTE)			12/07/2024	Apto para el cargo	N/A	4/08/2024	4/09/2024

EMPRESA Y/O OAC	PERSONAL ANTIGUO	PERSONAL NUEVO	PERSONAL RETIRADO	FECHA DE EXAMEN MEDICO	APTO	RESTRICCIONES	FECHA DE AFILIACIÓN ARL	FECHA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	MAURICIO ROMERO QUIROGA (DEPENDIENTE)			11/04/2024	SIN RESTRICCIONES	N/A	1/02/2024	3/09/2024
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	EVELYN JULIANA DIAZ GOMEZ (DEPENDIENTE)			10/04/2024	SIN RESTRICCIONES	N/A	27/03/2024	3/09/2024
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	DAYANY MARCELA PEÑA BASTIDAS (DEPENDIENTE)			5/04/2024	SIN RESTRICCIONES	N/A	8/02/2024	3/09/2024
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10			NICOL MUÑOZ ZUÑIGA (DEPENDIENTE)	8/04/2024	SIN RESTRICCIONES	N/A	2/04/2024	RETIRADA
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10			JULIETH ZUÑIGA GOMEZ (DEPENDIENTE)	8/05/2024	SIN RESTRICCIONES	N/A	2/05/2024	RETIRADA
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	JORGE ANDRES MUÑOZ SOSCUE (DEPENDIENTE)			15/05/2024	SIN RESTRICCIONES	N/A	2/05/2024	3/09/2024
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	GISSEL ANDREA MUÑOZ RIVERA (DEPENDIENTE)			8/05/20244	SIN RESTRICCIONES	N/A	3/0572024	3/09/2024
INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	ALVARO EFRAÌN AGUIRRE MAYA (DEPENDIENTE)			16/05/2024	SIN RESTRICCIONES	N/A	15/05/2024	3/09/2024

3. AUSENTISMOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDAD LABORAL O COMUN

NOMBRE	CEDULA	NOMBRE EMPRESA	INCAPACIDAD INICIAL		PRORROGA		
			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CÓDIGO CIE - 10
N/A							

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DEL PROGRAMA CAM PAZ TOTAL

NOTA: EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 NO SE PRESENTARON AUSENTISMO POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD COMÚN.

4. PROGRAMA DE INDUCCIÓN

FECHA	TEMA	NOMBRE EMPRESA	DURACION	NÚMERO DE ASISTENTES	FECHA	TEMA	NO
jueves, 1 de agosto de 2024	Inducción personal nuevo	Junta de Acción Comunal de la Vereda Nueva Florida	1 Hora	1			

JORNADAS DE INDUCCIÓN		TRABAJADORES QUE INGRESARON	No. TRABAJADORES QUE RECIBIERON INDUCCIÓN		
MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
1	1	1	1	1	

5. PROGRAMA DE INSPECCIONES

FECHA	INSPECCIÓN REALIZADA	INSPECCIÓN PLANEADA	INSPECCIÓN NO PLANEADA	TIEMPO DE LA INSPECIÓN	PLAN DE ACCIÓN
6/08/2024	Inspección de EPP a personal de obra (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST).	X		1 Hora	Dotar a los trabajadores de tapabocas ya que se encuentran en procesos de fundición y e
7/08/2024	Inspección de Botiquín de primeros Auxilios (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST).	X		1 Hora	N/A
7/08/2024	Inspección de obra (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST).	X		1 Hora	N/A
7/08/2024	Inspección de EPP a perosnal de obra (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST).	X		1 Hora	N/A
14/08/2024	Inspección de EPP a personal de obra (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST).	X		1 Hora	N/A
21/08/2024	Inspección de EPP a personal de obra (Realizada por Interventoria CONSORCIO MASO 10 ya que la OAC no cuenta con un profesional en SST).	X		1 Hora	Concientizar a los trabjadores d ela importancia del uso de EPP suministrados por la Junta d Florida.

6. PROGRAMA DE CAPACITACIONES SST

FECHA	TEMA	NOMBRE EMPRESA	DURACIÓN (Horas)
martes, 06 de agosto de 2024	Pausas activas, lesiones osteomusculares y medidas preventivas	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA EN APOYO DE INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1 Hora
miércoles, 14 de agosto de 2024	Riesgo mecanico, efectos sobre la salud, medidas preventivas.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA EN APOYO DE INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1 Hora
miércoles, 21 de agosto de 2024	Riesgo locativo, orden y aseo en obra.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA EN APOYO DE INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1 Hora

No. CAPACITACIONES REALIZADAS		PROMEDIO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL MES	HORAS DE CAPACITACIÓN		
MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
3	3	10	3	3	

7. ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NÚMERO DE TRABAJADORES QUE INGRESARON EL PERIODO	TRABAJADORES QUE RECIBIERON DOTACIÓN		
	NÚMERO DE TRABAJADORES NUEVOS QUE RECIBIERON DOTACIÓN	NÚMERO DE TRABAJADORES QUE RECIBIERON EPP	
3	3	3	

8. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL SG-SST

FECHA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NOMBRE EMPRESA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% CUMPLIMIENTO
6/08/2024	INSPECCIÒN DE EPP A OAC	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1	1	100%
7/08/2024	INSPECCIÒN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS A OAC	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1	1	100%
7/08/2024	INSPECCIÒN DE OBRA	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1	1	100%
10/08/2024	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y REINCORPORACIÓN LABORAL	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10	1	1	100%
14/08/2024	INSPECCIÒN DE EPP A OAC	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10		1	100%
21/08/2024	INSPECCIÒN DE EPP A OAC	INTERVENTORIA CONSORCIO MASO 10		1	100%

NOTA: LA OAC NO SE CUENTA CON EL PLAN ANUAL DEL SG-SST

9. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIÓNES INSEGURAS

	NOMBRE DE LA EMPRESA		NOTA: Describa con una X si es acto inseguro ó condición insegura.		
