ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

TOTALL INC S.A.S BIC
INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN

INFORME No 11 DE INTERVENTORÍA

TOTALL INC SAS BIC



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1804 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2023

PERIODO DE EJECUCIÓN:
01 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 5

ÍNDICE DE MODIFICACIONE 5

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 5

1. INTRODUCCIÓN 6

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
2.1.1 ANTECEDENTES: 8

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8

2.3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 10
2.3.1. CONTRATO DE OBRA 1805 DE 2023. 10
2.3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1844 DE 2023. 11
2.3.3. RELACIÓN DE PÓLIZAS. 12

2.3.3.1 Pólizas contrato de obra 12

2.3.3.2 Pólizas contrato de interventoría 14

3. ESTADO DE MANEJO DEL ANTICIPO 15

4. LISTADO DE EQUIPAMIENTOS 18

5. INFORME TÉCNICO 21

5.1. Visitas diagnósticas 22

5.2. Frentes en ejecución 22

6. RECURSOS UTILIZADOS 23
6.1 PERSONAL AUTORIZADO POR SDSCJ: 23
6.2 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 24
6.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA 24
6.4 RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA. 24
6.5 RECURSOS DEL CONTRATISTA. 24

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ORDEN CONTRACTUAL 24

7.1. Actividades de Orden Financiero: 25

7.2. Acta de recibo parcial de obra 24

7.3 Acta de recibo parcial de interventoría 25

7.4 Actividades de orden administrativo 25

8. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO 26

8.1 Actividades Realizadas por el contrato de obra 26

8.1.1. Administrativo: 26

8.1.2. Actividades realizadas por el contrato de Interventoría 26

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 27

10. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 30

10.1. OBSERVACIONES 30

10.2. CONCLUSIONES 30

11. ANEXOS

11.1. Informe semanal 47

11.2. Actas de comité 47

11.3. Relación de correspondencia enviada y recibida 47

11.4. Bitácoras de Emergencia y Obra 47

11.5. Registro Fotográfico 47

11.6. Conceptos Técnicos de los Especialistas Hidráulico y Eléctrico 47

11.7. Actualización Estado Casas de Justicia 47

11.8. Historial Pagos Proveedor 47

11.9. Informe SST 47

11.10. Informe Ambiental 47

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resumen Contrato de Obra 8

Tabla 2. Resumen Contrato de Interventoría 9

Tabla 3. Pólizas iniciales de obra. 9

Tabla 4. Pólizas iniciales de interventoría 10

Tabla 5. Plan de Inversión del Anticipo 10

Tabla 6. Listado de equipamientos a intervenir 14

Tabla 7. Visitas Diagnósticos. 16

Tabla 8. Frente de Obra-URI Puente Aranda. 17

Tabla 9. Frente de Obra-CER. 18

Tabla 10. Frente de Obra-EP Fontibón Celdas. 21

Tabla 11. Frente de Obra-CJ Usme. 24

Tabla 12. Frente de Obra-EP Fontibón. 26

Tabla 13. Frente de Obra-EP San Cristóbal. 28

Tabla 14. Frente de Obra-EP Suba. 29

Tabla 15. Frente de Obra-CJ San Cristóbal 32

Tabla 16. Frente de Obra-CESPA. 35

Tabla 17. Frente de Obra-EP Rafael Uribe. 37

Tabla 18. Frente de Obra-EP Engativá. 38

Tabla 19. Frente de Obra-CJ La Victoria. 41

Tabla 20. Frente de Obra-Baser 13. 43

Tabla 21. Frente de Obra-PM 15. 44

Tabla 22. Frente de Obra-Sala de Operaciones. 45

Tabla 23. Frente de Obra-C4. 46

Tabla 24. Frente de Obra-EP Ciudad Bolívar. 47

Tabla 25. Frente de Obra-CJ Mártires. 52

Tabla 26. Frente de Obra-Carabineros. 53

Tabla 27. Frente de Obra-CAI Delicias 54

Tabla 28. Frente de Obra-CAI Santa Martha. 55

Tabla 29. Frente de Obra-CAI Danubio. 56

Tabla 30. Frente de Obra-Vivienda Fiscal Caminos de Modelia Apto209. 57

Tabla 31. Frente de Obra- Vivienda Fiscal Caminos de Modelia Apto223. 58

Tabla 32. Frente de Obra-CJ Bosa. 59

Tabla 33. Frente de Obra-CAI SOCORRO. 60

Tabla 34. Frente de Obra-CJ Ciudad Bolívar. 61

Tabla 35. Frente de Obra-CAI Villas de Granada. 62

Tabla 36. Frente de Obra-CJJR Santafé. 63

Tabla 37. Frente de Obra-Comando PM13. 64

Tabla 38. Frente de Obra-CAI Modelo. 65

Tabla 39. Frente de Obra-BAFLA. 66

Tabla 40. Frente de Obra-CAI La Calera. 67

Tabla 41. Frente de Obra-CAI Santa Barbar. 68

Tabla 42. Frente de Obra-EP. Puente Aranda. 69

Tabla 43. Frente de Obra-CAI Lisboa. 71

Tabla 44. Frente de Obra-CAI Rosales 73

Tabla 45. Frente de Obra-CAI Granada. 75

Tabla 46. Frente de Obra-CAI Laches. 77

Tabla 47. Frente de Obra-CAI Colseguros. 79

Tabla 48. Frente de Obra-PM 13 Batallón Baraya. 81

Tabla 49. Frente de Obra-CAI Tunal. 83

Tabla 50. Frente de Obra-CAI Mazurén 85

Tabla 51. Frente de Obra-CAI Cruces 87

Tabla 52. Frente de Obra-CAI Bolivia 89

Tabla 53. Frente de Obra-CJ Usme Etapa 2 91

Tabla 54. Frente de Obra-Ep. San Cristóbal Sala Cipes 93

Tabla 55. Frente de Obra-EP. Usaquén 95

Tabla 56. Frente de Obra-CJ Campo Verde 97

Tabla 57. Frente de Obra-CAE y CTP Campo Verde 99

Tabla 58. Frente de Obra-CAI Guacamayas 101

Tabla 59. Frente de Obra-CAI Bachué 104

Tabla 60. Frente de Obra-CAI Oneida 106

Tabla 61. Frente de Obra-CAI San Luis 108

Tabla 62. Frente de Obra-CAI Restrepo 110

Tabla 63. Frente de Obra-CAI Campo Verde 112

Tabla 64. Frente de Obra-Nuevo Comando 115

Tabla 65. Frente de Obra-CAI Ramajal 117

Tabla 66. Emergencias 119

Tabla 67. Emergencias atendidas en el periodo 122

Tabla 68. Personal SDSCJ 124

Tabla 69. Personal Totall INC SAS BIC 125

Tabla 70. Personal Obrasw 126

Tabla 71. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad de interventoría 127

Tabla 72. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad del contratista 128

Tabla 73. Presupuestos iniciales. 129

Tabla 74. Actas Parciales de Obra. 131

Tabla 75. Actas Parciales de Interventoría. 132

Tabla 76. Informes mensuales Contrato de obra. 133

Tabla 77. Informes mensuales Contrato de interventoría. 134

Tabla 78. Comités de obra.....135

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El ORIGINAL del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación:

DEPENDENCIA	**No. DE COPIAS**
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Original
Biblioteca del Proyecto	1

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas paraproceder a realizar las modificaciones pertinentes.

ÍNDICE DE MODIFICACIONE

Índice Revisión	**Capítulo Modificado**	**Fecha de Modificación**	**Observaciones**
0	**-**	**-**	**VERSIÓN ORIGINAL**

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Título Documento		**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 1**		
REVISIÓN		**0**	**1**	**2**
RESPONSABLE ELABORACIÓN	Nombre			
	Firma			
	Fecha	06/09/2024		
RESPONSABLE REVISIÓN	Nombre	MARIA PIEDAD ESPINOSA V.		
	Firma			
	Fecha	09/09/2024		
RESPONSABLE APROBACIÓN	Nombre	FERNANDO JIMENEZ POLO		
	Firma			
	Fecha	09/09/2024		

1. INTRODUCCIÓN

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, mediante la Resolución No. 0491 20230925, ordenó la apertura del proceso de Selección de Concurso de Méritos Abiertos No. SCJ-SIF-CMA-001- 2023, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".

Se realizó acta de inicio del contrato de obra 1805 de 2023, acta quefue suscrita el día 09 del mes de octubre de 2023, con fecha terminación del 09 de agosto de 2023 con un plazo de ejecución de doce (10) meses.

Del mismo modo, se realizó acta de inicio del contrato de interventoría 1804 de 2023,acta que fue suscrita el día 09 del mes de octubre de 2023, con fecha terminación del 09 de septiembre de 2023 con un plazo de ejecución de once (11) meses.

La Interventoría ejercerá la función de representar a la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA en la supervisión y control de las accionesdel Contratista de obra, verificando que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales, establecidas en las reglas de participación y el Contrato celebrado por la Entidad.

El presente documento contiene el informe No 1 de Interventoría, en el cual se consigna los avances de los frentes de trabajo durante el periodo del 10 de octubre al 31de octubre de 2023, en la ejecución del contrato de obra No 1805 de 2023.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1 ANTECEDENTES:

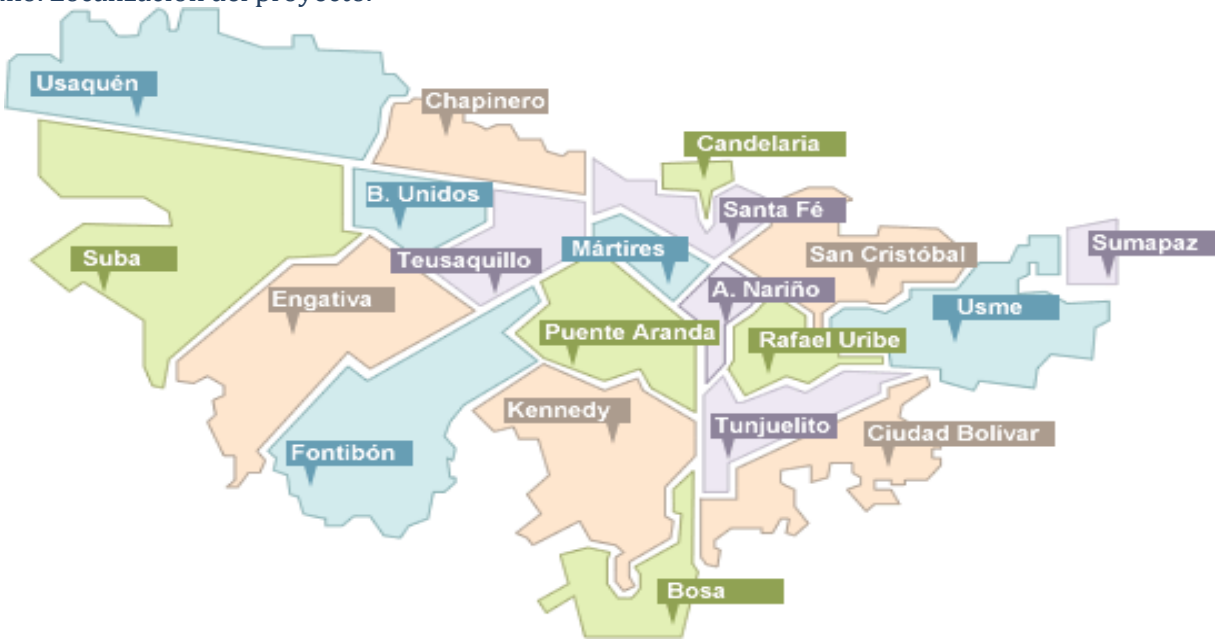
Que el Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicasy el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C para el período 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para Bogotá D.C del siglo XXI", tiene como objetivofundamental, lograr una redistribución más equitativa de vivir en Bogotá, impulsar la recuperación socioeconómica y cultural, transformar las oportunidades de educación,salud, cultura, productividad, innovación, generación de ingresos y disminución de la pobreza multidimensional dirigidas a brindar mayor inclusión social y productiva a lasmujeres, jóvenes y familias.
Que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia es un organismo de nivel central de orden distrital, creado mediante Acuerdo 637 de 2019 del Concejo de Bogotá, con cargo a los recursos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicialos bienes y servicios que la entidad requiere para el cumplimiento de su misión y lasautoridades competentes requieran para optimizar la seguridad de todos los habitantes de Bogotá.
Que las actividades de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia están enmarcadas en cuatro grandes líneas de inversión: a) Prevención y Control del Delitoen el Distrito Capital, b) Acceso a la Justicia (Nuevos y mejores Equipamientos), c) Fortalecimiento de los Organismos de Seguridad del Distrito y d) Gestión Institucional (fortalecimiento en transparencia, gestión pública, modernización, administración y mejoramiento de las TIC).
Dentro de las funciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, se encuentra:
a) Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en el Distrito capital , b) Proporcionar

bienes y servicios a las autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D.C. c) Adelantar la coordinación interinstitucional para mejorarlas condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital, en sus fases de prevención promoción, mantenimiento y restitución. D) Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en el Distrito Capital.

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las obras a ejecutar se desarrollarán en todas las localidades de Bogotá D.C. atendiendo los requerimientos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Plano. Localización del proyecto.



2.3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

2.3.1. CONTRATO DE OBRA 1805 DE 2023.

A continuación, se relaciona los aspectos contractuales más relevantes relacionadoscon el Contrato de Obra 1805 de 2023.

Tabla 1. Resumen Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA 1805 DE 2023	
OBJETO	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS"
No CONTRATO	1805 de 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRASW
NIT	899.999.061-9
REPRESENTANTE LEGAL	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES
PRORROGA	DOS (02) MESES

ACTA DE INICIO	09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	09 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR INICIAL	$ 6.106.791.802
ADICION	$ 2.748.000.000
VALOR TOTAL	$ 8.854.791.802

2.3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1804 DE 2023.

A continuación, se relaciona los aspectos contractuales más relevantes relacionadoscon el Contrato de Interventoría 1804 de 2023.

Tabla 2. Resumen Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1804 DE 2023	
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".
No CONTRATO	1804 de 2023
CONTRATISTA	TOTALL INC SAS BIC
NIT	901.620.351-9
REPRESENTANTE LEGAL	Fernando Jiménez Polo
PLAZO INCIAL	ONCE (11) MESES
ACTA DE INICIO	09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL	$ 869.826.000
VALOR TOTAL	$ 869.826.000

2.3.3. RELACIÓN DE PÓLIZAS.

A continuación, se relaciona las pólizas con las que se encuentran amparados los contratos de obra e interventoría.

2.3.3.1 Pólizas contrato de obra

Tabla 3. Pólizas iniciales de obra.

Póliza No.	11-44-101209093		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
Fecha de expedición.	09/10/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento del Contrato	03/10/2023	10/02/2025	$1.221.358.361,00
Buen manejo del anticipo	03/10/2023	10/02/2025	$1.221.358.361,00
Calidad del Servicio	03/10/2023	10/08/2025	$1.221.358.361,00

Prestaciones Sociales	03/10/2023	10/08/2027	$305.339.591,00
Responsabilidad civil extracontractual	03/10/2023	23/08/2024	$580.000.000,00

Tabla 3.1. Pólizas adición No. 1 de obra.

Póliza No.	11-44-101209093		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
Fecha de expedición.	30/05/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento del Contrato	10/10/2023	09/04/2025	$1.770.958.361,00
Buen manejo del anticipo	10/10/2023	09/04/2025	$1.770.958.361,00
Calidad del Servicio	10/10/2023	09/10/2025	$1.770.958.361,00
Prestaciones Sociales	10/10/2023	09/10/2027	$442.739.591,00
Responsabilidad civil extracontractual	10/10/2023	09/10/2024	$650.000.000,00

2.3.3.2 Pólizas contrato de interventoría

Tabla 4. Pólizas iniciales de interventoría

Póliza No.	21-44-101426773		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
Fecha de expedición.	05/10/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento del Contrato	03/10/2023	03/03/2025	$173,965,200.00
Calidad del Servicio	03/09/2024	03/09/2025	$173,965,200.00
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	03/10/2023	03/09/2027	$43,491,300.00
Responsabilidad civil extracontractual	03/10/2023	03/03/2024	$232,000,000.00

3. ESTADO DE MANEJO DEL ANTICIPO

El 30 de enero de 2024 se realiza el primer desembolso al contratista CONSORCIO OBRASW por un valor de $ 209.961.078,40, el 5 de febrero de 2024 se realiza un segundo desembolso por un valor de$72.173.020,28, el 15 de febrero de 2024 se realiza un tercer desembolso por un valor de $402.542.702, el 14 de marzo de 2024 se realiza un cuarto desembolso por un valor de $362.638.132,87, el 15 de marzo de 2024 se realiza un quinto desembolso por un valor de $34.482.747,44, el 18 de marzo de 2024 se realiza un sexto desembolso por un valor de $61.156.197,00, el 15 de febrero de 2024 se realiza un séptimo desembolso por un valor de $75.904.482,19. Ver anexo 11.8.

APROBACION - CONSORCIO OBRAS W ORDEN DE PAGO VR DEL ANTICIPO No 1

ORD	FECHA	FECHA	NIT	DV	BENEFICIARIO	No	CONCEPTO	SUBTOTAL	BASE	BASE	IVA (19%)	IVA	DCTOS	VALOR FRA	ANTICIPOS	RET GARANTIA	RET FTE	RET ICA		TOTAL A GIRAR	VR TOT
1	#########		9E+08	1	WRUSSY INGENIEROS SAS		REEMBOLSO POR PAGO							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 209.961.078,40
1		14-dic-23	9E+08		CONSTRUCCIONES RDL SAS		FRA RDLC 202 CORTE DE	$ 155.697.452,63						$ 155.697.452,63	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1		29-dic-23	9E+08		CONSTRUCCIONES RDL SAS		FRA RDLC 206 CORTE DE	$ 54.263.626						$ 54.263.626	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54.263.626	$ -
														$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
														$ -					$ -	$ -	$ -
														$ -					$ -	$ -	$ -
														$ -						TOTAL ORDEN DE	$ 209.961.078,40

Vo Bo Vo Bo

APROBACION - CONSORCIO OBRAS W ORDEN DE PAGO VR DEL ANTICIPO No 2

ORD	FECHA	FECHA	NIT	DV	BENEFICIARIO	No	CONCEPTO	SUBTOTAL	BASE	BASE	IVA (19%)	IVA	DCTOS	VALOR FRA	ANTICIPOS	RET GARANTIA	RET FTE	RET ICA		TOTAL A GIRAR	VR TOT
2	05-feb-24		9E+08	1	WRUSSY INGENIEROS SAS		REEMBOLSO POR PAGO							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 72.173.020,28
			9E+08		CONSTRUCCIONES RDL SAS		FRA RDLC 210 CORTE DE	$ 94.846.641,00			$ 655.304			$ 95.501.945,11	$ -	$ 4.742.332,05	$ 1.896.933	$ 654.442	$ 7.293.707	$ 88.208.238,42	$ -
							MENOS VALOR DE	-$ 16.035.218						$ 16.035.218	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.035.218	$ -
														$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
														$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
														$ -					$ -	$ -	$ -
														$ -						TOTAL ORDEN DE	$ 72.173.020,28

Vo Bo Vo Bo

APROBACION - CONSORCIO OBRAS W ORDEN DE PAGO VR DEL ANTICIPO No 3

ORD	FECHA	FECHA	NIT	DV	BENEFICIARIO	No	CONCEPTO	SUBTOTAL	BASE	BASE	IVA (19%)	IVA	DCTOS	VALOR FRA	ANTICIPOS	RET GARANTIA	RET FTE	RET ICA		TOTAL A GIRAR	VR TOT
3	15-feb-24		9E+08	1	WRUSSY INGENIEROS SAS		REEMBOLSO POR PAGO							$ -						$ -	$ 402.542.702
			1E+09		PAOLO RUSSI		FRA FVP 42	$ 102.299.027,68			$ 176.698,32			$ 102.475.726,00			$ 2.045.980,55	$ 777.472,61	$ 2.823.453	$ 99.652.272,84	
			9E+08	1	CONSTRUCCIONES RDL SAS		FRA RDLC-212	$ 266.516.940			$ 1.841.389,75			$ 268.358.329,75	$ 164.438,00	$ 13.325.615,44	$ 5.330.338,80	$ 2.025.528,75	$ 20.845.921	$ 247.512.409	
			9E+08	9	STOR CONSTRUCCIONES SAS		FRA FV 136	$ 50.670.459,89			$ 262.565,11			$ 50.933.025		$ 2.533.522,99	$ 1.013.409,20	$ 385.095,50	$ 3.932.028	$ 47.000.997	
			9E+08	0	SIGMA CONSTRUCCIONES Y		FRA FE 199	$ 9.047.882,68			$ 31.256,32			$ 9.079.139		$ 452.394,13	$ 180.957,65	$ 68.763,91	$ 702.116	$ 8.377.023	
														$ -						TOTAL ORDEN DE	$ 402.542.702

Vo Bo Vo Bo

APROBACION - CONSORCIO OBRAS W ORDEN DE PAGO VR DEL ANTICIPO No 4

ORD	FECHA	FECHA	NIT	DV	BENEFICIARIO	No	CONCEPTO	SUBTOTAL	BASE	BASE	IVA (19%)	IVA	DCTOS	VALOR FRA	ANTICIPOS	RET GARANTIA	RET FTE	RET ICA		TOTAL A GIRAR	VR TOT
4	#########		9E+08	1	WRUSSY INGENIEROS SAS		REEMBOLSO POR PAGO														$ 362.638.132,87
			1E+09		PAOLO RUSSI	FVP 45		$ 105.817.224,79			$ 182.775,21			$ 106.000.000,00	$ 26.000.000,00		$ 2.116.344,50	$ 804.210,91	$ 2.920.555,41	$ 103.079.444,59	
			9E+08	1	CONSTRUCCIONES RDL SAS	RDLC-213		$ 249.434.682,98			$ 1.723.366,90			$ 251.158.049,88	$ 100.000.000,00	$ 12.471.734,15	$ 4.988.693,66	$ 1.895.704	$ 19.356.131,40	$ 231.801.918,48	
			9E+08	9	STOR CONSTRUCCIONES SAS	FV 140		$ 29.923.796,77			$ 155.059,67			$ 30.078.856,44		$ 1.496.189,84	$ 598.475,94	$ 227.421	$ 2.322.086,64	$ 27.756.769,80	
														$ -						TOTAL ORDEN DE	$ 362.638.132,87

Vo Bo Vo Bo

APROBACION - CONSORCIO OBRAS W ORDEN DE PAGO VR DEL ANTICIPO No 5

ORD	FECHA	FECHA	NIT	DV	BENEFICIARIO	No	CONCEPTO	SUBTOTAL	BASE	BASE	IVA (19%)	IVA	DCTOS	VALOR FRA	ANTICIPOS	RETEGARANTIA	RET FTE	RET ICA		TOTAL A GIRAR	VR TOT
5	#########		9E+08	1	WRUSSY INGENIEROS SAS		REEMBOLSO POR PAGO A														$ 34.482.746,67
														$ -					$ -	$ -	
					VILLARRAGA GRANADOS MIGUEL A	APVG-314		$ 540.000,00						$ 540.000,00			$ 5.400,00	$ 2.235,60	$ 7.635,60	$ 532.364,40	
					VILLARRAGA GRANADOS MIGUEL A	APVG-315		$ 540.000,00						$ 540.000,00			$ 5.400,00	$ 2.235,60	$ 7.635,60	$ 532.364,40	
					VILLARRAGA GRANADOS MIGUEL A	APVG-288		$ 1.350.000,00						$ 1.350.000,00			$ 13.500,00		$ 13.500,00	$ 1.336.500,00	
					VILLARRAGA GRANADOS MIGUEL A	APVG-289		$ 1.080.000,00						$ 1.080.000,00			$ 10.800,00		$ 10.800,00	$ 1.069.200,00	
					CONTROL EN SALUD E HIGIENE S	FE 3852		$ 700.000,00			$ 133.000,00			$ 833.000,00					$ -	$ 833.000,00	
					CONTROL EN SALUD E HIGIENE S	FE 3886		$ 600.000,00			$ 114.000,00			$ 714.000,00					$ -	$ 714.000,00	
					MADERAS E IMPERMEABILIZANTES BO	E-18639		$ 5.079.832,00			$ 965.168,00			$ 6.045.000,00			$ 126.996,00	$ 35.051	$ 162.047,00	$ 5.882.953,00	
					MADERAS E IMPERMEABILIZANTES BO	E-18151		$ 6.226.890,76			$ 1.183.109,24			$ 7.410.000,00			$ 155.672,00		$ 155.672,00	$ 7.254.328,00	
					FERRETERIA EL TRIUNFO SAS	FCE 33552		$ 1.963.044,00			$ 372.978,00			$ 2.336.022,00			$ 49.076,00	$ 13.545	$ 62.621,00	$ 2.273.401,00	
					FERRETERIA EL TRIUNFO SAS	FCE 33385		$ 1.643.500,00			$ 312.265,00			$ 1.955.765,00			$ 41.087,00		$ 41.087,00	$ 1.914.678	
					FERRETERIA EL TRIUNFO SAS	FCE 33263		$ 1.255.140,00			$ 238.477,00			$ 1.493.617,00					$ -	$ 1.493.617,00	
					DISTRIBUIDORA METROCERAMICA	FE 52087		$ 1.884.034,00			$ 357.966,00			$ 2.242.000,00			$ 47.100,84	$ 12.999,83	$ 60.100,67	$ 2.181.899	
					ALFAGRES SA	B01-60378		$ 2.731.370,00			$ 518.960,00			$ 3.250.330,00					$ -	$ 3.250.330,00	
					PISOTRANS SA	PIS-132707		$ 159.272,00						$ 159.272,00					$ -	$ 159.272,00	
					LISTODO SAS	FVL-168200		$ 1.575.529,00			$ 299.351,00			$ 1.874.880,00					$ -	$ 1.874.880,00	
					MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES	FRA-31868		$ 3.225.570,00						$ 3.225.570,00			$ 32.255,70	$ 13.353,86	$ 45.609,56	$ 3.179.960,44	
														$ -						TOTAL ORDEN DE	$ 34.482.746,67

Vo Bo Vo Bo

APROBACION - CONSORCIO OBRAS W ORDEN DE PAGO VR DEL ANTICIPO No 6

ORD	FECHA	FECHA	NIT	DV	BENEFICIARIO	NOMINA	CONCEPTO	SUBTOTAL	BASE	BASE	IVA (19%)	IVA	DCTOS	VALOR FRA	ANTICIPOS	DEDUCCION DEL	RET FTE	RET ICA		TOTAL A GIRAR	VR TOT
5	#########		9E+08	1	WRUSSY INGENIEROS SAS		REEMBOLSO POR PAGO DE							$ 61.723.515		$567.318,00				$ 61.156.197	$ 61.156.197,00
		########			NOMINA ADMINISTRATIVA	15-mar-24		$ 7.544.086,00						$ 7.544.086,00					$ -	$ 7.544.086,00	
		1-mar-24			NOMINA ADMINISTRATIVA	1-mar-24		$ 8.034.753,00						$ 8.034.753,00					$ -	$ 8.034.753,00	
		1-mar-24			NOMINA OPERATIVA	1-mar-24		$ 1.810.667,00						$ 1.810.667,00					$ -	$ 1.810.667,00	
		15-feb-24			NOMINA ADMINISTRATIVA	15-feb-24		$ 8.034.753,00						$ 8.034.753,00					$ -	$ 8.034.753,00	
		15-feb-24			NOMINA OPERATIVA	15-feb-24		$ 1.705.933,00						$ 1.705.933,00					$ -	$ 1.705.933,00	
		#########			NOMINA ADMINISTRATIVA	31-ene-24		$ 6.327.764,00						$ 6.327.764,00					$ -	$ 6.327.764,00	
		#########			NOMINA OPERATIVA	31-ene-24		$ 2.879.733,00						$ 2.879.733,00					$ -	$ 2.879.733,00	
		#########			NOMINA ADMINISTRATIVA	16-ene-24		$ 6.287.136,00						$ 6.287.136,00					$ -	$ 6.287.136,00	
		#########			NOMINA OPERATIVA	16-ene-24		$ 1.991.734,00						$ 1.991.734,00					$ -	$ 1.991.734	
		29-dic-23			NOMINA ADMINISTRATIVA	29-dic-23		$ 5.797.303,00						$ 5.797.303,00					$ -	$ 5.797.303,00	
		29-dic-23			NOMINA OPERATIVA	29-dic-23		$ 3.486.653,00						$ 3.486.653,00					$ -	$ 3.486.653	
		15-dic-23			NOMINA ADMINISTRATIVA	15-dic-23		$ 7.823.000,00						$ 7.823.000,00					$ -	$ 7.823.000,00	
														$ -						TOTAL ORDEN DE	$ 61.156.197,00

Vo Bo Vo Bo

APROBACION - CONSORCIO OBRAS W ORDEN DE PAGO VR DEL ANTICIPO No 7

ORD	FECHA	FECHA	NIT	DV	BENEFICIARIO	No	CONCEPTO	SUBTOTAL	BASE	BASE	IVA (19%)	IVA	DCTOS	VALOR FRA	ANTICIPOS	RETEGARANTIA	RET FTE	RET ICA		TOTAL A GIRAR	VR TOT
3	15-feb-24		9E+08	1	WRUSSY INGENIEROS SAS		REEMBOLSO POR PAGO														$ 75.904.482,19
			1E+09		PAOLO RUSSI	FVP 46		$ 8.158.139,07			$ 14.091,33			$ 8.172.230,40			$ 163.162,78	$ 62.001,86	$ 225.165	$ 7.947.065,76	
			9E+08	1	CONSTRUCCIONES RDL SAS	RDLC-215		$ 40.573.057,15			$ 280.322,94			$ 40.853.380,09		$ 2.028.652,86	$ 811.461,14	$ 308.355,23	$ 3.148.469	$ 37.704.910,86	
			9E+08	9	ZULPISCINAS SAS	ZPE609		$ 35.305.907,26			$ 186.336,73			$ 35.492.243,99	$ 20.000.000,00	$ 1.765.295,36	$ 706.118,15	$ 268.324,90	$ 22.739.738	$ 32.752.505,58	
														$ -						TOTAL ORDEN DE	$ 75.904.482,19

Tabla 5. Plan de Inversión del Anticipo

PLAN DE MANEJO ANTICIPO - FAP CONSORCIO OBRASW 116840 SCJ-1805-2023
Fideicomitentes: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO, WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

VALOR DESEMBOLSADO ANTICIPO	$	1.221.358.360,00

ITEM	CONCEPTO / FECHA	30/01/2024 GIRO No. 1 2680912	08/02/2024 GIRO No. 2 2693265	22/02/2024 GIRO No. 3 2716430	19/03/2024 GIRO No. 4 2757034	21/03/2024 GIRO No. 5 2760304	26/03/2024 GIRO No. 6 2760331	26/03/2024 GIRO No. 7 2760315	GIRO No. 8	VALOR GIRADO	RESTANTE	VALOR ANTICIPO	PORCENTAJES
1	SUBCONTRATOS	$ 209.961.078,40	$ 72.173.020,28	$ 402.542.702,00	$ 362.638.132,87		$ 75.904.482,19		$ 2.499.999,82	$ 1.125.719.415,56	$ -	$ 1.125.719.415,56	92,17%
2	MATERIALES					$ 34.482.747,44				$ 34.482.747,44	$ -	$ 34.482.747,44	2,82%
3	NOMINAS							$ 61.156.197,00		$ 61.156.197,00	$ -	$ 61.156.197,00	5,01%
	TOTAL	$ 282.134.098,68	$ 72.173.020,28	$ 402.542.702,00	$ 362.638.132,87	$ 34.482.747,44	$ 75.904.482,19	$ 61.156.197,00	$ 2.499.999,82	$ 1.160.202.163,00	$ -	$ 1.221.358.360,00	94,99%

	$	0,00
DIFERENCIA	-$	0,00

Ver anexo 11.8

4. LISTADO DE EQUIPAMIENTOS

En la siguiente tabla se muestra el inventario de equipamientos suministrado por la Entidad, y que podrán ser modificados de acuerdo con las necesidades que ésta requiera.

ANEXO N°1 INVENTARIO DE EQUIPAMIENTOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ESTACIONES DE POLICIA - MEBOG				
No.	**LOCALIDAD**	**UNIDAD**	**DIRECCION**	**TELEFONO**
1	USAQUEN	E/1 USAQUEN - EDIFICIO ANTIGUO	CLL 165 Nº 8A-43	6784927-6781577
2	BOSA	E/7 BOSA	CLL 65 J SUR No- 77 N-23	7807255-7807266 7750229
3	KENNEDY	E/8 KENNEDY- BLOQUE ALOJAMIENTOS	CLL 41 D SUR No-78N-05	2642427-2739160-2731980-2648707
4	ENGATIVA	E/10 ENGATIVA	CR 78 A No-70-54	2519052-4368493 4364936 4364932
5	ANTONIO NARIÑO	E/15 ANTONIO NARIÑO	CARRERA 24 N° 18-90 SUR	3611635-3617677
6	CIUDAD BOLÍVAR	E/19 SUBESTACION MEISSEN	CALLE 62 BIS SUR CON CARRERA 17 BIS A	7912330
7	MARTIRES	E/24 GRUPO FUERZA DISPONIBLE	Av. CARACAS 6 51	5521177
8	SUBA	FUERTE DE CARABINEROS NORTE-LA GAITANA	TRANSVERSAL 126 No. 134-88	5189796
9	CHAPINERO	SIPOL MEBOG	CALLE 40 B No. 8-09	5159581
10	PUENTE ARANDA	SIJIN MEBOG-LABORATORIOS	EDIFICIO GUMOV PISO 5	5521177

CAI - MEBOG				
No.	**LOCALIDAD**	**UNIDAD**	**DIRECCION**	**TELEFONO**
1	USAQUEN	CAI NAVARRA	AUTOPISTA NORTE No 108-96	6193227
2	USAQUEN	CAI VILLA NIDIA	CALLE 163 No 6ª-25	6722797
3	USAQUEN	CAI VERBENAL	CL 186 C No- 36 C-55	6730111
4	USAQUEN	CAI CODITO	CARRERA 4 No 187ª BIS	6718230
5	USAQUEN	CAI LISBOA	CARRERA 7 No 130-01	2747918
6	CHAPINERO	CAI ESTADERO	CARRERA 11 Nº 87-09	6101819
7	CHAPINERO	CAI ROSALES	AVENIDA CIRCUMVALAR Nº 76A-00	2116777
8	CHAPINERO	CAI CHAPINERO	CALLE 60 Nº 9-12	2177472
9	CHAPINERO	CAI LA CALERA	KILOMETRO 3.5	6320840
10	SANTAFE	CAI GIRARDOT	CALLE 2 BIS N° 2-04	2801311
11	SANTAFE	CAI LOS LACHES	CRA 8 ESTE CON DIAG 4	2896756
12	SANTAFE	CAI LAS CRUCES	CRA 8 CON CALLE 2	2804343
13	SANTAFE	CAI SAN VICTORINO	AV. CARACAS CON CALLE 10	2864454
14	SANTAFE	CAI COLSEGUROS	CRA 10 CON CALLE 17	2861133
15	SANTAFE	CAI MIRADOR	KLM 5 VIA CHOACHI	2892398
16	SAN CRISTOBAL	CAI LOS LIBERTADORES	CALLE 56 SUR No 14 A - 11 EST	2067354
17	SAN CRISTOBAL	CAI ALTAMIRA	CALLE 48 SUR No 13 B 20 ESTE	3621000
18	SAN CRISTOBAL	CAI JUAN REY	CALLE 74 SUR CON CARRERA 15 ESTE	3655111
19	SAN CRISTOBAL	CAI RAMAJAL	CALLE 30 No 9 A - 00 ESTE	2067528
20	USME	CAI LA AURORA	CR 3 CCON CL 71 F SUR	7684004
21	USME	CAI NUEVO PROVENIR	CR 6 ESTE CON CL 100 SUR	Fuera de servicio

22	TUNJUELITO	CAI SAN CARLOS	DIAGONAL 51 CON CARRERA 18 A 20	2057215
23	BOSA	CAI VILLA DEL RIO	CARRERA 79 A CON CALLE 80 C SUR	2705062
24	BOSA	CAI PIAMONTE	CARRERA 78 C CON CALLE 69 B BIS SUR	7755388
25	BOSA	CAI LAURELES	CARRERA 87J CON CALLE 72 C SUR	7762197
26	BOSA	CAI ANTONIA SANTOS	CALLE 63 CON CARRERA 81 G SUR	7778844
27	BOSA	CAI SAN JOSE	CARRERA 79 A CON CALLE 80 C SUR	4494437
28	BOSA	CAI METROVIVIENDA- EL RECREO	CARRERA 97 CON CALLE 69 SUR	7234049
29	KENNEDY	CAI PATIO BONITO	CALLE 26 SUR CON CARRERA 87	2999952
30	KENNEDY	CAI CALDAS	DIAGONAL 38 CON CARRERA 80	2926298
31	KENNEDY	CAI VILLA CLAUDIA	CR 68 I No- 34-00	7284069
32	KENNEDY	CAI MARSELLA	TRASVERSAL 70 CON CALLE 9 A	4476681
33	FONTIBON	CAI SANTANDER	CLL 20D CR 96C	2981430
34	FONTIBON	CAI VERSALLES	CR 109 CON CLL 23-31	2987957
35	FONTIBON	CAI SABANA GRANDE	CR 106 CON CLL 14-99	4217431
36	FONTIBON	CAI CALLE 13	AV. CL 17 CALLE 132	
37	FONTIBON	CAI SALITRE	CLL 25 68D-00	2731016
38	ENGATIVA	CAI BACHUE	CALLE 89 NRO. 95 D 75	2286621
39	ENGATIVA	CAI FERIAS	AVENIDA CALLE 72 69 K 00	6603703
40	ENGATIVA	CAI QUIRIGUA	AVENIDA CALLE 80 CON TRANSVERSAL 94-00	2767763
41	ENGATIVA	CAI CIUDADELA COLSUBSIDIO	CALLE 86 A CARRERA 111 C	4350425
42	ENGATIVA	CAI SANTA MARÍA DEL LAGO	CARRERA 76 CON CALLE 75-00	2247211
43	ENGATIVA	CAI CALLE 80	AV CL 80 CRA 116B	
44	ENGATIVA	CAI JABOQUE	CALLE 67 A 110-00	4332033
45	SUBA	CAI ANDES	AV. SUBA CON CALLE 104	2266898
46	SUBA	CAI GAITANA	CALLE 139 NRO. 118-03	6895310
47	SUBA	CAI RINCON	CARRERA CON CALLE 128C-10	6821676
48	SUBA	CAI LA ALAMBRA	CALLE 116 CON CARRERA 54B	6372437
49	SUBA	CAI TIERRA LINDA	CALLE 127C NRO.49-00	6278674
50	SUBA	CAI SAN JOSE DE BAVARIA	CALLE 169 CON AV. BOYACÁ	3213000676
51	TEUSAQUILLO	CAI ESMERALDA	CALLE 44 C No 54-00	2222673
52	TEUSAQUILLO	CAI TEUSAQUILLO	CALLE 34 NO 16-13	2885252
53	TEUSAQUILLO	CAI SOLEDAD	CARRERA 24 NO 41-00	2886685
54	TEUSAQUILLO	CAI SAN LUIS	CALLE 60 NO 18 -50	3457366
55	MARTIRES	CAI SAMPER MENDOZA	CARRERA 22 CON CALLE 24	2696363
56	MARTIRES	CAI RICAURTE	CALLE10 CON CARRERA 28	2013344
57	MARTIRES	CAI SANTA ISABEL	CARRERA 27 CON CALLE 1F	2019299
58	ANTONIO NARIÑO	CAI VILLA MAYOR	CL 36 SUR POR CR 34D ESQUINA	2031392
59	PUENTE ARANDA	CAI TEJAR	AV. CARRERA 68 CON AV. 1 DE MAYO	2303203

60	CANDELARIA	CAI ROSARIO	CARRERA 5 CON CALLE 13	2860744
61	RAFAEL URIBE URIBE	CAI CLARET	CALLE 44 SUR No. 27-50	2059006
62	RAFAEL URIBE URIBE	CAI DIANA TURBAY	CALLE 48 C SUR No. 1 - 03	7720153
63	RAFAEL URIBE URIBE	CAI LOMAS	DIAGONAL 38 D SUR No. 11 - 00	2727220
64	RAFAEL URIBE URIBE	CAI LOS MOLINOS	CALLE 49D BIS SUR No. 5U - 03	7692199
65	RAFAEL URIBE URIBE	CAI SAN JORGE	TRANSVERSAL 16 No. 45F - 02 SUR	7144220
66	CIUDAD BOLIVAR	CAI VISTA HERMOSA	CALLE 70 N.º 18 I 70	7651121
67	CIUDAD BOLIVAR	CAI LUCERO	CALLE 64 N.º 71 G 54	7658363
68	CIUDAD BOLIVAR	CAI SAN FRANCISCO	CARRERA 20C N.º 67-10	7169661
69	CIUDAD BOLIVAR	CAI SANTO DOMINGO	CARRERA 77C 69 A 05	7807304
70	CIUDAD BOLIVAR	CAI PARAISO	CALLE 71P N.º 27M 04	7902883

CASAS FISCALES MEBOG / BXIII			
No.	**LOCALIDAD**	**UNIDAD**	**DIRECCION**
1	SUBA	ALMENDROS DE SUBA	CALLE 151A No. 114F-04 CASA 4
2	SUBA	ALMENDROS DE SUBA	CARRERA 115 No. 151C-88 APTO.102
3	RAFAEL URIBE URIBE	ALTOS DE LOS MOLINOS	DIAGONAL 48 SUR No 5H-32 APTO 102
4	RAFAEL URIBE URIBE	ALTOS DE LOS MOLINOS	DIAGONAL 47 SUR No. 5H - 55 APTO.202
5	RAFAEL URIBE URIBE	ALTOS DE LOS MOLINOS	DIAGONAL 47 SUR No 5H-91 APTO. 201
6	RAFAEL URIBE URIBE	ALTOS DE LOS MOLINOS	TRAV.5 H No. 45-13 Apto 102
7	RAFAEL URIBE URIBE	ALTOS DE LOS MOLINOS	TRAV 5H No. 45 - 13 SUR APTO.202
8	RAFAEL URIBE URIBE	ALTOS DE LOS MOLINOS	TRAV 5H No. 45 - 13 APTO. 301
9	USAQUEN	BELHORIZONTE	CARRERA 5 No. 187-15 INT 1 APTO.101
10	USAQUEN	BELHORIZONTE	CARRERA 5 No. 187-15 INT 14 APTO.203
11	USAQUEN	BELHORIZONTE	CARRERA 5 No. 187-15 INT 14 APTO.404
12	USAQUEN	BELHORIZONTE	CARRERA 5 No. 187-15 INT 15 APTO.104
13	RAFAEL URIBE URIBE	BOSQUES DE SAN JOSE	CALLE 48 Q SUR No. 5C - 08 INT 6 APTO. 121
14	RAFAEL URIBE URIBE	BOSQUES DE SAN JOSE	CALLE 48 Q SUR No. 5C-08 INT 5 APTO. 520
15	RAFAEL URIBE URIBE	BOSQUES DE SAN JOSE	CALLE 48 Q SUR No. 5 C - 08 INT 4 APTO. 314
16	FATIMA	CASA LINDA DEL TUNAL	CALLE 59A SUR No. 22B-66 CASA 3
17	FATIMA	CASA LINDA DEL TUNAL	CALLE 59B SUR No. 22B-39 CASA 1
18	FATIMA	CASA LINDA DEL TUNAL	CALLE 59B SUR No. 22B-49 CASA 3
19	FATIMA	CASA LINDA DEL TUNAL	CALLE 59B SUR No. 22B-65 CASA 1
20	FATIMA	CASA LINDA DEL TUNAL	CALLE 59C SUR No. 22B-50 CASA 2
21	FATIMA	CASA LINDA DEL TUNAL	CALLE 59B SUR No. 22B - 73 CASA 1
22	RAFAEL URIBE URIBE	CERROS DEL ORIENTE	TRANSV. 2 no. 48H - 41 SUR APTO.301
23	RAFAEL URIBE URIBE	CERROS DEL ORIENTE	TRANSV. 3 no. 48J - 09 SUR APTO.301
24	SUBA	LA ESMERALDA	CARRERA 92 No. 159-05 INT.4 APTO. 216
25	CIUDAD BOLIVAR	LA ESTANCIA	CARRERA 78A No. 47-30 SUR TORRE A APTO.102
26	CIUDAD BOLIVAR	LA ESTANCIA	CARRERA 78A No. 47-30 SUR TORRE A APTO.103

27	CIUDAD BOLIVAR	LA ESTANCIA	CARRERA 78A No. 47-30 SUR TORRE A APTO.204
28	CIUDAD BOLIVAR	LA ESTANCIA	CARRERA 78A No. 47-30 SUR TORRE A APTO.305
29	CIUDAD BOLIVAR	LA ESTANCIA	CARRERA 78A No. 47-30 SUR TORRE A APTO.406
30	CIUDAD BOLIVAR	LA ESTANCIA	CARRERA 78A No. 47-30 SUR TORRE A APTO.408
31	CIUDAD BOLIVAR	LA ESTANCIA	CARRERA 78A No. 47-30 SUR TORRE A APTO.505
32	CIUDAD BOLIVAR	LA ESTANCIA	CARRERA 78A No. 47-30 SUR TORRE A APTO.511
33	SUBA	MIRADOR DE SUBA	CARRERA 92 No. 162-40 INT.5 APTO 1018
34	USME	MIRAVALLE	CARRERA 3C BIS SUR No. 74-42 INT. 2 CASA 3 (ANTIGUA) CR 14T No 74-32S (ACTUAL)
35	USME	MIRAVALLE	CARRERA 3C BIS SUR No. 74-48 INT. 2 CASA 2 (ANTIGUA) CR 14T No 74-36S (ACTUAL)
36	USME	MIRAVALLE	CARRERA 3C BIS SUR No. 74-62 INT. 1 CASA 1
37	RAFAEL URIBE URIBE	MOLINOS DE LA CARACAS	Carrera 10B No 48a sur - -27 Manzana 37 Bloque 1 Apto 201
38	RAFAEL URIBE URIBE	MOLINOS DE LA CARACAS	Carrera 10B No 48a sur - -27 Bloque 3 APTO 301
39	RAFAEL URIBE URIBE	MOLINOS DE LA CARACAS	Carrera 10B No 48a sur - -27 Manzana 37 Bloque 3 Apto 201
40	RAFAEL URIBE URIBE	MOLINOS DE LA CARACAS	Carrera 10B No 48a sur - -27 Bloque 2 Apto 301
41	SUBA	PARQUES DEL CAMPO	CALLE 143 A No. 128C - 94 BLOQUE 1 APTO 101
42	KENNEDY	QUINTAS DE SAN MIGUEL 1	CRA 98 No. 46A-55 SUR ETAPA 1 CASA 76
43	KENNEDY	QUINTAS DE SAN MIGUEL 2	CRA 98 No. 46A-55 SUR ETAPA 2 CASA 1
44	KENNEDY	QUINTAS DE SAN MIGUEL 2	CRA 87 No. 48 - 55 SUR ETAPA 2 CASA 14
45	KENNEDY	QUINTAS DE SAN MIGUEL 2	CRA 98 No. 46A-55 SUR ETAPA 2 CASA 6
46	MARTIRES	RINCON DEL PROGRESO	CARRERA 20 No. 4-50 BLOQUE 6 APTO.203
47	MARTIRES	RINCON DEL PROGRESO	CARRERA 20 No. 4-50 BLOQUE 7 APTO.101
48	MARTIRES	RINCON DEL PROGRESO	CARRERA 20 No. 4-50 BLOQUE 8 APTO.101
49	KENNEDY	TINTALA	CALLE 6 A No. 88D-61 INT.24 APTO.205
50	KENNEDY	TINTALA	CALLE 6 A No. 88D-61 INT.37 APTO.403
51	KENNEDY	TINTALA	CALLE 6 A No. 88D - 61 INT.24 APTO.405
52	KENNEDY	TINTALA	CALLE 6 A No. 88D - 61 INT.24 APTO.504
53	KENNEDY	TINTALA	CALLE 6 A No. 88D - 61 INT.37 APTO.402
54	KENNEDY	TINTALA	CALLE 6 A No. 88D - 61 INT.24 APTO.403
55	KENNEDY	TINTALA	CALLE 6 A No. 88D - 61 INT.37 APTO.501
56	KENNEDY	TINTALA	CALLE 6 A No. 88D - 61 INT.37 APTO.503

CASAS DE JUSTICIA - SAJ			
No.	**TIPO DE INMUEBLE**	**LOCALIDAD**	**DIRECCION**
1	CASA DE JUSTICIA	SAN CRISTOBAL	CALLE 31 C Sur # 3 - 67 ESTE
2	CASA DE JUSTICIA	USME	CALLE 137 C Sur # 2 A 43
3	CASA DE JUSTICIA	BOSA	CARRERA 81 D # 59 A 59 Sur
4	CASA DE JUSTICIA	MARTIRES	CARRERA 21 # 14 - 75

CTP - CIJ -SAJ

No.	TIPO DE INMUEBLE	LOCALIDAD	DIRECCION
1	CTP	PUENTE ARANDA	CALLE 59 A N°22B-23 SUR
No.	**TIPO DE INMUEBLE**	**LOCALIDAD**	**DIRECCION**
1	CIJ	BOSA	Calle 85 Sur # 94 - 35 (Sujeto verificación)

CENTRO DE COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO C4				
No.	**TIPO DE INMUEBLE**	**LOCALIDAD**	**BARRIO**	**DIRECCION**
1	C4	FONTIBON	MONTEVIDEO	CALLE 20 N°68A - 06

BRIGADA XII				
No.	**TIPO DE INMUEBLE**	**LOCALIDAD**	**NOMBRE**	**DIRECCION**
1	EQUIPAMIENTO	USAQUEN	ALOJAMIENTO PM 13	CANTON NORTE
2	EQUIPAMIENTO	RURAL	ALOJAMIENTO BAMAR	POR DEFINIR
3	EQUIPAMIENTO	USME	ALOJAMIENTO PM15	POR DEFINIR
4	EQUIPAMIENTO	TUNJUELITO	ALOJAMIENTO BASER 13	CALLE 106 # 7-31
5	EQUIPAMIENTO	RAFAEL URIBE URIBE	POLIDEPORTIVO BITER	POR DEFINIR
6	EQUIPAMIENTO	PUENTE ARANDA	SALA OPERACCIONES DE LA DECIMA TERCERA BRIGADA	CARRERA 54 N 26 25

NOTA: La secretaria podrá modificar los equipamientos a intervenir previo aviso al contratista como resultado del análisis y de las consultas realizadas durante la etapa preliminar previstas en el numeral 2.5 de los estudios previos

5. INFORME TÉCNICO

En la siguiente tabla se detalla el número de equipamientos a intervenir y el valor proyectado para cada intervención, según criterio de priorización presentado por la Entidad.

Tabla 6. Listado de equipamientos a intervenir.

N°	AGENCIA	EQUIPAMIENTO	VALOR	
1	BRIGADA XIII	SALA OPERACIONES	$	144.043.022,00
2	BRIGADA XIII	PM 15	$	199.869.510,00
3	BRIGADA XIII	PM 13	$	150.333.422,00
4	BRIGADA XIII	BITER	$	25.170.000,00
5	BRIGADA XIII	BASER	$	199.771.762,00
6	BRIGADA XIII	BAMAR	$	291.680.287,00
7	BRIGADA XIII	BAFLA	$	29.131.997,00
8	BRIGADA XIII	BOLSA EMERGENCIAS	$	60.000.000,00
		TOTAL	**$**	**1.100.000.000,00**

N°	AGENCIA	EQUIPAMIENTO	VALOR	
9	MEBOG	ESTPO SAN CRISTOBAL	$	1.020.000.000,00
10	MEBOG	ESTPO KENNEDY	$	600.000.000,00
11	MEBOG	ESTPO ENGATIVA	$	450.000.000,00
12	MEBOG	ESTPO RAFAEL URIBE	$	600.000.000,00
13	MEBOG	ESTPO CIUDAD BOLIVAR	$	500.000.000,00
14	MEBOG	CARABINEROS	$	150.000.000,00
		TOTAL	**$**	**3.320.000.000,00**

N°	AGENCIA	EQUIPAMIENTO	VALOR	
15	MEBOG	CAI DELICIAS	$	31.885.887,00
16	MEBOG	CAI VILLA DEL RIO	$	68.691.012,00
17	MEBOG	CAI BELLA VISTA	$	39.975.755,00
18	MEBOG	CAI VILLA CLAUDIA	$	38.651.899,00
19	MEBOG	CAI SANTANDER	$	60.136.207,00
20	MEBOG	CAI VILLAS DE GRANADA	$	38.419.763,00
21	MEBOG	CAI PINAR	$	33.130.325,00
		TOTAL	**$**	**310.890.848,00**

N°	AGENCIA	EQUIPAMIENTO	VALOR	
22	MEBOG	BOLSA DE EMERGENCIAS	$	239.800.954,00
38	MEBOG	VIVIENDAS FISCALES (16)	$	180.000.000,00
		TOTAL	**$**	**419.800.954,00**

N°	AGENCIA	EQUIPAMIENTO	VALOR	
39	C4	C4	$	100.000.000,00
		TOTAL	**$**	**100.000.000,00**

N°	AGENCIA	EQUIPAMIENTO	VALOR
40	SAJ	LA VICTORIA	$ 50.000.000,00
41	SAJ	SANTA FE	$ 25.000.000,00
42	SAJ	CESPA	$ 45.000.000,00
43	SAJ	CER	$ 250.000.000,00
44	SAJ	URI PUENTE ARANDA	$ 160.000.000,00
		TOTAL	**$ 530.000.000,00**

N°	AGENCIA	EQUIPAMIENTO	VALOR
45	SAJ	BOSA	$ 50.000.000,00
46	SAJ	CIUDAD BOLIVAR	$ 50.000.000,00
47	SAJ	MARTIRES	$ 50.000.000,00
48	SAJ	SAN CRISTOBAL	$ 50.000.000,00
49	SAJ	USME	$ 50.000.000,00
50	SAJ	TUNJUELITO	$ 50.000.000,00
51	SAJ	BOLSA DE EMERGENCIAS	$ 26.100.000,00
		TOTAL	**$ 326.100.000,00**

De acuerdo a la solicitud realizada por el contratista mediante comunicado 0390-WR-2024 del 16 de abril de 2024 en donde manifiesta los motivos técnicos y razones por las cuales se solicita la adición No 1 por un valor de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES pesos m/cte. ($2.748.000.000) y prorroga No. 1 de dos (2) meses posteriores a la fecha de finalización del contrato estipulada del 09 de agosto de 2024. De acuerdo con la necesidad por parte de la SDSCJ se ampliarán los mantenimientos y mejoramientos programados y se generan nuevos alcances a nuevos equipamientos y por consiguiente una necesidad de adición de recursos representado en los siguientes equipamientos, con una distribución de recursos de la siguiente manera:

Casas de Justicia - CTP – Campo Verde. • Mantenimiento preventivo y reparación de cubiertas, que garanticen su impermeabilidad • Mantenimiento preventivo y reparación de cielorrasos por filtración de aguas lluvias. • Mantenimiento preventivo y reparación de humedades causadas por filtración de instalaciones hidrosanitarias y de aguas lluvias. • Mantenimiento preventivo y reparación de instalaciones sanitarias de baterías de baños, aseos y cocinetas. • Mantenimiento preventivo y reparación de instalaciones eléctricas de las sedes. • Mantenimiento preventivo y reparación de fachadas por procesos de micro agrietamiento y humedad. Incluye resanes, impermeabilizaciones y acabados de pintura. • Mantenimiento, arreglo o cambio de cerraduras y chapas (cuando aplique). • Mantenimiento preventivo y reparación del sistema de almacenamiento y bombeo de la red de agua potable, así como de la red contra incendios. • Las demás actividades de Mantenimiento, arreglo o cambio necesarias, para el correcto y adecuado, funcionamiento de los equipamientos. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se requiere adicionar desde esta meta, recursos al contrato 1805-2023, por concepto de mantenimiento para las Casas de Justicia, Salón Múltiple y el Centro de Traslado por Protección (CTP) Campo Verde, la suma de setenta y ocho millones de pesos $78´000.000.

Unidad de Reacción Inmediata – URI Puente Aranda

El contrato 1805 de 2023 vinculo dentro de sus necesidades, el mantenimiento preventivo y correctivo de la Unidad de Reacción Inmediata – URI Puente Aranda, la cual impacta la meta del plan de desarrollo “348 Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas ” y la meta proyecto “02 Diseñar e implementar el plan de mejoramiento de las unidades de reacción inmediata –URI existentes y construcción de tres URI nuevas” En este sentido, la URI es un equipamiento que le permite a la secretaria, además de apoyar en la recepción de denuncias y dar respuesta a los ciudadanos en temas de justicia, la reclusión de personas privadas de la libertad brindando capacidad en cupos carcelarios que son requeridos para dar respuesta a la demanda de Bogotá. Por lo anterior, es necesario adicionar este contrato que le permita atender las necesidades recurrentes del equipamiento, en temas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y garantizar condiciones óptimas para su operación. Para lo anterior, el proyecto cuenta con ($200.000.000) doscientos millones de pesos, que permitan extender el contrato hasta el mes de octubre de 2024.

Programa de Justicia Juvenil Restaurativa

La Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente cuenta con un presupuesto de $ 300.000.000 asignados en el PAA, a través de la meta PDD “347 Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa”, meta proyecto “04 mantener 3 sedes del programa distrital de justicia juvenil restaurativa” para la adición al contrato de mantenimiento de equipamientos de la SDSCJ. Estos recursos están dirigidos a continuar con el proceso de adecuación para la operación del CAE Campo Verde, el cual contempla entre las actividades a desarrollar la atención por parte del PDJJR de adolescentes y jóvenes ofensores, víctimas, sus redes de apoyo y comunidad, así como los procesos de formación para el trabajo y el alojamiento de adolescentes y jóvenes privados de la libertad. La atención del PDJJR se concentra en las oficinas de atención psicosocial del segundo piso, las cuales requieren para optimizar su funcionamiento la generación de divisiones en láminas prefabricadas, de manera que se puedan dividir en espacios para atenciones individuales, familiares y grupales, en coherencia con la metodología de atención del Programa. En lo que respecta a los talleres de formación, estos comprenden los siguientes:

- Mantenimiento y reparación de bicicletas y motos.
- Confección de ropa y calzado.
- Cocina.
- Peluquería, barbería y tatuaje.

Mediante el contrato de mantenimiento pasado se realizaron adecuaciones de estos talleres en lo que respecta a acabados de piso y pared, así como instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Sin embargo, como parte del proceso de habilitación de los procesos de formación para el trabajo, se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2023 una visita por parte de la Secretaría de Salud con el fin de identificar condiciones requeridas para su entrada en operación. De esta visita se derivaron las siguientes exigencias en materia de adecuaciones físicas 1. Adecuación de depósitos con relación al tipo de residuos que se generarán en los talleres de formación. 2. Demarcación de piso que permite diferenciar las zonas de trabajo y de circulación de los talleres de formación. 3. Malla para control de roedores, zancudos y palomas. 4. Lavado del tanque de almacenamiento de agua. 5. Control de humedades y goteras. 6. Instalaciones de servicios públicos adicionales para abastecimiento y desagüe de los talleres Adicionalmente, como

parte de los procesos de dotación de maquinaria y equipos, resulta necesario culminar adecuaciones de los talleres de formación en materia de:
1. Instalación de gas para la conexión de los equipos de cocina.
2. Sellado de perforaciones de muros para protección de las máquinas de calzado y ropa contra humedades y polvo.
3. Puerta de cerramiento de cuarto técnico y tableros eléctricos y de red contra incendios.
4. Instalaciones eléctricas y estructuras de soporte para los equipos extractores del taller de cocina.
Por lo anterior, se hace necesario adicionar recursos por valor de trescientos millones de pesos ($300.000.000) al presente contrato de mantenimiento de manera que se amplíe la capacidad de atención de esta sede y se realicen las adecuaciones exigidas por la Secretaría de Salud.

Centro Especial de Reclusión - CER

La presente solicitud se enmarca en la Meta Plan de Desarrollo 2020-2024 “342: Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva Cárcel Distrital” y la Meta Proyecto 7765 “Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá” Con el fin de brindar garantías de dignificación, mejoramiento de la calidad de vida y protección de los Derechos Humanos básicos y fundamentales de la población privada de la libertad recluida en el Centro Especial de Reclusión – C.E.R y, propender por la custodia y vigilancia durante su permanencia en el establecimiento carcelario; en términos de infraestructura física, se requiere contar con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los siguientes términos: • Traslado de la reja de acceso al pabellón Luz, de modo que la sala 12 de este pabellón, ahora usada como sala de aislamiento, quede independiente.
• Levantamiento de claraboyas de patio de reclusorio, ubicadas en la terraza del edificio, para permitir circulación de aire. • Instalación de ductos de ventilación y extractores de olores en los Pabellones Luz y Abundancia. • Revisión de espacios de ductos extractores de aire, para mitigar problemas de seguridad. • Mantenimiento preventivo y correctivo a push de sanitarios, duchas y lavamanos ubicados en los Pabellones Luz y Abundancia. • Mantenimiento preventivo y correctivo a cerraduras, chapas y bisagras de puertas. • Mantenimiento preventivo y reparación del sistema de almacenamiento y bombeo de la red de agua potable.
• Lavado y desinfección de tanques de agua potable. • Revisión y mantenimiento del circuito y redes eléctricas. • Mantenimiento preventivo a la puerta de acceso vehicular. • Adecuación de repisas en guardia externa para disposición de equipo anti motín. • Adecuar la escalera para que la persona privada de la libertad pueda acceder al camastro asignado. Por lo expuesto anteriormente, se requiere adicionar recursos al contrato 1805- 2023, por concepto de mantenimiento a la infraestructura física del Centro Especial de Reclusión - CER, la suma de Cincuenta Millones de pesos ($50.000.000).” Respecto a la adición solicitada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la misma se recibe con memorando de radicado No 1-2024-22856 indicando las razones por las cuales se requiere adicionar, siendo estas básicamente : a) Continuar con la atención de CAIS que se encuentran con necesidades urgentes de intervención con un valor presupuestado ($700.000.000) setecientos millones de pesos, b) repotenciar la Bolsa de emergencias, la cual se estima un valor de ejecución de ($160.000.000)

ciento sesenta millones de pesos para la atención de las emergencias que surjan hasta el final del contrato, c) se requiere iniciar los mantenimientos periódicos y rutinarios del Complejo Nuevo Comando MEBOG, el cual ya se estima un valor de ($850.000.000) ochocientos cincuenta millones de pesos. Respecto al monto solicitado por C4; se recibe memorando con Radicado No 3-2024-6568 en el cual solicitan adicionar al monto del equipamiento el valor de $120.000.000. Este monto se deriva del mantenimiento al sistema de agua nebulizada del equipamiento el cual hace 2 años no se realiza y es urgente
atender, así como también de la intervención en la cubierta del helipuerto para su puesta en servicio, siendo necesario una revisión del sistema eléctrico e iluminación de este de manera que el equipamiento C4 pueda renovar los permisos de utilización del Helipuerto ante la AEROCIVIL.

Los alcances definidos par cada equipamiento corresponden a:

AGENCIAS/EQUIPAMIENTOS	ADICION SOLICITADA
SEGURIDAD	
MEBOG	$2,000,000,000
CAI S	700.000.000,00
BOLSA EMERGENCIAS	160.000.000,00
MANTTO PERIODICO NUEVO COMANDO MEBOG	850.000.000,00
ESTACIÓN DE POLICIA PTE ARANDA	290.000.000,00
C4	$120,000,000
JUSTICIA	$628,000,000
CTP DE CAMPO VERDE	78.000.000,00
URI PUENTE ARANDA	200.000.000,00
CER	50.000.000,00
CAE CAMPO VERDE	300.000.000,00
TOTAL CTO 1805-2023	
TOTAL PROYECCION ADICION	2.748.000.000,00
% CONTRATO INCIAL	44,99%

Se analizaron los aspectos técnicos, jurídicos, financieros y encontramos que las necesidades de las agencias MEBOG, C4, Y Subsecretaría de Acceso a la Justicia, esta Interventoría considera que las necesidades se ajustan al objeto y alcance del contrato, se pueden ejecutar con el contratista CONSORCIO OBRAS W y requieren de un plazo adicional de 2 meses calendario. Se aclara también que la adición solicitada no supera el 50% del valor inicial del contrato, como también recalcar que los presupuestos contemplados cubren las necesidades requeridas por la entidad. Por tal motivo, la Interventoría da aval a la solicitud hecha por CONSORCIO OBRAS W y solicita a la secretaria Distrital de Convivencia Seguridad y Justicia proceder con el trámite correspondiente.

5.1. Visitas diagnósticas

Durante este periodo se realizó mesa de trabajo conjuntamente con el contratista y se priorizaron los diagnósticos de los diferentes equipamientos, el contratista presento presupuestos de los mismos para verificación y aprobación por partes e la interventoría.

Tabla 7. Diagnósticos

ESTACIONES DE POLICIA - MEBOG						
No.	LOCALIDAD	UNIDAD	DIAGNOSTICO S/N	FECHA DE DIAGNOSTICO	DIRECCION	TELEFONO
3	KENNEDY	E/8 KENNEDY- BLOQUE ALOJAMIENTOS	SI	27/10/2023	CLL 41 D SUR No-78N-05	2642427-2739160-2731980-2648707
4	ENGATIVA	E/10 ENGATIVA	SI	24/10/2023	CR 78 A No-70-54	2519052-4368493 4364936 4364932
	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	SI	24/11/2023		
6	CIUDAD BOLÍVAR	E/19 SUBESTACION MEISSEN	SI	24/11/2023	CALLE 62 BIS SUR CON CARRERA 17 BIS A	7912330
11	SANTAFE	GRUPO DE CARABINEROS PARQUE NACIONAL	SI	27/10/2023	AK 1 KM BOGOTA	
12	SUBA	EPOL SUBA	SI	1/11/2023	CRA 92 No. 143 - 31	
13	FONTIBON	E/ FONTIBON CELDAS	SI	7/11/2023		

CAI - MEBOG						
No.	LOCALIDAD	UNIDAD			DIRECCION	TELEFONO
46	SUBA	CAI GAITANA	SI	23/11/2023	CALLE 139 NRO. 118-03	6895310
71	ENGATIVA	CAI VILLAS DE GRANADA	SI	1/10/2023	CRA 112A No. 77A /30	
72	KENNEDY	CAI LAS DELICIAS	SI	3/11/2023	CRA 44SUR No. 72/40	

CASAS FISCALES MEBOG / BXIII					
No.	LOCALIDAD	UNIDAD			DIRECCION
2	SUBA	ALMENDROS DE SUBA	SI	23/10/2023	CARRERA 115 No. 151C-88 APTO.102
18	FATIMA	CASA LINDA DEL TUNAL	SI	25/10/2023	CALLE 59B SUR No. 22B-49 CASA 3
41	SUBA	PARQUES DEL CAMPO	SI	23/10/2023	CALLE 143 A No. 128C - 94 BLOQUE 1 APTO 101

CASAS DE JUSTICIA - SAJ						
No.	TIPO DE INMUEBLE	LOCALIDAD			DIRECCION	DIRECCION
1	CASA DE JUSTICIA SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	SI	7/11/2023	CALLE 31 C Sur # 3 - 67 ESTE	CALLE 31 C Sur # 3 - 67 ESTE
2	CASA DE JUSTICIA USME	USME	SI	9/10/2023	CALLE 137 C Sur # 2 A 43	CALLE 137 C Sur # 2 A 43
3	CASA DE JUSTICIA BOSA	BOSA	SI	1/12/2023	CARRERA 81 D # 59 A 59 Sur	CARRERA 81 D # 59 A 59 Sur
4	CASA DE JUSTICIA MARTIRES	MARTIRES	SI	1/12/2023	CARRERA 21 # 14 - 75	CARRERA 21 # 14 - 75
5	CASA DE JUSTICIA LA VICTORIA	MARTIRES	SI	7/11/2023	DIAG 37 SUR No. 2 -00	DIAG 37 SUR No. 2 -00
6	CASA DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA SANTA FE LA VICTORIA	SANTA FE	SI	27/11/2023	CARRERA 4 # 23 - 28	CARRERA 4 # 23 - 28

CTP - CIJ -SAJ					
No.	TIPO DE INMUEBLE	LOCALIDAD			DIRECCION
1	CTP	PUENTE ARANDA	SI	9/10/2023	CALLE 59 A N° 22B-23 SUR
2	CER	PUENTE ARANDA	SI	1/11/2023	CRA 41A No. 6/34
3	CESPA	PUENTE ARANDA	SI	20/10/2023	AV CRA 30 No. 11/85
No.	TIPO DE INMUEBLE	LOCALIDAD			DIRECCION
1	CAMPO VERDE	BOSA	SI	9/11/2023	Calle 85 Sur # 94 - 35 (Sujeto verificacion)

CENTRO DE COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO C4						
No.	TIPO DE INMUEBLE	LOCALIDAD			BARRIO	DIRECCION
1	C4	FONTIBON	SI	10/11/2023	MONTEVIDEO	CALLE 20 N° 68A - 06

BRIGADA XII						
No.	TIPO DE INMUEBLE	LOCALIDAD			NOMBRE	DIRECCION
1	EQUIPAMIENTO	USAQUEN	SI	18/10/2023	ALOJAMIENTO PM 15	CANTON NORTE
1A	EQUIPAMIENTO	USAQUEN	SI	18/10/2023	ALOJAMIENTO BASER 13	CANTON NORTE
2A	EQUIPAMIENTO	USAQUEN	SI	3/11/2023	SALA DE OPERACIONES	CANTON NORTE
2	EQUIPAMIENTO	RURAL	NO		ALOJAMIENTO BAMAR	POR DEFINIR
	EQUIPAMIENTO	BAFLA	NO		BAFLA	POR DEFINIR
5	EQUIPAMIENTO	RAFAEL URIBE URIBE	NO		POLIDEPORTIVO BITER	POR DEFINIR
7	EQUIPAMIENTO	PM 13	SI	26/10/2023	ALOJAMIENTO PM13 PUENTE ARANDA	CRA 50 No. 18/05

Tabla 7.1. Diagnósticos Adición

NO.	UNIDAD POLICIAL	LOCALIDAD	FECHA DIAGNOSTICO
1	CAI LISBOA	USAQUÉN	4/06/2024 7:00
2	CAI GRANADA	CHAPINERO	4/06/2024 9:00
3	CAI ROSALES	CHAPINERO	4/06/2024 11:00
4	CAI COLSEGUROS	SANTAFE	4/06/2024 13:00
5	CAI LACHES	SANTAFE	4/06/2024 15:00
6	CAI CRUCES	SANTAFE	4/06/2024 17:00
7	CAI RAMAJAL	SAN CRISTOBAL	6/06/2024 7:00
8	CAI GUACAMAYAS	SAN CRISTOBAL	6/06/2024 9:00
9	CAI TUNAL	TUNJUELITO	6/06/2024 11:00
10	CAI BACHUE	ENGATIVA	9/06/2024 9:00
11	CAI MAZUREN	SUBA	9/06/2024 7:00
12	CAI SAN LUIS	TEUSAQUILLO	9/06/2024 23:00
13	CAI GALERIAS	TEUSAQUILLO	9/06/2024 13:00
14	CAI SANTA ISABEL	MARTIRES	9/06/2024 15:00
15	CAI VALVANERA	ANTONIO NARIÑO	6/06/2024 13:00
16	CAI RESTREPO	ANTONIO NARIÑO	6/06/2024 13:00
17	CAI PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	10/06/2024 20:00
18	CAI CLARET	RAFAEL URIBE	6/06/2024 17:00
19	CAI BOLIVIA	CANDELARIA	
20	CAI LUCERO	CIUDAD BOLIVAR	10/06/2024 11:00

5.2. Frentes en ejecución

A la fecha del presente informe, han transcurrido 231 días desde la firma del acta de inicio y se relacionan los frentes donde el contratista inició la ejecución de actividades.

Tabla 8. Frente de Obra – UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA.

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Puente Aranda	URI PUENTE ARANDA	Carrera 40#10ª-08	24/10/2023	19/01/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA	Puente Aranda	Carrera 40 # 10ª-08

Polígono de intervención:



Descripción de Actividades:
frente de obra terminado, registro p/d red White ø 1/2" ó equivalente, reparaciones hidráulicas de PVCe 1/2",3/4" y 1", sondeos de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), rejilla con sosco de 3x2", desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrantes), mantenimiento de puertas en aluminio, cerradura safe o similar baño clasic 152 - aluminio satinado, cerradura SCH Lage o similar baño a-40s,

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100 %	0%

Actividades pendientes por ejecutar

Las solicitadas y aprobadas por la supervisión del contrato SSCJ para el buen funcionamiento del equipamiento.

Registro fotográfico


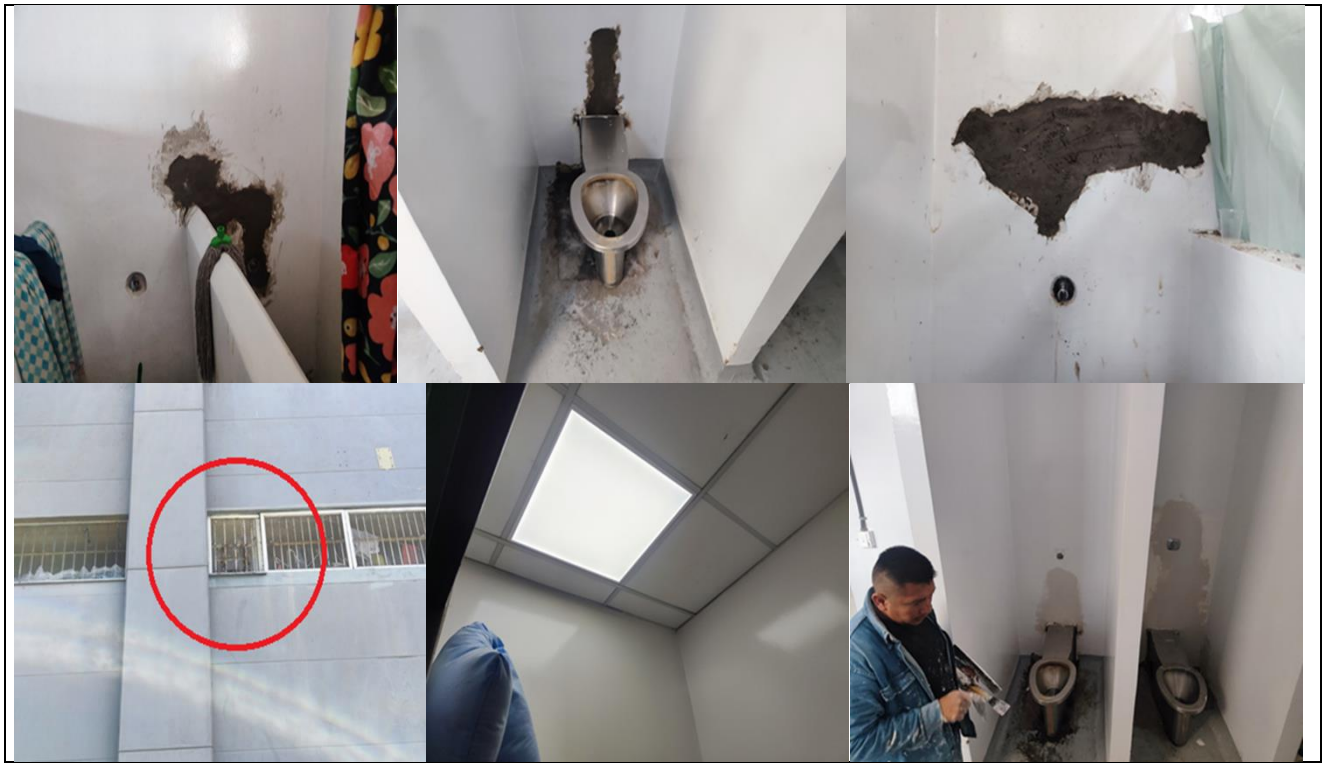


Tabla 9. Frente de Obra – CER.

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Puente Aranda	CER- CENTRO ESPECIALIZADO DE RECLUSION	CRA 41ª No. 6 / 343	1/11/2023	19/01/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CER	Puente Aranda	CRA 41ª No. 6 / 343

Polígono de intervención:



descripción de actividades:
frente de obra terminado, desmonte aparatos sanitarios (sólo atención de emergencias con reinstalación del mismo aparato sanitario), desmonte de push sanitarios, desmonte de accesorios sanitarios (tapa registros, pomos, regaderas, incrustaciones, rejillas, etc…), accesorios pvc-p ø 1/2", accesorios pvc-p ø 1 1/4", registro p/d red White ø 1/2" ó equivalente, suministro e instalación de push anti vandálico para sanitario.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
Las solicitadas y aprobadas por la supervisión del contrato SSCJ para el buen funcionamiento del equipamiento.		
Registro fotográfico		

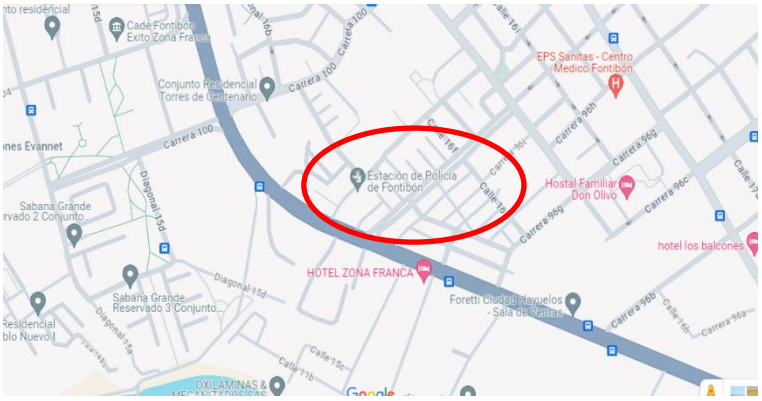


Tabla 10. Frente de Obra – E/FONTIBÓN CELDAS

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
FONTIBON	E/ FONTIBÓN CELDAS	CRA 98 #16 B 50	07/11/2023	05/01/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
E/FONTIBÓN CELDAS	Fontibón	CRA 98 #16 B 50

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado


Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		


NA

Registro fotográfico





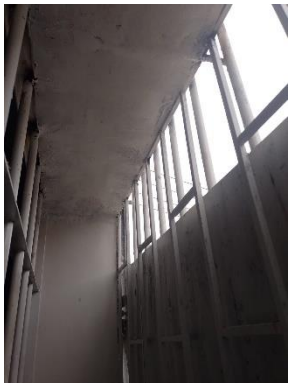

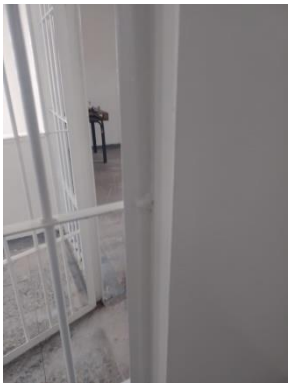




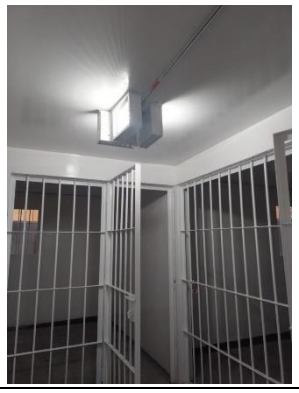



Tabla 11. Frente de Obra – CASA DE JUSTICIA USME

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
USME	CASA DE JUSTICIA USME	CALLE 137 C Sur # 2 A 43	11/11/2023	22/01/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CASA DE JUSTICIA USME	Usme	CALLE 137 C Sur # 2 A 43

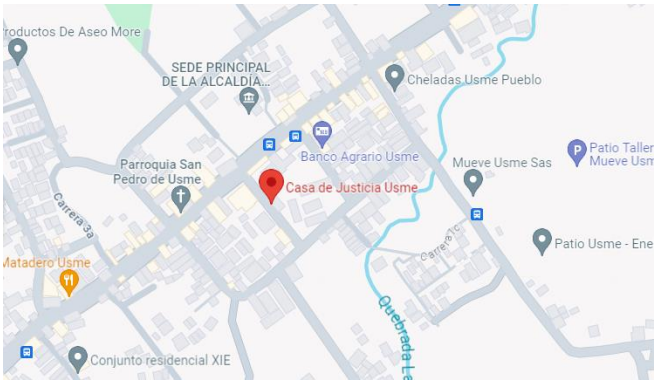Polígono de intervención:




Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado


Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%


Actividades pendientes por ejecutar

NA

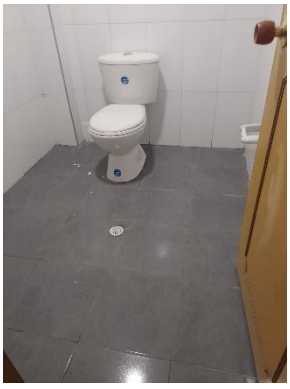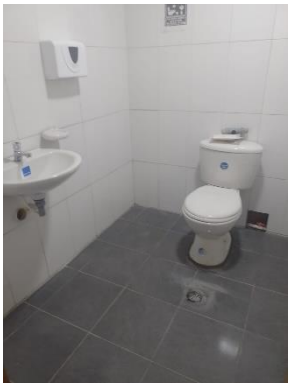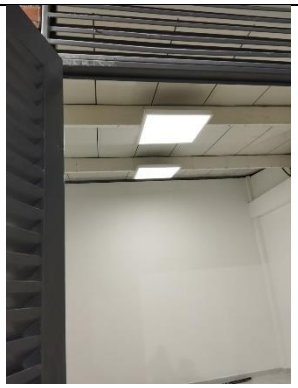Registro fotográfico











Aquaviva



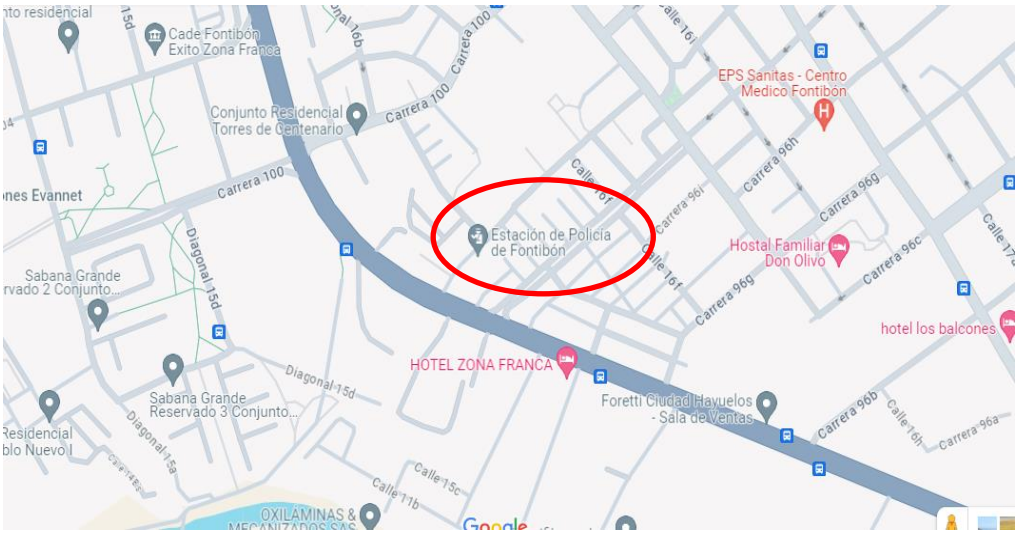


Tabla 12. Frente de Obra – ESTACIÓN DE POLICÍA FONTIBÓN

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
FONTIBON	E/ FONTIBÓN CELDAS	CRA 98 #16 B 50	04/12/2023	01/04/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
E/FONTIBÓN	Fontibón	CRA 98 #16 B 50

Polígono de intervención:



Frente de Obra Terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	100%

Actividades pendientes por ejecutar

NA

Registro fotográfico



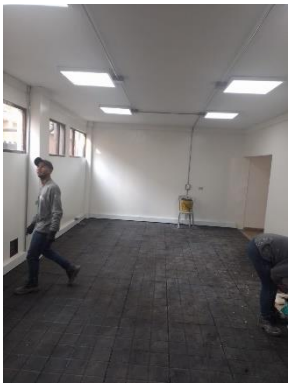
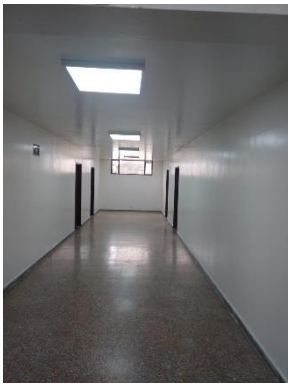





Tabla 13. Frente de Obra – ESTACIÓN DE POLICÍA SAN CRISTÓBAL

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
San Cristóbal	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	Avenida 1 de mayo No. 1-40.	05/12/2023	08/08/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
E/SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	AVENIDA 1 DE MAYO NO. 1-40

Polígono de intervención:



Descripción de actividades: Frente de Obra Terminado		
Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		

Registro fotográfico



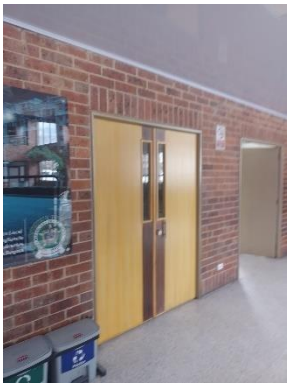
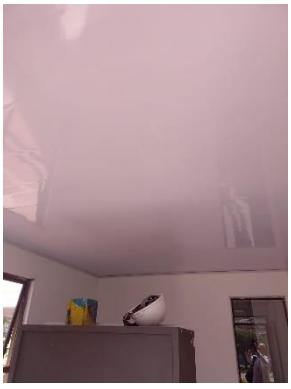
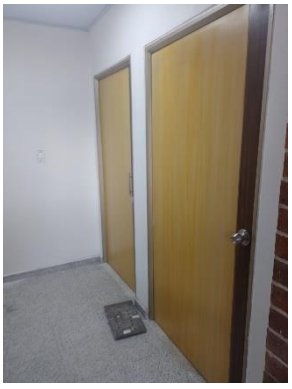













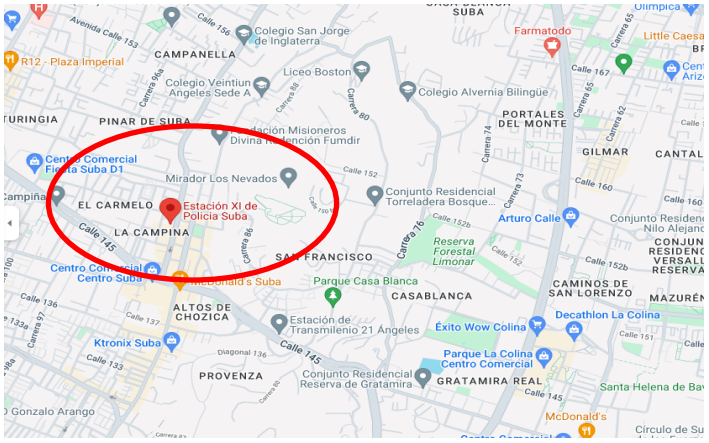



Tabla 14. Frente de Obra – ESTACIÓN DE POLICÍA DE SUBA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Suba	ESTACION DE POLICIA SUBA	Carrera 92 # 143-31.	4/12/2023	14/06/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
E.P/SUBA	SUBA	Carrera 92 # 143-31.

Polígono de intervención:



descripción de actividades:
Frente de obra terminado.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		

Registro fotográfico







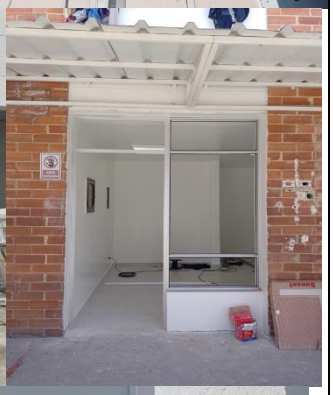






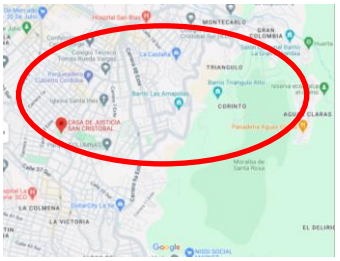



Tabla 15. Frente de Obra – CASA DE JUSTICIA SAN CRISTÓBAL

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
San Cristóbal	CASA DE JUSTICIA SAN CRISTOBAL	Diagonal 31C sur # 67 este -3	4/01/2024	05/02/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
C.J- SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	Dig 31csur # 67 este -3.

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado y entregado.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

NA

Registro fotográfico

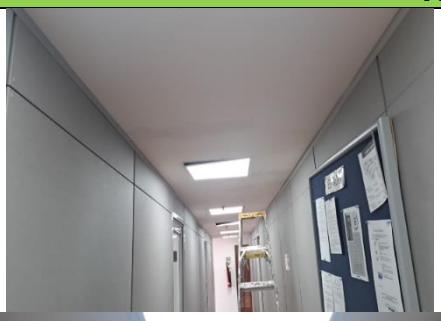
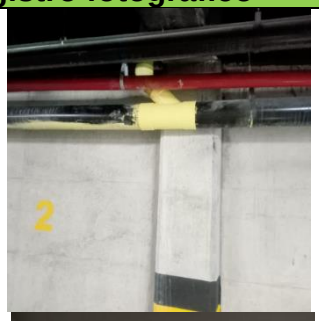
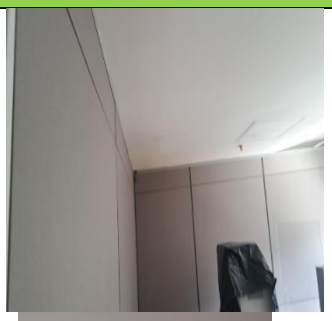
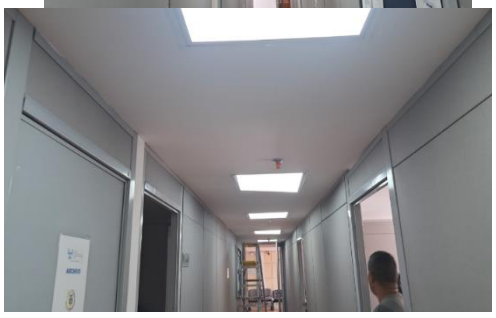
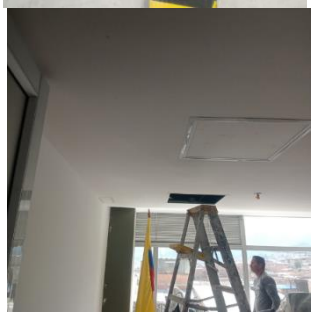
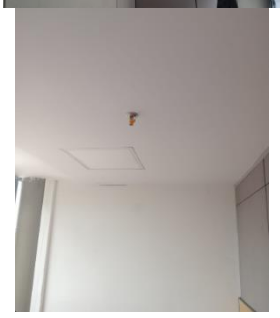
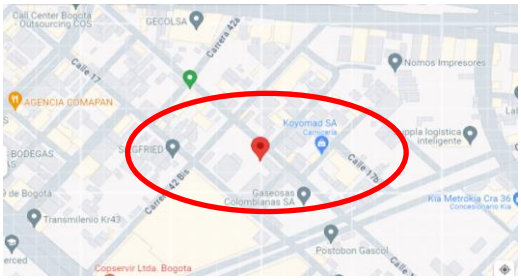







Tabla 16. Frente de Obra – CESPA – Centro Especializado para Adolescentes

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
PUENTE ARANDA	CESPA	Av. Carrera 30 # 11-85 .	16/1/2024	25/02/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CESPA – CENTRO ESPECIALIZADO PARA ADOLECENTES	PUENTE ARANDA	AV. Carrera 30 # 11 - 85.

Polígono de intervención:



Descripción de actividades: Sondeos de puntos sanitarios.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

- Mantenimiento, sellado y limpieza de ventanas de vidrios.

Registro fotográfico


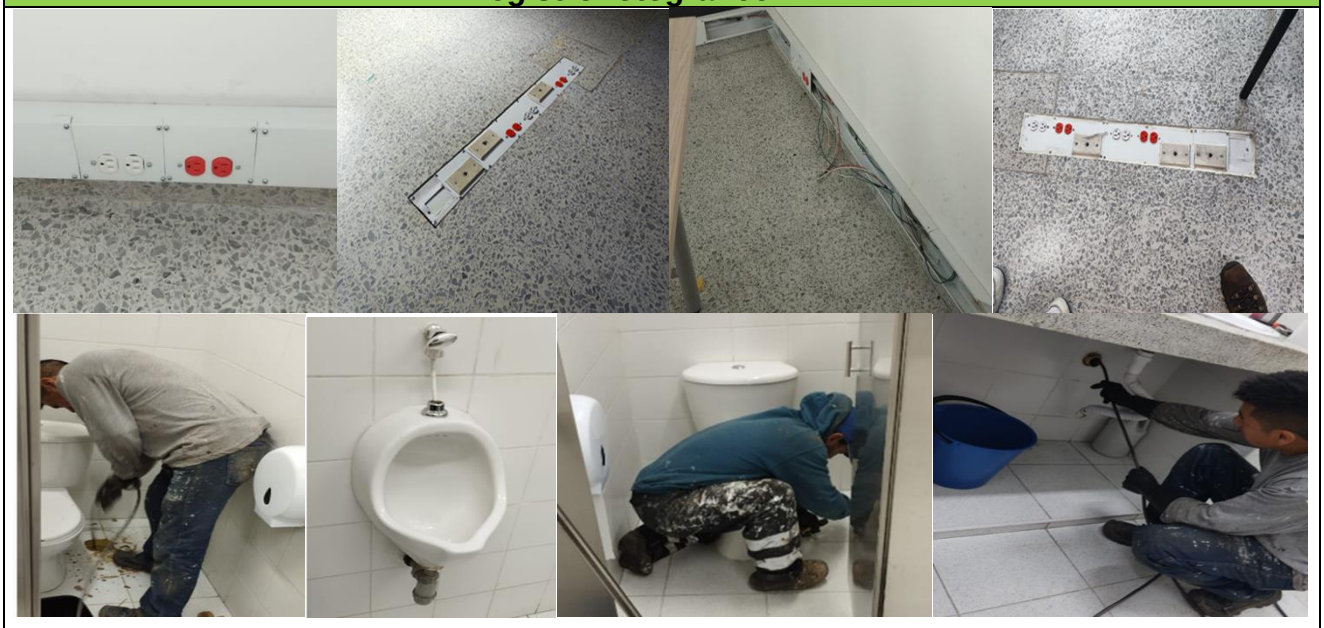


Tabla 17. Frente de Obra – ESTACIÓN DE POLICÍA RAFAEL URIBE

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Tunjuelito	ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE	Calle 34 sur # 24-39.	22/01/2024	11/05/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
E.P/ RAFAEL URIBE	TUNJUELITO	Calle 34 sur # 34-39.

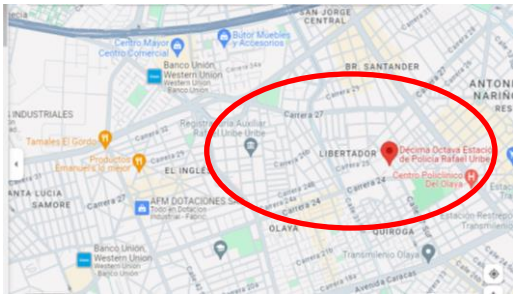Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado y entrega a MEBOG.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

NA

Registro fotográfico

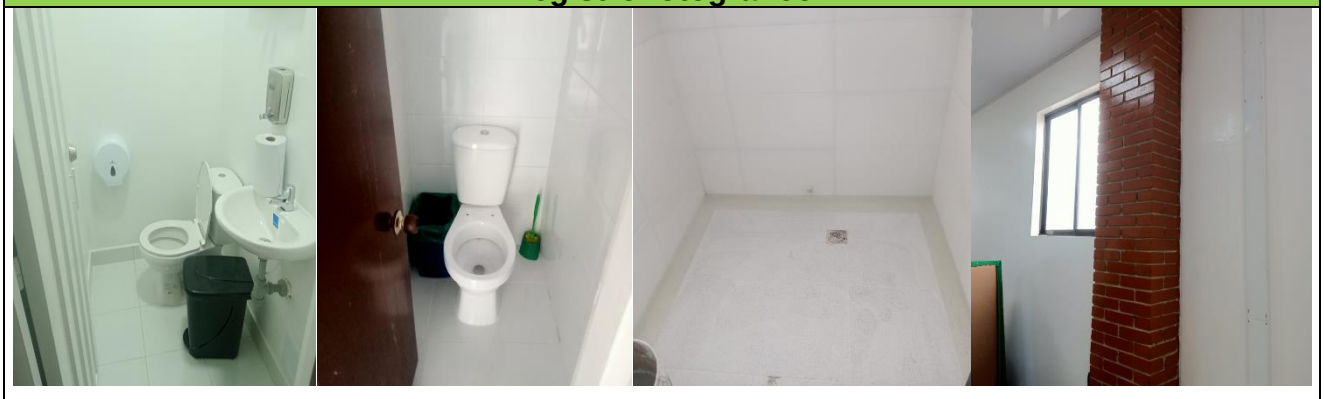





Tabla 18. Frente de Obra – ESTACIÓN DE POLICÍA DE ENGATIVÁ

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Engativá	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	Carrera 78ª # 70 - 54.	23/01/2024	27/04/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
E.P/ ENGATIVA	ENGATIVA	Carrera 78A # 70 - 54.

Polígono de intervención:




descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado



Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%


Actividades pendientes por ejecutar

N.A

Registro fotográfico

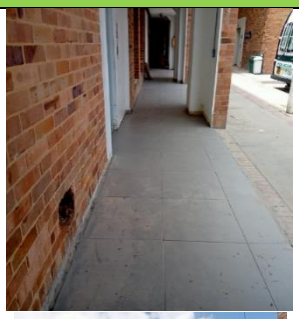

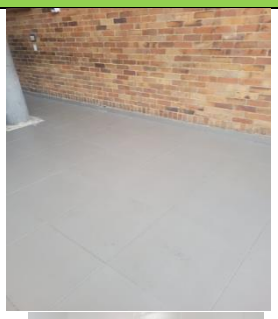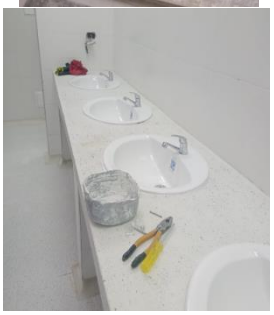


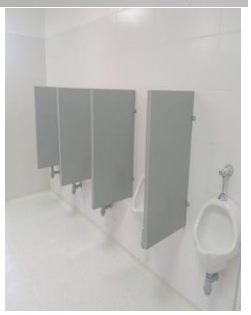


Tabla 19. Frente de Obra – CASA DE JUSTICIA LA VICTORIA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
San Cristóbal	CASA DE JUSTICIA LA VICTORIA	Calle 36 m sur .	24/01/2024	30/03/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
C J / LA VICTORIA	SAN CRISTOBAL	Calle 36 m sur .

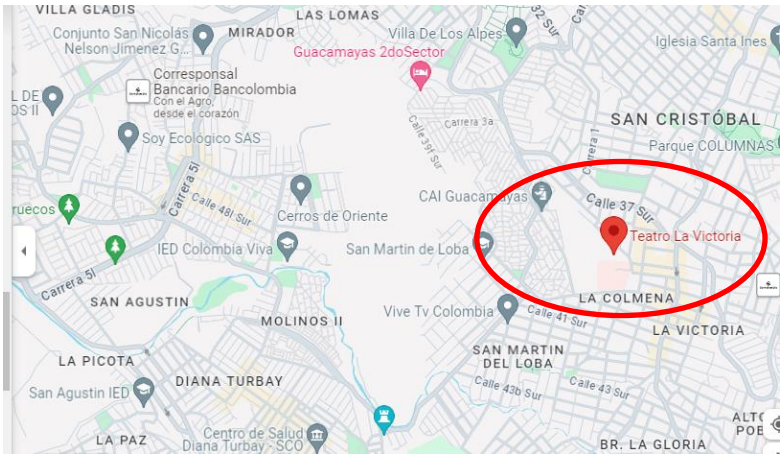Polígono de intervención:





descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado y entregado.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

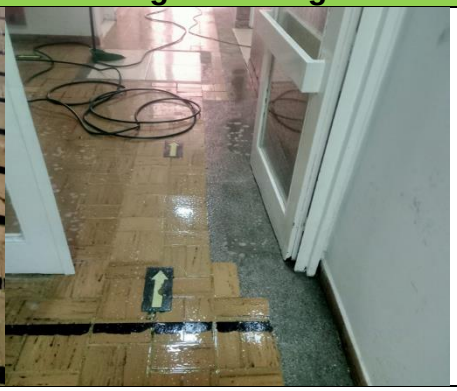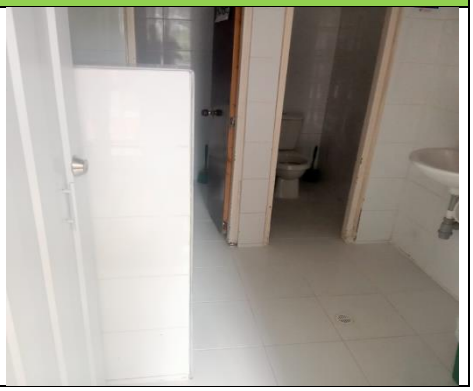N.A

Registro fotográfico


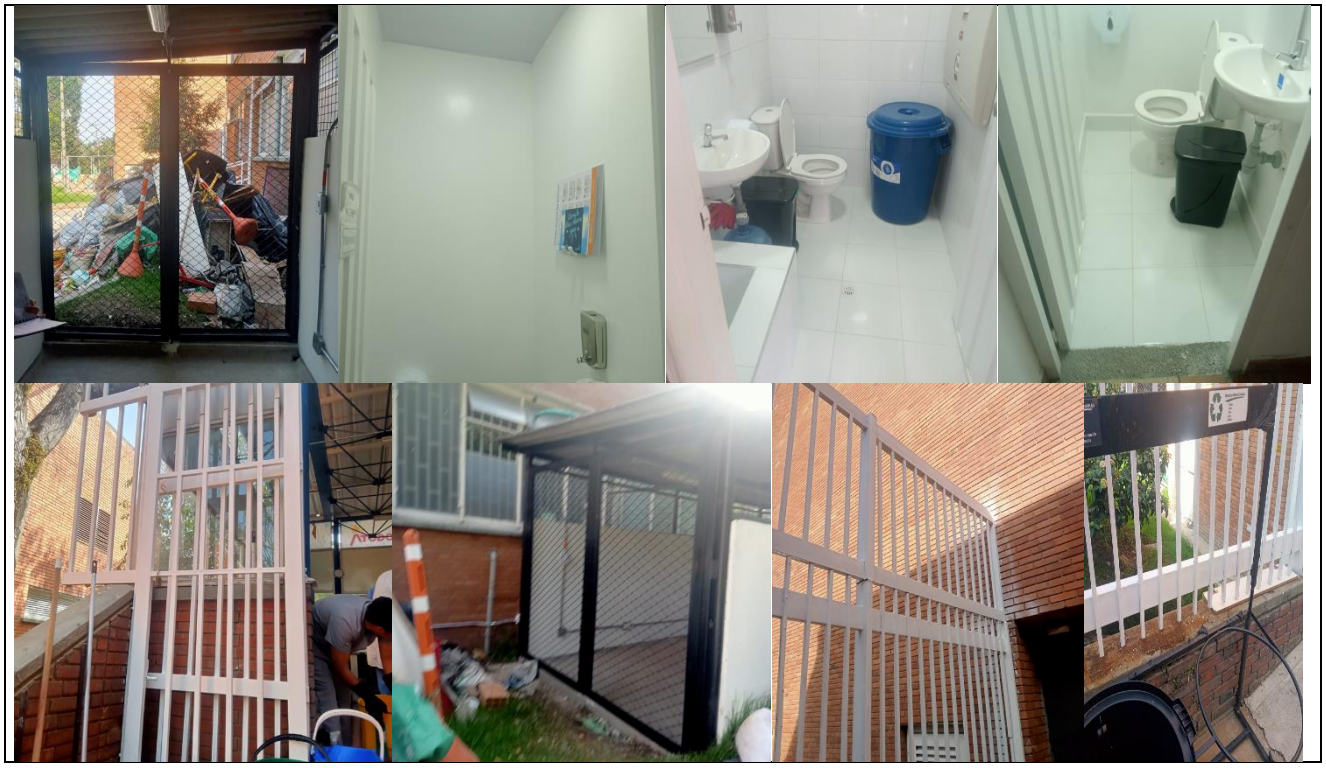


Tabla 20. Frente de Obra – BASER 13

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usaquén	BASER 13	Calle 106 # 7- 25.	15/01/2024	13/06/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
BASER 13	USAQUEN	Calle 106 # 7- 25.

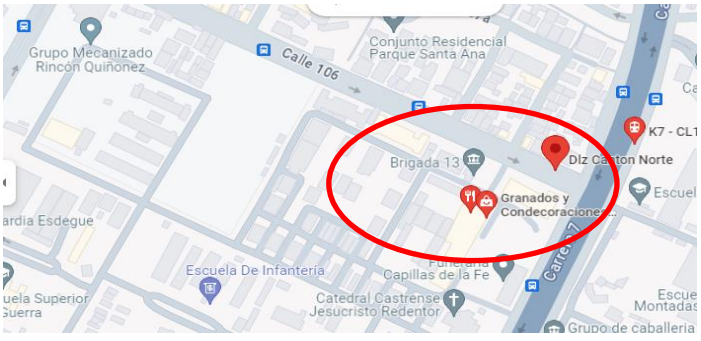Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	**0%**

Actividades pendientes por ejecutar

Entrega formal

Registro fotográfico












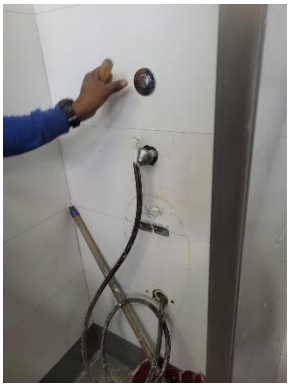

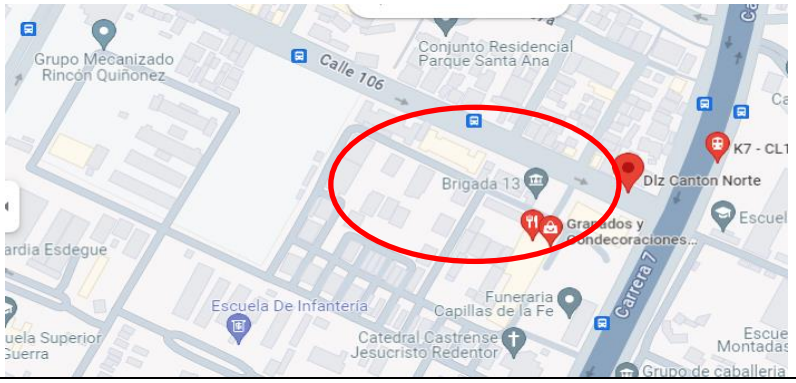


Tabla 21. Frente de Obra – PM 15

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usaquén	PM15	Calle 106 # 7- 25.	25/01/2024	17/05/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
PM 15	USAQUEN	Calle 106 # 7- 25.

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado y Entregado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

Entregado a la Brigada

Registro fotográfico















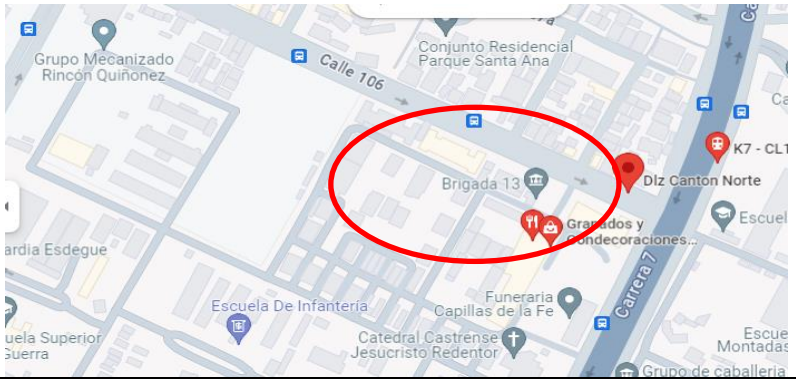


Tabla 22. Frente de Obra – SALA DE OPERACIONES

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usaquén	SALA DE OPERACIONES	Calle 106 # 7- 25.	15/01/2024	13/06/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
SALA DE OPERACIONES	USAQUEN	Calle 106 # 7- 25.

Polígono de intervención:




Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado


Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

Entregado a la Brigada

Registro fotográfico

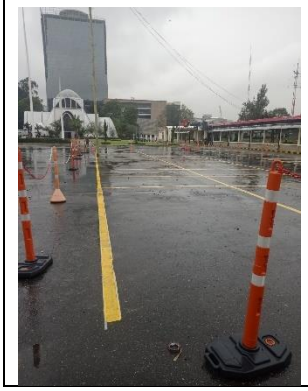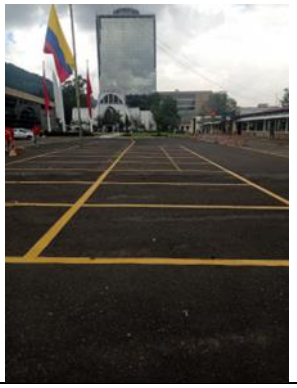


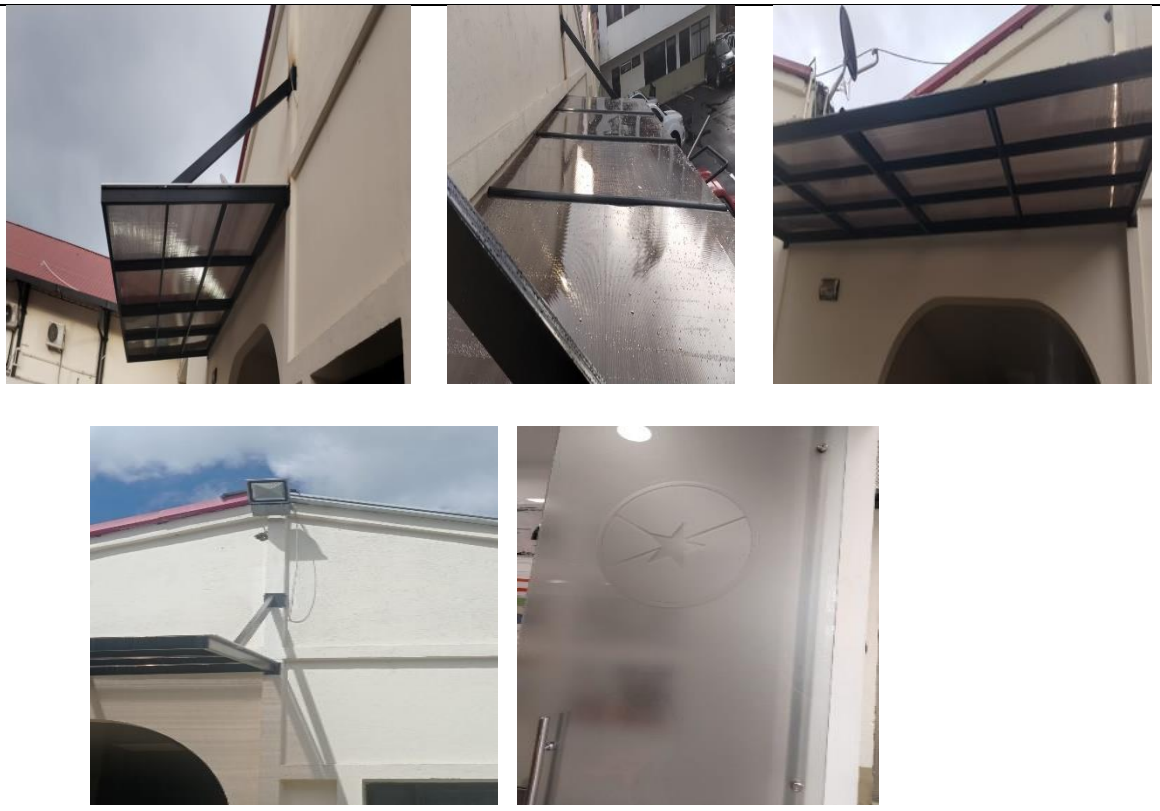


Tabla 23. Frente de Obra – Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá - C4

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Fontibón	Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá - C4	Calle 20 # 68A-06	18/01/2024	29/04/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
C4	FONTIBON	Calle 20 # 68A-06

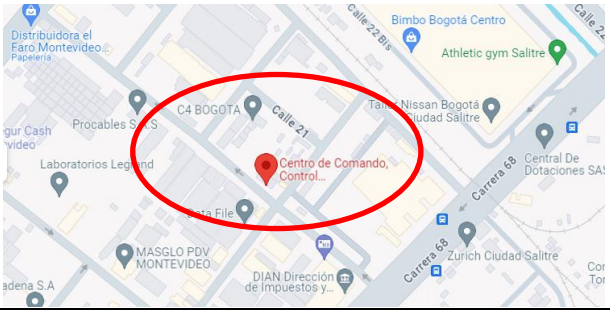Polígono de intervención:




Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
Poda		

Registro fotográfico



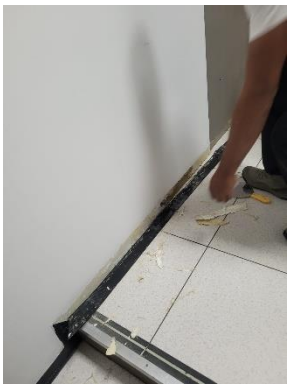



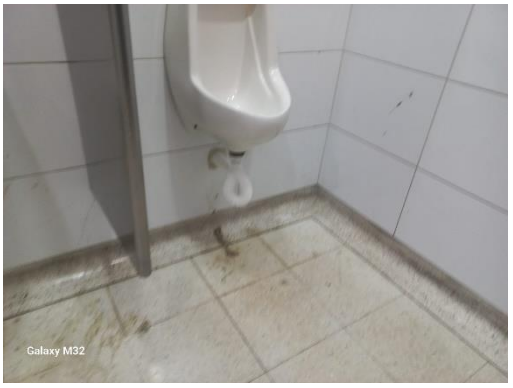




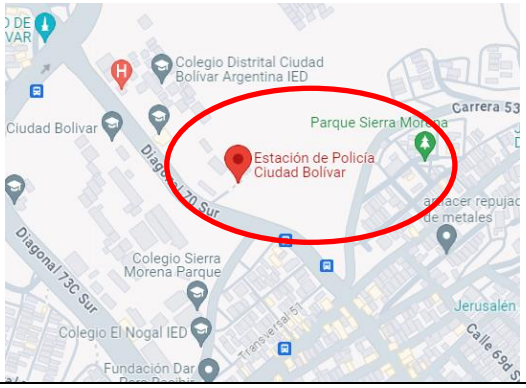


Tabla 24. Frente de Obra – ESTACIÓN DE POLICÍA CIUDAD BOLÍVAR

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Ciudad Bolívar	Estación de Policía Ciudad Bolívar	DG 70 sur	22/01/2024	19/06/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Estación de Policía Ciudad Bolívar	CIUDAD BOLIVAR	DG 70 sur

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%


Actividades pendientes por ejecutar

Entrega a la MEBOG

Registro fotográfico








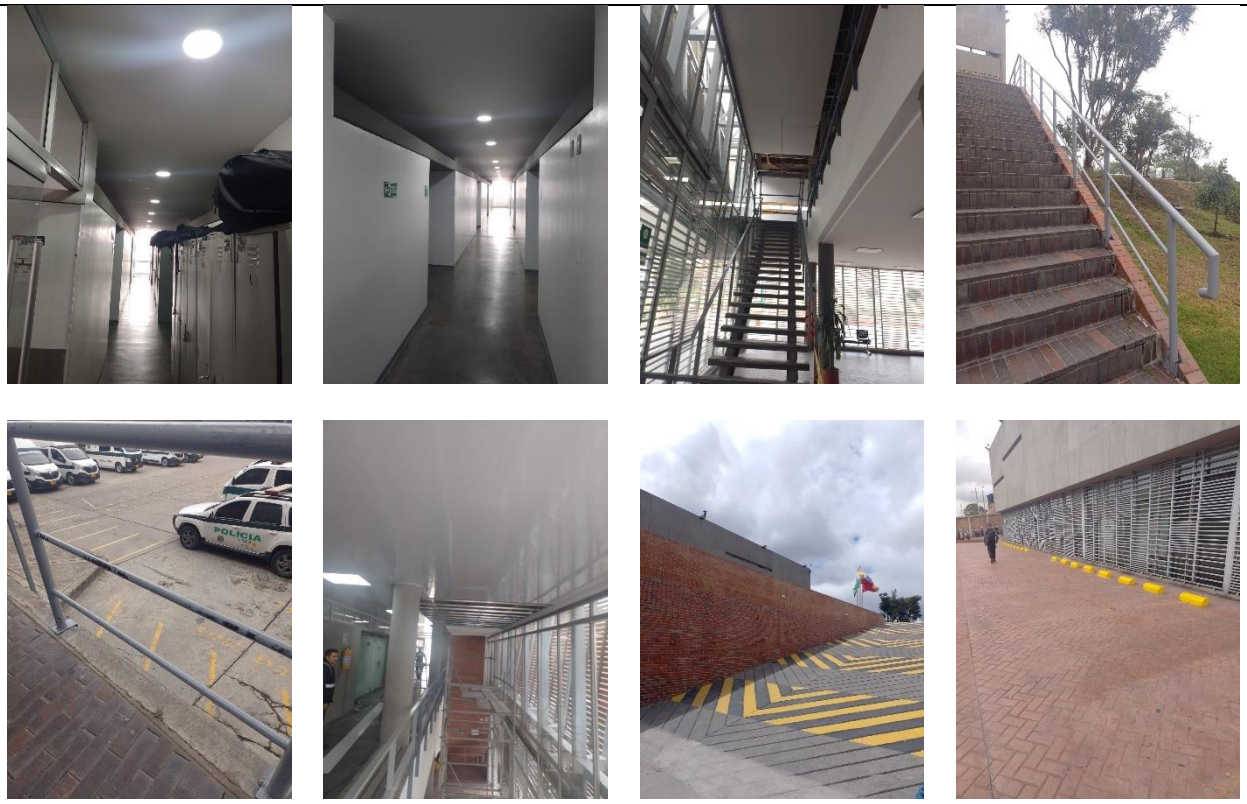


Tabla 25. Frente de Obra – CASA DE JUSTICIA MÁRTIRES

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Mártires	Casa de Justicia Mártires	Cra. 21 # 14 - 75	03/01/2024	03/05/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Casa de Justicia Mártires	CIUDAD BOLIVAR	DG 70 sur

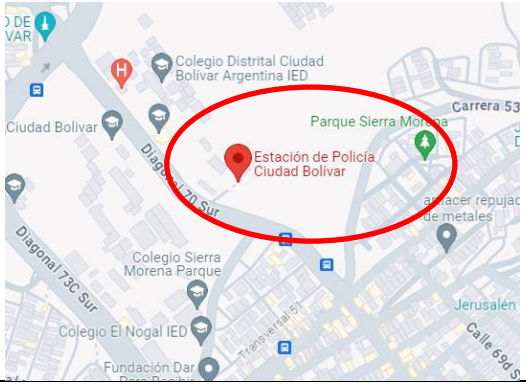Polígono de intervención:







Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
Entrega a la Interventoría		

Registro fotográfico

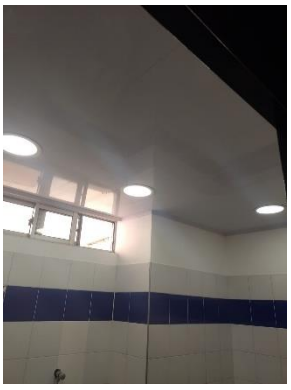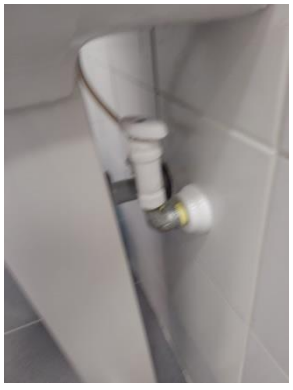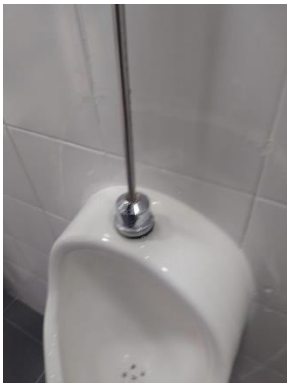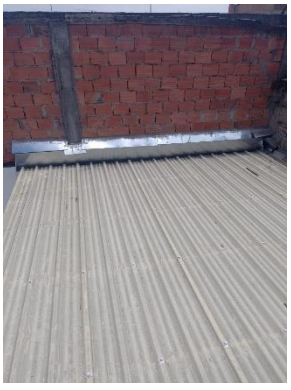

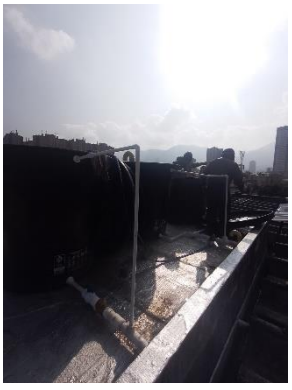
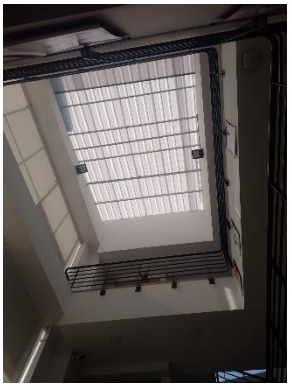






Tabla 26. Frente de Obra – CARABINEROS PARQUE NACIONAL

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Santa Fe	Carabineros parque nacional	Cra. 40 # 10A - 08	07/02/2024	09/05/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Carabineros parque nacional	SANTA FE	Cra 40 # 10ª -08

Polígono de intervención:




Descripción de actividades:
Frente de Obra terminado.


Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

Entregado a la MEBOG

Registro fotográfico

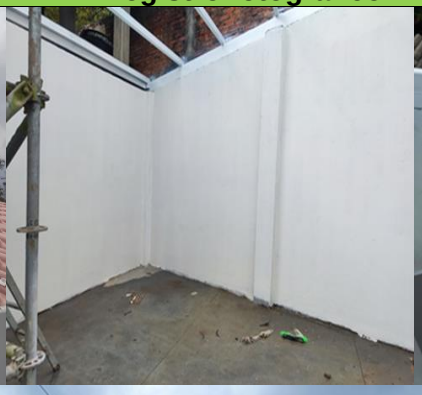

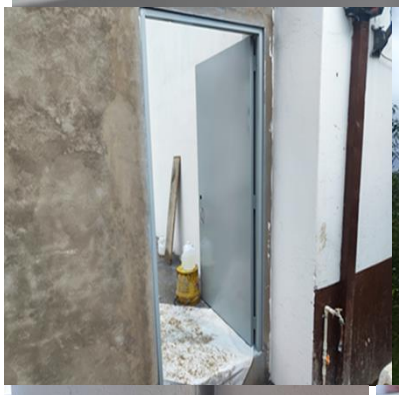


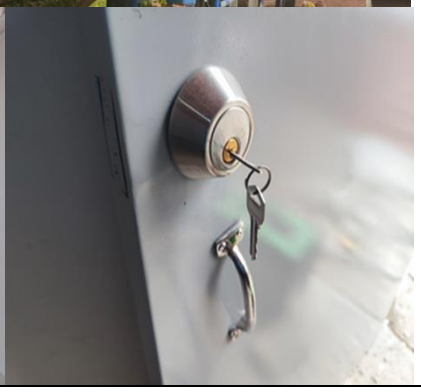



Tabla 27. Frente de Obra – CAI DELICIAS

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Kennedy	Caí Delicias	Calle. 44 A -sur # 72 - 40	15/02/2024	15/03/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí Delicias	KENNEDY	Calle 44ª-SUR # 72 -40

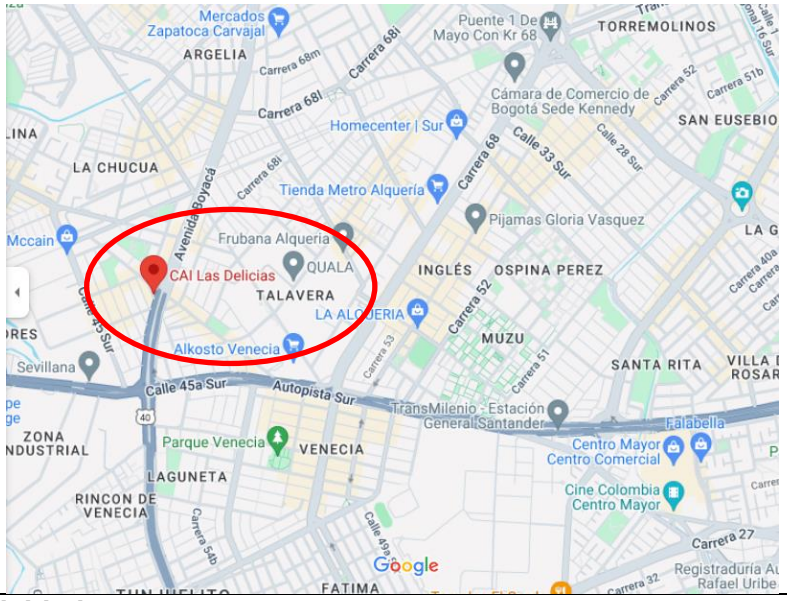Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100 %	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

Entrega a la MEBOG

Registro fotográfico




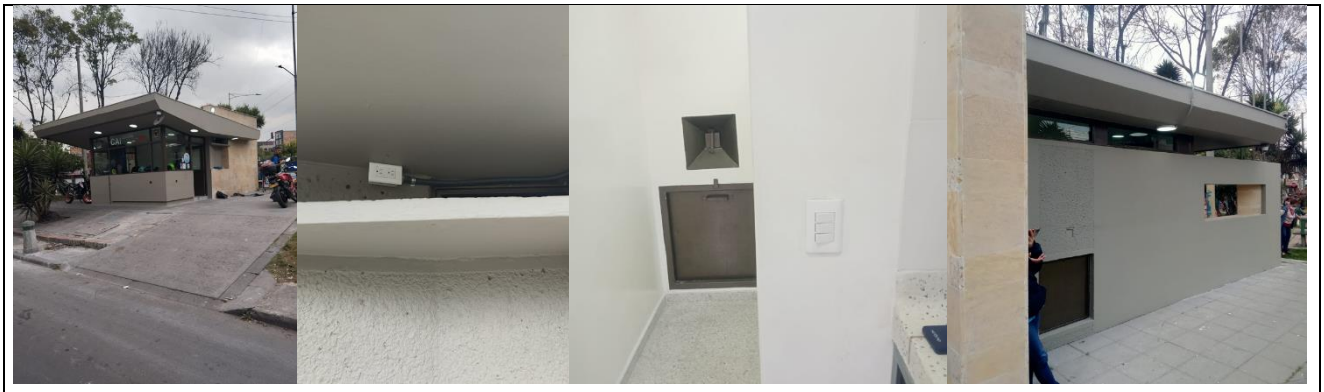


Tabla 28. Frente de Obra – CAI SANTA MARTA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usme	Caí Santa Marta	Calle. 44 A -sur # 72 - 40	07/02/2024	09/05/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí Santa Marta	USME	Calle 44ª-SUR # 72 -40

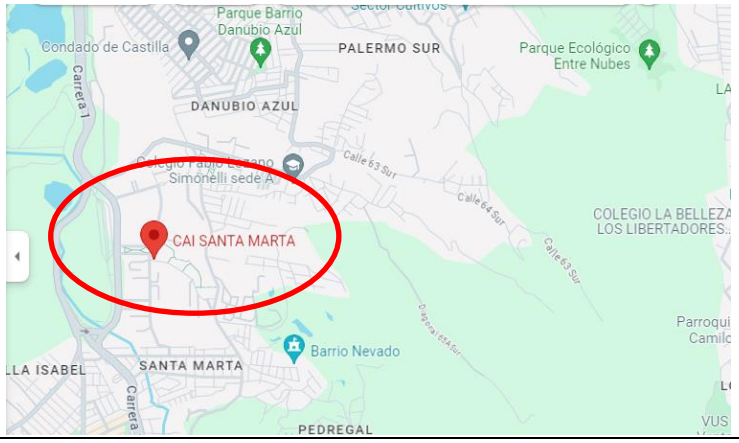Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

Entregado a MEBOG

Registro fotográfico

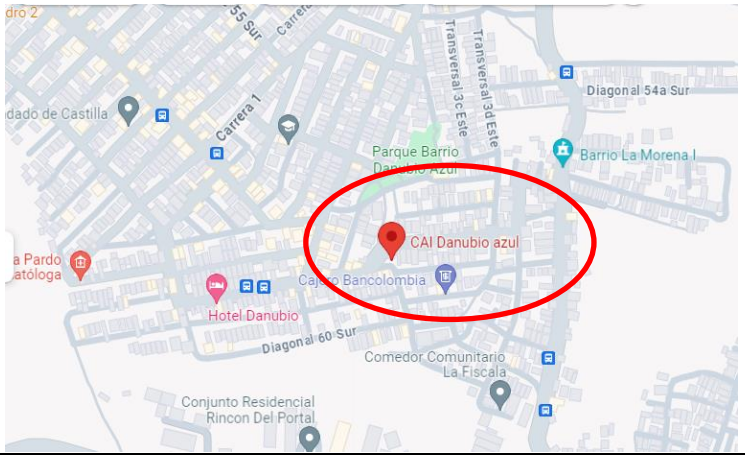


Tabla 29. Frente de Obra – CAI DANUBIO AZUL

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usme	Caí Danubio Azul	Dg. 58 -sur # 2 - 98	07/02/2024	09/04/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí Danubio Azul	USME	Dg 58 -SUR # 2 - 98

Polígono de intervención:





descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

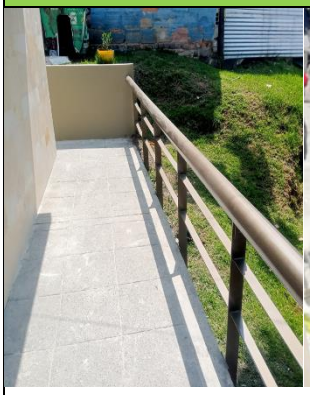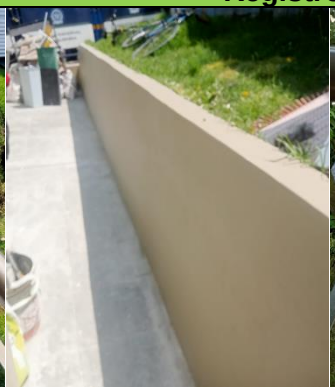Entregado a MEBOG

Registro fotográfico


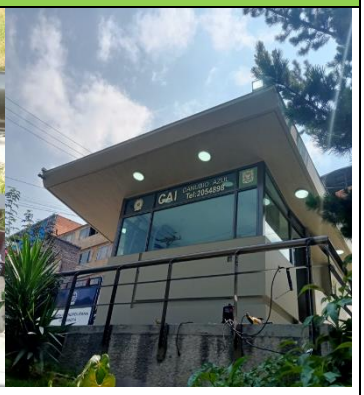


Tabla 30. Frente de Obra – VIVIENDA FISCAL CAMINOS DE MODELIA APTO 209

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Fontibón	Vivienda fiscal Caminos de Modelia apto 209	Calle. 20C # 93 – 25 Apto 209	22/02/2024	01/03/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Vivienda fiscal Caminos de Modelia apto 209	FONTIBON	Calle 20C # 93 – 25 Apto 209

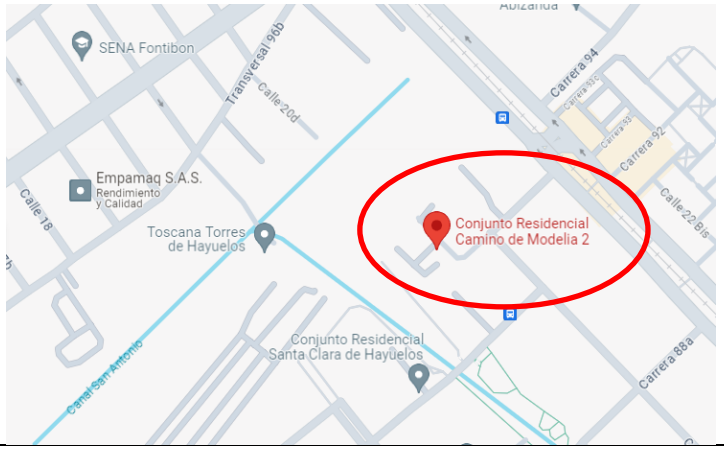Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

N.A

Registro fotográfico



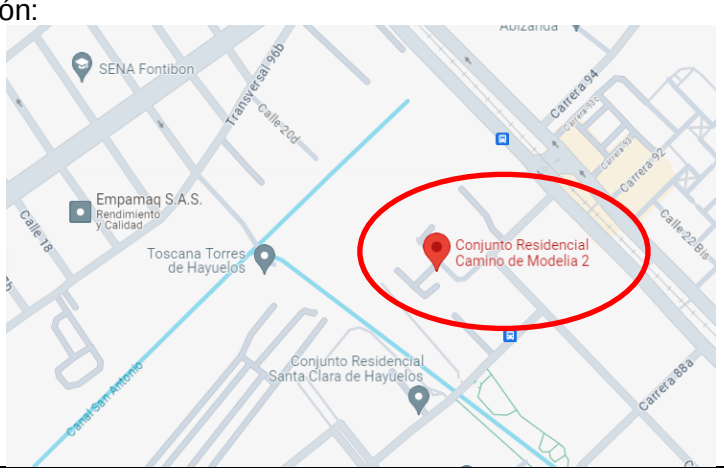


Tabla 31. Frente de Obra – VIVIENDA FISCAL CAMINOS DE MODELIA APTO 223

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Fontibón	Vivienda fiscal Caminos de Modelia apto 223	Calle. 20C # 93 – 25 Apto 223	22/02/2024	01/03/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Vivienda fiscal Caminos de Modelia apto 209	FONTIBON	Calle 20C # 93 – 25 Apto 223

Polígono de intervención:



descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

N.A

Registro fotográfico



Tabla 32. Frente de Obra – CASA DE JUSTICIA BOSA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Bosa	Casa de Justicia Bosa	CARRERA 81 D # 59 A 59 Sur	09/02/2024	26/04/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Casa de Justicia Bosa	BOSA	CARRERA 81 D # 59 A 59 Sur

Polígono de intervención:






Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado



Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
Frente entregado a entera satisfacción

Registro fotográfico

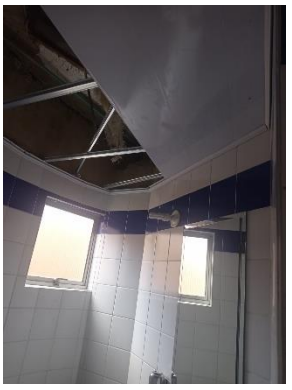


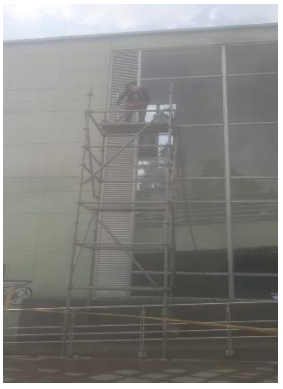



Tabla 33. Frente de Obra – CAI EL SOCORRO

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Kennedy	Caí El Socorro	Cra 77q # 29 SUR	18/03/2024	09/05/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí El Socorro	KENNEDY	Cra 77q # 29 SUR

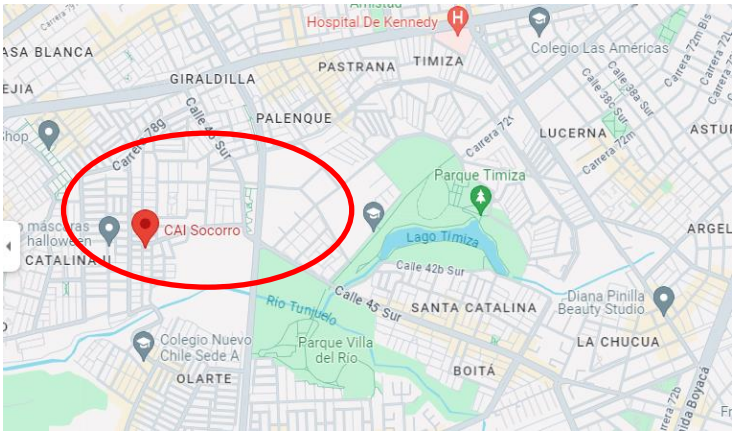Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

NA

Registro fotográfico

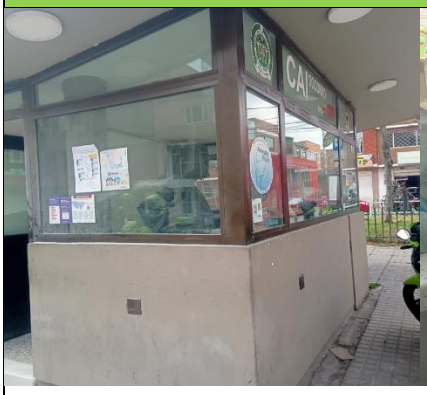








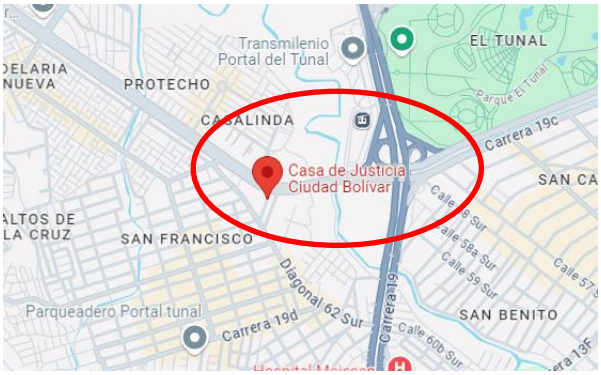


Tabla 34. Frente de Obra – CASA DE JUSTICIA CIUDAD BOLIVAR

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Ciudad Bolívar	Casa de Justicia Ciudad Bolívar	Diagonal 62 sur # 20f - 20	19/03/2024	19/05/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Casa de Justicia Ciudad Bolívar	Ciudad Bolívar	Diagonal 62 sur # 20f - 20

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

NA

Registro fotográfico


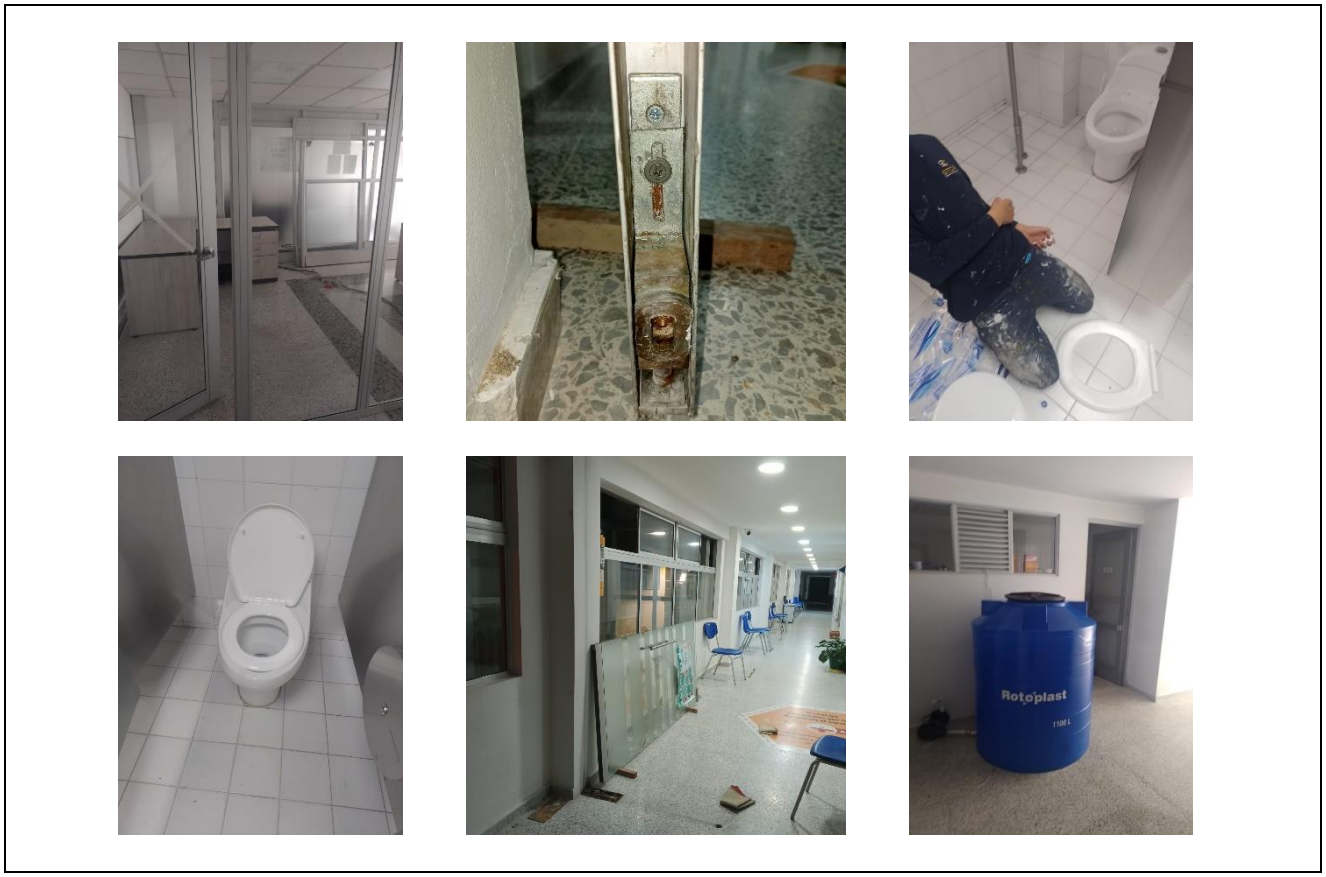


Tabla 35. Frente de Obra – CAI VILLAS DE GRANADA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Engativá	Caí V illas de Granada	Cra 112ª # 77ª-30	03/04/2024	03/05/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí Villas de granada	ENGATIVA	Cra 112ª # 77ª-30

Polígono de intervención:



descripción de actividades:
frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
NA

Registro fotográfico













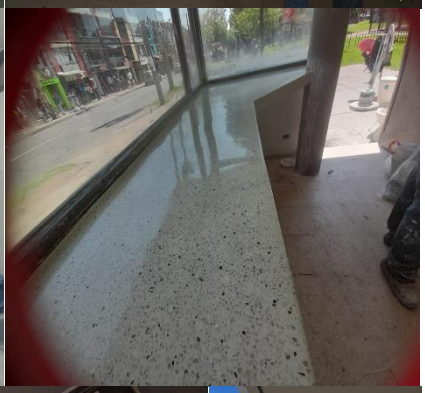
















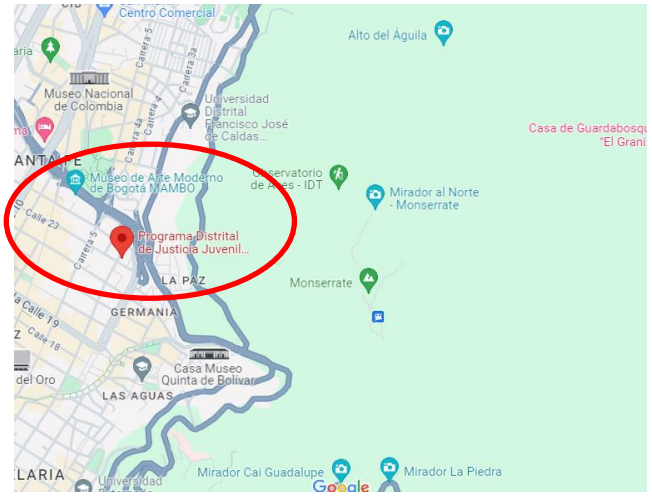


Tabla 36. Frente de Obra – CJJR SANTA FE

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Santa Fe	CJJR SANTA FE	Cra 4 # 23 - 28	10/04/2024	09/05/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CJJR Santa Fe	SAMTA FE	Cra 4 # 23 - 28

Polígono de intervención:



Descripción de Actividades:
Frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

N.A

Registro fotográfico







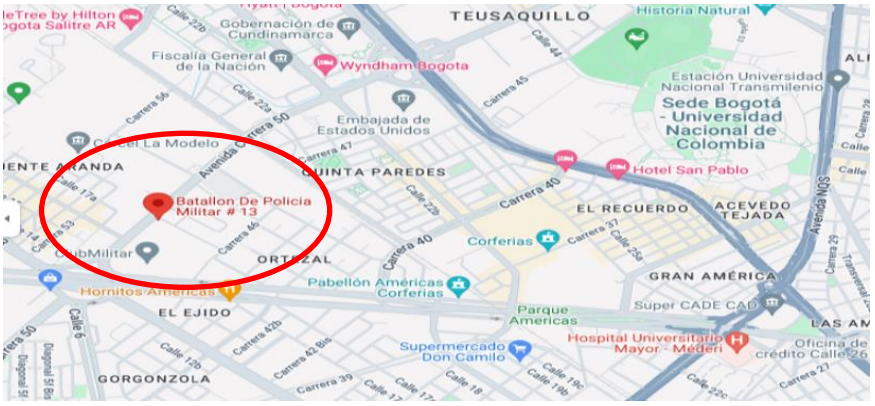


Tabla 37. Frente de Obra – COMANDO PM13

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Puente Aranda	Comando PM13	Cra 50 # 18-05	22/04/2024	09/05/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Comando PM13	PUENTE ARANDA	Cra 50 # 18-05

Polígono de intervención:



Descripción de Actividades:
Frente de obra terminado.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
NA

Registro fotográfico



Tabla 38. Frente de Obra – CAI MODELO

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Barrios Unidos	CAI Modelo	Calle 74 A No. 63 - 04	02/04/2024	02/05/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CAI Modelo	Barrios Unidos	Calle 74 A No. 63 - 04

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado


Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

NA

Registro fotográfico


CAI

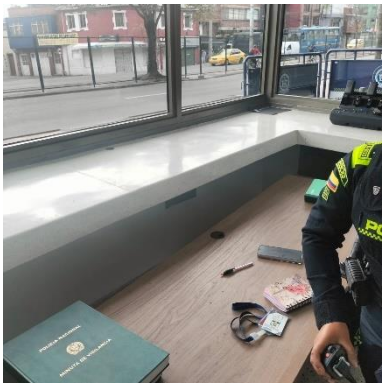



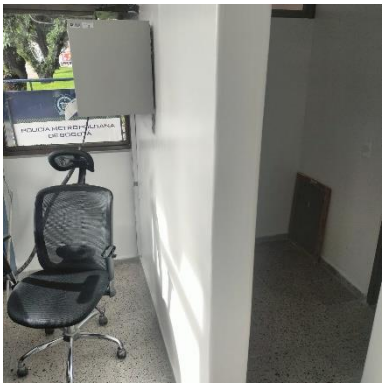
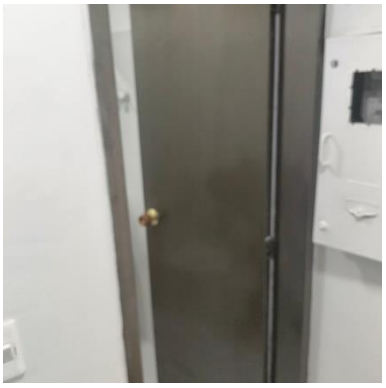
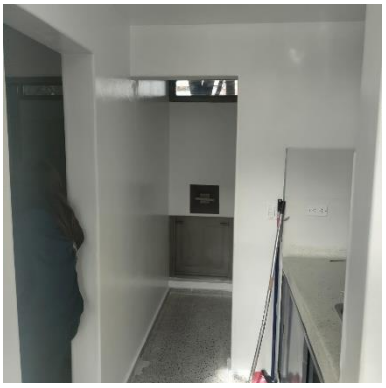




Tabla 39. Frente de Obra – BAFLA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Tunjuelito	BAFLA	BATALLON DE ARTILLERIA 13	09/05/2024	07/08/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
BAFLA	Tunjuelito	BATALLON DE ARTILLERIA 13

Polígono de intervención:




Descripción de actividades:
Frente de obra terminado


Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
94,83%	96,45%	1,62%

Actividades pendientes por ejecutar


NA

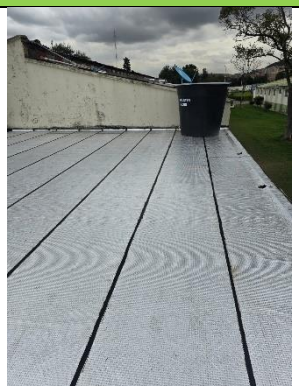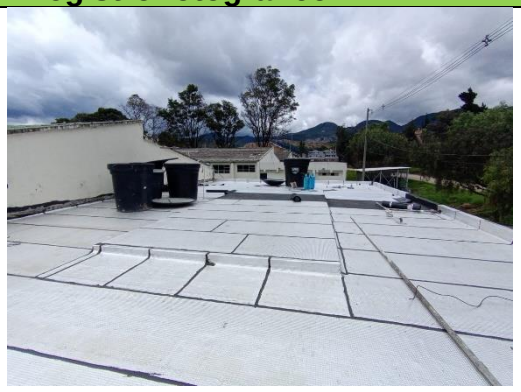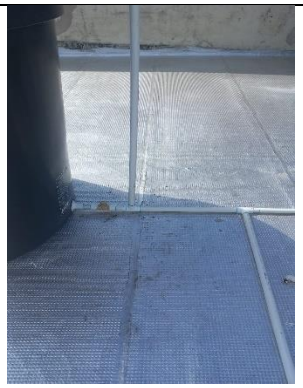Registro fotográfico












alojamiento 3





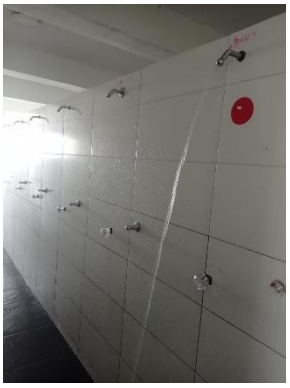








Tabla 40. Frente de Obra – CAI LA CALERA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usaquén	CAI La Calera	Via A La Calera Km. 3.5	20/05/2024	20/06/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CAI LA CALERA	Usaquén	Via A La Calera Km. 3.5

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado y entregado a la MEBOG.


Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

NA

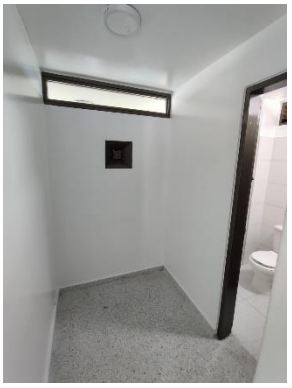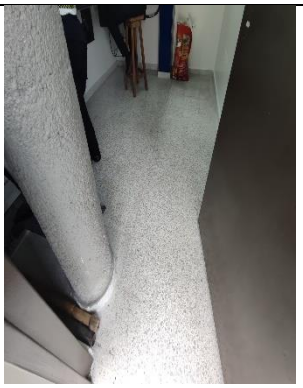
Registro fotográfico

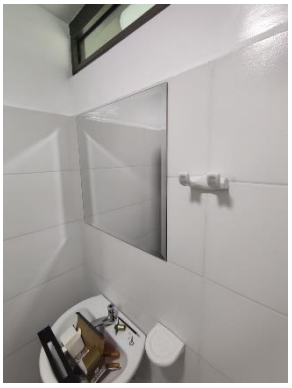













CAI Tel 632 0848



Tabla 41. Frente de Obra – CAI SANTA BÁRBARA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usaquén	CAI Santa Barbara	6, Ac 116 #61	16/05/2024	16/06/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CAI SANTA BARBARA	Usaquén	6, Ac 116 #61

Polígono de intervención:




Descripción de actividades:
Frente de Obra Terminado y entregado a la MEBOG.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%


Actividades pendientes por ejecutar


NA

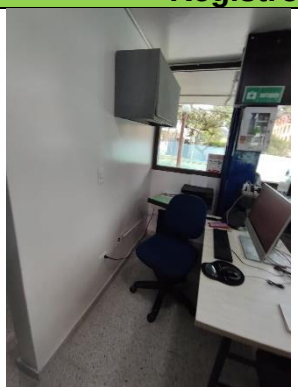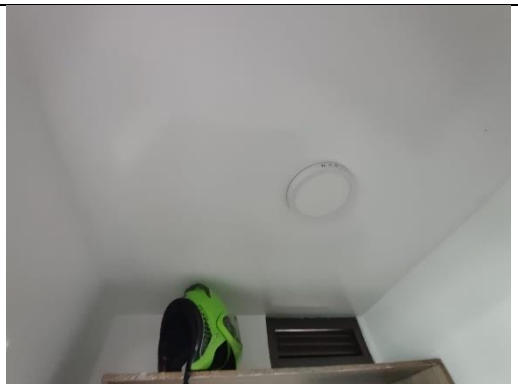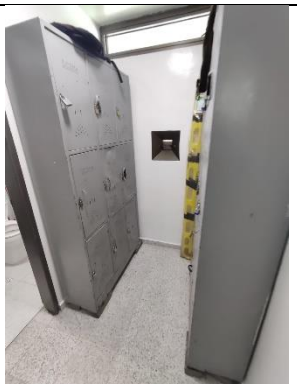
Registro fotográfico










CAI SANTA BARBARA
6014414719 - CEL. 3172541293











CAI SANTA BARBARA

Tabla 42. Frente de Obra – ESTACION POLICIA PUENTE ARANDA NUEVA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
PUENTE ARANDA	E.P PUENTE ARANDA NUEVA	Cra 39 # 10-25	9/05/2024	31/07/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Estación Policía Puente Aranda Nueva	PUENTE ARANDA	Cra 39 # 10-25

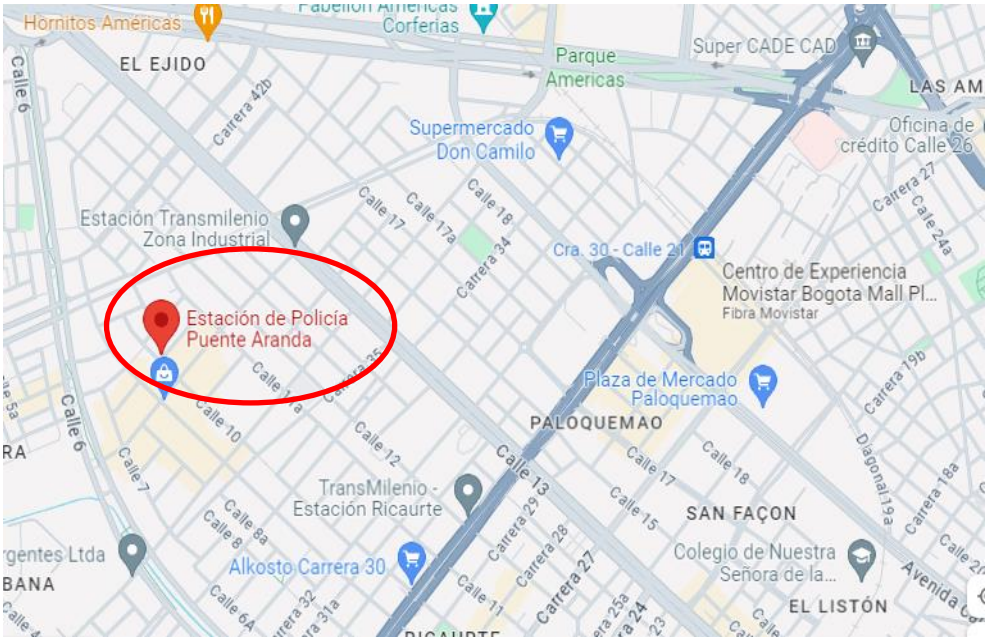Polígono de intervención:



Descripción de Actividades:

desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores).,suministro e instalación de interruptor doble, suministro e instalación de interruptor triple, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de interruptor sencillo, esmalte sobre mampostería, esmalte s/ lamina lineal, barniz s/muebles, desmonte ventanas o puertas metálicas (inc. retiro de sobrantes),desmonte de cableado eléctrico (contempla los cables contenidos dentro de un ducto entre calibres #8, #10 y #14),sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"),cableado 2#10,breaker industrial 3 x 15/60 a, mantenimiento general de tableros de 18 circuitos trifásicos (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general),suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica. ,puerta y marco en aluminio anodizado serie 3831/5020 - color mate natural + vidrio cristal templado incoloro 5 mm, pantalla led 24w 60x60 de incrustar, demolición cielo raso falso (inc. retiro de sobr.),demolición de muros tolete e=12 cm. (inc. retiro de sobr.),demolición afinado de piso de 5 cms, desmonte puertas con marcos (inc. retiro de sobr.),desmonte aparatos sanitarios (sólo atención de emergencias con reinstalación del mismo aparato sanitario),escarificar pañetes (inc. retiro de sobr.),suspensión de salida sanitaria (inc. retiro de sobr.),suspensión de salida hidráulica (inc. retiro de sobr.),desmonte de sifones, desmonte de push sanitarios, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye retiro y disposición final de escombros),desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores).,desmonte de piso en caucho (incluye retiro de sobrantes),remates ladrillo tolete

prensado, suministro e instalación de registro principal de agua potable d=3",mantenimiento de las dos bombas del sistema de presión, incluye instalación de válvula reguladora de presión a 60psi, calibración de los presos tatos a 90 y 85 psi. incluye revisión de conexión de motores y tableros, incluye instalación de dos válvulas desairadoras de 1" con accesorios. Brigada XIII. Cambio de tubería de la descarga de la bomba, incluye: 3 niples de 1 1/2", 1 registro de 1 1/2", 1 cheque de 1 1/2" y 1 unión coupling de 1 1/2",Cambio de flauta, incluye: 2 Tees de 3", 3 niples de 3", 1 copa de 3 x 1 1/2", 1 brida de 3", 2 niples de 1 1/2" y 8 uniones coupling de 3",registro p/d red White ø 1/2" ó equivalente, registro p/d red White ø 3/4" ó equivalente, punto agua fría PVC (inc. accesorios),reparaciones hidráulicas PVC de 1/2" - 3/4" y 1",punto desagüe PVC ø 2",reparaciones tubería PVC sanitaria de 3" ,accesorio PVC-s ø 3",sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"),suministro e instalación de cheque red White 3" o similar. (incluye retiro del cheque existente, limpieza y retiro de sobrantes), suministro e instalación de sifón tipo acordeón plástico, mantenimiento y limpieza de cajas de inspección. incluye limpieza de la caja, ajuste de marco y/o reparación de marco, salida + interruptor doble luminex o equivalente - PVC, salida + interruptor triple luminex o equivalente- PVC, salida + tomacorriente doble monofásica - PVC, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 9w, 95-227v, 870 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de cable thhn-thwn n 10 600v suministro e instalación de interruptor sencillo, tubería emt 3/4" - suspendida incluye accesorios, interruptor automático enchufable 2 polo 15/30 interruptor automático enchufable 2 polo 40/60 a, mantenimiento general de tableros de 18 circuitos trifásicos (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general),mantenimiento general de tableros de 24 circuitos trifásicos (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general),suministro e instalación de red eléctrica trifásica de cu en cable #8 awg, (3 fases + 1 neutro) + 1 #10 awg thhn/thwn 90º ,suministro e instalación de red eléctrica monofásica de cu 2 x n° 12 awg (1 fase + 1 neutro) + 1 x n° 12 t awg, suministro e instalación de red eléctrica monofásica de cu 2 x n° 10 awg (1 fase + 1 neutro) + 1 x n° 12 t awg, suministro e instalación de caja de paso de 40x40x20 en lámina cold rolled con recubrimiento en pintura electroestática calibre 20 ,marcación de tubería de red interna con cinta color naranja a=10 cm, revisión y organización general de tablero de 12 circuitos (contempla: identificación de circuitos, peinado y limpieza de tablero y marquillado),suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.,limpieza y reemboquille de enchape, afinado pisos vinisol mortero 1:4 h=4 cm, granito pulido, suministro e instalación de media caña en PVC de 6 cm. incluye desmote y retiro de mediacaña existente y tornillo de fijación., suministro e instalación de piso laminado spc. incluye superlon reforzado 2mm, mantenimiento de cubierta metálica. incluye tornillos de fijación, Sika Flex para sellado y reemplazo de tejas en mal estado en alturas iguales o inferiores a 8 metros, suministro e instalación de marcos en aluminio soporte 60*60. incluye pintura electroestática, suministro e instalación de malla angeo en fibra de vidrio para mosquitos, roedores y aves., suministro e instalación de pie de amigo platina 6" x 10" reforzado con soporte transversal ,enchape pared egeo 20.5 x 20.5(inc. win y remate en aluminio),reflector de piso 250 w, pantalla led 24w 60x60 de incrustar, suministro e instalación de reflector de 100w,ducha calypso mezclador (sum e instalación),orinal mediano de colgar institucional color blanco conexión ø 5/8" ref 21-aa-8860 mancesa ó similar., cambio de acople sanitario, desmonte y reposición de manija de ducha, incluye retiro de sobrantes, taparregistro 20 x 20 (sum e instalación),suministro e instalación de desagüe con rejilla para lavamanos, sencillo, con rebose, metálico, cromado, marca a&a o similar., suministro e instalación de sifón en p, para lavamanos, metálico cromado. importado, marca a&a o similar., llave manguera 1/2" (sum e instalación),revisión y reparación tanque sanitario (lavado, cambio flotador y accesorios),grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, suministro e instalación sanitario de tanque avanti o similar ,suministro e instalación de árbol de entrada para tanque de sanitario, suministro e instalación de árbol de salida para tanque de sanitario, cielo raso plano drywall, esmalte sobre mampostería, suministro e instalación de sistema automatizado de control de arranque suave de presión con variador de frecuencia para




motobombas de 7.5 hp, incluye adecuación eléctrica a cero metros para su correcto funcionamiento incluye: tablero eléctrico de control y mando construido en lámina cold-rolled calibre 18 contara de: breaker general 50ª. - protección contra sobre carga, caída de fase, con indicador de salto de relé. - controlador de arranque mando bombas tipo plc siemens o similar. -tres variadores de frecuencia 7,5 hp 220v invertec o similar. - cuatro selectores manuales off automático, debidamente identificados con marquillas. - cuatro lámparas luminosas indicadoras de operación y apagado de las bombas. - circuito de control cable no. 18 awg en con amarres y montaduras plásticas. - plano de conexiones. - cerradura con llave.


Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	%

Actividades pendientes por ejecutar

No hay actividades pendientes se verifican cantidades de obra intervenidas, se realizan remates y observaciones.

Registro fotográfico

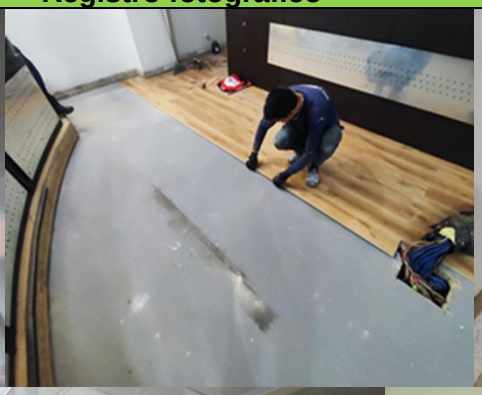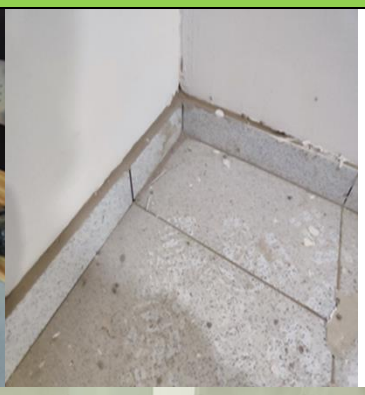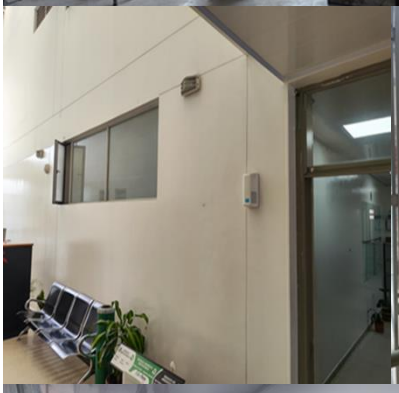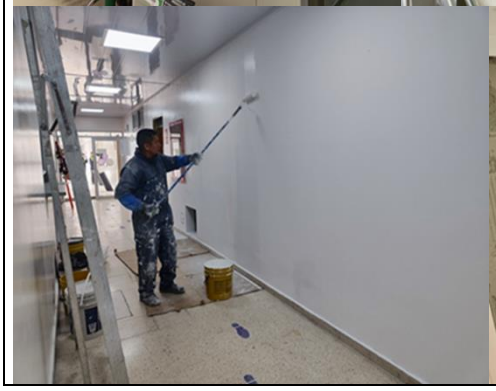


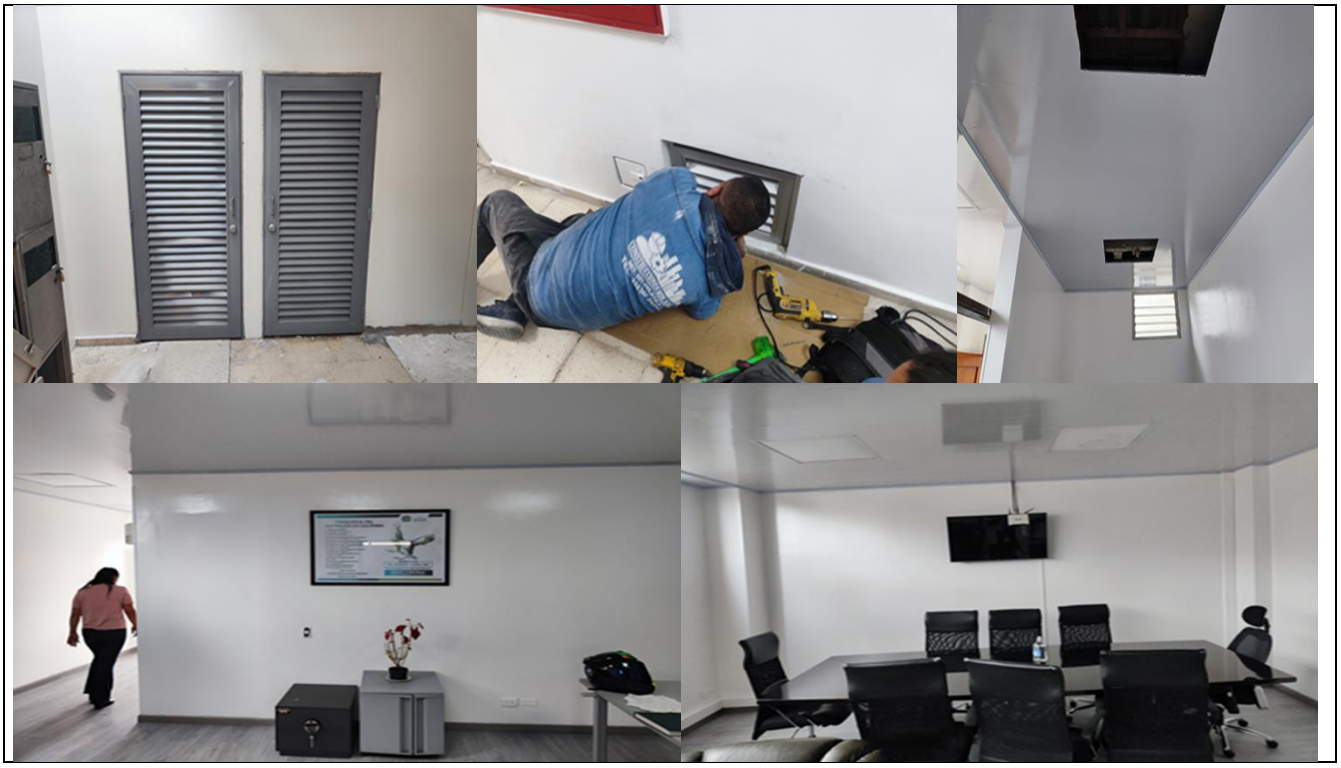


Tabla 43. Frente de Obra – CAI LISBOA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usaquén	Caí Lisboa	Cra 7 # 130 - 00	11/06/2024	30/07/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí Lisboa	Usaquén	Cra 7 # 130-00

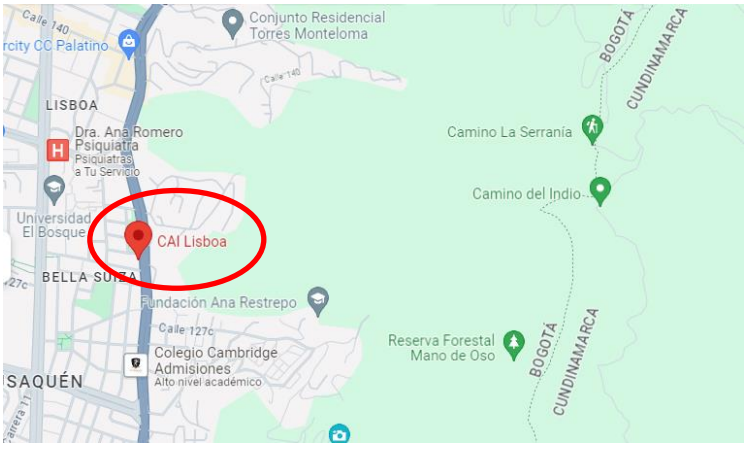Polígono de intervención:



Descripción de Actividades:
Frente de Obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100,5%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
NA

Registro fotográfico












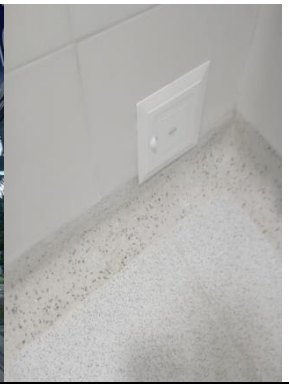



Tabla 44. Frente de Obra – CAI ROSALES

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Chapinero	Caí Rosales	Cra 1 # 76 - 80	11/06/2024	30/07/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Cai Rosales	Chapinero	Cra 1 # 76 - 80

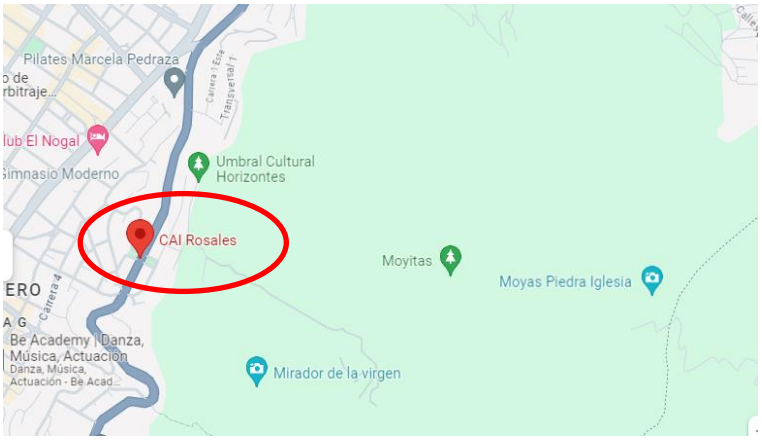Polígono de intervención:



Descripción de Actividades:
Frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
NA

Registro fotográfico


CAI

Tabla 45. Frente de Obra – CAI GRANADA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Chapinero	Caí Granada	Calle 64 # 3 - 00	11/06/2024	30/07/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí Granada	CHAPINERO	Calle 64 # 3 - 00

Polígono de intervención:



Descripción de Actividades:
Frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
NA

Registro fotográfico


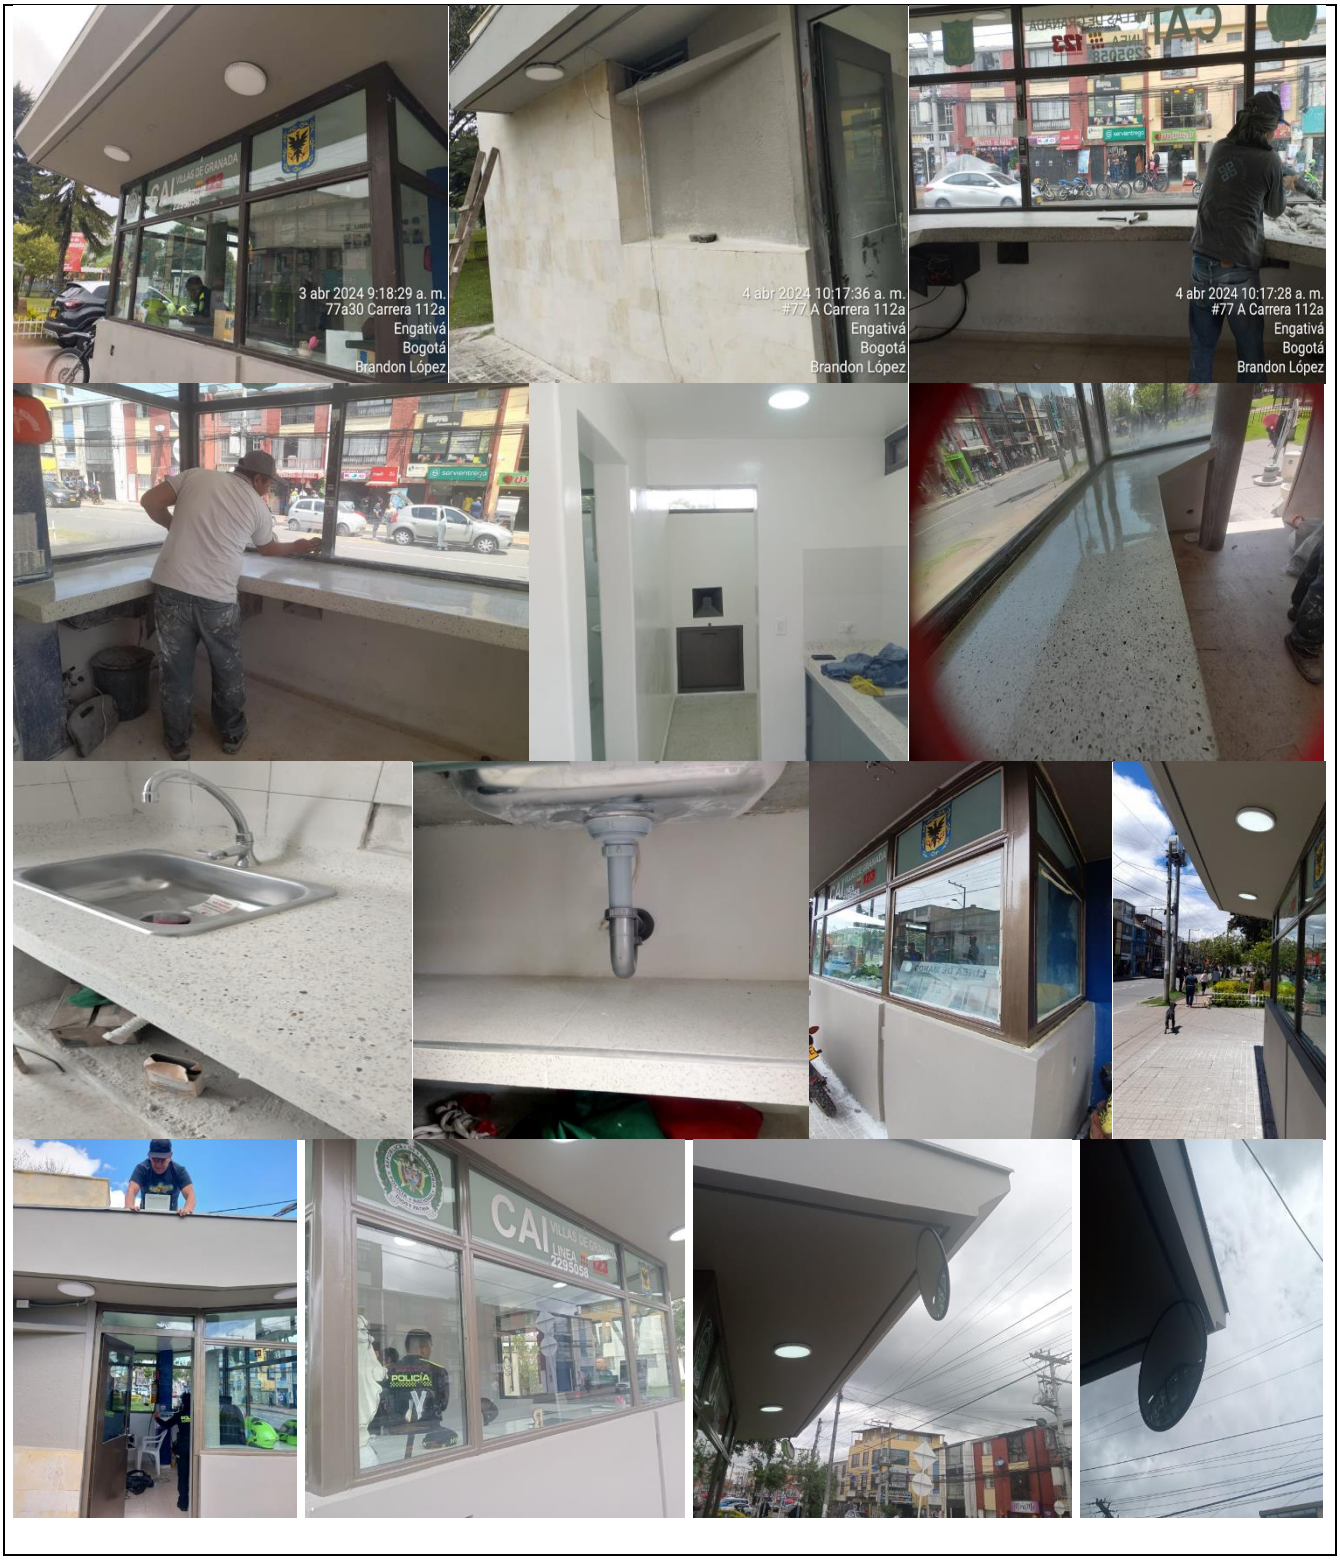

CAI VILLAS DE GRANADA
3 abr 2024 9:18:29 a. m.
77a30 Carrera 112a
Engativá
Bogotá
Brandon López
4 abr 2024 10:17:36 a. m.
#77 A Carrera 112a
Engativá
Bogotá
Brandon López
4 abr 2024 10:17:28 a. m.
#77 A Carrera 112a
Engativá
Bogotá
Brandon López
CAI
POLICÍA

Tabla 46. Frente de Obra – CAI LACHES

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Santa fé	Caí Laches	Diag 3C # 8-05	13/06/2024	30/07/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí Laches	SANTA FE	Diag 3C # 8 - 05

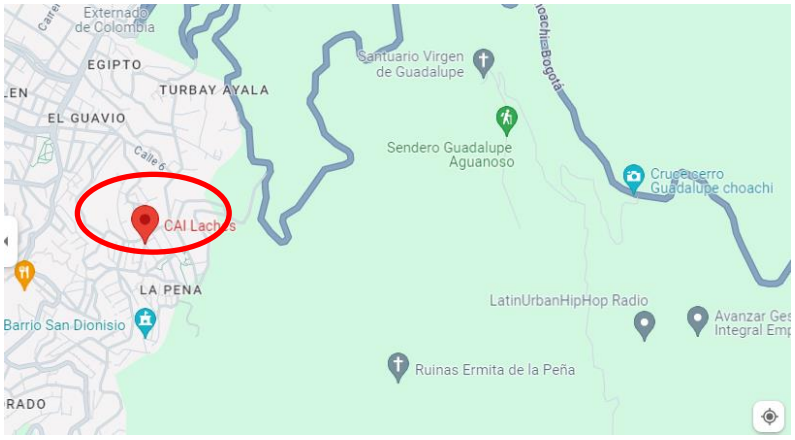Polígono de intervención:



Descripción de Actividades:
Frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
NA

Registro fotográfico



3 abr 2024 9:18:29 a. m.
77a30 Carrera 112a
Engativá
Bogotá
Brandon López
4 abr 2024 10:17:36 a. m.
#77 A Carrera 112a
Engativá
Bogotá
Brandon López
4 abr 2024 10:17:28 a. m.
#77 A Carrera 112a
Engativá
Bogotá
Brandon López

Tabla 47. Frente de Obra – CAI COLSEGUROS

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Santa Fé	Caí Colseguros	Cra 10 # 17-00	13/06/2024	30/07/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí Colseguros	SANTA FE	Cra 10 # 17-00

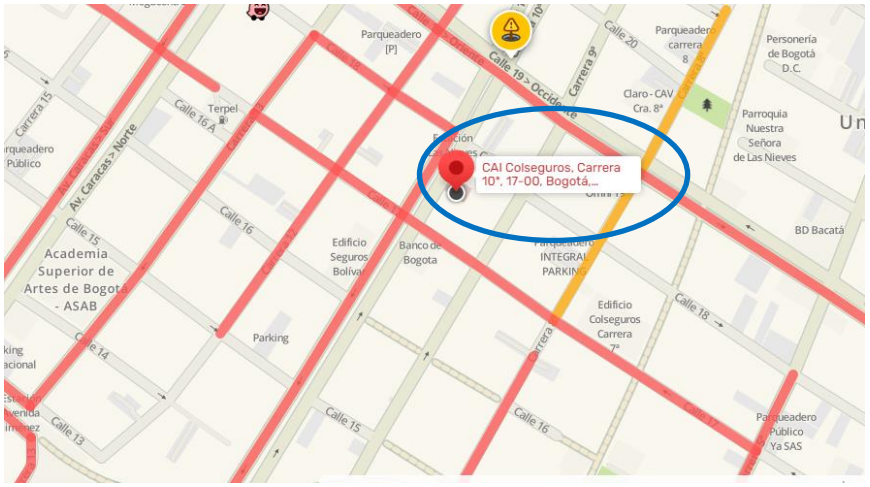Polígono de intervención:



descripción de actividades:
Frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
NA

Registro fotográfico



CAI
COLSEGUROS
LINEA 123
CAI
COLSEGUROS
LINEA 123

Tabla 48. Frente de Obra – COMANDO PM13 – BATALLON BARAYA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Puente Aranda	Batallón Baraya	Cra 50 # 18 -05	03/04/2024	03/05/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Batallón Baraya	PUENTE ARANDA	Cra 50 # 18 - 05

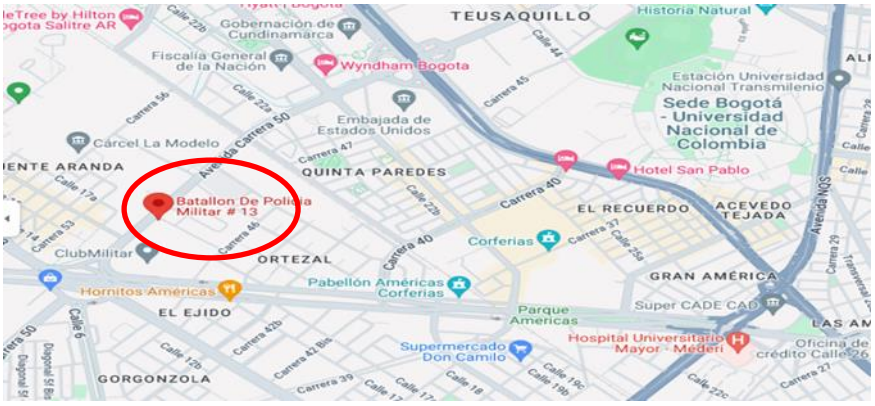Polígono de intervención:



Descripción de Actividades:
Frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

NA

Registro fotográfico


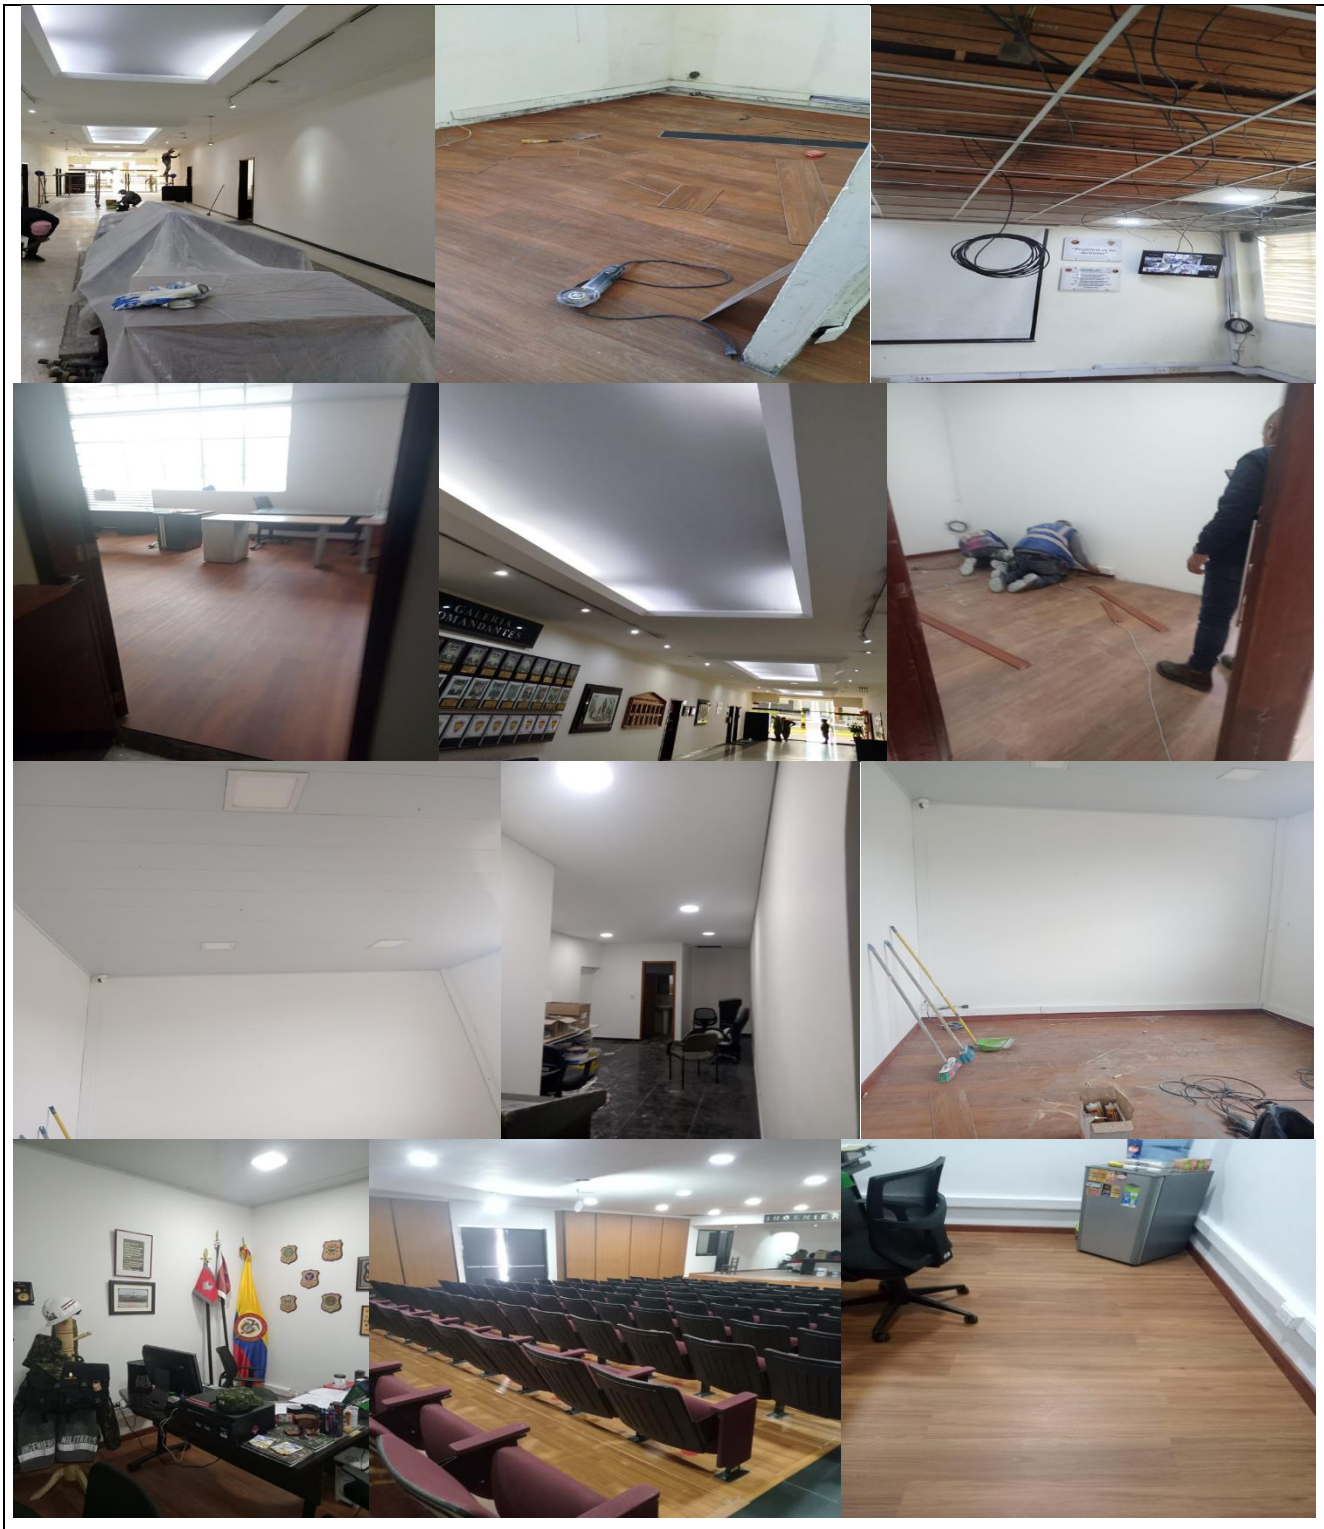


Tabla 49. Frente de Obra – CAI TUNAL

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Tunjuelito	Caí Tunal	Calle 48 C con Cra 24 sur	18/06/2024	18/07/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí Tunal	TUNJUELITO	Calle 48C con Cra24 sur

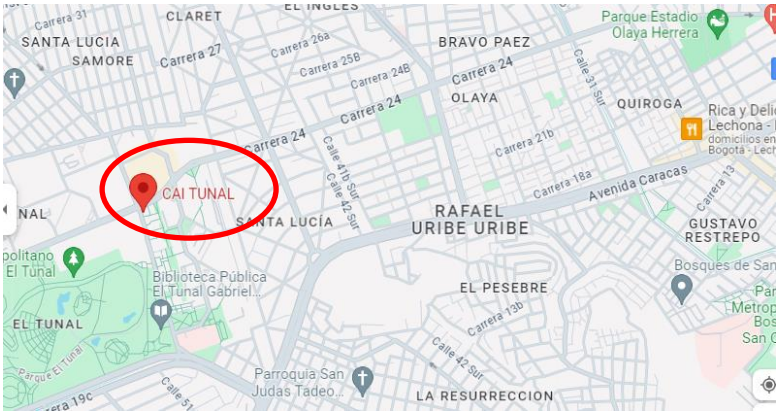Polígono de intervención:



Descripción de Actividades:
Frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
NA

Registro fotográfico

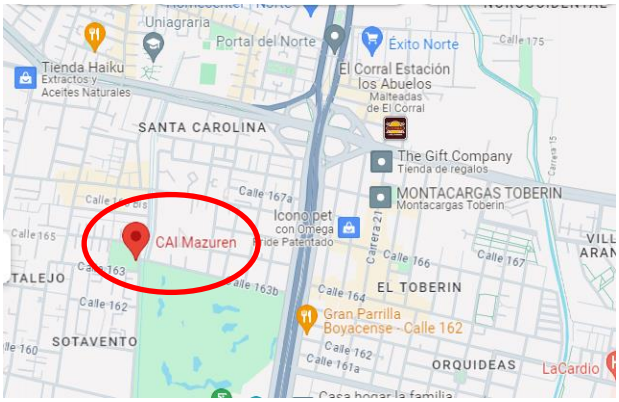


Tabla 50. Frente de Obra – CAI MAZUREN

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Suba	CAI Mazurén	Cra 54 # 163 - 1	22/06/2024	13/08/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CAI Mazurén	SUBA	Cra 54 # 163 - 1

Polígono de intervención:



Descripción de Actividades:
Frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
NA

Registro fotográfico

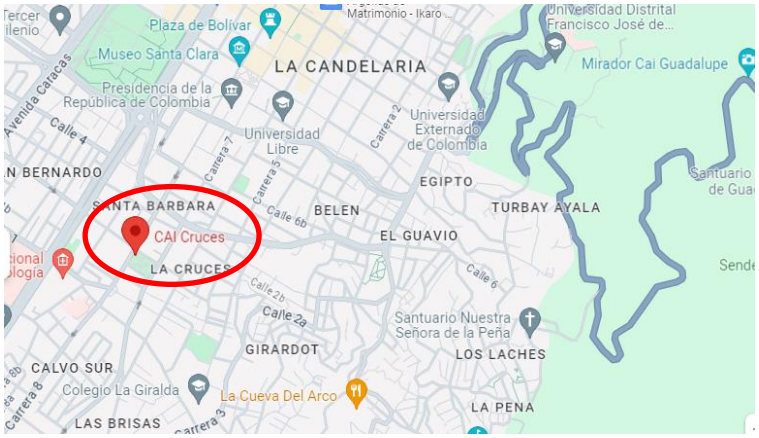


Tabla 51. Frente de Obra – CAI CRUCES

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Santa Fé	Caí Cruces	Cra 8 # 233	24/06/2024	15/08/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí Cruces	SANTA FE	Cra 8 # 233

Polígono de intervención:



Descripción de Actividades:
Frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
NA

Registro fotográfico



CAI
CRUCES
tel 2804111

Tabla 52. Frente de Obra – CAI BOLIVIA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
La Candelaria	Caí Bolivia	Calle 7 # 998	24/06/2024	15/08/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí Bolivia	LA CANDELARIA	Calle 7 # 998

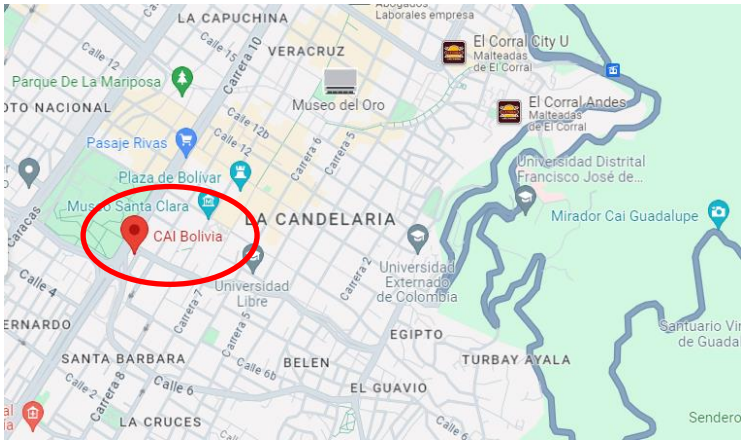Polígono de intervención:



descripción de actividades:
Frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
NA

Registro fotográfico



CAI BOLIVIA
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Tabla 53. Frente de Obra – CASA DE JUSTICIA USME ETAPA 2

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
USME	CASA DE JUSTICIA USME ETAPA 2	CALLE 137 C Sur # 2 A 43	29/05/2023	06/07/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CASA DE JUSTICIA USME ETAPA 2	Usme	CALLE 137 C Sur # 2 A 43

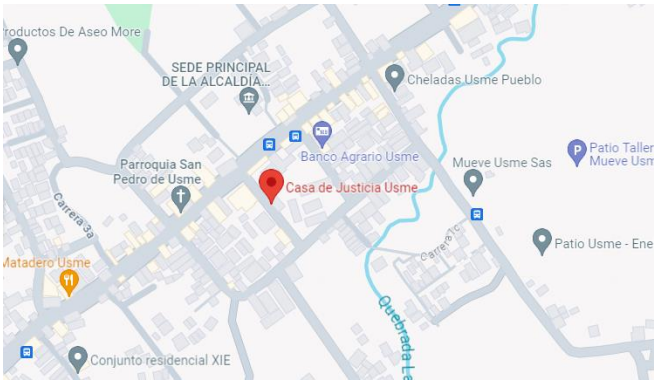Polígono de intervención:



Descripción de Actividades:
Frente terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

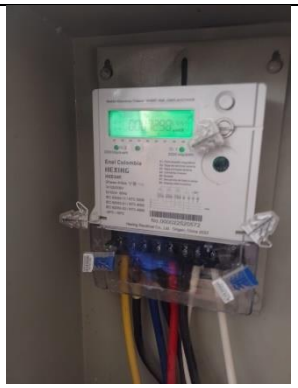
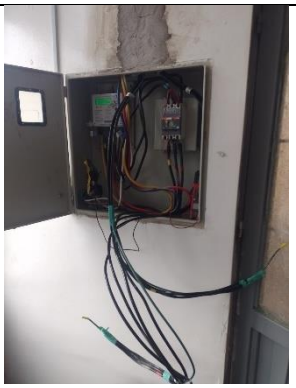
NA

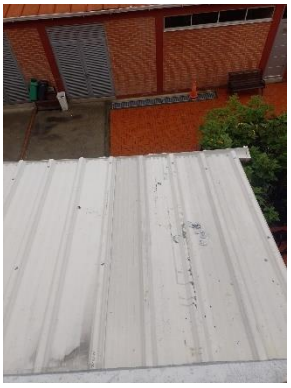
Registro fotográfico











30KVA
TRIFASICO

127.2
129.6
132.7
00000000


R S T
R S T

ULEFONE
SHOT ON ARMOR X5




Tabla 54. Frente de Obra – ESTACIÓN DE POLICÍA SAN CRISTÓBAL SALA CIEPS

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
San Cristóbal	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	Avenida 1 de mayo No. 1-40.	03/06/2024	03/07/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
E/SAN CRISTOBAL SALA CIEPS	SAN CRISTOBAL	AVENIDA 1 DE MAYO NO. 1-40

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

NA


Registro fotográfico










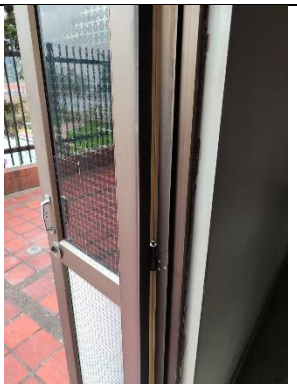

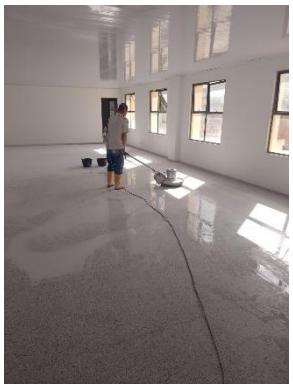





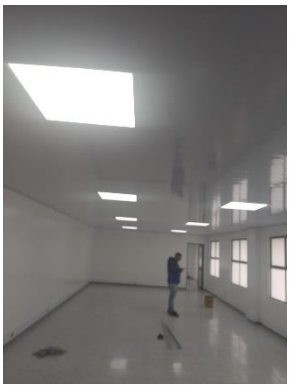


Tabla 55. Frente de Obra – ESTACIÓN DE POLICÍA USAQUÉN

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usaquén	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	Cl. 165 # 8A-43.	04/06/2024	27/09/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
ESTACION DE POLICIA USAQUEN	USAQUEN	Cl. 165 # 8A-43.

Polígono de intervención:




Descripción de Actividades:
Frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

NA

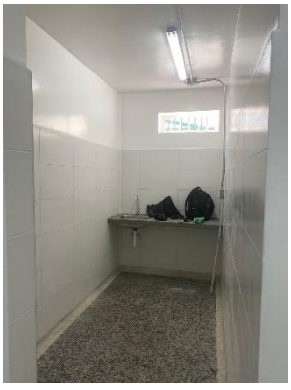Registro fotográfico


















bla 56. Frente de Obra – CASA DE JUSTICIA CAMPO VERDE

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Bosa	CASA DE JUSTICIA CAMPO VERDE	Cl. 85 SUR # 94.	17/06/2024	28/08/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CASA DE JUSTICIA CAMPO VERDE	BOSA	Cl. 85 SUR # 94.

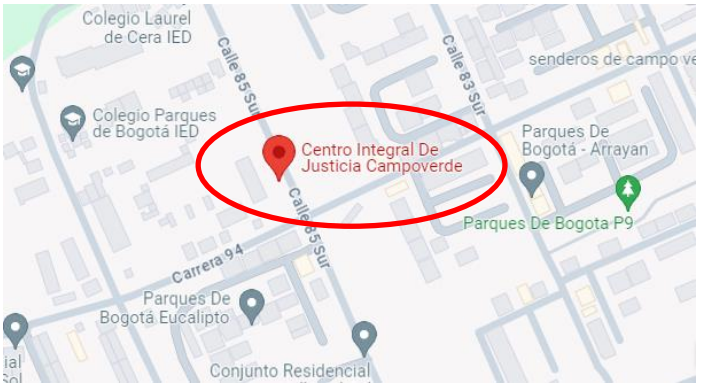Polígono de intervención:



descripción de actividades:

desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrantes), desmonte de push sanitarios, desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), salida + tomacorriente doble (gfci) luminex o equivalente para baños, laboratorios y cocinas – PVC, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 25w, 95-227v, 2320 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de interruptor doble, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de toma gfci, suministro e instalación de interruptor sencillo, cableado 1#10, cableado 2#10, suministro e instalación de salida + interruptor sencillo en tubería emt de 1/2" sobrepuesta, (longitud promedio de salida 3 ml), reinstalación de luminaria de incrustar o sobreponer, suministro e instalación de marcos en aluminio soporte 60*60. incluye pintura electroestática, instalación carpintería metálica, mantenimiento de portón en lámina cold rolled de 480 x 300 cm(incluye instalación de platinas de 3/16", pasadores, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura en esmalte , duro hueso y soldadura, en cada cara de los tubos de 1 " y en las 2 caras de la lámina), suministro e instalación de brazo cierrapuertas de 150 kg, suministro e instalación de brazos proyectante para ventana en aluminio, incluye ajuste y manija, suministro e instalación de lámparas herméticas, pantalla led 24w 60x60 de incrustar, suministro e instalación de lampara exterior tipo tortuga de 10w con rejilla color negro. (incluye bombillo), suministro e instalación de reflector de 100w, taparregistro 15 x 15 (sum e instalación), taparregistro 20 x 20 (sum e instalación), grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, suministro e instalación de push antivandálico para sanitario, cielo raso plano drywall, divisiones para baños en acero inoxidable, esmalte sobre mampostería, vinilo muros interiores 3 manos, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, cerradura puertas acceso principal, brazo retenedor forma no. 2, suministro e instalación manija galvanizada para puerta, mantenimiento de vidrios mediante el suministro e


instalación de película sanblasting, suministro de candado tipo alemán yale 870 o similar con gancho en acero endurecido doble bloqueo, anti segueta, suministro e instalación de fotocelda incluye elementos de fijación.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	98,10%	-1,09%

Actividades pendientes por ejecutar

Revisión eléctrica

Registro fotográfico

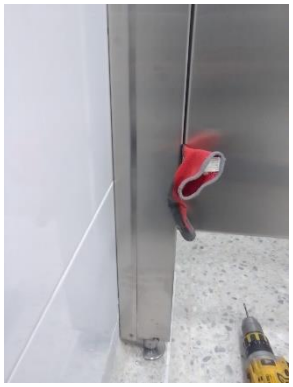





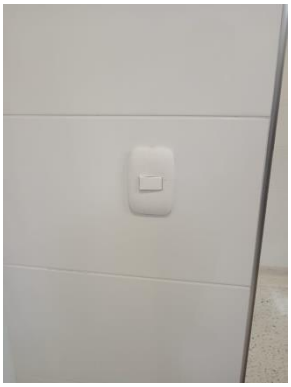
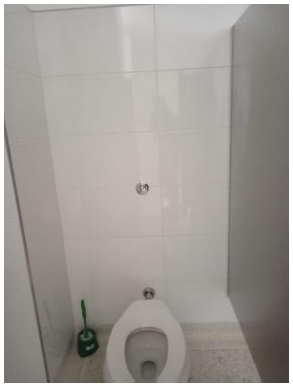
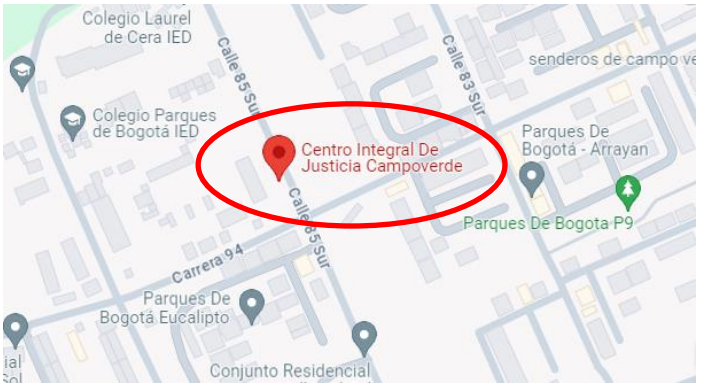





Tabla 57. Frente de Obra – CAE - CTP CAMPO VERDE

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Bosa	CAE T CTP CAMPO VERDE	Cl. 85 SUR # 94.		

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CAE Y CTP CAMPO VERDE	BOSA	Cl. 85 SUR # 94.

Polígono de intervención:



Descripción de Actividades:

demolición de muros (e=0,15) en altura de 17m, incluye cargue y transporte, desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), muro en ladrillo prensado santa fe o similar e = 12 cm, suministro e instalación de muro en lamina de superboard, doble cara, suministro e instalación de poyo para ducha o muebles con altura de 10 a 12 cm y con anchos iguales o inferiores a 12 cm, reparaciones hidráulicas PVC de 1/2" - 3/4" y 1", conducto evacuación gas 15 x 22, instalación interna punto adicional 6 m, soporte a la red, sellado y emboquillado de regata en muros y placas para tuberías de diámetros entre 1 1/2" a 4" sobre elementos de concreto, usando aditivos tipo sikadur 32 y sikatop 121 o similar, suministro e instalación de tubería pe al pe de 1/2". no incluye accesorios, suministro e instalación de accesorios para conexión de en tubería pe al pe de 1/2", salida + tomacorriente doble monofásica – PVC, reinstalación de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), pañete liso sobre muros 1:4, llenado y sellado de orificios pasadores de muros con mortero y epóxicos para anclajes tipo Sika anchofirx-2 o similar, realizando la previa imprimación de las paredes internas del orificio con adhesivo epóxicos para adherencia entre concreto fresco y endurecido, suministro y aplicación de pañete liso 1:4 lineal, (ancho máximo 0,6m). aplicado en alturas iguales o inferiores a 3m, picada de alistado endurecido para generar superficie rugosa para instalación de piso en cerámica, suministro e instalación de cubierta termoacústica tipo upvc e= 2,5mm o similar. incluye elementos de fijación y elementos para trabajo en altura. no incluye caballete, suministro e instalación de portón tipo persiana, incluye batiente en 2 hojas marco calibre 16, vanos tubulares, persiana doble pestaña machimbrada, pasadores, fallebas, chapa y terminado en pintura electroestática, suministro e instalación de malla expandida imt-20 cal. 14 instalada a modo de cielo raso soldada sobre reja de seguridad. incluye platina pisa malla de 1 1/2x3/16" anticorrosivo y esmalte, suministro e instalación de malla angeo en fibra de vidrio para mosquitos, roedores y aves, win de aluminio, suministro e instalación de enchape pared lineal, llave manguera 1/2" (sum e instalación), lamina plana Eternit 244 x 122 x 6, vinilo muros interiores 3 manos,

esmalte s/ lamina lineal, esmalte s/ marcos lamina, líneas tráfico 0.10, aplicación de pintura epóxica máximo 30cm, aplicación de pintura epóxica para pisos, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, suministro y aplicación de vinilo lineal para interiores 3 manos para anchos iguales o inferiores a 40 cm, remoción de cinta antideslizante. incluye retiro de material, suministro e instalación de lámina en acrílico de 5mm. incluye aplicación de Sika Flex, suministro e instalación de enchape cerámico para muros 30cmx60cm incluye pegante, boquilla y todos los elementos para su correcta ejecución, aseo en obra incluye implementos para su ejecución, suministro e instalación de estructura tipo pesada en alturas inferiores a 3 metros, suministro e instalación de acero de refuerzo, suministro e instalación de acero de refuerzo.


Estado programado

Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
60,50%	36,19%	- 21,34%



Actividades pendientes por ejecutar

vinilo muros interiores 3 manos, esmalte s/ lamina lineal, esmalte s/ marcos lamina, líneas tráfico 0.10, aplicación de pintura epóxica máximo 30cm, aplicación de pintura epóxica para pisos, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, suministro y aplicación de vinilo lineal para interiores 3 manos para anchos iguales o inferiores a 40 cm, remoción de cinta antideslizante. incluye retiro de material, suministro e instalación de lámina en acrílico de 5mm. incluye aplicación de Sika Flex, suministro e instalación de enchape cerámico para muros 30cmx60cm incluye pegante, boquilla y todos los elementos para su correcta ejecución, aseo en obra incluye implementos para su ejecución, suministro e instalación de estructura tipo pesada en alturas inferiores a 3 metros, suministro e instalación de acero de refuerzo, suministro e instalación de acero de refuerzo.

Registro fotográfico

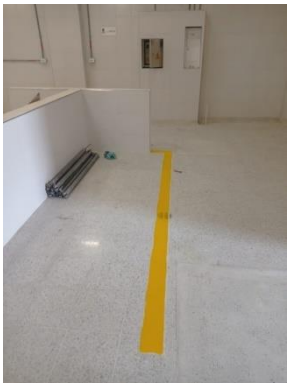



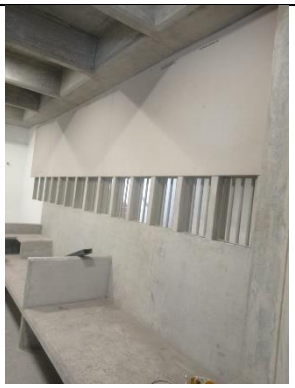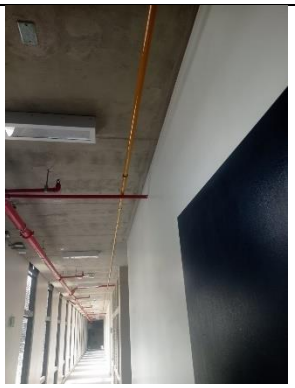

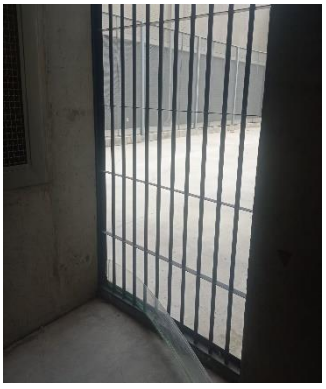
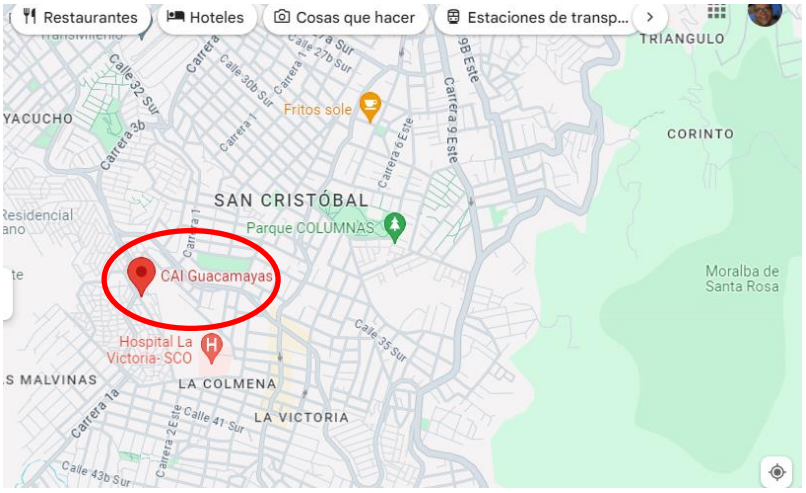




Tabla 58. Frente de Obra – CAI GUACAMAYAS

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
San Cristóbal	Caí Guacamayas	Calle 37ª sur No. 358	29/06/2024	15/08/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí Guacamayas	San Cristóbal	Calle 37ª sur No. 358

Polígono de intervención:



descripción de actividades:
Frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
NA.

Registro fotográfico



CAI AGUACAMAYAS
LINEA 123
ACAMAYAS
LINEA 123
06/07/2024 14:29

Tabla 59. Frente de Obra – CAI BACHUE

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Engativá	Caí Bachue	Calle 89 No. 95D - 75	10/07/2024	15/08/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí Bachue	ENGATIVA	Calle 89 No. 95D - 75

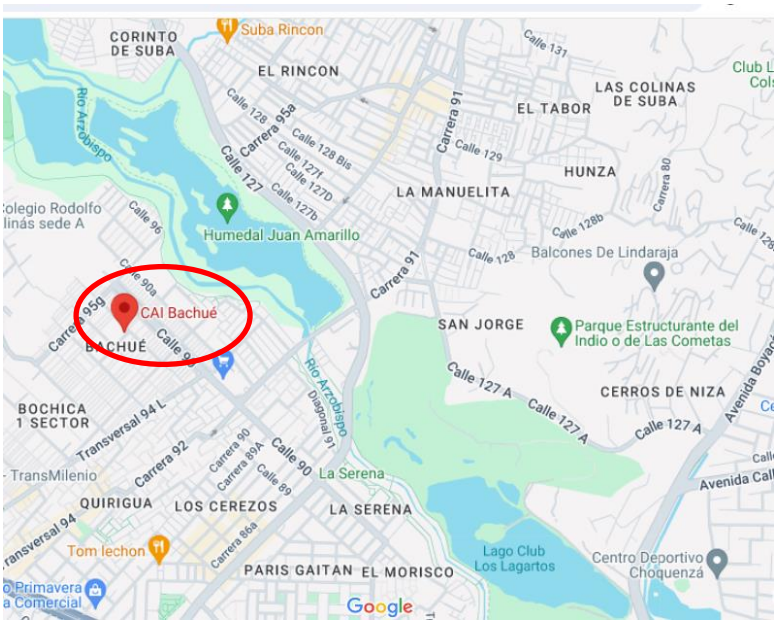Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de obra terminad.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
NA

Registro fotográfico









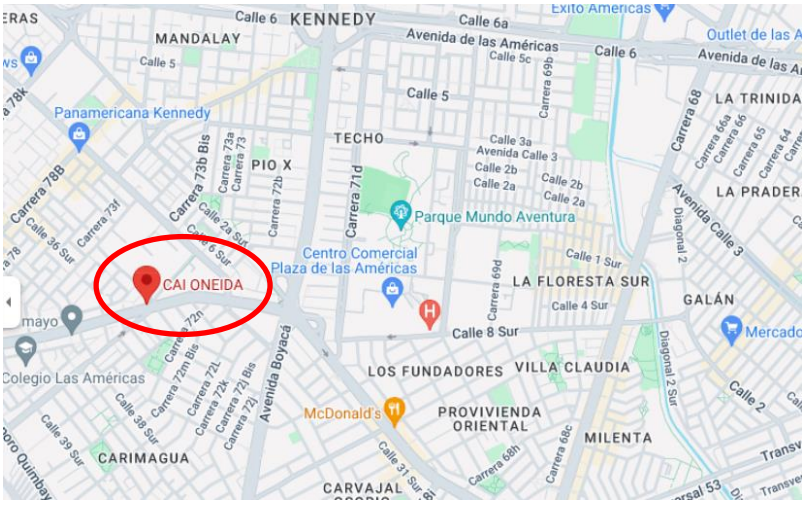


Tabla 60. Frente de Obra – CAI ONEIDA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Kennedy	Caí Oneida	Av. 1 de Mayo Calle 35b sur	10/07/2024	15/08/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí Oneida	KENNEDY	Av. 1 de Mayo Calle 35b sur

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de obra terminado.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
NA

Registro fotográfico



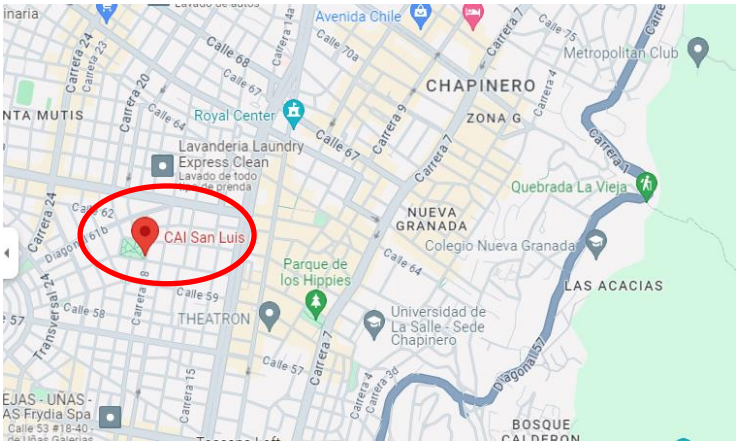


Tabla 61. Frente de Obra – CAI SAN LUIS

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Teusaquillo	Caí San Luis	AV Cra 13 Calle 60 bis	17/07/2024	17/08/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí San Luis	TEUSAQUILLO	AV Cra 13 Calle 60 bis


Polígono de intervención:



Descripción de actividades: Frente de obra terminado		
Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		





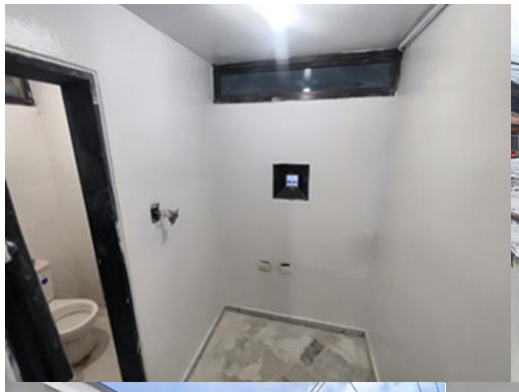



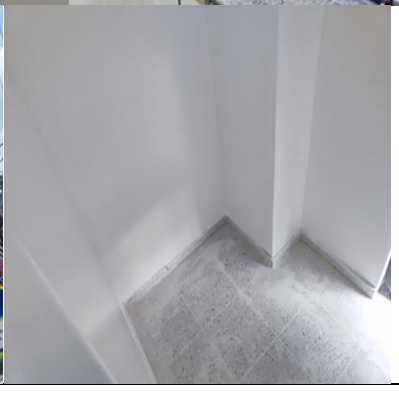



Tabla 62. Frente de Obra – CAI RESTREPO

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Antonio Nariño	CAI Restrepo	Diagonal 12 Sur # 16-50	25/07/2024	25/08/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CAI Restrepo	ANTONIO NARIÑO	Diagonal 12 Sur # 16-50

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

Instalación de loseta tipo IDU en el área perimetral

Registro fotográfico







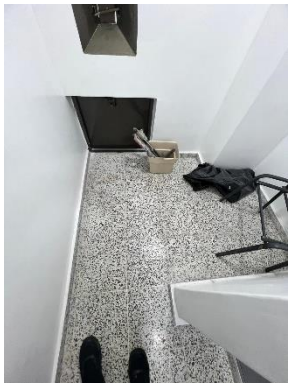









Tabla 63. Frente de Obra – CAI CAMPO VERDE

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Bosa	CAI Campo Verde	Calle 87 Sur # 90-01	11/07/2024	11/08/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CAI Campo Verde	BOSA	Calle 87 Sur # 90-01

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de obra terminado

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

NA

Registro fotográfico








CAI
CAMPO VERDE
POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

CAI
CAMPO VERDE



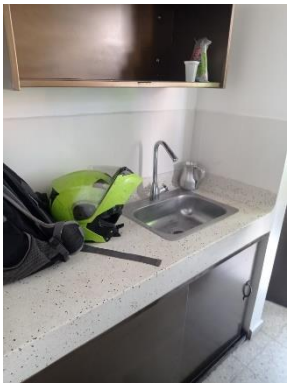
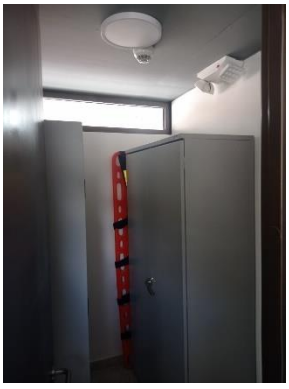
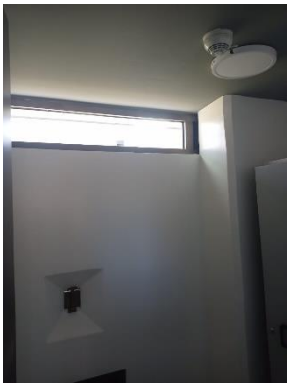
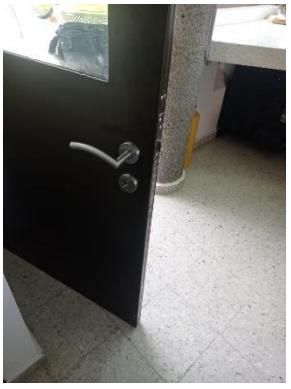
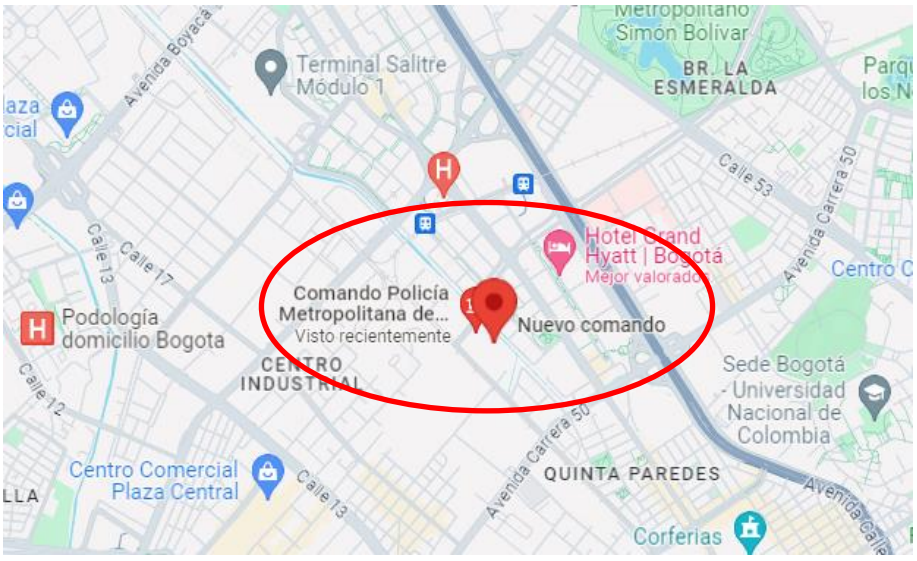






Tabla 64. Frente de Obra – Comando Policía Metropolitana de Bogotá- NUEVO COMANDO

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Teusaquillo	Comando Policía Metropolitana de Bogotá- Nuevo Comando	carrera 56 # 22-96	23/07/2024	01/10/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Comando Policía Metropolitana de Bogotá- NUEVO COMANDO	TEUSAQUILLO	carrera 56 # 22-96

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:

demolición de orinal ó lavamanos corrido (inc. retiro de sobr.). retiro y disposición final de residuos peligrosos incluye embalaje, transporte según cotización y normatividad secretaria distrital de ambiente. desmonte de push sanitarios, limpieza y desinfección de tanque en concreto para agua potable, muro en lámina de superboard, doble cara b 9 con espesor de 6 mm (incluye estructura, masilla acrílica y demás elementos para su correcta instalación), sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar. suministro e instalación de push antivandálico para sanitario, vinilo muros interiores 3 manos, líneas tráfico 0.10. remoción de pintura suelta manual, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, mantenimiento de vidrios mediante el suministro e instalación de película sanblasting, suministro e instalación de Sika Flex para reparaciones y mantenimientos, aseo en obra incluye implementos para su ejecución dentro de los espacios intervenidos, lavado y secado de piso flotante en porcelanato 60x60 e=2 cm con sistema de lavado a presión incluye todos los elementos para su ejecución (secciones de máximo 100 m2), desmonte piso flotante tipo porcelanato 60x60 e=2 cm incluye sistema succión para retiro de piezas, trasiego de piezas a zona de acopio incluye retiro plots e inventario de identificación. (secciones de máximo 100 m2), lavado de membrana impermeabilizante de acuerdo a ficha técnica del PROVEDOR con sistema de presión graduable incluye todos los elementos para su correcta ejecución (secciones de máximo 100 m2), reinstalación piso flotante tipo porcelanato 60x60 e=2 cm incluye

sistema succión para puesta de piezas, trasiego de piezas desde zona de acopio incluye instalación de plots. (secciones de máximo 100 m2), reinstalación piso flotante tipo porcelanato 60x60 e=2 cm incluye sistema succión para puesta de piezas, trasiego de piezas desde zona de acopio incluye instalación de plots. (secciones de máximo 100 m2), certificación de ascensores.


Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
10,20%	27,94%	17,74%


Actividades pendientes por ejecutar

Descripción de actividades:





demolición de orinal o lavamanos corrido (inc. retiro de sobr.). retiro y disposición final de residuos peligrosos incluye embalaje, transporte según cotización y normatividad secretaria distrital de ambiente. desmonte de push sanitarios, limpieza y desinfección de tanque en concreto para agua potable, muro en lámina de superboard, doble cara b 9 con espesor de 6 mm (incluye estructura, masilla acrílica y demás elementos para su correcta instalación), sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar. suministro e instalación de push antivandálico para sanitario, vinilo muros interiores 3 manos, líneas tráfico 0.10. remoción de pintura suelta manual, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, mantenimiento de vidrios mediante el suministro e instalación de película sanblasting, suministro e instalación de Sika Flex para reparaciones y mantenimientos, aseo en obra incluye implementos para su ejecución dentro de los espacios intervenidos, lavado y secado de piso flotante en porcelanato 60x60 e=2 cm con sistema de lavado a presión incluye todos los elementos para su ejecución (secciones de máximo 100 m2), desmonte piso flotante tipo porcelanato 60x60 e=2 cm incluye sistema succión para retiro de piezas, trasiego de piezas a zona de acopio incluye retiro plots e inventario de identificación. (secciones de máximo 100 m2), lavado de membrana impermeabilizante de acuerdo a ficha técnica del PROVEDOR con sistema de presión graduable incluye todos los elementos para su correcta ejecución (secciones de máximo 100 m2), reinstalación piso flotante tipo porcelanato 60x60 e=2 cm incluye sistema succión para puesta de piezas, trasiego de piezas desde zona de acopio incluye instalación de plots. (secciones de máximo 100 m2), reinstalación piso flotante tipo porcelanato 60x60 e=2 cm incluye sistema succión para puesta de piezas, trasiego de piezas desde zona de acopio incluye instalación de plots. (secciones de máximo 100 m2), Lavado de fosos aguas negras y aguas lluvias, lavado de tanques de agua potable y agua tratada.

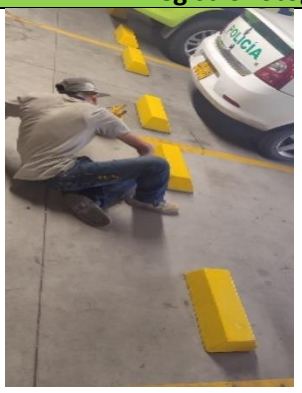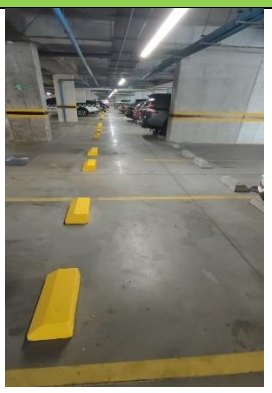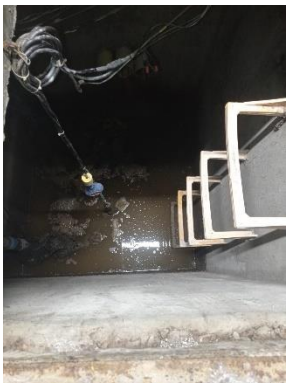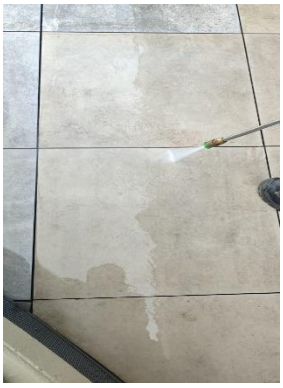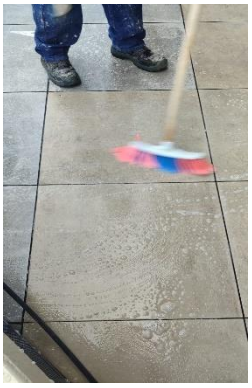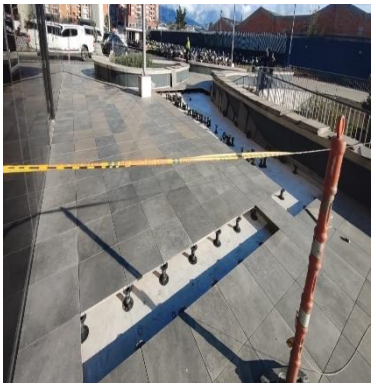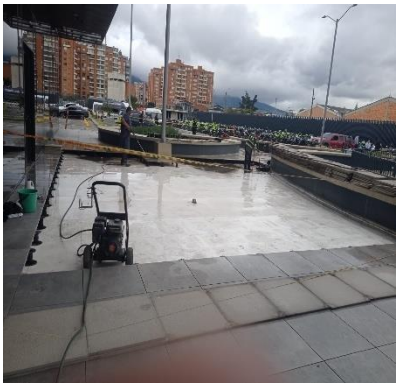
Registro fotográfico

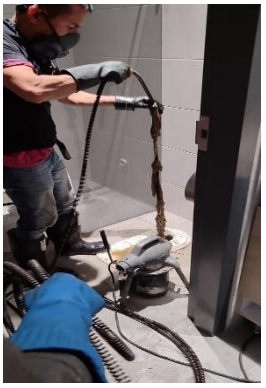
















Tabla 65. Frente de Obra – CAI RAMAJAL

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
San Cristóbal	CAI Ramajal	Calle 30 # 9a-00 Este	29/07/2024	29/08/2024

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CAI Ramajal	San Cristóbal	Calle 30 # 9a-00 Este

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:
Frente de obra terminado


Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

NA

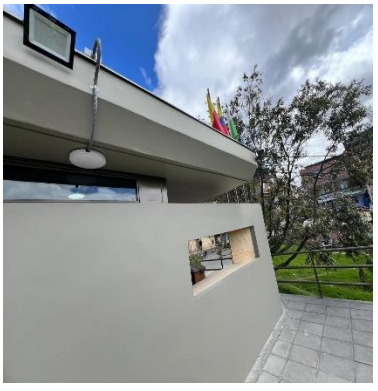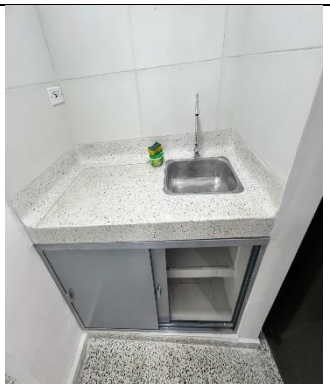
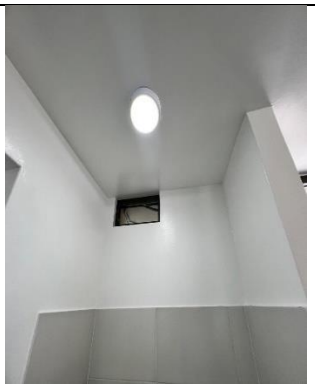
Registro fotográfico















Durante el periodo del presente informe, se presentaron varias actividades que precisaban mitigar el impacto negativo al funcionamiento normal de los equipamientosde las diferentes localidades de Bogotá. La cuadrilla y la línea de emergencia atendióla ejecución de estas actividades que se relacionan a continuación, con el seguimientoy acompañamiento por parte de la Interventoría

Tabla 66. Emergencias atendidas en el periodo.

No.	AGENCIA	BOLSA ASIGNADA	FRENTE	VALOR EMERGENCIA	SALDO EMERGENCUA
			CAI YOMASA	$ 2.844.166,00	
			VIVIENDA FISCAL MODELIA	$ 269.975,00	
			ESTACION DE POLICIA USAQUEN	$ 2.624.974,00	
			ESTACION DE POLICIA USAQUEN	$ 529.639,00	
			ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	$ 6.343.134,00	
			ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	$ 3.443.814,00	
			EPOL RAFAEL URIBE	$ 472.386,00	
			CAI ESTADERO	$ 9.593.071,00	
			ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	$ 133.392,00	
			EPOL CIUDAD BOLIVAR	$ 389.885,00	
			EPOL RAFAEL URIBE	$ 793.702,00	
			VIVIENDA FISCAL DE CAMINOS DE MODELIA APTO 210	$ 178.876,00	
			VIVIENDA FISCAL DE CAMINOS DE MODELIA	$ 303.549,00	
			EPOL RAFAEL URIBE	$ 558.317,00	
			SIPOL	$ 738.677,00	
			ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	$ 4.985.342,00	
			ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO	$ 2.324.623,00	
			EP RAFAEL URIBE (EMER-032)	$ 10.148.217,00	
			ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO	$ 2.324.623,00	
			EP RAFAEL URIBE (EMER-032)	$ 10.148.217,00	
			CAI SALITRE (EMER 41)	$ 3.285.146,00	
			CAI ANTONIA SANTOS (EMER36)	$ 6.185.119,00	
			ESTACION POLICIA USME (EMER37)	$ 8.642.738,00	
			SIPOL	$ 1.792.457,00	
			ESTACION POLICIA KENEDY	$ 842.906,00	
			ESTACION POLICIA KENEDY	$ 2.216.227,00	
			CAI ROMA	$ 702.735,00	
			EPOL CIUDAD BOLIVAR	$ 167.177,00	
			EPOL CIUDAD BOLIVAR	$ 605.558,00	
			CAI MIRADOR	$ 1.333.472,00	
			EPOL CIUDAD BOLIVAR	$ 6.498.251,00	
			CAI SANTE MARIA DEL LAGO	$ 2.872.166,00	
			CAI QUIRIGUA	$ 3.261.218,00	
			CAI SANTO DOMINGO	$ 2.608.974,40	
			EP PUENTE ARANDA (68)	$ 596.493,00	
			EP SANTAFA FE (69)	$ 2.804.385,00	
			EP BARRIOS UNIDOS	$ 3.660.808,00	
			COMANDO MEBOG (71)	$ 530.496,80	
			CAI FONTANAR (EMER 72)	$ 3.261.218,00	
			CAI RINCON (EMR) 73	$ 3.062.649,00	
			EP SANTA FE (EMER 74)	$ 677.372,00	

1	MEBOG	$	399.800.954,00	EP TUNJUELITO (EMER-077)	$	3.347.761,00	$ 171.774.711,79
				COMANDO MEBOG (EMER 78)	$	3.348.622,00	
				EP TUNJUELITO (79- Grietas y soldadura de rejas)	$	623.321,00	
				EP USAQUEN(80- Bombas y fuga en parqueadero)	$	5.791.788,00	
				CAI ALTAMIRA - fuga	$	391.629,00	
				EP SANTA FE - (90- celdas)	$	398.819,00	
				EP USME - (89 - hidro sanitaria baños)	$	2.822.949,00	
				CAI NAVARRA- electrica	$	1.110.458,00	
				EP PUENTE ARANDA (84- fuga parqueadero-cuarto electrico)	$	1.810.951,00	
				EP PUENTE FONTIBON (93 - ppl - baños)	$	141.603,00	
				CAI TOBERIN (97 - sondeos)	$	282.267,00	

				FUERTE DE CARABINEROS PARQ NACIONAL	$	1.800.000,00	
				EP USAQUEN (Revisión de equipos)	$	200.000,00	
				CAI FERIAS (Sondeos)	$	350.000,00	
				EP PUENTE ARANDA (94- fuga baño ofc y sotano)	$	1.569.737,00	
				EP SANTA FE (sondeo,pus y reflectores)	$	4.800.000,00	
				EP PUENTE ARANDA (96- filtración de agua alojamiento 3 piso)	$	7.212.398,00	
				CAI SAN CARLOS (Luminarias)	$	2.040.000,00	
				EP TUNJUELITO (Reparaciones hidraulicas)	$	1.200.000,00	
				CAI GALAN (Humedades en muro, sondeos)	$	1.200.000,00	
				SIPOL TEUSAQUILLO(sondeos)	$	240.000,00	
				EP BOSA (reflectores)	$	2.400.000,00	
				CAI FERIAS (Mantenimiento de tablero, luminarias y tomas)	$	2.200.000,00	

Página 1

				EP KENNEDY(Sondeos plaza de armas)	$	320.000,00	
				EP ENGATIVA(Sala de moritoreo)	$	1.200.000,00	
				EP BOSA (Mant 2 Bombas - flauta)	$	3.850.000,00	
				EP USME (Bombas - flauta)	$	3.000.000,00	
				EP TUNJUELITO (Filtración de agua alojamiento ofc)	$	680.000,00	
				EP USAQUEN (Celdas - soldaduras)	$	2.300.000,00	
				CAI GUAVIO (luminarias- mnatenimioento tablero)	$	3.600.000,00	
				CAI GRANJAS (Revisión eléctrica)	$	350.000,00	
				CAI GUAIMARAL (Revisión eléctrica)	$	350.000,00	
				E.P. SUBA (Revisión eléctrica)	$	348.000,00	
				E.P. USME (Revisión eléctrica- reflectores)	$	3.600.000,00	
				EP TUNJUELITO (Filtración de agua humedad)	$	1.600.000,00	

			EP TUNJUELITO (Filtración de agua humedad)	$	1.600.000,00		
			SIPOL TEUSAQUILLO(fuga de agua baño)	$	400.000,00		
			CAI SAN CARLOS (Fuga de aparatos sanitarios)	$	280.000,00		
			E.P. SUBA (FILTRACION BAÑO- SONDEO)	$	360.000,00		
			EP TUNJUELITO (Sondeos baño alojamiento)	$	250.000,00		
			EP TUNJUELITO (Sondeos,Limpieza de carcamo, cajas-celdas)	$	1.200.000,00		
			EP TUNJUELITO (Mantenimiento acceso vehicular - talanquera)	$	1.000.000,00		
			CAI RINCON (Cambio de manto cubierta)	$	6.000.000,00		
			CAI ALCAZERES (Mantenimiento de tablero y cambio de luminarias y reflectores)	$	3.000.000,00		
			E.P. ENGATIVA(Mantenimiento.- Tanque elevado)	$	300.000,00		
			E.P. FONTIBON (Humedad ofc sigin)	$	1.600.000,00		
			TOTAL EMERGENCIAS MEBOG	**$**	**183.153.608,20**		
			24,50%	**$**	**44.872.634,01**		
			TOTAL EMERGENCIAS MEBOG	**$**	**228.026.242,21**		

BRIGADA	$	60.000.000,00	PM13	$	3.035.015,00		
			CANTON NORTE - ILUMINACION OFC COMANDO	$	5.390.002,0000		
			PM13	$	7.408.186,0000		
			BASER 13 CANTON NORTE(EMER 42)	$	15.292.047,0000		
			BASER 13 CANTON NORTE(INST SANITARIAS 6")	$	3.000.000,0000	$	17.514.063,75
			TOTAL EMERGENCIAS BRIGADA	**$**	**34.125.250,00**		
			24,50%	**$**	**8.360.686,25**		
			TOTAL EMERGENCIAS BRIGADA	**$**	**42.485.936,25**		
			CASA DE JUSTICIA				
			CASA DE JUSTICIA BOSA	$	544.567,00		
			CJ SAN CRISTOBAL	$	1.049.751,00		
			CJ MARTIRES	$	294.386,00		
			CJ USME	$	2.614.552,00		
			CJ MARTIRES	$	2.191.763,00		
			CJ SAN CRISTOBAL	$	3.125.007,00		
			CJ CIUDAD BOLIVAR	$	1.384.756,00		
			CJ TUNJUELITO (87- falla electrica)	$	831.201,00		
			CJ SAN CRISTOBAL	$	1.280.000,00		
			CJ TUNJUELITO (Llave jardinera)	$	140.000,00		
			TOTAL CASA DE JUSTICIAS	$	13.455.983,00		
JUSTICIA	$	26.100.000,00	**CASA DE J J RESTURATIVA-URI-CER**				
			EMERGENCIA URI DE PUENTE ARANDA	$	4.927.000,0000		
			EMERGENCIA CTP URI PUENTE ARANDA	$	923.486,0000		
			CAMPO VERDE	$	1.315.000,0000		
			CJ RESTAURATIVA SANTAFE	$	381.820,0000		
			CJ USME	$	1.598.892,00		
			EMERGENCIA URI DE PUENTE ARANDA	$	936.973,00		
			EMERGENCIA URI DE PUENTE ARANDA	$	2.110.000,00		
			CESPA- PUNTO HIDRAULICO	$	948.711,00		
			CAMPO VERDE- PUSH SANITARIO	$	565.776,00	-$	29.847.390,44
			CAMPO VERDE- SOLDADURA MUEBLES	$	363.327,00		
			CAMPO VERDE- SISTEMA DE PRESION Y ELECTRICO	$	3.458.489,00		
			CJ CAMPO VERDE (EMER 76)	$	2.129.513,00		
			URI- CTP (Bodega - desmonte)	$	5.821.581,00		
			URI- CTP (llave)	$	601.112,00		
			CJ CAMPO VERDE (Bombas,niples,flautas)	$	4.500.000,00		
			CJ CAMPO VERDE (Cambio de reguladores)	$	300.000,00		
			CJ CAMPO VERDE (Mantenimiento de bombas, cambio de pretostato y flotador)	$	600.000,00		

		TOTAL CASA RESTAURATIVAS -URI-CER	$ 31.481.680,00	
		TOTAL EMERGENCIAS JUSTICIA	$ 45.727.663,00	
		24,50%	$ 11.203.277,44	
		TOTAL EMERGENCIAS JUSTICIA	$ 56.930.940,44	
		C4	$ 2.568.353,00	
		PODA DE CESPED	$ 1.093.191,00	
		C4	$ 429.810,00	
		C4	$ 376.732,00	
		C4	$ 2.038.121,00	
		C4	$ 7.641.826,00	
		C4	$ 593.776,00	
C4		C4	$ 1.630.496,80	-$ 27.035.797,25
		C4	$ 589.598,00	
		C4	$ 413.596,00	
		C4 (Mantenimiento de bombas y limpieza caja)	$ 1.900.000,00	
		C4 (Llave jardinera)	$ 140.000,00	
		C4 (Mantenimiento de bombas y limpieza caja)	$ 2.300.000,00	
		TOTAL EMERGENCIAS C4	$ 21.715.499,80	
		24,50%	$ 5.320.297,45	
		TOTAL EMERGENCIAS C4	$ 27.035.797,25	
CER		CER - CELDAS	$ 823.257,00	
		CER	$ 5.299.492,00	
		CER	$ 2.110.000,00	$ 10.249.772,51
		TOTAL EMERGENCIAS CER	$ 8.232.749,00	
		24,50%	$ 2.017.023,51	
		TOTAL EMERGENCIAS CER	$ 10.249.772,51	
TOTAL DE BOLSAS	$ 27.154.356.286,00	TOTAL DE EMERGENCIAS ATENDIDAS	$ 337.692.891,40	$ 158.457.835,11

Tabla 67. Emergencias conciliadas en el periodo

- Las emergencias se concilian en un lapso de tiempo mínimo de 3 días, en el momento que es autorizada por la supervisión del contrato, posteriormente se legalizan para la elaboración del acta de no previsto de emergencias.

No.	AGENCIA	FRENTE	VALOR EMERGENCIA
		E DE CARABINEROS PARQ NACIONAL(EMER 99) 1 POSTE PERO FU	$ 4.071.025,00
		EP USAQUEN (Revisión de equipos)105	$ 6.268.301,00
		EP PUENTE FONTIBON (100 - ppl - baños) 100	$ 1.109.277,00
		EP SANTA FE (sondeo,pus y reflectores)110	$ 3.679.941,00
		CAI SAN CARLOS (Luminarias)112	$ 3.261.218,00
		EP TUNJUELITO (Reparaciones hidraulicas)111	$ 1.200.000,00
		CAI GALAN (Humedades en muro, sondeos)	$ 1.111.746,00
		SIPOL TEUSAQUILLO(sondeos)120	$ 1.102.224,00
		EPOL FONTIBON (EMER 104 CELDAS)	$ 2.722.901,00
		EP BOSA (reflectores)	$ 2.214.075,00
		CAI FERIAS (Mantenimiento de tablero, luminarias y tomas)113	$ 3.261.218,00
		EP KENNEDY(Sondeos plaza de armas)115	$ 557.319,00
		EP BOSA (Mant 2 Bombas - flauta)119	$ 3.787.280,00
		EP USME (Bombas - flauta)114	$ 3.787.280,00
		EP TUNJUELITO (Filtración de agua alojamiento ofc)116	$ 1.248.022,00
		EP USAQUEN (Celdas - soldaduras)99	$ 2.300.000,00

1	MEBOG	CAI GUAVIO (luminarias- mnatenimioento tablero)118	$ 3.261.218,00
		CAI GRANJAS (Revisión eléctrica)144	$ 242.376,00
		CAI GUAIMARAL (Revisión eléctrica)143	$ 242.376,00
		E.P. USME (Revisión eléctrica- reflectores) 108	$ 8.553.234,00
		EP TUNJUELITO (Filtración de agua humedad)127	$ 1.938.918,00
		CAI SAN CARLOS (Fuga de aparatos sanitarios)125	$ 225.033,00
		EPOL FONTIBON (falla electrica subcomando)134	$ 928.735,00
		E.P. SUBA (FILTRACION BAÑO- SONDEO)124	$ 283.499,00
		EP TUNJUELITO (Sondeos,Limpieza de carcamo, cajas-celdas)130	$ 1.327.677,00
		EP TUNJUELITO (Mantenimiento acceso vehicular - talanquera)129	$ 303.329,00
		CAI RINCON (Cambio de manto cubierta)131	$ 5.402.077,00
		CAI ALCAZERES (Mantenimiento de tablero y cambio de luminarias y reflectores)128	$ 3.020.384,00
		E.P. FONTIBON (Humedad ofc sigin) 132	$ 1.238.287,00
		CAI SAN JOSE DE BAVARIA (Mantenimiento de tablero y cambio de luminarias y reflectores)137	$ 2.520.341,00
		CAI TORRES BLANCA (Mantenimiento de tablero y cambio de luminarias y reflectores,cerradura de baño, sondeos y limpieza de caja)139	$ 2.422.570,00
		CAI JABOQUE (Mantenimiento de tablero y cambio de luminarias y reflectores)138	$ 2.311.194,00
		EP USME (Carrotanque de agua - 24 m3)142	$ 1.430.000,00
		E.P. ENGATIVA(sin servicio de luz y agua) 140	$ 839.165,00
		CAI TELECOM(MANTENIMIENTO PUERTA -MANIJA) 145	$ 265.454,00
		CAI GUAYMARAL (MANTENIMIENTO PUERTA MANIJA) 146	$ 265.454,00
		CAI SANTA LIBRADA (MANTENIMIENTO PUERTA -MANIJA) 147	$ 265.454,00
		EPOL RAFAEL URIBE (Hidraulica celdas - cambio de push)141	$ 4.143.707,00
3	JUSTICIA	**CASA DE JUSTICIA**	
		CJ TUNJUELITO (101- humedad ofc)	$ 638.231,00
		CJ SAN CRISTOBAL) 123	$ 2.807.500,00
		CJ TUNJUELITO (Llave jardinera)148	$ 176.125,00
		CJMARTIRES (Bombas)117	$ 1.854.912,00
		CJ MARTIRES (CAMBIO DE CERRADURAS)149	$ 395.392,00
		CASA DE J J RESTURATIVA	
		CESPA ((MANTENIMIENTO TABLERO CAMBIO DE TOMA Y CLAVIJA) 150	$ 846.057,00
		CJ LA VICTORIA falla electtrica)126	$ 954.360,00
4	C4	c4 (fugas de agua)121	$ 1.041.798,00
		C4 (Mantenimiento de bombas y limpieza caja)135	$ 2.898.390,00
		C4 (Mantenimiento de vejigas)136	$ 5.024.122,00
		C4 (Mantenimiento de vejigas)162	$ 1.945.266,00

6. RECURSOS UTILIZADOS

Durante el desarrollo de los Contratos de Obra e Interventoría, cada una de las partes cuenta con el talento humano que se relaciona a continuación:

6.1 PERSONAL AUTORIZADO POR SDSCJ:

Tabla 68. Personal SDSCJ


CARGO	NOMBRE
Apoyo a la Supervisión	EDUIN ANTONIO MORENO SHET
Supervisión	RAFAEL OCHOA ORTIZ

6.2 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el desarrollo del compromiso contractual, TOTTAL INC SAS BIC, cuenta con el siguiente personal mínimo. Anexo 11.8

Tabla 69. Personal Tottal Inc SAS BIC.

CARGO	CANTIDAD	NOMBRE	Nombre
Director de Interventoría	1	*FERNANDO JIMÉNEZ POLO*	*FERNANDO JIMÉNEZ POLO*
Residente de Interventoría 1	1	*JUAN CARLOS BERROCAL LÓPEZ*	*MARIA PIEDAD ESPINOSA VIRGÜEZ*
Residente de Interventoría 2	1	*BENJAMIN ANTONIO HERNANDEZ G*	*ALEXIS REDONDO PEÑA*
Inspector 1	1	*YAJAIRA RINCÓN PINZÓN*	*DIEGO ALEXIS FORERO BELTRAN*
Inspector 2	1	*WILLIAM YOVANY PIAMONTE PÉREZ*	*CRISTIAN CAMILO BAQUERO CORREDOR*
Inspector 3	1	*JULIÁN FELIPE HERNÁNDEZ BALLESTEROS*	*YEISON DANILO DURAN BARBOSA*
Inspector 4	1	*MAURICIO MIGUEL MACARENO MERCADO*	*JAIME RODRIGUEZ*
Inspector 5	1	*FREDY CORTES*	*FREDY CORTES*
Profesional Seguridad Industrial	1	*KATHERINE GUAÑARITA DIAZ*	*KATHERINE GUAÑARITA DIAZ*
Profesional de presupuestosprogramación y control	1	*JUAN CARLOS MORALES RIVERA*	*JUAN CARLOS MORALES RIVERA*
Profesional redes eléctricas	1	*JESÚS ALBERTO LÓPEZ VELA*	*JESÚS ALBERTO LÓPEZ VELA*
Profesional redes Hidrosanitarias	1	*OMAR ARCHILA MENDOZA*	*OMAR ARCHILA MENDOZA*
Profesional en estructuras	1	*HERBERT GIRALDO GOMEZ*	*HERBERT GIRALDO GOMEZ*

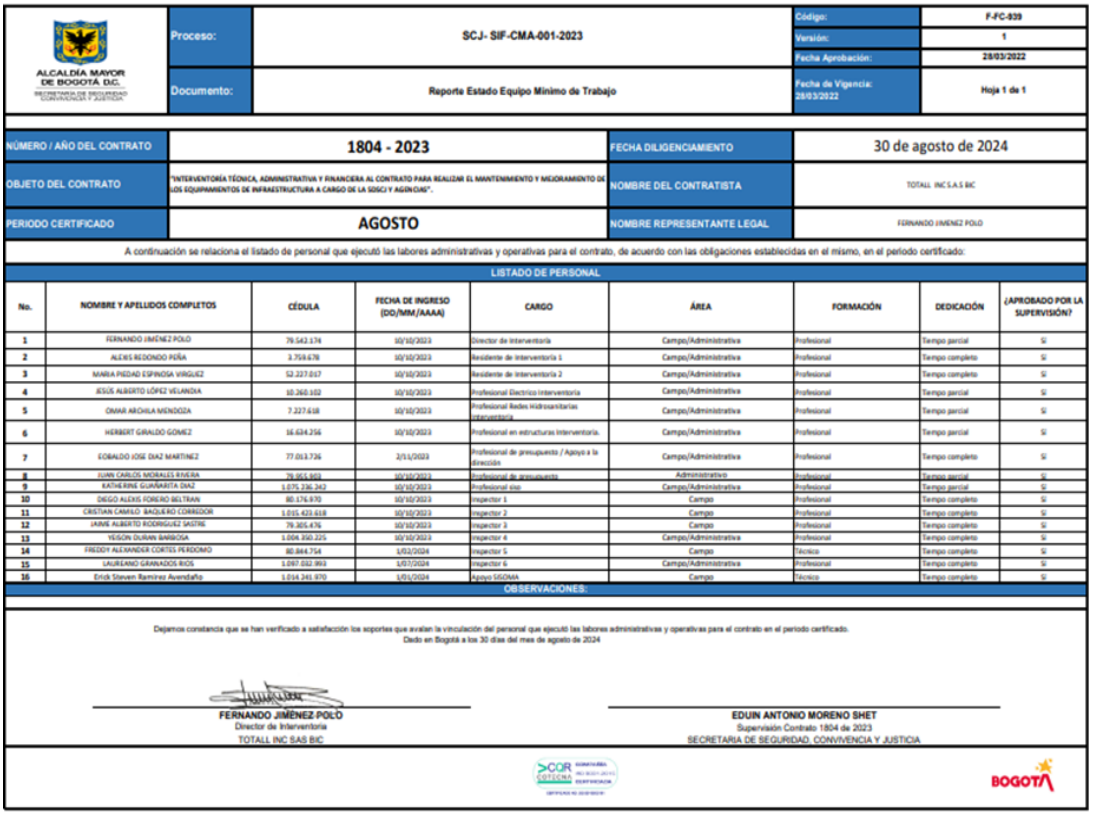

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso:	SCJ- SIF-CMA-001-2023	Código:	F-FC-039
			Versión:	1
			Fecha Aprobación:	28/03/2022
	Documento:	Reporte Estado Equipo Mínimo de Trabajo	Fecha de Vigencia: 28/03/2022	Hoja 1 de 1

NÚMERO / AÑO DEL CONTRATO	1804 - 2023	FECHA DILIGENCIAMIENTO	30 de agosto de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".	NOMBRE DEL CONTRATISTA	TOTALL INC S.A.S BIC
PERIODO CERTIFICADO	AGOSTO	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO JIMENEZ POLO

A continuación se relaciona el listado de personal que ejecutó las labores administrativas y operativas para el contrato, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el mismo, en el periodo certificado:

LISTADO DE PERSONAL

No.	NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	FECHA DE INGRESO (DD/MM/AAAA)	CARGO	ÁREA	FORMACIÓN	DEDICACIÓN	¿APROBADO POR LA SUPERVISIÓN?
1	FERNANDO JIMÉNEZ POLO	79.542.174	10/10/2023	Director de Interventoría	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo parcial	SI
2	ALEXIS REDONDO PEÑA	3.759.678	10/10/2023	Residente de Interventoría 1	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo completo	SI
3	MARIA PIEDAD ESPINOSA VIRGUEZ	52.227.017	10/10/2023	Residente de Interventoría 2	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo completo	SI
4	JESUS ALBERTO LÓPEZ VELANDIA	10.260.102	10/10/2023	Profesional Electrico Interventoria	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo parcial	SI
5	OMAR ARCHILA MENDOZA	7.227.618	10/10/2023	Profesional Redes Hidrosanitarias Interventoria	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo parcial	SI
6	HERBERT GIRALDO GOMEZ	16.634.256	10/10/2023	Profesional en estructuras Interventoria.	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo parcial	SI
7	EOBALDO JOSE DIAZ MARTINEZ	77.013.736	2/11/2023	Profesional de presupuesto / Apoyo a la dirección	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo completo	SI
8	JUAN CARLOS MORALES RIVERA	79.955.903	10/10/2023	Profesional de presupuesto	Administrativo	Profesional	Tiempo parcial	SI
9	KATHERINE GUAÑARITA DIAZ	1.075.236.242	10/10/2023	Profesional sso	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo parcial	SI
10	DIEGO ALEXIS FORERO BELTRAN	80.176.970	10/10/2023	Inspector 1	Campo	Profesional	Tiempo completo	SI
11	CRISTIAN CAMILO BAQUERO CORREDOR	1.015.423.618	10/10/2023	Inspector 2	Campo	Profesional	Tiempo completo	SI
12	JAIME ALBERTO RODRIGUEZ SASTRE	79.305.476	10/10/2023	Inspector 3	Campo	Profesional	Tiempo completo	SI
13	YEISON DURAN BARBOSA	1.004.350.225	10/10/2023	Inspector 4	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo completo	SI
14	FREDDY ALEXANDER CORTES PERDOMO	80.844.754	1/02/2024	Inspector 5	Campo	Técnico	Tiempo completo	SI
15	LAURIANO GRANADOS RIOS	1.087.032.993	1/07/2024	Inspector 6	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo completo	SI
16	Erick Steven Ramirez Avendaño	1.014.241.970	1/01/2024	Apoyo SISOMA	Campo	Técnico	Tiempo completo	SI

OBSERVACIONES:

Dejamos constancia que se han verificado a satisfacción los soportes que avalan la vinculación del personal que ejecutó las labores administrativas y operativas para el contrato en el periodo certificado.
Dado en Bogotá a los 30 días del mes de agosto de 2024

FERNANDO JIMÉNEZ POLO
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC

EDUIN ANTONIO MORENO SHET
Supervisión Contrato 1804 de 2023
SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

6.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista **CONSORCIO OBRASW**, contó con el siguiente personal para el desarrollo o ejecución de su compromiso contractual.

Tabla 70. Personal Consorcio Obrasw

CARGO	CANTIDAD	NOMBRE
Director de Obra	1	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Coordinador 1	1	VICTOR JOLMAN FORERO CALDAS
Coordinador 2	1	JEFERSON ANDRES DEJOY FELICIANO
Inspector 1	1	LIBARDO BAEZ DAZA
Inspector 2	1	EMILIO CERQUERA SALCEDO
Ingeniero 3	1	ROQUE JULIO BAEZ DAZA
Profesional de presupuestoy programación de obra	1	YURY YOHANA SUAREZ GUERRERO
Supervisor SISOMA	1	STEFANY KATERIN GONZALEZ ORJUELA
Asesor Estructural	1	LUIS ANGEL ESPITIA LOPEZ
Asesor Eléctrico	1	DANIEL ANDRES GAITAN MANRIQUE
Asesor Hidrosanitario	1	DIEGO ALEXIS ROJAS HERRERA

6.4 RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA.

Para el desarrollo del compromiso contractual, **TOTALL INC SAS BIC** contó con la siguiente maquinaria y/o equipos:

Tabla 71. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad de interventoría

CANTIDAD	EQUIPO
1	Equipo de oficina (Computadores, celulares, impresora)

6.5 RECURSOS DEL CONTRATISTA.

El **CONSORCIO OBRASW,** cuentan con la siguiente maquinaria y/o equipos, para la ejecución del contrato.

Tabla 72. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad del contratista

CANTIDAD	EQUIPO
1	Equipo de oficina (Computadores, celulares, impresora)
2	Camioneta para el transporte de material y personal requerido

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ORDEN CONTRACTUAL

El presente informe corresponde a la etapa de diagnósticos, sin embargo, el contratista inicio 6 frentes de obra que se desarrollaron del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2023:

7.1. Actividades de Orden Financiero:

A continuación, se relacionan los presupuestos presentados a la fecha por el Consorcio Obrasw luego de las visitas realizadas para diagnóstico. Los valores no son definitivos y puede presentar ajuste

Tabla 73. Presupuestos iniciales.

N°	Localidad	Unidad	Vr. Presupuestado
ESTACIÓN DE POLICIA			
1	Fontibon	ESTACION DE POLICIA FONTIBON CELDAS	$ 61.211.945
2	Fontibon	ESTACION DE POLICIA FONTIBON	$ 124.900.748
3	San Cristobal	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	$ 995.258.403
4	Suba	ESTACION DE POLICIA SAN SUBA	$ 513.247.484
5	Santa Fé	CARABINEROS PARQUE NACIONAL	$ 150.000.000
6	Kennedy	ESTACION DE POLICIA KENNEDY	$ 239.026.104
7	Engativá	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	$ 304.316.475
8	Tunjuelito	ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE	$ 292.275.032
9	Ciudad Bolivar	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	$ 245.779.485

CAI				
1	Engativá	CAI VILLAS DE GRANADA	$	27.743.060
2		CAI LAS DELICIAS	$	28.640.062
3	Suba	CAI GAITANA	$	81.280.181
CASAS FISCALES				
1	Suba	ALMENDROS DE SUBA	$	3.545.763
2	Fatima	CASA LINDA DEL TUNAL	$	9.790.850
3	Suba	EDF PARQUE DEL CAMPO	$	6.301.962
EQUIPAMIENTOS DE JUSTICIA				
1	Pte. Aranda	CESPA	$	24.049.840
CASAS DE JUSTICIA				
1	Usme	CJ USME	$	38.435.935
2	Mártires	CJ MARTIRES	$	33.150.797
3	San Cristóbal	CJ SAN CRISTOBAL	$	26.316.441
4	Bosa	CJ BOSA	$	60.275.716
5		CJ LA VICTORIA	$	56.774.300
6	Tunjuelito	CJ TUNJUELITO	$	64.195.516
7	Ciudad Bolivar	CJ CIUDAD BOLIVAR	$	37.173.647
4	Bosa	CAMPO VERDE	$	100.043.058
CENTRO DE TRASLADO Y PROTECCIÓN				
1	Pte. Aranda	URI PTE ARANDA	$	176.986.581
2	Pte. Aranda	CER	$	141.030.365
3	Santa Fé	CASA RESTAURATIVA SANTAFE	$	45.848.332

CENTRO DE COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO C4				
1	Fontibón	C4	$	139.463.629
BRIGADA				
1	Usaquén	BASER 13	$	142.702.015
2	Usaquén	SALA DE OPERACIONES	$	117.639.983
3	Usaquén	PM15	$	151.839.675
4	Pte. Aranda	PM13	$	95.528.984

7.2. Acta de recibo parcial de obra

Por parte del CONSORCIO OBRASW a la fecha del presente informe no se presentará acta de pago parcial.

Tabla 74. Actas Parciales Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA				
CONCEPTO	**PERIODO FACTURADO**	**ESTADO**	**VALOR**	
ACTA N°1	10-10-2023 al 31-10-2023	PAGADO	$	33.367.746,00
ACTA N°2	01-11-2023 al 30-11-2023	PAGADO	$	277.813.206,32
ACTA N°3	01-12-2023 al 30-12-2023	PAGADO	$	362.033.109,47
ACTA N°4	01-01-2024 al 31-01-2024	PAGADO	$	528.062.377,04
ACTA N°5	01-02-2024 al 29-02-2024	PAGADO	$	739.827.710,38
ACTA N°6	01-03-2024 al 31-03-2024	PAGADO	$	875.362.409,04
ACTA N°7	01-04-2024 al 30-04-2024	PAGADO	$	912.291.915,97
ACTA N°8	01-05-2024 al 31-05-2024	PAGADO	$	1.015.895.696,54
ACTA N°9	01-06-2024 al 30-06-2024	EN TRAMITE	$	818.146.963,02
TOTAL, FACTURADO.			$	5.562.801.133,35
VALOR DEL CONTRATO.			$	6.106.791.802,00

ADICIÓN NO. 1	$	2.748.000.000,00
VALOR DEL CONTRATO.	$	8.854.791.802,00
TOTAL, POR FACTURAR – LIQUIDACION.	$	3.291.990.668,65

7.3 Acta de recibo parcial de interventoría

Tabla 75. Actas Parciales Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CONCEPTO	**PERIODO FACTURADO**	**ESTADO**	**VALOR**
ACTA N°1	10-10-2023 AL 31-10-2023	PAGADO	$ 55.321.436,00
ACTA N°2	01-11-2023 al 30-11-2023	PAGADO	$ 82.982.155,00
ACTA N°3	01-12-2023 al 31-12-2023	PAGADO	$ 82.982.155,00
ACTA N°4	01-01-2024 al 31-01-2024	PAGADO	$ 82.982.155,00
ACTA N°5	01-02-2024 al 29-01-2024	PAGADO	$ 82.982.155,00
ACTA N°6	01-03-2024 al 31-03-2024	PAGADO	$ 82.982.155,00
ACTA N°7	01-04-2024 al 30-04-2024	PAGADO	$ 82.982.155,00
ACTA N°8	01-05-2024 al 31-05-2024	PAGADO	$ 82.982.155,00
ACTA N°9	01-06-2024 al 30-06-2024	PAGADO	$ 82.982.155,00
ACTA N°10	01-07-2024 al 31-07-2024	PAGADO	$ 82.982.155,00
ACTA N°11	01-08-2024 al 31-08-2024	EN TRAMITE	$ 67.665.166,54
TOTAL, FACTURADO.			$ 869.826.000,00
VALOR DEL CONTRATO.			$ 869.826.000,00
TOTAL, POR FACTURAR – LIQUIDACION.			$ 0,00

7.4 Actividades de orden administrativo

Las actividades de orden administrativo se han desarrollado de acuerdo con lo requerido contractualmente.

Tabla 76. Informes mensuales Contrato de obra.

INFORME	PERIODO	ESTADO
Informe mensual No 1	10/10/23 al 31/10/23	APROBADO
Informe mensual No 2	01/11/23 al 30/11/23	APROBADO
Informe mensual No 3	01/12/23 al 31/12/23	APROBADO
Informe mensual No 4	01/01/24 al 31/01/24	APROBADO
Informe mensual No 5	01/02/24 al 29/02/24	APROBADO
Informe mensual No 6	01/03/24 al 31/03/24	APROBADO

Informe mensual No 7	01/04/24 al 30/04/24	APROBADO
Informe mensual No 8	01/05/24 al 31/05/24	APROBADO
Informe mensual No 9	01/06/24 al 30/06/24	APROBADO
Informe mensual No 10	01/07/24 al 31/07/24	APROBADO
Informe mensual No 11	01/08/24 al 31/08/24	EN TRAMITE

De igual manera, a la fecha del presente informe, se relaciona el estado de losinformes mensuales de interventoría:

Tabla 77. Informes mensuales Contrato de interventoría.

INFORME	PERIODO	ESTADO
Informe mensual No 1	10/10/23 al 31/10/23	APROBADO
Informe mensual No 2	01/11/23 al 30/11/23	APROBADO
Informe mensual No 3	01/12/23 al 31/12/23	APROBADO
Informe mensual No 4	01/01/24 al 31/01/24	APROBADO
Informe mensual No 5	01/02/24 al 29/02/24	APROBADO
Informe mensual No 6	01/03/24 al 31/03/24	APROBADO
Informe mensual No 7	01/04/24 al 30/04/24	APROBADO
Informe mensual No 8	01/05/24 al 31/05/24	APROBADO
Informe mensual No 9	01/06/24 al 30/06/24	APROBADO
Informe mensual No 10	01/07/24 al 31/07/24	APROBADO
Informe mensual No 11	01/08/24 al 31/08/24	PRESENTE INFORME

Tabla 78. Comités de obra

No	FECHA	LUGAR
1	13/10/2023	SSCJ
2	10/10/2023	SSCJ
3	27/10/2023	SSCJ
4	02/11/2023	SSCJ
5	09/11/2023	SSCJ
6	20/11/2023	SSCJ
7	30/11/2023	SSCJ
8	14/12/2023	SSCJ
9	27/12/2023	SSCJ
10	12/01/2024	SSCJ
11	18/01/2024	SSCJ
12	25/01/2024	SSCJ
13	02/02/2024	SSCJ

14	08/02/2024	EP SAN CRISTOBAL
15	13/02/2024	CANTON NORTE
16	21/02/2024	CJ LA VICTORIA
17	29/02/2024	EP CIUDAD BOLIVAR
18	08/03/2024	INTERVENTORIA
19	13/03/2024	SSCJ
20	20/03/2024	SSCJ
21	04/04/2024	SSCJ
22	11/04/2024	SSCJ
23	19/04/2024	SSCJ
24	25/04/2024	SSCJ
25	03/05/2024	SSCJ
26	09/05/2024	CARABINEROS PARQUE NACIONAL
27	23/05/2024	SSCJ
28	30/05/2024	SSCJ
29	11/06/2024	SSCJ
30	20/06/2024	EP USAQUEN
31	26/06/2024	SSCJ
32	08/07/2024	SSCJ
33	18/07/2024	SSCJ
34	24/07/2024	SSCJ
35	01/08/2024	SSCJ
36	15/08/2024	SSCJ
37	22/08/2024	SSCJ
38	29/08/2024	SSCJ

8. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO

8.1 Actividades Realizadas por el contrato de Obra

8.1.1. Administrativo:

- Entrega de informes mensuales No 9 y 10.
- Envío para aprobación del personal del contratista que estará en los diferentes frentes de obra.
- Elaboración de Diagnósticos y Presupuestos de los diferentes frentes visitados
- Entrega de informe manejo ambiental.
- Entrega de correspondencia.
- Entrega de Acta de corte No. 9
- Realización de memorias Acta de corte No. 10

8.1.2. Actividades realizadas por el contrato de Interventoría

Durante la ejecución del contrato de obra la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Asistencia a comités y reuniones técnicas
- Revisión, verificación y aval de los diagnósticos, presupuestos, programaciones y flujos de inversión presentados por el contratista en cada equipamiento.
- Control del contrato de obra
- Asistencia y acompañamiento de las emergencias presentadas
- Realización de informes diarios, semanales y mensuales técnicos de interventoría e informes del área SSTA.
- Revisión y aprobación de informes mensuales e informes del área SSTA del contratista.
- Revisión de documentación contractual requerida
- Seguimiento a las bitácoras de obra y de emergencias
- Relación de correspondencia enviada y recibida
- Acompañamiento, seguimiento y control a los frentes de obra en donde se iniciaron actividades
- Revisión y conciliación de ítems no previstos del contrato de obra
- Acompañamiento y concepto de los especialistas estructurales, eléctricos, e hidrosanitarios en los equipamientos que lo han solicitado. Anexos 11.5.
- Se inicia la revisión de las memorias correspondientes al corte No. 10 de Obra
- Solicitud de adición y prorroga al contrato de interventoría.
- Solicitud al contratista incrementar el personal operativo en los frentes de obra para no incurrir en atrasos.
- Entrega de equipamientos a la MEBOG, referentes de las Casas de Justicia y encargados de la Brigadas.
- Conciliación del Balance Presupuestal del contrato.
- Reporte a la Supervisión de los saldos de cada uno de los rubros del contrato.

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES

Para efectos del cumplimiento del objeto del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del mismo y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad, las siguientes obligaciones generales:

1. Acatar la Constitución Política de Colombia, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. SE CUMPLE.
2. Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada. SE CUMPLE

3. Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. SE

CUMPLE

4. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, deberá constituir las garantías pactadas en el mismo. SE CUMPLIO

5. Suscribir el acta de inicio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única previa aprobación del personal que integra el “equipo de trabajo mínimo interventor”. SE CUMPLIO

6. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello. SE CUMPLE

7. Colaborar con LA ENTIDAD para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea el de mejor calidad. SE CUMPLE

8. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato LA ENTIDAD le imparta, y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. SE CUMPLE

9. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato, según corresponda. SE CUMPLE

10. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. SE CUMPLE

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta LA ENTIDAD por conducto del supervisor del contrato. SE CUMPLE

12. En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 del 2012, el contratista se obliga: a). Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral, ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso. SE CUMPLE

13. Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de Colombia y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños. SE CUMPLE

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

1. Gestionar ante la supervisión del contrato, la aprobación del personal que integra el “equipo de trabajo mínimo interventor”, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la propuesta. Para ello deberá remitir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la

suscripción del contrato, todos los documentos que acrediten la formación y experiencia requerida por LA ENTIDAD para cada uno de ellos. Como parte integral de los documentos, la relación, cargo, datos de contacto e incluir las afiliaciones al sistema de seguridad social. SE CUMPLE.

2. Sustituir de forma oportuna, el personal que por fuerza mayor o a solicitud de la supervisión del contrato, sea requerido. Ello deberá adelantarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la novedad o solicitud de cambio y el integrante que ingresa deberá acreditar iguales o superiores condiciones a las requeridas por LA ENTIDAD y aquellas que fueron objeto de ponderación por parte de LA ENTIDAD durante el proceso de adjudicación. SE CUMPLE

3. Cumplir, con lo establecido en el “ANEXO 3 – CONDICIONES TECNICAS”. SE CUMPLE

4. Cumplir con todas las obligaciones que por Ley corresponden a la interventoría, incluyendo aquellas aplicables de la “Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales” - G-EFSICE-02 de Colombia Compra Eficiente. SE CUMPLE

5. Recomendar a la supervisión del contrato, los procedimientos, métodos, acciones o cualquier otro tipo de actividad que, según su experiencia, conocimiento y buenas prácticas, puedan beneficiar el desarrollo del contrato de obra desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero y jurídico. SE CUMPLE

6. Cumplir durante la totalidad de plazo de ejecución del contrato y de forma taxativa, con los ofrecimientos realizados en su propuesta y los cuales hayan sido objeto de ponderación y asignación de puntaje. SE CUMPLE

7. Verificar y hacer seguimiento a las actividades y obligaciones de carácter técnico, que hacen parte del contrato de obra cuyo objeto es: “Realizar el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la SDSCJ y Agencias”, incluidos los documentos soportes y demás anexos que hacen parte integral del mismo. SE CUMPLE

8. Revisar, verificar y avalar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte del contratista de obra, los diagnósticos, actividades, cronogramas y procedimientos necesarios previos al inicio de cualquier actividad de obra. SE CUMPLE
9. Verificar que el personal profesional presentado para la ejecución del contrato por parte del Contratista de obra, cumpla con el porcentaje de dedicación mínima de disponibilidad en tiempo, requerido por LA ENTIDAD para la ejecución del contrato. SE CUMPLE

10. Revisar, verificar y avalar que las cantidades de obra, especificaciones técnicas y actividades correspondan con las realmente ejecutadas, de acuerdo con las necesidades establecidas por la Supervisión. Para ello, deberá estructurar, diligenciar, suscribir y presentar las actas o documentos necesarios, debidamente acompañado del registro fotográfico del antes, durante y después de la ejecución. SE CUMPLE

11. Programar, asistir y liderar los comités de obra ordinarios y extraordinarios que se programen o los que convoque la supervisión del contrato, en los cuales deberá presentar toda la información que le sea requerida por la supervisión con relación a la ejecución del contrato, para hacer el seguimiento a la ejecución contractual y para tomar las acciones que se deriven de su ejecución. SE CUMPLE

12. Levantar las actas de las reuniones o comités de obra que se lleven a cabo, debidamente suscritas y realizando el seguimiento a los compromisos allí adquiridos. Las actas de las reuniones deberán ser entregadas a la supervisión, en un plazo máximo de tres (3) días calendario posterior a la realización de las mismas. SE CUMPLE

13. Llevar una bitácora del desarrollo del contrato, donde se consignarán todas las instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución del objeto contractual. SE CUMPLE

14. Informar por escrito, de forma oportuna y permanente al Supervisor del Contrato, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución, así como el incumplimiento parcial o total del mismo. SE CUMPLE

15. Verificar que las actividades a ejecutar cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para cada una de ellas y se adelanten de acuerdo con las fichas técnicas de los productos, recomendaciones de los fabricantes y mediante la aplicación de buenas prácticas. SE CUMPLE

16. Analizar y dar respuesta motivada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a las sugerencias, solicitudes, reclamaciones y consultas del contratista de obra, resolviendo aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con el contratista los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución de las obras y trasladando a LA ENTIDAD únicamente las reclamaciones y consultas que a esta le competan de acuerdo con el alcance del contrato. SE CUMPLE

17. Verificar que los productos y actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra, cumplan con los reglamentos, normas técnicas y de calidad, presentando las certificaciones válidas que acrediten el cumplimiento de reglamentos, normas, entre otras, cuando estas apliquen. SE CUMPLE

18. Gestionar, coordinar y efectuar el seguimiento, a la oportuna atención de requerimientos, que con carácter de “Emergencias”, el Contratista de obra deba atender y sean solicitados por la supervisión. SE CUMPLE

19. Responder en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles contados desde su presentación, las consultas, conceptos y asesorías que solicite la SECRETARÍA y que sean del alcance de la INTERVENTORÍA. SE CUMPLE

20. Cumplir con los conceptos contemplados en el factor multiplicador indicados en su propuesta, lo cual será verificado en la liquidación del contrato. SE CUMPLE

21. Mantener un archivo organizado de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que, sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas. SE CUMPLE

22. Revisar, conceptuar y avalar por personal idóneo en la materia, los informes presentados por el Contratista de obra. SE CUMPLE

23. Revisar, avalar y gestionar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, los informes mensuales, cortes de obra, facturas de pago y demás documentos que le sean radicados por el Contratista de obra. En caso que sea necesario que el contratista de obra realice ajustes o modificaciones al mismo, la interventoría contará con tres (3) días hábiles para adelantar la nueva revisión, contados a partir de la entrega de los documentos por parte del contratista de obra. SE CUMPLE

24. Acreditar en formato establecido por la Supervisión, la disponibilidad del personal de interventoría en obra, de acuerdo con las dedicaciones establecidas por la Entidad. SE CUMPLE

25. Verificar el cumplimiento durante la totalidad de ejecución del contrato, de los ofrecimientos efectuados por el Contratista de obra con el fin de obtener los puntos asignados durante la evaluación de la oferta. SE CUMPLE

26. Mantener en su planta de personal el número mínimo de trabajadores en condición de discapacidad, o el que aplique, con el cual obtuvo el puntaje adicional de la oferta con la que fue seleccionado. En este último caso se deberá verificar la vigencia de la certificación sobre el porcentaje de trabajadores en condición de discapacidad con los cuales cuenta la contratista, expedida por el Ministerio de Trabajo (según aplique). SE CUMPLE

27. Presentar en su informe mensual, el seguimiento efectuado en los aspectos técnico, administrativo, financiero y jurídico, incluyendo desde cada uno de estos componentes, los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional y medio ambiental que por Ley apliquen. SE CUMPLE

28. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5° del Decreto 332 de 2020 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de denunciar las violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato. De igual forma evitar el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista. SE CUMPLE. La interventoría certifica que no se ha presentado por parte del contratista CONSORCIO OBRAS W, temas de abuso y acoso laboral ni sexual, ni ha recepcionado denuncias de violencia basadas en género en el marco de la ejecución del contrato, dando cumplimiento al Artículo 5 del Decreto 332 de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

29. Dar cumplimiento al Decreto 332 de 2020, garantizando la vinculación de mujeres para la ejecución del objeto contractual en un porcentaje mínimo de 50% teniendo en cuenta factores que acentúan su vulnerabilidad, como la condición de víctima del conflicto armado, las discapacidades, ser mujer jefa de hogar, entre otras. Esta vinculación y su permanencia será verificada a través del supervisor. SE CUMPLE.
La presente interventoría, se permite informar, que según en las hojas de vida presentada por el contratista CONSORCIO OBRAS W, y según la aprobación de ingreso de personal, el contratista NO CUMPLE, con el decreto 333 de 2020, debido a que el porcentaje de contratación de mujeres es del 25%. Por lo anterior, se solicita al contratista, dar cumplimiento a lo establecido en el decreto antes mencionado.

30. Verificar el cumplimiento de la adecuada señalización de los espacios a intervenir a fin de mitigar cualquier tipo de impacto. Para ello, deberá evaluar previo a la intervención los riesgos asociados a la actividad, su impacto, medidas de mitigación, tipo de señalización, etc. Así mismo, deberá velar porque el contratista de obra, informe y comunique de forma oportuna y adecuada a todas las personas que puedan verse afectadas, sobre el tipo de

actividad a realizar y las recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta. SE CUMPLE

31. Verificar el cumplimiento de adecuadas condiciones para el recibo, acopio y almacenamiento de materiales, sea la adecuada y en concordancia con las normas y recomendaciones de las administradoras de riesgos laborales – ARL. SE CUMPLE

32. Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento a las actividades y obligaciones del contratista en materia ambiental, que hacen parte del contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la SDSCJ y Agencias", incluidos los documentos y demás anexos que hacen parte integral del mismo. SE CUMPLE.
La presente interventoría, ha realizado seguimiento a las actividades ambientales desarrolladas por parte del contratista CONSORCIO OBRAS W, en el cual, ha cumplido en el periodo del presente informe; el contratista presentó el plan de manejo ambiental con su programa de gestión de residuos, en el cual, fue aprobado por la interventoría. Se entregó documentación para apertura del PIN ambiental a la entidad, en el cual, se encuentra en proceso de apertura. Se recomienda al contratista, iniciar con las actividades del plan de manejo ambiental, para dar cumplimiento a la normatividad ambiental.

33. Realizar la verificación, seguimiento y control para el cumplimiento de la legislación vigente que regulan los programas de salud ocupacional, entrega oportuna y adecuada de equipos de protección personal – EPP, protocolos de trabajo seguro en altura – TSA, protocolos para el trabajo seguro en espacios confinados y todos aquellos aplicables a la materia. SE CUMPLE

34. Revisar y aprobar el uso de herramientas y equipos apropiados y certificados (cuando aplique), para la debida ejecución de las actividades programadas: Equipos, andamios, líneas de vida, etc. SE CUMPLE
35. Vigilar que se dé cumplimiento a la legislación vigentes durante la ejecución del contrato, respecto a las adecuadas condiciones de trabajo, seguridad y salud e higiene ocupacional. SE CUMPLE

36. Entregar y verificar que todos los trabajadores a su cargo y a cargo del contratista de obra, estén debidamente uniformados, identificados de forma visible y clara, porten y den uso adecuado de todos los elementos de seguridad industrial, así como de los elementos de protección personal. SE CUMPLE

37. Cumplir con la totalidad de los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, en relación con sus dependientes y contratistas durante toda la ejecución contractual. SE CUMPLE

38. Mantener a disposición de LA ENTIDAD, copia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y de acuerdo con lo establecido en la legislación y normatividad vigente, incluidos los Estándares mínimos – Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo. SE CUMPLE

39. Ejecutar sus actividades minimizando los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente, dando estricto cumplimiento a las normas nacionales y distritales aplicables. SE CUMPLE

40. Cumplir con todas las demás obligaciones que le correspondan de acuerdo a la de

acuerdo con la ley con el “Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría” de la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, que se encuentre vigente. SE CUMPLE

41. Las demás actividades de carácter ambiental que ameriten el desarrollo del contrato. SE CUMPLE

OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. Gestionar ante las compañías aseguradoras la ampliación de la cobertura de los amparos a que haya lugar de acuerdo con las prórrogas, adiciones, suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato de interventoría, y aportarlas a LA Entidad dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de los modificatorios en SECOP. SE CUMPLE

2. Mantener el personal que hace parte de su equipo de trabajo, bajo las condiciones y el tipo de contratación laboral que corresponda con la exigibilidad de dedicación y condiciones requeridas por LA ENTIDAD, realizando los pagos que legalmente sean exigibles y de acuerdo
con la oferta y factor multiplicador presentado. SE CUMPLE

3. Remitir de forma mensual a la Supervisión, certificación suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal del contratista (según aplique), acompañado de la planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social Integral y Parafiscales, del personal vinculado al proyecto. SE CUMPLE
4. Revisar y aprobar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su presentación, la documentación que acredite la formación, experiencia, idoneidad, afiliaciones al sistema de seguridad social y demás que sean pertinentes, respecto al personal que conforma el equipo de trabajo del Contratista de obra y efectuar el seguimiento a la disponibilidad del mismo durante la totalidad de ejecución del contrato, en las condiciones requeridas por LA ENTIDAD. Así mismo, en caso que el Contratista de obra requiera cambiar algún o algunos miembros de su equipo, la INTERVENTORÍA, verificará el cumplimiento de los perfiles y afiliaciones, garantizando que sea igual o superior al establecido por la Entidad incluyendo aquellas que hayan sido objeto de ponderación según la oferta presentada. SE CUMPLE

5. Verificar y hacer seguimiento a cada una de las obligaciones que con carácter administrativo y financiero estén a cargo del Contratista de obra. SE CUMPLE

6. Revisar y aprobar el Plan de Inversión del Anticipo propuesto por el contratista de obra, vigilando el cumplimiento taxativo del mismo y llevando el registro inequívoco y avalado de los saldos, cargos y conceptos que reflejen la situación financiera del encargo fiduciario constituido. Cualquier diferencia entre los saldos bancarios registrados en el extracto que el contratista debe presentar versus el registro de gastos o el Plan de Inversión, deberá ser informado inmediatamente a la supervisión por parte del CONTRATISTA. El CONTRATISTA es el responsable del seguimiento financiero y contable del mismo. Así mismo, esta información deberá mantenerse actualizada y entregada de forma mensualizada a la supervisión o cuando esta lo solicite. SE CUMPLE.

7. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecución, manteniendo al día la

contabilidad de los mismos en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con el presupuesto, registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones realizados durante el desarrollo del objeto contractual. SE CUMPLE

8. Cumplir con las obligaciones que le sean atribuidas por parte del comité fiduciario, cuando así sea establecido por este. SE CUMPLE

9. Aprobar y gestionar o devolver oportunamente y para su modificación, las facturas, cuentas de cobro, actas de avance del contrato, informes y demás estructurados y presentados por el contratista de obra. A LA FECHA NO SE HA INICIADO ESTE TRAMITE

10. Presentar los informes de ejecución contractual, de acuerdo con las especificaciones solicitadas por la supervisión. En este deberá detallarse y conceptuarse el cumplimiento o no, de cada una de las obligaciones a cargo del contratista de obra, acompañado de las evidencias que lo soporten. SE CUMPLE

11. Establecer la línea de base del presupuesto de obra, los indicadores de gestión y la programación, para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra. SE CUMPLE

12. Gestionar ante la supervisión, de forma oportuna y por lo menos con 24 horas de antelación, los permisos y autorizaciones de ingreso a los diferentes equipamientos y áreas, cumpliendo para ellos los protocolos de seguridad e información que sean requeridos por los diferentes
organismos y dependencias. SE CUMPLE

13. Requerir a los contratistas, si a ello hubiere lugar para que tomen medidas para mejorar el rendimiento pactado, mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para LA ENTIDAD y las Entidades Territoriales, cuando a juicio de la INTERVENTORÍA se advierta retrasos en la ejecución, corroborando diariamente la efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados. Lo anterior, implica la revisión y aprobación de planes de choque o planes de contingencia. SE CUMPLE

14. Vigilar permanentemente la ejecución, hasta su puesta en marcha, comunicando por escrito y oportunamente al Contratista, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes sí hubiere lugar, según corresponda, indicando el plazo para que se adelanten los mismos. SE CUMPLE

OBLIGACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO

1. Adoptar las medidas necesarias para que el contrato de obra objeto de la interventoría se desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad. SE CUMPLE

2. Verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas en el contrato de obra, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. SE CUMPLE

3. Requerir al contratista cuando sea necesario modificar las garantías en valor o en plazo. Lo anterior incluye, todo tipo de novedad contractual que se presente durante la ejecución (prorrogas-suspensiones-otrosí etc.). En caso de que el contratista de ejecución de obra no

realice las ampliaciones a que haya lugar, el CONTRATISTA deberá informar a la SCJ de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas. SE CUMPLE

4. Informar al supervisor los hechos y/o circunstancias que puedan constituir un incumplimiento del contrato de obra objeto de interventoría, o que puedan constituir actos de corrupción. SE CUMPLE
5. Informar y entregar copia al supervisor de los requerimientos realizados al contratista del contrato de obra y remitir una copia de los mismos a la compañía aseguradora. En todos los requerimientos que se realicen al contratista de la obra se deberá establecer un término para el
cumplimiento de la obligación, y en caso que se incumpla dicho termino se deberá presentar al supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista y una tasación de los perjuicios ocasionados. SE CUMPLE

6. Informar, sustentar y avalar de manera oportuna cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación contractual, así como las solicitudes de prórroga, adición, modificación, suspensión o cualquier tipo de novedad o modificación al contrato de obra. El aval se debe presentar debidamente motivado y acompañada de los soportes o evidencias que la justifiquen. SE CUMPLE
7. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del contratista de ejecución de obra se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. SE CUMPLE

8. Proyectar las actas de recibo a satisfacción, así como el acta el acta de terminación y las demás actas necesarias en el marco del contrato de obra. SE CUMPLE

9. Apoyar a la supervisión de forma oportuna, durante el proceso de liquidación de los contratos de obra e interventoría, estructurando, consolidando y presentado los informes, soportes y documentos que para ello sean requeridos. SE CUMPLE

10. Asistir a la entidad en las audiencias, que se adelanten con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 – “IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO”- y las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen -debidos procesos, inclusive cuando se trate de suspensión y reanudación de la misma. Así mismo, deberá acompañar a la Entidad en los procesos a que haya lugar y demás reclamaciones administrativas o contractuales y hasta la vigencia de la garantía. SE CUMPLE

11. Apoyar a la Entidad en la estructuración y consecución de los documentos de respuesta, cuando sea del caso, y respecto de reclamaciones que se deriven de la ejecución de los contratos por parte de órganos de control, autoridad judicial administrativa y/o particular en virtud del derecho de petición. SE CUMPLE

12. Apoyar a la Entidad en la atención y proyección de respuesta a los requerimientos, PQR, derechos de petición y demás solicitudes que se presenten por parte de ciudadanos, entidades, entes de control y en general los diferentes actores que intervienen en el objeto contractual de la presente INTERVENTORÍA ya sea directa o indirectamente. SE CUMPLE

13. Requerir al contratista, si a ello hubiere lugar para que tomen medidas para mejorar el rendimiento pactado, mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para la secretaria y las Entidades Territoriales, cuando a juicio de la INTERVENTORÍA se advierta retrasos en la ejecución, corroborando diariamente la efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados. Lo anterior, implica la revisión y aprobación de planes de choque o planes de contingencia. SE CUMPLE

14. Vigilar permanentemente la ejecución, hasta su puesta en marcha, comunicando por escrito y oportunamente al Contratista, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes sí hubiere lugar, según corresponda, indicando el plazo para que se adelanten los mismos. SE CUMPLE

15. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. SE CUMPLE

10. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE INTERVENTORIA

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (AGOSTO DE 2024)

Equipamientos que finalizaron su mantenimiento AGOSTO y la descripción breve del tipo de mantenimiento que se realizó

BAFLA: DEMOLICIÓN AFINADOS DE PISO E=5 CM (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS). DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE TERRAZAS H=8CM (ALTURA 5 PISOS). DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES). ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE DE TEJA ONDULADA ETERNIT, DESMONTE DE SIFONES, DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES), DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA, COLOCADA SUPERFICIALMENTE, DESMONTE DE PUSH SANITARIOS, DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: RETIRO DE SOBRANTES), INSTALACIÓN HIDRÁULICA SANITARIA Y DE GAS, PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE LISO 1:4 LINEAL, (ANCHO MÁXIMO 0,6M). APLICADO EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M., MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3, AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE DE 3MM CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE CON EMULSIÓN ASFÁLTICA., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE DE 3MM CON FOIL DE ALUMINIO PARA ANCHOS IGUALES O INFERIORES A 60 CM. INCLUYE IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, REMOCIÓN DE PINTURA SUELTA MANUAL, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOBLE MANO DE PINTURA BITUMINOSA TEXSA O SIMILAR SOBRE MANTO

ASFALTICO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CAP.1000LT (INCLUYE CERTIFICACIÓN)

ESTACION DE POLICIA USAQUEN: CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE, DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.), DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.), DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.), DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 CM (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS), DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.), DEMOLICION DE POYO DE DUCHA, REGATA SOBRE MUROS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.), DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.), DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.), DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES), DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.), DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES), ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.), RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.), SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.), SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.), DESMONTE DE SIFONES, DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRATES), DESMONTE DE PUSH SANITARIOS, DEMOLICIÓN DE ACABADOS CERAMICOS DE PISO O MUROS EN ALTURAS DE HASTA 3M. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS), DESMONTE DE ACCESORIOS ELECTRICOS (TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES), DESMONTE DE CABLEADO ELECTRICO (CONTEMPLA LOS CABLES CONTENIDOS DENTRO DE UN DUCTO ENTRE CALIBRES #8, #10 Y #14), DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: RETIRO DE SOBRANTES), DESMONTE DE ACCESORIOS SANITARIOS (TAPA REGISTROS, POMOS, REGADERAS, INCRUSTACIONES, REJILLAS, ETC…), CORTE DE PLACA CON PULIDORA. INCLUYE ASEO, EXCAVACION MANUAL TIERRA H<2.50 M. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL), COMPACTACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE, MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR, SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MESÓN EN CONCRETO DE 60CM DE ANCHO POR 8 DE ALTO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA DE PISO CON ESPESOR ENTRE 10 Y 15 CM. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60 A 1 M DE ANCHO, CAJA INSPECCION 80 X 80 X 95 CM (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO), DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M, SUMINISTRO Y APLICACIÓN GRANIPLAST EN MUROS EXTERIORES PARA ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 10 METROS, CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC, ACCESORIO PVC-S Ø 2", ACCESORIO PVC-S Ø 4", TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO), TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO), TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO), CODO HG Ø 1/2", SONDEO DE PUNTOS SANITARIOS (ENTRE 1 1/2" Y 4"), REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN TIPO ACORDEÓN PLASTICO, SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE – EMT, PUNTO ELECTRICO PARA TOMA CORRIENTE DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER

18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO 1#12, CABLEADO 2#12, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA, INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A, SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA DE PASO, DIMENSIONES 20X20X15, INCLUYE TAPA EN PLASTICO Y ADTADORES TERMINAL EMT 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA EMT DE 1/2" SOBREPUESTA, (LONGITUD PROMEDIO DE SALIDA 3 ML), DESMONTE DE CANALETA METALICA DE TOMAS Y VOZ Y DATOS. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, RESANE DE FILOS CON MORTERO, RESANES GENERALES, SUMINISTO Y APLICACIÒN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M, SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO, SOLDADURAS Y TRANSPORTE DE INSUMOS A OBRA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE LISO 1:4 LINEAL, (ANCHO MAXIMO 0,6M). APLICADO EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M, AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 CM, AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 CM, MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3, MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE DE 3MM CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA TERMOACÙSTICA TIPO UPVC E= 2,5MM O SIMILAR. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÒN Y ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURA. NO INLCUYE CABALLETE, MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 CM (ANTIC - ESMALTE), PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE), SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CERRAMIENTO DE CELDAS (REJAS) ELABORADOS EN VARILLA METÁLICA LISA Ø7/8" PUESTA VERTICALMENTE CADA 0.10 Y PLATINAS 38X4MM (1½"X3/16"). CON MARCOS PERIMETRALES Y DIVISIONES VERTICALES MODULARES EN ÁNGULO METÁLICO 50 X 4MM (2"X3/16"). PIEZAS CONJUNTAMENTE SOLDADAS GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A VANDALISMO. FIJADA CON ANCLAJES CADA 0.20 EN EL PERÍMETRO. ACABADO PINTURA ESMALTE PARA METAL COLOR GRIS CLARO MATE APLICADA SOBRE BASE ANTICORROSIVA. (INCLUYE TRANSPORTE. EQUIPO Y MANO DE OBRA)., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS DE 55X43CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR DE 2". INCLUYE TORNILLOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS HERMETICAS, PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR, GRIFERIA LAVAPLATOS TIPO PRISMA O SIMILAR SOBREPONER (SUM E INSTALACIÓN), SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUETIPO AVANTI O SIMILAR, CAMBIO DE ACOPLE SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN EN P, PARA LAVAMANOS, METÁLICO CROMADO. IMPORTADO, MARCA A&A O SIMILAR, DUCHA ANTIVANDÁLICA DE ACCIÓN HIDROMECÁNICA, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-17125106 DOCOL Ó SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUSH ANTIVANDALICO PARA SANITARIO,

ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA, VINILO S/PAÑETE - 2 MANOS, PINTURA KORAZA PARA FACHADAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M. PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN TRES (3) CAPAS CON LIJADO PARA ACABADO FINAL. INCLUYE TRANSPORTE DE INSUMOS A OBRA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOBLE MANO DE PINTURA BITUMINOSA TEXSA O SIMILAR SOBRE MANTO ASFALTICO, LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS 30CMX60CM INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUMINISTRO Y FUNDICIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM. INCLUYE TRASIEGO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR 2 MANOS, TIPO KORAZA O SIMILIAR, ANCHO =<60 CM PARA ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 10 METROS, CONSTRUCCION DE MURO EN MAMPOSTERIA CONFINADA, INCLUYE LADRILLO TOLOTE 6X12X25CM CON MALLA ELECTROSOLDADA XX106 INCLUYE CONCRETO MORTERO Y ACERO DE REFUERZO PARA ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3 METROS INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUMINISTRO Y FUNDICION DE COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.2X0.2, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO.

CAI CAMPO VERDE: REGATA SOBRE MUROS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, SELLADO Y EMBOQUILLADO DE REGATA EN MUROS Y PLACAS PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 1 1/2" A 4" SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO, USANDO ADITIVOS TIPO SIKADUR 32 Y SIKATOP 121 O SIMILAR. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE LA CAJA, AJUSTE DE MARCO Y/O REPARACIÓN DE MARCO, SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS. ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI,TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA, SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE EN TUBERÍA EMT DE 1/2" SOBREPUESTA, (LONGITUD PROMEDIO DE SALIDA 3 ML),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PASO, DIMENSIONES 20X20X15, INCLUYE TAPA EN PLÁSTICO Y ADTADORES TERMINAL EMT 1/2",SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE CU 2 X N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 X N° 12 T AWG,MANTENIMIENTO DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE: CAMBIO DE BRAKERS QUE SE REQUIERAN, CAMBIO DE BARRAJES DE NEUTROS Y TIERRAS Y LIMPIEZA GENERAL),MARQUILLADO DE PUNTOS ELÉCTRICO PLASTIFICADO DE 1X2CM, ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.),RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.),DESMONTE DE CERRADURAS (INCLUYE RETIRO

DE SOBRANTES),EXCAVACION MANUAL TIERRA H<2.50 M. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL),RELLENO EN RECEBO B-200, INCLUYE COMPACTACIÓN. , MARCACIÓN DE TUBERÍA DE RED INTERNA CON CINTA COLOR NARANJA A=10 CM,SUMINISTO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M.,LOSETA PREFABRICADA CONCRETO TIPO A50 - 40 X 40 X 6 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:5, HECHO EN OBRA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DURO PISO, GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065, MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M, CENEFAS EN CONCRETO DE 0.30 - 3000 PSI, MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 CM (ANTIC - ESMALTE), MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE MIRILLA METÁLICA DE CAI. CONTEMPLA LA REPARACIÓN DE ZONAS AFECTADAS, MASILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO. MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MARCOS DE CARPINTERÍA EN ALUMINIO MEDIANTE RESANE, MASILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO TIPO ANOLOC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS DE 55X43CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE DOS HOJAS CADA UNA DE 0,675X0,75M EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE: MANIJA, MARCO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE POR AMBAS CARAS., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18. INCLUYE BISAGRAS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE, NO INCLUYE MARCO, GRANITO PULIDO MESONES B = 60 CM INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN, ENCHAPES EN PIEDRA MUÑECA, WIN DE ALUMINIO, RESTAURACIÓN DE PIEDRA MUÑECA. INCLUYE RE EMBOQUILLADA, GRIFERIA LAVAPLATOS TIPO PRISMA O SIMILAR SOBREPONER (SUM E INSTALACIÓN), INSTALACIÓN DE GRIFERIA ORINAL, INSTALACIÓN DE GRIFERIA SANITARIOS, ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR., SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUETIPO AVANTI O SIMILAR, CAMBIO DE ACOPLE SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR CON UN SOLO ORIFICIO CUMPLE CON LA ADA. MARCA TOTO O SIMILAR.,JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER O SIMILAR (SUM E INSTALACIÓN),TAPARREGISTRO 20 X 20 (SUM E INSTALACIÓN),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE CON REJILLA PARA LAVAMANOS, SENCILLO, CON REBOSE, METÁLICO, CROMADO, MARCA A&A O SIMILAR., LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACIÓN),INSTALACIÓN TANQUE P´SANITARIO (M.O.),SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL Ó SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR),GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR,ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL,ESMALTE S/ LAMINA LINEAL,PINTURA KORAZA PARA FACHADAS ,SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (CONTEMPLA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PREVIA APLICACIÓN),CERRADURA SAFE O SIMILAR ENTRADA 142A ALUMINIO SATINADO, SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CERRADURA

DE SEGURIDAD 4 PASADORES PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN CAI´S,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CRISTAL BISELADO DE 4MM,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CONVEXO DE 30CM DE DIÁMETRO. INCLUYE SOPORTE DE FIJACIÒN, ASEO EN OBRA INCLUYE IMPLEMENTOS PARA SU EJECUCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PUERTA DE PISO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.), REGATA SOBRE MUROS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, SELLADO Y EMBOQUILLADO DE REGATA EN MUROS Y PLACAS PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 1 1/2" A 4" SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO, USANDO ADITIVOS TIPO SIKADUR 32 Y SIKATOP 121 O SIMILAR. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE LA CAJA, AJUSTE DE MARCO Y/O REPARACIÓN DE MARCO, SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS. ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI,TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA, SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE EN TUBERÍA EMT DE 1/2" SOBREPUESTA, (LONGITUD PROMEDIO DE SALIDA 3 ML),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PASO, DIMENSIONES 20X20X15, INCLUYE TAPA EN PLÁSTICO Y ADTADORES TERMINAL EMT 1/2",SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE CU 2 X N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 X N° 12 T AWG,MANTENIMIENTO DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE: CAMBIO DE BRAKERS QUE SE REQUIERAN, CAMBIO DE BARRAJES DE NEUTROS Y TIERRAS Y LIMPIEZA GENERAL),MARQUILLADO DE PUNTOS ELÉCTRICO PLASTIFICADO DE 1X2CM,SUMINISTO Y APLICACIÒN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M.,ENCHAPES EN PIEDRA MUÑECA.

CAI RESTREPO: REGATA SOBRE MUROS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, SELLADO Y EMBOQUILLADO DE REGATA EN MUROS Y PLACAS PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 1 1/2" A 4" SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO, USANDO ADITIVOS TIPO SIKADUR 32 Y SIKATOP 121 O SIMILAR. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE LA CAJA, AJUSTE DE MARCO Y/O REPARACIÓN DE MARCO, SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS. ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI,TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA, SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE SALIDA +

TOMACORRIENTE DOBLE EN TUBERÍA EMT DE 1/2" SOBREPUESTA, (LONGITUD PROMEDIO DE SALIDA 3 ML),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PASO, DIMENSIONES 20X20X15, INCLUYE TAPA EN PLÁSTICO Y ADTADORES TERMINAL EMT 1/2",SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE CU 2 X N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 X N° 12 T AWG,MANTENIMIENTO DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE: CAMBIO DE BRAKERS QUE SE REQUIERAN, CAMBIO DE BARRAJES DE NEUTROS Y TIERRAS Y LIMPIEZA GENERAL),MARQUILLADO DE PUNTOS ELÉCTRICO PLASTIFICADO DE 1X2CM, ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.),RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.),DESMONTE DE CERRADURAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES),EXCAVACION MANUAL TIERRA H<2.50 M. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL),RELLENO EN RECEBO B-200, INCLUYE COMPACTACIÓN. , MARCACIÓN DE TUBERÍA DE RED INTERNA CON CINTA COLOR NARANJA A=10 CM,SUMINISTO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M.,LOSETA PREFABRICADA CONCRETO TIPO A50 - 40 X 40 X 6 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:5, HECHO EN OBRA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DURO PISO, GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065, MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M, CENEFAS EN CONCRETO DE 0.30 - 3000 PSI, MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 CM (ANTIC - ESMALTE), MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE MIRILLA METÁLICA DE CAI. CONTEMPLA LA REPARACIÓN DE ZONAS AFECTADAS, MASILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO. MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MARCOS DE CARPINTERÍA EN ALUMINIO MEDIANTE RESANE, MASILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO TIPO ANOLOC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS DE 55X43CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE DOS HOJAS CADA UNA DE 0,675X0,75M EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE: MANIJA, MARCO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE POR AMBAS CARAS., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18. INCLUYE BISAGRAS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE, NO INCLUYE MARCO, GRANITO PULIDO MESONES B = 60 CM INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN, ENCHAPES EN PIEDRA MUÑECA, WIN DE ALUMINIO, RESTAURACIÓN DE PIEDRA MUÑECA. INCLUYE RE EMBOQUILLADA, GRIFERIA LAVAPLATOS TIPO PRISMA O SIMILAR SOBREPONER (SUM E INSTALACIÓN), INSTALACIÓN DE GRIFERIA ORINAL, INSTALACIÓN DE GRIFERIA SANITARIOS, ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR., SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUETIPO AVANTI O SIMILAR, CAMBIO DE ACOPLE SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR CON UN SOLO ORIFICIO CUMPLE CON LA ADA. MARCA TOTO O SIMILAR.,JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER O SIMILAR (SUM E INSTALACIÓN),TAPARREGISTRO 20 X 20 (SUM E INSTALACIÓN),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE CON REJILLA PARA LAVAMANOS, SENCILLO, CON REBOSE, METÁLICO, CROMADO, MARCA A&A O SIMILAR., LLAVE MANGUERA 1/2"

(SUM E INSTALACIÓN),INSTALACIÓN TANQUE P´SANITARIO (M.O.),SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL Ó SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR),GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR,ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL,ESMALTE S/ LAMINA LINEAL,PINTURA KORAZA PARA FACHADAS ,SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (CONTEMPLA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PREVIA APLICACIÓN),CERRADURA SAFE O SIMILAR ENTRADA 142A ALUMINIO SATINADO, SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD 4 PASADORES PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN CAI´S,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CRISTAL BISELADO DE 4MM,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CONVEXO DE 30CM DE DIÁMETRO. INCLUYE SOPORTE DE FIJACIÒN, ASEO EN OBRA INCLUYE IMPLEMENTOS PARA SU EJECUCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PUERTA DE PISO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.), REGATA SOBRE MUROS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, SELLADO Y EMBOQUILLADO DE REGATA EN MUROS Y PLACAS PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 1 1/2" A 4" SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO, USANDO ADITIVOS TIPO SIKADUR 32 Y SIKATOP 121 O SIMILAR. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE LA CAJA, AJUSTE DE MARCO Y/O REPARACIÓN DE MARCO, SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS. ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI,TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA, SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE EN TUBERÍA EMT DE 1/2" SOBREPUESTA, (LONGITUD PROMEDIO DE SALIDA 3 ML),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PASO, DIMENSIONES 20X20X15, INCLUYE TAPA EN PLÁSTICO Y ADTADORES TERMINAL EMT 1/2",SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE CU 2 X N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 X N° 12 T AWG,MANTENIMIENTO DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE: CAMBIO DE BRAKERS QUE SE REQUIERAN, CAMBIO DE BARRAJES DE NEUTROS Y TIERRAS Y LIMPIEZA GENERAL),MARQUILLADO DE PUNTOS ELÉCTRICO PLASTIFICADO DE 1X2CM,SUMINISTO Y APLICACIÒN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M.,ENCHAPES EN PIEDRA MUÑECA.

CAI RAMAJAL: REGATA SOBRE MUROS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, SELLADO Y EMBOQUILLADO DE REGATA EN MUROS Y PLACAS PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 1 1/2" A 4" SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO, USANDO ADITIVOS TIPO SIKADUR 32 Y SIKATOP 121 O SIMILAR. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAJAS DE

INSPECCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE LA CAJA, AJUSTE DE MARCO Y/O REPARACIÓN DE MARCO, SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS. ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI,TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA, SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE EN TUBERÍA EMT DE 1/2" SOBREPUESTA, (LONGITUD PROMEDIO DE SALIDA 3 ML),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PASO, DIMENSIONES 20X20X15, INCLUYE TAPA EN PLÁSTICO Y ADTADORES TERMINAL EMT 1/2",SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE CU 2 X N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 X N° 12 T AWG,MANTENIMIENTO DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE: CAMBIO DE BRAKERS QUE SE REQUIERAN, CAMBIO DE BARRAJES DE NEUTROS Y TIERRAS Y LIMPIEZA GENERAL),MARQUILLADO DE PUNTOS ELÉCTRICO PLASTIFICADO DE 1X2CM, ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.),RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.),DESMONTE DE CERRADURAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES),EXCAVACION MANUAL TIERRA H<2.50 M. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL),RELLENO EN RECEBO B-200, INCLUYE COMPACTACIÓN. , MARCACIÓN DE TUBERÍA DE RED INTERNA CON CINTA COLOR NARANJA A=10 CM,SUMINISTO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M.,LOSETA PREFABRICADA CONCRETO TIPO A50 - 40 X 40 X 6 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:5, HECHO EN OBRA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DURO PISO, GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065, MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M, CENEFAS EN CONCRETO DE 0.30 - 3000 PSI, MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 CM (ANTIC - ESMALTE), MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE MIRILLA METÁLICA DE CAI. CONTEMPLA LA REPARACIÓN DE ZONAS AFECTADAS, MASILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO. MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MARCOS DE CARPINTERÍA EN ALUMINIO MEDIANTE RESANE, MASILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO TIPO ANOLOC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS DE 55X43CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE DOS HOJAS CADA UNA DE 0,675X0,75M EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE: MANIJA, MARCO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE POR AMBAS CARAS., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18. INCLUYE BISAGRAS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE, NO INCLUYE MARCO, GRANITO PULIDO MESONES B = 60 CM INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN, ENCHAPES EN PIEDRA MUÑECA, WIN DE ALUMINIO, RESTAURACIÓN DE PIEDRA MUÑECA. INCLUYE RE EMBOQUILLADA, GRIFERIA LAVAPLATOS TIPO PRISMA O SIMILAR

SOBREPONER (SUM E INSTALACIÓN), INSTALACIÓN DE GRIFERIA ORINAL, INSTALACIÓN DE GRIFERIA SANITARIOS, ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR., SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUETIPO AVANTI O SIMILAR, CAMBIO DE ACOPLE SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR CON UN SOLO ORIFICIO CUMPLE CON LA ADA. MARCA TOTO O SIMILAR.,JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER O SIMILAR (SUM E INSTALACIÓN),TAPARREGISTRO 20 X 20 (SUM E INSTALACIÓN),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE CON REJILLA PARA LAVAMANOS, SENCILLO, CON REBOSE, METÁLICO, CROMADO, MARCA A&A O SIMILAR., LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACIÓN),INSTALACIÓN TANQUE P´SANITARIO (M.O.),SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL Ó SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR),GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR,ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL,ESMALTE S/ LAMINA LINEAL,PINTURA KORAZA PARA FACHADAS ,SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (CONTEMPLA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PREVIA APLICACIÓN),CERRADURA SAFE O SIMILAR ENTRADA 142A ALUMINIO SATINADO, SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD 4 PASADORES PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN CAI´S,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CRISTAL BISELADO DE 4MM,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CONVEXO DE 30CM DE DIÁMETRO. INCLUYE SOPORTE DE FIJACIÒN, ASEO EN OBRA INCLUYE IMPLEMENTOS PARA SU EJECUCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PUERTA DE PISO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.), REGATA SOBRE MUROS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, SELLADO Y EMBOQUILLADO DE REGATA EN MUROS Y PLACAS PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 1 1/2" A 4" SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO, USANDO ADITIVOS TIPO SIKADUR 32 Y SIKATOP 121 O SIMILAR. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE LA CAJA, AJUSTE DE MARCO Y/O REPARACIÓN DE MARCO, SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS. ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI,TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA, SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE EN TUBERÍA EMT DE 1/2" SOBREPUESTA, (LONGITUD PROMEDIO DE SALIDA 3 ML),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PASO, DIMENSIONES 20X20X15, INCLUYE TAPA EN PLÁSTICO Y ADTADORES TERMINAL EMT 1/2",SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE CU 2 X N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 X

N° 12 T AWG,MANTENIMIENTO DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE: CAMBIO DE BRAKERS QUE SE REQUIERAN, CAMBIO DE BARRAJES DE NEUTROS Y TIERRAS Y LIMPIEZA GENERAL),MARQUILLADO DE PUNTOS ELÉCTRICO PLASTIFICADO DE 1X2CM,SUMINISTO Y APLICACIÒN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M.,ENCHAPES EN PIEDRA MUÑECA.

Equipamientos nuevos a los cuales se les hizo o se inició el mantenimiento en AGOSTO y también la descripción breve del tipo de mantenimiento.

URI DE PUENTE ARANDA: REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" Ó EQUIVALENTE, REPARACIONES HIDRAULICAS DE PVC DE 1/2",3/4" Y 1", SONDEOS DE PUNTOS SANITRARIOS (ENTRE 1 1/2" Y 4"), REJILLA CON SOSCO DE 3X2", DESMONTE DE CERRADURAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES), MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN ALUMINIO, CERRADURA SAFE O SIMILAR BAÑO CLASIC 152 - ALUMINO SATINADO, CERRADURA SCHLAGE O SIMILAR BAÑO A-40S,

CER: DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P´ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO), DESMONTE DE PUSH SANITARIOS, DESMONTE DE ACCESORIOS SANITARIOS (TAPA REGISTROS, POMOS, REGADERAS, INCRUSTACIONES, REJILLAS, ETC…), ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2", ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4", REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" Ó EQUIVALENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUSH ANTI VANDÁLICO PARA SANITARIO.

E.P PUENTE ARANDA NUEVA: DESMONTE DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS (TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES).,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA,ESMALTE S/ LAMINA LINEAL,BARNIZ S/MUEBLES, DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES),DESMONTE DE CABLEADO ELÉCTRICO (CONTEMPLA LOS CABLES CONTENIDOS DENTRO DE UN DUCTO ENTRE CALIBRES #8, #10 Y #14),SONDEO DE PUNTOS SANITARIOS (ENTRE 1 1/2" Y 4"),CABLEADO 2#10,BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A, MANTENIMIENTO GENERAL DE TABLEROS DE 18 CIRCUITOS TRIFÁSICOS (INCLUYE: CAMBIO DE BREAKERS QUE SE REQUIERAN, CAMBIO DE BARRAJES DE NEUTROS Y TIERRAS Y LIMPIEZA GENERAL),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE DE 3MM CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE CON EMULSIÓN ASFÁLTICA. ,PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 MM,PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR, DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.),DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE

SOBR.),DEMOLICIÓN AFINADO DE PISO DE 5 CMS,DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.),DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P´ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO),ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.),SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.),SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.),DESMONTE DE SIFONES, DESMONTE DE PUSH SANITARIOS, DEMOLICIÓN DE ACABADOS CERÁMICOS DE PISO O MUROS EN ALTURAS DE HASTA 3M. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS), DESMONTE DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS (TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES)., DESMONTE DE PISO EN CAUCHO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES), REMATES LADRILLO TOLETE PRENSADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PRINCIPAL DE AGUA POTABLE D=3", MANTENIMIENTO DE LAS DOS BOMBAS DEL SISTEMA DE PRESIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN A 60PSI, CALIBRACIÓN DE LOS PRESOS TATOS A 90 Y 85 PSI. INCLUYE REVISIÓN DE CONEXIÓN DE MOTORES Y TABLEROS, INCLUYE INSTALACIÓN DE DOS VÁLVULAS DESAIRADORAS DE 1" CON ACCESORIOS. BRIGADA XIII.,CAMBIO DE TUBERÍA DE LA DESCARGA DE LA BOMBA, INCLUYE: 3 NIPLES DE 1 1/2", 1 REGISTRO DE 1 1/2", 1 CHEQUE DE 1 1/2" Y 1 UNIÓN COUPLING DE 1 1/2",CAMBIO DE FLAUTA, INCLUYE: 2 TEES DE 3", 3 NIPLES DE 3", 1 COPA DE 3 X 1 1/2", 1 BRIDA DE 3", 2 NIPLES DE 1 1/2" Y 8 UNIONES COUPLING DE 3",REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" Ó EQUIVALENTE,REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" Ó EQUIVALENTE,PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS),REPARACIONES HIDRÁULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1",PUNTO DESAGUE PVC Ø 2",REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" ,ACCESORIO PVC-S Ø 3",SONDEO DE PUNTOS SANITARIOS (ENTRE 1 1/2" Y 4"),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RED WHITE 3" O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO DEL CHEQUE EXISTENTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN TIPO ACORDEÓN PLÁSTICO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE LA CAJA, AJUSTE DE MARCO Y/O REPARACIÓN DE MARCO, SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC, SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC, SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 9W, 95-227V, 870 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN-THWN N 10 600V NE,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, TUBERÍA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS,INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A,INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 40/60 A, MANTENIMIENTO GENERAL DE TABLEROS DE 18 CIRCUITOS TRIFÁSICOS (INCLUYE: CAMBIO DE BREAKERS QUE SE REQUIERAN, CAMBIO DE BARRAJES DE NEUTROS Y TIERRAS Y LIMPIEZA GENERAL),MANTENIMIENTO GENERAL DE TABLEROS DE 24 CIRCUITOS TRIFÁSICOS (INCLUYE: CAMBIO DE BREAKERS QUE SE REQUIERAN, CAMBIO DE BARRAJES DE NEUTROS Y TIERRAS Y LIMPIEZA GENERAL),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE CU EN CABLE #8 AWG, (3 FASES +

1 NEUTRO) + 1 #10 AWG THHN/THWN 90º ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE CU 2 X N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 X N° 12 T AWG,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE CU 2 X N° 10 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 X N° 12 T AWG,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 40X40X20 EN LÁMINA COLD ROLLED CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA CALIBRE 20 ,MARCACIÓN DE TUBERÍA DE RED INTERNA CON CINTA COLOR NARANJA A=10 CM,REVISIÓN Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS (CONTEMPLA: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PEINADO Y LIMPIEZA DE TABLERO Y MARQUILLADO),SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M.,LIMPIEZA Y REEMBOQUILLE DE ENCHAPE, AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 CM,GRANITO PULIDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 6 CM. INCLUYE DESMOTE Y RETIRO DE MEDIACAÑA EXISTENTE Y TORNILLO DE FIJACIÓN., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO SPC. INCLUYE SUPERLON REFORZADO 2MM, MANTENIMIENTO DE CUBIERTA METÁLICA. INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÒN, SIKAFLEX PARA SELLADO Y REEMPLAZO DE TEJAS EN MAL ESTADO EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 8 METROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS EN ALUMINIO SOPORTE 60*60. INCLUYE PINTURA ELECTROESTATICA,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANGEO EN FIBRA DE VIDRIO PARA MOSQUITOS, ROEDORES Y AVES., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO PLATINA 6" X 10" REFORZADO CON SOPORTE TRANSVERSAL ,ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(INC. WIN Y REMATE EN ALUMINIO),REFLECTOR DE PISO 250 W,PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 100W,DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACIÓN),ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR.,CAMBIO DE ACOPLE SANITARIO, DESMONTE Y REPOSICIÓN DE MANIJA DE DUCHA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TAPARREGISTRO 20 X 20 (SUM E INSTALACIÓN),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE CON REJILLA PARA LAVAMANOS, SENCILLO, CON REBOSE, METÁLICO, CROMADO, MARCA A&A O SIMILAR., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN EN P, PARA LAVAMANOS, METÁLICO CROMADO. IMPORTADO, MARCA A&A O SIMILAR., LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACIÓN),REVISIÓN Y REPARACION TANQUE P´SANITARIO (LAVADO, CAMBIO FLOTADOR Y ACCESORIOS),GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR,SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI O SIMILAR ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL DE ENTRADA PARA TANQUE DE SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL DE SALIDA PARA TANQUE DE SANITARIO, CIELO RASO PLANO DRYWALL,ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL DE ARRANQUE SUAVE DE PRESIÓN CON VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOBOMBAS DE 7.5 HP, INCLUYE ADECUACIÓN ELÉCTRICA A CERO METROS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE: TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL Y MANDO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 18 CONTARA DE: BREAKER GENERAL 50ª. - PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CARGA, CAÍDA DE FASE, CON

INDICADOR DE SALTO DE RELÉ. - CONTROLADOR DE ARRANQUE MANDO BOMBAS TIPO PLC SIEMENS O SIMILAR. -TRES VARIADORES DE FRECUENCIA 7,5 HP 220V INVERTEC O SIMILAR. - CUATRO SELECTORES MANUAL OFF AUTOMÁTICO, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON MARQUILLAS. - CUATRO LÁMPARAS LUMINOSAS INDICADORAS DE OPERACIÓN Y APAGADO DE LAS BOMBAS. - CIRCUITO DE CONTROL CABLE NO. 18 AWG EN CON AMARRES Y MONTADURAS PLÁSTICAS. - PLANO DE CONEXIONES. - CERRADURA CON LLAVE.

CASA DE JUSTICA CAMPO VERDE: DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRATES), DESMONTE DE CERRADURAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRATES), DESMONTE DE PUSH SANITARIOS, DESMONTE DE ACCESORIOS ELECTRICOS (TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES), SONDEO DE PUNTOS SANITARIOS (ENTRE 1 1/2" Y 4"), SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS – PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, CABLEADO 1#10, CABLEADO 2#10, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA EMT DE 1/2" SOBREPUESTA, (LONGITUD PROMEDIO DE SALIDA 3 ML), REINSTALACION DE LUMINARIA DE INCRUSTAR O SOBREPONER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS EN ALUMINIO SOPORTE 60*60. INCLUYE PINTURA ELECTROESTATICA, INSTALACIÓN CARPINTERIA METALICA, MANTENIMIENTO DE PORTON EN LÁMINA COLD ROLLED DE 480 X 300 CM(INCLUYE INSTALACION DE PLATINAS DE 3/16", PASADORES, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE , DURO HUESO Y SOLDADURA, EN CADA CARA DE LOS TUBOS DE 1 " Y EN LAS 2 CARAS DE LA LAMINA), SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO CIERRAPUERTAS DE 150 KGS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZOS PROYECTANTE PARA VENTANA EN ALUMINIO, INCLUYE AJUSTE Y MANIJA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS HERMETICAS, PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA EXTERIOR TIPO TORTUGA DE 10W CON REJILLA COLOR NEGRO. (INCLUYE BOMBILLO), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFELCTOR DE 100W, TAPARREGISTRO 15 X 15 (SUM E INSTALACIÓN), TAPARREGISTRO 20 X 20 (SUM E INSTALACIÓN), GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUSH ANTIVANDALICO PARA SANITARIO, CIELO RASO PLANO DRYWALL, DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA, VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M. PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN TRES (3) CAPAS CON LIJADO PARA ACABADO FINAL. INCLUYE TRANSPORTE DE INSUMOS A OBRA, CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL, BRAZO RETENEDOR DORMA NO. 2, SUMINISTRO E INSTALACION MANIJA GALVANIZADA PARA PUERTA, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS MEDIANTE EL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PELICULA SANDBLASTING, SUMINISTRO DE CANDADO TIPO ALEMAN YALE 870 O SIMILAR CON GANCHO EN ACERO ENDURECIDO DOBLEO BLOQUEO, ANTISEGUETA, SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.

CAI SAN LUIS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS. ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, TUBERÍA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE EN TUBERÍA EMT DE 1/2" SOBREPUESTA, (LONGITUD PROMEDIO DE SALIDA 3 ML),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PASO, DIMENSIONES 20X20X15, INCLUYE TAPA EN PLÁSTICO Y ADTADORES TERMINAL EMT 1/2",REVISIÓN Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS (CONTEMPLA: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PEINADO Y LIMPIEZA DE TABLERO Y MARQUILLADO),MARQUILLADO DE PUNTOS ELÉCTRICO PLASTIFICADO DE 1X2CM,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA METÁLICA DE 9,5X9,5CM, INCLUYE SEGURO CON PLATINA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 100W,ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR CON UN SOLO ORIFICIO CUMPLE CON LA ADA. MARCA TOTO O SIMILAR., JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER O SIMILAR (SUM E INSTALACIÓN),TAPARREGISTRO 20 X 20 (SUM E INSTALACIÓN),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE CON REJILLA PARA LAVAMANOS, SENCILLO, CON REBOSE, METÁLICO, CROMADO, MARCA A&A O SIMILAR., LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACIÓN),SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL Ó SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR),GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (CONTEMPLA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PREVIA APLICACIÓN),LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE DE PUERTA DE PISO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÒN, MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISO TIPO LOSETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO TIPO A50 CONTEMPLANDO LA REINSTALACIÓN DE LAS MISMAS LOSETAS DESMONTADAS. INCLUYE BASE DE MORTERO 1:5, CENEFAS EN CONCRETO DE 0.30 - 3000 PSI, SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE PUERTA BLINDADA (0,80X2,05M) CON MARCOS Y NAVE DE PUERTA FABRICADOS EN LAMINA COLD- ROLLED CAL. 14 PARA NIVEL III, MONTAJE DE MARCO A TRAVÉS DE TORNILLOS DE EXPANSIÓN Y EPÓXICOS.

CHAPA DE SEGURIDAD MULTIPUNTOS CON DOS (2) PASADORES (SUP. - INF.); CUATRO (4) AL FRENTE INCLUIDO EL PICAPORTE; SISTEMA DE LLAVES CODIFICADAS (5 UNIDADES). BISAGRAS TIPO CILINDRO DE ALTA RESISTENCIA EN ACERO COLD-ROLLED DE ¾" DE DIÁMETRO Y 3 ½" DE LONGITUD, SISTEMA DE RODAMIENTO INTERNO. MANIJAS DE APERTURA. (EXTERIOR- INTERIOR). ACABADOS EN LÁMINA Y PINTURA ELECTROSTÁTICA. MATERIALES DE FABRICACIÓN ANTI - INFLAMABLES. CRISTALES LAMINADOS EN CALIENTE NIVEL III. EXTREMO DE PASADORES DE LA CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE DE ½". SISTEMA INTERNO CON BUJES Y EMPAQUES EN VARILLAS PARA EVITAR EL RUIDO DE ELLAS. DISEÑO CON CRISTAL BLINDADO EN MODULO SUPERIOR Y MONTANTE SIMILAR AL DISEÑO DE LAS PUERTAS PARA CAI., PINTURA KORAZA PARA FACHADAS, ASEO EN OBRA INCLUYE ELEMENTOS PARA SU EJECUCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA BLINDADA EN COLD-ROLLED CAL. 14 NIVEL III. 1. CRISTALAES LAMINADOS EN CALIENTE INCOLORO E=30 MM NIVEL LLL. PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR CRUDO O NATURAL. PISA VIDRIO Y MARCO. 4. MONTAJE A TRAVES DE TORNILLOS DE EXPANSIÓN Y EPÓXICOS. PELÍCULA DE SEGURIDAD O ANTIESQUIRLAS DE 4" MLS. DE ESPESOR.

NUEVO COMANDO: DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.). RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS INCLUYE ENBALAJE, TRANSPORTE SEGÚN COTIZACIÓN Y NORMATIVIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. DESMONTE DE PUSH SANITARIOS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE EN CONCRETO PARA AGUA POTABLE, MURO EN LAMINA DE SUPERBOARD, DOBLE CARA B 9 CON ESPESOR DE 6 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA ACRILICA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN), SONDEO DE PUNTOS SANITARIOS (ENTRE 1 1/2" Y 4"), GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUSH ANTIVANDALICO PARA SANITARIO, VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS, LINEAS TRAFICO 0.10. REMOCION DE PINTURA SUELTA MANUAL, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M. PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN TRES (3) CAPAS CON LIJADO PARA ACABADO FINAL. INCLUYE TRANSPORTE DE INSUMOS A OBRA, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PELICULA SANDBLASTING, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIKA FLEX PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS, ASEO EN OBRA INCLUYE IMPLEMENTOS PARA SU EJECUCION DENTRO DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS, LAVADO Y SECADO DE PISO FLOTANTE EN PORCELANATO 60X60 E=2 CM CON SISTEMA DE LAVADO A PRESION INCLUYE TODOS LO ELEMENTOS PARA SU EJECUCION (SECCIONES DE MAXIMO 100 M2), DESMONTE PISO FLOTENTE TIPO PORCELANATO 60X60 E=2 CM INCLUYE SISTEMA SUCCION PARA RETIRO DE PIEZAS, TRASIEGO DE PIEZAS A ZONA DE ACOPIO INCLUYE RETIRO PLOTS E INVENTARIO DE IDENTIFICACION. (SECCIONES DE MAXIMO 100 M2), LAVADO DE MEMBRANA IMPERMEBILIZANTE DE ACUERDO A FICHA TECNICA DEL PROVEDOR CON SISITEMA DE PRESION GRADUABLE INCLUYE TODOS LOS

ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION (SECCIONES DE MAXIMO 100 M2), REINTALACION PISO FLOTENTE TIPO PORCELANATO 60X60 E=2 CM INCLUYE SISTEMA SUCCION PARA PUESTA DE PIEZAS, TRASIEGO DE PIEZAS DESDE ZONA DE ACOPIO INCLUYE INSTALACION DE PLOTS. (SECCIONES DE MAXIMO 100 M2), REINTALACION PISO FLOTENTE TIPO PORCELANATO 60X60 E=2 CM INCLUYE SISTEMA SUCCION PARA PUESTA DE PIEZAS, TRASIEGO DE PIEZAS DESDE ZONA DE ACOPIO INCLUYE INSTALACION DE PLOTS. (SECCIONES DE MAXIMO 100 M2

CAE - CTP CAMPO VERDE: DEMOLICION DE MUROS (E=0,15) EN ALTURA DE 17M, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE, DESMONTE DE ACCESORIOS ELECTRICOS (TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES), MURO EN LADRILLO PRENSADO SANTAFE O SIMILAR E = 12 CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN LAMINA DE SUPERBOARD, DOBLE CARA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POYO PARA DUCHA O MUEBLES CON ALTURA DE 10 A 12 CM Y CON ANCHOS IGUALES O INFERIORES A 12 CM, REPARACIONES HIDRÁULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1", CONDUCTO EVACUACION GAS 15 X 22, INSTALACIÓN INTERNA PUNTO ADICIONAL 6 M, SOPORTE A LA RED, SELLADO Y EMBOQUILLADO DE REGATA EN MUROS Y PLACAS PARA TUBERÍAS DE DIAMETROS ENTRE 1 1/2" A 4" SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO, USANDO ADITIVOS TIPO SIKADUR 32 Y SIKATOP 121 O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PE AL PE DE 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESIORIOS PARA CONEXIÓN DE EN TUBERÍA PE AL PE DE 1/2", SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA – PVC, REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS (TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES), PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, LLENADO Y SELLADO DE ORIFICIOS PASADORES DE MUROS CON MORTERO Y EPÓXICO PARA ANCLAJES TIPO SIKA ANCHOFIRX-2 O SIMILAR, REALIZANDO LA PREVIA IMPRIMACIÓN DE LAS PAREDES INTERNAS DEL ORIFICIO CON ADHESIVO EPÓXICO PARA ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE LISO 1:4 LINEAL, (ANCHO MAXIMO 0,6M). APLICADO EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M, PICADA DE ALISTADO ENDURECIDO PARA GENERAR SUPERFICIE RUGOSA PARA INSTALACIÓN DE PISO EN CERAMICA, SUMINSITRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA TERMOACÙSTICA TIPO UPVC E= 2,5MM O SIMILAR. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÒN Y ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURA. NO INLCUYE CABALLETE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN TIPO PERSIANA, INCLUYE BATIENE EN 2 HOJAS MARCO CALIBRE 16, VANOS TUBULARES, PERSIANA DOBLE PESTAÑA MACHIMBRADA, PASADORES, FALLEBAS, CHAPA Y TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MALLA EXPANDIDA IMT-20 CAL. 14 INSTALADA A MODO DE CIELO RAZO SOLDADA SOBRE REJA DE SEGURIDA. INCLUYE PLATINA PISAMALLA DE 1 1/2X3/16" ANTICORROSIVO Y ESMALTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANGEO EN FIBRA DE VIDRIO PARA MOSQUITOS, ROEDORES Y AVES, WIN DE ALUMINIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED LINEAL, LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACIÓN), LAMINA PLANA ETERNIT 244 X 122 X 6, VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS, ESMALTE S/ LAMINA LINEAL, ESMALTE S/ MARCOS LAMINA, LINEAS TRAFICO 0.10, APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA

MAXIMO 30CM, APICACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M. PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN TRES (3) CAPAS CON LIJADO PARA ACABADO FINAL. INCLUYE TRANSPORTE DE INSUMOS A OBRA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO LINEAL PARA INTERIORES 3 MANOS PARA ANCHOS IGUALES O INFERIORES A 40 CM, REMOCIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN ACRILICO DE 5MM. INCLUYE APLICACIÓN DE SIKAFLEX, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS 30CMX60CM INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, ASEO EN OBRA INCLUYE IMPLEMENTOS PARA SU EJECUCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO PESADA EN ALTURAS INFERIORES A 3 METROS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO

Cantidad de emergencias atendidas en AGOSTO y la descripción breve del tipo de emergencia/mtto atendido.

51 EMERGENCIAS ATENDIDAS, LA MAYORÍA POR REQUERIMIENTO DE FILTRACIONES DE AGUA, FALLAS ELÉCTRICAS Y DAÑOS EN LUMINARIAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBAS, REFORZAMIENTO DE REJAS, CAMBIO DE CUBIERTA, SONDEOS RED SANITARIA. LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES.

Así mismo, si se adicionan recursos durante el mes al contrato describirlo y el por qué se adicionaron

LA SUPERVISIÓN DA APROBACIÓN DE UNA ADICIÓN EN VALOR POR DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES PESOS MCTE ($2.748.000.000) Y UNA PRÓRROGA POR DOS MESES.

También incluir el porcentaje de avance del contrato a AGOSTO

*EJECUTADO FÍSICO: 88,56%

*AVANCE EN TIEMPO: 88,22%

*FINANCIERO: 62,82% (COBRADO)

Como recomendaciones y conclusiones, se solicita al contratista solucionar problemas con las dotaciones de EPP hacia los trabajadores de todos los frentes, como también señalizar, ubicar y retirar de los equipamientos los escombros que existan para que cumplan con la normativa.

Durante el presente periodo se continúa con el seguimiento y control de las obligaciones de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra 1805/23.

Se solicita al contratista incrementar el personal en todos los frentes de obra.

11. ANEXOS

11.1. Informes semanales
11.2. Actas de comité
11.3. Relación de correspondencia enviada y recibida
11.4. Bitácora de Emergencia y Bitácoras de Obra
11.5. Registro Fotográfico
11.6. Conceptos Técnicos de los Especialistas
11.7. Actualización Estado Casas de Justicia
11.8. Reporte Estado Equipo Mínimo de trabajo
11.9. Control General del Contrato
11.10. Informe SST
11.11. Informe Ambiental
