Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

**SGRD-25000**

San José de Cúcuta,

**Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:**
**Rad No. 2024-25000-028143-3**
2024-11-12 09:27 -RIESGO
Destino: 11400
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: TRAMITE DE PAGO: IM
Folios: 188
Anexos: INFORME DE ACTIVIDADES

Doctor
**ADRIANA BOADA ARGUELLO**
Profesional Especializado, Grado 10
Área de Presupuesto
Secretaria de hacienda Departamental
Gobernación de Norte de Santander

**REFERENCIA: TRAMITE DE PAGÓ** **SECOP II**

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, estoy enviando los respectivos documentos para la cancelación del compromiso relacionado a continuación:

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS NIT 901266624-6** , la suma de **QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($523.667.735,00) Registro Presupuestal No. 00 000072, fuente de financiación No. 1.2.1.0.00 – Ingresos corrientes de libre destinación**, correspondiente al acta parcial de obra No. 02 **RE-SGRD-001885-2024.**

Atentamente,

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretaria de Despacho
Secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres

| Trazabilidad | Nombre | Cargo | Firma / fecha |
|---|---|---|---|
| Proyectó: | **María Belén Para Ramirez** | **Secretaria** | |
| Revisión jurídica: | **Marlym Jhoana Montoya Novoa** | **Contratista** | |
| Aprobación Jurídica: | **Marlym Jhoana Montoya Novoa** | **Contratista** | |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

# ACTA PARCIAL #2

# CONTRATO DE OBRA No. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024

## OBJETO

**CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.**

## CONTRATISTA:

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S**

## PERIODO

**09 DE OCTUBRE DE 2024 A 05 DE NOVIEMBRE DE 2024**

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

San José de Cúcuta, 05 de noviembre de 2024

Doctor
**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Norte de Santander

REFERENCIA: RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 AGOSTO DE 2024, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

**Asunto:** Documentación Acta Parcial de Obra #1

Con el presente oficio se hace entrega de la documentación que soporta el **Acta Parcial de Obra No. 2** correspondiente al periodo de ejecución desde el 09 de octubre de 2024 al 05 de noviembre de 2024 del contrato de obra RE-SGRD- 01885-2024

**CONTENIDO**

- Factura
- Oficio Autorización descuento de estampilla Pro hospital 2%
- Certificación cuenta bancaria
- Copia RUT
- Copia del contrato
- Copia pólizas y aprobaciones
- Copia de disponibilidad presupuestal
- Copia de registro presupuestal
- Copia acta de inicio
- Copia acta parcial con anexo 01
- Memorias de cantidades y pre acta
- Certificado de contador manifestando que el contratista no tiene inhabilidad
- Informe de contratista con registro fotográfico.
- Informe de interventoría

Sin otro particular

Atentamente,

IVM CONSTRUCTORES SAS
NIT 901.266.624-6
R/L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
CC. 88.279.674
Contratista de Obra.

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

# 1. FACTURA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031




# IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S

**NIT : 901.266.624-6 Responsable de IVA**

Dirección : Calle 12 #4-47 Ofic 33 CC Internacional
Telefonos : 5710503
Email : ingimarvacca@hotmail.com
Cúcuta - Norte de Santander - Colombia

Resolución de Facturación N° 18764081192537. Numeración Autorizada Del IV 70 Hasta IV 200 Fecha 08/10/2024 Vigencia 12 Meses 08/10/2025

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **IV - 73**

**CLIENTE :** FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
**NIT ó C.C:** 900978341
**DIRECCION:**
**Ciudad:** CUCUTA
**Telefono:**
**EMAIL:**
**VENDEDOR :** VARIOS

**FECHA Y HORA EMISION**
12/11/2024 - 11:25:24 a. m.

**Forma de Pago:** CONTADO
**Fecha Vencimiento:**

| CANT. | DESCRIPCION | BOD | UND | IVA | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | COSTO DIRECTO | | UND | 0 | 398,975,181.00 | 398,975,181.00 |
| 1.00 | ADMINISTRACION 25% | | UND | 0 | 99,743,795.00 | 99,743,795.00 |
| 1.00 | IMPREVISTOS 0.5% | | UND | 0 | 1,994,876.00 | 1,994,876.00 |
| 1.00 | UTILIDAD 4.5% | | UND | 0 | 17,953,883.00 | 17,953,883.00 |
| 1.00 | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL | | UND | 0 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

OBSERVACIONES : ACTA N°2CONSTRRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO,MUNICIPIO DE CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CLAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO001287 DEL 06 DE JUNO DE 2024

SON : QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO Pesos

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 523,667,735.00 |
| **DESCUENTO** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **RETE. FTE.** | 0.00 |
| **TOTAL** | **523,667,735.00** |

CUFE:7c87a6048bb6cba70705a38dc6b1c9633b2aff8aa1095a41ff19aca0b6267f26a341615a7255aa5f4bde804fdcbfd8f8

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 772 al 779 del Codigo de Comercio. Causará intereses a la tasa maxima legal vigente, mensual o fracción a partir del vencimiento. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita y acepta el valor estipulado en la misma. Una vez entregada la mercancia a satisfacción del cliente no se aceptan reclamos ni devoluciones.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Fecha:

FIRMA Y SELLO EMPRESA

CONSTRUCTORES S.A.S

# 2. AUTORIZACION DESCUENTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL 2%

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

IVM CONSTRUCTORES S.A.S

San José de Cúcuta, 05 de noviembre de 2024

Señores
**TESORERIA DEPARTAMENTAL**
San José de Cúcuta

REFERENCIA: RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 AGOSTO DE 2024, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

Asunto: **Autorización Descuento Estampilla 2%**

El presente tiene como fin autorizar por medio de esta notificación se descuente el 2% correspondiente a las estampillas departamentales y descuentos de ley de la referencia a la factura de la referencia, por concepto Acta Parcial No. 02 de fecha 05 de noviembre de 2024

Sin otro particular

**IVM CONSTRUCTORES SAS**
**NIT 901.266.624-6**
**R/L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**
**CC. 88.279.674**
Contratista de Obra.

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

# 3. CERTIFICACION BANCARIA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

DAVIVIENDA

## A QUIEN INTERESE

CUCUTA 2022/08/26

COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS con Nit número 9012666246 de CUCUTA-NORTE DE SANTANDER posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**

| | |
|---|---|
| Número | 108969964056 |
| Fecha Apertura | 2022/08/26 |

Cordialmente,

DAVIVIENDA
660-OF. PRINCIPAL CUCUTA

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

# 4. RUT

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141043792596

(415)7707212489984(8020) 000014104379259 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 6 6 2 4 | 6 | Impuestos de Cúcuta 7 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO | IVM CONSTRUCTORES SAS |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Norte de Santander 5 4 | Cúcuta 0 0 1 |

41. Dirección principal
MODULO 4 SEC NUEVA SEXTA LC 21

42. Correo electrónico ivmconstructoressas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 5 2 0 7 2 0 3 1 | 3 2 2 9 1 0 1 7 8 1 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 2 0 | 2 0 2 4 0 5 3 0 | 4 2 1 0 | 2 0 1 9 0 3 1 5 | 0 8 1 1 | 0 9 9 0 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 4 8 5 2 5 5

- 5- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 30 / 14 : 38: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VACCA MACHADO IMAR ORLANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043792596

(415)7707212489984(8020) 000014104379259 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 6 6 2 4 | 6 | Impuestos de Cúcuta | 7 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 1 | |
| 73. Fecha | 2 0 1 9 0 3 0 1 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 9 0 3 1 9 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 3 4 6 1 9 0 | |
| 78. Departamento | 5 4 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 9 0 3 1 9 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Ítem | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043792596

(415)7707212489984(8020) 000014104379259 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 6 6 2 4 | 6 | Impuestos de Cúcuta 7 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 9 0 3 1 9 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadani 1 3 | 8 8 2 7 9 6 7 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VACCA | MACHADO | IMAR | ORLANDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043792596

(415)7707212489984(8020) 000014104379259 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 6 6 2 4 | 6 | Impuestos de Cúcuta | 7 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 9 1 1 6 2 6 9 3 | 0 | 1 9 7 1 5 6 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GERARDINO | SALCEDO | FRANKI | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 3 0 6 3 0 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 6 0 4 4 7 4 7 7 | 7 | 2 2 0 7 3 5 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MONSALVE | CHAUSTRE | ERIKA | LORENA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 0 0 8 0 1 |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# 5. COPIA DEL CONTRATO

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6692624 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 2 días de tiempo transcurrido *(28/08/2024 7:31:44 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | RE-SGRD-01885-2024 |
| **Objeto del contrato** | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 4 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 28/12/2024 11:59 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 29/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 29/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

IVM CONSTRUCTORES SAS

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 901266624

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | Banco de Bogotá | Ahorros | 303285241 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

*Aprobado por:* Imar Orlando Vacca Machado *Fecha de aprobación:* 29/08/2024 9:55:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

*Aprobado por:* William Vera Arias *Fecha de aprobación:* 30/08/2024 9:46:06 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayùu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de**

garantías? ☑Si ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Si ☑No

Seriedad de la oferta ☐Si ☑No

Cumplimiento ☑Si ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día de tiempo transcurrido *(29/08/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 28/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día de tiempo transcurrido *(29/08/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 28/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 16 días de tiempo transcurrido *(14/08/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 29/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

Responsabilidad civil extra contractual ☑Si ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(2/09/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☑No

## Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

## Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6692624
Proveedor IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros.
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros.
Código postal

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| Latitud: | | | |
| Longitud: | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE CUCUTILLA | COLOMBIA > Norte de Santander > Cucutilla |

1 CO1.PCCNTR.6692624

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1.499.910.681,00 | 1.499.000.749,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 72141107 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR EL GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 1287 DEL 6 DE | 1,00 | UN | 1.499.910.681,00 | 1.499.000.749,00 | 1.499.910.681,00 | 1.499.000.749,00 |

17

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 23 horas de tiempo transcurrido (29/08/2024 9:53:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | ANALISIS DEL SECTOR PUENTE CUCUTILLA 30 07 24.pdf | ANALISIS DEL SECTOR PUENTE CUCUTILLA 30 07 24.pdf | (detalle) |
| ☐ | ESTUDIO DE OPORTUNIDAD PUENTE CUCUTILLA.pdf | ESTUDIO DE OPORTUNIDAD PUENTE CUCUTILLA.pdf | (detalle) |
| ☐ | CDP 00000079 PUENTE CUCUTILLA.pdf | CDP 00000079 PUENTE CUCUTILLA.pdf | (detalle) |
| ☐ | ANEXO 1 CLAUSULADO GENERAL.pdf | ANEXO 1 CLAUSULADO GENERAL.pdf | (detalle) |
| ☐ | ANEXO 2 CLAUSULADO ESPECIFICO CONTRATO DE OBRA RE-SGRD-01885-2024.pdf | ANEXO 2 CLAUSULADO ESPECIFICO CONTRATO DE OBRA RE-SGRD-01885-2024.pdf | (detalle) |
| ☐ | DECRETO 001287 DEL 06 JUNIO 2024 CALAMIDAD PUBLICA.pdf | DECRETO 001287 DEL 06 JUNIO 2024 CALAMIDAD PUBLICA.pdf | (detalle) |
| ☐ | EVALUACION PUENTE CUCUTILLA VF.pdf | EVALUACION PUENTE CUCUTILLA VF.pdf | (detalle) |
| ☐ | RESOLUCION ADJUDICACION RE SGRD 01885 2024.pdf | RESOLUCION ADJUDICACION RE SGRD 01885 2024.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Willian Vera Arias | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 88158521 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Willian Vera Arias | 30/08/2024 9:46:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Willian Vera Arias |

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Si ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

| | | Valor |
|---|---|---|
| Presupuesto General de la Nación - PGN | ☐Si ☑No * | |
| Sistema General de Participaciones - SGP | ☐Si ☑No * | |
| Sistema General de Regalías - SGR | ☐Si ☑No * | |
| Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) | ☑Si ☐No * | 1.499.000.749 |
| Recursos de Crédito | ☐Si ☑No * | |
| Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) | ☐Si ☑No * | |
| | Total | 1.499.000.749 |

Validación Código BPIN

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2021004540151 | 2024 | Validado |

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Si ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 00000079 | CDP | No se ha iniciado | | 1.499.910.681 COP | 00-00-00 | - | Editar |

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

# 6. POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

# ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS

| GENERALIDADES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO / CONVENIO Nº Y FECHA: | RE-SGRD-01685-2024 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 | | | |
| VALOR INICIAL (En números): | $ 1.499.000.749 | | | |
| PLAZO: | **4 Meses** | | | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | No. 00000079 DEL 26 JULIO 2024 | | | |
| **GARANTÍAS:** | **AMPAROS INICIALES:** | **(%)** | **AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).** | **(%)** |
| Garantía de seriedad del ofrecimiento | | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo. | | | | |
| Pago anticipado | | | | |
| Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal | X | 10 | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales. | X | 5 | | |
| Estabilidad de la obra | X | 10 | | |
| Calidad de los bienes y equipos suministrados. | | | | |
| Correcto funcionamiento de los equipos. | | | | |
| Calidad del servicio. | | | | |
| Provisión de repuestos y accesorios. | | | | |
| Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se han pactado en el contrato. | | | | |
| Responsabilidad civil extra contractual. | X | 260 SMMLV | | |
| Otros amparos. | | | | |
| **MODIFICATORIOS Y ADICIONALES** (Si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos) | | | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL** (Si hay lugar a ello) | | | | |
| **VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL** (Si hay lugar a ello) | | | | |
| **TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL** (Si hay lugar a ello) | | | | |
| **VALOR TOTAL** (En números) | $ 1.499.000.749 | | | |
| **ASEGURADORA:** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | | |
| **POLIZA DE GARANTIA CUMPLIMIENTO Nº:** | No. 21-44-101449740 Anexo No.0 | | | |
| **POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL Nº:** | No. 21-40-101238693 Anexo No.0 | | | |
| **VIGENCIA RCivilextracontr. (dd/mm/aa):** | 29/08/2024 al 29/12/2029 | **VIGENCIA RCumplimiento. (dd/mm/aa):** | 29/08/2024 al 29/12/2024 | |

En San José de Cúcuta, a los 09 días del mes de septiembre 2024, en la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres Departamento Norte de Santander, se reunieron los suscritos: **WILLIAM VERA ARIAS**, Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Departamento Norte de Santander y **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO** Con C.C. No. **88.279.674**: como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

En constancia firman, a los nueve (09) días de septiembre de 2024.

POR EL DEPARTAMENTO

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

POR EL CONTRATISTA

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**
Contratista
C.C. 91.523.850

Proyectó: Alejandro Suarez Villamizar – Asesor Jurídico Externo SGRD
Revisó: Wilbam Vera Arias – secretario SGRD

# ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS

| GENERALIDADES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO / CONVENIO Nº Y FECHA:** | **RE – SGRD – 01885 - 2024** | | | |
| **VALOR INICIAL** (En números): | **$ 1.499.000.749** | | | |
| **PLAZO TOTAL** | **Cuatro (04) Meses** | | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | **No. 00000079 del 26 de julio de 2024** | | | |
| **GARANTÍAS:** | **AMPAROS INICIALES:** | **(%)** | **AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).** | **(%)** |
| Garantía de seriedad del ofrecimiento | | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo. | | | | |
| Pago anticipado. | | | | |
| Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal | X | 10 | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales. | X | 5 | | |
| Estabilidad de la obra. | X | 10 | | |
| Calidad de los bienes y equipos suministrados. | | | | |
| Correcto funcionamiento de los equipos. | | | | |
| Calidad del servicio. | | | | |
| Provisión de repuestos y accesorios. | | | | |
| Pago de multas y cláusula penal pecuniaria cuando se han pactado en el contrato. | | | | |
| Responsabilidad civil extracontractual. | X | 260 SMMLV | | |
| Otros amparos | | | | |
| **MODIFICATORIOS Y ADICIONALES** (si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos) | | | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL** (Si hay lugar a ello) | | | | |
| **VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL** (Si hay lugar a ello) | | | | |
| **TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL** (Si hay lugar a ello) | | | | |
| **VALOR TOTAL** (En números): | **$ 1.499.000.749** | | | |
| **ASEGURADORA:** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A** | | | |
| **-POLIZA DE GARANTIA Nº:** | No. 21-44-101449740 Anexo No.2 | | | |
| **POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL Nº:** | No. 21-40-101238693 Anexo No.2 | | | |
| VIGENCIA G. (dd/mm/aa): | DEL 10/09/2024 a 10/01/2030 | **VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):** | DEL 10/09/2024 AL 10/01/2025 | |

En San José de Cúcuta, a los 08 días del mes de octubre del año 2024, en La Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres, Departamento Norte de Santander, se reunieron Los suscritos: **WILLIAM VERA ARIAS,** Secretario para la Gestión Riesgo de Desastres, Departamento Norte de Santander y **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO con C.C No. 88.279.674** de Ocaña **R/L de IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S, NIT 901.266.624-6**; actuando como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

En constancia firman, el 08 de octubre de 2024.

POR EL DEPARTAMENTO

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO Nit 901.266.624-6**
**R/L. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**
C.C. **88.279.674** de Ocaña.
Contratista

CONSTRUCTORES S.A.S

# POLIZAS INICIALES

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101449740 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 08 | 2024 | 29 | 08 | 2024 | 00:00 | 29 | 12 | 2029 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | NIT: 901.266.624-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710503 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | NIT: 800.103.927-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710290 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE OBRA NO RE-SGRD-01885-2024 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES Y CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROPERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 29/08/2024 | 28/04/2025 | $149,991,068.10 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 29/08/2024 | 28/12/2027 | $74,995,534.05 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $149,991,068.10 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***2,749,151.00 | $ ******20,000.00 | $ *****526,138.00 | $ *********3,295,290.00 | $ ******374,977,670.25 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SANDRA MILENA CAMACHO TORRES | 163788 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

21-44-101449740

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101238693 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 08 | 2024 | 29 | 08 | 2024 | 00:00 | 29 | 12 | 2024 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | NIT: 901.266.624-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710503 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | NIT: 800.103.927-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710290 |

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LOS PERJUICIOS A TERCEROS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE OBRA NO RE-SGRD-01885-2024 SUSCVRITO ENTRE LAS PARTES Y CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 29/08/2024 | 29/12/2024 | $260,000,000.00 |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****217,260.00 | $ *******3,000.00 | $ ******41,849.00 | $ **********262,109.00 | $ ******260,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| SANDRA MILENA CAMACHO TORRES | 163788 | 100.00 |

| DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101238693

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSTRUCTORES S.A.S

# POLIZAS ACTUALIZADAS
# ACTA DE INICIO

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101449740 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 2024 | 10 | 09 | 2024 | 00:00 | 10 | 01 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | IDENTIFICACIÓN | NIT: 901.266.624-6 |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL | CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | TELÉFONO: | 5710503 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | IDENTIFICACIÓN | NIT: 800.103.927-7 |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14 | CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | TELÉFONO | 5710290 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE OBRA NO RE-SGRD-01885-2024 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES Y CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 10/09/2024 | 10/05/2025 | $149,991,068.10 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 10/09/2024 | 09/01/2028 | $74,995,534.05 | |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $149,991,068.10 | |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***2,749,151.00 | $ ******20,000.00 | $ *****526,138.00 | $ *********3,295,290.00 | $ ******374,977,670.25 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SANDRA MILENA CAMACHO TORRES | 163788 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

21-44-101449740

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101449740 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 2024 | 10 | 09 | 2024 | 00:00 | 10 | 01 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | | NIT: 901.266.624-6 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL | **CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | **TELÉFONO:** | 5710503 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | NIT: 800.103.927-7 | |
| **DIRECCIÓN:** AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14 | **CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | **TELÉFONO:** | 5710290 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101449740

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101238693 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 2024 | 10 | 09 | 2024 | 00:00 | 10 | 01 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | NIT: 901.266.624-6 | CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710503 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | NIT: 800.103.927-7 | AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14 | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710290 |

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

### OBJETO DEL SEGURO

**EN SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

AMPARAR LOS PERJUICIOS A TERCEROS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE OBRA NO RE-SGRD-01885-2024 SUSCVRITO ENTRE LAS PARTES Y CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SRCTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 10/09/2024 | 10/01/2025 | $260,000,000.00 | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****217,260.00 | $ *******3,000.00 | $ ******41,849.00 | $ **********262,109.00 | $ ******260,000,000.00 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| SANDRA MILENA CAMACHO TORRES | 163788 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101238693

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101238693 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 2024 | 10 | 09 | 2024 | 00:00 | 10 | 01 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | | NIT: 901.266.624-6 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL | **CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | **TELÉFONO:** | 5710503 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | NIT: 800.103.927-7 | |
| **DIRECCIÓN:** AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14 | **CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | **TELÉFONO:** | 5710290 |

**BENEFICIARIO:** 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

TEXTO ACLARATORIO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101238693

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSTRUCTORES S.A.S

# 7. COPIA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

Gobernación de Norte de Santander

**FONDO DE RIESGOS**
**NIT : 800103927-7**

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00 000079

Fecha: Jul-26/2024 1 - 1 **Area Admin/va:** 00 / GENERAL

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| UNIDAD EJECUTORA | CODIGO | NOMBRE CUENTA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1,499,910,681.00 |

**Fuente Recurso:** 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
**Producto MGA:** 4503003 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
**Código BPIN:** 2021004540151 - APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
**Producto DANE:** 83329 - Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.

**TOTALES** **1,499,910,681.00**

VIGENCIA: 2024
VALOR: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS.

*SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:*

*FUNCIONARIO:* WILLIAM VERA ARIAS
*CARGO:* SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
*DEPENDENCIA:* SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
*DOCUMENTO DE SOLICITUD:* 2222

**ADRIANA BOADA ARGUELLO**
Profesional Especializado

**ELABORÓ:**
**IDALY ROMERO MANTILLA**

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORES S.A.S

# 8. COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL - RP

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

32

Gobernación de Norte de Santander

**FONDO DE RIESGOS**
**NIT : 800103927-7**

## REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 000072

FECHA : ago-30/2024
A FAVOR DE : IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. NIT: 901266624-6
COMPROMISO : CONTRATO DE OBRA No.01885 DE 2024. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.
DISPONIBILIDAD : 00 000079 -- jul-26/2024
DEPENDENCIA : SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Nº. CONTRATO : 01885 DE 2024
TIPO CONTRATO : C.O - CONTRATO DE OBRA
DURACION : 4 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| UNIDAD EJECUTORA | CODIGO | NOMBRE CUENTA | DISPONIBILIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 000079 - jul-26/2024 | 1,499,000,749.00 |

**Fuente Recurso:** 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
**Producto MGA:** 4503003 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
**Código BPIN:** 2021004540151 - APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
**Producto DANE:** 83329 - Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.

**TOTALES** **1,499,000,749.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS.

**ADRIANA BOADA ARGUELLO**
Profesional Especializado

**ELABORÓ:**
**IDALY ROMERO MANTILLA**

CONSTRUCTORES S.A.S

# 9. COPIA ACTA DE INICIO

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-01 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 10/07/2017 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 1 de 3 | |

| ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO | |
|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | 10 de septiembre de 2024 |

| **1. GENERALIDADES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **CONTRATO No. - FECHA** | RE-SGRD-01885-2024, del 30 de agosto de 2024 |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES |
| **CONTRATISTA** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. |
| **C.C. o N.I.T.** | 901.266.624-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO |
| **C.C.** | 88.279.624 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | 1.499.000.749 |
| **PLAZO O DURACIÓN** | 4 meses |
| **FORMA DE PAGO** | El valor del Contrato es de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 1.499.000.749) M/CTE** EL DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA la ejecución de las obras objeto del presente contrato según actas parciales y/o final de obra ejecutada, aprobadas por el supervisor y con el visto bueno del Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres, previa presentación de los soportes respectivos. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de aportes en materia de seguridad social integral, y parafiscales para la realización de cada pago dentro del presente contrato de obra. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería retendrá a EL CONTRATISTA el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones y descuentos ordenados por las normas aplicables. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamento Norte de Santander |
| **RUBRO** | 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 00000079 del 26 de julio de 2024 |
| **SUPERVISOR** (Acto administrativo y fecha de designación) | William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres mediante memorando de |

**ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO**

| | |
|---|---|
| | designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024. |
| **INTERVENTOR** (Acto administrativo y fecha de designación) | No aplica. |

**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

**2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO**

| REQUISITO | FECHA |
|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 30 de agosto de 2024 |
| **Registro Presupuestal** | N° 00000072 DEL 30 de agosto de 2024 |

**2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN**

| REQUISITO | FECHA | | |
|---|---|---|---|
| **Impuesto de timbre** | No Aplica | | |
| **Publicación Gaceta** | No Aplica | | |
| **Garantía Única.**<br><br>No. 21-44-101449740 Anexo No.0<br>Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Fecha de Expedición: 30/08/2024<br>Fecha de aprobación: 10/09/2024 | Amparos | Valor Asegurado | Vigencia |
| | Cumplimiento del Contrato | $ 149.991.068,10 | 29/08/2024 al 28/04/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $ 74.995.534,05 | 29/08/2024 al 28/12/2027 |
| | Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 149.991.068,10 | Ampara 5 años |
| **Garantía Responsabilidad civil**<br><br>No. 21-40-101238693 Anexo No.0<br>Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Fecha de Expedición: 30/08/2024<br>Fecha de aprobación: 10/09/2024 | Valor asegurado | Vigencia | |
| | $ 260.000.000 | 18/06/2024 al 18/08/2024 | |
| **Otros (según el contrato):** | | | |

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-01 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 10/07/2017 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 3 de 3 | |

**ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO**

En San José de Cúcuta a los 10 días del mes de septiembre 2024, en las oficinas de la SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DE RIESGO, se reunieron los suscritos a saber: **WILLIAM VERA ARIAS**, Ordenador del Gasto - Supervisor, interventor Interno NO APLICA, Interventor Externo NO APLICA, **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.**, con NIT 901.266.624-6; Representada Legalmente por **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO** identificado con la cedula de ciudadanía No. 88.279.624, en calidad de Contratista, con el fin de acordar el inicio del contrato en mención, a partir de la fecha de la presente acta.

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

Se firma la presente por los que en ella intervienen.

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.**
NIT: 901.266.624-6
R/L. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
C.C. 88.279.624
**Contratista**

***Nota 1:*** *Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el Supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.*
***Nota 2:*** *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

CONSTRUCTORES S.A.S

# ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES #1

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-04 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 04/03/2024 | VERSIÓN 3 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 1 de 2 | |

**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No.1**

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | **28 DE OCTUBRE DE 2024** |

| **1. GENERALIDADES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **CONTRATO No. - FECHA** | RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | SECRETARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES |
| **CONTRATISTA** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS |
| **C.C. o N.I.T.** | 901.266.624-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO |
| **C.C.** | 88.279.674 DE OCAÑA |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749 |
| **PLAZO O DURACIÓN** | Cuatro (04) Meses |
| **SUPERVISOR** (Acto administrativo y fecha de desig) | WILLIAM VERA ARIAS – Secretario para la Gestión de Riesgo de Desastres, mediante memorando de designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024 |
| **INTERVENTOR** (Acto administrativo y fecha de desg) | No Aplica |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | N.A |
| **ACTA DE REINICIO** | N.A |
| **FECHA DE TERMINACION** | 10 DE ENERO DE 2025 |
| **ACTA DE APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTO** | No Aplica |
| **ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES** | ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 01 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024 |

En San José de Cúcuta el 28 de octubre de 2024, en las oficinas de la Secretaría para la Gestión de Riesgo, se reunieron los suscritos a saber: WILLIAM VERA ARIAS, Ordenador del Gasto por delegación, interventor Interno, NO APLICA Interventor Externo No Aplica, e IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS. Representada Legalmente por IMAR ORLANDO VACCA MACHADO Contratista, con el fin de acordar la modificación de las cantidades de obra No. 01 del contrato de la referencia, previas las siguientes consideraciones:

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-04 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 04/03/2024 | VERSIÓN 3 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 2 de 2 | |

**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No.1**

Una vez finalizada la revisión a los diseños iniciales y ejecutada la localización y replanteo de las estructuras que componen la obra, se evidenció la necesidad de realizar un ajuste de mayores y menores cantidades con respecto a las inicialmente contratadas, teniendo en cuenta las condiciones encontradas en campo con respecto a la necesidad de ampliación del paso provisional, para facilitar la movilidad de los vehículos que por allí transitan sin que la ejecución de las actividades constructivas impidan el paso o que se ponga en riesgo la integridad de los trabajadores de la obra, adicionalmente dadas las condiciones del terreno se hace necesario aumentar la cantidad de días en el manejo de aguas necesario para la ejecución de las demás actividades constructivas.

Teniendo en cuenta lo anotado en las consideraciones anteriores, las partes establecen la modificación de cantidades del contrato en referencia, contenidas en el Anexo No. 01, que forma parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS**
NIT 901.266.624-6
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
Contratista de obra

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RESGO DE DESASTRES

ANEXONo. 1 AL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1

CONTRATO DE OBRA No.RE-SGRD- 001885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 | FECHA DEL ACTA: 28/10/2024

| CONDICIONES DEL CONTRATO INCIAL | | | | | | MODIFICACION DE CANTIDADES No. 1 28 DE OCTUBRE DE 2024 | | | CONTRATODEL CONTRATO MODIFICADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UND | CANT | VR. UNITARIO | V.R PARCIAL | + - | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL |
| 1.0 | **PUENTE VEHICULAR** | | | | | | | | | |
| 1,01 | Replanteo y localización para puentes (Planimetría y Altimetría) | M2 | 285,36 | $ 6.781,00 | $1.935.026,00 | | | | 285,36 | $ 1.935.026,00 |
| 1,02 | Excavación mecánica en material tipo grava aricllosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m. | M3 | 1376,88 | $ 32.969,00 | $45.394.357,00 | + | 494,37 | $ 16.298.884,53 | 1.871,25 | $ 61.693.241,00 |
| 1,03 | Concreto ciclopeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm² | M3 | 38,35 | $ 748.682,00 | $28.711.955,00 | | | | 38,35 | $ 28.711.955,00 |
| 1,04 | Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi | M3 | 89,49 | $ 1.419.525,00 | $127.033.292,00 | | | | 89,49 | $ 127.033.292,00 |
| 1,05 | Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi | M3 | 94,44 | $ 1.519.012,00 | $143.455.493,00 | | | | 94,44 | $ 143.455.493,00 |
| 1,06 | Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....) | M3 | 34,83 | $ 1.419.525,00 | $49.442.056,00 | | | | 34,83 | $ 49.442.056,00 |
| 1,07 | Acero de refuerzo Grado 60 | KG | 16253,02 | $ 10.385,00 | $168.787.613,00 | | | | 16.253,02 | $ 168.787.613,00 |
| 1,08 | Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactacion en capas de 30 cm. | M3 | 1004,60 | $ 42.073,00 | $42.266.536,00 | | | | 1.004,60 | $ 42.266.536,00 |
| 1,09 | Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm) | UND | 4,00 | $ 2.311.720,00 | $9.246.880,00 | | | | 4,00 | $ 9.246.880,00 |
| 1,10 | Junta de dilatacion con angulo UPN 160 | M | 9,80 | $ 444.040,00 | $4.351.592,00 | | | | 9,80 | $ 4.351.592,00 |
| 1,11 | Placa de aproximacion Concreto 4000 Psi, resistencia 210 Kg/cm² | M3 | 8,82 | $ 1.419.525,00 | $12.520.211,00 | | | | 8,82 | $ 12.520.211,00 |
| 1,12 | Drenaje en Tuberia PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes (con rejilla 0.15 x 0.45 m) | UND | 4,00 | $ 356.976,00 | $1.427.904,00 | | | | 4,00 | $ 1.427.904,00 |
| 1,13 | Baranda en acero A-36 con tres Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=2.3 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje | M | 32,40 | $ 722.301,00 | $23.402.552,00 | | | | 32,40 | $ 23.402.552,00 |
| 1,14 | Base granular (INV. 330.1) | M3 | 90,00 | $ 286.800,00 | $25.812.000,00 | | | | 90,00 | $ 25.812.000,00 |
| 1,15 | Losa de pavimento en Concreto resistencia 4500 psi e=0.20 m | M3 | 60,00 | $ 1.419.525,00 | $85.171.500,00 | | | | 60,00 | $ 85.171.500,00 |
| 1,16 | Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1) | M | 154,00 | $ 6.730,00 | $1.036.420,00 | | | | 154,00 | $ 1.036.420,00 |
| 1,17 | Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado | M3 | 3047,93 | $ 39.448,00 | $120.234.743,00 | - | 89,96 | $ 3.548.677,63 | 2.957,97 | $ 116.686.065,00 |
| 1,18 | Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada) | M | 134,00 | $ 42.789,00 | $5.733.726,00 | | | | 134,00 | $ 5.733.726,00 |
| | **OBRAS COMPLEMENTARIA** | | | | | | | | | |
| 1,19 | Suministro e instalación de Geodrén tubular, zanja de 0.3 m x 0,8 m, incluye tubería de drenaje Hdpe ø4pulg y grava de 1/2" | M | 60,00 | $ 156.008,00 | $9.360.480,00 | | | | 60,00 | $ 9.360.480,00 |

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RESGO DE DESASTRES

ANEXONo. 1 AL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1

CONTRATO DE OBRA No.RE-SGRD- 001885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 | FECHA DEL ACTA: 28/10/2024

| CONDICIONES DEL CONTRATO INCIAL | | | | | | MODIFICACION DE CANTIDADES No. 1 28 DE OCTUBRE DE 2024 | | | CONTRATODEL CONTRATO MODIFICADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UND | CANT | VR. UNITARIO | V.R PARCIAL | +- | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL |
| 1,20 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica) | dia | 60,00 | $ 538.226,00 | $32.293.560,00 | + | 18,00 | $ 9.688.068,00 | 78,00 | $ 41.981.628,00 |
| 1,21 | Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavacion | M³ | 840,00 | $ 48.190,00 | $40.479.600,00 | | | | 840,00 | $ 40.479.600,00 |
| 1,22 | Dragado cauce natural (Ampliación de la seccion hidraulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la via provisional ) | M³ | 1600,00 | $ 32.411,00 | $51.857.600,00 | - | 406,67 | $ 13.180.581,37 | 1.193,33 | $ 38.677.019,00 |
| 1,23 | Obra falsa de la super estructura (Formaleta temporal) | M² | 117,60 | $ 772.005,00 | $90.787.788,00 | | | | 117,60 | $ 90.787.788,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | ***Subtotal*** | ***$1.120.742.884,00*** | | | | | **$ 1.130.000.577,00** |
| | | | | | | | | | | |
| | ***COSTO DIRECTO DE LA OBRA*** | | | | **$ 1.120.742.884,00** | | | | | ***$ 1.130.000.577,00*** |
| | ADMINISTRACIÓN | | 25,00% | | $ 280.185.721,00 | $ - | $ - | $ - | | $ 282.500.144,00 |
| | IMPREVISTOS | | 0,50% | | $ 5.603.714,00 | $ - | $ - | $ - | | $ 5.650.003,00 |
| | UTILIDAD | | 4,50% | | $ 50.433.430,00 | $ - | $ - | $ - | | $ 50.850.026,00 |
| | ***COSTO INDIRECTO DE LA OBRA*** | | | | **$ 336.222.865,00** | | | | | ***$ 339.000.173,00*** |
| | SOLICITUD DE VISITA Y PERMISO OCUPACION DE CAUCE | | | | **$ 12.035.000,00** | | | | | |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL | | | | **$ 30.000.000,00** | | | | | **$ 30.000.000,00** |
| | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO** | | | | **$ 1.499.000.749,00** | | | | | **$ 1.499.000.749,00** |

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**
**R/L DE IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S**
**CONTRATISTA**

**WILLIAM VERA ARIAS**
**SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**
VoBo Ordenador del Gasto - Supervisor

CONSTRUCTORES S.A.S

# 10. COPIA ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2 CON ANEXO 1

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-03 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 27/07/2010 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 1 de 2 | |

**ACTA DE PARCIAL No.2**

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | **05 DE NOVIEMBRE DE 2024** |

| **1. GENERALIDADES DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No. - FECHA** | RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | SECRETARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | | |
| **CONTRATISTA** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS | | |
| **C.C. o N.I.T.** | 901.266.624-6 | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO | | |
| **C.C.** | 88.279.674 DE OCAÑA | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 00000079 del 26 de julio de 2024 | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | No. 00000072 del 30 de agosto de 2024 | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749 | | |
| **PLAZO O DURACIÓN** | Cuatro (04) Meses | | |
| **SUPERVISOR** (Acto administrativo y fecha de desig) | WILLIAM VERA ARIAS – Secretario para la Gestión de Riesgo de Desastres, mediante memorando de designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024 | | |
| **INTERVENTOR** (Acto administrativo y fecha de desg) | No Aplica | | |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | N.A | | |
| **ACTA DE REINICIO** | N.A | | |
| **FECHA DE TERMINACION** | 10 DE ENERO DE 2025 | | |
| **Garantía Única.**<br>No. 21-44-101449740 Anexo No.2<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 07/10/2024<br>Fecha de aprobación: 08/10/2024 | **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Vigencia** |
| | Cumplimiento del Contrato | $ 149.991.068,10 | 10/09/2024 al 10/05/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e | $ 74.995.534,05 | 10/09/2024 al 09/01/2028 |

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-03 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 27/07/2010 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 2 de 2 | |

**ACTA DE PARCIAL No.2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Indemnizaciones Laborales | | |
| | Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 149.991.068,10 | Cinco años, 0 meses y 0 días |
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>No. 21-40-101238693 Anexo No.2<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 07/10/2024<br>Fecha de aprobación: 08/10/2024 | **Amparos** | **Valor Asegurado** | Vigencia |
| | Predios , labores y operaciones | $ 260.000.000 | 10/09/2024 al 10/01/2025 |
| **ACTA DE APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTO** | No Aplica | | |
| **ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES** | No Aplica | | |
| **ACTAS DE RECIBO PREVIAS** | ACTA PARCIAL No. 01 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2024 | | |
| **% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA** | 34,93% | | |
| **% EJECUTADO ACUMULADO** | 64,93% | | |
| **% DE TIEMPO TRANSCURRIDO** | 57 días trabajados / 123 Total días: 46,34% | | |

En San José de Cúcuta el 05 de noviembre de 2024, en las oficinas de la Secretaría para la Gestión de Riesgo, se reunieron los suscritos a saber: WILLIAM VERA ARIAS, Ordenador del Gasto por delegación, interventor Interno, NO APLICA Interventor Externo No Aplica, e IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS. Representada Legalmente por IMAR ORLANDO VACCA MACHADO Contratista, con el fin de realizar Acta Parcial de Obra No. 2 al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS**
NIT 901.266.624-6
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
Contratista de obra

# 11. MEMORIAS DE CANTIDADES

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RESGO [illegible] DESASTRES

| ANEXONo. 1 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 | FECHA DEL ACTA | 05/11/2024 |
|---|---|---|

| CONTRATO DE OBRA No.RE-SGRD- 001885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 | OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 |
|---|---|

| CONDICIONES DEL CONTRATO INCIAL | | | | | | CONDICIONES DEL CONTRATO MODIFICADO | | ACTA PARCIAL No 1 | | ACTA PARCIAL No 2 | | EJECUTADO ACUMULADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UND | CANT | VR. UNITARIO | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL |
| 1.0 | PUENTE VEHICULAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,01 | Replanteo y localización para puentes (Planimetria y Altimetria) | M2 | 285,36 | $ 6.781,00 | $1.935.026,00 | 285,36 | $ 1.935.026,00 | 285,36 | $ 1.935.026,00 | 0,00 | $ - | 285,36 | $ 1.935.026,00 | 0,00 | $ - |
| 1,02 | Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m. | M3 | 1376,88 | $ 32.969,00 | $45.394.357,00 | 1.871,25 | $ 61.693.241,00 | 1.372,48 | $ 45.249.293,00 | 498,77 | $ 16.443.948,00 | 1.871,25 | $ 61.693.241,00 | 0,00 | $ - |
| 1,03 | Concreto ciclopeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm² | M3 | 38,35 | $ 748.682,00 | $28.711.955,00 | 38,35 | $ 28.711.955,00 | 38,35 | $ 28.711.955,00 | 0,00 | $ - | 38,35 | $ 28.711.955,00 | 0,00 | $ - |
| 1,04 | Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi | M3 | 89,49 | $ 1.419.525,00 | $127.033.292,00 | 89,49 | $ 127.033.292,00 | | $ - | 89,49 | $ 127.033.292,00 | 89,49 | $ 127.033.292,00 | 0,00 | $ - |
| 1,05 | Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi | M3 | 94,44 | $ 1.519.012,00 | $143.455.493,00 | 94,44 | $ 143.455.493,00 | | $ - | 94,44 | $ 143.455.493,00 | 94,44 | $ 143.455.493,00 | 0,00 | $ - |
| 1,06 | Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....) | M3 | 34,83 | $ 1.419.525,00 | $49.442.056,00 | 34,83 | $ 49.442.056,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 34,83 | $ 49.442.056,00 |
| 1,07 | Acero de refuerzo Grado 60 | KG | 16253,02 | $ 10.385,00 | $168.787.613,00 | 16.253,02 | $ 168.787.613,00 | 8.188,82 | $ 85.040.896,00 | 3.200,90 | $ 33.241.347,00 | 11.389,72 | $ 118.282.243,00 | 4.863,30 | $ 50.505.371,00 |
| 1,08 | Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactacion en capas de 30 cm. | M3 | 1004,60 | $ 42.073,00 | $42.266.536,00 | 1.004,60 | $ 42.266.536,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1.004,60 | $ 42.266.536,00 |
| 1,09 | Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm) | UND | 4,00 | $ 2.311.720,00 | $9.246.880,00 | 4,00 | $ 9.246.880,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 9.246.880,00 |
| 1,10 | Junta de dilatacion con angulo UPN 160 | M | 9,80 | $ 444.040,00 | $4.351.592,00 | 9,80 | $ 4.351.592,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 9,80 | $ 4.351.592,00 |
| 1,11 | Placa de aproximacion Concreto 4000 Psi, resistencia 210 Kg/cm² | M3 | 8,82 | $ 1.419.525,00 | $12.520.211,00 | 8,82 | $ 12.520.211,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 8,82 | $ 12.520.211,00 |
| 1,12 | Drenaje en Tuberia PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes (con rejilla 0.15 x 0.45 m) | UND | 4,00 | $ 356.976,00 | $1.427.904,00 | 4,00 | $ 1.427.904,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 1.427.904,00 |
| 1,13 | Baranda en acero A-36 con tres Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=2.3 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje | M | 32,40 | $ 722.301,00 | $23.402.552,00 | 32,40 | $ 23.402.552,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 32,40 | $ 23.402.552,00 |
| 1,14 | Base granular (INV. 330.1) | M3 | 90,00 | $ 286.800,00 | $25.812.000,00 | 90,00 | $ 25.812.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 90,00 | $ 25.812.000,00 |
| 1,15 | Losa de pavimento en Concreto resistencia 4500 psi e=0.20 m | M3 | 60,00 | $ 1.419.525,00 | $85.171.500,00 | 60,00 | $ 85.171.500,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 60,00 | $ 85.171.500,00 |
| 1,16 | Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1) | M | 154,00 | $ 6.730,00 | $1.036.420,00 | 154,00 | $ 1.036.420,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 154,00 | $ 1.036.420,00 |
| 1,17 | Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado | M3 | 3047,93 | $ 39.448,00 | $120.234.743,00 | 2.957,97 | $ 116.686.065,00 | 2.829,94 | $ 111.635.631,00 | 128,03 | $ 5.050.434,00 | 2.957,97 | $ 116.686.065,00 | 89,96 | $ 3.548.678,00 |
| 1,18 | Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada) | M | 134,00 | $ 42.789,00 | $5.733.726,00 | 134,00 | $ 5.733.726,00 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 134,00 | $ 5.733.726,00 |
| | OBRAS COMPLEMENTARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,19 | Suministro e instalación de Geodrén tubular, zanja de 0.3 m x 0,8 m, incluye tubería de drenaje Hdpe e4pulg y grava de 1/2" | M | 60,00 | $ 156.008,00 | $9.360.480,00 | 60,00 | $ 9.360.480,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 60,00 | $ 9.360.480,00 |
| 1,20 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica) | dia | 60,00 | $ 538.226,00 | $32.293.560,00 | 78,00 | $ 41.981.628,00 | 29,00 | $ 15.608.554,00 | 29,00 | $ 15.608.554,00 | 58,00 | $ 31.217.108,00 | 20,00 | $ 10.764.520,00 |
| 1,21 | Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavacion | M³ | 840,00 | $ 48.190,00 | $40.479.600,00 | 840,00 | $ 40.479.600,00 | 420,00 | $ 20.239.800,00 | 0,00 | $ - | 420,00 | $ 20.239.800,00 | 420,00 | $ 20.239.800,00 |
| 1,22 | Dragado cauce natural (Ampliación de la seccion hidraulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la via provisional ) | M³ | 1600,00 | $ 32.411,00 | $51.857.600,00 | 1.193,33 | $ 38.677.019,00 | 800,00 | $ 25.928.800,00 | 393,33 | $ 12.748.219,00 | 1.193,33 | $ 38.677.019,00 | 0,00 | $ - |

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RESGO DE DESASTRES

ANEXONo. 1 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 | FECHA DEL ACTA | 05/11/2024

CONTRATO DE OBRA No.RE-SGRD- 001885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

| CONDICIONES DEL CONTRATO INCIAL | | | | | | CONDICIONES DEL CONTRATO MODIFICADO | | ACTA PARCIAL No 1 | | ACTA PARCIAL No 2 | | EJECUTADO ACUMULADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UND | CANT | VR. UNITARIO | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL |
| 1,23 | Obra falsa de la super estructura (Formaleta temporal) | M² | 117,60 | $ 772.005,00 | $90.787.788,00 | 117,60 | $ 90.787.788,00 | | $ - | 58,80 | $ 45.393.894,00 | 58,80 | $ 45.393.894,00 | 58,80 | $ 45.393.894,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | *Subtotal* | *$1.120.742.884,00* | | $ 1.130.000.577,00 | | $ 334.349.955,00 | | $ 398.975.181,00 | | $ 733.325.136,00 | | $ 396.675.441,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *COSTO DIRECTO DE LA OBRA* | | | | $ 1.120.742.884,00 | | *$ 1.130.000.577,00* | | *$ 334.349.955,00* | | $ 398.975.181,00 | | *$ 733.325.136,00* | | *$ 396.675.441,00* |
| | ADMINISTRACIÓN | | | 25,00% | $ 280.185.721,00 | | $ 282.500.144,00 | | $ 83.587.489,00 | | $ 99.743.795,00 | | $ 183.331.284,00 | | $ 99.168.860,00 |
| | IMPREVISTOS | | | 0,50% | $ 5.603.714,00 | | $ 5.650.003,00 | | $ 1.671.750,00 | | $ 1.994.876,00 | | $ 3.666.626,00 | | $ 1.983.377,00 |
| | UTILIDAD | | | 4,50% | $ 50.433.430,00 | | $ 50.850.026,00 | | $ 15.045.748,00 | | $ 17.953.883,00 | | $ 32.999.631,00 | | $ 17.850.395,00 |
| | *COSTO INDIRECTO DE LA OBRA* | | | | $ 336.222.865,00 | | *$ 339.000.173,00* | | *$ 100.304.987,00* | | $ 119.692.554,00 | | *$ 219.997.541,00* | | *$ 119.002.631,00* |
| | SOLICITUD DE VISITA Y PERMISO OCUPACION DE CAUCE | | | | $ 12.035.000,00 | | | | $ - | | $ - | | $ - | | |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL | | | | $ 30.000.000,00 | | $ 30.000.000,00 | | $ 15.000.000,00 | | $ 5.000.000,00 | | $ 20.000.000,00 | | $10.000.000,00 |
| | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | | | | $ 1.499.000.749,00 | | $ 1.499.000.749,00 | | 449.654.942,00 | | $ 523.667.735,00 | | 973.322.677,00 | | 525.678.072,00 |

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R/L DE IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA

WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VoBo Ordenador del Gasto - Supervisor

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

IVM CONSTRUCTORES S.A.S

| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 02 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 09/10/2024 AL 05/11/2024 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01685-2024 | | | SUPERVISION | | WILLIAM VERA ARIAS | | | |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | | | INTERVENTORIA | | N.A | | | |
| CAPÍTULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,02 | Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m. | UNIDAD DE MEDIDA | M3 | UBICACIÓN | CUCUTILLA | |





| ABSCISAS | DISTANCIA | AREA | M3 | ACUMULADO | CANTIDAD COBRADA ACTA PARCIAL 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| CUBICACION EXCAVACION TERRENO NATURAL TALUDES AMPLIACION | | | | | |
| TALUD LADO PAMPLONA | | | | | |
| 0+000 | | 0 | | - | |
| | 5 | | 2,585 | | |
| 0+005 | | 1,034 | | | |
| | 5 | | 4,820 | | |
| 0+010 | | 0,894 | | | |
| | 5 | | 14,453 | | |
| 0+015 | | 4,887 | | | |
| | 5 | | 34,215 | | |
| 0+020 | | 8,799 | | | |
| | 5 | | 41,205 | | |
| 0+025 | | 7,683 | | | |
| | 5 | | 53,623 | | |
| 0+030 | | 13,766 | | | |
| | 5 | | 75,328 | | |
| 0+035 | | 16,365 | | | |
| | 5 | | 72,688 | | |
| 0+040 | | 12,71 | | | |
| | 4 | | 50,184 | 50,18 | 50,18 |
| 0+044 | | 12,382 | | | |
| | 1 | | 6,191 | 6,19 | 56,38 |
| 0+045 | | 0 | | 56,38 | |
| TALUD LADO CUCUTILLA | | | | | |
| 0+000 | | 1,483 | | 0,00 | 56,38 |
| | 5 | | 79,843 | 79,84 | 136,22 |
| 0+005 | | 30,054 | | | |
| | 5 | | 143,900 | 143,90 | 280,12 |
| 0+010 | | 27,506 | | | |
| | 5 | | 104,618 | 104,62 | 384,74 |
| 0+015 | | 14,341 | | | |
| | 5 | | 61,673 | 61,67 | 446,41 |
| 0+020 | | 10,328 | | | |
| | 5 | | 40,920 | 40,92 | 487,33 |
| 0+025 | | 6,036 | | | |
| | 4 | | 12,442 | 12,44 | 499,77 |
| 0+029 | | 0,185 | | 443,39 | |
| TOTAL EXCAVACION TALUDES AMPLIACION | | | | 499,77 | |

OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| TOTAL EXCAVACION ACTA PARCIAL #2 | 498,77 |
| Vienen de acta parcial #1 | 1.372,48 |
| TOTAL EXCAVACION ACUMULADO ACTA PARCIAL #1 Y #2 | 1.871,25 |


Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR


Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

# SECCIONES CORTE ZAPATAS ESTRIBOS

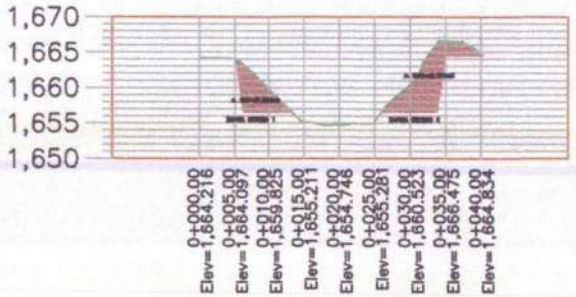



## PERFIL 0+000

ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 1000

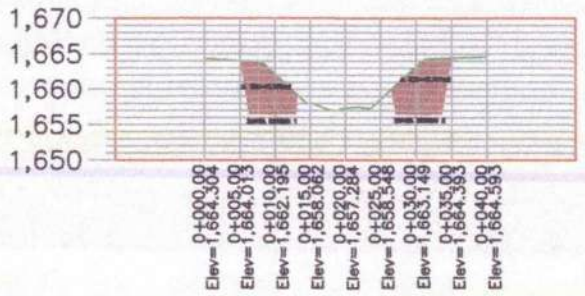


## PERFIL 0+006


ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 1000

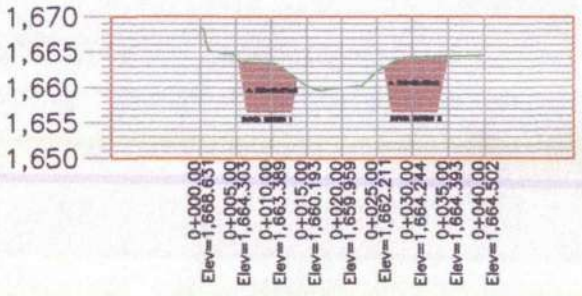



## PERFIL 0+012


ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 1000


# SECCIONES CORTE DRAGADO

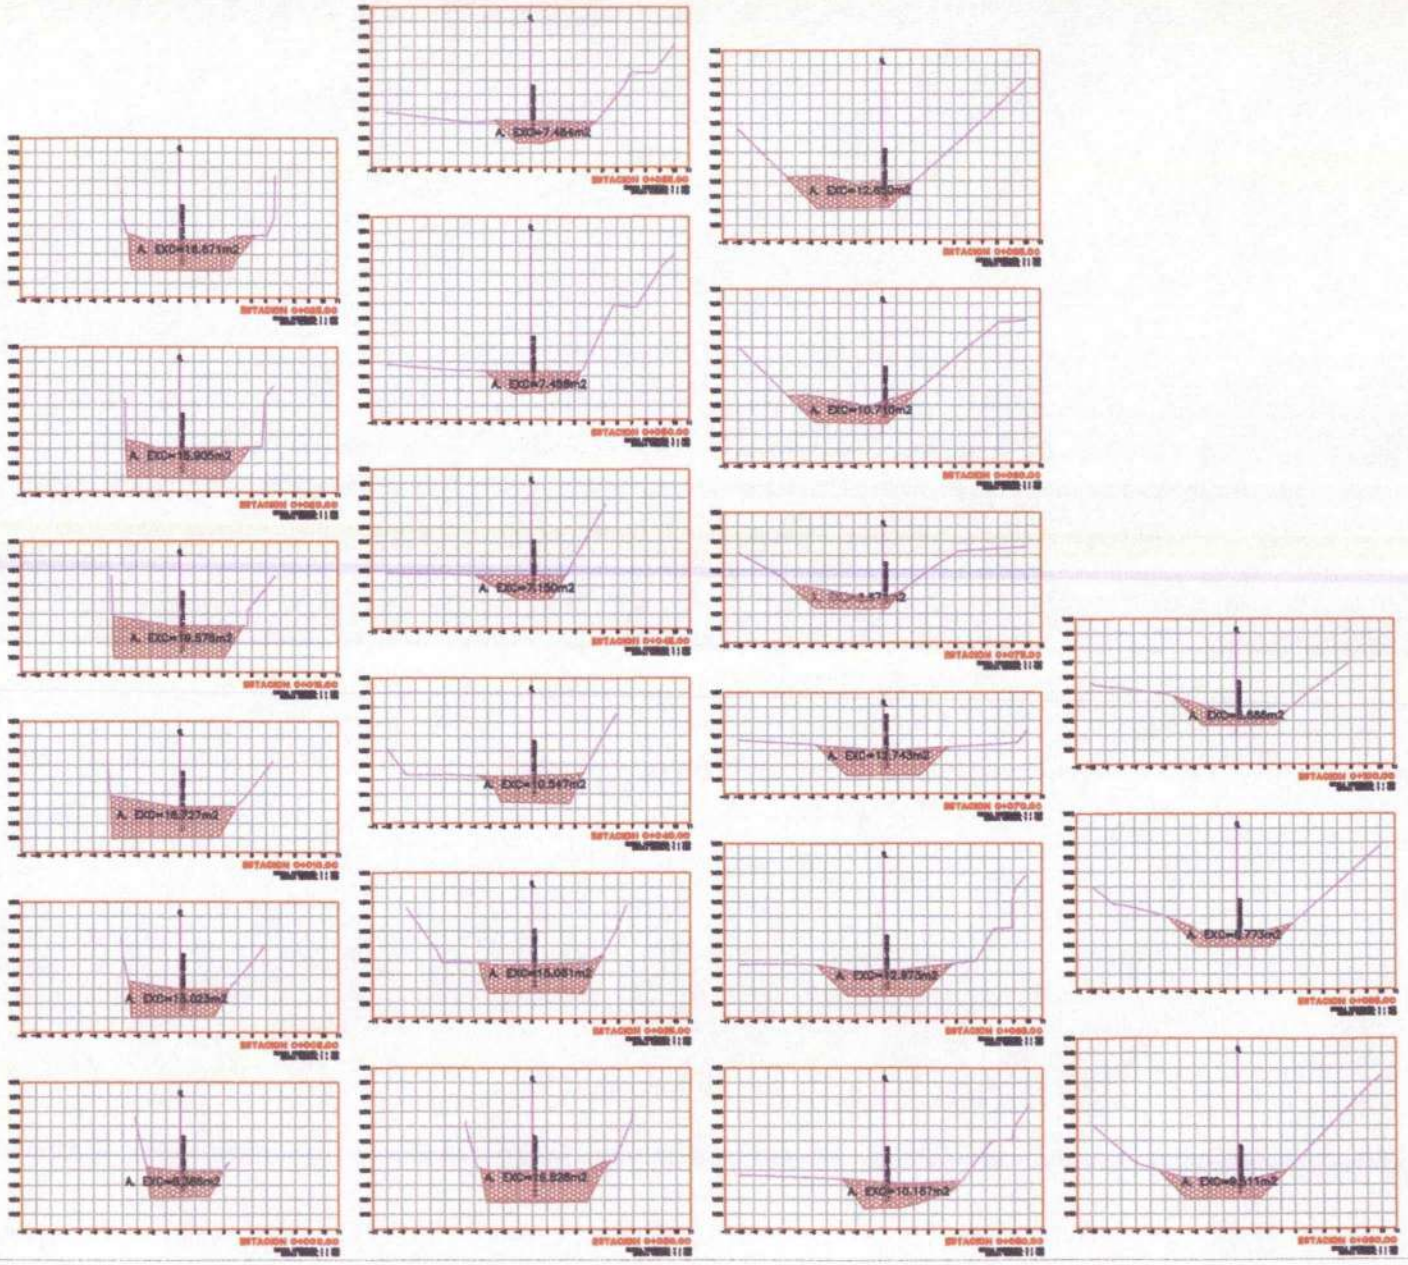



# SECCIONES CORTE TALUD CUCUTILLA

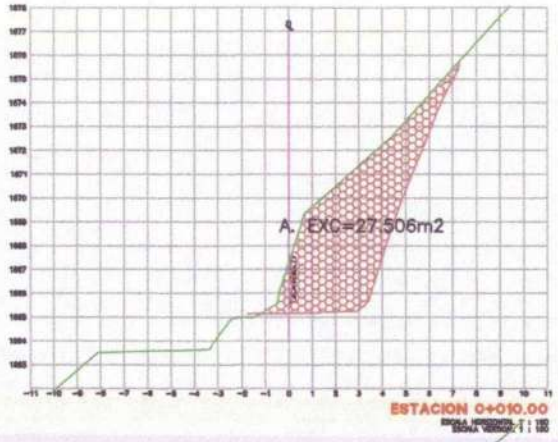


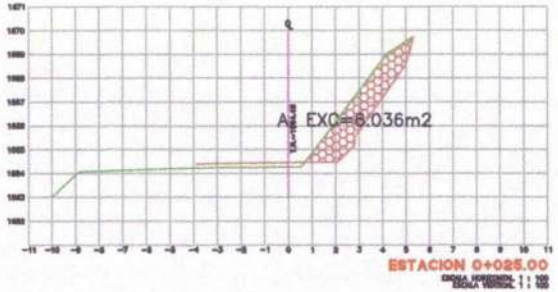


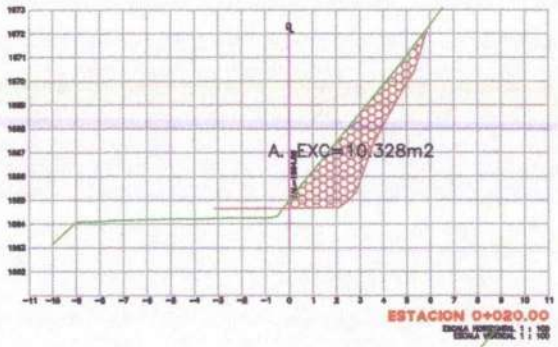



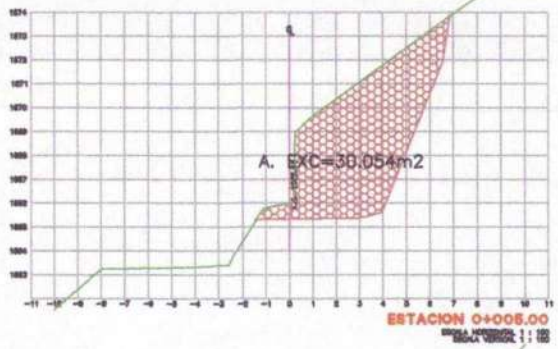
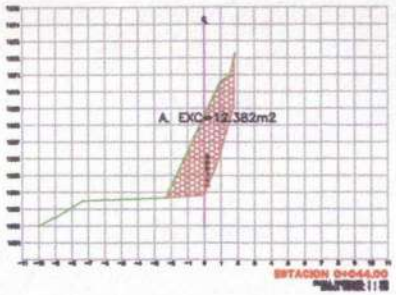


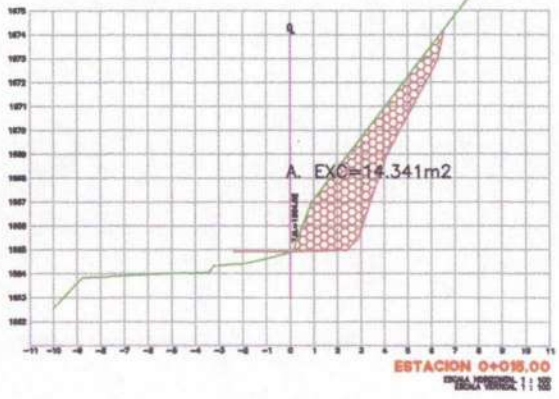



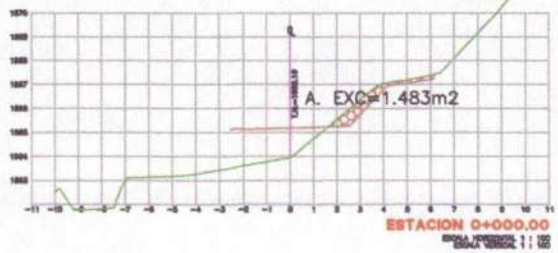
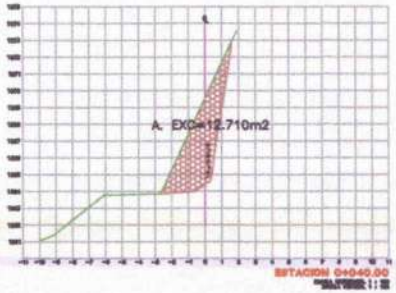




# SECCIONES CORTE TALUD PAMPLONA












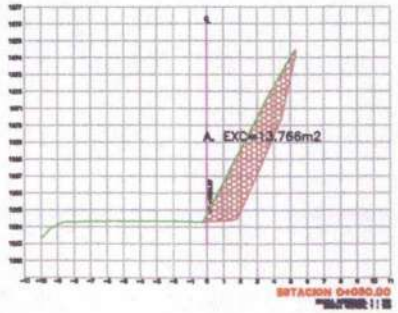






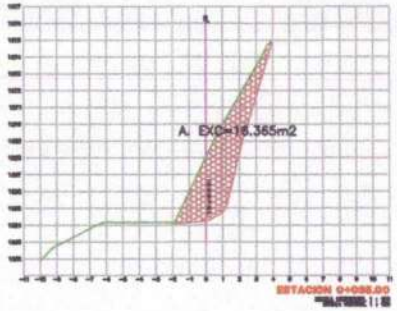
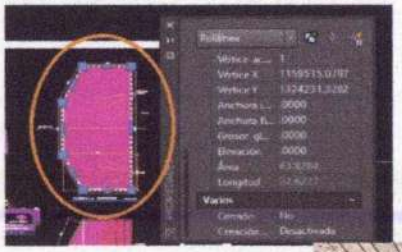
Gobernación de Norte de Santander
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

IVM CONSTRUCTORES S.A.S

| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 02 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 09/10/2024 AL 05/11/2024 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | | | SUPERVISION | | WILLIAM VERA ARIAS | | | |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | | | INTERVENTORIA | | N.A | | | |
| CAPÍTULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,04 | Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi | UNIDAD DE MEDIDA | M3 | UBICACIÓN | CUCUTILLA | |





| DETALLE | Dimensiones | | | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | A(m2) | Esp(m) | H(m) | | |
| | | | | | |
| Espesor de la zarpa 70 cm | 63,92 | 0,70 | | 2,00 | 89,49 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| TOTAL A COBRAR ACTA PARCIAL #2 | 89,49 |
| Vienen | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO ACTAS PARCIALES #1 Y #2 | 89,49 |

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:

WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor


Gobernación de Norte de Santander
SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

IMR CONSTRUCTORES S.A.S

| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 02 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 09/10/2024 AL 05/11/2024 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | | | SUPERVISION | | WILLIAM VERA ARIAS | | | |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | | | INTERVENTORIA | | N.A | | | |
| CAPÍTULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,05 | Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi | UNIDAD DE MEDIDA | M3 | | UBICACIÓN | CUCUTILLA |

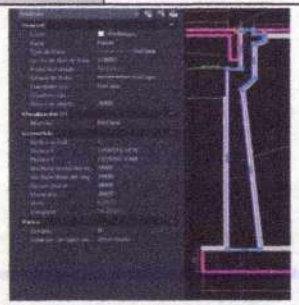







| DETALLE | Dimensiones A(m2) | Dimensiones L(m) | | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Se muestra area (4,25 m2) del vastago o concreto elevación y la longitud del muro que es de 11,24 m. | 4,25 | 11,11 | | 2,00 | 94,44 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| TOTAL A COBRAR ACTA PARCIAL #2 | 94,44 |
| Vienen | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO ACTAS PARCIALES #1 Y #2 | 94,44 |

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA


Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 02 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 09/10/2024 AL 05/11/2024 |
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | SUPERVISION | WILLIAM VERA ARIAS |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | INTERVENTORIA | N.A |

| CAPITULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,07 | Acero de refuerzo Grado 60 | UNIDAD | KG | UBICACIÓN | CUCUTILLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

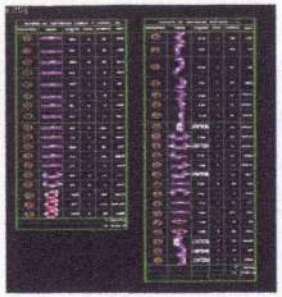







| DETALLE | Dimensiones Diámetro | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | # 4 | # 5 | # 7 | # 8 | Cant | |
| Kg / ml | 1,00 | 1,6 | 3,04 | 4 | (Und) | |
| 15 | 1,95 | | | | 40,00 | 78 |
| 16 | 2,55 | | | | 40,00 | 102 |
| 28 | 3,50 | | | | 84,00 | 294 |
| 29 | 2,80 | | | | 380,00 | 1064 |
| 30 | 8,45 | | | | 26,00 | 219,7 |
| 31 | | | | 5,25 | 32,00 | 672 |
| 32 | | | | 8,55 | 16,00 | 547,2 |
| A | 112,00 | | | | 2,00 | 224 |
| | | | | | | 3200,9 |

OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| TOTAL A COBRAR ACTA PARCIAL #2 | 3.200,90 |
| Vienen acta parcial #1 | 8.188,82 |
| TOTAL ACUMULADO ACTAS PARCIALES #1 Y #2 | 11.389,72 |

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

85

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

IVM CONSTRUCTORES S.A.S

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 02 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 09/10/2024 AL 05/11/2024 |
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | SUPERVISION | WILLIAM VERA ARIAS |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | INTERVENTORIA | N.A |

| CAPÍTULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,17 | Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado | UNIDAD DE MEDIDA | M3 | UBICACIÓN | CUCUTILLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





| DETALLE | Dimensiones B(m) | L(m) | H(m) | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragado cauce natural (Ampliación de la seccion hidraulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la via provisional ) | | | | | 1.871,25 |
| Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m. | | | | | 1.193,33 |
| fcator de expansión 1,3 | | | | | 3.983,95 |
| menos material seleccionado para rellenos | | | | | 1.004,60 |
| total cargue y retiro | | | | | 2.979,38 |
| menos cargue y retiro de material cobrado en acta parcial 1 | | | | | 2.829,94 |
| total a cobrar acta parcial #2 | | | | | 128,03 |

OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| TOTAL A COBRAR ACTA PARCIAL #2 | 128,03 |
| Vienen acta parcial #1 | 2.829,94 |
| TOTAL ACUMULADO ACTAS PARCIALES #1 Y #2 | 2.957,97 |

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

IMA CONSTRUCTORES S.A.S

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 02 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 09/10/2024 AL 05/11/2024 |
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | SUPERVISION | WILLIAM VERA ARIAS |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | INTERVENTORIA | N.A |

| CAPÍTULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,20 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica) | UNIDAD DE MEDIDA | dia | UBICACIÓN | CUCUTILLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





| DETALLE | Dimensiones | | | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dias | | | | |
| **Manejo de aguas** | 29,00 | | | | **29,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A COBRAR ACTA PARCIAL #2** | **29,00** |
| **Vienen acta parcial #1** | **29,00** |
| **TOTAL ACUMULADO ACTAS PARCIALES #1 Y #2** | **58,00** |

OBSERVACIONES:

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

IVM CONSTRUCTORES S.A.S

| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 02 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 09/10/2024 AL 05/11/2024 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | | | SUPERVISION | | WILLIAM VERA ARIAS | | | |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | | | INTERVENTORIA | | N.A | | | |
| CAPÍTULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,22 | Dragado cauce natural (Ampliación de la seccion hidraulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la via provisional ) | UNIDAD DE MEDIDA | M³ | | UBICACIÓN | CUCUTILLA |



| DETALLE | Dimensiones B(m) | L(m) | H(m) | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragado de cauce | 10,00 | 40,00 | 0,98 | | 393,33 |

| | |
|---|---|
| TOTAL A COBRAR ACTA PARCIAL #2 | 393,33 |
| Vienen acta parcial #1 | 800,00 |
| TOTAL ACUMULADO ACTAS PARCIALES #1 Y #2 | 1.193,33 |

OBSERVACIONES:

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

IMA CONSTRUCTORES S.A.S

| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 02 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 09/10/2024 AL 05/11/2024 |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | SUPERVISION | WILLIAM VERA ARIAS |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | INTERVENTORIA | N.A |

| CAPÍTULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,23 | Obra falsa de la super estructura (Formaleta temporal) | UNIDAD DE MEDIDA | M² | UBICACIÓN | CUCUTILLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| DETALLE | Dimensiones B(m) | L(m) | H(m) | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Obra falsa | 7,00 | 8,40 | | | 58,80 |

| | |
|---|---|
| TOTAL A COBRAR ACTA PARCIAL #2 | 58,80 |
| Vienen acta parcial #1 | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO ACTAS PARCIALES #1 Y #2 | 58,80 |

OBSERVACIONES:

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

CONSTRUCTORES S.A.S

# 12. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

CONSTRUCTORES S.A.S

En mi calidad de Revisor fiscal - Contador Público Titulado con Tarjeta Profesional No. 197156-T emitida por la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA**

QUE: El Sr. **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO** identificado con cédula de ciudadanía N° 88.279.674 representante legal de la empresa **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS** identificado con NIT 901.266.624-6, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social según el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002 y Ley 828 de 2003 y se encuentra al día a la fecha del presente documento, en cuanto a salud, riesgos laborales pensiones y aportes a cajas de compensación para el contrato RE-SGRD-01885-2024 cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

Se expide a los ocho (05) días del mes de noviembre de 2024 a solicitud del interesado

FRANKI GERARDINO SALCEDO
REVISOR FISCAL
T.P. 197156-T
C.C 1.091.162.693

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
197156-T
FRANKI
GERARDINO SALCEDO
C.C. 1091182693
RESOLUCION INSCRIPCION 1519
FECHA 14/11/2014
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
209425


198544
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

170BDD08E03CDB8A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANKI GERARDINO SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091162693 de TEORAMA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 197156-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.091.162.693
GERARDINO SALCEDO

APELLIDOS
FRANKI

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1990
TEORAMA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

21-ABR-2008 TEORAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-2509100-01140872-M-1091162693-20200605 0070862572A 1 9912306584


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
58279674
NUIP
VACCA MACHADO
APELLIDOS
IMAR ORLANDO
NOMBRES




Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: 5710503 Celular: 315-2072031

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901731704 | 1 | CONSTRUCTORA INCONORT SAS | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 54-673 | CARRERA 4 0E 42 | | 5760851 | | CONSTRUCCIONINCOSAS@GMAIL.COM | | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-10 | 2024-11 | 31436636 | E | 2024-11-01 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 5.849.900 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 16 | 31436636 | 2024-11-05 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | APPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot | ARL | IBC | Cot | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | | |
| 1 | CC 5440878 | IBAÑEZ CONTRERAS PEDRO PABLO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 2 | CC 5440878 | IBAÑEZ CONTRERAS ISIDRO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION-ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 3 | CC 13492157 | PALENCIA RIVERA LUIS ORLANDO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | EPS-S 0COOSALUD-ESSC24 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 4 | CC 13492314 | BLANCO PARRA ASCENCION | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. 0S.A. MOV-EPS041 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 5 | CC 88145288 | GARCIA MONCADA DANIEL | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION-ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | COMFAORIE NTE-CCFC50 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 6 | CC 88145827 | LIZCANO SUAREZ MARCO ANTONIO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION-ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | COMPENSAR -EPS-EPS008 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 7 | CC 88173326 | FLOREZ VEGA EDILBERTO | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 11 | 11 | 11 | 11 | COLPENSION-ES-25-14 | 476.667 | 76.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037 | 476.667 | 19.100 | COMFANORTE-CCF37 | 476.667 | 19.100 | 476.667 | 33.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 147.700 | S | 5429001 |
| 8 | CC 88233847 | COLLANTES CHAUSTRE JUAN RAMON | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | EPS-S 0COOSALUD-ESSC24 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 9 | CC 88240965 | SANCHEZ SANCHEZ ALEXANDER | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SALUD 0TOTAL-EPS002 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 10 | CC 88312157 | GELVES VALERO JOSE FERNEY | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION-ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 11 | CC 1005911574 | ORTEGA GELVES BRAYAN SNEYFFER | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | COMFAORIE NTE-CCFC50 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 12 | CC 1005011706 | MONCADA ORTEGA CIRO ALONSO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | COMFAORIE NTE-CCFC50 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 13 | CC 1093412156 | GARCIA GELVES VICTOR DANILO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION-ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | COMFAORIE NTE-CCFC50 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 14 | CC 1093412663 | PEREZ URBINA MIGUEL ALEXIS | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | COMFAORIE NTE-CCFC50 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 15 | CC 1093413878 | GARCIA GELVIS BROEDISON DEYMAR | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | COMFAORIE NTE-CCFC50 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 16 | CC 1093413879 | ORTEGA MONTES ERICKSSON STEVEN | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 5 | 5 | 5 | 5 | PORVENIR-230301 | 216.667 | 34.700 | 0 | 0 | COMFAORIE NTE-CCFC50 | 216.667 | 8.700 | COMFANORTE-CCF37 | 216.667 | 8.700 | 216.667 | 15.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 67.200 | S | 5429001 |



62

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901731704 | 1 | CONSTRUCTORA INCONORT SAS | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 54-673 | CARRERA 4 0E 42 | | 5760851 | | CONSTRUCCIONINCOSAS@GMAIL.COM | | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-10 | 2024-11 | 31436636 | E | 2024-11-01 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 5.849.900 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 16 | 31436636 | 2024-11-05 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 18.893.334 | 18.893.334 | 18.893.334 | 18.893.334 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 3) | | | | 16 | 3.023.000 | 0 | 0 | 0 | 3.023.000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 6 | 1.116.300 | 0 | 0 | 0 | 1.116.300 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 1 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 208.000 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 9 | 1.698.700 | 0 | 0 | 0 | 1.698.700 |
| EPS(Administradoras: 7) | | | | 16 | 755.800 | 0 | 0 | 0 | 755.800 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 1 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 52.000 |
| COMFAORIENTE | CCFC50 | 890500675 | 6 | 7 | 320.700 | 0 | 0 | 0 | 320.700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 1 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 52.000 |
| EPS-S COOSALUD | ESSC24 | 900226715 | 3 | 2 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 3 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 156.000 |
| COMPENSAR-EPS | EPS008 | 860066942 | 7 | 1 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 52.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 1 | 19.100 | 0 | 0 | 0 | 19.100 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 16 | 1.315.300 | 0 | 0 | 0 | 1.315.300 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 16 | 1.315.300 | 0 | 0 | 0 | 1.315.300 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 16 | 755.800 | 0 | 0 | 0 | 755.800 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890500516 | 3 | 16 | 755.800 | 0 | 0 | 0 | 755.800 |
| Gran Total | | | | | 5.849.900 | 0 | 0 | 0 | 5.849.900 |

CONSTRUCTORES S.A.S

# 13. INFORME DE CONTRATISTA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

# INFORME PARCIAL DE OBRA

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01 DE OBRA DE FECHA 08 OCTUBRE DE 2024

**PERIODO:** 09 DE OCTUBRE DE 2024 A 05 DE NOVIEMBRE DE 2024

**CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024**

**OBJETO:** CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

**CONTRATISTA:**

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS**
**Nit. 901.266.624-6**
**R/L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**
**C.C. No. 88.279.624 DE OCAÑA**

**CONTRATANTE:**

**SECRETARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES**
**GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER**

**San José de Cúcuta – Norte de Santander**

**NOVIEMBRE DE 2024**

CONSTRUCTORES S.A.S

# 1 RESUMEN EJECUTIVO

## 1.1 GENERALIDADES

**CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2022** CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

## DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto se llevará a cabo en la zona rural del municipio de Cucutilla, específicamente en la vía que comunica al municipio con la vía nacional de la ruta Pamplona - Bucaramanga. Actualmente la población de la zona rural y de la cabecera municipal se ve afectada en el desplazamiento, debido al colapso de un box Culvert, que por causa de las fuertes lluvias que hicieron presencia en esta zona geográfica se deterioró hasta ocasionar su colapso.

La siguiente imagen muestra la localización del municipio de Cucutilla en Colombia, y la ubicación de la obra

.

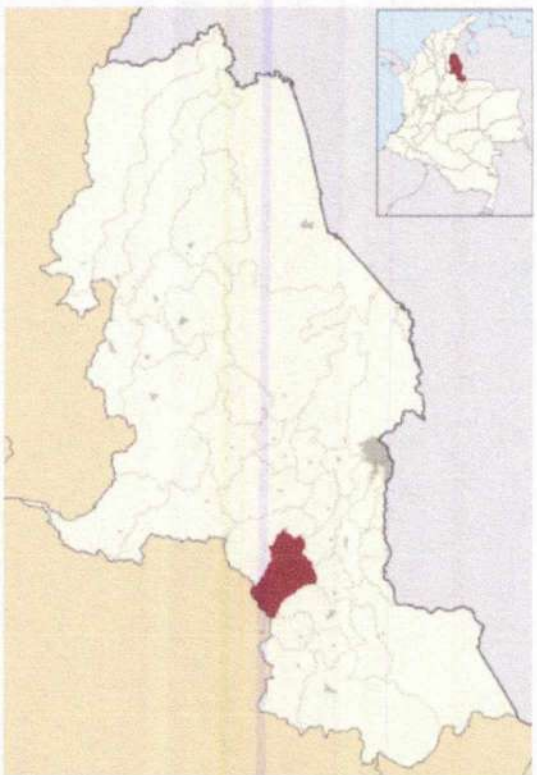


Ilustración No 1: *Localización de la obra a nivel Nacional y Departamental – fuente Wikipedia*

CONSTRUCTORES S.A.S




ilustración no 2: área de intervención del contrato de obra- fuente: consultoría

**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024**

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato de obra de acuerdo con el término, valor, objeto, fechas importantes, etc.

Información Contractual **CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024**:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024** | OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | |
| | VALOR CONTRATO | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.499.000.749,00) | |
| | CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS | **R/L** IMAR ORLANDO VACCA MACHADO |
| | NIT Y C.C. | **NIT.** 901-266-624-6 | **CC No.** 88.279.624 DE OCAÑA |
| | SUPERVISOR | WILLIAM VERA ARIAS – Secretario para la Gestión de Riesgo de Desastres, mediante memorando de designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024. | |
| | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | No. 00 000079 de Fecha 26 julio de 2024 | |

CONSTRUCTORES S.A.S

| CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 | | |
|---|---|---|
| | PRESUPUESTAL CONTRATO PRINCIPAL | |
| | REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO PRINCIPAL | No.00 000072 de Fecha 30 de agosto de 2024 |
| | FECHA DE INICIO | 10 de septiembre de 2024 |
| | PLAZO PACTADO CONTRATO PRINCIPAL | Cuatro (04) Meses |
| | ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01: | No Aplica |
| | ACTA DE REINICIO No. 01: | No Aplica |
| | TIEMPO SUSPENDIDO: | No Aplica |
| | % EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA | 34,93% |
| | % EJECUTADO ACUMULADO | 64,93% |

**POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**A LA FIRMA DEL CONTRATO**

| | **Amparos** | **Valor asegurado** | **Vigencia** |
|---|---|---|---|
| **Garantía Única.**<br>No. 21-44-101449740 Anexo No.0<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 30/08/2024<br>Fecha de aprobación: 09/09/2024 | Cumplimiento del Contrato | $ 149.991.068,10 | 29/08/2024 al 28/04/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $ 74.995.534,05 | 29/08/2024 al 28/12/2027 |
| | Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 149.991.068,10 | Cinco años, 0 meses y 0 días |

CONSTRUCTORES S.A.S

| | | |
|---|---|---|
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>No. 21-40-101238693 Anexo No.0<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 30/08/2024<br>Fecha de aprobación: 09/09/2024 | **Valor asegurado** | **Vigencia** |
| | $260.000.000 | 18/06/2024 al 18/08/2024 |

**A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Amparos** | **Valor asegurado** | **Vigencia** |
| **Garantía Única.**<br>No. 21-44-101449740 Anexo No.2<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 07/10/2024<br>Fecha de aprobación: 08/10/2024 | Cumplimiento del Contrato | $ 149.991.068,10 | 10/09/2024 al 10/05/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $ 74.995.534,05 | 10/09/2024 al 09/01/2028 |
| | Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 149.991.068,10 | Cinco años, 0 meses y 0 días |
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>No. 21-40-101238693 Anexo No.2<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 07/10/2024<br>Fecha de aprobación: 08/10/2024 | **Valor asegurado** | | **Vigencia** |
| | $260.000.000 | | 10/09/2024 al 10/01/2025 |

CONSTRUCTORES S.A.S

**ACTOS ADMINISTRATIVOS**

A continuación, se relacionan los actos administrativos del **CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024**:

| ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA |
|---|---|
| ACTA DE INICIO | 10 Septiembre de 2024 |
| ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1 | 08 Octubre de 2024 |

**ASPECTOS FINANCIEROS**

Anticipos, Actas parciales y/o Acta Final

**ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA NO. RE-CDGRD- 04093-2022 SUSCRITO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022**:

Para la ejecución de este contrato de obra no se contó con recursos de anticipo.

| Avance Financiero | Valor contractual | Parcial No. 1 | Parcial No. 2 | Parcial No. 3 | Valor restante por ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $ 1.499.000.749 | $ 449.654.942,00 | - | - | |
| VALOR ACTA A COBRAR | | | $523.667.735 | | |
| Total | $ 1.499.000.749 | | - | - | $ 525.678.072,00 |

**ASPECTOS TECNICOS**

- **Actas de obra:**

A corte de este informe se proyecta el trámite Acta Parcial de Obra No. 02 De fecha 05 de noviembre de 2024 al Contrato de Obra No. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024, con las actividades ejecutadas a la fecha.

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el desarrollo de la obra, para el periodo del **09 de octubre de 2024 al 05 de noviembre de 2024**, se ejecutaron los siguientes ítems del contrato, sus cantidades y avances se describen en la tabla que se relaciona a continuación los cuales cumplieron con los requerimientos y exigencias solicitados por la supervisión.

| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UND | CANT. | V.R PARCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | PUENTE VEHICULAR | | | |

CONSTRUCTORES S.A.S

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,01 | Replanteo y localización para puentes (Planimetría y Altimetría) | M2 | 0,00 | $ - |
| 1,02 | Excavación mecánica en material tipo grava aricllosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m. | M3 | 498,77 | $ 16.443.948,00 |
| 1,03 | Concreto ciclopeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm² | M3 | 0,00 | $ - |
| 1,04 | Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi | M3 | 89,49 | $ 127.033.292,00 |
| 1,05 | Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi | M3 | 94,44 | $ 143.455.493,00 |
| 1,06 | Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....) | M3 | 0,00 | $ - |
| 1,07 | Acero de refuerzo Grado 60 | KG | 3.200,90 | $ 33.241.347,00 |
| 1,08 | Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactacion en capas de 30 cm. | M3 | 0,00 | $ - |
| 1,09 | Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm) | UND | 0,00 | $ - |
| 1,10 | Junta de dilatacion con angulo UPN 160 | M | 0,00 | $ - |
| 1,11 | Placa de aproximacion Concreto 4000 Psi, resistencia 210 Kg/cm² | M3 | 0,00 | $ - |
| 1,12 | Drenaje en Tuberia PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes (con rejilla 0.15 x 0.45 m) | UND | 0,00 | $ - |
| 1,13 | Baranda en acero A-36 con tres Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=2.3 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje | M | 0,00 | $ - |
| 1,14 | Base granular (INV. 330.1) | M3 | 0,00 | $ - |
| 1,15 | Losa de pavimento en Concreto resistencia 4500 psi e=0.20 m | M3 | 0,00 | $ - |
| 1,16 | Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1) | M | 0,00 | $ - |
| 1,17 | Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado | M3 | 128,03 | $ 5.050.434,00 |
| 1,18 | Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada) | M | | $ - |

CONSTRUCTORES S.A.S

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **OBRAS COMPLEMENTARIA** | | | |
| 1,19 | Suministro e instalación de Geodrén tubular, zanja de 0.3 m x 0,8 m, incluye tubería de drenaje Hdpe ø4pulg y grava de 1/2" | M | 0,00 | $ - |
| 1,20 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica) | dia | 29,00 | $ 15.608.554,00 |
| 1,21 | Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavacion | $M^3$ | 0,00 | $ - |
| 1,22 | Dragado cauce natural (Ampliación de la seccion hidraulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la via provisional ) | $M^3$ | 393,33 | $ 12.748.219,00 |
| 1,23 | Obra falsa de la super estructura (Formaleta temporal) | $M^2$ | 58,80 | $ 45.393.894,00 |
| | | | | **$ 398.975.181,00** |
| ***COSTO DIRECTO DE LA OBRA*** | | | | **$ 398.975.181,00** |
| ADMINISTRACIÓN | | | | $ 99.743.795,00 |
| IMPREVISTOS | | | | $ 1.994.876,00 |
| UTILIDAD | | | | $ 17.953.883,00 |
| ***COSTO INDIRECTO DE LA OBRA*** | | | | **$ 119.692.554,00** |
| SOLICITUD DE VISITA Y PERMISO OCUPACION DE CAUCE | | | | **$ -** |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL | | | | **$ 5.000.000,00** |
| **VALOR TOTAL DEL PROYECTO** | | | | **$ 523.667.735,00** |

**DESCRIPCIÓN FINANCIERA EJECUTADA SEGÚN ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 02 DE FECHA 05 NOVIEMBRE DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024**

| Concepto: | Acta Parcial No.01 | Acta Parcial No.02 | Pendiente por ejecutar |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 08 Agosto de 2024 | 05 noviembre de 2024 | |
| Valor del contrato: | $ 1.499.000.749 | $ 1.499.000.749 | |
| Valor ejecutado según acta parcia | $ 449.654.942,00 | $523.667.735,00 | $ 525.678.072,00 |
| % de ejecución del acta: | 30,00 % | 34,93% | |
| % de ejecución acumulado a la fecha: | 30,00 % | 64,93% | 35,07% |

CONSTRUCTORES S.A.S

**AVANCE DE TIEMPO**

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO DE EJECUCION | : | 4 Meses |
| TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO | : | 57 Dias |
| AVANCE PORCENTUAL | : | **57 Dias trabajados / 123 Total Dias: 46,34 %** |

**Manejo del personal para la obra**

La firma contratista hizo llegar cada una de las afiliaciones del personal que está en campo realizando las actividades y ejecutando los ítems del contrato.

**PERSONAL CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024**

Se realizó cada una de las afiliaciones del personal y estas mismas afiliaciones fueron entregadas al supervisor del contrato.

En el desarrollo del contrato se realizó seguimiento permanente de los pagos al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión, caja de compensación familiar y riesgos profesionales laborales) del personal que participó en la ejecución del contrato.

Se anexa el pago de seguridad social de los empleados y del contratista.

**MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA**

A corte de este informe el contratista contó con la siguiente maquinaria y equipos en obra:

- Retroexcavadora 320 , Volquetas de 6 m3, rana, vibrocompactador, Carmix

**CONCLUSIONES**

El contratista cuenta con un avance de ejecución de obra acumulado a corte del 05 de noviembre de 2024 del 64,93%, en cuanto al tiempo estipulado para el desarrollo de las actividades constructivas derivadas del objeto contractual se encuentra en un 46,34% del tiempo contractual, lo que indica que se está dando cumplimiento a lo programado en el cronograma de obra.
El contratista mediante el presente informe soporta el pago de la presente Acta Parcial de Obra No. 02 de fecha 05 de noviembre de 2024 al Contrato de obra No. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE OCTUBRE DE 2024 por valor: **QUINIENTOS VEINTITRES MILLONESSEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($523.667.735,00)**

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS**
**Nit.. 901266.624-6**
**R/L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS**
**C.C. No. 88.279.624**
**CONTRATISTA**

CONSTRUCTORES S.A.S

# 14. INFORME DE SUPERVISION

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

# REGISTRO FOTOGRAFICO


**1,02 Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m.**





CONSTRUCTORES S.A.S


**1,04 Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi.**

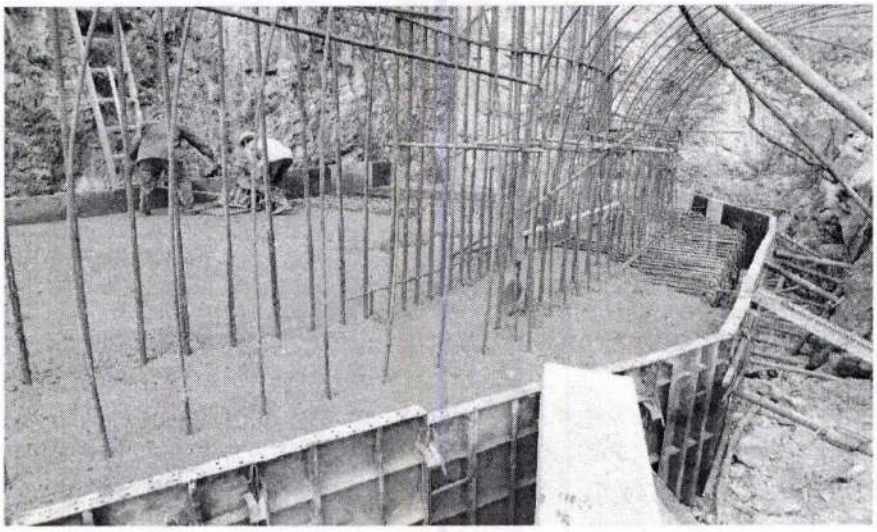



CONSTRUCTORES S.A.S

**1,05 Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi**

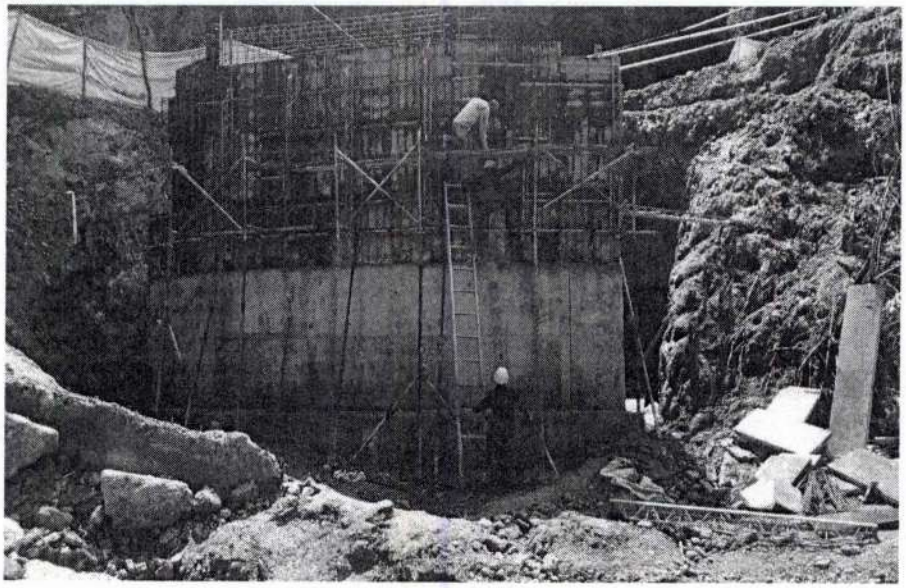




CONSTRUCTORES S.A.S

**1,07 Acero de refuerzo Grado 60**




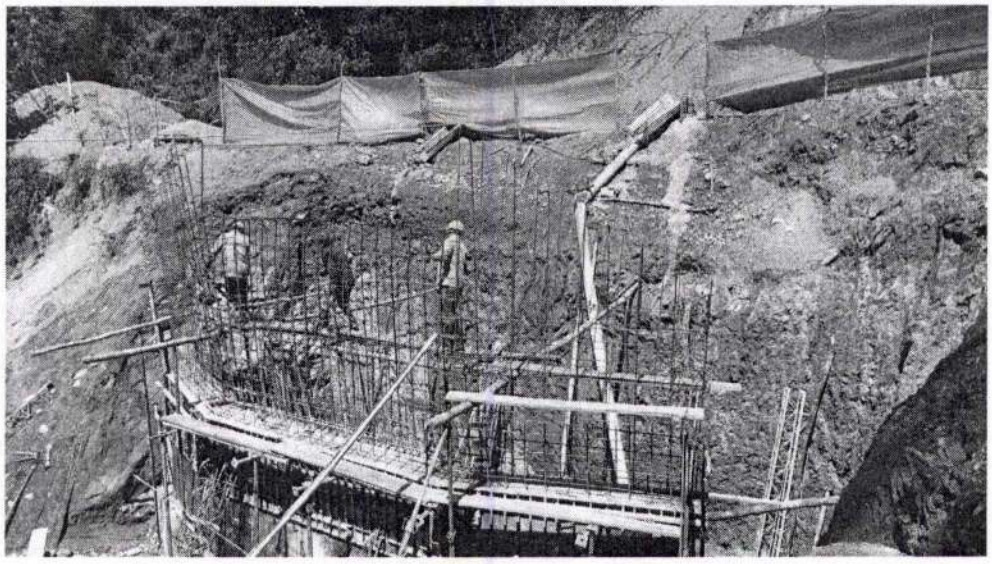

CONSTRUCTORES S.A.S


**1,17 Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado**

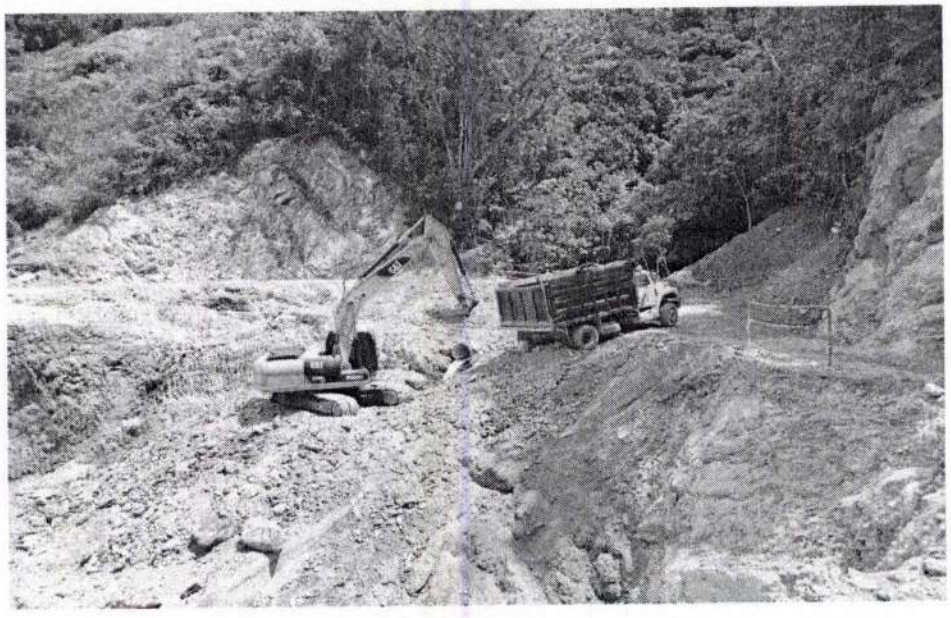

CONSTRUCTORES S.A.S

**1,20 Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta eléctrica)**



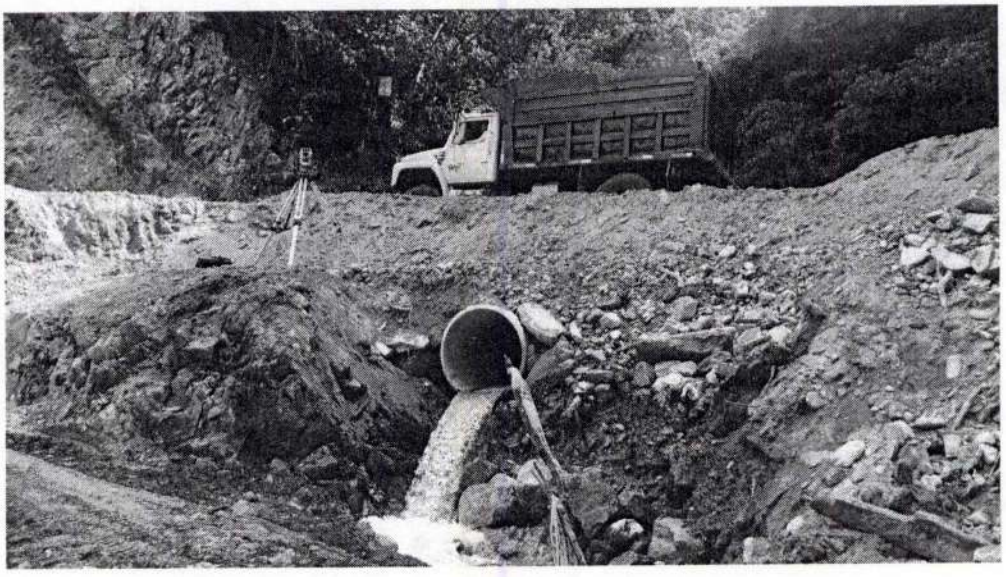

CONSTRUCTORES S.A.S


**1,22 Dragado cauce natural (Ampliación de la sección hidráulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la vía provisional )**






CONSTRUCTORES S.A.S

**1,23 Obra falsa de la superestructura (Formaleta temporal)**

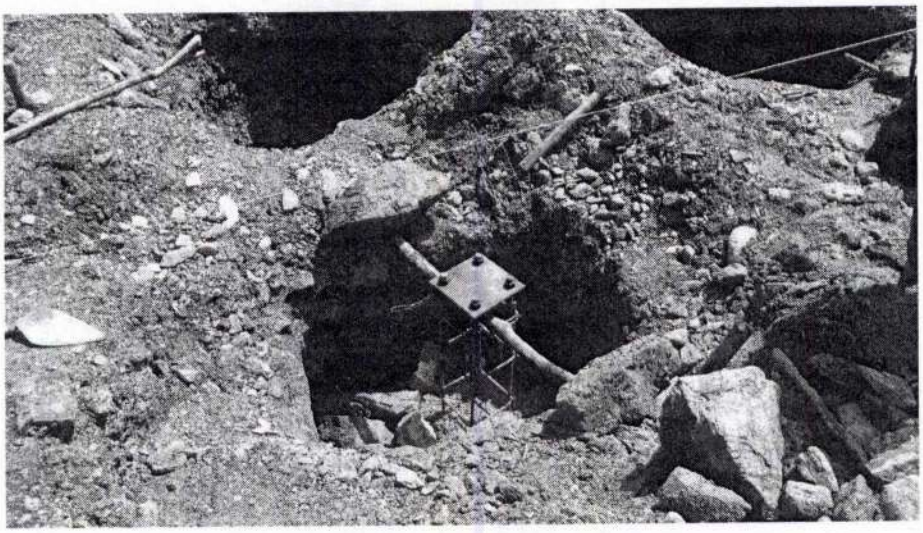

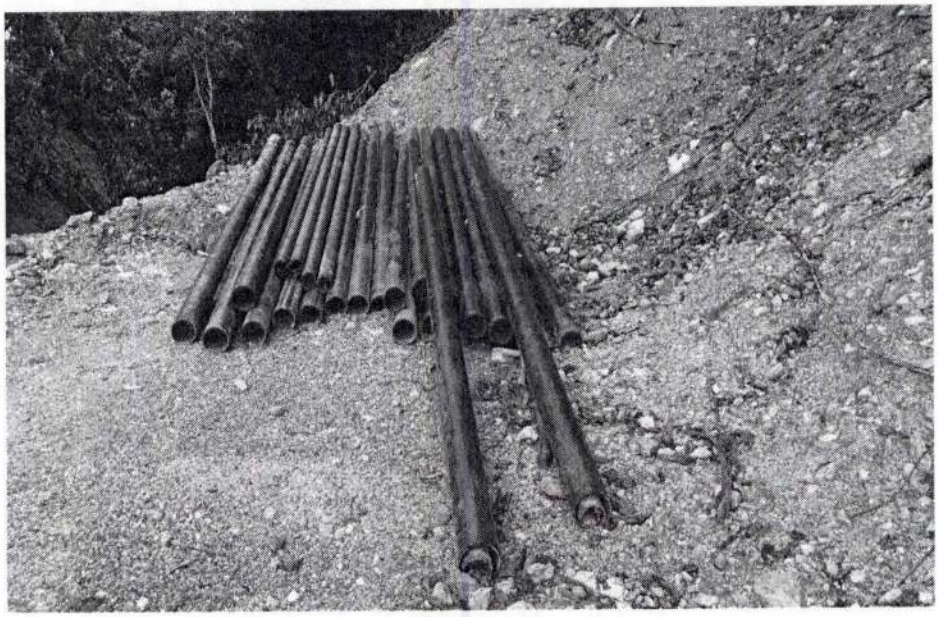

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-12 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 04/03/2024 | VERSIÓN 2 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 1 de 9 | |

# INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

| FECHA : | 05 de noviembre de 2024 |
|---|---|

| 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **FECHA Y No DEL CONTRATO** | RE-SGRD- 01885-2022 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres |
| **CONTRATISTA** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S |
| **C.C. o N.I.T.** | 901-266-624-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO |
| **C.C** | 88.279.624 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749 |
| **VALOR ADICIONAL CONTRATO** | No Aplica |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamento Norte de Santander |
| **PLAZO INICIAL** | Cuatro (04) Meses |
| **PLAZO ADICIONAL** | No Aplica |
| **PLAZO TOTAL** | Cuatro (04) Meses |
| **FORMA DE PAGO** | El valor del Contrato es de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749,** EL DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA la ejecución de las obras objeto del presente contrato según actas parciales y/o final de obra ejecutada, aprobadas por el supervisor y con el visto bueno del Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres, previa presentación de los soportes respectivos. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de aportes en materia de seguridad social integral, y parafiscales para la realización de cada pago dentro del presente contrato de obra. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería retendrá a EL CONTRATISTA el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones y |

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

| | | |
|---|---|---|
| | descuentos ordenados por las normas aplicables. | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 00 000079 del 26 de julio de 2024 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | No.00 000072 de Fecha 30 de agosto de 2024 | |
| **SUPERVISOR** | WILLIAM VERA ARIAS – Secretario para la Gestión de Riesgo de Desastres, mediante memorando de designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024. | |
| **INTERVENTOR EXTERNO** | - | |
| **ACTA DE INICIO** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | - | |
| **ACTA DE REINICIO** | - | |
| **ACTAS PARCIALES DE OBRAS** | - | **FECHA** |
| | ACTA PARCIAL DE OBRA #1 | 08 DE OCTUBRE DE 2024 |
| | ACTA PARCIAL DE OBRA #2 | 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **ACTAS DE MODIFICACIÓN** | No Aplica | |
| **ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS** | No Aplica | |

**RELACIÓN DE GARANTÍAS**

| | **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Vigencia** |
|---|---|---|---|
| **Garantía Única.**<br>No. 21-44-101449740 Anexo No.2<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 07/10/2024<br>Fecha de aprobación: 08/10/2024 | Cumplimiento del Contrato | $ 149.991.068,10 | 10/09/2024 al 10/05/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $ 74.995.534,05 | 10/09/2024 al 09/01/2028 |
| | Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 149.991.068,10 | Cinco años, 0 meses y 0 días |

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | Amparos | Valor Asegurado | Vigencia |
|---|---|---|---|
| No. 21-40-101238693 Anexo No.2<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 07/10/2024<br>Fecha de aprobación: 08/10/2024 | Predios, labores y operaciones | $ 260.000.000 | 10/09/2024 al 10/01/2025 |

| **2. ESTADO FINANCIERO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **FECHA** | **VALOR ACTA** | **COMPROBANTE DE EGRESO** | **VALOR PAGADO** |
| **ACTA PARCIAL No. 1** | **08 DE OCTUBRE DE 2024** | $ 449.654.942,00 | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATADO | $ 1.499.000.749 |
| ACTA PARCIAL No.01 DE FECHA 03 OCTUBRE DE 2024 | $ 449.654.942,00 |
| ACTA PARCIAL No.02 DE FECHA 03 OCTUBRE DE 2024 | $ 523.667.735,00 |
| **SALDO POR EJECUTAR** | **$** 525.678.072,00 |

### 3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

**1 ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Durante el periodo reportado en el presente informe se logró dar continuidad al proceso constructivo del puente mediante la ejecución de las actividades como lo son manejo de aguas, las actividades del dragado; seguidamente se procedió a realizar las actividades constructivas relacionadas el armado de refuerzo para la zarpa, formaleteado y vaciado de concreto de zarpa, armado de refuerzo de los estribos, formaleteado y vaciado de concreto para los estribos, retiro de material proveniente de las excavaciones y el dragado, y se dio inicio a las actividades de preparación para la instalación de las obras falsas.

Las obras ejecutadas durante el periodo reportado en acta parcial #2 que corresponde desde el 09 de octubre de 2024 al 05 de noviembre de 2024 están descritas en el siguiente cuadro:

:

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA**


| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UND | CANT. |
|---|---|---|---|
| **1.0** | **PUENTE VEHICULAR** | | |
| 1,02 | Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m. | M3 | 498,77 |
| 1,04 | Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi | M3 | 89,49 |
| 1,05 | Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi | M3 | 94,44 |
| 1,07 | Acero de refuerzo Grado 60 | KG | 3.200,90 |
| 1,17 | Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado | M3 | 128,03 |
| | **OBRAS COMPLEMENTARIA** | | |
| 1,20 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta eléctrica) | día | 29,00 |
| 1,22 | Dragado cauce natural (Ampliación de la sección hidráulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la vía provisional ) | $M^3$ | 393,33 |
| 1,23 | Obra falsa de la súper estructura (Formaleta temporal) | $M^2$ | 58,80 |

Alcanzando un porcentaje en ejecución de actividades constructivas contractuales durante el periodo reportado en el presente informe desde el 09 de octubre de 2024 con corte al 05 de noviembre de 2024 de 34,93% lo que implica un acumulado de ejecución de obra desde la firma del acta de inicio a la fecha de corte 05 de noviembre de 2024 de un 64,93% en ejecución de obra en un tiempo transcurrido de 57 días lo que representa un 46,34% del tiempo contractualmente estipulado para la ejecución de la obra, hecho que indica que el contratista está dando cumplimiento a la programación de obra aprobada

**2 INFORME FOTOGRÁFICO**

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA**


**EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL TIPO GRAVA ARICLLOSA CON AFLORAMINE ROCOSO. ALTURA SUPERIOR A 2 M.** cantidad ejecutada (498,77 m3)

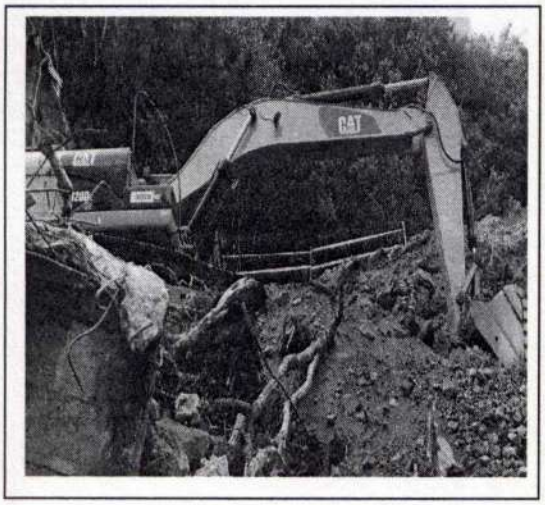





**ZARPA EN CONCRETO PARA PUENTES RESISTENCIA 4000 PSI** cantidad ejecutada (89,49 m3)




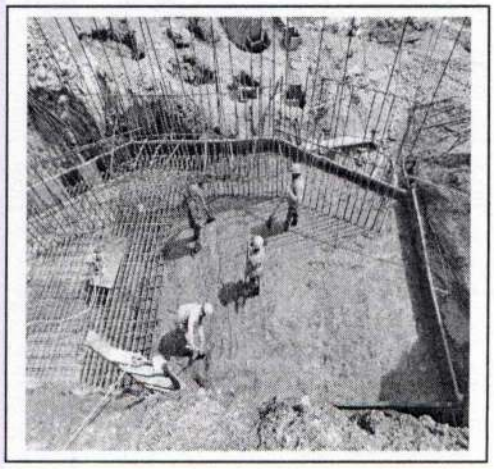


**MUROS O ELEVACIONES ESTRIBOS, CONCRETO PARA PUENTES RESISTENCIA 4000 PSI** cantidad ejecutada (94,44 m3)


**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA**

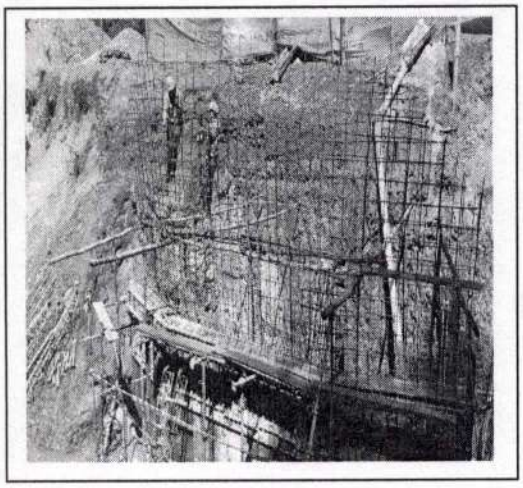

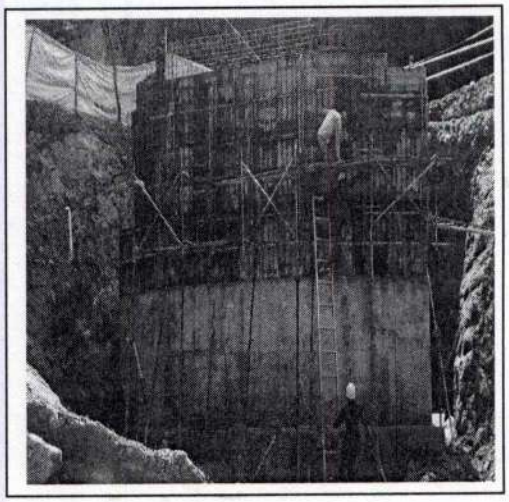

**ACERO DE REFUERZO GRADO 60**: (cantidad ejecutada (3200,9 kg)

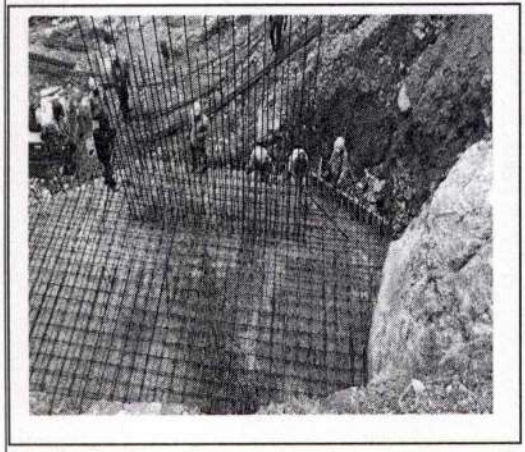

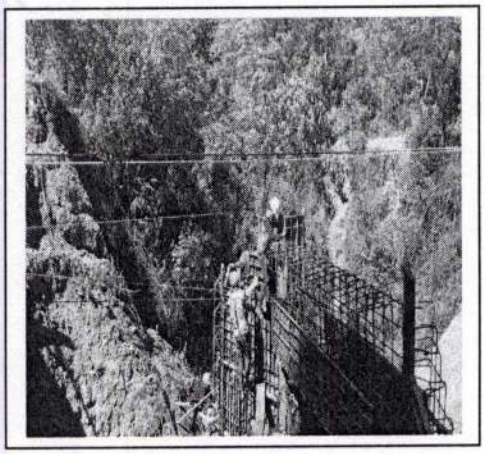

**CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO:** cantidad

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA**

ejecutada (128,03 M3





**MANEJO DE AGUAS**






## INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

**DRAGADO CAUCE NATURAL (Ampliación de la sección hidráulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la vía provisional):** cantidad ejecutada (393,33 M3)





**OBRA FALSA DE LA SUPER ESTRUCTURA:** cantidad ejecutada (58,80 M2)

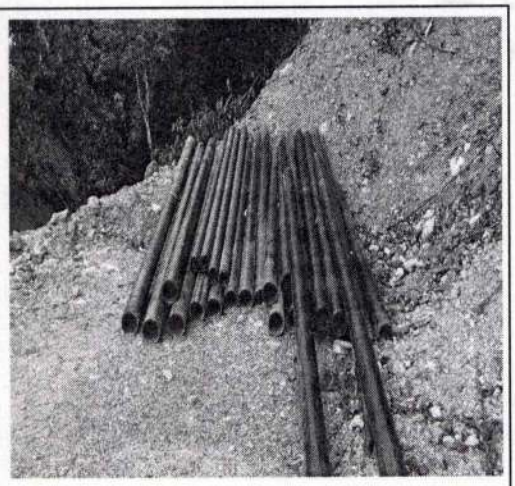



## INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

### 4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo WILLIAN VERA ARIAS con cedula de ciudadanía No. 88.158.521 de Cúcuta en mi condición de ordenador del gasto (a) del contrato de Obra No RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024, CERTIFICO que:

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO en calidad de Representante Legal de la IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución del (objeto contractual) durante el período comprendido del 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 y pagar es la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($523.667.735,00) correspondiente al pago Acta Parcial No. 02 del contrato en referencia.

De igual forma CERTIFICO que el contratista acredito los siguientes pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa planillas de pago)

**Observaciones (Si hay lugar a ello):**

| |
|---|
| |

Supervisor
**WILLIAM VERA ARIAS**
SECRETARIO SGRD

Contratista
**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS**
R.L. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO

| Trazabilidad | Nombre | Cargo | Firma / fecha |
|---|---|---|---|
| Proyectó: | **Edgar Fabian Labrador Valcárcel** | **Ing. Civil Contratista** | **05-11-2024** |
| Revisión jurídica: | **Marlym Jhoana Montoya** | **Asesora Jurídica Externa** | **05-11-2024** |
| Aprobación Jurídica: | **Marlym Jhoana Montoya** | **Asesora Jurídica Externa** | **05-11-2024** |
| Revisión área técnica: | **William Vera Arias** | **Secretario SGRD** | **05-11-2024** |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

CONSTRUCTORES S.A.S

# 16. ENSAYOS DE LABORATORIO

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| | DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRAULICO METODO RNL (ROAD NOTE LABORATORY) | CODIGO: IN-H-002 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSION:03 | FECHA: 16/12/2022 |
| | | PAGINA 1 DE 1 | |

**PROYECTO:** Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabit
**SOLICITANTE:** Imar Orlando Vacca Machado S.A.S.
**CONTACTO:** Imar Orlando Vacca Machado
**MATERIAL:** Triturado 3/4 - Arena de Trituración - Trituradora Concretos y Triturados El Zulia (CTZ)

**FECHA:** 3/10/2024
**RESISTENCIA:** 4000 PSI
**M.R.:** -
**ORDEN DE SERVICIO:** OS-3528

**Diseño de mezcla de concreto código OS3528-24-DM-01**

| Cemento Argos Uso General | Densidad | | Peso Unitario Suelto | |
|---|---|---|---|---|
| | 3,10 | g/cm³ | 1,21 | g/cm³ |

| CARACTERISTICAS AGREGADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agregado Grueso | | | Agregado Fino | | |
| TAMAÑO MAXIMO NOMINAL | 12,5 | mm | MODULO DE FINURA | 3,82 | |
| DENSIDAD SUELTA | 1,418 | g/cm³ | DENSIDAD SUELTA | 1,642 | g/cm³ |
| DENSIDAD COMPACTA | 1,573 | g/cm³ | DENSIDAD COMPACTA | 1,800 | g/cm³ |
| DENSIDAD SECA | 2,625 | g/cm³ | DENSIDAD SECA | 2,653 | g/cm³ |
| ABSORCIÓN | 1,210 | % | ABSORCIÓN | 1,235 | % |
| HUMEDAD NATURAL | 0,50 | % | HUMEDAD NATURAL | 0,50 | % |

| RESISTENCIA SOLICITADA - RELACIÓN A/C - DISEÑO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia requerida | **281,2** | kg/cm² | Resistencia diseño | **323** | kg/cm² |
| Asentamiento | 10 ± 2 | cm | Relación A/C | 0,41 | |
| Aire atrapado | 2 | % | Contenido de agua | 220 | lt/m³ |
| Volúmen Abs Agregados. | 606,91 | Lt/m3 | Peso Agregados | 1600,9 | Kg/m³ |
| Volúmen Agre. G. Promedio | 2,638 | | Cemento | 536,59 | Kg/m³ |

**CANTIDADES DE DISEÑO POR METRO CÚBICO**

| Material | Peso Seco Kg/m³ | Densidad gr/cm³ | Volumen Lt/m³ | % Agreg en peso | Corrección humedad | Peso x m³ Agr. Humedo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cemento | 536,6 | 3,10 | 173,1 | | | 536,6 |
| A.Fino | 720,4 | 2,65 | 251,5 | 45,0 | 3,6 | 724,0 |
| A.grueso | 880,5 | 2,63 | 335,4 | 55,0 | 4,4 | 884,9 |
| Agua | 220,0 | 1,00 | 220,0 | | -11,5 | 231,5 |
| Aire | | | 20,0 | | | |
| TOTAL | 2357,5 | | 1000,0 | | | |

**RESUMEN DISEÑO DE MEZCLA. COMPONENTES EN PESO/M³ Y PROPORCIONES**

| Material | Peso seco Kg/m3 | Proporción Peso | Peso húmedo Kg/m3 | Proporción Peso | Vol. Suelto Lt/m3 | Proporción Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cemento | 536,6 | 1,00 | 536,6 | 1,0 | 443,5 | 1,0 |
| A.Fino | 720,4 | 1,34 | 724,0 | 1,35 | 438,6 | 0,99 |
| A.grueso | 880,5 | 1,64 | 884,9 | 1,65 | 620,9 | 1,40 |
| Agua | 220,0 | | 231,5 | | 220,0 | |

| CANTIDADES PARA ELABORACIÓN DE CILINDROS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas Cilindro | 4 | | Volumen del Cilindro | 0,00167511 | m³ |
| No de Cilindros | 6 | | Volumen mezcla | 15,076 | Lt |
| **Cant. Cemento** | **8,090** | kg | **Cant. A.Fino** | **10,915** | kg |
| **Cant. Agua** | **3,491** | Lt | **Cant. A.grueso** | **13,341** | kg |

| CANTIDADES EN BALDES X BULTO DE CEMENTO DE 42,5 Kg | | |
|---|---|---|
| Capacidad del Balde (Lt) | 10 | |
| Bulto de Cemento (kg) | 42,5 | |
| **Material** | **Lt/bulto** | **N° de Baldes** |
| Arena | 34,74 | 3,47 |
| Triturado | 49,18 | 4,92 |
| Agua | 17,43 | 1,74 |

| CANTIDADES POR M3 | |
|---|---|
| **Cemento Kg/m3** | **537** |
| **Arena m3** | **0,439** |
| **Triturado m3** | **0,621** |
| **Agua Lt/m3** | **220,0** |

**Autorizó:**
Ing. Cristian Agudelo R.
Mat. Prof. No 54202-334998 NTS
**Director de Innovación**


**OBSERVACIÓN:** No se presentan observaciones.

| | INFORME DE RESULTADOS | CÓDIGO: LA-H-014 | |
|---|---|---|---|
| GEOTECNICAS DEL NORTE | | VERSIÓN: 04 | FECHA: 2024/06/25 |
| | ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO GRUESO | | |
| | NORMA INV E-213-13 | PÁGINA 1 DE 1 | |

**Informe No.: OS3528-24-AG-01**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO*:** | Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabit | **FECHA TOMA*:** | 2024-09-13 |
| **SOLICITANTE*:** | Imar Orlando Vacca Machado S.A.S. | **FECHA RECIBIDO:** | 2024-09-13 |
| **CONTACTO*:** | Imar Orlando Vacca Machado | **FECHA ENSAYO:** | 2024-10-01 |
| **MATERIAL:** | Triturado 3/4" | **FECHA INFORME:** | 2024-10-03 |
| **PROCEDENCIA*:** | Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ) | **No. ORDEN:** | OS-3528 |

| TABLA DE GRANULOMETRÍA | | | |
|---|---|---|---|
| $P_1$ | 5135,4 | $P_2$ | 5109,5 |
| **Tamiz** | **Peso Retenido** | **% Retenido** | **% Pasa** |
| 3" | 0 | 0 | 100,0 |
| 2 1/2" | 0 | 0 | 100,0 |
| 2" | 0 | 0 | 100,0 |
| 1 1/2" | 0 | 0 | 100,0 |
| 1" | 0 | 0 | 100,0 |
| 3/4" | 32,22 | 0,6 | 99,4 |
| 1/2" | 1963,9 | 38,2 | 61,1 |
| 3/8" | 1407,3 | 27,4 | 33,7 |
| No. 4 | 1674,2 | 32,6 | 1,1 |
| No. 8 | 31,87 | 0,6 | 0,5 |
| Fondo | 25,89 | 0,5 | |

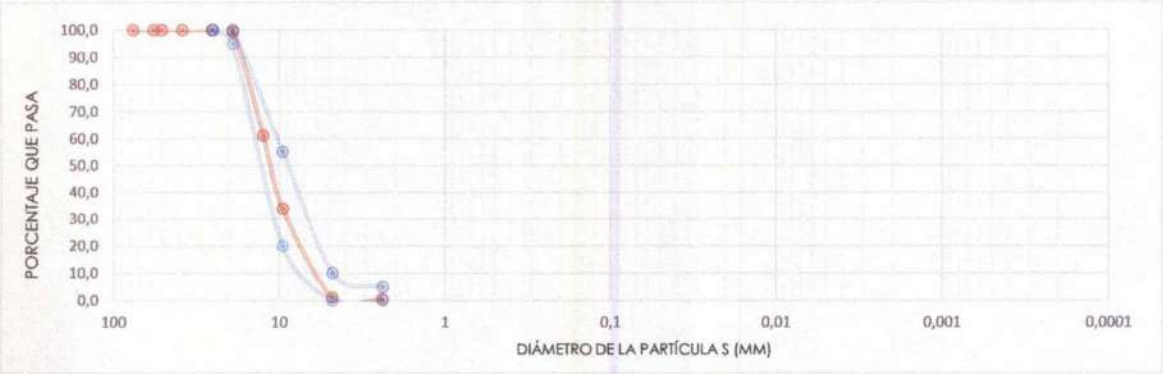


Gradación de la muestra

Norma INV (AG-25)

**OBSERVACIONES:** No se presentan observaciones.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*). GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

**Revisó:**
Gabriela Araque Lizarazo
**Director Técnico**

**Autorizó:**
Cristian Agudelo R.
**Gerente**

OFICINA - LABORATORIO: AV. GRANCOLOMBIA No. 4E 28 B. POPULAR, CÚCUTA - 5746312 - 350-6147123
E-MAIL: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com
www.geotecnicasdelnorte.com

Fin de informe

| | INFORME DE RESULTADOS | CÓDIGO: LA-H-015 | |
|---|---|---|---|
| GEOTECNICAS DEL NORTE | DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO | VERSIÓN: 04 | FECHA: 2024/06/25 |
| | NORMA INV E-223-13 | PÁGINA 1 DE 1 | |

**Informe No.: OS3528-24-AG-01**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO*:** | Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabit | **FECHA TOMA*:** | 2024-09-13 |
| **SOLICITANTE*:** | Imar Orlando Vacca Machado S.A.S. | **FECHA RECIBIDO:** | 2024-09-13 |
| **CONTACTO*:** | Imar Orlando Vacca Machado | **FECHA ENSAYO:** | 2024-09-28 |
| **MATERIAL:** | Triturado 3/4" | **FECHA INFORME:** | 2024-10-03 |
| **PROCEDENCIA:** | Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ) | **No. ORDEN:** | OS-3528 |

| | | |
|---|---|---|
| **Peso Muestra Seca (W)** | 3140 | (gr) |
| **Peso Muestra Superficialmente Seca (Wss)** | 3178 | (gr) |
| **Peso Muestra Sumergida en Agua (Ws)** | 1982 | (gr) |
| **Gravedad Específica** | 2,712 | (gr /cm$^3$) |
| **Gravedad Específica Seca** | 2,625 | (gr /cm$^3$) |
| **Gravedad Específica Saturada** | 2,657 | (gr /cm$^3$) |
| **% Absorción** | $\frac{Wss - W}{W} \times 100$ | **1,210** |

**OBSERVACIONES:** No se presentan observaciones.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*). GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

**Revisó:** Gabriela Araque Lizarazo
**Director Técnico**

**Autorizó:** Cristian Agudelo R.
**Gerente**

| | INFORME DE RESULTADOS | CÓDIGO: LA-H-016 | |
|---|---|---|---|
| GEOTECNICAS DEL NORTE S.A.S. | DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACÍOS DE LOS AGREGADOS GRUESO EN ESTADO SUELTO Y COMPACTO | VERSIÓN: 03 | FECHA: 2024/06/25 |
| | NORMA INV E-217-13 | PÁGINA 1 DE 1 | |

**Informe No.: OS3528-24-BG-01**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO*:** | Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabit | **FECHA TOMA*:** | 2024-09-13 |
| **SOLICITANTE*:** | Imar Orlando Vacca Machado S.A.S. | **FECHA RECIBIDO:** | 2024-09-13 |
| **CONTACTO*:** | Imar Orlando Vacca Machado | **FECHA ENSAYO:** | 2024-09-27 |
| **MATERIAL:** | Triturado 3/4" | **FECHA INFORME:** | 2024-10-03 |
| **PROCEDENCIA:** | Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ) | **No. ORDEN:** | OS-3528 |

| | | |
|---|---|---|
| **Diámetro Molde** | 15,2 | cm |
| **Altura Molde** | 17,8 | cm |
| **Volumen Molde** | 3230 | $cm^3$ |

| | PESO 1 | | PESO 2 | | PESO 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Material Suelto** | 4581 | (gr) | 4562 | (gr) | 4597 | (gr) |
| | **PESO 1** | | **PESO 2** | | **PESO 3** | |
| **Material Compacto** | 5062 | (gr) | 5107 | (gr) | 5075 | (gr) |
| **Densidad Suelta** | 1,418 | ($gr/cm^3$) | 1,412 | ($gr/cm^3$) | 1,423 | ($gr/cm^3$) |
| **Densidad Compacta** | 1,567 | ($gr/cm^3$) | 1,581 | ($gr/cm^3$) | 1,571 | ($gr/cm^3$) |

| | | |
|---|---|---|
| **Promedio Densidad Suelta** | **1,418** | ($gr/cm^3$) |
| **Promedio Densidad Compacta** | **1,573** | ($gr/cm^3$) |
| **Porcentaje De Vacíos en Agreg.** | **42%** | |

**OBSERVACIONES:** No se presentan observaciones.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*). GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

**Revisó:**
Gabriela Araque Lizarazo
**Director Técnico**

**Autorizó:**
Cristian Agudelo R.
**Gerente**



Fin del informe

| | INFORME DE RESULTADOS | CÓDIGO: LA-H-017 | |
|---|---|---|---|
| GEOTECNICAS DEL NORTE | ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO | VERSIÓN: 04 | FECHA: 2024/06/25 |
| | NORMA INV E-213-13 | PÁGINA 1 DE 1 | |

**Informe No.: OS3528-24-AF-01**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO*:** | Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabit | **FECHA TOMA*:** | 2024-09-13 |
| **SOLICITANTE*:** | Imar Orlando Vacca Machado S.A.S. | **FECHA RECIBIDO:** | 2024-09-13 |
| **CONTACTO*:** | Imar Orlando Vacca Machado | **FECHA ENSAYO:** | 2024-09-30 |
| **MATERIAL:** | Arena de Trituración | **FECHA INFORME:** | 2024-10-03 |
| **PROCEDENCIA:** | Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ) | **No. ORDEN:** | OS-3528 |

| TABLA DE GRANULOMETRÍA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $P_1$ | 1605,1 | $P_2$ | 1604,3 | NORMA (%) | |
| **Tamiz** | **Peso Retenido** | **% Retenido** | **% Pasa** | **Min.** | **Max.** |
| 3/8" | 4,85 | 0 | 99,7 | 100 | 100 |
| No. 4 | 354,6 | 22,1 | 77,6 | 95 | 100 |
| No. 8 | 317,1 | 19,8 | 57,8 | 80 | 100 |
| No. 16 | 255,8 | 15,9 | 41,9 | 50 | 85 |
| No. 30 | 238,6 | 14,9 | 27,0 | 25 | 60 |
| No. 50 | 274,7 | 17,1 | 9,9 | 10 | 30 |
| No. 100 | 99,65 | 6,2 | 3,7 | 2 | 10 |
| No. 200 | 58,97 | 3,7 | 0,1 | | |
| Fondo | 0,83 | | | | |

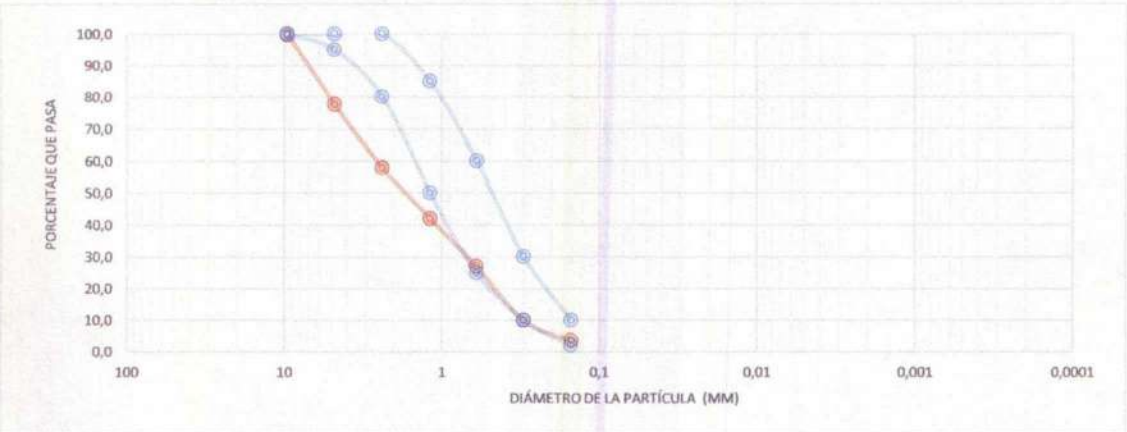


Granulometría muestra — Norma INV 630-13

**OBSERVACIONES:** No se presentan observaciones.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*). GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

**Revisó:** Gabriela Araque Lizarazo
**Director técnico**

**Autorizó:** Cristian Agudelo R.
**Gerente**



**Fin del informe**

| | INFORME DE RESULTADOS | CÓDIGO: LA-H-018 | |
|---|---|---|---|
| GEOTECNICAS DEL NORTE | DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO | VERSIÓN: 04 | FECHA: 2024/06/25 |
| | NORMA INV E-222-13 | PÁGINA 1 DE 1 | |

**Informe No.: OS3528-24-AG-01**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO*:** | Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabit | **FECHA TOMA*:** | 2024-09-13 |
| **SOLICITANTE*:** | Imar Orlando Vacca Machado S.A.S. | **FECHA RECIBIDO:** | 2024-09-13 |
| **CONTACTO*:** | Imar Orlando Vacca Machado | **FECHA ENSAYO:** | 2024-10-01 |
| **MATERIAL:** | Arena de Trituración | **FECHA INFORME:** | 2024-10-03 |
| **PROCEDENCIA:** | Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ) | **No. ORDEN:** | OS-3528 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Temperatura del Agua sin Aire** | °C | - | - | 23,0 |
| **Peso Muestra Seca al Horno** | gr | A | - | 493,9 |
| **Masa del Picnómetro Aforado Lleno de Agua** | gr | B | - | 716,1 |
| **Masa Total del Picnómetro Aforado con la Muestra y Lleno de Agua** | gr | C | - | 1030,4 |
| **Masa de la Muestra Saturada y Superficialmente Seca (SSS)** | gr | S | - | 500,0 |
| **Densidad Relativa Aparente Seca al Horno** | gr /cm3 | Sd | $\frac{997,5\ A}{(B+S-C)}$ | **2,653** |
| **Densidad Aparente Saturada y Superficialmente Seca (SSS)** | gr /cm$^3$ | Ss | $\frac{997,5\ S}{(B+S-C)}$ | **2,686** |
| **Densidad Aparente Saturada** | gr /cm$^3$ | Sa | $\frac{997,5\ A}{(B+A-C)}$ | **2,743** |
| **Absorción** | % | Abs | $\frac{S-A}{A}$ | **1,235** |

**OBSERVACIONES:** No se presentan observaciones.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*). GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

**Revisó:** Gabriela Araque Lizarazo
**Director Técnico**

**Autorizó:** Cristian Agudelo R.
**Gerente**

| | INFORME DE RESULTADOS | CÓDIGO: LA-H-019 | |
|---|---|---|---|
| GEOTECNICAS DEL NORTE | DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACÍOS DE LOS AGREGADOS FINOS EN ESTADO SUELTO Y COMPACTO | VERSIÓN: 04 | FECHA: 2024/06/25 |
| | NORMA INV E-217-13 | PÁGINA 1 DE 1 | |

**Informe No.: OS3528-24-BF-01**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO*:** | Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabit | **FECHA TOMA*:** | 2024-09-13 |
| **SOLICITANTE*:** | Imar Orlando Vacca Machado S.A.S. | **FECHA RECIBIDO:** | 2024-09-13 |
| **CONTACTO*:** | Imar Orlando Vacca Machado | **FECHA ENSAYO:** | 2024-09-27 |
| **MATERIAL:** | Arena de Trituración | **FECHA INFORME:** | 2024-10-03 |
| **PROCEDENCIA:** | Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ) | **No. ORDEN:** | OS-3528 |

| | | |
|---|---|---|
| **Diámetro Molde** | 10,17 | cm |
| **Altura Molde** | 11,5 | cm |
| **Volumen Molde** | 934,18 | $cm^3$ |

| | PESO 1 | | PESO 2 | | PESO 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Material Suelto** | 1520 | (gr) | 1533 | (gr) | 1550 | (gr) |
| | **PESO 1** | | **PESO 2** | | **PESO 3** | |
| **Material Compacto** | 1694 | (gr) | 1670 | (gr) | 1681 | (gr) |
| **Densidad Suelta** | 1,627 | ($gr/cm^3$) | 1,641 | ($gr/cm^3$) | 1,659 | ($gr/cm^3$) |
| **Densidad Compacta** | 1,813 | ($gr/cm^3$) | 1,788 | ($gr/cm^3$) | 1,799 | ($gr/cm^3$) |

| | | |
|---|---|---|
| **Promedio Densidad Suelta** | **1,642** | ($gr/cm^3$) |
| **Promedio Densidad Compacta** | **1,800** | ($gr/cm^3$) |
| **Porcentaje De Vacíos en Agreg.** | **32%** | |

**OBSERVACIONES:** No se presentan observaciones.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*). GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

**Revisó:**
Gabriela Araque Lizarazo
**Director Técnico**

**Autorizó:**
Cristian Agudelo R.
**Gerente**

| | INFORME DE RESULTADOS | CÓDIGO: LA-H-020 | |
|---|---|---|---|
| GEOTECNICAS DEL NORTE | CÁLCULO DE MÓDULO DE FINURA | VERSIÓN: 03 | FECHA: 2024/06/25 |
| | NORMA NTC-174 | PÁGINA 1 DE 1 | |

**Informe No.: OS3528-24-MF-01**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO*:** | Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabit | **FECHA TOMA*:** | 2024-09-13 |
| **SOLICITANTE*:** | Imar Orlando Vacca Machado S.A.S. | **FECHA RECIBIDO:** | 2024-09-13 |
| **CONTACTO*:** | Imar Orlando Vacca Machado | **FECHA ENSAYO:** | 2024-09-30 |
| **MATERIAL:** | Arena de Trituración | **FECHA INFORME:** | 2024-10-03 |
| **PROCEDENCIA:** | Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ) | **No. ORDEN:** | OS-3528 |

| Tamiz | % Retenido | % Ret. Acumulado |
|---|---|---|
| 3/8" | 0 | 0 |
| No. 4 | 22,1 | 22,1 |
| No. 8 | 19,8 | 41,9 |
| No. 16 | 15,9 | 57,8 |
| No. 30 | 14,9 | 72,7 |
| No. 50 | 17,1 | 89,8 |
| No. 100 | 6,2 | 96,0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Módulo De Finura** | $\frac{\sum \% \text{ RET. ACUM.}}{100}$ | = | **3,80** |

**OBSERVACIONES:** No se presentan observaciones.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*). GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

**Revisó:**
Gabriela Araque Lizarazo
**Director Técnico**

**Autorizó:**
Cristian Agudelo R.
**Gerente**

OFICINA - LABORATORIO: AV. GRANCOLOMBIA No. 4E 28 B. POPULAR, CÚCUTA - 5746312 - 350-6147123
E-MAIL: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com
www.geotecnicasdelnorte.com

Fin del informe

| GEOTECNICAS DEL NORTE S.A.S. / ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017 21-LAB-024 | INFORME DE RESULTADOS | CÓDIGO: LA-H-038 | |
|---|---|---|---|
| | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO | VERSIÓN: 07 | FECHA: 2024/06/25 |
| | NORMA INV E-410-13 | PÁGINA 1 DE 1 | |


**Informe No.: OS3528-24-CC-01**

**PROYECTO*:** Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabit
**SOLICITANTE*:** Imar Orlando Vacca Machado S.A.S.
**CONTACTO*:** Imar Orlando Vacca Machado
**MATERIAL*:** Concreto Mezclado en las Instalaciones de Geotécnicas del Norte S.A.S.
**PROCEDENCIA*:** Triturado 3/4'' - Arena de Trituración - Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ)

**FECHA TOMA*:** 2024-10-03
**FECHA DE RECIBIDO:** 2024-09-13
**FECHA DE ENSAYO:** 2024-10-07
**FECHA DE INFORME:** 2024-10-07
**No. ORDEN:** OS-3528

| CILINDRO # | ELEMENTO* | D - DIÁMETRO (mm) | | | h - ALTURA (mm) | | | | ÁREA | PESO | DENSIDAD | SLUMP* | EDAD | CARGA MÁXIMA | | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | | | TIPO DE FALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D1 | D2 | Promedio | h1 | h2 | h3 | Promedio | ($mm^2$) | (g) | ($kg/m^3$) | cm | (Días) | kN | kg | MPa | $kg/cm^2$ | PSI | |
| 1 | DISEÑO DE MEZCLA OS-3528 | 102,02 | 101,89 | 101,96 | 205,53 | 205,01 | 204,89 | 205,14 | 8164,1 | 3911 | 2340 | - | 4 | 145,9 | 14877 | 17,9 | 182,2 | 2592 | 5 |
| 2 | DISEÑO DE MEZCLA OS-3528 | 102,58 | 100,37 | 101,48 | 208,09 | 207,17 | 207,02 | 207,43 | 8087,4 | 3948 | 2350 | - | 4 | 138,6 | 14133 | 17,1 | 174,8 | 2486 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**OBSERVACIONES:** No se presentan observaciones.

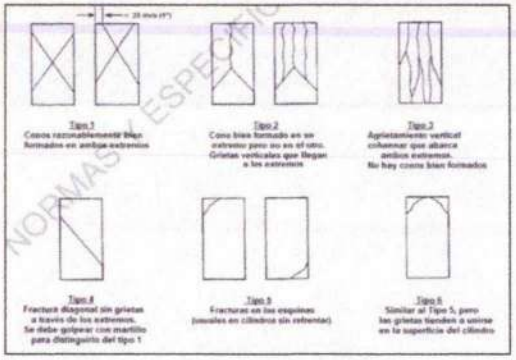


**TIPOS DE FALLA:**

**Tipo 1** Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
**Tipo 2** Cono bien formado en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos
**Tipo 3** Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos, no hay conos bien formados.
**Tipo 4** Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1
**Tipo 5** Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar)
**Tipo 6** Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilidro.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*).
GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

**Revisó:**
Gabriela Araque Lizarazo
**Director Técnico**

**Autorizó:**
Cristian Agudelo R.
**Gerente**

OFICINA - LABORATORIO: AV. GRANCOLOMBIA No. 4E 28 B. POPULAR, CÚCUTA - 5746312 - 350-6147123
E-MAIL: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com
www.geotecnicasdelnorte.com

Fin del informe

EQUITOCOL
INGENIERÍA

# *CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No. 0258*

***Referencia del equipo:*** *Estación SOKKIA SET3-50RX* ***Serial:*** *110133*

***Cliente:*** *OBSECON S.A.S.*

***Fecha de calibración:*** *7 de agosto de 2024*

***Fecha de vencimiento:*** *7 de febrero de 2025*

## *EQUIPOS DE PATRONAMIENTO*

*Colimador marca SOUTH RF F420-2T,*

*Expedida a solicitud del interesado a los siete (07) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2.024) y tiene una vigencia de Seis meses* ***(06)*** *meses a partir de la fecha.*

*Respuesta de la SUPERINTENDENCIA a las calibraciones. Cabe anotar que los EQUIPOS son calibrados y sujetados de acuerdo al manual del fabricante.*

***Favor exigir este documento en original y llamar a nuestros teléfonos para confirmar la autenticidad del mismo.***

Elaboro y Revisó:

**Jhonny Elver Patiño**
**Ingeniero Electrónico**
**M.P. NS206-90604**

EQUITOCOL
INGENIERÍA

## *INSPECCIÓN ÓPTICO MECÁNICO*

| | CORREGIDO | NO CORREGIDO | CORRECTO | NO APLICA |
|---|---|---|---|---|
| *Mantenimiento interno* | | | X | |
| *Niveles tubulares y ojo de pollo* | X | | | |
| *Chequeo del teclado* | | | X | |
| *Ajuste del compensador* | X | | | |
| *Mantenimiento base nivelante* | | | X | |
| *Limpieza exterior* | X | | | |
| *Frenos y movimientos lentos* | | | X | |
| *Ajuste de plomada óptica / laser* | | | X | |
| *Ajuste del distanciometro* | X | | | |
| *Ajuste del vertical* | X | | | |
| *Ajuste del horizontal* | X | | | |
| *Ajuste del retículo* | X | | | |
| *Mirillas de puntería* | | | X | |

## *INSPECCIÓN ELECTRONICA Y EDM*

***(distanciometro, línea base 40 m y 80m)***

| | |
|---|---|
| ***Lectura Vertical: 90°00"00´*** | ***Lectura Horizontal : 0° 00" 00*** |
| ***269°59'45" Opuesto*** | ***180°00'08" Opuesto*** |
| ***Error promedio 15" seg.*** | ***Error promedio 08" seg.*** |
| ***Calibrado : 90° 00 '00" Opuesto 270°00'00"*** | ***Calibrado : 0° 00 '00" Opuesto 180° 00'00*** |

***EQUITOCOL INGENIERIA,*** *capacitado y apto para reparar y corregir instrumentos topográficos* ***CERTIFICA*** *que el instrumento descrito anteriormente, fue revisado, calibrado y sometido a pruebas técnicas bajo parámetros y características de funcionamiento de los fabricantes.*

**VENTA, CALIBRACIÓN, REPARACIÓN Y ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS**
Cll. 11 Nº 3-16 B. San Luis, Cúcuta, Norte de Santander
3165262987/ 3115933424 5763721
equitocol.ingenieria@hotmail.com

EQUITOCOL
INGENIERÍA

## *REGISTRO FOTOGRAFICO DE EQUIPO EN CALIBRACION*



**VENTA, CALIBRACIÓN, REPARACIÓN Y ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS**
Cll. 11 Nº 3-16 B. San Luis, Cúcuta, Norte de Santander
3165262987/ 3115933424 5763721
equitocol.ingenieria@hotmail.com

EQUITOCOL
INGENIERÍA

# *CERTIFICADO DE CALIBRACION No. 0257*

***Referencia del equipo:*** *Nivel TOPCON AT-G6* ***Serial:*** *8F3313*

***Cliente:*** *OBSECON S.A.S.*

***Fecha de calibración:*** *07 de agosto de 2024*

***Fecha de vencimiento:*** *07 de febrero de 2025*

## *EQUIPOS DE PATRONAMIENTO*

*Colimador marca SOUTH RF F420-2T,*

*Expedida a solicitud del interesado a los siete (07) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2.024) y tiene una vigencia de Seis meses* **(06)** *meses a partir de la fecha.*

*Respuesta de la SUPERINTENDENCIA a las calibraciones. Cabe anotar que los EQUIPOS son calibrados y sujetados de acuerdo al manual del fabricante.*

***Favor exigir este documento en original y llamar a nuestros teléfonos para confirmar la autenticidad del mismo.***

Elaboro y Revisó:

**Jhonny Elver Patiño**
**Ingeniero Electrónico**
**M.P. NS206-90604**

EQUITOCOL
INGENIERÍA

## *INSPECCIÓN ÓPTICO MECÁNICO*

| | CORREGIDO | NO CORREGIDO | CORRECTO | NO APLICA |
|---|---|---|---|---|
| *Mantenimiento interno* | | | | X |
| *Nivel ojo de pollo* | X | | | |
| *Base nivelante* | X | | | |
| *Limpieza exterior* | X | | | |
| *Ajuste del retículo* | X | | | |
| *Movimientos lentos* | | | X | |
| *Compensador automático* | | | X | |
| *Mando de enfoque* | | | X | |

## *LECTURAS EN LINEA DE 28 m*


| *LECTURAS INICIALES* | *LECTURAS FINALES* |
|---|---|
| ***Lectura A= 30 mm*** | ***Lectura A= 30 mm*** |
| ***Lectura B= 32.2 mm*** | ***Lectura B= 30mm*** |
| ***ERROR= 2.2 mm*** | ***ERROR= 0 mm*** |

***EQUITOCOL INGENIERIA,*** *capacitado y apto para reparar y corregir instrumentos topográficos* ***CERTIFICA*** *que el instrumento descrito anteriormente, fue revisado, calibrado y sometido a pruebas técnicas bajo parámetros y características de funcionamiento de los fabricantes.*

**VENTA, CALIBRACION, REPARACION Y ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS**
Cll. 11 Nº 3-16 B. San Luis, Cúcuta, Norte de Santander
3165262987/ 3115933424 5763721
equitocol.ingenieria@hotmail.com

EQUITOCOL
INGENIERÍA

*REGISTRO FOTOGRAFICO DE EQUIPO EN CALIBRACION*

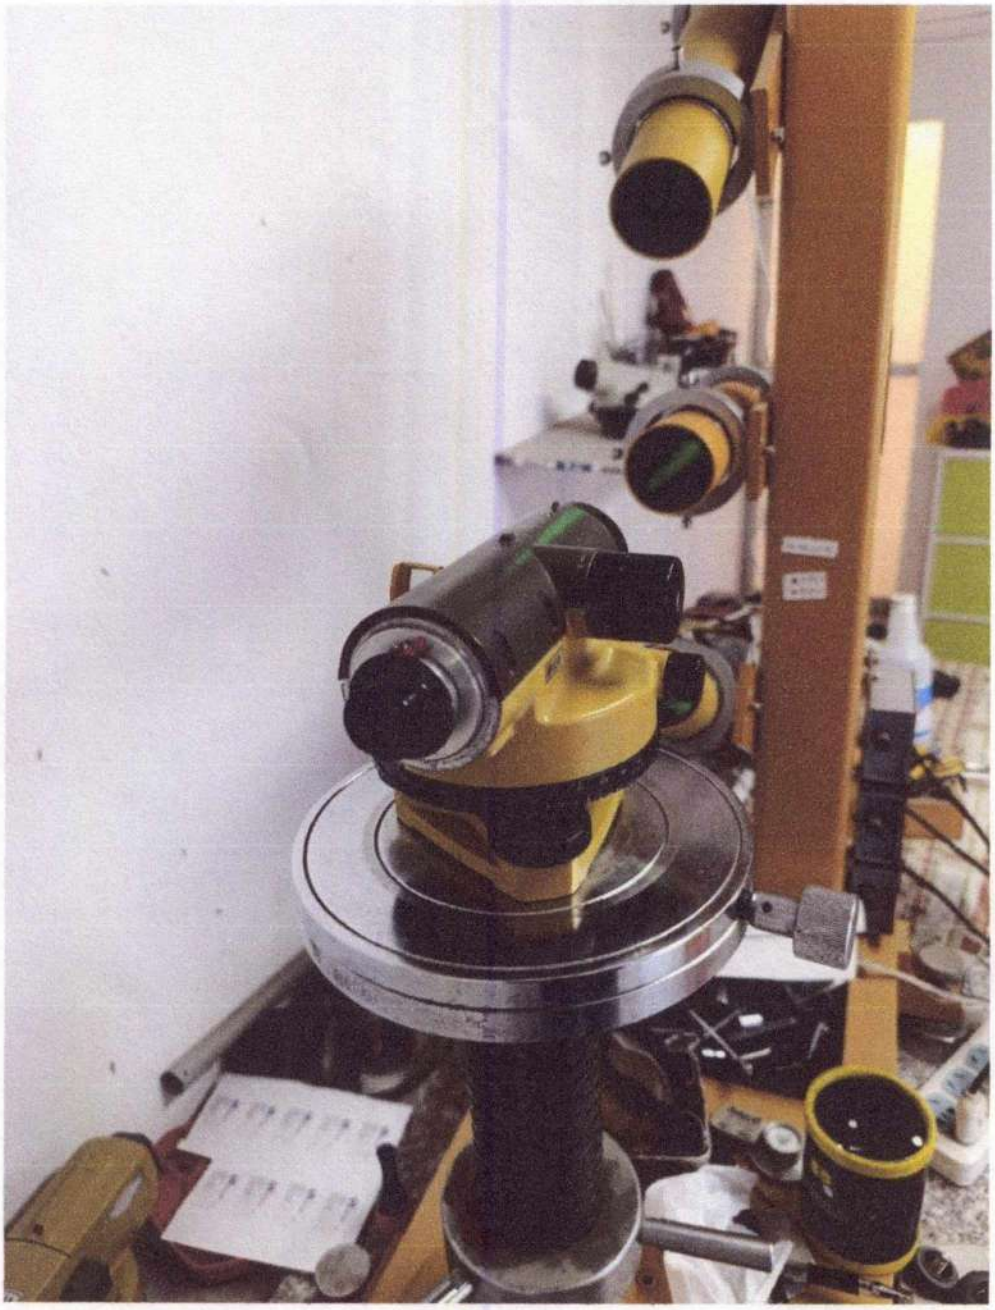

**VENTA, CALIBRACIÓN, REPARACIÓN Y ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS**
Cll. 11 Nº 3-16 B. San Luis, Cúcuta, Norte de Santander
3165262987/ 3115933424 5763721
equitocol.ingenieria@hotmail.com

# 15. BITACORA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

# BITACORA DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA N°: RE-SGRD-0185-2024
DEL 30 AGOSTO DEL 2024

CONTRATISTA: IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
NIT: 901.266.624-8.

REP. LEGAL: IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
CC: 88.279.624.

OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER.
OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO: 001287 DEL 06 JUNIO DEL 2024.

PLAZO EJECUCION: 4 MESES
ACTA INICIO: 10 SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACION INICIAL: 10 ENERO 2025.

NOMBRE: ING. LUIS EDUARDO BLANCO.
RESIDENTE OBRA.

NOMBRE:
SUPERVISION.

MARTES 10 SEPTIEMBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES DIARIAS, NOS DESPLAZAMOS A CUCUTILLA EN COMPAÑIA EQUIPO DE TOPOGRAFIA, TAMBIEN SE DESPLAZA AL SITIO DE OBRA EL PDTE J.A.C LEREDA (QUIEN ABITO BAJO).

PERSONAL EN OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- MAESTRO (1)
- OFICIALES (3)
- SST (1)
- ALMACENISTA (1)
- AYUDANTES (8)
- TOPOGRAFO (1)

- ESTACION TOTAL
- NIVEL
- BASTONES + PRISMAS
- MIRA.
- PORTA ESTACAS
- MACHETES
- ESTACAS - MIRA

MATERIALES:
- CINTA SEÑALIZACION
- MASETA - USTONES
- PUNTILLA

ACTIVIDADES:
- SE REALIZO REPLANTEO Y LOCALIZACION, IMPLANTANDO DISEÑO EN TERRENO.
- SE REALIZO EVALUACION DE CONDICIONES ACTUALES DE LA PUENTE PARA INICIAR ACTIVIDAD DE MANEJO DE AGUAS
- EN RECORRIDO DE TRAMO CADENERO: TRAMO DE DRAGADO DE CAUCE.

SIN NOVEDAD PARTICULAR SE CULMINARON ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 11 SEPTIEMBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DIARIAS

PERSONAL DE OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- TOPOGRAFO (1)

- EXCAVACION TOTAL MASIVA
- NIVEL PRESICION TOPCON
- BASTONES - PRISMAS - MIRA
- MOTOBOMBA
- HINCHA MEMORIAM
- EXCAVADORA 320 - D. CATERPILLAR (1)

MATERIALES:

- MADERA - PUNTILLAS
- ACPM - TUBERIA

- CUÑA
- SOLEADO
- (1)

ACTIVIDADES:

- DRAGADO AGUAS ARRIBA
- MANEJO AGUAS
- EXCAVACION MECANICA.
- REPLANTEO Y LOCALIZACION
- PMT. (PARE - SIGA)
- SEÑALIZACION
- ADECUACION CAMPAMENTO
- ADECUACION PATIO DESCARGUE
- ADECUACION BAÑOS
- ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL
- SUMINISTRO AGUA
- LIMPIEZA - ROCERIA.

SIENDO PARTICULAR SE CULMINARON LAS ACTIVIDADES DIARIAS 5:00 P.M.

RESIDENTE DE OBRA

JUEVES . 12 SEPTIEMBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES DIARIAS.

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST. (1)
- TOPOGRAFO (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- ALMACENISTA (1)

MATERIALES:
- ACPM - TUBERIA.
- MADERA - CINTA
- PUNTILLAS - AEROSOL.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS.
- DRAGADO AGUAS ARRIBA.
- REPLANTEO Y LOCALIZACION
- LIMPIEZA CAMPAMENTO
- ADECUACION CAMPAMENTO
- SEÑALIZACION OBRA.
- PTT. (PARE - SIGA)
- SEÑALES VERTICALES
- CERRAMIENTO PROVISIONAL
- SUMINISTRO AGUA
- CHARLA SST.

SIENDO LA PARTICULAR SE CULMINARON ACTIVIDADES DIARIAS A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

VIERNES 13 SEPTIEMBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES.

PERSONAL OBRA.

- ING. RESIDENTE (1.)
- SST (1)
- TOPOGRAFO (1)
- MAESTRO (1/2 OF) (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR EXCAVADORA (1.)

MATERIALES:

- ACPM
- MADERA - PUNTILLAS.
- CINTA SEÑALIZACION.

ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ARRIBA.
- REPLANTEO Y LOCALIZACION
- PTAR. (PARE - SIGA)
- LIMPIEZA CAMPAMENTO
- ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL
- SUMINISTRO AGUA. PROVISIONAL
- AMPLIACION BATEA SANITARIA.

HOY VEMOS

(1) EXCAVADORA 320 D- CA-
- ESTACION TOTAL SOKIA.
- NIVEL TOPICON
- H Y E MENOR.
- (1) MOTOBOMBA
- (1) BASTONES PARA - MIRA

CLIMA:

- SOLEADO

SIENDO LAS 5:00 PM TERMINAMOS ACTIVIDADES DIARIAS.

RESIDENTE DE OBRA.

SABADO 14 SEPTIEMBRE 2024

SIENDO LAS 9:00 AM. SE INICIARON ACTIVIDADES.

PERSONAL OBRA.

- ING. RESIDENTE (1).
- SST (1)
- MAESTRO C/MAC (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR EXCAVADORA (1)

MATERIALES:

- ACPM:
- COSTALES

ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- BOMBEO AGUAS ALMACENAMIENTO
- PETAR (PARE-SIGA)
- PLANEACION CORTE Y EXCAVACION MECANICA.
- CARGUE Y RETIRO.
- CHARLA SST.

SIN OTRO PARTICULAR SE COLOCAN. ACTIVIDADES DIARIAS

RESIDENTE OBRA.

(1) EXCAVADORA 320 D. CAT.
- MOTOBOMBA
(1) H. MENOR.
(1)
(1)
(8)
(5)

CLIMA:
SOLEADO.

LUNES 16 SEPTIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- ALMACENERO (1)
- OPERADOR EXCAVADORA (1)
- MAESTRO C/MAC (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- CONDUCTOR VOLQUETA (2)

MATERIALES:
- ACPM
- COSTALES

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ARRIBA
- EXCAVACION MECANICA
- PTTO. (PALEOLICA)
- CARGUE Y RETIRO.
- JARILLON.
- CHARLA SST.

SIN OTRO PARTICULAR DE COLABORACION ACTIVIDADES DIARIAS A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

MARTES 17 SEPTIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES.

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- ALMACENISTA (1)
- MAESTRO C/MAY (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- OPERADOR EXCAVADORA (1)
- VOLQUETEROS (2)

ASIGNADOS:
(1) EXCAVADORA 320 D-CAT
- VOLQUETA (BJ-231)
(1) VOLQUETA SAC-179.
- (MOTOBOMBA)
(1) HERRAMIENTA MENOR
(8) CUADRILLA
(1) MATERIAL AGREGADO
(2) CONSTRUCCION

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- BOMBEO AGUAS ARRIBA
- EXCAVACION MECANICA
- RELLENO
- CARGUE Y RETIRO
- PMT. (PARE Y SIGA)

CLIMA:
- SOLEADO
- NUBLADO
- LLUVIA
- MIXTO

- SE RECIBIO LA VISITA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL: RODRIGO HERNANDEZ PARADA PAEZ, EN COMPAÑIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL, GESTION DEL RIESGO MUNICIPAL Y DEMAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, DONDE QUEDARON MUY SATISFECHOS POR LOS AVANCES Y EJECUCION DE ESTA.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINARON ACTIVIDADES LABORALES A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

# MARTES 17 SEPTIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES.

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- ALMACENISTA (1)
- MAESTRO C/MAT (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- OPERADOR EXCAVADORA (1)
- VOLQUETEROS (2)

H Y E:
(1) - EXCAVADORA 320 D-CAT
- VOLQUETA IBJ-231
(1) - VOLQUETA SAC-179.
- MOTOBOMBA.-
(1) H Y E MENOR

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ARRIBA
- EXCAVACION MECANICA
- JARILLON
- CARGUE Y RETIRO
- PMT. (AMAE Y SIGA)

CUMA:
- SOLEADO.

- SE RECIBIO LA VISITA DEL SR. ALCALDE ELECTO: RODRIGO HERNANDEZ ARRADA PAE+, EN COMPAÑIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL, GESTION DEL RIESGO MUNICIPAL Y DEMAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, DONDE QUEDARON MUY SATISFECHOS POR LOS AVANCES Y LA EJECUCION DE ESTA.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINARON ACTIVIDADES LABORALES A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OOMA.

MIERCOLES 18 SEPTIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 NO SE INICIARON ACTIVIDADES.

PERSONAL OBRA
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO G/RAL (1)
- OFICIALES (3).
- ALMACENISTA (1)
- AYUDANTES (8)
- OPERADOR EXCAVADORA (1)
- VOLQUETEROS (2)

H Y E.
- EXCAVADORA 320D - CAT
- VOLQUETA (BJ-231)
- VOLQUETA SAC-179.
- CAMIX
- MEZCLADORA.
- VIBRADOR CONCRETO.
- MOTOBOMBA

MATERIALES:
- CEMENTO
- ARENA
- TRITURADO
- ACPM.

CIMA:
- SOCEADO.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ARRIBA
- EXCAVACION MECANICA + CARGUE Y RETIRO
- JARILLON
- PILOTE
- SE RECIBEN 200 BOLSOS CEMENTO ARIS. (ARTOS - 42.5 KG). REM. #589596.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINARON ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

# JUEVES 19 SEPTIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIARON ACTIVIDADES:

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST. (1)
- MAESTRO E/M (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (2)
- OPERADOR EXCAVADORA (1)
- VOLQUETEROS (2)
- ALBAÑIL (1).

H Y E:
(1) - EXCAVADORA
- VOLQUETA IBJ-231
(1) - VOLQUETA SAC-179.
- MOTOBOMBA.

MATERIALES:
- ACPM.
- CINTA SEÑALIZACION.
- COSTALES.

CLIMA:
- SOLEADO.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- ENTIBADO AGUAS ARRIBA.
- EXCAVACION MECANICA. - CARGUE Y RETIRO.
- DEMOLICION
- PMT.
- CHARLA SST.

SIN NOVEDAD PARTICULAR. SE CULMINARON ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

VIERNES 20 SEPTIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIARON ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO GENERAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- OPERADOR EXCAVADORA (1)
- VOLQUETEROS (2)
- ALMACENISTA (1).

H Y E:
- EXCAVADORA 320D-CAT
- VOLQUETA IBJ-231
- VOLQUETA SAC-179.
- MOTOBOMBA.

MATERIALES:
- ACPM.
- COSTALES
- TRITURADO (10M3 - 8 M3) HI 151769 - 151768.

CLIMA:
- SOLEADO.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ABAJO
- EXCAVACION MECANICA - CARGUE Y RETIRO
- DANILON
- PMT.
- CHARLA SST.

SIN NOVEDAD PARTICULAR SE CULMINARON ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

SABADO 21 SEPTIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIARON ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO E/LAC (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR EXCAVADORA (1)
- VOLQUETEROS (2)

H Y E:
- EXCAVADORA 320 D-CAT.
- VOLQUETA IBJ-231
- VOLQUETA JAC-H79.
- MOTOBOMBA.

MATERIALES:
- ACPM
- COSTALES
-

CLIMA:
- LLUVIAS MODERADAS EN LA MAÑANA.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ARRIBA
- EXCAVACION MECANICA. - CARGUE Y RETIRO.
- VAMILLON.
- JMT
- SE RECIBEN 150 BULTOS CEMENTO GRIS (ARGOS - BLS 24). REM. # 592430.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINARON ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM

RESIDENTE OBRA

LUNES 23 SEPTIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES.

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO OBRA (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- ALMACENISTA (1)

MATERIALES:
- ACPM
- COSTALES
- ARENA (10 M³. - 8 M³)

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ABAJO
- EXCAVACION MECANICA. - CARGUE Y RETIRO.
- JARILLON
- PMT
- CHARLA SST.

HYE:
- EXCAVADORA 320 D - CAT
- VOLQUETAS TBJ-231
- VOLQUETA SAC-179
- MOTOBOMBA
- RETROEXCAVADORA

CLIMA:
- SOLEADO

H: 151777 - 151778

SIN NOVEDAD PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

MARTES 24 SEPTIEMBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO CIVIL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- ALBAÑIL (1)
- OPERADOR EXCAVADORAS (2)
- OPERADOR RETRO (1)
- VOLQUETEROS (2)

HYE:
- EXCAVADORA 320D-CAT.
- RETROEXCAVADORA
- VOLQUETA 1BJ-231
- VOLQUETA JAC-179.
- MOTOBOMBA.

ACTIVIDADES:
- MANTEO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ABAJO
- EXCAVACION MECANICA.
- CARGUE Y RETIRO
- JANILLON
- PMT.

MATERIALES:
- COSTALES
- ACPM.

CLIMA:
- SOLEADO
- LLUVIAS MODERADAS TARDE

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINARON ACTIVIDADES DE HOY A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

MIERCOLES 25 SEPTIEMBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL DE OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO E/MAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADORES (2) - VOLQUETEROS (2)

MATERIALES:
- ACPM
- COSTALES.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ABAJO
- EXCAVACION MECANICA
- CARGUE Y RETIRO
- JARILLON
- PMT.
- CHARLA SST.

HYE:
- EXCAVADORA 320 D - CAT
- RETRO EXCAVADORA
- VOLQUETA (BJ-23)
- VOLQUETA YAS-612
- MOTOBOMBA.

CLIMA:
- SOLEADO.

SIN OTRO PARTICULAR SE DESPIDEN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

JUEVES 26 SEPTIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES.

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST. (1)
- MAESTRO GENERAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADORES (2)
- VOLQUETEROS (2)

HAY:
- EXCAVADORA 320 D - CAT
- RETROEXCAVADORA.
- VOLQUETA 1BJ - 231
- VOLQUETA VAC-412
- MOTOBOMBA.

MATERIALES:
- ACPM
- COSTALES

CLIMA:
- SOLEADO.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ABAJO
- EXCAVACION MECANICA
- CARGUE Y RETIRO
- JARILLON.
- PMT.

SIN NOVEDAD PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM

RESIDENTE OBRA

VIERNES 27 SEPTIEMBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/LA (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADORES (2)
- VULCANIZADOR (2)

H Y E:
- EXCAVADORA 320 D - CAT
- RETRO EXCAVADORA
- VOLQUETA IBJ-231.
- VOLQUETA VAC-612
- MOTOBOMBA.

MATERIALES:
- ACPM
- POSTALES
- MANGUERA.

CLIMA:
- LUVAS MODERADAS AM.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ABAJO
- EXCAVACION MECANICA.
- CARGUE Y RETIRO
- JARILLON
- PMT.
- CHARLA SST.

SIN NOVEDAD SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

# SABADO 28 SEPTIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO S/MAL (1)
- OFICIALES (3)
- ALMACENISTA (1)
- AYUDANTES (8)
- OPERADORES (2)
- VOLQUITEROS (2)

H Y E:
- EXCAVADORA 320D-CAT.
- RETROEXCAVADORA
- VOLQUETA 16J-23J
- VOLQUETA VAC-612
- MOTOBOMBA.

MATERIALES:
- ACPM
- COSTALES

CLIMA:
- SOLEADO.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- EXCAVACION MECANICA
- CARGUE Y RETIRO
- DRAGADO AGUAS ABAJO
- JAMILLON
- PMT.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:0 PM

RESIDENTE OBRA

LUNES 30 SEPTIEMBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES.

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO GENERAL (1)
- OFICIALES (3)
- ALBAÑILERIA (1)
- AYUDANTES (10)
- OPERADORES (2)
- VOLQUETEROS (2)

H Y E:
- EXCAVADORA 320 D CAT
- RETROEXCAVADORA
- VOLQUETA 183-231
- VOLQUETA VAC-612
- MOTOBOMBA.

MATERIALES:
- ACPM
- COSTALES
- ARENA (10 M³) N= 151811

CLIMA:
- SOLEADO.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- EXCAVACION MECANICA.
- CARGUE Y RETIRO
- DRAGADO AGUAS ABAJO
- JAMILLON
- PMT.
- CHARLA SST.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM

RESIDENTE OBRA.

MARTES 01 OCTUBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIARON ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST. (1)
- MAESTRO G/RAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- OPERADORES (1)
- VOLQUETEROS (2)
- ALMACENISTA (1)

H Y E:
- EXCAVADORA 320D-CAT.
- VOLQUETA IBJ-231
- VOLQUETA VAC-612
- MOTOBOMBA.

MATERIALES:
- ACPM
- COSTALES
- ARENA (8 m³) M=151813

CLIMA
- LLUVIAS MODERADAS DURANTE LA TARDE (2 PM - 4 PM)

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ABAJO
- EXCAVACION MECANICA
- CARGUE Y RETIRO
- CAMION.
- PMT

SIN OTRO PARTICULAR SE CUMPLEN ACTIVIDADES DE 6AM A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

MIERCOLES 02 OCTUBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO G/NAL.
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALBAÑIL (1)
- OPERADOR (1)
- VOLQUETEROS (2)

H Y E:
- EXCAVADORA 320D - CAT
- VOLQUETA JBJ - 231
- VOLQUETA VAC - 612.
- MOTOBOMBA.
- VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA).

MATERIALES:
- ACPM.
- COSTALES
- ARENA (10 M3) M: 151824
- PIEDRA (14 M3) SR: JOSE LUIS ACEVEDO.
- TRITURADO (8 M3) M: 151817

CLIMA:
- SOLEADO

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ABAJO
- CARGUE Y RETIRO
- JARILLON
- REPLANTEO ZANJAS (COLECTOR - PANDORA)
- PMT.
- CHARLA S.S.T.
- EXCAVACION MECANICA.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

JUEVES 03 OCTUBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIARON ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1).
- SST. (1)
- MAESTRO E/AM (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- VOLQUETEROS (2)
- OPERADORES (1)

HOY:
- EXCAVADORA 320 D - CAT.
- VOLQUETA YBJ-231
- VOLQUETA VAC-612
- MOTOBOMBA.
- RETROEXCAVADORA (1 BALDE)
- CAMMIX (7 M3)

MATERIALES:
- ACPM - ARENA - AGUA.
- COSTALES - TRITURADO - PIEDRA.
- GASOLINA - CEMENTO

CLIMA:
- LLUVIAS MODERADAS MAÑANA (8 AM - 10 AM).

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ABAJO
- EXCAVACION MECANICA
- CARGUE Y RETIRO
- VACIADO
- VACIADO CONCRETO CICLOPEO ZAPATA PAMPLONA (TOMA MUESTRAS).
- VACIADO CONCRETO CICLOPEO ZAPATA COCUYUCA (TOMA MUESTRAS)

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

# VIERNES 04 OCTUBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO CIVIL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR (1)
- VOLQUETEROS (2)

## H Y E:

- EXCAVADORA 320 D-CAT.
- VOLQUETA (BJ-23)
- VOLQUETA VAC-612
- MOTOBOMBA.
- VIBRO MANUAL (RANA)
- EXCAVADORA 320 D-CAT

## MATERIALES:

- ARENA (10 m³) HISABY
- ACPM
- LOSTALES
- ACERO FIGURADO. - ALAMBRE

## CLIMA:

- SOLEADO.

## ACTIVIDADES:

- MANTSO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ARRIBA
- JARILLON
- REPLANTEO ZARPA CUCHILLA - PANTALLA.
- ACERO ZARPA CUCHILLA - PANTALLA.
- PTCT.
- CHARLA SST.

SIN NOVEDAD PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 3:00 PM.

RESIDENTE OBRA

# JABADO 05 OCTUBLE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/IAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALBAÑIL (1)
- VOLQUETEROS (2)
- OPERADORES (1)

## MAQ Y E:

- EXCAVADORA 320 D-CAT
- VOLQUETA JBJ-231
- VOLQUETA VAC-612
- MOTOBOMBA.
- TRONZADORA
- PULIDORA.
- EXCAVADORA 320 D-CAT

## MATERIALES:

- ACERO FIGURADO
- ALAMBRE
- ACPM.
- COSTALES

## CLIMA:

- SOLEADO.

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS ABAJO
- CARGUE Y RETIRO
- CAMION.
- ACERO ZAPATAS
- PMT.
- EXCAVACION MECANICA.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DE DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

LUNES 07 OCTUBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/MAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- ELECTRICISTA (1)
- OPERADOR (1)

H Y E:
- MOTOBOMBA.
- TRONTADORA
- PULIDORA.
- H Y E MENOR.
- VOLQUETA IBJ-23
- VOLQUETA VAC-612.
- EXCAVADORA 320 D-CAT

MATERIALES:
- ACERO FIGURADO
- ALAMBRE.
- ACPM.
- COSTALES

CIMA:
- SOLEADO.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- JARILLON.
- ACERO ZAPATAS
- CHAMA SST.
- PMT.
-

- DRAGADO AGUAS ABAJO
- CARGUE Y RETIRO.
- JARILLON
- EXCAVACION MECANICA

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

ING. RESIDENTE.

MARTES 08 OCTUBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1).
- SST. (1)
- MAESTRO E/M (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR (1)

MATERIALES:
- ACERO FIGURADO
- ALAMBRE
- ACPM.
- TRITURADO (20 M3) MF-151865

HYE:
- MOTOBOMBA.
- TRONZADORA.
- PULIDORA
- H y E MENOR
- VOLQUETA IBJ-231
- VOLQUETA VAC-612.
- EXCAVADORA 320 D-CAT.

CLIMA:
- LLUVIAS MODERADAS EN HORAS TARDE (1 PM - 3 PM)

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- ACERO TARPAS
- PMT.
- DRAGADO AGUAS ABAJO
- CARGUE Y RETIRO.
- EXCAVACION MECANICA.
- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RETROEXCAVADORA Y CAMION, MEDIDAS DE ORGANIZAR LOGISTICA PARA VACIADO DE TARPAS.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

MIERCOLES 09 OCTUBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES:

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST. (1)
- MAESTRO E/LA (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR (1)

H Y E:
- MOTOBOMBA
- TRONZADORA
- PULIDORA
- H Y F MECOL.
- VOLQUETA IBJ-231
- VOLQUETA VAC 612
- EXCAVADORA 320 D - CAT

MATERIALES:
- ACPM.
- ACERO FIGURADO
- ALAMBRE
- TRITURADO (8 M³) N: 151867
- ARENA (10 M³) N: 151869

CLIMA:
- SOLEADO.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- ACERO ZAPATAS
- P.M.T.
- CHARLA SST.
- DRAGADO MECAS ABAD
- CARGUE Y RETIRO.
- JARILLON
- EXCAVACION MECANICA

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DIARIAS A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBLA.

JUEVES 10 OCTUBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA
- ING. RESIDENTE (1)
- SST. (1)
- MAESTRO 4/LAT (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR (1)

HYE.
- MOTOBOMBA
- TRONZADORA
- PULIDORA.
- H Y E. MENOR.
- VOLQUETA IBJ-231
- VOLQUETA VAC-612.
- EXCAVADORA 320 D CAT.

MATERIALES:
- ACPM
- ACERO FIGURADO
- ALAMBRE
- TRITURADO (10 M³) H=151874
- ARENA (8 M³) H=151873
- COSTALES

CIMA:
- DOCEADO
- SE RECIBEN 200 BULTOS CEMENTO GRIS (ARCOS 42.5 KG). REM.: #593879.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- ACERO ZAPATAS
- PMT.
- DRAGADO AGUAS ABAJO
- CARGUE Y RETIRO.
- JARILLON

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

VIERNES 11 OCTUBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES.

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST. (1)
- MAESTRO GRAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR (1).

MATERIALES:
- ACPM.
- ACERO FIGURADO
- ALAMBRE
- ARENA (8 m³) H: 151025
- COSTALES

H Y E:
- MOTOBOMBA
- TRONPADORA
- PLANCHA
- H y E MENOR.
- VOLQUETA 183-281.
- VOLQUETA VAC-612.
- EXCAVADORA 320 D-CAT.

CLIMA:
- LLUVIAS MODERADAS A FUERTES TARDE (2 PM - 4 PM)

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- ACERO ZAPATAS.
- PMT
- CHARLA SEGURIDAD
- DRAGADO AGUAS
- CARGUE Y RETIRO.
- JARILLON
- EXCAVACION MECANICA

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

SABADO 12 OCTUBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1.)
- SST (1)
- MAESTRO GRAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR (1)

H Y E:
- MOTOBOMBA
- TRONZADORA
- PULIDORA
- H Y E MENOR.
- VOLQUETA. IBJ-231
- VOLQUETA NAC-612.
- EXCAVADORA 320 D-CAT.

MATERIALES:
- ACPM
- ACERO FIGURADO
- ALAMBRE
- FORMALETA (TABLEROS, CERCHAS, PARALES)
- COSTALES

CLIMA:
- SOLEADO.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- ACERO ZAPATAS
- ENCOFRADO ZAPATA.
- PMT.
- DRAGADO MEJIAS
- CARGUE Y RETIRO.
- JAMILLON.
- EXCAVACION MECANICA.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DE DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

LUNES 14 OCTUBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES.

PERSONAL OBRA

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO E/MT (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- TOPOGRAFO (1)

MATERIALES

- ACPM.
- ACERO FIGURADO
- ALAMBRE
- FORMALETA.
- PUNTICIAS ACERO
- AEROSOL.
- CINTA SEÑALIZACION.

H Y E.

- MOTOBOMBA
- TRONZADORA
- BUILDOZA.
- H Y E VARIOS.
- ESTACION TOTAL SOKIA
- NIVEL MAESISICON TOPCOM
- BASTONES - PRISMAS - TRIPA.

CLIMA:

- SOLEADO.

- SE RECIBEN 200 BULTOS CEMENTO GRIS (ARGOS 42.5 KG) REMISION # 594355

ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- EXCAVACION MECANICA
- RECTIFICACION Y REPLANTEO DE ZAPATAS
- VERIFICACION DE BH. (2)
- CHEQUEO DE ALTIMETRIA.
- MANTENIMIENTO MEZCLADORA
- MANTENIMIENTO CALHIX.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

MARTES 15 OCTUBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO E/N-L (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)

H Y E
- MOTOBOMBA.
- TACHADORA
- PULIDORA.
- H Y E MEJOR.
- VOLQUETA IBJ-231
- VOLQUETA VAC-612.

MATERIALES:
- ACPM.
- MANGUERA.
- ARENA (10 M³) H° 151898.
- TRITURADO (18 M³) H° 151887 - 151886
- FORMALETA (TABLEROS, CUCHAS, BARRES)

CLIMA:
- LLUVIAS MODERADAS EN LA MAÑANA (8:00 AM - 10:00 AM)

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- ENCOFRADO ZARPA
- PMT.
- CHARLA SST.
- DRAGADO AGUAS
- CARGUE Y RETIRO.

- SE RECIBEN 200 BULTOS CEMENTO GRIS (ANGOS 42.5 KG) REMISION # S94797.

SIN OTRO PARTICULAR SE DESPIDEN ACENTUADOS DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

MIERCOLES 16 OCTUBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1).
- SST (1)
- MAESTRO E/CAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALBAÑIL (1)
- OPERADOR (1)

H Y E:

- MOTOBOMBA
- MEZCLADORA
- CAMION
- MOLDAJE CONCRETO
- EXCAVADORA 320-D-CAT.
- VOLQUETA TBS-231
- VOLQUETA VAC-612

MATERIALES:

- ACPM
- ARENA (8 m³) H:151894
- TRITURADO (10 m³) H:151896
- CEMENTO.
- COSTALES

CLIMA:

- SOLEADO AM
- NUBLADO PM.

ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS
- CARGUE Y RETIRO
- VACIADO CONCRETO ZAPATA PRINCIPAL (CTO 4000 PSI)
- CHARLA SST.
- PMT.
- JARILLON.
- ACERO REFUERZO.
- EXCAVACION MECANICA

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

# JUEVES 17 OCTUBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES.

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO G/RAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR (1)

## H Y E:

- MOTOBOMBA
- EXCAVADORA 320 D-CAT
- VOLQUETA IBJ-231
- VOLQUETA VAC-612

## MATERIALES:

- ACPM
- ARENA (10 m³) H: 151902
- TRITURADO (8 m³) H: 151901
- COSTALES

## CLIMA:

- SOLEADO AM
- NUBLADO PM

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS
- CAMIÓN:
- AGUA CURADO PARA CONCRETO ZARPA PANDORA.
- CARGUE Y RETIRO.
- SST.

- SE RECIBEN 300 BULTOS CEMENTO GRIS (CARGOS 425 KG)
- PEDIDO # 895098

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

VIERNES 18 OCTUBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES:

PERSONAL OBRA

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/CIV (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR (1)

H Y E.

- MOTOBOMBA
- MEZCLADORA
- CAMION
- VIBRADOR CONCRETO
- VOLQUETA IBJ-231
- VOLQUETA VAC-612
- EXCAVADORA 320D-CAT

MATERIALES:

- ACPM
- TRITURADO (10 m³) M:151910
- COSTALES
- ACERO Y ALAMBRE

CLIMA

- LLUVIAS MODERADAS EN LA MAÑANA (9 AM - 11 AM)

ACTIVIDADES:

- BANQUEO AGUAS
- DRAGADO AGUAS
- CARGUE Y RETIRO
- PMT.
- VACIADO CONCRETO 3000PSI CUCHILLA (CTO 4000 PSI).
- SE RECIBE REMISION N° 37765 (FORMALETA NORIEGA SAS).

- JAMILTON
- CHARLA SST.
- ACERO FIGURADO.
- EXCAVACION MECANICA

SIN OTRO PARTICULAR SE CIERRAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA:

SABADO 19 OCTUBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO G/AM (1).
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA
- OPERADOR (1)

H Y E.
- MOTOBOMBA
- EXCAVADORA 320 D- CAT
- VOLQUETA TBJ-231
- VOLQUETA VAC-612.
- H Y E MENOR.
- FRONTALOMA
- DUMPER.

MATERIALES
- ACPM.
- COSTALES
- AGUA.
- ACERO FIGURADO - ALAMBRE

CLIMA:
- SOLEADO AM
- NUBLADO PM.
LLUVIAS MODERADAS EN LA TARDE (1 PM - 4 PM)

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- VOLQUETA
- DRAGADO
- CARGUE Y RETIRO
- CARGA SST.
- PMT.
- EXCAVACION MECANICA
- AGUA CUADO CONCRETO ZAMPA CUNETA.
- ACERO REFUERZO.

SIN OVO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

LUNES 21 OCTUBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO E/M (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR (1)

H Y E:
- EXCAVADORA 320 D - CAT
- MOTOBOMBA
- VOLQUETA IBJ-231
- VOLQUETA VAC-612
- H Y E MENOR
- TRONZADORA
- PULIDORA

MATERIALES:
- ACPM
- COSTALES
- AGUA.
- ACAMBLE + ACERO FIGURADO

CLIMA:
- SOLEADO AM
- NUBLADO PM

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- BLAQUEO AGUAS
- CARGUE Y RETIRO
- DESMONTAJE ZAPATAS
- PMT.
- JARILLON.
- OBRA FALSA (EXCAVACION ZAPATAS)
- ACERO REFUERZO.
- EXCAVACION MECANICA

SIENDO LAS 5:00 PM SE FINALIZAN ACTIVIDADES DEL DIA SIN OTRO PARTICULAR

RESIDENTE OBRA

MARTES 22 OCTUBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES DIARIAS.

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/M (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR (1)

HYE:
- MOTOBOMBA
- EXCAVADORA 320 D-CAT.
- VOLQUETA IBJ-231
- VOLQUETA VAC-612
- H Y E. MENOR
- FORMALETA.
- PULIDORA.

MATERIALES:
- ACPM.
- CONCRETO (10 M3) H=15/35
- MADERA.

CLIMA:
- LLUVIAS MODERADAS EN HORAS TARDE (1:00 PM - 4:00 PM)

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- DRAGADO AGUAS
- JAMILON
- CARGUE Y RETIRO
- ENCOFRADO H/2 ESTRIBO Y ALETAS PARA PANTALLA
- OBRA FALSA (EXCAVACION MANUAL)
- CHARLA SST.
- PMT.
- EXCAVACION MECANICA.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

MIERCOLES 23 OCTUBRE 2024:

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES.

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO E/MAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR (1)

H Y E:
- MOTOBOMBA
- EXCAVADORA 320 D-CAT
- VOLQUETA IBS-231
- VOLQUETA VAC-612
- FORMALETA
- TRONZADORA
- PULIDORA

MATERIALES:
- ACPM
- ARENA (10 M³) H-151942
- COSTALES

CLIMA:
- SOLEADO AM
- NUBLADO PM.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- BRAGADO
- CARGUE Y RETIRO
- CAMION
- OBRA FALSA (EXCAVACION TAPADAS)
- PMT.
- ENCOFRADO H/2 ESTRIBO Y ALETAS ZAPATA PANTALLA
- MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y CAMION.
- EXCAVACION MECANICA
- ACERO REFUERZO.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

# JUEVES 24 OCTUBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES.

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO E/NAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR

## H Y E:

- MOTOBOMBA
- EXCAVADORA 320 D CAT
- VOLQUETA IBJ-231
- VOLQUETA VAC-612
- H Y E MENOR
- FORMALETA.
- VIBRADOR CONCRETO.

## MATERIALES:

- ACPM
- COSTALES
- ACERO FIGURADO
- ALAMBRE

## CLIMA:

- SOLEADO AM.
- NUBLADO PM
- LLUVIAS MODERADAS. EN HORAS TARDE: (1:00 PM - 3:00 PM)

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- DRAGADO
- EXCAVACION MECANICA
- CARGUE Y RETIRO
- ACERO REFUERZO
- ENCOFRADO H/2 ESTRIBO Y ALETAS. ZAPATA. PANTALLA.
- VACIADO CONCRETO ESTRIBO Y ALETAS (CONCRETO 4000 PSI).
- JARILLON
- OBRA FALSA (EXCAVACION RAMPAS)

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 6:00 PM

RESIDENTE OBRA.

# VIERNES 25 OCTUBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/NA (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR (1)

## MAYE:

- MOTOBOMBA
- EXCAVADORA 320 D - CAT
- VOLQUETA IBJ-231
- VOLQUETA VAC-612

## MATERIALES:

- ACPM
- COSTALES
- ACERO FIGURADO
- ALAMBRE

## CLIMA:

LLUVIAS MODERADAS EN HORAS MAÑANA (9:00 AM - 11:00 AM)

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- DRAGADO
- EXCAVACION MECANICA
- CARGUE Y RETIRO
- JARILLON
- OBRA FALSA (EXCAVACION MANUAL)
- ACERO REFUERZO
- PMT

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINARON ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM

RESIDENTE OBRA

# SABADO 26 OCTUBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/NAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR (1)

## H Y E:

- EXCAVADORA 320 D-CAT
- MOTOBOMBA
- VOLQUETA IBJ-231
- VOLQUETA VAC-612

## MATERIALES:

- ACPM
- COSTALES
- ACERO FIGURADO
- ALAMBRE

## CLIMA:

- SOLEADO AM
- LLUVIAS MODERADAS CON RAFAGAS TARDE (1:00 PM - 4 PM)

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- DRAGADO
- EXCAVACION MECANICA
- CARGUE Y RETIRO
- SALLEJON
- OBRA FALSA (EXCAV. ZAPATAS)
- ACERO REFORZADO
- PMT.
- CHARLA SST.

SIN OTRO PARTICULAR SE COLOCAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

LUNES 28 OCTUBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES.

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/MAR (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)

HOY:
- MOTOBOMBA.
- FORMALETA.
- PANALES
- TABLEROS
- COLCHAS.
- ANDAMIOS
- TALADRO MANUAL

MATERIALES:
- ACPM.
- ARENA
- TRITURADO (8 m3) M-151955
- TRITURADO (10 m3) M-151954
- TUBERIA PERFORACION 6"
- PLATINA 25 x 25 x 1/2"

CLIMA:
- LLUVIAS EN HORAS TARDE (1:00 PM - 5:00 PM)
- TORNILLO SIN FIN 4" (L: 0.50)

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- OBRA FALSA.
- ACERO REFUERZO.
- CHARLA SST.
- PMT.
- DESENCOFRADO FORMALETA PARA PANEL
- ENCOFRADO FORMALETA PARA CUCHILLA PANTALLA.

SIN OTRO PARTICULAR SE COMPLACEN ACTIVIDADES DOC DIA A LAS 5:00 PM

RESIDENTE OBRA

MARTES 29 OCTOBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/LAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)

HYE:
- MOTOBOMBA.
- FORMALETA
- ANDAMIOS
- TRONZADORA
- PULIDORA:
- TALADRO ARBOL.

MATERIALES:
- ACPM
- ARENA (8 M3) H: 151950.
- ARENA (10 M3) H: 151951
- ACERO REFUERZO
- TUBERIA PERFORACION 6"
- PLATINA 25x25 x 1/2"
- TORNILLO SIN FIN 1" (1:050)

CLIMA:
- LLUVIAS FUERTE EN HORAS TARDE (2:00 PM - 4:00 PM)

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- OBRA FALSA.
- ENCOFRADO FORMALETA PARA CUCUTILLA. - PAMPLONA.
- ACERO REFUERZO
- PMT.

- SE RECIBE LA VISITA DEL ING. VILLA-VENA. SECRETARIO DPTO UNGR.

SIN OTRO PARTICULAR DE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

MIERCOLES 30 OCTUBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/MAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)

M Y E:
- MOTOSOLDA
- FORMALETA (1)
- EQUIPO SOLDADURA
- TALADRO MANUAL
- TRONZADORA
- PULIDORA.

MATERIALES:
- ACPM
- TRITURADO (8 m³) N: 151962
- TRITURADO (10 m³) N: 151963
- BLOCAS METALICAS
- TUBERIA REFORMACION 6"
- PLATINA 25x25 x 1/2"
- TORNILLO SIN FIN 1" (1:0.50).

CLIMA:
- LLUVIAS MODERADAS EN HORAS TARDE (1:00 PM - 4:00 PM)

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- OBRA FALSA.
- ENCOFRADO FORMALETA PARA CUCHILLA - PANTALLA.
- ACERO REFUERZO
- CHARLA SST.
- PMT.

SIN OTRO PARTICULAR SE DESPIDEN ATENTAMENTE DEL DIA A LAS 5:00 PM

RESIDENTE OBRA

# JUEVES 31 OCTUBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIARON ACTIVIDADES

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/RA (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)

## H Y E:

- MOTOBOMBA
- FORMALETA
- EQUIPO SOLDADURA
- TROMPADURA
- PULIDORA
- TALADRO ARBOL.

## MATERIALES:

- ACPM.
- ARENA (8 M3) M-151971
- ARENA (10 M3) M-151970
- TUBERIA DENTONACION 6"
- PLATINAS 25x25 x 1/2"
- GRASA
- DUCTOLON 1"

## CLIMA:

- LLUVIAS MODERADAS EN HORAS TARDE (2:00 PM - 5:00 PM)

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- OBRA FALSA.
- ACERO REFUERZO.
- ENFORMADO FORMALETA ZARPA CUCUTILLA. Y PAMPLONA.
- MANTENIMIENTO MEZCLADORA Y CARMIX.
- P.M.T.

- SE RECIBEN 220 BULTOS CEMENTO GRIS (ARGOS 42.5 KG) REMISION # 895443.

SIENDO LAS 5:00 PM SE CULMINANDO ACTIVIDADES DEL DIA SIN OCHO PARTICULAR.

RESIDENTE OBRA

# VIERNES 01 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/MAC (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)

## HYE:

- MOTOBOMBA.
- CARMIX
- MIXCLADORA.
- VIBRADOR CONCRETO.
- GENERADOR ELECTRICO.

## MATERIALES:

- ACPM
- TRITURADO (8 m³) N: 151982
- TRITURADO (10 m³) N: 151974
- TUBERIA PERFORACION 6"

## CLIMA:

- LLUVIAS MODERADAS EN HORAS TARDE (1:00 PM - 3:00 PM)
- LLUVIAS FUERTE EN HORAS NOCHE (10:00 PM - 12:AM).

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- OBRA FALSA.
- ZAPATAS DE OBRA FACHA
- VACIADO CONCRETO ESTRIBO Y ALETAS ZAPATA CONTRA-PANTALLA (CONCRETO 4.000 PSI).
- CHARLA SST.
- PMT.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINARON ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

# SABADO 02 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

## PERSONAL OBRA

- ING. RESIDENTE (1)
- SST. (1)
- MAESTRO GRAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA. (1)

## H.Y.E:

- MOTOBOMBA.
- FORMALETA
- ANDAMIOS
- TRONZADORA
- PULIDORA
- TALADRO ARBOL.

## MATERIALES:

- ACPM.
- TRITURADO (10 $m^3$) N=15/1998
- ARENA (8 $m^3$) N=15/1991
- ACERO FIGURADO

## CLIMA:

- LLUVIAS MODERADAS EN HORAS TARDE (2:00 PM -- 8:00 PM)
- LLUVIAS FUERTES EN HORAS NOCHE (9:00 PM - 1:00 AM).

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- OBRA FALSA.
- PMT.

- EL AUMENTO DEL CAUDAL DE LA QUEBRADA. A CAUSA DE LAS LLUVIAS INTENSAS GENERARON COLAPSO Y DESPLAZAMIENTO AGUAS ABAJO DEL JARILLON (LOS TALES).

SIN OTRO PARTICULAR SE FINALIZAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

LUNES 04 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO ESPECIAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)

H Y E:
- MOTOBOMBA
- ANDAMIOS (1)
- H Y E MENOR
- POLIDORA
- TRONZADORA
- TALADRO MUSOL

MATERIALES:
- ACPM
- TUBERIA PENETRACION 6" EN HOJAS
- PLATINAS 25x25x1/2"
- TORNILLO SIN FIN 1"
- ALAMBRE
- ANGULO 2"x2"x1/4"

CLIMA:
- SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS MAÑANA (9 AM - 11 AM)
- LLUVIAS FUERTES (1:00 PM - 3:00 PM)

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- OBRA FALSA
- LLAMA SST
- PMT.
- CURADO CONCRETO
- RETIRO COSTALES ABRIBADOS POR LAS LLUVIAS

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINACION ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

# MARTES 05 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIARON ACTIVIDADES

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/OBRA (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- SOLDADOR (1)

## H Y E:

- MOTOBOMBA
- ANDAMIOS
- HYE MENOR
- TRONZADORA
- PULIDORA
- EQUIPO SOLDADURA

## MATERIALES:

- ACPM
- TRITURADO (8 M³) N°152000
- PLATINAS 25x25x 1/2"
- TORNILLO SIN FIN 1"
- ALAMBRE

## CLIMA:

- SE PRESENTARON LLUVIAS MODERADAS TARDE (2:00 PM - 4:00 PM)

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- OBRA FALSA
- SOLDADURA ELECTRICA
- REVISION LINEA VISA - ANFS Y ESLINGAS.
- MANTENIMIENTO MEZCLADORA Y CARRIX.
- PMT.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

CONSTRUCTORES S.A.S

# 17. COMITES DE OBRA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 5 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 9 DE Septiembre de 2024 | Hora de inicio: 2:30 PM | Hora de finalización: 3:00 PM |
| Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | |
| Tipo de Reunión: Reunión previa al inicio de obra. Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024 | | Comité Obra No.01 – comité previo al inicio de obra – |

## TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.01

1. Indicaciones de requisitos previos al inicio de obra

## DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 02:30 pm en la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 1 del contrato No. RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024, detallando lo siguiente:

Dando inicio al primer comité de obra en representación de la Secretaria de Gestión del riesgo de desastres: Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra), toma la palabra, dando como primera medida la bienvenida al contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS, quien es representado en el presente comité por el Ing. Imar Orlando Vacca (director de obra).

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 2 de 5 | |

## ACTA DE REUNION

El ingeniero William Vera Arias, indica al contratista que el fin del presente comité, es darle a conocer los requisitos previos al inicio de la obra y las actividades primarias que no solo corresponde a las actividades contractuales de obra, que también corresponden a actividades de orden administrativo que son requisitos para asegurar un correcto arranque del contrato de obra.

Se solicita al contratista que se debe realizar la socialización del proyecto, en esta reunión se debe dar a conocer a la comunidad la información general del contrato, ubicación , objeto contractual es importante que en la reunión se citen las personas pertenecientes a comunidades aledañas a la obra del municipio, se solicita sea realizada y coordinada con la Alcaldía municipal y se debe indicar a la secretaria para la gestión del riesgo de desastres fecha, lugar y hora de dicha reunión, así mismo se deben tomar registro fotográfico, levanta acta y recopilar listado y firmas de los asistentes.

Instalación de la valla, previo al inicio de las actividades constructivas se debe ubicar la valla informativa en la zona de ejecución de la obra, con la información básica de la obra, numero de contrato, objeto, nombre del contratista y nombre de la supervisión del contrato, con el logo de la gobernación y una foto del render del puente.

Es importante tener en cuenta que para dar inicio de obra el personal que allí ejecutará las actividades constructivas debe estar debidamente afiliado al sistema de seguridad social incluyendo, ARL, EPS, fondo de pensiones, caja de compensación y debe contar con su respectiva dotación y EPP´S necesarios.

Se aclara también al contratista que toda situación que se presente durante el desarrollo de la obra debe ser informada a la supervisión del contrato.

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 3 de 5 | |

**ACTA DE REUNION**

El cobro del contrato se realizara mediante actas parciales para lo que deberán entregar los respectivos soportes y carteras topográficas que evidencien las actividades ejecutadas que serán cobradas en cada una de las actas de recibo parcial, igualmente deberán presentar un informe de contratista correspondiente al periodo cobrado en donde describan las actividades relacionadas en el acta, el reporte financiero del contrato, la información general del contrato, el control de garantías y el respectivo registro fotográfico.

Durante el desarrollo de la obra el contratista deberá llevar un libro de bitácora en donde registre día a día las actividades ejecutadas y los sucesos que en ella se presenten durante la jornada laboral.

Previo al inicio de las actividades constructivas propias del puente vehicular se deberá realizar los movimientos de tierra y adecuación del terreno con el ánimo de garantizar el paso provisional de los vehículos por la zona dado que no se puede dejar incomunicado el municipio con los municipios aledaños y con el resto del departamento.

El ingeniero William Vera Arias, pregunta al contratista de obra si tiene alguna duda o requerimiento antes del inicio del contrato, a lo que este responde que todo se encuentra claro y que ya cuenta con la planificación para realizar las actividades previas y el cumplimiento de los requisitos descritos en el presente comité

**COMPROMISOS y CONCLUSIONES**

**COMPROMISO**

**CONTRATISTA**

1. El contratista deberá realizar socialización del contrato, deberá indicar a la supervisión fecha, hora y lugar.
2. Realizar la instalación de la valla informativa del contrato.
3. Previo a iniciar actividades constructivas realizar afiliación de los trabajadores.
4. Una vez realizada la socialización entregar copia del acta levantada en dicho evento.

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 4 de 5 | |

## ACTA DE REUNION

**SUPERVISION DEL CONTRATO**

1. Una vez revisado el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la obra, suscribir acta de inicio


**CONCLUSIONES**

1. Se puede proceder a realizar el inicio de las actividades constructivas de la obra

| ANEXOS SI ( ) NO ( ) | Fecha de aprobación del acta: |
|---|---|

| *Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión* | *Revisó: Ing. William Vera Arias, Secretario SGRD* | *Próxima Reunión: ---* |
|---|---|---|

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:*

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | WILLIAM VERA ARIAS |  |
| En Representación de | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | IMAR ORLANDO VACCA |  |
| En Representación de | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 4 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 20 de septiembre de 2024 | Hora de inicio: 3:00 PM | Hora de finalización: 3:50 PM |
| Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | |
| Tipo de Reunión: Seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de Obra Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024 | | Comité Obra No.02 – seguimiento de obra – |

## TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.02

1. Avance y seguimiento de ejecución de obra

## DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 3:00 pm en la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 2 del RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024, detallando lo siguiente:

En representación de la Secretaria de Gestión del riesgo de desastres: Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra) y en representación del contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS.: Ing. Imar Orlando Vacca (director de obra)

Toma la palabra el supervisor designado, Ing. William Vera Arias, quien realiza el saludo y procede a dar la palabra al Ing. Imar Orlando Pérez para que informe respecto al avance en la ejecución de la obra.

El ing. Imar Orlando Vacca, toma la palabra, da el respectivo saludo y realiza una descripción del avance de obra a la fecha, informando sobre la ejecución del conjunto de actividades

**ACTA DE REUNION**

constructivas derivabas del objeto del contrato de obra No. RE-SGRD- 01885 de 2024, en el que a la fecha se han desarrollado las siguientes actividades constructivas:

Durante el periodo comprendido entre la fecha de inicio de actividades (10 de septiembre de 2024) y la fecha del presente comité (20 de septiembre de 2024) se dio inicio a la actividad de Replanteo y localización para puentes. Hecho que permitió identificar claramente el sitio a intervenir y la ubicación de cada una de las estructuras componentes del puente vehicular a construir, adicionalmente se realizaron los levantamientos topográficos(altimetría) de la zona con el estado inicial para poder llevar el control de lo excavado

Así mismo el contratista de obra informa que se dio inicio a la actividad de Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m, la cual actualmente se encuentra en ejecución realizando los cortes en los taludes descritos como lado Cucutilla y lado Pamplona, estos cortes necesarios para realizar la ampliación de la zona establecida como paso provisional de los vehículos.

Paralelo a las actividades de excavación se dio inicio a la actividad de manejo de aguas, y construcción del jarillon que permita ejecutar las demás actividades constructivas, estas dos actividades se encuentran actualmente en ejecución

Otra de las actividades que actualmente se encuentra en ejecución es la de dragado del cauce natural.

El contratista informa que cuenta con el proceso de compra de materiales e insumos necesarios para la obra ya listos para iniciar su traslado al sitio de la obra (acero, cemento y materiales pétreos), adicionalmente cuenta con un carmix, equipo con el cual se realizara el respectivo proceso de preparación del concreto según los diseños y las resistencias establecidas.

A la fecha no ha presentado ningún inconveniente pueda afectar el normal avance de la obra, por lo que su ejecución se está realizando de acuerdo a lo establecido en el cronograma de obra.

El ingeniero William Vera, recuerda al contratista realizar el respectivo control de calidad de los materiales a emplear y verificar y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para ser implementadas en el desarrollo del contrato de obra.

Siendo las 3:50 pm se da por terminado el presente comité.

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 3 de 4 | |

## ACTA DE REUNION

**COMPROMISOS y CONCLUSIONES**

**COMPROMISO**

El contratista debe continuar con el normal desarrollo y ejecución de la obra.

Implementar el respectivo control de calidad de los materiales a emplear.

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato de obra

**CONCLUSIONES**

1. Según la ejecución de actividades de constructivas ejecutadas a la fecha se observa el cumplimiento a lo programado en el cronograma de obra.

| ANEXOS SI ( ) NO ( ) | Fecha de aprobación del acta: 20/09/2024 |
|---|---|

| *Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión* | *Revisó: Ing. William Vera Arias, Secretario SGRD* | *Próxima Reunión:* 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:*

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | WILLIAM VERA ARIAS | |
| En Representación de | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | IMAR ORLANDO VACCA | |
| En Representación de | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 4 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 30 de septiembre de 2024 | Hora de inicio: 9:50:00 AM | Hora de finalización: 10:00 AM |
| Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | |
| Tipo de Reunión: Seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de Obra Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024 | | Comité Obra No.03 – seguimiento de obra – |

## TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.03

1. Avance y seguimiento de ejecución de obra
2. Presentación y revisión preacta No. 01 de obra

## DESARROLLO DE LA REUNION .

En las oficinas de la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 3 del RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

El Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra), actuando en representación de la Secretaria para la gestión del riesgo de desastres toma la palabra dando el respectivo saludo y la bienvenida al presente comité, seguidamente solicita al contratista de obra información respecto al avance de obra a la fecha.

Hecho seguido toma la palabra el Ing. Imar Orlando Vacca en representación del contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS, quien informa respecto al avance en la ejecución de la obra derivada del contrato de obra No. RE-SGRD- 01885 de 2024, en el que a la fecha se han desarrollado las siguientes actividades constructivas:

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 2 de 4 | |

## ACTA DE REUNION

A la fecha del presente comité (30 de septiembre de 2024) se ejecutó la actividad de excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m, realizando los cortes requeridos para la cimentación del puente vehicular. Esta actividad se desarrolla de forma paralela a su respectivo cargue y retiro del material excavado.

Así, mismo continúa la ejecución de las actividades de manejo de aguas, y construcción del jarillon que permiten ejecutar las demás actividades constructivas.

Otra de las actividades que actualmente se encuentra en ejecución es la de dragado del cauce natural.

Una vez finalizada la excavación para la cimentación del puente vehicular, se procedió a realizar el vaciado de concreto ciclópeo para base o fundación de puentes y posteriormente se dio inicio al armado del acero de refuerzo para la zarpa y los estribos del puente, el contratista aclara que ya se encuentra en obra todo el acero figurado necesario para la construcción del puente.

A la fecha no ha presentado ningún inconveniente pueda afectar el normal avance de la obra, por lo que su ejecución se está realizando de acuerdo a lo establecido en el cronograma de obra.

El contratista presenta en comité la pre acta de obra No. 1 con sus respectivas memorias de cálculo y el informe No. 1 de actividades con su respectivo registro fotográfico esto con el fin de que sea revisada por la supervisión del contrato de obra para poder proceder a iniciar proceso de cobro mediante acta de recibo parcial No. 1 de las cantidades ejecutadas.

El ingeniero William Vera Arias, indica al contratista que se deben entregar adicionalmente todos los soportes de pago de seguridad social y que una vez se entregue toda la documentación que debe ser revisada se procederá a informar al contratista si es aprobada la pre acta o tienen algún tipo de observación que deba ser subsanada.

Siendo las 10:00 am se da por terminado el comité de obra #3

**COMPROMISOS y CONCLUSIONES**

**COMPROMISO**

El contratista debe realizar la entregar todas las memorias de cálculo y soportes que evidencien la ejecución de las cantidades de obra plasmadas en la pre acta de obra No. 1

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 3 de 4 | |

## ACTA DE REUNION

Entregar a la supervisión del contrato las planillas de pago de la seguridad social del personal que labora en obra

Por parte de la supervisión se genera el compromiso de revisar la pre acta No. 1 y sus memorias de cálculo una vez estas sean entregadas por el contratista en su totalidad



**CONCLUSIONES**

1. Según la ejecución de actividades de constructivas ejecutadas a la fecha se observa el cumplimiento a lo programado en el cronograma de obra.
2. El contratista solicita iniciar proceso de revisión de cantidades de obra ejecutadas para proceder a realizar el cobro de un acta de recibo parcial No, 01

| ANEXOS SI ( ) NO ( ) | Fecha de aprobación del acta: 30/09/2024 |
|---|---|

| *Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión* | *Revisó: Ing. William Vera Arias, Secretario SGRD* | *Próxima Reunión:* 08/10/2024 |
|---|---|---|

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:*

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | WILLIAM VERA ARIAS |  Firma |
| En Representación de | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | IMAR ORLANDO VACCA |  Firma |
| En Representación de | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 5 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 08 de octubre de 2024 | Hora de inicio: 8:10 AM | Hora de finalización: 9:00 AM |
| Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | |
| Tipo de Reunión: Seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de Obra Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024 | | Comité Obra No.04 – seguimiento de obra – |

## TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.04

1. Avance y seguimiento de ejecución de obra
2. Aprobación acta de recibo No. 01 de obra.

## DESARROLLO DE LA REUNION

En las oficinas de la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 4 del RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

El Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra), actuando en representación de la Secretaria para la gestión del riesgo de desastres toma la palabra dando el respectivo saludo y la bienvenida al presente comité, seguidamente solicita al contratista de obra información respecto al avance de obra a la fecha.

Hecho seguido toma la palabra el Ing. Imar Orlando Vacca en representación del contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS, quien informa respecto al avance en la ejecución de la obra derivada del contrato de obra No. RE-SGRD- 01885 de 2024, en el que a la fecha del presente comité se han desarrollado las siguientes actividades constructivas:

- Replanteo y localización para puentes

**ACTA DE REUNION**

- Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m (en ejecución)
- Concreto ciclópeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm².
- Acero de refuerzo Grado 60 (en ejecución)
- Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado (en ejecución)
- Manejo de aguas (en ejecución)
- Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavación, (en ejecución)
- Dragado cauce natural (Ampliación de la sección hidráulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la vía provisional), (en ejecución)

Se presenta ante la supervisión del contrato la documentación requerida para el cobro del acta de recibo parcial con las subsanaciones solicitadas y todas las memorias de cálculo de las cantidades cobradas.

A la fecha se encuentran ejecutadas:

| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UND | CANT. |
|---|---|---|---|
| **1.0** | **PUENTE VEHICULAR** | | |
| 1,01 | Replanteo y localización para puentes (Planimetría y Altimetría) | M2 | 285,36 |
| 1,02 | Excavación mecánica en material tipo grava aricllosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m. | M3 | 1.372,48 |
| 1,03 | Concreto ciclopeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm² | M3 | 38,35 |
| 1,07 | Acero de refuerzo Grado 60 | KG | 8.188,82 |
| 1,17 | Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado | M3 | 2.829,94 |
| | **OBRAS COMPLEMENTARIA** | | |
| 1,20 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica) | dia | 29,00 |
| 1,21 | Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavacion | M³ | 420,00 |
| 1,22 | Dragado cauce natural (Ampliación de la seccion hidraulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la via provisional ) | M³ | 800,00 |

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 3 de 5 | |

**ACTA DE REUNION**

A la fecha no ha presentado ningún inconveniente pueda afectar el normal avance de la obra, por lo que su ejecución se está realizando de acuerdo a lo establecido en el cronograma de obra.

El contratista presenta en comité la pre acta de obra No. 1 con sus respectivas memorias de cálculo y el informe No. 1 de actividades con su respectivo registro fotográfico esto con el fin de que sea revisada por la supervisión del contrato de obra para poder proceder a iniciar proceso de cobro mediante acta de recibo parcial No. 1 de las cantidades ejecutadas.

El ingeniero William Vera Arias, indica al contratista que una vez revisada la documentación presentada, las cantidades de obra y sus respectivas memorias de cálculo se aprueba el acta de recibo parcial No. 1 para ser presentada e iniciar el proceso de cobro de la misma

Siendo las 10:00 am se da por terminado el comité de obra #4

**COMPROMISOS y CONCLUSIONES**

**COMPROMISO**

Radicar el acta parcial No. 1

**CONCLUSIONES**

1. Se aprueba el acta parcial de obra No. 1 para iniciar proceso de cobro de las cantidades allí reportadas, las cuales ya fueron verificadas por la supervisión del contrato

| ANEXOS SI ( ) NO ( ) | Fecha de aprobación del acta: 08/10/2024 |
|---|---|

| *Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión* | *Revisó: ing. William Vera Arias, Secretario SGRD* | *Próxima Reunión:* 24/10/2024 |
|---|---|---|

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:*

| NOMBRE | WILLIAM VERA ARIAS | |
|---|---|---|
| En Representación de | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 4 de 5 | |

**ACTA DE REUNION**

| | | |
|---|---|---|
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | IMAR ORLANDO VACCA | |
| En Representación de | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 5 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 24 DE OCTUBRE DE 2024 | Hora de inicio: 9:00 AM | Hora de finalización: 10:10 AM |
| Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | |
| Tipo de Reunión: Seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de Obra Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024 | | Comité Obra No.05 – seguimiento de obra – |

## TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.05

1. Solicitud de realizar modificación de cantidades de obra
2. Presentación balance de obra
3. Avance y seguimiento de ejecución de obra

## DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 90:00 am en la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 5 del RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024, detallando lo siguiente:

En representación de la Secretaria de Gestión del riesgo de desastres: Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra) y en representación del contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS.: Ing. Imar Orlando Vacca (director de obra)

Toma la palabra el supervisor designado, Ing. William Vera Arias, quien realiza el saludo y procede a dar la palabra al Ing. Imar Orlando Pérez para que informe respecto al avance en la ejecución de la obra y para que exponga los hechos que dan origen a la necesidad de realizar un acta de mayores y menores cantidades de obra con respecto a las cantidades inicialmente contractuales.

## ACTA DE REUNION

El ing. Imar Orlando Vacca, toma la palabra he informa que una vez revisados los diseños entregados para la construcción del puente vehicular y luego de realizadas las actividades de localización y replanteo, se dio inicio a la ejecución de la excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m y Dragado cauce natural (Ampliación de la sección hidráulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la vía provisional), durante el desarrollo de estas se evidencio la necesidad de realizar un ajuste de mayores y menores cantidades con respecto a las inicialmente contratadas dado que para dar cumplimiento a lo descrito en los diseños teniendo en cuenta las condiciones encontradas en campo con respecto a la necesidad de ampliación del paso provisional, para facilitar la movilidad de los vehículos que por allí transitan sin que la ejecución de las actividades constructivas impidan el paso o que se ponga en riesgo la integridad de los conductores, los vehículos y la vida de los trabajadores de la obra.

Así mismo con respecto a la actividad de dragado dadas las condiciones encontradas en campo se evidencio mediante el levantamiento topográfico una menor cantidad que la inicialmente contratada. Por ende, debido a la variación de las cantidades de excavación y de dragado se ven afectadas las cantidades de obra del cargue y retiro de material sobrante dando como resultado una menor cantidad a la inicialmente contratada.

Igualmente, durante la ejecución de las actividades constructivas del puente se requiere aumentar los días contractuales para la actividad de manejo de aguas, esto teniendo en cuenta que para la correcta ejecución de las actividades constructivas, así como para el tránsito de trabajadores, maquinaria y equipos y el aseguramiento de la integridad física de quienes intervienen en todo el proceso constructivo se requiere tener un control y manejo de estas aguas asegurando de esta manera que no afectaran el desarrollo y ejecución de las obras .

El contratista presenta a la supervisión del contrato los soportes y las carteras topográficas correspondientes a los levantamientos realizados en obra que contienen la información de los volúmenes de excavación que soportan la solicitud de modificación mediante ajuste de mayores y menores cantidades de obra

En cuanto al seguimiento de la obra, el ing Imar Orlando, realiza una descripción del avance de obra a la fecha, informando sobre la ejecución del conjunto de actividades constructivas derivabas del objeto del contrato de obra No. RE-SGRD- 01885 de 2024, en el que a la fecha se han desarrollado las siguientes actividades constructivas:

- Replanteo y localización para puentes

**ACTA DE REUNION**

- Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m (en ejecución)
- Concreto ciclópeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm².
- Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi (en ejecución)
- Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi (en ejecución)
- Acero de refuerzo Grado 60 (en ejecución)
- Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado (en ejecución)
- Manejo de aguas (en ejecución)
- Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavación, (en ejecución)
- Dragado cauce natural (Ampliación de la sección hidráulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la vía provisional), (en ejecución)

Por lo anteriormente descrito, el contratista presenta a la supervisión del contrato el balance en el que las modificaciones de las cantidades de obra no afectan el valor del mismo y solicita a la entidad contratante que dadas las necesidades presentadas en campo y requeridas para la correcta ejecución de la obra considere la suscripción del acta de modificación de cantidades mediante el ajuste de mayores y menores cantidades de obra, toda vez que esta no afecta el valor del mismo.

Una vez analizadas las causales expuestas por el contratista y revisados los soportes presentados en donde se evidencia la necesidad de variación de los volúmenes de excavación y las demás situaciones expuestas, así como revisado y verificado el balance de obra presentado, el ingeniero William Vera Arias, indica al contratista que se aprueba la modificación de cantidades No. 1 para el contrato de obra No. RE-SGRD- 01885-2024

**COMPROMISOS y CONCLUSIONES**

**COMPROMISO**

Suscribir acta de modificación de cantidades No. 1 al contrato de obra RE-SGRD- 01885-2024

## ACTA DE REUNION


**CONCLUSIONES**

1. Se aprueba la suscripción de la modificación de cantidades de obra No. 1
2. según la ejecución de actividades de constructivas ejecutadas a la fecha se observa el cumplimiento a lo programado en el cronograma de obra.

| ANEXOS SI ( ) NO ( ) | Fecha de aprobación del acta: |
|---|---|

| *Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión* | *Revisó: Ing. William Vera Arias, Secretario SGRD* | *Próxima Reunión: ---* |
|---|---|---|

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:*

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | WILLIAM VERA ARIAS | <br>Firma |
| En Representación de | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | IMAR ORLANDO VACCA | <br>Firma |
| En Representación de | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 4 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 01 de noviembre de 2024 | Hora de inicio: 9:30 AM | Hora de finalización: 11:00 AM |
| Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | |
| Tipo de Reunión: Seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de Obra Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024 | | Comité Obra No.06 – seguimiento de obra – |

## TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.06

1. Avance y seguimiento de ejecución de obra
2. Aprobación acta de recibo No. 02 de obra.

## DESARROLLO DE LA REUNION

En las oficinas de la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 4 del RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

El Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra), actuando en representación de la Secretaria para la gestión del riesgo de desastres toma la palabra dando el respectivo saludo y la bienvenida al presente comité, seguidamente solicita al contratista de obra información respecto al avance de obra a la fecha.

Hecho seguido toma la palabra el Ing. Imar Orlando Vacca en representación del contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS, quien informa respecto al avance en la ejecución de la obra derivada del contrato de obra No. RE-SGRD- 01885 de 2024, en el que a la fecha del presente comité se han desarrollado las siguientes actividades constructivas:

- Replanteo y localización para puentes (ejecutada)

**ACTA DE REUNION**

- Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m (ejecutada)
- Concreto ciclópeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm². (ejecutada)
- Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi (ejecutada)
- Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi (ejecutada)
- Acero de refuerzo Grado 60 ((ejecutada para zarpa y estribos)
- Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado ((ejecutada)
- Manejo de aguas (en ejecución)
- Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavación, (en ejecución)
- Dragado cauce natural (Ampliación de la sección hidráulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la vía provisional), ((ejecutada)

Se presenta ante la supervisión del contrato la documentación requerida para el cobro del acta de recibo parcial con las subsanaciones solicitadas y todas las memorias de cálculo de las cantidades cobradas.

A la fecha no ha presentado ningún inconveniente pueda afectar el normal avance de la obra, por lo que su ejecución se está realizando de acuerdo a lo establecido en el cronograma de obra.

El contratista presenta en comité la pre acta de obra No. 2 con sus respectivas memorias de cálculo y el informe No. 2 de actividades con su respectivo registro fotográfico esto con el fin de que sea revisada por la supervisión del contrato de obra para poder proceder a iniciar proceso de cobro mediante acta de recibo parcial No. 2 de las cantidades ejecutadas.

El ingeniero William Vera Arias, indica al contratista que una vez revisada la documentación presentada, las cantidades de obra y sus respectivas memorias de cálculo se aprueba el acta de recibo parcial No. 2 para ser presentada e iniciar el proceso de cobro de la misma

Siendo las 11:00 am se da por terminado el comité de obra #6

**COMPROMISOS y CONCLUSIONES**

**COMPROMISO**

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 3 de 4 | |

## ACTA DE REUNION

Radicar el acta parcial No. 2



**CONCLUSIONES**

1. Se aprueba el acta parcial de obra No. 2 para iniciar proceso de cobro de las cantidades allí reportadas, las cuales ya fueron verificadas por la supervisión del contrato

| ANEXOS SI ( ) NO ( ) | Fecha de aprobación del acta: |
|---|---|

| *Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión* | *Revisó: Ing. William Vera Arias, Secretario SGRD* | *Próxima Reunión:* 24/10/2024 |
|---|---|---|

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:*

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | WILLIAM VERA ARIAS |  Firma |
| En Representación de | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | IMAR ORLANDO VACCA |  Firma |
| En Representación de | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
