	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - TOMO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3180 de 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

Contrato de Interventoría No. 5066 de 2023 **Interventoría:** CONSTRUMAJ SAS

Objeto Contrato de Obra:
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
1	**INTRODUCCION**		6
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		12
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.3	Seguimiento Items no previstos		13
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		13
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		15
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	15 - 20/22
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	15
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	15
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	15
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	15
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	16 - 23/27
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	16
4,8	Otros documentos seguimiento mensual		16
	• Seguimiento a la inversión de los desembolsos		16 - 28/43
	• Seguimiento Programa de Obra		16
	• Seguimiento Programa de Inversiones		16
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	16
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	17
	• Informes especialistas y profesionales		17
	• Informe matriz de riesgos		N/A
5	**Conclusiones y recomendaciones**		18
6	**Anexos**		19

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 5/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA
ERIODO MES: 01/08/2024 al 05/08/2024

CONVENIO No.: 3180 de 2023
OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre del 2023
FECHA DE INICIO: 12 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 de abril del 2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 31/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 5/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 7 MESES

VALOR INICIAL : $ 200.447.374,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.447.374,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5066 de 2023
INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD(ml)
Placa Huella	ML	64
Construcción de alcantarilla	UNIDAD	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD(ml)	CANTIDAD ACUMULADA
Placa Huella	ML	0	64
Construcción de alcantarilla	UNIDAD	0	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	146.771.680,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	2.184.423,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.491.271,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.447.374,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	0,00	146.771.680,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.940.198,00	50.491.271,00
VALOR EJECUTADO	1.940.198,00	197.262.951,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.447.374,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 197.262.951,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 98,90% %

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 10
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **20**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Juan Diego Jimenez Serna
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. : 25202 - 097497 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATO INVIAS N° 5066-2023

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 7





Versión 2

Tomo 7

PERIODO: DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

CONSTRUMAJ SAS

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Residente de Interventoría **Julio César Córdoba**	**Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**	**Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**

CONVENIO SOLIDARIO No. 3180 DE 2023

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PALO BLANCO – ITUANGO, ANTIOQUIA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo del 01 al 05 de agosto de 2024 por la Junta de Acción Comunal vereda Palo blanco en el municipio de Ituango, Antioquia del convenio solidario No. 3180 del 2023 con número de proceso en SECOP II: SPSC-CD-CS-163-2023, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", y cuyo número de ID en SECOP II es CO1.PCCNTR.5360711.

La interventoría del Contrato del convenio la realiza Construmaj S.A.S. bajo el contrato No. 5066 de 2023 con ID en SECOP II: CO1.SLCNTR.11855324 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1. Generado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS como entidad contratante y adjudicado mediante resolución No. 4637 del 18 de diciembre de 2023 a través del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DEO-SVR-149-2023.

Mediante resolución No. 4993 de fecha 30 de diciembre de 2023, se designó como supervisor al Ing. Mauricio Hoyos Sierra, mediante Resolución No. 2418 del 14 de julio de 2022 se designó como gestor técnico al ingeniero Diego Felipe Pabón Carrillo; Gestor Social - Subdirección de Sostenibilidad: Carlos Andrés Ossa Gestor Ambiental - Subdirección de Sostenibilidad: Audry Dayanna Menjura

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS estructuró el programa "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, mediante ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO VERDA PALO BLANCO – ITUANGO, ANTIOQUIA.

De acuerdo con el Convenio No. 3180 de 2023, suscrito entre la Junta de Acción Comunal de la vereda Palo Blanco – Ituango, Antioquia y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural de esta vereda, se tiene que; la entidad proyecta construir 120 metros de placa huella y 2 alcantarillas; sin embargo, luego de realizar el balance de obra final de obra, se proyectaron 64 metros de placa huella y una alcantarilla, esta sería la meta física final.

La vía objeto del alcance del convenio se encuentra catalogada como vía rural, y se encuentra en mal estado y sin ningún tipo de mantenimiento, deterioro en la superficie de rodadura, por lo cual se realizará la intervención a la vía, con el fin de restituir la normalidad al sitio descrito a continuación:

IDENTIFICACIÓN LAS COORDENADAS DEL TRAMO A INTERVENIR EN LA VEREDA PALO BLANCO, ITUANGO	
VEREDA PALO BLANCO:	• INICIA: 7°10´23.52" N, 75°47´21.84" O • FINAL: 7°11´12.48" N, 75°47´17.88" O

Tabla 3. Identificación de coordenadas.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA PALO BLANCO – ITUANGO, ANTIOQUIA.

Palo Blanco es una vereda del municipio de Ituango, Antioquia, Colombia y tiene una altitud de 1.748 metros sobre el nivel del mar. La vereda Palo Blanco está situada a 3 kilómetros y medio al suroeste de Ituango. Esta cerca de la localidad naranjo 2 y la Hormiga. El tramo para mejorar se localiza desde el K0+000 (Coordenadas de inicio 7°10´23.52" N, 75°47´21.84" O) al K0+120 (Coordenadas final 7°11´12.48" N, 75°47´17.88" O).

Figura 1. Zona de localización de la vereda Palo Blanco



Fuente: Google mapa

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Ituango es un Municipio de Colombia, situado en la subregión Norte del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Tarazá y el departamento de Córdoba, por el este con el municipio de Valdivia, por el sur con Briceño, Toledo y Peque, y por el oeste con Dabeiba y Mutata. Su cabecera está a 196 kilómetros de la capital de Antioquia, Medellín. El Municipio de Ituango tiene un total 28,634 habitantes, de los cuales: 11,325 son mujeres 39.6% y 17,309 son hombres 60.4%. El municipio de Ituango tiene una población Urbana de 7,074 habitantes lo que equivale al 24,70% del total de la población y un a población rural de 20,000 habitantes lo que equivale al 69,84% del total de la población.

Ituango es un municipio de vocación agrícola en donde sus principales ingresos dependen de la ganadería, el cultivo de café, caña de azúcar, el frijol y el maíz. También la minería artesanal de oro y platino ha servido de sustento para muchas de las familias y la cual ha sido ejercida de manera tradicional, así como también se explota la madera. Es un municipio que su economía se encuentra en transición, dado que esta dependía en gran parte de los cultivos de uso ilícito, los cuales fueron erradicados de manera voluntaria gracias a la implementación de los acuerdos de paz. Por ser un municipio en desarrollo, presenta muchos vacíos a nivel de movilidad vial e infraestructura.

Con el desarrollo del proyecto que se pretende ejecutar, se busca principalmente brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transpirabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el desarrollo económico de la región.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario recibido por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte de la JAC para la caracterización vial que se debe ejecutar:

Figura 2. Estado inicial de la vía.



Fuente: Levantamiento técnico

INVENTARIO VIAL

VEREDA	TRAMO VIAL POR INTERVENIR	LONGITUD PLACA HUELLA (M)	ALCANTARILLAS (UND)
Pablo Blanco	Coordenadas de inicio 7°10´23.52" N, 75°47´21.84" O; Coordenadas final 7°11´12.48" N, 75°47´17.88" O	64,00	1

Tabla 4. Inventario vial.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía por intervenir está catalogada de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huella y una alcantarilla.


Tramo por intervenir:


Dimensiones (m)			Obra por ejecutar
L	a	H	
64	5,0	0,15	PLACA HUELLA
6			1 ALCANTARILLAS


Tabla 5. Tramo para intervenir.


Para las secciones, se muestran las siguientes ilustraciones, en las cuales se encuentras las secciones transversales presentadas, por el IVIAS en la cartilla de Colombia rural.

Figura 3. Diseños de placa huella y alcantarilla.

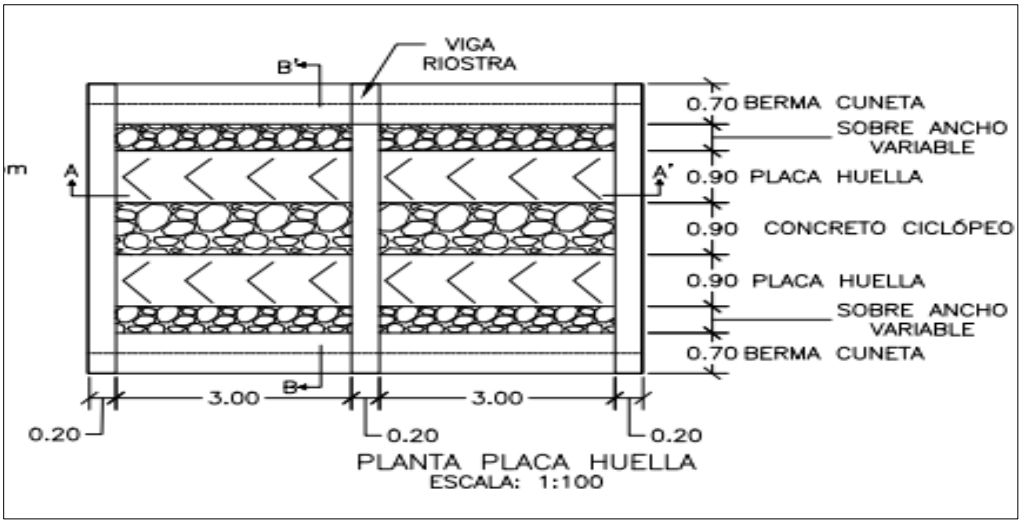

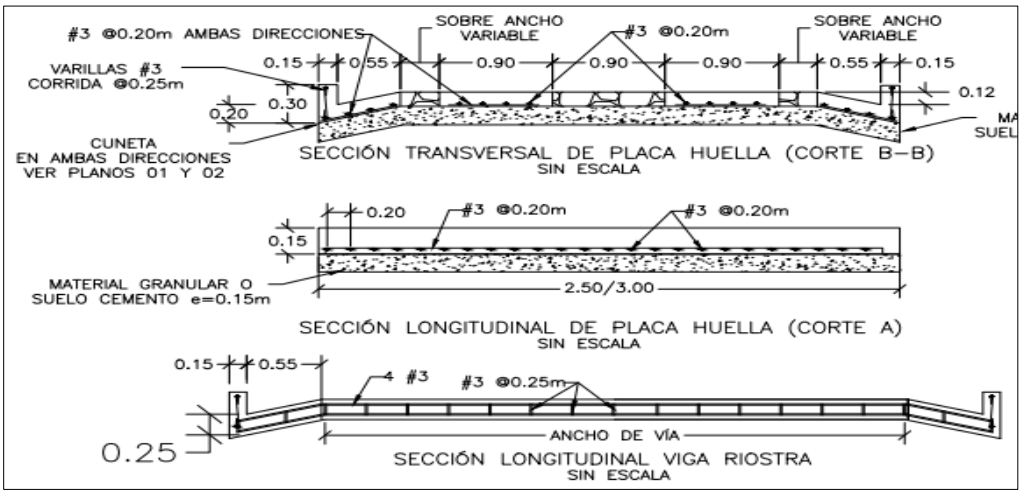

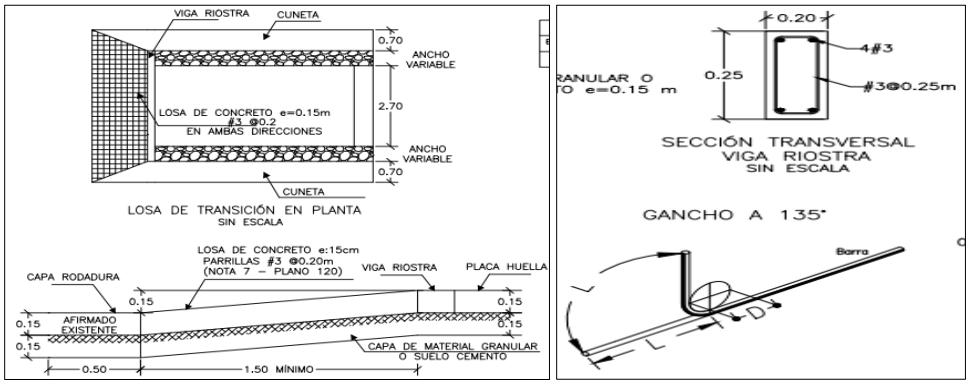

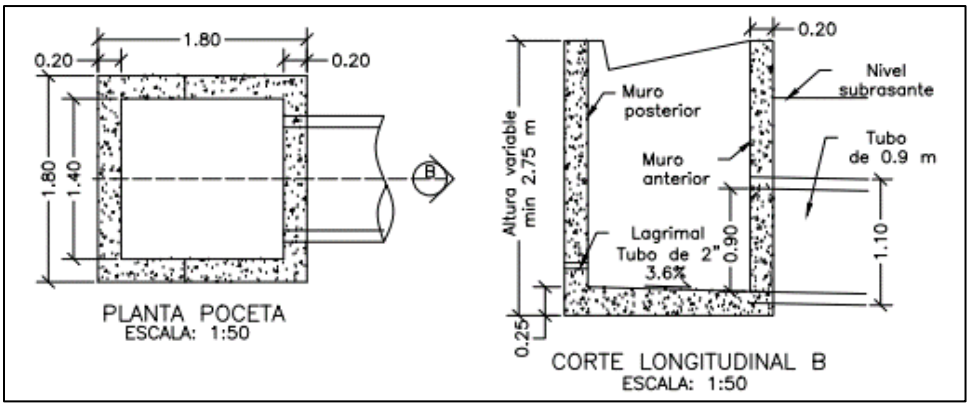

Fuente: Presupuesto oficial.

3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.

CONVENIO No 3180 DE 2023	
Concepto	**Fecha / Valor**
NÚMERO PROCESO DE SELECCIÓN	**SPSC-CD-CS-163-2023**
NÚMERO ID DEL SECOP	**CO1.PCCNTR.5360711**
NÚMERO DEL CONVENIO	3180 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	08 de septiembre de 2023
CONTRATISTA	JAC PALO BLANCO, ITUANGO ANT. NIT. 900.398.878-2 R.L. JUAN SEBASTIAN ZAPATAS JARAMILLO.
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 200.447.374,00
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, NIT. 800.215.807-2.
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	Vereda Palo Blanco, finca las brisas.
NÚMERO DE TELÉFONO	3206423560
CORREO ELECTRÓNICO	paloblancoituango@gmail.com
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DEL 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2023
SUSPENSIÓN No. 1	30 DE DICIEMBRE DE 2023
REANUDACIÓN No. 01	19 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
SUSPENSIÓN No. 2	26 DE ABRIL DE 2024
REANUDACIÓN No. 02	31 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINAC IÓN	05 DE AGOSTO DE 2024

Tabla 6. Información general del proyecto.

3.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

COMPONENTE TÉCNICO:

El componente técnico se cerró satisfactoriamente el día 13 de Julio, habiendo cumplido con todos los objetivos y actividades establecidas en el convenio.

COMPONENTE SOCIAL:

En virtud de la no ejecución de la PAGA, se procederá a la revisión de los recursos asignados para este fin, los cuales serán devueltos a la entidad contratante, junto con los rendimientos financieros generados, en cumplimiento de las disposiciones contractuales.

COMPONENTE SST:

El componente social se cerro satisfactoriamente el día 13 de Julio, habiendo garantizado la seguridad y salud de los trabajadores cumpliendo con los protocolos y normativa establecidas

COMPONENTE AMBIENTAL:

La implementación del plan de gestión ambiental se levo a cabo parcialmente, esto debido a que las practicas ambientales en obra se desarrollaron satisfactoriamente; sin embargo, la documentación complementaria para los entregables ambientales ante la entidad contratante, no fueron entregados por la Junta de Acción Comunal. Lo cual impidió realizar la entrega inicial de forma exitosa, a su vez, ha impedido avanzar con la entrega final. Se ha reiterado a la JAC la necesidad de entregar la información correspondiente.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS.

No se realizaron adiciones de ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO:

Durante este periodo la interventoría persevero en su función se supervisión y acompañamiento del proceso del PAGA, incluso cuando no se efectuó la ejecución del mismo, asegurando así la integridad y control del proceso.

AVANCE FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO DE 2024:

VALOR PROGRAMADO PERIODO	$ 200.447.374,00
VALOR EJECUTADO	$ 196.920.984,00

AVANCE FÍSICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024:

PROGRAMADO	100,00 %
EJECUTADO	100,00 %

AVANCE PREDIAL AL MES DE JULIO DE 2024:

- Predios por intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE AGOSTO DE 2024:

- Fuentes de material: Rio San Andrés del municipio de Briseño y Toledo Antioquia.
- Permiso minero: No 5214 y 5216
- Licencia ambiental: No 5214 y 5216
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

AVANCE SOCIAL AL MES DE AGOSTO DE 2024:

- Empleos generados: 20
- Empleos directos: 10
- Empleos indirectos: 10
- Socializaciones de inicio: 12/03/2024
- Capacitaciones: 0
- SAU: N/A
- Actas de vecindad: N/A
- Actas de cierre: N/A

ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- En cumplimiento de los procedimientos establecidos, la interventoría retornara los recursos asignados para el PAGA a la entidad contratante, incluyendo los intereses y acumulados.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO

4.1 INFORME SEMANAL

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el corte del presente informe, los cuales se adjuntan en el Anexo Informes semanales.

SEMANA	DESDE	HASTA
Semana 24	01/08/2024	05/08/2024

Por lo anterior, anexamos los informes semanales mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

Se concluyó con la ejecución de las actividades el 13 de julio en obra, por lo cual no se vio necesaria la presencia de maquinaria para el periodo del presente informe, por lo cual no anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal operativo que pertenecía a el proyecto se le genero la novedad de retiro el día 13 de Julio, por ende, para el presente informe no se genera planilla de seguridad social ni MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 no aplica para el desarrollo de los convenios del programa "Caminos comunitarios de la paz total".

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Debido a que el convenio culmino en el mes de Julio, no se tuvo en cuenta el reporte del clima.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el presente informe se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con el registro de los resultados de los cilindros que se fallaron para medir la resistencia final del concreto.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO

El control del anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-12 con la relación de las garantías, culmino. No hubo ninguna actualización al convenio. Por ende, no aplica para el presente informe.

4.8 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión de los desembolsos.**

Para el periodo del presente informe ya se aprobó el ultimo desembolsos, por lo cual, se anexa el informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios.

- **Seguimiento Programa de Obra**

La junta de acción comunal entregó el programa de obra al inicio de las actividades, el cual fue objeto de seguimiento por parte de la interventoría durante su ejecución. Dado que la obra ha finalizado, no se incluye programación adicional

- **Informe inversión de los desembolsos**

Al inicio de las actividades, la Junta de Acción Comunal entregó el Programa de Inversión de Desembolsos, el cual fue revisado y aprobado por la Interventoría.
Durante la ejecución del programa, la Interventoría realizó un seguimiento detallado, verificando la documentación correspondiente a cada desembolso, incluyendo:
- Comprobantes de pago
- Certificaciones bancarias
- Demás documentos de soporte
Estos documentos se anexaban a cada desembolso, garantizando la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos establecidos

- **Actas de Comité de Obra**

Para este reporte no se realizaron comités de obra, por lo cual no se anexa formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

- **Actas de Reunión**

Para este reporte no se realizaron comités de obra, por lo cual no se anexa ningún acta.

- **Informes de especialistas y profesionales**

No se requiere para el periodo del presente informe.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ **Obras Físicas y Financieras:** Se completaron el 100% de las obras físicas y financieras programadas, es de resaltar que la mesta física final del proyecto disminuyó, quedando en 64 metros lineales de placa huella y una alcantarilla. Dicho cambio se produjo por varios factores como: incremento en el ancho de vía, situación que se ajusto una vez se iniciaron las obras, aumento en el costo de transporte dado a inconvenientes presentados en las vías de acceso al proyecto, lo que generó acarreos adicionales que no se contemplaron en la planeacion inicial del proyecto, aumento en costos administrativos dado a las prórrogas surtidas y amento en costos de alquileres de maquinaria y equipo debido a la suspensión No. 2, ya que para esta suspensión se contaba con maquinaria y herramienta en obra, y el tiempo muerto fue por 36 días calendario.

- ✓ **Culminación del Pago de Nómina y Liquidaciones Laborales:** El 13 de julio se realizó el último pago de nómina del personal y sus respectivas liquidaciones laborales, quedando a paz y salvo con el personal operativo contratado. Este logro garantiza la satisfacción de los derechos laborales de los trabajadores

- ✓ **Acompañamiento y Supervisión:** La interventoría continuó con el acompañamiento y supervisión para la conclusión del tema del PAGA, asegurando la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Resultados Financieros

- ✓ **Recurso No Ejecutado:** El recurso del PAGA fue trasladado parcialmente a obra, esto debido a los inconvenientes de transporte presentados por el deslizamiento de tierras en las vías de acceso al proyecto, el restante del recurso no se aprobó dentro de los tiempos contractuales, por lo que se retornará a la entidad contratante como un recurso no ejecutado. Esta decisión se tomó después de un análisis exhaustivo y una evaluación detallada.

- ✓ **Traslado de Recursos:** Se trasladarán $2.208.684,00 M/CTE del recurso del PAGA a la entidad contratante, garantizando la integridad y la responsabilidad en la gestión de recursos.

6. ANEXOS.

6.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. **No hay correspondencia en el presente periodo.**

6.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras. **No aplica**

6.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas. **No aplica.**

6.4. Copia de la Bitácora del mes correspondiente. **No aplica.**

6.5. Otros anexos:

- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 - Informe Semanal.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Resumen Ensayos de Laboratorio
- Informe de inversión de los desembolsos.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA-CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 24 del 1/08/2024 al 5/08/2024 Final ☑ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — Apoyo Técnico y Administrativo a la Supervisión de Contratos de Interventoría. — MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 64 ML DE PLACA HUELLA - CONSTRUCCIÓN DE 1 UND DE ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA PALO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE ITUANGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ituango del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial Norte: 7° 10' 23.52", Oeste: 75° 47' 21.84" y el punto de referencia la coordenada final Norte: 7° 11' 12.48", Oeste: 75° 47' 17.88', del tramo postulado por la comunidad de la JAC Vereda Palo Blanco para su intervención con el programa; conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

CONVENIO No.	3180 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.447.374,00
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.447.374,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 de agosto de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5066 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.780.410,00
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 89.969.895,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 278.750.305,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	20 de agosto de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.447.374,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 196.920.984,00			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.526.390,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.780.410	$ 89.969.895,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 188.780.410	$ 54.261.105,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 35.708.790,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200.447.374,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200.447.374,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	196.920.984,00	98,24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(3.526.390,00)	-1,76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:			%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200.447.374,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	196.920.984,00	98,24%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(3.526.390,00)	-1,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA			

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	48.608.302,87	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	48.608.302,87	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	2.025.345,95	4,17%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$	1.683.094,75	3,46%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2024

VALOR FACTURA: $ 67.151.700,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00% — Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % 100,00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	M3	2,20
Conformación de la calzada existente	M2	320,00
Subbase Granular Clase C.	M3	21,00
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA	M3	17,30

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
Prog	2,20	2,20	100,0%
Ejec	2,20	2,20	100,0%
Prog	320,00	320,00	100,0%
Ejec	320,00	320,00	100,0%
Prog	21,00	21,00	100,0%
Ejec	21,00	21,00	100,0%
Prog	17,30	17,30	100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibrocompactador Manual		
Concretadora 1 1/2 Bulto		
Retroescavadora sobre llantas, motor 62 HP, Profundidad de escavacion 5,41 Metros		
Compactador Manual (Saltarin), Peso de operación 52Kg, Fuerza de impacto 12 KN		
Pulidora		
Vibro para Concreto		
Radial		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

	PLACA HUELLA	M3	17,30	Ejec	17,30	17,30	100,0%
*	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	M3	7,90	Prog	7,90	7,90	100,0%
				Ejec	7,90	7,90	100,0%
	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	M3	16,70	Prog	16,70	16,70	100,0%
				Ejec	16,70	16,70	100,0%
	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	M3	17,30	Prog	17,30	17,30	100,0%
				Ejec	17,30	17,30	100,0%
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	2536,60	Prog	2536,60	2536,60	100,0%
				Ejec	2536,60	2536,60	100,0%
	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	53,30	Prog	53,30	53,30	100,0%
				Ejec	53,30	53,30	100,0%
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50	Prog	0,50	0,50	100,0%
				Ejec	0,50	0,50	100,0%
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	8,10	Prog	8,10	8,10	100,0%
				Ejec	8,10	8,10	100,0%
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	579,00	Prog	579,00	579,00	100,0%
				Ejec	579,00	579,00	100,0%
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00	Prog	6,00	6,00	100,0%
				Ejec	6,00	6,00	100,0%
	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	21,00	Prog	21,00	21,00	100,0%
				Ejec	21,00	21,00	100,0%

Cizalla Manual de 90 Cm		
Coches o carretillas		
Motocarguero (Vehiculo)		
Caneca Plastica de 50 Litros		
Planta elecrica		
Total		

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Ubicado en el municipio de Toledo – Antioquia	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Por lo pequeño de la obra, no aplican estos persmisos.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN REVISION POR EL AREA DE SOSTENIBILIDAD DE INVIAS

OBSERVACIONES:
DADO A QUE EL PLAZON DEL CONTRATO FINALIZO Y NO SE OBTUVO RESPUESTA DEL AREA DE SOSTENIBILIDAD DE INVIAS, EL RECURSO PLANEADO PARA EL PAGA SE TOMARA COMO UN RECURSO NO EJECUTADO.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	22
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		19
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Vereda Palo Blanco, finca las brisas.

OBSERVACIONES:

DADO A QUE EL TRAMITE DEL PAGA NO SE LOGRO CULMINAR SATISFACTORIAMENTE, EL RUBRO DIPONIBLE PARA LAS ACTIVIDADES SOCIALES PROPUESTAS POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, NO PODRAN SER EJECUTADAS, POR LO QUE EL REURSON SERÁ DEVUELTO A LA ENTIDAD CONTRATANTE.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE INFORMA A LA JUNTA DE ACCION COMUNAL QUE DEBIDO A LA DEMORA EN RADICAR LA INFORMACION PARA EL PAGA , LA ENTIDAD NO LOGRO EMITIR CONCEPTO DE VIABILIDAD DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, POR LO QUE DICHO RECURSO NO PODRA SER EJECUTADO Y SE DEVOLVERA A LA ENTIDAD CONRATANTE.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REVISAR INFORMACION DEL PAGA TAN PRONTO LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ENVIE

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARA ESTA SEMANA NO HAY REGISTRO PARA MOSTRAR

PARA ESTA SEMANA NO HAY REGISTRO PARA MOSTRAR

PARA ESTA SEMANA NO HAY REGISTRO PARA MOSTRAR

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

LA META FISICA SE TERMINO AL 100%, LA CUAL CONSISTE EN 64 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA DE UN ACNCHO DE 5,00 M, Y LA OCNSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLLA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA: 10/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No.: 3180 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. NIT. 900.398.878-2

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA-CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5066 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	19 de abril de 2024	Densidades de suelos	INV E 164	Vereda Palo Blanco - Ituango	4	2147	7,7	SI	
2	22/04/2024	Ensayo de Mezclas		Valle de Toledo	1			SI	En la obra se deben elaborar cilindros de control de acuerdo con la norma ICONTEC 550 para proceder a realizar los respectivos ajustes.
3	24 de abril de 2024	Ensayo de resistencias		Valle de Toledo	1			SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	17/06/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de concreto	INV E 410	Vereda Palo Blanco, Ituango	1	21 Mpa	13,63 Mpa	N/A	Fallo a los 7 dias
2	17/06/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de concreto	INV E 410	Vereda Palo Blanco, Ituango	1	21 Mpa	13,82 Mpa	N/A	Fallo a los 7 dias
3	8/07/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de concreto	INV E 410	Vereda Palo Blanco, Ituango	1	21 Mpa	21,96 Mpa	SI	Fallo a los 28 dias
4	8/07/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de concreto	INV E 410	Vereda Palo Blanco, Ituango	1	21 Mpa	21,67 Mpa	SI	Fallo a los 28 dias
5	17/07/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de concreto	INV E 410	Vereda Palo Blanco, Ituango	1	21 Mpa	13,33 Mpa	N/A	Fallo a los 7 dias
6	17/07/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de concreto	INV E 410	Vereda Palo Blanco, Ituango	1	21 Mpa	13,43 Mpa	N/A	Fallo a los 7 dias
7	7/08/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de concreto	INV E 410	Vereda Palo Blanco, Ituango	1	21 Mpa	22,06 Mpa	SI	Fallo a los 28 dias
8	7/08/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de concreto	INV E 410	Vereda Palo Blanco, Ituango	1	21 Mpa	21,57 Mpa	SI	Fallo a los 28 dias
9	19/07/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de concreto	INV E 410	Vereda Palo Blanco, Ituango	1	21 Mpa	13,33 Mpa	N/A	Fallo a los 7 dias
10	19/07/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de concreto	INV E 410	Vereda Palo Blanco, Ituango	1	21 Mpa	13,14 Mpa	N/A	Fallo a los 7 dias
11	9/08/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de concreto	INV E 410	Vereda Palo Blanco, Ituango	1	21 Mpa	21,47 Mpa	SI	Fallo a los 28 dias
12	9/08/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de concreto	INV E 410	Vereda Palo Blanco, Ituango	1	21 Mpa	21,37 Mpa	SI	Fallo a los 28 dias

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soporten.

Firma

Nombre: LIDA YANETH MIRA OSORIO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202-203538 ANT


Firma:

Nombre: Julio Córdoba
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94



FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

Cliente: CONSTRUMAJ
Obra: Contrato 5066-2023
Dirección: Cra. 58 90-53 Bogotá
Teléfonos: 322 58 88
N.I.T.#: 901.563.205-7
Dirección de la Obra: Ituango Palo Blanco – convenio 3180-23

Características:
Agregado Fino:
Agregado Grueso:
Cemento:
Dosificación:
Interventor:

Fecha de Informe: 11 de julio de 2024
Contacto:
Factor de Proyección. 3 días:
Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673
Factor de Proyección. 14 días: X 1.25

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área	Altura (cm)	Volumen (cm^3)	Resist. esperada	Densidad (g/cm^3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm^2)	Resistencia A 28 días $(Kg/cm)^2$
		Vaciado	Prueba											
1	Placa huella y cunetas tramo 1 K0+0 al K0+52	10-06-24	17-06-24	7	15.2	13346	181	30.5	5520	21Mpa	2.417	55800	139	216
2	Placa huella y cunetas tramo 1 K0+0 al K0+52	10-06-24	17-06-24	7	15.2	13255	181	30.5	5520	21Mpa	2.401	56900	141	219
3	Placa huella y cunetas tramo 1 K0+0 al K0+52	10-06-24	8-07-24	28	15.2	13169	181	30.5	5520	21Mpa	2.385	90200		224
4	Placa huella y cunetas tramo 1 K0+0 al K0+52	10-06-24	8-07-24	28	15.2	13241	181	30.5	5520	21Mpa	2.398	88700		221


ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

ENSAYADO POR:
Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94



FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

Cliente: CONSTRUMAJ
Obra: Contrato 5066-2023
Dirección: Cra. 58 90-53 Bogotá
Teléfonos: 322 58 88
N.I.T.#: 901.563.205-7
Dirección de la Obra: Ituango Palo Blanco – convenio 3180-23

Características:
Agregado Fino:
Agregado Grueso:
Cemento:
Dosificación:
Interventor:

Fecha de Informe: 10 de agosto de 2024
Contacto:
Factor de Proyección. 3 días:
Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673
Factor de Proyección. 14 días: X 1.25

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área	Altura (cm)	Volumen (cm^3)	Resist. esperada	Densidad (g/cm^3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm^2)	Resistencia A 28 días $(Kg/cm)^2$
		Vaciado	Prueba											
1	Alcantarilla	10-07-24	17-07-24	7	15.2	13085	181	30.5	5520	21Mpa	2.370	54700	136	214
2	Alcantarilla	10-07-24	17-07-24	7	15.2	13196	181	30.5	5520	21Mpa	2.390	55200	137	215
3	Alcantarilla	10-07-24	7-08-24	28	15.2	13167	181	30.5	5520	21Mpa	2.385	90500		225
4	Alcantarilla	10-07-24	7-08-24	28	15.2	13055	181	30.5	5520	21Mpa	2.365	88300		220


ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

ENSAYADO POR:
Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94



FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

Cliente: CONSTRUMAJ
Obra: Contrato 5066-2023
Dirección: Cra. 58 90-53 Bogotá
Teléfonos: 322 58 88
N.I.T.#: 901.563.205-7
Dirección de la Obra: Ituango Palo Blanco – convenio 3180-23

Características:
Agregado Fino:
Agregado Grueso:
Cemento:
Dosificación:
Interventor:

Fecha de Informe: 12 de agosto de 2024
Contacto:
Factor de Proyección. 3 días:
Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673
Factor de Proyección. 14 días: X 1.25

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área	Altura (cm)	Volumen (cm^3)	Resist. esperada	Densidad (g/cm^3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm^2)	Resistencia A 28 días $(Kg/cm)^2$
		Vaciado	Prueba											
1	Placa huella y cunetas tramo 1 K0+0 al K0+12	12-07-24	19-07-24	7	15.2	13030	181	30.5	5520	21mpa	2.360	54600	136	213
2	Placa huella y cunetas tramo 1 K0+0 al K0+12	12-07-24	19-07-24	7	15.2	12685	181	30.5	5520	21mpa	2.298	53900	134	212
3	Placa huella y cunetas tramo 1 K0+0 al K0+12	12-07-24	9-08-24	28	15.2	12721	181	30.5	5520	21mpa	2.304	88000		219
4	Placa huella y cunetas tramo 1 K0+0 al K0+12	12-07-24	9-08-24	28	15.2	12937	181	30.5	5520	21mpa	2.343	87400		218

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

ENSAYADO POR:
Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

INFORME INVERSION DE LOS DESEMBOLSOS

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
443

Bogotá D.C. 01 de octubre de 2024.

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Atn: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Calle 51 No. 79-51
Medellín, Antioquia

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5066 de 2023 "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.**

ASUNTO: **INFORME FINANCIERO No. 05 DE DESEMBOLSOS – CONVENIO 3180 DE 2023 VEREDA PALO BLANCO, ITUANGO.**

Respetados señores:

Por medio del presente comunicado, nos permitimos presentar el informe No. 5 del desembolso aprobado por parte de la interventoría para el convenio citado en el asunto. Este incluirá un desglose detallado del desembolso efectuado en el mes de agosto de 2024, conforme a lo estipulado en el plan de inversiones aprobado.

Desembolso No. 05 de fecha el 12 de agosto de 2024:

Alquileres y Transporte	
Vibro compactador manual	$ 4.000.000,00
Subtotal	**$ 4.000.000,00**
Mano de Obra	
Pago seguridad social - Julio	$ 719.700,00
Subtotal	**$ 719.700,00**
TOTAL	**$ 4.719.700,00**

El total desembolsado en el mes de agosto de 2024 para el convenio 3180 de 2023 vereda Palo Blanco, Ituango, es de CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS **($4.719.700,00)** M/CTE.

Es importante resaltar que, existe un recurso no ejecutado del componente de Obras de compensación Ambiental y/o complementarias (PAGA), este recurso no ejecutado es por **$2.184.423,00** el cual será regresado a la entidad contratante, junto a los rendimientos financieros generados.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
443

Con el fin de respaldar los pagos mencionados previamente, se adjuntan los siguientes documentos que sirven como verificación del desembolso efectuado, asegurando la transparencia y precisión en los registros financieros:

- Plan de inversión desembolso convenio.
- Informe inversión buen manejo desembolso.
- Acta de comité operativo.
- Soportes Contables desembolso No. 05.

Agradecemos de antemano su atención quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional en caso de requerirse.

Cordialmente.

CONSTRUMAJ S.A.S.

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal.

Copia:	Archivo.
Proyectó:	Miguel Tocanchon – Apoyo técnico de interventoria.
Aprobó:	Juan Diego Jiménez Serna - director de interventoría.

PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 15/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — ANTIOQUIA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3180 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PALOBLANCO

OBJETO DEL CONVENIO:
Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal vereda Paloblanco del municipio de Ituango del departamento de Antioquia, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios Para La Paz Total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ S.A.S. INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

JUSTIFICACIÓN:

El convenio 3180 de 2023 fue suspendido el 26 de abril de 2024 hasta el 30 de mayo de 2024, ambas fechas inclusive, el inicio de actividades en obra se dio para el 22 de abril de 2024, donde ya se habian trasladado maquinaria, equipos y materiales a la obra. Razon por la cual ya se estaban incurriendo en costos de alquiler de maquinaria y bodega. Ese tiempo de suspension genero mas de un mes de tiempo muerto en alquileres causando afectacion en la meta fisica planeada inicialmente.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	$ 56.375.866	$ 10.139.289,00		$ 66.515.155,00	33,3%
2	MANO DE OBRA	$ -	$ 23.285.837,00	$ 719.700,00	$ 24.005.537,00	12,0%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Personal, Seguridad Industrial, Medidas Ambientales, Gastos Bancarios, Otros costos)	$ 18.507.900	$ 31.398.679,00	$ 3.058.930,00	$ 52.965.509,00	26,6%
4	ALQUILERES Y TRANSPORTES	$ 36.673.700	$ 13.103.050,00	$ 4.000.000,00	$ 53.776.750,00	27,0%
5	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -	$ -	$ 2.184.423,00	$ 2.184.423,00	1,1%
	TOTAL	$ 111.557.466,00	$ 77.926.855,00	$ 9.963.053,00	$ 199.447.374,00	100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: JUAN ESTEBAN ZAPATA JARAMILLO
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
Nombre: LIDA YANETH MIRA OSORIO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 05202-203538 ANT

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 4 **MES:** AGOSTO D E2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☑

CONVENIO No. 3180-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 97% **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 194.204.021,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Cuenta de cobro	3	12-ago-24	IVAN DARIO MIRA SUCERQUIA	$ 4.000.000,00	4	Alquiler de maquinaria
Planilla de seguridad social del mes de julio de 2024	Planilla No. 7934465290	13-ago-24	JAC VEREDA PALO BLANCO	$ 719.700,00	2	Planila de seguridad social del personal de julio de 2024
				$ 4.719.700,00		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 66.515.155,00	$ 66.515.155,00		$ 66.515.155,00	$ -
2	MANO DE OBRA	$ 24.005.537,00	$ 23.285.837,00	$ 719.700,00	$ 24.005.537,00	$ -
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Personal, Seguridad Industrial, Medidas Ambientales, Gastos Bancarios, Otros costos)	$ 52.965.509,00	$ 49.906.579,00		$ 49.906.579,00	$ 3.058.930,00
4	ALQUILERES Y TRANSPORTES	$ 53.776.750,00	$ 49.776.750,00	$ 4.000.000,00	$ 53.776.750,00	$ -
5	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 2.184.423,00	$ -		$ -	$ 2.184.423,00
	TOTALES	**$ 199.447.374,00**	**$ 189.484.321,00**	**$ 4.719.700,00**	**$ 194.204.021,00**	**$ 5.243.353,00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

EL VALOR DEL PAGA SERA RETORNADO AL INVIAS YA QUE ES UN RECURSO NO EJECUTADO
RESPECTO AL SALDO EN GASTOS ADMINISTRATIVOS, NO SE HA RELACIONADO EL VALOR DE LOS GASTOS BANCARIOS, DADO QUE LA JAC NO HA ENTREGADO LOS EXTRACTOS BANCARIOS PARA PODER DETERMINAR SU CUANTIA, ASU VEZ, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE HAN TRAMITADO POR ESTA MISMA RAZON.

SE HA REITERADO A LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA OBLIGACION CONRACTUAL QUE TIENEN A SU CARGO EN CUANTO A ESTOS PENDIENTES.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Juan Zapata
Nombre: JUAN ESTEBAN ZAPATA JARAMILLO
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Giovanni Luchini Luchini
Representante Legal
Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
Nombre: LIDA YANETH MIRA OSORIO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 05202-203538 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 3180-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisar el desembolso 5 y final solcitado por la JAC Palo Blanco

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Presentación
2. Explicación del objeto del comité operativo: Residente de Obra
3. Informe de desembolso solicitado #4: Contadora
4. Dudas e inquietudes: Participantes
5. Acuerdos, compromisos y conclusiones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Los profesionales de interventoria dan la bienvenida al los asistentes a la reunion de la vereda palo blanco tomando la palabra la Ingeniera Lida Yaneth , también realiza una corta presentación de todos los participantes y agradece a los compañeros de la comunidad pues se tuvieron que trasladar desde la vereda Palo Blanco hacia el casco urbano (aproximadamente 40 minutos).

De parte de la interventoría saludan el ingeniero Julio Córdoba, la social Daniela Rivero y la inspectora de obra Mercedes; el ingeniero y social se encuentran en el comité # 5 por medio de vídeo MEET. el tema principal a tratar es el desembolso final del convenio, el cual queda de la siguiente manera.

Planilla de seguridad social del mes de julio de 2024 por un valor del $719,700
Alquiler de maquinaria por vaor de $4.000.000,00









Para un valor total de $4.716.700,00 de desembolso aprobado. valor que es aprobado por el resto de participantes del comite operativo

Se dio paso a resolver las dudas e inquietudes, presentes en la reunion de acuerdo con lo informado y sin dudas.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
JUAN ZAPATA	PRESIDENTE JAC	JAC PALO BLANCO	
SILVIA LOPERA	CONTADORA	JAC PALO BLANCO	
LIDA YANETH	INGENIERA	JAC PALO BLANCO	
JAIME ZAPATA	REPRESENTANTE COMITÉ	JAC PALO BLANCO	
MARTIN TAPIAS	TESORERO	JAC PALO BLANCO	
LUZ MERCESDES AMAYA	INSPECTORA	CONSTRUMAJ	
JULIO CESAR CORDOBA	INGENIERO RESIDENTE	CONSTRUMAJ	
DANIELA RIVERO MUENTES	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	CONSTRUMAJ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

SOPORTES CONTABLES DESEMBOLSO No. 05.

Ituango; 12 de agosto de 2024

Señores:
Banco AV Villas
Oficina Bello

Ref.: Solicitud de transferencia vía ACH

Respetadores señores;

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ACH debitando de nuestra cuenta corriente así:

NOMBRE:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALOBLANCO
NIT.:	900398878-2
CUENTA CORRIENTE:	512175084

Transferir a:

BANCO	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL TITULAR	NIT. /CC	VALOR
BANCOLOMBIA	AHORRO	23853492671	IVÁN DARIO MIRA SUCERQUIA	70.578.049	$ 4.000.000
FINANCIERA JURISCOOP	AHORRO	58500138446	JAC VEREDA PALO BLANCO	900.398.878	$ 719.700

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.

Lo anterior a que no contamos con portal empresarial, ni otro medio de manejo

Atentamente,

Firmas autorizadas:

Nombre: Juan Esteban Zapata Jaramillo
Representante Legal
Contratista

Nombre: Giovanni Luchini Luchini
Representante Legal o su apoderado
Interventoría

ITUANGO, 12 DE AGOSTO DE 2024 **CUENTA DE COBRO # 3**

LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALOBLANCO

NIT. 900.398.878-2

DEBE A:

IVAN DARIO MIRA SUCERQUIA

CC 70.578.049

CALLE CAUCA CARRERA RUIZ- BARRIO EL CARMELO –ITUANGO ANT

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($4.000.000)

POR CONCEPTO DE: ARRIENDO Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA

ATENTAMENTE;

Ivan D. Mira S.

IVAN DARIO MIRA SUCERQUIA
CC 70.578.049
TEL: 302 456 11 60

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **70.578.049**

MIRA SUCERQUIA

APELLIDOS

IVAN DARIO

NOMBRES

Ivan D. Mira S

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAY-1962**

ITUANGO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-NOV-1985 ITUANGO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0101900-00625444-M-0070578049-20170725 0056590135A 1 47851147

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto: 0 2 — Actualización

4. Número de formulario: 14918632921

(415)7707212489381(8020) 000001491863292 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 0 5 7 8 0 4 9	6	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	70578049	1 9 8 5 1 1 2 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Ituango 3 6 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MIRA	SUCERQUIA	IVAN	DARIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Ituango 3 6 1

41. Dirección principal: CL CAUCA CR RUIZ BRR EL CARMELO

42. Correo electrónico: ivanmiras62@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 7 7 8 5 7 0 8	3 0 2 4 5 6 1 1 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 0 9 0 9 0 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadoras

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2023 - 06 - 06 / 08 10 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos correspondientes a la suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.30 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre: MIRA SUCERQUIA IVAN DARIO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900398878
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALO BLANCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	ITUANGO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	VRDA PALO BLANCO	TELÉFONO:	6048872
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7934465290**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	841617742

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	6	$ 288.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.700	$ 0	$ 288.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.600	$ 0	$ 41.600
230301	230301-PORVENIR	1	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.600	$ 0	$ 41.600
SUBTOTALES:										**$ 371.900**	**$ 0**	**$ 371.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 53.600
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 39.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.400	$ 0	$ 0	$ 39.400
SUBTOTALES:													**$ 93.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 93.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 161.800	$ 161.800	$ 0	$ 0	$ 161.800
SUBTOTALES:									**$ 161.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 161.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	8	$ 93.000	$ 0	$ 93.000
SUBTOTALES:			**$ 93.000**	**$ 0**	**$ 93.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900398878
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALO BLANCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	ITUANGO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	VRDA PALO BLANCO	TELÉFONO:	6048872
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**7934465290**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	841617742		

TOTAL	$ 719.700

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada
