DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 5083-2023
Periodo:	DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	29 de diciembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA DEL MUNICIPIO DE PACHO: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pacho del Departamento de Cundinamarca, en la vereda Quebrada Honda y La Palancana teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas Norte 5.257104172, Este -74.23876006 y punto de referencia final el PR 1+030, con coordenadas Norte 5.298008251, Este -74.21992806 conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA DEL MUNICIPIO DE PACHO: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pacho del Departamento de Cundinamarca, en la vereda Bajo Pasuncha teniendo como punto de referencia inicial el PR0+000 con coordenada Norte 5.25487, Este -74.22223 y punto de referencia final el PR0+060 con coordenadas Norte 5.26056, Este - 74.23122 conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS.

JUNTA DE ACCION COMUNAL EN LA VEREDA ALTO YASAL MUNICIPIO DE PACHO: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pacho del departamento de Cundinamarca, en la vereda Alto Yasal, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 y coordenadas Norte 5.2711605, Este -74.22230 punto de

referencia final el PR0+027, con coordenadas Norte 5.2682530, Este - 74.2192336 de la vía Alto Yasal, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAPIRA DEL MUNICIPIO PAIME: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paime del departamento de Cundinamarca, en la vereda Capira teniendo como punto de referencia inicial el punto de coordenadas NORTE 5,33145110528432, ESTE -74,1899043501056 en el PR0+000 y punto de referencia final de coordenadas NORTE 5,33145110528432, ESTE -74,1893622270851 en el PR0+256, de la vía VILLAGÓMEZ A PAIME SECTOR EL TABLÓN, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO PAIME: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paime del departamento de Cundinamarca, en la vereda San Rafael teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas Norte 5,35800505279099, Este -74,164125191924 y punto de referencia final de coordenadas Norte 5,35641664681083, Este -74,1643144830269 el PR0+200, de la vía VEREDA SAN RAFAEL A LA VEREDA CAMBUCO SECTOR LOS GUARUMOS, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MATA DE RAMO DEL MUNICIPIO TOPAIPI: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipi del departamento de Cundinamarca, en la vereda Mata de ramo, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas Norte 5.296989335, Este -74.22299852 y punto de referencia final el Km 0+460 de coordenadas Norte 5.298008251, Este -74.21992806 de la vía Principal mata de ramos-villa Gomez – Vereda mata de ramos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS.

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTE BELLO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Peñón del Departamento de Cundinamarca, en la vereda Monte Bello, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas Norte 5.268, Este -74.272 y punto de referencia final el PR0+207, con coordenadas Norte 5,268, Este -74,271 de la vía Palacios, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del departamento de Cundinamarca, en la vereda Laguna Verde, teniendo como

punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas Norte 5.245993447, Este -74.09093629 y punto de referencia final el PR 0+485,con coordenadas Norte 5.244825, Este -74.09082833 de la vía vereda laguna verde a vía hato viejo conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del departamento de Cundinamarca, en la vereda La Floresta, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas Norte 5.289112394, Este -74.14591937 y punto de referencia final el PR 0+485, con coordenadas Norte 5.288785, Este -74.14503167, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO : El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del departamento de Cundinamarca, en la vereda Región de los Ríos, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 y de coordenadas NORTE 5.27555389061944, ESTE - 74.126230438506 y punto de referencia final PR0+485 de coordenadas NORTE 5.27498617803638, ESTE -74.12551093, de la via vereda Los Ríos a via vereda Campo Hermoso. sector la escuela, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3478-023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA	NIT:	901.298.877-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		

FECHA DE INICIO:	21/12/23	2023S-VBOG-030790	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS ($199.674.031) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS ($199.674.031) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	DOS (02)		
PRÓRROGA N: 1	HASTA EL 30 DE ABRIL 2024		
PRÓRROGA N: 2	HASTA EL 30 DE JUNIO 2024		
PRORROGA No: 3	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024		
PRORROGA N: 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSION 1:	29 DE DICIEMBRE 2023 HASTA 16 DE ENERO 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3381-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO PASUNCHA	NIT:	901.205.960-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		

FECHA DE INICIO:	13/12/23	2023S-VBOG-028422	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($200.312.049) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($200.312.049) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	TRES (03)		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA N: 2	HASTA EL 30 DE JUNIO 2024		
PRORROGA N: 3	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024		
PRORROGA N: 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3612 -2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO YASAL	NIT:	901.205.873 -2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO YASAL MUNICIPIO DE PACHO EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13/12/23	2023S-VBOG-028428	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($198.779.288,00), MONEDA CORRIENTE.
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($198.779.288,00), MONEDA CORRIENTE.
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	TRES (03)
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO 2024
PRORROGA N:3	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024
PRORROGA N: 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3091-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CAPIRA	NIT:	901.292.445-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAPIRA DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21/12/23	2023S-VBOG-030718	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($195.105.319) MONEDA CORRIENTE.
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($195.105.319) MONEDA CORRIENTE.
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	TRES (03)
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO 2024
PRORROGA N:3	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024
PRORROGA N: 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSION 1:	29 DE DICIEMBRE 2023 HASTA 16 DE ENERO 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3096-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA SAN RAFAEL	NIT:	901.013.379-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21/12/23	2023S-VBOG-030745	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($195.105.319) MONEDA CORRIENTE.
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($195.105.319) MONEDA CORRIENTE.
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	TRES (03)
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO 2024
PRORROGA N:3	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024
PRORROGA N: 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSION 1:	29 DE DICIEMBRE 2023 HASTA 16 DE ENERO 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4657-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MATA DE RAMO	NIT:	900.184.711-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MATA DE RAMO DEL MUNICIPIO TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	27/12/23	2023S-VBOG-032268	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($199.186.308,00).
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($199.186.308,00).
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	TRES (03)
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO 2024
PRORROGA 3:	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024
PRORROGA N: 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSION 1:	29 DE DICIEMBRE 2023 HASTA 16 DE ENERO 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4612-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTE BELLO	NIT:	901.048.449-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTE BELLO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	28/12/23	2023S-VBOG-032904	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($200.940.745) MONEDA CORRIENTE.
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($200.940.745) MONEDA CORRIENTE.
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	TRES (03)
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO 2024
PRORROGA N: 3	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024
PRORROGA N: 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSION 1:	29 DE DICIEMBRE 2023 HASTA 16 DE ENERO 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3241-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORESTA	NIT:	901.576.708-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21/12/23	2023S-VBOG-030850	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($199.166.367) MONEDA CORRIENTE.
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($199.166.367) MONEDA CORRIENTE.
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	TRES (03)
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO 2024
PRORROGA 3:	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3793-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA REGION DE LOS RIOS	NIT:	901.057.290-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	27/12/23	2023S-VBOG-032244	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($199.276.933) MONEDA CORRIENTE.
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($199.276.933) MONEDA CORRIENTE.
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	TRES (03)
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO 2024
PRORROGA 3:	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSION 1:	29 DE DICIEMBRE 2023 HASTA 16 DE ENERO 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3779-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAGUNA VERDE	NIT:	901.013.970-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21/12/23	2023S-VBOG-030850	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($198.947.680.00).
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($198.947.680.00).
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	TRES (03)
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2024
PRÓRROGA N: 2	HASTA EL 30 DE JUNIO 2024
PRORROGA N: 3	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSION 1:	29 DE DICIEMBRE 2023 HASTA 16 DE ENERO 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

Convenio	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO
3478	1180023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$195.792.183,00	$198.674.031
				C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 2.881.848,00	
3381	1131723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$196.430.201,00	$199.312.049
				C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 2.881.848,00	
3612	1124323	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$194.897.440,00	$197.779.288

				C-2402-0600-14-0-2402112-02	$2.881.848,00	
3091	1357723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$192.904.549,00	$194.105.319
				C-2402-0600-14-0-2402112-02	$1.200.770,00	
3096	1129723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$194.105.319,00	$194.105.319
4657	1346123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$195.304.460,00	$198.186.308
				C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 2.881.848,00	
4612	1304023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$197.058.897,00	$199.940.745
				C-2402-0600-14-0-2402112-02	$2.881.848	
3241	1130523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$195.284.519,00	$198.166.367
				C-2402-0600-14-0-2402112-02	$2.881.848,00	
3793	1421023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$195.395.085,00	$198.276.933
				C-2402-0600-14-0-2402112-02	$2.881.848,00	
3779	1202923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$195.065.832,00	$197.947.680
				C-2402-0600-14-0-2402112-02	$2.881.848,00	

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 30 DE JUNIO 2024, para el periodo JUNIO, se reporta un avance para el convenio, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Convenio 3478-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 199.674.031	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 183.260.825	91.780%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 144.681.806	72.459%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 3381-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.312.049	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 200.312.049	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$180.441.093	90.080%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 3612-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$198.779.288	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 190.430.557	90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$144.131.763	72.609%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 3091-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$194.105.319	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$194.105.319	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$123.091.945	63.090%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 3096-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 194.105.319	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 190.000.000	95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$170.346.454	87.310%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 4657-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 199.186.308	100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 187.753.013	94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$184.566.032	92.66%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 4612-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.940.745	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 190.000.000	95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$158.553.010,79	79.30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 3241-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$199.166.367	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 199.166.367	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$199.166.367	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 3793-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 199.276.933	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 199.276.933	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$199.276.933	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 3779-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$198.947.680.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 198.947.680	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 198.947.680	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Convenio 3478-2023;

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

Convenio 3381-2023;

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

Convenio 3612-2023;

Meta física programada %: 90%
Meta física ejecutada %: 72.609%

Convenio 3091-2023;

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

Convenio 3096-2023;

Meta física programada %: 90%
Meta física ejecutada %: 87.310%

Convenio 4657-2023;

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

Convenio 4612-2023;

Meta física programada %: 90%
Meta física ejecutada %: 79.30%

Convenio 3241-2023

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

Convenio 3793-2023;

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

Convenio 3779-2023;

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CONVENIO	FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

Convenio 3478-2023;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No .4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO___

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	1	26/09/2023	30/04/2024
Patronal		1		
Contratistas y Subcontratista		1		
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	39.934.806,20	1	26/09/23	01/03/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.983.702,55	1	26/09/23	30/04/27
Estabilidad de la Obra	59.902.209,30	1	31/12/23	30/04/29

Convenio 3381-2023;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	1	25/09/2023	30/04/2023
Patronal		1		
Contratistas y Subcontratista		1		

Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	40.062.409,80	1	31/12/23	01/03/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.015.602,45	1	31/12/23	30/04/27
Estabilidad de la Obra	60.093.614,70	1	30/04/24	30/04/29

Convenio 3612-2023;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	1	28/09/2023	30/04/2024
Patronal		1		
Contratistas y Subcontratista		1		
Vehículos Propios y No Propios		1		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	39.755.857,60	1	31/12/23	01/03/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.938.964,40	1	31/12/23	30/04/27
Estabilidad de la Obra	59.633.786,40	1	30/04/24	30/04/29

Convenio 3091-2023;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	1	01/09/2023	30/04/2023
Patronal		1		
Contratistas y Subcontratista		1		
Vehículos Propios y No Propios		1		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	39.021.063,80	1	01/09/23	01/03/25
Pago de Salarios,	9.755.265,95	1	01/09/23	30/04/27

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra	58.531.595,70	1	30/04/24	30/04/29

Convenio 3096-2023;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO___

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$232.000.000	1	05/09/2023	31/12/2023
Patronal		1		
Contratistas y Subcontratista		1		
Vehículos Propios y No Propios		1		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	39.021.063,80	1	01/09/23	01/03/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.755.265,85	1	01/09/23	30/04/27
Estabilidad de la Obra	58.531.595,70	1	30/04/24	30/04/29

Convenio 4659-2023;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	1	31/12/2023	30/04/2024
Patronal		1		
Contratistas y Subcontratista		1		
Vehículos Propios y No Propios		1		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	39.837.263,00	1	27/11/23	31/10/24
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.959.316	1	27/11/23	31/12/26
Estabilidad de la Obra	59.755.893	1	27/11/23	31/12/26

Convenio 3241-2023;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	1	11/09/2023	30/04/2024
Patronal		1		
Contratistas y Subcontratista		1		
Vehículos Propios y No Propios		1		

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	39.833.273,40	1	27/11/23	01/03/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.958.318,35	1	27/11/23	30/04/27
Estabilidad de la Obra	59.749.910,10	1	27/11/23	30/04/29

Convenio 3793-2023;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: RCE
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	1	11/09/2023	30/04/2024
Patronal		1		
Contratistas y Subcontratista		1		
Vehículos Propios y No Propios		1		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	39.855.387	1	01/03/23	01/03/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.963.847	1	30/04/23	30/04/27
Estabilidad de la Obra	59.783.080	1	27/11/23	30/04/29

Convenio 3779-2023;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$232.000.000	1	09/10/2023	31/12/2023
Patronal		1		
Contratistas y Subcontratista		1		
Vehículos Propios y No Propios		1		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	39.789.536	1	01/03/23	01/03/25
Pago de Salarios,	9.947.384	1	30/04/23	30/04/27

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra	59.684.304	1	27/11/23	30/04/29

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5083-2023		
CONTRATISTA:	DATUM X S.A.S	NIT:	901.544.149-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		

OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	29/12/2023	2023S-VBOG-033757	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($347.035.899), MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($347.035.899), MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO.		
ANTICIPO	$58.325.361,20		
ANTICIPO OTORGADO:	$58.325.361,20		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	TRES (03)		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 24 DE MARZO 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE JUNIO 2024		
PRORROGA 4:	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	30 DE DICIEMBRE 2023 HASTA 22 DE ENERO 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1446823	2023	10	C-2402-0600-14-0-	$340.095.181,00	$0,00	$340.095.181,00

			2402041-02			

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 10 De fecha 30 DE SEPTIEMBRE 2024 para el período el contrato reporta un avance de 85 % :

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 85%
Total inversión ejecutada: $ 0.0%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ACTA No.**
21/06/2024	2

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.11 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS. N/A**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS. N/A**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Durante el periodo mencionado, se llevaron a cabo las visitas correspondientes con el fin de garantizar la supervisión efectiva de los convenios a cargo.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Durante el mes de Junio, se supervisaron diversas actividades en coordinación con la interventoría y los organismos de acción comunal.

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA DEL MUNICIPIO DE PACHO

Se realizó un seguimiento detallado a la Junta de Acción Comunal y a la interventoría, participando activamente en los Comités Operativos junto con la veeduría, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el residente de obra y el equipo de interventoría. En estos encuentros, se evaluaron los alcances y la ejecución de la obra.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA DEL MUNICIPIO DE PACHO:

Se realizó un seguimiento detallado a la Junta de Acción Comunal y a la interventoría, participando activamente en los Comités Operativos junto con la veeduría, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el residente de obra y el equipo de interventoría. En estos encuentros, se evaluaron los alcances y la ejecución de la obra.





JUNTA DE ACCION COMUNAL EN LA VEREDA ALTO YASAL MUNICIPIO DE PACHO


Se realizó un seguimiento detallado a la Junta de Acción Comunal y a la interventoría, participando activamente en los Comités Operativos junto con la veeduría, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el residente de obra y el equipo de interventoría. En estos encuentros, se evaluaron los alcances y la ejecución de la obra.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAPIRA DEL MUNICIPIO PAIME

Se realizó un seguimiento detallado a la Junta de Acción Comunal y a la interventoría, participando activamente en los Comités Operativos junto con la veeduría, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el residente de obra y el equipo de interventoría. En estos encuentros, se evaluaron los alcances y la ejecución de la obra.

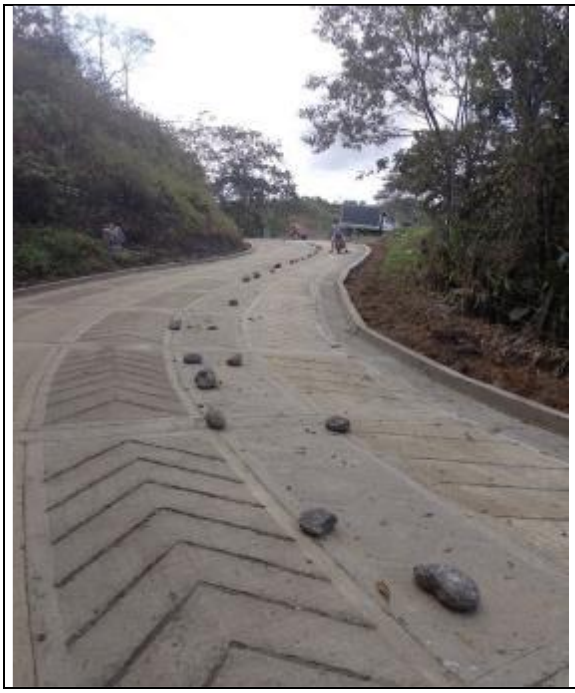



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO PAIME

Se realizó un seguimiento detallado a la Junta de Acción Comunal y a la interventoría, participando activamente en los Comités Operativos junto con la veeduría, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el residente de obra y el equipo de interventoría. En estos encuentros, se evaluaron los alcances y la ejecución de la obra.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MATA DE RAMO

Se realizó un seguimiento detallado a la Junta de Acción Comunal y a la interventoría, participando activamente en los Comités Operativos junto con la veeduría, el presidente de

la Junta de Acción Comunal, el residente de obra y el equipo de interventoría. En estos encuentros, se evaluó la ejecución de la obra.





JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTE BELLO.

Se realizó un seguimiento detallado a la Junta de Acción Comunal y a la interventoría, participando activamente en los Comités Operativos junto con la veeduría, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el residente de obra y el equipo de interventoría. En estos encuentros, se evaluaron los alcances y la ejecución de la obra.





JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORESTA

Se realizó un seguimiento detallado a la Junta de Acción Comunal y a la interventoría, participando activamente en los Comités Operativos junto con la veeduría, el presidente de

la Junta de Acción Comunal, el residente de obra y el equipo de interventoría. En estos encuentros, se evalúa la ejecución de la obra.





JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA REGION DE LOS RIOS

Se realizó un seguimiento detallado a la Junta de Acción Comunal y a la interventoría, participando activamente en los Comités Operativos junto con la veeduría, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el residente de obra y el equipo de interventoría. En estos encuentros, se evalúa la ejecución de la obra.





JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAGUNA VERDE

Se realizó un seguimiento detallado a la Junta de Acción Comunal y a la interventoría, participando activamente en los Comités Operativos junto con la veeduría, el presidente de

la Junta de Acción Comunal, el residente de obra y el equipo de interventoría. En estos encuentros, se evalúa la ejecución de la obra.





6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda a la interventoría y a las Juntas de Acción Comunal implementar estrategias que favorezcan un mayor avance en la ejecución de la obra, optimizando la compra de materiales y la gestión de recursos.

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR DE LA TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA (E)
