	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 24/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA SEMANA No.: 20 del 17/05/2024 al 23/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

1. Contruccion de 5 alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

De acuerdo con las especificaciones técnicas del Convenio Solidario suscrito entre la Junta de Acción Comunal y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS *"la definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir"*

Por lo tanto, una vez realizada la concertación y ajustado el presupuesto preliminar se tiene los siguientes alcances:

Construcción de cinco (5) alcantarillas en tubería Novafort de 36" de diámetro, las cuales incluyen las actividades de excavaciones, colocación de solado de limpieza, construcción de obras de encole y descole en concreto reforzado de 21 Mpa y todo lo relacionado con llenos requeridos.

Los parámetros de diseño y los parámetros geométricos para la construcción de las alcantarillas se desarrollan de acuerdo con el contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA

CONVENIO No. 3330 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199,468,218.00

FECHA DE INICIO: 21/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199,468,218.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

INTEGRANTES: CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO

CONTRATO No. 5039-2023 — VALOR INICIAL: $ 62,215,248.00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 62,215,248.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,468,218			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 126,403,010			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 73,065,208			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 62,215,248			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 26,721,164			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 35,494,084			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,355,955.00	73.37%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 158,836,541.99	79.63%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 126,403,009.75	63.37%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (32,433,532.25)	-16.26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 158,836,541.99	79.63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 126,403,009.75	63.37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 32,433,532.25	-16.26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30,179,541.38	15.13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24,734,059.03	12.40%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 62,215,248.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26,721,164.40	42.95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1,741,826.80	2.80%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,687,455.70	2.71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 15.13% Avance o Atraso Físico % -2.73%

Meta Física Ejecutada % 12.40%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Instalación de tubería	Und	5
	Excavaciones (Poceta y descole)	Und	10
*	Armado de estructuras en acero (Poceta y descole)	Und	10
*	Vaciado de poceta	und	5
*	Vaciado de descole	und	5

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Total	%
Prog	1	1	1	1	1	5	100.0%
Ejec	1	1	1	1		4	80.0%
Prog	2	2	2	2	2	10	100.0%
Ejec	2	2	2	2		8	80.0%
Prog	2	2	2	2	2	10	100.0%
Ejec	2	1	1	1		5	50.0%
Prog	1	1	1	1	1	5	100.0%
Ejec	1	1	1	1		4	80.0%
Prog	1	1	1	1		4	80.0%
Ejec	1	0.1	0.1	0.1		1.3	26%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Herramienta menor	1	1
Concretadora	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: A la fecha se han instalado 4 transversales, se vaciaron 4 pocetas y 2 placas de descole

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	-	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El personal en obra en su totalidad son hombres. Como novedad se tiene que solo hay 4 trabajadores en obra.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se remite información a la J.A.C remitida por el INVIAS donde se hace referencia a que: *"(…) nos informan desde planta central que es importante recordar a los Representantes Legales y contadores de las Juntas de Acción Comunal (OAC) la obligación de declarar renta ante la DIAN para el año 2023. Se solicita a la parte técnica, jurídica y social de cada territorial recordar a los integrantes mencionados (RL, Contadores) de las OAC acerca de las fechas en que se debió hacer dicha declaración. (…)"*

Se remite por parte de la interventoría al ingeniero residente de obra de la J.A.C presentación de PAGA del programa "Caminos Comunitarios de Paz Total".

La J.A.C envía ajustes al presupuesto a través del Ingeniero Residente.

Se requiere información del PAGA a la J.A.C por parte de la Interventoría.

Se reitera a la J.A.C cargue en la plataforma del SECOP II de la modificación de las pólizas que amparan el Convenio Solidario.

Se remite por parte de la Interventoría a la Junta de Acción Comunal para su diligenciamiento formatos del INVIAS, los cuales se requieren presentar a esta Entidad.

Se remite por parte de la interventoría Oficio de solicitud de información a la Junta de Acción Comunal, requiriendo así mismo el diligenciamiento de diferentes formatos. Para el efecto la interventoría anexa y envía vía correo electrónico los formatos dispuestos por el INVIAS, así como los instructivos correspondientes.

La interventoría remite oficio a la J.A.C haciendo referencia a realización de Comité Operativo y proyección de presupuesto para definir alternativa de solución en remplazo de la Transversal No. 4.

La Junta de Acción Comunal solicita a través de correo electrónico a la Entidad Bancaria donde tiene la cuenta para el manejo de los recursos, la siguiente información: (- original de extractos bancarios, - original de la certificación bancaria de rendimientos, - conciliación bancaria, y - comprobantes de movimientos (que contengan el número de la cédula de ciudadanía o Nit del beneficiario y concepto de pagos).

Las actividades de obra realizadas en la semana fue el armado de la estructura en acero para las pocetas de la transversal # 1. También, se realizó el armado de acero de refuerzo y encofrado de dos placas de descole para las transversales # 1 y # 3 respectivamente.

El resumen de avance de las obras es el siguiente:

TRANSVERSAL # 1
- Se instaló la tubería Novafort de 36", se atracó y relleno respectivamente = 100 %
- Excavación de poceta y descole = 100%
- Piso de poceta vaciado = 100%
- Armado y montaje de estructura para poceta = 100%
- Vaciado de poceta = 100%
- Conformación y estructura de aletas = 100%
- Vaciado de aletas y muro pantalla = 100%

TRANSVERSAL # 2
- Se instaló la tubería Novafort de 36", se atracó y rellenó = 100%
- Excavación de poceta y descole = 100%
- Piso de poceta vaciado = 100%
- Vaciado de poceta = 100%
- Placa o piso de Aletas vaciado = 100%
- Conformación y estructura de aletas = 0%

TRANSVERSAL # 3
- Se instaló la tubería Novafort de 36", se atracó y rellenó = 100%
- Excavación de poceta y descole = 100%
- Piso de poceta vaciado = 100%
- Armado y montaje de estructura para poceta = 100%
- Vaciado de poceta = 100%
- Piso de aletas vaciado = 100%
- Conformación y estructura de aletas = 0%


TRANSVERSAL # 4
- Se instaló la tubería Novafort de 36", se atracó y rellenó = 100%
- Excavación de poceta y descole = 100%
- Piso de poceta vaciado = 100%
- Vaciado de poceta = 100%
- Placa o piso de Aletas armado para vaciar = 100%
-Conformación y estructura de aletas = 0%

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar el armado de la estructura de acero de refuerzo para las placas de descole de las transversales # 2 y # 5.

Realizar el encofrado y vaciado de las placas respectivamente.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

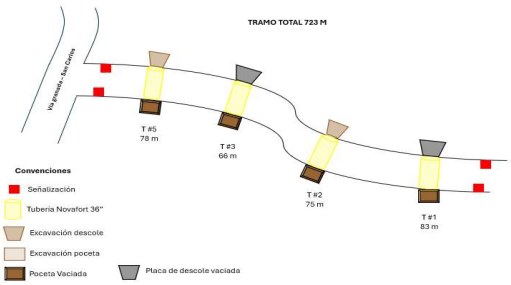

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio0

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Vereda la Quiebra, Granada - Antioquia.
Construccion poceta encole



Vereda la Quiebra, Granada - Antioquia.
Vaciado de piso de descole y armado de acero



Vereda la Quiebra, Granada - Antioquia.
Armado de acero para aletas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Requerir a la J.A.C en caso de requerirse y contemplando la ejecución física del Convenio, presentar con la suficiente antelación la justificación de prórroga del Convenio Solidario, dado la finalización del mismo en el mes de junio.

Remitir oficio al INVIAS en relación al PAGA – Gestión Social y Ambiental de los Convenios Solidarios en el marco del programa "Caminos comunitarios de la paz total", haciendo referencia a las dificultades de las J.A.C.

Remitir oficio al INVIAS en relación a las dificultades de gestión por parte de la Juntas de Acción Comunal de diferentes formatos de solicitudes, actas, informes, planes, seguimientos, entre otros, requeridos por dicha entidad.en relación a las dificultades de gestión por parte de la Juntas de Acción Comunal de diferentes formatos de solicitudes, actas, informes, planes, seguimientos, entre otros, requeridos por dicha entidad.

Remitir oficio a la J.A.C en lo que tiene que ver con la Gestión Contractual del Convenio Solidario y reiterar la entrega de información por parte de esta. Asi mismo realizar recomendaciones y anotaciones respecto a la ejecucion de la obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO

Matrícula Profesional No.: 25202147775CND

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
