INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL 8
MUNICIPIO DE AMALFI

CONTRATISTA DE OBRA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO

CONVENIO No. 4167 DE 2023

INTERVENTORÍA:

INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

CONTRATO No. 4824-2023

PERIODO:

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2024

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
ANEXO 1- MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 4167 DE 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO

Contrato de Interventoría No. 4824-2023 **Interventoría:** INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 8 **MES O PERIODO:** JULIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		10
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	**INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO**		12
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		14
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		14
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO**		15
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	15
4.2	Maquinaria y Equipo Convenio Solidario	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	15
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Convenio Solidario	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	15
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Convenio Solidario	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	NO APLICA
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	16
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	16
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	16
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Convenio Solidario	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	NO APLICA
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		16
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	NO APLICA
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	NO APLICA
	• Seguimiento Programa de Obra		16
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	16
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	16
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	17
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	16
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		18
5.1	Información general del contrato		18
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		19
5.3	Informes especialistas y profesionales		21
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		21
5.5	Informe matriz de riesgos.		21
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		21
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		21
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		21
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	21
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	22
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	22
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	22
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	22
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		22
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NO APLICA
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NO APLICA
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	22
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	22
7	**Conclusiones y recomendaciones**		23
8	**Anexos**		24
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia,		24
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		24
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad		24
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		24

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
ANEXO 2 - MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1

FECHA: 5/08/2024 (Día/Mes /Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — PERIODO MES: JULIO

CONVENIO No.: 4167 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO

PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DEL 2023	VALOR INICIAL :	$ 200,773,257.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE DEL 2023	VALOR ADICIONALES:	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	17 DE ENERO DEL 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200,773,257.00
FECHA DE VENCIMIENTO:	14 DE JUNIO DEL 2024	DESEMBOLSO CONCEDIDO:	
PLAZO ACUMULADO:	5 MESES 4 DIAS	DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4824-2023 — INTERVENTOR: INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S — SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	-	-
Alcantarillas	Construcción	UND	5
	Rehabilitación	UND	1
Mantenimiento	Alcantarillas	m	68
Otros (Especificar cuales)	Limpieza zonas no boscosas	Ha	2

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	-	-	-
Alcantarillas	Construcción	UND	12	5
	Rehabilitación	UND	1	1
Mantenimiento	Alcantarillas	m	68	68
Otros (Especificar cuales)	Limpieza zonas no boscosas	Ha	2	2

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150,519,436.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4,485,583.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45,768,238.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199,773,257.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 5,481,778.17	$ 159,578,877.68
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1,370,444.54	$ 39,894,719.43
VALOR EJECUTADO	$ 6,852,222.71	$ 199,473,597.11

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 199,473,597.11
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199,473,597.11
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99.85%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11

REGISTRO FOTOGRÁFICO

TRANSVERSAL #2 TERMINADA



Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi, Departamento de Antioquia

POCETA TRANSVERSAL #2



Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi, Departamento de Antioquia

DESCOLE TRANSVERSAL #2



Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi, Departamento de Antioquia

TRANSVERSAL #3 TERMINADA



Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi, Departamento de Antioquia

POCETA TRANSVERSAL #3



Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi, Departamento de Antioquia

DESCOLE TRANSVERSAL #3



Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi, Departamento de Antioquia

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma



Nombre. Cesar Mauricio Castañeda Salcedo
Director de Interventoría
Idoneidad Profesional No. 2520214777SCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Interventor, Dirección Territorial

INTERPROYECTOS S.A.S

CONTROL DE APROBACIÓN

NOMBRE DEL DOCUMENTO:		Informe Mensual de interventoría No. 8 - Julio
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:		
VERSIÓN:	**2**	

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			
ACTIVIDAD	**FECHA**	**NOMBRE DEL EJECUTOR**	**FIRMA**
Elaboración	02/08/2024	Sebastián Cediel Rentería	
Revisión	05/08/2024	Cesar Mauricio Castañeda Salcedo	
Verificación			
Aprobación		Mauricio Hoyos Sierra	

DISTRIBUCIÓN		
Persona a quien se envía	**Cargo**	**Organización**
Mauricio Hoyos Sierra	Director Territorial Antioquia	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	**Fecha**	**Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior**
1	12/09/2024	N/A
2	30/09/2024	Ajuste de las observaciones realizadas por parte del INVIAS.

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 7

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8

2.1 LOCALIZACIÓN 8

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 10

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 11

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 11

3 INFORMACION CONVENIO SOLIDARIO 13

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 13

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 14

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 15

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 15

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 16

4.1 INFORME SEMANAL 16

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO 16

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 16

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO 16

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 17

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 17

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO 17

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO SOLIDARIO 17

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 17

- *Seguimiento a la inversión de anticipo: 17*
- *Seguimiento Programa de Obra 17*
- *Seguimiento Programa de Inversiones 17*
- *Actas de Comité de obra 18*
- *Actas de reunión 18*

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 19

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 19

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR: 20

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 22

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC 22

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS. 22

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA. 22

- *Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 22*

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 23

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 23

- *Seguimiento a la inversión del Anticipo 23*
- *Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado. 23*
- *Seguimiento al Plan de Cargas 23*

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24

8 ANEXOS 25

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO..... 25

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 25

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS..... 25

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE. 25

LISTA DE TABLAS

Tabla 3.1- Información general del Convenio Solidario 4167 de 2023 - Vereda Guayabito 14
Tabla 5.1- Información general del Contrato de interventoría No. 4824 de 2023 20

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 2.1 Departamento de Antioquia 8
Imagen 2.2 - Municipio de Amalfi 9
Imagen 2.3 - Vía Amalfi – Vereda Guayabito 9
Imagen 2.4 - Tramo a intervenir 10

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1- MEPI-MN1-IN-15-FR-1 1
ANEXO 2 - MEPI-MN1-IN-15-FR-2 2
ANEXO 3. INFORME SEMANAL - MEPI-MN-IN-15-FR-3 16
ANEXO 4. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA – MEPI-MN1-IN-15-FR-4 16
ANEXO 5. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA - MEPI-MN1-IN-15-FR-6. 16
ANEXO 6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MEPI-MN1-IN-15-FR-10. 17
ANEXO 7. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO – MEPI- MEPI-MN1-IN-15-FR-11. 17
ANEXO 8. SEG GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO - MEPI-MN1-IN-15-FR-12 17
ANEXO 9. ACTA DE COMITÉ DE OBRA- MEPI-MN1-IN-14-FR-1. 18
ANEXO 10. ACTA DE REUNION - MEPI-MN1-IN-14-FR-2 18
ANEXO 11. SEGURIDAD SOCIAL CTO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-7 23
ANEXO 12. INF FINAN Y PTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-9 23
ANEXO 13. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CTO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-13 23
ANEXO 14. CORRESPONDENCIA GENERADA 25
ANEXO 15. REGISTRO FOTOGRÁFICO 25
ANEXO 16. BITÁCORA. 25

1 INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional, a través del instituto Nacional de Vías (INVIAS), dentro del marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, asignó fondos para apoyar el desarrollo del programa ejecutado por organismos y/o juntas de acción comunal, en cumplimiento de la legislación vigente.

El desarrollo de infraestructura vial y la conectividad con municipios y ciudades de las zonas rurales es crucial para su progreso y mejora en términos de movilidad. Estas comunidades experimentan un crecimiento en la calidad de vida de sus habitantes a medida que se fortalece su red vial.

Por consiguiente, la construcción de un camino ancestral en este sector desempeña un buen papel esencial en el mantenimiento y conservación de los caminos en esta área, lo que brinda confianza y seguridad tanto a peatones como a conductores que transitan por esta vía.

El informe siguiente proporciona todos los detalles relacionados con aspectos administrativos, técnicos, financieros, así como información detallada sobre el estado y el progreso del **CONVENIO No. 4167 DE 2023** con objeto **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"** correspondiente al mes de julio. Asimismo, se remite a INVIAS, a la Dirección Territorial Antioquia, al despacho del Supervisor del Contrato de interventoría No. 4824-2023, Ingeniero Mauricio Hoyos Sierra.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN[1]

El municipio de Amalfi se encuentra localizado en la zona nordeste del Departamento de Antioquia, dista 141 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y producción de panela. Tiene una extensión total de 1210 Km cuadrados de los cuales solo 8,5 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El municipio de Amalfi se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 6°54´33" N
Longitud: 75° 04´36" O

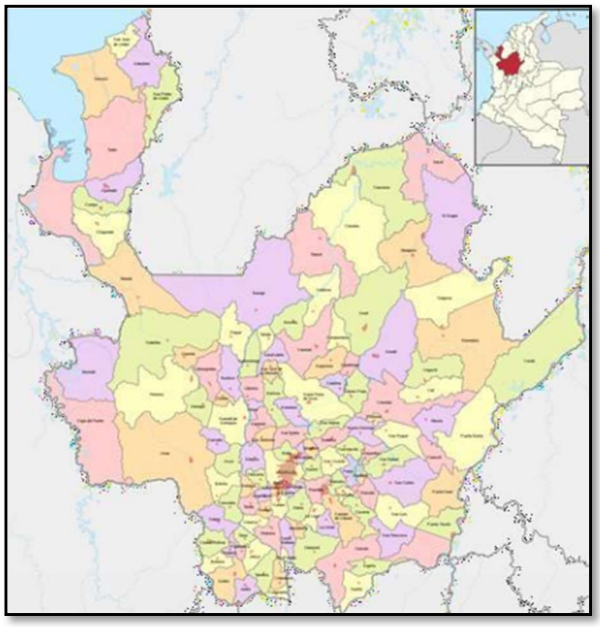


Imagen 2.1 Departamento de Antioquia

[1] Anexo 1 Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, SECOP II. Número del procesoSPSC-CD-CS-721 DE 2023.



Imagen 2.2 - Municipio de Amalfi

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Amalfi del departamento de Antioquia, en la vereda Guayabito, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas (6°48'22.40"N, 75° 5'28.33"O) y punto de referencia final las coordenadas (6°47'4.39"N, 75° 5'27.11"O), de la vía terciaria, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

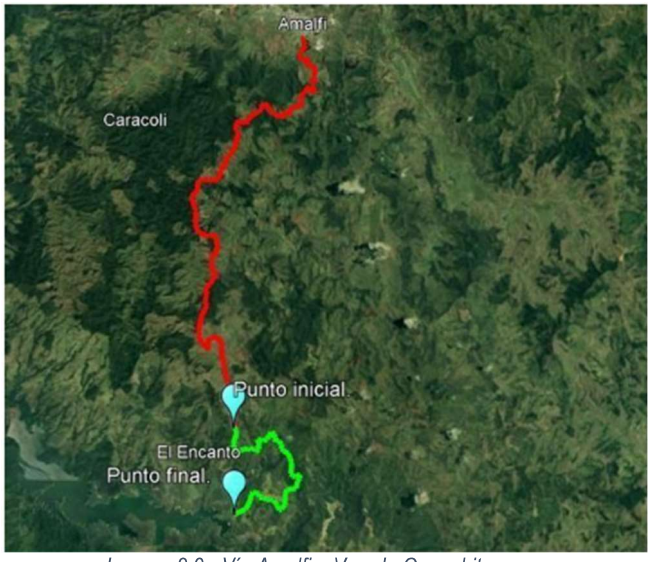


Imagen 2.3 - Vía Amalfi – Vereda Guayabito

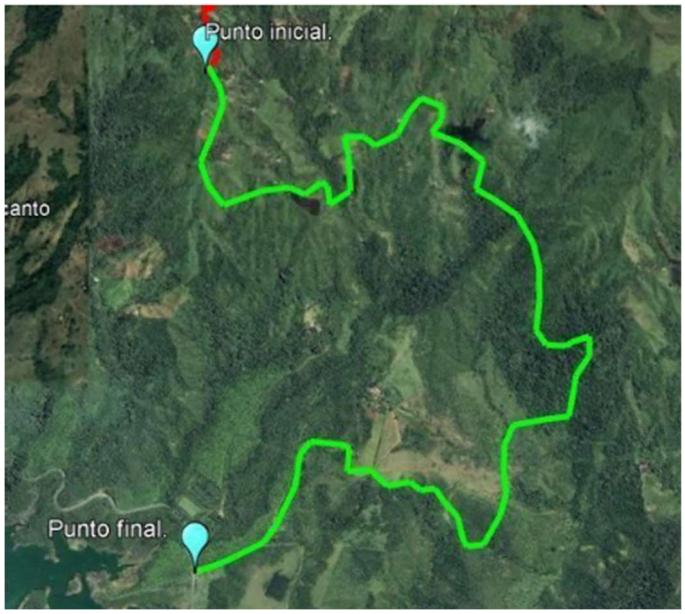


Imagen 2.4 - Tramo a intervenir

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto objeto del convenio de referencia se ejecuta en la vereda Guayabito, zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia.

De su ejecución se beneficia la población de esta vereda directamente y visitantes temporales, mejorando la conectividad de los beneficiarios por cuanto al realizar un manejo de las aguas esto repercute en mejorar el estado de las vías, mejorar la calidad de vida de los habitantes al permitir un mejor acceso a sus veredas.

Es de indicar que de acuerdo con los estudios previos del proyecto a ejecutar se señala por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, que:

> *"Que dentro de las funciones del INVIAS se encuentra la de brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al*

servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región."[2]

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Según reporte de visita ID:1237 realizada por el instituto Nacional de Vías INVIAS, dicha vía tiene el nombre de: Guayabito Vega Mejía, con un ancho promedio de 2.5 metros y 2 carriles. Se identificaron por parte del INVIAS 19 alcantarillas de las cuales 2 no requieren mantenimiento, 1 se debe demoler y 16 requieren mantenimiento. Se identificaron 6 posibles puntos para construcción de alcantarillas y 1 punto para construcción de un Box Coulvert.[3]

Es una vía terciaria que parte en el cruce conocido como Vivero Los Guayacanes Porce II de EPM, que comunica con la vereda Guayabito, la cual se encuentra a nivel de afirmado, en muy mal estado debido a la falta de intervención y adecuación, así como a la falta de alcantarillas para un adecuado manejo de las aguas, condiciones que empeoran en la temporada de lluvias, volviendo casi que intransitables estas vías.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.[4]

Asimismo, según el presupuesto oficial comprende: 80 metros de limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900 mm; 2 Ha de desmonte y limpieza de zonas no boscosas; así como la construcción de 29 metros de alcantarillas en tubería de Concreto Reforzado de 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior, las cuales incluyen las actividades de excavaciones, colocación de solado de limpieza, construcción de obras de encole y descole en concreto reforzado de 21 Mpa y todo lo relacionado con llenos requeridos.

[2] Estudios Previos del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, SECOP II. Número del proceso SPSC-CD-CS-721 DE 2023.
[3] Reporte de visita ID:1237 realizada por el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS - Dirección Técnica y de Estructuración. Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI Grupo SIG. SECOP II. Número del proceso SPSC-CD-CS-721 DE 2023.
[4] Estudios Previos del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, SECOP II. Número del proceso SPSC-CD-CS-721 DE 2023.

De igual manera se contempla la ejecución de actividades ambientales y sociales del programa de adaptación de la guía de manejo socioambiental (PAGA), orientados a evitar, prevenir, corregir y mitigar o compensar los impactos generados en desarrollo del proceso de mejoramiento de la vía mencionada.

No obstante es de indicar que de acuerdo con las especificaciones técnicas del Convenio Solidario suscrito entre la Junta de Acción Comunal y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS *"la definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir"*

Por lo tanto, una vez realizada la concertación y ajustado el presupuesto preliminar se tiene que el alcance de la vereda Guayabito del municipio de Amalfi es el siguiente:

Construcción de cinco (5) alcantarillas en tubería Novafort de 36" de diámetro, las cuales incluyen las actividades de excavaciones, colocación de solado de limpieza, construcción de obras de encole y descole en concreto reforzado de 21 Mpa y todo lo relacionado con llenos requeridos. Por otra parte, se incluye la rehabilitación de una (1) alcantarilla existente con la construcción del descole y la poceta; así mismo se prioriza 68 metros de limpieza a mano de alcantarillas existentes y 2 Ha para desmonte y limpieza de zonas no boscosas.

Los parámetros de diseño y los parámetros geométricos para la construcción de las alcantarillas se desarrollan de acuerdo con el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

3 INFORMACION CONVENIO SOLIDARIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO No. - FECHA	4167 DE 2023
No. DEL PROCESO SECOP II	SPSC-CD-CS-721 DE 2023.
ID DEL CONTRATO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.5506776
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO
CC. O NIT	811.001.227-1
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO ÁNGEL CASTRILLÓN
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR DEL CONTRATO	$ 200.773.257
FECHA DE INICIACIÓN	22 de diciembre del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre del 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	28 de diciembre del 2023
FECHA DE REANUDACION No. 1	17 de enero del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSION No. 1	20 de enero de 2024
FECHA PRORROGA No. 1	19 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1	30 de abril de 2024
FECHA PRORROGA No 2	23 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2	14 de junio de 2024

FECHA PRORROGA No 3	14 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3	30 de julio de 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN	VEREDA GUAYABITO – MUNICIPIO DE AMALFI
SUPERVISOR	MAURICIO HOYOS SIERRA
INTERVENTOR	INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S - CONTRATO No. 4824-2023

Tabla 3.1- Información general del Convenio Solidario 4167 de 2023 - Vereda Guayabito

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el presente periodo se adelantaron varias actividades entre las cuales están:

- Se finalizó la actividad de vaciado para las estructuras (poceta y descole) de la transversal #1.
- Se realizó el relleno con material de excavación para la transversal #1.
- Se realizó limpieza de todos los puntos donde se realizaron las obras.
- Se realizó afinado de las estructuras en concreto de las 4 transversales.
- Se realizó la construcción de una quinta alcantarilla y la rehabilitación de una sexta.
- Se realizó el desmonte de la capa vegetal donde se ubica la transversal #5 y donde está la obra #6 que es la rehabilitación de una transversal ya existente.
- Se realizó excavación manual para las estructuras de la transversal #5.
- Se realizó excavación con maquinaria, la instalación del tubo con su respectivo atraque y relleno con material proveniente de la excavación y posteriormente se ejecutó su compactación.
- Se realizó la construcción de las estructuras para la transversal #5 y la rehabilitación de la transversal #6 existente, con la construcción de descole y la poceta.
- Se realizó el relleno con material de excavación para estas dos obras #5 y #6.

Con respecto a otras actividades se encuentra lo siguiente:

Se remite por parde la J.A.C presupuesto para considerar la construcción de una quinta transversal.

Se programa realización de Comité Operativo.

Se realiza Comité Operativo se aprueba la construcción de una quinta transversal y la rehabilitación de una alcantarilla existente, teniendo en cuenta las necesidades de mejoramiento vial en la vereda.

Se autoriza desembolsos por valor de $51.678.537.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Durante el mes la Junta de Acción Comunal de la vereda Guayabito del municipio de Amalfi – Antioquia continúo avanzando con la construcción de las alcantarillas en ejecución del Convenio Solidario para el mejoramiento vial, y de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Para el efecto se ejecutaron las obras descritas en a las actividades mes para cada transversal, concluyendo de esa forma, con la construcción de cinco alcantarillas, así como la limpieza de alcantarillas existentes, el desmonte y limpieza de zonas no boscosas, y la rehabilitación de una transversal existente.

Se realizaron comités operativos para la toma de decisiones en ejecución del Convenio Solidario y por otra parte se continuó realizando comités de obra como parte del seguimiento al desarrollo de las obras, donde se imparte recomendaciones por parte de la Interventoría

Desde la interventoría se continuó realizando el seguimiento a las actividades del Convenio Solidario, con el fin de que su objeto finalizara a cabalidad, así mismo, se absuelven dudas e inquietudes elevadas por parte de la Junta de Acción Comunal.

Finalmente, según prórroga del Convenio Solidario gestionada en el periodo pasado, se logra concluir la ejecución de las obras.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

El reporte de ejecución mensual del Convenio Solidario y el estado general del proyecto del periodo comprendido en el presente informe, se relaciona en el **ANEXO 2 - MEPI-MN1-IN-15-FR-2.**

4.1 INFORME SEMANAL

El desarrollo semanal del Convenio Solidario se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los informes semanales están suscritos por el director de interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III- Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. Gestión Social, VI. Actividades realizadas en la semana y acumuladas, VII. Actividades a realizar en la siguiente semana, VIII. Esquema grafico avance metas físicas programadas vs metas físicas, XI. Registro fotográfico y XII. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de contratista.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto en el **ANEXO 3. INFORME SEMANAL - MEPI-MN-IN-15-FR-3**

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta el **ANEXO 4. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA – MEPI-MN1-IN-15-FR-4** correspondiente al Convenio Solidario.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta el **ANEXO 5. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA - MEPI-MN1-IN-15-FR-6** en el que se relaciona el personal dispuesto para el periodo del presente informe por la Junta de Acción Comunal.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica la presentación de dicho formato.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Para el mes de julio, el clima por lo general se comportó de buena manera pues la temporada de lluvias disminuyó notablemente y en general se pudo trabajar en obra sin ningún contratiempo debido al clima.

Se adjunta así mismo el **ANEXO 6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MEPI-MN1-IN-15-FR-10.**

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se adjunta resultado de ensayo de laboratorio **ANEXO 7. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO – MEPI-MEPI-MN1-IN-15-FR-11**.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO

Se diligencia el **ANEXO 8. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO - MEPI-MN1-IN-15-FR-12** correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS del Convenio Solidario.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO SOLIDARIO

No aplica la presentación de este formato.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión de anticipo:**

  El Convenio Solidario No. 4167 de 2023 no contempla anticipo en su forma de pago.

- **Seguimiento Programa de Obra**

No aplica para el periodo de presentación del presente informe.

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

  No aplica la presentación de este formato.

- **Actas de Comité de obra**

Se adjunta el **ANEXO 9. ACTA DE COMITÉ DE OBRA- MEPI-MN1-IN-14-FR-1** correspondientes al periodo.

- **Actas de reunión**

Se adjunta el **ANEXO 10. ACTA DE REUNION - MEPI-MN1-IN-14-FR-2** correspondientes al periodo.

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	4824-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4 de diciembre de 2023
No. DEL PROCESO SECOP II	IP-DT-ANT-032-2023
ID DEL CONTRATO EN SECOP II:	CO1.SLCNTR.11776162
CONTRATISTA	INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S RL: Cesar Mauricio Castañeda Salcedo
NIT	900.819.630-1
DIRECCION /TELÉFONO	Calle 2B No. 81A – 460. Cel. 312 2031439
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
PLAZO INICIAL	Hasta 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	22 de diciembre del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre del 2023
SUSPENSIÓN No. 1	28 de diciembre del 2023
FECHA DE REANUDACION No. 1	17 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN SUSPENSION No. 1	20 de enero de 2024
PRORROGA No. 1	19 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1	11 de abril de 2024

PRORROGA No. 2	11 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2	30 de abril de 2024
PRORROGA No. 3	29 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.3	14 de junio de 2024
PRORROGA No. 4	14 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.4	30 de julio de 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 48.711.128
VALOR ACTUAL	$ 48.711.128

Tabla 5.1- Información general del Contrato de interventoría No. 4824 de 2023

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR:

Durante el transcurso del periodo comprendido en el presente informe, la interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del Convenio Solidario No. 4167 de 2023.

- Elaboración informes semanales de interventoría.
- Elaboración de informes mensuales de interventoría
- Se reporta al INVIAS información relacionada con ejecución del Convenio Solidario No. 4167 de 2023.
- Se realiza observaciones al presupuesto presentado por parte de la J.A.C para la construcción del transversal.
- Participación en Comités Operativos.
- Se está en comunicación con las J.A.C para el desarrollo de gestiones administrativas.
- Se realizó las gestiones de acuerdo con rol de la interventoría en lo que tiene que ver con la solicitud de desembolso de las J.A.C presentada en este periodo.
- Se coordina desembolso requerido por parte de la J.A.C y el Banco.
- Se continúa realizando seguimiento en campo a la ejecución de las obras de construcción de alcantarillas en la vereda Guayabito del Municipio de Amalfi.

- Se continúa impartiendo recomendaciones técnicas en cuanto a la construcción de las alcantarillas; con el propósito de realizar la correcta ejecución de las obras teniendo en cuenta los lineamientos, diseños y parámetros en los cuales se fundamenta la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
- Se realizan Comités de Obra.
- Se dan orientaciones a la J.A.C en temas administrativos a su cargo.
- Se atienden consultas de la J.A.C en relación con las actividades del Convenio Solidario.

Actividades Ambientales y SST

- Se asiste a las reuniones virtuales convocadas por el INVAS relacionadas con el Plan de Gestión Ambiental del Programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total".
- Se continúa verificado la señalización de la obra para el mes de julio.
- Se continúa realizando recomendaciones frente a la disposición de residuos y desechos de la obra (Bolsas de cemento, escombros, sobrantes de mezcla, tubos, etc). y limpieza en el lugar de las obras.
- Se dan indicaciones respeto a limpieza de la obra, teniendo en cuenta la finalización de la misma en el mes julio.
- Se verifica la utilización durante la jornada de trabajo de los elementos de protección personal, así como el porte de los uniformes.
- Se continúa realizando recomendaciones respecto a la manipulación y uso de herramientas, previniendo riesgos en su utilización.
- Se realiza relación de equipo y/o maquinaria utilizada por la Junta de Acción Comunal para este periodo.
- Reporte de personal dispuesto en obra semana a semana, según informes semanales presentados por parte de la Interventoría.
- Se verifica en sitio de obra las condiciones de trabajo para el mes de julio.

Actividades Sociales

- Se está en comunicación con la Profesional Social del INVIAS para gestiones propias de este componente por parte de la Interventoría y la J.A.C.

- Comunicación para este periodo con la J.A.C para la atención de temas en el componente social derivados de la ejecución del Convenio Solidario.
- Se asiste a las reuniones virtuales convocadas por el INVAS relacionadas con el componente social.
- Se asiste a capacitación virtual del INVIAS sobre "inclusión social con perspectiva de género" del programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total"
- Se gestiona la entrega de formatos del componente social del proyecto dispuesto por el INVIAS.
- Se atiende solicitudes de información requerida por el INVIAS en lo que tiene que ver con el componente social.
- Acompañamiento a las J.A.C en el diligenciamiento de formatos del componente social.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

En el presente informe no se requirieron informes de los especialistas.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC

En el presente informe no aplica

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

En el presente informe no aplica

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

- **Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.**

En el presente informe no aplica

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el presente informe no aplica

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjunta el **ANEXO 11. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-7** en el que se relaciona el personal de interventoría dispuesto para el periodo del presente informe.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjunta el **ANEXO 12. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-9** en el que se relaciona información financiera y presupuestal del contrato de interventoría.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjunta **ANEXO 13. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-13** en el que se relacionan la póliza del contrato de interventoría (Garantía Única).

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No aplica para este tipo de proyecto.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo**

El contrato de interventoría No. 4824 de 2023 no contempla anticipo en su forma de pago.

- **Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.**

Para el periodo del presente informe no aplica plan de cargas.

- **Seguimiento al Plan de Cargas**

Para el periodo del presente informe no se ha generado seguimiento al plan de cargas.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Junta de Acción Comunal de la vereda Guayabito del municipio de Amalfi – Antioquia, culminó las actividades de obra según alcance definitivo del Convenio Solidario.
- Se logró concluir la obra dentro del plazo establecido en la prórroga No.3 realizada en el mes de junio.
- Teniendo en cuenta la optimización de recursos dentro del Convenio, se logró ejecutar a cabalidad el alcance del Convenio y desarrollar la rehabilitación de una transversal existente.
- Se recomienda y requiere a la J.A.C completar la información que se encuentra pendiente de entrega a la Interventoría.
- Se recomienda a la J.A.C avanzar con gestiones a su cargo para llevar a cabo la liquidación del Convenio Solidario con el INVIAS.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

Correspondencia Enviada (Interventoría):

ASUNTO	REFERENCIA	FECHA DE ENVIO
Reporte de Información INVIAS /JAC	Convenio Solidario 4167 de 2023	08/07/2024

Ver **ANEXO 14.** Correspondencia Generada

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Para el periodo se adjunta registro fotográfico de actividades realizadas en ejecución del Convenio Solidario. **Ver ANEXO 15. REGISTRO FOTOGRÁFICO.**

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

No Aplica para el presente informe.

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.

Para el periodo se adjunta Bitácora **Ver ANEXO 16. BITÁCORA.**
