
hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**		**PI - IN - F11**
			VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES		**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

CAPÍTULO	**4.0**	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS
ITEMS	**4.1.3**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI PARA ESCALERAS. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA METALICA COMPLETA, ANDAMIOS CERTIFICADOS, PARALES, AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES

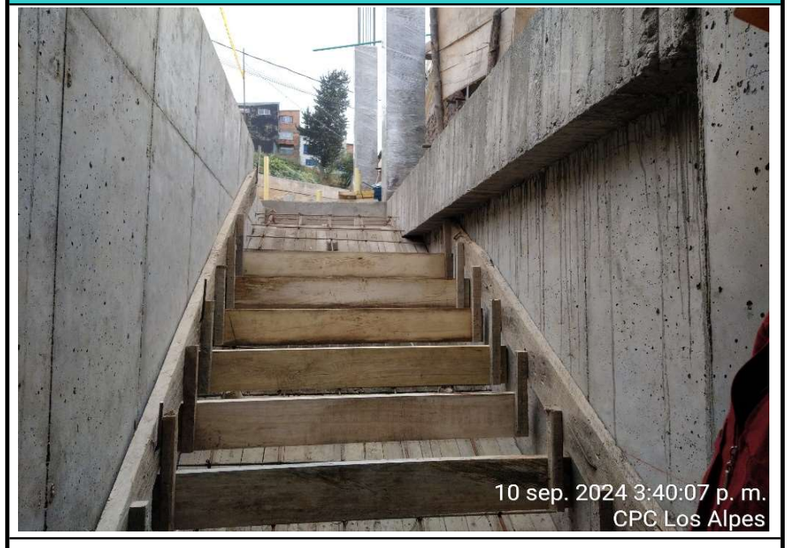

Fotografía No. 1: Item 4.1.3. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Escaleras sótano - piso 1

ANTES



Fotografía No. 2: Item 4.1.3. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Escaleras sótano - piso 1

ANTES



Fotografía No. 3: Item 4.1.3. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Escaleras sótano - piso 1

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**		**PI - IN - F11**
			VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES		**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

CAPÍTULO	**4.0**	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS
ITEMS	**4.1.3**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI PARA ESCALERAS. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA METALICA COMPLETA, ANDAMIOS CERTIFICADOS, PARALES, AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.


DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

DURANTE




Fotografía No. 4: Item 4.1.3. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Escaleras sótano - piso 1

DURANTE

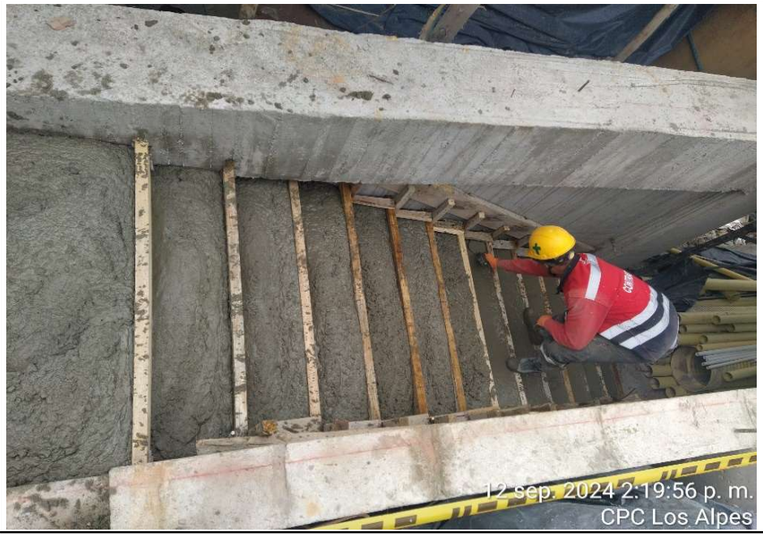

Fotografía No. 5: Item 4.1.3. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Escaleras sótano - piso 1

DURANTE

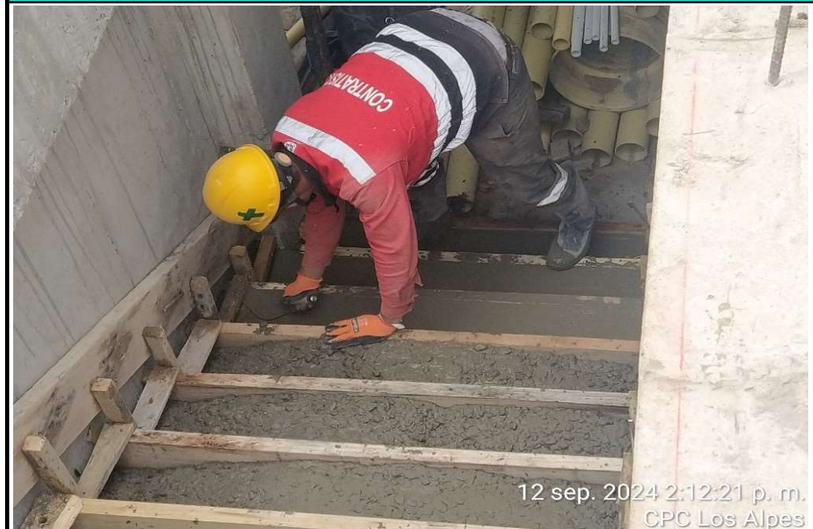

Fotografía No. 6: Item 4.1.3. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Escaleras sótano - piso 1


hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11** **VERSIÓN 01**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

CAPÍTULO	**4.0**	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS
ITEMS	**4.1.3**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI PARA ESCALERAS. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA METALICA COMPLETA, ANDAMIOS CERTIFICADOS, PARALES, AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

DESPUÉS

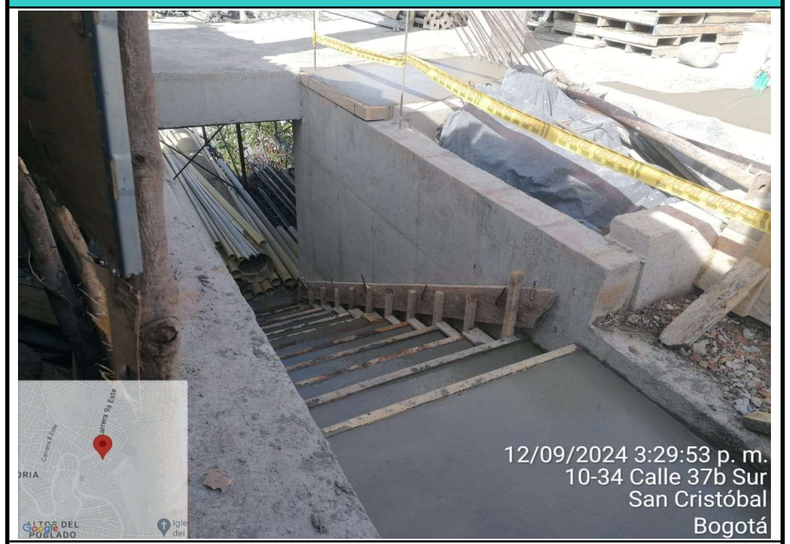

Fotografía No. 7: Item 4.1.3. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Escaleras sótano - piso 1

DESPUÉS



Fotografía No. 8: Item 4.1.3. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Escaleras sótano - piso 1

DESPUÉS



Fotografía No. 9: Item 4.1.3. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Escaleras sótano - piso 1

Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**		**PI - IN - F11**
			VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES		**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

CAPÍTULO	**4.0**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**
ITEMS	**4.2.1**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI .

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES



Fotografía No. 1: Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Escaleras sótano - psio 1

ANTES



Fotografía No. 2: Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Escaleras sótano - psio 1

ANTES



Fotografía No. 3: Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Escaleras sótano - psio 1

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**		**PI - IN - F11**
			VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES		**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

CAPÍTULO	**4.0**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**
ITEMS	**4.2.1**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI .

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

DURANTE	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 4: Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Escaleras sótano - psio 1	**Fotografía No. 5:** Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Escaleras sótano - psio 1	**Fotografía No. 6:** Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Escaleras sótano - psio 1

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**		**PI - IN - F11**
			VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES		**VIGENCIA: 30/09/09**


Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

CAPÍTULO	**4.0**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**
ITEMS	**4.2.1**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI .

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 7: Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Bordillo	**Fotografía No. 8:** Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Bordillo	**Fotografía No. 9:** Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Bordillo

hapil Ingeniería	INFORME SEMANAL		PI - IN - F11
			VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES		VIGENCIA: 30/09/09
Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024
CAPÍTULO	**4.0**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**	
ITEMS	**4.2.1**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI .	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.		

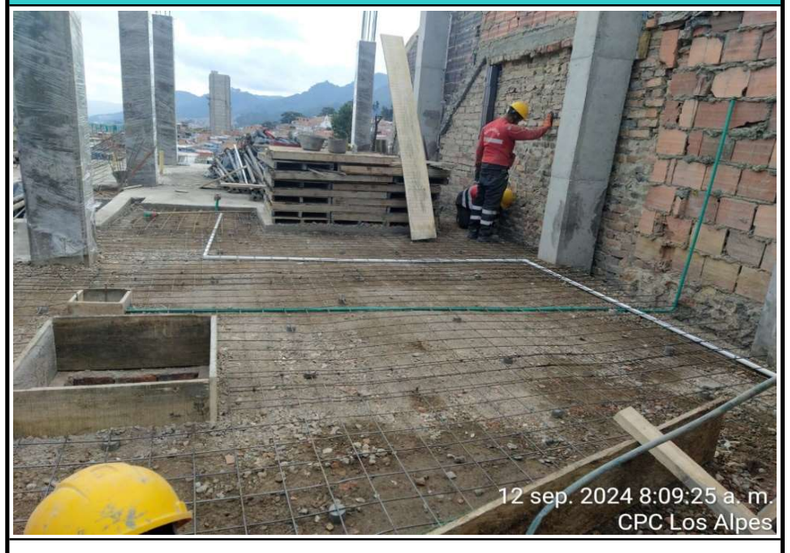ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 10: Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Juntas	**Fotografía No.11:** Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Juntas	**Fotografía No. 12:** Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Juntas

Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11** **VERSIÓN 01**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

CAPÍTULO	**8.4**	**REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)**
ITEMS	**8.4.3**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 2"

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 1: Item 8.4.3 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria PVC-S 2". Contrapiso nivel -0-05m	**Fotografía No. 2:** Item 8.4.3 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria PVC-S 2". Contrapiso nivel -0-05m	**Fotografía No. 3:** Item 8.4.3 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria PVC-S 2". Contrapiso nivel -0-05m

Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11** **VERSIÓN 01**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

CAPÍTULO	**8.4**	**REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)**
ITEMS	**8.4.6**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-P 3"

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 1: Item 8.4.6 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria PVC-S 3". Contrapiso nivel -0-05m	**Fotografía No. 2:** Item 8.4.6 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria PVC-S 3". Contrapiso nivel -0-05m	**Fotografía No. 3:** Item 8.4.6 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria PVC-S 3". Contrapiso nivel -0-05m

Observaciones:

hapil Ingeniería	INFORME SEMANAL		PI - IN - F11 VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES		VIGENCIA: 30/09/09

Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

CAPÍTULO	**8.2**	**REDES DE AGUA FRIA PVC P**
ITEMS	**8.2.3**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED PVC 1" RDE 13.5

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES



Fotografía No. 1: Item 8.2.3 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria PVC 1" RDE 13,5

DURANTE



Fotografía No. 2: Item 8.2.3 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria PVC 1" RDE 13,5

DURANTE



Fotografía No. 3: Item 8.2.3 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria PVC 1" RDE 13,5

Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11** **VERSIÓN 01**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

CAPÍTULO	**8.4**	**REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)**
ITEMS	**8.4.5**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 4"

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 1: Item 8.4.5 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria PVC-S 4". Contrapiso nivel -0-05m	**Fotografía No. 2:** Item 8.4.5 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria PVC-S 4". Contrapiso nivel -0-05m	**Fotografía No. 3:** Item 8.4.5 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria PVC-S 4". Contrapiso nivel -0-05m

Observaciones:

hapil Ingeniería	INFORME SEMANAL		PI - IN - F11 VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES		VIGENCIA: 30/09/09

Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

CAPÍTULO	**NP**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS**
ITEMS	**NP-01**	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES



Fotografía No. 1: Item NP-01 Subbase granular clase a (SBG_A) con reciclado de concreto hidráulico (suministro, extendido manual, humedecimiento y compactación con vibrocompactador)

DURANTE



Fotografía No. 2: Item NP-01 Subbase granular clase a (SBG_A) con reciclado de concreto hidráulico (suministro, extendido manual, humedecimiento y compactación con vibrocompactador)

DURANTE



Fotografía No. 3: Item NP-01 Subbase granular clase a (SBG_A) con reciclado de concreto hidráulico (suministro, extendido manual, humedecimiento y compactación con vibrocompactador)


Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11**
		VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

ANTES	**1.0**	**PRELIMINARES**
ITEMS	**1.1**	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M. (INCLUYE PUERTA PROVISIONAL EN LAMINA DE ZINC CALIBRE 35 PARA ENTRADA VEHICULAR (DIMENSIONES 2.4 X 3.5) Y PUERTA PARA DE TRABAJADORES EN LAMINA DE ZINC CALIBRE 35 DIMENSIONES 1.0 X 2.4 M)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

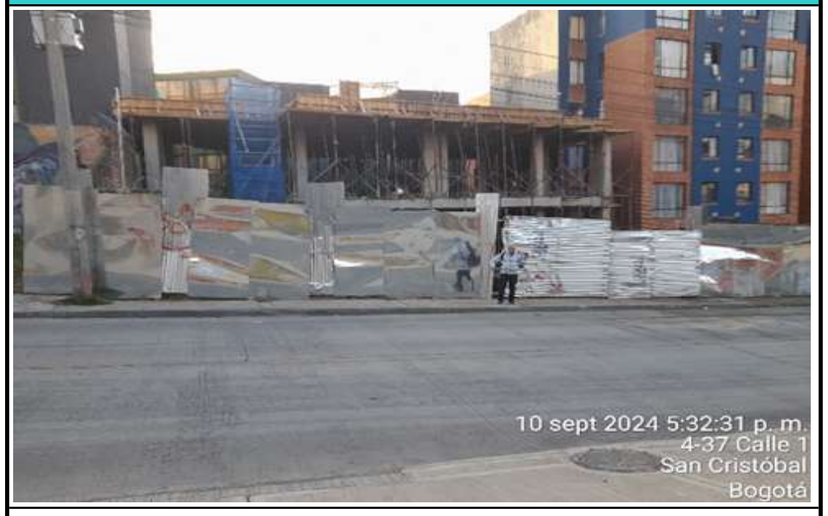ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 1: Item 1.1 Cerramiento en teja de zinc calibre 35 altura = 2.4 m. (Incluye puerta provisional en lamina de zinc calibre 35 para entrada vehicular (dimensiones 2.4 x 3.5) y puerta para de trabajadores en lamina de zinc calibre 35 dimensiones 1.0 x 2.4 m)	**Fotografía No. 2:** Item 1.1 Cerramiento en teja de zinc calibre 35 altura = 2.4 m. (Incluye puerta provisional en lamina de zinc calibre 35 para entrada vehicular (dimensiones 2.4 x 3.5) y puerta para de trabajadores en lamina de zinc calibre 35 dimensiones 1.0 x 2.4 m)	**Fotografía No. 3:** Item 1.1 Cerramiento en teja de zinc calibre 35 altura = 2.4 m. (Incluye puerta provisional en lamina de zinc calibre 35 para entrada vehicular (dimensiones 2.4 x 3.5) y puerta para de trabajadores en lamina de zinc calibre 35 dimensiones 1.0 x 2.4 m)

Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11**
		VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

ANTES	**2.0**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CIMENTACIONES**
ITEMS	**2.3**	CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y OTROS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES	DURANTE	DURANTE
		
Fotografía No. 1: Item 2.3. Cargue, transporte, retiro y disposición final material producto de excavación y otros	**Fotografía No. 2:** Item 2.3. Cargue, transporte, retiro y disposición final material producto de excavación y otros	**Fotografía No. 3:** Item 2.3. Cargue, transporte, retiro y disposición final material producto de excavación y otros

Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11**
		VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

ANTES	**1.0**	**PRELIMINARES**
ITEMS	**1.3**	DEMOLICIÓN DE ZONA GENERAL, INCLUYE MUROS EN MAMPOSTERÍA, ANTEPISO EN CONCRETO, VIGAS DE CIMENTACION, ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS, CUBIERTAS Y EN GENERAL TODO LO EXISTENTE PARA PODER DEJAR EL TERRENO APTO PARA LA NUEVA EDIFICACIÒN, INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL MECANICA Y/O MANUAL, CARGA MECÁNICA SOBRE VOLQUETA. EL PRECIO INCLUYE , CARGUE MECÁNICO, EXCAVACIÓN MECÁNICA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO CERTIFICADO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.	

ANTES



Fotografía No. 1: Item 1.3 Demolición de zona general, incluye muros en mampostería, antepiso en concreto, vigas de cimentacion, zapatas, columnas, vigas, viguetas, cubiertas y en general todo lo existente para poder dejar el terreno apto para la nueva edificaciòn, Incluye demolición total mecanica y/o manual, carga mecánica sobre volqueta. El precio incluye , cargue mecánico, excavación mecánica, retiro y disposición final a botadero certificado.

ANTES



Fotografía No. 2: Item 1.3 Demolición de zona general, incluye muros en mampostería, antepiso en concreto, vigas de cimentacion, zapatas, columnas, vigas, viguetas, cubiertas y en general todo lo existente para poder dejar el terreno apto para la nueva edificaciòn, Incluye demolición total mecanica y/o manual, carga mecánica sobre volqueta. El precio incluye , cargue mecánico, excavación mecánica, retiro y disposición final a botadero certificado.

DURANTE



Fotografía No. 3: Item 1.3 Demolición de zona general, incluye muros en mampostería, antepiso en concreto, vigas de cimentacion, zapatas, columnas, vigas, viguetas, cubiertas y en general todo lo existente para poder dejar el terreno apto para la nueva edificaciòn, Incluye demolición total mecanica y/o manual, carga mecánica sobre volqueta. El precio incluye , cargue mecánico, excavación mecánica, retiro y disposición final a botadero certificado.

Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11** **VERSIÓN 01**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

ANTES	**8.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIOS**
ITEMS	**8.3.1**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 1: Item 8.3.1 Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 4"	**Fotografía No. 2:** Item 8.3.1 Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 4"	**Fotografía No. 3:** Item 8.3.1 Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 4"

Observaciones:

hapil Ingeniería	INFORME SEMANAL		PI - IN - F11 VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS		VIGENCIA: 30/09/09

Periodo Fechas	7/09/2024	AL	13/09/2024

ANTES	**2.0**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CIMENTACIONES**
ITEMS	**2.1**	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES	ANTES	DURANTE
		
Fotografía No. 1: Item 2.1 Excavación manual en material común. Eje 4 a fachada	**Fotografía No. 2:** Item 2.1 Excavación manual en material común. Eje 4 a fachada	**Fotografía No. 3:** Item 2.1 Excavación manual en material común. Eje 4 a fachada

Observaciones:

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	31	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024
HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024		

						TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
1.0	PRELIMINARES									
1.1	Cerramiento en teja de zinc calibre 35 altura = 2.4 m. (Incluye puerta provisional en lamina de zinc calibre 35 para entrada vehicular (dimensiones 2.4 x 3.5) y puerta para de trabajadores en lamina de zinc calibre 35 dimensiones 1.0 x 2.4 m)	ML	$ 101.808	58,05	$ 5.909.954	10,7	$ 1.089.346	47,35	$ 4.820.609	0,53%
1.2	Localización y replanteo topográfico	M2	$ 4.463	175,56	$ 783.524	175,56	$ 783.524	0,00	$ -	0,00%
1.3	Demolición de zona general, incluye muros en mampostería, antepiso en concreto, vigas de cimentacion, zapatas, columnas, vigas, viguetas, cubiertas y en general todo lo existente para poder dejar el terreno apto para la nueva edificaciòn, Incluye demolición total mecanica y/o manual, carga mecánica sobre volqueta. El precio incluye , cargue mecánico, excavación mecánica, retiro y disposición final a botadero certificado.	M2	$ 50.012	536,16	$ 26.814.519	535,96	$ 26.804.432	0,20	$ 10.087	0,00%
1.3					**$ 33.507.998**		**$ 28.677.301,4**		**$ 4.830.696**	**0,53%**
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CIMENTACIONES									
2.1	Excavación manual en material común	M3	$ 26.202	117,51	$ 3.078.997	110,61	$ 2.898.203	6,90	$ 180.794	0,02%
2.2	Suministro,transporte e instalacion de relleno en recebo tipo b400 o similar compactado al 95% P.M	M3	$ 103.788	0,00	$ -					
2.3	Cargue, transporte, retiro y disposicion final material producto de excavación y otros	M3	$ 35.575	332,12	$ 11.815.169	331,554	$ 11.795.034	0,57		
					$ 14.894.167		**$ 14.693.237**		**$ 180.794**	**0,02%**
3.0	CIMENTACION									
3.1	Suministro, transporte e instalacion de concreto de ciclopeo (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)	M3	$ 339.097	50,94	$ 17.273.601	50,94	$ 17.273.601,18	0,00		
3.2	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	M3	$ 711.829	19,15	$ 13.631.525	17,94	$ 12.770.212,26	1,21	$ 861.313	0,10%
3.3	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para muros de contención (No incluye refuerzo)	M3	$ 922.564	16,82	$ 15.517.526	13,79	$ 12.722.157,56	3,03	$ 2.795.369	0,31%
3.4	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de cimentación (No incluye refuerzo)	M3	$ 727.480	19,00	$ 13.822.120	8,99	$ 6.540.045,20	10,01	$ 7.282.075	0,80%
3.5	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de contrapiso e= 10 cm (Incluye corte y dilatación)	M2	$ 80.546	130,18	$ 10.485.478	93,464	$ 7.528.151,34	36,72	$ 2.957.327	0,33%
					$ 70.730.252		**$ 56.834.168**		**$ 13.896.084**	**1,54%**
4.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS									
4.1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ -			
4.1.1	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, H total = 40 cm (Incluye torta superior e= 10 cm, cuantía concreto = 0.19 m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo) .Incluye formaleta completa de entrepiso, parales, casetòn recuperable, plastico para recubrimiento de caseton. agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	$ 256.269	276,59	$ 70.881.309		$ -	276,59	$ 70.881.309	7,83%
4.1.2	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 942.783	20,99	$ 19.789.015	5,62	$ 5.298.440	15,37	$ 14.490.575	1,60%
4.1.3	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 1.254.287	7,85	$ 9.846.153		$ -	7,85	$ 9.846.153	1,09%
4.1.4	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para tanque en concreto, Impermeabilizado, relacion A/C = 0,45, aire incorporado del 6% (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 1.023.677	9,56	$ 9.786.352		$ -	9,56	$ 9.786.352	1,08%
4.1.5	Suministro, transporte e instalacion de cinta PVC O-22 para tanque en concreto	ML	$ 96.307	34,10	$ 3.284.069		$ -	34,10	$ 3.284.069	0,36%
4.1.6	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para foso elevapersonas, (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 975.432	1,82	$ 1.775.286		$ -	1,82	$ 1.775.286	0,20%
4.1.7	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para graderia, (no incluye acero de refuerzo), acabado liso con llana metalica, Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	$ 94.698	0,00	$ -		$ -	0,00		
4.2	ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA				$ -		$ -	0,00	$ -	
4.2.1	Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .	KG	$ 5.367	15151,05	$ 81.315.685	9845,13	$ 52.838.812,71	5305,92	$ 28.476.873	3,15%
4.2.2	Suministro, transporte e instalacion de refuerzo en malla electrosoldada.	KG	$ 6.367	2249,65	$ 14.323.522	332,723	$ 2.118.447,34	1916,93	$ 12.205.074	1,35%
					$ 211.001.391		**$ 60.255.700,5**		**$ 150.745.690**	**16,66%**
5.0	PISOS BASES Y ACABADOS									
5.1	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 para alistado de pisos, e=0,04 máx.	M2	$ 36.096	219,66	$ 7.928.847			219,66	$ 7.928.847	0,88%

EJECUCION SEMANAL CANTIDADES (SEMANAS)

ÍTEM	JUNIO 31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	JULIO 05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	AGOSTO 02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24
1.0														
1.1		10,70												
1.2	175,56													
1.3	492,66		16,00			27,30								
1.3														
2.0														
2.1	43,53	2,04	1,34	24,68	4,68	34,34								
2.2	-													
2.3	331,55													
3.0														
3.1	50,94													
3.2	-				17,94									
3.3	-					13,79			0,18					
3.4	-			3,77	5,22									
3.5	-					93,46				1,42				
4.0														
4.1														
4.1.1	-											42,16		
4.1.2	-					5,62								
4.1.3	-													
4.1.4	-												10,00	1,87
4.1.5	-													
4.1.6	-													1,60
4.1.7	-													
4.2	-													
4.2.1	2.354,24	444,55			3.258,02	3.788,32		13,45		35,86		1.319,55	371,23	
4.2.2	-					332,72						295,40		
5.0														
5.1														

ÍTEM	SEPTIEMBRE 06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	OCTUBRE 04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	NOVIEMBTRE 01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	DIC 29-11-24	06-12-24
3.3	0,06													
3.5	0,79	2,45												
4.1.2	7,14													
4.1.3		1,20												
4.2.1		1.079,45												
4.2.2	20,72	16,39												

	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
	FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	31	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024
HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024		

						TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
5.2	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e = 0.04 máx.	M2	$ 37.913	130,79	$ 4.958.641			130,79	$ 4.958.641	0,55%
5.3	Suministro, transporte e instalación de piso porcelatano. Caliza rectificado marfil caras diferenciadasde primera calidad o similar . Dimensiones 40 x 88 cm	M2	$ 145.339	45,94	$ 6.676.874			45,94	$ 6.676.874	0,74%
5.4	Suministro, transporte e instalación de guardaescobas porcelatano caliza rectificado marfil caras diferenciadas de primera calidad o similar H= 8 cm	ML	$ 25.899	70,88	$ 1.835.721			70,88	$ 1.835.721	0,20%
5.6	Suministro, transporte e instalación de baldosa vibro prensada tipo Deck de Madera 15x60 o similar	M2	$ 121.817	64,99	$ 7.916.887			64,99	$ 7.916.887	0,87%
5.7	Suministro, transporte e instalación de guardaescoba de vibro prensada tipo Deck de Madera H= 7 cm	ML	$ 21.523	63,97	$ 1.376.826			63,97	$ 1.376.826	0,15%
5.8	Suministro, transporte e instalación de cinta antideslizante con Fotoluminiscente x 48mm	ML	$ 13.156	62,00	$ 815.672			62,00	$ 815.672	0,09%
5.9	Suministro, transporte e instalación de mediacaña en granito pulido prefabricado h =10cms	ML	$ 45.730	7,10	$ 324.683			7,10	$ 324.683	0,04%
5.10	Construccion de bocapuerta en granito pulido, ancho 10 cm, Incluye dilatación en bronce por ambos costados	ML	$ 80.474	10,20	$ 820.835			10,20	$ 820.835	0,09%
5.11	Suministro, transporte e instalación de piso ceramico comercial calama multicolor caras diferenciadas 51 x 51	M2	$ 79.878	199,30	$ 15.919.685			199,30	$ 15.919.685	1,76%
					$ 48.574.672		**$ -**		**$ 48.574.672**	**5,37%**
6.0	**MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**									
6.1	Mampostería en bloque nº 5 o similar	M2	$ 52.063	734,91	$ 38.261.385			734,91	$ 38.261.385	4,23%
6.2	Remates sobre muro en concreto de 2500 psi (12x20 cm) (Incluye acero de refuerzo)	ML	$ 65.389	49,95	$ 3.266.181			49,95	$ 3.266.181	0,36%
6.3	Bordillo de remate para placas de cubierta en mamposteria bloque N. 5 o similar	ML	$ 28.142	27,60	$ 776.719			27,60	$ 776.719	0,09%
6.4	Anclaje epoxico D=5/8", profundidad del anclaje 10 cm, Long varilla 1/2" = 70 cm, (Incluye acero de refuerzo)	UND	$ 25.172	235,00	$ 5.915.420			235,00	$ 5.915.420	0,65%
6.5	Columnetas en concreto de 2500 psi., 12 cm x 20 cm incluye acero de refuerzo	ML	$ 61.533	293,96	$ 18.088.376			293,96	$ 18.088.376	2,00%
6.6	Suministro, transporte e instalacion de mueble para cocina completo medidas 2.70 x 0,60 metros. Incluye mueble inferior en melanima e= 15 mm, acabado mate con apariencia a madera natural, poceta en acero inoxidable y griferia , meson en granito negro san gabriel e= 20 mm con salpicadero h= 10 cm. Esfufa de empotrar en acero inoxidable de dos puestos de 34.1 x 42.5 cm a gas natural. Incluye perforaciones para estufa y poceta y en general todo lo requerido para su correcta instalaciòn.	UND	$ 2.980.340	2,00	$ 5.960.680			2,00	$ 5.960.680	0,66%
6.7	Suministro, transporte e instalacion de esquineros sobre mamposteria	ML	$ 11.056	146,98	$ 1.625.023			146,98	$ 1.625.023	0,18%
					$ 73.893.784		**$ -**		**$ 73.893.784**	**8,17%**
7.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
7.1	**SALIDAS ELECTRICAS**									
7.1.01	SALIDA PARA ILUMINACION MONOFASICA , CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE TOMA PARA CONEXIÓN RAPIDA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 189.516	112	$ 21.225.792			112,00	$ 21.225.792	2,35%
7.1.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 181.536	28,00	$ 5.083.008			28,00	$ 5.083.008	0,56%
7.1.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 227.563	11,00	$ 2.503.193			11,00	$ 2.503.193	0,28%
7.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 183.622	12,00	$ 2.203.464			12,00	$ 2.203.464	0,24%
7.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 202.405	3,00	$ 607.215			3,00	$ 607.215	0,07%

SEMANAS — EJECUCION SEMANAL CANTIDADES

JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
31-05-24 07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24		05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24

	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	

Contrato ___X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	31	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024
HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024		

						TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
7.1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 223.050	3,00	$ 669.150			3,00	$ 669.150	0,07%
7.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 219.967	6,00	$ 1.319.802			6,00	$ 1.319.802	0,15%
7.1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 446.577	5,00	$ 2.232.885			5,00	$ 2.232.885	0,25%
7.1.09	SALIDA PARA MOTOR TRIFASICO 3HP, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 204.374	2,00	$ 408.748			2,00	$ 408.748	0,05%
7.2	**CAJAS DE PASO, CANALIZACIONES**				$ -					
7.2.01	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) LISTADO SECRETARIA 5.1.101	UN	$ 755.210	1,00	$ 755.210			1,00	$ 755.210	0,08%
7.2.01.A	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-275 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 1.883.329	1,00	$ 1.883.329			1,00	$ 1.883.329	0,21%
7.2.02	TUBERÍA EMT Ø3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 21.233	24,76	$ 525.729			24,76	$ 525.729	0,06%
7.2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN LISTADO SECRETARIA 5.1.48	ML	$ 171.477	4,81	$ 824.804			4,81	$ 824.804	0,09%
7.2.04	TUBERÍA EMT Ø1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 51.640	9,71	$ 501.424			9,71	$ 501.424	0,06%
7.2.05	CANALETA METALICA 100X40, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 49.051	14,11	$ 692.110			14,11	$ 692.110	0,08%
7.2.06	TUBERÍA EMT Ø2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 72.893	4,00	$ 291.572			4,00	$ 291.572	0,03%
7.2.07	CAJA DE PASO PLASTICA 20X20	UN	$ 122.870	1,00	$ 122.870			1,00	$ 122.870	0,01%
7.3	**ACOMETIDAS, PARCIALES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN**				$ -					
7.3.01	CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	UN	$ 1.559.641	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00%
7.3.2	DERIVACIÓN AEREA EN BAJA TENSION, NORMA ENEL CODENSA AE219, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	UN	$ 2.326.362	1,00	$ 2.326.362			1,00	$ 2.326.362	0,26%
7.3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA. LISTADO SECRETARIA 5.1.23	UN	$ 847.348	1,00	$ 847.348			1,00	$ 847.348	0,09%
7.3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.33	UN	$ 19.032	22,00	$ 418.704			22,00	$ 418.704	0,05%
7.3.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.38	UN	$ 125.868	2,00	$ 251.736			2,00	$ 251.736	0,03%
7.3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS	UN	$ 189.308	1,00	$ 189.308			1,00	$ 189.308	0,02%
7.3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. LISTADO SECRETARIA 5.1.65	UN	$ 419.679	1,00	$ 419.679			1,00	$ 419.679	0,05%
7.3.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X30A, 25KA	UN	$ 319.852	2,00	$ 639.704			2,00	$ 639.704	0,07%
7.3.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3XN.2+N.2N+N.2T SERIE 8000 AL	ML	$ 119.682	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00%
7.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3X35mm + 50mm AILSADO DE 3X2 + 1/0	ML	$ 119.682	13,78	$ 1.649.218			13,78	$ 1.649.218	0,18%
7.3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE 3XN.10F+N.10N+N-1OT EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	ML	$ 26.719	75,00	$ 2.003.925			75,00	$ 2.003.925	0,22%
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 2KVA, 120V, 5 MINUTOS	UN	$ 2.530.904	1,00	$ 2.530.904			1,00	$ 2.530.904	0,28%
7.4	**DATOS**				$ -					

SEMANAS																												
JUNIO					JULIO				AGOSTO						SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24	
EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																												

hapil Ingeniería	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	31	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024
HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO VR. TOTAL	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	%
7.4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK CON 18 UR INCLUYE ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE. LISTADO SECRETARIA 5.1.121	UN	$ 1.575.086	1,00	$ 1.575.086			1,00	$ 1.575.086	0,17%
7.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO. LISTADO SECRETARIA 55.1.68	UN	$ 104.864	4,00	$ 419.456			4,00	$ 419.456	0,05%
7.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP. LISTADO SECRETARIA 5.1.109	ML	$ 5.459	20,28	$ 110.709			20,28	$ 110.709	0,01%
7.4.04	CERTIFICACION PUNTO DE DATOS	UN	$ 7.691	4,00	$ 30.764			4,00	$ 30.764	0,00%
7.5	**ILUMINACION**				$ -					
7.5.01	SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.85	UN	$ 171.134	19,00	$ 3.251.546			19,00	$ 3.251.546	0,36%
7.5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X18W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN,	UN	$ 174.193	14,00	$ 2.438.702			14,00	$ 2.438.702	0,27%
7.5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA LED 60X60, INCLUYE DERIVACIÓN EN CABLE, ENCAUCHETADO 3X14 AWG, CLAVIJA Y MARCO EN ALUMINIO PARA INCRUSTAR. LISTADO SECRETARIA 5.1.174	UN	$ 137.708	44,00	$ 6.059.152			44,00	$ 6.059.152	0,67%
7.5.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN,	UN	$ 119.682	30,00	$ 3.590.460			30,00	$ 3.590.460	0,40%
7.5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.81	UN	$ 79.079	9,00	$ 711.711			9,00	$ 711.711	0,08%
7.6	**VARIOS SISTEMA ELÉCTRICO**				$ -					
7.6.01	Certificación RETIE de uso final bajo resolución de Agosto de 2013 por organismo de certificación avalada por la ONAC	UN	$ 9.133.300	1,00	$ 9.133.300			1,00	$ 9.133.300	1,01%
					$ 80.448.079		**$ -**		**$ 80.448.079**	**8,89%**
8.0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIOS**									
8.1	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PVCP Y AGUA CALIENTE (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)**									
8.1.1	Suministro, transporte e instalación de punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	UN	$ 42.230	13,00	$ 548.990			13,00	$ 548.990	0,06%
8.2	**REDES DE AGUA FRIA PVC P**				$ -					
8.2.1	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1/2" RDE 9	ML	$ 12.266	50,00	$ 613.300			50,00	$ 613.300	0,07%
8.2.2	Suministro, transporte e instalación de red pvc 3/4" RDE 11	ML	$ 13.378	16,00	$ 214.048			16,00	$ 214.048	0,02%
8.2.3	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1" RDE 13.5	ML	$ 16.825	16,00	$ 269.200			16,00	$ 269.200	0,03%
8.2.4	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1 1/2" RDE 21	ML	$ 28.199	14,00	$ 394.786			14,00	$ 394.786	0,04%
8.3	**SALIDAS SANITARIAS (PVCS)**				$ -					
8.3.1	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 4"	UN	$ 153.883	12,00	$ 1.846.596			12,00	$ 1.846.596	0,20%
8.3.2	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 2"	UN	$ 141.690	6,00	$ 850.140			6,00	$ 850.140	0,09%
8.3.3	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/sifón 2"	UN	$ 128.916	13,00	$ 1.675.908			13,00	$ 1.675.908	0,19%
8.3.4	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 4"	UN	$ 99.440	2,00	$ 198.880			2,00	$ 198.880	0,02%
8.3.5	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 3"	UN	$ 22.781	2,00	$ 45.562			2,00	$ 45.562	0,01%
8.4	**REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)**				$ -					
8.4.1	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-l 2"	ML	$ 24.531	36,00	$ 883.116			36,00	$ 883.116	0,10%
8.4.3	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 2"	ML	$ 33.861	10,00	$ 338.610			10,00	$ 338.610	0,04%
8.4.4	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 3"	ML	$ 55.374	126,00	$ 6.977.124			126,00	$ 6.977.124	0,77%
8.4.5	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 4"	ML	$ 66.581	107,00	$ 7.124.167			107,00	$ 7.124.167	0,79%
8.4.6	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-p 3"	ML	$ 83.653	24,00	$ 2.007.672			24,00	$ 2.007.672	0,22%
8.4.7	Suministro, transporte e instalación de tragantes 4" - 6"	UN	$ 69.195	4,00	$ 276.780			4,00	$ 276.780	0,03%
8.4.8	Suministro, transporte e instalación de rejilla 4" - 6"	UN	$ 56.980	6,00	$ 341.880			6,00	$ 341.880	0,04%
8.4.9	Suministro, transporte e instalación de rejilla 3" - 2"	UN	$ 16.292	3,00	$ 48.876			3,00	$ 48.876	0,01%
8.5	**VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION**				$ -					
8.5.1	Suministro, transporte e instalación de valvula de ventilación 2"	UN	$ 121.094	10,00	$ 1.210.940			10,00	$ 1.210.940	0,13%
8.5.2	Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1/2"	UN	$ 93.787	9,00	$ 844.083			9,00	$ 844.083	0,09%
8.5.3	Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1"	UN	$ 146.088	1,00	$ 146.088			1,00	$ 146.088	0,02%
8.5.4	Suministro, transporte e instalación de valvula de retención red white tipo pesado 1"	UN	$ 140.530	1,00	$ 140.530			1,00	$ 140.530	0,02%
8.5.5	Suministro, transporte e instalación de flotador mecanico 3/4"	UN	$ 151.579	1,00	$ 151.579			1,00	$ 151.579	0,02%

EJECUCION SEMANAL CANTIDADES — SEMANAS

ÍTEM	JUNIO 31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	JULIO 05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	AGOSTO 02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	SEPTIEMBRE 06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	OCTUBRE 04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	NOVIEMBTRE 01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	DIC 29-11-24	06-12-24
8.2.3																6,02												
8.3.1															2,00													
8.3.2															2,00													
8.3.3															3,00													
8.3.4												2,00																
8.4.3											10,50					8,40												
8.4.4																4,40												
8.4.5											8,10	2,00			20,70	4,40												
8.4.6															7,80													

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	31	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024
HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO VR. TOTAL	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	%
8.6	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA, CONCRETO Y OTROS**				$ -					
8.6.1	Cajas de inspección de 40 x 40 (medidas internas)	UD	$ 446.232	2,00	$ 892.464			2,00	$ 892.464	0,10%
8.6.2	Cajas de inspección de 60 x 60 (medidas internas)	UD	$ 536.454	2,00	$ 1.072.908			2,00	$ 1.072.908	0,12%
8.6.3	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombeo tipo lapicero trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=2.00 lps y H=25.00 m. Incluye tanque hidroneumático.	UD	$ 10.428.576	1,00	$ 10.428.576			1,00	$ 10.428.576	1,15%
8.6.4	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombas eyectoras trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=10.00 lps y H=7.00 m. Incluye valvulas de compuertas y cheques.	UD	$ 12.351.376	1,00	$ 12.351.376			1,00	$ 12.351.376	1,37%
8.7	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				$ -					
8.7.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m	M3	$ 25.906	56,80	$ 1.471.461			56,80	$ 1.471.461	0,16%
8.7.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	$ 29.316	22,72	$ 666.060			22,72	$ 666.060	0,07%
8.7.3	Relleno con arena de peña	M3	$ 59.782	11,36	$ 679.124			11,36	$ 679.124	0,08%
8.7.4	Retiro de sobrantes a una distancia de 22 km (incluye cargue)	M3	$ 29.461	29,54	$ 870.160			29,54	$ 870.160	0,10%
8.8	**PUNTOS GAS (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)**				$ -					
8.8.1	Suministro, transporte e instalación de punto de gas pealpe 1/2"	UN	$ 50.296	2,00	$ 100.592			2,00	$ 100.592	0,01%
8.9	**REDES DE GAS**				$ -					
8.9.1	Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1620	ML	$ 13.287	5,00	$ 66.435			5,00	$ 66.435	0,01%
8.9.2	Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1216	ML	$ 11.572	6,00	$ 69.432			6,00	$ 69.432	0,01%
8.10	**CENTRO DE VÁLVULAS**				$ -					
8.10.1	Suministro, transporte e instalación de valvula pealpe 1216	UN	$ 40.705	2,00	$ 81.410			2,00	$ 81.410	0,01%
8.11	**RED CONTRA INCENDIO**				$ -					
8.11.1	Suministro, transporte e instalación de punto Gabinetes Clase II	Un.	$ 129.526	3,00	$ 388.578			3,00	$ 388.578	0,04%
8.11.2	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø4"	Un.	$ 194.855	20,00	$ 3.897.100			20,00	$ 3.897.100	0,43%
8.11.3	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø1 1/2"	Un.	$ 64.745	10,00	$ 647.450			10,00	$ 647.450	0,07%
8.11.4	Suministro, transporte e instalación de Siamesa De ø4"×ø2½"×ø2½", inlcuye cheque ranurado de 4"	Un.	$ 2.196.763	1,00	$ 2.196.763			1,00	$ 2.196.763	0,24%
8.11.5	Suministro, transporte e instalación de Gabinete en Lamina Cold Rolled Calibre 20 de 0.77×0.77×0.22, Válvula angular 1½", Soporte tipo canasta, Manguera fibra poliester y caucho 1½"×100', Boquilla chorro y niebla 1½"-Hacha pico 4½" lbs, Llave Spaner-Extintor de polvo	Un.	$ 776.330	3,00	$ 2.328.990			3,00	$ 2.328.990	0,26%
					$ 65.357.733		**$ -**		**$ 65.357.733**	**7,22%**
9.0	**CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS**									
9.1	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e=0,04 máx, para cubiertas	M2	$ 40.328	42,00	$ 1.693.776			42,00	$ 1.693.776	0,19%
9.2	Suministro, transporte e instalación de Cielo Raso de PVC Blanco e= 7 cm, incluye estructura de soporte	M2	$ 77.641	286,30	$ 22.228.618			286,30	$ 22.228.618	2,46%
9.3	Impermeabilización con sika manto -1300 emulsión bituminosa elástica, e= 2 mm. Incluye acabado en pintura reflectiva de aluminio	M2	$ 97.314	42,00	$ 4.087.188			42,00	$ 4.087.188	0,45%
					$ 28.009.583		**$ -**		**$ 28.009.582**	**3,10%**
10.0	**PINTURA Y ACABADO DE MUROS**									
10.1	Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm. (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 26.243	637,58	$ 16.731.881			637,58	$ 16.731.881	1,85%
10.2	Pañete impermeabilizado muros 1:4 e=1.5 cm (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 29.057	831,27	$ 24.154.067			831,27	$ 24.154.067	2,67%
10.3	Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 16.033	601,10	$ 9.637.436			601,10	$ 9.637.436	1,07%
10.4	Pintura tipo acrilica para exteriores, a 3 manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 21.380	484,35	$ 10.355.403			484,35	$ 10.355.403	1,14%
10.5	Pintura epoxica a tres manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 31.893	132,19	$ 4.215.936			132,19	$ 4.215.936	0,47%
10.6	Estuco plástico acrílico (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 19.740	659,01	$ 13.008.857			659,01	$ 13.008.857	1,44%
10.7	Enchape cerámico pared blanco tipo Jaya cara unica 25 cm x 43 cm Blanca de primera calidad o similar	M2	$ 82.066	226,14	$ 18.557.995			226,14	$ 18.557.995	2,05%
10.8	Suministro, transporte e instalacion de meson en policuarzo, espesor 2 cm, incluyen faldon frontal de 10 cm, ancho 60 cm.	ML	$ 537.038	5,40	$ 2.900.005			5,40	$ 2.900.005	0,32%
					$ 99.561.581		**$ -**		**$ 99.561.580**	**11,00%**
11.0	**CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, DIVISIONES Y OTROS)**									
11.1	**CARPINTERIA METALICA Y OTROS**									
11.1.1	Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia . V01- V05	M2	$ 573.523	13,45	$ 7.713.884			13,45	$ 7.713.884	0,85%

SEMANAS — EJECUCION SEMANAL CANTIDADES

ÍTEM	JUNIO 31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	JULIO 05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	AGOSTO 02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	SEPTIEMBRE 06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	OCTUBRE 04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	NOVIEMBTRE 01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	DIC 29-11-24	06-12-24
8.6.2												1,00																

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X___ Convenio _____		INFORME EJECUTIVO SEMANA No	31	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024
HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024		

												SEMANAS																									
												JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
						TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR				31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%		EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																											
11.1.2	Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia.V02- V03- V04	M2	$ 477.672	10,35	$ 4.943.905			10,35	$ 4.943.905	0,55%																												
11.1.3	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V06 -V07	M2	$ 488.920		$ -			0,00																														
11.1.4	Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P6). No incluye cerradura	M2	$ 526.440	21,55	$ 11.344.782			21,55	$ 11.344.782	1,25%																												
11.1.5	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3 -P5). No incluye cerradura	M2	$ 512.238	10,80	$ 5.532.170			10,80	$ 5.532.170	0,61%																												
11.1.6	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2	$ 493.010	4,86	$ 2.396.029			4,86	$ 2.396.029	0,26%																												
11.1.7	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV02- PV03	M2	$ 467.769	51,83	$ 24.244.467			51,83	$ 24.244.467	2,68%																												
11.1.8	Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia . V01- V03	M2	$ 573.523		$ -			0,00																														
11.1.9	Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia.V02- V06	M2	$ 477.672		$ -			0,00																														
11.1.10	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada proyectante con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V04	M2	$ 513.916		$ -			0,00																														
11.1.11	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V05	M2	$ 488.920		$ -			0,00																														

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio ______	**INFORME EJECUTIVO SEMANA No**	**31**	**CONTRATO / CONVENIO No.**	**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**				
MUNICIPIO	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**7/09/2024**
HASTA:	**13/09/2024**	**FECHA INFORME:**	**13/09/2024**		

						TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**V. UNITARIO**	**REVISADA**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**%**
11.1.12	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV04	M2	$ 467.769		$ -			0,00		
11.1.13	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija, corrediza y montante superior tipo persiana, en sistem tradicional 3831 con aln 1101, pisavidrio plano riel superior rodachinas ducasse chapa pico loro llave llave haladera, persiana superior aln 315 vidrio laminado incoloro 3+3. PV2 - PV3	M2	$ 578.330		$ -			0,00		
11.1.14	Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P5). No incluye cerradura	M2	$ 526.440		$ -			0,00		
11.1.15	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3). No incluye cerradura	M2	$ 512.238	4,80	$ 2.458.742			4,80	$ 2.458.742	0,27%
11.1.16	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2	$ 493.010	4,86	$ 2.396.029			4,86	$ 2.396.029	0,26%
11.1.17	Suministro, transporte e instalación de porton metalico corredizo lámina coldrolled lisa calibre 18, con bisagras y pasador, terminada con anticorrosivo, y esmalte sintetico. medidas (2,30 x 2,40 m) . incluye cerradura de sobreponer	UND	$ 2.406.479		$ -			0,00		
11.1.18	Suministro, transporte e instalacion de cerradura cilíndrica de manija júpiter a50ws cromo mate schlage	UND	$ 103.989	21,00	$ 2.183.769			21,00	$ 2.183.769	0,24%
11.2	**BARANDAS Y PASA MANOS**				$ -					
11.2.1	Suministro, transporte e instalacion de baranda en acero inoxidable 304, calibre 18, pasamanos en tubo de 2" y entramado horizontal en tuberia de 1/2" calibre 18. incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa. Segun diseño.	ML	$ 661.954	13,50	$ 8.936.379			13,50	$ 8.936.379	0,99%
11.2.2	Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable 304, calibre 18, Tuberia de 2". incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa o muro. Segun diseño	ML	$ 189.066	8,60	$ 1.625.968			8,60	$ 1.625.968	0,18%
11.3	**DIVISIONES Y ESPEJOS**				$ -					
11.3.1	Suministro, transporte e instalación de espejo flotado biselado de 4 mm. Incluye estructura de soporye 1 x 1/2",profundidad 1 cm.	M2	$ 254.618	3,20	$ 814.778			3,20	$ 814.778	0,09%
					$ 74.590.903		**$ -**		**$ 74.590.902**	**8,24%**
12.0	**APARATOS SANITARIOS**									
12.1	Suministro, transporte e instalación de Taza Baltica entrada posterior. (Incluye Taza Báltica Plus Entrada Posterior de Ref. 113121001. Sistema Instalación Entrada Posterior de Ref. O15300001. Válvula Antivandálica de Ref. 751250001. Asiento Sanitario Institucional Forte de Ref. 609551001 y brida sanitaria)	UND	$ 1.442.940	4,00	$ 5.771.760			4,00	$ 5.771.760	0,64%
12.2	Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye grifería)	UND	$ 790.606	4,00	$ 3.162.424			4,00	$ 3.162.424	0,35%
12.3	Suministro, transporte e instalación de grifería lavamanos Monocontrol Dakar Media	UND	$ 212.545	4,00	$ 850.180			4,00	$ 850.180	0,09%

SEMANAS — **EJECUCION SEMANAL CANTIDADES**

JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24

hapil Ingeniería	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio ______		INFORME EJECUTIVO SEMANA No	31		CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023			
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"								
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024	HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO VR. TOTAL	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	%
12.4	Suministro, transporte e instalación de juegos de barra de seguridad (Incluye barra plegable REF 706590001, barra de seguridad recta REF 706550001, accesorios de anclajes y escudos)	UND	$ 977.512	4,00	$ 3.910.048			4,00	$ 3.910.048	0,43%
					$ 13.694.412		**$ -**		**$ 13.694.412**	**1,51%**
13.0	**EQUIPOS ESPECIALES**									
13	**PLATAFORMA ELEVAPERSONAS**				$ -					
13.1	Suministro transporte e instalacion de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende tres pisos, tres paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	UND	$ 127.844.901	0,00	$ -			0,00	$ -	
13.2	Suministro e instalación de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende cuatro pisos, cuatro paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. El equipo cuenta con los elementos de la norma NTC5926-1,. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	UND	$ 104.967.841	0,00	$ -			0,00	$ -	
					$ -		**$ -**		**$ -**	**0,00%**
14.0	**VARIOS**									
14.1	Aseo general final y limpieza	M2	$ 3.614	557,93	$ 2.016.359			557,93	$ 2.016.359	0,22%
14.2	Suministro, transporte e instalación de aviso nomenclatura exterior, en acrilico de 10 mm cristal con frente en acero satinado 304 calibre 22, incluye instalacion con cinta doble faz y pegado industrial	UND	$ 4.758.930	1,00	$ 4.758.930			1,00	$ 4.758.930	
14.3	Sumistro, transporte e instalacion de jardineras prefabricas en cemento acanalada, medidas 100 cm x 60 cm x 30 cm. Impermeabilizada interiormente. No incluye terra negra, ni elemento vegetal.	UND	$ 239.869	12,00	$ 2.878.428			12,00	$ 2.878.428	0,32%
					$ 9.653.718		**$ -**		**$ 9.653.717**	**0,54%**
	SUMA				**$ 823.918.273**		**$ 160.460.406**		**$ 663.437.725**	**72,80%**
	NP									
NP-01	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 161.255,00	45,59	$ 7.351.615	39,734	$ 6.407.306	5,86	$ 944.309	0,10%
NP-05	CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI PARA CAISSON D= 1.50M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE ACELERANTE, MOTOBOMBA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO, DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM Y FORMALETA	ML	$ 3.195.040,00	18,00	$ 57.510.720	15,9	$ 50.801.136	2,10	$ 6.709.584	0,74%
NP-06	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	$ 416.064,00	10,00	$ 4.160.640	4,374	$ 1.819.864	5,63	$ 2.340.776	0,26%
NP-07	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.	ML	$ 11.848.280,00	1,00	$ 11.848.280	0		1,00	$ 11.848.280	1,31%
					$ 80.871.256		**59.028.306,11**		**21.842.949,34**	**2,41%**
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 904.789.529**		**$ 219.488.713**		**$ 685.280.674**	**75,21%**

SEMANAS — EJECUCION SEMANAL CANTIDADES

ÍTEM	JUNIO 31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	JULIO 05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	AGOSTO 02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	SEPTIEMBRE 06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	OCTUBRE 04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	NOVIEMBTRE 01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	DIC 29-11-24	06-12-24
NP-01						39,73						4,00	21,00	7,00		42,00												
NP-05		4,23	3,20	4,40	2,80	1,27																						
NP-06			1,36	3,01							0,72																	
NP-07																												
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**7,55%**	**1,88%**	**1,28%**	**2,07%**	**4,77%**	**6,71%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,02%**	**0,03%**	**0,13%**	**2,35%**	**1,73%**	**0,52%**	**1,10%**	**1,69%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	7,55%	**9,43%**	**10,71%**	**12,78%**	**17,55%**	**24,26%**	**24,26%**	**24,27%**	**24,28%**	**24,32%**	**24,45%**	**26,80%**	**28,53%**	**29,05%**	**30,16%**	**31,85%**	**31,85%**	**#####**	**#####**	**#####**	**#####**	**#####**	**#####**	**#####**	**#####**	**#####**	**#####**	**#####**

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	31	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"

MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024	HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024

											SEMANAS																									
											JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
											31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
			846,26		1177,11																															
				TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR																															
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																													
1.0	**PRELIMINARES**																																			
1.1	Cerramiento en teja de zinc calibre 35 altura = 2.4 m. (Incluye puerta provisional en lamina de zinc calibre 35 para entrada vehicular (dimensiones 2.4 x 3.5) y puerta para de trabajadores en lamina de	ML	20,20	5,00	$ 509.040	15,20	$ 1.547.482	0,09%	-					5,00												15,20												
1.2	Localización y replanteo topográfico	M2	356,01	356,01	$ 1.588.873	0,00	$ -		356,01																												
1,3	Demolición de zona general, incluye muros en mampostería, antepiso en concreto, vigas de cimentacion, zapatas, columnas, vigas, viguetas, cubiertas y en general todo lo existente para poder dejar el terreno apto para la nueva edificación, Incluye demolición total mecanica y/o manual, carga mecánica sobre volqueta. El precio incluye , cargue mecánico, excavación mecánica, retiro y disposición final a botadero certificado.	M2	182,50	182,50	$ 9.127.190	0,00	$ -		172,84					25,66																							
1.3					**$ 11.225.103**		**$ 1.547.482**	**0,09%**																														
2.0	**MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CIMENTACIONES**																																			
2.1	Excavación manual en material común	M3	1177,11	1100,94	$ 28.846.830	76,17	$ 1.995.806	0,12%	1.094,19	67,92															15,00	360,00											
2.2	Suministro,transporte e instalacion de relleno en recebo tipo b400 o similar compactado al 95% P.M	M3	0,00		$ -	0,00	$ -																													
2.3	Cargue, transporte, retiro y disposicion final material producto de excavación y otros	M3	1988,13	1477,75	$ 52.571.063	510,38	$ 18.156.715	1,06%	1.465,81	11,94											312,00					980,00											
					$ 81.417.893		**$ 20.152.521**	**1,18%**																														
3.0	**CIMENTACION**																																			
3.1	Suministro, transporte e instalacion de concreto de ciclopeo (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)	M3	85,27	85,27	$ 28.914.801	0,00	$ -		85,27					28,36																							
3.2	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	M3	30,52	30,52	$ 21.725.021	0,00	$ -	0,00%	30,52																												
3.3	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para muros de contención (No incluye refuerzo)	M3	0,00		$ -	0,00	$ -																													
3.4	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de cimentación (No incluye refuerzo)	M3	43,23	40,93	$ 29.775.756	2,30	$ 1.673.204	0,10%	37,25					3,68												2,30											
3.5	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de contrapiso e= 10 cm (Incluye corte y dilatación)	M2	338,96	230,36	$ 18.554.738	108,60	$ 8.747.135	0,51%						230,36																							
					$ 98.970.316		**$ 10.420.339**	**0,61%**																														
4.0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**																																			
4,1	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**																																			
4.1	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, H total = 40 cm (Incluye torta superior e= 10 cm, cuantía concreto = 0.19 m3/m2 - según diseño) (no incluye acero de refuerzo) .Incluye formaleta completa de entrepiso, parales, casetón recuperable, plastico para recubrimiento de caseton. agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0,00	0,00	$ -		$ -																														
4.2	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0,00	0,00	$ -		$ -																														
4.3	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	7,88	0,00	$ -	7,88	$ 9.883.782	0,58%																														
4.4	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para tanque en concreto, Impermeabilizado, relacion A/C = 0,45, aire incorporado del 6% (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	10,95	0,00	$ -	10,95	$ 11.209.263	0,66%																														
4.5	Suministro, transporte e instalacion de cinta PVC O-22 para tanque en concreto	ML	75,76	0,00	$ -	75,76	$ 7.296.218	0,43%																														
4.6	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para foso elevapersonas, (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	2,02	0,00	$ -	2,02	$ 1.970.373	0,12%																2,35													
4.1.7	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para graderia, (no incluye acero de refuerzo), acabado liso con llana metalica, Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0,00	0,00	$ -		$ -																														

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	31	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"

MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024	HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024

											SEMANAS																									
											JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC
											31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
			846,26			1177,11																														
				TOTAL EJECUTADO			POR EJECUTAR																															
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	CANTIDAD	VR. TOTAL		CANTIDAD	VR. TOTAL		%	EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																											
4,2	**ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA**																																				
4.7	Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .	KG	28849,09	27334,10	$	146.702.099	1514,99	$	8.130.967	0,48%	18.192,97	120,00	161,77		536,01	8.323,35				418,86	3.247,36	2.150,00	2.150,00	1.437,61		1.503,02												
4.8	Suministro, transporte e instalacion de refuerzo en malla electrosoldada.	KG	4372,60	1423,62	$	9.064.214	4372,60	$	27.840.344	1,63%						1.423,62							708,51	862,25	1.225,18												
					$	**155.766.313**		**$**	**66.330.947**	**3,88%**																											
5.0	**PISOS BASES Y ACABADOS**																																				
5.1	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 para alistado de pisos, e=0,04 máx.	M2	337,57		$	-	337,57	$	12.184.927	0,71%																											
5.2	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e = 0.04 máx.	M2	504,11		$	-	504,11	$	19.112.322	1,12%																											
5.3	Suministro, transporte e instalación de piso porcelatano. Caliza rectificado marfil caras diferenciadasde primera calidad o similar . Dimensiones 40 x 88 cm	M2	399,18		$	-	399,18	$	58.016.422	3,39%																											
5.4	Suministro, transporte e instalación de guardaescobas porcelatano caliza rectificado marfil caras diferenciadas de primera calidad o similar H= 8 cm	ML	181,38		$	-	181,38	$	4.697.561	0,27%																											
5.6	Suministro, transporte e instalación de baldosa vibro prensada tipo Deck de Madera 15x60 o similar	M2	112,45		$	-	112,45	$	13.698.322	0,80%																											
5.7	Suministro, transporte e instalación de guardaescoba de vibro prensada tipo Deck de Madera H= 7 cm	ML	146,21		$	-	146,21	$	3.146.878	0,18%																											
5.8	Suministro, transporte e instalación de cinta antideslizante con Fotoluminiscente x 48mm	ML	97,50		$	-	97,50	$	1.282.710	0,08%																											
5.9	Suministro, transporte e instalación de mediacaña en granito pulido prefabricado h =10cms	ML	128,87		$	-	128,87	$	5.893.225	0,34%																											
5.10	Construccion de bocapuerta en granito pulido, ancho 10 cm, Incluye dilatación en bronce por ambos costados	ML	24,25		$	-	24,25	$	1.951.495	0,11%																											
5.11	Suministro, transporte e instalación de piso ceramico comercial calama multicolor caras diferenciadas 51 x 51	M2	54,01		$	-	54,01	$	4.314.211	0,25%																											
								$	**124.298.072**	**7,27%**																											
6.0	**MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**		**0**																																	
6.1	Mampostería en bloque nº 5 o similar	M2	744,01		$	-	744,01	$	38.735.393	2,27%																											
6.2	Remates sobre muro en concreto de 2500 psi (12x20 cm) (Incluye acero de refuerzo)	ML	87,57		$	-	87,57	$	5.726.115	0,34%																											
6.3	Bordillo de remate para placas de cubierta en mamposteria bloque N. 5 o similar	ML	63,71		$	-	63,71	$	1.792.927	0,10%																											
6.4	Anclaje epoxico D=5/8", profundidad del anclaje 10 cm, Long varilla 1/2" = 70 cm, (Incluye acero de refuerzo)	UND	280,00		$	-	280,00	$	7.048.160	0,41%																											
6.5	Columnetas en concreto de 2500 psi., 12 cm x 20 cm incluye acero de refuerzo	ML	497,00		$	-	497,00	$	30.581.901	1,79%																											
6.6	Suministro, transporte e instalacion de mueble para cocina completo medidas 2.70 x 0,60 metros. Incluye mueble inferior en melanima e= 15 mm, acabado mate con apariencia a madera natural, poceta en acero inoxidable y griferia , meson en granito negro san gabriel e= 20 mm con salpicadero h= 10 cm. Esfufa de empotrar en acero inoxidable de dos puestos de 34.1 x 42.5 cm a gas natural. Incluye perforaciones para estufa y poceta y en general todo lo requerido para su correcta instalación.	UND	2,00		$	-	2,00	$	5.960.680	0,35%																											
6.7	Suministro, transporte e instalacion de esquineros sobre mamposteria	ML	117,80		$	-	117,80	$	1.302.397	0,08%																											
								$	**91.147.572**	**5,33%**																											
7.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																																				
7,1	**SALIDAS ELECTRICAS**				$	-																															
7,1,01	SALIDA PARA ILUMINACION MONOFASICA , CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE TOMA PARA CONEXIÓN RAPIDA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	160,00		$	-	160,00	$	30.322.560	1,77%																											
7,1,02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	28,00		$	-	28,00	$	5.083.008	0,30%																											

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	31	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"

MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024	HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024

846,26 1177,11

				TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR			SEMANAS																											
									JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
									31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																											
7,1,03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	15,00		$ -	15,00	$ 3.413.445	0,20%																												
7,1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	14,00		$ -	14,00	$ 2.570.708	0,15%																												
7,1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00		$ -	1,00	$ 202.405	0,01%																												
7,1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00		$ -	4,00	$ 892.200	0,05%																												
7,1,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00		$ -	6,00	$ 1.319.802	0,08%																												
7,1,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00		$ -	10,00	$ 4.465.770	0,26%																												
7,1,09	SALIDA PARA MOTOR TRIFASICO 3HP. CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00		$ -	2,00	$ 408.748	0,02%																												
7,2	**CAJAS DE PASO, CANALIZACIONES**				$ -																														
7,2,01	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) LISTADO SECRETARIA 5.1.101	UN	2,00		$ -	2,00	$ 1.510.420	0,09%																												
7.2.01.A	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-275 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0,00		$ -		$ -																												
7,2,02	TUBERÍA EMT Ø3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	47,37		$ -	47,37	$ 1.005.807	0,06%																												
7,2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN LISTADO SECRETARIA 5.1.48	ML	19,85		$ -	19,85	$ 3.403.818	0,20%																												
7,2,04	TUBERÍA EMT Ø1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	20,29		$ -	20,29	$ 1.047.776	0,06%																												
7,2,05	CANALETA METALICA 100X40, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	15,89		$ -	15,89	$ 779.420	0,05%																												
7,2,06	TUBERÍA EMT Ø2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	6,00		$ -	6,00	$ 437.358	0,03%																												
7,2,07	CAJA DE PASO PLASTICA 20X20	UN	1,00		$ -	1,00	$ 122.870	0,01%																												
7,3	**ACOMETIDAS, PARCIALES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN**																																		
7,3,01	CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	UN	1,00		$ -	1,00	$ 1.559.641	0,09%																												
7.3.2	DERIVACIÓN AEREA EN BAJA TENSION, NORMA ENEL CODENSA AE219, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	UN	0,00		$ -		$ -																												
7,3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA. LISTADO SECRETARIA 5.1.23	UN	1,00		$ -	1,00	$ 847.348	0,05%																												
7,3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.33	UN	22,00		$ -	22,00	$ 418.704	0,02%																												
7,3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.38	UN	2,00		$ -	2,00	$ 251.736	0,01%																												
7,3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS	UN	1,00		$ -	1,00	$ 189.308	0,01%																												
7,3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. LISTADO SECRETARIA 5.1.65	UN	1,00		$ -	1,00	$ 419.679	0,02%																												

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	31	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"			

MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024	HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024

													SEMANAS																							
													JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
													31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
			846,26			1177,11																																		
				TOTAL EJECUTADO				POR EJECUTAR																																		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	CANTIDAD		VR. TOTAL		CANTIDAD		VR. TOTAL		%	EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																													
7,3,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X30A, 25KA	UN	2,00		$	-	2,00	$	639.704	0,04%																														
7,3,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3XN.2+N.2N+N.2T SERIE 8000 AL	ML	40,00		$	-	40,00	$	4.787.280	0,28%																														
7,3,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3X35mm + 50mm AILSADO DE 3X2 + 1/0	ML	12,79		$	-	12,79	$	1.530.733	0,09%																														
7,3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE 3XN.10F+N.10N+N-1OT EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	ML	0,00		$	-		$	-																														
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 2KVA, 120V, 5 MINUTOS	UN	1,00		$	-	1,00	$	2.530.904	0,15%																														
7,4	**DATOS**				$	-																																		
7,4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK CON 18 UR INCLUYE ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE. LISTADO SECRETARIA 5.1.121	UN	1,00		$	-	1,00	$	1.575.086	0,09%																														
7,4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO. LISTADO SECRETARIA 55.1.68	UN	3,00		$	-	3,00	$	314.592	0,02%																														
7,4,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP. LISTADO SECRETARIA 5.1.109	ML	15,72		$	-	15,72	$	85.815	0,01%																														
7,4,04	CERTIFICACION PUNTO DE DATOS	UN	3,00		$	-	3,00	$	23.073	0,00%																														
7,5	**ILUMINACION**																																							
7,5,01	SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.85	UN	27,00		$	-	27,00	$	4.620.618	0,27%																														
7,5,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X18W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN,	UN	26,00		$	-	26,00	$	4.529.018	0,26%																														
7,5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA LED 60X60, INCLUYE DERIVACIÓN EN CABLE, ENCAUCHETADO 3X14 AWG, CLAVIJA Y MARCO EN ALUMINIO PARA INCRUSTAR. LISTADO SECRETARIA 5.1.174	UN	61,00		$	-	61,00	$	8.400.188	0,49%																														
7,5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN,	UN	42,00		$	-	42,00	$	5.026.644	0,29%																														
7,5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.81	UN	12,00		$	-	12,00	$	948.948	0,06%																														
7,6	**VARIOS SISTEMA ELÉCTRICO**				$	-																																		
7,6,01	Certificación RETIE de uso final bajo resolución de Agosto de 2013 por organismo de certificación avalada por la ONAC	UN	1,00		$	-	1,00	$	9.133.300	0,53%																														
								$	**104.818.435**	**6,13%**																														
8.0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIOS**																																							
8.1	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PVCP Y AGUA CALIENTE (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)**				$	-																																		
8.1.1	Suministro, transporte e instalación de punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	UN	17,00		$	-	17,00	$	717.910	0,04%																														
8.2	**REDES DE AGUA FRIA PVC P**																																							
8.2.1	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1/2" RDE 9	ML	78,00		$	-	78,00	$	956.748	0,06%																														
8.2.2	Suministro, transporte e instalación de red pvc 3/4" RDE 11	ML	3,00		$	-	3,00	$	40.134	0,00%																														
8.2.3	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1" RDE 13.5	ML	53,00		$	-	53,00	$	891.725	0,05%																														
8.2.4	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1 1/2" RDE 21	ML	14,00		$	-	14,00	$	394.786	0,02%																														
8.3	**SALIDAS SANITARIAS (PVCS)**																																							
8.3.1	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 4"	UN	5,00		$	-	5,00	$	769.415	0,05%													2,00		2,00	4,00				5,00										
8.3.2	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 2"	UN	7,00		$	-	7,00	$	991.830	0,06%													6,00			7,00													
8.3.3	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/sifón 2"	UN	7,00		$	-	7,00	$	902.412	0,05%															3,00														
8.3.4	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 4"	UN	13,00		$	-	13,00	$	1.292.720	0,08%															6,00														
8.3.5	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 3"	UN	0,00		$	-		$	-																														
8.4	**REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)**																																							
8.4.1	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-l 2"	ML	19,00		$	-	19,00	$	466.089	0,03%																														
8.4.3	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 2"	ML	132,00		$	-	132,00	$	4.469.652	0,26%															11,00														
8.4.4	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 3"	ML	12,00		$	-	12,00	$	664.488	0,04%																														
8.4.5	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 4"	ML	151,00		$	-	151,00	$	10.053.731	0,59%											10,00	8,00			43,50														

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	31	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"

MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024	HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024

846,26

1177,11

				TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR			SEMANAS																									
									JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
									31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																											
8.4.6	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-p 3"	ML	36,00		$ -	36,00	$ 3.011.508	0,18%																											
8.4.7	Suministro, transporte e instalación de tragantes 4" - 6"	UN	11,00		$ -	11,00	$ 761.145	0,04%																											
8.4.8	Suministro, transporte e instalación de rejilla 4" - 6"	UN	0,00		$ -		$ -																											
8.4.9	Suministro, transporte e instalación de rejilla 3" - 2"	UN	0,00		$ -		$ -																											
8.5	**VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION**																																	
8.5.1	Suministro, transporte e instalación de valvula de ventilación 2"	UN	13,00		$ -	13,00	$ 1.574.222	0,09%																											
8.5.2	Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1/2"	UN	14,00		$ -	14,00	$ 1.313.018	0,08%																											
8.5.3	Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1"	UN	3,00		$ -	3,00	$ 438.264	0,03%																											
8.5.4	Suministro, transporte e instalación de valvula de retención red white tipo pesado 1"	UN	1,00		$ -	1,00	$ 140.530	0,01%																											
8.5.5	Suministro, transporte e instalación de flotador mecanico 3/4"	UN	1,00		$ -	1,00	$ 151.579	0,01%																											
8.6	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA, CONCRETO Y OTROS**																																	
8.6.1	Cajas de inspección de 40 x 40 (medidas internas)	UD	1,00		$ -	1,00	$ 446.232	0,03%																											
8.6.2	Cajas de inspección de 60 x 60 (medidas internas)	UD	1,00		$ -	1,00	$ 536.454	0,03%																											
8.6.3	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombeo tipo lapicero trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=2.00 lps y H=25.00 m. Incluye tanque hidroneumático.	UD	1,00		$ -	1,00	$ 10.428.576	0,61%																											
8.6.4	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombas eyectoras trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=10.00 lps y H=7.00 m. Incluye valvulas de compuertas y cheques.	UD	1,00		$ -	1,00	$ 12.351.376	0,72%																											
8.7	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																																	
8.7.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m	M3	10,80		$ -	10,80	$ 279.785	0,02%																											
8.7.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	4,32		$ -	4,32	$ 126.645	0,01%																											
8.7.3	Relleno con arena de peña	M3	2,16		$ -	2,16	$ 129.129	0,01%																											
8.7.4	Retiro de sobrantes a una distancia de 22 km (incluye cargue)	M3	5,62		$ -	5,62	$ 165.453	0,01%																											
8.8	**PUNTOS GAS (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)**																																	
8.8.1	Suministro, transporte e instalación de punto de gas pealpe 1/2"	UN	2,00		$ -	2,00	$ 100.592	0,01%																											
8.9	**REDES DE GAS**																																	
8.9.1	Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1620	ML	4,00		$ -	4,00	$ 53.148	0,00%																											
8.9.2	Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1216	ML	4,00		$ -	4,00	$ 46.288	0,00%																											
8.10	**CENTRO DE VÁLVULAS**																																	
8.10.1	Suministro, transporte e instalación de valvula pealpe 1216	UN	2,00		$ -	2,00	$ 81.410	0,00%																											
8.11	**RED CONTRA INCENDIO**																																	
8.11.1	Suministro, transporte e instalación de punto Gabinetes Clase II	Un.	3,00		$ -	3,00	$ 388.578	0,02%																											
8.11.2	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø4"	Un.	12,00		$ -	12,00	$ 2.338.260	0,14%																											
8.11.3	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø1 1/2"	Un.	16,00		$ -	16,00	$ 1.035.920	0,06%																											
8.11.4	Suministro, transporte e instalación de Siamesa De ø4"×ø2½"×ø2½", inlcuye cheque ranurado de 4"	Un.	1,00		$ -	1,00	$ 2.196.763	0,13%																											
8.11.5	Suministro, transporte e instalación de Gabinete en Lamina Cold Rolled Calibre 20 de 0.77×0.77×0.22, Válvula angular 1½", Soporte tipo canasta, Manguera fibra poliester y caucho 1½"×100', Boquilla chorro y niebla 1½"-Hacha pico 4½" lbs, Llave Spaner-Extintor de polvo	Un.	3,00		$ -	3,00	$ 2.328.990	0,14%																											
							$ 63.035.505	**3,69%**																											
9	**CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS**																																	
9.1	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e=0,04 máx, para cubiertas	M2	213,00		$ -	213,00	$ 8.589.864	0,50%																											
9.2	Suministro, transporte e instalación de Cielo Raso de PVC Blanco e= 7 cm, incluye estructura de soporte	M2	403,40		$ -	403,40	$ 31.320.379	1,83%																											
9.3	Impermeabilización con sika manto -1300 emulsión bituminosa elástica, e= 2 mm. Incluye acabado en pintura reflectiva de aluminio	M2	403,00		$ -	403,00	$ 39.217.542	2,29%																											
							$ 79.127.785	**4,63%**																											
10	**PINTURA Y ACABADO DE MUROS**																																	
10.1	Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm. (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	669,41		$ -	669,41	$ 17.567.195	1,03%																											
10.2	Pañete impermeabilizado muros 1:4 e=1.5 cm (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	798,27		$ -	798,27	$ 23.195.331	1,36%																											
10.3	Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	669,41		$ -	669,41	$ 10.732.570	0,63%																											
10.4	Pintura tipo acrilica para exteriores, a 3 manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	581,42		$ -	581,42	$ 12.430.760	0,73%																											
10.5	Pintura epoxica a tres manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	62,33		$ -	62,33	$ 1.987.891	0,12%																											
10.6	Estuco plástico acrilico (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1250,83		$ -	1250,83	$ 24.691.286	1,44%																											
10.7	Enchape cerámico pared blanco tipo Jaya cara unica 25 cm x 43 cm Blanca de primera calidad o similar	M2	206,80		$ -	206,80	$ 16.971.249	0,99%																											
10.8	Suministro, transporte e instalacion de meson en policuarzo, espesor 2 cm, incluyen faldon frontal de 10 cm, ancho 60 cm.	ML	6,20		$ -	6,20	$ 3.329.636	0,19%																											

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	31	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"

MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024	HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024

846,26

1177,11

				TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR			SEMANAS																											
									JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
									31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																											
							$ 110.905.917	6,49%																													
11	CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, DIVISIONES Y OTROS)																																		
11.1	CARPINTERIA METALICA Y OTROS																																		
11.1.1	Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia . V01- V05	M2	39,05		$ -	39,05	$ 22.396.073	1,31%																												
11.1.2	Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia.V02- V03- V04	M2	88,77		$ -	88,77	$ 42.402.943	2,48%																												
11.1.3	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V06 -V07	M2	21,60		$ -	21,60	$ 10.560.672	0,62%																												
11.1.4	Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P6). No incluye cerradura	M2	21,36		$ -	21,36	$ 11.244.758	0,66%																												
11.1.5	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3 -P5). No incluye cerradura	M2	22,32		$ -	22,32	$ 11.433.152	0,67%																												
11.1.6	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2	7,20		$ -	7,20	$ 3.549.672	0,21%																												
11.1.7	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV02- PV03	M2	29,25		$ -	29,25	$ 13.682.243	0,80%																												
11.1.8	Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia . V01- V03	M2	22,00		$ -	22,00	$ 12.617.506	0,74%																												
11.1.9	Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia.V02- V06	M2	10,30		$ -	10,30	$ 4.920.022	0,29%																												
11.1.10	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada proyectante con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V04	M2	7,75		$ -	7,75	$ 3.982.849	0,23%																												
11.1.11	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V05	M2	12,00		$ -	12,00	$ 5.867.040	0,34%																												

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	31	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"

MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024	HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024

											SEMANAS																									
											JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE					DIC	
											31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
			846,26		1177,11																																	
				TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR																																	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																															
11.1.12	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV04	M2	19,86		$ -	19,86	$ 9.289.892	0,54%																															
11.1.13	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija, corredizа y montante superior tipo persiana, en sistem tradicional 3831 con aln 1101, pisavidrio plano riel superior rodachinas ducasse chapa pico loro llave llave haladera, persiana superior aln 315 vidrio laminado incoloro 3+3. PV2 - PV3	M2	41,12		$ -	41,12	$ 23.780.930	1,39%																															
11.1.14	Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P5). No incluye cerradura	M2	24,66		$ -	24,66	$ 12.982.010	0,76%																															
11.1.15	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3). No incluye cerradura	M2	9,60		$ -	9,60	$ 4.917.485	0,29%																															
11.1.16	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2			$ -		$ -																															
11.1.17	Suministro, transporte e instalación de porton metalico corredizo lámina coldrolled lisa calibre 18, con bisagras y pasador, terminada con anticorrosivo, y esmalte sintetico. medidas (2,30 x 2,40 m) . incluye cerradura de sobreponer	UND	1,00		$ -	1,00	$ 2.406.479	0,14%																															
11.1.18	Suministro, transporte e instalacion de cerradura cilíndrica de manija júpiter a50ws cromo mate schlage	UND	20,00		$ -	20,00	$ 2.079.780	0,12%																															
11,2	**BARANDAS Y PASA MANOS**																																					
11.2.1	Suministro, transporte e instalacion de baranda en acero inoxidable 304, calibre 18, pasamanos en tubo de 2" y entramado horizontal en tuberia de 1/2" calibre 18. incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa. Segun diseño.	ML	20,00		$ -	20,00	$ 13.239.080	0,77%																															
11.2.2	Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable 304, calibre 18, Tuberia de 2". incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa o muro. Segun diseño	ML	35,00		$ -	35,00	$ 6.617.310	0,39%																															
11,3	**DIVISIONES Y ESPEJOS**																																					
11.3.1	Suministro, transporte e instalación de espejo flotado biselado de 4 mm. Incluye estructura de soporye 1 x 1/2",profundidad 1 cm.	M2	4,00		$ -	4,00	$ 1.018.472	0,06%																															
							$ 218.988.369	**12,81%**																															
12	**APARATOS SANITARIOS**																																					
12.1	Suministro, transporte e instalación de Taza Baltica entrada posterior. (Incluye Taza Báltica Plus Entrada Posterior de Ref. 113121001. Sistema Instalación Entrada Posterior de Ref. O15300001. Válvula Antivandálica de Ref. 751250001. Asiento Sanitario Institucional Forte de Ref. 609551001 y brida sanitaria)	UND	5,00		$ -	5,00	$ 7.214.700	0,42%																															
12.2	Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye grifería)	UND	5,00		$ -	5,00	$ 3.953.030	0,23%																															
12.3	Suministro, transporte e instalación de grifería lavamanos Monocontrol Dakar Media	UND	5,00		$ -	5,00	$ 1.062.725	0,06%																															
12.4	Suministro, transporte e instalación de juegos de barra de seguridad (Incluye barra plegable REF 706590001, barra de seguridad recta REF 706550001, accesorios de anclajes y escudos)	UND	4,00		$ -	4,00	$ 3.910.048	0,23%																															
							$ 16.140.503	**0,94%**																															
13	**EQUIPOS ESPECIALES**																																					
13	**PLATAFORMA ELEVAPERSONAS**																																					
13,1	Suministro transporte e instalacion de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende tres pisos, tres paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	UND	0,00		$ -		$ -																															

hapil Ingeniería	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES				
Contrato ___X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	31	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024	HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024

846,26

1177,11

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO VR. TOTAL	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VR. TOTAL	%
13,2	Suministro e instalación de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende cuatro pisos, cuatro paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. El equipo cuenta con los elementos de la norma NTC5926-1,. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	UND	1,00		$ -		$ -	
							$ -	**0,00%**
14	**VARIOS**							
14.1	Aseo general final y limpieza	M2	1157,91		$ -	1157,91	$ 4.184.687	0,24%
14.2	Suministro, transporte e instalación de aviso nomenclatura exterior, en acrilico de 10 mm cristal con frente en acero satinado 304 calibre 22, incluye instalacion con cinta doble faz y pegado industrial	UND	1,00		$ -		$ -	
14,3	Sumistro, transporte e instalacion de jardineras prefabricas en cemento acanalada, medidas 100 cm x 60 cm x 30 cm. Impermeabilizada interiormente. No incluye terra negra, ni elemento vegetal.	UND	0,00		$ -		$ -	
							$ 4.184.687	**0,24%**
	SUMA				**$ 347.379.624**		**$ 911.098.134**	**53,30%**
	NP							
NP-01	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	400,00	192,36	$ 31.019.657	207,64	$ 33.482.343	1,96%
NP-02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI, PARA PLACA DE ENTREPISO CON VIGAS DESCOLGADAS, H TOTAL = 40 CM (INCLUYE TORTA SUPERIOR E= 10 CM, CUANTÍA CONCRETO = 0.19 M3/M2 -SEGÚN DISEÑO) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA COMPLETA DE ENTREPISO, PARALES, CASETÓN RECUPERABLE, PLÁSTICO PARA RECUBRIMIENTO DE CASETÓN. AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	627,16	154,77	$ 43.246.266	472,40	$ 132.002.195	7,72%
NP-03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI PARA COLUMNAS. (NO INCLUYE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA METÁLICA COMPLETA, ANDAMIOS CERTIFICADOS, PARALES, AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	41,68	12,35	$ 12.334.019	29,33	$ 29.292.047	1,71%
NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI, PARA MUROS DE CONTENCIÓN (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	68,13	9,22	$ 9.023.607	58,91	$ 57.640.712	3,37%
NP-06	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	5,00	2,07	$ 861.252	2,93	$ 1.219.068	0,07%
					96.484.801,13		**253.636.364,48**	**14,84%**
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 443.864.426**		**$ 1.164.734.499**	**68,14%**

SEMANAS – EJECUCION SEMANAL CANTIDADES (JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE)

ÍTEM	31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24
13,2																		
14.1																		
14.2																		
14,3																		
NP-01						192,36						102,5				88,00		
NP-02						154,77							201,47		205,09			
NP-03						12,35						13,25		15,83				
NP-04						9,22												
NP-06		2,07																
	15,59%	**0,22%**	**0,05%**	**0,00%**	**0,17%**	**10,65%**	**0,04%**	**0,03%**	**0,00%**	**0,20%**	**1,02%**	**3,33%**	**4,33%**	**1,83%**	**3,83%**	**4,13%**	**0,00%**	**0,00%**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**15,59%**	**15,80%**	**15,86%**	**15,86%**	**16,02%**	**26,67%**	**26,71%**	**26,74%**	**26,74%**	**26,94%**	**27,96%**	**31,29%**	**35,62%**	**37,45%**	**41,28%**	**45,41%**	**45,41%**	**45,41%**

SEMANAS – EJECUCION SEMANAL CANTIDADES (OCTUBRE, NOVIEMBTRE, DIC)

ÍTEM	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**45,41%**	**45,41%**	**45,41%**	**45,41%**	**45,41%**	**45,41%**	**45,41%**	**45,41%**	**45,41%**	**45,41%**

hapil Ingeniería	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____			INFORME EJECUTIVO SEMANA No		31		CONTRATO / CONVENIO No.		FDLSC-COP-928-2023
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:			CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"						
MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024	HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME: 13/09/2024

PROGRAMADO VS EJECUTADO ALPES

		SEMANAS																									
		JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC	
		31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
PROGRAMADO	SEMANAL	13,08%	5,88%	0,30%	0,30%	0,77%	0,99%	1,58%	1,00%	0,71%	0,73%	0,67%	0,73%	0,50%	0,54%	2,21%	3,01%	2,84%	4,26%	5,98%	6,24%	6,26%	6,64%	7,07%	5,70%	5,51%	6,66%	6,59%	3,23%
	ACUMULADO	13,08%	18,96%	19,27%	19,57%	20,34%	21,33%	22,90%	23,90%	24,62%	25,35%	26,02%	26,75%	27,25%	27,79%	30,00%	33,01%	35,85%	40,11%	46,09%	52,33%	58,59%	65,23%	72,30%	78,00%	83,52%	90,18%	96,77%	100,00%
EJECUTADO	SEMANAL	7,56%	1,88%	1,28%	2,07%	4,77%	6,71%	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,13%	2,35%	1,73%	0,52%	1,10%	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ACUMULADO	7,56%	9,44%	10,72%	12,79%	17,56%	24,27%	24,27%	24,28%	24,29%	24,33%	24,46%	26,81%	28,54%	29,06%	30,17%	31,86%	31,86%	31,86%	31,86%	31,86%	31,86%	31,86%	31,86%	31,86%	31,86%	31,86%	31,86%	31,86%
ADELANTO/ATRASO		0,00%	-9,53%	-8,54%	-6,78%	-2,78%	2,94%	1,36%	0,37%	-0,32%	-1,02%	-1,56%	0,06%	1,29%	1,27%	0,17%	-1,16%												

PROGRAMADO VS EJECUTADO BRISAS


		SEMANAS																									
		JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC	
		31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
PROGRAMADO	SEMANAL	16,59%	1,36%	0,21%	0,41%	0,38%	1,94%	3,79%	3,92%	2,20%	1,92%	1,72%	2,78%	3,12%	2,99%	4,09%	4,10%	3,68%	4,80%	4,13%	3,28%	2,49%	3,67%	3,78%	3,59%	3,65%	4,82%	3,18%	7,43%
	ACUMULADO	16,59%	17,95%	18,16%	18,57%	18,95%	20,89%	24,67%	28,59%	30,79%	32,71%	34,44%	37,22%	40,34%	43,33%	47,42%	51,51%	55,20%	60,00%	64,13%	67,40%	69,90%	73,57%	77,35%	80,93%	84,58%	89,41%	92,59%	100,02%
EJECUTADO	SEMANAL	15,59%	0,22%	0,05%	0,00%	0,17%	10,65%	0,04%	0,03%	0,00%	0,20%	1,02%	3,33%	4,33%	1,83%	3,83%	4,13%	0,00%	0,20%	0,20%	1,02%	1,02%	3,33%	3,33%	4,33%	4,33%	1,83%	1,83%	3,83%
	ACUMULADO	15,59%	15,80%	15,86%	15,86%	16,02%	26,67%	26,71%	26,74%	26,74%	26,94%	27,96%	31,29%	35,62%	37,45%	41,28%	45,41%	45,41%	45,61%	45,81%	46,83%	47,85%	51,18%	54,51%	58,84%	63,17%	65,00%	66,83%	70,66%
ADELANTO/ATRASO		0,00%	-2,15%	-2,30%	-2,71%	-2,92%	5,79%	2,04%	-1,85%	-4,05%	-5,77%	-6,48%	-5,93%	-4,72%	-5,88%	-6,14%	-6,10%												


PROGRAMADO VS EJECUTADO OBRA SALONES


		SEMANAS																									
		JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC	
		31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
PROGRAMADO	SEMANAL	15,38%	2,93%	0,24%	0,37%	0,51%	1,61%	3,02%	2,91%	1,68%	1,51%	1,36%	2,07%	2,21%	2,14%	3,44%	3,72%	3,39%	4,61%	4,77%	4,30%	3,80%	4,70%	4,92%	4,32%	4,30%	5,46%	4,36%	5,97%
	ACUMULADO	15,38%	18,30%	18,54%	18,91%	19,43%	21,04%	24,06%	26,97%	28,65%	30,16%	31,52%	33,59%	35,81%	37,95%	41,39%	45,11%	48,50%	53,11%	57,88%	62,18%	65,98%	70,68%	75,60%	79,92%	84,21%	89,68%	94,04%	100,01%
EJECUTADO	SEMANAL	12,81%	0,79%	0,48%	0,72%	1,76%	9,28%	0,03%	0,023%	0,01%	0,14%	0,71%	2,99%	3,43%	1,38%	2,89%	3,28%	0,00%	0,13%	0,13%	0,67%	0,67%	2,18%	2,18%	2,83%	2,83%	1,20%	1,20%	2,51%
	ACUMULADO	12,81%	12,62%	13,29%	14,32%	16,79%	25,47%	25,49%	25,51%	25,52%	25,63%	26,21%	29,05%	32,08%	34,55%	37,43%	40,72%	40,72%	40,85%	40,98%	41,64%	42,31%	44,49%	46,67%	49,50%	52,32%	53,52%	54,72%	57,22%
ADELANTO/ATRASO		0,00%	-5,68%	-5,25%	-4,59%	-2,64%	4,43%	1,43%	-1,46%	-3,13%	-4,53%	-5,31%	-4,54%	-3,73%	-3,40%	-3,95%	-4,39%												

hapil Ingeniería	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____			INFORME EJECUTIVO SEMANA No		31		CONTRATO / CONVENIO No.		FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:			CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"							
MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	7/09/2024	HASTA:	13/09/2024	FECHA INFORME:	13/09/2024

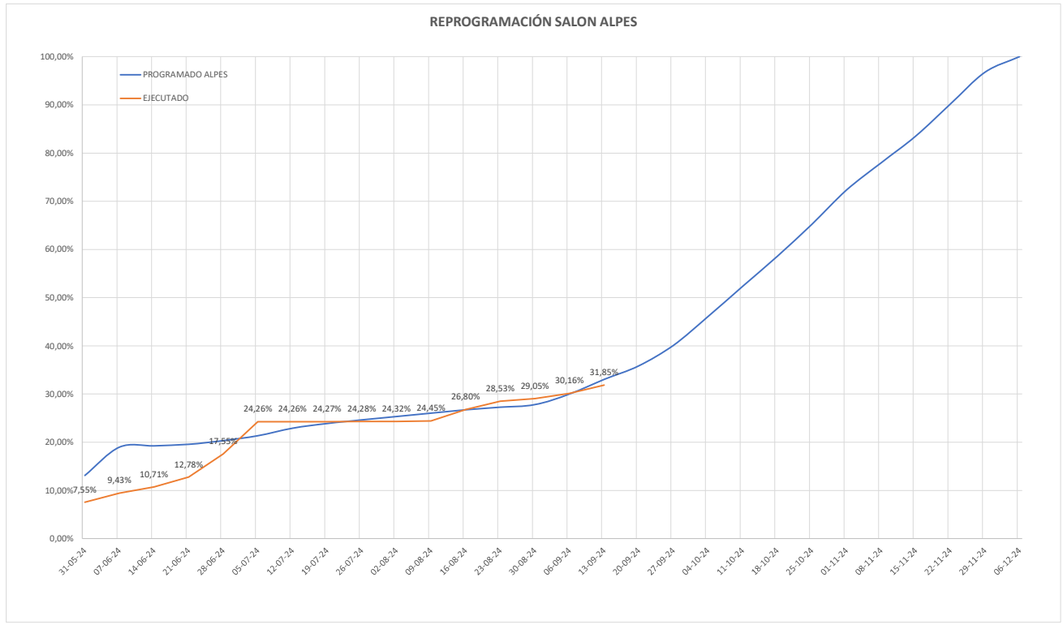

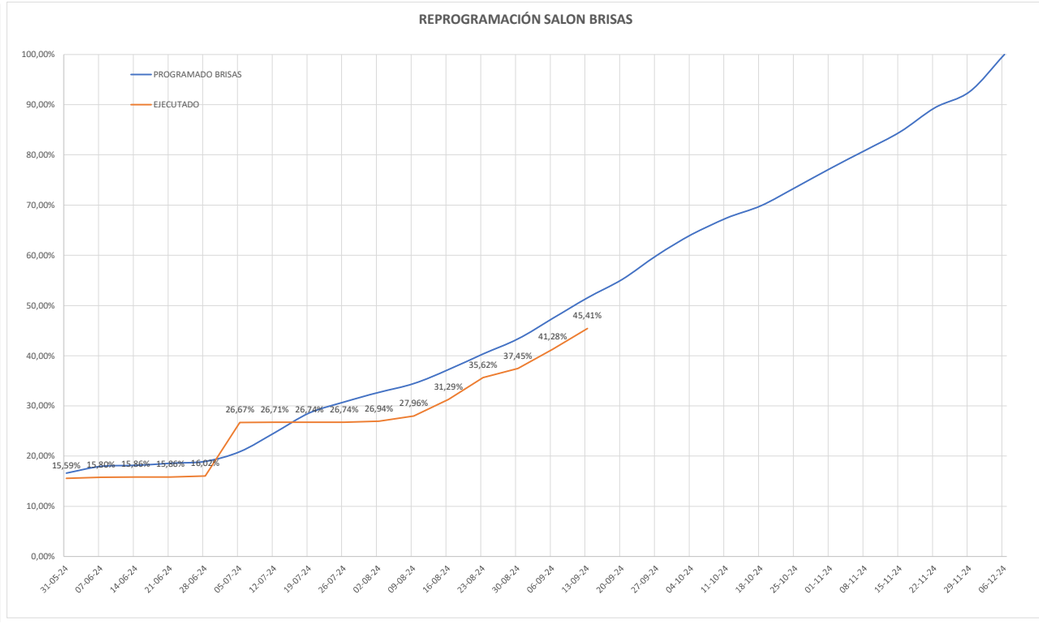

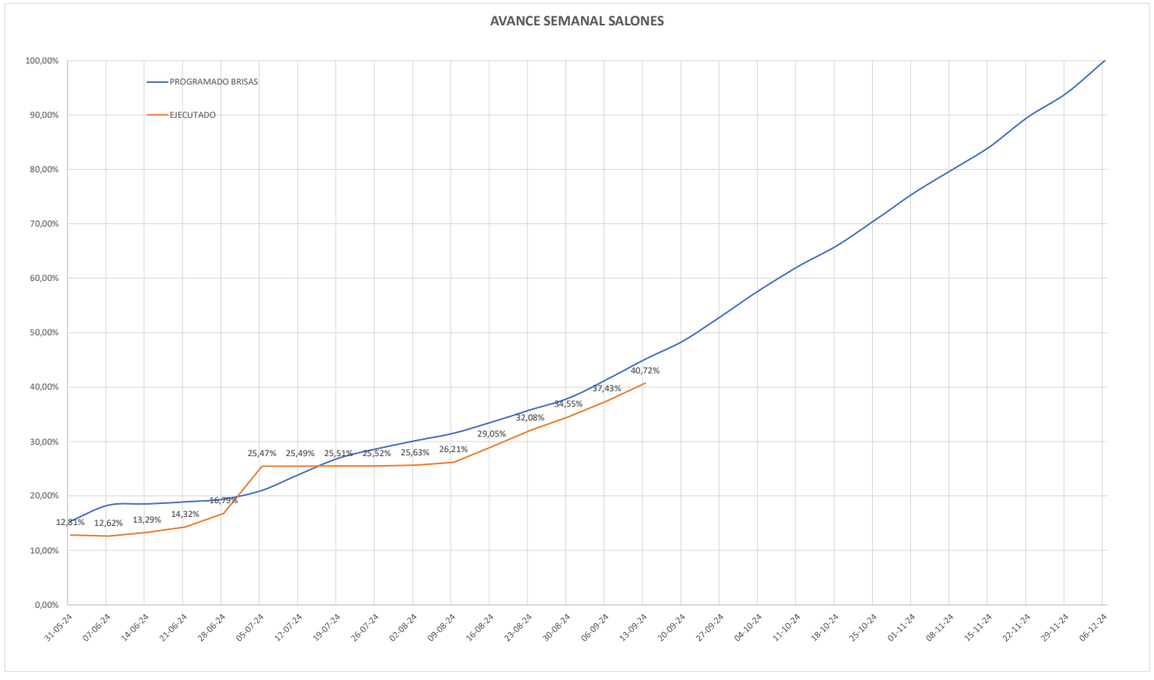

hapil Ingeniería	**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA** **FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____	**INFORME EJECUTIVO SEMANA No**	**31**	**CONTRATO / CONVENIO No.**	**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**				

MUNICIPIO	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**7/09/2024**	**HASTA:**	**13/09/2024**	**FECHA INFORME:**	**13/09/2024**

FLUJO DE FONDOS ALPES (MILLONES DE PESOS)

	SEMANAS																									
	JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC	
	01-06-24	08-06-24	15-06-24	22-06-24	29-06-24	06-07-24	13-07-24	20-07-24	27-07-24	03-08-24	10-08-24	17-08-24	24-08-24	31-08-24	07-09-24	14-09-24	21-09-24	28-09-24	05-10-24	12-10-24	19-10-24	26-10-24	02-11-24	09-11-24	16-11-24	23-11-24	30-11-24	07-12-24
SEMANAL	158,43	71,23	3,68	3,68	9,28	11,98	19,11	12,07	8,65	8,86	8,12	8,86	6,06	6,59	26,73	36,49	34,36	51,54	72,44	75,59	75,79	80,42	85,67	69,00	66,78	80,69	79,83	39,11
ACUMULADO	158,43	229,66	233,34	237,01	246,30	258,28	277,38	289,45	298,11	306,96	315,08	323,94	330,00	336,59	363,32	399,81	434,17	485,71	558,15	633,75	709,53	789,95	875,62	944,61	1011,39	1092,08	1171,92	1211,02

35%

FLUJO DE FONDOS BRISAS (MILLONES DE PESOS)

	SEMANAS																									
	JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC	
	01-06-24	08-06-24	15-06-24	22-06-24	29-06-24	06-07-24	13-07-24	20-07-24	27-07-24	03-08-24	10-08-24	17-08-24	24-08-24	31-08-24	07-09-24	14-09-24	21-09-24	28-09-24	05-10-24	12-10-24	19-10-24	26-10-24	02-11-24	09-11-24	16-11-24	23-11-24	30-11-24	07-12-24
SEMANAL	379,27	31,06	4,69	9,37	8,70	44,29	86,55	89,60	50,22	43,98	39,39	63,62	71,33	68,29	93,51	93,62	84,18	109,74	94,31	74,92	57,00	83,90	86,43	81,95	83,45	110,26	72,75	169,79
ACUMULADO PROGRAMADO	379,27	410,33	415,02	424,39	433,09	477,37	563,92	653,52	703,74	747,72	787,12	850,73	922,06	990,35	1083,86	1177,48	1261,66	1371,40	1465,71	1540,63	1597,63	1681,53	1767,96	1849,91	1933,36	2043,62	2116,37	2286,16

65%

FLUJO DE FONDOS OBRA TOTAL (MILLONES DE PESOS)

	SEMANAS																									
	JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC	
	01-06-24	08-06-24	15-06-24	22-06-24	29-06-24	06-07-24	13-07-24	20-07-24	27-07-24	03-08-24	10-08-24	17-08-24	24-08-24	31-08-24	07-09-24	14-09-24	21-09-24	28-09-24	05-10-24	12-10-24	19-10-24	26-10-24	02-11-24	09-11-24	16-11-24	23-11-24	30-11-24	07-12-24
SEMANAL	537,70	102,29	8,36	13,04	17,98	56,27	105,66	101,66	58,88	52,84	47,51	72,47	77,39	74,88	120,24	130,11	118,54	161,28	166,76	150,51	132,79	164,32	172,09	150,95	150,22	190,95	152,58	208,90
ACUMULADO PROGRAMADO	537,70	639,99	648,36	661,40	679,38	735,65	841,31	942,97	1001,85	1054,69	1102,20	1174,67	1252,06	1326,93	1447,17	1577,29	1695,83	1857,11	2023,86	2174,38	2307,16	2471,48	2643,58	2794,52	2944,75	3135,70	3288,29	3497,19
ACUMULADO EJECUTADO	448,44	441,99	465,37	501,56	587,96	891,91	892,59	893,28	893,60	897,68	917,85	1017,38	1123,35	1209,74	1310,86	1425,84												

AJUSTE Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (Incl. AIU) [F = G - E]	4,65
VALOR TOTAL OBRA	3501,84
