hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**		**PI - IN - F11**
			VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES		**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

CAPÍTULO	**4.0**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**
ITEMS	**4.2.1**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI .

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES




Fotografía No. 1: Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas piso 2 a piso 3

ANTES



Fotografía No. 2: Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas piso 2 a piso 3

ANTES

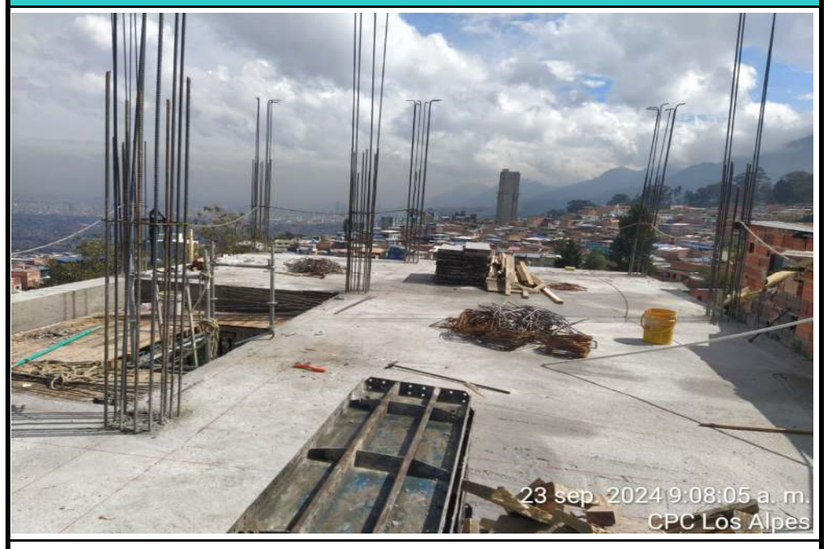

Fotografía No. 3: Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas piso 2 a piso 3

hapil Ingeniería	INFORME SEMANAL		PI - IN - F11
			VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES		VIGENCIA: 30/09/09

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

CAPÍTULO	**4.0**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**
ITEMS	**4.2.1**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI .

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
Fotografía No. 4: Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas piso 2 a piso 3	**Fotografía No. 5:** Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas piso 2 a piso 3	**Fotografía No. 6:** Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas piso 2 a piso 3

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**		**PI - IN - F11**
			VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES		**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

CAPÍTULO	**4.0**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**
ITEMS	**4.2.1**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI .

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

DESPUÉS



Fotografía No. 7: Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas piso 2 a piso 3

DESPUÉS



Fotografía No. 8: Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas piso 2 a piso 3

DESPUÉS



Fotografía No. 9: Item 4.2.1.Suminsitro, transporte e instalcion de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas piso 2 a piso 3

Observaciones:


hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11** **VERSIÓN 01**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

CAPÍTULO	**4.0**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**
ITEMS	**4.1.2**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI PARA COLUMNAS. (NO INCLUYE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA METALICA COMPLETA, ANDAMIOS CERTIFICADOS, PARALES, AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES

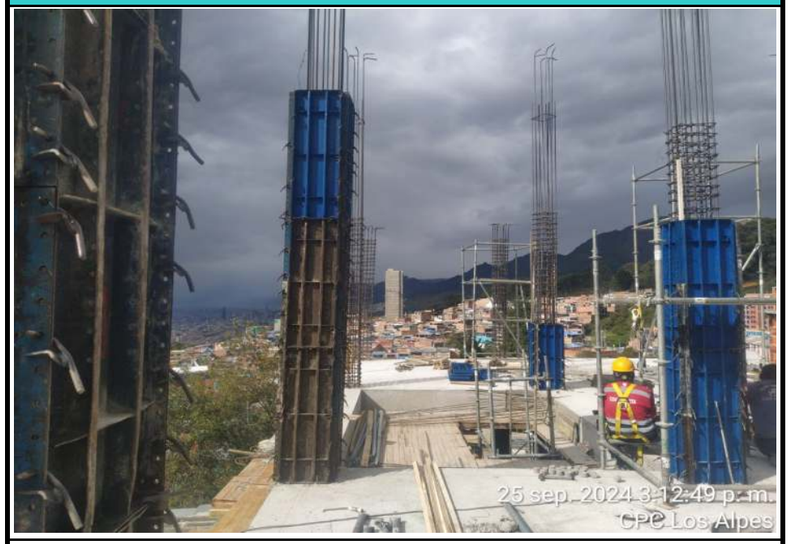

Fotografía No. 1: Item 4.1.2. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Columnas piso 2 a piso 3

ANTES



Fotografía No. 2: Item 4.1.2. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Columnas piso 2 a piso 3

ANTES



Fotografía No. 3: Item 4.1.2. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Columnas piso 2 a piso 3

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**		**PI - IN - F11**
			VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES		**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

CAPÍTULO	**4.0**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**
ITEMS	**4.1.2**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI PARA COLUMNAS. (NO INCLUYE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA METALICA COMPLETA, ANDAMIOS CERTIFICADOS, PARALES, AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

DURANTE




Fotografía No. 4: Item 4.1.2. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Columnas piso 2 a piso 3

DURANTE



Fotografía No. 5: Item 4.1.2. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Columnas piso 2 a piso 3

DURANTE

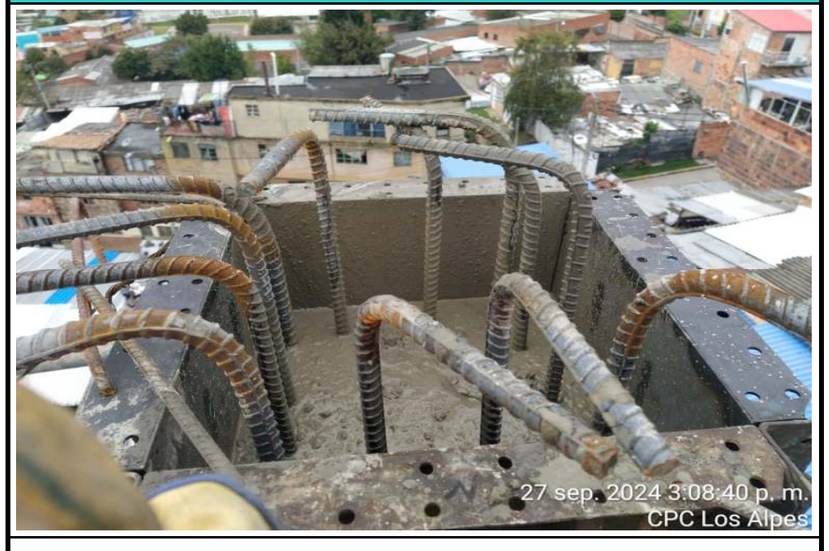

Fotografía No. 6: Item 4.1.2. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Columnas piso 2 a piso 3

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11**
		VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

CAPÍTULO	**4.0**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**
ITEMS	**4.1.2**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI PARA COLUMNAS. (NO INCLUYE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA METALICA COMPLETA, ANDAMIOS CERTIFICADOS, PARALES, AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

DESPUÉS



Fotografía No. 7: Item 4.1.2. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Columnas piso 2 a piso 3

DESPUÉS



Fotografía No. 8: Item 4.1.2. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Columnas piso 2 a piso 3

DESPUÉS



Fotografía No. 9: Item 4.1.2. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Columnas piso 2 a piso 3

Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**		**PI - IN - F11**
			VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS		**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

ANTES	**4.0**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**
ITEMS	**4.1.3**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI PARA ESCALERAS. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA METALICA COMPLETA, ANDAMIOS CERTIFICADOS, PARALES, AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 1: Item 4.1.3. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Piso 1 a piso 2	**Fotografía No. 2:** Item 4.1.3. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Piso 1 a piso 2	**Fotografía No. 3:** Item 4.1.3. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Piso 1 a piso 2

hapil Ingeniería	INFORME SEMANAL		PI - IN - F11
			VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS		VIGENCIA: 30/09/09

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

ANTES	**4.0**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**
ITEMS	**4.1.3**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI PARA ESCALERAS. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA METALICA COMPLETA, ANDAMIOS CERTIFICADOS, PARALES, AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 4: Item 4.1.3. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Piso 1 a piso 2	**Fotografía No. 5:** Item 4.1.3. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Piso 1 a piso 2	**Fotografía No. 6:** Item 4.1.3. Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. Piso 1 a piso 2

Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**		**PI - IN - F11**
			VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS		**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

ANTES	**6.0**	**MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**
ITEMS	**6.1**	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE Nº 5 O SIMILAR

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

DURANTE



Fotografía No. 1: Item 6.1. Mampostería en bloque nº 5 o similar. Piso 1 y piso 2

DURANTE



Fotografía No. 2: Item 6.1. Mampostería en bloque nº 5 o similar. Piso 1 y piso 2

DESPUÉS



Fotografía No. 3: Item 6.1. Mampostería en bloque nº 5 o similar. Piso 1 y piso 2

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11**
		VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

ANTES	**6.0**	**MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**
ITEMS	**6.1**	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE Nº 5 O SIMILAR

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

DURANTE



Fotografía No. 4: Item 6.1. Mampostería en bloque nº 5 o similar. Piso 1 y piso 2

DURANTE



Fotografía No. 5: Item 6.1. Mampostería en bloque nº 5 o similar. Piso 1 y piso 2

DESPUÉS



Fotografía No. 6: Item 6.1. Mampostería en bloque nº 5 o similar. Piso 1 y piso 2

Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11**
		VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

ANTES	**4.0**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**
ITEMS	**4.2.1**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI .

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 1: Item 4.2.1. Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi . Escaleras	**Fotografía No. 2:** Item 4.2.1. Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi . Escaleras	**Fotografía No. 3:** Item 4.2.1. Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi . Escaleras

Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11**
		VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

ANTES	**4.0**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**
ITEMS	**4.2.2**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 1: Item 4.2.2. Suministro, transporte e instalacion de refuerzo en malla elctrosoldada. Rampa	**Fotografía No. 2:** Item 4.2.2. Suministro, transporte e instalacion de refuerzo en malla elctrosoldada. Rampa	**Fotografía No. 3:** Item 4.2.2. Suministro, transporte e instalacion de refuerzo en malla elctrosoldada. Rampa

Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11**
		VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

ANTES	**NP**	**NO PREVISTOS**
ITEMS	**NP-02**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI, PARA PLACA DE ENTREPISO CON VIGAS DESCOLGADAS, H TOTAL = 40 CM (INCLUYE TORTA SUPERIOR E= 10 CM, CUANTÍA CONCRETO = 0.19 M3/M2 -SEGÚN DISEÑO) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA COMPLETA DE ENTREPISO, PARALES, CASETÓN RECUPERABLE, PLÁSTICO PARA RECUBRIMIENTO DE CASETÓN. AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 1: Item NP-02 Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, h total = 40 cm (incluye torta superior e= 10 cm, cuantía concreto = 0.19 m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo). incluye formaleta completa de entrepiso, parales, casetón recuperable, plástico para recubrimiento de casetón. agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.. Rampa	**Fotografía No. 2:** Item NP-02 Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, h total = 40 cm (incluye torta superior e= 10 cm, cuantía concreto = 0.19 m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo). incluye formaleta completa de entrepiso, parales, casetón recuperable, plástico para recubrimiento de casetón. agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.. Rampa	**Fotografía No. 3:** Item NP-02 Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, h total = 40 cm (incluye torta superior e= 10 cm, cuantía concreto = 0.19 m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo). incluye formaleta completa de entrepiso, parales, casetón recuperable, plástico para recubrimiento de casetón. agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.. Rampa

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11**
		VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

ANTES	**NP**	**NO PREVISTOS**
ITEMS	**NP-02**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI, PARA PLACA DE ENTREPISO CON VIGAS DESCOLGADAS, H TOTAL = 40 CM (INCLUYE TORTA SUPERIOR E= 10 CM, CUANTÍA CONCRETO = 0.19 M3/M2 -SEGÚN DISEÑO) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA COMPLETA DE ENTREPISO, PARALES, CASETÓN RECUPERABLE, PLÁSTICO PARA RECUBRIMIENTO DE CASETÓN. AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 4: Item NP-02 Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, h total = 40 cm (incluye torta superior e= 10 cm, cuantía concreto = 0.19 m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo). incluye formaleta completa de entrepiso, parales, casetón recuperable, plástico para recubrimiento de casetón. agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.. Rampa	**Fotografía No. 5:** Item NP-02 Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, h total = 40 cm (incluye torta superior e= 10 cm, cuantía concreto = 0.19 m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo). incluye formaleta completa de entrepiso, parales, casetón recuperable, plástico para recubrimiento de casetón. agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.. Rampa	**Fotografía No. 6:** Item NP-02 Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, h total = 40 cm (incluye torta superior e= 10 cm, cuantía concreto = 0.19 m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo). incluye formaleta completa de entrepiso, parales, casetón recuperable, plástico para recubrimiento de casetón. agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.. Rampa

Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**		**PI - IN - F11**
			VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS		**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

ANTES	**NP**	**NO PREVISTOS**
ITEMS	**NP-03**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI PARA COLUMNAS. (NO INCLUYE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA METÁLICA COMPLETA, ANDAMIOS CERTIFICADOS, PARALES, AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 1: Item NP-03. Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (no incluye refuerzo). incluye formaleta metálica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	**Fotografía No. 2:** Item NP-03. Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (no incluye refuerzo). incluye formaleta metálica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	**Fotografía No. 3:** Item NP-03. Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (no incluye refuerzo). incluye formaleta metálica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL**	**PI - IN - F11**
		VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS	**VIGENCIA: 30/09/09**

Periodo Fechas	21/09/2024	AL	27/09/2024

ANTES	**NP**	**NO PREVISTOS**
ITEMS	**NP-03**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI PARA COLUMNAS. (NO INCLUYE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA METÁLICA COMPLETA, ANDAMIOS CERTIFICADOS, PARALES, AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
Fotografía No. 4: Item NP-03. Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (no incluye refuerzo). incluye formaleta metálica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	**Fotografía No. 5:** Item NP-03. Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (no incluye refuerzo). incluye formaleta metálica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	**Fotografía No. 6:** Item NP-03. Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (no incluye refuerzo). incluye formaleta metálica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

Observaciones:

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33	CONTRATO / CONVENIO No. FDLSC-COP-928-2023
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"		
MUNICIPIO: BOGOTÁ	DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE: 21/09/2024 HASTA: 27/09/2024	FECHA INFORME: 27/09/2024

						TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
1.0	**PRELIMINARES**									
1.1	Cerramiento en teja de zinc calibre 35 altura = 2.4 m. (Incluye puerta provisional en lamina de zinc calibre 35 para entrada vehicular (dimensiones 2.4 x 3.5) y puerta para de trabajadores en lamina de zinc calibre 35 dimensiones 1.0 x 2.4 m)	ML	$ 101.808	58,05	$ 5.909.954	10,7	$ 1.089.346	47,35	$ 4.820.609	0,53%
1.2	Localización y replanteo topográfico	M2	$ 4.463	175,56	$ 783.524	175,56	$ 783.524	0,00	$ -	0,00%
1.3	Demolición de zona general, incluye muros en mampostería, antepiso en concreto, vigas de cimentacion, zapatas, columnas, vigas, viguetas, cubiertas y en general todo lo existente para poder dejar el terreno apto para la nueva edificaciòn, Incluye demolición total mecanica y/o manual, carga mecánica sobre volqueta. El precio incluye , cargue mecánico, excavación mecánica, retiro y disposición final a botadero certificado.	M2	$ 50.012	536,16	$ 26.814.519	535,96	$ 26.804.432	0,20	$ 10.087	0,00%
1.3					**$ 33.507.998**		**$ 28.677.301,4**		**$ 4.830.696**	**0,53%**
2.0	**MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CIMENTACIONES**									
2.1	Excavación manual en material común	M3	$ 26.202	117,51	$ 3.078.997	110,61	$ 2.898.203	6,90	$ 180.794	0,02%
2.2	Suministro,transporte e instalacion de relleno en recebo tipo b400 o similar compactado al 95% P.M	M3	$ 103.788	0,00	$ -					
2.3	Cargue, transporte, retiro y disposicion final material producto de excavación y otros	M3	$ 35.575	332,12	$ 11.815.169	331,554	$ 11.795.034	0,57		
					$ 14.894.167		**$ 14.693.237**		**$ 180.794**	**0,02%**
3.0	**CIMENTACION**									
3.1	Suministro, transporte e instalacion de concreto de ciclopeo (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)	M3	$ 339.097	50,94	$ 17.273.601	50,94	$ 17.273.601,18	0,00		
3.2	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	M3	$ 711.829	19,15	$ 13.631.525	17,94	$ 12.770.212,26	1,21	$ 861.313	0,10%
3.3	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para muros de contención (No incluye refuerzo)	M3	$ 922.564	16,82	$ 15.517.526	13,79	$ 12.722.157,56	3,03	$ 2.795.369	0,31%
3.4	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de cimentación (No incluye refuerzo)	M3	$ 727.480	19,00	$ 13.822.120	8,99	$ 6.540.045,20	10,01	$ 7.282.075	0,80%
3.5	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de contrapiso e= 10 cm (Incluye corte y dilatación)	M2	$ 80.546	130,18	$ 10.485.478	93,464	$ 7.528.151,34	36,72	$ 2.957.327	0,33%
					$ 70.730.252		**$ 56.834.168**		**$ 13.896.084**	**1,54%**
4.0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**									
4.1	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**						$ -			
4.1.1	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, H total = 40 cm (Incluye torta superior e= 10 cm, cuantía concreto = 0.19 m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo) .Incluye formaleta completa de entrepiso, parales, casetòn recuperable, plastico para recubrimiento de caseton. agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	$ 256.269	276,59	$ 70.881.309		$ -	276,59	$ 70.881.309	7,83%
4.1.2	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 942.783	20,99	$ 19.789.015	5,62	$ 5.298.440	15,37	$ 14.490.575	1,60%
4.1.3	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 1.254.287	7,85	$ 9.846.153		$ -	7,85	$ 9.846.153	1,09%
4.1.4	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para tanque en concreto, Impermeabilizado, relacion A/C = 0,45, aire incorporado del 6% (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 1.023.677	9,56	$ 9.786.352		$ -	9,56	$ 9.786.352	1,08%
4.1.5	Suministro, transporte e instalacion de cinta PVC O-22 para tanque en concreto	ML	$ 96.307	34,10	$ 3.284.069		$ -	34,10	$ 3.284.069	0,36%
4.1.6	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para foso elevapersonas, (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 975.432	1,82	$ 1.775.286		$ -	1,82	$ 1.775.286	0,20%
4.1.7	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para graderia, (no incluye acero de refuerzo), acabado liso con llana metalica, Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	$ 94.698	0,00	$ -		$ -	0,00		
4.2	**ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA**				$ -		$ -	0,00	$ -	
4.2.1	Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .	KG	$ 5.367	15151,05	$ 81.315.685	9845,13	$ 52.838.812,71	5305,92	$ 28.476.873	3,15%
4.2.2	Suministro, transporte e instalacion de refuerzo en malla electrosoldada.	KG	$ 6.367	2249,65	$ 14.323.522	332,723	$ 2.118.447,34	1916,93	$ 12.205.074	1,35%
					$ 211.001.391		**$ 60.255.700,5**		**$ 150.745.690**	**16,66%**
5.0	**PISOS BASES Y ACABADOS**									
5.1	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 para alistado de pisos, e=0,04 máx.	M2	$ 36.096	219,66	$ 7.928.847			219,66	$ 7.928.847	0,88%

EJECUCION SEMANAL CANTIDADES — SEMANAS

ÍTEM	JUNIO 31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	JULIO 05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	AGOSTO 02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	SEPTIEMBRE 06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	OCTUBRE 04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	NOVIEMBRE 01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	DIC 29-11-24	06-12-24
1.1		10,70																										
1.2	175,56																											
1.3	492,66		16,00			27,30																						
2.1	43,53	2,04	1,34	24,68	4,68	34,34																						
2.2	-																											
2.3	331,55																											
3.1	50,94																											
3.2	-				17,94																							
3.3	-					13,79			0,18						0,06													
3.4	-			3,77	5,22																							
3.5	-					93,46				1,42					0,79	2,45		2,23										
4.1.1	-											42,16					109,13	109,71										
4.1.2	-					5,62									7,14			4,70										
4.1.3	-															1,20		0,12										
4.1.4	-												10,00	1,87														
4.1.5	-																											
4.1.6	-													1,60														
4.1.7	-																											
4.2	-																											
4.2.1	2.354,24	444,55			3.258,02	3.788,32		13,45		35,86		1.319,55	371,23			1.079,45	978,84	4.912,35										
4.2.2	-					332,72						295,40			20,72	16,39	654,83	658,21										
5.1																												

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024
HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO VR. TOTAL	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	%
5.2	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e = 0.04 máx.	M2	$ 37.913	130,79	$ 4.958.641			130,79	$ 4.958.641	0,55%
5.3	Suministro, transporte e instalación de piso porcelatano. Caliza rectificado marfil caras diferenciadasde primera calidad o similar . Dimensiones 40 x 88 cm	M2	$ 145.339	45,94	$ 6.676.874			45,94	$ 6.676.874	0,74%
5.4	Suministro, transporte e instalación de guardaescobas porcelatano caliza rectificado marfil caras diferenciadas de primera calidad o similar H= 8 cm	ML	$ 25.899	70,88	$ 1.835.721			70,88	$ 1.835.721	0,20%
5.6	Suministro, transporte e instalación de baldosa vibro prensada tipo Deck de Madera 15x60 o similar	M2	$ 121.817	64,99	$ 7.916.887			64,99	$ 7.916.887	0,87%
5.7	Suministro, transporte e instalación de guardaescoba de vibro prensada tipo Deck de Madera H= 7 cm	ML	$ 21.523	63,97	$ 1.376.826			63,97	$ 1.376.826	0,15%
5.8	Suministro, transporte e instalación de cinta antideslizante con Fotoluminiscente x 48mm	ML	$ 13.156	62,00	$ 815.672			62,00	$ 815.672	0,09%
5.9	Suministro, transporte e instalación de mediacaña en granito pulido prefabricado h =10cms	ML	$ 45.730	7,10	$ 324.683			7,10	$ 324.683	0,04%
5.10	Construccion de bocapuerta en granito pulido, ancho 10 cm, Incluye dilatación en bronce por ambos costados	ML	$ 80.474	10,20	$ 820.835			10,20	$ 820.835	0,09%
5.11	Suministro, transporte e instalación de piso ceramico comercial calama multicolor caras diferenciadas 51 x 51	M2	$ 79.878	199,30	$ 15.919.685			199,30	$ 15.919.685	1,76%
					$ 48.574.672		**$ -**		**$ 48.574.672**	**5,37%**
6.0	**MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**									
6.1	Mampostería en bloque nº 5 o similar	M2	$ 52.063	734,91	$ 38.261.385			734,91	$ 38.261.385	4,23%
6.2	Remates sobre muro en concreto de 2500 psi (12x20 cm) (Incluye acero de refuerzo)	ML	$ 65.389	49,95	$ 3.266.181			49,95	$ 3.266.181	0,36%
6.3	Bordillo de remate para placas de cubierta en mamposteria bloque N. 5 o similar	ML	$ 28.142	27,60	$ 776.719			27,60	$ 776.719	0,09%
6.4	Anclaje epoxico D=5/8", profundidad del anclaje 10 cm, Long varilla 1/2" = 70 cm, (Incluye acero de refeurzo)	UND	$ 25.172	235,00	$ 5.915.420			235,00	$ 5.915.420	0,65%
6.5	Columnetas en concreto de 2500 psi., 12 cm x 20 cm incluye acero de refuerzo	ML	$ 61.533	293,96	$ 18.088.376			293,96	$ 18.088.376	2,00%
6.6	Suministro, transporte e instalacion de mueble para cocina completo medidas 2.70 x 0,60 metros. Incluye mueble inferior en melanima e= 15 mm, acabado mate con apariencia a madera natural, poceta en acero inoxidable y griferia , meson en granito negro san gabriel e= 20 mm con salpicadero h= 10 cm. Esfufa de empotrar en acero inoxidable de dos puestos de 34.1 x 42.5 cm a gas natural. Incluye perforaciones para estufa y poceta y en general todo lo requerido para su correcta instalaciòn.	UND	$ 2.980.340	2,00	$ 5.960.680			2,00	$ 5.960.680	0,66%
6.7	Suministro, transporte e instalacion de esquineros sobre mamposteria	ML	$ 11.056	146,98	$ 1.625.023			146,98	$ 1.625.023	0,18%
					$ 73.893.784		**$ -**		**$ 73.893.784**	**8,17%**
7.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
7.1	**SALIDAS ELECTRICAS**									
7.1.01	SALIDA PARA ILUMINACION MONOFASICA , CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE TOMA PARA CONEXIÓN RAPIDA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 189.516	112	$ 21.225.792			112,00	$ 21.225.792	2,35%
7.1.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 181.536	28,00	$ 5.083.008			28,00	$ 5.083.008	0,56%
7.1.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 227.563	11,00	$ 2.503.193			11,00	$ 2.503.193	0,28%
7.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 183.622	12,00	$ 2.203.464			12,00	$ 2.203.464	0,24%
7.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 202.405	3,00	$ 607.215			3,00	$ 607.215	0,07%

EJECUCION SEMANAL CANTIDADES — SEMANAS

ÍTEM	JUNIO 31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	JULIO 05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	AGOSTO 02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	SEPTIEMBRE 06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	OCTUBRE 04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	NOVIEMBTRE 01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	DIC 29-11-24	06-12-24
5.2																												
5.3																												
5.4																												
5.6																												
5.7																												
5.8																												
5.9																												
5.10																												
5.11																												
6.0																												
6.1																												
6.2																												
6.3																												
6.4																		15,00										
6.5																												
6.6																												
6.7																												
7.0																												
7.1																												
7.1.01																												
7.1.02																												
7.1.03																												
7.1.04																												
7.1.05																												

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"

MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024	HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024

						TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR			SEMANAS																														
											JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC					
											31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%	EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																																
7.1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 223.050	3,00	$ 669.150			3,00	$ 669.150	0,07%																																
7.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 219.967	6,00	$ 1.319.802			6,00	$ 1.319.802	0,15%																																
7.1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 446.577	5,00	$ 2.232.885			5,00	$ 2.232.885	0,25%																																
7.1.09	SALIDA PARA MOTOR TRIFASICO 3HP, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 204.374	2,00	$ 408.748			2,00	$ 408.748	0,05%																																
7.2	**CAJAS DE PASO, CANALIZACIONES**				$ -																																				
7.2.01	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) LISTADO SECRETARIA 5.1.101	UN	$ 755.210	1,00	$ 755.210			1,00	$ 755.210	0,08%																																
7.2.01.A	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-275 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 1.883.329	1,00	$ 1.883.329			1,00	$ 1.883.329	0,21%																																
7.2.02	TUBERÍA EMT Ø3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 21.233	24,76	$ 525.729			24,76	$ 525.729	0,06%																																
7.2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN LISTADO SECRETARIA 5.1.48	ML	$ 171.477	4,81	$ 824.804			4,81	$ 824.804	0,09%																																
7.2.04	TUBERÍA EMT Ø1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 51.640	9,71	$ 501.424			9,71	$ 501.424	0,06%																																
7.2.05	CANALETA METALICA 100X40, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 49.051	14,11	$ 692.110			14,11	$ 692.110	0,08%																																
7.2.06	TUBERÍA EMT Ø2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 72.893	4,00	$ 291.572			4,00	$ 291.572	0,03%																																
7.2.07	CAJA DE PASO PLASTICA 20X20	UN	$ 122.870	1,00	$ 122.870			1,00	$ 122.870	0,01%																																
7.3	**ACOMETIDAS, PARCIALES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN**				$ -																																				
7.3.01	CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	UN	$ 1.559.641	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00%																																
7.3.2	DERIVACIÓN AEREA EN BAJA TENSION, NORMA ENEL CODENSA AE219, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	UN	$ 2.326.362	1,00	$ 2.326.362			1,00	$ 2.326.362	0,26%																																
7.3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA. LISTADO SECRETARIA 5.1.23	UN	$ 847.348	1,00	$ 847.348			1,00	$ 847.348	0,09%																																
7.3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.33	UN	$ 19.032	22,00	$ 418.704			22,00	$ 418.704	0,05%																																
7.3.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.38	UN	$ 125.868	2,00	$ 251.736			2,00	$ 251.736	0,03%																																
7.3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS	UN	$ 189.308	1,00	$ 189.308			1,00	$ 189.308	0,02%																																
7.3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. LISTADO SECRETARIA 5.1.65	UN	$ 419.679	1,00	$ 419.679			1,00	$ 419.679	0,05%																																
7.3.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X30A, 25KA	UN	$ 319.852	2,00	$ 639.704			2,00	$ 639.704	0,07%																																
7.3.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3XN.2+N.2N+N.2T SERIE 8000 AL	ML	$ 119.682	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00%																																
7.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3X35mm + 50mm AILSADO DE 3X2 + 1/0	ML	$ 119.682	13,78	$ 1.649.218			13,78	$ 1.649.218	0,18%																																
7.3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE 3XN.10F+N.10N+N-1OT EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	ML	$ 26.719	75,00	$ 2.003.925			75,00	$ 2.003.925	0,22%																																
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 2KVA, 120V, 5 MINUTOS	UN	$ 2.530.904	1,00	$ 2.530.904			1,00	$ 2.530.904	0,28%																																
7.4	**DATOS**				$ -																																				

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"

MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024	HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024

						TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR			SEMANAS																										
											JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
											31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%	EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																											
7.4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK CON 18 UR INCLUYE ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE. LISTADO SECRETARIA 5.1.121	UN	$ 1.575.086	1,00	$ 1.575.086			1,00	$ 1.575.086	0,17%																											
7.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO. LISTADO SECRETARIA 55.1.68	UN	$ 104.864	4,00	$ 419.456			4,00	$ 419.456	0,05%																											
7.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP. LISTADO SECRETARIA 5.1.109	ML	$ 5.459	20,28	$ 110.709			20,28	$ 110.709	0,01%																											
7.4.04	CERTIFICACION PUNTO DE DATOS	UN	$ 7.691	4,00	$ 30.764			4,00	$ 30.764	0,00%																											
7.5	**ILUMINACION**				$ -																															
7.5.01	SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.85	UN	$ 171.134	19,00	$ 3.251.546			19,00	$ 3.251.546	0,36%																											
7.5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X18W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN,	UN	$ 174.193	14,00	$ 2.438.702			14,00	$ 2.438.702	0,27%																											
7.5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA LED 60X60, INCLUYE DERIVACIÓN EN CABLE, ENCAUCHETADO 3X14 AWG, CLAVIJA Y MARCO EN ALUMINIO PARA INCRUSTAR. LISTADO SECRETARIA 5.1.174	UN	$ 137.708	44,00	$ 6.059.152			44,00	$ 6.059.152	0,67%																											
7.5.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN,	UN	$ 119.682	30,00	$ 3.590.460			30,00	$ 3.590.460	0,40%																											
7.5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.81	UN	$ 79.079	9,00	$ 711.711			9,00	$ 711.711	0,08%																											
7.6	**VARIOS SISTEMA ELÉCTRICO**				$ -																															
7.6.01	Certificación RETIE de uso final bajo resolución de Agosto de 2013 por organismo de certificación avalada por la ONAC	UN	$ 9.133.300	1,00	$ 9.133.300			1,00	$ 9.133.300	1,01%																											
					$ 80.448.079		**$ -**		**$ 80.448.079**	**8,89%**																											
8.0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIOS**																																			
8.1	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PVCP Y AGUA CALIENTE (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)**																																			
8.1.1	Suministro, transporte e instalación de punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	UN	$ 42.230	13,00	$ 548.990			13,00	$ 548.990	0,06%																											
8.2	**REDES DE AGUA FRIA PVC P**				$ -																															
8.2.1	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1/2" RDE 9	ML	$ 12.266	50,00	$ 613.300			50,00	$ 613.300	0,07%																											
8.2.2	Suministro, transporte e instalación de red pvc 3/4" RDE 11	ML	$ 13.378	16,00	$ 214.048			16,00	$ 214.048	0,02%																											
8.2.3	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1" RDE 13.5	ML	$ 16.825	16,00	$ 269.200			16,00	$ 269.200	0,03%																	6,02		3,55								
8.2.4	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1 1/2" RDE 21	ML	$ 28.199	14,00	$ 394.786			14,00	$ 394.786	0,04%																											
8.3	**SALIDAS SANITARIAS (PVCS)**				$ -																															
8.3.1	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 4"	UN	$ 153.883	12,00	$ 1.846.596			12,00	$ 1.846.596	0,20%																2,00										
8.3.2	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 2"	UN	$ 141.690	6,00	$ 850.140			6,00	$ 850.140	0,09%																2,00			1,00							
8.3.3	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/sifón 2"	UN	$ 128.916	13,00	$ 1.675.908			13,00	$ 1.675.908	0,19%																3,00			3,00							
8.3.4	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 4"	UN	$ 99.440	2,00	$ 198.880			2,00	$ 198.880	0,02%																											
8.3.5	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 3"	UN	$ 22.781	2,00	$ 45.562			2,00	$ 45.562	0,01%																											
8.4	**REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)**				$ -																															
8.4.1	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-l 2"	ML	$ 24.531	36,00	$ 883.116			36,00	$ 883.116	0,10%																											
8.4.3	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 2"	ML	$ 33.861	10,00	$ 338.610			10,00	$ 338.610	0,04%												10,50					3,09									
8.4.4	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 3"	ML	$ 55.374	126,00	$ 6.977.124			126,00	$ 6.977.124	0,77%																	4,40									
8.4.5	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 4"	ML	$ 66.581	107,00	$ 7.124.167			107,00	$ 7.124.167	0,79%												8,10	2,00			15,50	4,40									
8.4.6	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-p 3"	ML	$ 83.653	24,00	$ 2.007.672			24,00	$ 2.007.672	0,22%																7,80										
8.4.7	Suministro, transporte e instalación de tragantes 4" - 6"	UN	$ 69.195	4,00	$ 276.780			4,00	$ 276.780	0,03%																											
8.4.8	Suministro, transporte e instalación de rejilla 4" - 6"	UN	$ 56.980	6,00	$ 341.880			6,00	$ 341.880	0,04%																											
8.4.9	Suministro, transporte e instalación de rejilla 3" - 2"	UN	$ 16.292	3,00	$ 48.876			3,00	$ 48.876	0,01%																											
8.5	**VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION**				$ -																															
8.5.1	Suministro, transporte e instalación de valvula de ventilación 2"	UN	$ 121.094	10,00	$ 1.210.940			10,00	$ 1.210.940	0,13%																											
8.5.2	Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1/2"	UN	$ 93.787	9,00	$ 844.083			9,00	$ 844.083	0,09%																											
8.5.3	Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1"	UN	$ 146.088	1,00	$ 146.088			1,00	$ 146.088	0,02%																											
8.5.4	Suministro, transporte e instalación de valvula de retención red white tipo pesado 1"	UN	$ 140.530	1,00	$ 140.530			1,00	$ 140.530	0,02%																											
8.5.5	Suministro, transporte e instalación de flotador mecanico 3/4"	UN	$ 151.579	1,00	$ 151.579			1,00	$ 151.579	0,02%																											

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"

MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024	HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO VR. TOTAL	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	%	SEMANAS / EJECUCION SEMANAL CANTIDADES — JUNIO 31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	JULIO 05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	AGOSTO 02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	SEPTIEMBRE 06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	OCTUBRE 04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	NOVIEMBTRE 01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	DIC 29-11-24	06-12-24
8.6	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA, CONCRETO Y OTROS**				$ -																																	
8.6.1	Cajas de inspección de 40 x 40 (medidas internas)	UD	$ 446.232	2,00	$ 892.464			2,00	$ 892.464	0,10%																												
8.6.2	Cajas de inspección de 60 x 60 (medidas internas)	UD	$ 536.454	2,00	$ 1.072.908			2,00	$ 1.072.908	0,12%												1,00																
8.6.3	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombeo tipo lapicero trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=2.00 lps y H=25.00 m. Incluye tanque hidroneumático.	UD	$ 10.428.576	1,00	$ 10.428.576			1,00	$ 10.428.576	1,15%																												
8.6.4	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombas eyectoras trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=10.00 lps y H=7.00 m. Incluye valvulas de compuertas y cheques.	UD	$ 12.351.376	1,00	$ 12.351.376			1,00	$ 12.351.376	1,37%																												
8.7	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				$ -																																
8.7.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m	M3	$ 25.906	56,80	$ 1.471.461			56,80	$ 1.471.461	0,16%																												
8.7.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	$ 29.316	22,72	$ 666.060			22,72	$ 666.060	0,07%																												
8.7.3	Relleno con arena de peña	M3	$ 59.782	11,36	$ 679.124			11,36	$ 679.124	0,08%																												
8.7.4	Retiro de sobrantes a una distancia de 22 km (incluye cargue)	M3	$ 29.461	29,54	$ 870.160			29,54	$ 870.160	0,10%																												
8.8	**PUNTOS GAS (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)**				$ -																																
8.8.1	Suministro, transporte e instalación de punto de gas pealpe 1/2"	UN	$ 50.296	2,00	$ 100.592			2,00	$ 100.592	0,01%																												
8.9	**REDES DE GAS**				$ -																																
8.9.1	Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1620	ML	$ 13.287	5,00	$ 66.435			5,00	$ 66.435	0,01%																												
8.9.2	Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1216	ML	$ 11.572	6,00	$ 69.432			6,00	$ 69.432	0,01%																												
8.10	**CENTRO DE VALVULAS**				$ -																																
8.10.1	Suministro, transporte e instalación de valvula pealpe 1216	UN	$ 40.705	2,00	$ 81.410			2,00	$ 81.410	0,01%																												
8.11	**RED CONTRA INCENDIO**				$ -																																
8.11.1	Suministro, transporte e instalación de punto Gabinetes Clase II	Un.	$ 129.526	3,00	$ 388.578			3,00	$ 388.578	0,04%																												
8.11.2	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø4"	Un.	$ 194.855	20,00	$ 3.897.100			20,00	$ 3.897.100	0,43%																												
8.11.3	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø1 1/2"	Un.	$ 64.745	10,00	$ 647.450			10,00	$ 647.450	0,07%																												
8.11.4	Suministro, transporte e instalación de Siamesa De ø4"×ø2½"×ø2½", inlcuye cheque ranurado de 4"	Un.	$ 2.196.763	1,00	$ 2.196.763			1,00	$ 2.196.763	0,24%																												
8.11.5	Suministro, transporte e instalación de Gabinete en Lamina Cold Rolled Calibre 20 de 0.77×0.77×0.22, Válvula angular 1½", Soporte tipo canasta, Manguera fibra poliester y caucho 1½"×100', Boquilla chorro y niebla 1½"-Hacha pico 4½" lbs, Llave Spaner-Extintor de polvo	Un.	$ 776.330	3,00	$ 2.328.990			3,00	$ 2.328.990	0,26%																												
					$ 65.357.733		**$ -**		**$ 65.357.733**	**7,22%**																												
9.0	**CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS**																																				
9.1	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e=0,04 máx, para cubiertas	M2	$ 40.328	42,00	$ 1.693.776			42,00	$ 1.693.776	0,19%																												
9.2	Suministro, transporte e instalación de Cielo Raso de PVC Blanco e= 7 cm, incluye estructura de soporte	M2	$ 77.641	286,30	$ 22.228.618			286,30	$ 22.228.618	2,46%																												
9.3	Impermeabilización con sika manto -1300 emulsión bituminosa elástica, e= 2 mm. Incluye acabado en pintura reflectiva de aluminio	M2	$ 97.314	42,00	$ 4.087.188			42,00	$ 4.087.188	0,45%																												
					$ 28.009.583		**$ -**		**$ 28.009.582**	**3,10%**																												
10.0	**PINTURA Y ACABADO DE MUROS**																																				
10.1	Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm. (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 26.243	637,58	$ 16.731.881			637,58	$ 16.731.881	1,85%																												
10.2	Pañete impermeabilizado muros 1:4 e=1.5 cm (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 29.057	831,27	$ 24.154.067			831,27	$ 24.154.067	2,67%																												
10.3	Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 16.033	601,10	$ 9.637.436			601,10	$ 9.637.436	1,07%																												
10.4	Pintura tipo acrílica para exteriores, a 3 manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 21.380	484,35	$ 10.355.403			484,35	$ 10.355.403	1,14%																												
10.5	Pintura epoxica a tres manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 31.893	132,19	$ 4.215.936			132,19	$ 4.215.936	0,47%																												
10.6	Estuco plástico acrílico (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 19.740	659,01	$ 13.008.857			659,01	$ 13.008.857	1,44%																												
10.7	Enchape cerámico pared blanco tipo Jaya cara unica 25 cm x 43 cm Blanca de primera calidad o similar	M2	$ 82.066	226,14	$ 18.557.995			226,14	$ 18.557.995	2,05%																												
10.8	Suministro, transporte e instalacion de meson en policuarzo, espesor 2 cm, incluyen faldon frontal de 10 cm, ancho 60 cm.	ML	$ 537.038	5,40	$ 2.900.005			5,40	$ 2.900.005	0,32%																												
					$ 99.561.581		**$ -**		**$ 99.561.580**	**11,00%**																												
11.0	**CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, DIVISIONES Y OTROS)**																																				
11.1	**CARPINTERIA METALICA Y OTROS**																																				
11.1.1	Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia . V01- V05	M2	$ 573.523	13,45	$ 7.713.884			13,45	$ 7.713.884	0,85%																												

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio ______		INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33		CONTRATO / CONVENIO No.		FDLSC-COP-928-2023		
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"								
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024	HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024

						TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
11.1.2	Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia.V02- V03- V04	M2	$ 477.672	10,35	$ 4.943.905			10,35	$ 4.943.905	0,55%
11.1.3	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V06 -V07	M2	$ 488.920		$ -			0,00		
11.1.4	Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P6). No incluye cerradura	M2	$ 526.440	21,55	$ 11.344.782			21,55	$ 11.344.782	1,25%
11.1.5	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3 -P5). No incluye cerradura	M2	$ 512.238	10,80	$ 5.532.170			10,80	$ 5.532.170	0,61%
11.1.6	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2	$ 493.010	4,86	$ 2.396.029			4,86	$ 2.396.029	0,26%
11.1.7	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV02- PV03	M2	$ 467.769	51,83	$ 24.244.467			51,83	$ 24.244.467	2,68%
11.1.8	Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia . V01- V03	M2	$ 573.523		$ -			0,00		
11.1.9	Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia.V02- V06	M2	$ 477.672		$ -			0,00		
11.1.10	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada proyectante con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V04	M2	$ 513.916		$ -			0,00		
11.1.11	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V05	M2	$ 488.920		$ -			0,00		

	SEMANAS																											
	JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE					DIC
	31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
ÍTEM	EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																											
11.1.2																												
11.1.3																												
11.1.4																												
11.1.5																												
11.1.6																												
11.1.7																												
11.1.8																												
11.1.9																												
11.1.10																												
11.1.11																												

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024
HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO VR. TOTAL	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	%	SEMANAS / EJECUCION SEMANAL CANTIDADES
											JUNIO: 31-05-24, 07-06-24, 14-06-24, 21-06-24, 28-06-24 / JULIO: 05-07-24, 12-07-24, 19-07-24, 26-07-24 / AGOSTO: 02-08-24, 09-08-24, 16-08-24, 23-08-24, 30-08-24 / SEPTIEMBRE: 06-09-24, 13-09-24, 20-09-24, 27-09-24 / OCTUBRE: 04-10-24, 11-10-24, 18-10-24, 25-10-24 / NOVIEMBRE: 01-11-24, 08-11-24, 15-11-24, 22-11-24 / DIC: 29-11-24, 06-12-24
11.1.12	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV04	M2	$ 467.769		$ -			0,00			
11.1.13	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija, correditza y montante superior tipo persiana, en sistem tradicional 3831 con aln 1101, pisavidrio plano riel superior rodachinas ducasse chapa pico loro llave llave haladera, persiana superior aln 315 vidrio laminado incoloro 3+3. PV2 - PV3	M2	$ 578.330		$ -			0,00			
11.1.14	Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P5). No incluye cerradura	M2	$ 526.440		$ -			0,00			
11.1.15	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3). No incluye cerradura	M2	$ 512.238	4,80	$ 2.458.742			4,80	$ 2.458.742	0,27%	
11.1.16	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2	$ 493.010	4,86	$ 2.396.029			4,86	$ 2.396.029	0,26%	
11.1.17	Suministro, transporte e instalación de porton metalico corredizo lámina coldrolled lisa calibre 18, con bisagras y pasador, terminada con anticorrosivo, y esmalte sintetico. medidas (2,30 x 2,40 m) . incluye cerradura de sobreponer	UND	$ 2.406.479		$ -			0,00			
11.1.18	Suministro, transporte e instalacion de cerradura cilíndrica de manija júpiter a50ws cromo mate schlage	UND	$ 103.989	21,00	$ 2.183.769			21,00	$ 2.183.769	0,24%	
11.2	**BARANDAS Y PASA MANOS**				$ -						
11.2.1	Suministro, transporte e instalacion de baranda en acero inoxidable 304, calibre 18, pasamanos en tubo de 2" y entramado horizontal en tuberia de 1/2" calibre 18. incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa. Segun diseño.	ML	$ 661.954	13,50	$ 8.936.379			13,50	$ 8.936.379	0,99%	
11.2.2	Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable 304, calibre 18, Tuberia de 2". incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa o muro. Segun diseño	ML	$ 189.066	8,60	$ 1.625.968			8,60	$ 1.625.968	0,18%	
11.3	**DIVISIONES Y ESPEJOS**				$ -						
11.3.1	Suministro, transporte e instalación de espejo flotado biselado de 4 mm. Incluye estructura de soporye 1 x 1/2",profundidad 1 cm.	M2	$ 254.618	3,20	$ 814.778			3,20	$ 814.778	0,09%	
					$ 74.590.903		**$ -**		**$ 74.590.902**	**8,24%**	
12.0	**APARATOS SANITARIOS**										
12.1	Suministro, transporte e instalación de Taza Baltica entrada posterior. (Incluye Taza Báltica Plus Entrada Posterior de Ref. 113121001. Sistema Instalación Entrada Posterior de Ref. O15300001. Válvula Antivandálica de Ref. 751250001. Asiento Sanitario Institucional Forte de Ref. 609551001 y brida sanitaria)	UND	$ 1.442.940	4,00	$ 5.771.760			4,00	$ 5.771.760	0,64%	
12.2	Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye grifería)	UND	$ 790.606	4,00	$ 3.162.424			4,00	$ 3.162.424	0,35%	
12.3	Suministro, transporte e instalación de grifería lavamanos Monocontrol Dakar Media	UND	$ 212.545	4,00	$ 850.180			4,00	$ 850.180	0,09%	

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024
HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024		

						TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
12.4	Suministro, transporte e instalación de juegos de barra de seguridad (Incluye barra plegable REF 706590001, barra de seguridad recta REF 706550001, accesorios de anclajes y escudos)	UND	$ 977.512	4,00	$ 3.910.048			4,00	$ 3.910.048	0,43%
					$ 13.694.412		**$ -**		**$ 13.694.412**	**1,51%**
13.0	**EQUIPOS ESPECIALES**									
13	**PLATAFORMA ELEVAPERSONAS**				$ -					
13.1	Suministro transporte e instalacion de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende tres pisos, tres paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	UND	$ 127.844.901	0,00	$ -			0,00	$ -	
13.2	Suministro e instalación de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende cuatro pisos, cuatro paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. El equipo cuenta con los elementos de la norma NTC5926-1,. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	UND	$ 104.967.841	0,00	$ -			0,00	$ -	
					$ -		**$ -**		**$ -**	**0,00%**
14.0	**VARIOS**									
14.1	Aseo general final y limpieza	M2	$ 3.614	557,93	$ 2.016.359			557,93	$ 2.016.359	0,22%
14.2	Suministro, transporte e instalación de aviso nomenclatura exterior, en acrilico de 10 mm cristal con frente en acero satinado 304 calibre 22, incluye instalacion con cinta doble faz y pegado industrial	UND	$ 4.758.930	1,00	$ 4.758.930			1,00	$ 4.758.930	
14.3	Sumistro, transporte e instalacion de jardineras prefabricas en cemento acanalada, medidas 100 cm x 60 cm x 30 cm. Impermeabilizada interiormente. No incluye terra negra, ni elemento vegetal.	UND	$ 239.869	12,00	$ 2.878.428			12,00	$ 2.878.428	0,32%
					$ 9.653.718		**$ -**		**$ 9.653.717**	**0,54%**
	SUMA				**$ 823.918.273**		**$ 160.460.406**		**$ 663.437.725**	**72,80%**
	NP									
NP-01	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 161.255,00	45,59	$ 7.351.615	39,734	$ 6.407.306	5,86	$ 944.309	0,10%
NP-05	CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI PARA CAISSON D= 1.50M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE ACELERANTE, MOTOBOMBA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO, DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM Y FORMALETA	ML	$ 3.195.040,00	18,00	$ 57.510.720	15,9	$ 50.801.136	2,10	$ 6.709.584	0,74%
NP-06	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	$ 416.064,00	10,00	$ 4.160.640	4,374	$ 1.819.864	5,63	$ 2.340.776	0,26%
NP-07	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.	ML	$ 11.848.280,00	1,00	$ 11.848.280	0		1,00	$ 11.848.280	1,31%
					$ 80.871.256		**59.028.306,11**		**21.842.949,34**	**2,41%**
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 904.789.529**		**$ 219.488.713**		**$ 685.280.674**	**75,21%**

SEMANAS — EJECUCION SEMANAL CANTIDADES

ÍTEM	JUNIO 31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	JULIO 05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	AGOSTO 02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	SEPTIEMBRE 06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	OCTUBRE 04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	NOVIEMBTRE 01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	DIC 29-11-24	06-12-24
NP-01						39,79						4,00	21,00	7,00		40,00												
NP-05		4,23	3,20	4,40	2,80	1,27																						
NP-06			1,36	3,01							0,72																	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	7,55%	1,88%	1,28%	2,07%	4,77%	6,71%	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,13%	2,33%	1,73%	0,52%	1,07%	1,63%	4,13%	7,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7,55%	9,43%	10,71%	12,78%	17,55%	24,26%	24,26%	24,27%	24,29%	24,32%	24,45%	26,78%	28,51%	29,03%	30,10%	31,73%	35,86%	42,98%	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X___ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"

MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024	HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024

										SEMANAS																									
										JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
										31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24		04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
				TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR																															
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																													
1.0	**PRELIMINARES**																																				
1.1	Cerramiento en teja de zinc calibre 35 altura = 2.4 m. (Incluye puerta provisional en lamina de zinc calibre 35 para entrada vehicular (dimensiones 2.4 x 3.5) y puerta para de trabajadores en lamina de	ML	20,20	5,00	$ 509.040	15,20	$ 1.547.482	0,09%	-					5,00											15,20		7,18	0,04%										
1.2	Localización y replanteo topográfico	M2	356,01	356,01	$ 1.588.873	0,00	$ -		356,01																												
1,3	Demolición de zona general, incluye muros en mampostería, antepiso en concreto, vigas de cimentacion, zapatas, columnas, vigas, viguetas, cubiertas y en general todo lo existente para poder dejar el terreno apto para la nueva edificación, Incluye demolición total mecanica y/o manual, carga mecánica sobre volqueta. El precio incluye , cargue mecánico, excavación mecánica, retiro y disposición final a botadero certificado.	M2	236,54	182,50	$ 9.127.190	54,04	$ 2.702.648	0,16%	172,84					25,66													38,04	0,11%										
1.3					**$ 11.225.103**		**$ 4.250.130**	**0,25%**																													
2.0	**MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CIMENTACIONES**																																				
2.1	Excavación manual en material común	M3	1177,11	1100,94	$ 28.846.830	76,17	$ 1.995.806	0,12%	1.094,19	67,92														15,00	360,00												
2.2	Suministro,transporte e instalacion de relleno en recebo tipo b400 o similar compactado al 95% P.M	M3	0,00		$ -	0,00	$ -																														
2.3	Cargue, transporte, retiro y disposicion final material producto de excavación y otros	M3	1988,13	1477,75	$ 52.571.063	510,38	$ 18.156.715	1,06%	1.465,81	11,94											312,00				980,00												
					$ 81.417.893		**$ 20.152.521**	**1,18%**																													
3.0	**CIMENTACION**																																				
3.1	Suministro, transporte e instalacion de concreto de ciclopeo (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)	M3	85,27	85,27	$ 28.914.801	0,00	$ -		85,27					28,36																							
3.2	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	M3	30,52	30,52	$ 21.725.021	0,00	$ -	0,00%	30,52																												
3.3	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para muros de contención (No incluye refuerzo)	M3	0,00		$ -	0,00	$ -																														
3.4	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de cimentación (No incluye refuerzo)	M3	43,23	40,93	$ 29.775.756	2,30	$ 1.673.204	0,10%	37,25					3,68											2,30		2,06	0,09%										
3.5	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de contrapiso e= 10 cm (Incluye corte y dilatación)	M2	338,96	230,36	$ 18.554.738	108,60	$ 8.747.135	0,51%						230,36																							
					$ 98.970.316		**$ 10.420.339**	**0,61%**																													
4.0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**																																				
4,1	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**																																				
4.1	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, H total = 40 cm (Incluye torta superior e= 10 cm, cuantía concreto = 0.19 m3/m2 - según diseño) (no incluye acero de refuerzo) .Incluye formaleta completa de entrepiso, parales, casetón recuperable, plastico para recubrimiento de caseton. agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0,00	0,00	$ -		$ -																														
4.2	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0,00	0,00	$ -		$ -																														
4.3	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	7,88	0,00	$ -	7,88	$ 9.883.782	0,58%																		2,05	2,33	0,17%										
4.4	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para tanque en concreto, Impermeabilizado, relacion A/C = 0,45, aire incorporado del 6% (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	10,95	0,00	$ -	10,95	$ 11.209.263	0,65%																													
4.5	Suministro, transporte e instalacion de cinta PVC O-22 para tanque en concreto	ML	75,76	0,00	$ -	75,76	$ 7.296.218	0,43%																													
4.6	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para foso elevapersonas, (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	2,02	0,00	$ -	2,02	$ 1.970.373	0,12%															2,35														
4.1.7	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para graderia, (no incluye acero de refuerzo), acabado liso con llana metalica, Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0,00	0,00	$ -		$ -																														

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X___ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"			

MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024	HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024

				TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR			SEMANAS																											
									JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
									31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24		04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																												
4,2	**ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA**																																		
4.7	Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .	KG	28849,09	27334,10	$ 146.702.099	1514,99	$ 8.130.967	0,47%	18.192,97	120,00	161,77		536,01	8.323,35				418,86	3.247,36	2.150,00	2.150,00	1.437,61		1.503,02	1.239,22	164,49	0,05%									
4.8	Suministro, transporte e instalacion de refuerzo en malla electrosoldada.	KG	4372,60	1423,62	$ 9.064.214	4372,60	$ 27.840.344	1,63%						1.423,62							708,51	862,25	1.225,18			425,83	0,16%									
					$ 155.766.313		**$ 66.330.947**	**3,87%**																													
5.0	**PISOS BASES Y ACABADOS**																																		
5.1	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 para alistado de pisos, e=0,04 máx.	M2	337,57		$ -	337,57	$ 12.184.927	0,71%																												
5.2	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e = 0.04 máx.	M2	504,11		$ -	504,11	$ 19.112.322	1,12%																												
5.3	Suministro, transporte e instalación de piso porcelatano. Caliza rectificado marfil caras diferenciadasde primera calidad o similar . Dimensiones 40 x 88 cm	M2	399,18		$ -	399,18	$ 58.016.422	3,39%																												
5.4	Suministro, transporte e instalación de guardaescobas porcelatano caliza rectificado marfil caras diferenciadas de primera calidad o similar H= 8 cm	ML	181,38		$ -	181,38	$ 4.697.561	0,27%																												
5.6	Suministro, transporte e instalación de baldosa vibro prensada tipo Deck de Madera 15x60 o similar	M2	112,45		$ -	112,45	$ 13.698.322	0,80%																												
5.7	Suministro, transporte e instalación de guardaescoba de vibro prensada tipo Deck de Madera H= 7 cm	ML	146,21		$ -	146,21	$ 3.146.878	0,18%																												
5.8	Suministro, transporte e instalación de cinta antideslizante con Fotoluminiscente x 48mm	ML	97,50		$ -	97,50	$ 1.282.710	0,07%																												
5.9	Suministro, transporte e instalación de mediacaña en granito pulido prefabricado h =10cms	ML	128,87		$ -	128,87	$ 5.893.225	0,34%																												
5.10	Construccion de bocapuerta en granito pulido, ancho 10 cm, Incluye dilatación en bronce por ambos costados	ML	24,25		$ -	24,25	$ 1.951.495	0,11%																												
5.11	Suministro, transporte e instalación de piso ceramico comercial calama multicolor caras diferenciadas 51 x 51	M2	54,01		$ -	54,01	$ 4.314.211	0,25%																												
							$ 124.298.072	**7,26%**																													
6.0	**MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**		**0**																																
6.1	Mamposteria en bloque n° 5 o similar	M2	744,01		$ -	744,01	$ 38.735.393	2,26%																		31,46	207,77	0,63%								
6.2	Remates sobre muro en concreto de 2500 psi (12x20 cm) (Incluye acero de refuerzo)	ML	87,57		$ -	87,57	$ 5.726.115	0,33%																												
6.3	Bordillo de remate para placas de cubierta en mamposteria bloque N. 5 o similar	ML	63,71		$ -	63,71	$ 1.792.927	0,10%																												
6.4	Anclaje epoxico D=5/8", profundidad del anclaje 10 cm, Long varilla 1/2" = 70 cm, (Incluye acero de refuerzo)	UND	280,00		$ -	280,00	$ 7.048.160	0,41%																												
6.5	Columnetas en concreto de 2500 psi., 12 cm x 20 cm incluye acero de refuerzo	ML	497,00		$ -	497,00	$ 30.581.901	1,79%																												
6.6	Suministro, transporte e instalacion de mueble para cocina completo medidas 2.70 x 0,60 metros. Incluye mueble inferior en melanina e= 15 mm, acabado mate con apariencia a madera natural, poceta en acero inoxidable y grifería , meson en granito negro san gabriel e= 20 mm con salpicadero h= 10 cm. Esfufa de empotrar en acero inoxidable de dos puestos de 34.1 x 42.5 cm a gas natural. Incluye perforaciones para estufa y poceta y en general todo lo requerido para su correcta instalación.	UND	2,00		$ -	2,00	$ 5.960.680	0,35%																												
6.7	Suministro, transporte e instalacion de esquineros sobre mamposteria	ML	117,80		$ -	117,80	$ 1.302.397	0,08%																												
							$ 91.147.572	**5,32%**																													
7.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																																		
7,1	**SALIDAS ELECTRICAS**				$ -																														
7,1,01	SALIDA PARA ILUMINACION MONOFASICA , CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE TOMA PARA CONEXIÓN RAPIDA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	160,00		$ -	160,00	$ 30.322.560	1,77%																												
7,1,02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	28,00		$ -	28,00	$ 5.083.008	0,30%																												

hapil Ingeniería	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				

MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024	HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024	

				TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%
7,1,03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	15,00		$ -	15,00	$ 3.413.445	0,20%
7,1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	14,00		$ -	14,00	$ 2.570.708	0,15%
7,1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00		$ -	1,00	$ 202.405	0,01%
7,1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00		$ -	4,00	$ 892.200	0,05%
7,1,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00		$ -	6,00	$ 1.319.802	0,08%
7,1,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00		$ -	10,00	$ 4.465.770	0,26%
7,1,09	SALIDA PARA MOTOR TRIFASICO 3HP, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00		$ -	2,00	$ 408.748	0,02%
7,2	**CAJAS DE PASO, CANALIZACIONES**				$ -			
7,2,01	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) LISTADO SECRETARIA 5.1.101	UN	2,00		$ -	2,00	$ 1.510.420	0,09%
7.2.01.A	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-275 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0,00		$ -		$ -	
7,2,02	TUBERÍA EMT Ø3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	47,37		$ -	47,37	$ 1.005.807	0,06%
7,2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN LISTADO SECRETARIA 5.1.48	ML	19,85		$ -	19,85	$ 3.403.818	0,20%
7,2,04	TUBERÍA EMT Ø1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	20,29		$ -	20,29	$ 1.047.776	0,06%
7,2,05	CANALETA METALICA 100X40, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	15,89		$ -	15,89	$ 779.420	0,05%
7,2,06	TUBERÍA EMT Ø2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	6,00		$ -	6,00	$ 437.358	0,03%
7,2,07	CAJA DE PASO PLASTICA 20X20	UN	1,00		$ -	1,00	$ 122.870	0,01%
7,3	**ACOMETIDAS, PARCIALES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN**							
7,3,01	CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	UN	1,00		$ -	1,00	$ 1.559.641	0,09%
7.3.2	DERIVACIÓN AEREA EN BAJA TENSION, NORMA ENEL CODENSA AE219, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	UN	0,00		$ -		$ -	
7,3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA. LISTADO SECRETARIA 5.1.23	UN	1,00		$ -	1,00	$ 847.348	0,05%
7,3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.33	UN	22,00		$ -	22,00	$ 418.704	0,02%
7,3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.38	UN	2,00		$ -	2,00	$ 251.736	0,01%
7,3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS	UN	1,00		$ -	1,00	$ 189.308	0,01%
7,3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. LISTADO SECRETARIA 5.1.65	UN	1,00		$ -	1,00	$ 419.679	0,02%

SEMANAS — EJECUCION SEMANAL CANTIDADES

JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24		04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24

	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	

Contrato ___X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33	CONTRATO / CONVENIO No. FDLSC-COP-928-2023
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022”		

MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024	HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024

				TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%
7,3,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X30A, 25KA	UN	2,00		$ -	2,00	$ 639.704	0,04%
7,3,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3XN.2+N.2N+N.2T SERIE 8000 AL	ML	40,00		$ -	40,00	$ 4.787.280	0,28%
7,3,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3X35mm + 50mm AILSADO DE 3X2 + 1/0	ML	12,79		$ -	12,79	$ 1.530.733	0,09%
7,3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE 3XN.10F+N.10N+N-1OT EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	ML	0,00		$ -		$ -	
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 2KVA, 120V, 5 MINUTOS	UN	1,00		$ -	1,00	$ 2.530.904	0,15%
7,4	**DATOS**				$ -			
7,4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK CON 18 UR INCLUYE ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE. LISTADO SECRETARIA 5.1.121	UN	1,00		$ -	1,00	$ 1.575.086	0,09%
7,4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO. LISTADO SECRETARIA 55.1.68	UN	3,00		$ -	3,00	$ 314.592	0,02%
7,4,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP. LISTADO SECRETARIA 5.1.109	ML	15,72		$ -	15,72	$ 85.815	0,01%
7,4,04	CERTIFICACION PUNTO DE DATOS	UN	3,00		$ -	3,00	$ 23.073	0,00%
7,5	**ILUMINACION**							
7,5,01	SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.85	UN	27,00		$ -	27,00	$ 4.620.618	0,27%
7,5,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X18W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN,	UN	26,00		$ -	26,00	$ 4.529.018	0,26%
7,5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA LED 60X60, INCLUYE DERIVACIÓN EN CABLE, ENCAUCHETADO 3X14 AWG, CLAVIJA Y MARCO EN ALUMINIO PARA INCRUSTAR. LISTADO SECRETARIA 5.1.174	UN	61,00		$ -	61,00	$ 8.400.188	0,49%
7,5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN,	UN	42,00		$ -	42,00	$ 5.026.644	0,29%
7,5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.81	UN	12,00		$ -	12,00	$ 948.948	0,06%
7,6	**VARIOS SISTEMA ELÉCTRICO**				$ -			
7,6,01	Certificación RETIE de uso final bajo resolución de Agosto de 2013 por organismo de certificación avalada por la ONAC	UN	1,00		$ -	1,00	$ 9.133.300	0,53%
							$ 104.818.435	**6,12%**
8.0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIOS**							
8.1	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PVCP Y AGUA CALIENTE (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)**				$ -			
8.1.1	Suministro, transporte e instalación de punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	UN	17,00		$ -	17,00	$ 717.910	0,04%
8.2	**REDES DE AGUA FRIA PVC P**							
8.2.1	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1/2" RDE 9	ML	78,00		$ -	78,00	$ 956.748	0,06%
8.2.2	Suministro, transporte e instalación de red pvc 3/4" RDE 11	ML	3,00		$ -	3,00	$ 40.134	0,00%
8.2.3	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1" RDE 13.5	ML	53,00		$ -	53,00	$ 891.725	0,05%
8.2.4	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1 1/2" RDE 21	ML	14,00		$ -	14,00	$ 394.786	0,02%
8.3	**SALIDAS SANITARIAS (PVCS)**							
8.3.1	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 4"	UN	5,00		$ -	5,00	$ 769.415	0,04%
8.3.2	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 2"	UN	7,00		$ -	7,00	$ 991.830	0,06%
8.3.3	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/sifón 2"	UN	7,00		$ -	7,00	$ 902.412	0,05%
8.3.4	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 4"	UN	13,00		$ -	13,00	$ 1.292.720	0,08%
8.3.5	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 3"	UN	0,00		$ -		$ -	
8.4	**REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)**							
8.4.1	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-l 2"	ML	19,00		$ -	19,00	$ 466.089	0,03%
8.4.3	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 2"	ML	132,00		$ -	132,00	$ 4.469.652	0,26%
8.4.4	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 3"	ML	12,00		$ -	12,00	$ 664.488	0,04%
8.4.5	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 4"	ML	151,00		$ -	151,00	$ 10.053.731	0,59%

SEMANAS — EJECUCION SEMANAL CANTIDADES

ÍTEM	JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
	31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24		04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
7,3,08																													
7,3,09																													
7,3,10																													
7,3,11																													
7.3.12																													
7,4																													
7,4,01																													
7,4,02																													
7,4,03																													
7,4,04																													
7,5																													
7,5,01																													
7,5,02																													
7,5,03																													
7,5,04																													
7,5,05																													
7,6																													
7,6,01																													
8.1																													
8.1.1																													
8.2																													
8.2.1																													
8.2.2																													
8.2.3																													
8.2.4																													
8.3																													
8.3.1										2,00		2,00	4,00			5,00													
8.3.2										6,00			7,00																
8.3.3												3,00																	
8.3.4												6,00																	
8.3.5																													
8.4																													
8.4.1																													
8.4.3												11,00																	
8.4.4																													
8.4.5							10,00	8,00				43,50																	

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X___ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"

MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024	HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024

											SEMANAS																									
											JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
											31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24		04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
				TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR																																
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																														
8.4.6	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-p 3"	ML	36,00		$ -	36,00	$ 3.011.508	0,18%																														
8.4.7	Suministro, transporte e instalación de tragantes 4" - 6"	UN	11,00		$ -	11,00	$ 761.145	0,04%																														
8.4.8	Suministro, transporte e instalación de rejilla 4" - 6"	UN	0,00		$ -		$ -																														
8.4.9	Suministro, transporte e instalación de rejilla 3" - 2"	UN	0,00		$ -		$ -																														
8.5	**VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION**																																				
8.5.1	Suministro, transporte e instalación de valvula de ventilación 2"	UN	13,00		$ -	13,00	$ 1.574.222	0,09%																														
8.5.2	Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1/2"	UN	14,00		$ -	14,00	$ 1.313.018	0,08%																														
8.5.3	Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1"	UN	3,00		$ -	3,00	$ 438.264	0,03%																														
8.5.4	Suministro, transporte e instalación de valvula de retención red white tipo pesado 1"	UN	1,00		$ -	1,00	$ 140.530	0,01%																														
8.5.5	Suministro, transporte e instalación de flotador mecanico 3/4"	UN	1,00		$ -	1,00	$ 151.579	0,01%																														
8.6	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA, CONCRETO Y OTROS**																																				
8.6.1	Cajas de inspección de 40 x 40 (medidas internas)	UD	1,00		$ -	1,00	$ 446.232	0,03%																														
8.6.2	Cajas de inspección de 60 x 60 (medidas internas)	UD	1,00		$ -	1,00	$ 536.454	0,03%																														
8.6.3	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombeo tipo lapicero trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=2.00 lps y H=25.00 m. Incluye tanque hidroneumático.	UD	1,00		$ -	1,00	$ 10.428.576	0,61%																														
8.6.4	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombas eyectoras trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=10.00 lps y H=7.00 m. Incluye valvulas de compuertas y cheques.	UD	1,00		$ -	1,00	$ 12.351.376	0,72%																														
8.7	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																																				
8.7.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m	M3	10,80		$ -	10,80	$ 279.785	0,02%																														
8.7.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	4,32		$ -	4,32	$ 126.645	0,01%																														
8.7.3	Relleno con arena de peña	M3	2,16		$ -	2,16	$ 129.129	0,01%																														
8.7.4	Retiro de sobrantes a una distancia de 22 km (incluye cargue)	M3	5,62		$ -	5,62	$ 165.453	0,01%																														
8.8	**PUNTOS GAS (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)**																																				
8.8.1	Suministro, transporte e instalación de punto de gas pealpe 1/2"	UN	2,00		$ -	2,00	$ 100.592	0,01%																														
8.9	**REDES DE GAS**																																				
8.9.1	Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1620	ML	4,00		$ -	4,00	$ 53.148	0,00%																														
8.9.2	Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1216	ML	4,00		$ -	4,00	$ 46.288	0,00%																														
8.10	**CENTRO DE VÁLVULAS**																																				
8.10.1	Suministro, transporte e instalación de valvula pealpe 1216	UN	2,00		$ -	2,00	$ 81.410	0,00%																														
8.11	**RED CONTRA INCENDIO**																																				
8.11.1	Suministro, transporte e instalación de punto Gabinetes Clase II	Un.	3,00		$ -	3,00	$ 388.578	0,02%																														
8.11.2	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø4"	Un.	12,00		$ -	12,00	$ 2.338.260	0,14%																														
8.11.3	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø1 1/2"	Un.	16,00		$ -	16,00	$ 1.035.920	0,06%																														
8.11.4	Suministro, transporte e instalación de Siamesa De ø4"×ø2½"×ø2½", inlcuye cheque ranurado de 4"	Un.	1,00		$ -	1,00	$ 2.196.763	0,13%																														
8.11.5	Suministro, transporte e instalación de Gabinete en Lamina Cold Rolled Calibre 20 de 0.77×0.77×0.22, Válvula angular 1½", Soporte tipo canasta, Manguera fibra poliester y caucho 1½"×100', Boquilla chorro y niebla 1½"-Hacha pico 4½" lbs, Llave Spaner-Extintor de polvo	Un.	3,00		$ -	3,00	$ 2.328.990	0,14%																														
							$ 63.035.505	**3,68%**																														
9	**CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS**																																				
9.1	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e=0,04 máx, para cubiertas	M2	213,00		$ -	213,00	$ 8.589.864	0,50%																														
9.2	Suministro, transporte e instalación de Cielo Raso de PVC Blanco e= 7 cm, incluye estructura de soporte	M2	403,40		$ -	403,40	$ 31.320.379	1,83%																														
9.3	Impermeabilización con sika manto -1300 emulsión bituminosa elástica, e= 2 mm. Incluye acabado en pintura reflectiva de aluminio	M2	403,00		$ -	403,00	$ 39.217.542	2,29%																														
							$ 79.127.785	**4,62%**																														
10	**PINTURA Y ACABADO DE MUROS**																																				
10.1	Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm. (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	669,41		$ -	669,41	$ 17.567.195	1,03%																														
10.2	Pañete impermeabilizado muros 1:4 e=1.5 cm (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	798,27		$ -	798,27	$ 23.195.331	1,35%																														
10.3	Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	669,41		$ -	669,41	$ 10.732.570	0,63%																														
10.4	Pintura tipo acrílica para exteriores, a 3 manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	581,42		$ -	581,42	$ 12.430.760	0,73%																														
10.5	Pintura epoxica a tres manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	62,33		$ -	62,33	$ 1.987.891	0,12%																														
10.6	Estuco plástico acrílico (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1250,83		$ -	1250,83	$ 24.691.286	1,44%																														
10.7	Enchape cerámico pared blanco tipo Jaya cara unica 25 cm x 43 cm Blanca de primera calidad o similar	M2	206,80		$ -	206,80	$ 16.971.249	0,99%																														
10.8	Suministro, transporte e instalacion de meson en policuarzo, espesor 2 cm, incluyen faldon frontal de 10 cm, ancho 60 cm.	ML	6,20		$ -	6,20	$ 3.329.636	0,19%																														

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"

MUNICIPIO	BOGOTÁ CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024	HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024

										SEMANAS																											
										JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
										31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24		04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
				TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR																																	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																														
							$ 110.905.917	6,48%																															
11	CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, DIVISIONES Y OTROS)																																				
11.1	CARPINTERIA METALICA Y OTROS																																				
11.1.1	Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia . V01- V05	M2	39,05		$ -	39,05	$ 22.396.073	1,31%																														
11.1.2	Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia.V02- V03- V04	M2	88,77		$ -	88,77	$ 42.402.943	2,48%																														
11.1.3	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V06 -V07	M2	21,60		$ -	21,60	$ 10.560.672	0,62%																														
11.1.4	Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P6). No incluye cerradura	M2	21,36		$ -	21,36	$ 11.244.758	0,66%																														
11.1.5	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3 -P5). No incluye cerradura	M2	22,32		$ -	22,32	$ 11.433.152	0,67%																														
11.1.6	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2	7,20		$ -	7,20	$ 3.549.672	0,21%																														
11.1.7	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras. vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV02- PV03	M2	29,25		$ -	29,25	$ 13.682.243	0,80%																														
11.1.8	Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia . V01- V03	M2	22,00		$ -	22,00	$ 12.617.506	0,74%																														
11.1.9	Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia.V02- V06	M2	10,30		$ -	10,30	$ 4.920.022	0,29%																														
11.1.10	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada proyectante con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V04	M2	7,75		$ -	7,75	$ 3.982.849	0,23%																														
11.1.11	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V05	M2	12,00		$ -	12,00	$ 5.867.040	0,34%																														

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"			

MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024	HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024

										SEMANAS																											
										JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
										31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24		04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
				TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR																																
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																														
11.1.12	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV04	M2	19,86		$ -	19,86	$ 9.289.892	0,54%																														
11.1.13	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija, corrediza y montante superior tipo persiana, en sistem tradicional 3831 con aln 1101, pisavidrio plano riel superior rodachinas ducasse chapa pico loro llave llave haladera, persiana superior aln 315 vidrio laminado incoloro 3+3. PV2 - PV3	M2	41,12		$ -	41,12	$ 23.780.930	1,39%																														
11.1.14	Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P5). No incluye cerradura	M2	24,66		$ -	24,66	$ 12.982.010	0,76%																														
11.1.15	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3). No incluye cerradura	M2	9,60		$ -	9,60	$ 4.917.485	0,29%																														
11.1.16	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2			$ -		$ -																														
11.1.17	Suministro, transporte e instalación de porton metalico corredizo lámina coldrolled lisa calibre 18, con bisagras y pasador, terminada con anticorrosivo, y esmalte sintetico. medidas (2,30 x 2,40 m) . incluye cerradura de sobreponer	UND	1,00		$ -	1,00	$ 2.406.479	0,14%																														
11.1.18	Suministro, transporte e instalacion de cerradura cilíndrica de manija júpiter a50ws cromo mate schlage	UND	20,00		$ -	20,00	$ 2.079.780	0,12%																														
11.2	**BARANDAS Y PASA MANOS**																																				
11.2.1	Suministro, transporte e instalacion de baranda en acero inoxidable 304, calibre 18, pasamanos en tubo de 2" y entramado horizontal en tuberia de 1/2" calibre 18. incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa. Segun diseño.	ML	20,00		$ -	20,00	$ 13.239.080	0,77%																														
11.2.2	Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable 304, calibre 18, Tuberia de 2". incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa o muro. Segun diseño	ML	35,00		$ -	35,00	$ 6.617.310	0,39%																														
11,3	**DIVISIONES Y ESPEJOS**																																				
11.3.1	Suministro, transporte e instalación de espejo flotado biselado de 4 mm. Incluye estructura de soporye 1 x 1/2",profundidad 1 cm.	M2	4,00		$ -	4,00	$ 1.018.472	0,06%																														
							$ 218.988.369	**12,79%**																														
12	**APARATOS SANITARIOS**																																				
12.1	Suministro, transporte e instalación de Taza Baltica entrada posterior. (Incluye Taza Báltica Plus Entrada Posterior de Ref. 113121001. Sistema Instalación Entrada Posterior de Ref. O15300001. Válvula Antivandálica de Ref. 751250001. Asiento Sanitario Institucional Forte de Ref. 609551001 y brida sanitaria)	UND	5,00		$ -	5,00	$ 7.214.700	0,42%																														
12.2	Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye grifería)	UND	5,00		$ -	5,00	$ 3.953.030	0,23%																														
12.3	Suministro, transporte e instalación de grifería lavamanos Monocontrol Dakar Media	UND	5,00		$ -	5,00	$ 1.062.725	0,06%																														
12.4	Suministro, transporte e instalación de juegos de barra de seguridad (Incluye barra plegable REF 706590001, barra de seguridad recta REF 706550001, accesorios de anclajes y escudos)	UND	4,00		$ -	4,00	$ 3.910.048	0,23%																														
							$ 16.140.503	**0,94%**																														
13	**EQUIPOS ESPECIALES**																																				
13	**PLATAFORMA ELEVAPERSONAS**																																				
13,1	Suministro transporte e instalacion de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende tres pisos, tres paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	UND	0,00		$ -		$ -																														

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio ______	**INFORME EJECUTIVO SEMANA No**	**33**	**CONTRATO / CONVENIO No.**	**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**				
MUNICIPIO	**BOGOTÁ**	**CUNDINAMARCA**	**DEPARTAMENTO**	**CUNDINAMARCA**	
PERIODO DEL INFORME DESDE:	**21/09/2024**	**HASTA:**	**27/09/2024**	**FECHA INFORME:**	**27/09/2024**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REVISADA	TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO VR. TOTAL	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VR. TOTAL	%
13,2	Suministro e instalación de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende cuatro pisos, cuatro paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. El equipo cuenta con los elementos de la norma NTC5926-1,. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	UND	1,00		$ -		$ -	
							$ -	**0,00%**
14	**VARIOS**							
14.1	Aseo general final y limpieza	M2	1157,91		$ -	1157,91	$ 4.184.687	0,24%
14.2	Suministro, transporte e instalación de aviso nomenclatura exterior, en acrilico de 10 mm cristal con frente en acero satinado 304 calibre 22, incluye instalacion con cinta doble faz y pegado industrial	UND	1,00		$ -		$ -	
14,3	Sumistro, transporte e instalacion de jardineras prefabricas en cemento acanalada, medidas 100 cm x 60 cm x 30 cm. Impermeabilizada interiormente. No incluye terra negra, ni elemento vegetal.	UND	0,00		$ -		$ -	
							$ 4.184.687	**0,24%**
	SUMA				**$ 347.379.624**		**$ 913.800.783**	**53,38%**
	NP							
NP-01	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	400,00	192,36	$ 31.019.657	207,64	$ 33.482.343	1,96%
NP-02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI, PARA PLACA DE ENTREPISO CON VIGAS DESCOLGADAS, H TOTAL = 40 CM (INCLUYE TORTA SUPERIOR E= 10 CM, CUANTÍA CONCRETO = 0.19 M3/M2 - SEGÚN DISEÑO) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA COMPLETA DE ENTREPISO, PARALES, CASETÓN RECUPERABLE, PLÁSTICO PARA RECUBRIMIENTO DE CASETÓN. AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	627,16	154,77	$ 43.246.266	472,40	$ 132.002.195	7,71%
NP-03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI PARA COLUMNAS. (NO INCLUYE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA METÁLICA COMPLETA, ANDAMIOS CERTIFICADOS, PARALES, AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	41,68	12,35	$ 12.334.019	29,33	$ 29.292.047	1,71%
NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI, PARA MUROS DE CONTENCIÓN (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	68,13	9,22	$ 9.023.607	58,91	$ 57.640.712	3,37%
NP-06	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	5,00	2,07	$ 861.252	2,93	$ 1.219.068	0,07%
					96.484.801,13		**253.636.364,48**	**14,82%**
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 443.864.426**		**$ 1.167.437.147**	**68,19%**

SEMANAS — EJECUCION SEMANAL CANTIDADES

ÍTEM	JUNIO 31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	JULIO 05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	AGOSTO 02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24
13,2														
14.1														
14.2														
14,3														
NP-01						192,36						102,5		
NP-02						154,77							201,47	
NP-03						12,35						13,25		15,83
NP-04						9,22								
NP-06		2,07												
	15,56%	**0,22%**	**0,05%**	**0,00%**	**0,17%**	**10,63%**	**0,04%**	**0,03%**	**0,00%**	**0,20%**	**1,02%**	**3,33%**	**4,32%**	**1,83%**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**15,56%**	**15,78%**	**15,83%**	**15,83%**	**16,00%**	**26,63%**	**26,67%**	**26,70%**	**26,70%**	**26,90%**	**27,92%**	**31,24%**	**35,56%**	**37,39%**

ÍTEM	SEPTIEMBRE 06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24		OCTUBRE 04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	NOVIEMBTRE 01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	DIC 29-11-24	06-12-24
13,2															
14.1															
14.2															
14,3															
NP-01		88,00													
NP-02	205,09			71,82	1,17%										
NP-03				0,97	0,06%										
NP-04				11,28	0,64%										
NP-06															
	3,83%	**4,12%**	**0,63%**	**3,13%**	**3,13%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**41,22%**	**45,34%**	**45,97%**	**49,10%**		**49,10%**	**49,10%**	**49,10%**	**49,10%**	**49,10%**	**49,10%**	**49,10%**	**49,10%**	**49,10%**	**49,10%**

hapil Ingeniería	**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA** **FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____				**INFORME EJECUTIVO SEMANA No.**	**33**	**CONTRATO / CONVENIO No.**		**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**						
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO:**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**21/9/2024**	**HASTA:**	**27/9/2024**	**FECHA INFORME:**	**27/9/2024**

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES					
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO					**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS**
	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL	
	1, PRELIMINARES				
1,1	1.1 Cerramiento en teja de zinc calibre 35 altura = 2.4 m. (Incluye puerta provisional en lamina de zinc calibre 35 para entrada vehicular (dimensiones 2.4 x 3.5) y puerta para de trabajadores en lamina de zinc calibre 35 dimensiones 1.0 x 2.4 m)	**0,30%**	**0,06%**	**0,03%**	
1,2	1.2 Localización y replanteo topográfico	**0,09%**	**0,09%**	**0,00%**	
1,3	1.3 Demolición de zona general, incluye muros en mampostería, antepiso en concreto, vigas de cimentacion, zapatas, columnas, vigas, viguetas, cubiertas y en general todo lo existente para poder dejar el terreno apto para la nueva edificaciòn, Incluye demolición total mecanica y/o manual, carga mecánica sobre volqueta. El precio incluye , cargue mecánico, excavación mecánica, retiro y disposición final a botadero certificado.	**1,33%**	**1,36%**	**0,07%**	
2	**2. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CIMENTACIONES**				
2.1	2.1 Excavación manual en material común	**1,20%**	**1,25%**	**0,00%**	
2.2	2.2 Suministro,transporte e instalacion de relleno en recebo tipo b400 o similar compactado al 95% P.M	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
2.3	2.3 Cargue, transporte, retiro y disposicion final material producto de excavación y otros	**3,06%**	**2,80%**	**0,00%**	
3	**3. CIMENTACION**				
3.1	3.1 Suministro, transporte e instalacion de concreto de ciclopeo (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)	**1,71%**	**2,07%**	**0,00%**	
3.2	3.2 Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	**1,45%**	**2,42%**	**0,00%**	
3.3	3.3 Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para muros de contención (No incluye refuerzo)	**0,58%**	**0,48%**	**0,00%**	
3.4	3.4 Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de cimentación (No incluye refuerzo)	**1,68%**	**1,37%**	**0,06%**	
3.5	3.5 Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de contrapiso e= 10 cm (Incluye corte y dilatación)	**1,40%**	**0,97%**	**0,01%**	

	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
	FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____				**INFORME EJECUTIVO SEMANA No.**	**33**	**CONTRATO / CONVENIO No.**		**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**						
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO:**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**21/9/2024**	**HASTA:**	**27/9/2024**	**FECHA INFORME:**	**27/9/2024**

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES					
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO					**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS**
	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL	
4.0	**4. ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y METALICAS**				
4.1	**4.1. ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y METALICAS**				
4.1.1	4.1.1 Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, H total = 40 cm (Incluye torta superior e= 10 cm, cuantía concreto = 0.19 m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo) .Incluye formaleta completa de entrepiso, parales, casetòn recuperable, plastico para recubrimiento de caseton. agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	**2,63%**	**0,00%**	**1,04%**	
4.1.2	4.1.2 Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	**0,73%**	**0,45%**	**0,16%**	**4.1.2 Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.** Se realiza la instalación de concreto de 3000 PSI para la totalidad de columnas en el frente de obra Los Alpes, estas se encuentran desde el nivel 3.75m a 7.55m
4.1.3	4.1.3 Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	**0,73%**	**0,00%**	**0,11%**	
4.1.4	4.1.4 Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para tanque en concreto, Impermeabilizado, relacion A/C = 0,45, aire incorporado del 6% (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	**0,78%**	**0,90%**	**0,00%**	**4.1.3 Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.** Se realizó el suministro e instalación de concreto der resistencia de 3000 psi para las escaleras del CPC Brisas, estas escaleras corresponden a la conexión entre el primer y segundo piso cuenta con 2 descansos en la totalidad del tramo y se ubica entre los ejes 3-4 y C-D
4.1.5	4.1.5 Suministro, transporte e instalacion de cinta PVC O-22 para tanque en concreto	**0,39%**	**0,00%**	**0,00%**	
4.1.6	4.1.6 Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para foso elevapersonas, (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	**0,14%**	**0,14%**	**0,00%**	
4.1.7	4.1.7 Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para graderia, (no incluye acero de refuerzo), acabado liso con llana metalica, Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
4.2	**4.2 ESTRUCTURAS DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA**				
4.2.1	4.2.1 Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .	**8,77%**	**9,81%**	**1,01%**	**4.2.1 Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .** Se realizó la instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI para las escaleras en el CPC Brisas entre piso 1 y piso 2 ubicadas en el eje 3-4 y C-D. Se realizó la instalación de acero de refuerzo para la totalidad de las columnas desde el nivel 3.75m a 7.55m en el frente de obra CPC Los Alpes
4.2.2	4.2.2 Suministro, transporte e instalacion de refuerzo en malla electrosoldada.	**1,57%**	**1,15%**	**0,26%**	**4.2.2 Suministro, transporte e instalacion de refuerzo en malla electrosoldada.** Se realizó la instalación de refuerzo en malla electrosoldada para la placa correspondiente a la rampa vehicular en el frente de obra Las Brisas
5.0	**5. PISOS BASES Y ACABADOS**				
5.1	5.1 Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 para alistado de pisos, e=0,04 máx.	**0,75%**	**0,00%**	**0,00%**	
5.2	5.2 Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e = 0.04 máx.	**0,89%**	**0,00%**	**0,00%**	
5.3	5.3 Suministro, transporte e instalación de piso porcelatano. Caliza rectificado marfil caras diferenciadasde primera calidad o similar . Dimensiones 40 x 88 cm	**2,40%**	**0,00%**	**0,00%**	

hapil Ingeniería	**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA** **FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____			**INFORME EJECUTIVO SEMANA No.**	**33**	**CONTRATO / CONVENIO No.**	**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**					
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO:**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**21/9/2024**	**HASTA:**	**27/9/2024**	**FECHA INFORME:**	**27/9/2024**

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS**
	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL	
5.4	5.4 Suministro, transporte e instalación de guardaescobas porcelatano caliza rectificado marfil caras diferenciadas de primera calidad o similar H= 8 cm	**0,24%**	**0,00%**	**0,00%**	
5.5	5.5 Suministro, transporte e instalación de baldosa vibro prensada tipo Deck de Madera 15x60 o similar	**0,80%**	**0,00%**	**0,00%**	
5.6	5.6 Suministro, transporte e instalación de guardaescoba de vibro prensada tipo Deck de Madera H= 7 cm	**0,17%**	**0,00%**	**0,00%**	
5.7	5.7 Suministro, transporte e instalación de cinta antideslizante con Fotoluminiscente x 48mm	**0,08%**	**0,00%**	**0,00%**	
5.8	5.8 Suministro, transporte e instalación de mediacaña en granito pulido prefabricado h =10cms	**0,23%**	**0,00%**	**0,00%**	
5.9	5.9 Construccion de bocapuerta en granito pulido, ancho 10 cm, Incluye dilatación en bronce por ambos costados	**0,10%**	**0,00%**	**0,00%**	
5.10	5.10 Suministro, transporte e instalación de piso ceramico comercial calama multicolor caras diferenciadas 51 x 51	**0,75%**	**0,00%**	**0,00%**	
6.0	**6. MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**				
6.1	6.1 Mampostería en bloque nº 5 o similar	**2,86%**	**0,00%**	**0,40%**	**6.1 Mampostería en bloque nº 5 o similar.** Se continua el proceso de instalación de mampostería en bloque No.5 en el piso 1 y 2 del CPC Brisas, según planos estructurales y arquitectónicos
6.2	6.2 Remates sobre muro en concreto de 2500 psi (12x20 cm) (Incluye acero de refuerzo)	**0,33%**	**0,00%**	**0,00%**	
6.3	6.3 Bordillo de remate para placas de cubierta en mamposteria bloque N. 5 o similar	**0,10%**	**0,00%**	**0,00%**	
6.4	6.4 Anclaje epoxico D=5/8", profundidad del anclaje 10 cm, Long varilla 1/2" = 70 cm, (Incluye acero de refuerzo)	**0,48%**	**0,00%**	**0,01%**	
6.5	6.5 Columnetas en concreto de 2500 psi., 12 cm x 20 cm incluye acero de refuerzo	**1,81%**	**0,00%**	**0,00%**	
6.6	6.6 Suministro, transporte e instalacion de mueble para cocina completo medidas 2.70 x 0,60 metros. Incluye mueble inferior en melanima e= 15 mm, acabado mate con apariencia a madera natural, poceta en acero inoxidable y griferia , meson en granito negro san gabriel e= 20 mm con salpicadero h= 10 cm. Esfufa de empotrar en acero inoxidable de dos puestos de 34.1 x 42.5 cm a gas natural. Incluye perforaciones para estufa y poceta y en general todo lo requerido para su correcta instalaciòn.	**0,44%**	**0,00%**	**0,00%**	

hapil Ingeniería	**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA** **FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____				**INFORME EJECUTIVO SEMANA No.**	**33**	**CONTRATO / CONVENIO No.**		**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**						
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO:**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**21/9/2024**	**HASTA:**	**27/9/2024**	**FECHA INFORME:**	**27/9/2024**

	INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES				
	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS**
	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL	
6.7	6.7 Suministro, transporte e instalacion de esquineros sobre mamposteria	**0,11%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.0	**7. INSTALACIONES ELECTRICAS**				
7.1.	**7.1 SALIDAS ELECTRICAS**				
7.1.1.	7.1.1 SALIDA PARA ILUMINACION MONOFASICA , CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE TOMA PARA CONEXIÓN RAPIDA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	**1,91%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.1.1.	7.1.2 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	**0,38%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.1.2.	7.1.3 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	**0,22%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.1.1.	7.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	**0,18%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.1.1.	7.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	**0,03%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.1.1.	7.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	**0,06%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.1.1.	7.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	**0,10%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.1.1.	7.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	**0,25%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.1.1.	7.1.8 SALIDA PARA MOTOR TRIFASICO 3HP, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	**0,03%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.2.	**7.2 CAJAS DE PASO, CANALIZACIONES**				
7.2.1	7.2.1 CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) LISTADO SECRETARIA 5.1.101	**0,08%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.2.2	7.2.2 CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-275 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	**0,07%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.2.3	7.2.3 TUBERÍA EMT Ø3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	**0,06%**	**0,00%**	**0,00%**	

hapil Ingeniería	**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA** **FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____			**INFORME EJECUTIVO SEMANA No.**	**33**	**CONTRATO / CONVENIO No.**	**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**					
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO:**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**21/9/2024**	**HASTA:**	**27/9/2024**	**FECHA INFORME:**	**27/9/2024**

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS**
	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL	
7.2.4	7.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN LISTADO SECRETARIA 5.1.48	**0,16%**	**0,06%**	**0,00%**	
7.2.5	7.2.5 TUBERÍA EMT Ø1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	**0,06%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.2.6	7.2.6 CANALETA METALICA 100X40, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	**0,05%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.2.7	7.2.7 TUBERÍA EMT Ø2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	**0,03%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.2.8	7.2.8 CAJA DE PASO PLASTICA 20X20	**0,01%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.3	**7.3 ACOMETIDAS, PARCIALES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION**				
7.3.1	7.3.1 CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	**0,06%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.3.2	7.3.2 DERIVACIÓN AEREA EN BAJA TENSION, NORMA ENEL CODENSA AE219, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	**0,09%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.3.3	7.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA. LISTADO SECRETARIA 5.1.23	**0,06%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.3.4	7.3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.33	**0,03%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.3.5	7.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.38	**0,02%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.3.6	7.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS	**0,01%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.3.7	7.3.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. LISTADO SECRETARIA 5.1.65	**0,03%**	**0,00%**	**0,00%**	

hapil Ingeniería	**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA** **FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____				**INFORME EJECUTIVO SEMANA No.**	**33**	**CONTRATO / CONVENIO No.**		**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**						
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO:**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**21/9/2024**	**HASTA:**	**27/9/2024**	**FECHA INFORME:**	**27/9/2024**

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS**
	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL	
7.3.8	7.3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X30A, 25KA	**0,05%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.3.9	7.3.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3XN.2+N.2N+N.2T SERIE 8000 AL	**0,18%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.3.10	7.3.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3X35mm + 50mm AILSADO DE 3X2 + 1/0	**0,12%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.3.11	7.3.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE 3XN.10F+N.10N+N-1OT EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	**0,07%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.3.12	7.3.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 2KVA, 120V, 5 MINUTOS	**0,19%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.4	**7.4 DATOS**				
7.4.1	7.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK CON 18 UR INCLUYE ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE. LISTADO SECRETARIA 5.1.121	**0,12%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.4.2	7.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO. LISTADO SECRETARIA 55.1.68	**0,03%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.4.3	7.4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP. LISTADO SECRETARIA 5.1.109	**0,01%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.4.4	7.4.4 CERTIFICACION PUNTO DE DATOS	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.5	**7.5 ILUMINACION**				
7.5.1	7.5.1 SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.85	**0,29%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.5.2	7.5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X18W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN,	**0,26%**	**0,00%**	**0,00%**	

hapil Ingeniería	**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA** **FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____			**INFORME EJECUTIVO SEMANA No.**	**33**	**CONTRATO / CONVENIO No.**	**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**					
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO:**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**21/9/2024**	**HASTA:**	**27/9/2024**	**FECHA INFORME:**	**27/9/2024**

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS**
	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL	
7.5.3	7.5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA LED 60X60, INCLUYE DERIVACIÓN EN CABLE, ENCAUCHETADO 3X14 AWG, CLAVIJA Y MARCO EN ALUMINIO PARA INCRUSTAR. LISTADO SECRETARIA 5.1.174	**0,54%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.5.4	7.5.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN,	**0,32%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.5.5	7.5.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.81	**0,06%**	**0,00%**	**0,00%**	
7.6	**7.6 VARIOS SISTEMA ELÉCTRICO**				
7.6.1	7.6.1 Certificación RETIE de uso final bajo resolución de Agosto de 2013 por organismo de certificación avalada por la ONAC	**0,68%**	**0,00%**	**0,00%**	
8	**8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. RED CONTRA INCENDIOS**				
8.1	**8.1 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PVCP Y AGUA CALIENTE (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)**				
8.1.1	8.1.1 Suministro, transporte e instalación de punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	**0,05%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.2	**8.2 REDES DE AGUA FRIA PVC P**				
8.2.1	8.2.1 Suministro, transporte e instalación de red pvc 1/2" RDE 9	**0,06%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.2.2	8.2.2 Suministro, transporte e instalación de red pvc 3/4" RDE 11	**0,01%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.2.3	8.2.3 Suministro, transporte e instalación de red pvc 1" RDE 13.5	**0,04%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.2.4	8.2.4 Suministro, transporte e instalación de red pvc 1 1/2" RDE 21	**0,03%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.3	**8.3 SALIDAS SANITARIAS (PVCS)**				
8.3.1	8.3.1 Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 4"	**0,10%**	**0,06%**	**0,00%**	

hapil Ingeniería	**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA** **FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____			**INFORME EJECUTIVO SEMANA No.**	**33**	**CONTRATO / CONVENIO No.**	**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**					
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO:**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**21/9/2024**	**HASTA:**	**27/9/2024**	**FECHA INFORME:**	**27/9/2024**

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS**
	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL	
8.3.2	8.3.2 Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 2"	**0,07%**	**0,08%**	**0,01%**	
8.3.3	8.3.3 Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/sifón 2"	**0,10%**	**0,03%**	**0,01%**	
8.3.4	8.3.4 Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 4"	**0,06%**	**0,03%**	**0,00%**	
8.3.5	8.3.5 Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 3"	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.4	**8.4 REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)**				
8.4.1	8.4.1 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-l 2"	**0,05%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.4.3	8.4.3 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 2"	**0,18%**	**0,03%**	**0,00%**	
8.4.4	8.4.4 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 3"	**0,28%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.4.5	8.4.5 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 4"	**0,64%**	**0,23%**	**0,00%**	
8.4.6	8.4.6 Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-p 3"	**0,19%**	**0,02%**	**0,00%**	
8.4.7	8.4.7 Suministro, transporte e instalación de tragantes 4" - 6"	**0,04%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.4.8	8.4.8 Suministro, transporte e instalación de rejilla 4" - 6"	**0,01%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.4.9	8.4.9 Suministro, transporte e instalación de rejilla 3" - 2"	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	

hapil Ingeniería	**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA** **FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____			**INFORME EJECUTIVO SEMANA No.**	**33**	**CONTRATO / CONVENIO No.**	**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**					
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO:**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**21/9/2024**	**HASTA:**	**27/9/2024**	**FECHA INFORME:**	**27/9/2024**

	INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES				
	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS**
	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL	
8.5	**8.5 VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION**				
8.5.1	8.5.1 Suministro, transporte e instalación de valvula de ventilación 2"	**0,10%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.5.2	8.5.2 Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1/2"	**0,08%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.5.3	8.5.3 Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1"	**0,02%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.5.4	8.5.4 Suministro, transporte e instalación de valvula de retención red white tipo pesado 1"	**0,01%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.5.5	8.5.5 Suministro, transporte e instalación de flotador mecanico 3/4"	**0,01%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.6	**8.6 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA, CONCRETO Y OTROS**				
8.6.1	8.6.1 Cajas de inspección de 40 x 40 (medidas internas)	**0,05%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.6.2	8.6.2 Cajas de inspección de 60 x 60 (medidas internas)	**0,06%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.6.3	8.6.3 Suministro, transporte e instalación de equipo de bombeo tipo lapicero trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=2.00 lps y H=25.00 m. Incluye tanque hidroneumático.	**0,77%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.6.4	8.6.4 Suministro, transporte e instalación de equipo de bombas eyectoras trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=10.00 lps y H=7.00 m. Incluye valvulas de compuertas y cheques.	**0,92%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.7	**8.7 MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
8.7.1	8.7.1 Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m	**0,07%**	**0,00%**	**0,00%**	
8.7.2	8.7.2 Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	**0,03%**	**0,00%**	**0,00%**	

hapil Ingeniería	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____				INFORME EJECUTIVO SEMANA No.	33	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023		
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"							
MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/9/2024	HASTA:	27/9/2024	FECHA INFORME:	27/9/2024

	INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES				
	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS
	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL	
8.7.3	8.7.3 Relleno con arena de peña	0,03%	0,00%	0,00%	
8.7.4	8.7.4 Retiro de sobrantes a una distancia de 22 km (incluye cargue)	0,04%	0,00%	0,00%	
8.8	**8.8 PUNTOS GAS (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)**				
8.8.1	Suministro, transporte e instalación de punto de gas pealpe 1/2"	0,01%	0,00%	0,00%	
8.9	**8.9 REDES DE GAS**				
8.9.1	8.9.1 Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1620	0,00%	0,00%	0,00%	
8.9.2	8.9.2 Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1216	0,00%	0,00%	0,00%	
8.10	**8.10 CENTRO DE VÁLVULAS**				
8.10.1	8.10.1 Suministro, transporte e instalación de valvula pealpe 1216	0,01%	0,00%	0,00%	
8.11	**8.1 1 RED CONTRA INCENDIO**				
8.11.1	8.11.1 Suministro, transporte e instalación de punto Gabinetes Clase II	0,03%	0,00%	0,00%	
8.11.2	8.11.2 Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø4"	0,23%	0,00%	0,00%	
8.11.3	8.11.3 Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø1 1/2"	0,06%	0,00%	0,00%	
8.11.4	8.11.4 Suministro, transporte e instalación de Siamesa De ø4"×ø2½"×ø2½", inlcuye cheque ranurado de 4"	0,16%	0,00%	0,00%	

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____			**INFORME EJECUTIVO SEMANA No.**	**33**	**CONTRATO / CONVENIO No.**	**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**					
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO:**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**21/9/2024**	**HASTA:**	**27/9/2024**	**FECHA INFORME:**	**27/9/2024**

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS**
	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL	
8.11.5	8.11.5 Suministro, transporte e instalación de Gabinete en Lamina Cold Rolled Calibre 20 de 0.77×0.77×0.22, Válvula angular 1½", Soporte tipo canasta, Manguera fibra poliester y caucho 1½"×100', Boquilla chorro y niebla 1½"-Hacha pico 4½" lbs, Llave Spaner-Extintor de polvo	**0,17%**	**0,00%**	**0,00%**	
9	**9.CUBIERTAS-IMPERMEABILIZACIONES.CIELO RASOS**				
9,1	9.1 Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e=0,04 máx, para cubiertas	**0,38%**	**0,00%**	**0,00%**	
9.2	9.2 Suministro, transporte e instalación de Cielo Raso de PVC Blanco e= 7 cm, incluye estructura de soporte	**1,99%**	**0,00%**	**0,00%**	
9,30	9.3 Impermeabilización con sika manto -1300 emulsión bituminosa elástica, e= 2 mm. Incluye acabado en pintura reflectiva de aluminio	**1,61%**	**0,00%**	**0,00%**	
10	**10. PINTURA Y ACABADO DE MUROS**				
10,1	10.1 Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm. (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	**1,27%**	**0,00%**	**0,00%**	
10.2	10.2 Pañete impermeabilizado muros 1:4 e=1.5 cm (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	**1,76%**	**0,00%**	**0,00%**	
10,3	10.3 Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	**0,76%**	**0,00%**	**0,00%**	
10,4	10.4 Pintura tipo acrilica para exteriores, a 3 manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	**0,85%**	**0,00%**	**0,00%**	
10,5	10.5 Pintura epoxica a tres manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	**0,23%**	**0,00%**	**0,00%**	
10,6	10.6 Estuco plástico acrílico (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	**1,40%**	**0,00%**	**0,00%**	
10.7	10.7 Enchape cerámico pared blanco tipo Jaya cara unica 25 cm x 43 cm Blanca de primera calidad o similar	**1,32%**	**0,00%**	**0,00%**	
10.8	10.8 Suministro, transporte e instalacion de meson en policuarzo, espesor 2 cm, incluyen faldon frontal de 10 cm, ancho 60 cm.	**0,23%**	**0,00%**	**0,00%**	

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____				**INFORME EJECUTIVO SEMANA No.**	**33**	**CONTRATO / CONVENIO No.**		**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**						
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO:**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**21/9/2024**	**HASTA:**	**27/9/2024**	**FECHA INFORME:**	**27/9/2024**

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS**
	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL	
11	**11. CARPINTERIA (MATALICA, ALUMINIO,MADERA,ACERO,VIDRIO,DIVISIONES Y OTROS)**				
11.1.1	11.1.1 Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia . V01- V05	**1,12%**	**0,00%**	**0,00%**	
11.1.2	11.1.2 Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia.V02- V03- V04	**1,76%**	**0,00%**	**0,00%**	
11.1.3	11.1.3 Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V06 -V07	**0,39%**	**0,00%**	**0,00%**	
11.1.4	11.1.4 Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P6). No incluye cerradura	**0,84%**	**0,00%**	**0,00%**	
11.1.5	11.1.5 Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3 -P5). No incluye cerradura	**0,63%**	**0,00%**	**0,00%**	
11.1.6	11.1.6 Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	**0,22%**	**0,00%**	**0,00%**	
11.1.7	11.1.7 Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV02- PV03	**1,41%**	**0,00%**	**0,00%**	
11.1.8	11.1.8 Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia . V01- V03	**0,47%**	**0,00%**	**0,00%**	
11.1.9	11.1.9 Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia.V02- V06	**0,18%**	**0,00%**	**0,00%**	
11.1.10	11.1.10 Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada proyectante con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V04	**0,15%**	**0,00%**	**0,00%**	
11.1.11	11.1.11 Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V05	**0,22%**	**0,00%**	**0,00%**	
11.1.12	11.1.12 Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV04	**0,34%**	**0,00%**	**0,00%**	
11.1.13	11.1.13 Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija, corrediza y montante superior tipo persiana, en sistem tradicional 3831 con aln 1101, pisavidrio plano riel superior rodachinas ducasse chapa pico loro llave llave haladera, persiana superior aln 315 vidrio laminado incoloro 3+3. PV2 - PV3	**0,88%**	**0,00%**	**0,00%**	

hapil Ingeniería	**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA** **FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____			**INFORME EJECUTIVO SEMANA No.**	**33**	**CONTRATO / CONVENIO No.**	**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**					
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO:**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**21/9/2024**	**HASTA:**	**27/9/2024**

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES						
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO					**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS**	
	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL		
11.1.14	11.1.14 Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P5). No incluye cerradura	**0,48%**	**0,00%**	**0,00%**		
11.1.15	11.1.15 Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3). No incluye cerradura	**0,27%**	**0,00%**	**0,00%**		
11.1.16	11.1.16 Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	**0,09%**	**0,00%**	**0,00%**		
11.1.17	11.1.17 Suministro, transporte e instalación de porton metalico corredizo lámina coldrolled lisa calibre 18, con bisagras y pasador, terminada con anticorrosivo, y esmalte sintetico. medidas (2,30 x 2,40 m) . incluye cerradura de sobreponer	**0,09%**	**0,00%**	**0,00%**		
11.1.18	11.1.18 Suministro, transporte e instalacion de cerradura cilíndrica de manija júpiter a50ws cromo mate schlage	**0,16%**	**0,00%**	**0,00%**		
11,2	**11.2 BARANDAS Y PASA MANOS**					
11.2.1	11.2.1 Suministro, transporte e instalacion de baranda en acero inoxidable 304, calibre 18, pasamanos en tubo de 2" y entramado horizontal en tuberia de 1/2" calibre 18. incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa. Segun diseño.	**0,82%**	**0,00%**	**0,00%**		
11.2.2	11.2.2 Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable 304, calibre 18, Tuberia de 2". incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa o muro. Segun diseño	**0,31%**	**0,00%**	**0,00%**		
11,3	**11.3 DIVISIONES Y ESPEJOS**					
11.3.1	11.3.1 Suministro, transporte e instalación de espejo flotado biselado de 4 mm. Incluye estructura de soporye 1 x 1/2",profundidad 1 cm.	**0,07%**	**0,00%**	**0,00%**		
12	**12. APARATOS SANITARIOS**					
12,1	12.1 Suministro, transporte e instalación de Taza Baltica entrada posterior. (Incluye Taza Báltica Plus Entrada Posterior de Ref. 113121001. Sistema Instalación Entrada Posterior de Ref. O15300001. Válvula Antivandálica de Ref. 751250001. Asiento Sanitario Institucional Forte de Ref. 609551001 y brida sanitaria)	**0,48%**	**0,00%**	**0,00%**		
12,2	12.2 Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye grifería)	**0,26%**	**0,00%**	**0,00%**		
12,3	12.3 Suministro, transporte e instalación de grifería lavamanos Monocontrol Dakar Media	**0,07%**	**0,00%**	**0,00%**		
12,4	12.4 Suministro, transporte e instalación de juegos de barra de seguridad (Incluye barra plegable REF 706590001, barra de seguridad recta REF 706550001, accesorios de anclajes y escudos)	**0,29%**	**0,00%**	**0,00%**		

hapil Ingeniería	**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA** **FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____				**INFORME EJECUTIVO SEMANA No.**	**33**	**CONTRATO / CONVENIO No.**		**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**						
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO:**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**21/9/2024**	**HASTA:**	**27/9/2024**	**FECHA INFORME:**	**27/9/2024**

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS**
	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL	
13	**13. EQUIPOS ESPECIALES**				
13	**13. PLATAFORMAS ELEVAPERSONAS**				
13,1	13.1 Suministro transporte e instalacion de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende tres pisos, tres paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
13,2	13.2 Suministro e instalación de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende cuatro pisos, cuatro paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. El equipo cuenta con los elementos de la norma NTC5926-1,. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	**3,90%**	**0,00%**	**0,00%**	
14	**14. VARIOS**				
14,1	14.1 Aseo general final y limpieza	**0,23%**	**0,00%**	**0,00%**	
14,2	14.2 Suministro, transporte e instalación de aviso nomenclatura exterior, en acrilico de 10 mm cristal con frente en acero satinado 304 calibre 22, incluye instalacion con cinta doble faz y pegado industrial	**0,35%**	**0,00%**	**0,00%**	
14,3	14.3 Sumistro, transporte e instalacion de jardineras prefabricas en cemento acanalada, medidas 100 cm x 60 cm x 30 cm. Impermeabilizada interiormente. No incluye terra negra, ni elemento vegetal.	**0,11%**	**0,00%**	**0,00%**	
NP	**ÍTEM NO PREVITOS**				
	NP-01 SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR).	**2,67%**	**2,13%**	**0,00%**	
	NP-02 Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, H total = 40 cm (incluye torta superior e=10 cm, cantidad concreto= 0.19 m3/m2 - según diseño) (no incluye acero de refuerzo)	**6,51%**	**5,82%**	**0,75%**	**NP-02 Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, H total = 40 cm (incluye torta superior e=10 cm, cantidad concreto= 0.19 m3/m2 - según diseño) (no incluye acero de refuerzo)** Se realiza la instalación de concreto de resietncia de 4000 PSI para la placa correspondiente a la rampa vehicular que comprende el eje 4-1 en el frente de obra Las Brisas
	NP-03 Suministro, transporte de concreto de resistencia 4000 psi, para columnas. (No incluye refuerzo)	**1,55%**	**1,54%**	**0,04%**	**NP-03 Suministro, transporte de concreto de resistencia 4000 psi, para columnas. (No incluye refuerzo).** Se realiza la instalación de concreto de resistencia de 4000 PSI para las 4 columnas de sección 30x30 entre piso 3 y cubierta en el frente de obra las brisas
	NP-04 Suministro, transporte de concreto de resistencia 4000 psi, para muros de conteción (No incluye refuerzo)	**2,47%**	**0,33%**	**0,41%**	**NP-04 Suministro, transporte de concreto de resistencia 4000 psi, para muros de conteción (No incluye refuerzo).** Se realiza el suministro e instalación de concreto para el muro de conbtención correspondiente a la fachada de la edificación en el frente de obra Las Brisas

hapil Ingeniería	**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA** **FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____				**INFORME EJECUTIVO SEMANA No.**	**33**	**CONTRATO / CONVENIO No.**		**FDLSC-COP-928-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"**						
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**	**DEPARTAMENTO:**	**CUNDINAMARCA**	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	**21/9/2024**	**HASTA:**	**27/9/2024**	**FECHA INFORME:**	**27/9/2024**

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS**
ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL	
NP-05 CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI PARA CAISSON D=1.40M, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, INCLUYE ACELERANTE, MOTOBOMBA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO, DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM Y FORMALETA DE MADERA.	**2,13%**	**1,89%**	**0,00%**	
NP-06 Suministro, transporte e instalación de concreto de ciclipeo (60% DE CONCRETO F´C=3000 PSI)	**0,23%**	**0,11%**	**0,00%**	
NP-07 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2, CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE, EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.	**0,44%**	**0,00%**	**0,00%**	
COMPONENTE SOCIAL (INCLUYE A.I.U)	**0,77%**	**0,54%**	**0,02%**	Durante la semana en curso los profesionales sociales de obra, realizaron seguimientos a sus compromisos contractules, cumpliendo con los espacios para atención al ciudadano, acompañamiento desde el componente social a las actividades de obra, asistencia a los comités de seguimiento y demás actividades propias del componente social.
COSTO COMPONENTE AMBIENTAL (INCLUYE A.I.U)	**1,49%**	**1,04%**	**0,03%**	Durante la semana en curso los profesionales ambientales de obra, realizaron seguimientos a sus compromisos contractules, cumpliendo con los requerimientos ambientales como disposición de residuos, capacitaciones, inspecciones, acompañamiento desde el componente ambiental a las actividades de obra, asistencia a los comités de seguimiento y demás actividades propias del componente ambiental.
COSTO COMPONENTE SST (INCLUYE A.I.U)	**0,62%**	**0,43%**	**0,01%**	Durante el periodo en cuestión el contratista de obra realizaron capacitaciones del area SST, inspecciones de equipos y materiales, diigenciamiento de formularios y participación de los comites de seguimiento.
AJUSTE Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INC A.I.U)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
	100,00%	**39,68%**	**4,45%**	

hapil Ingeniería	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____			INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33		CONTRATO / CONVENIO No.		FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:			CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"						
MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024	HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024

PROGRAMADO VS EJECUTADO ALPES

		SEMANAS																									
		JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC	
		31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
PROGRAMADO	SEMANAL	13,08%	5,88%	0,30%	0,30%	0,77%	0,99%	1,58%	1,00%	0,71%	0,73%	0,67%	0,73%	0,50%	0,54%	2,21%	3,01%	2,84%	2,26%	5,98%	6,24%	6,26%	6,64%	7,07%	5,70%	5,51%	6,66%	6,59%	3,23%
	ACUMULADO	13,08%	18,96%	19,27%	19,57%	20,34%	21,33%	22,90%	23,90%	24,62%	25,35%	26,02%	26,75%	27,25%	27,79%	30,00%	33,01%	35,85%	38,11%	44,09%	50,33%	56,59%	63,23%	70,30%	76,00%	81,52%	88,18%	94,77%	98,00%
EJECUTADO	SEMANAL	7,56%	1,88%	1,28%	2,07%	4,77%	6,71%	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,13%	2,33%	1,73%	0,52%	1,07%	1,63%	4,13%	7,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ACUMULADO	7,56%	9,44%	10,72%	12,79%	17,56%	24,27%	24,27%	24,28%	24,30%	24,33%	24,46%	26,79%	28,52%	29,04%	30,11%	31,74%	35,87%	42,99%	42,99%	42,99%	42,99%	42,99%	42,99%	42,99%	42,99%	42,99%	42,99%	42,99%
ADELANTO/ATRASO		0,00%	-9,53%	-8,54%	-6,78%	-2,78%	2,94%	1,36%	0,38%	-0,32%	-1,02%	-1,56%	0,04%	1,27%	1,25%	0,11%	-1,27%	0,02%	4,88%										

PROGRAMADO VS EJECUTADO BRISAS


		SEMANAS																									
		JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC	
		31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
PROGRAMADO	SEMANAL	16,59%	1,36%	0,21%	0,41%	0,38%	1,94%	3,79%	3,92%	2,20%	1,92%	1,72%	2,78%	3,12%	2,99%	4,09%	4,10%	1,68%	2,80%	4,13%	3,28%	2,49%	3,67%	3,78%	3,59%	3,65%	4,82%	3,18%	7,43%
	ACUMULADO	16,59%	17,95%	18,16%	18,57%	18,95%	20,89%	24,67%	28,59%	30,79%	32,71%	34,44%	37,22%	40,34%	43,33%	47,42%	51,51%	51,20%	56,00%	60,13%	63,40%	65,90%	69,57%	73,35%	76,93%	80,58%	85,41%	88,59%	96,02%
EJECUTADO	SEMANAL	15,56%	0,22%	0,05%	0,00%	0,17%	10,63%	0,04%	0,03%	0,00%	0,20%	1,02%	3,33%	4,32%	1,83%	3,83%	4,12%	0,63%	3,13%	0,20%	1,02%	1,02%	3,33%	3,33%	4,32%	4,32%	1,83%	1,83%	3,83%
	ACUMULADO	15,56%	15,78%	15,83%	15,83%	16,00%	26,63%	26,67%	26,70%	26,70%	26,90%	27,92%	31,24%	35,56%	37,39%	41,22%	45,34%	45,97%	49,10%	49,30%	50,32%	51,34%	54,66%	57,99%	62,31%	66,63%	68,46%	70,29%	74,11%
ADELANTO/ATRASO		0,00%	-2,17%	-2,33%	-2,74%	-2,95%	5,74%	2,00%	-1,89%	-4,09%	-5,81%	-6,52%	-5,98%	-4,78%	-5,94%	-6,20%	-6,18%	-5,22%	-6,90%										


PROGRAMADO VS EJECUTADO OBRA SALONES


		SEMANAS																									
		JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC	
		31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
PROGRAMADO	SEMANAL	15,36%	2,95%	0,24%	0,37%	0,52%	1,60%	3,01%	2,89%	1,68%	1,51%	1,35%	2,06%	2,20%	2,13%	3,43%	3,72%	2,09%	2,61%	4,78%	4,32%	3,81%	4,71%	4,94%	4,33%	4,30%	5,47%	4,38%	5,95%
	ACUMULADO	15,36%	18,31%	18,55%	18,92%	19,44%	21,04%	24,05%	26,95%	28,62%	30,13%	31,48%	33,54%	35,75%	37,88%	41,31%	45,02%	45,81%	49,72%	54,50%	58,82%	62,63%	67,34%	72,28%	76,61%	80,91%	86,38%	90,76%	96,71%
EJECUTADO	SEMANAL	12,75%	0,80%	0,48%	0,73%	1,78%	9,26%	0,03%	0,023%	0,01%	0,14%	0,71%	2,98%	3,41%	1,37%	2,86%	3,25%	1,86%	4,53%	0,13%	0,66%	0,66%	2,16%	2,16%	2,80%	2,80%	1,19%	1,19%	2,48%
	ACUMULADO	12,75%	12,61%	13,28%	14,31%	16,78%	25,45%	25,47%	25,49%	25,50%	25,61%	26,19%	29,02%	32,04%	34,46%	37,32%	40,57%	42,43%	46,96%	47,09%	47,75%	48,41%	50,57%	52,73%	55,53%	58,33%	59,52%	60,71%	63,19%
ADELANTO/ATRASO		0,00%	-5,70%	-5,27%	-4,61%	-2,66%	4,41%	1,42%	-1,46%	-3,13%	-4,51%	-5,29%	-4,53%	-3,71%	-3,41%	-3,99%	-4,46%	-3,38%	-2,76%										

hapil Ingeniería	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33			CONTRATO / CONVENIO No.		FDLSC-COP-928-2023			
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"									
MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024	HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024

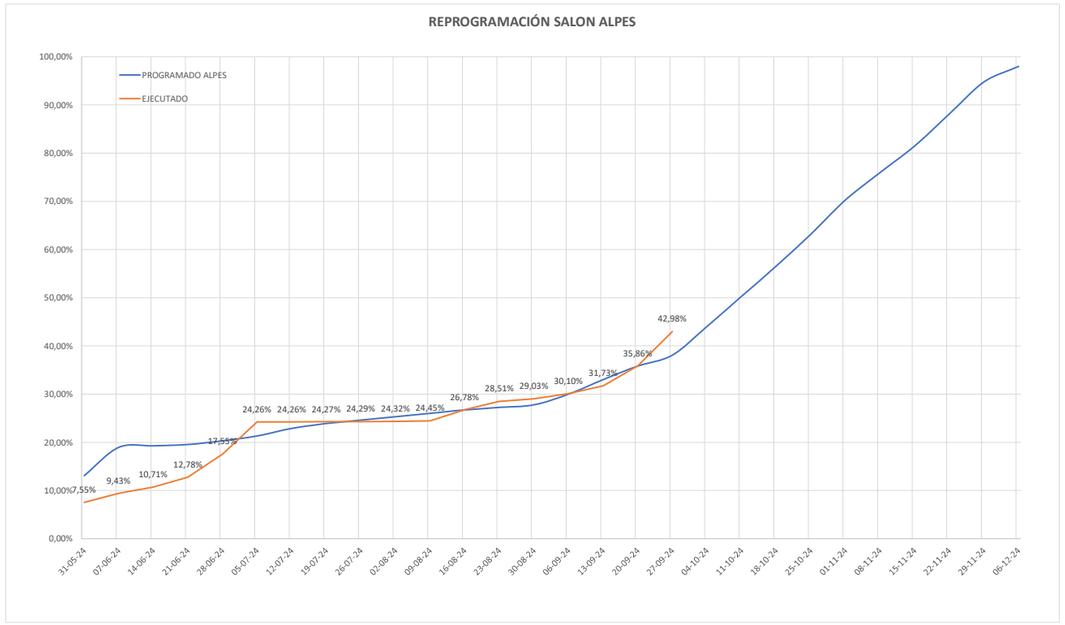

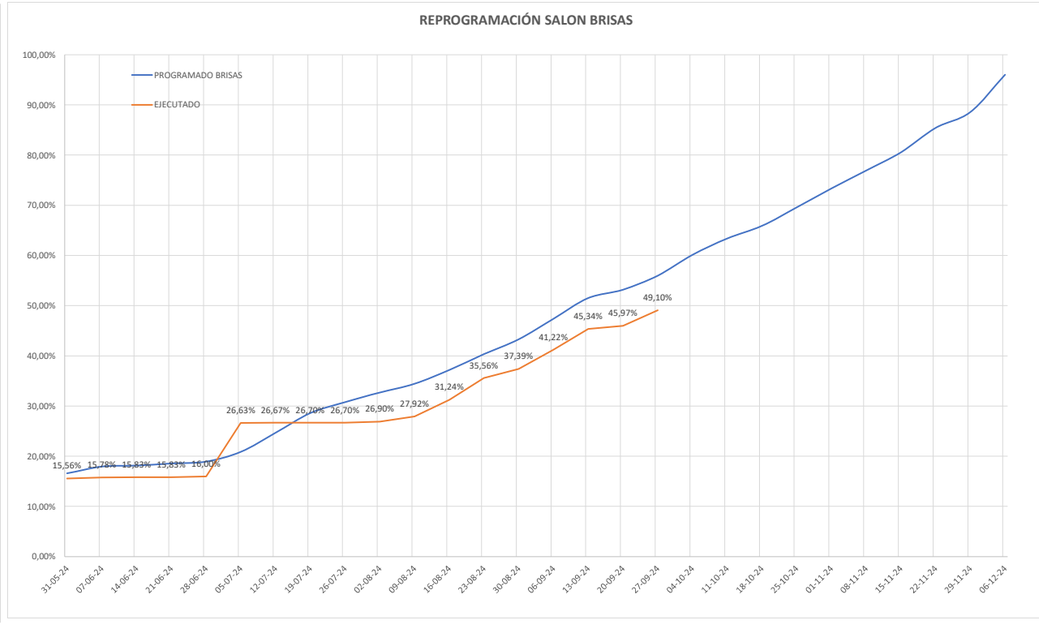

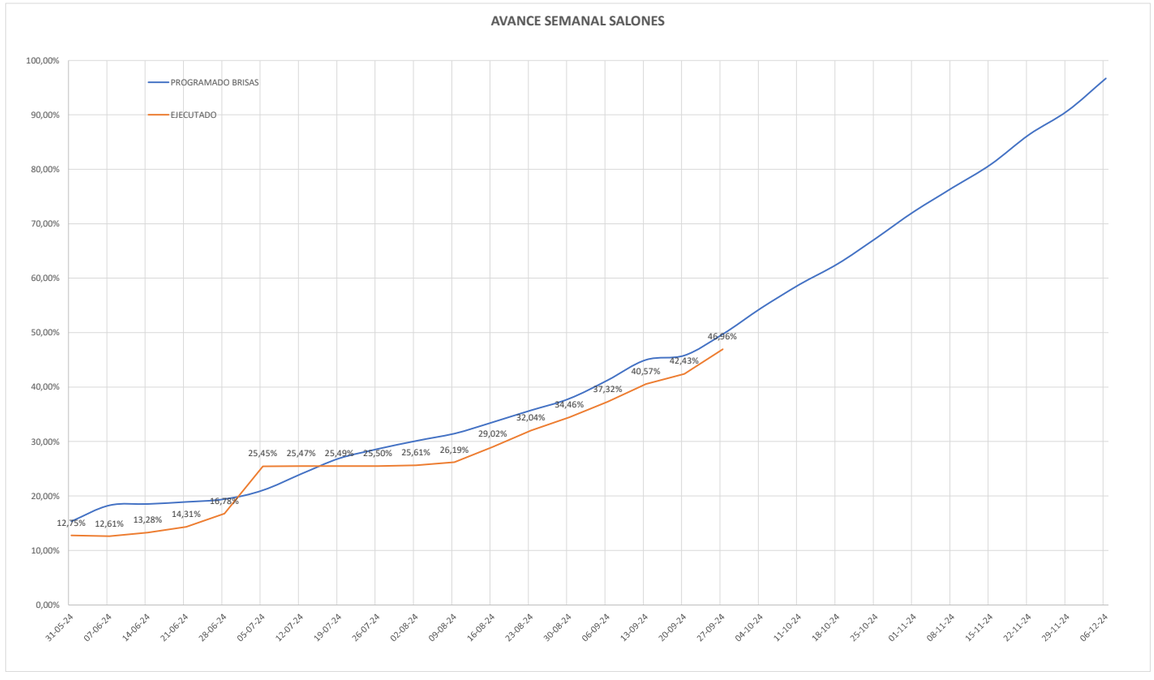

hapil Ingeniería	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	33	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				

MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	21/09/2024	HASTA:	27/09/2024	FECHA INFORME:	27/09/2024

FLUJO DE FONDOS ALPES (MILLONES DE PESOS)

	SEMANAS																									
	JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC	
	01-06-24	08-06-24	15-06-24	22-06-24	29-06-24	06-07-24	13-07-24	20-07-24	27-07-24	03-08-24	10-08-24	17-08-24	24-08-24	31-08-24	07-09-24	14-09-24	21-09-24	28-09-24	05-10-24	12-10-24	19-10-24	26-10-24	02-11-24	09-11-24	16-11-24	23-11-24	30-11-24	07-12-24
SEMANAL	158,43	71,23	3,68	3,68	9,28	11,98	19,11	12,07	8,65	8,86	8,12	8,86	6,06	6,59	26,73	36,49	34,36	27,32	72,44	75,59	75,79	80,42	85,67	69,00	66,78	80,69	79,83	39,11
ACUMULADO	158,43	229,66	233,34	237,01	246,30	258,28	277,38	289,45	298,11	306,96	315,08	323,94	330,00	336,59	363,32	399,81	434,17	461,49	533,93	609,53	685,31	765,73	851,40	920,39	987,17	1067,86	1147,70	1186,80

35%

FLUJO DE FONDOS BRISAS (MILLONES DE PESOS)

	SEMANAS																									
	JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC	
	01-06-24	08-06-24	15-06-24	22-06-24	29-06-24	06-07-24	13-07-24	20-07-24	27-07-24	03-08-24	10-08-24	17-08-24	24-08-24	31-08-24	07-09-24	14-09-24	21-09-24	28-09-24	05-10-24	12-10-24	19-10-24	26-10-24	02-11-24	09-11-24	16-11-24	23-11-24	30-11-24	07-12-24
SEMANAL	379,27	31,06	4,69	9,37	8,70	44,29	86,55	89,60	50,22	43,98	39,39	63,62	71,33	68,29	93,51	93,62	38,46	64,03	94,31	74,92	57,00	83,90	86,43	81,95	83,45	110,26	72,75	169,79
ACUMULADO PROGRAMADO	379,27	410,33	415,02	424,39	433,09	477,37	563,92	653,52	703,74	747,72	787,12	850,73	922,06	990,35	1083,86	1177,48	1215,94	1279,97	1374,28	1449,20	1506,20	1590,10	1676,53	1758,48	1841,93	1952,19	2024,94	2194,73

65%

FLUJO DE FONDOS OBRA TOTAL (MILLONES DE PESOS)

	SEMANAS																									
	JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC	
	01-06-24	08-06-24	15-06-24	22-06-24	29-06-24	06-07-24	13-07-24	20-07-24	27-07-24	03-08-24	10-08-24	17-08-24	24-08-24	31-08-24	07-09-24	14-09-24	21-09-24	28-09-24	05-10-24	12-10-24	19-10-24	26-10-24	02-11-24	09-11-24	16-11-24	23-11-24	30-11-24	07-12-24
SEMANAL	537,70	102,29	8,36	13,04	17,98	56,27	105,66	101,66	58,88	52,84	47,51	72,47	77,39	74,88	120,24	130,11	72,83	91,34	166,76	150,51	132,79	164,32	172,09	150,95	150,22	190,95	152,58	208,90
ACUMULADO PROGRAMADO	537,70	639,99	648,36	661,40	679,38	735,65	841,31	942,97	1001,85	1054,69	1102,20	1174,67	1252,06	1326,93	1447,17	1577,29	1650,11	1741,46	1908,21	2058,73	2191,52	2355,83	2527,93	2678,87	2829,10	3020,05	3172,64	3381,54
ACUMULADO EJECUTADO	446,57	441,55	464,94	501,12	587,51	891,19	891,87	892,56	892,88	896,96	917,09	1016,14	1122,00	1206,77	1306,83	1420,58	1485,78	1644,34										

AJUSTE Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (Incl. AIU) [F = G - E]	120,30
VALOR TOTAL OBRA	3501,84

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL DE OBRA**	PI IN F 15
		VERSIÓN 00
	CONTROL ESTADO DEL TIEMPO CASA DE LA PARTICIPACIÓN LAS BRISAS	

CONTRATO No. / Y NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"
INTERVENTOR	CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S BIC
CONTRATISTA:	HAPIL INGENIERIA S.A.S
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

BRISAS

DÍAS / MES	AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	TOTAL
MARZO	2024																				14:20 a 15:30	13:00 a 16:30				6:00 a 9:30							**10**	**15**
ABRIL	2024	10:00 a 14:30		14:20 a 17:30	8:00 a 15:30	15:00 a 17:30	13:00 a 17:30												16:15 a 17:40	13:30 a 14:30			14:30 a 15:30	15:15 a 15:40										**8**	**22**
MAYO	2024															12:37 a 12:45	9:50 a 10:36																**19**	**12**
JUNIO	2024				9:00 a 17:00				Todo el día			9:00 am a 11:00 am	8:00 am a 11:00 am																1:30 a 3:10 pm				**12**	**18**
JULIO	2024												1:24 a 2:09 pm																				**25**	**7**
AGOSTO	2024																																**29**	**1**
SEPTIEMBRE	2024																										2:10 a 4:00							
																																TOTAL	**103**	**75**


CONTROL DEL TIEMPO	DESDE :	14 9 2024	HASTA	20 9 2024

CONCEPTO	TOTALES		CONVENCIONES	CV	COLOR
TOTAL DE DÍAS SOLEADOS	4	4,00	DÍAS SOLEADOS	DS	
TOTAL DÍAS NUBLADOS			DÍAS NUBLADOS	DN	
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	2	2,00	LLUVIAS FUERTES	LLF	
			LLUVIAS MODERADAS	LLM	
			LLUVIAS AISLADAS	LLA	
TOTAL		6,00			

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE EL ULTIMO PERIODO		
FECHA DE INICIO	**FECHA ACTUAL**	
21 de septiembre de 2024	27 de septiembre de 2024	
RESUMEN	**DÍAS**	**% LLUVIA PROYECTO**
TOTAL DÍAS SECOS	4	67%
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	2	33%
TOTAL	**6**	**100%**

ESTADO DEL TIEMPO ACUMULADO		
FECHA DE INICIO	**FECHA ACTUAL**	
7 de febrero de 2024	27 de septiembre de 2024	
RESUMEN	**DÍAS**	**% LLUVIA PROYECTO**
TOTAL DÍAS SECOS	103	50,0%
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	75	36,4%
TOTAL	**178**	86,4%

OBSERVACIONES :	
FECHA INICIO	7/03/2024
FECHA REPORTE	27/9/2024
DIAS TRACURRIDOS	206,00

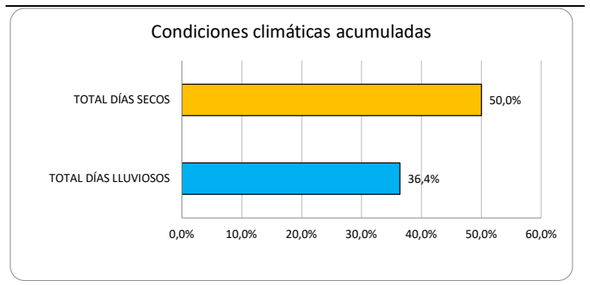

hapil Ingeniería	**INFORME SEMANAL DE OBRA**	PI IN F 15
		VERSIÓN 00
	CONTROL ESTADO DEL TIEMPO CASA DE LA PARTICIPACIÓN LOS ALPES	

CONTRATO No. / Y NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"
INTERVENTOR	CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S BIC
CONTRATISTA:	HAPIL INGENIERIA S.A.S
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

ALPES

DÍAS / MES	AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	TOTAL
MARZO	2024																				14:20 a 15:30	15:00 a 16:30				6:00 a 9:30							**10**	**15**
ABRIL	2024	10:00 a 14:30		14:20 a 17:30	8:00 a 15:30	15:00 a 17:30	13:00 a 17:30												16:15 a 17:40	13:30 a 14:30			14:30 a 15:30	15:15 a 15:40										**8**	**22**
MAYO	2024															12:37 a 12:45	9:50 a 10:36																**19**	**12**
JUNIO	2024				9:00 a 17:00				Todo el día			9:00 am a 11:00 am	8:00 am a 11:00 am																1:30 a 3:10 pm				**12**	**18**
JULIO	2024												1:24 a 2:09 pm																				**25**	**7**
AGOSTO	2024																																**29**	**1**
SEPTIEMBRE	2024																																	
																																TOTAL	**103**	**75**

CONTROL DEL TIEMPO	DESDE :	14 9 2024	HASTA	20 9 2024

CONCEPTO	TOTALES		CONVENCIONES	CV	COLOR
TOTAL DE DÍAS SOLEADOS	4	4,00	DÍAS SOLEADOS	DS	
TOTAL DÍAS NUBLADOS			DÍAS NUBLADOS	DN	
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS		2,00	LLUVIAS FUERTES	LLF	
	2		LLUVIAS MODERADAS	LLM	
			LLUVIAS AISLADAS	LLA	
TOTAL		6,00			

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE EL ULTIMO PERIODO		
FECHA DE INICIO	**FECHA ACTUAL**	
14 de septiembre de 2024	20 de septiembre de 2024	
RESUMEN	**DÍAS**	**% LLUVIA PROYECTO**
TOTAL DÍAS SECOS	4	67%
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	2	33%
TOTAL	**6**	**100%**

ESTADO DEL TIEMPO ACUMULADO		
FECHA DE INICIO	**FECHA ACTUAL**	
7 de febrero de 2024	20 de septiembre de 2024	
RESUMEN	**DÍAS**	**% LLUVIA PROYECTO**
TOTAL DÍAS SECOS	103	51,8%
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	75	37,7%
TOTAL	**178**	89,4%

OBSERVACIONES :	
FECHA INICIO	7/03/2024
FECHA REPORTE	20/9/2024
DIAS TRACURRIDOS	199,00

