ANEXO 5
BITÁCORA DE OBRA
CENTRO DE COMERCIO LUNA VALLENATA



Fecha: 10/oct/2023

Personal en obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Pajarita

Estado del tiempo
- Nublado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
En el lugar del proyecto se realizaron actividades de localizacion y replanteo para fundida de zapatas; corte, armado y figurado de hierro para vigas; relleno de excavaciones.

Se encuentran 15 excavaciones de zapatas abiertas al lado del muro de cerramiento de la Institucion educativa, Se solicita atacar este frente de trabajo, ya que dicho muro corre riesgo de desestabilizarse.

Se fundieron 18 pedestales durante la jornada de trabajo.

→ Las excavaciones se intervinieron respectivamente con el fin de no desestabilizar el muro, Esta actividad se realizo debidamente con chequeo topografico. tambien se realizo la señalizacion de dichas excavaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL RELLENO DE MANERA RAPIDA DE LAS EXCAVACIONES DE ZAPATAS DE CERRAMIENTO

Fecha: 11/oct/2023

-Personal en obra Por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Mano de obra no calificada

Personal en Obra por partede Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Pajarita

Estado del tiempo
-Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la jornada de trabajo en lugar del proyecto se realizaron actividades de localización y replanteo para excavaciones de zapatas; Fundida de pedestales y zapatas.

No se ha evidenciado el paso de las afiliaciones de seguridad social por parte de la mano de obra.

se hizo el retiro en horas de la tarde de la pajarita.

→ El pago de Aportaciones de seguridad social se ha visto retrasada por parte de las EPS los cuales no nos brindan respuesta inmediata.

⇒ TENGA EN CUENTA QUE TRABAJADOR QUE NO ESTÉ AFILIADO Y AL DIA CON EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, NO DEBE PERMITIRSE EL INGRESO A LA OBRA

Fecha: 12/ oct /2023
Pasonal en Obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Mano de obra no calificada

Personal en Obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residentede Interventoria

Maquinaria en obra
- N/A

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
En el lugar del proyecto se realizaron actividades de de localizacion y replanteo para excavaciones de zapatas; relleno de excavaciones con el material sobrante de las excavaciones; corte, armado y figurado de vigas.

No se ha evidenciado el pago de las afiliaciones de seguridad social por parte de la mano de obra

→ Seguimos a la espera de respuesta de la EPS. pero el proceso se esta haciendo debidamente

⇒ DEBE AGILIZARSE ESTE PROCESO YA QUE SE EVIDENCIA ALTO GRADO DE ABANDONO EN OBRA, LO QUE SE TRADUCE EN EL RETRAZO DE ACTIVIDADES AL NO HABER PERSONAL SUFICIENTE EN OBRA POR FALTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL DIA

Fecha: 13/ oct/ 2023
Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en equipo
- N/A

Estado del tiempo
- se presentaron lluvias en la jornada de la tarde.

Aspectos tecnicos
En el lugar del proyecto se realizaron actividades de localizacion y replanteo para fundida de pedestales; armado de formaletas para Pedestales; relleno de excavaciones con el material sobrante de las excavaciones; corte, armado y figurado de hierro para vigas.

Durante la jornada de la tarde se fundieron 26 Pedestales.

No se ha evidenciado el pago de las afiliaciones de

Seguridad social por parte de la mano de obra.

➤ Se entregaron las planillas correspondientes al mes, del personal de mano de obra

Brigith Agudelo C.
SISO

Fecha: 14/oct/2023
Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria

- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- N/A

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos:
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de desencofrado de pedestales localizacion y replanteo de area de zapatas y pedestales, relleno de excavaciones con el material sobrante de excavaciones; corte, armado y figurado de vigas.

No se ha evidenciado el pago de las afiliaciones de seguridad social por parte de la mano de obra.

→ Se realizaron sin novedad las actividades descritas y se continuo esperando respuesta de los EPS.

=) ES DEBER DEL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR LOS TRÁMITES A TIEMPO DE AFILIACIONES Y PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SE RECUERDA QUE NO SE HA PERMITIDO EL ACCESO DE PERSONAL SIN EL PAGO DE LA SEG. SOCIAL, EN CASO DE QUE ALGUN TRABAJADOR ENGRESE SIN LA AUTORIZACION DE INTERVENTORIA, SERA RESPONSABILIDAD PLENA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha: 11/oct/2023
Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de descopiado de Pedestales, relleno y compactación de area de zapata, se fundieron pedestales en la jornada de la tarde, en donde se obtuvo un asentamiento de 4 pulgadas.

→ Efectivamente se realizaron las actividades descritas y se realizaron los ensayos correspondientes.

⇒ SE DEJO ESCRITO QUE LAS ACTIVIDADES DE OBRA SON MUY LENTAS, NO SE REFLEJA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

Fecha: 18/oct/2023
Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SSOMA

- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada en el lugar del proyecto se realizaron actividades de armado de Pedestales, excavaciones mancales, desencofrado de Pedestales.

En conjunto con la profesional sst y la profesional social, se dio inicio a la creación del comite de convivencia laboral y paritario.

→ Se realizaron las actividades descritas. Sin novedad y efectivamente se creo el comite de convivencia laboral y paritario en obra

Fecha: 19/oct/2023

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topográfica
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini cargador

Estado del tiempo
- Nublado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada en el lugar del proyecto se realizaron actividades de desencofrado y encofrado de pedestales, Fundida de pedestales en donde se obtuvo en la prueba de asentamiento un valor de 2.5 pulgadas, compactación manual,

Por parte de la profesional social se realizó una charla a todo el personal antes de iniciar labores.

→ Se realizaron los actividades descritas y se subsano el asentamiento de la mezcla en obra y se hizo acompañamiento a la charla.

Fecha: 20/oct/2023

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comisión topográfica
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de desencofre y encofre de Pedestales, armado de hierro de pedestales, Compactación manual, se fundieron pedestales obteniendo un asentamiento de 4.5 pulgadas.

Iniciando la jornada por parte de la profesional social y la profesional SST, se realizo una pausa activa hacia el personal dentro de la obra.

Se eliminaron 0.30 m de los pedestales, ya que estos quedaron con una altura Incorrecta, se recomienda tener un mejor coidado al momento de realizar la actividad de localizacion y replanteo de area.

→ Se realizaron las actividades descritas anteriormente, se hizo acompañamiento a la jornada de pausa activa, los pedestales se subsanaron alturas para mejorar la precisión del nivel del elemento posterior

=) TENER CUIDADO Y REALIZAR CHEQUEO TOPOGRAFICO ANTES DE LA FUNDIDA, IMPLEMENTAR AUTORIZACION DE FUNDIDA.

Fecha: 21/oct/2023
Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Intaventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de excavación, corte y figurado de hierro, desencofrado de Pedestales.

En el modulo 1, se tuvo que destruir 1Azapata (12) ya que los ejes estaban corridos, se recomienda un maximo cuidado al momento de hacer la actividad de localización y replanteo de área

→ Se realizaron las actividades descritas anteriormente y se demolio zapata del modulo 1A la cual en el momento del chequeo fotografico amojo

una pequeña desviación por lo tanto se subsana en obra, para no quedar acordada teniendo en cuenta que esta zona era la unica definida por diseño del proyecto

Fecha: 23/oct/2023

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte del Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en equipo

- Mini cargador

Estado del tiempo
- Se presentaron lluvias en la jornada de la tarde.

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral se realizaron actividades de localizacion y replanteo de area, relleno y compactacion manual.

Por parte la Profesional SST se realizo una charla de inicio de semana.

→ Se realizaron las actividades descritas ordinariamente sin novedad y se realizo el respectivo acompañamiento a la charla con el profesional SIJO.

Fecha: 24/oct/2023

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comision topografica

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra
- Mini cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral se adelantaron actividades administrativas, limpieza general de la obra.

Durante la jornada laboral se presenta ausencia del Personal de mano de obra, del cual aun no se esclarece el motivo de la ausencia

Se dió entrada a la obra 1 baño portatil para uso del personal dentro de la obra.

→ Se realizaron las actividades descritas anteriormente, dado que se estaban dejando los diseños se presentaron cambios que nos llevaron a suspender

actividades por lo cual estos entraran en una etapa de revisión para ser aprobadas

=> TODO CAMBIO DEBE SER INFORMADO A LA SUPERVICION, YA QUE SON LOS DUEÑOS (CONTRATANTES) DEL PROYECTO

Fecha: 25/oct/2023

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA

- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar de proyecto se adelantaron actividades administrativas, limpieza general de la obra.

Aun se evidencia ausencia del personal de mano de obra, de los cuales aun no se esclarece el motivo de ausencia.

→ Se realizaron las actividades descritas anteriormente y debido al personal por temas de revisión de diseños, se suspendieron actividades debido a que estas entraron en una fase de mejora.

→ LA INTERVENTORIA DESCONOCE DICHAS MEJORAS, SE SUGIERE INFORMAR FORMALMENTE.

Fecha: 26/oct/2023

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica

Personal en obra Por Parte de Interventoria:
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral se realizaron actividades de limpieza general de la obra, localización y replanteo de areas, se reforzó el cerramiento de la obra y se adelantaron actividades de administrativ

Continua Presentandose la ausencia del personal de mano de obra, aun sin esclarecer los motivos de dicha ausencia.

→ Se realizaron las actividades descritas contractualmente y en cuanto a la ausencia de personal se debe a la suspensión de actividades por temas de que los diseños entraron en una fase de revisión para ser mejorados

=) SE SOLICITA INFORMACION FORMAL SOBRE AUSENCIA DE PERSONAL, YA QUE ESTO AUMENTA EL RIESGO EN OBRA

Fecha: 27/oct/2023

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- soleado

SISOMA

-N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral el personal de mano de obra retomo labores, realizando actividades de limpieza en el entorno al proyecto, y se adelantaron actividades administrativas

Aun no son esclarecidos los motivos de esta ausencia del personal de mano de obra.

→ Se realizaron las actividades antes descritas como tambien actividades administrativas, los motivos de la ausencia del personal son debido a temas de rediseño los cuales entraron en una fase de revisión para ser mejorados por lo cual se suspendieron actividades y se esta trabajando arduamente en temas administrativos.

⇒ LA REVISION A TOMADO BASTANTE TIEMPO CONSIDERABLE, SE SOLICITA AL CONTRATISTA INFORMAR DE MANERA FORMAL A LA INTERVENTORIA

Fecha: 28/oct/2020
Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini cargador

Estado del tiempo
- Nublado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral continuan adelantando actividades administrativas y limpieza y aden general en la obra;

Continua la ausencia del personal de mano de obra del cual aun no son esclarecido los motivos.

⇒ Se seguen realizando las actividades descritas anteriormente en cuanto a la ausencia del personal es debido a que los diseños se le hicieron ajustes por lo cual nos llevo a

suspender actividades de mano de obra con el fin de cumplir con todos los requerimientos del proyecto

⇒ AUN NO SE FORMALIZA LA SUSPENCION DE ACTIVIDADES

Fecha: 30/oct/2023

Personal en obra por parte de l contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini cargador

Estado del tiempo

- Nublado

SISOMA

- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral se adelantaron actividades de limpieza general y del entorno del proyecto, se continuan adelantando actividades administrativas

Aun no se conocen los motivos oficiales de la ausencia del personal de mano de obra.

→ Se realizaron las actividades antes descritas como tambien proyectando el futuro avance de la obra en cuanto a su ejecución para poder mitigar retrasos.

El personal esta ausente por temas de ajustes en los diseños que nos llevaron a suspender actividades ya que estas entraron en una fase de mejora.

Fecha: 31/oct/2023
Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini cargador

Estado del tiempo
- Nublado

SISOMA
- NP

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral se continua adelantando actividades administradivas, limpieza general dentro y en el entorno del proyecto.

Se continua sin tener una respuesta de los motivos de la ausencia de mano de obra.

→ Se realizaron las actividades anteriormente descritas como tambien labores administrativos y depuracion de diseños del proyecto para hacer ingreso de personal de mano de obra.

⇒ SE SOLICITA PRONTO INGRESO DE PERSONAL DE MANO DE OBRA CON SUS RESPECTIVOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, YA QUE EL ASENTAMIENTO AUMENTA PROGRESIVAMENTE

Fecha: 1| Nov | 2023
Personal en Obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica

Personal en obra Por parte del contratista
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Se presentaron lluvias durante la jornada de la tarde

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se adelantaron actividades administrativas, se realizaron limpiezas dentro y en el entorno al proyecto.

Continua la ausencia del personal de mano de obra.

→ Se realizaron las actividades anteriormente descrit en su mayoria abministrativas para mientras actividades de mano de obra.

La ausencia del personal es debido a que los diseños presentaron cambios los cuales no llevan a suspender actividades debido a que estos fueron ajustados para mejorarlos.

SE RECUERDA QUE NO EXISTE AUN DE SUSPENCION FORMAL, POR LO CUAL EL TIEMPO SIGUE CORRIENDO

Fecha: 2/ NOV /2023

Personal en obra por parte del contratista

- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por parte de Interventoria

- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra

- Mini cargador

Estado del tiempo

- Nublado, Presentando lluvias en la mañana hasta las 9:30 am

SISOMA

- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se retomaron las actividades de corte, armado y figurado de hierro para los pilotes; excavaciones manuales para pilotes; Debido a las lluvios

Presentadas las excavaciones abiertas se encontraron con abundante agua del cual durante la jornada fue retirada manualmente.

Se realizó charla de ingreso al personal por parte de la profesional SST.

Se tenia previsto una visita por parte de la secretaria de Infraestructura, la cual quedó aplazada hasta nueva orden.

→ Se realizaron las actividades anteriormente descritas por lo cual se reactivan actividades de mano de obra con personal el cual se realizo acompañamiento a charla de ingreso

Por ocuparnos de las secretarias de infraestructura no se pudo realizar la revisión prevista.

=) TENER EN CUENTA QUE LA ACTIVIDAD DE PILOTINES NO SE TIENE DISEÑO FORMAL, NI SE ENCUENTRA INCLUIDO DENTRO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Fecha: 8/NOV/2023

Personal en obra por parte del contratista

- Director de obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica.

- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini cargador

Estado del tiempo
- Nublado, Presentando lluvias hasta las 7 am

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos.
En el lugar del proyecto se realizaron actividades de corte, armado y figura de hierro para pedestals y pilotes; localización y replanteo de area de Pilotes; Se fundieron 8 pilotes; limpieza de excavaciones abiertas producto de las lluvias.

→ Se realizaron las actividades anteriormente descritas, el tema de las lluvias nos impide avanzar significativamente, pero seguimos trabajando arduamente para sacar adelante el proyecto.

⇒ REALIZAR FORMALMENTE LA INCLUSION DE ITEMS N.P. AL PROYECTO

Fecha: 4/Nov/2023

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos laboros:

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de corte, armado y figurado de hierro, localización y replanteo de area de pilotes, excavaciones manuales de pilotes, fundida de pilotes.

Por parte del contratista llegó la notificación de que el dia (6/NOV/2023) se laborara con normalidad

→ Se realizaron las actividades anteriormente descritas y con el fin de ejecutar plan chagne se realizaron labores el día lunes festivo 6 de nov en aras de mitigar retrasos

Fecha: 6/NOV/2023

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Maro de obra no calificada
- Profesional sst

Personal en obra Por parte del Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra
- Mini cargador

110

Estado del tiempo

- Soleado

SISOMA

-

Aspectos tecnicos:

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de excavación de pilotes, zapatas, figurado de acero, amarre de pilotes

hasta la fecha no se evidenciado las afiliaciones a fondo de pension, EPS y AFP del personal de mano de obra no calificada, se le solicita al contratista hacer entrega de estas.

→ Se realizaron las actividades anteriormente descritas y se sigue avanzando progresivamente en obra con fines de mitigar retrasos.
Se esta realizando el proceso de Apiliación de los trabajadores por el momento cuentan con ARL

Fecha: 7 | Nov | 2023

Personal en Obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de Obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra
- Mini cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos

Durante la jornad

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se adelantaron actividades administrativas, limpieza general de la obra, limpieta en el entorno de la obra.

Se evidencia ausencia del personal de mano de obra no calificada, de el cual no se dio motivo alguno a Interventoria.

→ Se realizaron las actividades antes descritas y tambien se suspenden actividades de mano de obra por detalles estructurales por definir del proyecto.

Fecha: 8/Nov/2023

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Pridesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos:

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se adelantaron actividades administrativas, limpieza general dentro y en el entorno al proyecto.

Continua la ausencia del personal de mano de obra no calificada, sin justificacion Oficial presentada a Interventoria.

→ Se realizaron las actividades descritas anteriormente
Se suspenden actividades de mano de obra por temas estructurales por definir los cuales impiden

avanzar significativamente.

Fecha: 9 Nov 2023

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del Proyect

Se adelantaron actividades administrativas limpieza en el entorno del proyecto, se refor el cerramiento del proyecto.

Continua la ausencia del personal de maes de obra, del cual no se evidencia motivo de dicha ausencia.

→ Se realizaron las actividades anteriormente descritas y se suspenden actividades de mano de obra por temas estructurales por definir

Fecha: 10/Nov/2023


Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada


Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini cargador

SISOMA
- N/A

ANEXO 5.1
BITÁCORA DE OBRA
CENTRO DE ACOPIO RIO DE ORO





Fecha 10-10-2023

personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 Ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social.

Mano de obra no calificada

1 Maestro de obra

2 oficiales

4 Ayudantes

4 oficios varios

personal en obra por parte de interventoría

1 Ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE

Maquinaria en obra

1 Mezcladora

Estado del Tiempo

Mañana lloviznó M.día llovizna Tarde. Nublado

Simo

- rondas de inspección
- se verifica porte y uso de EPP.
- se verifica adecuada señalización

ACTIVIDADES.

Se inician las labores diarias con actividades de figuración y armado del acero transversal de las vigas de cimentación junto con el acero transversal de los pedestales y los parrillas de las zapatas en sus diferentes tipologías se termina con las excavaciones manuales de las zapatas 0-E, y 0-D. al nivel de implantación suministradas en los planos de cimentación, en las horas de la tarde se presentan lluvias con poca intensidad.





Fecha 11-10-2023

personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social.

Mano de obra no calificada

1 Maestro de obra

Powered by CamScanner

2 Oficiales
4 Ayudantes
4 Oficios varios
personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoria
1 profesional HSE

Maquinaria en obra
1 Mezcladora

Estado del tiempo
Mañana soleado Media soleado tarde soleado

Si sonia.
Se realizan rondas de inspección y se verifica el porte y uso adecuado de EPP. y manejo del transito.
ACTIVIDADES.
Debido a las lluvias registradas la noche anterior se lleva a cabo la limpieza de las excavaciones que se encontraban con material pantanoso. Este proceso es necesario para avanzar en las actividades de acuerdo con las especificaciones de los planos de cimentación. Continuando con la rutina diaria de trabajo se procede con la tarea de figuración y armado de los refuerzos de acero en las vigas de cimentación, asi como en los pedestales y los parrillas de los zapatas en sus diversas tipologias.
Los insumos y materiales necesarios para continuar con la ejecución de la obra han llegado al sitio. Se han verificado la entrega de acero y Cemento. Es importante destacar que para facilitar la entrega de estos materiales, los controladores viales estuvieron atentos y coordinaron el acceso a la obra desde la via adyacente.

líder





Fecha 12-10-2023

Personal en obra por parte del contratista.

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente.

1 Ingeniero civil-residente de obra

1 Profesional HSE - residente SST.

1 Profesional social.

MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

1 Maestro de obra

2 Oficiales

4 Ayudantes

4 oficio varios

Personal en obra por parte de interventoria.

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 Profesional HSE.

Maquinaria en obra - Equipos

1 mezcladora

Powered by CamScanner

Estado del tiempo
Mañana Nublado Media Nublado Tarde lluvia

SISOMA.
- Se verifica el adecuado manejo de tránsito
- Se realizan rondas de inspección de seguridad.

ACTIVIDADES.

Se prosigue con las excavaciones de las zapatas, que desempeñarán la función de contrapeso para la estructura. Los insumos y materiales necesarios para continuar con la ejecución de obra han llegado al sitio. Se ha verificado la entrega de material pétreo. Es importante destacar que para facilitar la entrada de estos materiales, los controladores viales estuvieron atentos y coordinaron el acceso a la obra desde la vía adyacente, se continua con la rutina diaria de trabajo, se procede con la tarea de figuración y armado de refuerzo de acero en las vigas de cimentación, así como en los pedestales y los parrillas de las zapatas en sus diversas tipologías.





líder=

Powered by CamScanner

Fecha 13-10-2023

Personal en obra por parte del contratista.

MANO DE OBRA CALIFICADA.

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST.

1 profesional social.

MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

1 Maestro de obra

7 oficiales

4 Ayudantes

4 oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría.

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE.

Maquinaria en obra - equipos

1 Mezcladora

Estado del tiempo

Mañana soleado M.Día soleado Tarde soleado

Sisoma.

- se verifica el porte y uso adecuado de EPP y se hacen las respectivas recomendaciones.

- ACTIVIDADES

se prosigue con los excavaciones de los zapatas, que desempeñaran la función de contrapeso para la estructuras. Estas zapatas se ubican en los ejes B' C'D respectivamente. Además se ha iniciado el proceso de armado de los aceros que serán utilizados como refuerzo longitudinal en los pedestales P1, P2 y P3, tal como se indica en los planos y especificaciones de cimentación del proyecto en ejecución

líder:

Powered by CamScanner





Fecha 14-10-2023

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada.

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional ASE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada.

1 Maestro de obra

4 Ayudantes

2 Oficiales.

4 oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría.

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional ASE

Maquinaria en obra. - Equipos

1 mezcladora

Estado del tiempo
Mañana Nublado M. día Nublado Tarde. Nublado

Sisoma
- Acompañamiento a jornada de limpieza.
- Adecuado porte y uso de EPP.
- se verifica señalización en las zonas de riesgo.

ACTIVIDADES.
se prosigue con el proceso de armado de los aceros destinados a servir como refuerzo longitudinal. en pedestales P1, P2, P3 siguiendo los indicaciones detal. obs en los planos y los especificaciones de cimentación del proyecto en ejecución, además se da inicio a la jornada de limpieza y organización en la obra.





Fecha 17-10-2023
personal en obra por parte de contratistas.
Mano de obra calificada.

Powered by CamScanner

1 Arquitecto residente - comisión topográfica
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - Residente SST
1 profesional social
Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
2 oficiales
4 Ayudantes
5 oficial vial
.
Personal en obra por parte de interventoria.
1 ingeniero civil - Residente de interventoría.
1 profesional HSE

Maquinaria en obra - equipos
1 mezcladora

Estado del tiempo
Mañana Nubado Mañana Nubado Tarde Nubado
Nota: lluvia en la noche.
· Síntomas.
Se verifica adecuado porte y uso EPP.

.
Actividades.
Teniendo en cuenta que se ha efectuado la debida radicación de la información correspondiente a los ítems no previstos, el cual son principales y concretos capítulos, que incluyen las especificaciones técnicas, las cotizaciones de los insumos y los análisis de los precios unitarios, es relevante destacar que estos elementos son una parte esencial de la ruta crítica de actividades en el marco del capítulo N°2, conocido

líder

como "Movimiento de tierra, en este contexto se procede con la ejecución de tareas fundamentales que engloban la excavación, armado del acero de refuerzo y la fundición de los micro pilotes en las zapatas tipo 1, específicamente en las zapatas 4-E, 4-C, 4-B, y 4-A1 respectivamente.





Fecha - 18 - 10 - 2023

personal por parte de contratistas

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente comisión topográfica.

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

2 oficiales

4 Ayudantes

5 oficial yonuy.

Personal en obra por parte de interventoría.
1 ingeniero civil - Residente de interventoría
1 profesional HSE.

Maquinaria en obra - equipos
No aplica


Estado del tiempo:
Mañana soleado Tarde soleado Medio, soleado

Sisoma.
+ rondas de inspección de seguridad
→ se verifica adecuado porte y uso epp.

ACTIVIDADES.
El proyecto continua avanzando en las actividades de la ruta crítica no programadas. Se esta llevando a cabo la excavación, armado del acero de refuerzo y la fundición de los micropilotes en las zapatas tipo 1 específicamente en las zapatas 3-E, 3-C, 3-B, y 3-A1, además se ha realizado el suministro de concreto ciclópeo en las zapatas 4-E, 4-C, 4-B y 4-A1. Simultaneamente, se prosigue con las tareas de figurado y armado del acero de refuerzo de pedestales de zapatas, que posteriormente, serán instalados en las áreas correspondientes, siguiendo rigurosamente las indicaciones detalladas en los planos de cimentación del proyecto, en compañía de la comisión topográfica se implantaron las coordenadas de instalación de pedestales.

Powered by CamScanner



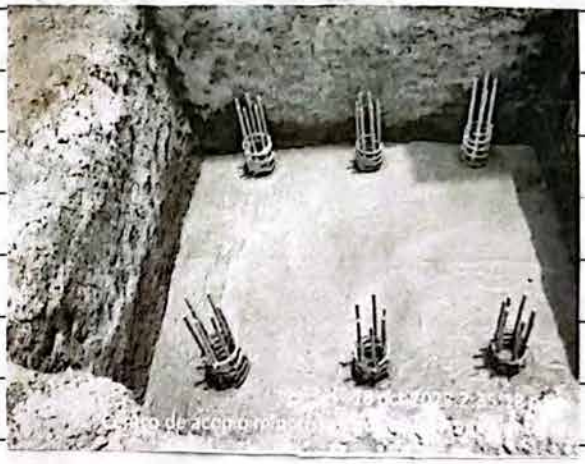

Fecha 19-10-2023

Personal por parte del contratista

Mano de obra calificada.

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada.

1 maestro de obra

2 oficiales

4 Ayudantes

5 Oficiales varios

Personal en obra por parte de interventoría.

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE

Maquinaria en obra - Equipos.

1 Mezcladora

Powered by CamScanner

Estado del tiempo
Mañana Soleado M.día Soleado Tarde Soleado

Sisoma.
- Rondas de inspección
- recomendaciónes
- Verificar parte y uso adecuado de EPP.

ACTIVIDADES
Se mantienen en curso las actividades de figurad y armado del acero de refuerzo de pedestales y zapatas, en paralelo a la ejecución de actividade críticas relacionadas con items no previstos. Estas ultima engloban la excavación armado olel acero de refuerz y la fundiación de micropilotes en las zapatas tipo 1 especificamente en las zapatas Z-E, Z-C, Z-B y O-A1. Adicionalmente. se ha completado el suministro de conc to ciclópeo, en las zapatas 3-E, 3-C, 3-B, y 3-A1.



Powered by CamScanner

Fecha 20-10-2023
Personal en obra por parte del contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil- residente de obra
1 profesional HSE- residente SST
1 profesional social.
Mano de obra no calificada.
1 maestro de obra
2 oficiales
4 Ayudantes
5 oficios varios
Personal en obra por parte de interventoría.
1 ingeniero civil. residente de interventoría.
1 profesional HSE

Maquinaria en obra- Equipos.
1 mezcladora

Estado del tiempo.
Mañana soleado Medio soleado tarde soleado.

Si somos
- Rondas de inspección
- Se verifica charla de inicio de turno
- Se verifica adecuada señalización y disposición de residuos

ACTIVIDADES
Se inicia la instalación del acero de refuerzo de los parillas de las zapatas y el acero de refuerzo de los pedestales en los ejes 3-A, 3-C, y 3-E. con el objetivo de llevar a cabo la fundición simul

líder

tonca de estos elementos, al mismo tiempo se procede con la fundición del concreto ciclópeo en la zapata O-A7, De manera paralela, se mantiene la excavación y armado del acero de los micropilotes en las zapatas tipo 1 y tipo 6, situadas en los ejes 2-A7 y 1-O respectivamente. Esta secuencia de actividades se ejecuta con precisión para asegurar el progreso eficiente de la obra.





-Fecha 21-10-2023

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada.

1 Arquitecto residente.

1 Ingeniero civil - residente de obra.

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social.

Mano de obra no calificada.

1 Maestro de obra


2 oficiales

4 Ayudantes
5 obreros de oficios varios.
Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría.
1 Profesional HSE

Maquinaria en obra - Equipos
1 mezcladora

Estado del tiempo.
Mañana Nublado M.día nublado tarde. Nublado
Noche lluvia en la noche.
Sismos.
- Rondas de inspección
- Recomendaciones en materia de SST.

ACTIVIDADES
Se da inicio a la instalación del acero de refuerz
de los parrillas de las zapatas y de los pedestal
en los ejes 4-A1, con el propósito de realizar el su
ministro de concreto F'c 3000 PSI de estos compo
nentes de forma simultánea. Este proceso se desarr
de manera coordinada para garantizar una ejecuc
eficaz de la obra. Se prosigue con la figuración y ar
do de los pedestales de tipo 1. que estan destina
a ser instalados en las zapatas restantes.
Esta secuencia de actividades se ejecutan con prec
para asegurar el progreso eficiente de la obra.

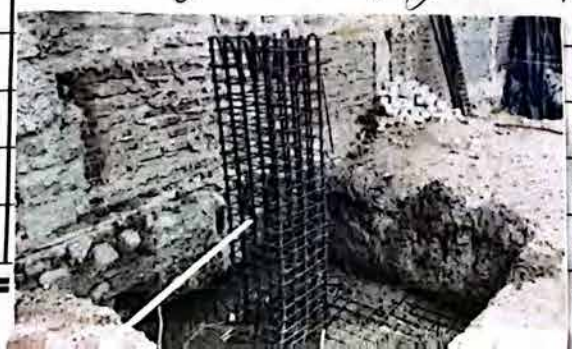



líder=

Powered by CamScanner



• 23-10-2023

personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 Maestro de obra

2 oficiales

4 Ayudantes

5 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE.

Maquinaria en obra - equipos

1 Mezcladora

Estado del tiempo

Mañana - Soleado M. día - Nublado tarde - lluvioso

Si soma.

Por parte del contratista se realiza socialización del plan de emergencia

- Socialización de la ruta de evacuación
- Conformación de brigadas de emergencia.

líder=

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES.

Las actividades de figuración y armado del acero de refuerzo de pedestales y zapatas siguen en marcha, al mismo tiempo que avanzamos en la ejecución de actividades críticas relacionadas con ítems no previstos. Actualmente estamos trabajando en el encofrado de los micropilotes, que posteriormente serán fundidos en las zapatas Z-A1 y 1-0, respectivamente además simultáneamente se realiza el figurado y armado del acero de pedestales y zapatas en sus diversas tipologías.





·Fecha 24-10-2023

Personal en obra por parte del contratista

1 Maestro de obra calificado

1 Arquitecto residente

1 Ingeniero civil - residente de obra

Powered by CamScanner

1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social
Mano de obra no calificada
1 Maestro de obra
2 oficiales
4 Ayudantes
5 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra
1 Mezcladora

Estado del tiempo
Mañana - soleado Medio. Nublado Tarde lluvioso

Si soma.
- Rondas ole inspección de seguridad
- se verifica charlas de inicio de turno

ACTIVIDADES.
- Se procede con una de las actividades crít
de la ruta, que implica el suministro de concre
ciclópeo en las zapatas 2-A1 y 1-0. Esta acción
es fundamental para estabilizar el suelo y
avanzar con los elementos relacionados con la cim
tación del proyecto. Al mismo tiempo, se continu
con la instalación del acero de refuerzo tanto e
las parrillas de las zapatas como el acero de pedestal
Simultaneamente, se lleva a cabo el suministro de
concreto con una resistencia de F'c: 3000 PSI e

líder=

la zapatas de los ejes 4-C, lo cual estuvo en linea con las especificaciones detalladas en los planos de cimentación, adicionalmente se continua con el figurado y armado olel acero de pedestales y zapatas en sus diversas tipologias.





Fecha 25-10-2023

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social.

Mano de obra no calificada

1 Maestro de obra

2 oficiales

4 Ayudantes

5 obreros de oficios varios.

Personal en obra por parte de interventoria

líder=

1 ingeniero civil - residente de interventoria.
1 profesional HSE.

Maquinaria - Equipo en obra
1 Mezcladora

Estado del tiempo
Mañana soleado Media soleado Tarde soleado

Si somos.
- El encargado SST contratista realiza charlas de inicio de turno.
- Se verifica parte y uso adecuado de EPP.

Actividades
La construcción del concreto ciclópeo para el mejoramiento del suelo, una actividad crítica y no prevista inicialmente, avanzo de manera Progresiva. Durante esta etapa, se han llevado a cabo el suministro de concreto ciclópeo de las zapatas Z-A1 y Z-D, junto con la instalación de la refuerzos de acero en estas zapatas y el pedestal en el eje Z-E todos estos elementos han sido ensamblados y asegurados siguiendo las especificaciones detalladas en los planos de cimentación. Además el proceso de corte, figurado y armado de acero en pedestales y zapatas de diversas tipologías continua sin contratiempos. Esta secuencia de actividades sigue el cronograma previamente establecido y se ajusta plenamente a los requerimientos del proyecto.

Powered by CamScanner





Fecha 26-10-2023

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 Profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada.

1 Maestro de obra

2 oficiales

4 Ayudantes

5 Obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil - residente de interventoría.

1 profesional HSE

Maquinaria - Equipo en obra.


1 Mezcladora
Estado del tiempo
Mañana Nublado M.día Nublado Tarde. Nublado
Noche. Lluvia en la noche
Si soma.
- Rondas de inspección de seguridad.
- Por parte de la profesional social se distribuye en la comunidad volantes con información referente al proyecto.


ACTIVIDADES.
se inicia el suministro de concreto F'c. 3000 a la zapata ubicada en la posición 2-E. Esta zapata cumple con las especificaciones de una zapata de tipología #1. paralelamente, se prosigue con la instalación del acero de refuerzo en la zapata de los ejes 1-C, que abarca tanto la parrilla como el pedestal. Estas acciones estan siendo llevadas a cabo de acuerdo con las pautas y los planos de cimentación del proyecto. asegurando que se cumplan los estandares de calidad y seguridad establecidos.





Powered by CamScanner





Fecha 27-10-2023
Personal en obra por parte del contratista.
Mano de obra calificada.
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil- residente de obra
1 profesional HSE- residente SST
1 profesional social.
Mano de obra no calificada.
1 Maestro de obra.
2 oficiales
4 Ayudantes
5 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoria.
1 ingeniero civil- residente de interventoria
1 profesional HSE

Maquinaria en obra
una Mezcladora.

Estado del tiempo
Mañana Nublado M. Dia Nublado Tarde. Nublado
Noche. Lluvia en la noche.
Si somos.
- Se verifica charlas de inicio de turno
- Se realizan rondas de inspección de seguridad.
- Se realizan recomendaciones en materia de
SST.

ACTIVIDAD EL

Se inicia el suministro de concreto F'C: 3000 PSI a la zapata ubicada en la posición 1-C, la cual se ajusta a las especificaciones de una zapata de tipología #1. De manera simultanea se continua con el proceso de corte. Figuración y armado del acero de refuerzo de los pedestales tipo 2 con el fin de que estos elementos estén listos para su instalación en las zapatas correspondientes.





Fecha 28-10-2023

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

líder

Powered by CamScanner

2 Oficiales
4 Ayudantes
5 obreros de oficios Varios

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria en obra - equipos
1 Mezcladora

Estado del tiempo
Mañana Nublado M.dia Nublado Tarde Lloviendo


Sismos.
Se verifica la adecuada demarcación y señalización de áreas peligrosas.
Se realizan rondas de inspección de seguridad

ACTIVIDADES.
Se inicia la jornada laboral con actividades relacionadas con el proceso de corte, figuración y armado del acero de refuerzo de los pedestales tipo 2 con el objetivo de tener preparado este elemento para su posterior instalación en los respectivos cortes pondientes





líder



Fecha 30 - 10 - 2023

Personal en obra por parte del contratista.
1 ingeniero civil - residente de obra
1 Arquitecto residente
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social.
Mano de obra no calificada
1 Maestro de obra
2 oficiales
4 Ayudantes
5 obreros de oficios varios.

Personal en obra por parte de interventoría.
1 ingeniero civil - residente de interventoría.
1 profesional HSE.

Maquinaria - equipos en obra.
1 Mezcladora.

Estado del tiempo.
Mañana Nublado M.dia Nublado Tarde. Nublado.
Nota. lluvia en la noche
Sismo.
No se realizan actividades en obra puesto que el personal por parte de contratista no se presentó

ACTIVIDADES.
El personal relacionado anteriormente por parte de líder=

contratistas debio hacer presencia en obra. sin embargo el dia de hoy, no se presentaron a realizar sus actividades laborales tanto el area administrativa como el area operativa. la interventoria desconoce los motivos de esta ausencia ya que no se recibió una notificación previa al respecto, por ende no se realizaron actividades laborales el dia de hoy.



fecha 31-10-2023

Personal en obra por parte del contratista

1 - ingeniero civil - residente de obra
1 - Arquitecto residente
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social
Mano de obra no calificada
1 Maestro de obra
2 oficiales
4 Ayudantes

5 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría
1 profesional HSE
1 ingeniero civil - residente de interventoría.

Maquinaria en obra - equipos.
1 Mezcladora.

Estado del tiempo.
Mañana soleado M.día soleado Tarde. soleado

Síntesis.
- Rondas de inspección de seguridad.
- se verifica disposición adecuada de residuos
- se realizan recomendaciones en materia de SST

ACTIVIDADES
La jornada laboral comienza con una serie de actividades relacionadas con el proceso de corte, figuración y armado del acero de refuerzo de los pedestales tipo 2. estas actividades son fundamentales para preparar los elementos estructurales necesarios en el proyecto. Mientras se llevan a cabo estas tareas, se inicia el suministro de concreto F'c 3000 PSI en la ubicación 4-B, lo que implica la entrega y vertido del concreto en esa área específica. ES importante destacar que las condiciones climáticas han presentado desafíos adicionales ya que se ha acumulado agua debido a las fuertes lluvias registradas durante la noche anterior, como resultado se procede a la extracción del agua acumulada para garantizar un entorno de trabajo seguro y

líder

ejecente





Fecha 01-11-2023

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE. - residente SST

1 profesional social.

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

2 oficiales

4 Ayudantes

5 obreros de oficios varios.

Personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional - HSE

Mayordomía en obra - equipos

Powered by CamScanner

1 Mezcladora


Estado del tiempo
Mañana lluvia M. día Nublado Tarde. Nublado Noche. lluvia en la noche
Sisoma
- Rondas de inspección de seguridad
- se verifican charlas de inicio de turno y pausas activas
- se hacen recomendaciones en materia de SST


ACTIVIDADES
La jornada laboral comienza con una serie de actividades escenciales para el avance del proyecto. En primer lugar, se prosigue con las excavaciones necesarias para la construcción de las vigas de cimentación en los ejes 4 y 5. Estas excavaciones son cruciales para la preparación del terreno y la posterior colocación de las vigas. Simultaneamente, se lleva a cabo el armado de acero de refuerzo de los pedestales tipo No. 2, una vez que el acero de refuerzo de los pedestales está armado y preparado, se procede a su instalación en los lugares correspondientes. Posteriormente, se realiza el suministro de concreto de F'c: 3000 PSI, siguiendo rigurosamente los especificaciones del diseño, esto asegura que se cumplan los requisitos de resistencia y durabilidad de la estructura.





Powered by CamScanner





·Fecha - 02-11-2023

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social.

Comisión topográfica.

Mano de obra no calificada

1 Maestro de obra

1 oficiales

4 ayudantes

5 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría

1 Ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra

1 Mezcladora

Estado del tiempo

Mañana · Nublado Medio Nublado Tarde lluvia noche

Si somos

- Se verifica el porte y uso adecuado de EPP.
- Se realizan rondas de inspección de seguridad

ACTIVIDADES.

Powered by CamScanner

Se mantiene el ritmo de trabajo con las jornadas de instalación del acero de refuerzo de pedestales, que previamente han sido debidamente armados. A continuación se procede al suministro de concreto con una resistencia de F'c 3000 PSI en los ejes 2-B. siguiendo las especificaciones del diseño estructural. Simultaneamente se continua con los excavaciones manuales necesarias para las vigas ubicadas en los ejes mencionados anteriormente. En paralelo, en colaboración con la comisión topográfica, se establecen los coordenadas geodésicas de los pedestales y zapatas de contrapeso. Esta información es esencial para garantizar una correcta ubicación y (alco) alineado de estos elementos.





Fecha 03-11-2023

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente.

1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social.
Comisión
Mano de obra no calificada
1 Maestro de obra
2 oficiales
4 Ayudantes
5 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría.
1 profesional HSE

Maquinaria - equipos en obra
1 Mezcladora

Estado del tiempo
Mañana Nublado M. día Nublado Tarde. Nublado

Si somos
- Se verifica charlas de inicio de turno
Se realizan rondas de inspección

Actividades.
Se han continuado las excavaciones manuales para las zapatas de contrapeso, una actividad que experimentaba un retraso en la programación debido a la necesidad de garantizar la estabilidad del terreno.
Asimismo, se ha procedido con el suministro de concreto de resistencia F'c 3000 PSI para las zapatas ubicadas en los ejes 3-B, Adicionalmente se han montado

los labores de corte, figuración y armado del acero de refuerzo en los diferentes tipologías de zapatas y pedestales, siguiendo las especificaciones técnicas de cada uno. Estos avances se alinean con el plan de trabajo y garantizan la continuidad de la obra.





Fecha - 04-11-2023

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada.

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social.

Mano de obra no calificada.

1 Maestro de obra

2 oficiales

4 Ayudantes

5 obreros de OFICIOS VARIOS

Personal en obra por parte de interventoría.
1 Ingeniero civil - residente de interventoría
1 Profesional HSE

Maquinaria - equipos en obra
1 Mezcladora

Estado del tiempo
Mañana soleado M. día soleado Tarde. soleado

Sisoma.
- Se realizan rondas de inspección
- Se realiza acompañamiento a jornada de orden y aseo.
- Se verifica el adecuado porte y uso de EPP.

ACTIVIDADES.
En la jornada diaria, se ha continuado con la excavación manual de las zapatas de contrapeso correspondientes a las tipologías #4 y #5 de la misma estructura. Además se han mantenido las labores de corte, figuración y armado de acero de refuerzo en los diversos tipologías de zapatas y pedestales, asegurando que se cumplan las especificaciones técnicas correspondientes a cada una de ellas. Estos avances están perfectamente alineados con el plan de trabajo y garantizan la progresión de la obra. Es importante destacar que también se llevó a cabo una jornada de orden y aseo en toda la obra, contribuyendo a mantener un entorno seguro y organizado.

líder=

Powered by CamScanner





Fecha - 07 - 11 - 2023.

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada.

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 Maestro de obra

2 oficiales

3 Ayudantes

5 obreros de oficios varios.

Personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE

Maquinaria - equipo en obra

1 Mezcladora

Estado del tiempo
Mañana soleado M. día Nublado Tarde lluvia.


SISOMA
- Se verifica Charla de inicio de turno y uso y porte adecuado de los EPP.
- Se verifica un colaborador retirado con su respectivo paz y salvo firmado.

ACTIVIDADES
En la rutina diaria, se mantuvieron activas las tareas de figuración, corte y armado del acero de refuerzo destinado a las zapatas y pedestales respectivamente. A su vez, se avanzó con el suministro de concreto del día en las zapatas, las cuales actúan como contrapeso estructural en los ejes 3. Además, se llevó a cabo el proceso de fundición de pedestales en el eje 3, asegurando la estricta adherencia a las especificaciones técnicas detalladas de cada uno de los elementos. Estos avances se alinean integralmente con el plan de trabajo establecido, lo que asegura la continuidad y el cumplimiento de los hitos del proyecto.





Powered by CamScanner



Fecha 08-11-2023

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 Maestro de obra

2 oficiales

3 Ayudantes

5 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría.

1 ingeniero civil - residente de interventoría.

1 profesional HSE.

Mayonana - equipos en obra.

1 Mezcladora

Estado del Tiempo

Mañana. Nublado M. día Nublado tarde. lluvia

Si somo.

- Se realizan rondas de inspección de seguridad
- se verifican inspecciones a equipos por parte de la inspectora siso contratista.
- se verifica señalización del area de trabajo.

Líderes

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES

La jornada laboral del día consistió en una serie de actividades fundamentales para el avance del proyecto. Se procedió con la colocación del acero de refuerzo de los pedestales tipo 3 especificados en los zapatas tipo 4. Además se mantuvo el proceso de figuración y armado del acero de refuerzo, tanto para pedestales como para columnas lo que contribuye a la preparación de elementos estructurales esenciales para la cimentación y el soporte general del proyecto en curso.





Fecha 09-11-2023

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada.

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Powered by CamScanner

Mano de obra no calificada
1 Maestro de obra
2 oficiales
3 Ayudantes
5 obreros de oficios varios

personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - equipo en obra
1 Mezcladora

Estado del tiempo
Mañana soleado Media soleado Tarde soleado

Sisoma
- rondas de inspección de seguridad.
- se realizan recomendaciones en materia de SST
- se verifica adecuado señalización y uso de epp.

ACTIVIDADES
- la jornada laboral del día consistió en una serie de actividades fundamentales para el avance del proyecto. se procedió con la colocación del acero de refuerzo de los pedestales tipo 3, específicamente en las zapatas tipo 5. enseguida, se realizo el suministro de concreto F'c: 3000 PSI en las mismas zapatas localizadas en el eje 5. Además se mantuvo el proceso de figuración y armado del acero de refuerzo, tanto para pedestales como para columnas, lo que contribuye a la preparación de elementos estructurales esenciales para la cimentación y soporte general del proyecto en curso.

líderes





Fecha 10-11-2023

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil- residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social.

Mano de obra no calificada.

1 Maestro de obra

2 oficiales

3 Ayudantes

5 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría.

1 ingeniero civil- residente de interventoría.

1 profesional HSE

Mayormaria- equipo en obra

líderes
