Secretaria de Infraestructura 2024 - 2027

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA:		PERIODO No. 11	DEL	06 de mayo	AL	12 de mayo

1. INFORMACIÓN GENERAL


CONTRATO No.:	2023-04-0011
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
LOCALIZACIÓN:	Valledupar - Rio de oro, Cesar
CONTRATISTA:	Centro de comercio Valledupar 2023
INTERVENTORIA:	Grupo consultor e ingenieros S.A.S

2, INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

PLAZO INICIAL:	Ocho (8) meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	10 De julio del 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
TIEMPO SUSPENDIDO:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 de Marzo del 2024		
FECHA DE PRORROGA 1:	08 de Marzo del 2024		
PLAZO PRORROGA 1 (mes):	5,00		
PLAZO ACTUALIZADO:	13,00		
PLAZO TRANSCURRIDO:	10,00	EQUIVALE AL	77%
VALOR INICIAL :	$		14.951.092.652,70
VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR FINAL:	$		14.951.092.652,70
VALOR PAGADO:	$		6.597.418.836,33
VALOR POR PAGAR:	$		8.353.673.816,37

3, AVANCE DEL CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
	49,76%	59,30%	50,46%	60,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 7.439.245.340,46	$ 8.866.301.022,57	$ 7.543.862.204,11	$ 9.003.062.769,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AVANCE	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
	Semana 1	Semana 1	Semana 2	Semana 2	Semana 3	Semana 3	Semana 4	Semana 4
FISICO %	0,70%	0,91%	0,91%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FINANCIERO %	$ 104.616.863,65	$ 136.761.747,25	$ 136.024.776,23	$ 63.247.419,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACUMULADO SEMANAL	$ 7.543.862.204,11	$ 9.003.062.769,82	$ 7.679.886.980,34	$ 9.066.310.189,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	50,46%	60,22%	51,37%	60,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

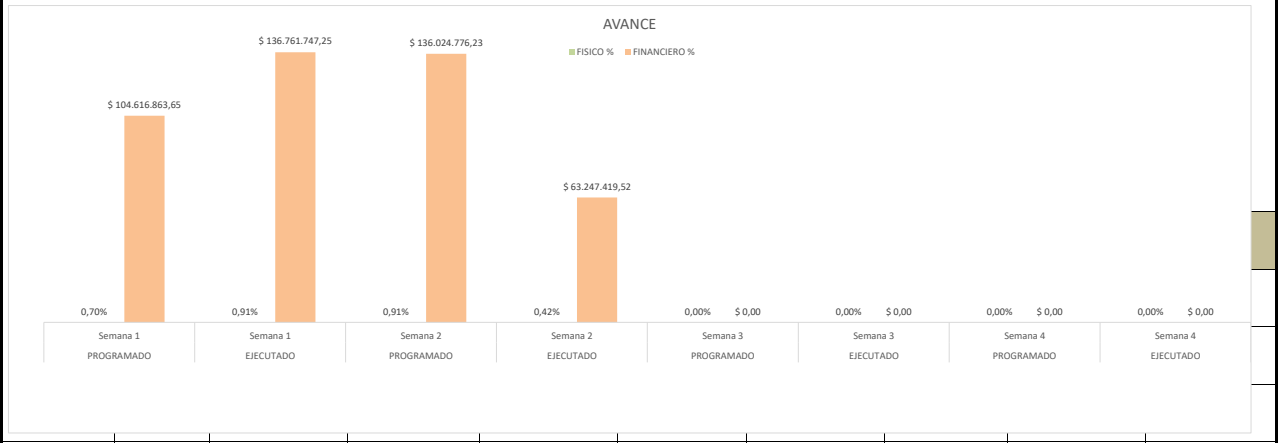

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Actividades realizadas durante la semana:

Actividades realizadas en el Centro de acopio Minorista y mayorista:

1. Instalacion de la lamina metaldeck para la viga canal que recoje las aguas lluvias
2. Instalación de la malla electrosoldada para el acero de refuerzo de la placa de contrapiso de la bodega general.
3. Suministro de concreto F'c: 3000 Psi para la conformación de la placa cubierta de la viga canal.
4. Levante de mampostería y remates de muros con la estructura metálica
5. Aplicación de pañetes impermeabilizados para la mampostería ya confinada.
6. Suministro de concreto para columnetas y vigas de confinamiento de la mampostería.

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Actividades realizadas durante la semana:

1. Corte, figurado y armado de acero de refuerzo para columnas.
2. Encofrado en formaleta metalica para el tanque de almacenamiento.
3. Suministro de concreto F'c= 3000 para Columnas
4. Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para tapa superior del tanque subterraneo.

5, REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR



Fotografía Nº 1



Fotografía Nº 2



Fotografía Nº3



Fotografía Nº4



Fotografía Nº 5



Fotografía Nº 6

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR



Fotografía Nº 7



Fotografía Nº 8



Fotografía Nº9



Fotografía Nº10



Fotografía Nº 11



Fotografía Nº 12

Elaboro:

Carlos Miguel Quintero Castro
