BITÁCORA DE OBRA

NO. CONTRATO DE OBRA.	NO. 2023- 04-0011
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO VALLEDUPAR 2023
DIRECTOR DE OBRA.	BARROS PIMIENTA CHESMAN HOBBET
RESIDENTE DE OBRA	CARLOS MARIO SANCHEZ
NO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	NO 2023- 05- 0011
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RÍO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	GRUPO CONSULTORES E INGENIEROS "GRUCOING S.A.S"
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ALVARO SOLANO AGUILAR
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	LUZ ANGELA JARAMILLO
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA:	GIOVANNY ALFONSO GARCÍA JACOME
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR
PLAZO DE EJECUCIÓN:	08 MESES 00 DÍAS
FECHA DE INICIO:	10 DE JULIO 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARZO 2023

Powered by CamScanner

Fecha 10-05-2024
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
4 oficiales
1 Ayudante
4 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - Equipo en obra
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto
1 Mezcladora
1 Cortadora

Estado del tiempo
Mañana Nublado M.DIA Nublado Tarde Lluvioso

JORNADA
Se verifica el ingreso de personal
Se realiza charla de inicio de turno

líderes

y pausas activas al personal de obra
Se verifica porte y uso adecuado de dotación y EPP.
se realiza adecuada disposición de residuos y desechos de obra
Se realiza inspección de herramientas y equipos se hacen recorridos en obra para verificar que las actividades se realicen de forma segura.

ACTIVIDADES
Durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1, continuo con el levantamiento de la mampostería restante, asegurando de ajustarla a los niveles de la estructura metálica ya instalada. esta acción se llevó a cabo con el fin de sellar adecuadamente la estructura y protegerla contra los agentes externos.
La cuadrilla N°2 se prosiguió con la recevaluación de las áreas siguientes para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se (compactación) mejorará con la loza de contra piso, con el objetivo de avanzar en esta tarea
La cuadrilla N°3 dio inicio al replanteo de las labores de construcción del muro en el predio vecino, el cual había sido afectado en las actividades de demolición de la estructura existente. este trabajo fue comprometido por el contratista a través de un acta. se iniciaron las actividades con la toma de niveles y el acopio de materiales

líder=

necesarios para comenzar la contrucción.





Fecha 11-05-2024

Personal en obra por parte de contratistas

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

1 Ayudante

4 oficiales

4 obreros de oficios varios.

Personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE.

Maquinaria - equipos en obra

líder

1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto
1 Tronzadora
1 Mezcladora

Estado del Tiempo
MAÑANA Soleado MEDIA Soleado TARDE Soleado

SISOMA.
Se identifica registro de ingreso de personal
Se realizan pausas activas al personal en obra
Se realiza adecuada disposición de residuos
y desechos de obra.
Se identifica uso adecuado de dotación
y EPP.
Se verifica que las actividades se realicen
de forma adecuada y segura.
Se realizan jornadas de orden y aseo

ACTIVIDADES
Durante la jornada diaria se coordinaron
las cuadrillas para dar continuidad
a las actividades programadas distribuyendo
las tareas de la siguiente manera
La cuadrilla N°1: Se continuó con el levanta
miento de la mampostería restante, asegurando
nos de ajustarla a los niveles de la estruc
tura metálica ya instalada. Esta acción se
llevó a cabo con el fin de sellar adecua
damente la estructura y protegerla contra los
agentes externos.
La cuadrilla N°2 se enfocó en suministrar
y aplicar el piso de nivelación sobre las
placas previamente fundidas, con el objetivo

Powered by CamScanner

de optimizar los niveles hacia desagues pluviales instalados
Nota se llevo a cabo una jornada de limpieza en toda el area del proyecto con el fin de recolectar todos los desechos de obra y garantizar su disposición final conforme a las normativas correspondientes:





Fecha 14-05-2024
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil- residente de obra
1 Profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
1 Ayudante
4 OA civiles
4 obreros de OA civil varios

líderes

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - equipo en obra
1 Tronzadora
1 Mezcladora
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto.

Estado del tiempo
Mañana Nublado M. día Nublado Tarde Nublado

SISOMA.
Se registra el ingreso de personal a la obra se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP
se realizan reconocimiento en obra y se identifica que las actividades se realizan de forma segura
se identifica inspección de equipos y herramientas.

ACTIVIDADES.
Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 ha llevado a cabo la producción y suministro de concreto con una resistencia de F'c 3000 PSI, lo cual indica la capacidad de soportar cargas especificas tras un periodo de 28 días de fraguado

Este suministro fué destinado especialmente para las losas de contrapiso en el area de la bodega general con un acabado esmaltado y pulido. Es importante destacar que durante ese proceso se ha dado estricto cumplimiento a los parámetros de fabricación detallados en las especificaciones técnicas y los diseños correspondientes.
Todo se ha realizado con el objetivo principal de garantizar la conformidad con la normativa vigente, asegurando así la integridad estructural y la calidad duradera de las instalaciones constructivas.
En la gradolla Nº2 se ha dado prioridad a la aplicación de pañete impermeabilizado sobre la mampostería ya construida y reforzada, con el objetivo de garantizar una total protección contra la infiltración de aguas lluvias en el proyecto.





líder

Fecha 15-05-2024
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
1 Ayudante
4 obreros de oficios varios
4 oficiales

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra
1 Formaleta
1 Mezcladora
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto

Estado del tiempo
Mañana soleado Media soleado tarde soleado

SISOMA
se registro el ingreso de personal a la obra
se identifica parte y uso de dotación y EPP.
se identifica adecuada disposición de residuos y desechos de obra
se realizan rondas de inspección a cargo de

trabajo para verificar que las actividades se realicen de manera segura y adecuada.

ACTIVIDADES

Durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1 continua con la producción y suministro de concreto con una resistencia de F'c 3000 psi, lo cual indica la capacidad de soportar cargas especificas tras un periodo de 28 días de fraguado. este suministro fue destinado especialmente para las losas de contrapiso en el area de la bodega general con un acabado esmaltado y pulido. es importante destacar que durante este proceso se ha dado estricto cumplimiento a los parametros de fabricación detallados en las especificaciones técnicas y los diseños correspondientes, todo ello se ha realizado con el objetivo principal de garantizar la conformidad con la normativa vigente, asegurando así la integridad estructural y la calidad duradera de las instalaciones construidas.

La cuadrilla N°2 continua con la aplicación de pañete impermeabilizado sobre la mampostería ya construida y reforzada, con el objetivo de garantizar una total protección contra la infiltración de agua de lluvia en el proyecto.

La cuadrilla N°3 progreso con la parametración de las áreas siguientes para ajustar la nivelación

lider=

lación y compactación del terreno donde se mejorará con la loza de contrapiso con el objetivo de avanzar en esta tarea.





Fecha 16-05-2024

Personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social.

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra
3 oficios varios- obreros
1 Ayudante
4 oficiales.

Personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Powered by CamScanner

Maquinaria - equipo en obra
1 Vibrador
1 Mezcladora
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto.

Estado del tiempo
Mañana Nublado MEDIA Nublado Tarde Nublado

SISOMA
Se registra el ingreso de personal
se identifica parte y uso de dotación y EPP
se realizan recorridos en obra para verificar que las actividades se realicen de forma segura
se identifica adecuada disposición de residuos y desechos de obra.

En las horas de la mañana aproximadamente a los 8:15 am el trabajador Ruben Miranda sufre un accidente de trabajo. Mientras caminaba, tropezó con su propia pie, lo que ocasionó una caída desde su mismo nivel, al caer el trabajador, golpeo la rodilla derecha, como primera acción, el trabajador recibió primeros auxilios por parte de la HSE contratista, posteriormente es trasladado al centro hospitalario de la localidad acompañado de la HSE contratista, se procede a realizar el reporte de dicho accidente a la Arl a la cual esta vinculada

Powered by CamScanner

do el trabajador, luego es atendido por el medico que realizó una revisión y determina que el trabajador presenta una contusión en la rodilla derecha y como medida de manejo le formula medicamentos y solicita una radiografía para descartar posibles lesiones adicionales. El médico otorgo tres días de incapacidad al trabajador.

Como recomendación se debe realizar una inspección en el area donde ocurrio el accidente para identificar y corregir posibles riesgos, se debe reforzar la capacitación sobre la prevención de caidas y la importancia de la atención a los movimientos personales al caminar, por ultimo se debe dar seguimiento al estado de salud del trabajador y asegurarse de que cumpla con el tratamiento prescrito

ACTIVIDAD

Durante la jornada diaria, se coordinan las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera, La cuadrilla N°1 continua con la aplicación de pañete impermeabilizado sobre la mampostería ya construida y reforzada, con el objetivo de garantizar una total protección contra la infiltración de aguas lluvias en el proyecto

La cuadrilla N°2 ha iniciado la aplicación del anticipo en la placa de

la bodega general con el objetivo de mejorar los niveles hacia la red de desagüe y evitar la humedad causada por aguas pluviales recogidas en la placa de la abiertura.

la cuadrilla N°3 se prosiguió con la recevaluación de las áreas siguientes para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará con la losa del contrapiso, con el objetivo de avanzar en esta tarea.



Fecha 17-05-2024

personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 Ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE

1 profesional social

Mano de obra no calificada

Powered by CamScanner

1 maestro de obra
5 oficiales
4 obreros de oficios varios
1 Ayudante
Personal instalación de Drywall
2 obreros de instalación

personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE.

Maquinaria - Equipos en obra
1 Vibradora
1 Mezcladora
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto

Estado del tiempo
MAÑANA Nublado M. DÍA Nublado TARDE Nubl

RISOMA
Se registra el ingreso de personal a la obra
se recepciona la documentación requerida para el ingreso de personal nuevo.
se realiza charla de inicio de turno a los colaboradores y pausas activas
Se realizan recorridos en obra para verificar que las actividades se realicen de manera segura.
Se identifica uso adecuado de dotación y EPP.
Se identifica adecuada disposición de residuos

líder=

ACTIVIDADES

Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1 continua con la aplicación de pañete impermeabilizado sobre la mampostería ya construida y reforzada, con el objetivo de garantizar una total protección contra la infiltración de agua de lluvia en el proyecto.

La cuadrilla N°2 continua con el levantamiento de la mampostería ya restante, asegurandonos de ajustarla a los niveles de la estructura metalica ya instalada Esta acción se llevó a cabo con el fin de sellar adecuadamente la estructura y protegerla contra los agentes externos.

La cuadrilla N°3 continua con la construcción de la mampostera y los elementos estructurales que conformaran dicha mampostería en el predio Vecino, propiedad del señor Elkin Eduardo Casadiego, tal como se había establecido en el acta de compromiso. Esto se llevó a cabo debido a que el contratista, durante las actividades de demolición de las instalaciones del antiguo inmueble, afectó el muro con la vibración de la actividad, lo que hizo necesario demolerlo.

La cuadrilla N°4 se comenzó con la toma de niveles de los acabados del piso concreto en la placa general, para luego proceder con

Powered by CamScanner

la instalación de los perfiles que sosten
drán el drywall del acero rasa, conto
a los diseños arquitectónicos





Fecha 18-05-2024.
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil residente de obra
1 profesional HSE residente SST
1 profesional social.

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
5 oficiales
4 obrero de oficiales varios
1 Ayudante

personal instalación Drywall
2 obreros de instalación

líder=

personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra
1 Ironzadora
1 Mezcladora
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto

ESTADO DEL TIEMPO.
Mañana Nublado Medio Nublado Tarde Nub to

SISOMA.
se registra el ingreso de personal a obra
se realiza charla de inicio de turno
se realiza entrega de EPP al personal en obra
se identifica parte y uso adecuado de EPP.
se hacen recorridos en obra para verificar que las actividades se realicen de forma segura segura.

ACTIVIDADES.
Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1: Continua con la aplicación de pañete impermeabilizado sobre la muro posteria ya construida y reforzada, con el objetivo de garantizar una total protección

líder=

Powered by CamScanner

contra la infiltración de agua de lluvia en el proyecto.
La cuadrilla Nº2. se continuo con el levantamiento de la mampostería restante, asegurandonos de ajustarla a los niveles de la estructura metálica ya instalada Esta acción se realizó con el propósito de sellar adecuadamente la estructura y protegerla contra los agentes externos.
La cuadrilla Nº3 se continuo con la construcción de la mampostería y los elementos estructurales que confinaran dicha mampostería, en el predio Yeano, propiedad del señor Elkin Faviano Casadiegos, tal como se había establecido en el acta de compromiso Esto se llevó a cabo debido a que, durante las actividades de demolición de las instalaciones del antiguo matadero, el contratista afectó el muro con la vibración lo que hizo necesaria su demolición.
La cuadrilla Nº4 se comenzó con la toma de niveles de los acabados del deb rado en la placa general, para luego proceder con la instalación de los perfiles que sostendran el drywall del cielo raso, conforme a los diseños arquitectonicos




Fecha 20-05-2024.
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social.

Mano de obra no calificada.
1 maestro de obra
5 oficiales
4 obreros de oficios varios
1 Ayudante

Personal instalación Drywall.
2 obreros de instalación

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE.

Maquinaria - equipo en obra
1 Ironzadora
1 Mezcladora
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto.

Estado del tiempo

Powered by CamScanner

Mañana soleado M.Día soleado Tarde soleado

SIGMA

Se registra el ingreso de personal
Se identifican charlas de inicio de turno
Se realiza por parte del area social, la entrega del certificado de reconocimiento al empleado del mes
Se identifica parte y uso adecuado de dotación y EPP.
Se identifica inspección de equipos y herramientas.
Se realiza jornada de Orden y aseo para la adecuada disposición de residuos y desechos de obra.

ACTIVIDADES.

Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 prosiguió con la recuperación de las áreas siguientes para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará con la loza de contrapiso con el objetivo de avanzar en esta tarea.
La cuadrilla N°2 se continuó con la instalación de los perfiles que sostendrán el drywall del cielo raso, conforme a los diseños arquitectónicos.
La cuadrilla N°3 se continuó con el levantamiento de la mampostería restante, asegu

der=

condonal de ajustarla a los niveles de la estructura metálica ya instalada, esta acción se realizó con el propósito de sellar adecuadamente la estructura y protegerla contra los agentes externos.

La cuadrilla N°4 continua con la aplicación del pañete impermeabilizado sobre la mampostería ya construida y reforzada, con el objetivo de garantizar una total protección contra la infiltración de aguas lluvias en el proyecto.





Fecha 21-05-2023

personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 Ingeniero civil- residente de obra

1 profesional - HSE residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

Powered by CamScanner

5 oficiales
4 obreros de oficios varios
1 Ayudante

Personal instalación Dry wall
2 obreros de instalación

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - Profesional residente de interventoría
1 profesional ASE

Maquinaria - Equipos en obra
1 Mezcladora
1 vibro de concreto
1 vibro compactador tipo rana

Estado del tiempo
Mañana soleado - M.DIA soleado Tarde soleado

SISOMA
Se registra el ingreso de personal a obra
Se identifica parte y USO adecuado de dotación y EPP.
Se verifica que las actividades se realicen de forma segura y adecuada.
Se realizan rondas de inspección en el área del proyecto


ACTIVIDADES
Durante la jornada diaria, se coordinan las cuadrillas para dar continuidad a las

Powered by CamScanner

actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 prosiguió con la recuperación de las áreas de trasiego de la bodega general y zona de manipulación de carga, para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará con la base de contrapiso, con el objetivo de avanzar en esta tarea.
La cuadrilla N°2. con el terreno ya compactado y replanteado, se procede a la instalación de la malla electrosoldada en el área delineada. Esta se coloca sobre los dados de concreto que cumplen con las mismas especificaciones del concreto a verter, garantizando así la homogeneidad necesaria para cumplir con los recubrimientos establecidos en los planos y diseños.
La cuadrilla N°3 continuo con el levantamiento de la mampostería restante, asegurando donde de ajustarla a los niveles de la estructura metálica ya instalada. Esta acción se realizó con el propósito de sellar adecuadamente la estructura y protegerla contra los agentes externos.
La cuadrilla N°4 continuó con la construcción de la mampostería y los elementos estructurales que la confinaran en el predio vecino propiedad del señor Elkin Fonseca Castellanos. Posteriormente, se procedió a levantar y construir las vigas y columnas que confinaran la mampostería, tal como se estableció en el acta de compromiso.

lider

la cuadrilla N°5 continua con la aplicación de pañete impermeabilizado sobre la muro posterior ya construido y reforzado, con el objetivo de garantizar una total protección contra la infiltración de agua lluvia en el proyecto.

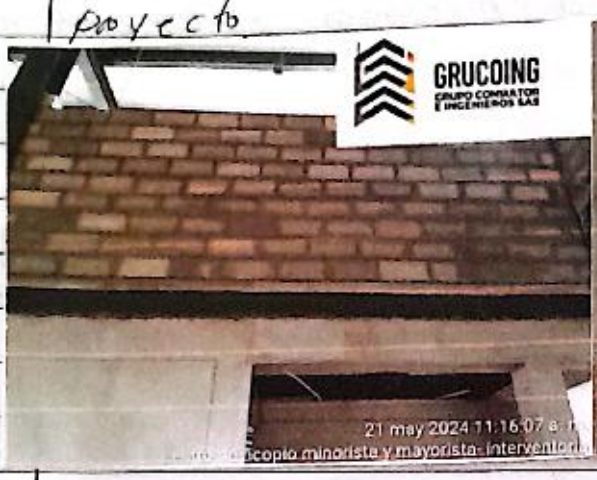



fecha 22-05-2023

personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 Ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social.

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

5 oficiales

4 obreros de oficios varios

1 Ayudante

Personal instalación de Drywall
2 obreros de instalación

Personal en obra por parte de interventoria
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional - HSE

Maquinaria - Equipo en obra
1 Tronzadora
1 Mezcladora
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto.

Estado del tiempo
Mañana soleado Media soleado Tarde soleado

SISOMA
se realizan charlas de inicio de turno y pausas activas al interior de la obra
se identifica uso y uso de dotación y EPP
se realiza la reconformación de los comites copasst y de emergencias.
se verifica que las actividades se realicen de forma segura
se realiza adecuada disposición de residuos desechos de obra

ACTIVIDADES
durante la jornada diaria, se coordinan las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera

líder=

La cuadrilla N°1 se procede a la instalación de la tubería para la energía electrica con el fin de preparar adecuadamente el area para la construcción de la placa de contra piso. Este paso es fundamental para asegurar todas las instalaciones electricas y que esten correctamente ubicadas y protegidas antes de verter el concreto, garantizando así la seguridad y funcionamiento del sistema eléctrico en la edificación.

La cuadrilla N°2. Se procede a la elaboración del concreto con una resistencia de F'C 3000 PSI el cual será vertido en el area previamente preparada para la construcción de la placa de contrapiso. Esta placa se ubicara en las zonas de trasiego y manipulación de carga de la bodega, asegurando una base robusta y duradera que soporte adecuadamente las actividades logisticas y el peso de los materiales manejados en estas areas.

La cuadrilla N°3. se continua con la aplicación de poliuretano impermeabilizado sobre la mampostería ya construida y reforzada con el objetivo de garantizar una total protección contra la infiltración de agua de lluvia en el proyecto.

La cuadrilla N°4 se continuo con la instalación de los perfiles que sostendran el drywall del cielo raso, conforme a los diseños arquitectonicos.

Fecha 23 - 05 - 2024
Personal en obra por parte del contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada.
1 maestro de obra
5 oficiales
4 obreros de oficios varios
1 Ayudante.

Personal instalación drywall
3 obreros de instalación

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE.

Maquinaria - Equipo en obra
1 Tronculadora
1 Mezcladora
1 vibro de concreto
1 vibro compactador tipo rana

Estado del tiempo
Mañana soleado Medio soleado Tarde. soleado

Powered by CamScanner

SISOMA:
- Se registra el ingreso de personal en obra
- Se recepciona documentación de un alabañil obr de instalación de drywall
- Se identifica señalización y demarcación de áreas peligrosas
- Se realizan pausas activas
- Se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP

ACTIVIDADES
Durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 prosiguió con la recebada de las áreas del patio en el costado Norte del proyecto para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará con la loza del contrapiso, con el objetivo de avanzar en esta tarea.
La cuadrilla N°2 continua con la aplicación de pañete impermeabilizado sobre la mampostería ya construida y reforzada, con el objetivo de garantizar una total protección contra la infiltración de agua de lluvia en el proyecto.
La cuadrilla N°3 continuó con la construcción de la mampostería y los elementos estructurales que la confinaran en el predio vecino, propiedad del señor Elkin Fernando Castellegos posteriormente, se procedió a levanta- y continu

las vigas y columnas que conforman la mampostería, tal como se estableció en el acta de compromiso.

la cuadrilla N.° 4 se continuó con el levantamiento de la mampostería restante, asegurandose de ajustarla a los niveles de la estructura metálica ya instalada. Esta acción se realizó con el propósito de sellar adecuadamente la estructura y protegerla contra los agentes externos.





Fecha 24-05-2024

Personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil- residente de obra

1 Profesional HSE- residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

Powered by CamScanner

1 maestro de obra
5 oficiales
4 obreros de oficios varios.
1 Ayudante

personal instalación de Dry wall
3 obreros de instalación.

personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra
1 Formaleta
1 Mezcladora
1 vibrador de concreto
1 rana compactador tipo rana

Estado del tiempo
Mañana Nublado Media Nublado Tarde Nublado

SISOMA
se registra el ingreso de personal
se identifican charlas de inicio de turno
se identifica porte y uso de dotación y EPP.
se realiza adecuada disposición de residuos y desechos de obra.
se verifica que las actividades se realicen de forma adecuada y segura.

ACTIVIDADES
Durante la jornada diaria, se coordinaron las

cuadrillas para dar continuidad a las activi dades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N°1 procedió con la excavación de las áreas de las rampas que dan acceso al área de trasiego de la bodega general y área de manipulación de cargo, para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorara la losa de contrapiso, con el objetivo de avanzar en la tarea

La cuadrilla N°2 procede con la instalación de la tubería para la energía eléctrica, con el fin de preparar adecuadamente el área para la construcción de la placa de contrapiso. Este paso es fundamental para asegurar que todas las instalaciones eléctricas estén correctamente ubicadas y protegidas antes de verter el concreto, garantizando así la seguridad y funcionalidad del sistema eléctrico en la edificación.

La cuadrilla N°3 se centró en la extendida de la malla electrosoldada de diámetro de varilla 6 mm con el fin de avanzar y seguidamente dejar el área ya dispuesta para mejorarla con la placa de contrapiso en el área del patio en el costado norte del proyecto.

La cuadrilla N°4 procedió con la aplicación de los contrapisos de nivelación en el área del mezanine, siguiendo exactamente lo indicado en los diseños

líder

Powered by CamScanner





Fecha. 25 - 05 - 2024

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada.

1 maestro de obra

5 oficiales

4 obreros de oficios varios

1 Ayudante

Personal instalacion Drywall

3 obreros de instalación

Personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE

Maquinaria - equipo en obra
1 Mezcladora
1 Vibradora
1 vibro de concreto
1 vibro compactador tipo rana

Estado del tiempo
Mañana lluvioso M.DIA Nublado Tarde. Nublado

SISOMA.
- Se registra el ingreso de personal a obra
- Se identifica adecuado porte y uso de dotación y EPP.
- Se identifica inspección de herramientas y equipos en obra
- Se realiza adecuada disposición de residuos y desechos de obra.
Se Verifica que las actividades se realicen de forma segura.

ACTIVIDADES
Durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°. 1. se procede a la elaboración del concreto con una resistencia de F'c 3000 PSI, el cual será vertido en el área previamente preparada para la construcción de la placa de contrapiso. esta placa se ubicará en las zonas del patio en el sector de norte del proyecto, asegurando una base robusta y duradera que soporte adecuadamente

líder

las actividades logísticas y el peso de los materiales manejados en estas áreas.
La cuadrilla N° 2. continuó con la construcción de la mampostería y los elementos estructurales que la confinaran en el predio vecino propiedad del señor elkin fauricio Casadiegos posteriormente, se procedió a levantar y continuar las vigas y columnas que confinarán la mampostería, tal como se estableció en el acto de compromiso.
La cuadrilla N° 3 con el personal de la obra, se dedica una hora antes del inicio del descanso del fin de semana a realizar una jornada de orden y aseo con el objetivo de mantener limpio todo el perimetro y las areas del proyecto.





Fecha 24-05-2024
Personal en obra por parte de contratista
Maestro de obra coli Ávila

1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST.
1 profesional social.

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
5 oficiales
4 obreros de oficios varios
1 Ayudante.

Personal instalación Drywall
3 obreros de instalación.

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil- residente de interventoría
1 profesional HSE.

Maquinaria - Equipo en obra.
1 Mezcladora
1 Tronzadora
1 vibro de concreto
1 vibro compactador tipo rana.

ESTADO DEL TIEMPO.
Mañana Nublado Media. Nublado Tarde. Lluvia

SISOMA.
Se registra el ingreso de personal a obra
Se realizan recorridos en obra
Se identifica pausas activas dirigidas a los colaboradores
Se identifica porte y uso adecuado de

Powered by CamScanner

dotación y EPP.
Se verifica que las actividades se realicen de forma segura.
En el área social se realiza actividad llamada el nudo humano.

ACTIVIDAD.
Durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas de la siguiente manera para dar continuidad a las actividades programadas.
La cuadrilla No 1 prosiguió con la nivelación de las áreas de las rampas que dan acceso al área de trasiego de la bodega general y el área de manipulación de carga, para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará con la losa de contrapiso, con el objetivo de avanzar en esta tarea.
La cuadrilla No 2. se centró en la instalación de la malla electrosoldada con varillas de 6m de diámetro con el fin de avanzar en el proyecto y preparar el área para la colocación de la placa de contrapiso en las rampas de acceso entre el área de trasiego y la de manipulación de carga. La malla se instaló sobre dados de concreto con la misma resistencia respetando el espaciamiento indicado en el diseño del acceso de refuerzo.
La cuadrilla No 3. continuó con la construcción de la mampostería y los elementos estructurales que la conforman en el predio vecino propiedad del señor Elmer Fausto Cassio

gol, posteriormente, se procedió a levantar y construir las vigas y columnas que continuán la mampostería, tal como se estableció en el acta de compromiso.

La cuadrilla N°4 con las areas de la placa de la bodega general y la viga canal terminadal, se procedio a iniciar la impermeabilización de las placas. el objetivo es asegurar la hermeticidad para proteger el proyecto de las aguas lluvias y mantenerlo completamente seco y libre de humedades.





Fecha 28-05-2024

Personal en obra por parte del contratista.

Mano de obra calificada.

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil residente de obra

1 profesional social

1 profesional HSE - residente SST

Mano de obra no calificada

Powered by CamScanner

1 maestro de obra
5 oficiales
4 obreros de oficios varios
1 Ayudante

Personal instalación drywall
3 obreros de instalación

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - equipos en obra
1 Vibradora
1 Mezcladora
1 vibro de concreto
1 vibro compactador tipo rana

Estado del tiempo
Mañana Nublado Mitad Nublado Tarde Lluvia

SISO MA.
Se registra el ingreso de personal
Se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP
Se identifica demarcación de áreas de trabajo
Se verifica que las actividades se realicen de forma adecuada.

ACTIVIDADES.
Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las

Actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 se dedica al suministro de concreto para las vigas y columnetas que confinaron la mampostería levantada en el predio vecino de Sr Elkin Fourcio Casa de ego para subsanarle el muro divisorio que durante actividades de demolición se vió afectado por dicha actividad.
La cuadrilla N°2 con las áreas de placa de la bodega general y la viga canal terminadas, se procede a la continuidad de la impermeabilización de las placas. El objetivo es asegurar la hermeticidad para proteger el proyecto de las aguas lluvias y mantener completamente seco y libre de humedades.
La cuadrilla N°3 procede con la elaboración del concreto con una resistencia de f'c. 3000 psi, el cual será vertido en el área previamente preparada para la construcción de la placa de contrapiso. Esta placa se ubicará en las rampas de acceso entre el área de trasiego y el área de manipulación de cargas, asegurando una base robusta y duradera que soporte adecuadamente las actividades logísticas y el peso de los materiales manejados en estas áreas.
La cuadrilla N°4 se continua con la aplicación del paño de impermeabilizado sobre la mampostería ya construida y reforzada, con el objetivo de garantizar una total protección contra la infiltración de aguas lluvias en el proyecto.





Fecha 29-05-2024.

Personal en obra por parte del contratista.

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingenieo civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social.

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

4 Obreros de oficios varios

5 oficiales

1 Ayudante.

Personal instalación Drywall

3 obreros de instalación.

personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE.

líder

Powered by CamScanner

Maquinaria - Equipos en obra
1 Tronzadora
1 Mezcladora
1 Vibro de concreto
1 Vibro compactador tipo rana

Estado del tiempo
Mañana soleado Media soleado Tarde soleado

SISOMA
Se registra el ingreso de personal en obra
Se identifican pausas activas dirigidas a los colaboradores del proyecto.
Se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP
Se identifica inspección de herramientas y area de trabajo.
Se verifica que las actividades se realicen de manera adecuada y segura.

ACTIVIDADES
Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 ha finalizado las actividades de levantamiento de mampostería en Arenada, sobre la viga de amarre fundida en días anteriores, cumpliendo con el compromiso establecido en un acta por el contratista para subsanar los daños ocasionados durante la demolición de la estructura existente del antiguo matadero del municipio de

Powered by CamScanner

de Oro, en el departamento del Cesar.
Estas obras se realizaron en el predio vecino del señor Fabricio Casadiegos.
La cuadrilla N°2 con las áreas de la placa de la bodega general y la viga canal terminadas, se procede a la continuidad de la impermeabilización de las placas. El objetivo es asegurar la hermeticidad para proteger el proyecto de las aguas lluvias y mantenerlo completamente seco y libre de humedades.
La cuadrilla N°3 se prosiguió con la nivelación de las áreas de manipulación de carga del proyecto, para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará con la loza de contrapiso, esmaltada y pulida, con el objetivo de avanzar en esta tarea.
La cuadrilla N°4 se centró en la instalación de malla electrosoldada con varillas de 6 mm de diámetro, con el fin de avanzar en el proyecto y preparar el área para la colocación de la placa de contrapiso en el área de manipulación de carga, la malla se instaló sobre dados de concreto con la misma resistencia, respetando el espaciamiento indicado en el diseño del acero de refuerzo.
La cuadrilla N°5 se continuó con la construcción de la mampostería y los elementos estructurales que la confinan en las áreas pendientes, elevándola a los niveles de la estructura metálica previamente instalada.





Powered by CamScanner

Fecha 30 05 2024

personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

1 Ayudante

4 obreros de oficios varios

5 oficiales.

personal instalación Drywall

3 obreros de instalación

personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE

Maquinaria equipos en obra

1 Tronzadora

1 Mezcladora

1 vibro de concreto

1 vibro compactador tipo rana

1 pistola de presión

1 taladro

1 pulidora

Estado del tiempo

Mañana Nublado Media Nublado Tarde Lluvioso

SISOMA.
Se registra el ingreso de personal
Se realizan charlas de inicio de turno
Se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP.
Se verifica que las actividades se realicen de forma segura y adecuada. En el area se entrega el acta de compromiso pactado de construcción de muro.

ACTIVIDADES.
Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas de la siguiente manera para dar continuidad a las actividades programadas.
La cuadrilla N°2 con las areas de la placa de la bodega general y la viga canal terminadas, se procede a la continuidad de la impermeabilización sobre la mampostería ya construida y de las placas, aplicando manto edil tal como lo expresa la especificación técnica. El objetivo es asegurar la hermeticidad para proteger el proyecto de las aguas lluvias y mantenerlo completamente seco y libre de humedades.
La cuadrilla N°2. se continua con la aplicación de poñete impermeabilizado sobre la mampostería ya construida y reforzada, con el objetivo de garantizar una total protección contra la infiltración de agua lluvia en el proyecto.
La cuadrilla N°3 se procede a la elaboración del concreto con una resistencia de F'c 3000 PSI, el cual será vertido en el area previamente preparada para la

Powered by CamScanner

construcción de la placa de contrapiso esta placa se ubicará en las zonas de manipulación de carga del proyecto El procedimiento se realizó en áreas longitudinales debido a la extensión del área a mejorar, asegurando una base robusta y duradera que soporte adecuadamente las actividades logísticas y el peso de los materiales manejados en estas áreas

La cuadrilla No 4. inicio la nivelación de las áreas de la zona de exteriores del proyecto, para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará con la zona en concreto. con el objetivo de avanzar en esta área





Fecha 31 - 05 - 2024
personal en obra por parte de contratista
mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 Ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
1 Ayudante
5 oficiales
4 obreros de oficios varios

Personal instalación Drywall
3 obreros de instalación.

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE.

Maquinaria - Equipos en obra.
1 Tronzadora
1 Mezcladora
1 vibro de concreto
1 vibro compactador tipo rana
1 pistola de presión
1 taladro
1 pulidora

Estado del tiempo
Mañana Nublado M. día Nublado Tarde Lluvia.

SISOMA.
Se registra el ingreso de personal a obra
se realizan charlas de inicio de turno
se identifica uso adecuado de dotación y EPP.

lidera

Powered by CamScanner

se realizan rondas de inspección y se verifica que las actividades se realicen de manera adecuada y segura.

Actividades

Durante la jornada diaria se coordinan las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas distribuyendo las tareas de la siguiente manera

La cuadrilla N°1 ya con los montos instalados y conformadas las áreas a impermeabilizar como lo es en el área de la placa cubierta de la bodega general y la viga canal, se procede a aplicar la pintura alquitrán para continuar con dicha impermeabilización.

La cuadrilla N°2 se continua con la aplicación del pañete impermeabilizado sobre la mampostería ya construida y reforzada, con el objetivo de garantizar una total protección contra la infiltración de aguas lluvias en el proyecto.

La cuadrilla N°3 procede a la elaboración de concreto con una resistencia de F'c 3000 PSI. el cual será vertido en el área previamente preparada para la construcción de la placa de contrapiso esmaltada y pulida tal cual como lo dicen las especificaciones técnicas. Esta placa se ubicará en las zonas de manipulación de carga del proyecto. El procedimiento se realizó en dos longitudinales debido a la extensión del área longitudinal a mejorar, asegurando una base

robusta y duradera que soporte adecuadamente las actividades logisticas y el peso de material manejado en estas areas.
La cuadrilla N°4 continué con la construcción de mamposteria y los elementos estructurales que la confinan en las areas pendientes, elevandola a los niveles de la estructura metálica previamente instalada.





Fecha 01-06-2024
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil residente de obra
1 profesional HSE
1 profesional social
Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
1 Ayudante
5 Oficiales
4 obreros de oficios varios

líder

personal instalacion drywall
3 ayudantes de instaldación

personal en obra por parte de interventoria
1 ingeniero civil - residente de interventoria
1 profesional HSE

Maquinaria - Equipos en obra
1 franzadora
1 Mezcladora
1 vibro de concreto
1 vibro compactador tipo rana
1 pistola de presión
1 Taladro
1 pulidora

Estado del tiempo
MAÑANA Nublado M.DIA. Nublado TARDE Nublado

SISOMA
se realiza el registro de ingreso de personal en obra
se realiza charla de inicio de turno y pausas activas al interior de la obra
se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP.
se realiza inspección de herramientas y equipos
se realizan recorridos en obra y se verifica que las actividades se realicen de forma segura.

ACTIVIDADES.

Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera. La cuadrilla N°1: se procede a la elaboración del concreto con la resistencia de F'c: 3000 psi, el cual será vertido en el área previamente preparada para la construcción de la placa de contrapiso esmaltada y pulida tal cual como lo dicen las especificaciones técnicas, esta placa se ubicará en la zona de manipulación de carga del proyecto. El procedimiento se realizó en áreas longitudinales debido a la extensión del área a mejorar, asegurando una base robusta y duradera, que soporte adecuadamente las actividades logísticas y el peso de los materiales manejados en estas áreas.

La cuadrilla N° 2 continuó con la construcción de la mampostería y los elementos estructurales que la confinan en las áreas perimetrales, elevándola a los niveles de la estructura metálica previamente instalada.

La cuadrilla N°3: ya con los muros instalados y conformadas las áreas a impermeabilizar, como lo es el área de la placa abierta de la bodega general y la vigueta, se continua a aplicar la pintura asfáltica, para continuar con dicha impermeabilización.

La cuadrilla N° 4 se continua con la aplicación de poliuretano impermeabilizado sobre la mampostería ya construida y reforzada, con el objetivo de garantizar un total protección

líderes

Powered by CamScanner

contra la infiltración de agua de lluvia en el proyecto.
La cuadrilla A&S se inicio la recevaluación de las areas de las zonas de exteriores del proyecto, para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorara con la lora en contacto, con el objetivo de avanzar en esta tarea.





Fecha 04-06-2024
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada.
1 maestro de obra
1 Ayudante
5 ohadatos

5 obreros de oficios varios

personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE.

Maquinaria - Equipo en obra
1 Vibradora
1 Mezcladora
1 vibro de concreto
1 vibro compactador tipo rana.

Estado del tiempo
Mañana Nublado M. Día Nublado tarde. Nublado

SI SOMA.
Se registra el ingreso de personal a obra
Se identifica poste y uso adecuado de dotación y EPP
Se realizan charlas de inicio de turno
Se realizan jornadas de orden y aseo
Se identifica adecuada disposición de residuos y desechos en obra.

ACTIVIDADES.
Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera
La cuadrilla N°1 continuo con la construcción de la composteria y los elementos estructurales que la conforman en las áreas pendientes, elevandola a los niveles de la

líder=

estructura metálica previamente instalada la cuadrilla N°2. se prosiguió con la nivelación de las arcos del patio en el costado oeste del proyecto, para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará con la loza de contrapiso esmaltada y pulida, con el objetivo de avanzar en esta tarea


La cuadrilla n°3 se cimbraron las dilataciones en el arca de traslado y manipulación de carga para luego ser cortadas con una sierra de punta de diamante. Las juntas de dilatación o juntas de expansión ya que son elementos creados en el diseño y construcción de estructuras de concreto, el cual permite que el concreto se expanda y contraiga debido a los cambios de temperatura, la humedad y otros factores ambientales.


La cuadrilla n°4 se inicia el desalojo de escombros en la zona de descarga del proyecto para ajustar la nivelación y compactación de terreno. Posteriormente se mejorará el arca con una losa de pavimento con una resistencia de F'c 4,000 PSI a los 28 días, con el objetivo de avanzar en esta tarea.





Powered by CamScanner





fecha 05-06-2024

Personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente o
1 ingeniero civil- residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
1 Ayudante
4 obreros de oficios varios
5 oficiales

Personal en obra por parte de interventoría.
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional H.S.E.

Maquinaria - Equipo en obra
1 Tronzadora
1 Niveladora
1 vibro de concreto
1 vibro compactador tipo rana

Estado del tiempo
Mañana Nublado Tarde Nublado Tarde Nublado

SISOMA.
Se registra el ingreso de personal

líder

se identifica parte y uso adecuado de dotación y EPP
se realiza inspección de maquinaria y herramientas.
se verifica que las actividades se realicen de forma adecuada y segura.
se realiza cambio o reposición de EPP dañados o vencidos
Actividades
Durante la jornada de hoy, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 se centró en la instalación de la malla electrosoldada de 6 mm de diametro con el fin de avanzar en el proyecto y preparar el area para la colocación de la placa de contrapiso en el area del patio en el costado oeste, la malla se instaló sobre dados de concreto con la misma resistencia, respetando el espaciamiento indicado en el diseño del area de refuerzo.
La cuadrilla N°2 procede con la elaboración de concreto con una resistencia de F'c 300 PSI, el cual será vertido en el area previamente preparada para la construcción de la placa de contrapiso esmaltada y pulida tal cual como lo dicen las especificaciones tecnicas. esta placa se ubicará en la zona del patio del costado oeste del proyecto. el procedimiento se realizó en areas longitudinales debido a la extensión del area a

mejorado, asegurando una base robusta y duradera que soporte adecuadamente las actividades logísticas y el peso de los materiales manejados en estas áreas.

La cuadrilla N°3 se prosiguió con la nivelación de las áreas de la zona de descargo del proyecto para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará el área con una losa de pavimento con una resistencia de F'c: 4000 PSI a los 28 días con el objetivo de avanzar en esta tarea.

La cuadrilla N°4 se procede a la elaboración del concreto con una resistencia de F'c 3.000 PSI, el cual será vertido en el área previamente preparada para la construcción de los elementos estructurales como lo son vigas y columnetas que confinarán la mampostería levantada.





líder

Fecha 06-06-2024
Personal en obra por parte de contratista
1 Arquitecto residente d
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social.

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
1 ayudante
4 obreros de oficios varios.
5 oficiales

personal en obra parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoria
1 profesional HSE

Maquinaria - Equipo en obra.
1 Cortadora
1 Mezcladora
1 vibro de concreto
1 vibro compactador tipo rana.

Estado del tiempo.
Mañana Nublado Media Nublado Tarde. Nublado

SISOMA.
- Se registra el ingreso de personal a obra
- Se realiza cambio o reposición de dotación EPP dañados
- Se realizan pausas activas al interior de la obra.

se identifica uso y uso de dotación y EPP para realizar las actividades laborales.
se realiza adecuada disposición de residuos y desechos de obra.

Actividades
durante la jornada diaria, se coordinan las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 prosiguió con la recuperación de las áreas de la zona de descargue del proyecto, para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará el área con una losa de pavimento con una resistencia de F'c 4000 PSI a los 28 días, con el objetivo de avanzar en esta tarea.
La cuadrilla N°2. se centró en la instalación de la malla electrosoldada con varillas de 6mm de diámetro, con el fin de avanzar en el proyecto y preparar el área para la colocación de la placa de contrapiso en el área de circulación de área de oficinas, la malla se instaló sobre dados de concreto con la resistencia, respetando el espaciamiento indicado en el diseño del acero de refuerzo.
La cuadrilla N°3 se continua con la misma aplicación de pared impermeabilizado sobre la mampostería construida y reforzada, con el objetivo de garantizar una total protección

lider

contra la infiltración de agua pluvial en el proyecto.
La cuadrilla N°4 se continuó con la construcción de la mampostería y los elementos estructurales que la confinan en las zonas pendientes; elevándola a los niveles de la estructura metálica previamente instalada.





Fecha 27-06-2024.
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil- residente de obra
1 profesional HSE- residente SST.
1 profesional social.

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
1 Ayudante
4 oficios de oficios varios
5 oficiales.

Personal en obra por parte de interventoría.
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria en obra
1 Trituradora
1 Mezcladora
1 vibro compactador tipo rana
1 vibro de concreto.

Estado del tiempo.
Mañana Nublado Media Nublado Tarde lluvia.

SISOMA.
- se registra el ingreso de personal a obra.
- se realizan rondas de inspección y se verifica que las actividades se realicen de forma segura y adecuada
- se identifican jornadas de orden y aseo al interior de la obra
- se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP.


ACTIVIDADES.
Durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 se continua con la aplicación de concreto impermeabilizado sobre la mampostería ya construida y reforzada, con el objetivo de garantizar una total protección contra la infiltración de aguas lluvias en el


Powered by CamScanner

proyecto.
La cuadrilla N°2 procede con la elaboración del concreto con una resistencia de f'c 3000 PSI, el cual será vertido en el área previamente preparada para la construcción de la placa de contrapiso, esta placa se ubicará en la zona de trasiego de las oficinas del proyecto. El procedimiento se realizó en áreas longitudinales debido a la extensión del área a mejorar, asegurando una base robusta y duradera que soporte adecuadamente las actividades logísticas y el peso de los materiales manejados en esta área.
La cuadrilla N°3. ha iniciado el replanteo y excavación del cárcamo en la zona de descargas, cuya función será recolectar el agua pluvial de las áreas exteriores. Este sistema de recolección conducirá el agua a través de una red de tuberías hasta el afluente situado en el costado norte del proyecto. Esta actividad es fundamental para garantizar un drenaje eficiente y evitar posibles inundaciones, asegurando así la correcta gestión de las aguas pluviales y contribuyendo a la sostenibilidad y operatividad del proyecto en su conjunto.



Powered by CamScanner





Fecha 08-06-2024
Personal en obra por parte del contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente.
1 ingeniero civil - residente de obra.
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
1 Ayudante
4 obreros de oficios varios
5 Oficiales

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria en obra
1 trompudora
1 Mezcladora
1 vibro de concreto
1 vibro compactador tipo rana

Estado del tiempo
Mañana soleado Media nublado Tarde lluvia

SISOMA.
Se registra el ingreso de personal en obra

lider

Powered by CamScanner

se hacen rondas de inspección de seguridad y se verifica que las actividades se realicen de forma adecuada y segura.
Se identifica que las actividades se realicen portando la dotación y los EPP de manera permanente.
Se realiza la inspección de equipos y herramientas.

Actividades
Durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N° 1 se centro en la recepción y excavación del cárcamo y replanteo en la zona de descarga, cuya función será recolectar el agua pluvial en las áreas externas. Este sistema de recolección conducirá el agua a través de una red de tuberías hasta el afluente situado en el costado norte del proyecto. Esta actividad es fundamental para garantizar un drenaje eficiente y evitar posibles inundaciones, asegurando así la correcta gestión de las aguas pluviales y contribuyendo a la sostenibilidad y operatividad del proyecto en su conjunto.
La cuadrilla N° 2. continuo con la recepción de las áreas en la zona de descarga del proyecto, para ajustar la nivelación y compactación del terreno donde se mejorará el área con una losa de pavimento con una resistencia de F'c 4000 PSI a los 28 días. con el objetivo de avanzar

en esta tarea.
La cuadrilla N°3 se procede con la elaboración del concreto con una resistencia de F'c 3000 PSI, el cual será vertido en el área previamente preparada para la construcción de la placa de contrapiso, esta placa se ubicará en la zona de trasiego de las oficinas del proyecto. El procedimiento se realizó en áreas longitudinales debido a la extensión del área a mejorar, asegurando una base robusta y duradera que soporte adecuadamente las actividades logísticas y el peso de los materiales manejados en estas áreas.
Nota, el personal operativo del contratista llevó a cabo una jornada de orden y aseo en toda el área de la obra con el objetivo de armonizar los ambientes laborales y ampliar la zona de ejecución en el área exterior. Durante esta actividad, se seleccionaron los residuos según lo explicado en la charla diaria, y se dispuso adecuadamente del exceso de material o escombros.



líder
